CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO GIBRALTAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | IDRD | BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar las obras y actividades complementarias de la manzana del cuidado Centro de Alto Rendimiento el Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy, Bogotá.

INFORME DE GESTIÓN DE CALIDAD # 3(ABRIL) Versión 2
POR PARTE DEL CONTRATISTA ACORDE CON EL PLAN DE CALIDAD

PLAZO DE EJECUCIÓN VEINTISEIS (26) MESES

CONTRATANTE IDRD

CONTRATISTA: CONSORCIO GIBRALTAR

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.06.05 10:03:59 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

Tabla de contenido

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN 8
1.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS 8
1.1.1. CONTRATISTA EJECUTOR 8
1.1.2. INTERVENTORÍA 9
1.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN 10
1.3. CONTROL Y SEGUIMENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS 13
1.4. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES 18
1.4.1 SEGUIMIENTO A ACTAS COMITÉ 18
1.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 19
1.4.3 BITÁCORA DE OBRA 19
1.4.4 CONTROL DE LOS REGISTROS 19
1.5. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA 20
1.5.1. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 20
1.5.2. LISTADO MAESTRO DE PLANOS 20
1.6. PLAN DE ADQUISICIONES 21
2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO 22
2.1. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN 22
2.2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS 23
2.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 23
2.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES 24
2.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 24
2.5.1. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DEL PROCESO DE ENTREGABLES 24
2.5.2. SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES 27
2.5.3. EVIDENCIAR RESULTADOS DE VALIDACION 29
3. CONTROL DE LA GESTION 30
3.1. CONTROL DE LOS CAMBIOS 30
3.2. SALIDAS NO CONFORMES 30

3.3. AUDITORIAS 30

TABLAS

Tabla 1. Generalidades Contrato Constructor 8
Tabla 2. Generalidades del Contrato Interventoría 9
Tabla 3. Medición de indicadores aplicables al periodo 10
Tabla 4. Seguimiento del recurso humano 14
Tabla 5. Firmas Autorizadas 16
Tabla 6. Actas Comité 19
Tabla 7. Revisión de Entregables 24
Tabla 8. Documentos radicados previamente para el anticipo 27

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización - Vista Área Polo de Desarrollo Sur Gibraltar 4
Ilustración 2. Esquema Básico Del Edificio Centro de Alto Rendimiento 7
Ilustración 3. Esquema Diseño Arquitectónico 7
Ilustración 4. Localización y logística en el predio 22

ANEXOS

Anexo 0 Medición de los indicadores de gestión

Anexo 1 Actas de comité

Anexo 2 Correspondencia recibida y enviada

Anexo 3 Control de registros

Anexo 4 Listado Maestro de Documentos

Anexo 5 Registro Fotográfico

Anexo 6 Acciones Correctivas

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la información que evidencia la gestión de calidad por parte de CONSORCIO GIBRALTAR en el proyecto **Centro de Alto Rendimiento en el marco de la Manzana del Cuidado del Porvenir (Gibraltar). Localidad De Kennedy – Bogotá** Con el fin de lograr satisfacer los requisitos del cliente y alcanzar los objetivos que han sido establecidos en el plan de calidad, se han contemplado las exigencias de la Norma NTC ISO 9001:2015 orientando las actividades administrativas y operativas al cumplimiento de estas y a su vez las que han sido establecidas en el pliego de condiciones y requeridas por la entidad contratante IDRD.

Durante el periodo del presente informe se ha asumido con responsabilidad la verificación de la calidad de la etapa inicial, se implementó el plan de calidad para la ejecución del contrato de Obra No IDRD-CTO-3203-2023 y se realizó seguimiento a la implementación del mismo, de lo cual se evidencia cumplimiento con las especificaciones aplicables a las actividades ejecutadas en el presente periodo y establecidas por el IDRD en el apéndice correspondiente.

Para la ejecución del proyecto se verificó también el cumplimiento de las especificaciones de la norma sismo resistente NSR-10 y demás normas establecidas para la construcción de este tipo de infraestructura, las cuales están descritas en el plan de calidad. El proyecto: Centro de Alto Rendimiento en el marco de la Manzana del cuidado del Porvenir (Gibraltar). Localidad de Kennedy ubicado en la Carrera 91 # 43-20 Sur barrio el Porvenir en Bogotá Distrito Capital.

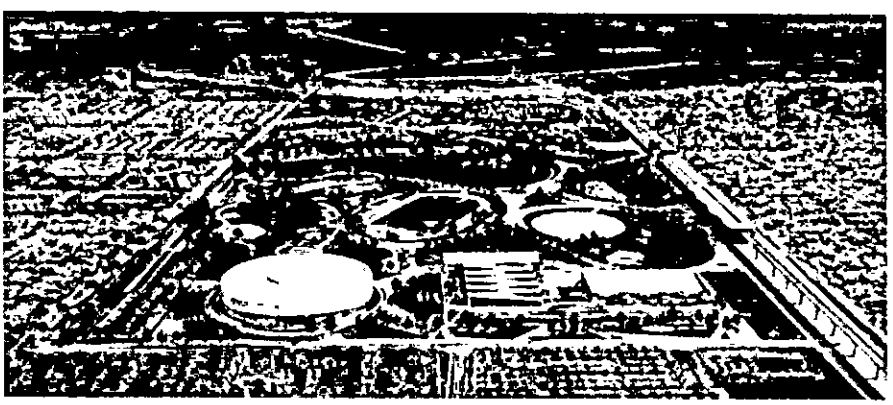


Ilustración 1. Localización - Vista Área Polo de Desarrollo Sur Gibraltar.

El alcance del plan de calidad del proyecto es: Verificar el cumplimiento del objeto del contrato de obra y todas las obligaciones específicas, así como también las especificaciones técnicas y productos entregables que se encuentran contenidos en los documentos de ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGO DE CONDICIONES Y ANEXO TÉCNICO CON SUS APENDICES del contrato objeto de intervención.

Para ello se efectúa la verificación sobre los productos contratados los cuales en su generalidad contemplan los siguientes espacios:

- Polideportivo:

✓ Graderías.
✓ Escenario de competencia.
✓ Ocho (8) salones de entrenamiento (Gimnasia, Boxeo, Taekwondo, Judo,
✓ Karate, Lucha, Esgrima y Pesas).
✓ Unidad ciencias aplicadas.

- Piscinas:

✓ Graderías.
✓ Restaurante.
✓ Gimnasio.
✓ Salón spinning.
✓ Tres (3) salones múltiples.
✓ Piscina olímpica.
✓ Piscina de entrenamiento.
✓ Vertieres.

- Cultural:

✓ Auditorio.
✓ Salón múltiple (tres espacios).

- Administrativo:

✓ Administraciones.
✓ Administrador.
✓ Cuarto de seguridad.

- Técnico (restringido):

- ✓ Calderas de piscina.
- ✓ Cuartos eléctricos.
- ✓ Tanques de almacenamiento de agua.
- ✓ Equipos de ventilación mecánica

- Accesos, servicios y circulaciones.

Se deberán adelantar las siguientes actividades administrativas y de coordinación del proyecto:

- ✓ Revisión de la información y validación de los documentos entregados por la consultoría presentados mediante un informe de conformidad a lo descrito en la etapa inicial del proyecto.
- ✓ Implementación de metodología BIM.
- ✓ Revisión y Validación de los tratamientos silviculturales frente a estudios y diseños.
- ✓ Plan de Construcción y Coordinación Logística.
- ✓ Solicitud de Permisos o actualización de estos.
- ✓ Y todos los trámites respectivos que se requieran para recibir el aval o aprobación por parte de las diferentes Entidades.

FASES DEL PROYECTO

Fase 1: Etapa inicial: Efectuar el reconocimiento y retroalimentación de información del proyecto entregado por el IDRD producto del contrato de consultoría No. 3662-2019 cuyo objeto consistió en "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PARA EL CENTRO DEPORTIVO RECREATIVO CULTURAL (CEFE) DEL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR-BICENTENARIO)" recibido a satisfacción por el supervisor del contrato, con el propósito que se realicen las actividades contractuales, descritas en el anexo 1 - anexo técnico.

Fase 2: Etapa de construcción: Efectuar las actividades administrativas y de coordinación del proyecto, así como la construcción de la edificación del CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) mediante un módulo arquitectónico que contempla un polideportivo, una zona de piscinas, área cultural, área administrativa, área técnica, accesos y circulaciones con unárea de 23.467,74 m2 y urbanismo con un área 19.102,01 m2.

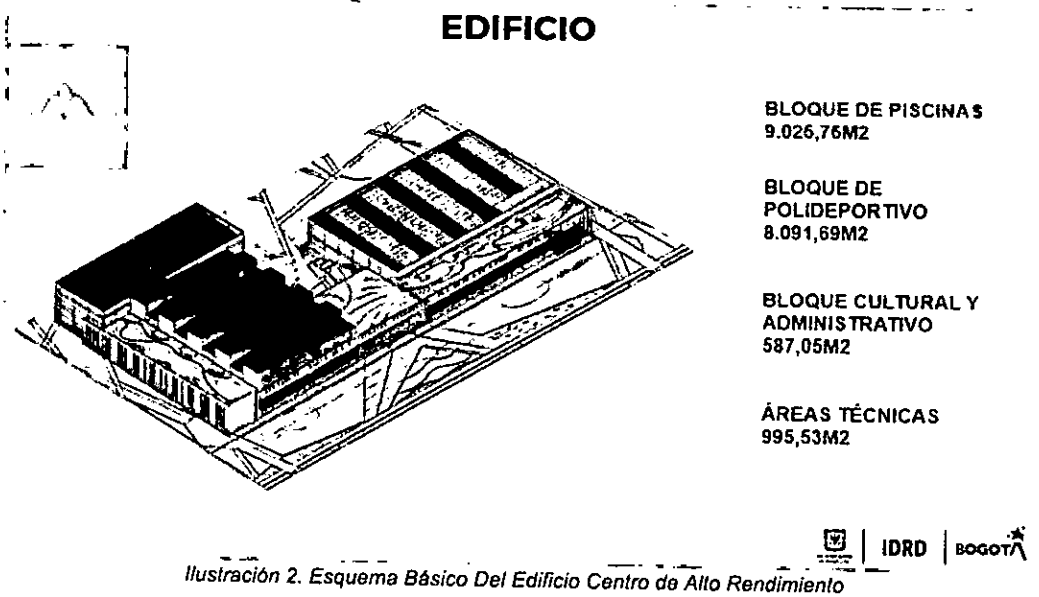


Ilustración 2. Esquema Básico Del Edificio Centro de Alto Rendimiento

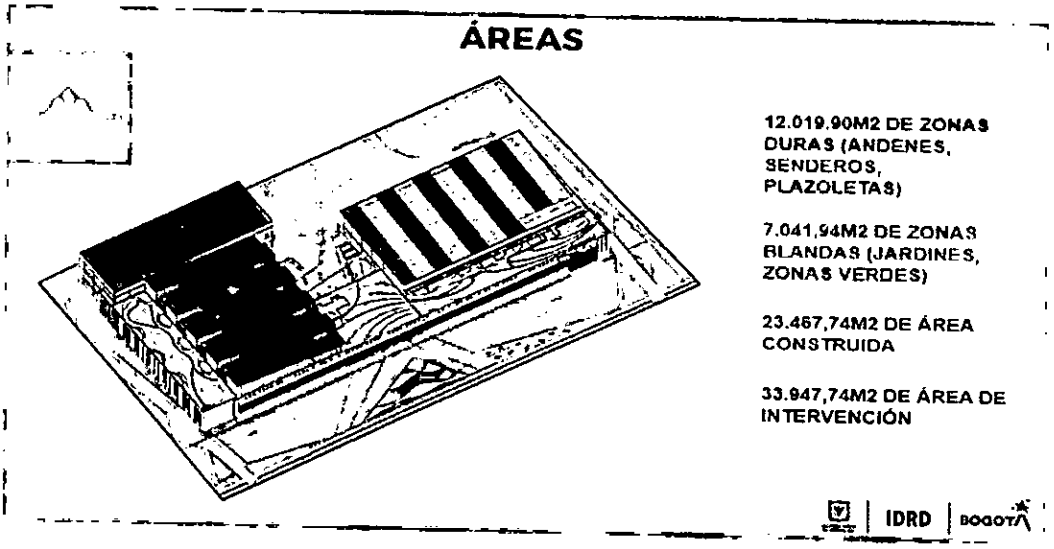


Ilustración 3. Esquema Diseño Arquitectónico

4

1. ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS

1.1.1. CONTRATISTA EJECUTOR

Tabla 1. Generalidades Contrato Constructor

CONTRATISTA	CONSORCIO GIBRALTAR
NIT	N° 901.777.403 -8
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA MANZANA DEL CUIDADO CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTÁ.
N° CONTRATO	DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023
FECHA DE INICIO	6 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE ABRIL DE 2026
PLAZO DE LA ETAPA DE OBRA	VEINTISEIS (26) MESES
ALCANCE OBJETO CONTRACTUAL	Desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en el anexo 1 – técnico, se aplica para las obras y actividades complementarias del proyecto, de acuerdo con el objeto del mismo: CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LA MANZANA DEL CUIDADO CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY BOGOTÁ". De todas las fases del proyecto: Etapa Inicial, Etapa de Construcción; de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación IDRD-DG-LP015-2023.

Para el presente periodo no se presentaron suspensiones, adiciones o prorrogas al contrato de obra que hace parte integral del proyecto, en cuanto a las pólizas se encuentran vigentes, la misma fue solicitada desde el 22 de diciembre de 2023, con fecha de inicio de entrada en vigencia del 30 de noviembre de 2023, hasta el 30 de enero del 2026, que presenta los siguientes amparos:

- Predios labores y operaciones.
- Contratistas y subcontratistas.
- Perjuicios extra patrimoniales.
- Responsabilidad civil Patronal.
- Vehículos propios y no propios.

No obstante, se presenta comunicado de interventoría CIG-IDRD-CEFE-E057-2024 del 8 de marzo de 202 donde se solicita la actualización por la fecha de inicio del contrato, radicación de los pagarés originales de las pólizas del contrato de obra con el comunicado IDRD-3203-E099-2023 del 14 de marzo de 2024 y se presenta comunicado IDRD-3203-E0112-2023 del 18 de marzo de 2024 con la actualización de las pólizas firmadas en original

a.) Póliza de seguro de cumplimiento estatal con # 400052682.
b.) Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual deriva de cumplimiento con el # 400052683.

1.1.2. INTERVENTORÍA

Tabla 2. Generalidades del Contrato Interventoría

CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
NIT	901.780.784-1
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, SST Y JURÍDICA A LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LOS PROYECTOS 1 y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ".
N° CONTRATO	3219 DE 2023
FECHA DE INICIO	6 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	6 DE MAYO DE 2026

PLAZO DE LA ETAPA DE OBRA	VEINTISIETE (27) MESES
ALCANCE	Ejecutar las obligaciones generales establecidas en los estudios previos y pliego de que hacen parte integral del contrato 3219 DE 2023, así como realizar la interventoría técnica, administrativa, contable, financiera, social, ambiental, SST y jurídica a las obras y actividades complementarias para la ejecución de: "PROYECTOS 1 y 2 A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - STC DEL IDRD PARA EL PREDIO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTÁ".

1.2. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTIÓN

Se presenta a continuación el seguimiento a los indicadores de gestión propuestos para el presente periodo que ha sido exclusivo de apropiación de los estudios y diseños de consultoría, así como de la entrega de los documentos mínimos ligados al anexo 1 como entregables, para dar viabilidad a la etapa de construcción, los mismos presentan medición debido a que la etapa o fase 2 no se ha viabilizado pero ya el presente periodo corresponde al primer mes del plazo de obra y por lo tanto ya se presentan retrasos en los productos de planes y programas ambientales vitales para autorizar el inicio y gestionados interdisciplinariamente con la Interventoría en representación de la entidad contratante IDRD.

Para una mayor visualización se adjuntan en el ***(Anexo 0. - Medición de los Indicadores de Gestión),*** la misma tabla describe en las observaciones el detalle del logro o el incumplimiento, que se sustenta con la redacción de una no conformidad y el tratamiento con acciones correctivas.

Tabla 3. Medición de indicadores aplicables al periodo

No	NOMBRE	FORMULA DEL INDICADOR	META valor mínimo aceptable)	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	SEGUIMIENTO DEL 3ER INFORME DE FASE 1		
						DATOS	% ALCANZADO	CUMPLE
1	Índice de seguimiento de GANT, cumplimiento de actividades y/o obras ejecutadas, según lo planificado. Curva S	Tiempo real de ejecución de las actividades Vs tiempo proyectado ejecución de las actividades del proyecto. Nota 1: para el mes 1 y 2 de la fase 1 se consideraron actividades y no tiempo. Nota 2: para el mes 3 de la fase 1 se consideraron actividades y por ser también el 1er mes de obra se consideró valores del presupuesto	95%	Director de Obra	Mensual	8 actividades ejecutadas / 8 actividades programadas	100%	SI
						43.489 / 626.079	7%	NO
2	Índice de valor ganado	Presupuesto ejecutado Vs presupuesto presentado	100%	Director de Obra	Mensual	Entrega de documentos para tramitar el anticipo	No aplica	N/A
						43.489 / 626.079	7%	NO

3	Índice de cumplimiento del plan de inspección y ensayos	No de actividades del plan de inspección y ensayos ejecutadas Vs las actividades del plan de inspección y ensayos planificadas	100%	Profesional de Calidad	Mensual	Periodo sin inicio de dicho control	No aplica	N/A
4	Índice de Salidas No Conformes	No. de salidas no conformes eficaces vs el No de Salidas No Conformes	80%	Profesional de Calidad	Trimestral	se presenta 1 NC	No aplica	N/A
5	Índice de satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes PQRFS	No de PQRFS resueltas efectivamente Vs total de PQRFS recibidas	80%	Profesional Social	Trimestral	No se presentan	No aplica	N/A
6	Índice de Satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes	No de encuestas de satisfacción con calificación buena vs en total de encuestas de satisfacción	80%	Profesional de Calidad	Trimestral	No corresponde el periodo	No aplica	N/A
7	Índice de mejora continua	No de Indicadores de gestión que cumplieron con la meta vs el total de Indicadores	80%	Profesional de Calidad	Mensual	1/1	25%	SI
8	Índice de oportunidad en la entrega de informes	Entrega de informes dentro del plazo establecido Vs el total de los informes entregados	80%	Director de obra	Mensual	8/8	100%	N/A

9	Índice de Cumplimiento de entrega de productos por componente	# de productos por componente entregados Vs el total de los productos requeridos a entregar	80%	Profesional de Calidad	Mensual	9/13	69%	NO
10	Índice de control de los equipos seguimiento y medición	# total de equipos de seguimiento y medición controlados Vs el total de equipos de seguimiento y medición utilizados	80%	Profesional de Calidad	Mensual	No corresponde el periodo	No aplica	N/A
11	Índice de Cumplimiento al plan de adquisiciones,	# de actividades del plan de adquisiciones ejecutadas Vs el # de actividades planificadas de adquisiciones	80%	Profesional de Compras	Mensual	No corresponde el periodo	No aplica	N/A

1.3. CONTROL Y SEGUIMENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS

Durante el presente periodo se aprueba el profesional de informática y telecomunicaciones el ingeniero JAIME ARTURO CHAVES NIÑO en reemplazo del ingeniero que se había propuesto en el mes de marzo el Ing. MAICOL TORREBLANCA.

Así mismo se informa que en el periodo no se han realizado cambios de personal y que se encuentran todos los profesionales activos de acuerdo con la dedicación solicitada de la misma fase 1, además se informa que de acuerdo con el comunicado CIG- IDRD-CEFE-149-2024 del 9 de abril de2024 no se autoriza por parte de la interventoría y la entidad contratante el inicio de actividades de la fase 2 etapa constructiva, hasta que se encuentren aprobados y radicados en la Secretaria Distrital de Ambiente los planes PMA, PGRD y PCA.

Tabla 4. Seguimiento del recurso humano









No.	CARGOS CONTRACTUALES	NOMBRE	% DE DEDICACIÓN	FECHA Y # RADICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA	FECHA Y # RADICADO DE APROBACIÓN INTERVENTORIA
1	DIRECTOR DE OBRA	STEVE MORENO ORTIZ	100%	12 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E027-2023 Remisión entrega preliminar hojas de vida personal clave	23-FEB-24 y IDRD-CEFE-040-2024 - Revisión HV No.2 y 3 y aceptación personal contratista No.2
22	PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL	MARIA ISABEL ROCHA ROMERO	80%		
23	PROFESIONAL EN CALIDAD	CAROLINA SANCHEZ LEÓN	100%		
4	PROFESIONAL ESTRUCTURAL	YESID ALEXANDER MUNAR CASTAÑEDA	100%		
9	PROFESIONAL HIDRÁULICO	GINA PAOLA GONZALEZ REYES	0%		
10	PROFESIONAL ELÉCTRICO O ELECTRICISTA	ANDRES FABIAN BECERRA PORRAS	0%		
25	PROFESIONAL PAISAJISMO Y FORESTAL	FERNANDO CALIXTO CHAVARRO	10%		
36	BIOLOGO	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA LOPEZ	16%		
6	PROFESIONAL GEOTECNISTA	MAXIMILIANO VILLADIEGO ESTRADA	30%	22 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E047-2023 Remisión entrega hojas de vida personal clave	
11	PROFESIOANAL MECANICO Y AIRE ACONDICIONADO	RICARDO OCTAVIO CARRANZA	0%		
28	PROFESIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE	CARLOS ORLANDO RODRIGUEZ GONZALEZ	15%		
37	PROFESIONAL EN URBANISMO	CARLOS ALBERTO SINESTERRA AULESTIA	0%	27 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E055-2023 Rev. 2 y3 Hoja de vida profesionales	
29.1	AUX ADMINISTRATIVO DE OBRA 1	LAURA PAOLA ALVARADO CHAVARRO	100%		21-mar-24 IDRD-CEFE-108-2024 - Revisión HV No 7 y aceptación personal contratista No. 5 ratifica listado completo de personal aprobado
29.2	AUX ADMINISTRATIVO DE OBRA 2	NICOLAS RODRIGUEZ ROJAS	100%		
24	RESIDENTE DISEÑO CONTROL DE OBRA (PROF DE COMPRAS)	SANTAGO REYES GUTIERREZ	100%	21-MAR-24 y IDRD--3203-E0128-2023 radicación en físico de las hojas de vida aprobadas	
32	RESIDENTE DISEÑO Y CONTROL DE OBRA – PROF BIM	JOSE ARLEY RODRIGUEZ PINEDA	100%		
35.1	CADENERO I	CARLOS JULIO OBANDO	80%		
35.2	CADENERO II	DAIRO STWART IBARRA PARADA	80%		
27	PROFESIONAL SST	ADRIANA CASTELBLANCO	100%	28-FEB-24 y IDRD--3203-E057-2023	08-MAR-24 CIG-IDRD-CEFE-053-2024

No.	CARGOS CONTRACTUALES	NOMBRE	% DE DEDICACIÓN	FECHA Y # RADICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA	FECHA Y # RADICADO DE APROBACIÓN INTERVENTORIA
34	TOPOGRAFO	LUIS ALEXI NIETO BARRERA	80%	27 DE FEB DE 2024 y IDRD–3203-E055-2023 Rev. 2 y 3 Hoja de vida profesionales	08-MAR-24 CIG-IDRD-CEFE-053-2024
13	PROFESIONAL AMBIENTAL	SANDRA RUIZ RUIZ	100%	27 DE FEB DE 2024 y IDRD–3203-E055-2023 Rev. 2 y 3 Hoja de vida profesionales 13-03-24 IDRD–3203-E094-2023 14-03-24 IDRD-3203-E0103-2023	08-MAR-24 CIG-IDRD-CEFE-053-2024
14	RESIDENTE AMBIENTAL DE OBRA	LADY MILENA BENAVIDES POSADA	100%		08-MAR-24 CIG-IDRD-CEFE-053-2024
15	MAESTRO O INSPECTOR DE OBRA	DAVID HUMBERTO GUIZA	0%		08-MAR-24 CIG-IDRD-CEFE-053-2024
26	PROFESIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	RICARDO ALARCON OVALLE	0%		08-MAR-24 CIG-IDRD-CEFE-053-2024
30	**INGENIERO INFORMATICO Y TELECOMUNICA...**	**JAIME ARTURO CHAVES NIÑO**	0%	**IDRD-3203-E0122-2023 04-04-24 IDRD-3203-E0167-2023 17-04-24 IDRD-3203-E0218-2023 18-04-24 IDRD-3203-E0223-2023**	**15-ABR-24 CIG-IDRD-CEFE-165-2024 17-04-24 CIG-IDRD-CEFE-165-2024**
33	PROFESIONAL HIDROGEOLOGO	SARA E CHAPARRO	0%	27 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E055-2023 Rev. 2 y 3 Hoja de vida profesionales 13-03-24 IDRD-3203-E094-2023 14-03-24 IDRD-3203-E103-2023	08-MAR-24CIG-IDRD-CEFE-053-2024
CARGOS CONTRACTUALES APROBADOS QUE NO APLICAN PARA LA PRESENTE FASE					
21	ABOGADO	JUAN MANUEL ROMERO VILLA	10%	12 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E027-2023 Remisión entrega preliminar hojas de vida personal clave 22 DE FEB DE 2024 y IDRD–3203-E047-2023 Remisión entrega hojas de vida personal clave	23 DE FEB DE 2024 y IDRD-CEFE-040-2024 - Revisión HV No.2 y 3 y aceptación personal contratista No.2 21-mar-24 IDRD-CEFE-108-2024 - Revisión HV No 7 y aceptación
31	INGENIERO REDES CONTRA INCENDIO	GINA PAOLA GONZALEZ REYES	0%		
2.1.	PROFESIONAL AUXILIAR DE OBRA No.1	ALEJANDRO PEREZ SARDOTH	0%		
2.2.	PROFESIONAL AUXILIAR DE OBRA No 2	LAURA CAROLINA ALVAREZ RAMIREZ	0%		
3	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	MARTHA YANNETH AVENDAÑO ORJUELA	100%		

No.	CARGOS CONTRACTUALES	NOMBRE	% DE DEDICACIÓN	FECHA Y # RADICADO POR PARTE DEL CONTRATISTA	FECHA Y # RADICADO DE APROBACIÓN INTERVENTORIA
5	RESIDENTE DE ESTRUCTURA METÁLICA	RAUL CARO OLARTE	0%	27 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E055-2023 Rev. 2 y 3 Hoja de vida profesionales 21-MAR-24 y IDRD--3203-E0128-2023 radicación en físico de las hojas de vida aprobadas	personal contratista No. 5 ratifica listado completo de personal aprobado
7	RESIDENTE DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	JUAN CARLOS VARGAS CHAPARRO	100%		
8	RESIDENTE DE ACABADOS	LORENA DEL ROSARIO MUÑOZ RIVERA	0%		
12	RESIDENTE DE INSTALACION DE PISCINAS	GINA PAOLA GONZALEZ REYES	0%		
16	ALMACENISTA	HERMENEGILDO CASTILLO	0%	12 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E027-2023 Remisión entrega preliminar hojas de vida personal clave 22 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E047-2023 Remisión entrega hojas de vida personal clave 27 DE FEB DE 2024 y IDRD--3203-E055-2023 Rev. 2 y3 Hoja de vida profesionales	23 DE FEB DE 2024 y IDRD-CEFE-040-2024 - Revisión HV No.2 y 3 y aceptación personal contratista No.2 21-mar-24 IDRD-CEFE-108-2024 - Revisión HV No 7 y aceptación personal contratista No. 5 ratifica listado completo de personal aprobado
17	AUXILIAR DE ALMACEN	JOSÉ FERNANDO SOLORZANO TORRES	0%		
18	SECRETARIA DE OBRA	MONICA OLIVA DANIELD´S PARADA	0%		
19	PERSONAL OPERARIO	BIBIANA MOSQUERA MOSQUERA	0%		
20	MENSAJERO DE OBRA	DORIS CAROLINA GOMEZ GONZALEZ	0%		

Tabla 5. Firmas Autorizadas

FECHA	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
29-02-2024	ALFREDO MUÑOZ RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL	CONTRATISTA	
29-02-2024	GERMAN PRADILLA	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	CONTRATISTA	
29-02-2024	STEVE MORENO ORTIZ	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATISTA	
29-02-2024	CAROLINA SANCHEZ LEON	RESIDENTE DE CALIDAD	CONTRATISTA	
29-02-2024	ADRIANA CASTELBLANCO	RESIDENTE DE SST	CONTRATISTA	

29-02-2024	MARIA ISABEL ROCHA	RESIDENTE SOCIAL	CONTRATISTA	
29-02-2024	YESID MUNAR	ESTRUCTURAL	CONTRATISTA	
29-02-2024	MAXIMILIANO VILLADIEGO	GEOTECNISTA	CONTRATISTA	
29-02-2024	ANDRES BECERRA	ELECTRICISTA	CONTRATISTA	
29-02-2024	RICARDO CARRANZA	MECANICO	CONTRATISTA	
29-02-2024	FERNANDO CALIXTO	FORESTAL	CONTRATISTA	
29-02-2024	ALEXI NIETO	TOPOGRAFO	CONTRATISTA	
29-02-2024	MIGUEL CASTAÑEDA	BIOLOGO	CONTRATISTA	
29-02-2024	CARLOS SINESTERRA	URBANISMO	CONTRATISTA	
29-02-2024	CARLOS RODRIGUEZ	TRANSITO Y TRANSPORTE	CONTRATISTA	
30-03-2024	LADY MILENA BENAVIDES	RESIDENTE AMBIENTAL	CONTRATISTA	
30-03-2024	SANDRA RUIZ RUIZ	PROF. EN MANEJO DE SUELOS CONTAMINADOS	CONTRATISTA	
30-03-2024	RICARDO ALARCON OVALLE	PROF. EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	CONTRATISTA	

30-03-2024	SARA E CHAPARRO	PROF. HIDROGEOLOGO	CONTRATISTA	
30-03-2024	JUAN MANUEL ROMERO VILLA	ABOGADO	CONTRATISTA	
30-03-2024	MARTHA YANNETH AVENDAÑO	ING. RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA	
30-03-2024	JUAN CARLOS VARGAS CHAPARRO	RESIDENTE DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	CONTRATISTA	
30-03-2024	SANTIAGO REYES GUTIERREZ	RESIDENTE DISEÑO CONTROL DE OBRA (PROF DE COMPRAS)	CONTRATISTA	
30-03-2024	JOSE ARLEY RODRIGUEZ PINEDA	RESIDENTE DISEÑO Y CONTROL DE OBRA - PROF BIM	CONTRATISTA	
30-03-2024	CARLOS JULIO OBANDO	CADENERO I	CONTRATISTA	
30-03-2024	DAIRO STIWART IBARRA PARADA	CADENERO II	CONTRATISTA	
17-04-2024	**JAIME ARTURO CHAVEZ NIÑO**	**INGENIERO INFORMATICO Y DE TELECOMUNICACIONES**	**CONTRATISTA**	

1.4. SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES

1.4.1 SEGUIMIENTO A ACTAS COMITÉ

A continuación, se relacional las actas de comité técnico suscritas durante la ejecución del contrato, en donde los compromisos adquiridos a lo largo de la ejecución del proyecto se les dio un alcancé, cumpliendo a satisfacción las directrices dadas, se evidencia dicho control en el cuadro de seguimiento a compromisos. (***Anexo 1. Actas celebradas en el periodo).***

Tabla 6. Actas Comité

Acta No	COMITÉ / REUNIÓN	FECHA
8	Comité	03/04/2024
9	Comité	10/04/2024
10	Comité	17/04/2024
11	Comité	24/04/2024
12	Comité	30/04/2024

1.4.2 CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Cabe anotar que se lleva acabo el debido control documental, en el caso específico de la correspondencia correspondiente al periodo. ***(Anexo 2. Correspondencia Recibida y Enviada)***

Para el periodo del presente informe no se presentaron ni se requirieron consultas por parte de entes de control o entidades públicas.

1.4.3 BITÁCORA DE OBRA

La bitácora obra se suscribirá una vez finalice la fase 1, durante el presente periodo se realizaron visitas conjuntas para revisar el componente biótico (forestal y biólogo) de la obra y la interventoría para consolidar los documentos de revisión y apropiación de la respectiva fase.

1.4.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Los registros que se han generado en el periodo se han controlado en el listado maestro de registros, correspondiendo a la entrega de los informes por especialidad que corresponden a las revisiones de los componentes de la fase 1 de apropiación de los estudios y diseños de consultoría y que al ser revisados fueron radicados ante la interventoría, que dan cumplimiento a lo establecido por el cliente y requerimientos de la fase pre-obra y planteado en el plan de calidad. ***(Anexo No. 3 Control de registros).***

1.5. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La información documentada que maneja el contratista este almacenado en la nube del CONSORCIO GIBRALTAR y es de fácil acceso al personal directivo del proyecto.

Durante el presente periodo se generaron cambios en las versiones de los documentos radicados en el presente periodo aplica para:

I. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,
II. El plan de manejo de Residuos de Demolición y Construcción (RCD),
III. El plan de contingencia ambiental
IV. el plan de gestión de riesgos de desastre.
V. La programación de obra fase 2
VI. El Plan de construcción y coordinación logística.
VII. Plan de manejo de fauna.
VIII. Plan de manejo forestal.
IX. El Plan de ejecución BIM.
X. Documento Bogotá Construcción Sostenible.

Como seguimiento y control a la información documentada, control de los documentos internos y/o externos que se requirieron durante el periodo de abril en el desarrollo del Contrato de Obra 3202 de 2023, se describen en el Listado maestro de documentos internos y externos.

1.5.1. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Durante el presente periodo, se lista en el ***(Anexo 4. - Listado maestro de información documentada).***

1.5.2. LISTADO MAESTRO DE PLANOS

El Listado maestro de Planos se encuentra en proceso de elaboración ya que durante la presente etapa de recepción de la información del contrato de consultoría objeto de apropiación durante los primeros dos meses de plazo, es así como al término del periodo falta la consolidación del juego de planos definitivos de obra y la coordinación interdisciplinaria entre los mismos que permitan el inicio de la fase 2 de construcción con él mínimo de contratiempos, que correspondería al mes de abril.

Por lo tanto, se presentará cuando se tenga completo para el primer informe de la fase 2, en él se identificará claramente las versiones de los planos, asegurando que en la obra se contará con la versión definitiva y vigente.

1.6. PLAN DE ADQUISICIONES

La información de gestión del plan de adquisiciones no aplica para el presente periodo debido a que se encuentra en fase de pre-obra y a la fecha el mismo se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría, mediante comunicación IDRD-E105-2023 del 14 de marzo de 2024 se solicita dar respuesta a la revisión con celeridad a la documentación radicada para dar viabilidad al inicio de la fase 2 y obtener el correspondiente aval del IDRD.

2. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO

2.1. SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y PRESERVACIÓN

Para el desarrollo y ejecución del alcance del presente contrato se determinó y se proporcionó la infraestructura necesaria para cumplir con los requerimientos del cliente y lograr la conformidad con los requisitos del producto. la Oficina Administrativa, ubicada en la ciudad de Bogotá en la CARRERA 16# 93ª36; piso 6to la cual cuenta con software; hardware; muebles, enseres y equipos de comunicación; Para el presente periodo en el sitio de la obra no se realiza manejo de campamentos fijos o temporales, por encontrase en la etapa de pre-obra.

Se adjunta el esquema de la localización del proyecto, que evidencia la logística, indicando la distribución del campamento y los frentes de obra.

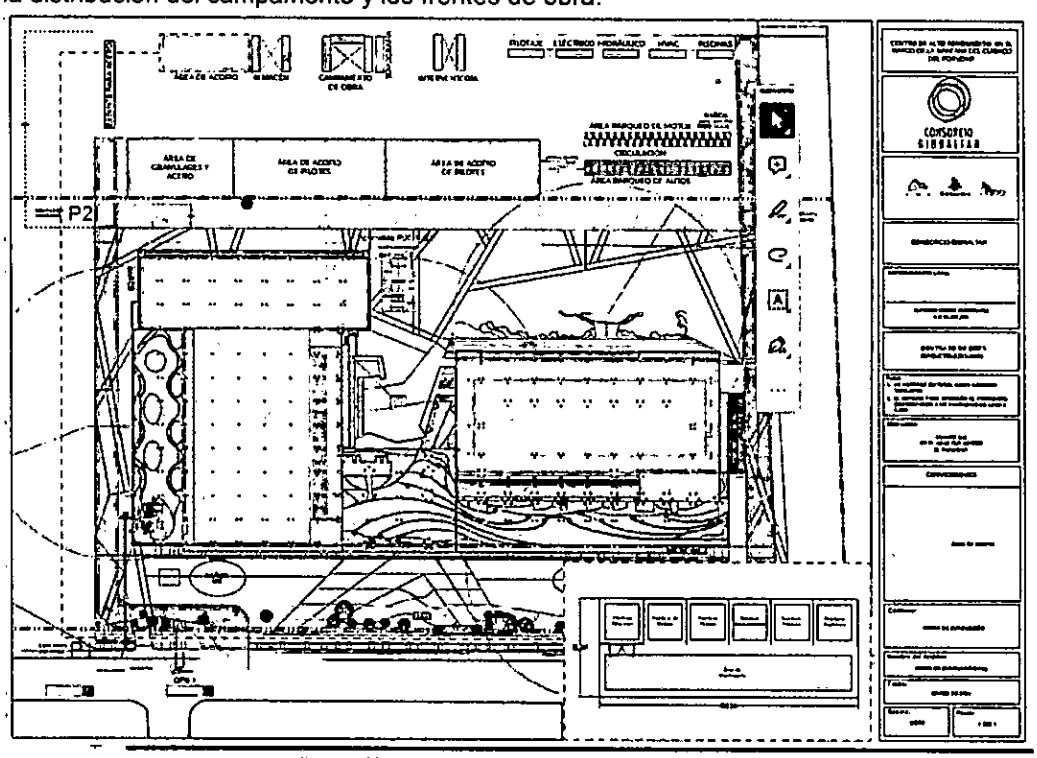


Ilustración 4. Localización y logística en el predio

No obstante, se informa que durante el presente mes se llevaron al predio dos container de 40 pies cada uno.

- Ambiente para la operación de los procesos

Durante el presente periodo de abril se ha determinado, proporcionado y mantenido el ambiente necesario para la operación de los procesos y la ejecución de la apropiación de los estudios y diseños, la combinación de los factores humanos y físicos ha sido efectiva para el buen funcionamiento de dicha etapa, se ha contado con un ambiente tranquilo, libre de conflictos; los espacios se mantienen a una temperatura adecuada, bien ventilados e iluminados, oficinas del CONSORCIO GIBRALTAR.

- Maquinaria y Equipos

Para el periodo del presente informe se entrega la relación de la Maquinaria con la cual se contará en obra, radicado el 16 de febrero de 2024 y con la comunicación IDRD-E105-2023 del 14 de marzo de 2024 se solicita dar respuesta a la documentación radicada para dar viabilidad al inicio de la fase 2 en lo que respecta a equipo mínimo para la construcción.

Así mismo se informa que con el empleo de una retroexcavadora se adecuo el acceso externo al sitio de la obra. ***(Anexo 5 – registro fotográfico).***

2.2. CUMPLIMIENTO AL PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

De acuerdo a las actividades ejecutadas en el periodo no aplica el seguimiento y control al plan de inspección y ensayos y dará inicio durante la etapa de construcción o fase 2.

2.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Para el presente periodo no se relacionan equipos para las actividades de seguimiento y medición.

- ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO

  Para el presente informe no se aporta el certificado de acreditación del laboratorio. Por estar aun en la fase 1.

12

- CALIBRACIÓN EQUIPOS LABORATORIO

  Para el presente informe no se aportan certificados de calibración de los equipos de laboratorio. Por estar aun en la fase 1 y no requerirse la implementación del plan de inspección y ensayo aún.

- EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA

  El CONSORCIO GIBRALTAR quien desarrolló actividades correspondientes al levantamiento topográfico en el predio entre el 15 y el 29 de febrero, para el presente periodo no ha requerido emplear los equipos de topografía, debido a que no se avala el inicio de la fase 2.

2.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES

Durante el presente periodo no se relacionan materiales, debido a que se encuentra el proyecto en la fase 1, apropiación de los estudios y diseños de consultoría, para planear la etapa de construcción. Se realizaron adecuaciones externas para el inicio de la fase 2 con material granular y rajón

2.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

2.5.1. SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DEL PROCESO DE ENTREGABLES

Soporte de cumplimiento de las entregables iniciales 10 días después de acta de inicio

Tabla 7. Revisión de Entregables

ITEM	ENTREGABLE	REVISION DE LOGRO DEL ENTREGABLE	TIEMPO ENTREGA
1	HOJA DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL	21/03/24 y última fecha de aprobación de personal 17/04/24	10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ORDEN DE INICIACIÓN DEL CONTRATO PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.
2	RELACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO DE OBRA	16/02/24	

3	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA ECONÓMICA (EN CASO DE QUE LA FORMA DE PAGO INCLUYA ESTA MODALIDAD)	14/03/24 20/03/24 05/04/24	
4	PROGRAMA DE OBRA	12/03/24 22/04/24	
5	LOS DEMÁS QUE PUEDAN EXIGIRSE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES		15 DÍAS CALENDARIO Pág. 23 anexo técnico
5.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	06/02/24 30/04/24	
5.2	PLAN GESTIÓN DEL RIESGO	18/03/24 30/04/24	
5.3	PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL RCD	07/02/24	
5.4	VALLA DE OBRA	24/03/24 25/04/24	

Durante el presente periodo se continua con la apropiación de los documentos de consultoría, base para el desarrollo de la fase 2 la construcción, el documento Plan de Calidad fue notificado con aprobación el 26 de marzo, se radico en documento físico y digital en el mes de abril.

Para el presente periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2024, se cuenta con la programación de la fase 1- Pre obra, radicado el 27 de febrero y se oficializo el 28 de febrero, sobre la cual se reporta el cumplimiento de la fase 1 a cargo del CONSORCIO GIBRALTAR, la programación de la fase 2 quedo aprobada oficialmente el 15 de marzo de 2024. desarrollo durante el periodo, las siguientes actividades:

Dentro el periodo se realiza entrega y radicación de los documentos objeto contractual y **Programación de Obra fase 2, flujo de inversión del proyecto, plan de inversión del anticipo y aprobación definitiva por parte de interventoría** con base al plan de calidad de acuerdo con los requisitos establecidos por el cliente y la normatividad vigente aplicable.

En coordinación con el equipo de trabajo se llevaron a cabo las Actas de vecindad, para los predios cercanos al sitio objeto del proyecto.

Además de la radicación de los siguientes planes en sus versiones definitivas, que pueden variar y que son los siguientes planes:

- Plan de Gestión Social
- Plan de Manejo Ambiental (radicado al IDRD el 30 de abril de 2024).
- Plan de Manejo de Fauna V-0 (radicado el 14 de marzo de 2024).
- Plan de Contingencia Ambiental (radicado al IDRD el 30 de abril de 2024).

- ❖ Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición V-3 (aprob. 10/03/24).
- ❖ Plan de Gestión del Riesgo (radicado al IDRD el 30 de abril de 2024).
- ❖ Plan de Manejo de Trafico (aprobado el 11 de marzo de 2024).
- ❖ Plan – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (radicado al IDRD el 16 de abril de 2024).
- ❖ Plan de Calidad (aprobado el 28 de marzo de 2023)
- ❖ Plan de Construcción y coordinación logística.
- ❖ Plan de ejecución BIM (Rta a observaciones. 02/04/24).

Así mismo en consonancia con el anexo 1 - técnico, bajo las directrices de los documentos contractuales se apropiaron los estudios y diseños y retroalimentación de la información del proyecto entregado por el IDRD producto del contrato de consultoría No. 3662-2019 se ha revisado y se radican los informes correspondientes a la etapa por componentes que se listan:

- Apéndice Forestal V-1.
- Apéndice Paisajístico.
- Apéndice Hidrosanitario y de Gas.
- Informe estructural.
- Informe Eléctrico.
- Informe de instalaciones mecánicas de aire acondicionado.
- Informe Arquitectónico.
- Informe de Seguridad y Control
- Informe de Voz y Datos
- Informe de Geotecnia.

Se informa que en consideración a la falta de definición en la viabilidad de los informes de apropiación de cada componente se envía la comunicación IDRD-E105-2023 del 14 de marzo de 2024 en donde se solicita dar respuesta a la documentación radicada para dar viabilidad al inicio de la fase 2 y apoyo adicional con el comunicado IDRD-E125-2023 del 22 de marzo de 2024, en donde se solicita la suspensión del contrato por falta de definición definitiva tanto en los apéndices como los diferentes informes de apropiación por componente, que continua en estudio por parte de la interventoría y consultor-diseñador del proyecto para el IDRD.

Se reafirma que se cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinario en Ingeniería y Arquitectura cuyas competencias (formación, experiencia y habilidades) garantizan la confiabilidad y cumplimiento del objeto contractual.

Agregar comunicados de interventoría con trazabilidad a la revisión de los informes de apropiación durante el presente periodo

2.5.2. SEGUIMIENTO A LA VERIFICACIÓN DE LOS ENTREGABLES

Soporte de cumplimiento de las entregables para gestionar el trámite del anticipo.

Tabla 8. Documentos radicados previamente para el anticipo

ANTICIPO	DESCRIPCION	FECHA DE PRESENTANCION LIMITE	FECHA DE SEGUIMIENTO.
1	Ejecución del 100% de las actividades y entrega de productos de la etapa inicial del contrato de obra, aprobados por la interventoría y el Supervisor del Contrato de Interventoría IDRD.	2 MESES	EN EJECUCION NO APLICA ENTREGA EN EL PRESENTE PERIODO
2	Aprobación de la póliza de buen manejo y correcta inversión del anticipo	INICIO	POLIZAS APROBADAS DESDE EL 2023
3	El contratista de obra deberá elaborar, un **plan detallado de inversión** del anticipo, haciendo uso del formato disponible en el sistema isolucion o el que el supervisor de la interventoría determine para tal fin, el cual deberá ser remitido a la interventoría de obra para su aprobación.	10 DIAS HABILES	21/02/24
4	Constitución de un Patrimonio Autónomo: En virtud de lo previsto por la Ley, el Proponente que resulte adjudicatario deberá constituir un Patrimonio Autónomo de objeto único para la administración del anticipo en una entidad financiera certificada. Los desembolsos con cargo al anticipo se harán únicamente para el pago de los rubros indicados en el Plan detallado de inversión del anticipo aprobado por la Interventoría y requerirán la firma del interventor.	INICIO	ENERO DE 2024
5	El contratista de obra deberá entregar a la Interventoría copia del documento de la constitución de la fiducia con el propósito que la interventoría de conformidad con sus obligaciones contractuales verifique que, en el mismo se hayan incluido la totalidad de las condiciones exigidas tanto en la Ley como en los estudios previos y pliegos de condiciones.	10 DIAS HABILES	02/02/24 y 15/03/24

6	Aprobación de la interventoría del Plan detallado de manejo del anticipo. El contratista presentará el plan de manejo del anticipo, discriminando con detalle la destinación de los recursos que deben corresponder al porcentaje de anticipo aprobado con respecto al presupuesto de cada una de las intervenciones, dicho plan solo deberá contener actividades relacionadas con la construcción y no debe incluir ningún valor referente costos indirectos y/o de Personal o recurso humano, salvo los costos asociados a la mano de obra no calificada del proyecto.	10 DIAS HABILES	21/02/24

ENTREGABLES ETAPA INICIAL

ITEM	ENTREGABLE	FECHA DE PRESENTACION
1	PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA	"DURACIÓN (2) MESES EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR UN RECONOCIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO ENTREGADO POR EL IDRD"(**PAG23**)
2	PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GERENCIA (PIG) (BIM)	
3	REALIZAR LA CREACIÓN DE USUARIO REPORTE DE CANTIDADES DE RESIDUOS PELIGROSOS	
4	DOCUMENTO TÉCNICO DE SOPORTE PARA REGISTRO ANTE EL PROGRAMA DE "BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE".	
5	ELABORACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	
6	ENTREGABLES TABLA 03 PLANES PROGRAMAS E INSUMOS	
ITEM	**ENTREGABLE**	**FECHA DE PRESENTACION**
1	PLAN GESTIÓN SOCIAL	PLAZO DETERMINADO EN EL CRONOGRAMA CONCERTADO ENTRE EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ETAPA INICIAL 2 MESES
2	PLAN SST	
3	PLAN DE CALIDAD	
4	APENDICE ELÉCTRICO	
5	HIDROSANITARIO-SERVICIOS PÚBLICOS	
6	SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE	
7	GEOTECNIA INFORME TÉCNICO	
8	ESTRUCTURA INFORME TÉCNICO	
	FORESTAL Y FAUNA	
10	PAISAJISMO	

INFORME VIABILIDAD CONSTRUCTIVA

ITEM	ENTREGABLE	FECHA DE PRESENTACION
11.1	ARQUITECTURA	PLAZO DETERMINADO EN EL CRONOGRAMA CONCERTADO ENTRE EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ETAPA INICIAL 2 MESES Se solicita con la comunicación IDRD-3203-E116-2023 la definición de la viabilidad constructiva, adicional a la presente lista contenida en el anexo 1, se incluye el paisajismo – forestal y fauna además de solicitar información sobre sistemas urbanos de drenaje de los cuales a la fecha no hay información
11.2	HVAC	
11.3	ELECTRICO	
11.4	VOZ Y DATOS	
11.5	HIDRAULICO Y GAS	
11.6	SEGURIDAD Y CONTROL	

2.5.3. EVIDENCIAR RESULTADOS DE VALIDACION

Durante el presente periodo no aplica evidenciar resultados de validación debido a que no se han aprobado entregables que requieran ser validados, debido a que la etapa de construcción no ha iniciado.

- **EJECUCION DE ACTIVIDADES EXTERNAS AL PREDIO**

Se adecuo el ingreso al sitio del proyecto, se instaló la estructura de la valla, señales de precaución dispuestas de acuerdo con el PMT y material granular y piedra rajón para preparar la vía de ingreso además de la instalación del portón de acceso al predio.

(Anexo 5 – Registro fotográfico).

- **SERVICIO DE TIME LAPSE CON FOTOS**

Para el servicio de Time Lapse se envía el oficio IDRD-3203-E044-2023, definiendo la ubicación de los postes y las respectivas cámaras de fecha 21 de febrero de 2024, para el presente periodo se ratifica ubicación y alcance de las mismas con registro fotográfico y evidencia de ubicación, quedando la trazabilidad de dicha actividad con los comunicados IDRD-3203-E063-2023 del 4 de marzo IDRD-3203-E092-2023 del 12 de marzo aprobación por parte de la Interventoría. No obstante, a la fecha no se ha autorizado el inicio de dicha actividad.

15

3. CONTROL DE LA GESTION

3.1. CONTROL DE LOS CAMBIOS

Para el presente periodo no se generaron cambios en las versiones de la información documentada debido a que los cambios a nivel geotécnico y estructural fueron presentados en el comité del 28 de febrero de los corrientes y a la fecha continúan en estudio, se adjuntara la trazabilidad de la solicitud de cambios en el diseño de los pilotes para apoyar la etapa de construcción y debidamente justificada en el componente técnico, junto con el componente ambiental y el de riesgos. Ver acta de comité del 28 de febrero, comunicaciones que brindan la trazabilidad y la justificación técnica de la solicitud del cambio, no obstante, para el cierre del presente informe, el IDRD no ha dado aprobación del cambio propuesto de **"cimentación con pilotes hincados"** con el apoyo del Consultor – diseñador, para dar el aval y el inicio de la fase 2, se tendrá definido si el cambio en los diseños obtuvo la viabilidad, por lo tanto, la trazabilidad y aprobación estará sustentada en el informe inicial de la fase 2 que será posterior al tercer mes, debido a que se continua en la fase 1.

3.2. SALIDAS NO CONFORMES

Para el presente periodo aplica las salidas no conformes en el proyecto se tratarán de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control de las salidas no conformes; esto con el fin de poder hacer un seguimiento al plan de acción, responsable y cierre de esta, y verificar que su respectivo cierre.

Incluir la falta de logro en los indicadores de programación y entrega de productos y mejora continua. ***(Anexo 6 – Acciones correctivas).***

3.3. AUDITORIAS

Para el presente periodo no se tiene programado la ejecución de auditoria interna, las mismas contractuales se llevarán a cabo una durante el año 2024 y otro sobre el 2025, en los porcentajes estimados para el proyecto por parte del IDRD así:

Realizar sus auditorías internas al 30% y 70% de ejecución del proyecto, con el diligenciamiento del programa de auditorías, que se entregará en la fase 2 de construcción, en la fase 1 no se llevarán a cabo por su corta duración solo 2 meses.

RESPONSABLES DEL DOCUMENTO		
ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
Carolina Sánchez	Steve Moreno Ortiz	Alfredo Muñoz Rodríguez
Cargo: RESIDENTE DE CALIDAD	Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Fecha: abril de 2024	**Fecha: abril de 2024**	**Fecha: abril de 2024**

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
06/05/2024	01	se describen los profesionales activos para el periodo correspondiente al informe y se indica que cambio de personal hubo en el periodo. Se detalla que durante el periodo no se presentan equipos de seguimiento y medición. Codificación de formatos y la inclusión de código de documentos en el listado maestro y correcciones en el control de correspondencia y la numeración del documento.

ANEXO 0

MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN

No	NOMBRE	FORMULA DEL INDICADOR	META valor mínimo aceptable)	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN	SEGUIMIENTO DEL 3ER INFORME DE FASE 1			OBSERVACIONES
						DATOS	% ALCANZADO	CUMPLE	
1	Índice de seguimiento de GANT, cumplimiento de actividades y/o obras ejecutadas, según lo planificado. Curva S	Tiempo real de ejecución de las actividades Vs tiempo proyectado ejecución de las actividades del proyecto. Nota 1: para el mes 1 y 2 de la fase 1 se consideraron actividades y no tiempo. Nota 2: para el mes 3 de la fase 1 se consideraron actividades y por ser también el 1er mes de obra se consideró valores del presupuesto	95%	Director de Obra	Mensual	8 actividades ejecutadas 8 actividades programadas	100%	SI	Se continúa gestionando las actividades de fase 1 aún no aprobadas, por corresponder al tema crítico que no solo reporta al IDRD sino a Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría Distrital de Salud y el IDIGER, que sin aprobación no se dictamina la viabilidad de la fase 2 construcción y depende de la aprobación de la totalidad de los documentos de la fase 1 documental: • Presentación de la hoja de vida del ingeniero Informático y de telecomunicaciones • SG-SST coordinado con los Planes ambientales • Plan de Manejo Ambiental y complemento con el componente Biótico (fauna y forestal). • Plan de Gestión del Riesgo • Plan de Contingencia Ambiental • Plan de construcción y coordinación logística. • Plan de implementación y Gerencia (PIG) (BIM) • Informes mensuales de los diferentes componentes
						43.489 626.079	7%	NO	El primer mes de la etapa de construcción no fue autorizada por no contar con todos documentos aprobados en el componente ambiental y que deben quedar radicadas ante las siguientes entidades: .- Secretaría Distrital de Salud -. Secretaría Distrital de Medio Ambiente -. Idiger
2	Índice de valor ganado	Presupuesto ejecutado Vs presupuesto presentado	100%	Director de Obra	Mensual	Entroga de documentos para tramitar el anticipo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se presenta control presupuestal, pero se indica que hasta no contar con la aprobación de todos los documentos de la fase 1, no se autoriza el inicio de la fase de construcción, por ende se informa en el comunicado IDRD-E0229-2023 El primer corte de programación en donde se informa el atraso de obra en las actividades de Tala de árboles, excavaciones y cerramiento en teja, estando pendiente a la fecha la respuesta a las observaciones a los diseños entregados, por causas imputables a todas las partes Contratista-Interventoría-Entidad contratante, se asume un mes adicional de fase 1 y se resta de la fase 2 de construcción.
						43.489 626.079	7%	NO	El primer mes de la etapa de construcción no fue autorizada por no contar con todos documentos aprobados en el componente ambiental y que deben quedar radicadas ante las siguientes entidades: .- Secretaría Distrital de Salud -. Secretaría Distrital de Medio Ambiente -. Idiger
3	Índice de cumplimiento del plan de Inspección y ensayos	No de actividades del plan de inspección y ensayos ejecutadas Vs las actividades del plan de inspección y ensayos planificadas	100%	Profesional de Calidad	Mensual	Periodo sin inicio de dicho control	No aplica	N/A	Durante el presente periodo no se presentan actividades del plan de inspoección y ensayo debido a que la etapa de construcción no ha iniciado y no aplica el periodo de medición
4	Índice de Salidas No Conformes	No. de salidas no conformes oficaces vs el No de Salidas No Conformes	80%	Profesional de Calidad	Trimestral	se presenta 1 NC	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se presentan salidas no conformes debido a que la etapa de construcción no ha iniciado y se encuentra en proceso el cierre de la fase 1.

5	Índice de satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes PQRFS	No de PQRFS resueltas efectivamente Vs total de PQRFS recibidas	80%	Profesional Social	Trimestral	No se presentan	No aplica	N/A	Durante el presente periodo no se presentan PQRFS debido a que se está realizando durante el presente periodo la consolidación del Plan de Gestión social y no aplica el periodo de medición
6	Índice de Satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes	No de encuestas de satisfacción con calificación buena vs on total de encuestas de satisfacción	80%	Profesional de Calidad	Trimestral	No corresponde el periodo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se está en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto no aplica la medición
7	Índice de mejora continua	No de Indicadores de gestión que cumplieron con la meta vs el total de indicadores	80%	Profesional de Calidad	Mensual	1/1	25%	SI	Aplica para el presente periodo solo el primer indicador, Logro del 100%
8	Índice de oportunidad en la entrega de informes	Entrega de informes dentro del plazo establecido Vs el total de los informes entregados	80%	Director de obra	Mensual	8/8	100%	N/A	Durante el presente periodo se continua en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto, se informa de la entrega de informes mensuales del componente apropiados a la fecha pendiente de entrega solamente los correspondientes al mes de abril, ya entregados los de los meses de febrero y marzo. Componente: 1. Social, 2. SST, 3. ambiental, 4. fauna, 5. Forestal, 6. hidrogeología, 7. Calidad, 8. Técnico.
9	Índice de Cumplimiento de entrega de productos por componente	# de productos por componente entregados Vs el total de los productos requeridos a entregar	80%	Profesional de Calidad	Mensual	9/13	69%	NO	Durante el presente periodo se continua en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, no obstante, aplica el cumplimiento de los productos y a la fecha los ambientales no se encuentran avalados para aprobar el inicio de la fase 2. Productos: 1. Social: PGS, 2. SST: SG-SST y aporte al PGR y PCA, 3. Ambiental: PMA, PCA, PGRD, PRCD, BCS 4. fauna, 5. Forestal, 6. hidrogeología, 7. Calidad, 8. Técnico, BIM y Plan de Construcción y Logística.
10	Índice de control de los equipos seguimiento y medición	# total de equipos de seguimiento y medición controlados Vs el total de equipos de seguimiento y medición utilizados	80%	Profesional de Calidad	Mensual	No corresponde el periodo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se continua en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto, se empleó una estación para la inspección preliminar del predio en el mes de febrero y durante el mes de marzo y abril se dio aprobación al levantamiento topográfico. no aplica la medición en el mes debido a que, no se autorizó el inicio de la fase 2
11	Índice de Cumplimiento al plan de adquisiciones,	# de actividades del plan de adquisiciones ejecutadas Vs el # de actividades planificadas de adquisiciones	80%	Profesional de Compras	Mensual	No corresponde el periodo	No aplica	N/A	Durante el presente periodo se continua en la fase 1 de reconocimiento y apropiación del proyecto con base en el contrato de consultoría No. 3662-2019, por lo tanto no aplica la medición, no se autorizó el inicio de la fase 2

. Siglas: PGS: Plan de Gestión Social, PMA: Plan de Manejo Ambiental, PCA: Plan de contingencia Ambiental, PGRD: Plan de Gestión de Riesgo de Desastres, PRCD: Plan de Gestión de Residuos de Demolición y Construcción, BCS: Bogotá Construcción Sostenible y SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ANEXO 1

ACTA CELEBRADAS EN EL PERIODO

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS PACTADOS	CONSORCIO GIBRALTAR
FO-GC-16	15/03/2024	V1

MES DE CONTROL :ABRIL DE 2024

DILIGENCIADO POR: ING. CAROLINA SANCHEZ LEON

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
fase 1	FEBRERO	15-feb-24	1	1. Entrega del cronograma de obra-preliminar	15/02/2024		Cronograma de obra preliminar	x		
				2. El contratista de obra debe tener vigilancia en el predio las 24 horas	15/02/2024		comunicado de vigilancia compartida con velodromo	x		21/02/2024
				3. coordinar revisión PMA	15/02/2024		PMA	x		
				4. coordinar revisión Plan de contingencia	15/02/2024		plan de contingencia	x		
				5. Tramites ambientales (permiso valla - PIN) remitir doc prediligenciados editables al IDRD	15/02/2024		editables valla y solic PIN	x		
				6. Coordinar reunión calidad en el IDRD - 10 am, previa validación profesionales de calidad	15/02/2024	compromiso de parte de la interventoria	Plan de calidad	x		11/03/2024
		21-feb-24	2	Presentar propuesta por escrito de ubicación punto de atención al ciudadano (PAC)	23/20/2024		Plan de Gestión Social	x		
				Se solicita por parte de la profesional Johanna del IDRD que se presente la revisión del plan con su respectiva lista de chequeo.	Próxima semana		Plan de Gestión Social	x		
				Entrega Plan de SG - SST.	21/02/2024		SG-SST	x		
				Entrega de monitoreos realizados por la EAAB	Próxima semana			x		27/03/2024
				Entrega de todos los planes y programas medio ambientales a la SDA y diferentes entes.	Plazo máximo 20 marzo.		Planes y programas Medio ambientales	x		
				Coordinar visita al predio profesionales forestales y biólogos	Lunes 26 o martes 27 de febrero		Acta de visita de obra	x		27/03/2024
				Entrega Plan de Contingencia	21/02/2024		Plan de Contingencia	x		
				Correo estado de planes y revisiones de interventoria.	22/02/2024		Acta de comité	x		27/03/2024
				Entrega de planes subsanados medio ambientales	28/02/2024		Planes y programas Medio ambientales	x		
				Cronograma de entregables del contratista	Próxima semana		Cronograma preliminar fase 1	x		
				Entrega Plan de Calidad	22/02/2024		Plan de calidad	x		
				Entrega hojas de vida personal clave	22/02/2024	aprobación parcial	hojas de vida con soportes	x		27/03/2024

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
fase 1	FEBRERO	21-feb-24	2	Revisión y/o aprobación de hojas de vida del contratista.	23/02/2024		carta de interventoria asunto aprobación personal clave contratista	x		
				Coordinar mesa de trabajo con la EAAB.	26 o 27/02/2024		acta de mesa de trabajo	x		
				Actualizar viabilidad de conexión con VANTI la cual se vence el 14 de marzo.	14/03/2024		tramite actualizado de viabilidad VANTI	x		12/04/2024
				Coordinar mesa de trabajo con el Ing. Francisco Chavista	Próxima semana		acta de mesa de trabajo	x		
				Entrega informe de revisión de informe de geotecnia del contratista de obra	23 - 26/02/2024	Informe de Geotecnia	Informe de Geotecnia	x		6/03/2024
				Entrega de informe solicitud cambio pilotaje	23 - 26/02/2024	Informe de Geotecnia	sustentacion técnica solicitud de cambio	x		6/03/2024
				Presentar la observación del distanciamiento entre micropilotes del área externa	Próxima semana	Informe de Geotecnia	propuesta técnica del proceso econstructivo	x		6/03/2024
		28-feb-24	3	Entrega presentación social	1/03/2024	componente tecnico, ambiental, social y de sst	presentación	x		6/03/2024
				Entrega Programa de RCD	1/03/2024		Programa de RCD	x		6/03/2024
				Entrega Plan de Manejo Ambiental	1/03/2024		PMA	x		30/04/2024
				Visita a campo forestal y Biólogos - 8:00 am	4/03/2024		Acta de visita de obra	x		6/03/2024
				Entrega de todos los planes y programas medio ambientales a la SDA y diferentes entes.	Plazo máximo 20 marzo.		Acta de comité	x		30/04/2024
				Cronograma de entregables del contratista	28/02/2024		Cronograma preliminar fase 1	x		
				Entrega de Informe mensual contratista de obra	4/03/2024	componente tecnico, ambiental, social, calidad y de ssl	informe mensual	x		24/04/2024
				Entrega de informe mensual interventoría	5/03/2024		informe mensual	x		24/04/2024
				Entrega completa de cambio de cimentación	Próxima semana	Informe de Geotecnia seguimiento siguiente comité	Informe de Geotecnia	x		6/03/2024
				Entrega BEP	Próxima semana		Plan de ejecución BIM	x		6/03/2024
				Entrega Plan de Calidad	22/02/2024		Plan de calidad	x		
				Entrega hojas de vida personal clave	22/02/2024	aprobación parcial	hojas de vida con soportes	x		4/04/2024
				Revisión y/o aprobación de hojas de vida del contratista.	1/03/2024	aprobación parcial	hojas de vida con soportes	x		4/04/2024
				Actualizar viabilidad de conexión con VANTI la cual se vence el 14 de marzo.	14/03/2024		tramite actualizado de viabilidad VANTI	x		12/04/2024
				Coordinar mesa de trabajo con el Ing. Francisco Chavista	Próxima semana		acta de mesa de trabajo	x		6/03/2024

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
fase 1	FEBRERO	28-feb-24	3	Entrega informe de revisión de Informe de geotecnia del contratista de obra	23 - 26/02/2024	Informe de Geotecnia seguimiento siguiente comité	Informe de Geotecnia	x		
				Presentar la observación del distanciamiento entre micropilotes del área externa	Próxima semana	Informe de Geotecnia seguimiento siguiente comité	propuesta técnica del proceso cconstructivo	x		6/03/2024
				Coordinar mesas de trabajo entre pares de especialidades	Próxima semana	Informe de Geotecnia seguimiento siguiente comité	acta de mesa de trabajo	x		6/03/2024
				Entrega de mejoramiento de suelo para el proyecto.	1/03/2024	Informe de Geotecnia seguimiento siguiente comité	propuesta técnica del proceso cconstructivo	x		6/03/2024
fase 1	MARZO	6-mar-24	4	Entrega presentación social al IDRD	8/03/2024		presentación	x		
				Informe mensual contratista de obra	8/03/2024		informe	x		
				Entrega de tomas de Time Laps en formatos de IDRD	8/03/2024		registro fotografico	x		
				Instalación Valla	6/04/2024		reg fotog valla	x		3/04/2024
				Revisión planes de calidad interventoria - 8:00 am presencial	11/03/2024		acta de mesa de trabajo	x		
				Revisar el plan SST interventoría-contratista – Revisión del plan SST. Para el próximo comité debe estar subsanado	13/03/2024		comunicado adjunto lista de chequeo SG-SST	x		16/04/2024
				Entrega Programa de RCD - reunión virtual a las 4:00 pm subsanar documento.	6/03/2024		Programa de RCD	x		
				Entrega de todos los planes y programas medio ambientales a la SDA y diferentes entes.	Plazo máximo 20 marzo.		Planes y programas Medio ambientales	x		30/04/2024
				Entrega por parte del Contratista a la Interventoría de la versión 0 del documento Plan de Manejo de Fauna Silvestre	11/03/2024		Plan de manejo fauna silvestre V-0	x		
				Radicación Plan de Contingencia V2	6/03/2024		comunicado rad. Plan de Contingencia	x		
				Plan de gestión del riesgo - reunión virtual 3:00 pm	6/03/2024		Plan de Gestión del riesgo	x		
				Cronograma de entregables del contratista	8/03/2024		programación Preliminar fase 1	x		
				Entrega de informe mensual contratista de obra	8/03/2024		informe mensual contratista	x		
				Entrega completa de cambio de cimentación	Próxima semana		justificación técnica de cambio de cimentación	x		13/03/2024
				Entrega BEP	Próxima semana		rad. BEP	x		13/03/2024

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
fase 1	MARZO	6-mar-24	4	Revisión y/o aprobación de hojas de vida del contratista.	8/03/2024	compromiso de parte de la interventoria	hojas de vida con soportes	x		
				Actualizar viabilidad de conexión con VANTI la cual se vence el 14 de marzo.	14/03/2024		Rad. Viabilidad VANTI	x		12/04/2024
				Programacion de obra ajustarla acorde a las observaciones de interventoria	12/03/2024		programación de obra	x		
				Coordinar mesa de trabajo con los pares electricos del IDRD, contratista de obra e interventoria - virtual hoy 3:00 pm	6/03/2024		acta de mesa de trabajo	x		
				Entrega de mejoramiento de suelo para el proyecto.	11/03/2024		sustentacion técnica, mejoramiento de suelo	x		
				Coordinar mesa de trabajo con los pares estructurales y geotecnia del IDRD, contratista de obra e interventoria - virtual hoy 4:00 pm	6/03/2024		acta de mesa de trabajo	x		
fase 1	MARZO	11-mar-24	1-mesa de trab	Atencion de observaciones del plan de calidad	15/03/2024		plan de calidad nueva version	x		
				entrega listas de chequeo de informes mensuales de los componentes	12/03/2024	compromiso de parte de la interventoria	listas de chequeo de informes	x		12/04/02024
fase 1	MARZO	13-mar-24	5	Presentación de la reunión de inicio	13/03/2024		presentación	x		
				Muestra de chaqueta	20/03/2024		muestra	x		
				Informe mensual No 1 social	18/03/2024		informe mensual	x		
				Plan de calidad subsanado	15/03/2024		plan de calidad	x		
				SG-SST interventoria	15/03/2024	compromiso de parte de la interventoria	SG-SST	x		
				Revisión del SG-SST del contratista	13/03/2024	compromiso de parte de la interventoria	comunicado de revisión	x		
				Formulario para liquidación pev	13/03/2024		formulario para liquidación	x		
				Rem doc BTA CONSTR SOSTENIBLE	18/03/2024		BTA CN SOSTENIBLE	x		
				Rem Plan de Gestión del Riesgo	15/03/2024		PGR	x		
				Presentar alcance PMA (Forestal/fauna)	15/03/2024		PMA	x		
				Diagnóstico Fauna (Plan de avifauna)	15/03/2024		Diagnóstico FAUNA	x		
				Informe justificación cambio de cimentación	15/03/2024		Informe justificación cambio	x		
				avance de diseño de pilotes	13/03/2024		avance del diseño	x		
				Mesa de trabajo virtual /geotecnia /estructuras	15/03/2024		acta de mesa de trabajo	x		
				Rem de documentos de la TPO	15/03/2024		TPO	x		
				subsanación de APU	13/03/2024		APU	x		
fase 1	MARZO	13-mar-24	5	Plan de manejo de inversión de anticipo	19/03/2024		Plan de manejo del anticipo	x		
				entrega de programación al IDRD	15/03/2024		programación de obra	x		

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
fase 1	MARZO	20-mar-24	6	Justificación homolog hojas de vida	20/03/2024		Justificación homolog hojas	x		
				Actas de vecindad (35)	22/03/2024		actas de vecindad	x		
				Acta de socialización inicial	20/03/2024		acta de socialización	x		
				Radicación físico del plan de calidad	22/03/2024		plan de calidad	x		
				Concepto subsanación plan de SG-SST	20/03/2024		comunicado su concepto	x		
				Mesa de trabajo SG-SST (informe 1)	20/03/2024		acta de mesa de trabajo	x		
				Producto publicidad externa visual	22/03/2024		producto publicidad externa	x		
				Reunión monitoreo hidrogeologico			acta de reunión	x		
				Informe monitoreo CAR radicado	22/03/2024		informe monitoreo car	x		
				informe ambiental No 1 entrega	20/03/2024		informe ambiental	x		
				inicio proceso monitoreo	6/04/2024		informe de avance	x		5/04/2024
				Radicación plan de fauna y flora (sub)	22/03/2024		Plan de fauna	x		
				Forestal subsanado	22/03/2024		forestal	x		
				Subsanación Plan de riesgo	22/03/2024		PGR	x		
				Mesa de trabajo Plan de Riesgo	21/03/2024		acta de mesa de trabajo	x		
				Concepto modificación de la cimentación (doc)			justificación técnica de cambio de cimentación	x		
				Remitir carta autorización ENEL	20/03/2024		remitir carta autorización	x		
				Doc TPO acueducto	22/03/2024		Doc TPO	x		
fase 1	MARZO	27-mar-24	7	Revisión acta reunión de inicio	27/03/2024		Revisión acta reunión	x		
				Remitir documentación contratacion personal (planillas-afiliaciones)	30/03/2024		soportes de pago de planillas de seg social	x		
				Remitir volante de convocatoria y oficios comité de participación ciudadana No. 1.	10/04/2024		Remitir VOLANTE	x		11/04/2024
				Subsanación plan de calidad de interventoria	2/04/2024		Plan de calidad	x		3/04/2024
				Radicacion a interventoria plan de calidad en físico pro-eprobado	1/04/2024		Plan de calidad	x		3/04/2024
				Subsanación informe mensual de calidad No. 1	27/03/2024		Subsanación INFORME	x		
				Remitir Plan SG-SST subsanado	1/04/2024		SG-SST	x		16/04/2024
				Radicar plan SG-SST del contratista	2/04/2024		SG-SST	x		16/04/2024
				Remitir Plan SG-SST subsanado de interventoria	30/03/2024		SG-SST	x		
				Remitir informe mensual SST No. 1 subsanado	1/04/2024		Remitir informel SST	x		15/04/2024
				Entrega plan de manejo ambiental (PMA) subsanado	30/03/2024		PMA	x		
				Radicar PMA aprobado al IDRD	2/04/2024		Radicar PMA	x		30/04/2024
				Plan de gestion RCD (control de cambios)	27/03/2024		Plan de RCD	x		30/04/2024
				Remitir plan de contingencia (PCD) subsanado	1/04/2024		Plan de Contingencia	x		30/04/2024

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
faso 1	MARZO	27-mar-24	7	Radicar Plan de contingencia PDC aprobado o el pronunciamiento frente al estado del documento al IDRD	2/04/2024		Plan de Contingencia	x		30/04/2024
				Plan de monitoreo de aguas subterraneas subsanado a interventoria	27/03/2024		Plan de monitoreo	x		
				Radicar plan de monitoreo aprobado a la entidad	1/04/2024		comunicación de entrega plan de monitoreo	x		12/04/2024
				Revision informe mensual ambiental contratista	27/03/2024		Revision informe mensual	x		
				Bogota Construccion sostenible ajusado			bogota construccion sostenible	x		2/04/2024
				Plan de gestion del riesgo subsanado	1/04/2024		PGR	x		3/04/2024
				Entrega plan de gestión del riesgo a la entidad	3/04/2024		PGR	x		
				Recorrido verificación diagnostico forestal	2/04/2024		recorrido verificación diagnostico	x		3/04/2024
				Entrega diagnostico forestal subsanado	3/04/2024		entrega diagnostico forestal	x		12/04/2024
				Plan de manejo de fauna subsanado	1/04/2024		Plan de fauna	x		12/04/2024
				Revision y aprobación plan de manejo de fauna	2/04/2024			x		30/04/2024
				Oficio aprobación parcial APU´s	27/03/2024		oficio aprobación parcial	x		5/04/2024
				Plan de inversión del anticipo ajustado fisico y firmado	1/04/2024		Plan de Inversión del anticipo	x		3/04/2024
				Indicaciones TPO electrica	1/04/2024		Indicaciones TPO	x		19/04/2024
				Remisión documentos para TPO EAAB	1/04/2024		Remisión DOCUMENTOS	x		19/04/2024
				Entrega v3 BEP/PEB	1/04/2024		BEP/PEB	x		3/04/2024
				Revisión v3 BEP/PEB	3/04/2024		BEP/PEB	x		3/04/2024
				Plan BEP/PEB interventoria	1/04/2024		BEP/PEB	x		3/04/2024
				Carta autorización. BIM acceso modelos BIM	1/04/2024		Comunicado BIM	x		3/04/2024
				Radicación fisico IDRD versiones BEP/PEB	1/04/2024		BEP/PEB	x		3/04/2024
				Concepto solicitud suspension contrato de obra	27/03/2024		comunicado de rta	x		
				Concepto diseño definitivo pilotes hincados	2/04/2024		Concepto diseño definitivo	x		3/04/2024

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
fase 1	ABRIL	3-abr-24	8	Remitir actas de vecindad digitales a la interventoria	3/04/2024		actas de vecindad	x		
				entrega informe mesual social No 2	3/04/2024		informe	x		
				Radicar Plan de calidad del contratista al IDRD	3/04/2024		plan de calidad	x		
				Radicar el plan de calidad de interventoria al IDRD	4/04/2024		plan de calidad	x		
				Revisión informe mensual de calidad No. 1 interventoria	4/04/2024		informe	x		
				Radicar informe mensual No1 de calidad a interventoria	4/04/2024		informe	x		
				Radicar informe mensual de calidad No1 interventoria al IDRD	5/04/2024		informe	x		
				Remitir informe mensual No. 2 a la interventoria	4/04/2024		informe	x		
				Concepto revisión plan SST del contratista	4/04/2024		comunicado	x		16/04/2024
				Concepto de revisión informe mensual SST No. 1 del contratista	8/04/2024		comunicado	x		
				Remitir Plan de interventoria subsanado	3/04/2024		Plan de interventoria	x		
				Entregar informe mensual de SST No. 2	4/04/2024		informe	x		
				Concepto Plan de Manejo de Fauna contratista	3/04/2024		comunicado	x		
				Oficio de solicitud incremento dedicación profesional de fauna	8/04/2024		comunicado	x		
				Entrega diagnostico forestal subsanado	3/04/2024		informe	x		
				Entrega Plan de Manejo de Vegetación	4/04/2024		Plan manejo de vegetación	x		
				Entrega informe mensual No. 1 forestal	3/04/2024		informe	x		
				Entrega informe mensual No. 1 fauna	8/04/2024		informe	x		
				Entrega informe mensual No. 2 forestal y fauna	3/04/2024		informe	x		
				Aprobación V3 BEP del contratista	3/04/2024		BEP/PEB	x		
				Oficio alcance a la autorización de acceso a modelos BIM de la consultoria	3/04/2024		BEP/PEB	x		
				Radicación BEP del contratista	5/04/2024		BEP/PEB	x		
				Respuesta concepto cimentación pilotes hincados	4/04/2024		comunicado	x		30/04/2024
				Mesa de trabajo consultoria cimentación	12/04/2024		acta de mesa de trabajo	x		
				Entrega Plan de Contingencia	3/04/2024		Plan de Contingencia	x		30/04/2024
				Radicar plan de contingencia al IDRD	5/04/2024		Plan de Contingencia	x		30/04/2024
				Revisión PMA del contratista	8/04/2024		PMA	x		30/04/2024
				Remisión oficio estado planes componente ambiental	5/04/2024		comunicado	x		30/04/2024
				Revisión Plan de contingencia del contratista	8/04/2024		Plan de Contingencia	x		30/04/2024
				Entrega Plan de Gestión del riesgo	3/04/2024		PGR	x		30/04/2024
				Concepto de revisión PMA RCD	5/04/2024		PMA RCD	x		30/04/2024
				Remisión oficio estado de planes y programas con compromisos	5/04/2024		comunicado	x		30/04/2024
				Entrega hoja de vida ingeniero de telecomunicaciones	3/04/2024		hoja de vida Ing de inform y telec	x		18/04/2024
				Radicado fisico plan de inversión del anticipo	3/04/2024		Plan de inversion del anticipo		x	30/04/2024

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
fase 1	ABRIL	10-abr-24	9	Entrega balance capitulo de cimentación	12/04/2024		balance de cap cimentación	x		
				Reunión revisión balance cimentación	12/04/2024		reunión	x		
				Revisión y concepto hoja de vida del profesional de telecomunicaciones	11/04/2024		comunicado	x		18/04/2024
				respuesta diseños definitivo pilotaje hincado	10/04/2024		comunicado	x		30/04/2024
				Reunión en la EAAB (modelo hidráulico)	10/04/2024		reunión	x		
				Propuesta APU BIM 360	16/04/2024		comunicado	x		30/04/2024
				Concepto de revisión PMA	10/04/2024		comunicado			
				Mesa de trabajo revisión PMA y PDC	10/04/2024		acta de mesa de trabajo	x		30/04/2024
				Concepto revisión Bogotá construcción sostenible	11/04/2024		comunicado	x		
				Concepto revisión informe No 1 ambiental del contratista	11/04/2024		comunicado	x		
				Remitir documentos personal de monitoreo	10/04/2024		comunicado	x		
				Oficio de aprobación plan de manejo fauna y forestal	10/04/2024		comunicado	x		
				Concepto revisión plan de manejo de riesgos	10/04/2024		comunicado	x		
				Entrega CD's actas de vecindad	10/04/2024		comunicado	x		
				Asistencia profesional de calidad del contratista.	16/04/2024		acta de comité con firma de asistencia prof calidad	x		24/04/2024
				Entrega informe mensual calidad No 1 contratista	11/04/2024		radicado informe	x		
				Subsanacion informe mensual calidad No 1	11/04/2024		radicado informe	x		
				Entrega informe mensual calidad No 2	15/04/2024		radicado informe	x		15/04/2024
				Concepto revisión plan SST del contratista	10/04/2024		comunicado	x		
				Subasanación informe mensual No 1 SST contratista	12/04/2024		radicado informe	x		
				Concepto revisión informe mensual No 1 SST contratista	15/04/2024		comunicado	x		17/04/2024
				Entrega informe mensual SST No 2	10/04/2024		radicado informe	x		
				Concepto revisión informe mensual No 2 SST contratista	15/04/2024		comunicado	x		29/04/2024
				Concepto revisión plan SST de Interventoria	12/04/2024		comunicado	x		

PERIODO	MES	FECHA	# ACTA	COMPROMISOS	FECHA DE COMPROMISO	DESCRIPCIÓN	REGISTRO	CUMPLIDO	NO CUMPLIDO	NUEVA FECHA DE SEGUIMIENTO
fase 1	ABRIL	17-abr-24	10	Concepto revisión informe mensual No 1 SST contratista	17/04/2024		comunicado	x		
				Subsanación informe mensual SST No 2	19/04/2024		radicado informe	x		
				Subsanación plan SST de Interventoría	17/04/2024		comunicado	x		
				Plan SST digital contratista	17/04/2024		comunicado	x		
				Plan de gestión del riesgo subsanado	19/04/2024		comunicado	x		
				concepto rev, del plan del riesgo	17/04/2024		comunicado	x		
				rta velodromo profe. De riesgos	23/04/2024		comunicado	x		24/04/2024
				mesa de trabajo presupuesto	17/04/2024		comunicado	x		
				Programación y balance pilotes hincados	18/04/2024		comunicado	x		
				subsanación dos diseños del pilotaje	17/04/2024		comunicado	x		
				Revisión informe mensual de calidad No. 1 y 2	19/04/2024		comunicado	x		
				Informe estado planes componente ambiental	23/04/2024		comunicado	x		30/04/2024
				Remitir V3 informe ambiental No 1	17/04/2024		comunicado	x		
				Doc TPO acueducto subsanados	18/04/2024		comunicado	x		
				Rta hoja de vida prof telecomunicaciones	18/04/2024		comunicado	x		
				Recoger CD EAAB modelo hidráulico	23/04/2024		comunicado	x		
fase 1	ABRIL	24-abr-24	11	Concepto revisión informe mensual No 1 SST	17/04/2024		comunicado	x		
				subsanación informe SST No. 2	19/04/2024		informe	x		
				Subsanación plan SST interventoria	17/04/2024		informe	x		
				Plan de gestión de riesgos subsanado	19/04/2024		PGR	x		
				concepto revisión interventoría Plan de Gestión del Riesgo	17/04/2024		comunicado	x		30/04/2024
				rta velodromo profe. De riesgos	23/04/2024		comunicado	x		
				Programación y balance pilotes hincados	18/04/2024		comunicado	x		
				subsanación diseño pilotaje	17/04/2024		comunicado	x		
				Revisión informe calidad No 1 y No 2	19/04/2024		comunicado	x		
				Informe estado planes componente ambiental	23/04/2024		comunicado	x		30/04/2024
				Remitir V3 informe ambiental No 1	17/04/2024		informe	x		
				Doc TPO acueducto subsanados	18/04/2024		comunicado	x		
				Rta hoja de vida prof telecomunicaciones	18/04/2024		comunicado	x		
				Recoger CD EAAB modelo hidráulico	23/04/2024		CD EAAB	x		
				entregar balance presupuestal	20/04/2024		comunicado		x	Siguiente comité
				Mesa de trabajo forestal	19/04/2024		acta de reunión		x	Siguiente comité
fase 1	ABRIL	3004/2024	12	Informe estado planes componente ambiental	30/04/2024		radicación planes ambientales	x		
				Informe No 3 componente social	3/05/2024		informe		x	Siguiente comité
				Subsanar informe de SST No 2	2/05/2024		informe		x	Siguiente comité
				Informe No 3 componente SST	3/05/2024		informe		x	Siguiente comité
				informe No 3 componente calidad	3/05/2024		informe		x	Siguiente comité
				Informe No 3 componente ambiental	3/05/2024		informe		x	Siguiente comité

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA No. 8	DD	MM	AA
ACTA No. 8		3	4	2024

LUGAR: SALON CARACOL-IDRD **HORA DE INICIO:** 9:20 a. m. **HORA FIN:** 1:45 p. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. Componente social	4. Componente forestal y fauna
2. Componente de calidad	5. Componente tecnico
3. Componente SST	6. Componente ambiental

TEMAS TRATADOS

1. Componente social

Se da lectura a los compromisos del acta anterior.
La profesional social de la Interventoria manifiesta que el contratista el 27/03/2024 finalizo la elaboración de las actas de vecindad. Por lo tanto, se solicita que las remita en digital a la Interventoria el 3/04/2024 para revisión previa. Se aclara al contratista que las actas de vecindad deben quedar radicadas antes del 5/04/2024.
Se informa que el contratista ya remitió el volante de convocatoria y las comunicaciones personalizadas, ya fueron revisadas por la interventoría y gestora social de la entidad, sin embargo, esta pendiente la aprobación del volante por la oficina de comunicaciones del IDRD.
Se solicita al contratista que el informe mensual No. 2 debe ser remitido a la interventoría el 3/04/2024.
Acta de la reunión de inicio ya fue cargada al sistema informativo del IDRD.

La profesional social del IDRD, manifiesta que el 3/04/2024, se remitió correo a la interventoría con el fin de dar aclaración de la obligación del reporte de vinculación de personal de los proyectos se consigna en la Obligación Nro. 3.6.5 Económica: Contratación de población vulnerable, enfoque diferencial y de Género, dado que esta información, aunque corresponde al componente social debe estar validad por los profesionales SST. Se reitera que esta información se debe remitir el ultimo día laboral de cada mes.

Adicional a lo anterior, se reitera que la información entregada del reporte de vinculación de personal debe ser trazable entre los componentes social y SST en los informes mensuales.

2. Componente de Calidad

El contratista remitió el plan de calidad aprobado el físico el 2/04/2024. Por lo tanto, la interventoría se compromete a radicarlo a la entidad en físico el 3/04/2024.
La supervisión informa que ya se dio preaprobación al plan de calidad de la interventoria. La interventoría se compromete a radicarlo en físico a la entidad el 4/04/2024.
La supervisión informa que como ya se aprobó el plan de calidad de la Interventoria se procederá a revisar el informe mensual No. 1 de calidad y se dará respuesta entre el 3/04/2024 y el 4/04/2024.
Con relación a al informe mensual No. 1 del contratista, ya fue preaprobado por la interventoría. El contratista se compromete a radicar en físico a la interventoría el informe el 4/04/2024. Y la interventoría lo radicaría el 5/04/2024 a la entidad en físico.
El contratista se compromete a remitir a la Interventoria el informe mensual No. 2 a la interventoría.

3. Componente SST
El contratista remitió el plan SST subsanado el 2/04/2024 en las horas de la noche, no cumplió con la fecha de entrega pactada en el comité de obra No. 7, ya que se debía entregar el 1/04/2024. La profesional SST de la Interventoria manifiesta que se dará concepto sobre el plan presentado por el contratista el 4/04/2024. La supervisión manifiesta que no se ha recibo el Plan SST de la Interventoria subsanado, se tenía como compromiso para el 30/03/2024, sin embargo, no fue entregado. La profesional SST de la Interventoria manifiesta que presento problemas técnicos con el correo electrónico. Por lo tanto, la supervisión realiza un llamado de atención al respecto y solicita que de manera urgente que la profesional de Interventoria remita el Plan SST subsanado antes de las 10:00 a.m del 3/04/2024. la profesional SST emitirá concepto sobre dicho plan antes del 5/04/2024.
La supervisión realiza llamado de atención, ya que los profesionales SST y de calidad del contratista no se encuentran en el comité de obra. La supervisión manifiesta que como solución inmediata en el informe mensual No. 3 se adjunten las fichas de EPP que hacen falta. Sin embargo, se aclara para la aprobación del plan de contingencia estas fichas si deben estar incluidas. Se solicita que el 4/04/2024 la Interventoria emita concepto de revisión sobre el plan SST entregado por el contratista. El contratista debe entregar a la interventoria informe mensual SST No. 2 el 4/04/2024.
La supervisión solicita que el plan de contingencia debe estar aprobado lo mas pronto posible, el contratista radico el 2/04/2024 el plan de contingencia subsanado, esta en proceso de revisión por parte de la Interventoria.
4. Componente forestal
El 2/04/2023, se realiza visita al predio para recorrido de verificación de individuos arbóreos. El ing. Mauricio Cano, profesional de fauna de la Interventoría, manifiesta que con relación al plan de manejo fauna presentado por el contratista, el 3/04/2024 se emitirá concepto de aprobación por parte de la interventoría. La ing. Sandra Ballen, profesional del IDRD, manifiesta que antes de las actividades de descapote o excavación se presente el manejo de los roedores, ya sea por medio de la prestación de servicios de un tercero se debe implementar previamente y evitar problemas de sanidad con la comunidad. Se debe tener en cuenta que en el predio de CAR hay un árbol que presenta un nido y se debe mantener aislado mientras se genera el desarrollo de los polluelos.
En caso de que se presenten enjambres de abejas, se debe prever y tener un plan de manejo. Establecer medidas de manejo previo a la intervención tanto forestales como de fauna. El profesional de fauna del contratista manifiesta que se debe tener en cuenta que para el proceso de ahuyentamiento se requiere una mayor dedicación profesional de fauna a la establecida en los pliegos de condiciones, por lo tanto, solicita a la interventoría evaluar si es posible incrementar la dedicación del biologo. Respecto a lo anterior, la interventoría manifiesta que esta solicitud debe remitirse por escrito y la interventoría emitirá un concepto al respecto.
La interventoría manifiesta que el 2/04/2024 se remitió hay contratista un oficio de solicitud de los entregables de la etapa inicial del componente forestal y fauna. El profesional forestal del IDRD, manifiesta que se esta a la espera de la entrega del diagnóstico forestal por parte del contratista, adicional a lo anterior, se solicito la entrega del plan de manejo de la vegetación. Respecto a lo anterior, el contratista manifiesta que esta información se remite el 3/04/2024.
La profesional del IDRD solicita a la interventoría el informe No. 1 de fauna, se aclara que los informes ambiental, forestal y fauna son separados y se deben entregar los 5 primeros días del mes siguiente.
5. Componente Tecnico
TPO: Se da lectura a los compromisos del acta anterior. Se informa que se cambio la reunion con el acueducto tentativamente al 10/04/2024 para la entrega y socialización del modelo hidrualico y ya se remitieron los documentos al ing. Camilo Barrera para tramite de provisional ante la EAAB. APU: El ing. Oscar Tamayo, manifiesta que todos los APU deben venir con las actividades propuestas por el consultor y remitirse a la especificación del APU entregada por la consultoría, los precios son los que varían de acuerdo con el valor de los insumos que tiene el contratista, pero no pueden sobrepasar el valor del CIO. No se pueden omitir las actividades que trae cada APU del consultor. El contratista manifiesta que lo mas importante es adecuar los ítems sin desconocer ningún componente dentro del APU.

El contratista recomienda realizar un cronograma de trabajo frente a las conexiones definitivas de servicios públicos a futuro, adicional a lo anterior, el contratista propone la implementación de paneles solares en el proyecto, suministrar un gran porcentaje de energía solar sobre las cubiertas de la piscina, dado que con relación al costo beneficio seria un diferencial para el proyecto. El profesional eléctrico del IDRD, manifiesta que es válida la propuesta, sin embargo, se debe presentar de manera formal para evaluarla.
BIM: El contratista remitió la V3 del BEP, el día 3/04/2024 la interventoría dará aprobación a esta versión. El 1/04/2024, se remitió al IDRD la V1 de la estrategia de seguimiento del BEP de interventoría. El día 3/04/2024 la interventoría remitirá alcance a la autorización de acceso a modelos BIM de la consultoría. La supervisión solicita que se presente anulación de la V1 dado que no se aplicara y se espera al 5/04/2024 presentar concepto con relación a la estrategia de seguimiento del BIM entregada por la interventoría. El contratista manifiesta que el 5/04/2024 remitirá a la interventoría la V3 del BEP en físico.
El contratista manifiesta que para ejecutar la metodología BIM correctamente se requiere utilizar BIM 360 para dar el alcance requerido, es un costo adicional, dado que no están contemplados en el presupuesto ni rembolsable. Se presentará los APU´s de estas actividades adicionales a la interventoría para su concepto.
Cimentación: El director de interventoría manifiesta que se recibió por parte del contratista la solicitud de cambio de cimentación y existe un consenso general sobre el cambio reconocimiento los beneficios ambientales y técnicos, sin embargo, en la parte económica al implementar este tipo de cimentación hincada se presenta un sobrecosto. Se presenta una desviación económica de 6.700 millones aproximadamente en una revisión preliminar, en el ejercicio realizado por la interventoría se incluye las actividades propias del pilote hincado y descabece de pilotes que no ful incluida por el contratista en su APU presentado, en caso tal que se llegue a aprobar este cambio. Respecto a lo anterior, el contratista manifiesta que si hicieron falta incluir actividades en el APU de pilotaje hincado como el descabece de pilotes, posicionamiento de las maquinas, recebos, etc.
El contratista manifiesta que el cambio constructor responsable será firmado por el Ing. Steve Moreno, Director de Obra, en el momento que se llegue a un acuerdo con relación a la cimentación, se remitirá carta de aceptación de constructor responsable. El contratista manifiesta que teniendo en cuenta que la cimentación es la actividad próxima a los preliminares, se radicara un oficio a la interventoría indicando que se requieren mayores recursos para la ejecución del alcance del contrato, teniendo en cuenta el alcance técnico y las observaciones presentadas a los diseños se requiere dar celeridad a la toma de decisiones, sin embargo, se desconocen los tiempos de respuesta del consultor, con el cual, no se tiene ninguna relación contractual. El Ing. Oscar Tamayo, manifiesta que, con relación al oficio presentado por la interventoría sobre el pilotaje, se dará respuesta el 4/04/2024 al mismo, dado que ya se esta analizando con los profesionales técnicos del IDRD.
La supervisión tramitara ante la consultoría las dudas y las observaciones que se tangan a los diseños, pero es responsabilidad de la supervisión verificar que los insumos entregados por la consultoría son viables para la ejecución. La supervisión manifiesta que en el momento que se presente un documento oficial por parte de la interventoría indicando los recursos faltantes para la ejecución del contrato, se evaluara y tramitara ante el ordenador del gasto para su autorización. Mientras las actividades estén contratadas se puede manejar por un acta de mayores y menores y control de cambios. La supervisión solicita al contratista y la interventoría revisar los perfiles estratigráficos y ubicaciones de perforaciones realizados por el Ing. Alfonso Uribe en el estudio de suelos, antes de tomar cualquier decisión con relación a la cimentación.
La supervisión manifiesta que para el 5/04/2024 deben estar radicados y aprobados todos los planes y programas. Desde la supervisión para la etapa inicial no se deben suspender las actividades preliminares de obra. Sin embargo, el contratista manifiesta que requiere de tiempos mínimos de contratación para actividad de pilotaje, dado que se debe realizar con anticipación, como las cartillas del acero con los diseños aprobados, el despacho del acero esta demorando entre 15 y 20 días por parte las siderúrgicas. Respecto a lo anterior, el contratista manifiesta que en la programación aprobada hay dos meses de preliminares, sin embargo, es importante que la entidad conozca que hay afectaciones que van a implicar mesas de trabajo. Cualquier mezcla que entre en contacto con un lixiviado pierde resistencia y como constructores no se va a tomar ese riesgo por la estabilidad del proyecto. El contratista presenta balance preliminar con actividades adicionales (mayores y menores cantidades).

La interventoría manifiesta que teniendo en cuenta que el 6/04/2024 finaliza la etapa inicial e inician los preliminares, se requiere dar celeridad a la definición de la cimentación por todas las partes y urgente las mesas de trabajo con el consultor para dar respuesta a las observaciones. El contratista manifiesta que para presentar un balance presupuestal del proyecto requiere la retroalimentación por parte del consultor de las observaciones presentadas. La abogada de la interventoría Ivonne Guerrero, manifiesta que la interventoría y la entidad contratante realizaron una reunión el 2/04/2024, donde la interventoría expuso el contexto técnico y jurídico del contrato.
Se aclara por parte de la interventoría que no estamos en condiciones técnicas de proceder con el inicio de esta etapa dos, el anexo técnico y obviamente, pues en concordancia con lo que establecen las cláusulas contractuales, establecen un único término de ejecución del contrato, que está por 26 meses. Cuya nota al final de la nota cuatro en el anexo técnico, está estipulando que esos son términos estimados, pero que el plazo total son 26 meses. Inicialmente, dentro de ese mismo texto también está establecido que la etapa o el término que está estimado para la obra es de 24 meses.
Efectivamente debido al volumen de la revisión de los documentos y demás han llevado a que en este momento no se haya culminado con esa labor de la etapa inicial, están actividades pendientes de todas las partes intervinientes contractuales en este proyecto, entiéndase, constructor, interventoría y entidad contratante. La indeterminación que estaban esos dos meses iniciales establecidos no permite a la interventoría establecer en este momento responsabilidades o culpas, para que la interventoría pueda determinar si efectivamente esta talanquera y el que se haya cumplido estos dos meses sin que se haya culminado esas actividades, son de cuenta del contratista de obra de la entidad, contra tanto de la Interventoría, pero de manera general y transversal se puede decir somos todos.
En este orden de ideas, la propuesta que ha hecho la interventoría ante una solicitud de suspensión del constructor de obra es que no era posible proceder con esa suspensión, toda vez que durante la suspensión lo que se iba a generar es lo mismo que se hace en todos los proyectos y era seguir trabajando. La interventoría aclara que aquí se está cursando una circunstancia en la cual la definición de esos componentes técnicos no depende en exclusiva de las personas aquí actualmente intervinientes. La interventoría propuso una prórroga de esta etapa inicial que está prevista en el contrato. Con el fin, de que la interventoría y la entidad contratante tengan una medida o un mecanismo de control frente a las actividades y frente a la definición de las responsabilidades que cursan en este momento.
Un argumento que manifestó la interventoría el día de ayer ante la entidad contratante fue que en este momento estamos en un contexto preliminar. Porque que vayamos a tener todos los componentes definidos y absolutamente todo definido para esta etapa inicial no va a ser posible. Sin embargo, sí estamos en capacidad técnica, administrativa, jurídica y financiera de poder solventar una suma cercana y un balance lo. Digamos lo más, lo probabilísticamente lo más acercado posible a la realidad en el cual estemos hablando de los capítulos de preliminares y de 3 componentes. Sería irresponsable desde el punto de vista profesional y empresarial que la tanto el constructor como la interventoría se comprometieran a presentar un balance en esas condiciones.
La solicitud y la propuesta de parte de la interventoría era que se surta un plan de contingencia de (1) mes de parte de la entidad, contratista e interventoría, para que desde cada una de sus aristas se establezcan los compromisos y se establezca un cronograma de trabajo. Que durante este mes se dé el traslado las observaciones al consultor, que el consultor se comprometa a entregarlas y se presente en mesas de trabajo con el constructor y con la interventoría a solventar esa clase de observaciones. Durante el plan de contingencia, se debe establecer si vamos a tomar más tiempo o no, porque una vez terminado ese plan de contingencia, para el inicio de la etapa de obra que no hay necesidad de suscribir acta de inicio porque el anexo técnico no lo exige.
Durante este mes de plan de contingencia se deben establecer los mínimos de funcionalidad antes de que se suscriba la etapa de obra. La interventoría propone, ese plan de contingencia si es voluntad de las partes, obviamente, pues con esta propuesta lo que se deriva es que el contratista de obras se comprometa a remitir ese plan de contingencia para que la interventoría haga un seguimiento per semanal dentro de los próximos comités. Desde ya la interventoría exhorta al contratista de obra para que en sus programaciones cuando se ya se esté construyendo, empiece a establecer sus los factores de rendimiento, de tal manera que se agote hasta el más mínimo recurso para que se mantenga el término de ejecución en estos 26 meses.

6. Componente ambiental
Plan de manejo ambiental-Plan de contingencia: el contratista el 2/04/2024, realizo entrega de la V4 del plan de manejo ambiental y el plan de contingencia. La interventoría remitirá concepto de revisión el 8/04/2024. Se establece que si al 5/04/2024 la entidad no aprueba el plan de contingencia técnico y se finaliza la etapa inicial, como interventoría se remitirá informe hasta la revisión que se llegue, ya que se requiere tiempo suficiente para revisión e indicara el contratista no cumplió con los tiempos pactados de entrega de los planes. Se debe remitir un oficio con las observaciones pendientes (adjuntar las listas de chequeo) de cada uno de los planes y programas del componente ambiental. Teniendo en cuenta, que no se puede iniciar fase constructiva si no se tienen los planes aprobados, no se puede dar cumplimiento a la ordenanza de la autoridad ambiental por consiguiente no se puede iniciar obra.
Plan de gestión del riesgo: El contratista a la fecha no ha remitido el plan de gestión del riesgo subsanado. El contratista se compromete a entregar el plan el 3/04/2024.
PMA de RCD: El contratista informa que remitió el programa a la interventoría el 1/04/2024 subsanado, está en revisión por interventoría. Se emitirá concepto de revisión el 5/04/2024.
Plan de monitoreo de aguas subterráneas: La supervisión manifiesta que el 1/04/2024 recibió plan de monitoreo, por lo tanto, se tuvo ajustar la programación. La purga y la limpieza estaba programada para iniciar el 9/04/2024, sin embargo, se movieron las fechas, la purga y la limpieza quedo para el 15/04/2024 y el monitoreo quedo para el 23/04/2024. Para que en el concepto se indique que la programación tuvo que correrse porque se demoraron en la entrega del producto.
Informe mensual ambiental: La interventoría manifiesta que el informe mensual No. 1 ambiental del contratista e interventoría se remitió a la supervisión el 25/03/2024.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Remitir actas de vecindad digitales a la Interventoria	Contratista	3/04/2024
Entregar Informe mensual social No. 2	Contratista	3/04/2024
Radicar Plan de Calidad del contratista al IDRD	Interventoria	3/04/2024
Radicar Plan de Calidad de interventoria al IDRD	Interventoria	4/04/2024
Revisión informe mensual No. 1 calidad interventoria	IDRD	4/04/2024
Radicar Informe mensual calidad No. 1 a interventoria	Contratista	4/04/2024
Radicar informe mensual calidad No. 1 del contratista al IDRD	Interventoria	5/04/2024
Remitir informe mensual No. 2 a la interventoría	Contratista	4/04/2024
Concepto revisión Plan SST del contratista	Interventoria	4/04/2024
Concepto de revision informe mensual SST No1 del contratista	Interventoria	8/04/2024
Remitir Plan SST de interventoria subsanado	Interventoria	3/04/2024
Entregar informe mensual SST No. 2	Contratista	4/04/2024
Concepto Plan de Manejo de Fauna contratista	Interventoria	3/04/2024
Oficio solicitud incremento dedicación profesional de fauna	Contratista	8/04/2024
Entrega diagnostico forestal	Contratista	3/04/2024
Entrega Plan de Manejo de la Vegetación.	Contratista	3/04/2024
Entrega informe mesnual No. 1 forestal	Interventoria	3/04/2024
Entrega informe mensual No. 1 fauna	Interventoria	4/04/2024
Entrega Informe mensual No. 2 fauna y forestal	Contratista	3/04/2024
Aprobación V3 BEP del contratista	Interventoria	3/04/2024
Oficio alcance a la autorización de acceso a modelos BIM de la consultoría	Interventoria	3/04/2024
Radicación BEP del contratista	Interventoria	5/04/2024
Respuesta concepto cimentacion pilotes hincados	IDRD	4/04/2024
Mesa de trabajo consultoria cimentación	IDRD	12/04/2024
Entrega plan de contiingencia	Contratista	3/04/2024
Radicar plan de contingencia al IDRD	Interventoria	5/04/2024
Revisión PMA del contratista	Interventoria	8/04/2024
Remisión oficio estado planes componente ambiental	Interventoria	5/04/2024
Revisión Plan de contingencia del contratista	Interventoria	8/04/2024
Entrega plan de gestión del riesgo	Contratista	3/04/2024
Concepto de revision PMA RCD	Interventoria	5/04/2024
Remision oficio estado planes y programas con compromisos	Interventoria	5/04/2024
Entrega hoja de vida telecomunicaciones	Contratista	3/04/2024
Radicar fisico plan de inversión del anticipo	Interventoria	3/04/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN					
¿Se logró el objetivo?	SI		NO		
Observaciones					

Siendo las 1:45 pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Alejandra Castrillón

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite de Obra No. 8 CAR FECHA: 3 04 2024

HORA INICIAL 9:20 am HORA FINAL 1:45 pm LUGAR Salon Caracol IDRD

					DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Ivonne Lucia Guerrero	Abog. Interventor		Guerrero		legal@andresmartinez.com.co	3059148829
2	RAUL A. PINZON R.	DIR. INTERVENT.	INTERVENT.		CONS. INT.	RAPINTOR@Hotmail.com	3118866672
3	Fabio Puentes	Prof Calidad	Interventoria		Cons interv		
4	Daniela Buitrago N.	Interventoria	Interventoria		cons interv	danielabuitrago@vginge	3125788534
5	ANDREA CATALINA QUEVEDO RUIZ	INTERVENTORA SST	INTERV		CIC	residente.sst.interventor@gmail.com	3107116547
6	Santiago Reyes	Gerente C. Gibraltar	Contratista		Cons Gib	saregu@gmail.com	3102638510
7	STEVE MORENO O	DIRECTOR OBRA	CONTRATISTA		CONS GIB	director.obra.gibraltar@gmail	3045811225
8	Arley Rodriguez	Coordinador BIM	Contratista		C. Gibraltar	Coordinador.Gibraltar2019	3112215485
9	Maria Isabel Rocha Romero	Prof Social	Contratista		C. Gibraltar	Social.contratogibraltar@gmail	—
10	Daisy Garcia Rivera	Residente Social Interv	Interventoria		Cons Interv		3147683249
11	Carmen Lucia Velez Valdenebro	Apoyo Sup SSOAT	SST.		IDRD.	Carmen.velez@idrd.gov.co	3209004770
12	Johanna Chavez Galán	Apoyo Sup. Calidad	IDRD.				
13	Nancy Hernandez Anaya	Apoyo Tec Sup.	IDRD		IDRD	nancy.hernandez@idrd.gov.co	3203333553
14	Francy Liliana Murillo	Apoyo Tec. Sup.	IDRD		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3013208265
15	Juliana Castellanos	SST	Contratista		Gibraltar	Sstcontratista@gmail.com	3108510051
16	Nicolas Rodriguez R.	Prof. Presupuesto	Contratista		C. Gibraltar	presupuestogibraltar@gmail.com	3229504906
17	Alfredo Ramos R	Rep. Legal	Contratista		C. Gibraltar	garmac@ame.com.co	3163059678
18	Yenis Nunez C.	Ing. Estructural	Contratista		C. Gibraltar	Yenisnunez@gmail.com	3112108202

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del [illegible] realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden [illegible] en la página web del IDRD https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL-V4

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de Obra No. 8 FECHA: 3 04 2024

HORA INICIAL 9:20am HORA FINAL 1:45pm LUGAR Salon Caracol IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO
1	Andres Martinez	RL Interv.	INTERVENTORIA		Interventoria	interventoriaglobal@gmail.com	712.329
2	William Jimenez Salazar	Esp. electrico	Interventoria		Interventoria	william.jimenez@ingenieriaconsultoria.com	3146170213
3	Nathaly Mena	Ese. Geotec	IDRD		IDRD	nathaly.mena@idrd.gov.co	3004
4	Oscar Ricardo Tangarife	Supervisor Intv.	STC-Intv.		IDRD	oscar.tangarife@idrd.gov.co	3223074918
5	Edwin Rivera Pedraza	Apoyo Sup Elec	STC-IDRD		IDRD	edwin.rivera@idrd.gov.co	3129922265
6	Sebastian Mendez Montenegro	Interventor	Interventoria		Interventoria	Sebastian.Mendez@hrc	3202
7	Edwin Castillo Londoño	Interventoria	Interventoria		Interventoria	edcastillo@gmail.com	3014816350
8	Sandra Ruiz	Ep Ambiental	Consorcio 66		Consorcio	sandru29@gmail.com	3006799765
9	Alejandra Ramirez	Apoyo Ambiental	STC		IDRD		
10	Mylena Fernandez	Residente Amb.	Consorcio 6 Milenio		Consorcio	ambiental.consorcio6@hotmail.com	3144430372
11	Natalia Pantoja V	Coord. Amb	Consorcio I	NATALIA	e IDRD	nataliapv96@hot	3213938516
12	Walter Lopez Giraldo	Res Ambiental	Interventoría		Coningi	interamb.cerro@gmail.com	3142181402
13							
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V 4

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA No. 9	DD	MM	AA
ACTA No. 9		10	4	2024

LUGAR: SALON CARACOL-IDRD **HORA DE INICIO:** 9:40 a. m. **HORA FIN:** 12:00 p. m.

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1 Componente tecnico	4 Componente gestión del riesgo
2 Componente financiero	5
3 Componente ambiental	6

TEMAS TRATADOS

1. Componente Tecnico

Cimentación: Compromiso por las partes contratista e interventoría presentar balance presupuestal del capítulo de cimentación con relación a la propuesta de cimentación de pilotes hincados.
La interventoría, manifiesta que en el balance se debe contemplar todas las actividades necesarias, la interventoría solicita que en el balance se debe modificar el precio e incluir el ítem de camisa metálica.
Se establece el compromiso de mesa de trabajo entre contratista e interventoría para el 10/04/2024 para revisión de balance presupuestal de cimentación.
La interventoría manifiesta que en las revisiones del cambio de la cimentación se han enfocado en la afectación de la cimentación por los lixiviados debido a la permeabilidad que presenta el suelo. Y al introducir agua se van a densificar mas los lixiviados afectando el acero y el concreto.

Con relación al diseño definitivo de pilotes hincado, la interventoría manifiesta que se siguen presentando las observaciones previamente remitidas por la interventoría, por lo tanto, el 10/04/2024 se notificara mediante comunicado al contratista de esta reiteración. Se plantea realizar una mesa de trabajo entre las partes contratiste e interventoría para revisión de las observaciones al diseño.

Hojas de vida: La interventoría se compromete a dar concepto el 11/04/2024 sobre la hoja de vida del profesional de telecomunicaciones presentado por el contratista.
Constructor Responsable: Se está a la espera de la definición de la cimentación para dar continuidad con el tramite de constructor responsable.
El contratista manifiesta que cualquier modificación arquitectónica que se realice requiere ajuste de licencia ante la curaduría.

TPO
Eléctrica: A la fecha ENEL no ha dado respuesta, el plazo se cumple el 12/04/2024, se informará por parte del contratista tan pronto se tenga respuesta.
Hidráulica: El día 10/04/2024 se tiene reunión en el EAAB para entrega del modelo hidráulico e inducción. La interventoría manifiesta que 2/04/2024 se realizó él envió de los documentos solicitados para TPO a la entidad.

2. Componente financiero
Análisis de Precios Unitarios: El contratista remitió los APU subsanados de acuerdo con las ultimas observaciones remitidas por la consultoría en cuanto a que se incluyeran los ítems de la consultoría. Está en proceso de revisión por parte de interventoría. Presupuesto: El 6/04/2024 el contratista remitió un presupuesto preliminar, el cual, se encuentra en revisión por la interventoría. La interventoría solicita la revisión completa del presupuesto al detalle. Dado que la instrucción del IDRD es que presente un balance de todos los ítems del presupuesto. Respecto a lo anterior, el contratista manifiesta que hasta que no se de respuesta por parte de la consultoría a las observaciones presentadas a los diseños por parte de la consultoría, no se puede entregar un balance detallado.
El contratista manifiesta que, si ha realizado revisión de cantidades de obra, sin ámbargo, es necesario una respuesta por parte del consultor con relación a las observaciones presentadas en capítulos de voz y datos, columnas y demás. La supervisión informa que el 10/04/2024 se realizara reunión con la consultoría, para revisión de observaciones presentadas. Anticipo: El contratista realizo entrega de la documentación para la solicitud del tramite del anticipo, sin embargo, hasta no tener todos los entregables de la etapa inicial, la interventoría no puede generar la certificación de cumplimiento requerida.
3. Componente Ambiental
Plan de Manejo Ambiental: La interventoría manifiesta que el 10/04/2024 se remitirá revisión al plan de manejo ambiental para subsanación de observaciones. Compromiso: Realizar mesa de trabajo para revisión y socialización de observaciones al plan de manejo ambiental y el plan de contingencia. La supervisión solicita que la mesa de trabajo sea transcrita, con el fin, de conocer las conclusiones a las que se lleguen entre las partes en dicha mesa.
Plan de Contingencia: Se remitieron observaciones por parte de la interventoría al plan de contingencia. La supervisión aclara que el componente SST debe estar correlacionado en cada ficha, no se debe presentar como un anexo. La interventoría manifiesta que los planes deben estar revisados y aprobados para el 12/04/2024.
La supervisión manifiesta que el radicado de entrada del producto de publicidad exterior visual ante la SDA 2024ER63551 del 20 de marzo de 2024, debe estar impreso y reposar en la carpeta del componente ambiental en el frente de obra. Bogotá Construcción Sostenible: La interventoría se compromete a remitir concepto de revisión para el 11/04/2024.
Informe mensual No. 1 ambiental: La supervisión manifiesta que con relación al informe mensual ambiental No. 1 de la interventoría, se realizó devolución de este, ya que no incluye la aprobación del informe mensual ambiental No. 1 del contratista. Por tanto, se reitera que no se revisan informes de interventoría sin la aprobación de los informes de obra. La interventoría manifiesta que el informe mensual No. 1 ambiental del contratista no está aprobado. La supervisión solicita que se realice un pronunciamiento de la interventoría sobre el informe mensual No. 1 del contratista para el 11/04/2024.
La supervisión aclara que no se puede iniciar actividades constructivas hasta que no esta el plan de gestión del riesgo en ambiente y el plan de contingencia en secretaria de salud. Se hace la claridad no rocerías, no tala, ni movimiento y descapote no actividades preliminares solo se puede realizar la instalación del cerramiento sobre la carrera 91 y avenida Villavicencio.
Para la radicación de los productos del componente ambiental, deben entregarse impresos con separadores en medio magnético, con listas de chequeo y trazabilidad de observaciones, debidamente firmados. Para el programa de RCD, no radicar hasta que se envié el soporte del PIN, se debe adjuntar el numero de PIN al documento. La supervisión solicita reportar la información y documentos del personal de CAR para el monitorio del 12 al 20 de abril de 2024. Se deberá hacer acompañamiento permanente desde el componente ambiental a este monitoreo.

4. Componente gestión del riesgo
Se recibió el plan del riesgo el 3/04/2024, sin embargo, en el marco de la revisión se evidencia que más 50% del plan presenta similitud con el plan del riesgo del contratista de obra del proyecto de velódromo. Se evidencio en el documento presentado que no se subsanaron las observaciones presentadas por la interventoría. Por lo tanto, la interventoría remitirá un oficio al contratista del velódromo solicitando claridad sobre la autoría del documento presentado, dado que el documento no esta referenciado. Respecto a lo anterior, el contratista manifiesta que se ha solicitado asesoría a los profesionales de Velódromo.
5. Componente forestal y fauna
La interventoría manifiesta que el 10/04/2024, se remita al contratista la aprobación del plan de manejo de fauna y el plan de vegetación.
6. Componente social
Las actas de vecindad fueron remitidas por el contratista el 5/04/2024, sin embargo, estamos a la espera de la entrega de los CDS por parte del contratista para proceder a radicar ante la entidad. El contratista realizo entrega del informe social No. 2 el 9/04/024, se encuentra en revisión por parte de la interventoría. Se reitera al contratista que los informes mensuales deben ser entregados el 3 de cada mes. El 25/01/2024 se realizo visita al predio donde se identifico en el predio la presencia de caninos, se establecido el compromiso de reubicarlos. Adicional, para el caso del habitante de calle evidenciado en el predio, la secretaria de integración social notifico que entrara en un proceso de concertación con él. Sin embargo, ni el habitante de calle ni los caninos se encuentran dentro del polígono del CAR.
7. Componente de calidad
Se evidencia en el comité que el profesional de calidad del contratista no está en el comité de obra, se solicita al contratista la asistencia de los profesionales en el comité. El contratista se compromete a radicar el informe mensual de calidad No. 2 el 11/04/2023, se reitera que el contratista esta incumpliendo con las fechas de entrega de los informes mensuales. El plan de calidad de interventoría fue radico el 4/04/2024 a la entidad. El plan de calidad del contratista fue radico el 8/04/2024 a la entidad. Se establece como compromiso que la profesional de calidad del contratista se presente al próximo comité. La interventoría se compromete a realizar entrega del informe mensual No. 1 subsanado el 11/04/2024. La interventoría debe entregar el informe mensual No. 2 el 15/04/2024.
8. Componente SST
Plan SST: La interventoría manifiesta que se remitieron observaciones al Plan SST del contratista el 8/04/2024, no se cumplió con el compromiso se debían remitir observaciones el 3/04/2024. El contratista atendió las observaciones al plan SST el día 10/04/2024, por lo tanto, la supervisión solicita que el 10/04/2024 se emita concepto por parte de la interventoría y si está aprobado, mañana debe quedar radicado ante de medio día. Informe mensual: El informe mensual No. 1 del contratista, la interventoría remitió observaciones al mismo el 10/04/204, no se cumplió el compromiso por parte de la interventoría ya que se debían remitir observaciones el 8/04/2024. El contratista se compromete a entregar subsanación el 12/04/2024 del informe mensual No. 1 y la interventoría debe emitir concepto el 15/04/2024. La supervisión realiza llamado de atención, se deben cumplir los compromisos por parte de interventoría.
El contratista se compromete a realizar la entrega del informe mensual No. 2 el 10/04/2024, la interventoría emitirá concepto de revisión el 15/04/2024. Plan SST de interventoría se remitieron el 10/04/2024 la subsanación del plan al IDRD, se realizará revisión por parte de la supervisión. Se solicita al contratista y la interventoria las chaquetas y camet, se recuerda que para iniciar la obra se deben tener listas.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega balance capitulo de cimentación	Contratista-Interventoria	12/04/2024
Reunión revisión balance cimentación	Contratista-Interventoria	12/04/2024
Revisión y concepto hoja de vida del profesional telecomunicaci	Interventoria	11/04/2024
Respuesta diseño definitivo pilotaje hincado	Interventoria	10/04/2024
Reunión en el EAAB (modelo hidraulico)	Contratista-Interventoria	10/04/2024
Propuesta APU BIM 360	Contratista	16/04/2024
Concepto de revisión PMA	Interventoria	10/04/2024
Mesa de trabajo revisión PMA y PDC	Contratista-Interventoria	10/04/2024
Concepto revisión bogota construcción sostenible	Interventoria	11/04/2024
Concepto revisión informe No. 1 ambiental del contratista	Interventoria	11/04/2024
Remitir documentos personal monitoreo	Contratista-Interventoria	10/04/2024
Oficio aprobación plan de manejo de fauna y forestal	Interventoria	10/04/2024
Concepto revisión plan de manejo de riesgos	Interventoria	10/04/2024
Entrega CDs actas de vecindad	Contratista	10/04/2024
Asistencia profesional de calidad del contratista	Contratista	16/04/2024
Entrega informe mensual calidad No. 1 del contratista	Contratista	11/04/2024
Subsanacion informe mensual No. 1 calidad	Interventoria	11/04/2024
Entrega informe mensual calidad No. 2	Interventoria	15/04/2024
Concepto revisión Plan SST contratista	Interventoria	10/04/2024
Subsanación informe mensual No. 1 SST contratista	Contratista	12/04/2024
Concepto revisión informe mensual No. 1 SST contratista	Interventoria	15/04/2024
Entrega informe mensual No. 2 SST	Contratista	10/04/2024
Concepto revisión informe mensual No. 2 SST contratista	Interventoria	15/04/2024
Concepto revisión plan SST de interventoria	IDRD	12/04/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI		NO	
Observaciones				

Siendo las 12:45 pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Alejandra Castrillón

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite No. 9 CAR FECHA: 10 04 2024

HORA INICIAL 9:30 am HORA FINAL 12:00 pm LUGAR Salon Caracol IDRD

					DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO
1	RAUL A. PINZON R.	DIR. INTERVENT.	INTERVENTORIA		INTERVENT.	RAMPINZON@HOTMAIL.COM	311 8868672
2	Edwin Castillo Lagarinez	Prof. Riesgos	Interventoria		CIG	edgjrx35@gmail.com	3004816352
3	William Jiménez Salazar	Prof. Electrico	Interventoria		CIG	williamjimenez@jimeningenieros.com	3166192
4	Daniela Bustrago Naranjo	Interventoría	Interventoria		CIG	danielabustrago@vsingenieria.com	3125783434
5	Esther Paulina Martinez	Interventora	Interventoria		C.I.G	logrinsasas@gmail.com	3213924397
6	Sebastian Mendez Montenegro	Con. Interventoria	Interventoria		C.I.G	Sebastian.mendez.mo@hotmail.com	3202879179
7	STEVE MORENO C.	GIR GEO C.G	CONSTRUCTOR		C.G	directorgirgeoingenieria@gmail.com	3043412251
8	Diley Rodriguez	Constructor Civil	Constructor		C.G	Conciar.ingenieria@gmail.com	3177155855
9	Maximiliano Villadiego E.	espec. geotecnia	constructor		C.G.	Pagtimientosyconcretossas@gmail.com	3123623582
10	Yesid Chivara C.	Esp Estructural	Construct.		CC	Yesidmvar@gmail.com	3002100302
11	Nilona Benavides	Residente Ambiental	Construcción		C.G	ambiental.ingcarbalt@hotmail.com	3144453122
12	Sandra Ruiz	Esp. Ambiental	Contratista		C.G	sanru.29@gmail.com	3006729965
13	Ricardo Alarcon O.	Esp. Riesgos	Contratista		C.G.	ralarcone@gmail.com	3102582828
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
17	Oscar Ricardo Tamayo T	Sup. de Interv.	ISC - IDRD		IDRD	[illegible]	[illegible]
18	Alejandro Castellon P.	Residente Intv	Interventoria		Intv		

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujecion a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la pag na web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite de obra No. 9 CAR FECHA: 10 04 2024

HORA INICIAL 9:30am HORA FINAL 12:00pm LUGAR Salon Caracol IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Delmar García H.	Ing. Especialista	Interventoria			ingarciam@ingenieriaingeotecnica.com	3144753270
2	JAIR SUAREZ	ARQUITECTURA	CONSORCIO CARACOL			arquitair@gmail.com	3142648772
3	J. Manuel Palma V.	Ing. ESTRUCTURAC	IDRD			jesus.palma@gmail.com	3118490081
4	Julian Agudelo Ingeniero	Interventoria Civil	Interventoria			julianagudeloingeniero@outlook.com	3202336342
5	Walter López Giraldo	Ing. Ambiental	Interventoría		Caingi	interambcosta@gmail.com	5142184612
6	Giselle Alejandra Ramirez	Apoyo Sup. Ambiental y Riesgos	STC		IDRD		
7	Forth. Adriana Carolina Alcazar	Profesional Interventoria	Interventoria		Interventoria	interventoriaobra1@gmail.com	3134[illegible]
8	Franci Liliana Murillo	APOYO TEC SUP.	STC		IDRD	franci.murillo@idrd.gov.co	3043608725
9	Nancy E. Hernandez A.	Apoyo Tec Sup	STC		IDRD	nancy.hernandez@idrd.gov.co	3203133858
10	Adriana Castellanos	Residente SST.	Contratista		Gibraltar	Solfeo_2@yahoo.com	3109518051
11	ANDRES QUEVEDO IVR	RESIDENTE SST	INTERVENTORIA		STC	residentesst.intervobras@gmail.com	3167[illegible]
12	Fabio Alexander Fuentes	Prof Calidad	Calidad		Interventoria		
13	Johanna Chavez Golan	Apoyo SST. Calidad	IDRD STC				
14	Carmen Lucia Velez Guillermo	Apoyo Sup. Social	STC	IDRD		carmen.velez@idrd.gov.co	3204054770
15	Oscar Cachya Casas Camargo	Ing. Forestal	Interventoria		Int. Obra	interventoriaobra1@gmail.com	3002164115
16	Alfredo Muñoz Rodriguez	Rep. Legal	contratista			aramcia@ymr.com.co	3163059658
17	Wataly Cuellar Ciano	Residente Social	Interventoria		Interventoria	Residentesocialgibraltar@gmail.com	3142693209
18	Ma. Isabel Rojas Romero	Profesional	contratista		Gibraltar	Social.contacto.obra@gmail.com	
19	Héctor Hernán Meza	Ing. Topográfico	Interventoría		Interventoría	hhmaco@Yahoo.com	3124302246

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: http://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

BOGOTÁ

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comite de Obra No 10 CAR	DD	MM	AA
ACTA No. 10		17	04	2024

LUGAR: Salón Caracol IDRD. HORA DE INICIO: 9:20am HORA FIN: 12:00pm

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. Componente social	4. Componente ambiental
2. Componente SST	5. Componente forestal
3. Componente Calidad.	6. Componente tecnico.

TEMAS TRATADOS

- Se adjunta listado de asistencia al acta de comite
- Se adjunta trazabilidad de compromisos del acta anterior

Powered by CamScanner

TEMAS TRATADOS

· Componente social [redacted]

- Actas de vecindad · El 12/4/2024 se entregaron las actas de vecindad en físico al IDRD. Se solicita al contratista entregar las copias a los dueños de los predios.
- Informe mensual: El 17/04/2024 la Intv. da aprobación al informe mensual No. 2 del contratista
- Comite participación ciudadana: El contratista remitio la presentación subsanada de acuerdo a las recomendaciones dadas por la entidad

Componente SST:

- Plan SST Contratista: La interventoria aprobo el 12/04/2024 Plan SST del contratista, El contratista lo radico en físico el 16/04/2024, se encuentra en revisión por la interventoria. Si esta OK se radicará el 17/04/2024 al IDRD. Se solicita el plan SST del contratista en digital.
- Informe mensual No 1: La supervisión solicita a la interventoria dar concepto de revisión al informe el 17/04/2024.
- Informe mensual No. 2: El contratista se compromete a subsanar el informe el 19/04/2024.

La supervisión solicita ser consecuente en la revisión de los informes mensuales por parte de la interventoria.

- Plan SST de interventoria: La supervisión solicita que se subsane el Plan SST el 17/04/2024.
- La supervisión solicita a la interventoria las chaquetas de dotación
- Se aclara, que no se ha dado respuesta por parte de la supervisión a los informes mensuales SST de la Intv, hasta que no este aprobado el plan SST.
- Se solicita que la interventoria de fecha de entrega de chaquetas de dotación, ya que deben estar identificados con carnet y chaqueta.

Powered by CamScanner

TEMAS TRATADOS

- Componente Calidad: Pendiente revisión del IDRD o subsanación de informe No. 2 de calidad de la interventoría.
Los informes mensuales No 1 y No 2 de calidad ya estan aprobados por la intv y radicados al IDRD en físico.
- Componente ambiental:
- Plan de contingencia: La interventoría remitio el PDC el 15/04/24 a la supervisión por correo. y dio un alcance al documento el 17/04/2024
El prof. de riesgos de la intv. manifiesta que el PDC en el componente de riesgos, no esta aprobado.
La prof SST de intv, manifiesta que en el PDC, por el componente SST esta aprobado.
La supervisión solicita que el PDC debe estar subsano de acuerdo al apendice remitido previamente por el IDRD y se solicita los listas de chequeo y un informe de revisión de la interventoría. Para revisar el PDC se requiere el PMA aprobado.
La supervisión solicita dar un alcance al Plan de Contingencia, ya que no esta aprobado por todos los componentes, se encuentra incompleto y no se revisara la versión enviada.
Plan de gestión del riesgo: La intv. solicitá al contratista de velodromo aclaración si la Ing. Johana Barrientos participó en la elaboración del PGRD del proyecto de CAR.
Se requiere el profesional de riesgo del contratista aprobado debe presentarse en el comite y el contratista dar claridad sobre la actuación de la Ing. Johana en el contrato de CAR.
La interventoria manifiesta que el 17/04/2024 se remite observaciones a la V5 del plan de riesgos remitido por el contratista el 16/04/2024.
El contratista se compromete a enviar el Plan de Gestión del Riesgo subsanado el 19/04/2024.
Se le realizo llamado de atención al contratista por la demora en la entrega de los productos del componente de riesgos.
La supervisón solicita que para el proxímo comite se presente la respuesta de velodromo sobre la profesional de Gestion Riesgo.

Powered by CamScanner

TEMAS TRATADOS

- [Plan de manejo ambiental]: Esta pendiente la subsanación del PMA en el componente forestal
La supervisión solicita que se remita un estado de entregables de productos del componente ambiental para entes de control.
- [Programa RCD]: La interventoria el 16/04/2024 radico en fisico al IDRD el programa de RCD. Ya se aperturo el PIN.
- [Bogota Construcción Sostenible]: En revision por la supervision del IDRD.
- [Informe mensual No.1]: La intv. el dia 17/04/2024 aprobó el informe del contratista.
- La supervision solicita remitir informe No.1 de intv. con la aprobación del informe del contratista el 17/04/2024.
- [Informe mensual No.2]: Pendiente concepto de revisión por la interventoria hasta la aprobación del informe mensual No.1
- [Plan de monitoreo hidrogeológico]: El 16/04/2024 en visitación los 7 pozos, se tomaron registros de nivel freatico, profundidad del pozo, temperatura conductividad. El pozo No. 6 no se pudo inspeccionar debido al mal estado del pozo, ya se encuentra obstruido con residuos. La supervisión solicita que en el oficio remisorio del PDC y el PDGR sea contundente en que solo se requiere radicar de acuerdo al concepto 3491 y no se debe esperar aprobacion por la SDA.
La SDA no autorizo ninguna actividad de purga o limpieza hasta que no se pronuncien sobre el plan de monitoreo radicado.

- [Componente forestal]
- Acta WR: La supervisión manifiesta que cuando se este terminando obra se solicita mesa de trabajo de paisajismo para actualización de Acta WR. Teniendo en cuenta que no se realizan cambios a la resolucion No. 01085 de 2023 silvicultural
- La interventoria solicita al contratista dar prioridad a la subsanación del plan de gestión del riesgo. y plan de contingencia, sin estos planes radicados no se puede iniciar obra

Powered by CamScanner

TEMAS TRATADOS

[redacted] El contratista remitio el 11/04/2024 el balance de cap. de cimentación.
El 16/04/2024. se realizo mesa de trabajo de las partes contratista e interventoria para revisión del balance.
El contratista manifiesta que se esta en la elaboración del balance presupuestal pero se requiere una mesa de trabajo entre las partes para definir la presentación del presupuesto.
La supervisión manifiesta que el 16/04/2024 se realizo mesa de trabajo estructural con la consultoria y se tiene previsto 17/04/2024 mesa de trabajo de geotecnia con el consultor.
[redacted] El contratista remitio el 11/04/2024 balance general del proyecto, pero la interv manifiesta que se presentan observaciones, se plantea una mesa de trabajo entre las partes, para socialización de observaciones el 17/04/2024.
la supervisión solicita que se realice mesa de trabajo. para presupuesto. la supervisión manifiesta que la prioridad es la revisión de cimentación con la consultoria dada la premura del inicio de la actividad y posteriormente se revisaran las otras disciplinas.
[redacted]
La interventoría solicita al contratista de obra la entrega de Programación y balance de la propuesta de pilotes hincados. Programación el 17/04/2024 y balance el 18/04/2024.
El contratista manifiesta que los diseños de pilotaje hincado no se van a cobrar a la entidad, solo el ajuste a los reembolsos los que requiera este cambio ante la curaduría
La interventoria manifiesta que se esta a la espera que el contratista de respuesta a las observaciones presentados al diseño estructural de pilotes.
El contratista se compromete a radicar programación de pilotes el 17/04/2024
La interventoria se compromete el 20/04/24 entregar el balance presupuestal del proyecto con relación a propuesta de pilotaje hincado. y el balance general del proyecto. conceptuado por la interventoria y el concepto de cambio de pilotaje

Powered by CamScanner

TEMAS TRATADOS

- La supervisión solicita que se remita balance presupuestal de capitulos de preliminares, cimentación y estructura radicado al IDRD y en ese oficio solicitar las mesas de trabajo con el consultor de geotecnia y estructura
- La propuesta de cambio de pilotaje se debe sustentar tecnica, juridica y administrativamente esta cambio al tipo de pilotaje
- Se compromete contratista e interventoria a realizar mesa de trabajo para revisión del balance el 17/04/2024
- La interventoria se compromete a radicar al IDRD el 20/04/2024 el balance presupuestal

TIPO

Hidráulico: Se presentaron observaciones a los documentos de la TPO, hacen falta memorias de calculo de acometidas.
El contratista se compromete a entregar los documentos subsanados el 18/04/2024.
El presupuesto del modelo hidraulico lo debe entregar el contratista el 26/04/2024.
La interventoría informa que el CD del modelo hidráulico llego roto, por lo tanto, la supervisión solicita que se designe una persona para recoger nuevamente el modelo en la EAAB, lo antes posible.

Hojas de Vida: El contratista se compromete al 18/04/2024 remite respuesta a las observaciones presentados a la hoja de vida del profesional de telecomunicaciones.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Concepto revisión informe No.1 SST	Interventoría	17/04/2024
Subsanación informe SST No. 2	Contratista	19/04/2024
Subsanación Plan SST interventoría	Interventoría	17/04/2024
Plan SST Digital contratista	Interventoría	17/04/2024
Plan de gestión del riesgo sub.	Contratista	19/04/2024
Concepto rev. del plan de riesgo.	Interventoría	17/04/2024
Respuesta velodromo prof. riesgos	Interventoría	23/04/2024
Mesa de trabajo presupuesto.	Intv-Contratista	17/04/2024
Programación y balance pilotes hincados	Contratista	18/04/2024
Subsanación obs. diseño pilotaje	Contratista	17/04/2024
Revisión informe calidad 1 y 2	IDRD	19/04/2024
Informe estado productos componente ambiental.	Interventoría	23/04/2024.
Remitir V3 Informe ambiental No 1	Interventoría	17/04/2024
Documentos TPOEAAB Subsanados	Contratista	18/04/2024
Respuesta hoja de vida prof telecomu.	Contratista	18/04/2024
Recoger CD EAAB Modelo hidraulico	Interventoría	23/04/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las 12:00 pm se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Alejandra Castillon P.

Powered by CamScanner

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
Entrega balance presupuestal	Interventoría	20/04/24
Mesa de trabajo forestal.	Intv - IDRD.	19/04/24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Alejandra Castillon P.

Powered by CamScanner

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de Obra No. 10CAR FECHA: 17 04 2024

HORA INICIAL 9:20am HORA FINAL 12:00pm LUGAR Salon Corocol IDRD.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO
1	RAUL A. PINZON R.	DIR. INTERVENT.	INTERVT.		INTERVT.	RAULPINZON@HOTMAIL	3188868 72
2	Wilber Treine Sánchez	Residente SIM	Interventor		Interventor	wpicon.sim@gmail.com	3152070 733
3	Jose Rubén Fonseca López	Apoyo Supervisión	ORC-IDRD				
4	Fabio Alexander Fuentes	Prof Calidad	Interventoría		Interventoría		
5	Carolina Sánchez León	Residente Calidad	Contratista		Consorcio Gibraltar	carjorcesar@gmail.com	3102094166
6	Sandra Ruiz Ruiz	Espec. Ambiental	Contratista		Consorcio Gibraltar	ambiental.consorcio.gibraltar@gmail.com	3006897165
7	Milena Bonads	Residente Ambiental	Contratista		Gibraltar	ambiental.grsacgibraltar@gmail.com	3144453032
8	Adriana Castellanos	Residente SST	Contratista		Gibraltar	salleo_12@yahoo.com	3108515051
9	Maximiliano Villadiego E.	Espec. Geotecnia	contratista		Gibraltar	pavimentosyconcretosespc@gmail.com	3123623582
10	William Jiménez Salcedo	Prof Eléctrico	Interventor		Interventoría	williamjimenez@jimenezingenieros.com	3166170113
11	Daniela Buitrago Naranjo	interventoria	interventoria		interventoría	danielabuitrago@vaingenieros.co	3125738391
12	Nicolás Rodríguez Rojas	Rol. Costos y Ppto	Contratista		Consorcio Gibraltar	pcsgeotecgibraltar2024@gmail.com	3229855196
13	Yesid Ruiz C.	Esp. Estructu.	Contratista		Cons Gibraltar	Yesidruiz2@gmail.com	3002100702
14	Ingrid Johanna Barrera Mujica	Asesora SHO	Contratista		Consorcio Gibraltar	ingridjohannabm@gmail.com	3125584967
15	Sara Eulalia Chaparo Gordillo	Hidrogeólogo	Contratista		Consorcio Gibraltar	saraeulalia19@gmail.com	3204386100
16	ANDREA CATALINA QUEVEDO RUIZ	PROF. SST	INTERVENTORIA		CIS	residentesst.interv.gibraltar@gmail.com	3103116643
17	Santiago Reyes Gutierrez	Gerente Técnico	Contratista		consorcio gibraltar	saregu@gmail.com	3102638510
18	STEVE MORENO ORTIZ	DIRECTOR OBRA.	CONTRATISTA.		C. GIBRALTAR	CARCGIBRALTAR@GMAIL.COM	3043912251

Con la suscripción del presente formulario, autoriza al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD. https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V 4

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite de Obra No 10 CAR FECHA: 17 9 2024

HORA INICIAL 9:20am HORA FINAL 2:00pm LUGAR Salón Caracol IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO
1	Arley Rodriguez	Coordinador BIM	C.Gibraltar		C.Gibraltar	Coordinacion C.Gibraltar@	3112765435
2	Walter López	Esp ambiental	Interventoría		Coningi	interamb.valderrama@gmail.com	3042846612
3	Julian Agudelo Niño	Residente Amb	Interventoría		Coningi	Juagudelo@gmail.com	3202356372
4	Yaney Murillo	Apoyo Tec. Sup.	STC-IDRD		IDRD	Yaney.murillo@idrd.gov.co	3043808785
5	Nancy Hernandez	Apoyo Tec. Sup.	STC-IDRD		IDRD	nancy.hernandez@idrd	3203133858
6	LAURA ESCARPETA	Apoyo Tec. Sup	STC-IDRD		IDRD	laura.escarpeta@idrd.gov.co	323-136-3611
7	Andrés Suárez Suárez	Apoyo Tec Sup	STC-IDRD		IDRD	jorge.suarez@idrd.gov.co	3147098458.
8	Oscar Ricardo Tamayo T	Sup. clo Interv.	STC-IDRD		IDRD	oscar.tamayo@idrd.gov.co	3222074785
9	Andres Martinez	Interventoria	Interventoría		Interv.	intervcabrigibraltar@gmail.com	3153897045
10	Miguel Angel Castañeda López	Biólogo - Fauna S	C. Gibraltar		C. Gibraltar	miancab1982@gmail.com	3431411426
11	Faith Adriana Cuevas Alayón	Coordinadora Inter.	Interventoría		Cons. Interv. Gibr.	interventoriagibraltar@gmail.com	3134230273.
12	J Manuel Palmol.	Ing. Estructural	IDRD		IDRD	Jose.Palmol@IDRD.gov	3118490081
13	Weimar García M.	Ing. Geotecnista	Interventoría		Interventoría	ingeocim@ingenieriaygeotecnia	3104733270
14	Alfredo Muñoz R	R Legal	C. Gibraltar		C. Gibraltar	gerencia@amr.com.co	3163098778
15	Oscar Casas	I Forestal	Interventoría		Interven	oscarenriquecasas@gmail.com	3102164115
16	Johanna. Chaves	Apoyo logístico	IDRD				
17	Maria Alejandra Castillon	Residente Intv	Interventoría				
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V 4

Página 10.

Powered by CamScanner

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comite de Obra No. 11 CAR	DD	MM	AA
ACTA No. 11		24	04	2024

LUGAR: Salon Caracol IDRD. HORA DE INICIO: 9:20am HORA FIN: 11:00am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. Componente social.
2. Componente SST
3. Componente Calidad
4. Componente Ambiental.
5. Componente Forestal y fauna
6. Componente tecnico.

TEMAS TRATADOS

1. Componente social:

Actas de vecindad: El 22/04/2024 se entregaron copias de los actas de vecindad de los responsables de los predios, en su totalidad.

Primer comite de participación ciudadana: El 17/04/2024 se llevo a cabo el primer comite de participación ciudadana bajo los lineamientos establecidos en el plan de gestión social y el apendice social del IDRD. El 20/04/2024 el contratista remito acta de reunión del primer comité de participación ciudadana la cual fue revisada por la interventoria y se remitió a la entidad el 22/04/2024

Solicitud reporte de vinculación laboral mensual proyectos abril 2024: Se recuerda al contratista e interventoría el reporte de vinculación del personal del mes de abril de 2024 a mas tardar el 30 de abril de 2024 con los soportes de pago de seguridad social o en su defecto afiliación para los que entraron en el presente mes.

TEMAS TRATADOS

2. Componente SST:

- Plan SG-SST: La interventoría manifiesta que el 23/04/2024 se radicó en físico el plan SG-SST de interventoría a la entidad.
- Informe mensual No 1.: El 23/04/2024 la interventoria remitio aprobacion al informe No. 1 SST del contratista.
- El contratista se compromete a radicar a intv. el informe en Fisico el 25/04/2024
- El informe mensual No. 1 de la interventoria presenta observaciones, la interventoria se compromete a remitir el informe subsanado el informe el 24/04/2024
- La interventoria se compromete a remitir V1 del informe No. 2 SST el 26/04/2024

3. Componente de Calidad:

Informe mensual: El informe mensual No. 1 y No. 2 del contratista ya se encentran aprobados y radicados en el IDRD

El informe mensual No. 1. de interventoria fue preaprobado por la supervisión el 23/04/2024., se compromete a radicar en fisico el 24/04/2023.

4. Componente de fauna y flora:

- El Plan de Manejo de fauna se encuentra en proceso de subsanacion por parte del contratista, se solicita a la interventoria remitir oficio formal con las observaciones al plan de manejo de fauna emitidas por el IDRD.
- El plan de manejo de vegetacion se remitia subsanado al IDRD el 22/04/2024 debidamente subsanado.

GESTIÓN DOCUMENTAL - V.2

TEMAS TRATADOS

• Componente ambiental

Plan de Gestion del Riesgo: El profesional de riesgos de la interventoria manifiesta que ya fue revisado el documento, se presentan observaciones de forma, que se remitiran al contratista el 24/04/2024, con concepto de aprobacion
la supervisión solicita que la version aprobada se adjunte al PMA.
Por lo tanto, ya se puede realizar la revisión del PAC por parte del componente EST y de riesgos

• Plan de Manejo Ambiental: Se presentarón observaciones a fichas de mejoramiento de lixiviados, fichas tecnicas se deben adjuntar. Se solicita a interventoría revisar con detalle el documento. El 24/04/2024 se remitira correo con observaciones por parte de la supervisión.
la Secretaria Distrital de Salud, modelo cualitativo de obras ofensivos, a través de derecho de peticion se solicite, para incluirlo y tenerlo en cuenta en caso de una PQR. (Estudio de olores ofensivos)

- Bogota Construcción Sostenible: Se requiere mesa tecnica para socalizacion de observaciones con relación al componente arquitectura, se programará en el transcurso de la semana
- Plan de monitoreo de aguas subterraneas: Se esta a la espera del pronunciamiento por parte de la SDA.
La supervisión solicita que los planes y programas del componente ambiental faltantes se presenten a conformidad lo antes posible
De acuerdo a la matriz de riesgo, se solicita que se aplique plan de emergencia dado que a la fecha no se han aprobado el PMA, el plan de contingencia y el plan de gestión de riesgos.

AS TRATADOS

stCompontaTecnico

La supervision manifiesta que a la fecha,
- No se ha demostrado que lo contratado por el IDRD no funcione con relación a los pilotes, por lo tanto, se esta a la espera que se remita esta justificacion por la interv.
- El IDRD solicita que se remita completa la justificación de pilotaje hincado, dado que no se ha recibido.
- El contratista manifiesta que desde el inico del proyecto se indico que el pilotaje tipo kelly no funciona por estabilidad de la obra.
- La supervisión solicita que con la justificacion de cambio se presenten los APUs.
- El contratista presenta informe de justificacion de pilotaje hincado
- La supervisión, solicita al contratista fortalecer la justificacion juridica del combio de pilotaje.

TPO:

Electrica: El contratista inicio proceso de contratación de actividades de media tension, se solicita al contratista que debe validar si se requiere licencia de aprobación excavaciones
La supervisión manifiesta y reitera que no se puede iniciar actividad de obra hasta no estar radicados los planes y programas del componente ambiental

Acueducto: La interventoria ya realizó la recolección del CD del modelo hidraulica se entregara al contratista despues del comite. Ya se remitieron a la supervisión los documentos de tipo de EAAB Subsanados
El contratista manifiesta que sigue a la espera de la respuesta por parte de la consultoria a las observaciones de los diseños presentados.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Radicar informe No. 1 SST Físico	Contratista	25/04/2024
Subsanación informe No. 1 Interv.	Interventoría	24/04/2024
Informe No. 2 SST V1	Interventoría	26/04/2024
Radicar informe No 1 Calidad	Interventoría	24/04/2024
Subsanación Plan Gestión de Riesgos.	Contratista.	24/04/2024
Concepto revisión Plan de Contingencia	Interventoría	24/04/2024.
Mesa técnica Construcción Sostenible	Todas las partes	29/04/2024
Justificación cambio de pilotaje	Interventoría	27/04/2024
(jurídica, presupuestal, técnica)		
Oficio observaciones plan de manejo	Interventoría	24/04/2024
de Fauna		
Entrega CD Modelo Hidráulico	Interventoría	24/04/2024
Revisión POC y PGDR desde el	Interventoría	29/04/2024
Componente SST y riesgo		
Observaciones plan manejo ambiental	IDRD	24/04/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las 11:00am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE		
CARGO		CARGO		

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORÓ EL ACTA:	Arq. Alejandra Castrillón

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite de Obra No. 11 CAR FECHA: 24 04 2024

HORA INICIAL 9:00 am HORA FINAL _____ LUGAR Salón Caracol IDRD.

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	RAUL A. PINZON R	DIR. INTERV.	INTERVENT		INTERVENT.	RAMPINZON@[illegible]	3118868622
2	Fabio Alexander Puentes	Prof Calidad	Interventoría		Interventoría	interventoriacarcalidad@gmail.com	
3	Carmen Lucia Velez Valderrama	Apoyo Sup Social	STC.		IDRD	Carmen.velez@idrd.gov.co	3204059770
4	Johanna Chavez Cortes	Apoyo Sup Predial	STC IDRD				
5	Walter López Giraldo	Coord. Ambiental	Interventoría		CONINGI	interamb.cara@gmail.com	3142181612
6	Edwin Castillo Landinez	Proj. Riesgos	Interventoría		CIG	edgiocas@gmail.com	3004316380
7	Daniela Buitrago Naranjo	Apoyo interventoria	interventoria		CIG.	daniela.buitrago@vaingenieria.com	3125[illegible]39
8	Maximiliano Villadiego E	Espec. Geotecnia	Gibraltar		Cons. Gib.	Pavimentos y concretos spc@gmail	3123623582
9	Andres Martinez	Interventoria RL	Interventoría		Interventoría	interventoriagibraltar@gmail.com	3153897045
10	Adriana Castellanos	Contratista Gibraltar	Contratista		Gibraltar	Solfeo_12@yahoo.com	3108515051
11	Arley Rodriguez	Consorcio Gibral	Contratista		C. Gibralta	Coordinacion.Consorciogibraltar	3112215485
12	Santiago Reyes	Consorcio Gibraltar	Contratista		C. Gibraltar	saregu@gmail.com	3102638510
13	Yelda Nava	Lab - Gibraltar	Laboratorista		C. Gibraltar	Yeldanava@gmail.com	300 210 02 82
14	Nicolás Rodriguez Lopez	Prof Costos y Pres.	Contratista		C. Gibraltar	presupuestogibralteriorge@gmail.com	3229305496
15	Steve Moreno Ortiz	Director ORPD	Contratista		C. Gibraltar	directorcdrgibraltar@gmail	3043412254
16	Alfredo Munoz	Dep legal	Contratista		//	gerencia@amr.com.co	3163059678
17	Ricardo Marroquin	Esp. Riesgos	Contratista		C. Gibraltar	rolaricone@gmail.com	3102583838
18	Jose Rubén Fonseca López	Apoyo Supervisor	STC - IDRD				

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

Pag 9

30

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité de Obra No. 11 CAR FECHA: 24 04 2024

HORA INICIAL 9:00am HORA FINAL 11:00am LUGAR Salón Caracol IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Oscar Ricardo Tamayo T	Sup. cto interv	STC-IDRD		IDRD	oscar.tamayo@idrd.gov.co	3223099718
2	Francy Murillo	Apoyo Tec. Sup.	STC-IDRD		IDRD	francy.murillo@idrd.gov.co	3043808785
3	Andres Suarez	Apoyo Tec Sup	STC-IDRD		IDRD	jorgea.suarez@idrd.gov.co	3127018458
4	Maria Isabel Rocha Romero	Profesional Social	Contratista		Consorcio Gibraltar	social.cariari.gibraltar@gmail.com	3213491289
5	Miguel Angel Castañeda López	Biólogo	Contratista		Cons. Gibraltar	miancalo1982@gmail.com	3143141426
6	Maria Bernardes Rocha	Residente Ambiental	Contratista		Cons. Gibraltar	ambiental.consorciogibraltar@gmail.com	3144533032
7	Sandra Ruiz Ruiz	Prof Ambiental Social	Contratista		Cons Gibraltar	ambiental.consorciogibraltar@gmail.com	3006985960
8	Carolina Sánchez León	Prof de Calidad.	Contratista		Consorcio Gibraltar	carporcesar@gmail.com	3102094166
9	Sara Eulalia Chaparro G.	Hidrogeóloga	Contratista		C. Gibraltar	sarageology19@gmail.com	3124386100
10	Ingrid Johanna Clemente M.	Asesora GRD	Contratista		C. Gibraltar	ingjohannabm@gmail.com	3155807987
11	ANDRES CATALINA MESIAS RUIZ	Prof SSY	INTERVENTORIA		CIC	residentessst.interventoriagibraltar@gmail.com	3103116614
12	Nancy Hernandez Araya	Apoy Tec Sup	STC IDRD		IDRD	nancy.hernandez@idrd	3203137888
13	Fanth Tatiana Guevara Alcayde	Coordinadora Interv	Interventoria		Consorcio Interventoria Gibraltar	interventoriacgibraltar@gmail.com	3134230273
14	Gerardo Calixto Ch	Inspector contratista	contratista		consorcio gibraltar	pacta.jorge.de.la@gmail.com	3008607285
15	J. Manuel Palma C.	Ing Est. IDRD	STC IDRD		IDRD	Jesus.palma@IDRD.gov	3118490085
16	William Rueda Salcedo	Prof. Electrico	Interventoria		Interventoria	William.rueda@consultoriasic.com	3126132217
17	Maria Alejandra Castillón	R. Interventoria	Interventoria		Interventoria		
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/políticas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

Pag 3

TRAZABILIDAD DE COMPROMISOS COMITÉ DE OBRA CAR No. 10				
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE**	**CUMPLIO/NO CUMPLIO**	**OBSERVACIONES**
Concepto revision informe No. 1 SST	Interventoría	17/4/2024	CUMPLIO	APROBADO. La interventoría mediante comunicado CIG-IDRD-CEFE-192-2025 del 23 de abril de 2024 da respuesta comunicado IDRD--3203-E211-2023.
Subsanación informe SST No. 2	Contratista	19/4/2024	CUMPLIO	El contratista mediante el comunicado IDRD--3203-E227-2023 del 19 de abril de 2024, remite V2 del Informe mensual No. 2
Subsanación Plan SST Interventoría	Interventoría	17/4/2024	CUMPLIO	La interventoría mediante el comunicado CIG-IDRD-INT-076-2024 del 23 de abril de 2024, radica on físico Plan SST aprobado.
Plan de gestión de riesgos subsanado	Contratista	19/4/2024	CUMPLIO	El contratista el 21/04/2024 remito V5 del plan de gestión del riesgo, el cual se encuentra en revisión por la interventoría.
Concepto revisión interventoría Plan de Gestión del Riesgo	Interventoría	17/4/2024	PENDIENTE	En revisión.
Respuesta velódromo profesional de riesgos	Interventoría	23/4/2024	CUMPLIO	El contratista do velódromo mediante el comunicado CE-206-125-0240 indicó que la profesional de riesgo está prestando asesoría al contratista de CAR
Programación y balance pilotes hincados	Contratista	18/4/2024	CUMPLIO	El contratista el 19/04/2024, remitio programación y balance de pilotes hincados.
Subsanación diseño pilotaje	Contratista	17/4/2024	CUMPLIO	El 18 de abril de 2024, el contratista mediante el comunicado IDRD--3203-E220-2023 remite ALCANCE A COMUNICADO IDRD-CTO-3203-E203-2023 REVISIÓN DISEÑO ESTRUCTURAL PILOTES HINCADOS
Revisión informe de Calidad No. 1 y No. 2	IDRD	19/4/2024	CUMPLIO	IDRD envía observaciones Informe N 1 de Calidad a la cual luego de aclaraciones varias se da respuesta definitiva por parte de interventoría el día 23 de abril de 2024
Informe estado productos componente ambiental	Interventoría	23/4/2024	PENDIENTE	
Remitir V3 del informe ambiental No. 1 de interventoría	Interventoría	17/4/2024	CUMPLIO	La interventoría el 22 de abril de 2024 mediante comunicado CIG-IDRD-INT-075-2024 remite informe mensual ambiental CAR No 1.
Documentos TPO Subsanados	Contratista	18/4/2024	CUMPLIO	El contratista el 19/04/2024 remite mediante IDRD--3203-E00219 Remisión documentos TPO EAAB. Ya se remitieron a la entidad.
Respuesta hoja de vida profesional telecomunicaciones	Contratista	18/4/2024	CUMPLIO	La interventoría mediante comunicado CIG-IDRD-CEFE-186-2024 del 19 de abril de 2024, radica a la entidad hoja de vida de profesional de telecomunicaciones aprobada.
Recoger CD modelo hidráulico EAAB	Interventoría	23/4/2024	CUMPLIO	Ya se recogio la tinormacion en la EAAB
Entrega balance presupuestal	Interventoría	20/4/2024	PENDIENTE	Esta compromiso esta pendiente, la interventoría y contratista se encuentra trabajando en el documento.
Mesa de trabajo forestal	Interventoría-IDRD	19/4/2024	PENDIENTE	Esta compromiso esta pendiente

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: Comite No. 11 CAR	DD	MM	AA
ACTA No. 11		30	4	2024

LUGAR: Salón Caracol IDRD. HORA DE INICIO: 9:16am. HORA FIN: 11:00am

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA

1. Componente Socio	4. Componente forestal y fauna
2. Componente SST	5. Componente ambiental
3. Componente Calidad.	6. Componente tecnico.

TEMAS TRATADOS

1. Componente Social:

- Informe mensual: Se recomienda hacer entrega del informe social mensual del contralista a mas tardar el 3 de mayo de 2024
- Segundo comite participacion ciudadana: el 15/05/2024 se va a ejecutar el segundo comite de participación ciudadana, por lo cual, se solicita hacer llegar a la interventoria las artes de los volantes de convocatoria el 3/05/2024 para revisión y aprobación de la interventoria y la entidad, asi mismo la presentación para el 6/05/2024

La supervisión solicita que el 30/04/2024 antes del mediodia se remita la documentación del personal vinculado

la supervisión informa que esta pendiente la radicación del informe social No.1., debido a que no se ha aprobado el informe SST No.1.

Se solicita a la interventoria incluir en la chaqueta el numero del contrato de interventoria,

TEMAS TRATADOS

2. Componente SST:

Informe Mensual No. 1 Interventoria: La supervisión manifiesta que el 2/05/2024 remite concepto de revisión

Informe Mensual No. 1 Obra: El contratista se compromete a remitir informe subsanado el 2/05/2024 y la interventoria dara concepto de revisión el 3/05/2024

La supervisión solicita que el 30/04/2024 se realice mesa de trabajo entre las partes contratista e interventoria para socalización de observaciones al informe SST No. 2

La supervisión solicita que los profesionales de interventoria se presenten a tiempo en el comite

3. Componente de calidad:

Informe mensual No. 1: La supervisión solicita que el informe No. 1 de inty, se subsane el 30/04/2024

Se solicita al contratista presentar el informe mensual No 3. el 3/05/2024

Nota SST: El paz y salvo de las personas que estan por prestación de servicios debe estar firmado por las dos partes, tanto para el contratista como interventoría, solicita la supervisión Se solicita el acompañamiento del profesional SST

4. Componente forestal y fauna

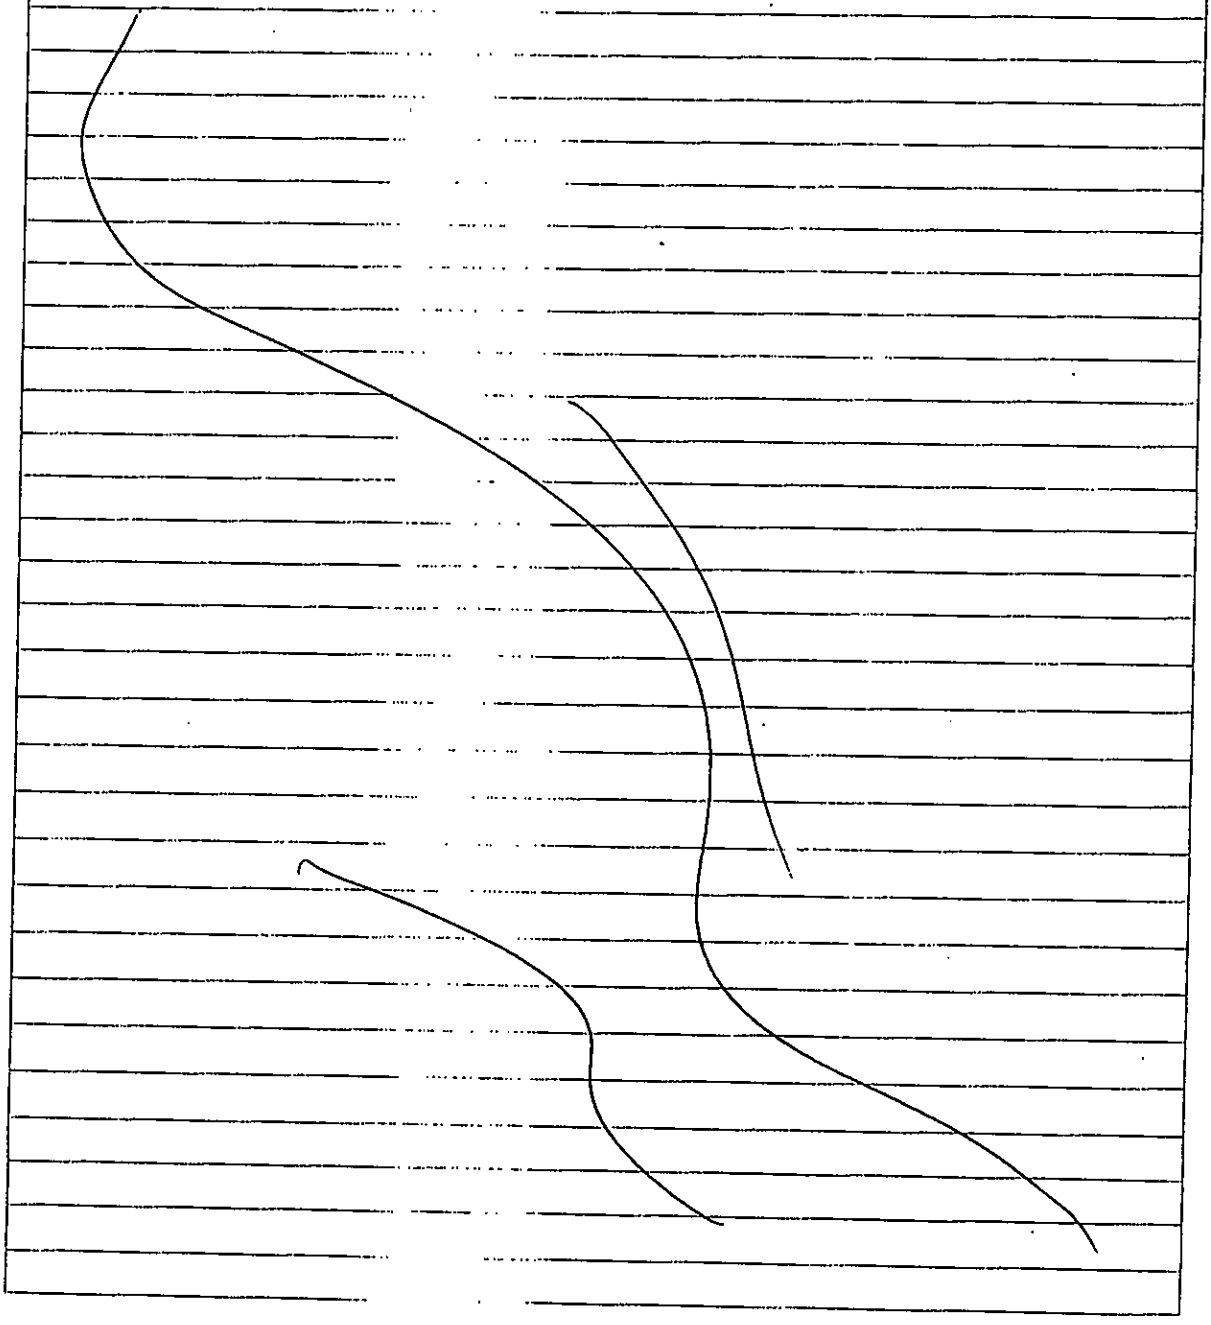
- Plan de manejo de vegetación: La interventoria remite el 29/04/2024 el plan de manejo de vegetación subsanado a la supervisión
- Plan de manejo de fauna: El contratista el 26/04/2024 remitio el plan de manejo de fauna subsanado, el cual, se encuentro en revision por parte del profesional de fauna de la inty, Compromiso remitir concepto de revisión el 30/4/2024.
- Informe mensual No. 2: La interventoria se compromete a remitir el informe el 30/04/2024 a la supervisión
- La supervisión solicita que para cualquier actividad que se realice en el predio se debe contar con la presencia de la profesional SST e informar con antelación el inicio de actividades

40

TEMAS TRATADOS
- Se solicita que el contratista presente actualizado el cronograma de tales para el 30/04/2024
- La interventoria solicita que se presente el protocolo de manejo de roedores completa antes del 2/05/2024
(Componente ambiental)
- Plan de Manejo ambiental: La interventoría remitio el 30/04/24 el PMA aprobado a la supervisión, en la actualidad que esta en revision del plan de manejo de vegetación por el IDRD
- Plan de Gestión del Riesgo: El 25/04/2024 la interventoria remitio el plan de gestión del riesgo aprobado a la supervision
- Plan de contingencia ambiental: La interventoria el 30/04/2024 remite a la supervisión el PDC aprobado por todos los componentes transversales.
- Instalación de valla: La supervisión realiza un llamado de atención al contratista por la instalación de la valla, se le reitera al contratista que no se pueden ejecutar actividades dentro del predio hasta que los planes y programas del componente ambiental se radiquen a las entidades correspondientes y toda actividad debe estar supervisada por el profesional SST. Se le reitera al contratista de obia que debe atacar las instrucción previamente dadas.
La interventoria manifiesta que el 30/04/2024 se remite oficio al Contratista sobre la instalación de la valla.
La supervisión manifiesta que se debe tener un profesional en campo de interventoria para verificación de actividades que ejecute el contratista
- Informe mensual No. 1 de interventoria: El 30/04/2024 se remitio revisión de la supervisión al informe.
- Bogota. Conetrucción Sostenible: La supervisión aclara que las observaciones presentadas se deben a que se debe llegar a categoria intermedia, dado que el documento presentado no cumple ni la categoria basica. Se solicita al contratista presentar el documento subsanado el 2/05/2024

TEMAS TRATADOS

- La interventoria manifiesta que el 25/04/2024, se remitió las observaciones de Bogota Construcción Sostenible por correo electronico.



TEMAS TRATADOS

Componente técnico:

El contratista manifiesta que en el predio ya se ejecuto la rampa de acceso en material granulado, puerta de acceso, instalación de la valla, instalación de postes de time lapse, instalación de señalización PMT.

Se programa para el 7/05/2024 para revisión presupuestal de propuesta de pilotaje hincado mesa de trabajo en la entidad

La interventoria edita que desde el componente ambiental se socialice a los profesionales tecnicos los planes y programación ambiental.

TIPO

Hidraulica: El contratista se compromete a remitir el presupuesto de modelo hidraulico el 6/05/2024 a la interventoria.

La supervisión manifiesta que ya se valido la documentación y se esta espera de oficio remisorio Firmado para remitir a la EAAB

Electrico: El contratista manifiesta que se va a dar inicio a las actividades de media tensión

Comentación:

El contratista manifiesta que a la fecha no cuentan con respuesta por parte de la consultoria a los diseños electrico, voz y datos, seguridad y control, ventilación mecanica.

- Se programa mesa de trabajo electrico para el 2/05/2024

La supervisión solicita que el 30/04/2024 se remita por la interventoria la respuesta a las preguntas remitidas de pilotaje.

La supervisión manifiesta que el documento de cambio de pilotaje remitida por la interventoria se envia a la consultoria para revisión y se programara mesa de trabajo para el 7/05/2024, se solicita que la interventoria y el contratista asista a esa mesa de trabajo para revisión de la solicitud presentada

Se solicita a la supervisión por parte del contratista, respuesta a las observaciones a los diseños, o que se de apropiación por el IDRD. sobre las mismas

TEMAS TRATADOS

Plan inversión del anticipo: El contratista se compromete a remitir el programa detallado del anticipo el 2/05/2024
El 30/04/2024 se remitirá para revisión previa los documentos de anticipo al IDRD.
Se informa a la entidad que está pendiente la entrega de los diseños de los SDS.

BIM

La interventoría manifiesta que ya se remitió la V1.1 de la estrategia de seguimiento BIM a la supervisión el 29/04/2024
Se requiere definir el nivel de desarrollo o madurez se va a modelar el proyecto.
Está pendiente la presentación del cronograma del modelamiento por parte del contratista.
El contratista manifiesta que se va a presentar cronograma con la programación contractual para el 3105/2024.

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN
Informe social No. 3	Contratista	3/05/2024
Arte volantes convocatoria	Contratista	3/05/2024
Concepto revisión informe No. 1 SST	IDRD.	2/05/2024
Subsanación informe No. 2 SST	Contratista	2/05/2024
Concepto revisión informe No. 1 SST	Interventoría	3/05/2024
Subsanación Informe No.2 Calidad	Interventoria	30/04/2024
Mesa trabajo SST Informe	Contratista - Intv.	30/04/2024
Presentación comite No. 2	Contratista	6/05/2024
Informe mensual No 2 Fauna	Interventoria	30/04/2024
Actualizar cronograma de tales	Contratista	30/04/2024
Documentación personal	Interv_Contratista	30/04/2024
Protocolo manejo raqdores	Contratista	2/05/2024
Presentación comite participacion ciudadana	Contratista	6/05/2024
Programa inversión antiopo detallado	Contratista	2/05/2024
Socialización planes de manejo		
Subsanación Bogota Construcción Sostenible	Contratista	2/05/2024

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	

Observaciones

Siendo las 11:00am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE	Arq. Adriana Guerrero	
CARGO		CARGO	Coordinadora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Alejandra Castrillon

COMPROMISOS		
TEMA	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN
Mesa de trabajo electrica	Todos los partes	2/05/24
Oficio respuesta preguntas cimenta- ción	Interventoria	30/04/2024
Remitir documentos anticipo revisión previa	Interventoria	30/04/24
Presupuesto moddo hidraulico	Contratista	6/05/24
Cronograma de moddamiento	Contratista	3/05/24.

EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
¿Se logró el objetivo?	SI	X	NO	
Observaciones				

Siendo las 11:00 am se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA		SECRETARIO (S) si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.		
FIRMA		FIRMA		
NOMBRE		NOMBRE	Arq. Adriana Guerrero	
CARGO		CARGO	Coordinadora Interventoría	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA:	Arq. Alejandra Castrillon

43

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comité No. 12 CAR FECHA: 30 04 2024

HORA INICIAL 9:16 am HORA FINAL 11:00 am LUGAR Salon Caracol IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	RAUL A. PINZON R.	DIR. INTERVENT.	INTERVENT.		INTERVENT	[illegible]	3118868672
2	Fabio Puentes	Prof. Calidad	Interventoria		Interventoria		
3	Wilfer López Giraldo	Coord. Ambiental	Interventoría		COINGI	interamb.cafe@gmail.com	3142184612
4	Daniela Buitrago Naranjo	Apoyo interventoría	Interventoría		Interventoría	danielabuitrago@vaingeniería.com	3125783934
5	Adriana Castellanos	Res SST	Contratista		Contub	Solfeo_12@Yahoo.com	3103875055
6	Ma. Isabel Roona Romero	Prof. Social	Contratista		C.Gibraltar	social.consorciogibraltar@gmail.com	3213470230
7	Carolina Sánchez León	Prof de Calidad	Contratista		C.Gibraltar	carjorcesan@gmail.com	3102094166
8	Sara Eulalia Chaparro G.	Hidrogeóloga	Contratista		C. Gibraltar	sarageology25@gmail.com	3209386100
9	Santiago Reyes G	Gerencia Tecn.	Contratista		C. Gibraltar	saregu@gmail.com	3102638510
10	STEVEN MORENO OBTE	DIRECTOR OBRA	CONTRATISTA		C. GIBRALTAR	ingstevemoreno@gmail.com	3143412251
11	Arley Rodriguez	Coordinada Tecnica	Contratista		C. Gibraltar	C.Gibraltar@Gmail.com	3112215485
12	Nicolás Rodríguez Rojas	Prof. Costos y Ptos	Contratista		C.Gibraltar	presupuestogibraltar2024@gmail.com	3229382496
13	Milena Benavides	Residente Ambiental	Contratista		C. Gibraltar	conjuntol.consorciogibraltar@gmail.com	3144453032
14	ANGELES CATALINA QUEVEDO VIA	PROF SST	INTERVENTOR		CR 6	SST residente SST interventor gibraltar@gmail.com	3167116011
15	Ricardo Alarcon O	Prof. Est. Riesgos	Contratista		C. Gibraltar	ricardoalarcon216@gmail.com	3102783833
16	Juan Manuel Palma Zuñiga	Ing. ESTRUCTURAL	IDRD		IDRD	juanm.palma@IDRD....	3115490081
17	Camilo A. BARRERA S.	ESP. HIDRAULICO	STC - IDRD		IDRD	camilo.barrera@idrd.gov.co	3107307269
18	Wilber Vieira Sánchez	Prof. BIM	Interventoría		Interventoría	wjvieira777@gmail.com	3152070173

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: Comite de Obra No. 12 CAR FECHA: 30 04 2024

HORA INICIAL 9:16 am HORA FINAL 11:00 am LUGAR Salón Caracol IDRD

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA	DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD		
					ENTIDAD	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
1	Faith Adriana Guerrero Alayón	Coordinadora Interv	Interventoría		Consorcio Interventoría	interventoria.gibraltar9@gmail.com	3134730273
2	Oscar Ricardo Tamayo Tamyo	Sup. Cto interv	STC-IDRD		IDRD	oscar.tamayo@idrd.gov.co	3223074
3	Nancy E. Hernandez A.	Apoy Tec Sup.	STC-IDRD		IDRD	nancy.hernandez@idrd.	320313385
4	Carlos Felipe Suárez P.	Apoyo Tec Sup	STC-IDRD		IDRD	carlos.suarez@IDRD.GOV.CO	3125053727
5	Andres Suarez Suarez	Apoy Tec. Sup	STC-IDRD		IDRD	jorge.suarez@IDRD.GOV.CO	3127078455
6	Laura Escarpeta	Apoy Tec Sup	STC-IDRD		RJRD	laura.escarpeta@sdmd.gov.co	3234563564
7	Carmen Lucia Vélez Maldonado	Apoyo Sup. Social	STC.		IDRD	carmen.velez@idrd.gov.co	3204064770
8	Johanna Chaves Galeano	Apoyo Sub calidad	STC				
9	Sandra Ruiz Ruiz	Prof. Ambiental-Sub	Consorcio Gibr		Consorcio	ambiental.corsorcio.g.ibraltar@gmail.com	3006789965
10	Maria Alejandra Castrillón	Interv. Residente	Interv.		Interv.	interventoria.cgr@gmail.com	—
11	William Jiménez Salazar	Inter. Electrico	Interventoría		Inter.	william.jimenez@gruasdelvalle.com	
12	Edu Rivero Pedraza	Apoy Sup elec	STC-IDRD				
13	Nathaly Nun	Sup Geotec	STC-IDRD		IDRD	nath.nun@idrd.gov	
14							
15							
16							
17							
18							

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

ANEXO 2

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA / RECIBIDA 30/04/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
FO-GC-14		V2

FECHA DE ACTUALIZACIO: 30/04/2024

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD REMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
										FECHA	HORA	
ENVIADO	IDRD-3203-E001-2023	27/12/2023	Sin registro	Solicitud apertura y condiciones de manejo cuenta corriente CONSORCIO GIBRALTAR	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	BBVA - Alejandro Jimenez Justi	N.A.	Carrera 9 #72-21	N.A.	N.A.	BBVA - Alejandro Jimenez Justi
ENVIADO	IDRD 3203-E002-2023	27/12/2023	[illegible]	Envio formularios firmados y documentos apertura cuenta corriente 853-034908 CONSORCIO GIBRALTAR	1. SOLICITUD VINCULACION PERSONA JURIDICA 2. Formato de autodeclaración fiscal 3. [illegible]	CONSORCIO GIBRALTAR	BBVA - Alejandro Jimenez Justi	N.A.	Carrera 9 #72-21	N.A.	N.A.	BBVA - Alejandro Jimenez Justi
ENVIADO	IDRD-3203-E003-2023	9/1/2024	[illegible]	Solicitud de riesgo en el predio ubicado en la localidad de Kennedy	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO -	N.A.	Diagonal 47 No. 77A-09 Int 11	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO	10-01-2024-8:31	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO -
RECIBIDO	CIG-IDRD-001-2023	12/1/2024	N.A.	Entrega de documentación etapa inicial	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	licitaciones@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-003-2023	12/1/2024	N.A.	Solicitud de esquema de localización de componentes de obra y cerramiento del proyecto	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	licitaciones@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-004-2023	12/1/2024	N.A.	Solicitud de información URGENTE - generación de empleos profesional y operativo	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	licitaciones@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E004-2023	10/1/2024	[illegible]	Solicitud firma autenticada	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [illegible]	interventoriabibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR [illegible]	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-001-2023	10/1/2024	N.A.	Entrega de documentación etapa inicial	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	licitaciones@amr.com.co	N.A.	Salida	10/1/2024	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E005-2023	16/1/2024	[illegible]	Respuesta oficio CIG-IDRD-001-2023 entrega de documentación etapa inicial y CID-IDRD-CEFE-003-2024 entrega documentación etapa inicial	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [illegible]	interventoriabibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR [illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E006-2023	16/1/2024	N.A.	Respuesta oficio CIG-IDRD-004-2023 solicitud de información urgente - generación de empleos profesional y operativo	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [illegible]	interventoriabibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR [illegible]	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-002-2024	19/1/2024	N.A.	Ratificación del Incumplimiento técnico del Contrato de Consultoría No. 3642 de 2019 - CENTRO RECREATIVO DEPORTIVO Y CULTURAL (CRDC- [illegible]	drive/folders/1EnjAnEvEyKvMpmKQNDJtzs	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	recepcion@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-009-2024	22/1/2024	N.A.	Solicitud de implantación del proyecto	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	recepcion@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E007-2024	22/1/2024	[illegible]	Respuesta oficio CIG-IDRD-008-2024 Arte Valla	1 folio	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñóz Rodríguez	recepcion@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E008-2024	22/1/2024	[illegible]	Respuesta oficio 003-2024 Cerramiento de obra	1 folio	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [illegible]	interventoriabibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR [illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E009-2024	23/1/2024	[illegible]	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-009-2024 Cerramiento de obra	1 folio	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [illegible]	interventoriabibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR [illegible]	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-011-2024	23/1/2024	N.A.	Observaciones arte de la valla	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	recepcion@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-012-2024	24/1/2024	N.A.	Reiteración - Solicitud de Implantación del Proyecto	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	recepcion@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-014-2024	25/1/2024	[illegible]	Remisión Oficio IDRD No. 20244200018391 y Documento "Factibilidad de Servicio - EAAB"	88 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	recepcion@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-015-2024	26/1/2024	[illegible]	Remisión Oficio IDRD No. 20244300020771 y Documentos "Factibilidad No. 1500201926 y Proyecto Serie 3 No. 1500037442"	6 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	recepcion@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-016-2024	26/1/2024	[illegible]	Remisión Oficio IDRD No. 20244300020771 y Documentos "Factibilidad No. 1500201926 y Proyecto Serie 3 No. 1500037442"	50 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	recepcion@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E010-2023	26/1/2024	[illegible]	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-011-2024 Observaciones Arte Valla	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés [illegible]	interventoriabibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR [illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E011-2023	26/1/2024	[illegible]	Solicitud de información consultoría	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriabibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.

TIPO DE COMUNICACIÓN	NÚMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NÚMERO DE RADICACIÓN/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD PEMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN EJECUTA		FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
ENVIADO	IDRD-3703-E0012-2023	31/1/2024	RELLO EN CONSECUTIVO - CAMILO 13 [illegible]	Carta condiciones de manejo Gibraltar	1 folio	CONSORCIO GIBRALTAR	BBVA - Alejandro Jimenez Justi	N.A.	Carrera 9#72-21	N.A.	N.A.	BBVA - Alejandro Jimenez Justi
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-019-2024	31/1/2024	[illegible]	Información firma de acta de inicio y tramite desembolso de anticipo.	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible]@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3703-E0013-2023	2/2/2024	[illegible] CONSORCIO GIBRALTAR [illegible]	Solicitud de documento para conformación de fiducia	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0014-2023	2/2/2024	[illegible] CONSORCIO GIBRALTAR	Solicitud de certificado bancario IDRD	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0015-2023	2/2/2024	[illegible] CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión documentos plan de gestión social	43 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-020-2024	2/2/2024	[illegible] Concejo de Bogotá [illegible]	Cumplimiento Acuerdo 787-2020 Concejo de Bogotá de valla de obra	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible]@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3703-E0016-2024	6/2/2024	[illegible] [illegible] CONSORCIO GIBRALTAR	Firma acta de Inicio y solicitud de fecha de entrega del lote de construcción del CEFE Gibraltar	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0017-2023	2/2/2024	[illegible] CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión revisión apéndice forestal	11 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0018-2023	6/2/2024	[illegible] CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión Plan de manejo ambiental y plan de contingencia	129 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0019-2023	7/2/2024	[illegible] CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión Plan de gestión de residuos de construcción y demolición	32 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0020-2023	8/2/2024	[illegible] CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión Informe de revisión estructural	26 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0021-2023	7/2/2024	[illegible] CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión plan de gestión de riesgo	46 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0022-2023	7/2/2024	[illegible] CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión Informe eléctrico	8 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-021-2024	5/2/2024	[illegible] Nestor Guerrero	ACTA DE INICIO para firma	2 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible]@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-023-2024	7/2/2024	[illegible] Nestor Guerrero	ACTA DE INICIO para firma	2 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible]@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-024-2024	7/2/2024	[illegible] ENTREGA PREDIO PARA CONSTRUCCION DEL CAR - MANZANA DEL CUIDADO PORVENIR	ENTREGA PREDIO PARA CONSTRUCCION DEL CAR - MANZANA DEL CUIDADO PORVENIR	2 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible]@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3703-E0023-2023	9/2/2024	[illegible] [illegible] CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión Informe Instalaciones mecánicas de aire acondicionado	8 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0024-2023	9/2/2024	[illegible] CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión Informe arquitectura	68 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0025-2023	9/2/2024	[illegible] VALLA DE OBRA CONSORCIO GIBRALTAR	Contenido valla de obra	4 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0026-2023	12/2/2024	[illegible] CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión personal comisión topografía	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0027-2023	12/2/2024	[illegible] CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión entrega preliminar hojas de vida personal clave	27 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0028-2023	13/2/2024	[illegible] DOCUMENTOS PMT CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión documentos PMT	4 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0029-2023	13/2/2024	[illegible] REVISIÓN COMPONENTE SEGURIDAD Y CONTROL CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión revisión componente seguridad y control	12 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0030-2023	13/2/2024	[illegible] REVISIÓN COMPONENTE VOZ Y DATOS CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión revisión componente de voz y datos	8 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0031-2023	13/2/2024	[illegible] LÍNEA TÉCNICA DE USUARIO Y CLAVE PARA IDEAM CONSORCIO GIBRALTAR	Solicitud de línea técnica de usuario y clave para IDEAM	PENDIENTE	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0032-2023	14/2/2024	[illegible] DE INSPECCIÓN PRELIMINAR CONSORCIO GIBRALTAR	Remisión acta de inspección preliminar	4 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0033-2023	14/2/2024	[illegible] Requerimiento de vigilancia y seguridad en el predio del proyecto CONSORCIO GIBRALTAR	Contenido Requerimiento de vigilancia y seguridad en el predio del proyecto	PENDIENTE	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD REMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-027-2024	14/2/2024	[illegible]	Requerimiento de vigilancia y seguridad en el predio del proyecto	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible]	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-028-2024	14/2/2024	[illegible]	Solicitud de documentos para registro de valla de obra	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible]	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3703-E0034-2023	15/2/2024	[illegible]	Remisión programación y flujo de inversión	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0035-2023	15/2/2024	[illegible]	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-027-2024	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0036-2023	16/2/2024	[illegible]	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-031-2024 Revisión No 1 Plan de Manejo de tránsito.	6 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0037-2023	16/2/2024	[illegible]	Remisión maquinaria mínima del proyecto.	14 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-032-2024	16/2/2024	[illegible]	Revisión No. 1 Plan de Gestión del Riesgo - respuesta comunicado IDRD--3703-E121-2023.	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible]	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3703-E0038-2023	20/2/2024	[illegible]	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-028-2024	42 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0039-2023	20/02/2024	Sin registro	respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-029-2024 Entrega Observaciones No.1 Plan de Gestión Social	111 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0040-2023	20/02/2024	[illegible]	remisión informe de geotecnia	22 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-034-2024	20/2/2024	Sin registro	Revisión No. 2 Entrega Observaciones finales del Plan de Contingencia del CAR Gibraltar.	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible]	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-036-2024	20/2/2024	Sin registro	Revisión No. 2 Entrega Observaciones finales del Plan de Contingencia del CAR Gibraltar.	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible]	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3703-E0041-2023	21/02/2024	[illegible]	Entrega de Análisis de precios unitarios (APU'S) para el proyecto.	2 folios	CONSORC+H63:O639O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0042-2023	21/02/2024	[illegible]	Entrega de Plan de inversión de anticipo	1 folio	CONSORC+H63:O639O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0043-2023	21/02/2024	Sin registro	Remisión sistema de gestión y salud en el trabajo.	1 folio - APÉNDICE SG-SST IDRD 102 MB	CONSORC+H63:O639O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0044-2023	21/02/2024	[illegible]	Ubicación de postes, cámaras Times Lapse y P.A.C punto de atención al ciudadano.	6 folios	CONSORC+H63:O639O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0045-2023	21/02/2024	[illegible]	Cambio representante legal suplente Consorcio Gibraltar.	1 folio	CONSORC+H63:O639O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0046-2023	21/02/2024	[illegible]	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-029-2024 Revisión No. 1 de hojas vida profesionales	25 folios	CONSORC+H+H48:O6843:O639 O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0047-2023	22/02/2024	[illegible]	Alcance oficio IDRD-3203-E046-2026 Revisión No. 1 de hojas vida profesionales.	32 folios	CONSORC+H+H48:O6843:O639 O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-038-2024	22/2/2024	Sin registro	Revisión hojas de vida y aceptación del personal del contratista de obra No.1.	ZIP	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible]	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3703-E0048-2023	23/02/2024	[illegible]	RESPUESTA OFICIO CIG-IDRD-CEFE-033-2024 APROBACION PLAN DE GESTION SOCIAL V-1	112 FOLIOS	CONSORC+H+H48:O6843:O639 O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0049-2023	23/02/2024	[illegible]	Formatos apertura y condiciones de manejo cuenta corriente CONSORCIO GIBRALTAR		CONSORCIO GIBRALTAR	BANCO ITAU - Juan Pablo Salomonte	N.A.	Calle 12 #7-32	N.A.	N.A.	BANCO ITAU - Juan Pablo Salomonte
ENVIADO	IDRD-3703-E0050-2023	23/02/2024	Sin registro	Cambio sistema de cimentación	N.A.	CONSORC+H+H48:O6863:O639 O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0051-2023	23/02/2024	Sin registro	Alcance oficio IDRD--3203-E036-2023, certificación de bienes de patrimonio	1 folio	CONSORC+H+H48:O6863:O639 O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-040-2024	23/2/2024	Sin registro	Revisión hojas de vida No.2 y No.3 y aceptación del personal del contratista de obra No.2.	ZIP	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible]	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-042-2024	23/2/2024	Sin registro	Aprobación piezas comunicativas - Centro de Alto Rendimiento	8 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible]	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3703-E0052-2023	24/02/2024	Sin registro	REMISIÓN APÉNDICE PAISAJÍSTICO.	51 folios	CONSORC+H+H48:O6863:O639 O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD REMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
ENVIADO	IDRD-3703-E0053-2023	27/02/2024	[redacted]	REMISIÓN PLAN DE CALIDAD	344 folios	CONSORC+H+H48:O4843:O43 O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0054-2023	27/02/2024	[redacted]	RESPUESTA OFICIO CIG-IDRD-CEFE-033-2024 Plan de gestión del riesgo.	81 folios	CONSORC+H+H48:O4843:O43 O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0055-2023	27/02/2024	Sin registro	RESPUESTA OFICIO CIG-IDRD-CEFE-040-2024 Revisión hojas de vida No.2 y No.3 y aceptación del personal del contratista de obra	32 folios	CONSORC+H+H48:O4843:O43 O GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-046-2024	27/2/2024	Sin registro	Actualización del Certificado de predicción de servicio de gas emitido por Vanti para el Centro de Alto Rendimiento.	2 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[redacted]	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-054-2024	27/2/2024	[redacted]	RESPUESTA OFICIO CIG-IDRD-CEFE-033-2024 Plan de gestión del riesgo.	81 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[redacted]	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3703-E0056-2023	28/02/2024	Sin registro	RESPUESTA OFICIO CIG-IDRD-CEFE-030-2024 Plan de Manejo Ambiental.	La cantidad de folios no coincide con los anexos	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0057-2023	28/02/2024	Sin registro	ALCANCE OFICIO IDRD-3203-E055-2023 Revisión hojas de vida	8 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0058-2023	28/02/2024	[redacted]	Remisión programación fase 01 Pre obra.	La cantidad de folios no coincide con los anexos	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0059-2023	1/03/2024	[redacted]	Alcance oficio IDRD-3203-E050-2023 Cambio de cimentación.	La cantidad de folios no coincide con los anexos	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0060-2023	1/03/2024	N.A.	POLIZA 400052893 NACIONAL DE SEGUROS S.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	N.A.	N.A.	DANIEL LONDOÑO	N.A.	DANIEL LONDOÑO
ENVIADO	IDRD-3703-E0061-2023	1/03/2024	[redacted]	PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN PG-RCD v2.	La cantidad de folios no coincide con los anexos	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	ICOP LTDA.	N.A.	ICOP LTDA.
ENVIADO	IDRD-3703-E0062-2023	1/03/2024	[redacted]	PLAN DE CONTINGENCIA v2.	La cantidad de folios no coincide con los anexos	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-050-2024	5/3/2024	[redacted]	Revisión No. 1 Programa de Residuos de Construcción y Demolición -RDC- respuesta comunicado IDRD-3203-E061-2023.	59 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[redacted]	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3703-E0063-2023	4/03/2024	[redacted]	Ubicación cámaras time lapse.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0064-2023	4/03/2024	[redacted]	Remisión ajuste programación fase 02 obra.	La cantidad de folios no coincide con los anexos	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0065-2023	4/03/2024	[redacted]	Remisión revisión componente hidrosanitario y gas	La cantidad de folios no coincide con los anexos	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-051-2024	5/3/2024	[redacted]	Consideraciones y recomendaciones del Especialista Estructural de la Interventoría respecto al cambio de cimentación - respuesto Oficio IDRD-3203-E050-2023.	6 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[redacted]	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-052-2024	05 de marzo de 2024	[redacted]	Remisión Manual de uso Marca – Bogotá.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[redacted]	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD REMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		NOMBRE DEL RESPONSABLE DE
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-054-2024	05 de marzo de 2024	Recibido en el radicado	Revisión No. 1 IDRD-3203-E020-2023- Informe de revisión estructural.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-055-2024	06 de marzo de 2024	Recibido en el radicado	Revisión No. 2 Plan de Gestión del Riesgo – respuesta comunicado IDRD-3203-E054-2023.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
ENVIADO	IDSD-3203-E0066-2023	7/03/2024	Sin registro	Remisión PAC	1 folio	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-053-2024	08 de marzo de 2024	Recibido en el radicado	ón hojas de vida No.2 y No.3 y aceptación del pe	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-056-2024	08 de marzo de 2024	Recibido en el radicado	ad – respuesta comunicado IDRD-3203-E0053-202	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-057-2024	8 de marzo de 2024	Recibido en el radicado	actualizadas contrato de obra: IDRD-3203- -2023C	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodriguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0068-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Alcaldía Local de Bosa	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Alcaldía Local de Bosa	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0069-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Personería Local de Bosa	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Personería Local de Bosa	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0070-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Junta Administradora Local de Bosa	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Junta Administradora Local de Bosa	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0071-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Gerencia Local de Bosa	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Gerencia Local de Bosa	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0072-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Estación 7ma de Policía de Bosa	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Estación 7ma de Policía de Bosa	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0073-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Estación de Bomberos de Bosa	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Estación de Bomberos de Bosa	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0074-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Alcaldía Local de Kennedy	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Alcaldía Local de Kennedy	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0075-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Personería Local de Kennedy	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Personería Local de Kennedy	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0076-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Junta Administradora Local de Kennedy	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Junta Administradora Local de Kennedy	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0077-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Gerencia Local de Kennedy	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Gerencia Local de Kennedy	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0078-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Estación de Policía de Kennedy	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Estación de Policía de Kennedy	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0079-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Estación de Bomberos de Kennedy	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Estación de Bomberos de Kennedy	N.A.	N.A.

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD PEMTENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN ESCRIBE		FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
ENVIADO	IDRD-3203-E0080-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Secretaria para la Integración Social	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	Secretaria para la Integración Social	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0081-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	IDRD-SUBDIRECCION DE PARQUES	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	IDRD-SUBDIRECCION DE PARQUES	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0082-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	IDRD-SUBDIRECCION TÉCNICA	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	IDRD-SUBDIRECCION TÉCNICA	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0083-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Secretaria de Planeación Distrital	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	Secretaria de Planeación Distrital	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD 3203-E0084-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0085-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0086-2023	8/03/2024	Sin registro	Invitación reunión social	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	ENTIDADES LOCALES PENDIENTE DETALLAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0087-2023	10/03/2024	Sin registro	Radicación solicitud certificación disponibilidad de servicio Vanti.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CG-IDRD-CEE(-059-2024	11 de marzo de 2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Revisión No. 2 - Programación de obra (fase 2) y flujo de inversión. Respuesta a comunicado: IDRD-3203-E084-2023	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	interventoria@amt.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0057-2023	11/03/2024	[redacted]	Documentos Anticipo	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0088-2023	11/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión Aprobación del COI con la aprobación del PMT.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0089-2023	11/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Concepto técnico cimentación pilotaje	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0090-2023	12/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	SOLICITUD COPIA DE ACTO ADMINISTRATIVO VINCULACIÓN DEL CARGO Y ORDENADOR DEL GASTO IDRD.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0091-2023	12/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Alcance oficio 064 Ajuste programación fase 02.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0092-2023	12/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Ubicación de las cámaras de time lapse	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0093-2023	12/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA DE CIMENTACIÓN CON PILOTES HINCADOS	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD REMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DEPENDENCIA	NOMBRE DE QUIEN EJECUTA		FUNCIONARIO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
ENVIADO	IDRD-3203-E0094-2023	13/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Publicación hojas de vida	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0095-2023	12/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Plan de ejecución EIA V1	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0096-2023	13/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrega Informe gestión N°1 SST – Fase preconstrucción	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0097-2023	13/03/2024	rad No 2024-663-043648-2 fecha: 14/03/2024 9:53:36 am	Invitación reunión de Inicio	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Departamento Nacional de Planeación	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	Departamento Nacional de Planeación	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0098-2023	13/03/2024	rad No 2024-663-043644-2 fecha: 14/03/2024 9:49:02 am	Invitación reunión de Inicio	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Departamento Nacional de Planeación	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	Departamento Nacional de Planeación	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0099-2023	14/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Pagares originales de las polizas del contrato de obra	4 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0100-2023		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0101-2023		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0102-2023	14/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	ACTAS DE VECINDAD.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0103-2023	14/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Alcance al oficio IDRD-3203-E090-2023 Informe SST N°1 preconstrucción Versión 2.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0104-2023	14/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	RESPUESTA A COMUNICADO CIG-IDRD-VEL-058-2024 REVISION APU.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0105-2023	14/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Alcance oficio IDRD-E005-2023 entrega de documentación etapa inicial y CID-IDRD-CEFE-022-2024 entrega de documentación etapa inicial.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0106-2023	14/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión plan de manejo de fauna	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0107-2023	15/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrega Informe forestal No. 1	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0108-2023	15/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Alcance oficio IDRD-3203-E094-2023 proceso de valoración y aprobación hojas de vida	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0109-2023	15/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Contrato de lidución Consorcio Gibraltar.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-070 -2024	15/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Aprobación programación de obra (fase2) y Flujo de inversión del proyecto - Respuesta a comunicado: IDRD-3203-E091-2023	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	ingenieria@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD REMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		RESPONSABLE DE
RECIBIDO	CG-IDRD CEFE-071 - 2024	15/03/2024	RADICADO	Resultado revisión Versión 1 del Plan de Monitoreo de Aguas Subterráneas – respuesta correo electrónico CDRC GIBRALTAR - Plan de Monitoreo	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CG-IDRD-CEFE-088-2024	15/03/2024	RADICADO	Radicación Plan de Ejecución BIM PEB/BEP en su segunda versión.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0110	18/03/2024	RADICADO	PROGRAMA DE DOCUMENTOS ENTREGABLES FASE I.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0110A-2023	15/03/2024		Remisión plan de gestión de riesgo de desastres v3	158 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0112	18/03/2024	RADICADO	actualización de polizas	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0113	18/03/2024	RADICADO	Alcance oficio IDRD--3203-E0108-2023 hojas de vida: hidrogeologo y el ing informatico y de telecomunicaciones	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0114	18/03/2024	RADICADO	Documentos de soporte trámite: Registro Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0115	18/03/2024	RADICADO	ENTREGA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0116		RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0117		RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0118	18/03/2024	RADICADO	remitión informe social # 1 mes de febrero	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0119	18/03/2024	RADICADO	Alcance oficio IDRD--3203-E0110-2023 Remisión plan de gestión de riesgo de desastres v3	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0120		RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0121	19/03/2024	RADICADO	PROGRAMACION APROBADA EN FISICO	10 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0122		RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0123	18/03/2024	RADICADO	DISEÑO ESTRUCTURAL DEFINITIVO PARA ALTERNATIVA PILOTES HINCADOS.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0124	19/03/2024	RADICADO	PLAN DE CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACIÓN/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD REMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-090 -2024	19/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión Aprobación del CDI con la aprobación del PMT - IDRD-3203-E088.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@gmr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-092 -2024	19/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Revisión hojas de vida No. 5 y aceptación del personal del contratista de obra No. 4.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@gmr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-093 -2024	19/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Aprenda subsanación a observaciones y lista de chequeo al Plan SG-SST para entrega, para su conocimiento y fines pertinentes.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@gmr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-094 -2024	19/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remision programación	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@gmr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-095 -2024	19/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	SOLICITUD Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA DE CIMENTACIÓN CON PILOTES HINCADOS	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@gmr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-096 -2024	19/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión de las garantías contractuales del Consorcio Gibraltar de cumplimiento estatal No 400052682 y responsabilidad civil Consorcio No.400052684 actualizadas a firma de acta de	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@gmr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-097 -2024	19/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Aprobación Informe social No.1 V1– Centro de Alto Rendimiento	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@gmr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-098 -2024	19/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	APROBACION PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Vr2	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@gmr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-099-2024	19/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Revisión No. 3 Plan de Gestión del Riesgo – respuesta comunicada IDRD–3203-E0119-2023	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@gmr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-100-2024	20/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	A Entidad Autorización modelos Revit Consultoría diseños	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@gmr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-101-2024	20/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	A Entidad Informe Interventoría Rev. Hidrosanitaria y gas	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@gmr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-102-2024	20/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	A Entidad Solicitud diseño de sistemas de drenaje sostenible SUDS	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@gmr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0126	20/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-093-2024 Aprenda subsanación a observaciones y lista de chequeo al Plan SG-SST para entrega	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0127	20/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrega de Análisis de Precios Unitarios de Actividades No Previstas.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0128	21/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión en físico hojas de vida aprobadas	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0129	21/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión en físico plan de inversión del anticipo	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0125	22/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Solicitud de suspensión del contrato de obra No. IDRD-CTO-3203-2023.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0130	22/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remitón en físico documentos valla	68 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0131	22/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remitón Plan de Construcción y Logístico	97 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD REMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FUNCIONARIO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO
ENVIADO	IDRD-3703-E0132	21/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión plan de manejo de tránsito	44 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0133	21/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrego de Plan de Monitoreo Agua Subterránea.	54 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0134		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-104-2024	21/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión radicado Vorti	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-105-2024	21/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Aprobación Plan de Construcción y Coordinación Logística. Respuesta v	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-106-2024	21/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Revisión No. 1 Informe mensual Forestal – Febrero Vr.2 y Ficha del componente Forestal Vr.1.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-107-2024	21/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Solicitud Implementación PAT	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-108-2024	21/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Revisión HV No 7 y aceptación personal contratista No. 5	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-109-2024	21/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Revisión No. 1 Opción Pilotes Hincados	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-110-2024	21/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Observaciones a la versión 0 Informe Mensual No, 1 Fauna.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3703-E0135	22/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	ACTIVIDADES ADICIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0136	22/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Aclaración de especificación ítem. 1.7.4 CERRAMIENTO LÁMINA TRAPEZOIDAL CAL.24 (TUBO RECT+LÁMIN.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0137	22/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	DISEÑO ESTRUCTURAL DEFINITIVO PARA ALTERNATIVA PILOTES HINCADOS.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3703-E0138		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-111-2024	22/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	SOLICITUD Y JUSTIFICACION TECNICA PARA LA EJECUCION DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA DE CIMENTACION CON PILOTES HINCADOS.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-112-2024	22/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrego hojas de vida del personal clave del contratista aprobadas por la interventoría	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-113-2024	22/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO aprobado	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-114-2024	22/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión plan de construcción y coordinación logística aprobado	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-115-2024	22/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión físico Plan de Manejo de Tránsito Aprobado	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez	gerencia@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñoz Rodríguez

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD REMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-116-2024	22/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión físico documentación Valla	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-117-2024	22/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Revisión Apéndice Paisajístico, Respuesta comunicado IDRD-3203-E052-2023	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-120-2024	25/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Observaciones al plan de contingencia	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0139	26/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PROVISIONAL DE OBRA TPO EAAB.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-118-2024	26/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Observaciones IEP V2 - CAR	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-119-2024	26/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Solicitud documentos para tramite de provisional de obra (TPO) ante EAAB	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-121-2024	26/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Notificación aprobación Plan de Calidad	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-122-2024	26/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Observaciones al Plan de Monitoreo de Agua Subterráneo. Respuesta IDRD-3203-E133-2023	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-123-2024	26/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión informe correspondiente a la revisión del INFORME DE INSTALACIONES MECÁNICAS DE AIRE ACONDICIONADO. Respuesta oficio IDRD-3203-E0023-2023.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0140	27/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	SOLICITUD DE CONTINUACION DEL CICLO DE VIDA MODELOS BIM	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0141	27/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Solicitud manejo de raederas	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Secretaría Distrital de Salud	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Secretaría Distrital de Salud	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0142	27/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Respuesta a Comunicado CIG-IDRD-CEFE-122-2024 Observaciones Plan De Monitoreo.	58 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0143	27/03/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Respuesta oficio CIG-IDRD-CEFE-071-2024. Observaciones plan de ejecución BIM.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-125-2024	27/03/24	PENDIENTE DE # RADICADO	RESPUESTA A SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3203-2023. Oficio IDRD-3203-E125-2023 de 22 de marzo de 2024.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0144	1/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	APU'S INSTALACIONES ELECTRICAS	68 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0145	1/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	PLAN DE MANEJO DE FAUNA	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriagibralta	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-126-2024	1/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Ratificación solicitud constructor responsable CAR	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-127-2024	1/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Revisión No. 3- Análisis de precios unitarios. Respuesta a comunicado: IDRD-3203-E104-2023	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-128-2024	1/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Respuesta comunicado IDRD-3203-E143-2023. Observaciones al Plan de Monitoreal Hidrologico.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-129-2025	1/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Observaciones Plan de Ejecución BIM PEB/IEP en su tercera versión, Respuesta oficio IDRD-3203-E043-2023 Plan de ejecución BIM V3.	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	gerencia@amr.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez

SG

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD EMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		RESPONSABLE DE
ENVIADO	IDRD-3203-E0145	2/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	IDRD-3203-E145-2023 respuesta a comunicado de reiteracion de nuevo constructor responsable	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-139-2024	2/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Solicitud consolidado Documentos Entregables Componente Forestal y Fauna	n folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez	[illegible] g	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR Arq. Alfredo Muñóz Rodríguez
ENVIADO	IDRD-3203-E0147	2/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	[illegible]	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0148	2/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Diseños y Detalles Estructurales Faltantes de Cimentación Para Áreas de Urbanismo,	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0149	2/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Respuesta Observaciones Plan de Ejecución BIM PEB/BEP V.3	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0150	2/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrega plan de calidad físico y digital	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0151	2/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrega de Plan de gestión SST V3	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0152	2/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Atención de observaciones informe gestión SST Nº1,	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0153	2/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Plan de manejo ambiental V-4	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0154	2/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	PLAN DE CONTINGENCIA v2	4 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0155	2/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Documentos para el registro Bogotá construcción sostenible.	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0156	2/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Respuesta al ORCIO CIG-IDRD-CEFE-128-2024 Observaciones al Plan de Monitoreo de Agua Subterráneo. Respuesta IDRD-3203-E143-2023.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0157	3/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Respuesta IDRD-CEFE-130-2024 Entregables componente fauna y flora	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0158	3/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrega de informe ambiental mes de marzo	6 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0159	3/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrega de programa de manejo ambiental de RCD	7 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0160	3/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrega plan de gestión del riesgo	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0161	4/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrega del informe mensual de marzo componente forestal	1 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0162	4/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrega informe mensual No. 7 de fauna	7 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0163		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0164	4/04/2024	[illegible]	Rem físicos y en original de los actos de vecindad inicio	87 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Alcaldía Local de Bosa	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	Alcaldía Local de Bosa	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0165	4/04/2024	[illegible]	Rem físicos y en original de los actos de vecindad inicio	87 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Alcaldía Local de Kennedy	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	Alcaldía Local de Kennedy	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-132-2024	4/04/2024	RADICADO IDRD [illegible]	Remisión ratificación observaciones componente arquitectónico CAE	OBSERVACIONES INFORME DE ARQUITECTURA (74 Folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	correcta@amv.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-134-2024	4/04/2024		Alcance oficio CIG-IDRD-CEFE-100-2024. Autorización modelos Revit consultoría de diseños	Oficio IDRD—3203-E0140-2023 (2 Folios)Oficio IDRD-CEFE-100-2024 (2 Folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	correcta@amv.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-136-2024	4/04/2024		Aprobación Plan de Ejecución BIM PEB/BEP en su versión 3.1. Respuesta oficio IDRD-3203-E0149-2023.	LISTA_DE_CHEQUEO_DOCUMENTAL - BIM CAR (2 Folios) 01-PLAN-DE-EJECUCION-BIM CAR V 3.1 (53 folios) OFICIO IDRD-3203-E0148-2023 (1 folio)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	correcta@amv.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-137-2024	4/04/2024		Revisión Análisis de precios Unitarios	Comparativo APU'S (excel)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo	correcta@amv.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-139-2024	4/04/2024		Solicitud entrega Plan de Contingencia	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo	correcta@amv.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0167	4/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	hoja de vida ingeniero informático	10 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0169	4/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrega del acta de vecindad subestación Chicalá ENEL	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	ENEL Colombia	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	ENEL Colombia	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0171	4/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	rem Plan de monitoreo de aguas subterraneas	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0166	5/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Plan de ejecución BIM radicado en físico y digital	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0168	5/04/2024	RADICADO IDRD [illegible]	entrega de APU'S contractuales	969 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0170	5/04/2024	RADICADO IDRD [illegible]	Entrega de las actas de vecindad inicio	87 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0172	5/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remision Informe No. 1 Componente de calidad	79 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0173	5/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Atención de observ. Del Plan de Contingencia CIG-IDRD-CEFE-139-2024	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0175	5/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Rta Rev APU'S Contractuales CIG IDRD CEFE-137-2024	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	interventoriaibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-131-2024	5/04/2024		Alcance al comunicado CIG-IDRD-CEFE-103-2024 - Solicitud y justificación técnica, ambiental y económico para la ejecución de la segunda alternativa de cimentación con pilotes hincados.	Oficio IDRD—3203-E0130-2023 (4 Folios) Oficio IDRD—3203-E093-2023 (23 Folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD ING. OSCAR RICARDO TAMAYO - Profesional	correcta@amv.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-138-2024	5/04/2024		Anulación Plan de Ejecución BIM V1. Alcance oficio IDRD-CEFE-088-2024.	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	correcta@amv.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-140-2024	5/04/2024		Remisión Informe Mensual de Obra No. 1 Componente de Calidad	Informe de Calidad No. 1 (77 folios) 1 CD	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	correcta@amv.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD PERTENECE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRONICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		RESPONSABLE DE
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-141-2024	5/04/2024		A entidad radicado Factibilidad Provisional Electrico	Factibilidad Provisional Electrico	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-142-2024	5/04/2024		Entidad Radicadon REF V3.1 - CAR	2. 01-PLAN-DE-EJECUCION-SIM CAR V	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-143-2024	5/04/2024		Estado entregables componente ambiental CAR	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
ENVIADO	IDRD-3203-E0174	6/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Balance Presupuestal Preliminar	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y	interventoriaibraltar	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-144-2024	8/04/2024		Remisión Plan de Calidad del contratista	TOMO 1 (1-200) Folios TOMO 2 (201-380) Folios (1) CD	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-150-2024	8/04/2024		Solicitud entrega informes mensuales No. 2	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	GIBRALTAR Alfredo	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-147-2024	8/04/2024		A Entidad Solicitud de diseños y detalles estructurales faltantes de cimentación para áreas de urbanismo	DRD-3203-E148-2023 (1 Folio) Gmail - CDRC GIBRALTAR - DISEÑOS Y DETALLES ESTRUCTURALES FALTANTES (2 Folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD ING. OSCAR RICARDO TAMAYO - Profesional Especializado	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-149-2024	8/04/2024		No Inicio de Etapa de Obra - previo cumplimiento obligaciones de la Etapa Inicial	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-152-2024	8/04/2024		Entrega Inicial Territorio y Ubicación del Proyecto del Programa del Monitoreo de Agua	Correo del IDRD + creación del programa de monitoreo de agua	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	GIBRALTAR Alfredo	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-133-2025	10/04/2024		IDRD-CEFE-133-2024 - Remisión aprobado informe forestal No. 1 CAR	Informe Mensual Forestal No. 1 V2 Febrero (1) Folios]	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	GIBRALTAR Alfredo	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-153-2024	10/04/2024		Revisión No. 1 - Plan de manejo de la vegetación Vr. 0. Respuesta comunicado: IDRD-3203-0157-2023	Plan de manejo de la Vegetación V0(03-04-2024) (20 Folios).	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-154-2024	10/04/2024		Acrobación Plan de Manejo de Fauna. Respuesta oficio IDRD-3203-E0146-2023	Plan de Manejo de Fauna Silvestre Gibraltar_V1_01-04-2024 (81 Folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-155-2024	10/04/2024		Radicación observaciones oficio IDRD-CEFE-111-2024 -Revisión diseño estructural para	OFICIO IDRD-CEFE-111-2024 (1 Folio) OFICIO 03-003-2024 Observaciones	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	GIBRALTAR Alfredo	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0176	10/04/2024	Link. https://we.tl/t-ajr comida	Atención de observaciones revisión 3 plan SG-SST	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0177	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Rem Informe Tecnico V-2 marzo	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriaibraltar	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0178	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Rem Informe Calidad V-2 marzo	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriaibraltar	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0179	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Alcaldía Local de Usaquén	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Alcaldía Local de Usaquén	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0180	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Personería Local de Usaquén	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Personería Local de Usaquén	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0181	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Junta Administradora Local de Usaquén	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Junta Administradora Local de Usaquén	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0182	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Gerencia Local de Usaquén	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Gerencia Local de Usaquén	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0183	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Estación 7ma de Policía de Usaquén	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Estación 7ma de Policía de Usaquén	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0184	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Estación de Bomberos de Usaquén	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Estación de Bomberos de Usaquén	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0185	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Alcaldía Local de Kennedy	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Alcaldía Local de Kennedy	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0186	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Personería Local de Kennedy	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Personería Local de Kennedy	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0187	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Junta Administradora Local de Kennedy	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Junta Administradora Local de Kennedy	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0188	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Gerencia Local de Kennedy	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Gerencia Local de Kennedy	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0189	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Estación de Policía de Kennedy	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Estación de Policía de Kennedy	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0190	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Estación de Bomberos de Kennedy	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Estación de Bomberos de Kennedy	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0191	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Secretaría para la Integración Social	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Secretaría para la Integración Social	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0192	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	IDRD-SUBDIRECCION DE PARQUES	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	IDRD-SUBDIRECCION DE PARQUES	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0193	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	IDRD-SUBDIRECCION TÉCNICA	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	IDRD-SUBDIRECCION TÉCNICA	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0194	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Secretaría de Planeación Distrital	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	Secretaría de Planeación Distrital	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0195	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Entrega de Informe de Gestión SST No. 2 Marzo	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0196	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	interventoriaibraltar@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES	N.A.	N.A.

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD EMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN RECIBE		FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
ENVIADO	IDRD-3203-E0197	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Invitación 1er comité de participación ciudadana	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Dpto Nacional de Planeación	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Dpto Nacional de Planeación	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0198	11/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	invitación 1er comité de participación ciudadana	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Dirección de Gestión y Promoción del Sistema General de Regalías	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-156-2024	11/04/2024		Revisión No. 2 – Registro Fotográfico. Comunicado: IDRD-3203-E161-2023 Anexo del Informe mensual forestal – Marzo.	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-157-2024	11/04/2024		Cota cero Proyecto No. 1 Centro de Alto Rendimiento	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-158-2024	11/04/2024		Requerimiento asistencia Comité de Obra.	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-159-2024	11/04/2024		Radicación observaciones oficio IDRD-CEFE-077-2024 -Revisión Plan de Gestión de Riesgo de [illegible]	IDRD-CEFE-077-2024 (12 FOLIOS) LISTA_DE_CHEQUEO_DOCUMENTAL [illegible]	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-151-2024	12/04/2024		Revisión No. 1 Informe Mensual Forestal de Marzo V10 - Aprobación	Informe No.2 (Marzo2024) V0 (11 folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-160-2024	12/04/2024		A entidad Actas de vecindad Iniciales- CAR - IDRD	90 Folios 17 CD	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y [illegible]	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-161-2024	12/04/2024		Aprobación actas de vecindad Iniciales - CAR	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	[illegible]	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-162-2024	12/04/2024		Notificación Aprobación Plan SG-SST V3. Respuesta oficio IDRD-3203-E176-2023-Atención de observaciones revisión 3 plan SG-SST	Lista de Chequeo Aprobación Contratista PLAN SG-SST CAR- IDRD (5 Folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-163-2024	12/04/2024		Notificación Aprobación Plan Monitoreo Aguas Subterráneas V3. Respuesta oficio IDRD-3203-E0171-2023 Remisión plan de monitoreo de aguas subterráneas.	PMH_C_A_R_V3 (58 folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-164-2024	12/04/2024		Remisión factibilidad No. CD-008331-2024 gas natural VANTI	IDRD-3203-E0203-2023 (1 Folio) CD-008331-2024 ACTUALIZACIÓN (1 Folio)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD [illegible]	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
ENVIADO	IDRD-3203-E0199		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriagibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0200		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriagibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0201		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriagibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0202	12/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	carega soliciudes(cartas) vigencia por un año - serv de gas nat CD- [illegible]	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0204	12/04/2024	RADICADO 12/04/24 4:26 pm	Plan de manejo de fauna	81 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriagibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0205	12/04/2024	RADICADO 12/04/24 4:26 pm	plan de manejo de vegetación	20 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriagibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0206	12/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Rta al oficio CIG-IDRD-CEFE-156-2024 complemento y reg fotográfico	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0207		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	[illegible]	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0208	12/04/2024	RADICADO 12/04/24 4:55 pm	Plan de monitoreo de aguas subterraneas aprobación con el comunicado CIG-IDRD-CEFE-163-2024	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0209	15/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión informe de componente calidad de agua	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR [illegible]	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-165-2024	15/04/2024		Respuesta comunicado IDRD-3203-E167-2023. Hoja de vida Ing. Telecomunicaciones	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	GIBRALTAR Alfredo [illegible]	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-166-2024	15/04/2024		Notificación Aprobación Informe Mensual No. 2 Calidad. Respuesta oficio IDRD-3203-E178-2023.	LISTADECHEQUEOINFORMEINTERVENTORA_COMPONENTECALIDAD MARZO (3 Folios) INF MAR IDRD_COMPLETO (111 Folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-167-2024	15/04/2024		Notificación Aprobación Programa de Manejo Ambiental de RCD.	PMI_Web.file SDA (1 Folio) LISTA DE CHEQUEO DOC_CAR PMA-RCD_2024.08.04 (1 Folio))	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-168-2024	15/04/2024		Solicitud cronograma detallado para actualización de modelo LOD 350.	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo [illegible]	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-169-2024	15/04/2024		Remisión Informe Mensual de Obra No. 2 Componente de Calidad		CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo [illegible]	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-170-2024	15/04/2024	Remitida por correo electronico	Reiteración observaciones oficio CIG-IDRD-CEFE-159-2024 -Revisión Plan de Gestión de Riesgo de Desastres V5	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-171-2024	15/04/2024	Remitida por correo electronico	Observaciones del Plan de Manejo de la Vegetación Vr.1	Plan de manejo de la Vegetación V0(03-04-2024).docx (20 Folios) Plan de manejo de la Vegetación V0(03-04-2024).pdf (20 Folios) Ficha PMA-V5 (15 folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	[illegible]@amr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0210	16/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	RESPUESTA A COMUNICADOS CIG-IDRD-CEFE-111-2024 y CIG-IDRD-CEFE-153-2024 REVISION DE DISEÑO ESTRUCTURAL PARA ALTERNATIVA PILOTES HINCADOS	5 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vesga	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0211	15/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Informe de gestión de SST No 1 V-3	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriagibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0212	15/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Rem Programa de manejo ambiental de RCD	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	[illegible]	interventoriagibralta	N.A.	[illegible]	N.A.	N.A.

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD REMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRONICO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE QUIEN ESCRIBE		FUNCIONARIO RESPONSABLE DE
ENVIADO	IDRD-3203-E0213	16/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Requerimientos para la Implementación BIM Centro De Alto Rendimiento.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0214		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0215	16/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Rta a comunicación CIG-IDRD-CEFE-174-2024 Aprueba radicación física del SG-SST V-4	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0216	16/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Rta a las observaciones del IDRD fichas técnicas de vegetación	60 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0217	16/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Plan de Gestión del Riesgo de Desastres V-5	372 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-172-2024	16/04/2024		Remisión Plan de monitoreo de aguas subterraneas	Subterráneos (181 Folios) (1 CD)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-173-2024	16/04/2024		Remisión Programa de Manejo Ambiental de RCD	TOMO 2 (201-271) (1 CD)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-174-2024	16/04/2024	Remitido por correo electronico	Aprueba Radicacion Plan SG-SST aprobado por Interventoria	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-175-2024	16/04/2024	Remitido por correo electronico	Remisión Justificación técnica, ambiental, jurídica y de costos de la alternativa de pilotes hincados.	Justificación técnica, ambiental, jurídica y de costos de la alternativa de pilotes hincados (17 Folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0218	17/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Rta a comunicación CIG-IDRD-CEFE-165-2024 Hoja de vida el Ing de Telecomunicaciones Rta com IDRD-3203-E167-2023	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-176-2024	17/04/2024	20242100125622	Entrega de análisis de precios unitarios contractuales	1344 Folios en 7 Tomos ICD	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-177-2024	17/04/2024		Remisión Plan SG-SST Aprobado	Plan SG-SST (1395 Folios) 7 CARPETAS (1 CD)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-178-2024	17/04/2024	Remitido por correo electronico	SOLICITUD DE PREGUNTAS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL IDRD AL PLANTEAMIENTO DE PILOTES HINCADOS	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-179-2024	17/04/2024	Remitido por correo electronico	Revisión HV No 8 y aceptación personal contratista No. 6	Personal aprobado No. 6 (comprimido)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-180-2024	17/04/2024	Remitido por correo electronico	Aprobación Informe social 2 V1 - CAR	Informe Mensual Social No. 2 (421 Folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-181-2024	17/04/2024	Remitido por correo electronico	Componente de Fauna	Anexo 1. CAR Informe Final Fauna Silvestre_Febrero_V1_12-03-2024-1 (16	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-182-2024	17/04/2024	Remitido por correo electronico	Remisión radicado de ingreso PEV en la autoridad ambiental, para su conocimiento y fines pertinentes.	20242100069757_00002-2 (2 Folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0220	18/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	ALCANCE A COMUNICADO IDRD-CTO-3203-E203-2023 REVISION DISEÑO ESTRUCTURAL PILOTES HINCADOS	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0221	18/04/2024	RADICADO FISICO [illegible]	radicación en físico y en digital informe de fauna 1	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0222	18/04/2024	RADICADO FISICO [illegible]	radicación en físico y en digital Informe forestal 1 y 2	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0223	18/04/2024	RADICADO FISICO [illegible]	Alcance del comunicado IDRD-E0122-2023 Item Hoja de vida en físico del ingeniero Informatico y de telecomunicaciones	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0224	18/04/2024	RADICADO E[illegible]	Rta comunicado S2024048440 del 22/03/2024 y el comunicado S2024049878 del 27/03/24	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Secretaria para la Integración Social	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Secretaria para la Integración Social	N.A.	N.A.
ENVIADO [illegible]	IDRD-3203-E0225	18/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Solicitud de cambio de cta bancaria para operación del contrato	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-183-2024	18/04/2024	Remitido por correo electronico	Entrega Plan de Manejo de Vegetación V1	Gmail – Archivo comprimido Fichas PMA y PMVegetación (18-04-2024) (7 documentos)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
ENVIADO	IDRD-3203-E0218	19/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión de documentos TPO EAAB	6 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriagibralta	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0226	19/04/2024	RADICADO FISICO [illegible]	Item Informe mensual social No 2 V-1	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriagibralta	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0227	19/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Informe de gestión de SST No 2 V-2	4 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriagibralta	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-185-2024	18/04/2024		Entrega Informe mensual forestal No. 1	Informe mensual No. 1 Forestal 47 Folios 1CD	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-186-2024	19/04/2024	20242100129253	Entrega No. 2 Hoja de vida personal Clave Contratista	Hoja de vida profesional telecomunicaciones (6 folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-187-2024	19/04/2024		Entrega Informe mensual fauna No. 1	Informe mensual Fauna No. 1 (17 folios) 1 CD	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-188-2025	19/04/2024		Entrega Informe mensual forestal No. 2	313 Folios 1 CD	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-189-2025	19/04/2024	Remitido por correo electronico	Remisión cuenta consignación rendimientos recursos regalías – Proyecto 1 CAR	Circular_Externa_012_marzo_23_2023 (1) (1) (2 Folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	CIG-IDRD-CEFE-190-2025	19/04/2024	Remitido por correo electronico	Preaprobación informe mensual ambiental No.1 V1– Centro de Alto Rendimiento	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martínez Vargo	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodríguez	esrencia@amv.com.c o	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0228	22/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Estado entregables registro Bogotá Construcción Sostenible y PMA	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0229	22/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Remisión primer corte de programación	3 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriagibralta	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0230	21/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Rta al comunicado CIG-IDRD-CEFE-139-2024	372 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriagibralta	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0231		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriagibralta	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0232	22/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Envio de formato portal acctred	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	banco de Occidente	interventoriagibralta	N.A.	banco de Occidente	N.A.	N.A.

TIPO DE COMUNICACIÓN	NUMERO DE CONSECUTIVO	FECHA	NUMERO DE RADICACION/ FECHA	ASUNTO	ANEXOS	NOMBRE DE LA ENTIDAD REMITENTE	DIRIGIDO A	CORREO ELECTRÓNICO	DEFECCIÓN	NOMBRES DE QUIEN RECIBE		RESPONSABLE DE
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-191-2025	23/04/2024	Remitido por correo electronico	Respuesta comunicado IDRD-3203-E225-2023. Cambio cuenta bancaria	Oficio y solicitud cambio cuenta bancaria CONSORCIO GIBRALTAR (4	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-192-2025	23/04/2024	Remitido por correo electronico	Respuesta comunicado IDRD-3203-E211-2023. Aprobación Informe SST No. 1 V3	INFORME PRECONSTRUCCION SST Nº 1 Gibraltar V3 (29 folios)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-193-2025	23/04/2024		Entrega físico de CD con información del modelo hidráulico de consultoría No. 1 02-35300-	1 CD	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-194-2025	23/04/2024	Remitido por correo electronico	Respuesta al oficio IDRD-3203-E0213-2015 "Requerimientos para la Implementación BIM Centro De Alto Rendimiento".	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-195-2025	23/04/2024	Remitido por correo electronico	Respuesta a oficio IDRD-3203-E0228-2023, estado entregables registro bogotá Construcción Sostenible y Plan de Manejo Ambiental.	N/A	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0233	24/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	RESPUESTA A OBSERVACIONES INFORME MENSUAL TECNICO No 1	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0234	24/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	ENTREGA DE PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES V5.1.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-184-2024	24/04/2024		Observaciones Plan de Manejo de Fauna		CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-196-2025	24/04/2024		Observaciones Plan de Manejo de Vegetación	Archivo comprimido Fichas PMA y PMVegetación (18-04-2024) (7 documentos)	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo Muñoz Rodriguez	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0235	25/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	ALCANCE A COMUNICADO IDRD-3203-E220-2023 DEL 18 DE ABRIL DE 2024.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0236	25/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	entrega informe SST No 1 V-3	342 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriagibralta	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0237		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriagibralta	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0238	26/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Respuesta radicado IDRD-CEFE-184-2024 del 18-04-2024 de asunto: Observaciones Plan de Manejo de Fauna.	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez Vesga	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR Arq. Andrés Martinez	N.A.	N.A.
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-198-2025	26/04/2024		Remisión informe social No. 1	(21) Folios Un (1) CD	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-199-2025	26/04/2024		Remision Informe SST No. 1	2 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	CONSORCIO GIBRALTAR
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-200-2025	26/04/2024	Remitido por correo electronico	Solicitud entrega plan detallado de inversión del anticipo	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0239		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriagibralta	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0240	29/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Solicitud estado de percepción de olores ofensivos Parque el Parvenir (Gibraltar)	1 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	Secretaria Distrital de Salud	interventoriagibralta r@gmail.com	N.A.	Secretaria Distrital de Salud	N.A.	N.A.
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-201-2025	29/04/2024		Solicitud entrega informe semanal de avance de ejecución.	2 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-202-2025	29/04/2024		Observaciones informe tecnico No. 2	2 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0241		PENDIENTE DE # RADICADO	pendiente de subsanar en la correspondencia	n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriagibralta	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0242	30/04/2024	PENDIENTE DE # RADICADO	Actual cronograma de Talas	2 folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriagibralta	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
ENVIADO	IDRD-3203-E0243		PENDIENTE DE # RADICADO		n folios	CONSORCIO GIBRALTAR	CONSORCIO	interventoriagibralta	N.A.	CONSORCIO	N.A.	N.A.
RECIBIDO	OG-IDRD-CEFE-203-2025	30/04/2024		Aprobación informe Fauna, Respuesta IDRD-3203-E0163-2023 informe mensual fauna 2	2 folios	CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	CONSORCIO GIBRALTAR Alfredo	gerencia@gmr.com.co	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ANEXO 3

LISTADO DE REGISTROS

BOGOTÁ	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	
FO-GC-02	10/01/2024	V1

FECHA DE ACTUALIZACION: 30/04/2024

CAR GIBRALTAR								
TIPO (INT / EXT)	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL/FISICO	NIVEL DE ACCESO	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL
EXTERNO	N/A	ACTA DE COMTÉ REUNIÓN	DIRECTOR DE OBRA	OFICINA	FISICO	RESTRINGIDO	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
EXTERNO	N/A	LISTADO DE ASISTENCIA REGISTRO DE DIVULGACIÓN	DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD	OFICINA	FISICO	RESTRINGIDO	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
INTERNO	FO-GC-01	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD	OFICINA/ P.CALIDAD	DIGITAL	GENERAL	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
INTERNO	FO-GC-02	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	PROFESIONAL DE CALIDAD	OFICINA/ P.CALIDAD	DIGITAL	GENERAL	2 AÑOS	DESTRUIR
INTERNO	N/A	CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DE APENDICE FORESTAL	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
INTERNO	N/A	INFORME DE REVISION ESTRUCTURAL	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
INTERNO	N/A	INFORME DE REVISION ELECTRICO	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DE REVISION INSTALACIONES MECÁNICAS - AIRE ACONDICIONADO	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DE REVISION DE ARQUITECTURA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y CONTROL	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DEL COMPONENTE DE VOZ Y DATOS	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DE GEOTECNIA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DEL APENDICE PAISAJISTICO	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	VALLA DE OBRA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	APENDICE HIDROSANITARIO REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	PLAN DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	DOCUMENTOS TPO EAAB	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORMES DE FAUNA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORMES DE FORESTAL	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO

ANEXO 3

LISTADO DE REGISTROS

54

BOGOTÁ	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	
FO-GC-02	10/01/2024	V1

FECHA DE ACTUALIZACION: 30/04/2024

CAR GIBRALTAR								
TIPO (INT / EXT)	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL/FISICO	NIVEL DE ACCESO	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL
EXTERNO	N/A	ACTA DE COMTÉ REUNIÓN	DIRECTOR DE OBRA	OFICINA	FISICO	RESTRINGIDO	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
EXTERNO	N/A	LISTADO DE ASISTENCIA REGISTRO DE DIVULGACIÓN	DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD	OFICINA	FISICO	RESTRINGIDO	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
INTERNO	FO-GC-01	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	DIRECTOR DE OBRA Y PROFESIONAL DE CALIDAD	OFICINA/ P.CALIDAD	DIGITAL	GENERAL	2 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
INTERNO	FO-GC-02	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	PROFESIONAL DE CALIDAD	OFICINA/ P.CALIDAD	DIGITAL	GENERAL	2 AÑOS	DESTRUIR
INTERNO	N/A	CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DE APENDICE FORESTAL	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
INTERNO	N/A	INFORME DE REVISION ESTRUCTURAL	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO MUERTO
INTERNO	N/A	INFORME DE REVISION ELECTRICO	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DE REVISION INSTALACIONES MECÁNICAS - AIRE ACONDICIONADO	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DE REVISION DE ARQUITECTURA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y CONTROL	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DEL COMPONENTE DE VOZ Y DATOS	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DE GEOTECNIA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORME DEL APENDICE PAISAJISTICO	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	VALLA DE OBRA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	APENDICE HIDROSANITARIO REDES DE SERVICIOS PUBLICOS	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	PLAN DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	DOCUMENTOS TPO EAAB	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORMES DE FAUNA	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORMES DE FORESTAL	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO

TIPO (INT / EXT)	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	RESPONSABLE	LUGAR DE ALMACENAMIENTO	MEDIO DE ALMACENAMIENTO DIGITAL/FISICO	NIVEL DE ACCESO	TIEMPO DE RETENCIÓN	DISPOSICIÓN FINAL
INTERNO	N/A	INFORMES DE COMPONENTE CALIDAD	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORMES COMPONENTE SST	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORMES COMPONENTE AMBIENTAL	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORMES TECNICOS	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	INFORMES DE COMPONENTE SOCIAL	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	DOCUMENTOS BOGOTA CONSTRUCCION SOSTENIBLE	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
INTERNO	N/A	ACTAS DE VECINDAD	COORDINADOR DEL PROYECTO	OFICINA	FISICO Y DIGITAL	RESTRINGIDO	20 AÑOS	ARCHIVO ACTIVO
	Nota: CONSORCIO UTILIZA LOS FORMATOS DISPUESTOS POR EL IDRD APLICABLES AL PROYECTO							

ELABORÓ: ING. CAROLINA SANCHEZ LEÓN

ANEXO 4

LISTADO MAESTRO DE INFORMACION DOCUMENTADA

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	CONSORCIO GIBRALTAR
FO-GC-01	10/01/2024	V1

FECHA DE ACTUALIZACIO: 30/04/2024

CAR GIBRALTAR					
TIPO (INT / EXT)	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE
INTERNO	PL-GC-01	PLAN DE CALIDAD	3	26/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	PLA-SST-004	PLAN - SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	12/04/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	4	30/04/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE CONTINGENCIA AMBIENTAL	4	30/04/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	4	18/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	5	30/04/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	2	23/02/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	PMT-CAR	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	2	16/02/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	2	20/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-08	PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE MONITOREO HIDROGEOLOGICO	1	13/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE CONSTRUCCION Y COORDINACION LOGISTICA	1	19/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	PLAN-DE-EJECUCION-BIM CAR	PLAN DE EJECUCION BIM	2	27/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	N/A	PLAN DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS	2	5/04/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-01	MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-03	MATRIZ LEGAL TÉCNICA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-04	MATRIZ LEGAL SST	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-05	MATRIZ LEGAL AMBIENTAL	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-06	MATRIZ LEGAL SOCIAL	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-10	MATRIZ DE PRESERVACION DE MATERIALES	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-11	MATRIZ DE PRESERVACION DE LA OBRA EJECUTADA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	IN-GC-07	INFORME MENSUAL	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	OT-GC-09	METODOLOGIA DE CONSTRUCCION	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	PR-GC-01	PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	PR-GC-02	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	CONSORCIO GIBRALTAR
FO-GC-01	10/01/2024	V1

FECHA DE ACTUALIZACIO: 30/04/2024

CAR GIBRALTAR					
TIPO (INT / EXT)	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE
INTERNO	PR-GC-03	PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES "PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE"	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	PR-GC-04	PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE MATERIALES	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	PR-GC-05	PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE SALIDAS NO CONFORMES "NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	PR-MC-01	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-01	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-02	LISTADO MAESTRO DE REGISTROS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-03	SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-04	REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-05	TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-06	MODIFICACIONES, AJUSTES Y COMPLEMENTOS A LOS DISEÑOS: "MATRIZ DE CONTROL DE CAMBIOS DE DISEÑO"	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-07	MATRIZ DE SALIDAS NO CONFORMES	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-08	ENCUESTA DE SATISFACCIÓN	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-09	LISTADO MAESTRO DE PLANOS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-12	LIBERACION DE TOPOGRAFIA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-13	LIBERACION	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-14	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA /RECIBIDA	2	30/04/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-GC-15	CONTROL DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA	1	15/03/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-MC-01	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-MC-02	PROGRAMA DE AUDITORIAS	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
INTERNO	FO-MC-03	PLAN DE AUDITORIA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	CONSORCIO GIBRALTAR
FO-GC-01	10/01/2024	V1

FECHA DE ACTUALIZACIO: 30/04/2024

CAR GIBRALTAR					
TIPO (INT / EXT)	CÓDIGO	NOMBRE	VERSIÓN	FECHA	FUENTE
INTERNO	FO-MC-04	INFORME DE AUDITORÍA	1	10/01/2024	CONSORCIO GIBRALTAR
EXTERNO	N/A	NTC ISO 9001	2015	23/09/2015	ICONTEC
EXTERNO	N/A	CONTROL DE CAMBIOS AL PROYECTO	1	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	CONTROL DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	1	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	ACTA DE COMTÉ REUNIÓN	2	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	LISTADO DE ASISTENCIA REGISTRO DE DIVULGACIÓN	4	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	CONTROL DE CAMBIOS AL PROYECTO	1	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	REVISION Y VERIFICACIÓN DISEÑO HIDROSANITARIO CONSULTORA_v1	4	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	FICHA TÉCNICA PROCESOS DE OBRA O CONSULTORIA_v1	1	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	REGISTRO Y CONTROL DEL PRODUCTO Y O SERVICIO NO CONFORME	3	N/A	IDRD
EXTERNO	N/A	MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RIESGOS EN PROCESOS CONTRACTUALES	3	N/A	IDRD
	Nota: CONSORCIO UTILIZA LOS FORMATOS DISPUESTOS POR EL IDRD APLICABLES AL PROYECTO				

ELABORADO POR: ING. CAROLINA SANCHEZ LEON


ANEXO 5

REGISTRO FOTOGRAFICO


BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 REGISTRO FOTOGRAFICO	CONSORCIO GIBRALTAR
FO-CN-05	23/04/2024	V1



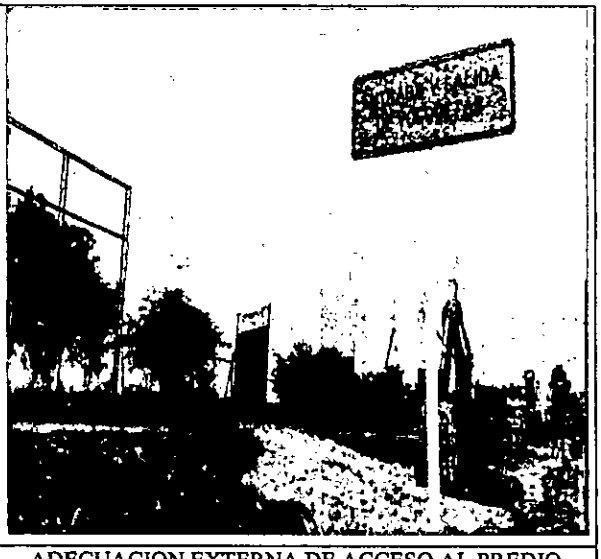
INSTALACION DE SEÑALIZACION PREVENTIVA AJUSTADO A LO PROPUESTO EN EL PMT



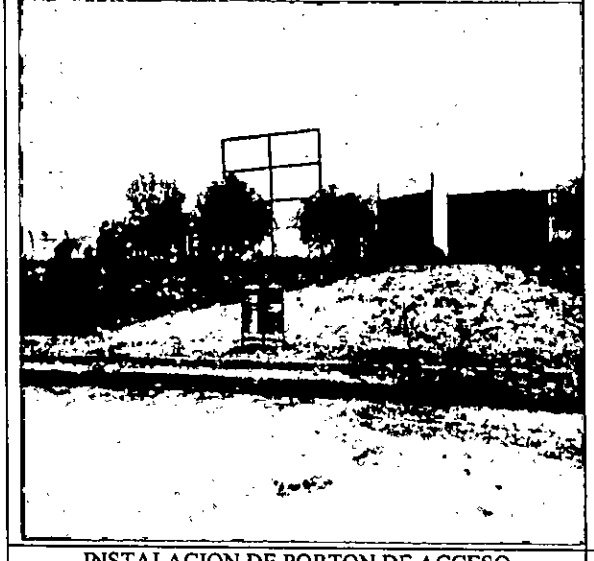ADECUACION EXTERNA DE ACCESO AL PREDIO PARQUE GIBRALTAR





INSTALACION DE PORTON DE ACCESO

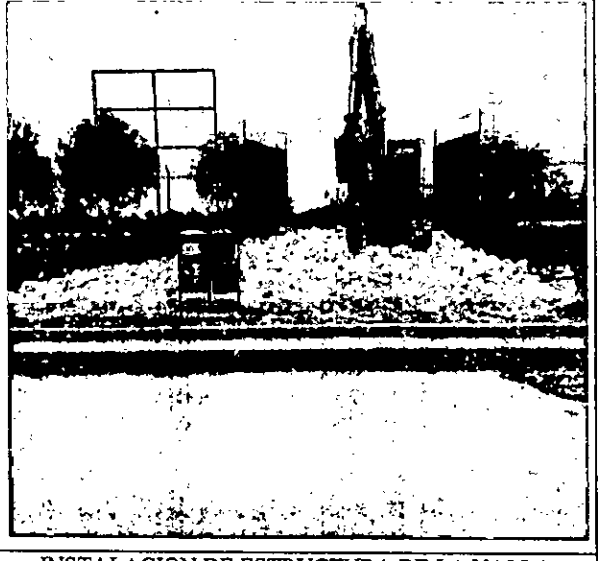

INSTALACION DE ESTRUCTURA DE LA VALLA

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 REGISTRO FOTOGRAFICO	CONSORCIO GIBRALTAR
FO-CN-05	23/04/2024	V1

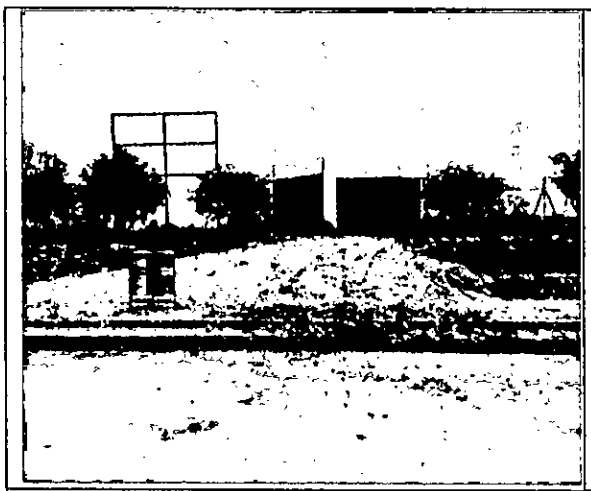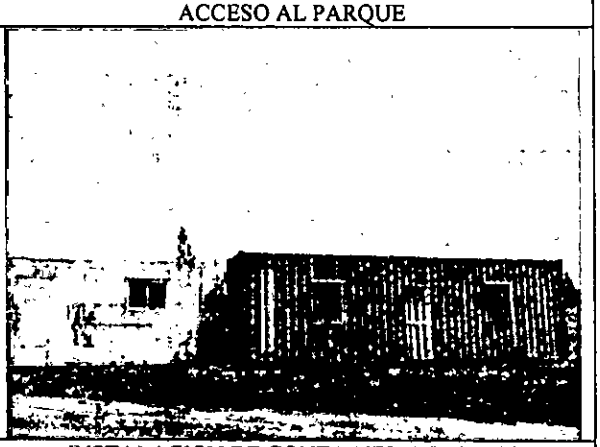	
VISTA DE INGRESO Y ADECUACION EXTERNA DEL ACCESO CON MATERIAL GRANULAR	VISTA DEL PORTON INSTALADO EN EL AREA DE ACCESO AL PARQUE
	
INSTALACION DE CONTAINER DE 40 PIES	INSTALACION DE CONTAINER DE 40 PIES

ANEXO 6

ACCIONES CORRECTIVAS

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 MATRIZ SALIDAS NO CONFORMES	CONSORCIO GIBRALTAR 4
FO-GC-07	10/01/2024	V1

#	COMPONENTE / ESPECIALIDAD	ID	CAUSA REPORTE LA SALIDA NO CONFORME	FECHA DE REPORTE	PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA SALIDA NO CONFORME	REQUISITO INCUMPLIDO	CORRECCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES	RESPONSABLE	RECURSOS	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	ESTATUS DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS	FECHA DE CIERRE
1	TECNICO/ AMBIENTAL	1	PROF. DE CALIDAD	30/04/2024	CONSTRUCCION	El proyecto de construcción del CAR debería haber iniciado dos meses después de superada la fase 1 de apropiación de los estudios y diseños de consultoría y un mes después los productos no se encuentran avalados para tal fin, por lo tanto los indicadores correspondientes al primer mes de construcción no se lograron los de presupuesto y entrega de productos, por ende el balance de los mismos en cuanto a la eficacia.	9.evaluación del desempeño 9.1.3 Análisis y evaluación literal d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz	1. Mesas de trabajo con el equipo interdisciplinario para gestionar los prod faltantes. 2. Ajustar la programación de obra para recuperar el mes y las activ programadas en el 2do mes de construcción	mayo de 2024	Director de Obra Ing de Presupuestos Ing(s) componente ambiental	Aprobación de los productos faltantes PMA Plan de Contingencia amb Plan de Gestión del Riesgo de Desastres.	IDRD -Interventoría - Contratista Consorcio Gibraltar (Director de Obra)	pendiente	pendiente

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO**	CONSORCIO GIBRALTAR
FO-MC-01	10/01/2024	V1

SOLICITUD No.	0	1

TIPO DE ACCIÓN: CORRECTIVA [X] MEJORA [ ]

ORIGEN:

AUDITORÍA INTERNA	[ ]	AUDITORÍA EXTERNA	[ ]	QUEJAS Y RECLAMOS	[ ]
PETICIONES	[ ]	SALIDA NO CONFORME	[ ]	TENDENCIA DEL SECTOR	[ ]
OTRO:	[X]	Cuál: Falta de logro de los indicadores de gestión			

FECHA: 30 de abril de 2024

PROCESO: CONSTRUCCION / COMPONENTE AMBIENTAL

RESPONSABLE: DIRECTOR DE OBRA / ING STEVE MORENO ORTIZ

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
(5 w 2 h: Qué, Quién, Cómo, Cuándo, Cuánto, Dónde, Para qué)

Se evidencia que el Índice de seguimiento de GANT, cumplimiento de actividades y/o obras ejecutadas, según lo planificado. Curva S, el Índice de valor ganado, Índice de Cumplimiento de entrega de productos por componente y por ende el Índice de mejora continua no se logra, debido a que a la fecha y según comunicado CIG- IDRD-CEFE-149-2024 del 9 de abril de2024 no se autoriza por parte de la interventoría y la entidad el inicio de actividades de la etapa constructiva hasta que se encuentren aprobados y radicados en la SDA del distrito los planes PMA, PGRD y PCA, esto genera que para la fecha ya se cuenta con un mes de atraso en el inicio de actividades como son la tala de árboles, las excavaciones preliminares y el cerramiento en teja parte de otras actividades de preliminares sin ejecución, por lo tanto se genera una no conformidad no imputable al Consorcio Gibraltar por falta de logro de los indicadores planeados y que no lograron su cumplimiento.

CORRECCIÓN (SÓLO APLICA PARA ACCIONES CORRECTIVAS)

1. **Evidenciar en las observaciones de los indicadores porque no se lograron las metas** del Índice de seguimiento de GANT, cumplimiento de actividades y/o obras ejecutadas, según lo planificado. Curva S, el Índice de valor ganado, Índice de Cumplimiento de entrega de productos por componente y por ende el Índice de mejora continua.
2. Ajuste de la programación de la fase 1 y de la fase 2.

3. Mesas de trabajo para obtener prontamente la coordinación y aprobación de los productos: PMA, PGRD y PCA

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (8 m's: Materiales, Método, Moneda, Medio ambiente, Mano de obra, Maquinaria, Medición, Management)
Método: Falta de gestión interdisciplinaria de los profesionales técnicos, con los ambientales y otras partes como la Interventoría y la entidad contratante el IDRD, de tal forma que la coordinación permita unos productos adecuados a atender los riesgos ambientales y de seguridad en caso de que se llegaren a presentar.

PLAN DE ACCIÓN

No.	ACCIONES	RESPONSABLE	Plazo de cumplimiento
1.	**Evidenciar en las observaciones de los indicadores porque no se lograron las metas** del Índice de seguimiento de GANT, cumplimiento de actividades y/o obras ejecutadas, según lo planificado. Curva S, el Índice de valor ganado, Índice de Cumplimiento de entrega de productos por componente y por ende el Índice de mejora continua	Profesional de calidad	Informe de abril
2.	Ajuste de la programación de la fase 1 y de la fase 2.	Director de Obra	Radicación de programación ajustada con plan de recuperación
3.	Mesas de trabajo para obtener prontamente la coordinación y aprobación de los productos: PMA, PGRD y PCA	Profesionales ambientales de obra e interventoría	1ra semana de mayo
4.			
5.			
6.			
7.			

BOGOTÁ Instituto Distrital de Recreación y Deporte	**CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORAMIENTO**	CONSORCIO GIBRALTAR
FO-MC-01	10/01/2024	V1

No.	SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN	FECHA	CUMPLIDA		FECHA NUEVO SEGUIMIENTO
			SI	NO	
1.					
2.					
3.					
4.					

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO:

RESPONSABLE: PROFESIONAL DE CALIDAD

APROBÓ: DIRECTOR DE OBRA FECHA DE CIERRE:

Lista de chequeo

CONSORCIO
GIBRALTAR

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL	CIG-SC-F-006-IDRD REVISIÓN: 0 FECHA: 03/05/2024

COMPONENTE DE CALIDAD
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N.	3203-2023		***Parque:***	***Proyecto 1 - Centro de alto Rendimiento CAR***					
Objeto contractual:	Contratar las obras y actividades complementarias de la manzana del cuidado Centro de Alto Rendimiento el Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy, Bogotá.								
N° Radicado:		IDRD-3203-E0249-2023	**N° Informe: 3**	3	**Versión:**	1	**Revisión**	1	
Revisa:									
Periodo del Informe:	**Del:**	1-abr.-24	**Al**	30-abr.-24	**Fecha Revisión:**	lunes, 6 de mayo de 2024			
Concepto de revisión:									
PRE APROBADO		**APROBADO**			**NO APROBADO**	X			

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN					
Descripción del estado de los contratos (obra e interventoría) Se solicita incluir datos contractuales vigentes: * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prórrogas**, consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)				X	**PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO** ***Fecha de inicio:*** **martes, 6 de febrero de 2024** ***Fecha Final:*** **domingo, 5 de abril de 2026** ***Plazo Actual:*** 26 meses ***Contratista:*** **CONSORCIO GIBRALTAR** ***Interventoría:*** **CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR** En el numeral 1.1 se evidencia la Tabla 1. Generalidades Contrato Constructor y la Tabla 2. Generalidades del Contrato Interventoría
Seguimiento a indicadores de gestión Presentar el porcentaje de avance del periodo. Se debe evidenciar el control a los indicadores de gestión conforme los requisitos contractuales, incluir entre otros: Cumplimiento de cronograma, entrega de productos, ejecución de presupuesto, y demás indicadores propuestos en el plan de calidad. Establecer metas de cumplimiento y plan de acción. Reportar indicadores tanto de interventoría como de contratista de obra.			X		En el Anexo 0 se evidencia la MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN para el periodo del informe, de igual forma se evidencia cuadro de observaciones explicando la medición o no medición de cada indicados. Sin embargo se debe verificar el indicador Índice de oportunidad en la entrega de informes puesto que este aplica para el periodo de medición y en el cuadro se indica que no aplica medición de igual forma verificar el cumplimiento del mismo ya que todos los informes no se están entregando en las fechas establecidas, de igual forma levantar su respectiva acción correctiva.
Control y seguimiento de los recursos humanos Describir el cumplimiento de los profesionales (claves - mínimos) requeridos en el contrato por parte de contratista e interventoría durante el periodo ejecutado. Se debe presentar un cuadro donde se relacione: Nombre, cargo, % dedicación, fecha y N° radicados de aprobación por parte del responsable en cada contrato asociado y los cambios de personal en el periodo. Se debe presentar la relación de las de firmas autorizadas para el proceso de elaboración revisión y aprobación del presente informe.			X		***Personal mínimo OBRA*** En el numeral 1.3 se evidencia el control y seguimiento de recursos humanos incluyendo todos los cargos contractuales y los profesionales aprobados a la fecha de corte del presente informe, sin embargo no se describen cuales profesionales están activos para el periodo correspondiente al informe y tampoco se indica si hubo o no cambio de personal para el periodo
Seguimiento al cumplimiento del plan de calidad *Certificar el cumplimiento del plan de calidad del contratista ejecutor y la aprobación del informe mensual del periodo.	X				No Aplica para la revisión de este informe
Seguimiento a las comunicaciones **ACTAS DE COMITÉ:** Presentar cuadro de seguimiento al cumplimiento de los compromisos, y anexar las actas generadas en el periodo.					***Seguimiento a Actas de Comité*** En el anexo 1 se evidencian las actas de comité celebradas durante el periodo, sin embargo en el informe se relacionan 5 actas de reunión sin embargo solo se anexan 4 actas y en el seguimiento a los compromisos en la columna de fecha de seguimiento en su mayoría están vacías por favor completar. ***Correspondencia enviada y recibida***

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA: Presentar cuadro de seguimiento de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo en ejecución. Tanto de contratista como de interventoría. **BITÁCORA:** Anexar registro de bitácora con número de consecutivo o numeración aplicada entre el primer y último día del periodo reportado.			X		En el anexo 2 se evidencia el registro de control de correspondencia enviada y recibida sin embargo este formato no viene codificado por solicitud del cliente todos los formatos usados para el proyecto se deben codificar ***Bitácora de obra*** En el numeral 1.4.3 se informa la no aplicabilidad de la bitácora de obra para el periodo
Seguimiento de la información documentada Reportar los cambios de versión generados en el periodo, fecha de actualización y cambios generados de los documentos contractuales; planes, programas, formatos, planos, programación, balance, etc.; según los documentos relacionados en el listado maestro de documentos del plan de calidad aprobado.			X		En el anexo 3 se evidencia el Control de registros actualizado a la fecha de presentación del informe y en el Anexo 4 se evidencia el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS sin embargo se evidencian documentos internos sin codificar, por solicitud del cliente todos los formatos, procedimientos y demás aplicables para el proyecto se deben codificar
Seguimiento al Plan de adquisiciones La interventoría debe evidenciar el cumplimiento de lo propuesto por el contratista en el plan de adquisiciones para el periodo de reporte en comparación con lo ejecutado. Presentar los registros que evidencien la ejecución del plan.				X	En el numeral 1.6 se informa la no aplicabilidad del plan de adquisiciones para el periodo del presente informe
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO					
Seguimiento a la Infraestructura y Preservación Descripción de los recursos dispuestos en obra durante el periodo para el desarrollo de cada etapa en el contrato del contratista e interventoría según lo establecido en cada plan de calidad.				X	En el numeral 2.1.se describe el seguimiento a la infraestructura y preservación, se describe la localización del proyecto
Cumplimiento al Plan de Inspección y ensayo del proyecto Presentar evidencia de cumplimiento del plan de Inspección y ensayo del plan de calidad de cada contrato asociado. *Evidenciar el cumplimiento del plan de inspección y ensayos del contratista ejecutor presentando un análisis de los resultados obtenidos *Evidenciar el cumplimiento del plan de Inspección y ensayos de la interventoría				X	***Plan de Inspección y ensayo OBRA*** En el numeral 2.2 se describe la aplicabilidad del seguimiento al plan de inspección y ensayos para el periodo del informe
Control y seguimiento de los Equipos de Inspección, medición y ensayo *Evidenciar la verificación de los laboratorios acreditados ante ONAC, proveedor de cada contrato asociado. * Entregar los registros de verificación de idoneidad de los equipos de Inspección, medición y ensayo (topografía, densímetros, termómetros, entre otros utilizados) certificados de calibración, frecuencia de chequeo o verificación, metodología usada de acuerdo al plan de calidad de cada contrato asociado			X		***Equipos de medición y ensayo OBRA*** En el numeral 1.3 se describe el CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO, no se relacionan los equipos a los que se les hace seguimiento y medición.
Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales Presentar información de los materiales e insumos recibidos en el periodo que inciden en la calidad de la obra con los certificados de calidad o ensayos de laboratorio correspondientes, y registros de liberación por parte de interventoría.				X	En el numeral 2.4. se describe el CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES
Control y seguimiento de las actividades *Presentar evidencia del control y seguimiento realizado a las actividades de obra ejecutadas en el periodo				X	En el numeral 2.5. se describe se describe el control y seguimiento a las actividades

actividades de obra ejecutadas en el periodo. Todos los registros deben ser coherentes con el cumplimiento al Plan de Inspección de las actividades ejecutadas.				^	realizadas en el periodo
CONTROL DE LA GESTIÓN					
Control de cambios Se debe documentar la identificación, análisis y control de todos los cambios generados durante el desarrollo del objeto contractual, describiendo claramente la justificación y los impactos derivados de dicho cambio, incluyendo los registros que lo soportan y relacionando los documentos que cambian de versión.				X	En el numeral 3.1. se indicada que no se presentaron cambios no previstos o modificaciones.
Salidas no conformes Presentar un cuadro resumen de las salidas no conformes del proyecto por parte de interventoría (informes, productos, planes, evidencias de inspecciones en campo, materiales que no cumplan con especificaciones de calidad, etc.) donde se especifique fecha, componente, tratamiento y cierre. Reportar en el informe, las salidas no conformes por parte del contratista (indicar fecha, componente, tratamiento y cierre).				X	*S.N.C. PROYECTO* En el numeral 3.2. se indicada la no aplicabilidad de este ítem para el periodo del informe presentado
Auditorías internas Seguimiento a la planificación (Programa y plan de auditoría) y el informe de auditoría interna de acuerdo a la programación establecida en los requisitos contractuales de cada contrato asociado.				X	*Auditoría Interna OBRA* En el numeral 3.3. se indicada la no aplicabilidad de este ítem para el periodo del informe presentado

ANEXOS (Copias y Originales)	
	Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión:
	Anexo 0 Indicadores de gestión
	Anexo 1 Actas Celebradas
	Anexo 2 Correspondencia
	Anexo 3 Listado de Registros
	Anexo 4 Listado Información Documentada
	Anexo 5 Registro Fotográfico
	Anexo 6 Acciones correctivas

OBSERVACIONES GENERALES
Se evidencia numeración repetida dentro del Informe, por favor revisar y corregir
Todos los Registros fotográficos deber ir fechados
En el comunicado IDRD-3203-E0249-2023 se habla de entrega informe calidad V3 y en realizad es V1 favor verificar
VoBo. Profesional de Calidad Interventoría

CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR	LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL	CIG-SC-F-006-IDRD REVISIÓN: 0 FECHA: 03/05/2024

COMPONENTE DE CALIDAD
INFORME MENSUAL - ETAPA DE OBRA

Contrato N.	3203-2023			Parque:	*Proyecto 1 - Centro de alto Rendimiento CAR*						
Objeto contractual:	Contratar las obras y actividades complementarias de la manzana del cuidado Centro de Alto Rendimiento el Porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy, Bogotá.										
N° Radicado:			IDRD-3203-E0259-2023		N° Informe: 3	3	Versión:	2	Revisión	2	
Revisa:											
Periodo del Informe:	Del:	1-abr.-24	Al	30-abr.-24	Fecha Revisión:	miércoles, 8 de mayo de 2024					
Concepto de revisión:											
PRE APROBADO			APROBADO		X	NO APROBADO					

DOCUMENTO	%Cumplimiento N/A	0%	50%	100%	OBSERVACIONES
ESTADO CONTRACTUAL Y DE GESTIÓN					
Descripción del estado de los contratos (obra e interventoría) Se solicita incluir datos contractuales vigentes: * **Suspensiones**, consecutivo y plazo de suspensión * **Adiciones**, consecutivo y valor de la adición * **Prórrogas**, consecutivo y Plazo de adición * Gestión de incumplimientos (si aplica)				X	PLAZO DE EJECUCIÓN PROYECTO *Fecha de Inicio:* martes, 6 de febrero de 2024 *Fecha Final:* domingo, 5 de abril de 2026 *Plazo Actual:* 26 meses *Contratista:* CONSORCIO GIBRALTAR *Interventoría:* CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR En el numeral 1.1 se evidencia la Tabla 1. Generalidades Contrato Constructor y la Tabla 2. Generalidades del Contrato Interventoría
Seguimiento a indicadores de gestión Presentar el porcentaje de avance del periodo. Se debe evidenciar el control a los indicadores de gestión conforme los requisitos contractuales, incluir entre otros: Cumplimiento de cronograma, entrega de productos, ejecución de presupuesto, y demás indicadores propuestos en el plan de calidad. Establecer metas de cumplimiento y plan de acción. Reportar indicadores tanto de interventoría como de contratista de obra.				X	En el Anexo 0 se evidencia la MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN para el periodo del Informe, de igual forma se evidencia cuadro de observaciones explicando la medición o no medición de cada indicador.
Control y seguimiento de los recursos humanos Describir el cumplimiento de los profesionales (claves - mínimos) requeridos en el contrato por parte de contratista e interventoría durante el periodo ejecutado. Se debe presentar un cuadro donde se relacione: Nombre, cargo, % dedicación, fecha y N° radicados de aprobación por parte del responsable en cada contrato asociado y los cambios de personal en el periodo. Se debe presentar la relación de las de firmas autorizadas para el proceso de elaboración revisión y aprobación del presente informe.				X	*Personal mínimo OBRA* En el numeral 1.3 se evidencia el control y seguimiento de recursos humanos incluyendo todos los cargos contractuales y los profesionales aprobados a la fecha de corte del presente informe, de igual forma se indican los cambios de personal para el periodo
Seguimiento al cumplimiento del plan de calidad *Certificar el cumplimiento del plan de calidad del contratista ejecutor y la aprobación del informe mensual del periodo.	X				No Aplica para la revisión de este informe
Seguimiento a las comunicaciones **ACTAS DE COMITÉ:** Presentar cuadro de seguimiento al cumplimiento de los compromisos, y anexar las actas generadas en el periodo.					*Seguimiento a Actas de Comité* En el anexo 1 se evidencian las actas de comité celebradas durante el periodo, se relacionan las 5 actas de reunión realizadas en el periodo *Correspondencia enviada y recibida*

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA: Presentar cuadro de seguimiento de la correspondencia enviada y recibida durante el periodo en ejecución. Tanto de contratista como de Interventoría. **BITÁCORA:** Anexar registro de bitácora con número de consecutivo o numeración aplicada entre el primer y último día del periodo reportado.				X		En el anexo 2 se evidencia el registro de control de correspondencia enviada y recibida *Bitácora de obra* En el numeral 1.4.3 se informa la no aplicabilidad de la bitácora de obra para el periodo
Seguimiento de la Información documentada Reportar los cambios de versión generados en el periodo, fecha de actualización y cambios generados de los documentos contractuales; planes, programas, formatos, planos, programación, balance, etc.; según los documentos relacionados en el listado maestro de documentos del plan de calidad aprobado.				X		En el anexo 3 se evidencia el Control de registros actualizado a la fecha de presentación del informe y en el Anexo 4 se evidencia el LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Seguimiento al Plan de adquisiciones La Interventoría debe evidenciar el cumplimiento de lo propuesto por el contratista en el plan de adquisiciones para el periodo de reporte en comparación con lo ejecutado. Presentar los registros que evidencien la ejecución del plan.				X		En el numeral 1.6 se informa la no aplicabilidad del plan de adquisiciones para el periodo del presente informe
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO						
Seguimiento a la Infraestructura y Preservación Descripción de los recursos dispuestos en obra durante el periodo para el desarrollo de cada etapa en el contrato del contratista e interventoría según lo establecido en cada plan de calidad.				X		En el numeral 2.1.se describe el seguimiento a la infraestructura y preservación, se describe la localización del proyecto
Cumplimiento al Plan de Inspección y ensayo del proyecto Presentar evidencia de cumplimiento del plan de inspección y ensayo del plan de calidad de cada contrato asociado. *Evidenciar el cumplimiento del plan de Inspección y ensayos del contratista ejecutor presentando un análisis de los resultados obtenidos *Evidenciar el cumplimiento del plan de Inspección y ensayos de la Interventoría				X		*Plan de Inspección y ensayo OBRA* En el numeral 2.2 se describe la aplicabilidad del seguimiento al plan de inspección y ensayos para el periodo del informe
Control y seguimiento de los Equipos de Inspección, medición y ensayo *Evidenciar la verificación de los laboratorios acreditados ante ONAC, proveedor de cada contrato asociado. * Entregar los registros de verificación de idoneidad de los equipos de Inspección, medición y ensayo (topografía, densímetros, termómetros, entre otros utilizados) certificados de calibración, frecuencia de chequeo o verificación, metodología usada de acuerdo al plan de calidad de cada contrato asociado				X		*Equipos de medición y ensayo OBRA* En el numeral 1.3 se describe el CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.
Control y seguimiento de la trazabilidad de los materiales Presentar información de los materiales e insumos recibidos en el periodo que inciden en la calidad de la obra con los certificados de calidad o ensayos de laboratorio correspondientes, y registros de liberación por parte de Interventoría.				X		En el numeral 2.4. se describe el CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES
Control y seguimiento de las actividades *Presentar evidencia del control y seguimiento realizado a las actividades de obra ejecutadas en el periodo						En el numeral 2.5. se describe se describe el control y seguimiento a las actividades

actividades de obra ejecutadas en el periodo. Todos los registros deben ser coherentes con el cumplimiento al Plan de Inspección de las actividades ejecutadas.					X	realizadas en el periodo
CONTROL DE LA GESTIÓN						
Control de cambios Se debe documentar la identificación, análisis y control de todos los cambios generados durante el desarrollo del objeto contractual, describiendo claramente la justificación y los impactos derivados de dicho cambio, incluyendo los registros que lo soporten y relacionando los documentos que cambian de versión.					X	En el numeral 3.1. se indicada que no se presentaron cambios no previstos o modificaciones.
Salidas no conformes Presentar un cuadro resumen de las salidas no conformes del proyecto por parte de interventoría (informes, productos, planes, evidencias de inspecciones en campo, materiales que no cumplan con especificaciones de calidad, etc.) donde se especifique fecha, componente, tratamiento y cierre. Reportar en el informe, las salidas no conformes por parte del contratista (indicar fecha, componente, tratamiento y cierre).					X	*S.N.C. PROYECTO* En el numeral 3.2. se indicada la no aplicabilidad de este ítem para el periodo del informe presentado
Auditorías Internas Seguimiento a la planificación (Programa y plan de auditoría) y el informe de auditoría interna de acuerdo a la programación establecida en los requisitos contractuales de cada contrato asociado.					X	*Auditoría Interna OBRA* En el numeral 3.3. se indicada la no aplicabilidad de este ítem para el periodo del informe presentado

ANEXOS (Copias y Originales)	
	Documentos incluidos en documento objeto de la presente revisión:
	Anexo 0 Indicadores de gestión
	Anexo 1 Actas Celebradas
	Anexo 2 Correspondencia
	Anexo 3 Listado de Registros
	Anexo 4 Listado Información Documentada
	Anexo 5 Registro Fotográfico
	Anexo 6 Acciones correctivas

OBSERVACIONES GENERALES
VoBo. Profesional de Calidad Interventoría

Oficio de radicación

CONSORCIO
GIBRALTAR

CONSORCIO
GIBRALTAR

Bogotá D.C., 06 de mayo de 2024

IDRD-3203-E0259-2023

SEÑORES:
CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
Arq. Andrés Martínez Vesga
Representante legal
interventoriagibraltar@gmail.com
Bogotá D. C.

Ref.: **Proyecto MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR) - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 cuyo objeto es Contratar las obras y actividades complementarias del centro de alto rendimiento en el marco de la manzana del cuidado del porvenir (Gibraltar), en la localidad de Kennedy en Bogotá.**

Asunto: Remisión informe de calidad 03 abril V2.

Respetados señores:

Por medio de la presente remitimos el informe mensual número 03 del componente de calidad, comprendido desde el 01 de abril al 30 de abril.

Así mismo damos claridad a las observaciones presentadas que consideramos no son tenidas en cuenta para ajustar en el presente informe V2.

Observación 1: En el Anexo 0 se evidencia la MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN para el periodo del informe, de igual forma se evidencia cuadro de observaciones explicando la medición o no medición de cada indicador. Sin embargo, se debe verificar el indicador Índice de oportunidad en la entrega de informes puesto que este aplica para el periodo de medición y en el cuadro se indica que no aplica medición de igual forma verificar el cumplimiento del mismo ya que todos los informes no se están entregando en las fechas establecidas, de igual forma levantar su respectiva acción correctiva.

Respuesta 1: Para el presente mes de abril se realizaron las entregas de los informes, no obstante, las implicaciones son de tipo administrativo y logístico de cumplimiento con los productos de la fase 1, por lo tanto, la no conformidad y los planes de acción ya no serán viables durante la etapa de construcción porque ya estaremos en otra fase, la 2, de construcción.

Observación 3: En el anexo 1 se evidencian las actas de comité celebradas durante el periodo, sin embargo, en el informe se relacionan 5 actas de reunión sin embargo solo se anexan 4 actas y en el seguimiento a los compromisos en la columna de fecha de seguimiento en su mayoría están vacías por favor completar.

Respuesta 3: Se incluye el acta faltante, no obstante, fecha de seguimiento no aplica cuando el compromiso se ha logrado, si se compara con los meses anteriores, quedan los seguimientos del

CONSORCIO
GIBRALTAR

compromiso cuando no se han cumplido en los comités siguientes y como fecha final con la que se subsano. Es decir que no aplica colocar fecha próxima cuando el compromiso es satisfecho.
Sin otro particular, agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

I.C. Steve Moreno Ortiz
Director De Proyecto.
Consorcio Gibraltar
Elaboro: ARP
Reviso: SMO
Aprobó: SMO

CONSORCIO
INTERVENTORES GIBRALTAR

Sticker web
https://orfeo.idrd.gov.c...
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD
No. 20242100164202 Código Web: W8e7hg
FECHA:20-05-2024 16:56:01 FOLIOS: 79
RADICADOR: CARLOS ANDRES MARTIN GACHA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUC
REMITENTE: CONSORCIO INTERVENTORES GIBRALTAR
ASUNTO: ENTREGA CONTRATO DE OBRA
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Bogotá D.C., 20 de mayo de 2024

CIG-IDRD-CEFE-248-2024

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
ING. OSCAR RICARDO TAMAYO
Profesional Especializado
oscar.tamayo@idrd.gov.co.
Calle 63 # 59ª – 06

Referencia. **Proyecto CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO** - CONTRATO DE OBRA IDRD-CTO-3203-2023 cuyo objeto es "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MARCO DE LA MANZANA DEL CUIDADO DEL PORVENIR (GIBRALTAR). LOCALIDAD DE KENNEDY – BOGOTA.

Asunto: Entrega Informe de Calidad de Obra No. 3. Proyecto No. 1 Centro de Alto Rendimiento.

Como interventoría delegada para el contrato de la referencia, en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales nos permitimos remitir Informe de Calidad de Obra No. 3. Proyecto No. 1 Centro de Alto Rendimiento debidamente aprobado por esta interventoría, para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

Arq. Raúl Pinzón
Director de Interventoría

Elaboró y proyectó: Ing. Fabio Puentes. Residente de Calidad
Revisó: Arq. Farith Adriana Guerrero Alayón.
Aprobó: Arq. Andrés Martínez Vesga.
Anexo: Informe de Calidad Obra No. 3 (78 Folios)
1CD

Calle 120 A # 7- 36 Of. 802
PBX: (571) 2456144
www.andresmartinez.com.co
gerencia@andresmartinez.com.co
Bogotá · Colombia

79
