ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTIÓN CONTRACTUAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA O INTERVENTORIA	MAJA01.04.03.P002.F005	
		VERSIÓN	002

1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Tipo de Contrato: OBRA [X]	INTERVENTORÍA [ ]
Informe Número: 1	Periodo comprendido entre el (29/09/2023) hasta el (15/04/2024)
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato o Aceptación de Oferta No. No .4151.010.26.1.1521-2023	
Nombre Completo del Contratista: FEXXA SAS	
Documento de identificación del contratista: 900.091.915-8	
Nombre (s) del Supervisor (es): FERNANDO PAZ MERA	
Organismo: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
Obra Física Ejecutada del Periodo: 80%	Obra Física Ejecutada Acumulada: 80%
Objeto del contrato: REALIZAR LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SUR OCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
29 septiembre 2023	8 junio 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Modificación del contrato:

MODIFICACION No. 1 de fecha: 27 de diciembre de 2023: suspensión al contrato
MODIFICACION No. 2 de fecha 16 de febrero de 2024 prórroga del contrato

Suspensión No 1: Desde el 28 de diciembre de 2023 hasta el 30 de enero de 2024 por treinta y cuatro (34) días calendarios
Prorroga a la suspensión No 1: desde el 31 de enero de hasta el 16 de febrero de 2024 por diecisiete (17) días calendario

Reanudación: a partir del 16 de febrero de 2024

Cesión:

Terminación anticipada:

Acta de recibo final de obra:

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del Contrato:
Es hasta por la suma de DOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 233.617.388)

Adición N/A

Prórroga:
PRORROGAR el plazo de ejecución por el termino de ciento once (111) días calendario contados a partir del primero (19) de febrero de 2024 hasta el ocho (08) de junio de 2024

Resumen Contable y Financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$ 233.617.388 oo	$ 186.300. 394.oo	$ 00, oo	$ 47.316.994

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN:
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo a los requerimientos de Ley.

PERSONA NATURAL N/A

Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural, N/A
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de pago:

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TÉCNICO

Actividades realizadas en el periodo:

1, VIA VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES, CORREGIMIENTO DE VILLACARMELO, COMUNA 55. Avance de obra en el frente: 100%

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).
- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)
- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).
- ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%)."
- ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.

2, VEREDA LA FONDA SECTOR LA ROCHELA - VILLACARMELO (COMUNA 55) Avance de obra en el frente: 100%

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).
- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)
- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).
- ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%)."
- ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.

3, VEREDA CABECERA SECTOR SAN MIGUEL - VILLACARMELO (COMUNA 55). . Avance de obra en el frente: 100%

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).
- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)
- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).
- ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%)."
- ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.

4, VEREDA LA FONDA SECTOR VILLA LUZ - VILLACARMELO (COMUNA 55), . Avance de obra en el frente: 100%

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).
- DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.
- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)
- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).
- ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).
- ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DE MANTENIMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE. COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.
- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.
- CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE. FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.
- REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.

5, VEREDA LA FONDA SECTOR BOCATOMA - VILLACARMELO (COMUNA 55), . Avance de obra en el frente: 100%

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).
- DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.
- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)
- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).
- ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).
- ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE. COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.
- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.
- CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE. FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.
- REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS

6, VEREDA CABECERA SECTOR LA CARMELITA ADONAY OSPINA - VILLACARMELO (COMUNA 55), . Avance de obra en el frente: 100%

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).
- DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.
- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)
- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).
- ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).
- ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE. COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.
- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.
- CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE. FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.
- REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.

7, VEREDA CABECERA SECTOR FINCA LA CARMELITA - VILLACARMELO (COMUNA 55), . Avance de obra en el frente: 100%

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).
- DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.
- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)
- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).
- ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

7%).
- ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE. COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.
- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA.
- CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE. FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL.
- REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI.
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS

8, VEREDA CABECERA SECTOR CENTRO DE SALUD - VILLACARMELO (COMUNA 55), . Avance de obra en el frente: 100%

- LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES).
- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)
- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).
- ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 7%).
- ESCARIFICACIÓN. CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS.
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA. CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.

9 VIA PICO DE AGUILA SECTOR LA UNION VEREDA EL JARDIN - PANCE (COMUNA 53)
- Avance de frente = 0,00%

10, VEREDA EL JARDIN - SECTOR CANTARRANA - VIA EL PEON - PANCE (COMUNA 53)

- Avance de frente = 0,00%

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

11, VEREDA PANCE CABECERA - SECTOR ESTADERO AQUI ME QUEDO - VIA PUEBLO PANCE - PANCE (COMUNA 53)

- Avance de frente = 0,00%

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Foto No. 1	Descripción: VIA VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES



Foto No. 2	Descripción VIA VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES





Foto No. 3	Descripción: VIA VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES


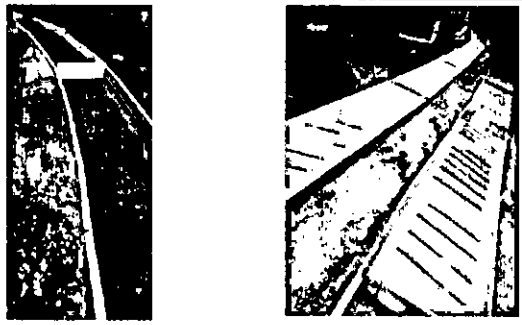


Foto No. 4	Descripción: VIA VEREDA LA FONDA, SECTOR BUENOS AIRES

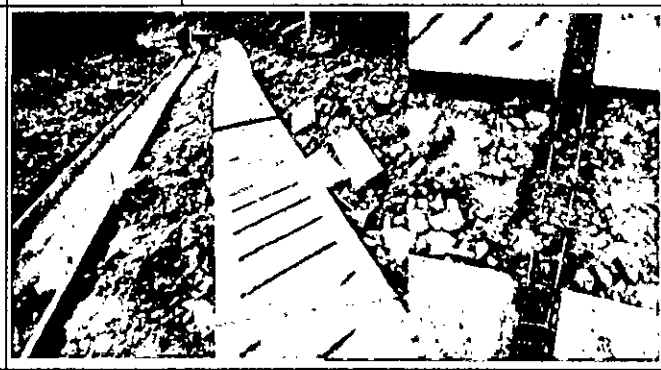
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 5	Descripción: 2,VEREDA LA FONDA SECTOR LA ROCHELA	Foto No. 6	Descripción: 2,VEREDA LA FONDA SECTOR LA ROCHELA
			
Foto No. 7	Descripción: 2,VEREDA LA FONDA SECTOR LA ROCHELA	Foto No. 8	Descripción: 2,VEREDA LA FONDA SECTOR LA ROCHELA
			
Foto No. 9	Descripción: 3,VEREDA CABECERA SECTOR SAN MIGUEL	Foto No. 10	Descripción: 3,VEREDA CABECERA SECTOR SAN MIGUEL

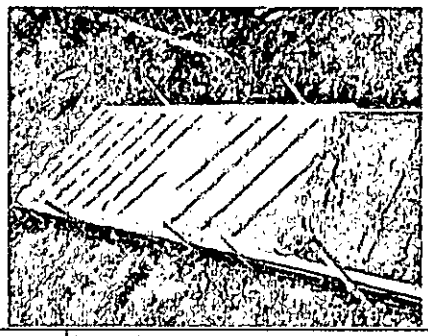
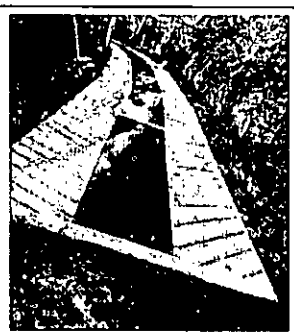


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 11	Descripción: 3, VEREDA CABECERA SECTOR SAN MIGUEL	Foto No. 12	Descripción: 3,VEREDA CABECERA SECTOR SAN MIGUEL
			
Foto No. 13	Descripción: 4, VEREDA LA FONDA SECTOR VILLA LUZ	Foto No. 14	Descripción: 4, VEREDA LA FONDA SECTOR VILLA LUZ
			
Foto No. 15	Descripción: 4, VEREDA LA FONDA SECTOR VILLA LUZ	Foto No. 16	Descripción: 4, VEREDA LA FONDA SECTOR VILLA LUZ


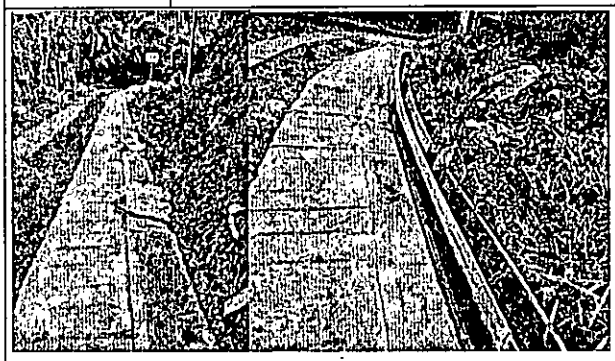
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 17	Descripción: 5, VEREDA LA FONDA SECTOR BOCATOMA	Foto No. 18	Descripción: 5, VEREDA LA FONDA SECTOR BOCATOMA
			
Foto No. 19	Descripción: 5, VEREDA LA FONDA SECTOR BOCATOMA	Foto No. 20	Descripción: 5, VEREDA LA FONDA SECTOR BOCATOMA
			
Foto No. 21	Descripción: 6, VEREDA CABECERA SECTOR LA CARMELITA ADONAY OSPINA	Foto No. 22	Descripción: 6, VEREDA CABECERA SECTOR LA CARMELITA ADONAY OSPINA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 23	Descripción: 6, VEREDA CABECERA SECTOR LA CARMELITA ADONAY OSPINA	Foto No. 24	Descripción: 6, VEREDA CABECERA SECTOR LA CARMELITA ADONAY OSPINA
			
Foto No. 25	Descripción: 7, VEREDA CABECERA SECTOR FINCA LA CARMELITA	Foto No. 26	Descripción: 7, VEREDA CABECERA SECTOR FINCA LA CARMELITA
			
Foto No. 27	Descripción: 7, VEREDA CABECERA SECTOR FINCA LA CARMELITA	Foto No. 28	Descripción: 7, VEREDA CABECERA SECTOR FINCA LA CARMELITA

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

			
Foto No. 29	Descripción: 8, VEREDA CABECERA SECTOR CENTRO DE SALUD	Foto No. 30	Descripción: 8, VEREDA CABECERA SECTOR CENTRO DE SALUD
			
Foto No. 31	Descripción: 8, VEREDA CABECERA SECTOR CENTRO DE SALUD	Foto No. 32	Descripción: 8, VEREDA CABECERA SECTOR CENTRO DE SALUD

RECIBO A SATISFACCIÓN:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, las obras o interventoría con base en las condiciones establecidas en el Contrato o Aceptación de Oferta No._____ y que a continuación se describen:

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

7. FIRMAS RESPONSABLES

Nombre y firma del Supervisor
FERNANDO PAZ MERA

Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 15 DE ABRIL DE 2024

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
