INFORME DE ACTIVIDADES 2 (ADICIONAL Y PRORROGA No. 1)

CONVENIO SOLIDARIO

N° CO1.PCCNTR.5284036 de 2023

CONVENIO SOLIDARIO N°	**CO1.PCCNTR.5284036**
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL BOSQUE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL BOSQUE
VALOR DEL CONVENIO	$35.774.448,90
VALOR ADICIONAL DEL CONVENIO	$11.755.319,97
PLAZO DE EJECUCION	1 MES
PRORROGA	7 DIAS
ACTA DE SUSPENSIÓN	20 de noviembre de 2023
ACTA DE REINICIO	14 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	30 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de diciembre de 2023

ALCANCE INICIAL DEL CONVENIO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1,00	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	m3	70,40	$1.750,00	$123.200,00
2,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR	m3	70,40	$95.360,00	$6.713.344,00
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO MR 38	m3	35,20	$438.366,67	$15.430.506,78
4,00	Suministro e instalacion Mortero 1:3 (Cemento:Arena)	m3	12,67	$390.840,00	$4.951.942,80
5,00	Suministro de piedra barichara (5% area)	m2	19,56	$120.000,00	$2.346.666,66

COSTO TOTAL DIRECTO		$29.565.660,24
ADMINISTRACCION	20,0%	$5.913.132,05
IMPREVISTOS	1,0%	$295.656,60
UTILIDAD	0,0%	
COSTO TOTAL INDIRECTO (A.I.U.)		$6.208.788,65

COSTO TOTAL OBRA	$35.774.448,90

						MAYORES Y MENORES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR. UNIT.	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD
1,00	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	m3	70,40	$1.750,00	$123.200,00	0,00	$ -	774,40
2,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR	m3	70,40	$95.360,00	$6.713.344,00	0,00	$ -	70,40
3,00	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO MR 38	m3	35,20	$438.366,67	$15.430.506,78	0,00	$ -	35,20
4,00	Suministro e instalacion Mortero 1:3 (Cemento:Arena)	m3	12,67	$390.840,00	$4.951.942,80	0,00	$ -	12,67
5,00	Suministro de piedra barichara (5% area)	m2	19,56	$120.000,00	$2.346.666,66	80,96	$ 9.715.199,98	100,52
				COSTO TOTAL DIRECTO	$29.565.660,24			
				ADMINISTRACCION	$5.913.132,05	$6.159.532,05		
				IMPREVISTOS	$295.656,60	$307.976,60		
				UTILIDAD				
				COSTO TOTAL INDIRECTO (A.I.U.)		$6.208.788,65		
				COSTO TOTAL OBRA		$35.774.448,90		$47.529.840,87

FORMA DE PAGO

La entidad Estatal girará a la cuenta que se constituya a nombre del convenio o al Patrimonio Autónomo, según corresponda, el valor a su cargo en mediante desembolsos parciales así: **A) PAGO ANTICIPADO**: El municipio reconocerá un pago anticipado correspondiente al 50% del valor total del convenio suma equivalente a **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($17.887.224.45) M/CTE.,** el cual se desembolsará una vez perfeccionado el convenio, cumpliendo los requisitos de ejecución del mismo y la correspondiente suscripción al acta de inicio. **B) UN SEGUNDO DESEMBOLSO:** Por valor de **CATORCE MILLONES TRECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($14,309,779.56) M/CTE** equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del convenio, el cual se desembolsará una vez ejecutada el cincuenta (50%) por ciento de

obra, y **C) UN DESEMBOLSO FINAL:** Por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($3.577.444.89) M/CTE.,** equivalente al diez por ciento (10%) del valor del convenio, el cual se desembolsará una vez se suscriba el acta de recibo final, informe de supervisor y liquidación del respectivo convenio; pagos que se efectuaran a la cuenta bancaria de la junta de acción comunal Barrio El Bosque.

RELACION DE ACTAS

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO	30 de octubre de 2023
ACTA DE SUSPENSION	20 de noviembre de 2023
ACTA DE REINICIO	14 de diciembre de 2023
ACTA PAGO PARCIAL N°1	7 de noviembre de 2023
ACTA PAGO PARCIAL N°2	22 de diciembre de 2023
ACTA PAGO PARCIAL N°3	26 de diciembre de 2023

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Durante el periodo comprendido entre el 16 de diciembre y 26 de diciembre se ejecutaron las siguientes cantidades las cuales demuestran una ejecución superior al 50% del alcance adicional y prorroga No. 1 del convenio según lo estipulado en la cláusula FORMA DE PAGO correspondiente a un valor de CUATRO MILLOES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($4.702.156,79) valor equivalente al 40% del valor del adicional del convenio para el segundo pago.


CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

PROYECTO CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL BOSQUE PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL MUNICIPIO DE EL SOCORRO, SANTANDER"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD
1,00	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO A MANO	m^3	35,20
2,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB BASE GRANULAR	m^3	35,20
3,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO MR 38	m^3	17,60
4,00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MORTERO 1:3 (CEMENTO: ARENA)	m^3	6,34
5,00	SUMINISTRO DE PIEDRA DE BARICHARA (5% ÁREA)	m^2	9.77777


1. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO

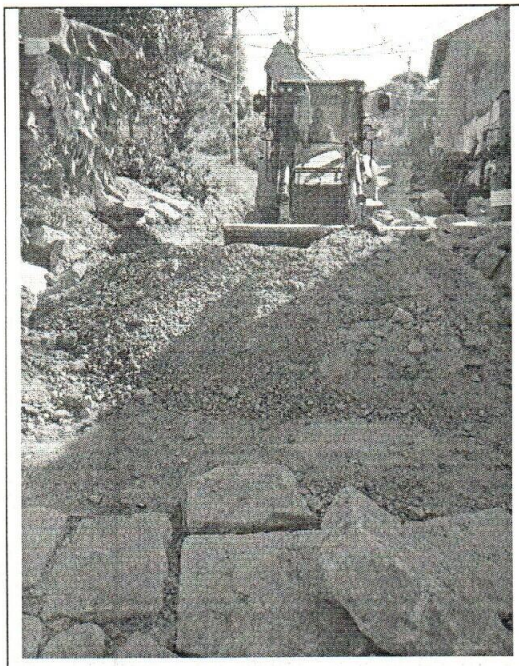


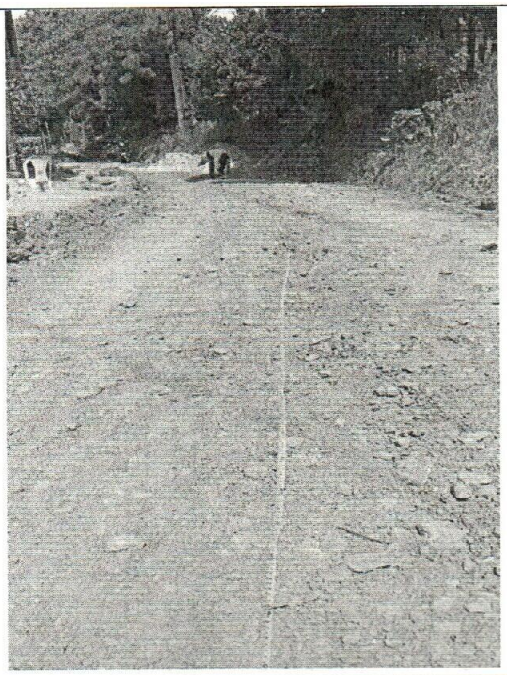

Excavaciones varias en material común en seco a mano


2. SUMINISTRO E INSTALACION DE SUB BASE GRANULAR

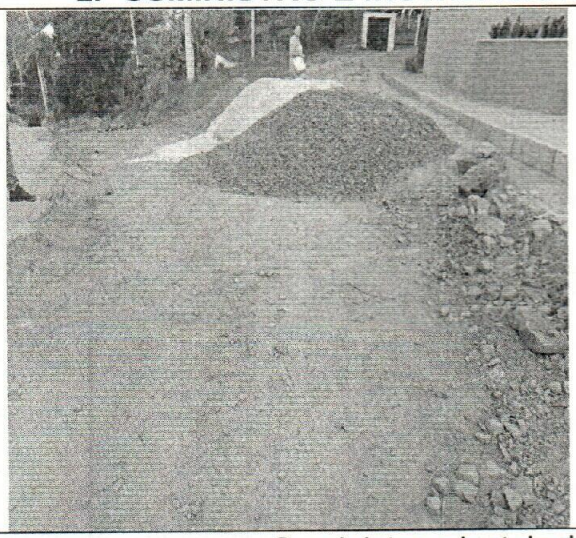


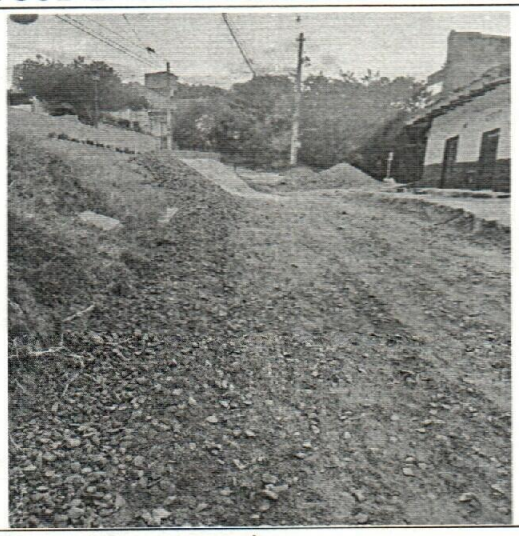

Suministro e instalación de sub base granular


3. SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO MR 38

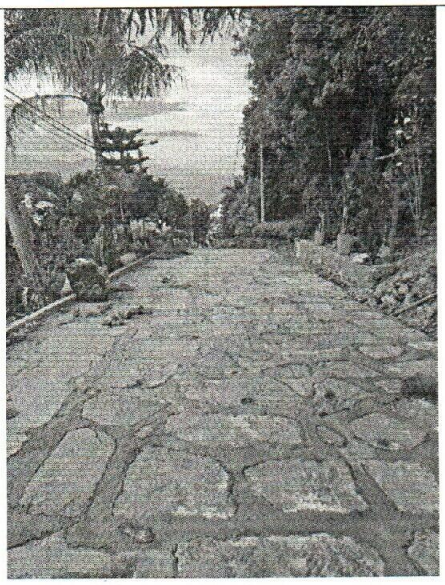


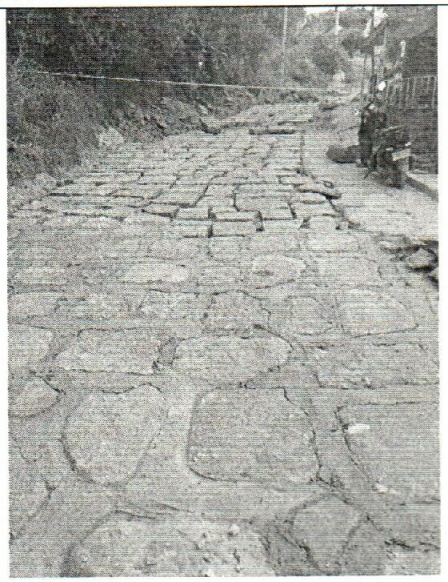

Suministro e instalación de concreto **MR 38**


4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN MORTERO 1:3 (CEMENTO: ARENA)

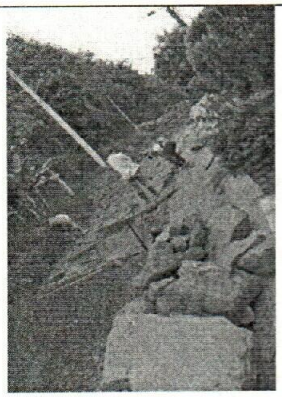


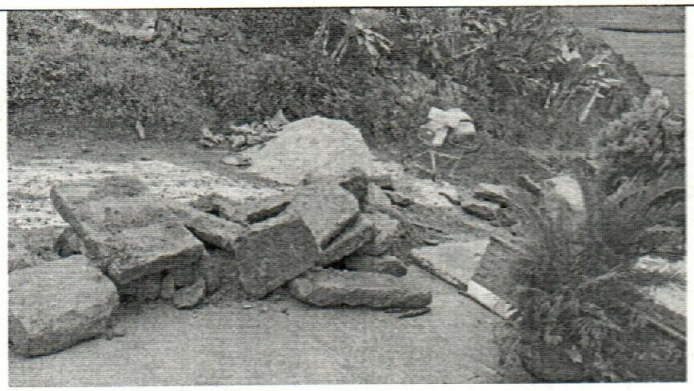

Suministro e instalación mortero 1:3 (cemento: arena)

5. SUMINISTRO DE PIEDRA DE BARICHARA

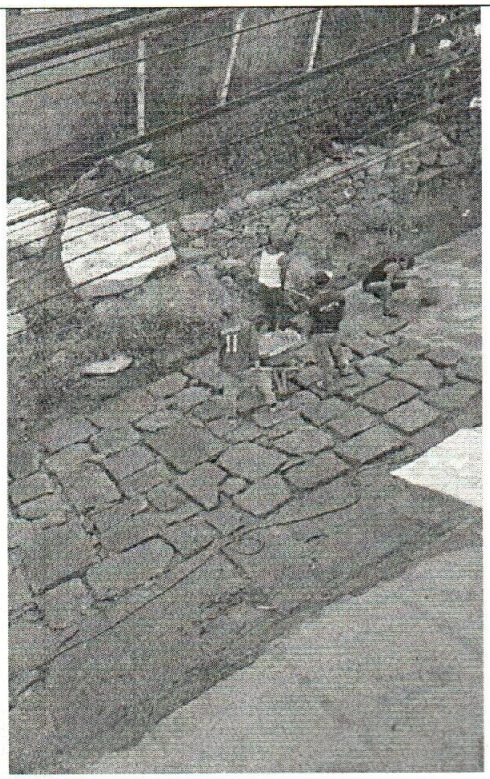

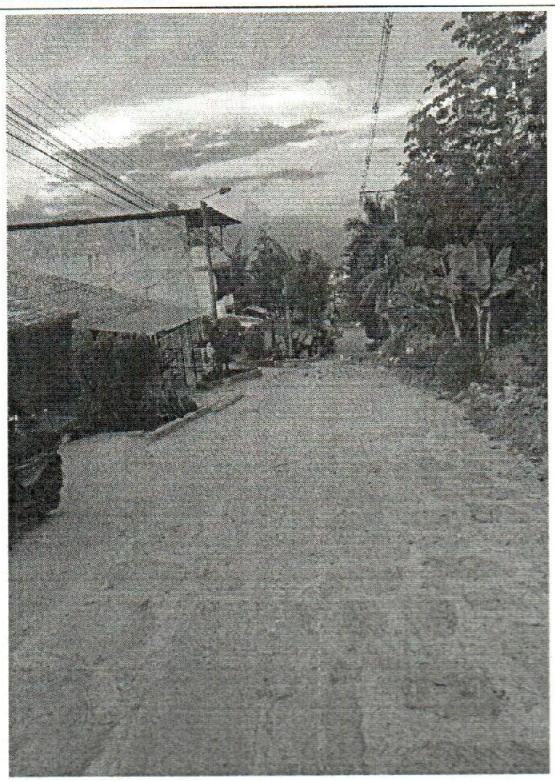

Suministro de piedra de Barichara

V.o.B.o:

Ing. Ángelo Marcelo Rivera Martínez
Contratista de Apoyo Sec. de Planeación

Elaboro:

Ing. Jeyson Julian Leon Rueda
Ing. Civil Apoyo Junta de acción comunal
T.P: 68202-416348 STD

Lelia Marina Ariza de Quiroga
Presiente Junta de Acción Comunal Barrio El Bosque
