

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**0**	**REFORZAMIENTO HOGAR ICBF SEDE TUNJA**	**110 días**	**lun 15/11/21**	**mié 23/03/22**	
2		**1**	**OBRAS PRELIMINARES**	**21 días**	**lun 15/11/21**	**jue 09/12/21**	
3		**1.1**	**ACTIVIDAD PRELIMINAR**	**21 días**	**lun 15/11/21**	**jue 09/12/21**	
4		1.1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	3 días	lun 15/11/21	jue 18/11/21	
5		1.1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M	2 días	jue 18/11/21	sáb 20/11/21	4
6		1.1.3	DESCAPOTE Y LIMPIEZA	3 días	sáb 20/11/21	mié 24/11/21	5
7		1.1.4	DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP	3 días	vie 19/11/21	mar 23/11/21	5CC+1 día
8		1.1.5	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS EN CUALQUIER MATERIAL	3 días	sáb 20/11/21	mié 24/11/21	5CC+2 días
9		1.1.6	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL	3 días	mar 23/11/21	vie 26/11/21	10CC+1 día
10		1.1.7	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO	3 días	lun 22/11/21	jue 25/11/21	8CC+1 día
11		1.1.8	DESMONTE DE MURO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL	2 días	lun 22/11/21	mié 24/11/21	5CC+1 día
12		1.1.9	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 m	5 días	vie 26/11/21	jue 02/12/21	9
13		1.1.10	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	2 días	mar 23/11/21	jue 25/11/21	7
14		1.1.11	DESMONTE PUNTO HIDRAULICO	3 días	vie 19/11/21	mar 23/11/21	7CC
15		1.1.12	DESMONTE DE PUNTO SANITARIO	3 días	vie 19/11/21	mar 23/11/21	7CC
16		1.1.13	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA (E=012 A 0,15) O (E=0,16 A 0,30)	5 días	mar 23/11/21	dom 28/11/21	10CC+1 día
17		1.1.14	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	5 días	lun 29/11/21	sáb 04/12/21	16
18		1.1.15	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA	5 días	mié 01/12/21	mar 07/12/21	17CC+2 días
19		1.1.16	DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.	2 días	sáb 20/11/21	mar 23/11/21	7CC+1 día
20		1.1.17	DESMONTE ESTRUCTURA METALICA Y/O MADERA INCLUYE MATERIAL DE CUBIERTA	7 días	mié 01/12/21	jue 09/12/21	17CC+2 días
21		0	FIN ACTIVIDADES PRELIMINARES	0 días	jue 09/12/21	jue 09/12/21	20
22		**2**	**EXCAVACIONES, DEMOLICIONES, ENTIBADOS Y RELLENOS**	**24 días**	**lun 15/11/21**	**dom 12/12/21**	
23		**2.1**	**EXCAVACIONES**	**7 días**	**sáb 04/12/21**	**dom 12/12/21**	
24		2.1.1	EXCAVACIONES A MANO DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD	5 días	sáb 04/12/21	vie 10/12/21	20CC+3 días
25		2.1.2	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	5 días	mar 07/12/21	dom 12/12/21	24CC+2 días
26		**2.2**	**CARGUE Y DESCARGUE**	**24 días**	**lun 15/11/21**	**dom 12/12/21**	
27		2.2.1	CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES HASTA BOTADERO AUTORIZADO (HASTA 5 KM)	24 días	lun 15/11/21	dom 12/12/21	3CC
28		**3**	**CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS**	**73 días**	**jue 09/12/21**	**vie 04/03/22**	
29		**3.1**	**CONCRETOS**	**73 días**	**jue 09/12/21**	**vie 04/03/22**	
30		**3.1.1**	**CONCRETOS SIMPLES**	**4 días**	**lun 13/12/21**	**vie 17/12/21**	
31		3.1.1.1	CONCRETO SIMPLE RESIST. 14.0 MPA (140KG/CM2)	4 días	lun 13/12/21	vie 17/12/21	25
32		**3.1.2**	**CONCRETOS ESTRUCTURALES**	**73 días**	**jue 09/12/21**	**vie 04/03/22**	
33		3.1.2.1	COLUMNAS 3500 PSI	21 días	sáb 11/12/21	mié 05/01/22	34CC+2 día
34		3.1.2.2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI	21 días	jue 09/12/21	dom 02/01/22	25CC+2 días
35		3.1.2.3	COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA MAMPOSTERÍA NUEVA	7 días	jue 23/12/21	vie 31/12/21	113CC+3 días
36		1.3.1.2	DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 10 x 20 cm	7 días	jue 24/02/22	vie 04/03/22	113CC+3 días
37		3.1.2.5	VIGA CINTA 3500 PSI	21 días	sáb 11/12/21	mié 05/01/22	34CC+2 día
38		3.1.2.6	VIGA DE CIMENTACIÓN DE 3500 PSI	21 días	sáb 11/12/21	mié 05/01/22	34CC+2 días
39		3.1.2.7	MESONES EN CONCRETO DE 60 cm	5 días	mié 12/01/22	mar 18/01/22	115
40		3.1.2.8	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 15*15, 5mm	7 días	vie 28/01/22	sáb 05/02/22	68,69,70,7
41		**3.2**	**ACERO**	**21 días**	**jue 09/12/21**	**dom 02/01/22**	

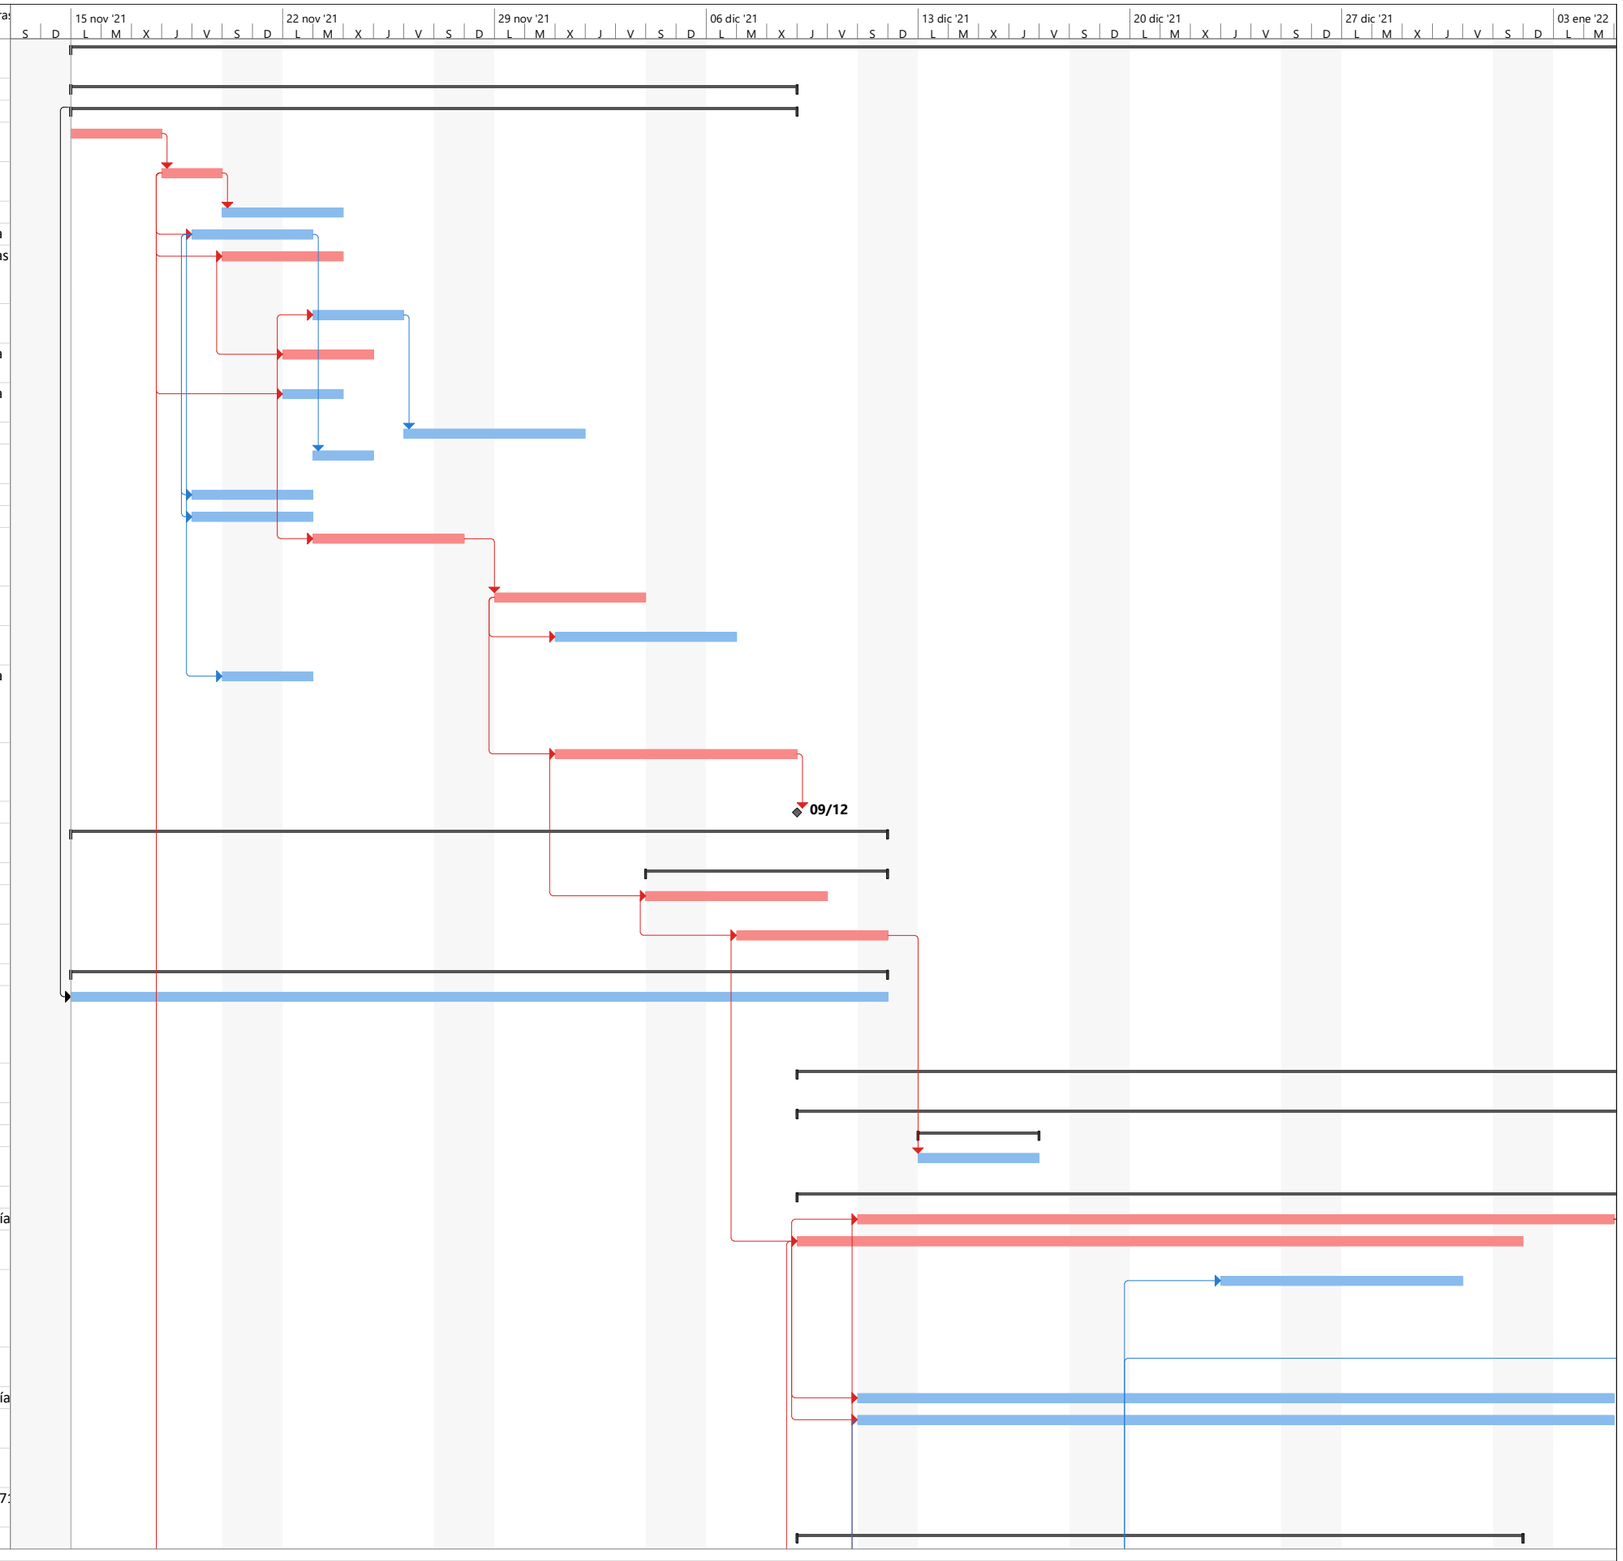

Proyecto: Cronograma Hogar IC
Fecha: jue 07/10/21

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Retrasada
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
42		3.2.1	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	21 días	jue 09/12/21	dom 02/01/22	34CC
43		**4**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**	**91 días**	**vie 19/11/21**	**sáb 05/03/22**	
44		**4.1**	**ACOMETIDA HIDRÁULICA**	**2 días**	**mié 26/01/22**	**vie 28/01/22**	
45		4.1.1	ACOMETIDA Y MEDIDOR TOTALIZADOR 1/2"	2 días	mié 26/01/22	vie 28/01/22	47,48,49,5
46		**4.2**	**PUNTOS HIDRÁULICOS**	**58 días**	**vie 19/11/21**	**mié 26/01/22**	
47		4.2.1	PUNTO LAVAMANOS AF PARAL DE PISO 1/2"	3 días	mar 11/01/22	vie 14/01/22	55CC,56CC días
48		4.2.2	PUNTO SANITARIO AHORRADOR PARAL DE PISO 1/2"	3 días	sáb 22/01/22	mié 26/01/22	68CC,69CC días
49		4.2.3	PUNTO LAVAPLATOS AF/AC PARAL DE PISO 1/2"	3 días	mar 11/01/22	vie 14/01/22	55CC,56CC días
50		4.2.4	PUNTO DUCHA AF/AC PARAL DE PISO 1/2"	3 días	mar 11/01/22	vie 14/01/22	55CC,56CC días
51		4.2.5	PUNTO LLAVE DE MANO 1/2"	3 días	mar 11/01/22	vie 14/01/22	55CC,56CC
52		4.2.6	DESMONTE PUNTO LAVAMANOS	2 días	vie 19/11/21	dom 21/11/21	5CC+1 día
53		4.2.7	DESMONTE PUNTO SANITARIO	2 días	vie 19/11/21	dom 21/11/21	5CC+1 día
54		**4.3**	**REDES DE AGUA FRÍA**	**10 días**	**mié 05/01/22**	**dom 16/01/22**	
55		4.3.1	TUBERÍA RDE 9 PVC PRESION 500 PSI 1/2"	10 días	mié 05/01/22	dom 16/01/22	33
56		4.3.2	ACCESORIOS PVC PRESIÓN 1/2"	10 días	mié 05/01/22	dom 16/01/22	33
57		**4.4**	**REGISTROS Y MEDIDORES RED DE SUMINISTRO**	**3 días**	**mié 26/01/22**	**sáb 29/01/22**	
58		4.4.1	REGISTRO COMPUERTA PESADO RED WHITE 1/2"	1 día	mié 26/01/22	jue 27/01/22	47,48,49,5
59		4.4.2	MEDIDOR PARA AGUA 1/2"	1 día	mié 26/01/22	jue 27/01/22	47,48,49,5
60		4.4.3	CAJA PARA 1 MEDIDOR (NO INCLUYE MEDIDOR)	3 días	mié 26/01/22	sáb 29/01/22	47,48,49,5
61		**4.5**	**SALIDAS SANITARIAS**	**3 días**	**sáb 22/01/22**	**mié 26/01/22**	
62		4.5.1	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2"	3 días	sáb 22/01/22	mié 26/01/22	68CC,69CC días
63		4.5.2	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	3 días	sáb 22/01/22	mié 26/01/22	68CC,69CC días
64		4.5.3	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4"	3 días	sáb 22/01/22	mié 26/01/22	68CC,69CC
65		4.5.4	SIFON DE PISO 2"	3 días	sáb 22/01/22	mié 26/01/22	68CC,69CC
66		4.5.5	SIFON DE PISO 4"	3 días	sáb 22/01/22	mié 26/01/22	68CC,69CC
67		**4.6**	**RED DE DESAGUES AGUAS RESIDUALES**	**10 días**	**lun 17/01/22**	**vie 28/01/22**	
68		4.6.1	TUBERÍA PVC SANITARIA 2"	10 días	lun 17/01/22	vie 28/01/22	55,56
69		4.6.2	TUBERÍA PVC SANITARIA 3"	10 días	lun 17/01/22	vie 28/01/22	55,56
70		4.6.3	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	10 días	lun 17/01/22	vie 28/01/22	55,56
71		4.6.4	ACCESORIO SANITARIO 2"	10 días	lun 17/01/22	vie 28/01/22	55,56
72		4.6.5	ACCESORIO SANITARIO 3"	10 días	lun 17/01/22	vie 28/01/22	55,56
73		4.6.6	ACCESORIO SANITARIO 4"	10 días	lun 17/01/22	vie 28/01/22	55,56
74		**4.7**	**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES**	**5 días**	**lun 17/01/22**	**sáb 22/01/22**	
75		4.7.1	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 160 mm 6"	5 días	lun 17/01/22	sáb 22/01/22	55,56
76		**4.8**	**TUBERÍA ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS**	**5 días**	**mar 22/02/22**	**dom 27/02/22**	
77		4.8.1	TUBERÍA ALCANTARILLADO NOVAFORT O SIMILAR 110 mm 4"	5 días	mar 22/02/22	dom 27/02/22	79,80,81
78		**4.9**	**RED DE DESAGUES AGUAS LLUVIAS**	**5 días**	**mié 16/02/22**	**mar 22/02/22**	
79		4.9.1	TUBERÍA PVC SANITARIA 4"	5 días	mié 16/02/22	mar 22/02/22	120
80		4.9.2	ACCESORIO SANITARIO 4"	5 días	mié 16/02/22	mar 22/02/22	120
81		4.9.3	MORDAZA 20 CM 4"	5 días	mié 16/02/22	mar 22/02/22	120
82		**4.10**	**RED DE GAS**	**7 días**	**sáb 05/02/22**	**dom 13/02/22**	
83		4.10.1	TUBERÍA COBRE GAS 1/2"	5 días	sáb 05/02/22	vie 11/02/22	108
84		4.10.2	TUBERÍA COBRE GAS 3/4"	5 días	sáb 05/02/22	vie 11/02/22	108
85		4.10.3	ACCESORIO COBRE GAS 1/2"	5 días	sáb 05/02/22	vie 11/02/22	108
86		4.10.4	ACCESORIO COBRE GAS 3/4"	5 días	sáb 05/02/22	vie 11/02/22	108
87		4.10.5	REGISTRO PARA GAS 1/2"	1 día	vie 11/02/22	sáb 12/02/22	86
88		4.10.6	REGULADOR DE UNICA ETAPA DE 20 m3/h	1 día	vie 11/02/22	sáb 12/02/22	86
89		4.10.7	MEDIDOR DE GAS (INCLUYE CARGO POR CONEXIÓN)	1 día	sáb 12/02/22	dom 13/02/22	87,88
90		4.10.8	DUCTO DE PARED SENCILLA CALIBRE 24 GALVANIZADO 20 X 10 cm	1 día	sáb 12/02/22	dom 13/02/22	87,88
91		4.10.9	REJILLAS PARA VENTILACIÓN GAS NATURAL 20 x 20 (NO INCLUYE INSTALACIÓN)	1 día	sáb 12/02/22	dom 13/02/22	87,88

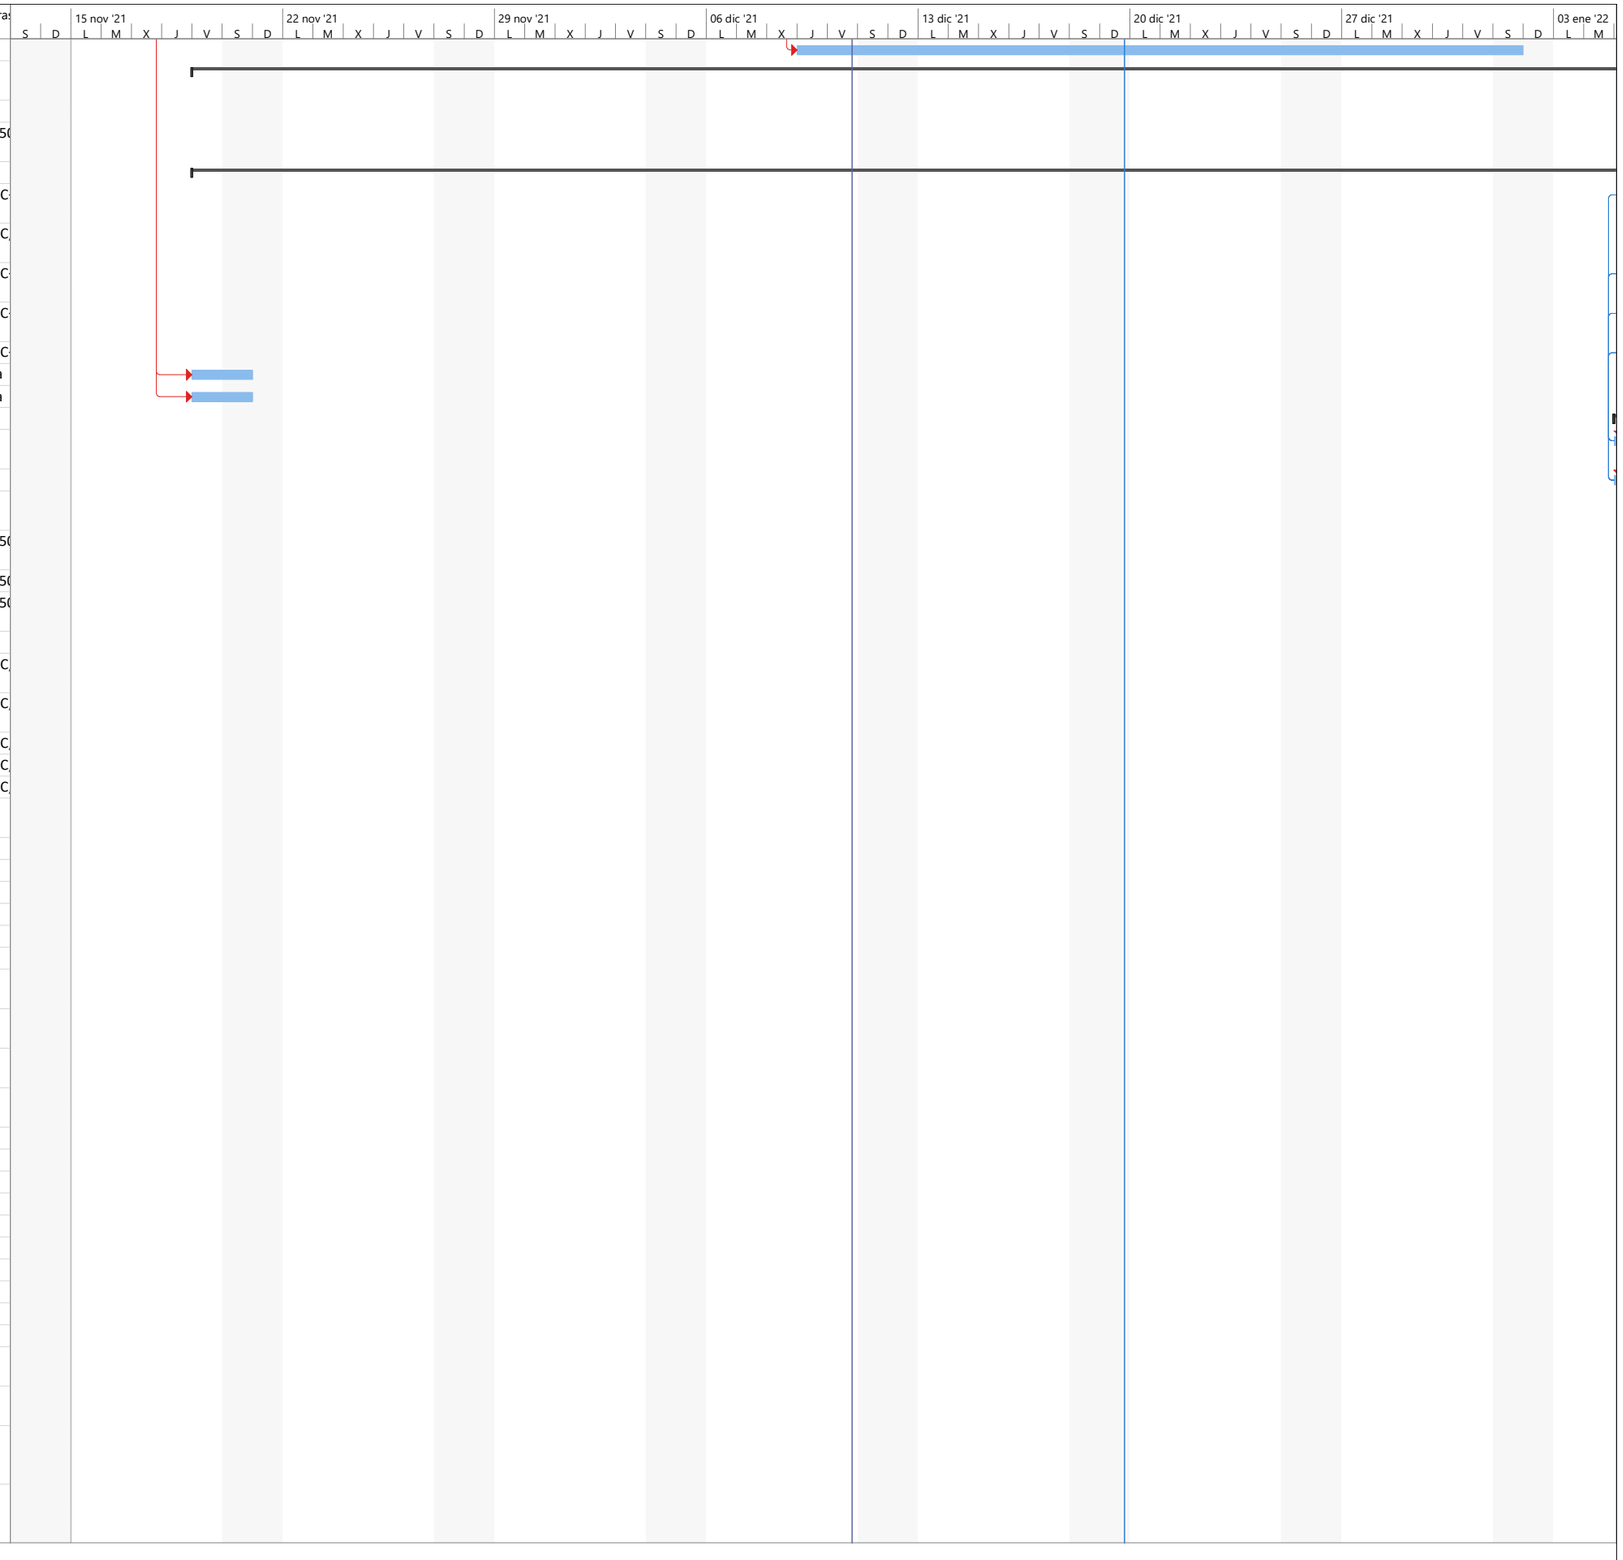

Proyecto: Cronograma Hogar IC
Fecha: jue 07/10/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Tareas críticas · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · División crítica
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Retrasada · Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
92		**4.11**	**PUNTOS DE GAS**	**1 día**	**lun 14/02/22**	**mar 15/02/22**	
93		4.11.1	PUNTO DE GAS ESTUFA 1/2" EN COBRE	1 día	lun 14/02/22	mar 15/02/22	89,90,91
94		**4.12**	**MONTAJE DE APARATOS DE GAS**	**1 día**	**mar 15/02/22**	**mié 16/02/22**	
95		4.12.1	MONTAJE ESTUFA	1 día	mar 15/02/22	mié 16/02/22	93
96		**4.13**	**OBRAS EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO**	**36 días**	**sáb 22/01/22**	**sáb 05/03/22**	
97		4.13.1	CAJAS DE INSPECCION AGUA RESIDUAL 60 cm X 60 cm	5 días	sáb 22/01/22	vie 28/01/22	75
98		4.13.2	CAJAS DE INSPECCION AGUA LLUVIA 60 cm X 60 cm	5 días	lun 28/02/22	sáb 05/03/22	77
99		**4.14**	**PRUEBAS DE INSTALACIONES Y OTROS**	**12 días**	**lun 17/01/22**	**dom 30/01/22**	
100		4.14.1	PRUEBA HIDROSTÁTICA	2 días	vie 28/01/22	dom 30/01/22	55,68,69,7(
101		4.14.2	PRUEBA HERMÉTICA	2 días	vie 28/01/22	dom 30/01/22	55,68,69,7(
102		4.14.3	TANQUE PLASTICO 500 LT	2 días	lun 17/01/22	mié 19/01/22	55,56
103		**5**	**EDIFICACIONES, ARQUITECTÓNICAS, CARPINTERÍA**	**60 días**	**lun 20/12/21**	**dom 27/02/22**	
104		**5.1**	**PISOS**	**20 días**	**vie 28/01/22**	**dom 20/02/22**	
105		5.1.1	AFINADO DE PISO	10 días	jue 03/02/22	mar 15/02/22	110CC+5 d
106		5.1.2	ACABADO DE PISO INSTITUCIONAL PORCELANATO ANTIDESLIZANTE	10 días	mié 09/02/22	dom 20/02/22	105CC+5 días
107		5.1.3	ACABADO DEL PISO INSTITUCIONAL LINEAL	10 días	mié 09/02/22	dom 20/02/22	105CC+5 días
108		5.1.4	CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)	7 días	vie 28/01/22	sáb 05/02/22	51,73
109		5.1.5	GUARDAESCOBA PISO INSTITUCIONAL CERAMICA 30 X 30	7 días	sáb 12/02/22	dom 20/02/22	107CC+3 días
110		5.1.6	PLACA CONTRAPISO E =0.15	10 días	vie 28/01/22	mié 09/02/22	40CC,119(
111		**5.2**	**MAMPOSTERÍA Y DIVISIONES**	**23 días**	**lun 20/12/21**	**sáb 15/01/22**	
112		5.2.1	MURO EXTERIORES EN LADRILLO	8 días	jue 06/01/22	sáb 15/01/22	113
113		5.2.2	MURO EN BLOQUE HUECO NO. 5 CON MORTERO PEGA 1:3	15 días	lun 20/12/21	jue 06/01/22	33CC,38CC días
114		**5.3**	**FRISOS ENCHAPES Y ACABADOS**	**20 días**	**sáb 25/12/21**	**mar 18/01/22**	
115		5.3.1	PAÑETE EN MORTERO E :1.5 CM	15 días	sáb 25/12/21	mié 12/01/22	113CC+5 d
116		5.3.2	ESTUCO SOBRE PAÑETE	15 días	vie 31/12/21	mar 18/01/22	115CC+5 d
117		**5.4**	**CUBIERTA**	**46 días**	**mié 05/01/22**	**dom 27/02/22**	
118		5.4.1	ESTRUCTURA METÁLICA CORREAS, CERCHAS.	35 días	mié 05/01/22	mar 15/02/22	33
119		5.4.2	CUBIERTA TERMOACUSTICA	21 días	sáb 22/01/22	mié 16/02/22	118CC+15
120		5.4.3	CUBIERTA TERMOACUSTICA TRASLUCIDA POLICABORNATO	21 días	sáb 22/01/22	mié 16/02/22	118CC+15 días
121		5.4.4	CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)	10 días	mié 16/02/22	dom 27/02/22	116,118,11
122		**5.5**	**PINTURA**	**13 días**	**lun 03/01/22**	**mar 18/01/22**	
123		5.5.1	PINTURA VINILO 3 MANOS PARA MUROS INTERIORES	6 días	lun 03/01/22	dom 09/01/22	116CC+2 días
124		5.5.2	PINTURA KORAZA PARA FACHADAS	7 días	lun 10/01/22	mar 18/01/22	112CC+3 días
125		5.5.3	PINTURA EPOXICA	7 días	lun 10/01/22	mar 18/01/22	112CC+3 d
126		**5.6**	**CARPINTERÍA**	**37 días**	**sáb 15/01/22**	**dom 27/02/22**	
127		5.6.1	PUERTA METALICA COLD ROLED C. 18, ANCHO 1.0 M, INCLUYE MARCO	3 días	lun 21/02/22	jue 24/02/22	123,106,10
128		5.6.2	PUERTA METALICA COLD ROLED C. 18,BAÑO ANCHO 0.75 M, INCLUYE MARCO	3 días	lun 21/02/22	jue 24/02/22	123,106,10
129		5.6.3	PUERTA METALICA COLD ROLED C. 18 BAÑO DISCPACITADOS ANCHO 1.5 M	3 días	lun 21/02/22	jue 24/02/22	123,106,10
130		5.6.4	PUERTA MADERA SALONES 0.8 M	3 días	lun 21/02/22	jue 24/02/22	123,106,10
131		5.6.5	CERRADURA PARA PUERTAS	3 días	jue 24/02/22	dom 27/02/22	130
132		5.6.6	BARANDAYPASAMANOSENTUBO2 " GALVANIZADO PARACIRCULACIONES EXTERIORES	1 día	lun 21/02/22	mar 22/02/22	123,106,10
133		5.6.7	VENTANA ALUMINIO	5 días	lun 21/02/22	sáb 26/02/22	123,106,10
134		5.6.8	PUERTA VENTANA ALUMINIO	5 días	lun 21/02/22	sáb 26/02/22	123,106,10

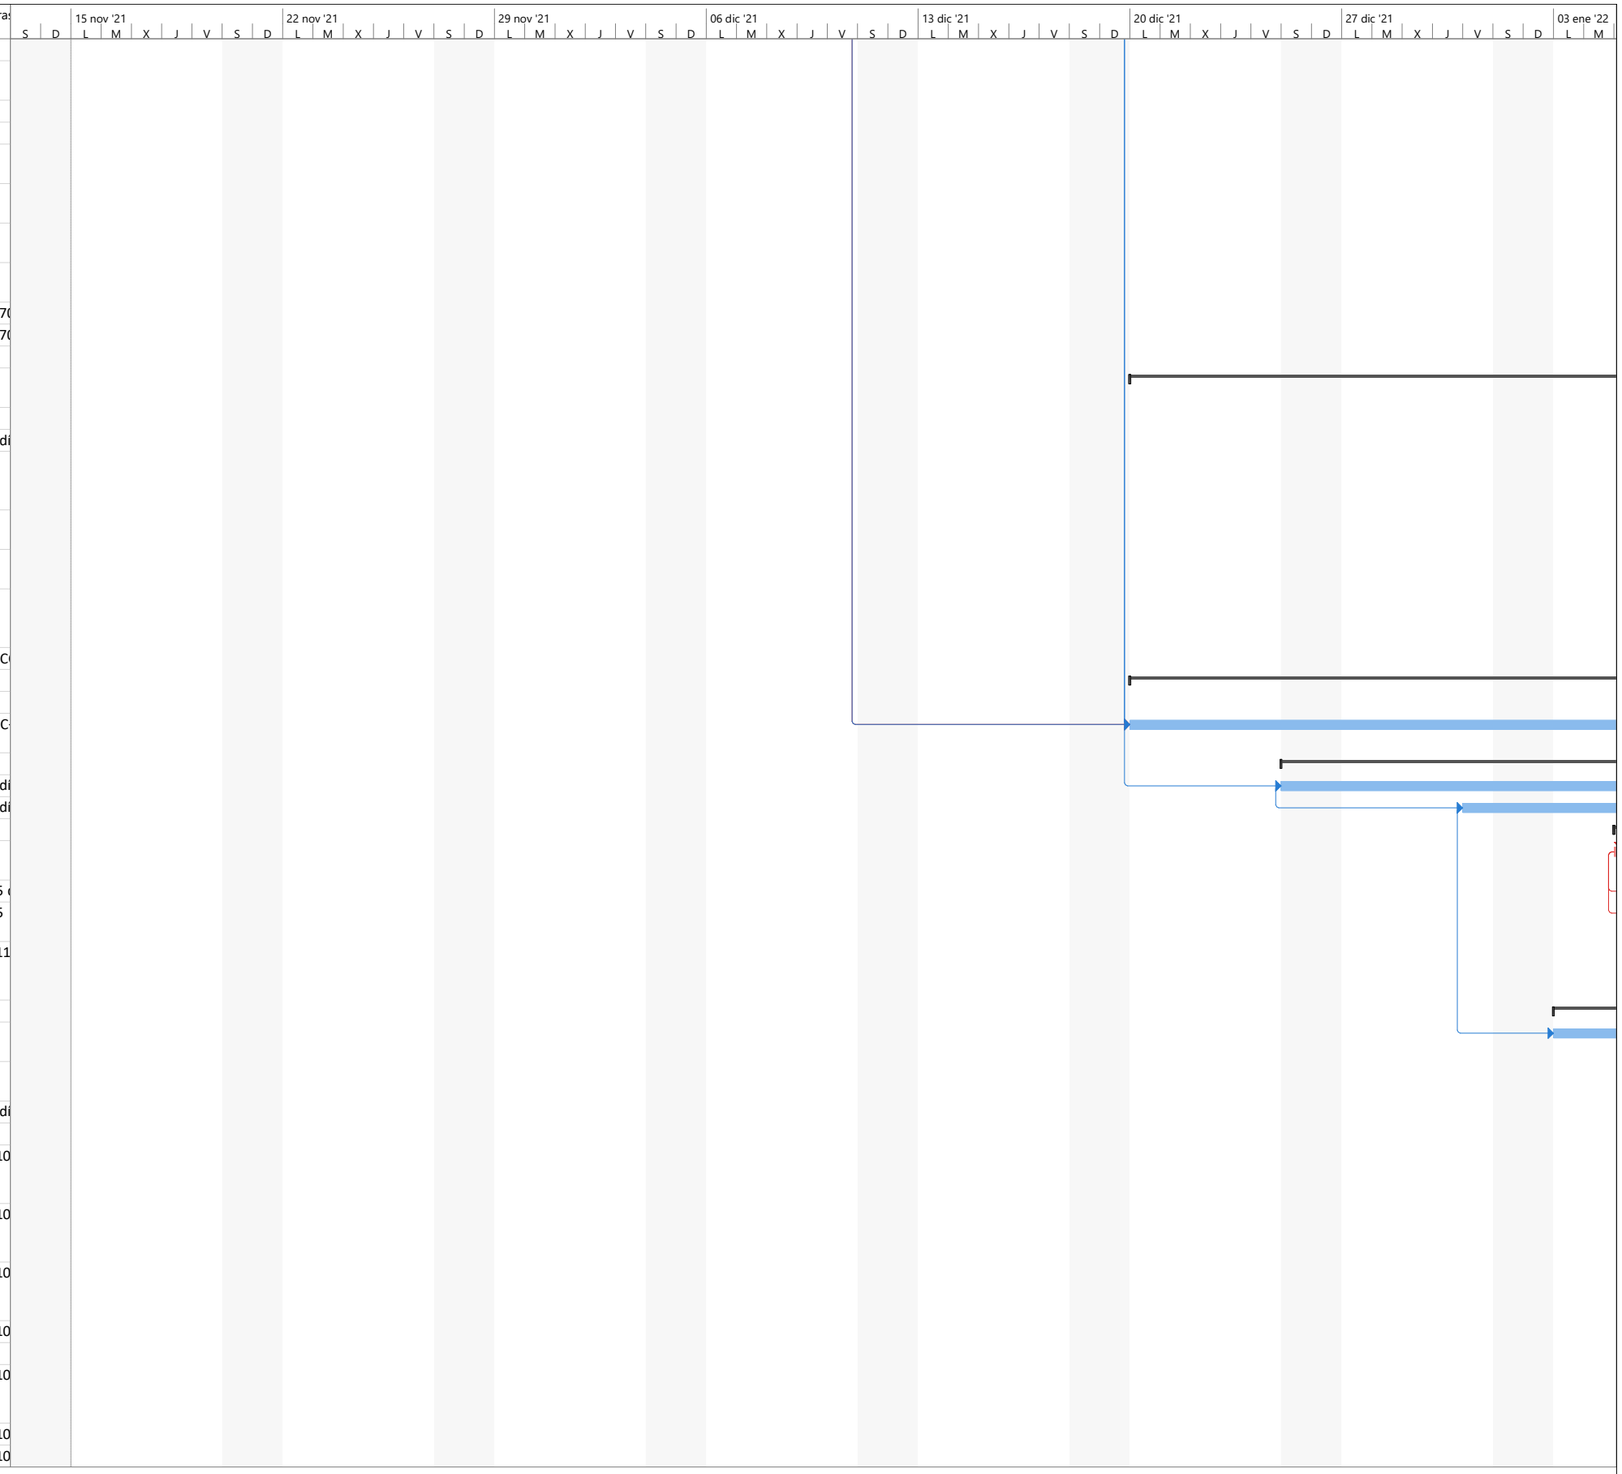

Proyecto: Cronograma Hogar IC
Fecha: jue 07/10/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Tareas críticas · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · División crítica
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Retrasada · Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
135		5.6.9	CERRAMIENTO EXTERIOR CON MODULOS EN TUBERIA H.G. DIAM=2" , CALIBRE 2 MM,CON TAPA SUPERIOR GALVANIZADA, MALLA ESLABONADA DE HUECO 2 " CALIBRE 10, MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" X 1/8" , PLATINA DE 1/2" X 1/8", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO, H= 2,0 M	15 días	sáb 15/01/22	mié 02/02/22	112
136		**5.7**	**EQUIPAMENTO Y OTROS**	**21 días**	**sáb 15/01/22**	**mié 09/02/22**	
137		5.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL DOS PIEZAS (INCLUYE ACCESORIOS)	3 días	sáb 05/02/22	mié 09/02/22	108
138		5.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA DE TANQUE (DOS PIEZAS) PARA ADULTO	3 días	sáb 05/02/22	mié 09/02/22	108
139		5.7.3	BARRA MESON CON LAVAMANOS (NO BATERIA) L: 80 CM ANCHO 60 CM	3 días	sáb 05/02/22	mié 09/02/22	108
140		5.7.4	BARRA MESON CON LAVAMANOS (BATERIA) L: 400 CM ANCHO 60 CM	3 días	sáb 05/02/22	mié 09/02/22	108
141		5.7.5	POCETA DE LAVADADO EN MAMAPOSTERIA ENCHAPADA	2 días	sáb 05/02/22	mar 08/02/22	108
142		5.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	3 días	sáb 05/02/22	mié 09/02/22	108
143		5.7.7	DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE C-20, E=300 CMS., ENTAMBORADA CON LAMINA C-20, ESTRUCTURA EN TUBO CUADRADO GALAVANIZADO	3 días	sáb 05/02/22	mié 09/02/22	108
144		5.7.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA TIPO TELÉFONO	1 día	sáb 05/02/22	dom 06/02/22	108
145		5.7.9	ADOQUIN ECOLOGICO	20 días	sáb 15/01/22	mar 08/02/22	112
146		**6**	**COMPONENTE ELÉCTRICO**	**66 días**	**mié 05/01/22**	**mié 23/03/22**	
147		**6.1**	**SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS EN EL PUNTO FIJO**	**3 días**	**lun 28/02/22**	**jue 03/03/22**	
148		6.1.1	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA	3 días	lun 28/02/22	jue 03/03/22	123,121
149		6.1.2	SALIDA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA DOBLE REGULADA	3 días	lun 28/02/22	jue 03/03/22	123,121
150		6.1.3	SALIDA TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA DOBLE TRIFASICA	3 días	lun 28/02/22	jue 03/03/22	123,121
151		**6.2**	**TUBERIA ELECTRICA**	**10 días**	**mié 05/01/22**	**dom 16/01/22**	
152		6.2.1	TUBERIA PVC 1/2 "	10 días	mié 05/01/22	dom 16/01/22	33
153		6.2.2	TUBERIA EMT 1 1/2"	10 días	mié 05/01/22	dom 16/01/22	33
154		6.2.3	TUBERIA EMT 3/4"	10 días	mié 05/01/22	dom 16/01/22	33
155		**6.3**	**ILUMINACION**	**14 días**	**lun 28/02/22**	**mié 16/03/22**	
156		6.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60 X 40	8 días	lun 28/02/22	mié 09/03/22	121,123,15
157		6.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA HALOGENA 17 W	5 días	mié 09/03/22	mar 15/03/22	156
158		6.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA HALOGENA 18 W	5 días	mié 09/03/22	mar 15/03/22	156
159		6.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCANDESCENTE ROSETA TECHO	3 días	lun 28/02/22	jue 03/03/22	121,123,15
160		6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCANDESCENTE ROSETA TIPO APLIQUE	3 días	lun 28/02/22	jue 03/03/22	121,123,15
161		6.3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMPARA DE EMERGENCIA 6W-12W	1 día	mar 15/03/22	mié 16/03/22	157,158
162		6.3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR MOVIMIENTO	1 día	mar 15/03/22	mié 16/03/22	157,158
163		6.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO	1 día	lun 28/02/22	mar 01/03/22	121,123,15
164		6.3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE	1 día	lun 28/02/22	mar 01/03/22	121,123,15
165		**6.4**	**SISTEMA CONTRA INCENDIOS**	**2 días**	**mié 16/03/22**	**vie 18/03/22**	
166		6.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO	2 días	mié 16/03/22	vie 18/03/22	161,162

Proyecto: Cronograma Hogar IC
Fecha: jue 07/10/21


Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Tareas críticas · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · División crítica
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Retrasada · Progreso

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
167		6.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR TERMICO	2 días	mié 16/03/22	vie 18/03/22	161,162
168		6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUZ ESTRABOSCOPICA Y SONORA	2 días	mié 16/03/22	vie 18/03/22	161,162
169		6.4.4	PANEL DE DETECCION DE INCENDIOS	2 días	mié 16/03/22	vie 18/03/22	161,162
170		**6.5**	**VOZ Y DATOS**	**2 días**	**vie 18/03/22**	**dom 20/03/22**	
171		6.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA BALA IP	2 días	vie 18/03/22	dom 20/03/22	166,167,16
172		6.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA DOMO ANTIBANDALICA	2 días	vie 18/03/22	dom 20/03/22	166,167,16
173		6.5.3	SUMINISTRO RACK 60 X 60	2 días	vie 18/03/22	dom 20/03/22	166,167,16
174		6.5.4	BANDEJA PORTACABLES MALLA	2 días	vie 18/03/22	dom 20/03/22	166,167,16
175		**6.6**	**CONDUCTORES**	**4 días**	**vie 18/03/22**	**mié 23/03/22**	
176		14	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	3 días	vie 18/03/22	mar 22/03/22	169
177		14.1	CABLE FPL 2X14	2 días	lun 21/03/22	mié 23/03/22	173
178		15	CABLE UTP	2 días	lun 21/03/22	mié 23/03/22	173
179		15.1	CABLE UTP 6A	2 días	lun 21/03/22	mié 23/03/22	173
180		0	FIN DEL PROYECTO	0 días	mié 23/03/22	mié 23/03/22	179




Proyecto: Cronograma Hogar IC
Fecha: jue 07/10/21

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · Tareas críticas · Progreso manual
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · División crítica
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Retrasada · Progreso

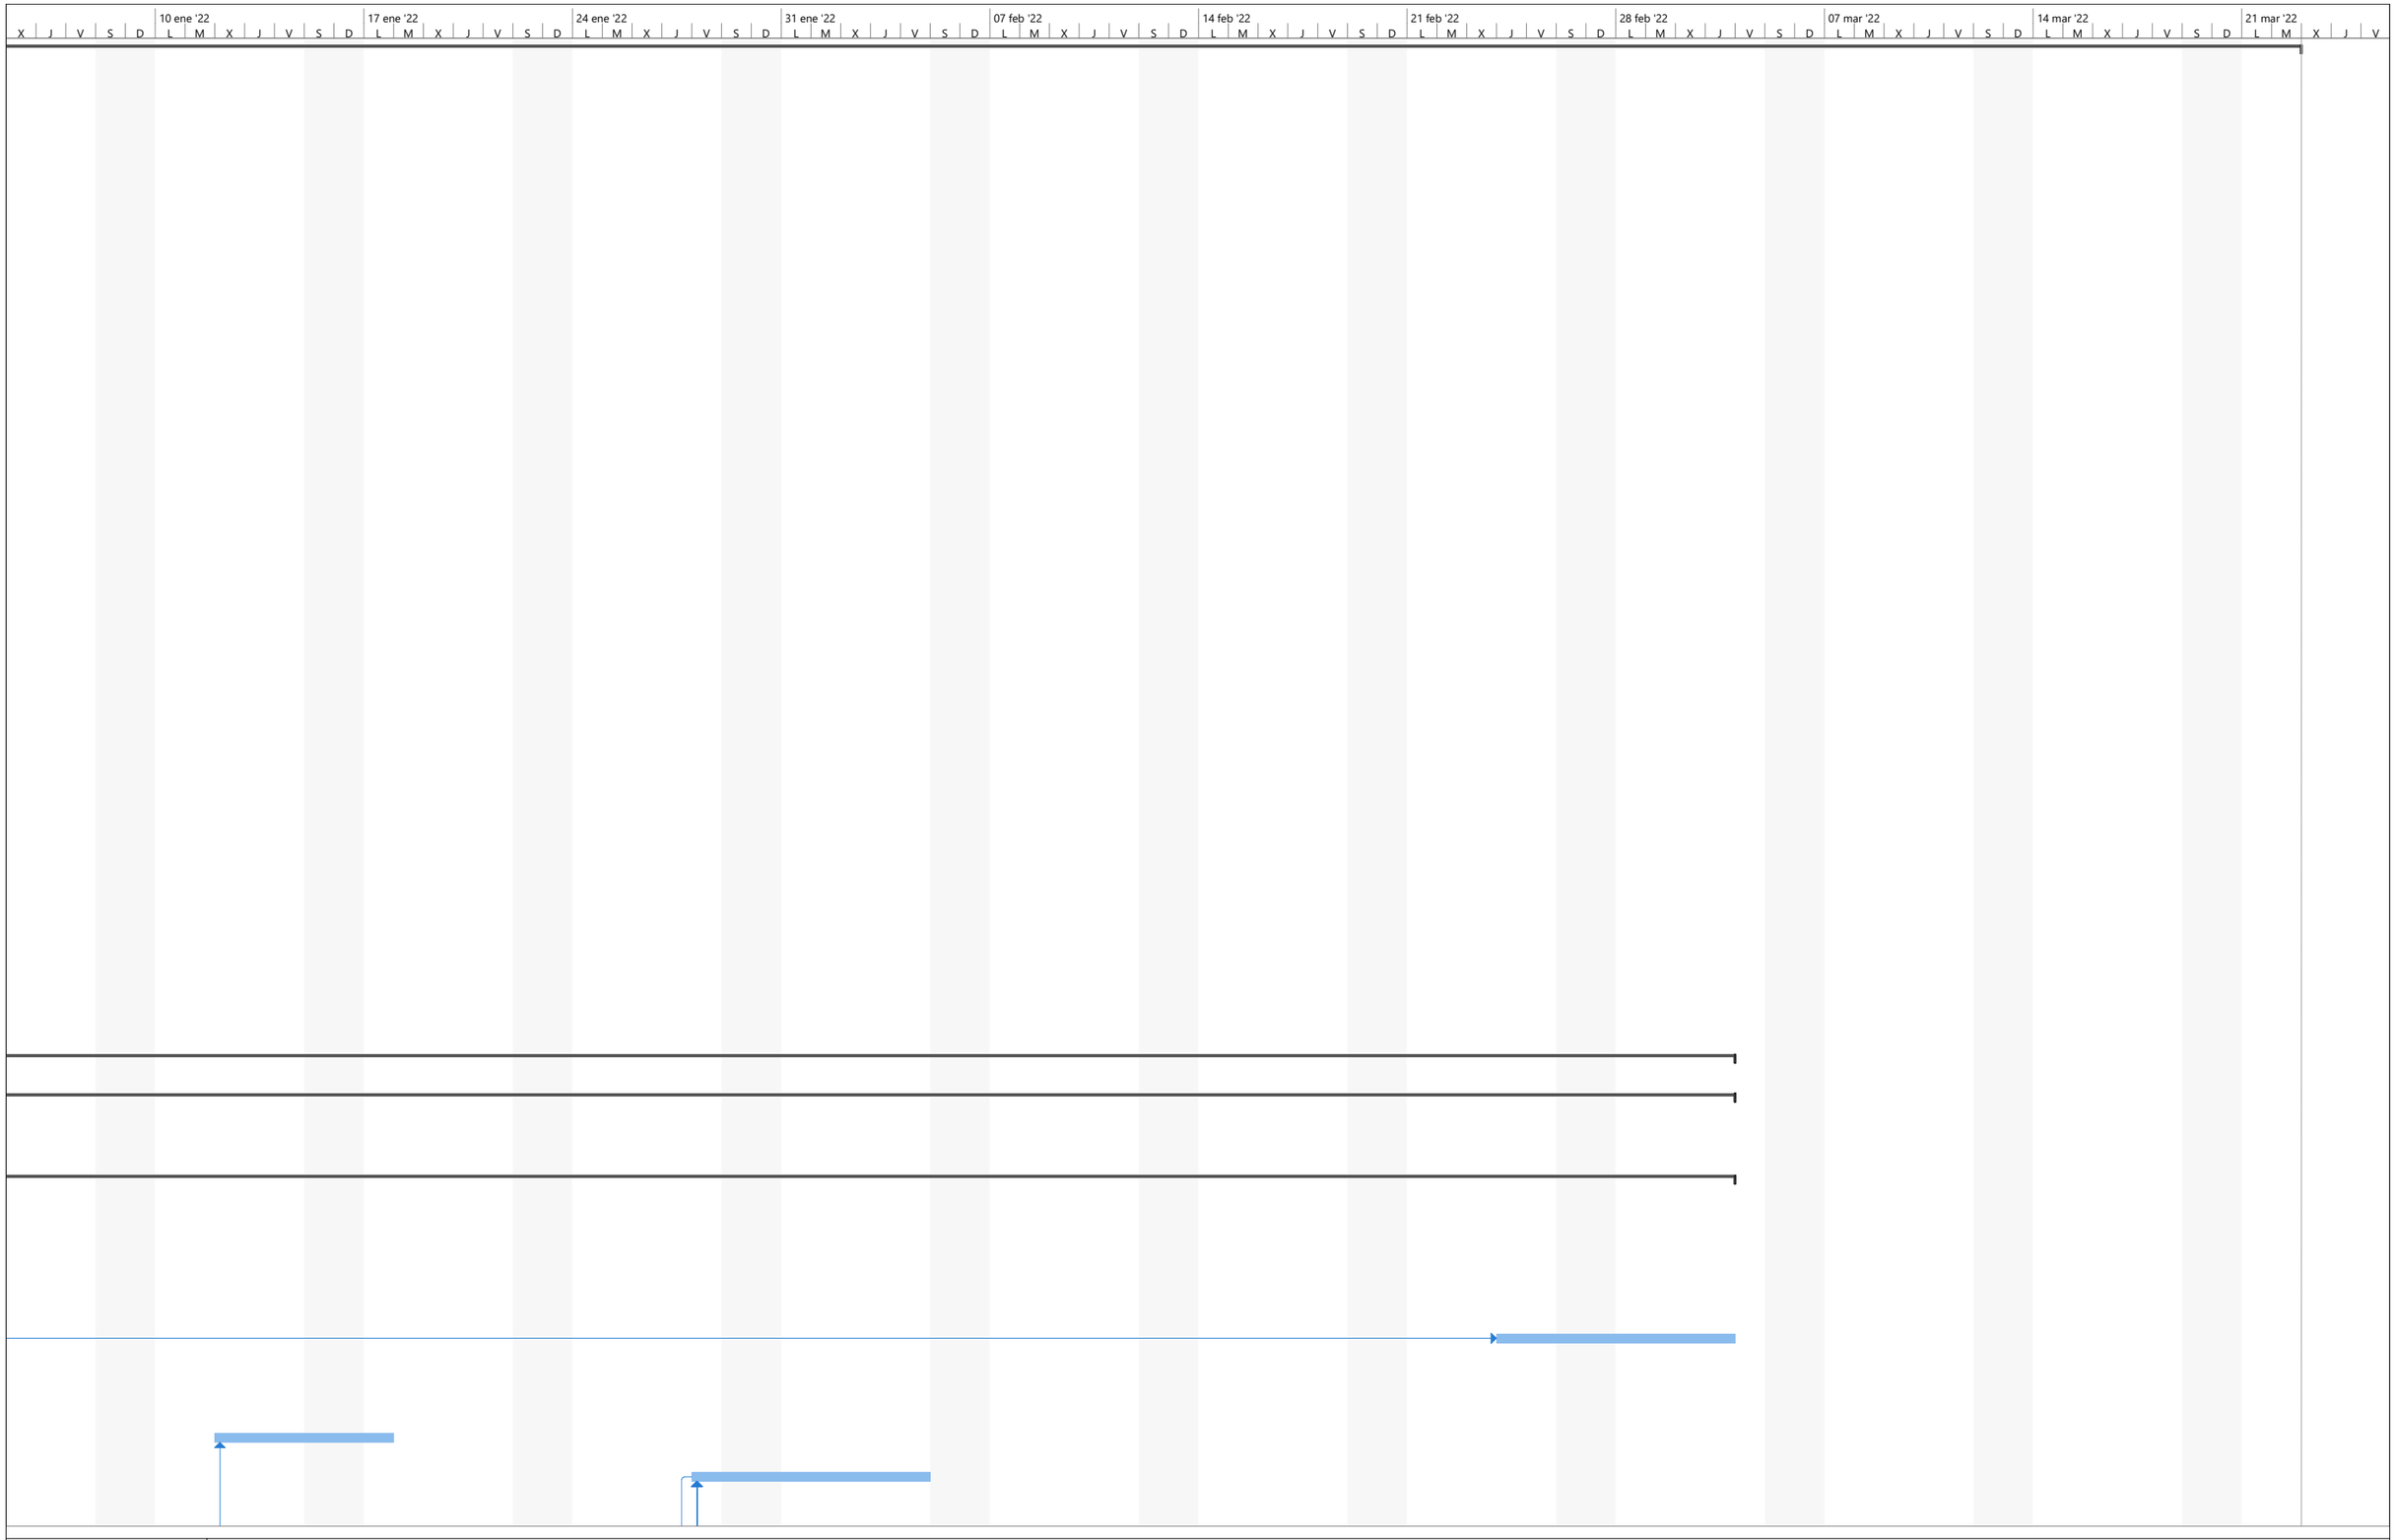


Proyecto: Cronograma Hogar IC
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Tareas críticas	Progreso manual		
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	División crítica			
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Retrasada	Progreso			

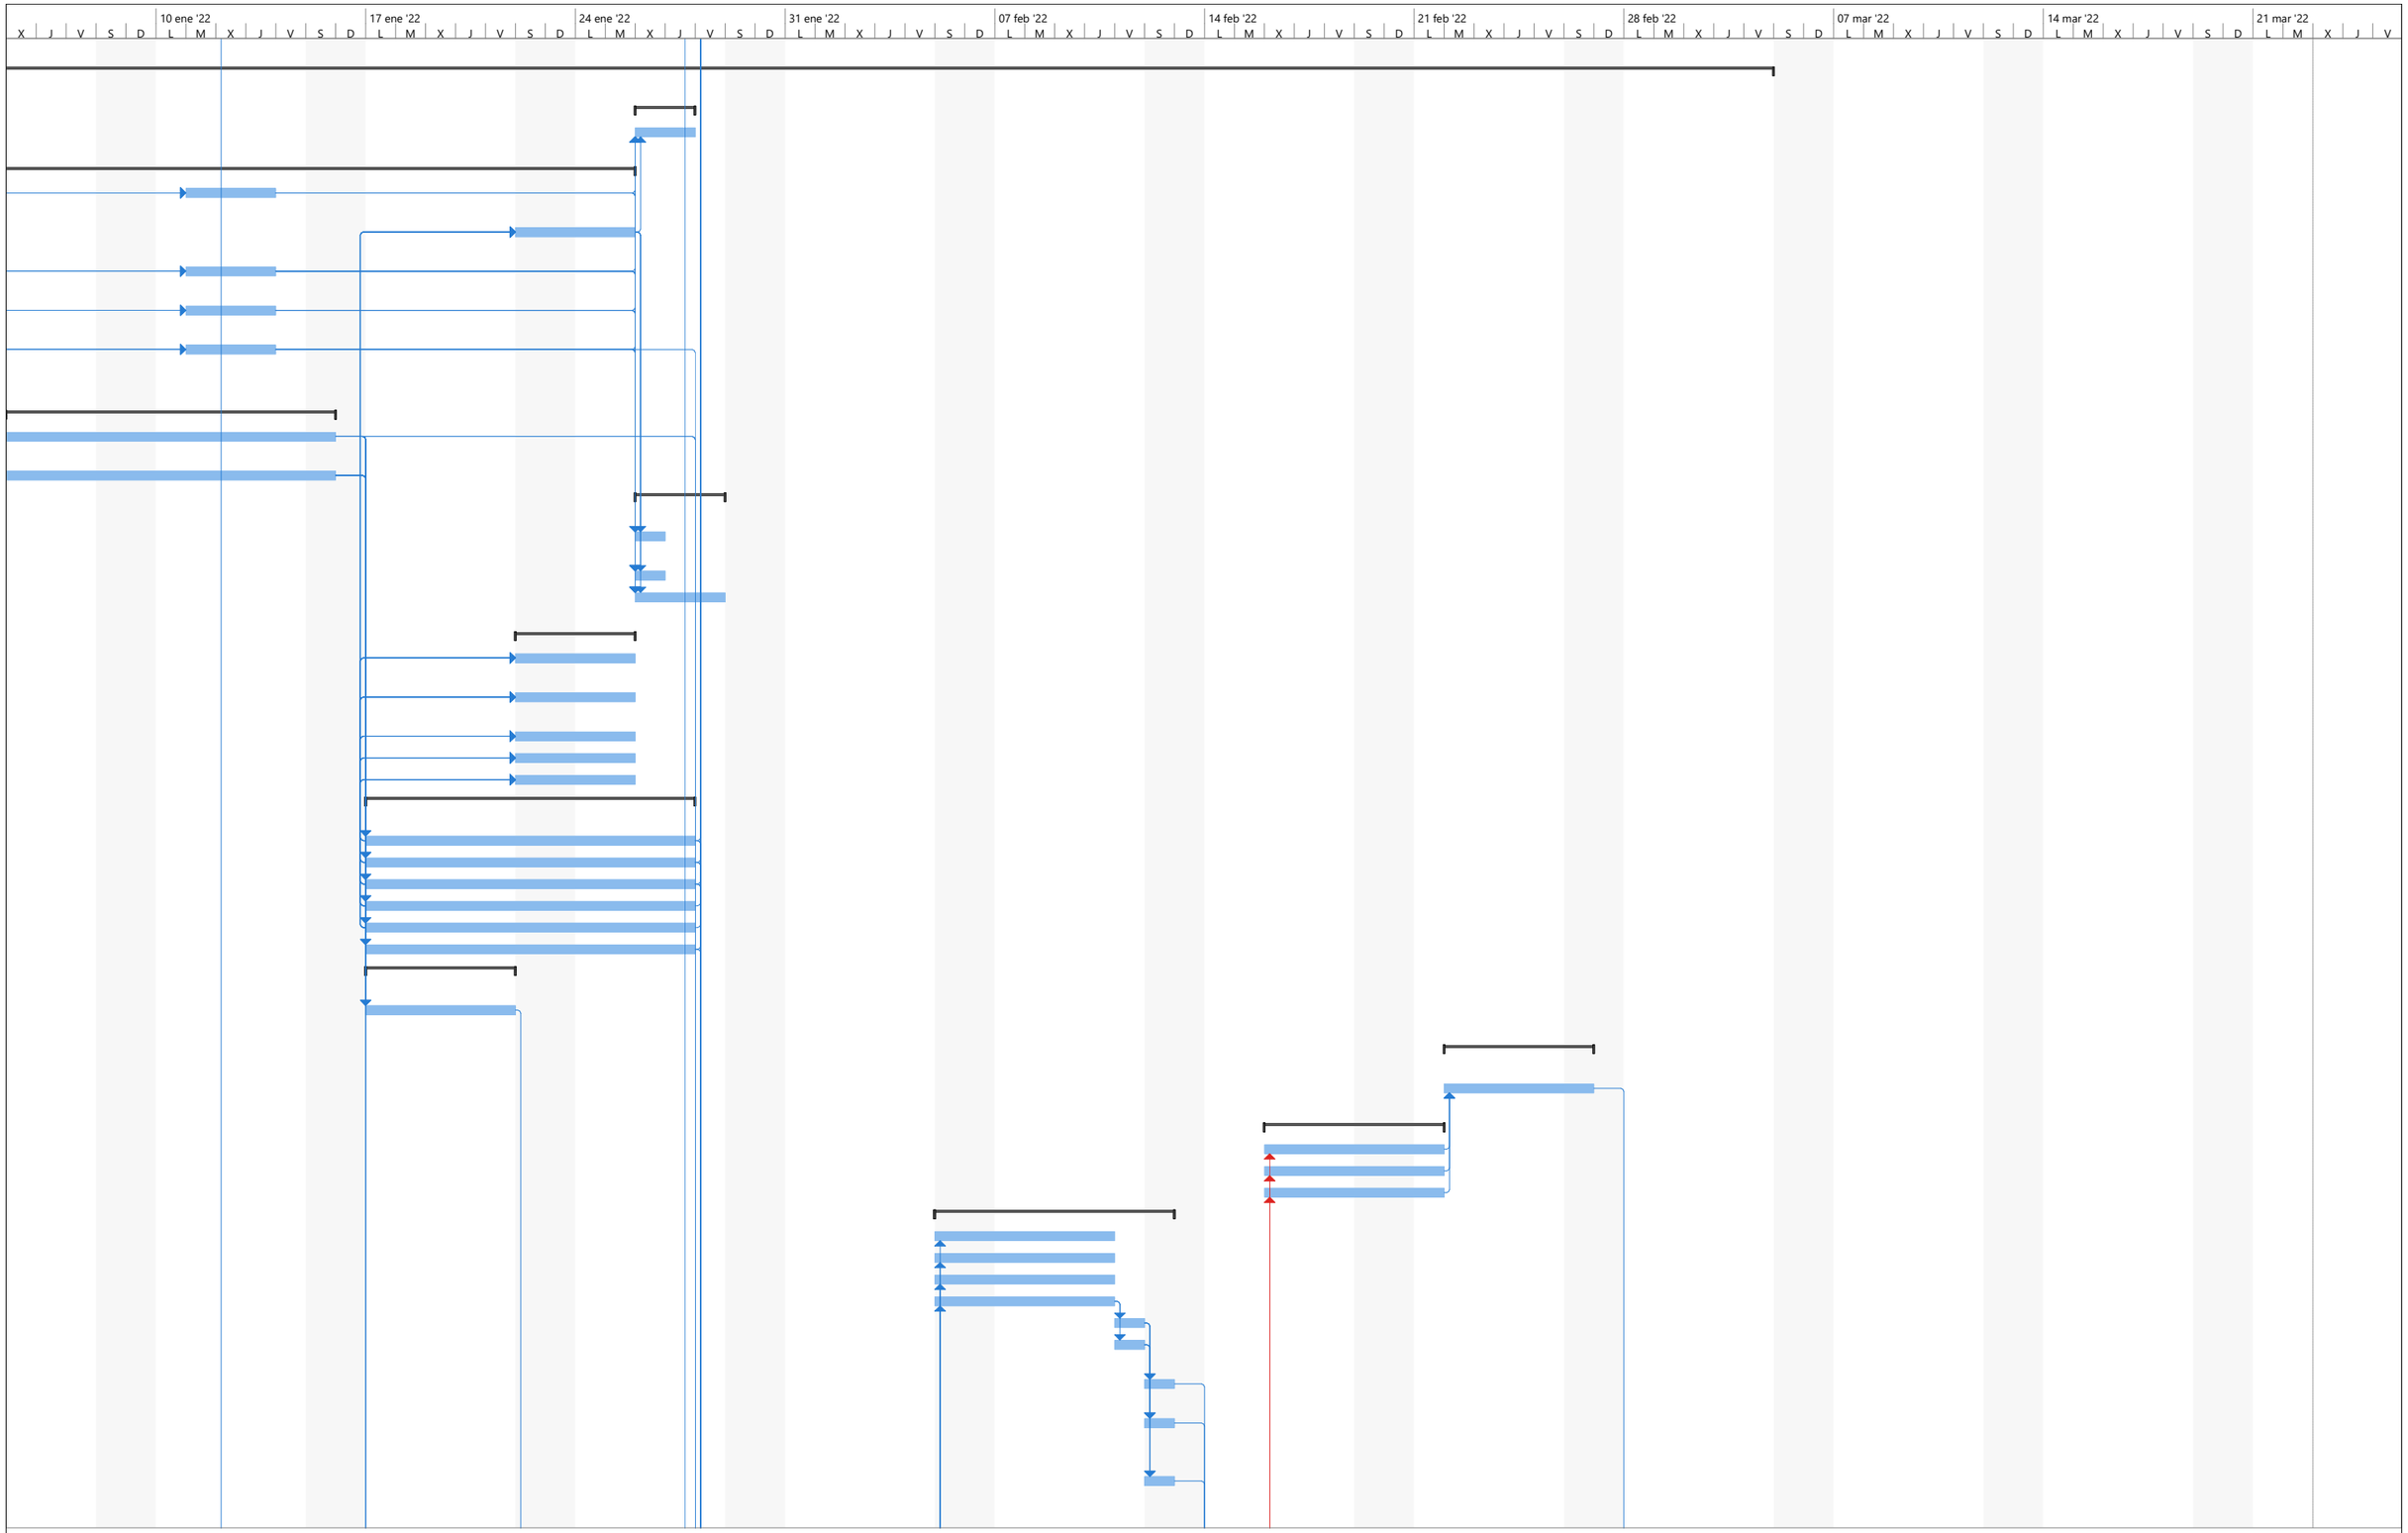


Proyecto: Cronograma Hogar IC
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Tareas críticas	Progreso manual		
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	División crítica			
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Retrasada	Progreso			

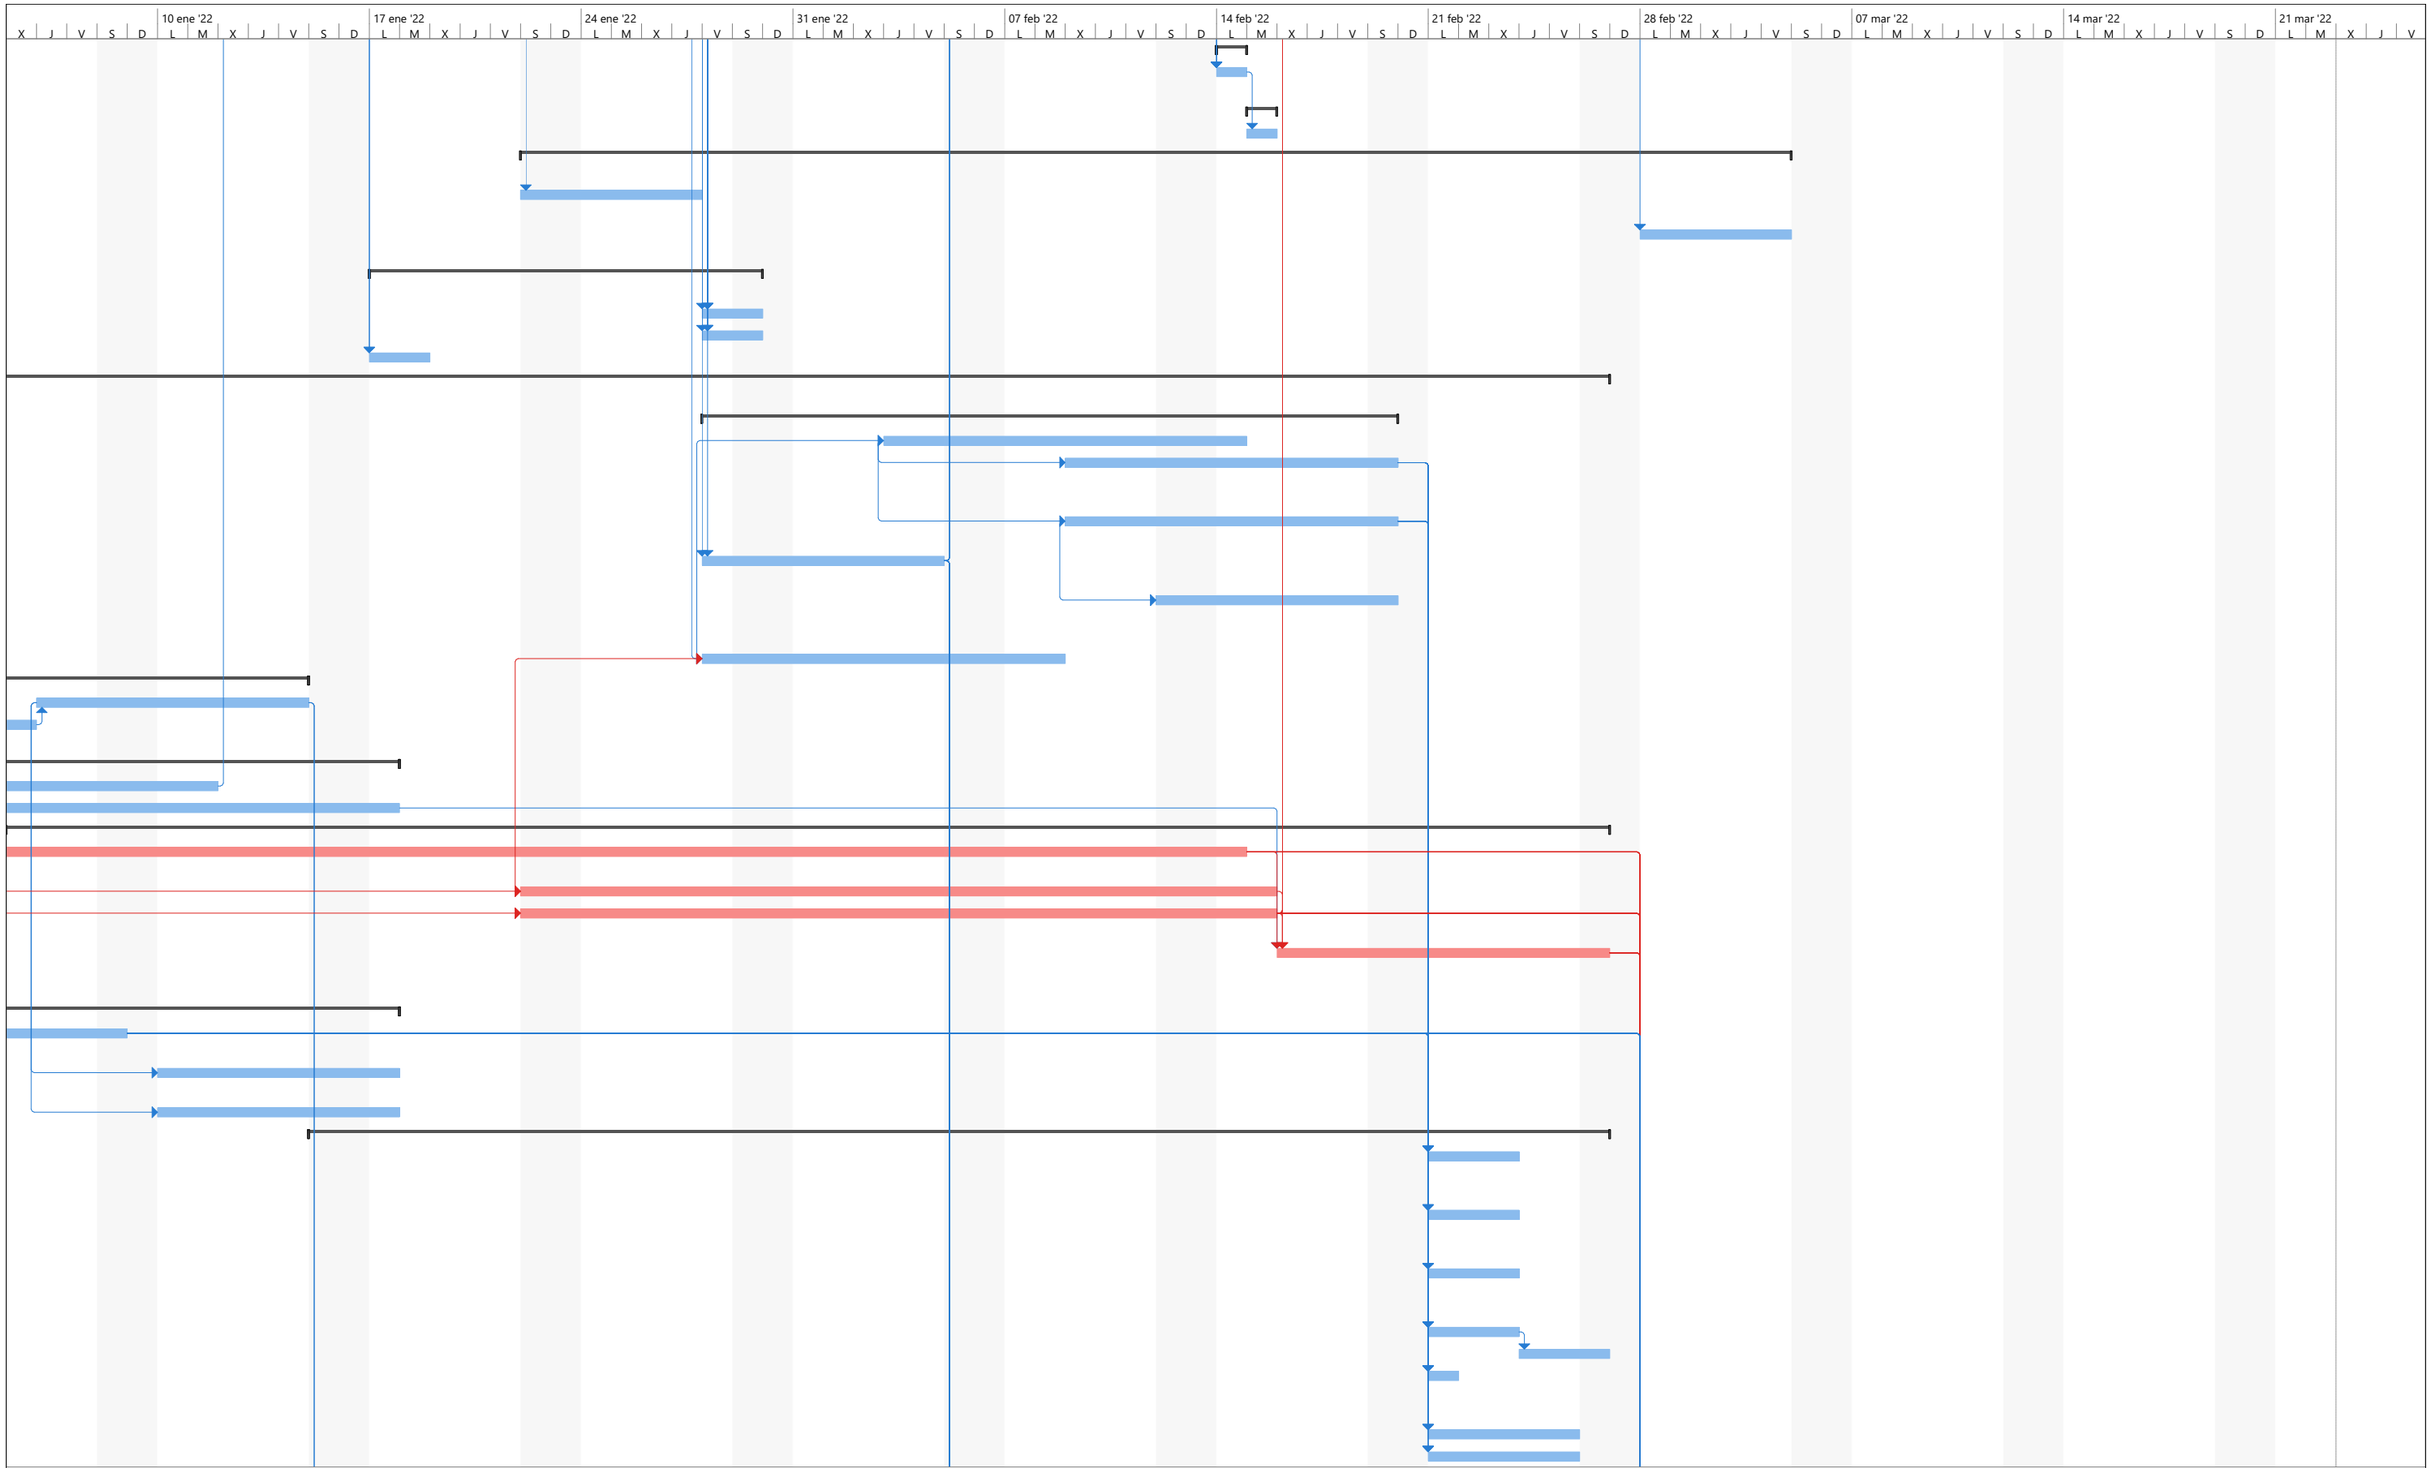

Proyecto: Cronograma Hogar IC
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Tareas críticas	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	División crítica	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Retrasada	Progreso	

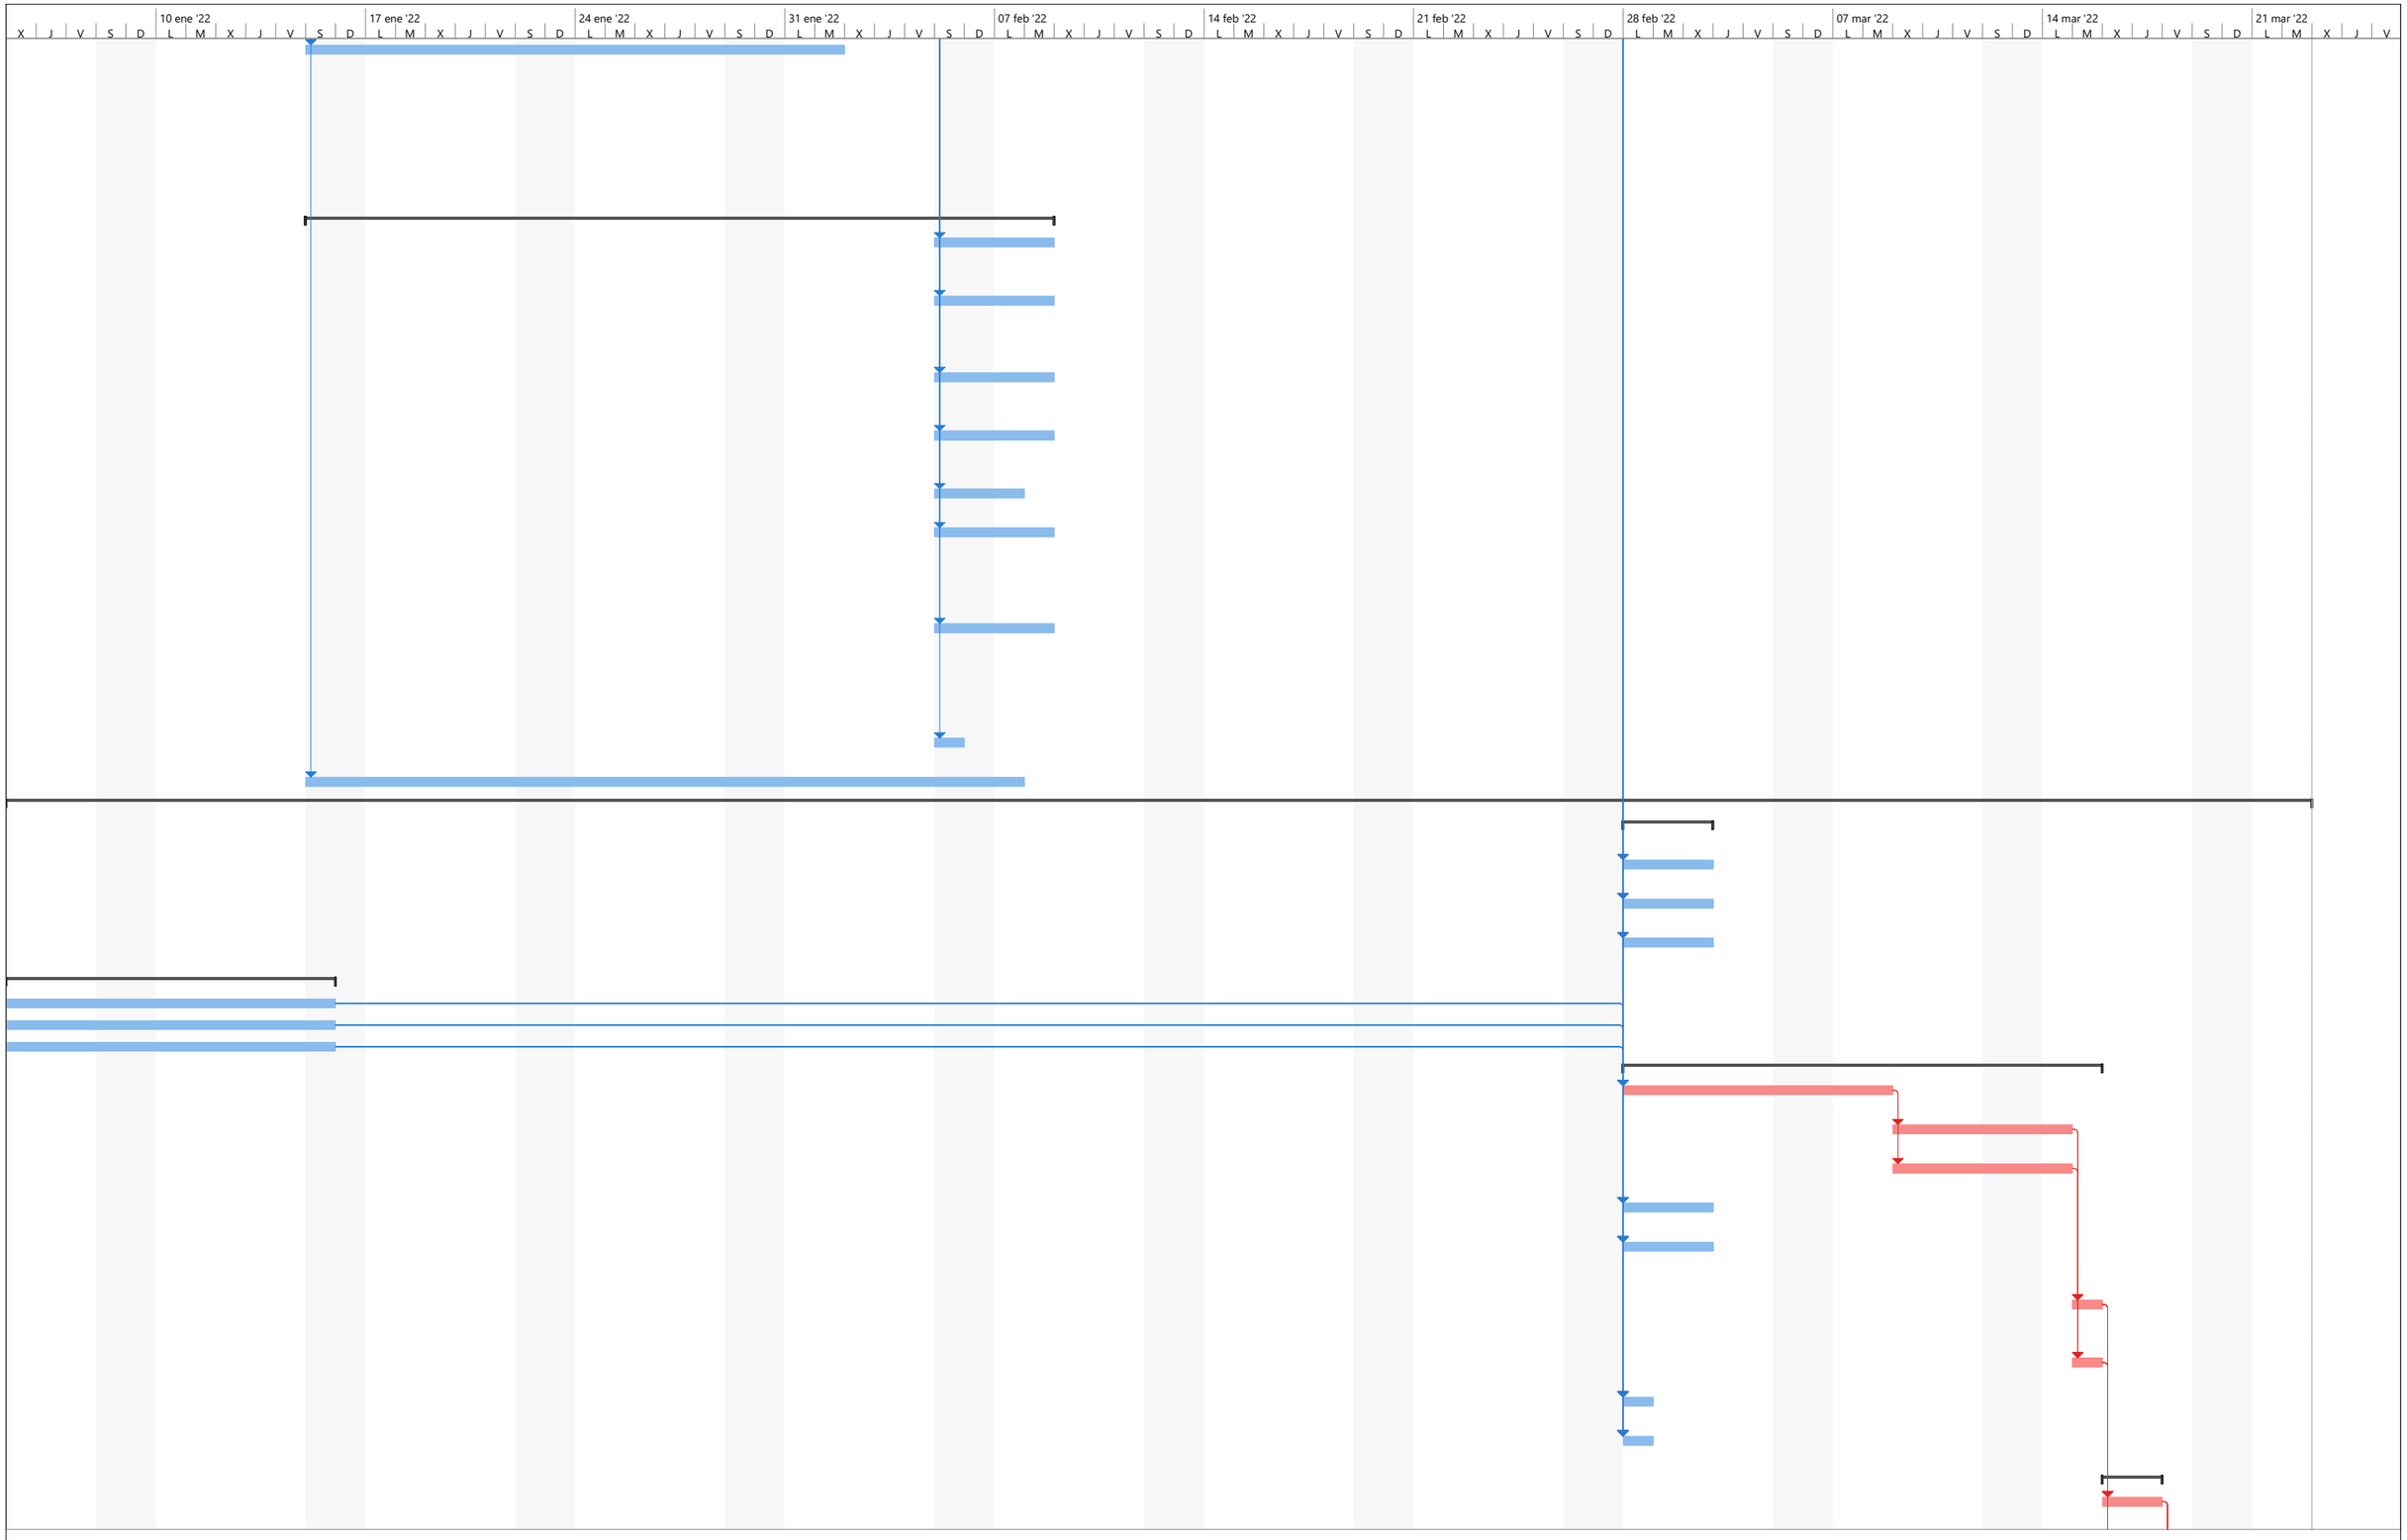

Proyecto: Cronograma Hogar IC
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Tareas críticas	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	División crítica
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Retrasada	Progreso



Proyecto: Cronograma Hogar IC
Fecha: jue 07/10/21

Tarea	Resumen	Hito inactivo	solo duración	solo el comienzo	Hito externo	Tareas críticas	Progreso manual
División	Resumen del proyecto	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	solo fin	Fecha límite	División crítica	
Hito	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Tareas externas	Retrasada	Progreso	
