Chiquinquirá, 24 de julio de 2023

Ingeniero
Javier Iván Barreto Pinto
ivan.barreto@boyaca.gov.co
Supervisor Contrato de interventoría

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1655 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA."

Asunto: REMISIÓN DEL INFORME MENSUAL No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1655.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta las obligaciones del contrato No. 1655 de 2023 de presentar informes mensuales, el objeto del contrato de realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental al contrato de obra pública 1614 de 2023, y en atención a las obligaciones de CONSORCIO INTER PUENTE 2023 como interventoría del contrato citado en el asunto, a continuación, se relaciona EL INFORME 2 donde se adjunta la documentación al presente informe:

- Formato informe 2
- Informe general de interventoría
- Planillas de seguridad social del personal de obra e interventoria
- Cronograma de Obra.

Cordialmente:

CONSORCIO INTER PUENTE 2023
Rep. Legal JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
C.C.1.010.200.976.

BOYACÁ GRANDE GOBERNACION DE BOYACA
SECRETARIA CONTRATACION
TRAMITADO
CARLOS SEBASTIAN APONTE ORTÍZ
FECHA 07/06/2024

GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		FECHA: 24/Jul/2019

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	2	FECHA:	29	de	JUNIO	de	2023

PERIODO:	DEL	26	de	MAYO	de	2023	AL	25	de	JUNIO	de	2023

CONTRATO No:	1614	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	N/A

OBJETO:

DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

LOCALIZACION:

Departamento de Boyacá (vía secundaria que comunica a los municipios de Tibaná y Chinavita, a la altura de la vereda Sisa del municipio de Úmbita)

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

MEJORES VIAS PARA BOYACA QUE AVANZA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS	**ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R/L JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO	**JAVIER IVÁN BARRETO PINTO**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
N/A	N/A		N/A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

VALOR INICIAL:	$ 1.028.027.036,00	VALOR ADICIONALES:	$ 0,00	VALOR TOTAL:	$ 1.028.027.036,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL OBRA (Según prorrogas y suspensiones)	25	de	AGOSTO	de	**2023**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL INTER(Según prorrogas y suspensiones)	25	de	AGOSTO	de	**2023**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**49,6%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**11,6%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**29,6%**



GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

No PÓLIZA	14-44-101178193	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							17	4	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	3	2023	16	11	2023	$ 154.204.055,40
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	3	2023	16	7	2026	$ 154.204.055,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	16	7	2023	16	7	2028	$ 205.605.407,20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	3	3	2023	16	7	2023	$ 308.408.110,80

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	14-40-101053978	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							17	4	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	16	3	2023	16	7	2023	$ 232.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	16	3	2023	16	7	2023	$ 232.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	16	3	2023	16	7	2023	$ 232.000.000,00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR	X	MALO		PÉSIMO	

Descripción: Conforme a lo programado en el cronograma vigente para el periodo comprendido entre el 26 de mayo al 25 de junio de 2023, Se presentan atrasos atribuibles al contratista de obra, han cambiado las condiciones climáticas en presencia de lluvias intensas, situación que genera atrasos en las actividades de Obra.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	26	4	2023

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Actividades de demarcación, señalización conforme a lo descrito en el plan de manejo tránsito.	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita
Replanteamientos topográficos, fijación y localización de puntos de referencia para inicio de excavaciones.	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita
Visita de seguimiento por los especialistas estructural y el especialista en geotecnia para corroborar que los ejes de cimentaciónes estén acordes a lo plasmado en los diseños.	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita
Excavaciones Mecanicas varias en material comun seco.	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita
Suministro figurada y amarre de acero 60000 psi 420 mpa. En Estribo No. 2	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita

Fundida en concreto de primera etapa de cimentacion en Estribo No. 2	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita
Suministro, fabricación, corte, ensamblaje y montaje de estructura metálica	Cra. 12C #55a - 48 Barrio Tunjuelito

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Elaboración de informe mensual	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita
Elaboración de informes semanales	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita
Seguimiento al cronograma de actividades de obra	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita
Seguimiento de las condiciones climáticas	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita
Diligenciamiento de la bitácora de obra	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita
Asistencia y elaboración de comités de obra donde se realizará la revisión técnica del proyecto junto al contratista de obra y supervisor.	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita
Asistencia en la planta de fabricación de corte y ensamble de la estructura metalica	Cra. 12C #55a - 48 Barrio Tunjuelito
Recorrido para revisión y chequeos del diseño de cimentación	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita
Solicitud al conratista mediante comunicado C.I.P-1655-021 con relación a certificados de calidad de los materiales (Acero Figurado).	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Estación Total TOPCON Modelo GTS – 246NW	Replanteo Topográfico	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
Nivel Topográfico Colimador Marca SOUTH Modelo LF – 3B	Nivelación - Translado de puntos de referencia	15%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
Retro excavadora CAT 416E	Descapote, excavación superficial	5%	requeridos
Retro excavadora Oruga KOMATSU PC130.	Excavación Profunda	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
Apisonador (canguro) MASALTA MR70H,	Compactación de Base estribo No. 2	5%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
Martillo HILTI 3000	Demoledor de Roca profunda en estribo No. 1	15%	Cumple con los requisitos minimos requeridos

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
Acero Figurado.	FIGURADOS Y MALLAS JB S.A.S.	Acero Grado 420 sismorresistente cumpliendo con la norma técnica colombiana NTC 2289
Concreto	HOLCIM COLOMBIA SA	Cocreto de 4000 psi tipo INVIAS
Material Comun del Sitio.	N.A	Se utilizo Recebo del afirmado de la via, que cumple con las condiciones como material de relleno.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
Nivel Topográfico Colimador Marca SOUTH Modelo LF – 3B	Nivelación, Traslado de puntos de referencia	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO	24	5	2023	$ 308.408.110,80
ACTA PARCIAL No. 1				
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**N/A**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
DESCRIPCIÓN	FECHA			VALOR
ANTICIPO				N/A
ACTA PARCIAL No. 1				
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS				**N/A**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
26/05/2023	Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	ENTREGA VALLA INFORMATIVA Y SOLICITUD DE APROBACIÓN	ENVIADO VIA CORREO
26/05/2023	Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	ENTREGA Y VISTO BUENO AL ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA	ENVIADO VIA CORREO
26/05/2023	Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	ENTREGA Y VISTO BUENO AL ESTUDIOS HIDRAULICOS E HIDROLOGICOS	ENVIADO VIA CORREO
26/05/2023	Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	ENTREGA Y VISTO BUENO AL COMPONENTE FINANCIERO	ENVIADO VIA CORREO
29/05/2023	Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	ENTREGA VALLA INFORMATIVA Y SOLICITUD DE APROBACIÓN	ENVIADO VIA CORREO
30/05/2023	Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL PROCESO DE DEMOLICIÓN DEL PUENTE SISA	ENVIADO VIA CORREO

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

6/06/2023	Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE	ENVIADO VIA CORREO
14/06/2023	David Ferney Velosa H secretario de Planeación, Infraestructura y Desempeño	SOLICITUD PLAN DE MANEJO DE RIESGOS AL CONTRATO DE OBRA	ENVIADO VIA CORREO
16/06/2023	Isduar Humberto Páez Ramos Contratista de obra. CC Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de	SOLICITUD CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL ACERO Y SOLICITUD DE AJUSTE AL CRONOGRAMA DE	ENVIADO VIA CORREO
20/06/2023	Isduar Humberto Páez Ramos Contratista de obra. CC Javier Iván Barreto Pinto	CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL	ENVIADO VIA CORREO

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS	4.158.923	X	X	X	26	5	2023	25	6	2023
CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	74.373.208	X	X	X	26	5	2023	25	6	2023
JIMMY VERGARA SILVA	74.321.878	X	X	X	26	5	2023	25	6	2023
VICTOR MANUEL CAMACHO	9.658.759	X	X	X	26	5	2023	25	6	2023
CRUZ ANGELICA LOZANO VELASQUEZ	39.427.037	X	X	X	26	5	2023	25	6	2023
NELSON ODENS MORA FRANCO	18.386.964	X	X	X	26	5	2023	25	6	2023
JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	1.010.200.976	X	X	X	26	5	2023	25	6	2023
HERNAN PLAZAS SOLER	79.709.927	X	X	X	26	5	2023	25	6	2023
EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO	9.398.385	X	X	X	26	5	2023	25	6	2023

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	X	NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DORECTOR DE OBRA	ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS	4.158.923
RESIDENTE DE OBRA	CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	74.373.208
ASESOR EN GEOTECNIA	JIMMY VERGARA SILVA	74.321.878
ASESOR HIDRAULICO O HIDROLOGICO	VICTOR MANUEL CAMACHO	9.658.759
HSEQ	CRUZ ANGELICA LOZANO VELASQUEZ	39.427.037

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	NELSON ODENS MORA FRANCO	18.386.964
INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	1.010.200.976
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	HERNAN PLAZAS SOLER	79.709.927
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO	9.398.385

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
El contratista ha realizado entrega de documentación solicitada por Corpochivor para la dar tramite y aprobacion del permiso de ocupacion del cauce.	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Se ha remitido la documentacion necesaria a corpochivor para la aprobación del permiso de Ocupacion del cauce a la fecha se espera la respuesta por parte de la entidad.	Puente Sisa Vereda Juncal - Umbita

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
N/A				N/A

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
N/A				N/A

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
Acero Grado 420	FIGURADOS Y MALLAS JB S.A.S.	82	Material que cumple con la norma tecnica colombiana NTC. 2289

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Acta de Comité de Obra No 3	29	5	2023	Se reunierón el contratista de obra y el contratista interventoria y el supervisor Ing. Javier Ivan Barreto en las oficinas de la gobernacion para solicitar el visto bueno de los estudios y diseños.
Acta de Comité de Obra No 4	1	6	2023	Se reunierón el contratista de obra y el contratista interventoria y el supervisor Ing. Javier Ivan Barreto en la Obra, donde se pacta el inicio de las actividades
Acta de Comité de Obra No 5	16	6	2023	Se realiza visita de parte del Ing. Supervisior Javier Ivan Barreto, el contratista de Obra. Ing Isduar Ramos, donde expone los avances del contrato de obra.

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 0.							Informe previo al acta de inicio
Informe de Interventoría No. 1.	26	4	2023	25	5	2023	Informe referente a la etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 2.	26	5	2023	25	6	2023	Informe de Actividades de Obra ejecutadas

OBSERVACIONES:

El presente informe No. 2 comprendido entre el 26 de mayo al 25 de junio de 2023 expone la ejecución de las actividades de obra dando cumplimiento al Manual de Supervisión e Interventoría de la Gobernación de Boyacá vigente.


GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	SI	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	SI	
Amortización del anticipo	SI	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	SI	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	NO	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	SI	
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	SI	
Memorias y planos de diseño aprobados	SI	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	SI	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	SI	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	YA SE RADICO	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	SI	
Generales		
Registro fotográfico	SI	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:



Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE:	CONSORCIO INTER PUENTE 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATO: No. 1655 DE 2023

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"

INTERVENTOR: CONSORCIO INTER PUENTE 2023
R/L JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO

INFORME 2

BOYACA – JUO 2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1 Localización 4
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 5
3.1 Información general del contrato 5
3.2 Alcance e impacto del proyecto 5
3.3 Proceso Contractual 6
3.4 Estado financiero del Contrato de obra 7
3.5 Seguimiento a las garantías contractuales 7
3.6 Relación de personal del Contrato de Obra. 10
3.7 Resumen de las actividades que ejecutó el contratista de obra 11
3.8 Avance mensual 20
3.9 Maquinaria, Pruebas y ensayos de laboratorio 21
3.10 Plan de Calidad Obra 21
4. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 22
4.1 Información general del contrato. 22
4.2 Proceso Contractual 22
4.3 Estado financiero del contrato de interventoría 23
4.5 Seguimiento de las garantías contractuales 24
4.6 Relación de personal de Interventoría 25
4.7 Descripción de las actividades que realizó la interventoría: 26
5. CORRESPONDENCIA 31
5.1 Correspondencia Enviada 31
5.2 Correspondencia Recibida 32
6. CONCLUSIONES 34
7. ANEXOS 34

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las obligaciones del contrato No. 1655 de 2023 de presentar informes mensuales, el objeto del contrato de realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental al contrato de obra pública 1614 de 2023, y las obligaciones generales de realizar un reconocimiento técnico y detallado del contrato actual. En el presente informe se describe el control y seguimiento que se realizará durante el plazo contractual, con el fin de cumplir el objeto previsto en el alcance.


El documento se desarrolla de la siguiente manera: En primer lugar, se describe la localización del proyecto, estado inicial del sitio de implantación, así como las características técnicas del proyecto desde el punto de vista arquitectónico y estructural.

Posteriormente, se presenta la información general del contrato de obra, que incluye el presupuesto inicial, las garantías contractuales, la descripción de las actividades que se van a ejecutar. De igual manera se presenta la información del contrato de interventoría con las mismas especificaciones.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Localización

El proyecto se desarrolla en el Departamento de Boyacá. El puente Sisa se ubica sobre la vía secundaria que comunica a los municipios de Tibaná y Chinavita, a la altura de la vereda Sisa del municipio de Úmbita.

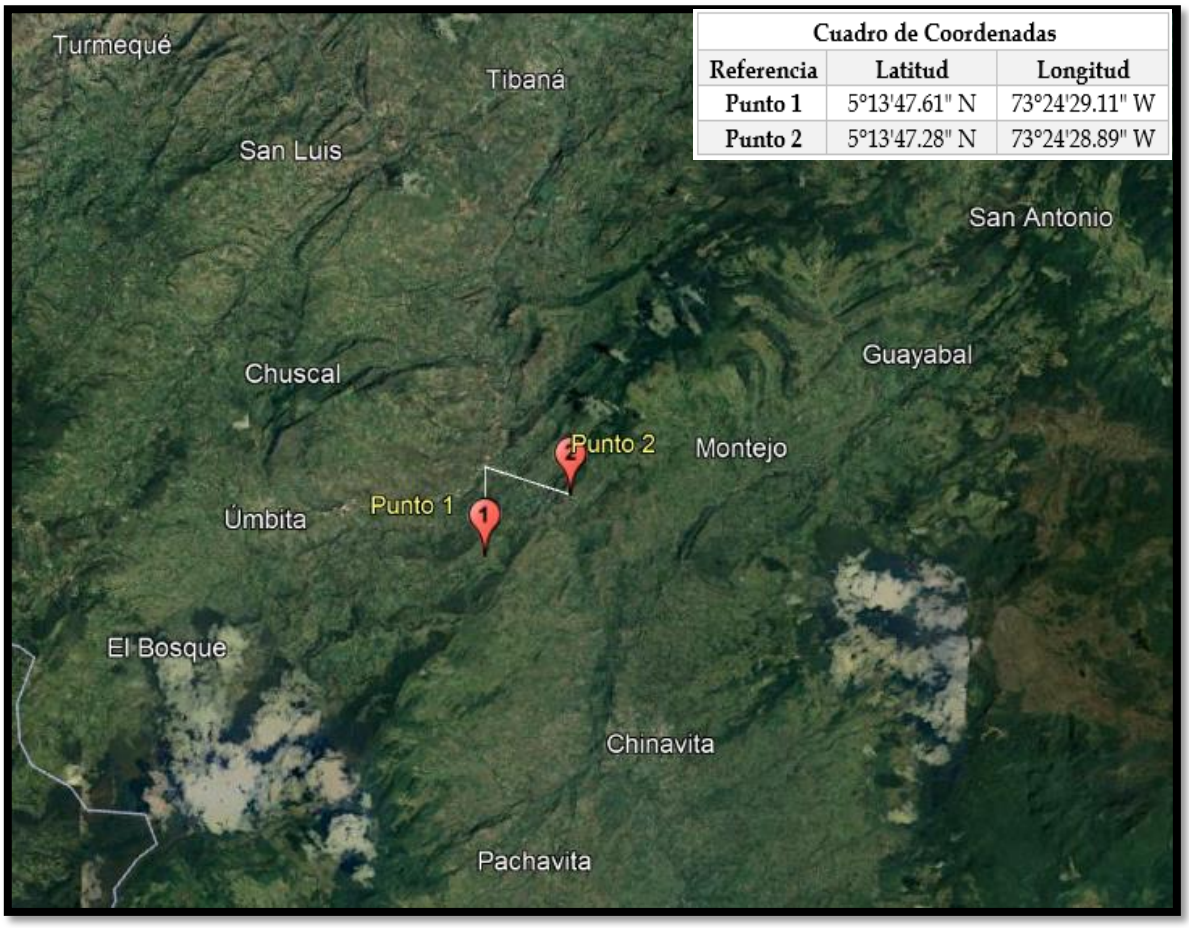

Cuadro de Coordenadas		
Referencia	**Latitud**	**Longitud**
Punto 1	5°13'47.61" N	73°24'29.11" W
Punto 2	5°13'47.28" N	73°24'28.89" W

Ilustración 1. Localización del proyecto.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información general del contrato

Contrato de obra Pública No.	1614 de 2023
Contratante:	Departamento de Boyacá
Nit:	891.800.498-1
Objeto:	"DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".
Contratista:	ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS C.C. 4.158.923 de Maripi
Interventor:	CONSORCIO INTER PUENTE 2023 NIT: 901.693.376-5 R/L Juan Francisco Pachón Roncancio
Plazo inicial:	Cuatro (4) meses
Valor inicial:	MIL VEINTIOCHO MILLONES VEINTISIETE MIL TREINTA Y SEIS PESOS ($1,028,027,036.00).

3.2 Alcance e impacto del proyecto

El objeto del contrato de obra es realizar la construcción de un puente metálico con el fin de habilitar un paso seguro para la población de Tibaná y Chinavita, a la altura de la vereda Sisa del municipio de Úmbita.

La longitud a construir es de aproximadamente 24 metros lineales, los cuales están apoyados en la super estructura en vigas metálicas y losa de concreto reforzado los cuales están soportados sobre estribos con cimentación sobre zapatas, a una profundidad de 4.00m medidos desde la rasante del terreno.

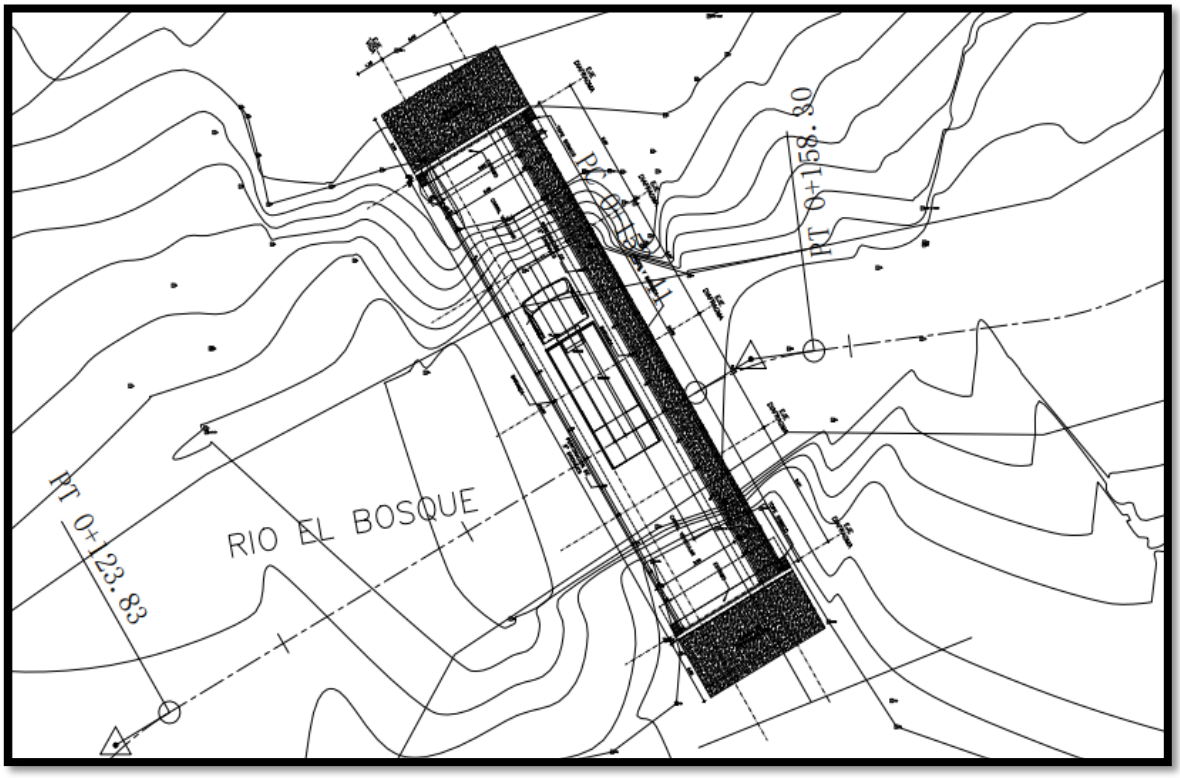


Ilustración 2. Diseño Estructural en planta del puente.

3.3 Proceso Contractual

El día 16 de marzo del 2023, se firmó virtual el Contrato de Obra No. 1614 de 2023, cuyo objeto es "DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA", entre ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS, en su calidad de CONTRATISTA, y el DEPARTAMENTO DE BOYACA en su calidad de CONTRATANTE.

El día 12 de abril del 2023 se expidieron las pólizas correspondientes al contrato de obra.

3.4 Estado financiero del Contrato de obra

FORMA DE PAGO CONTRATO DE OBRA				
PAGO	**COMPONENTE**	**FORMA DE PAGO**	**PORCENTAJE**	**VALOS A PAGAR**
1	Construcción de la Obra	Anticipo	30%	$ 308,408,110.80
2		Actas de recibo parcial	60%	$ 616,816,221.60
3		Acta de Liquidación	10%	$ 102,802,703.60
Valor Total del Contrato de Obra				**$ 1,028,027,036.00**

3.5 Seguimiento a las garantías contractuales

El contrato de obra pública No 1614 de 2023 en su CLÁUSULA DECIMA "GARANTÍA UNICA", establece que el contratista debe presentar garantía de cumplimiento para cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, de igual manera debe contar con un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual, con las siguientes especificaciones:

Garantía de cumplimiento		
Amparo	**Vigencia**	**Valor asegurado**
Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	El valor es equivalente al 15% del total del contrato. Vigencia: Duración del contrato
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato	Plazo del contrato y dos (2) años más.	El valor es equivalente al 15% del valor total del contrato.
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción.	Una vigencia será de cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra.	El valor es equivalente al 20% del total del contrato.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo	El valor es equivalente al anticipo (30%)


Garantía de responsabilidad civil extracontractual		
Amparo	**Vigencia**	**Valor asegurado**
Responsabilidad civil extracontractual debe proteger al Departamento de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista. Igualmente debe cubrir los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado.	Igual al periodo de ejecución del contrato.	El valor es equivalente a 200 SMMLV

A partir de lo anterior el contratista suscribió las siguientes pólizas actualizadas según contrato de obra:

Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal No. Póliza 14-44-101178193 (Anexo 3)			
Aseguradora	**Seguros del estado S. A**		
Fecha de expedición	**12/04/2023**		
Concepto	**Vigencia (fechas)**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento del contrato	16/03/2023	16/11/2023	$ 154.204.055,40
Pago de salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/03/2023	16/07/2026	$ 154.204.055,40
Estabilidad y calidad de la obra.	16/03/2023	16/07/2028	$ 205.605.407,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo.	16/03/2023	16/07/2023	$ 308.408.110,80

Póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. Póliza 14-40-101053978 (Anexo 1)			
Aseguradora	**Seguros del estado S. A**		
Fecha de expedición	**12/04/2023**		
Concepto	**Vigencia (fechas)**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Predios labores y operaciones	16/03/2023	16/07/2023	$ 232.000.000.00
Contratistas y subcontratistas	16/03/2023	16/07/2023	$ 232,000,000.00
Vehículos propios y no propios	16/03/2023	16/07/2023	$ 232,000,000.00

El día 17 de abril de 2023 se da aprobación de las pólizas de cumplimento por parte de la secretaria de contratación de la Gobernación de Boyacá y el mismo día se da aprobación de la responsabilidad civil extracontractual por parte de la secretaria de contratación de la Gobernación de Boyacá por medio de la plataforma SECOP II.

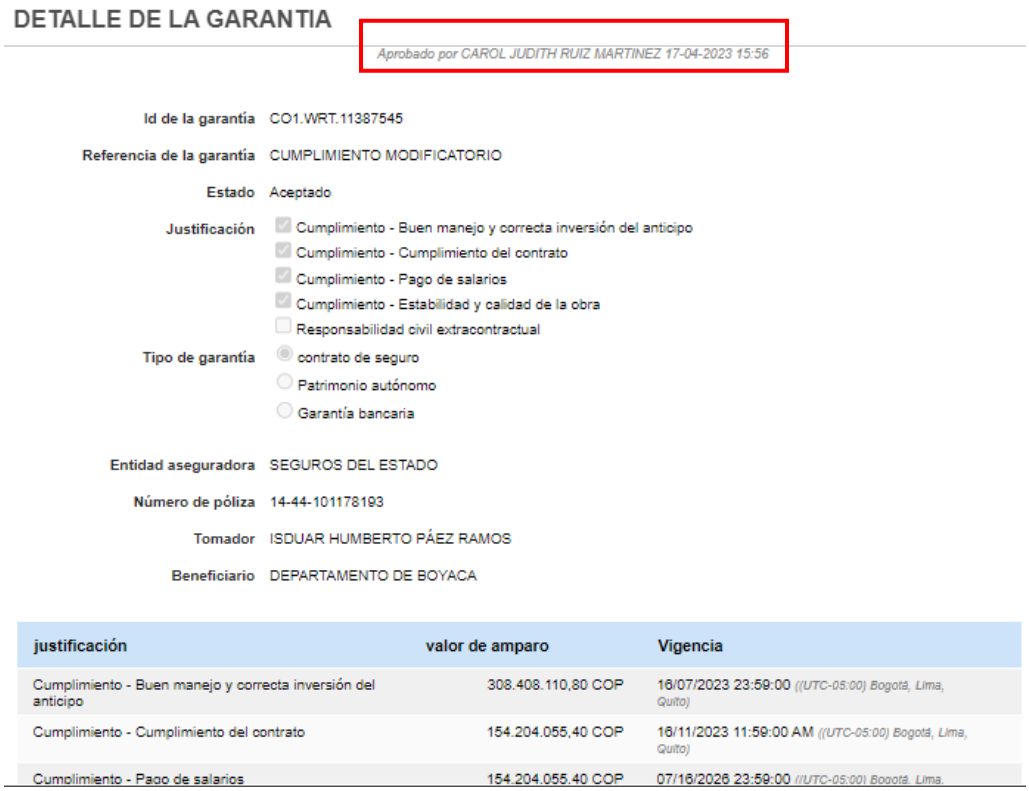

DETALLE DE LA GARANTIA

Aprobado por CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ 17-04-2023 15:56

Id de la garantía CO1.WRT.11387545

Referencia de la garantía CUMPLIMIENTO MODIFICATORIO

Estado Aceptado

Justificación
- [x] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [ ] Responsabilidad civil extracontractual

Tipo de garantía
- (•) contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 14-44-101178193

Tomador ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS

Beneficiario DEPARTAMENTO DE BOYACA

justificación	valor de amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	308.408.110,80 COP	16/07/2023 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	154.204.055,40 COP	16/11/2023 11:59:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Cumplimiento - Pago de salarios	154.204.055,40 COP	07/16/2026 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima,

Ilustración 3. Aprobación de la póliza de cumplimiento del contrato de obra. Fuente SECOP II



DETALLE DE LA GARANTIA

Aprobado por CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ 17-04-2023 15:56

Id de la garantía CO1.WRT.11338310

Referencia de la garantía

Estado Aceptado

Justificación
- ☐ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- ☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☐ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☐ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- ☑ Responsabilidad civil extracontractual

Tipo de garantía
- ◉ contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 14-40-101053978

Tomador ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS

Beneficiario DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

justificación	valor de amparo	Vigencia
Responsabilidad civil extracontractual	232.000.000,00 COP	16/07/2023 16:00:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Ilustración 4. Aprobación de la póliza de responsabilidad civil extracontractual del contrato de obra. Fuente SECOP II

3.6 Relación de personal del Contrato de Obra.

Durante el periodo de ejecución del 26 de mayo al 25 de junio se referencia el personal de obra que estará presente:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESIÓN
Director de Obra	Isduar Humberto Páez Ramos	C.C. 4.158.923	Ing. Civil
Residente de Obra	Carlos Augusto Rincón Zambrano	C.C. 74.373.208	Ing. Civil (Especialista en geotecnia vial y pavimentos)
Asesor en Geotecnia	Jimmy Vergara Silva	C.C. 74.321.878	Ing. Civil (Especialista en geotecnia vial y pavimentos)
Asesor en estructuras	Jimmy Vergara Silva	C.C. 74.321.878	Ing. Civil (Especialista en estructuras)

Asesor Hidráulico o Hidrológico	Víctor Manuel Camacho	C.C. 9.658.759	Ing. Civil (Especialista en ingeniería de sistemas hídricos urbanos)
HSEQ	Cruz Angelica Lozano Velasquez	C.C. 39.427.037	Ing. Ambiental (Especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo)

Al verificar esta información, el contratista está cumpliendo con el personal requerido presentado en la propuesta y por tanto se anexan los contratos de los profesionales. *Anexo A.*

De la misma manera las planillas de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales del personal administrativo, operativo y de obra utilizados en desarrollo del objeto contratado están de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes de conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios), para el contrato de interventoría. *Anexo. B*

3.7 Resumen de las actividades que ejecutó el contratista de obra

Etapa de Construcción.

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD
2	**CIMENTACIÓN**	
2,01	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	Metro Cúbico
2,02	PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)	Metro Cúbico
2,03	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	kilogramo
3	**TABLERO Y VIGAS PUENTE**	
3,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	kilogramo

2. CIMENTACIÓN

2.01 EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO.






Seguimiento en la instalación de señalización.





Replanteo topográfico y materialización de puntos.

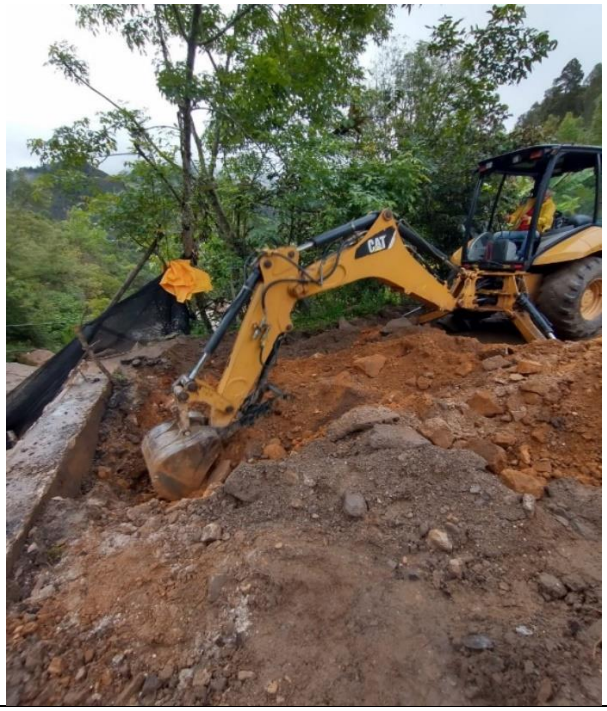Descapote y excavaciones estribo No. 2





Descapote y excavaciones estribo No. 2





Excavaciones profundas en estribo No. 1 y 2.





Acompañamiento y Seguimiento al contratista en la demolición de roca.




Replanteo topográfico y materialización de puntos.





verificación de ejes principales de la cimentación

2.02 PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)



Acompañamiento y supervisión en fundida de zapata estribo No. 2



Seguimiento e inspección en la elaboración de cilindros

2.03 SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa




Seguimiento y verificación de cantidades de acero figurado.




Acompañamiento y verificación del armado de acero, parrilla inferior de zapata.



Acompañamiento y Seguimiento al contratista en el armado de aceros estribo 2.



Acompañamiento y Seguimiento al contratista en el armado de aceros estribo 2.



Revisión y verificación de armado de formaleta.

3. TABLERO Y VIGAS PUENTE

3.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA





Fabricación, corte y ensamble de viga metálica





Seguimiento y verificación de pruebas de tintas penetrantes




Seguimiento y verificación de pruebas de tintas penetrantes

3.8 Avance mensual

Durante el periodo contemplado del 26 de mayo de 2023 al 25 de junio de 2023 por parte de la interventoría se realizó el seguimiento, control y verificación a la ejecución y cumplimiento del clausulado contractual, enmarcadas en el cronograma de obra durante la ejecución del proyecto.

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO
% acumulado (26 abril 2023 – 25 junio 2023)	29.62%	11.60 %
Inversión acumulada	$ 304.501.608.06	$ 119.251.136.18
Observaciones: Se presenta un avance ejecutado inferior del **18** % con respecto al programado.		

En el periodo se tenía programado iniciar con los ítems descritos durante la etapa de construcción.

3.9 Maquinaria, Pruebas y ensayos de laboratorio

- **Maquinaria y Equipo.**

Durante la etapa de construcción se utilizaron los siguientes equipos y maquinaria:

- ✓ Estación Total TOPCON Modelo GTS – 246NW
- ✓ Nivel Topográfico Colimador Marca SOUTH Modelo LF – 3B
- ✓ Prisma
- ✓ Retro excavadora CAT 416E
- ✓ Retro excavadora Oruga KOMATSU PC130.
- ✓ Apisonador (canguro) MASALTA MR70H, Motor HONDA GX160.
- ✓ Demoledor de roca HILTI 3000.

3.10 Plan de Calidad Obra

A continuación, se relacionan los capítulos que presentará el contratista en el plan de calidad, el cual allegará en las dos primeras semanas siguientes a la firma del acta de inicio ya que es necesario reunirse con los especialistas a fin de sustentar concretamente el plan de calidad acorde a las especificaciones que den cada uno de los especialistas:

- Alcance
- Entradas del plan de calidad
- Política de calidad
- Mapa de procesos
- Perfiles de cargo, capacitaciones, inducciones
- Responsabilidades del plan de calidad
- Control de información documentada
- Provisión de recursos
- Gestión del riesgo
- Documentos
- Diseño
- Plan de ensayos para las actividades y materiales y lista de inspección de actividades con criterios de aceptación.
- Identificación de trazabilidad
- Propiedad del cliente
- Control de compras y contratos o procesos contratados externamente
- Registro y control de no conforme acciones correctivas y accidentes y satisfacción del cliente.

- Auditorías internas.

Durante el periodo del presente informe del 26 de mayo al 25 de junio de 2023 se evidencia que el contratista ha dado cumplimiento general a las gestiones y actividades generales propuestas en el plan de calidad.

4. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1 Información general del contrato.

Contrato de Interventoría No.	1655 de 2023
Contratante:	Departamento de Boyacá
Nit:	891.800.498-1
Objeto:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA".
Contratista:	CONSORCIO INTER PUENTE 2023 NIT. 901693376 – 5 R/L Juan Francisco Pachón Roncancio
Plazo inicial:	Cuatro (4) Meses
Valor inicial:	SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS ($71.942.372.00).

4.2 **Proceso Contractual**

El día 22 de marzo de 2023, se firmó virtualmente el Contrato de Interventoría No. 1655 del 2023, cuyo objeto es " INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL

DEPARTAMENTO DE BOYACA". Entre CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R/L JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO en su calidad de CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO DE BOYACA en su calidad de CONTRATANTE
El día veintitrés (23) de marzo de dos mil veintitrés (2023) se expidieron las pólizas correspondientes al contrato.

4.3 Estado financiero del contrato de interventoría

PAGOS PARCIALES CONTRATO DE OBRA				
PAGO	**COMPONENTE**	**FORMA DE PAGO**	**PORCENTAJE**	**VALOS A PAGAR**
1	Construcción de la Obra	Actas Parciales	90%	$ 64.748.134,80
2		Acta de Liquidación	10%	$ 7.194.237,20
Valor Total del Contrato de Interventoría				**$ 71.942.372,00**

4.3 Recurso físico de interventoría

A continuación, se presenta la localización de la oficina y el vehículo disponible para el desplazamiento del personal:

- Ubicación de la oficina en el sitio del proyecto:



- Ubicación de la oficina secundaria: Chiquinquirá Boyacá en la dirección CR 9 C 3A 51, el horario de atención de la oficina es de lunes a viernes de 8 am a 12pm y de 2 pm a 6 pm.
- Vehículo: vitara gris de placa CWZ 297



Ilustración 5. Vehículo disponible para el desplazamiento del personal.

- Equipo de topografía: la interventoría dispuso del equipo de topografía.

4.5 Seguimiento de las garantías contractuales


El contrato de interventoría N° 1655 de 2023 en su CLÁUSULA DECIMA "GARANTÍA UNICA DEL CONTRATO", establece que el oferente y el contratista se obliga a constituir, a favor del Departamento de Boyacá Garantía única que ampare lo siguiente:

Garantía de cumplimiento		
Amparo	**Vigencia**	**Valor asegurado**
Cumplimiento del contrato	Hasta la liquidación del Contrato	El valor es equivalente al 20% del total del contrato.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Plazo del contrato y tres (3) años más.	El valor es equivalente al 20% del valor total del contrato.
Calidad del servicio.	Cinco (5) años más contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra.	El valor es equivalente al 20% del total del contrato.

A partir de lo anterior el contratista suscribió las siguientes pólizas actualizadas según contrato de interventoría.

Póliza de cumplimiento entidad estatal Póliza No. CBC- 100045013 Anexo 0			
Aseguradora	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A		
Fecha de expedición	23/03/2022		
Concepto	**Vigencia (fechas)**		**Valor**
	Desde	**Hasta**	
Cumplimiento	22/03/2023	22/07/2023	$ 14.388.474,40
Prestaciones Sociales	22/03/2023	22/07/2026	$ 14.388.474,40
Calidad del servicio	22/03/2023	22/07/2028	$ 14.388.474,40

El día 30 de marzo de 2023 se da aprobación de las pólizas de cumplimento por parte de la secretaria de contratación de la Gobernación de Boyacá por medio de la plataforma SECOP II.

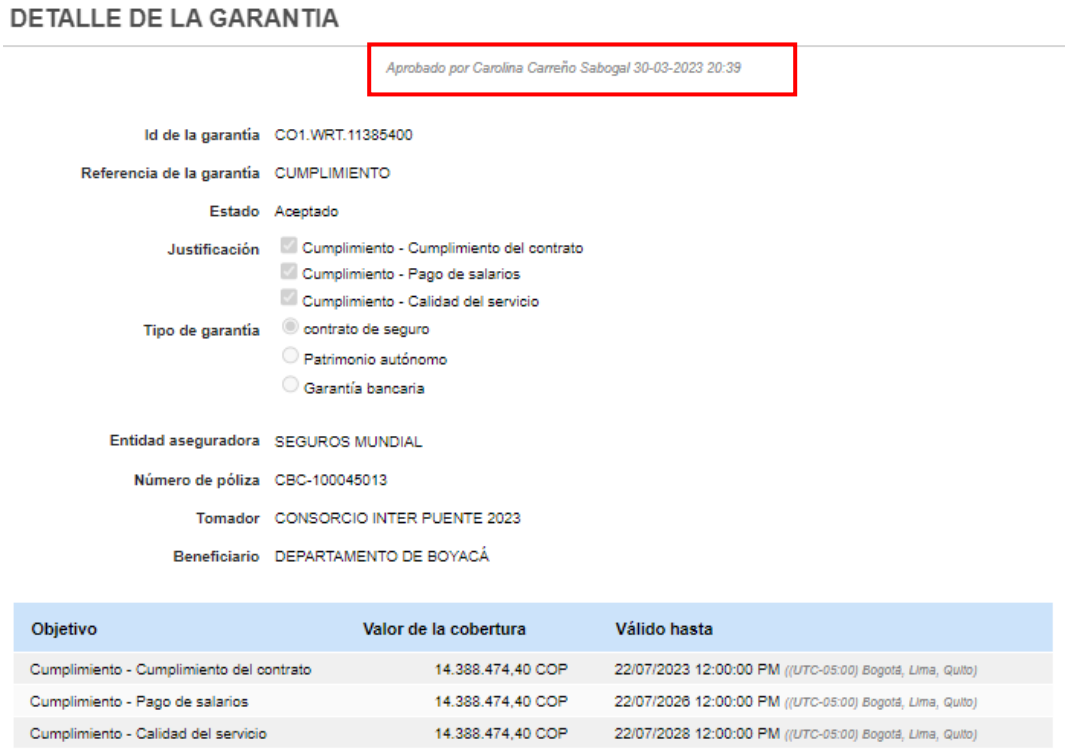

DETALLE DE LA GARANTIA

Aprobado por Carolina Carreño Sabogal 30-03-2023 20:39

Id de la garantía CO1.WRT.11385400

Referencia de la garantía CUMPLIMIENTO

Estado Aceptado

Justificación
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- ◉ contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS MUNDIAL

Número de póliza CBC-100045013

Tomador CONSORCIO INTER PUENTE 2023

Beneficiario DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Objetivo	Valor de la cobertura	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	14.388.474,40 COP	22/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	14.388.474,40 COP	22/07/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	14.388.474,40 COP	22/07/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Ilustración 6. Aprobación de la póliza de cumplimiento del contrato de interventoría. Fuente SECOP II

4.6 Relación de personal de Interventoría

Durante la ejecución del contrato se referencia el personal de interventoría que estará presente:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESIÓN
Director de Interventoría	Nelson Odens Mora Franco	C.C. 18.386.964	Ing. Civil
Ingeniero Residente de interventoría	Juan Francisco Pachón Roncancio	C.C. 1.010.200.976	Ing. Civil (Especialista en Gerencia de Proyectos)
Especialista Estructural	Hernán Plazas Soler	C.C. 79.709.927	Ing. Civil (Especialista en Estructuras)
Especialista en Geotecnia	Edilson Ernesto Bareño Moreno	C.C. 9.398.385	Ing. Civil (Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos)

La información de estos profesionales anteriormente descritos es la misma que la del personal requerido presentado en la propuesta y por tanto se anexan los contratos. *Anexo C.*

De la misma manera las planillas de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales del personal administrativo, operativo y de obra utilizados en desarrollo del objeto contratado están de acuerdo a las bases de cotización establecidas en las normas vigentes de conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios), para el contrato de interventoría. *Anexo D.*

4.7 Descripción de las actividades que realizó la interventoría:

La interventoría estará presente en el desarrollo de todas las actividades que se llevaran a cabo a lo largo del tiempo en que se ejecutara el proyecto:

- ✓ Elaboración de informe mensual
- ✓ Elaboración de informes semanales
- ✓ Seguimiento al cronograma de actividades de obra.
- ✓ Seguimiento de las condiciones climáticas
- ✓ Diligenciamiento de la bitácora de obra.
- ✓ Asistencia a la socialización del proyecto.
- ✓ Asistencia a comités de obra donde se realizará la revisión técnica del proyecto junto al contratista de obra y supervisor.

- ✓ Acompañamiento al contratista en actividades de demarcación, señalización conforme a lo descrito en el plan de manejo tránsito.
- ✓ Acompañamiento en la verificación de replanteamientos topográficos, fijación y localización de puntos para inicio de excavaciones.
- ✓ Acompañamiento del especialista estructural y el especialista en geotecnia para corroborar que los desplantes de la cimentación estén acordes a lo plasmado en los diseños.
- ✓ Recorrido para chequeos y verificación del diseño de cimentación, se realiza interpretación de planos para corroborar los replanteamientos topográficos.
- ✓ Programación de las actividades a realizar para la próxima semana.
- ✓ Seguimiento y control a los protocolos de Bioseguridad.
- ✓ Control de calidad de los materiales.
- ✓ Control de correspondencia enviada y recibida.
- ✓ Registro fotográfico de las actividades realizadas.

Convenciones

DOMINGO
FESTIVO

Registro diario de condiciones climáticas						
Clima/Día	**MAYO**					
	26	27	28	29	30	31
	V	S	D	L	M	M
Soleado y Seco		X			X	X
Nublado	X					
Lluvias moderadas						
Lluvias intensas						

Registro diario de condiciones climáticas																									
Clima/Día	**JUNIO**																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D
Soleado y Seco	X		X		X				X	X			X										X	X	
Nublado						X		X																	
Lluvias moderadas		X					X								X		X			X		X			
Lluvias intensas														X		X					X				

DIRECCION: CR 9 C 3 A 51	**EMAIL:** jypconsul.2019@gmail.com	**TELEFONO:** 3112832618

✓ Se realizó revisión de los estudios y diseños y se dio aval de los mismos.

ACTIVIDAD	REQUISITOS MINIMOS	CUMPLE	NO CUMPLE
TOPOGRAFÍA DE DETALLE (INCLUYE LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO E INFORMACIÓN GENERAL)	Levantamiento topográfico detallado (la cartografía, el perfil y la topografía de la superficie del terreno)	X	
	Levantamiento topográfico en un área suficiente, por lo menos 300 m antes y después del puente, y 200 m aguas arriba y 200 m aguas abajo	X	
ESTUDIOS DE SUELOS Y GEOTECNIA	Formaciones geológicas presentes.	X	
	Ubicación y espesor de las unidades de suelo y roca.	X	
	Propiedades ingenieriles de las unidades de suelo y roca, como peso unitario, resistencia al corte y compresibilidad	X	
	Condiciones del agua subterránea.	X	
	Consideraciones locales, por ejemplo, depósitos de suelos licuables, expansivos o dispersivos, cavidades subterráneas producidas por soluciones producto de erosión ambiental o por actividad minera, o potencial de inestabilidad del talud	X	
	Definición de los lugares más adecuados para realizar las perforaciones en cada una de las márgenes del río donde se construirán los estribos del puente.	X	
	Descripción geológica-geotécnica y condiciones geomorfológicas del sitio propuesto.	X	
	Ejecución de perforaciones incluyendo prueba de SPT	X	
	Pruebas de Suelo Pruebas en Roca y pruebas Geofisicas.	X	
	Análisis de muestra en laboratorio.	X	
	Tipificación geomecánica del perfil de suelo y descripción de perfiles estratigráficos.	X	
	Selección y cálculo geotécnico del sistema de fundación.	X	
	Cálculos de la capacidad portante.	X	

ACTIVIDAD	REQUISITOS MINIMOS	CUMPLE	NO CUMPLE
	Cálculos de asentamientos o desplazamientos de las fundaciones y de las estructuras en contacto con el terreno para cada uno de los casos de carga que establece el CCP-14 y analizados en el diseño estructural	X	
	Diseño geotécnico de la cimentación.	X	
ESTUDIOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS (INCLUYE ANÁLISIS DE SOCAVACIÓN)	Datos de caudal de crecientes máximas extraordinarias, crecientes ordinarias y verano.	X	
	Zonas de inundación y la dirección de la corriente durante las crecientes.	X	
	Cálculo del caudal máximo de diseño que pueda ocurrir con una determinada frecuencia en el lugar donde se va a emplazar el puente, las especificaciones de dimensionamiento, el gálibo del puente y los niveles de socavación probables.	X	
	Caracterización morfométrica de la cuenca	X	
	Análisis de socavación y erosión, identificando los niveles de socavación general y local, así como el cono de socavación, representatividad del modelo hidrológico e hidráulico, chequeo de calibración del mismo, caracterización climatológica de la zona de estudio, geoprocesamiento y delimitación de la cuenca al punto de interés.	X	
DISEÑO ESTRUCTURAL DE PUENTES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (ACCESOS Y OTROS)	Análisis de reforzamiento de elementos existentes (patología vulnerabilidad estructural)	X	
	Diseño estructural de puente y obras complementarias (accesos y otros)	X	
	Análisis estructural	X	
ESTUDIOS AMBIENTALES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL COSTEO	Cartografía, metadatos y GDB cartografía base y GDB temática	X	
	Descripción del proyecto, definición de objetivos y alcance del componente ambiental, localización, uso de la infraestructura, proceso	X	

ACTIVIDAD	REQUISITOS MINIMOS	CUMPLE	NO CUMPLE
PARA SU IMPLEMENTACIÓN	constructivo, área de influencia de la obra y condiciones ambientales.		
	Identificación y evaluación de impactos ambientales	X	
	Medidas de manejo ambiental previstas, con el respectivo marco legal, la evaluación de impacto ambiental de cada actividad y sus medidas de mitigación.	X	
	Línea base ambiental	X	
	Plan de salud ocupacional y seguridad industrial del personal de obra.	X	
	Formatos de control mensual del PMA.	X	
	Definir los permisos ambientales por uso e intervención de recursos naturales requeridos para el desarrollo de las obras	X	
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO	Diseño geométrico antes del puente y después del puente definiendo las aproximaciones, acorde con las normas y criterios establecidos en El Manual de Diseño Geométrico del INVIAS	X	
	Presentación de los planos de planta – perfil incluyendo la geometría del puente	X	
	Secciones Transversales del estudio cada 10 metros, intercalando los sitios donde se localizan muros, sitios potencialmente inestables, obras de drenaje menores con esviaje y sin esviaje que no requieren topografías especiales, del ancho necesario que permita el diseño total de las obras de encole y descole. Indicar en cada sección la abscisa, las cotas de rasante y del terreno natural, así como el área de corte y/o de terraplén.	X	
	Identificación de las obras complementarias	X	
DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN VIAL	Señalización Vial bajo los lineamientos de la normatividad	X	

ACTIVIDAD	REQUISITOS MINIMOS	CUMPLE	NO CUMPLE
	vigente, MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2015		
	Cantidades de señalización tanto horizontal como vertical	X	
	Planos en formato DWG y PDF	X	
	Relación de las señales tanto verticales como horizontales en los planos	X	
COMPONENTE FINANCIERO	Presupuesto de obra: listado de actividades de obra con sus respectivas cantidades, unidades, valores unitarios, valores totales, costos directos, costos indirectos y costo total.	X	
	Memorias de cantidades gráficas.	X	
	Detalle de porcentaje de Administración, Imprevistos y Utilidades (AIU).	X	

- ✓ Asistencia a comités de obra donde se realizará la revisión técnica del proyecto junto al contratista de obra y supervisor.
- ✓ Control de calidad de los materiales.
- ✓ Control de correspondencia enviada y recibida.

5. CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona el listado de correspondencia manejada durante el mes.

5.1 Correspondencia Enviada.

CONSECUTIVO	FECHA DE ENVIO	ENVIADO A	ASUNTO
C.I.P-1655-013	26-may-23	Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	ENTREGA VALLA INFORMATIVA Y SOLICITUD DE APROBACIÓN
C.I.P-1655-014	26-may-23	Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	ENTREGA Y VISTO BUENO AL ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA
C.I.P-1655-015	26-may-23	Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	ENTREGA Y VISTO BUENO AL ESTUDIOS HIDRAULICOS E HIDROLOGICOS

C.I.P-1655-016	26-may-23	Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	ENTREGA Y VISTO BUENO AL COMPONENTE FINANCIERO
C.I.P-1655-017	29-may-23	Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	ENTREGA VALLA INFORMATIVA Y SOLICITUD DE APROBACIÓN
C.I.P-1655-018	30-may-23	Javier Iván Barreto PintoSupervisor Contrato de interventoría	SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL PROCESO DE DEMOLICIÓN DEL PUENTE SISA
C.I.P-1655-019	6-jun-23	Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA
C.I.P-1655-020	14-jun-23	David Ferney Velosa H secretario de Planeación, Infraestructura y Desempeño Institucional.	SOLICITUD PLAN DE MANEJO DE RIESGOS
C.I.P-1655-021	16-jun-23	Isduar Humberto Páez Ramos Contratista de obra. CC Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	SOLICITUD CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL ACERO Y SOLICITUD DE AJUSTE AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.
C.I.P-1655-022	20-jun-23	Isduar Humberto Páez Ramos Contratista de obra. CC Javier Iván Barreto Pinto Supervisor Contrato de interventoría	CITACIÓN COMITÉ VIRTUAL

5.2 Correspondencia Recibida.

CONSECUTIVO	FECHA DE RECIBIDO	ENVIADO A	ASUNTO	REMITENTE
S-2023-001004-INFDDIV	29 de mayo de 2023	CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	Aprobación valla informativa	JAVIER IVAN BARRETO PINTO PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
S-2023-001016-INFDDIV	30 de mayo de 2023	CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	Solicitud Plan de Manejo del Riesgos	JAVIER IVAN BARRETO PINTO PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

S-2023-001035-INFDDIV	1 de junio de 2023	CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	Respuesta oficio C.I.P-1655-018 del 30 de mayo de 2023 (TRAMITE PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE).	JAVIER IVAN BARRETO PINTO PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
S-2023-001037-INFDDIV	1 de junio de 2023	CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	Plantilla rotulo para planos	JAVIER IVAN BARRETO PINTO PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
C.O. -1614-2023-001	6 de junio de 2023	CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	Aprobación de estudios y diseños, adición de recursos e inicio de obra.	ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS CONTRATISTA DE OBRA.
S-2023-001066-INFDDIV	7 de junio de 2023	CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	Informe Revisión 1 estudios y diseños.	JAVIER IVAN BARRETO PINTO PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
C.O. -1614-2023-002	7 de junio de 2023	CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	Solicitud permiso ocupación de cauce.	ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS CONTRATISTA DE OBRA.
S-2023-001079-INFDDIV	9 de junio de 2023	CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	Requerimientos varios ejecución contratos.	JAVIER IVAN BARRETO PINTO PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA
S-2023-001140-INFDDIV	21 de junio de 2023	CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	Remisión formatos.	JAVIER IVAN BARRETO PINTO PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

C.O. -1614-2023-003	26 de junio de 2023	CONSORCIO INTER PUENTE 2023 R.L. JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	Justificación de mayores y menores cantidades.	ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS CONTRATISTA DE OBRA.

6. CONCLUSIONES

- A la fecha del presente informe comprendido entre el 26 de mayo al 25 de junio de 2023 el contratista presenta un avance ejecutado del **11,60** % **(**$ 119.251.136.18) contra un programado del **29,62** % **(**$ 304.501.608.06) de acuerdo al cronograma de Obra presentado por el contratista.
- Conforme a lo programado en el cronograma vigente para la etapa de construcción, Se presentan atrasos atribuibles al contratista de obra, han cambiado las condiciones climáticas en presencia de lluvias intensas, situación que genera atrasos en las actividades de Obra
- De acuerdo al acta de inicio y a la fecha de corte del presente informe el contratista presenta un avance en tiempo de 60 días que corresponde a un avance acumulado del **49,56** %. de acuerdo al cronograma de obra.

7. ANEXOS

ANEXO A

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 1416 de 2023 – MES DE JUNIO.

Chiquinquirá, 02 de agosto de 2023

Ingeniero
Javier Iván Barreto Pinto
ivan.barreto@boyaca.gov.co
Supervisor Contrato de interventoría

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1655 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA."

Asunto: Revisión y verificación de planillas de Seguridad Social y parafiscales del contratista del mes de junio de 2023.

La interventoría a través del seguimiento SST revisa, verifica y aprueba las planillas de los aportes de seguridad social, afiliaciones y parafiscales del período comprendido entre el 26 de mayo al 25 de junio del 2023, de los trabajadores del contratista ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS, conforme a lo requerido por la entidad contratante.

Cordialmente:

CONSORCIO INTER PUENTE 2023
Rep. Legal JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
C.C.1.010.200.976.

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS
IDENTIFICACION:	CC-4158923
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-10
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-10
FECHA DE PAGO:	2023-07-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-06
NUMERO PLANILLA:	26689441
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26689441
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 375.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 480.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 855.000	$ 855.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/08/2023

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-74373208 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2023-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	8	256.000	2.400	258.400
Período salud:	2023-06	EPS005	800251440	SANITAS	1	8	200.000	1.900	201.900
Planilla Nro.:	27082074 Tipo I	SINARP	0	SINARP	0	8	0	0	0
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	8	0	0	0
Fecha transacción:	2023-07-14	PASENA	899999034	SENA	1	8	0	0	0
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	PAICBF	899999239	ICBF	1	8	0	0	0
Transacción:	46318195	PAESAP	899999054	ESAP	0	8	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	8	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 460.300

PAGADO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900725797	8	GLOBAL CIVIL INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	cll 43a 7 03	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3138912	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	52109164	9452109164	E	2023/06/26	2023/06/08	BANCO AV VILLAS	0	$928,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OFICINA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
Centro de Trabajo: OFICINA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$2,320,000	$371,200			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$12,200		$0	$0
1	CC	1053331112	GONZALEZ DANIEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
2	CC	74321878	VERGARA JIMMY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: OBRA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Centro de Trabajo: OBRA 1 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$0	$0
3	CC	1053342402	HERNANDEZ IVAN	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$3,480,000	$556,800			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$139,200			$3,480,000	$93,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900725797	8	GLOBAL CIVIL INGENIERIA S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OFICINA	cll 43a 7 03	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3138912	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	52109164	9452109164	E	2023/06/26	2023/06/08	BANCO AV VILLAS	0	$928,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$556,800	$0	$0	$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$371,200	$0	$0	$371,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$93,000	$0	$0	$93,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$93,000	$0	$0	$93,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$139,200	$0	$0	$139,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$139,200	$0	$0	$139,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$139,200	$0	$0	$139,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$92,800	$0	$0	$92,800
TOTAL				**3**	**$928,200**	**$0**	**$0**	**$928,200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9658759
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTOR MANUEL CAMACHO REYES
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 24 NO 10 - 23	TELÉFONO:	6356149
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7889020166**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/07/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		44368475

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 10.500
SUBTOTALES:									**$ 10.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN									SALUD							ARP																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 9658759	CAMACHO REYES VICTOR MANUEL	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 2.000.000				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.000.000	9658759	$ 10.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 580.500**

ANEXO B

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1655 de 2023 – MES DE JUNIO.

Chiquinquirá, 02 de agosto de 2023

Ingeniero
Javier Iván Barreto Pinto
ivan.barreto@boyaca.gov.co
Supervisor Contrato de interventoría

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1655 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA."

Asunto: Revisión y verificación de planillas de Seguridad Social y parafiscales – Consorcio Inter Puente 2023 del mes de junio de 2023.

La interventoría a través del seguimiento SST revisa, valida y hace entrega de las planillas de los aportes de seguridad social, afiliaciones y parafiscales del período comprendido entre el 26 de mayo al 25 de junio del 2023, de los trabajadores del Consorcio Inter Puente 2023, conforme a lo requerido por la entidad contratante.

Cordialmente:

CONSORCIO INTER PUENTE 2023
Rep. Legal JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
C.C.1.010.200.976.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 26413845
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2023-06-26

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NELSON ODENS MORA FRANCO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	18386964	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 12 NO33 55	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	NELSONODENS@YAHOO.COM	TELÉFONO	3457072
FAX	3457072	SUCURSAL	7	NOMBRE SUCURSAL	GOBERNACION
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 05	Año: 2023	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		26413845

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-18386964	59	No	No	No	66	1	3711001	Salario	MORA FRANCO NELSON ODENS	$3.200.000

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 18386964																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 18386964	COLPENSIONES	30	$3.200.000	0.1600000	$512.000	$0	$0	$512.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 18386964	SOS-EPS	30	$3.200.000	0.1250000	$400.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.200.000	3711001	0.0243600	$78.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-18386964	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$512.000	$0	$0	$0	$0	10	$6.000	$0	$0	$518.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SOS-EPS	1	$400.000	$0	0	$0	0	$0	$400.000	10	$4.700	$0	$404.700	$0	0	$0	$0	$404.700	$0	$0	$404.700

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$78.000	0	$0	$0	$78.000	10	$1.000	$79.000	0	$0	$790	$79.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	10	$0	$0
SENA	0	$0	10	$0	$0
ICBF	0	$0	10	$0	$0
ESAP	0	$0	10	$0	$0
MinEdu	0	$0	10	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$404.700
PENSIONES	1	$518.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$79.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.001.700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010200976		PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 9C #3A-51	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	51191392	9453509327	I	2023/07/21	2023/07/17	BANCOLOMBIA	0	$423,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,460,000**	**$233,600**			**$1,460,000**	**$182,500**			**$0**	**$0**			**$1,460,000**		**$7,700**		**$0**	**$0**		**$423,800**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$1,460,000**	**$233,600**			**$1,460,000**	**$182,500**			**$0**	**$0**			**$1,460,000**		**$7,700**		**$0**	**$0**		**$423,800**
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																					**$1,460,000**	**$233,600**			**$1,460,000**	**$182,500**			**$0**	**$0**			**$1,460,000**		**$7,700**		**$0**	**$0**		**$423,800**
1	CC	1010200976 PACHON JUAN							X											23030 1	30	$1,460,000	$233,600	EPS037	30	$1,460,000	$182,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,460,000	0.522%	$7,700	0	$0	$0	No	$423,800
Total	**Afiliados(1)**																				$1,460,000	$233,600			$1,460,000	$182,500			$0	$0			$1,460,000		$7,700		$0	$0		$423,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010200976		PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 9C #3A-51	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-06	51191392	9453509327	I	2023/07/21	2023/07/17	BANCOLOMBIA	0	$423,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$233,600	$0	$0	$233,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$233,600	$0	$0	$233,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$0	$0	$7,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,700	$0	$0	$7,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$182,500	$0	$0	$182,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$182,500	$0	$0	$182,500
TOTAL				**1**	**$423,800**	**$0**	**$0**	**$423,800**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	9398385	EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO	CLL 17 15 48	3118951680	edilsonernesto@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOYACÁ	TUNJA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	05/07/2023	69094343	$709.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	139.200				139.200	0	0	139.200			1.392	139.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	139.200	139.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	709.200	709.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	9398385	EDILSON ERNESTO BAREÑO MORENO		CLL 17 15 48	3118951680	edilsonernesto@yahoo.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOYACÁ	TUNJA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	I	05/07/2023	69094343	$709.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornudo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	9398385	BAREÑO MORENO EDILSON ERNESTO	57	0			N																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	250.000	14-11	2.000.000	5	139.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO B

CERTIFCADOS DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS

GAMATECNICA INGENIERIA SAS

Nit. 800.066.243-9

CERT No 8409

SER VICIO DE LABORATORIO OPTOMECANICO Y E L ECT RON ICO

CERTIFICADO DE AJUSTE Y CALIBRACION

FECHA: 01 OCTUBRE 2016 CODIGO : GAMA-MTO-003 VERSION 003

BOGOTA D.C. 21/04/2023 FECHA DE VENCIMIENTO 21/10/2023

EMPRESA RICARDO VALBUENA

DIRECCION CALLE 10 A No 18-80 CIUDAD DUITAMA

INSTRUMENTO N IVEL MARCA RUIDE

MODELO RLC 32 SERIE No X114266

PRECISION ANGULAR N.A PRECISION EN DISTANciA n. a

1. INSPECCION OPTOMECANICA	02						X
1.1 TRIPODE							X
1.2 BASE NIVELANTE							X
1.3 NIVELES TUBULARES Y ESFERICOS							X
1.4 VERTICALIDAD							X
1.5 OPTICA GENERAL (LENTES Y PRISMAS)							X
1.6 EJE VERTICAL Y HORIZONTAL							X
1.7 FRENOS Y MOVIMIENTOS TANGENCIALES							N.A
1.8 PLOMADA OPTICA							
2. INPECCION SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR (COLIMADOR 02 MARCA RUIDE, SERIE 0301.			¿	g g	¿		
2.1 COMPENSADOR OPTOME CANICO							N.A
2.2 COMPENSADOR ELECTRONICO							N.A
2.3 COLIMACION VERTICAL							. NA
2.4 COLIMACION HORIZONTAL							.NA

POSICION 1 (VERTICAL) GRADOS MIN SEG

POSICION2 (VERTICAL) GRADOS MIN SEG

ERROR DETECTADO GRADOS MIN - SEG

POSICION 1 (HORIZONTAL) - GRADOS MIN SEG

POSICION 2 (HORIZONTAL) - GRADOS MIN - SEG

ERROR DETECTADO GRADOS - MIN SEG


GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S

CERT No 8409

3 INSPECCION DE CONTROL DE DIFERENCIA NIVEL (COLIMADOR MARCA CARL ZEISS PRESICION 0.02 ¨ Y SOBRE LINEA BASE 50 M	CORRECCION	AJUSTE	LUBRICACION	REPARACION	REPUESTOS	LIMPIEZA	CUMPLE LUZU.
3.1 SISTEMA PENDULAR (AUTOMATICO)							X
3.2 SISTEMA DE COLIMACION (MECANICO)							N.A

A1	1.450	MM	B2	1.552	MM
A2	1.450	MM	B1	1.552	MM
A1-A2	0	MM	B2-B1	0	MM

ERROR DETECTADO 0 MM

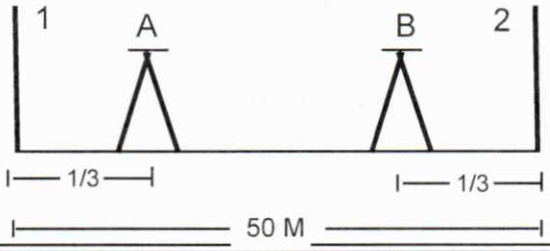

4. INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE 319.678 M (DISTANCIOMETRO) CONDICIONES: TEMPERATURA 15 GRADOS, PRESION ATMOSFERICA 560 MM/HG, CONSTANTE PRISMA -30	CORRECCION	AJUSTE	LUBRICACION	REPARACION	REPUESTOS	LIMPIEZA	CUMPLE LUZU.
4.1 PRISMAS							N.A
4.2 NIVEL ESFERICO BASTON							N.A
4.3 BASTON							.NA
4.4 MEDIDA DISTANCIA							N.A

4.5 CONSTANTE DEL PPM	ADECUADA	X	INADECUADA	
4.6 CONSTANTE DEL PRISMA	ADECUADA	X	INADECUADA	

5. CONTROLES Y VISUALIZACION ELECTRONICA	CORRECCION	AJUSTE	LUBRICACION	REPARACION	REPUESTOS	LIMPIEZA	CUMPLE LUZU.
5.1 TECLADO							X
5.2 DISPLAY							X
5.3 ACCESO MEMORIA							X
5.4 BATERIA							X
5.5 COMUNICACION DISPOSITIVO EXTERNO							X

GAMATECNICA INGENIERIA S.A.S. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO HAN SIDO CORREGIDOS PARA SATISFACER LOS PARAMETROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE

ING. LEONIDAS REYES CASTELBLANCO
DIRECTOR TECNICO

CARRERA 6 No 46 -09 - TELS. 2 452 089 - 2 872 080 - 2 872 497 - FAX 2 872 497 - asistente@gamatecnica.cor
ventas@gamatecnica.com BOGOTA D.C

LIDERES EN SISTEMAS GNSS
TOPOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE
Geosystem INGENIERIA

CODIGO: MRC-R-CTA-09

NIT. 830.051.298-7
SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO
CERTIFICADO DE AJUSTE

CERTIFICADO No.

12744

INSTRUMENTO: ESTACION TOTAL **MARCA** TOPCON **MODELO:** GTS- 246NW **PRECISION ANGULAR:** 2" **SERIAL No.** V20160	**FECHA DE REVISION** 25 de enero de 2023 **SUGERIMOS NUEVA REVISION** 24 de julio de 2023 **DEPARTAMENTO:** Arauca **CIUDAD:** Arauca **EMPRESA:** S&R CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS **NIT:** 900904055-1

INSPECCION OPTICOMECANICA	CORRECCION	AJUSTE	LUBRICACION	REPARACION	REPUESTOS	LIMPIEZA	FUNCION ACEPTABLE
TRIPODE							X
BASE NIVELANTE							X
NIVELES TUBULARES Y ESFERICOS							X
VERTICALIDAD							X
OPTICA GENERAL							X
EJE VERTICAL Y HORIZONTAL							X
FRENOS Y MOVIMIENTOS TANGENCIALES							X
PLOMADA ÓPTICA							X

	°	'	''
POSICION 1 (VERTICAL D)	88	17	51
POSICION 1 (HORIZONTAL D)	0	0	0
POSICION 1 (VERTICAL I)	271	42	10
POSICION 1 (HORIZONTAL I)	179	59	58
ERROR OBSERVADO V			1
ERROR OBSERVADO H			2

	°	'	''
POSICION 2 (VERTICAL D)	91	36	24
POSICION 2 (HORIZONTAL D)	0	0	0
POSICION 2 (VERTICAL I)	268	23	34
POSICION 2 (HORIZONTAL I)	180	0	1
ERROR OBSERVADO V			2
ERROR OBSERVADO H			1

Avenida Calle 53 No. 67 - 83 - PBX: (571) 745 2929 Cel: 312 480 1386 - Fax: Opción 5
contactenos@geosysteming.com - www.geosysteming.com - Bogotá - Colombia

LIDERES EN SISTEMAS GNSS
TOPOGRAFIA Y MEDIO AMBIENTE
GeoSystem INGENIERIA

NIT. 830.051.298-7

SERVICIO DE LABORATORIO OPTICOMECÁNICO Y ELECTRÓNICO

CERTIFICADO DE AJUSTE

CERTIFICADO No.
12744

INSPECCION EDM SOBRE LINEA BASE 320.162 M (DISTANCIOMETRO) CONDICIONES: TEMPERATURA 15 GRADOS, PRESION ATMOSFERICA 560 MMGG, CONSTANTE DEL PRISMA -30	AJUSTE	LUBRICACION	REPARACION	REPUESTOS	LIMPIEZA	FUNCION ACEPTABLE
PRISMAS						X
NIVEL ESFERICO						X
BASTON						X
MEDIDA DISTANCIA						X
CONSTANTE DEL PPM	X					
CONSTANTE DEL PRISMA	X					

INSPECCION DEL SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR, COLIMADOR MARCA SOUTH PRODUCT MODEL LF – 3B	AJUSTE	LUBRICACION	REPARACION	REPUESTOS	LIMPIEZA	FUNCION ACEPTABLE
COMPENSADOR OPTICOMECANICO						X
COMPENSADOR ELECTRONICO						X
CIERRE DE ANGULOS VERTICALES						X
CIERREDE ANGULOS HORIZONTALES						X

CONTROLES Y VISUALIZACION ELECTRONICA	AJUSTE	LUBRICACION	REPARACION	REPUESTOS	LIMPIEZA	FUNCION ACEPTABLE
TECLADO						X
DISPLAY						X
ACCESO MEMORIA						X
BATERIA						X
COMUNICACIÓN DISPOSITIVO EXTERNO						X

GEOSYSTEM INGENIERIA S.A.S. CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y QUE LOS ERRORES ENCONTRADOS AL INGRESO DEL EQUIPO, HAN SIDO CORREGIDOS DE ACUERDO CON LOS PARAMETROS DE TOLERANCIA ESTABLECIDOS POR EL FABRICANTE.

JOSE HERNANDEZ
MANTENIMIENTO TECNICO

ANEXO C

COMITES DE SEGUIMIENTO DE OBRA
JUNIO 2023

Boyacá	FORMATO	VERSION: 0
		CODIGO: M-PD-ID-F-012
ACTA DE COMITÉ		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA:	Lunes, 29 de Mayo 2023
CONTRATO / CONVENIO N°	1614 de 2023
OBJETO	Diseños, Construcción de Estribos y Suministro, Fabricación Transporte e instalación de puente metálico en la vía chinavita – Tibaná sobre el Río el Basque, en el departamento de Boyacá.

LECTURA ACTA ANTERIOR

Aclaraciones al acta anterior:

Powered by CamScanner

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS	
COMPROMISO	OBSERVACIÓN

DESARROLLO DEL COMITÉ

Se reunen en la Secretaria de infraestructura en las oficinas de la Gobernación de Boyacá en Secretaria el Supervisor Ivan Bonilla de la interventoria, el contratista de obra y el contratista de interventoria.

El contratista de obra Solicita a la secretaria de infraestructura el visto bueno a los estudios y Diseños, lo más pronto posible para ejecutar las actividades allí establecidos.

Se presento de manera general el diseño estructural, la cimentación que tendra el puente y el contratista expone las actividades que ejecutaran.

El Supervisor de la interventoria manifiesta que si de revisión a los borradores que cumplan con la normatividad actual vigente, tambien solicita que se consulte en lo posible el tipo de acero a instalar preferiblemente inoxidable que no se requiera pintura.

Powered by CamScanner

Se revisa el presupuesto presentado por el contratista de obra y con visto bueno de interventoría. El Supervisor de interventoría solicita que el campamento y el cerramiento no se incluya como ítem Si no que se incluya dentro de del plan de manejo ambiental.

El Supervisor observa la señalización vial en la cual observa que la señal de 40 le parece velocidad alta y por tanto solicita se revise la señalización vial.

Se observa que las juntas de dilatación no están diseñadas.

Powered by CamScanner

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN:		

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Consta en copropiedad la licencia de demolición del puente.		Interventoría.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	CELULAR	FIRMA
Javier Ivan Barreto P	Profesional Especialista Supervisor	3212043770	
Isducir H. Paez P	CONTRATISTA OBRA	3105602030	
Jorge Alberto Hurtado Leon	DIRECTOR DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	3124534077	
Juan Francisco Pachon	Interventoría	3222186323	

Powered by CamScanner

FECHA PRESENTE ACTA:	01/06/2023
CONTRATO / CONVENIO N°	1614 de 2023
OBJETO	DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

LECTURA ACTA ANTERIOR

Aclaraciones al acta anterior: N.A

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	OBSERVACIÓN
N.A.	N.A.

DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 9:00 am del día 1 de junio se da inicio al comité de obra, donde se cuenta con la participación del contratista de obra, contratista de interventoría, Jorge Hurtado León Director de Desarrollo infraestructura vial, Jhon Fredy Piña Secretario de Infraestructura Pública, William Ávila López, apoyo profesional Secretaria Infraestructura Pública, Javier Iván Barreto Pinto supervisor contrato de interventoría en el sitio del proyecto.

El ingeniero Jimmy Vergara especialista en estructuras por parte del contratista manifiesta que las condiciones actuales del terreno para hacer la cimentación cumplen perfectamente y se debe proceder hacer las excavaciones.

Por parte de la gobernación informa el cambio del valor en la valla, el cual debe ser el sumatorio total entre el contrato de obra más el contrato de interventoría.

La Gobernación considera la posibilidad de colocar la maquinaria para realizar el enrocado final ya que para el contrato de obra los recursos están limitados y no hay posibilidad de incluir esta actividad que sería necesaria para la protección de socavación de los estribos.

Se realiza visita previa por parte del especialista estructural y el especialista en geotecnia para corroborar que los desplantes de la cimentación estén acordes a lo plasmado en los diseños.

La interventoría menciona que el día de hoy 1 de junio se da inicio a realizar las actas de vecindad de los predios cercanos al proyecto.

El contratista en compañía de interventoría menciona a la gobernación la inasistencia temporal de un propietario de la vivienda cercana al proyecto donde se tiene previsto realizar el acta de vecindad, por lo anterior la gobernación informa que se debe realizar la visita en compañía de personería municipal o con el

presidente de la junta de acción comunal.

Por parte de la gobernación durante el recorrido hizo la verificación del replanteo, la señalización y los elementos de protección que se encuentran enmarcados dentro del plan de manejo de tránsito.

La gobernación le sugiere al contratista iniciar actividades de obra del puente para el día lunes 5 de junio de 2023.

La interventoría junto con la gobernación solicita al contratista buscar un lugar autorizado para trasladar el material producto de la excavación.

El contratista para el día lunes 5 de junio se compromete a iniciar actividades de obra con maquinaria en la zona del proyecto.


La gobernación solicita se programe una nueva socialización para dar a conocer a la comunidad el resultado de los estudios y diseños.

Se presenta registro fotográfico del comité realizado en el sitio del proyecto.





FIN
DE OBRA


1/06/2023

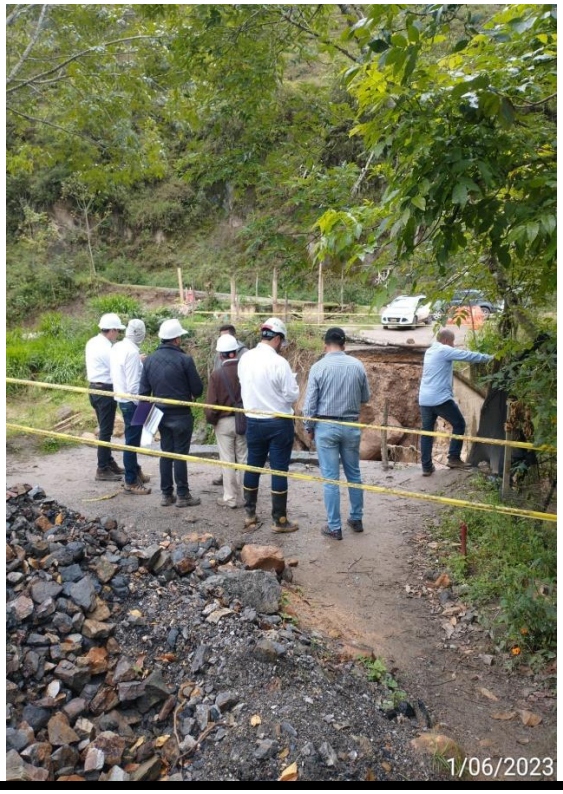
1/06/2023



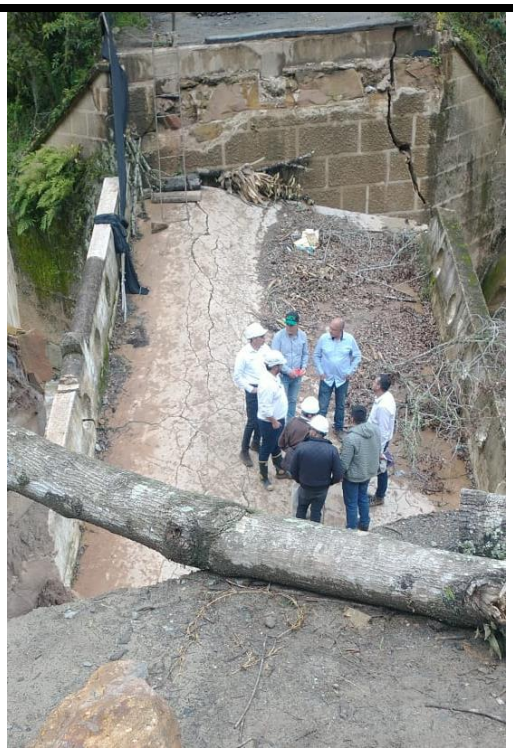

	No se estableció.

COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Iniciar actividades de excavación con maquinaria.	5-06-2023	Contratista
Preparar el documento para el trámite del permiso de ocupación del cauce ante CORPOCHIVOR	**PARCIAL**	Contratistas.
Programar la nueva socialización del proyecto ante la comunidad.	**PARCIAL**	Contratistas.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	CELULAR	FIRMA
ISDUAR HUMBERTO PAEZ	**CONTRATISTA**	**-------**	**Firmado en Original**
JORGE HURTADO LEÓN	**GOBERNACIÓN**	**-------**	**Firmado en Original**

JIMMY VERGARA	CONTRATISTA	-------	Firmado en Original
JHON FREDY PIÑA	GOBERNACIÓN	-------	Firmado en Original
WILLIAM ÁVILA LÓPEZ	GOBERNACIÓN	-------	Firmado en Original
JAVIER IVÁN BARRETO P	INTERVENTORÍA	-------	Firmado en Original
JUAN FRANCISCO PACHÓN	INTERVENTORIA	-------	Firmado en Original

FECHA PRESENTE ACTA:	16/06/2023
CONTRATO / CONVENIO N°	1614 de 2023
OBJETO	DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA.

LECTURA ACTA ANTERIOR

Aclaraciones al acta anterior:

Durante el recorrido de obra se evidencia el ajuste a la valla del proyecto compromiso pactado en el acta de comité realizada el 01 de junio de 2023 entre contratista e interventoría, a requerimiento por parte de la gobernación (Ing. Javier Iván Barreto).

VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	OBSERVACIÓN
Ajuste del valor en la valla del proyecto	CUMPLIDO
Iniciar actividades de excavación con maquinaria.	CUMPLIDO
Preparar el documento para el trámite del permiso de ocupación del cauce ante CORPOCHIVOR	PARCIAL
Programar la nueva socialización del proyecto ante la comunidad.	PARCIAL

DESARROLLO DEL COMITÉ

Siendo las 10:00 am del día 16 de junio se da inicio al comité de obra No. 5, donde se cuenta con la participación del contratista de obra, Isduar Humberto Páez, Jorge Hurtado León Director de Desarrollo e infraestructura vial, Jhon Fredy Piña secretario de Infraestructura Pública, Javier Iván Barreto Pinto supervisor contrato de interventoría en el sitio del proyecto.

La interventoría dentro del componente técnico y a través del seguimiento de obra informa los estados de avance y retrasos de contratista encontrando lo siguiente:

- **AVANCE EN TIEMPO:** 46 días con corte al 11 de junio de 2023
  Avance en tiempo: **38.01%**

- **AVANCE FISICO:** 46 días con corte al 11 de junio de 2023
  Avance programado: **9.59%**
  Avance Ejecutado: **7.95%**

Por parte del contratista informa un avance de obra del 0.77% correspondiente a las excavaciones de los estribos 1 y 2, manifiesta que las excavaciones se realizaron de 6.20 m por 4.25 m de acuerdo a los diseños.

El contratista informa que se realizó el armado de la parrilla inferior y se encuentra en proceso el armado de la parrilla superior correspondiente al estribo No. 2.

La gobernación (Ing. Javier Iván Barreto) comenta el tipo de maquinaria utilizado en las excavaciones, el contratista afirma que se utilizaron retroexcavadora 416E, retroexcavadora orugada 130 y Martillo Demoledor de roca HILTI 3000.

El contratista informa que el material producto de la excavación se tiene situado para restringir el paso del peatón.

A solicitud del Ing. Javier Iván Barreto, el contratista afirma que se realizó la solicitud de pedido del acero llegando una cantidad de 3.627,30 Kg con sus distanciadores plásticos.

Durante el recorrido por parte de la gobernación se hizo la verificación de demarcación y señalización de acuerdo al PMT, así mismo se verifico el avance de obra en cuanto a excavaciones y armado de acero.

Por parte de la gobernación (Ing. Javier Iván Barreto) solicita a la interventoría realizar visita al taller de corte y ensamblaje de la estructura metálica, para la revisión y avance de la estructura, revisión de ficha técnica y confirmación de fechas de despacho.

A solicitud del Ing. Javier Iván Barreto, el contratista menciona la programación para la próxima semana basada en la terminación de excavaciones, armado de acero estribo 1 y 2, y finalmente fundida de zapata estribo 2.

A petición de la gobernación, la interventoría solicita al contratista realizar la cotización para el enrocado de soporte de estribos de cimentación.

La interventoría informa a la gobernación que se realizó la totalidad de actas de vecindad de propietarios cercanos al proyecto.

Se presenta registro fotográfico del comité realizado en el sitio del proyecto.







	No se estableció.

COMPROMISOS PACTADOS		
COMPROMISO	**FECHA**	**RESPONSABLE**
Solicitud de cotización del enrocado de soporte a estribos de cimentación	PARCIAL	Contratista

PARTICIPANTES			
NOMBRE	**CARGO**	**CELULAR**	**FIRMA**
ISDUAR HUMBERTO PAEZ	**CONTRATISTA**	**------**	**Firmado en Original**
JORGE HURTADO LEÓN	**GOBERNACIÓN**	**------**	**Firmado en Original**
JHON FREDY PIÑA	**GOBERNACIÓN**	**------**	**Firmado en Original**
JAVIER IVÁN BARRETO P	**INTERVENTORÍA**	**------**	**Firmado en Original**
WILLIAM ÁVILA LÓPEZ	**GOBERNACIÓN**	**------**	**Firmado en Original**
JUAN FRANCISCO PACHÓN	**INTERVENTORIA**	**------**	**Firmado en Original**

ANEXO D

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA

ITEM	BIENACTIVIDAD	FUENTE	UNIDAD	CANT		VALORUNITARIO	VALORTOTAL	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				
								SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16	
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL																	
1	ESTUDIOS TECNICOS																							
1,01	ESTUDIOS Y DISEÑOS A NIVEL FASE III PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA–TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE.	Cotización	UNIDAD	1,00		$ 80.916.000,00	$ 80.916.000,00	$ 20.229.000,00	$ 20.229.000,00	$ 20.229.000,00	$ 20.229.000,00													$ 80.916.000,00
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT		VR UNITARIO	VR TOTAL																	
2	CIMENTACIÓN																							
2,01	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO.	Precios Gober.	Metro Cúbico	3,24	0,00	$ 13.430,00	$ 43.513,00							$ 43.513,00										$ 43.513,00
2,02	PEDESTAL CONCRETO 21,1 Mpa (3000 PSI)	Precios Gober.	Metro Cúbico	11,75	0,00	$ 629.500,00	$ 7.396.625,00						$ 3.698.312,50	$ 3.698.312,50										$ 7.396.625,00
2,03	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	Precios Gober.	kilogramo	514,00	12	$ 6.600,00	$ 3.799.488,00						$ 3.799.488,00											$ 3.799.488,00
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT		VR UNITARIO	VR TOTAL																	
3	TABLERO Y VIGAS PUENTE																							
3,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE, FABRICACIÓN, ENSAMBLAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA	Precios Gober.	kilogramo	#######	0,00	$ 21.666,00	$ 705.704.952,00								$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 705.704.952,00
ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT		VR UNITARIO	VR TOTAL																	
4	RELLENO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA																							
4,01	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN INDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**)	Precios Gober.	Metro Cúbico	28,00	0,00	$ 74.810,00	$ 2.094.680,00																$ 2.094.680,00	$ 2.094.680,00
						COSTO DIRECTO GRUPO 2 - 3 - 4	$ 719.039.258,00																	$ 719.039.258,00
								$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 1.030.000,00	$ 12.360.000,00
								DIRECTO	$ -	$ 7.497.800,50	$ 3.741.825,50	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 78.411.661,33	$ 80.506.341,33	$ 719.039.258,00 $ 80.916.000,00
								A	$ -	$ 1.874.450,13	$ 935.456,38	$ 19.602.915,33	$ 19.602.915,33	$ 19.602.915,33	$ 19.602.915,33	$ 19.602.915,33	$ 19.602.915,33	$ 19.602.915,33	$ 19.602.915,33	$ 19.602.915,33	$ 19.602.915,33	$ 19.602.915,33	$ 20.126.585,33	$ 179.759.814,50
								I	$ -	$ 149.956,01	$ 74.836,51	$ 1.568.233,23	$ 1.568.233,23	$ 1.568.233,23	$ 1.568.233,23	$ 1.568.233,23	$ 1.568.233,23	$ 1.568.233,23	$ 1.568.233,23	$ 1.568.233,23	$ 1.568.233,23	$ 1.568.233,23	$ 1.610.126,83	$ 14.380.785,16
								U	$ -	$ 224.934,02	$ 112.254,77	$ 2.352.349,84	$ 2.352.349,84	$ 2.352.349,84	$ 2.352.349,84	$ 2.352.349,84	$ 2.352.349,84	$ 2.352.349,84	$ 2.352.349,84	$ 2.352.349,84	$ 2.352.349,84	$ 2.352.349,84	$ 2.415.190,24	$ 21.571.177,74
								TOTAL																$ 1.028.027.035,40
								$ 80.916.000,00	$ 1.030.000,00	$ 10.777.140,65	$ 5.894.373,15	$ 102.965.159,73	$ 102.965.159,73	$ 102.965.159,73	$ 102.965.159,73	$ 102.965.159,73	$ 102.965.159,73	$ 102.965.159,73	$ 102.965.159,73	$ 102.965.159,73	$ 102.965.159,73	$ 105.688.243,73	$ 1.028.027.035,40
									7,87%	0,10%	1,05%	0,57%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,02%	10,28%	100,00%
									7,87%	7,97%	9,02%	9,59%	19,61%	**29,62%**	39,64%	49,66%	59,67%	69,69%	79,70%	89,72%	100,00%		

													0,090195236	0,095928911	0,196086938	0,296244965								
														9,592891076	19,60869378	29,6244965								
									7,87%	0,077%		0%	0%	0,074%	3,58%									
										7,948%		7,948%	7,948%	8,02%	**11,60%**									

COSTO DIRECTO $ 799.955.258,00

ESTUDIOS TÉCNICOS	$	80.916.000,00
OBRA PÚBLICA	$	719.039.258,00

COSTO INDIRECTO $ 228.071.778,00

NISTRACIÓN	25%	$ 179.759.815,00		
PREVISTOS	2%	$ 14.380.785,00		$ 215.711.778,00
UTILIDAD	3%	$ 21.571.178,00		
			PAGA	$ 12.360.000,00

VALOR TOTAL $ 1.028.027.036,00

INGENIERO CIVIL ISDUAR HUMBERTO PÁEZ RAMOS

ANEXO E

SOPORTES DE CORRESPONDENCIA

Gmail

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>

ENTREGA DISEÑO VALLA INFORMATIVA Y SOLICITUD DE APROBACIÓN

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 26 de mayo de 2023, 11:58 a.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buen dia,

Adjunto solicitud de aprobación de diseño de la valla informativa por parte de la supervisión de la Gobernación allegada por el contratista de obra.

Esperamos respuesta lo más pronto posible.

--
cordialmente,
CONSORCIO INTER PUENTE 2023
CEL. 3112832618

13. C.I.P-1655-013_ENTREGA VALLA INFORMATIVA Y SOLICITUD DE APROBACIÓN.pdf
261K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

ENTREGA Y VISTO BUENO AL ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 26 de mayo de 2023, 4:54 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buen dia,

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

2 archivos adjuntos

14. C.I.P-1655-014_VISTO BUENO ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA.pdf
101K

024_23_UMBITA_FINAL.pdf
4947K

Gmail

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>

ENTREGA DE LOS ESTUDIOS HIDRAULICOS E HIDROLOGICOS

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 26 de mayo de 2023, 5:20 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buen día,

--
cordialmente,
CONSORCIO INTER PUENTE 2023
CEL. 3112832618

2 archivos adjuntos

15. C.I.P-1655-015_VISTO BUENO ESTUDIOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS.pdf
94K

ESTUDIOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS.rar
17078K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

ENTREGA COMPONENTE FINANCIERO

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 26 de mayo de 2023, 5:59 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buen dia,

--
cordialmente,
CONSORCIO INTER PUENTE 2023
CEL. 3112832618

5 archivos adjuntos

- **16. C.I.P-1655-016_VISTO BUENO COMPONENTE FINANCIERO.pdf** 89K
- **BALANCE_FORMATO_GOBER_CIM_SUPER_1_CARRIL.xls** 104K
- **BALANCE_FORMATO_GOBER_CIM_SUPER_1_CARRIL.pdf** 431K
- **memorias_CIM_SUPR.pdf** 2435K
- **memorias_CIM_SUPR.xlsx** 5164K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

SOLICITUD APROBACION DE VALLA

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 29 de mayo de 2023, 4:27 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buenas tardes

Mediante la presente envío formato de valla para su aprobación.

--

cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

17. C.I.P-1655-017_ENTREGA VALLA INFORMATIVA Y SOLICITUD DE APROBACIÓN - copia.pdf
206K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL PROCESO DE DEMOLICIÓN DEL PUENTE SISA

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 30 de mayo de 2023, 4:18 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buen dia,

Envío solicitud de información de la licencia a Corpochivor.

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

18. C.I.P-1655-018 Solicitud de información CORPOCHIVOR.pdf
87K

Gmail

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>

INFORME SEMANAL 5 PUENTE CHINAVITA-TIBANÁ

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 30 de mayo de 2023, 5:16 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buen dia,

De acuerdo a las obligaciones del contrato de interventoría No.1655 de 2023 se hace entrega del informe semanal No.5 al contrato de obra No. 1614 de 2023 con objeto DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

5. Informe Semanal.pdf
737K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

COMITE DE OBRA No. 4 PENTE CHINAVITA - TIBANÁ

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 2 de junio de 2023, 11:02 a.m.
Para: lsduar@hotmail.com, JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buen día Ingenieros.

Remito Acta de Comité de Obra No.4 del día 1 de junio de 2023 realizada en la zona del proyecto puente Chinavita - Tibaná, para su revisión y aprobación y ser remitida para firmas.

Quedo atento a sus comentarios.

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

Acta de Comite No. 4.docx
1803K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

Re: COMITE DE OBRA No. 4 PENTE CHINAVITA - TIBANÁ

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 6 de junio de 2023, 3:46 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buen día,

Remito nuevamente el acta de comité No. 4 para su aprobación y ser remitida para firmas.

El mar, 6 jun 2023 a la(s) 11:20, JAVIER IVAN BARRETO PINTO (ivan.barreto@boyaca.gov.co) escribió:

> Ingeniero Francisco.
>
> Se devuelve el proyecto del Acta de Comité N° 4, con algunos ajustes, para su consideración, gracias.
>
> ***JAVIER IVAN BARRETO PINTO***
> *Profesional Especializado*
> *Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial*
>
> *El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.*
>
> ---
>
> **De:** J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>
> **Enviado:** viernes, 2 de junio de 2023 11:02
> **Para:** lsduar@hotmail.com <lsduar@hotmail.com>; JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>
> **Asunto:** COMITE DE OBRA No. 4 PENTE CHINAVITA - TIBANÁ
>
> Buen día Ingenieros.
>
> Remito Acta de Comité de Obra No.4 del día 1 de junio de 2023 realizada en la zona del proyecto puente Chinavita - Tibaná, para su revisión y aprobación y ser remitida para firmas.
>
> Quedo atento a sus comentarios.
>
> --
> **cordialmente,**
> **J&P CONSULTORES SAS**
> **CEL. 3112832618**
>
> Gobernación de Boyacá | Boyacá Avanza
>
> Página web: www.boyaca.gov.co
> Correo electrónico: contactenos@boyaca.gov.co
> PBX: (57) 8 7420150

Dirección: Calle 20 # 9 - 90
Tunja - BOYACÁ

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo seguridad.digital@boyaca.gov.co"

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

Acta de Comite No. 4 ajustada..docx
1804K

Gmail

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>

APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y ADICIÓN DE RECURSOS AL CONTRATO DE OBRA 1614 DE 2023

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 6 de junio de 2023, 5:41 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buen dia,

cordialmente,
CONSORCIO INTER PUENTE 2023
CEL. 3112832618

2 archivos adjuntos

19. C.I.P-1655-019 VISTO BUENO ADICIÓN.pdf
105K

1. Aprobación.pdf
150K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

Fwd: Solicitud permiso de ocupación de cauce

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 7 de junio de 2023, 5:31 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

---------- Forwarded message ---------
De: **Isduar Paez** <isduar@hotmail.com>
Date: mié, 7 jun 2023 a la(s) 17:29
Subject: Solicitud permiso de ocupación de cauce
To:
Cc: jypconsul.2019@gmail.com <jypconsul.2019@gmail.com>

Muy buenas tardes, en el marco del contrato de obra N°1614 del 16 de marzo de 2023 suscrito entre el departamento de Boyacá e Isduar Humberto Páez Ramos, cuyo objeto corresponde a "DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA" me permito amablemente adjuntar los documentos y requerimientos solicitados para iniciar con el proceso del permiso de ocupación de cauce.

Atentamente,

ISDUAR HUMBERTO PAEZ RAMOS
INGENIERO CIVIL CONTRATISTA
CELULAR 3156044077
DIRECCION CR 10 # 9 - 64 CHIQUINQUIRA

Documentación permiso de ocupación de cauce.zip

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

2. Permiso Ocupación de Cauce.pdf
109K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

INFORME SEMANAL No 6 PUENTE CHINAVITA-TIBANÁ

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 8 de junio de 2023, 4:49 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buen Tardes,

De acuerdo a las obligaciones del contrato de interventoría No.1655 de 2023 se hace entrega del informe semanal No.6 al contrato de obra No. 1614 de 2023 con objeto DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

Informe Semanal No 6..pdf
1321K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

INFORME SEMANAL No 7 PUENTE CHINAVITA-TIBANÁ

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 14 de junio de 2023, 4:31 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buenas Tardes.

De acuerdo a las obligaciones del contrato de interventoría No.1655 de 2023 se hace entrega del informe semanal No.7 al contrato de obra No. 1614 de 2023 con objeto DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

Informe Semanal No. 7.pdf
958K

Gmail J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>

Re: INFORME SEMANAL No 7 PUENTE CHINAVITA-TIBANÁ

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 15 de junio de 2023, 3:49 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buen dia ing,

Envío informe semanal No. 7 Ajustado

El jue, 15 jun 2023 a la(s) 14:31, JAVIER IVAN BARRETO PINTO (ivan.barreto@boyaca.gov.co) escribió:

> Ingeniero Francisco
>
> Ya encontré el informe N° 6, solo se requiere ajustar el 7
>
> ***JAVIER IVAN BARRETO PINTO***
> *Profesional Especializado*
> *Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial*
>
> *El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.*
>
> ---
>
> **De:** JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>
> **Enviado:** jueves, 15 de junio de 2023 14:27
> **Para:** J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>
> **Asunto:** RE: INFORME SEMANAL No 7 PUENTE CHINAVITA-TIBANÁ
>
> Ingeniero Francusco.
>
> El Informe semanal N° 6 no se ha entregado, y del informe N° 7, las fechas no corresponden, favor verificar y volver a radicar.
>
> ***JAVIER IVAN BARRETO PINTO***
> *Profesional Especializado*
> *Dirección de Desarrollo de la Infraestructura Vial*
>
> *El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.*
>
> ---
>
> **De:** J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>
> **Enviado:** miércoles, 14 de junio de 2023 16:31

Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>
Asunto: INFORME SEMANAL No 7 PUENTE CHINAVITA-TIBANÁ

Buenas Tardes.

De acuerdo a las obligaciones del contrato de interventoría No.1655 de 2023 se hace entrega del informe semanal No.7 al contrato de obra No. 1614 de 2023 con objeto DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

Página web: www.boyaca.gov.co
Correo electrónico: contactenos@boyaca.gov.co
PBX: (57) 8 7420150
Dirección: Calle 20 # 9 - 90
Tunja - BOYACÁ

"El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Gobernación de Boyacá, es únicamente para el uso del destinatario ya que puede contener información pública reservada o información pública clasificada (privada o semiprivada), las cuales no son de carácter público. Si usted no es el destinatario, se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal. Si usted es el destinatario, le solicitamos dar un manejo adecuado a la información; de presentarse cualquier suceso anómalo, por favor informarlo al correo seguridad.digital@boyaca.gov.co"

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

Informe Semanal No. 7.pdf
949K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

SOLICITUD PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 16 de junio de 2023, 11:16 a.m.
Para: Planeación@umbita-boyaca.gov.co
CC: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Cordial saludo.

ING. Ferney Veloza.

Mediante el siguiente oficio se solicita de manera formal el Plan de Manejo de Riesgos para trámites documentales de la Obra.

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

20. C.I.P-1655-020 SOLICITUD PLAN DE MANEJO DE RIESGOS..pdf
87K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

SOLICITUD CERTIFICADOS DE CALIDAD DEL ACERO

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 17 de junio de 2023, 9:53 a.m.
Para: isduar@hotmail.com
CC: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Cordial saludo.

ING. Isduar Humberto Páez.

Mediante el siguiente oficio se solicita los certificados de calidad del acero y ajuste al cronograma de actividades.

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

21. C.I.P-1655-021 SOLICITUD CERTIFICADOS DE CALIDAD DE ACERO.pdf
243K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

SOLICITUD PLAN DE MANEJO DE RIESGOS

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 20 de junio de 2023, 11:27 a.m.
Para: planeacion@umbita-boyaca.gov.co
CC: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Cordial saludo.

ING. Ferney Veloza.

Mediante el siguiente oficio se solicita de manera formal el Plan de Manejo de Riesgos para trámites documentales de la Obra.

--

cordialmente,

J&P CONSULTORES SAS

CEL. 3112832618

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

20. C.I.P-1655-020 SOLICITUD PLAN DE MANEJO DE RIESGOS..pdf
87K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

COMITE DE OBRA No. 5 PENTE CHINAVITA - TIBANÁ

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 20 de junio de 2023, 2:55 p.m.
Para: isduar@hotmail.com
CC: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Buenas Tardes Ingenieros.

Se remite Acta de Comité de Obra No.5 del día 16 de junio de 2023, realizada en la zona del proyecto puente Chinavita - Tibaná, para su revisión, aprobación y ser remitida para firmas.

Quedo atento a sus comentarios.

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

Acta de Comite No. 5.docx
478K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

CITACIÓN COMITE VIRTUAL

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 20 de junio de 2023, 6:04 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>, isduar@hotmail.com

Buen día,

--
cordialmente,
CONSORCIO INTER PUENTE 2023
CEL. 3112832618

22. C.I.P-1655-022_CITACIÓN A COMITE VIRTUAL.pdf
148K

Gmail **J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com>**

INFORME SEMANAL No. 8 PUENTE CHINAVITA-TIBANÁ

1 mensaje

J&P Consultores <jypconsul.2019@gmail.com> 21 de junio de 2023, 5:28 p.m.
Para: JAVIER IVAN BARRETO PINTO <ivan.barreto@boyaca.gov.co>

Cordial saludo.

ING. Javier Iván Barreto.

De acuerdo a las obligaciones del contrato de interventoría No.1655 de 2023 se hace entrega del informe semanal No.8 al contrato de obra No. 1614 de 2023 con objeto DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBOS Y SUMINISTRO, FABRICACIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUENTE METÁLICO EN LA VÍA CHINAVITA-TIBANÁ SOBRE RÍO EL BOSQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

--
cordialmente,
J&P CONSULTORES SAS
CEL. 3112832618

Informe Semanal No. 8.pdf
1479K
