COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Culturas

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA A CONSULTORÍA

Código: F-GIN-172
Versión: 0
Fecha: 31/Oct/2023

■ Público ☐ Reservado ☐ Clasificado

FECHA:	Semana: **ONCE** **15/04/2024** **21/04/2024**		
OBJETO:	**"Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad de los estudios técnicos y proyectos para la construcción de monumentos en el Corregimiento de Pueblo Bello, distrito Turbo, Antioquia y municipio de Mapiripán, Meta."**		
CONTRATO No.:	4265-2023	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:**	4334-2023
CONTRATISTA	AEU ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO	**INTERVENTOR**	IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS
VALOR CONTRATO:	$ 402.307.703,00	**VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**	$ 169.180.421,00
FECHA DE INICIO:	10/11/2023	**FECHA DE INICIO INTERVENTORÍA:**	10/11/2023
FECHA DE SUSPENSION No1:	14/12/2023	**FECHA DE SUSPENSIÓN No 1 DE INTERVENTORÍA:**	14/12/2023
AMPLIACION A SUSPENSION No1:	12/02/2024	**AMPLIACION A SUSPENSION No1:**	12/02/2024
SEGUNDA AMPLIACION A SUSPENSION No1:	13/03/2024	**SEGUNDA AMPLIACION A SUSPENSION No1:**	13/03/2024
FECHA DE REINICIO:	14/03/2024	**FECHA DE REINICIO DE INTERVENTORÍA:**	14/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15/12/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DE INTERVENTORÍA:**	15/12/2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	7/06/2024	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA:**	7/06/2024
PLAZO DE DURACIÓN: (dias)	120	**PLAZO DE DURACIÓN INTERVENTORÍA: (dias)**	120


3. Descripción actividades ejecutadas

Esta semana se realiza comité de seguimiento el 18 de abril, donde se registra la trazabilidad de los seguimientos a las consultas realizadas por el consultor, en el plan de contingencia formulado por el consultor recibido el 16 de abril, se evidencia la demora de un mes en consultas ante terceros, donde la norma urbana que es de vital importancia para desarrollar las FASES siguientes del proyecto no tiene respuestas claras por parte de Planeacion Turbo, asi mismo la respuesta de CORPOURABA en cuanto a que señala que el predio se encutnra en una zona de AMENAZA ALTA DE INUNDACION, hace prioritario la consulta ante el IDEAM (en cuanto a historicos de lluvias) y ante Aguas Regionales, por cuanto el predio no cuenta con disponibilidad de agua potable. Se recibe respuesta de Planeación el lunes 22 de abril remitida a la interventoria para su analisis.


1. Avance del proyecto: se muestra el estado de avance de los productos

NO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE ATRASO
1	RECIBIMOS OBSERVACIONES A PLAN DE CONTIGENCIA ELABORADO POR CONSULTOR EN CUANTO A AJUSTE DE FECHAS	15/04/2024	15/04/2024	0
2	AJUSTE A PLAN DE CONTINGENCIA DEL CONSULTOR SEGÚN OBSERVACIONES	16/04/2024	16/04/2024	0
3	COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL 18 DE ABRIL DE 2024	18/04/2024	18/04/2024	0
4	RECIBIMOS CONSULTA DE NORMA URBANA DE PLANEACION TURBO	16/04/2024	22/04/2024	6
5	RECIBIMOS ESTADO DE CONSULTAS POR PRIORIDAD DEL CONSULTOR	18/04/2024	18/04/2024	0
6	SOLICITAMOS SUSPENSION MEDIANTE OFICIO No PA-4334-2023-075 (EN EL MARCO DEL PLAN DE CONTIGENCIA DEL CONSULTOR)	18/04/2024	18/04/2024	0
7	ENTREGA DE PRELIMINARES PARA REVISION DE INTERVENTORIA PARA REVISION Y APROBACION	23/04/2024	23/04/2024	0
	ACTIVIDADES SEGÚN CRONOGRAMA APROBADO			
8	Informe de Levantamiento topográfico (ACTIVIDAD 1) EN CURSO	12/04/2024	23/04/2024	11
9	Informe de levantamiento forestal (ACTIVIDAD 1) EN CURSO	12/04/2024	23/04/2024	11
10	Informe de estudio geotécnico (ACTIVIDAD 2) EN CURSO	12/04/2024	23/04/2024	11
11	Informe (Concepto) de Diagnóstico Arquitectónico EN CURSO	12/04/2024	23/04/2024	11
12	Informe (Concepto) de diagnóstico urbano EN CURSO	12/04/2024	23/04/2024	11
13	Informe de Diagnóstico y plan Gestión Social (ACTIVIDAD 11) EN CURSO	12/04/2024	23/04/2024	11
	Las actividades anteriores corresponden a la fase PRELIMINARES del proyecto			
14	Planimetría del Proyecto Arquitectónico (ACTIVIDAD 3)	3/05/2024	POR INICIAR	N/A
15	Avance de Memoria descriptiva del proyecto (ACTIVIDAD 3)	3/05/2024	POR INICIAR	N/A
16	Planimetría del Proyecto Urbano y paisajismo (ACTIVIDAD 4)	3/05/2024	POR INICIAR	N/A
17	Avance de Memoria descriptiva del proyecto (ACTIVIDAD 4)	3/05/2024	POR INICIAR	N/A
18	Memoria descriptiva de estrategias de arquitectura bioclimática (ACTIVIDAD 5)	3/05/2024	POR INICIAR	N/A
19	Informe de Diseño Estructural Madera (ACTIVIDAD 6)	3/05/2024	POR INICIAR	N/A
20	Informe de Diseño estructural Concreto (ACTIVIDAD 6)	3/05/2024	POR INICIAR	N/A
21	Informe de Estudio de Redes Hidrosanitarias	3/05/2024	POR INICIAR	N/A
22	Informe (Concepto) de Otras redes	3/05/2024	POR INICIAR	N/A
23	Informe de Gestión social (CON FECHA ENTRE EL 27 DE ABRIL Y 5 DE MAYO VISITA EN CAMPO)	5/05/2024	POR INICIAR	N/A
	Las actividades anteriores corresponden a la fase DISEÑOS del proyecto			

2. Registro Fotográfico



Visual 1



Visual 2



Visual 3



Visual 4

5. Control Avance Financiero

ESTADO DEL PLAZO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PORCENTAJE DEL PLAZO (%)
	73,00	**61%**
	VALOR ($)	PORCENTAJE (%)
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA (1)	**$ 228.015.650,8**	**62,03%**
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA (2)	**$ 83.926.067,7**	**22,82%**
EVALUACIÓN DEL AVANCE (2) - (1)	**-$ 144.089.583,07**	**39,21%**
Se presenta un atraso	Se evidencia que la cronologia del tiempo del proyecto es mayor en porcentaje a la real ejecución, no se ha iniciado etapa de diseños porque no hay claridad en la consulta de norma en algunos puntos que se deben aclarar y todavia hay vacios en respuestas de disponibilidad de servicios	
ESTADO DE AVANCE EN DÍAS (Atraso)	47,00	

6. Personal

	CARGO	CANT
INTERVENTORÍA	DIRECTOR	1
	COORDINADOR DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISMO	1
	TOPOGRAFO	1
	INGENIERO GEOTECNISTA	1
	ASESOR BIOCLIMATICO	1
	DISEÑADOR ESTRUCTURAL	1
	DISEÑADOR ELECTRICO	1
	DISEÑADOR HIDRAULICO	1
	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA CONCEPTUALIZACION MI	1
	ASESOR PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	1
CONTRATISTA	**CARGO**	**CANT**
	DIRECTOR	1
	COORDINADOR DISEÑOS ARQUITECTONICOS	1
	COORDINADOR DISEÑOS URBANOS	1
	TOPÓGRAFO	1
	CADENERO	1
	INGENIERO GEOTECNISTA	1
	ASESOR BIOCLIMÁTICO	1
	DISEÑADOR ESTRUCTURAL	1
	DISEÑADOR ELÉCTRICO	1
	DISEÑADOR HIDRÁULICO	1
	INGENIERO AMBIENTAL	1
	PROFESIONAL SOCIAL	1
	COORDINADOR EQUIPO MUSEOLÓGICO	1
	MUSEOLOGO	1
	FACILITADOR	1
	PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	1
	TOTAL PERSONAL VINCULADO	**26**

ARQ. YAMIL FABIAN CASTRILLON
DIRECTOR INTERVENTORIA


ARQ. MONICA I. GOMEZ REY
COORDINADORA INTERVENTORIA


PORCENTAJES SEMANA

SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	2,29%	2,29%	1,40%	1,40%
2	5,35%	7,64%	4,46%	5,86%
3	5,35%	12,99%	3,92%	9,78%
4	5,35%	18,34%	3,30%	13,08%
5	5,35%	23,69%	0,70%	13,78%
6	5,72%	29,41%	1,80%	15,58%
7	6,00%	35,41%	1,25%	16,83%
8	6,00%	41,41%	0,92%	17,75%
9	6,00%	47,41%	1,60%	19,35%
10	6,95%	54,36%	1,60%	20,95%
11	7,67%	62,03%	1,87%	22,82%
12				
13				
14				
15				
16				

CANTIDADES SEMANA


SEM	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO	EJECUTADO ACUMULADO
1	$ 8.430.536,66	$ 8.430.536,66	$ 5.141.692,60	$ 5.141.692,60
2	$ 19.671.252,24	$ 28.101.788,90	$ 16.399.340,60	$ 21.541.033,20
3	$ 19.671.252,24	$ 47.773.041,14	$ 14.399.340,60	$ 35.940.373,80
4	$ 19.671.252,24	$ 67.444.293,38	$ 12.142.576,06	$ 48.082.949,86
5	$ 19.671.252,24	$ 87.115.545,62	$ 2.572.839,83	$ 50.655.789,69
6	$ 21.030.020,02	$ 108.145.565,64	$ 6.608.256,67	$ 57.264.046,35
7	$ 22.049.096,00	$ 130.194.661,64	$ 4.608.256,67	$ 61.872.303,02
8	$ 22.049.096,00	$ 152.243.757,64	$ 3.387.849,83	$ 65.260.152,84
9	$ 22.049.096,00	$ 174.292.853,64	$ 5.888.638,30	$ 71.148.791,14
10	$ 25.548.952,31	$ 199.841.805,95	$ 5.888.638,30	$ 77.037.429,44
11	$ 28.173.844,86	$ 228.015.650,81	$ 6.888.638,30	$ 83.926.067,74
12				
13				
14				
15				
16				

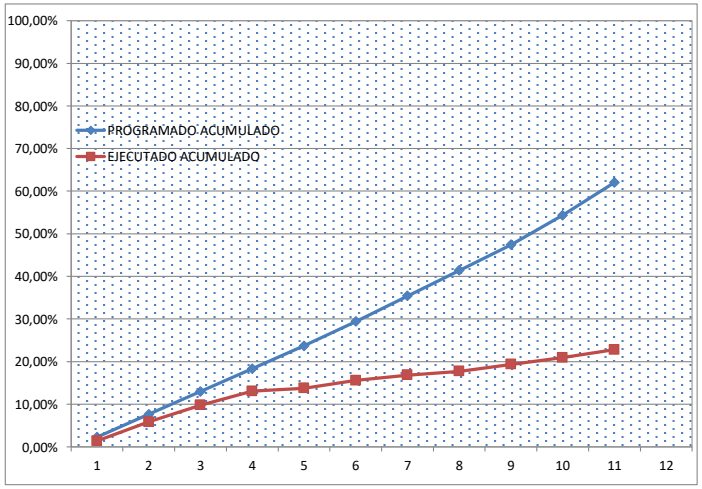

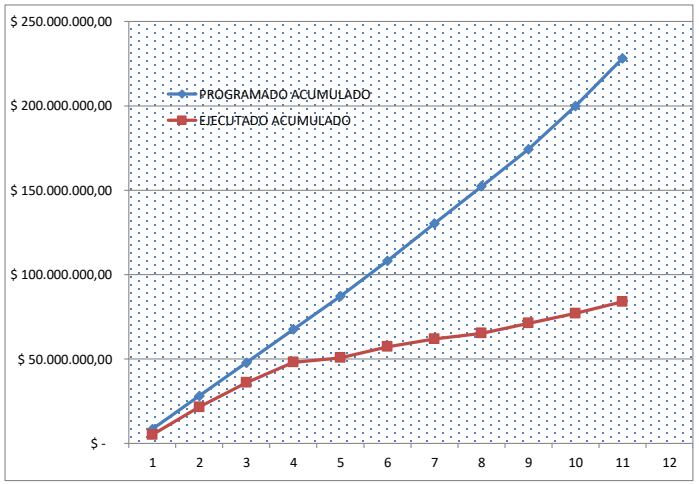

ARQ. YAMIL FABIAN CASTRILLON
DIRECTOR INTERVENTORIA

ARQ. MONICA I. GOMEZ REY
COORDINADORA INTERVENTORIA

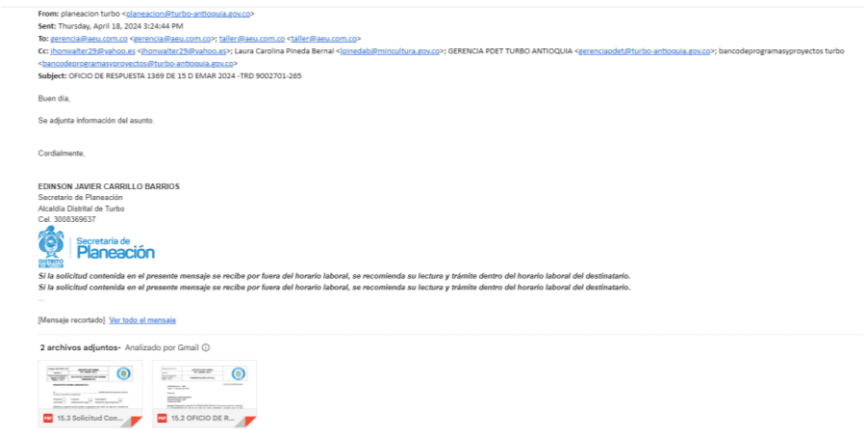

From: planeacion turbo <planeacion@turbo-antioquia.gov.co>
Sent: Thursday, April 18, 2024 3:24:44 PM
To: gerencia@aeu.com.co <gerencia@aeu.com.co>; taller@aeu.com.co <taller@aeu.com.co>
Cc: jhonwalter29@yahoo.es <jhonwalter29@yahoo.es>; Laura Carolina Pineda Bernal <lpinedabi@mincultura.gov.co>; GERENCIA PDET TURBO ANTIOQUIA <gerenciapdet@turbo-antioquia.gov.co>; bancodeprogramasyproyectos turbo <bancodeprogramasyproyectos@turbo-antioquia.gov.co>
Subject: OFICIO DE RESPUESTA 1369 DE 15 D EMAR 2024 -TRD 9002701-265

Buen dia.

Se adjunta información del asunto.

Cordialmente,

EDINSON JAVIER CARRILLO BARRIOS
Secretario de Planeación
Alcaldía Distrital de Turbo
Cel. 3008369637

Secretaría de Planeación


Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.
Si la solicitud contenida en el presente mensaje se recibe por fuera del horario laboral, se recomienda su lectura y trámite dentro del horario laboral del destinatario.

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

2 archivos adjuntos- Analizado por Gmail

15.3 Solicitud Con... 15.2 OFICIO DE R...

RECIBIDO DE COMUNICACIÓN PLANEACION DE TURBO




Comité de Seguimiento Cto 4265-23 Monumento Pueblo Bello
Jueves, 18 de abril · 11:00am – 12:00pm
Reunión de Microsoft Teams
5 invitados
1 sí, 4 en espera
Laura Carolina Pineda Bernal Organizador
AEU diseño
AEU gerencia
arq.monika.rey@gmail.com
Interventoría Estudios Monumentos Mincultura

Microsoft Teams ¿Necesita ayuda?
Unirse a la reunión ahora
Id. de reunión: 272 029 682 061
Código de acceso: eFUeoV
¿Asistirás? Sí No Quizás

Interventoría Estudi...
Abrir vista detallada

EVIDENCIA COMITÉ SEGUIMIENTO 18 DE ABRIL DE 2024

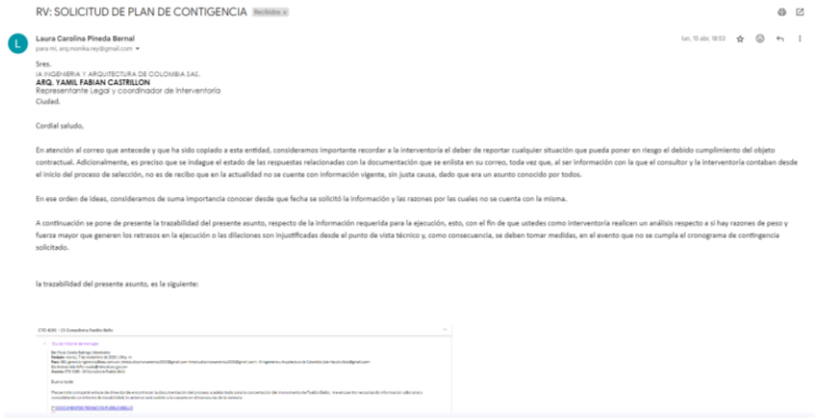

RV: SOLICITUD DE PLAN DE CONTIGENCIA

Laura Carolina Pineda Bernal
para mí, arq.monika.rey@gmail.com

Sres.
IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS.
ARQ. YAMIL FABIAN CASTRILLON
Representante Legal y coordinador de Interventoria
Ciudad.

Cordial saludo,

En atención al correo que antecede y que ha sido copiado a esta entidad, consideramos importante recordar a la interventoría el deber de reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo el debido cumplimiento del objeto contractual. Adicionalmente, es preciso que se indague el estado de las respuestas relacionadas con la documentación que se enlista en su correo, toda vez que, al ser información con la que el consultor y la interventoría contaban desde el inicio del proceso de selección, no es de recibo que en la actualidad no se cuente con información vigente, sin justa causa, dado que era un asunto conocido por todos.

En ese orden de ideas, consideramos de suma importancia conocer desde que fecha se solicitó la información y las razones por las cuales no se cuenta con la misma.

A continuación se pone de presente la trazabilidad del presente asunto, respecto de la información requerida para la ejecución, esto, con el fin de que ustedes como interventoría realicen un análisis respecto a si hay razones de peso y fuerza mayor que generen los retrasos en la ejecución o las dilaciones son injustificadas desde el punto de vista técnico y, como consecuencia, se deben tomar medidas, en el evento que no se cumpla el cronograma de contingencia solicitado.

la trazabilidad del presente asunto, es la siguiente:

OBSERVACIONES DE MINISTERIO DE CULTURA A PLAN DE CONTINGENCIA



Abrir con Documentos de Google

Bogotá D.C., 18 de abril 2.024

Señor:
ARQ. YAMIL FABIAN CASTRILLON
IA INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS.
Representante Legal y director de interventoria

intestudiosmonumentos2023@gmail.com

Referencia: Contrato de consultoría 4265-23, suscrito entre el Ministerio de las culturas, las artes y los saberes y Consorcio AEU, y contrato de Interventoría 4334-23.

Asunto: Oficio TRD 900.27.01-284 de Secretaria de Planeación, Distrito de Turbo, Respuesta a comunicado MC055275\2024 y Comunicado AEU-MC-PB-016

Cordial saludo,

Por medio del presente y en el marco del seguimiento efectuado por la interventoría IA Ingeniería y Arquitectura de Colombia SAS, al contrato de consultoría 4265 de 2023, desde el Grupo de Infraestructura Cultural en calidad de supervisor del contrato, nos permitimos remitir el comunicado TRD 900.27.01-284, en el cual emiten respuesta a la Solicitud de información Normativa aplicable al predio mediante el cual se realizan los estudios técnicos y proyectos de construcción del Centro Cultural Monumento "CICATRIZ" Corregimiento de Pueblo Bello, Turbo - Antioquia.

Como es de su conocimiento, esta información es indispensable para la continuación y culminación debida de la consultoría, así como el control y cumplimiento a lo ordenado por la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aras de restituir los derechos de las comunidades afectadas y dar paso a la fase de obra, adicionalmente se precisa indicar que, toda observación y/o concepto técnico deberá ser comunicado, contar con soportes y el correspondiente aval de la interventoría.

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Dirección: Calle 9 No 8 - 31, Bogotá D.C. Colombia
Sede Correspondencia
Casa Abadía Calle 8 # 8 A -31

RECIBIMOS NORMA URBANA DE PLANEACION

ENTIDAD	ESTADO	OFICIO	OBSERVACIÓN
Secretaría de Planeación		AEU-MC_PB-016 AEU-MC_PB-031	Sin respuesta consulta normativa Sin respuesta consulta frente a temas de acueducto y alcantarillado
Secretaría de Ambiente		AEU-MC_PB-017	Respuesta remite a Corpourabá
CORPOURABÁ		AEU-MC_PB-018	Responde a cada punto, aclarando que la esfactibilidad frente a normativa y trámites aplicables al proyecto deberá solicitarse Concepto Ambiental una vez se tengan los diseños y se debe hacer un pago.
EPM (Energía)		AEU-MC_PB-019	Respuesta: Disponibilidad de servicio
Aguas Regionales		AEU-MC_PB-020	Relaciona que no es prestadora del servicio (acueducto y alcantarillado) en Pueblo Bello y recomienda consultar con planeación municipal
Corregiduría Pueblo Bello		AEU-MC_PB-021	Sin respuesta
Secretarías de inclusión social, cultura y educación		AEU-MC_PB-022	Respuesta parcial: Solo responde 1 de los 10 temas consultados
Secretaría de Movilidad		AEU-MC_PB-023	Sin respuesta

Como se relaciona en el cuadro anterior las respuestas pendientes son:
- SEC. PLANEACIÓN: A los oficios AEU-MC_PB-016 y AEU-MC_PB-031
- CORREGIDURÍA PUEBLO BELLO: Al oficio AEU-MC_PB-021
- SEC. MOVILIDAD: Al oficio AEU-MC_PB-023

Y complemento a la respuesta de SEC. INCLUSIÓN SOCIAL, CULTURA Y EDUCACIÓN al oficio AEU-MC_PB-022

Considerando lo descrito, se adjuntan los oficios de las consultas sin respuesta o respuesta incompleta: AEU-MC_PB-016 - 21 - 22 - 23 y 31 para su correspondiente radicación ante entidades pertinentes, como se acordó en comité del día de hoy.

Adicionalmente, solicitamos muy amablemente se cite a la mesa de trabajo virtual planteada para el próximo miércoles 24 de abril de 2024 (2:00pm) a las siguientes entidades:
- SEC. PLANEACIÓN
- SEC. MOVILIDAD
- SEC. INCLUSIÓN SOCIAL
- SEC. CULTURA

Agradecemos su colaboración y quedamos atentos a cualquier inquietud

CERTIFICACIONES Y CONSULTAS POR PRIORIDAD

SOLICITUD DE SUSPENSION No2 CONTRATO No4265-2023 Y 4334

Interventoría Estudios Monumentos Mincultura <interventoriamonumentos2023@gmail.com>
para jramirez, Laura, AEU

Bogotá, 18 de abril de 2024 **PA-4334-2023-075**

Señores:
MINISTERIO DE CULTURA
Carrera 8 No 8 – 43
Bogotá DC
Atn. Arq. Juliana Ramírez Rodríguez
Coordinadora grupo de Infraestructura
C.C: Arq. Laura Pineda
Apoyo a la supervisión MINCULTURA
Arq. Verónica Ortiz Murcia
Representante legal AEU

Referencia: Contrato de Interventoría Nº: 4334-2023

Objeto: "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, legal, ambiental y de aseguramiento de calidad de los estudios técnicos y proyectos para la construcción de monumentos en el Corregimiento de Pueblo Bello, distrito Turbo, Antioquia y municipio de Mapiripán, Meta"

Asunto: SOLICITUD DE SUSPENSION AL CONTRATO DE CONSULTORIA No4265-2023 y DE INTERVENTORIA No 4334-2023

Cordial saludo,

La Interventoría ha recibido por parte del consultor AEU mediante oficio **No AEU-MC_PB-033** en el marco de la propuesta de un plan de contingencia solicitado por la Interventoría el pasado 12 de abril y que dentro de las acciones en aras de mitigar el riesgo de sobrepasar el tiempo contractual en trámites ante terceros de los que no hay respuesta a hoy 17 de abril, consideramos que en el actuar se debe proceder de Inmediato en vista de que se ha consumido (34) treinta y cuatro días desde que se reiniciaron los contratos del asunto. Esta Interventoría presenta la solicitud de suspensión No 2 en los contratos de la referencia, fundamentada en los siguientes aspectos principales:

1. En cumplimiento de la Sentencia de 31 de enero de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la masacre de Pueblo Bello, el Ministerio de Cultura (MinCultura), mediante el concurso de

ENVIO SOLICITUD DE SUSPENSION 18 DE ABRIL DE 2024

CONTRATISTA

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
ARQ. VERONICA ORTIZ	DIRECTOR	30%
ARQ. DANILO SEPULVEDA	COORDINADOR DISEÑO ARQUITECTONICO	50%
ARQ. CARLOS PUERTA	COORDINADOR DISEÑO URBANO	70%
NICOLAS FERNANDO CARDONA	TOPÓGRAFO	90%
YEINER MARTINEZ HERNANDEZ	CADENERO	90%
DANIEL FERNANDO CALVO TREJOS	INGENIERO GEOTECNISTA	70%
ALBERT FABIAN VELASCO SANDOVAL	ASESOR BIOCLIMÁTICO	20%
FREDY ANTONIO VILLADA VELASQUEZ	DISEÑADOR ESTRUCTURAL	80%
OMAR LOPEZ DELGADO	DISEÑADOR ELÉCTRICO	30%
YHAN MICHEL BEDOYA HINCAPIE	DISEÑADOR HIDRÁULICO	30%
SANDRA VIVIANA SANTAMARIA SEGURA	INGENIERO AMBIENTAL	20%
OLGA YOLANDA ROBAYO CRUZ	PROFESIONAL SOCIAL	60%
CATALINA DEL ROCIO ROJAS CASALLA	COORDINADOR EQUIPO MUSEOLÓGICO	50%
JOSE JULIAN AGUDELO MORA	MUSEOLOGO	50%
POR SUBSANAR	FACILITADOR	100%
MAURICIO VANEGAS RUBIO	PROFESIONAL EN PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	50%

INTERVENTORÍA

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN
ARQ. FABIAN YAMIL CASTRILLON	DIRECTOR	12,5%
ARQ. MONICA I. GOMEZ REY	COORDINADOR DISEÑO ARQUITECTONICO Y URBANISMO	25,0%
ING FERNEY ROCHA	TOPOGRAFO	7,5%
ING ARMANDO RUIZ	INGENIERO GEOTECNISTA	10,0%
ING ANDRES GARCIA	ASESOR BIOCLIMATICO	5,0%
ING MANUEL ANTONIO	DISEÑADOR ESTRUCTURAL	10,0%
ING JAIME PALOMARES	DISEÑADOR ELECTRICO	7,5%
ING OMAR ARCHILA	DISEÑADOR HIDRAULICO	5,0%
VICTOR DEL VALLE	COORDINADOR DE INTERVENTORÍA CONCEPTUALIZACION MUSEOGRAFICA	12,5%
ING. ERICK MORENO	ASESOR PRESUPUESTOS Y PROGRAMACION	10,0%

PERSONAL APROBADO POR CAMBIO EL 4 DE ABRIL DE 2024
