

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1	**1**	**PROYECTO OBRERO**	**133 días**	**mié 1/05/24**	**vie 1/11/24**		
2	0	INICIO	0 días	mié 1/05/24	mié 1/05/24		3;100;61;62;66;69;1
3	0.1	Estudios y preconstructivos	21 días	mié 1/05/24	mié 29/05/24	2	4;5;6
4	**1**	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**28 días**	**jue 30/05/24**	**lun 8/07/24**	**3**	**10;9;162**
5	1.1	LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.	15 días	jue 30/05/24	mié 19/06/24	2;3	6
6	1.2	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	10 días	jue 20/06/24	mié 3/07/24	2;3;5	7FC-5 días;61;62;100
7	1.3	CAMPAMENTO EN TABLA 18M2	3 días	jue 27/06/24	lun 1/07/24	6FC-5 días	8
8	1.4	PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A=60CM	5 días	mar 2/07/24	lun 8/07/24	7	
9	**2**	**DEMOLICIONES Y RETIROS**	**25 días**	**mar 9/07/24**	**lun 12/08/24**	**4**	**18CC+1 día;19CC+1 día;32CC+10 días;33CC+10**
10	2.1	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS	10 días	mar 9/07/24	lun 22/07/24	4	11;12;59
11	2.2	DEMOL. PAVIMENTO CONCRETO E=15CM	5 días	mar 23/07/24	lun 29/07/24	10	13;14;15;42
12	2.3	DEMOL. SARDINEL DE 15X15CMS.	5 días	mar 23/07/24	lun 29/07/24	10	
13	2.4	DEMOL. CONTRAPISO EN CONCRETO E=5CM-10CM	5 días	mar 30/07/24	lun 5/08/24	11	
14	2.5	DEMOL. CAJAS - CABEZALES (INCLUYE CARGUE)	5 días	mar 30/07/24	lun 5/08/24	11	
15	2.6	DEMOL. CAJA DE INSPECCION	5 días	mar 30/07/24	lun 5/08/24	11	16;17
16	2.7	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	5 días	mar 6/08/24	lun 12/08/24	15	
17	2.8	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP.)	5 días	mar 6/08/24	lun 12/08/24	15	
18	**3**	**VIA**	**45 días**	**mié 10/07/24**	**mar 10/09/24**	**9CC+1 día**	**162;145**
19	3.1	EXCAVACIÓN CONGLOMERADO A MAQUINA	5 días	mié 10/07/24	mar 16/07/24	9CC+1 día	20CC+5 días;63;102;95;118;9
20	3.2	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	5 días	mié 17/07/24	mar 23/07/24	19CC+5 días	21
21	3.3	CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR=95	5 días	mié 24/07/24	mar 30/07/24	20	22CC+50%
22	3.4	SUMINISTRO E INSTALACION SUB BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	5 días	vie 26/07/24	vie 2/08/24	21CC+50%	23CC+50%
23	3.5	SUMINISTRO E INSTALACION BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	5 días	mié 31/07/24	mar 6/08/24	22CC+50%	24CC;26CC;25FC+10 días
24	3.6	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL TIPO NT 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	5 días	mié 31/07/24	mar 6/08/24	23CC	
25	3.7	ADOQUIN GRESS VEHICULAR H=5.0CM	5 días	mié 21/08/24	mar 27/08/24	23FC+10 días	27;28;29FC-1 día
26	3.8	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO DE CONCRETO.	5 días	mié 31/07/24	mar 6/08/24	23CC	
27	3.9	LINEA DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	5 días	mié 28/08/24	mar 3/09/24	25	
28	3.10	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	5 días	mié 28/08/24	mar 3/09/24	25	
29	3.11	PAV. CONCRET. PREMEZCLADO MR=42	5 días	mar 27/08/24	lun 2/09/24	25FC-1 día	
30	3.12	COMISION TOPOGRÁFICA	45 días	mié 10/07/24	mar 10/09/24	19FF	
31	3.13	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP.)	10 días	mié 10/07/24	mar 23/07/24	19FF	
32	**4**	**4. ANDENES**	**69.6 días**	**mar 23/07/24**	**lun 28/10/24**	**9CC+10 días**	**162**
33	4.1	CONFORM. COMPACT. SUBRASANTE CBR=95	9 días	mar 23/07/24	vie 2/08/24	9CC+10 días	34CC+50%;86;87;67
34	4.2	SUMINISTRO E INSTALACION SUB BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE A	10 días	lun 29/07/24	lun 12/08/24	33CC+50%	35CC+50%
35	4.3	SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL TIPO NT 2500 O SIMILAR NO TEJIDO	5 días	lun 5/08/24	lun 12/08/24	34CC+80%	36CC+80%;37;38;82
36	4.4	CORDON CONCRETO 3100 PSI (10X20-25 CM)	13 días	vie 9/08/24	mié 28/08/24	35CC+80%	39CC-30%
37	4.5	SUMINISTRO E INSTALACION BORDILLO PREFABRICADO DE CONCRETO.	22 días	lun 12/08/24	mié 11/09/24	35	150
38	4.6	ADOQUIN GRESS VEHICULAR H=5.0CM	24 días	lun 12/08/24	vie 13/09/24	35	41FC-20%;43FC-5 día
39	4.7	COMISION TOPOGRÁFICA	60 días	lun 5/08/24	lun 28/10/24	36CC-30%	
40	**5**	**OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MOBILIARIO**	**55.5 días**	**mar 30/07/24**	**mar 15/10/24**		**162**
41	5.1	ALCORQUE EN CONCRETO MR=36 INC. JUNTA	18 días	vie 6/09/24	mié 2/10/24	38FC-20%	143
42	5.2	REPELLO MURO IMPERMEABLE 1:3	20 días	mar 30/07/24	lun 26/08/24	2;11	143CC+30%
43	5.3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III HASTA 75X75 INC. POSTE	5 días	vie 6/09/24	vie 13/09/24	38FC-5 días	44CC;45CC
44	5.4	SEÑAL VERTICAL DOBLE DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III HASTA 75X75 INC. POSTE	2 días	vie 6/09/24	mar 10/09/24	43CC	
45	5.5	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III HASTA 75X75 INC. POSTE	1 día	vie 6/09/24	lun 9/09/24	43CC	46
46	5.6	SEÑAL VERTICAL DOBLE DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III HASTA 75X75 INC. POSTE	1 día	lun 9/09/24	mar 10/09/24	45	
47	5.7	BOLARDO TIPO CEIBA	25 días	lun 12/08/24	lun 16/09/24	38CC	
48	5.8	TERTULIADERO BANCA SENCILLA CON ESPALDAR	7 días	vie 13/09/24	mar 24/09/24	38	
49	5.9	MESA DE PARQUES CRICLE	3 días	vie 13/09/24	mié 18/09/24	2;38	50
50	5.10	BUTACO CIRCLE	5 días	mié 18/09/24	mié 25/09/24	49	
51	5.11	ARCO UMBRAL DE ACERO	5 días	vie 13/09/24	vie 20/09/24	38	52
52	5.12	TROMPETA EN FORIA	7 días	vie 20/09/24	mar 1/10/24	51	53;54
53	5.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALA LED DE PISO 3W	8 días	mar 1/10/24	vie 11/10/24	52	
54	5.14	SUMINISTRO E INSTALACION GUIRNALDA EXTERIOR 15 LUCES LED 10M	10 días	mar 1/10/24	mar 15/10/24	52	
55	5.15	PARASOL INCL. ANCLAJE, FLANCHE E INSTALACIÓN	15 días	vie 13/09/24	vie 4/10/24	38	
56	**6**	**REDES SECAS**	**73 días**	**jue 4/07/24**	**lun 14/10/24**		**162;145**
57	**6.1**	**RED ELECTRICA DE AP**	**70 días**	**jue 4/07/24**	**mié 9/10/24**		
58	6.1.1	POSTE LAMINA 3/16" X 9 MTS	7 días	vie 13/09/24	mar 24/09/24	38	
59	6.1.2	RETIRO DE POSTE	3 días	mar 27/08/24	jue 29/08/24	10;60;61;62	59;65
60	6.1.3	RETIRO DE TRANSFORMADOR EN MT	2 días	mar 23/07/24	mié 24/07/24	64;63;61;62	59;65
61	6.1.4	RETIRO DE CABLE ACSR	12 días	jue 4/07/24	vie 19/07/24	2;6	59;60;64
62	6.1.5	DESMONTE DE CONJUNTO PRIMARIO SENCILLO	2 días	jue 4/07/24	vie 5/07/24	2;6	59;60;64
63	6.1.6	DESMONTE DE CONJUNTO SECUNDARIO	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/24	19	60
64	6.1.7	DESCONEXIÓN CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	1 día	lun 22/07/24	lun 22/07/24	61;62	60
65	6.1.8	DESMONTE DE LUMINARIAS	5 días	jue 25/07/24	mié 31/07/24	60	69
66	6.1.9	DESMONTE RETENIDA A TIERRA	2 días	vie 23/08/24	lun 26/08/24	2;69	59
67	6.1.10	DESCONEXIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	20 días	lun 5/08/24	vie 30/08/24	33	68CC+10%
68	6.1.11	DESCONEXIÓN DE CONTADOR DE ENERGÍA	20 días	mié 7/08/24	mar 3/09/24	67CC+10%	
69	6.1.12	DESCONEXIÓN RED SECUNDARIA 3 O MÁS HILOS	16 días	jue 1/08/24	jue 22/08/24	2;65	59;66
70	6.1.13	CABLE COBRE HLFR 4/0 AWG	25 días	mar 13/08/24	mar 17/09/24	75CF	71CC+50%
71	6.1.14	CABLE COBRE HLFR 1/0 AWG	25 días	vie 30/08/24	jue 3/10/24	70CC+50%	
72	6.1.15	INSTALACIÓN CABLE SECUNDARIO #3/0 A #4/0	20 días	lun 19/08/24	lun 16/09/24	82	73;84
73	6.1.16	ACOMETIDA E. 2F(2#8+1#10), 3/4"	15 días	lun 16/09/24	lun 7/10/24	72	81CC+50%;84CC+60%
74	6.1.17	POSTE DE CONCRETO 12X1050 KG	2 días	vie 13/09/24	mar 17/09/24	38	75;76
75	6.1.18	CONCRETADA DE POSTES PRIMARIOS	1 día	mar 17/09/24	mié 18/09/24	74	70CF
76	6.1.19	INSTALACIÓN TRAFO 10 A 50 KVA	2 días	mar 17/09/24	jue 19/09/24	74	77;78;79
77	6.1.20	INSTALACIÓN TRAFO 75 A 112,5 KVA	2 días	jue 19/09/24	lun 23/09/24	76	78;80
78	6.1.21	INSTALACIÓN CORTACIRCUITOS O PARARRAYOS	2 días	lun 23/09/24	mié 25/09/24	77;76	
79	6.1.22	VESTIDA DE CONJUNTO CORRIDO SENCILLO	3 días	jue 19/09/24	mar 24/09/24	76	
80	6.1.23	VESTIDA CONJUNTO DOBLE TERM DOBLE H (3F)	2 días	lun 23/09/24	mié 25/09/24	77	
81	6.1.24	MURETE PARA CONTADOR Y CAJA CON REJA	10 días	jue 26/09/24	mié 9/10/24	73CC+50%	
82	6.1.25	TUBO PVC 4"	5 días	lun 12/08/24	lun 19/08/24	35	72;83CC+30%
83	6.1.26	CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 1.0X1.0X1.0MT	5 días	mié 14/08/24	mar 20/08/24	82CC+30%	
84	6.1.27	INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA	5 días	vie 27/09/24	vie 4/10/24	72;73CC+60	

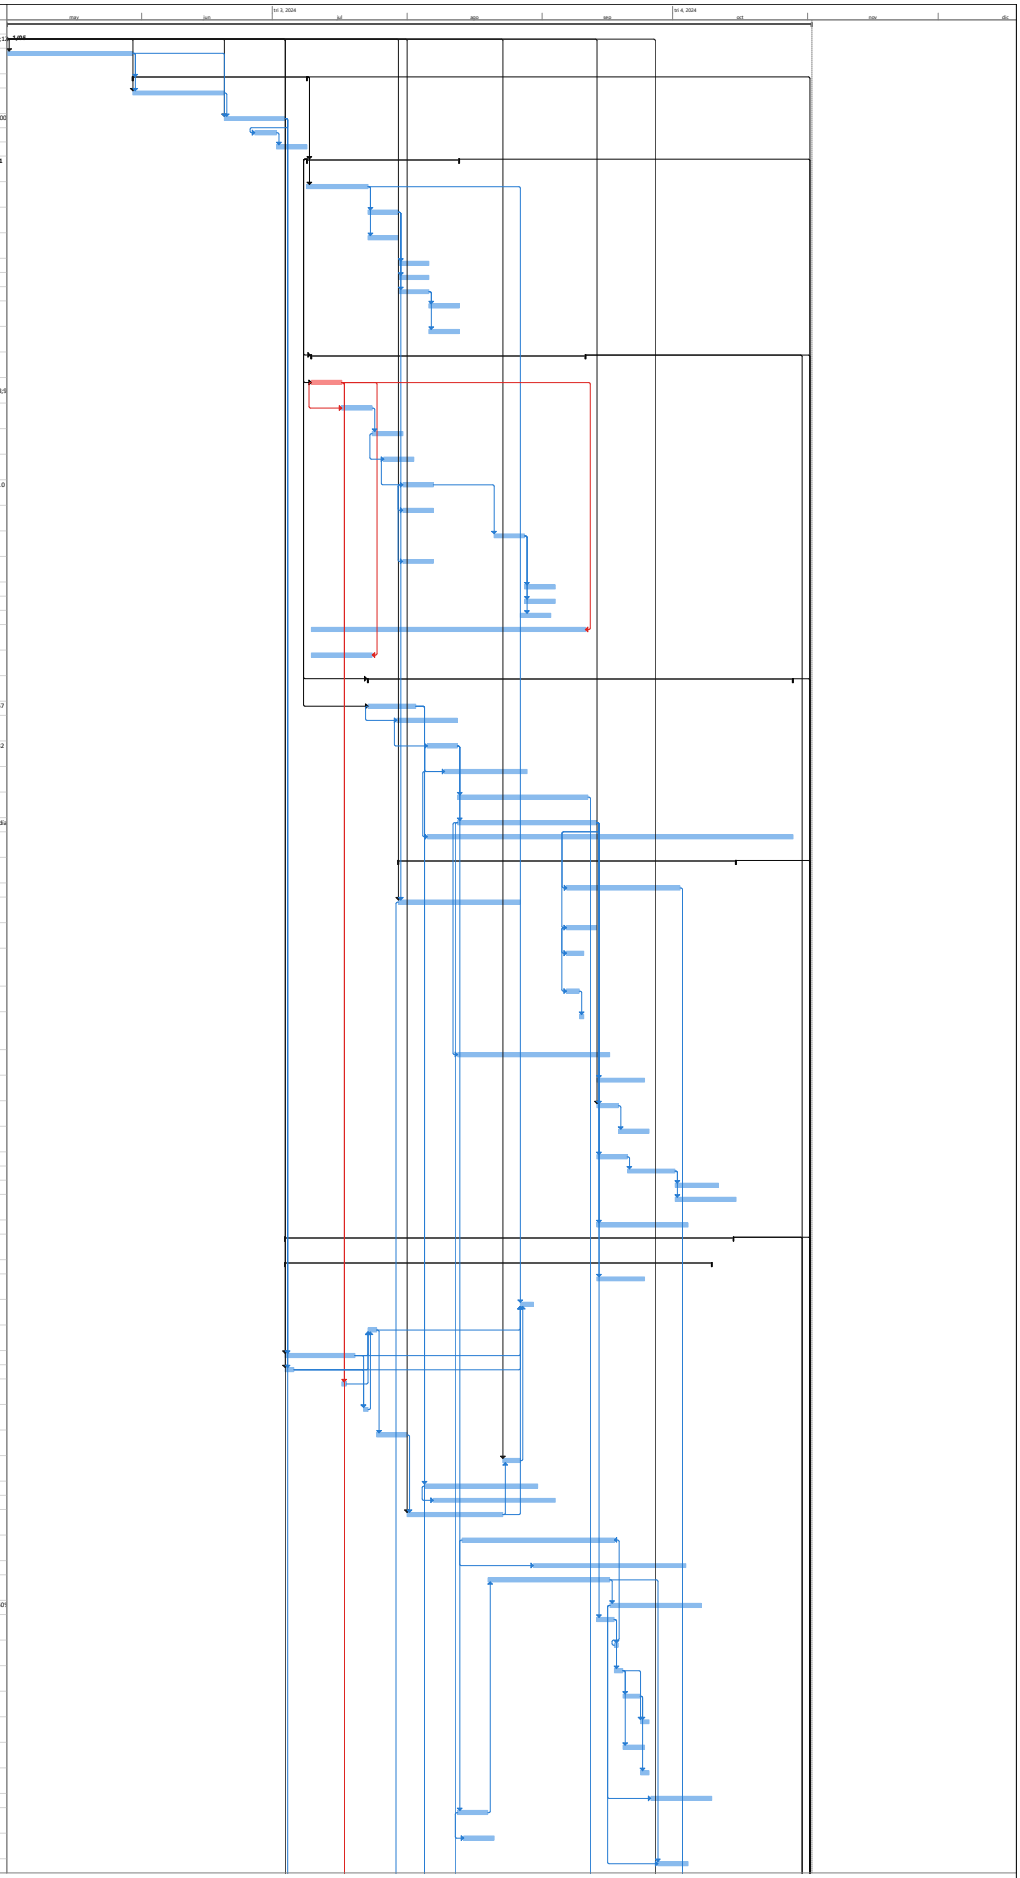

Proyecto: CRONOGRAMA OBR
Fecha: lun 8/04/24

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
85	**6.2**	**RED TELECOMUNICACIONES**	**51 días**	**lun 5/08/24**	**lun 14/10/24**		**145**
86	6.2.1	CAMARA INSPECCIÓN TIPO B H=0.00 - 1.50 MTS	10 días	lun 5/08/24	vie 16/08/24	33	88
87	6.2.2	EXCAVACION TIERRA A MANO	15 días	lun 5/08/24	vie 23/08/24	33	89
88	6.2.3	CAMARA INSPECCION TIPO B H=1.50 - 2.00 MTS	7 días	lun 19/08/24	mar 27/08/24	86	
89	6.2.4	EXCAVACION EN CONGLOMERADO MANUAL	30 días	lun 26/08/24	vie 4/10/24	87	90,92
90	6.2.5	PERFORAC A ROTAC CON DIAMANT SUELOS BLAN	5 días	lun 7/10/24	vie 11/10/24	89	91
91	6.2.6	TUBO GALV 2 X 3MTS	1 día	lun 14/10/24	lun 14/10/24	90	
92	6.2.7	TUBERIA GALVANIZADA 4"	4 días	lun 7/10/24	jue 10/10/24	89	
93	**7**	**REDES HUMEDAS**	**85 días**	**jue 4/07/24**	**mié 30/10/24**		**162;146;145**
94	**7.1**	**PRELIMINARES**	**60 días**	**jue 4/07/24**	**mié 25/09/24**		
95	7.1.1	LOCALIZACIÓN - REPLANTEO VIAS URBANAS	6 días	mié 17/07/24	mié 24/07/24	19	97
96	7.1.2	LOCALIZACION - REPLANTEO ACUEDUCTO - ALCANTARILLADO	6 días	mié 17/07/24	mié 24/07/24	19	97
97	7.1.3	CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M	8 días	jue 25/07/24	lun 5/08/24	95;96	98;99
98	7.1.4	ADECUACION PROVISIONAL DE SENDEROS PEATONALES EN MADERA	5 días	mar 6/08/24	lun 12/08/24	97	
99	7.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24	97	
100	7.1.6	COMISION TOPOGRÁFICA	60 días	jue 4/07/24	mié 25/09/24	2;6	
101	**7.2**	**REDES DE ACUEDUCTO**	**61 días**	**mié 17/07/24**	**mié 9/10/24**		
102	7.2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO HASTA 2,00M DE PROFUNDIDAD	20 días	mié 17/07/24	mar 13/08/24	19	103;112;115CC
103	7.2.2	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	4 días	mié 14/08/24	lun 19/08/24	102	104
104	7.2.3	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO DE LA EXCAVACION	10 días	mar 20/08/24	lun 2/09/24	103	105
105	7.2.4	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO IMPORTADO (TIPO ROCAMUERTA), COMPACTADO CON SALTARÍN	10 días	mar 3/09/24	lun 16/09/24	104	106
106	7.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLCHON DE ARENA	4 días	mar 17/09/24	vie 20/09/24	105	107
107	7.2.6	TUBERIA DE PRESION PARA ACUEDUCTO DE 4"	7 días	lun 23/09/24	mar 1/10/24	106	108;109;110;111
108	7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE HD 4X4 EL PVC	1 día	mié 2/10/24	mié 2/10/24	107	
109	7.2.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIONES PVC PRESION 4"	1 día	mié 2/10/24	mié 2/10/24	107	
110	7.2.9	VALV COMPUERTA HIERRO D= 4"	1 día	mié 2/10/24	mié 2/10/24	107	
111	7.2.10	ANCLAJE EN CONCRETO DE 21 MPA PARA TEE 4"; CODOS 4", TAPONES 4" Y UNIONES 4".	3 días	mié 2/10/24	vie 4/10/24	107	114
112	7.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ACUEDUCTO COMPLETA Ø1/2" A RED DE 4" - 6"	8 días	mié 14/08/24	vie 23/08/24	102	113
113	7.2.12	CAJA CONTADOR ACUEDUCTO	3 días	lun 26/08/24	mié 28/08/24	112	
114	7.2.13	PRUEBA HIDRAULICA A TUBERIA PVC 4"- 8"	3 días	lun 7/10/24	mié 9/10/24	111	
115	7.2.14	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	25 días	mié 17/07/24	mar 20/08/24	102CC	116FF
116	7.2.15	CARGUE MAT. EXCAV. A MAQUINA (SIN TRANSP.)	25 días	mié 17/07/24	mar 20/08/24	115FF	
117	**7.3**	**ALCANTARILLADO**	**76 días**	**mié 17/07/24**	**mié 30/10/24**		**146**
118	7.3.1	EXCAVACIÓN A MAQUINA DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO PROFUNDIDAD ENTRE 0 Y 2,00 M	5 días	mié 17/07/24	mar 23/07/24	19	119
119	7.3.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO HASTA 2,00M DE PROFUNDIDAD	5 días	mié 24/07/24	mar 30/07/24	118	120;121;122
120	7.3.3	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	4 días	mié 31/07/24	lun 5/08/24	119	
121	7.3.4	ENTIBADO O PROTECCION DE TALUDES PARA PROTECCION DE EXCAVACIONES	1 día	mié 31/07/24	mié 31/07/24	119	
122	7.3.5	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	3 días	mié 31/07/24	vie 2/08/24	119	123;124
123	7.3.6	RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE 16" A 33"	2 días	lun 5/08/24	mar 6/08/24	122	
124	7.3.7	RELLENO GRAVA TRITURADA PARA LECHO DE TUBERÍA	4 días	lun 5/08/24	jue 8/08/24	122	127;129
125	7.3.8	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECTO DE LA EXCAVACION	3 días	vie 27/09/24	mar 1/10/24	2;127;128;1	
126	7.3.9	RELLENO CON MATERAL SELECCIONADO IMPORTADO (TIPO ROCAMUERTA), COMPACTADO CON SALTARÍN	5 días	jue 17/10/24	mié 23/10/24	139	140
127	7.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NOVAFORT 6" DOMICILIARIAS	4 días	vie 9/08/24	mié 14/08/24	124	128;125
128	7.3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NOVAFORT 10" SUMIDEROS	3 días	jue 15/08/24	lun 19/08/24	127	125
129	7.3.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NOVAFORT 12" 315mm	6 días	vie 9/08/24	vie 16/08/24	124	130;125
130	7.3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE NOVAFORT 12" X 6"	3 días	lun 19/08/24	mié 21/08/24	129	131;125
131	1.9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NOVAFORT 355-S8	2 días	jue 22/08/24	vie 23/08/24	130	132;125
132	7.3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC NOVAFORT 500mm	4 días	lun 26/08/24	jue 29/08/24	131	133;125
133	7.3.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE NOVAFORT 20" X 6"	4 días	vie 30/08/24	mié 4/09/24	132	134;125
134	9.3.1	TUB PVC NOVALOC ASTM 24" SANIT"	6 días	jue 5/09/24	jue 12/09/24	133	135;125
135	9.3.16	CONEXIÓN DOMICILIARIA GRANDES DIÁMETROS	4 días	vie 13/09/24	mié 18/09/24	134	136;125
136	7.3.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE NOVAFORT 14" X 6"	6 días	jue 19/09/24	jue 26/09/24	135	137;125
137	7.3.20	CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, CON ALTURA DE CÁMARA ENTRE 2,01 - 2,50 m.	6 días	vie 27/09/24	vie 4/10/24	136	138
138	7.3.21	CONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN TIPO B, SEGÚN NORMAS DE EMCALI, CON ALTURA DE CÁMARA ENTRE 2,51 - 3,00 m.	3 días	lun 7/10/24	mié 9/10/24	137	139
139	7.3.22	CONSTRUCCION DE CAJA INSPECCION 60X60 CM PROF: 0.6 -1.0M (INCLUYE MARCO METALICO Y CONTRAMARCO METALICO, TAPA REFORZADA E IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO)	5 días	jue 10/10/24	mié 16/10/24	138	126;141
140	7.3.23	RETIRO SOBRANTES MAQUINA HASTA10KM.	5 días	jue 24/10/24	mié 30/10/24	126	
141	7.3.24	SUMIDERO ESPECIAL LONGITUDINAL CON DESARENADO TIPO B	3 días	jue 17/10/24	lun 21/10/24	139	
142	**8**	**ARTE Y MURALISMO**	**29.2 días**	**lun 9/09/24**	**vie 18/10/24**		**162;146;145**
143	8.1	MURALISMO Y ARTE URBANO	12 días	mié 2/10/24	vie 18/10/24	42CC+30%;4	
144	8.2	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MONUMENTOS	6 días	lun 9/09/24	mar 17/09/24	38CC+20 días	
145	**9**	**LIMPIEZA FINAL**	**2 días**	**jue 31/10/24**	**vie 1/11/24**	**148;142;93;**	
146	9.1	LIMPIEZA GENERAL	2 días	jue 31/10/24	vie 1/11/24	148;142;11	147FF;162FF
147	9.2	RETIRO ACARREO MATERIAL VOLQUETA KILOM	1 día	vie 1/11/24	vie 1/11/24	146FF	162
148	**10**	**PAISAJISMO**	**33 días**	**mié 11/09/24**	**lun 28/10/24**		**162;146;145**
149	10.1	SUMINISTRO E INSTALACION TIERRA AGRICOLA	5 días	mar 17/09/24	mar 24/09/24	150	151;152;159
150	10.2	RETIRO DE PRADO MALEZA	4 días	mié 11/09/24	mar 17/09/24	37	149;156;158
151	10.3	PRADO GATEADORA	4 días	mar 24/09/24	lun 30/09/24	149	
152	10.4	PLANTA ORNAMENTAL PEQUEÑA, H= 20-40 CM	7 días	mar 24/09/24	jue 3/10/24	149	153
153	10.5	PLANTA ORNAMENTAL GRANDE H=50-80 CM	7 días	jue 3/10/24	lun 14/10/24	152	155
154	10.6	PODA DE ARBOLES, INC. RETIRO DE RESIDUOS	4 días	mié 16/10/24	mar 22/10/24	155	157
155	10.7	RIEGO DE PRENDIMIENTO (2M3 X 100 M2)	2 días	lun 14/10/24	mié 16/10/24	153;156	154
156	10.8	CONTROL DE HORMIGA ARRIERA Y CARACOL AFRICANO	4 días	mar 17/09/24	lun 23/09/24	150	155
157	10.9	INTERVENCIÓN PARTES AFECTADAS INDIVIDUOS ARBOREOS	4 días	mar 22/10/24	lun 28/10/24	154	
158	10.10	CORTE ARBOL MAS RETIRO(INCL.RAICES)H>3.0	5 días	mar 17/09/24	lun 24/09/24	150	
159	10.11	ARBOL NATIVO H=80 - 100 CM	2 días	mar 24/09/24	jue 26/09/24	149	160
160	10.12	PALMA AFRICANA - CERA 80 - 100CM	2 días	jue 26/09/24	lun 30/09/24	159	161
161	10.13	PALMA MANILA H=180 - 200CM	2 días	lun 30/09/24	mié 2/10/24	160	
162	11	FIN	0 días	vie 1/11/24	vie 1/11/24	4;9;18;32;4	

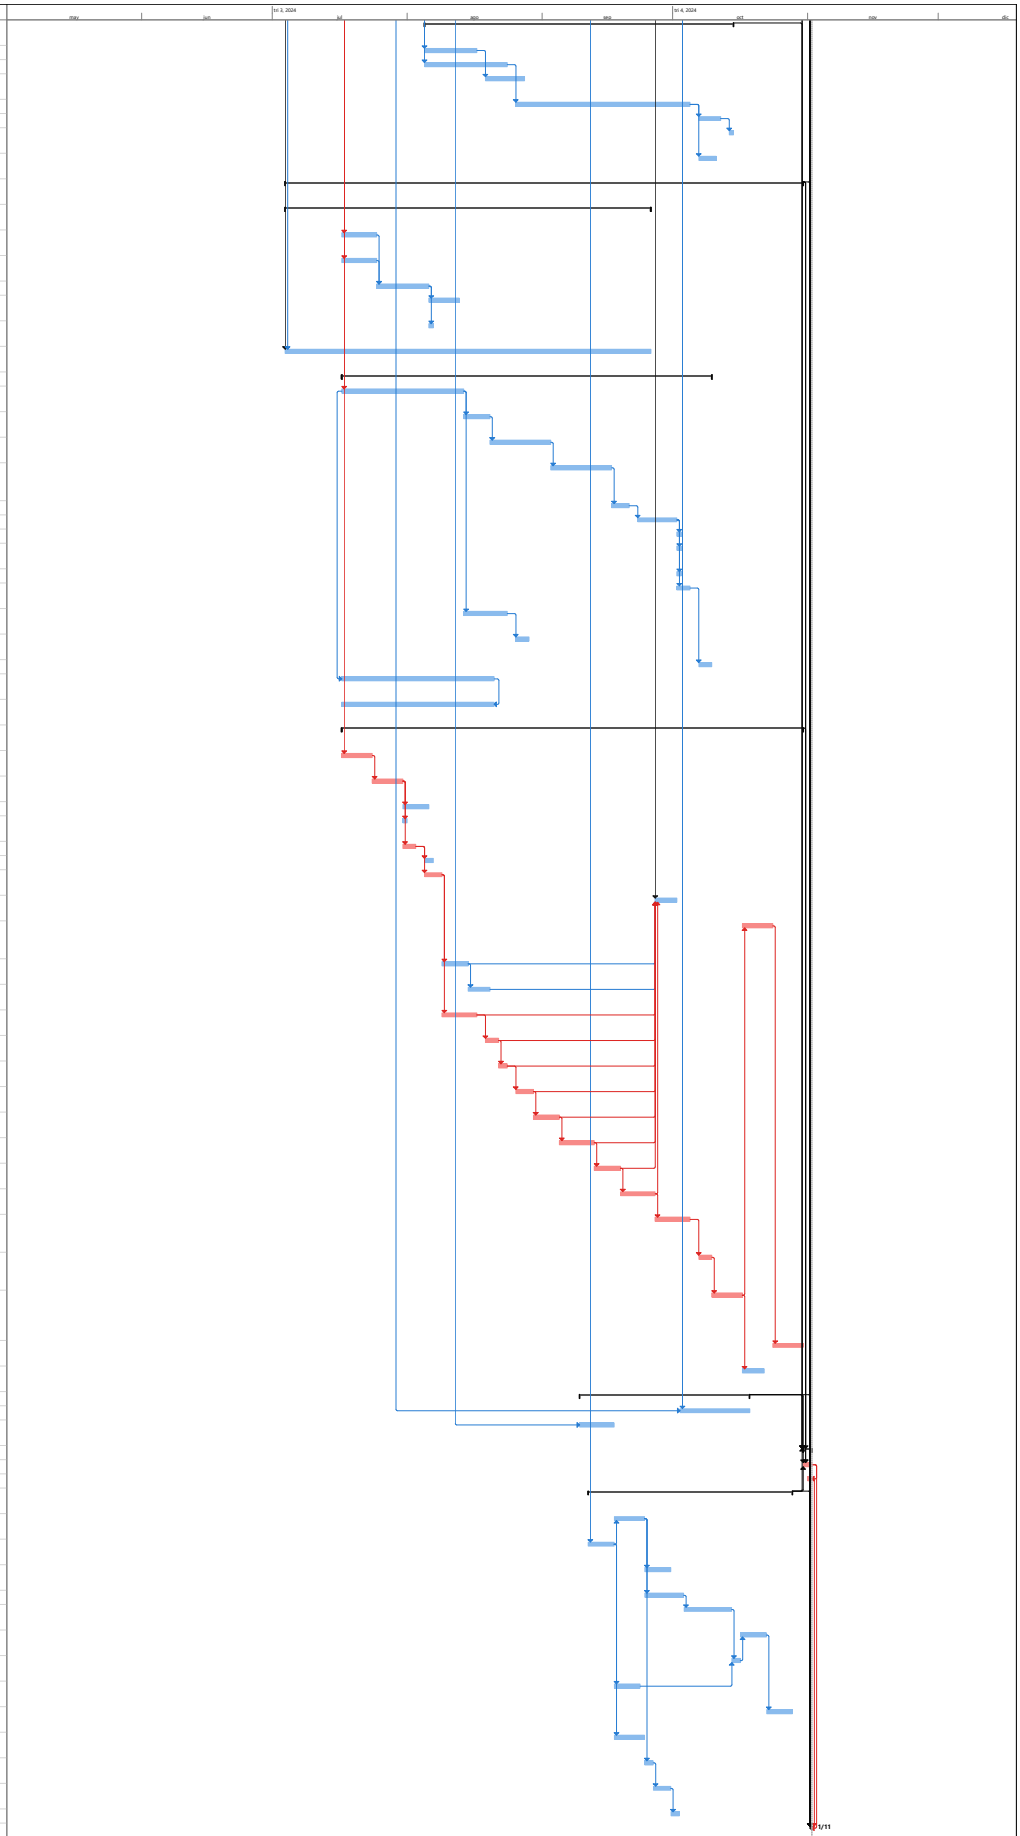

Proyecto: CRONOGRAMA OBR
Fecha: lun 8/04/24

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Tareas críticas · División crítica · Progreso · Progreso manual
