INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE LA MESA SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	26,88%	26,88%
Valor básico de la Obra	$ 31.691.551,11	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	89,78%	89,78%
Valor básico de la Obra	$ 31.691.551,11	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

AVANCE

ACTIVIDADES REALIZADAS
•PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA
•REGATA SOBRE MURO
•RESANE
•PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]

IMAGENES AVANCE



Comentario: PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA



Comentario: REGATA SOBRE MURO

INFORME SEMANAL


Semana Número: 4 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE LA MESA SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

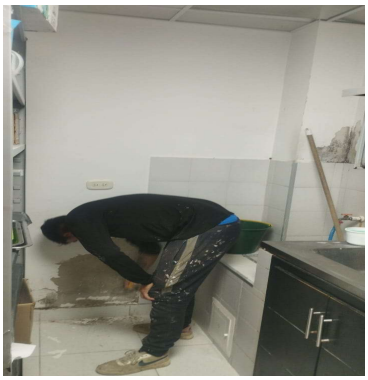

Comentario: RESANE



Comentario: PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]

Imagen

Comentario:

Imagen

Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE PACHO SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	71,71%	71,71%
Valor básico de la Obra	$ 70.336.761,31	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	80,53%	80,53%
Valor básico de la Obra	$ 70.336.761,31	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA


AVANCE

ACTIVIDADES REALIZADAS
•PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]

IMAGENES AVANCE



Comentario: PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]

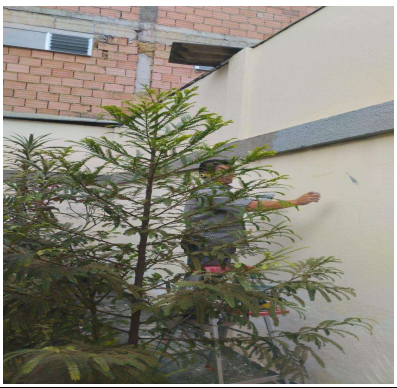

Comentario: PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma
Nombre :
Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ZIPAQUIRÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	48,10%	48,10%
Valor básico de la Obra	$ 28.394.791,42	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	95,27%	95,27%
Valor básico de la Obra	$ 28.394.791,42	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA

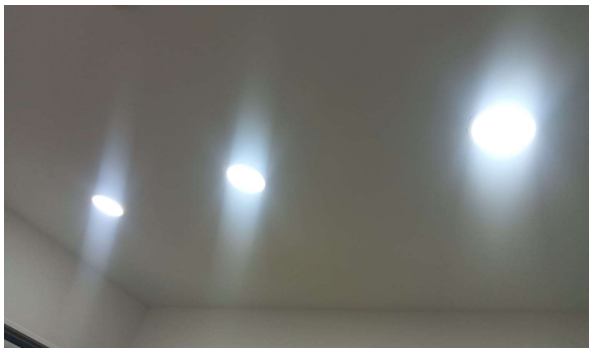


IMAGEN OFICINA


AVANCE

ACTIVIDADES REALIZADAS
•INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS
•INSTALACIÓN SANITARIO TIPO AHORRADOR
•INSTALACIÓN ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE
•INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR

IMAGENES AVANCE



Comentario: INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS

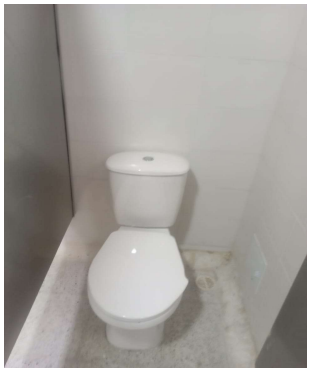

Comentario: SANITARIO TIPO AHORRADOR

INFORME SEMANAL


Semana Número: 4 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días


ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ZIPAQUIRÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

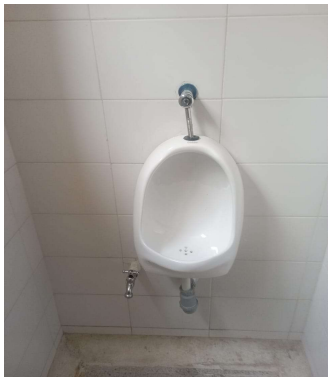

Comentario: ORINAL TIPO GOTTA O SIMILAR, INCLEYE LLAVE DE PUSH Y DESAGUE

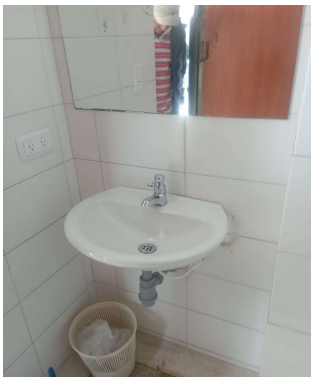

Comentario: . LAVAMANOS DE COLGAR

Imagen

Comentario:

Imagen

Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE GUADUAS SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,60%	9,60%
Valor básico de la Obra	$ 77.223.368,38	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	91,89%	91,89%
Valor básico de la Obra	$ 77.223.368,38	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA

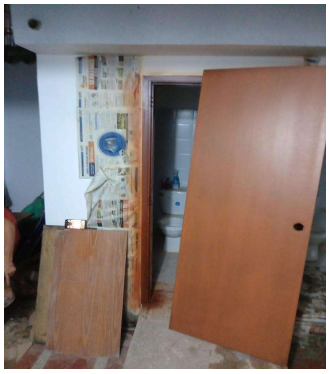


IMAGEN OFICINA

AVANCE

ACTIVIDADES REALIZADAS
•TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL

IMAGENES AVANCE



Imagen

Comentario: TINTILLA SOBRE MADERA LINEAL

Comentario:

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma
Nombre :
Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ESPINAL SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	16,24%	16,24%
Valor básico de la Obra	$ 61.401.293,13	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	98,06%	98,06%
Valor básico de la Obra	$ 61.401.293,13	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

AVANCE

ACTIVIDADES REALIZADAS
•VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS
•ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL
•PELÍCULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS

IMAGENES AVANCE



Comentario: VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS



Comentario: ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE ESPINAL SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	Imagen
Comentario: PELÍCULA ANTIREFLEJO DE SEGURIDAD 4 MICRAS	Comentario:
Imagen	Imagen
Comentario:	Comentario:

OBSERVACIONES	**CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA**
	Firma Nombre : Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CHAPARRAL SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	52,89%	52,89%
Valor básico de la Obra	$ 27.970.383,68	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	89,82%	89,82%
Valor básico de la Obra	$ 27.970.383,68	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

AVANCE

ACTIVIDADES REALIZADAS
•RESANE
•MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL

IMAGENES AVANCE



Comentario: RESANE



Comentario: RESANE

INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CHAPARRAL SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	Imagen
Comentario: MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	Comentario:
Imagen	Imagen
Comentario:	Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 4 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE MELGAR SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,07%	12,07%
Valor básico de la Obra	$ 84.838.594,98	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	94,43%	94,43%
Valor básico de la Obra	$ 84.838.594,98	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

AVANCE

ACTIVIDADES REALIZADAS
•PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA
•DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS
•ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA

IMAGENES AVANCE





Comentario: PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA

Comentario: DESMONTE DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL


Semana Número: 4 Del: 25 de diciembre de 2023 Al: 31 de diciembre de 2023

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE MELGAR SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

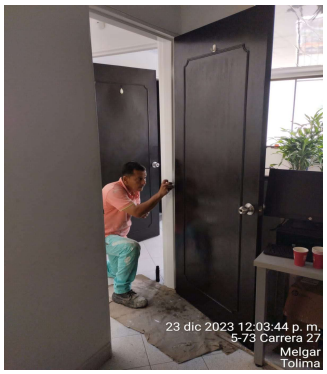	Imagen
Comentario: ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	Comentario:
Imagen	Imagen
Comentario:	Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.
