INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 8 de enero de 2024 Al: 14 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE PACHO SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	4,87%	76,72%
Valor básico de la Obra	$ 70.336.761,31	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	9,22%	89,94%
Valor básico de la Obra	$ 70.336.761,31	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA

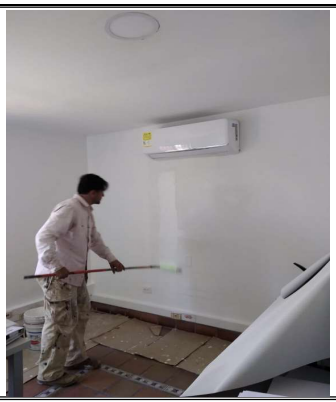


IMAGEN OFICINA


AVANCE

Se realiza apliación de pintura en muros internos

IMAGENES AVANCE



Comentario: Aplicación de pintura en muros de oficina

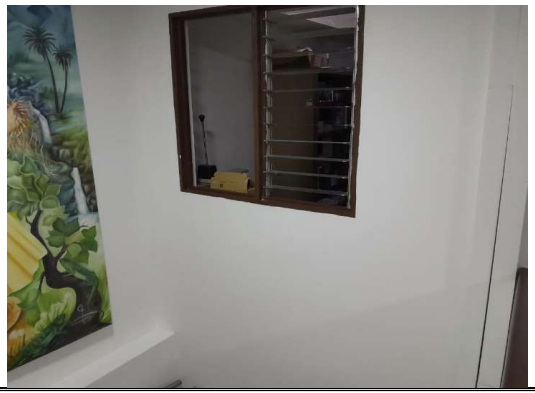

Comentario: Aplicación de pintura en punto fijo escalera

INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 8 de enero de 2024 Al: 14 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE PACHO SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)



Comentario: Aplicación de pintura en punto fijo escalera



Comentario: Aplicación de pintura en punto fijo escalera



Comentario: Aplicación de pintura en punto fijo escalera



Comentario: Aplicación de pintura en punto fijo escalera

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 8 de enero de 2024 Al: 14 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE GACHETÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	40,16%	75,46%
Valor básico de la Obra	$ 77.561.598,53	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	9,64%	9,64%
Valor básico de la Obra	$ 77.561.598,53	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se realiza recorrido de cubierta y limpieza de ladrillo a la vista en muros internos

IMAGENES AVANCE



Comentario: Se realiza recorrido de cubierta



Comentario: Se realiza recorrido de cubierta

INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 8 de enero de 2024 Al: 14 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE GACHETÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)



Comentario: Se realiza limpieza de ladrillo



Comentario: Se realiza limpieza de ladrillo

Imagen

Comentario:

Imagen

Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 8 de enero de 2024 Al: 14 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CHIQUINQUIRÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,44%	25,47%
Valor básico de la Obra	$ 87.470.638,67	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	9,88%	80,04%
Valor básico de la Obra	$ 87.470.638,67	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se realizan actividades de demolición de enchape, resanes con estuco y pintura de muros

IMAGENES AVANCE



Comentario: Demolición enchape de muro



Comentario: Resanes muros internos

INFORME SEMANAL

Semana Número: 6 Del: 8 de enero de 2024 Al: 14 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días


ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CHIQUINQUIRÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)




Comentario: Resanes muros exteriores

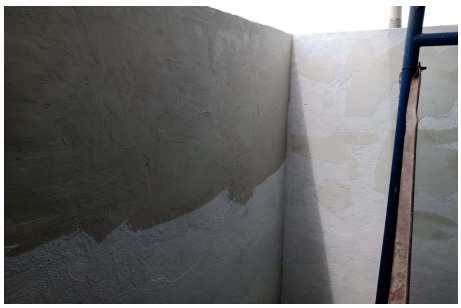

Comentario: Resane en muro



Comentario: Aplicación de vinilo tipo I

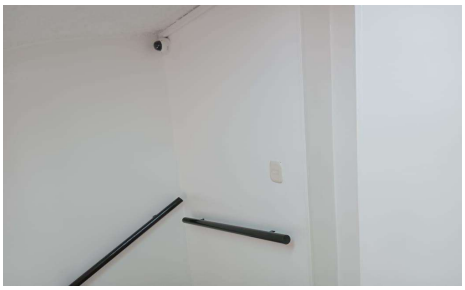

Comentario: Aplicación vinilo tipo I

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:
