INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 5 de febrero de 2024 Al: 11 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE PACHO SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	10,23%	93,28%
Valor básico de la Obra	$ 70.336.761,31	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	93,12%
Valor básico de la Obra	$ 70.336.761,31	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

AVANCE

A la espera de aprobación de actividades mayores y menores para continuar con la ejecución y terminación de actividades en esta sede

IMAGENES AVANCE

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 5 de febrero de 2024 Al: 11 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE GACHETÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,19%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 77.561.598,53	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,76%	63,47%
Valor básico de la Obra	$ 77.561.598,53	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se realizan actividades de pintura en puertas de madera de oficinas

IMAGENES AVANCE



Imagen

Comentario: Se realiza actividad de pintura en puertas de madera

Comentario:

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma

Nombre :

Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 5 de febrero de 2024 Al: 11 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CHIQUINQUIRÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	12,07%	89,41%
Valor básico de la Obra	$ 87.470.638,67	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	9,64%	91,06%
Valor básico de la Obra	$ 87.470.638,67	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

AVANCE

Resanes sobre muros, pintura sobre muros internos y sbre techo en placas de oficinas

IMAGENES AVANCE



Comentario: Aplicación de pintura sobre muros internos



Comentario: Aplicación de pintura sobre techo y muros internos

INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 5 de febrero de 2024 Al: 11 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CHIQUINQUIRÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)



Comentario: Resanes sobre muro



Comentario: Aplicación de pintura sobre muro



Comentario: Aplicación de pintura sobre muro



Comentario: Aplicación de pintura sobre muro

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 5 de febrero de 2024 Al: 11 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CÁCHIRA SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,06%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 29.246.647,32	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	9,55%	91,12%
Valor básico de la Obra	$ 29.246.647,32	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA

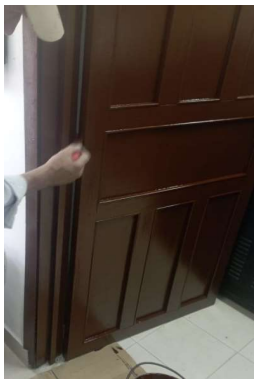


IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se realiza pintura sobre puertas de madera, pintura sobre carpintería metálica como las ventanas, emboquillada de enhape y aplicación de pintura en muros de fachada

IMAGENES AVANCE



Comentario: Aplicación de pintura sobre puertas de madera



Comentario: Aplicación de pintura sobre carpintería metálica en ventanas

INFORME SEMANAL

Semana Número: 10 Del: 5 de febrero de 2024 Al: 11 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CÁCHIRA SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)



Comentario: Emboquillada de enchape



Comentario: Aplicación de pintura en koraza sobre la fachada



Comentario: Aplicación de pintura koraza en fachada



Comentario: Aplicación de pintura koraza en fachada

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:
