INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE PACHO SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,15%	96,43%
Valor básico de la Obra	$ 70.336.761,31	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,30%	95,42%
Valor básico de la Obra	$ 70.336.761,31	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA




IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se realizan actividades de aplicación de vinilo tipo I, emboquillada de enchape e instalación de luminarias y enchufes

IMAGENES AVANCE



Comentario: Aplicación de vinilo tipo I



Comentario: Boquilla de enchape

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE PACHO SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	
Comentario: Instalación de luminarias	Comentario: Instalación de interruptor
Imagen	Imagen
Comentario:	Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE GACHETÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 77.561.598,53	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	12,51%	75,98%
Valor básico de la Obra	$ 77.561.598,53	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA


AVANCE

Se realizan actividades en cubierta, tanque de agua potable, cielo raso y barandas en madera

IMAGENES AVANCE



Comentario: Se realiza actividad de cielo raso

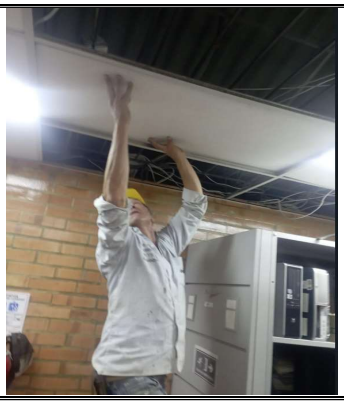

Comentario: Se realizan actividades en cielo raso

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días


ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE GACHETÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:


CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)



Comentario: Se realiza limpieza de tanque de agua potable

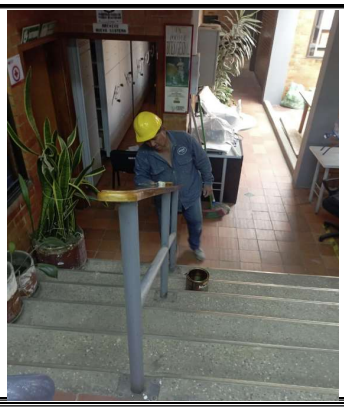

Comentario: Se realiza pintura de barandas en madera

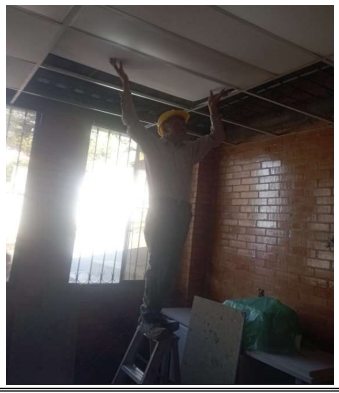

Comentario: Se realiza desmonte de cielo raso



Comentario: Se realiza desmonte de cielo raso

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CHIQUINQUIRÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6,05%	95,46%
Valor básico de la Obra	$ 87.470.638,67	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	8,94%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 87.470.638,67	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

AVANCE

Resanes sobre muros, pintura sobre muros internos y sbre techo en placas de oficinas

IMAGENES AVANCE



Comentario: Aplicación de pintura sobre muros internos



Comentario: Aplicación de pintura sobre techo y muros internos

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CHIQUINQUIRÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)



Comentario: Resanes sobre muro



Comentario: Aplicación de pintura sobre muro



Comentario: Aplicación de pintura sobre muro



Comentario: Aplicación de pintura sobre muro

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CÁCHIRA SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 29.246.647,32	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	6,70%	97,82%
Valor básico de la Obra	$ 29.246.647,32	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA

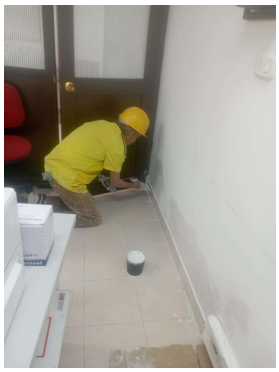


IMAGEN OFICINA


AVANCE

Se realiza pintura sobre puertas de madera, pintura sobre carpintería metálica como las ventanas, emboquillada de enhape y aplicación de pintura en muros de fachada

IMAGENES AVANCE



Comentario: Aplicación de pintura

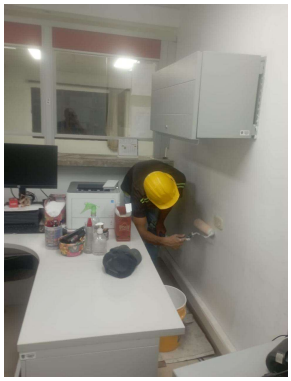

Comentario: Aplicación de pintura

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA** **PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07** **Versión: 01** **Fecha: 11 - 08 - 2021** **Página 1 de 1**

INFORME SEMANAL


Semana Número: 11 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CÁCHIRA SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

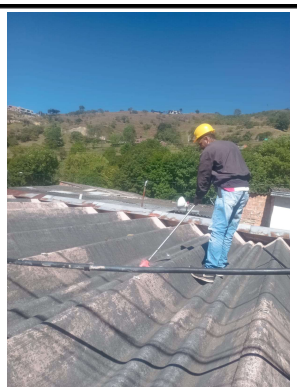	
Comentario: Recorrido de cubierta teja anulado	Comentario:
Imagen	Imagen
Comentario:	Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:
