INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE PACHO SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,57%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 70.336.761,31	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	4,58%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 70.336.761,31	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se realiza instalación de sanitario y pintura de puertas metálicas y en madera

IMAGENES AVANCE





Comentario: Instalación de sanitario

Comentario: Aplicación de pintura en esmalte

INFORME SEMANAL


Semana Número: 11 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días


ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE PACHO SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

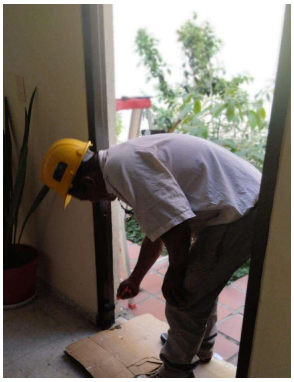

Comentario: Aplicación de pintura en esmalte

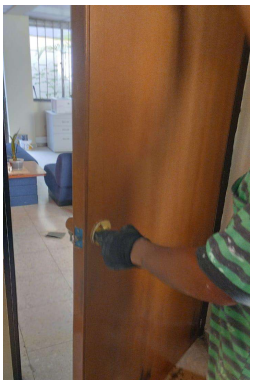

Comentario: Aplicación de tintilla en puertas

Imagen

Comentario:

Imagen

Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE GACHETÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 77.561.598,53	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	24,02%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 77.561.598,53	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA




IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se realizan actividades em cubierta, cielo raso y enchapes

IMAGENES AVANCE



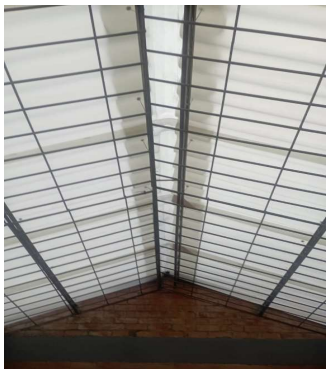

Comentario: Se termina intervención en cubierta

Comentario: Se termina intervención en cubierta

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE GACHETÁ SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)



Comentario: Instalación cielo raso



Comentario: Demolición de enchape



Comentario: Instalación enchape



Comentario: Instalación enchape

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Matrícula No.:

INFORME SEMANAL

Semana Número: 11 Del: 12 de febrero de 2024 Al: 18 de febrero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE CÁCHIRA SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA)

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 29.246.647,32	$

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	2,18%	100,00%
Valor básico de la Obra	$ 29.246.647,32	

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF - NIT: 901762215 - 4
Contrato No.	2391 DE 2023
Valor Inicial:	$ 600.182.493,03
Valor Actualizado:	$ 600.182.493,03
Plazo Inicial:	2 MESES Y 20 DÍAS
Plazo Actualizado:	2 MESES Y 20 DÍAS
Fecha de Iniciación:	5 DE DICIEMBRE DE 2023
Fecha de Vencimiento:	24 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Plazo Actualizado:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Vencimiento:	

IMAGEN OFICINA



IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se realiza aplicación de vinilo tipo I

IMAGENES AVANCE



Imagen

Comentario: Aplicación de vinilo tipo I

Comentario:

OBSERVACIONES

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

Firma
Nombre :
Matrícula No.:
