SGC-CP-16335-24
Neiva, junio 13 de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Ciudad


Ref.: Contrato de interventoría No.437 de 2023
Asunto: Informe de interventoría No.7

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 al 31 de mayo de 2024, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe interventoría No.7
2. Informes semanales del periodo
3. Acta de comité técnico
4. Correspondencia
5. Seguridad social

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

7

Ingenieria & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	7	Periodo comprendido entre el :	1 de mayo de 2024	y el:	31 de mayo de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
Contrato Nº:	437 DE 2023
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES
Fecha de Inicio:	NOVIEMBRE 8 DE 2023
Fecha de Terminación:	SEPTIEMBRE 7 DE 2024
Valor Inicial:	$ 152.573.345,00
Valor adicional:	$ -
Valor total:	$ 152.573.345,00
Valor pagado:	$ 54.397.509,04
Valor por pagar:	$ 98.175.835,96
Nombre Supervisor:	ING. JAVIER CARDOZO GUTIERREZ

CONTRATO DE OBRA

Objeto:	"ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
Contrato N.º:	423 DE 2023
Contratista:	SOFOR INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES
Fecha de Inicio:	NOVIEMBRE 8 DE 2023
Fecha de Terminación:	SEPTIEMBRE 7 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.505.964.466,00
Valor adicional:	
Valor total:	$ 1.505.964.466,00
Valor pagado:	$ 536.874.274,00
Valor por pagar:	$ 969.090.192,00
Nombre interventor:	ING. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/10/2023	22/03/2025	$ 45.772.020,00
Prestaciones sociales	30/10/2023	9/09/2027	$ 15.257.340,00
Calidad del servicio	30/10/2023	12/03/2025	$ 15.257.340,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	8/11/2023	11/03/2025	$ 301.192.893,20
Pago salarios, prestaciones sociales e ind.	8/11/2023	8/09/2027	$ 150.596.446,60
Calidad y correcto func. bienes y equipos	8/11/2023	11/03/2025	$ 301.192.893,20
Estabilidad y calidad de la obra	8/11/2023	8/09/2029	$ 301.192.893,20
Responsabilidad civil extracontractual	8/11/2023	8/09/2024	$ 348.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial 1	29/12/2023	$ 19.229.353,00
Acta parcial 2	30/04/2024	$ 22.733.428,42
Acta parcial 3	En proceso	$ 12.434.727,62
TOTAL		**$ 54.397.509,04**

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial 1	4/04/2024	$ 206.778.825,00
Acta parcial 2	30/04/2024	$ 207.328.798,00
Acta parcial 3	En proceso	$ 122.766.651,00
TOTAL		**$ 536.874.274,00**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

7

Ingeniería & Construcción

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	49,43%	16,69%	66,12%
% Ejecutado	35,85%	3,58%	39,43%
Diferencia	-13,59%	-13,11%	-26,69%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 744.432,89	$ 251.356,03	$ 995.788,92	66,12%
% Ejecutado	$ 539.816,91	$ 53.958,76	$ 593.775,67	39,43%
Diferencia	$ -	$ (197.397,27)	$ (197.397,27)	-26,69%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

En este periodo se ejecutaron actividades de obra en los predios de los siguientes municipios:

Paicol: vereda La Laja en el predio RNSC Cerritos se ejecutaron 600m de aislamiento de 600m contractuales; en el municipio de **Neiva** se hincaron los postes para el aislamiento del predio Mirador de la vereda San Miguel, en la vereda Santa Lucia en el predio Veraguas se han ejecutado 600m de 1.770m y en la vereda La Plata se hincaron los postes para el aislamiento del predio Himalaya y se inició el ahoyado e hincado de postes en el predio La Carolina. También se terminó la restauracion activa de las 3 ha faltantes en el Resguardo indígena del municipio de **Iquira**.

2. PERSONAL


CONTRATO DE CONSULTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	4		80,00%	0,00%	4
TÉCNICO	1		20,00%	0,00%	1
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	5	0	100,00%	0,00%	5
TOTALES	5		100,00%		


CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		4	0,00%	26,67%	4
TÉCNICO	1	1	6,67%	6,67%	2
M.O.N.C.	9		60,00%	0,00%	9
TOTAL	10	5	66,67%	33,33%	15
TOTALES	15		100,00%		


TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	**7**	CQ Ingenieria & Construcción

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

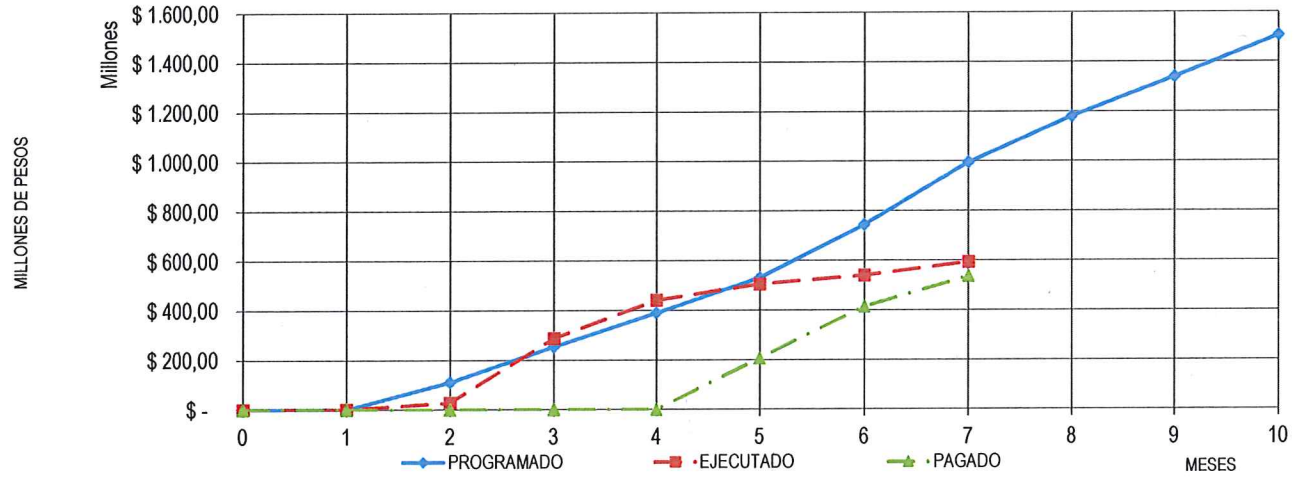

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo el contratista avanzó en actividades de entrega de materiales en la mayoría de predios del municipio de Neiva para mejorar el rendimiento; con respecto a la situación de los predios de Santa María se solicitó a la CAM seguir gestionando ante la Gobernación para pronta solución a la problemática que existe. De igual manera, se le solicitó al contratista entregar la reprogramación en el cual garantice que las actividades faltantes se ejecuten dentro del tiempo establecido en el contrato.
Se continúa en proceso de verificación de los aislamientos terminados y parciales en los diferentes predios.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Federico Pérez Charry **Cargo:** Inspector de Interventoría	**Nombre:** Hermencia Zambrano Serrato **Cargo:** Coordinador de Interventoría	**Nombre:** Carlos Arturo Quiza Camacho **Cargo:** Contratista de Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

7

Ingenieria & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	423 DE 2023	**Contratista:**	SOFOR INGENIERIA SAS
Periodo:	1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Coordinador contratista de obra	ANDRES FELIPE SAAVEDRA	**Coordinador de Interventoria:**	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
	ÍTEMS				**$ 1.197.967.119,00**				**$ 429.414.452,00**	**$ 42.923.207,00**	**$ 472.337.660,00**		**$ 725.629.459,00**
1	Aislamiento en zonas de proteccion de la cuenca hidrigrafica del rio Las Ceibas	ML	35.467,00	$ 23.408	$ 830.215.310,00	17.111,00	600,00	17.711,00	$ 400.536.109,00	$ 14.044.864,00	$ 414.580.973,00	17.756,00	$ 415.634.337,00
2	Procesos de restauracion activa en areas de conservacion de la zona de reserva forestal (predioos adquiridos y otros) en la cuenca hodrografica del rio Las Ceibas	HA	10,00	$ 7.896.838	$ 78.968.375,00	0,00		0,00				10,00	$ 78.968.375,00
3	Implementar procesos de restauracion activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)	HA	30,00	$ 9.626.114	$ 288.783.434,00	3,00	3,00	6,00	$ 28.878.343,00	$ 28.878.343,00	$ 57.756.687,00	24,00	$ 231.026.747,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				**$ 1.197.967.119,00**				**$ 429.414.452,00**	**$ 42.923.207,00**	**$ 472.337.660,00**		**$ 725.629.459**
	ADMINISTRACION		**10,00%**		$ 119.796.712,00				$ 42.941.445,00	$ 4.292.321,00	$ 47.233.766,00		$ 72.562.946,00
	IMPREVISTOS		**5,00%**		$ 59.898.356,00				$ 21.470.723,00	$ 2.146.159,00	$ 23.616.883,00		$ 36.281.473,00
	UTILIDAD		**9,00%**		$ 107.817.041,00				$ 38.647.301,00	$ 3.863.089,00	$ 42.510.389,00		$ 65.306.651,00
	IVA		**19,00%**		$ 20.485.238,00				$ 7.342.987,00	$ 733.987,00	$ 8.076.974,00		$ 12.408.264,00
	COSTO AIU (24.00%)				**$ 307.997.347,00**				**$ 110.402.456,00**	**$ 11.035.556,00**	**$ 121.438.012,00**		**$ 186.559.334,00**
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 1.505.964.466,00**				**$ 539.816.908,00**	**$ 53.958.763,00**	**$ 593.775.672,00**		**$ 912.188.793,00**
											39,43%		

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 1.505.964.466,00	**V/R ANTICIPO:**	N/A
V/R ADICIONES:	$ 0,00	**% ANTICIPO:**	0,00%
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 1.505.964.466,00**	**% RETEGARANTIA:**	0,00%

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No. 1	FE-96	4/04/2024	$ 206.778.825,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 206.778.825,00	$ 1.299.185.641,00	13,73%
2	Acta parcial No. 2	FE-98 y 99	30/04/2024	$ 207.328.798,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 207.328.798,00	$ 1.091.856.843,00	13,77%
2	Acta parcial No. 3	FE-100 y 101	En proceso	$ 122.766.651,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 122.766.651,00	$ 969.090.192,00	8,15%
	TOTAL			**$ 536.874.274,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 414.107.623,00**	**$ 969.090.192,00**	**35,65%**

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 152.573.345,00	**V/R ANTICIPO:**	NA
V/R ADICIONES:	$ 0,00	**% ANTICIPO:**	NA
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 152.573.345,00**	**% RETEGARANTIA:**	10,00%

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No.1	FVE 59	29/12/2023	$ 19.229.353,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 19.229.353,00	$ 133.343.992,00	12,60%
2	Acta parcial No.2	FVE 60 y 61	30/04/2024	$ 22.733.428,42	$ 0,00	N/A	N/A	$ 22.733.428,42	$ 110.610.563,58	14,90%
3	Acta parcial No.3	FVE 62 y 64	En proceso	$ 12.434.727,62	$ 0,00	N/A	N/A	$ 12.434.727,62	$ 98.175.835,96	8,15%
	TOTAL			**$ 54.397.509,04**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 54.397.509,04**	**$ 98.175.835,96**	**35,65%**

cam	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 2**	7	CQ Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	SOFOR INGENIERIA SAS	Coordinador de obra:	ANDRES FELIPE SAAVEDRA
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Coordinador Interventoria:	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO
Fecha del registro fotográfico:	1 de mayo de 2024	al	31 de mayo de 2024

FOTOGRAFÍA No.1



PREDIO HIMALAYA - VDA LA PLATA - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.2



PREDIO LA CAROLINA - VDA LA PLATA - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.3



HINCADO DE POSTES - MIRADOR - SAN MIGUEL - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.4



RNSC VERAGUAS - SANTA LUCIA - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.5



LIMPIEZA DE LOTE PARA SIEMBRA - RESGUARDO RIO NEGRO - IQUIRA

FOTOGRAFÍA No.6



SIEMBRA - RESGUARDO RIO NEGRO - IQUIRA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	6-may-24	PERIODO No.	25	DEL	29/04/2024	AL	5/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	437 DE 2023	CONTRATO No.:	423 DE 2023
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	PLAZO INICIAL (5 MESES):	304
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	125	DÍAS POR EJECUTAR	125
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	304	PLAZO ACTUALIZADO:	304
PLAZO TRANSCURRIDO:	179 EQUIVALE AL 58,9%	PLAZO TRANSCURRIDO:	179 EQUIVALE AL 58,9%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00	VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/12/2023	25/12/2023	-21
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	1/04/2024		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	11/12/2023	15/01/2024	-35

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 796.469.676,12	52,89%	-16,26%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 551.587.438,72	36,63%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante
LUIS MORALES	5.854.546	Ayudante
ISRAEL MARTINEZ MONROY	93.128.802	Ayudante
NIVER ARDILA	1.071.987.467	Ayudante
EDUARDO ORTIZ	9.905.006	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,00%	30,77%	4
	TECNICO	1	1	7,69%	7,69%	2
	M.O/N.C	7	0	53,85%	0,00%	7
	TOTALES	**8**	**5**	**61,54%**	**38,46%**	**13**
	TOTAL	13		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se inició la ejecución de 600m de 1.770m del aislamiento en el predio Veraguas vereda Santa Lucía del municipio de Neiva; de igual manera en el municipio de Paicol predio Cerritos, vereda La Laja se realizaron 400m de 600m del aislamiento. Se avanzó con el transporte de postes hasta sitio de trabajo en los predios Himalaya y La Carolina, vereda La Plata del municipio de Neiva.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados continúan en proceso de verificación por parte de la Interventoría. Se recomienda al contratista aumentar la mano de obra ya que se esta reflejando un atraso significativo en las actividades.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



AVANCE - RNSC CERRITOS -PAICOL



AVANCE - RNSC VERAGUAS - NEIVA



TRANSPORTE DE MATERIALES - HIMALAYA - NEIVA



TRANSPORTE DE MATERIALES - LA CAROLINA - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	14-may-24	PERIODO No.	26	DEL	6/05/2024	AL	12/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	437 DE 2023			CONTRATO No.:	423 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (5 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	118			DÍAS POR EJECUTAR	118		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	186	EQUIVALE AL	61,2%	PLAZO TRANSCURRIDO:	186	EQUIVALE AL	61,2%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00			VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/12/2023	25/12/2023	-21
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	1/04/2024		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	11/12/2023	15/01/2024	-35

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 848.506.464,54	56,34%	-19,33%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 557.472.705,01	37,02%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante
LUIS MORALES	5.854.546	Ayudante
ISRAEL MARTINEZ MONROY	93.128.802	Ayudante
NIVER ARDILA	1.071.987.467	Ayudante
EDUARDO ORTIZ	9.905.006	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,00%	30,77%	4
	TECNICO	1	1	7,69%	7,69%	2
	M.O/N.C	7	0	53,85%	0,00%	7
	TOTALES	**8**	**5**	**61,54%**	**38,46%**	**13**
	TOTAL	13		100%		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se continuó el hincado de postes del aislamiento en el predio Veraguas vereda Santa Lucía del municipio de Neiva; de igual manera, en el municipio de Paicol predio Cerritos, vereda La Laja se realizaron 600m de 600m del aislamiento. Se avanzó con el transporte de postes hasta sitio de trabajo en el predio La Carolina y se están hincando postes en el predio de Himalaya en la vereda La Plata del municipio de Neiva.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados continúan en proceso de verificación por parte de la Interventoría. Se recomienda al contratista aumentar la mano de obra ya que se esta reflejando un atraso significativo en las actividades.


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



RNSC CERRITOS - VDA LA LAJA - PAICOL



AVANCE - RNSC VERAGUAS - NEIVA

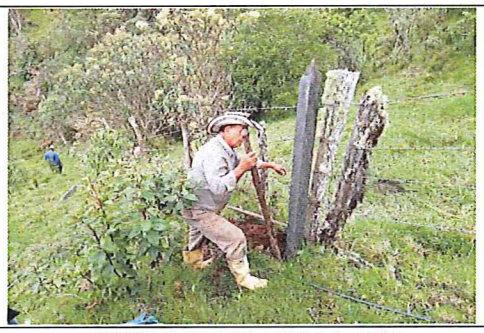

HINCADO DE POSTES - HIMALAYA - NEIVA



TRANSPORTE DE MATERIALES - LA CAROLINA - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	20-may-24	PERIODO No.	27	DEL	13/05/2024	AL	19/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	437 DE 2023			CONTRATO No.:	423 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (5 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DIAS POR EJECUTAR	111			DIAS POR EJECUTAR	111		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	193	EQUIVALE AL	63,5%	PLAZO TRANSCURRIDO:	193	EQUIVALE AL	63,5%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00			VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/12/2023	25/12/2023	-21
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	1/04/2024		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	11/12/2023	15/01/2024	-35
				-56,00

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 897.600.618,15	59,60%	-22,59%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 557.472.705,01	37,02%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante
ISRAEL MARTINEZ MONROY	93.128.802	Ayudante
JOSE HERRERA	5.843.980	Ayudante
JHON HERNANDEZ	1.110.531.154	Ayudante
JACOBO VARGAS	1.110.443.170	Ayudante
MIYER ADALBER ARIAS SANCHEZ	1.193.517.973	Ayudante
HENRY VARON BORDA	93.382.205	Ayudante


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,00%	26,67%	4
	TECNICO	1	1	6,67%	6,67%	2
	M.O/N.C	9	0	60,00%	0,00%	9
	TOTALES	**10**	**5**	**66,67%**	**33,33%**	**15**
	TOTAL	**15**		**100%**		

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se continuó el hincado de postes del aislamiento en el predio Veraguas vereda Santa Lucía del municipio de Neiva, también se hincaron postes en el predio de Himalaya y se inició limpia en el aislamiento y se continuó con el transporte de postes hasta sitio de trabajo en el predio La Carolina en la vereda La Plata del municipio de Neiva.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados continúan en proceso de verificación por parte de la Interventoría. Se recomendó al contratista de obra mejorar rendimientos ya que se está reflejando un atraso significativo en las actividades. Igualmente, en comité técnico se le solicitó presentar una reprogramación de las actividades para garantizar la culminación de las actividades contractuales en el plazo requerido.
La Gobernación del Huila aún no ha definido a la CAM la solución de los predios para la ejecución de la actividad de restauración activa en el municipio de Santa María.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



AVANCE - RNSC VERAGUAS - NEIVA



HINCADO DE POSTES - HIMALAYA - NEIVA



LIMPIA DE AISLAMIENTO - LA CAROLINA - NEIVA



TRANSPORTE A SITIOS - LA CAROLINA - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	27-may-24	PERIODO No.	28	DEL	20/05/2024	AL	26/05/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	437 DE 2023	CONTRATO No.:	423 DE 2023
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	PLAZO INICIAL (5 MESES):	304
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DIAS POR EJECUTAR	104	DIAS POR EJECUTAR	104
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	304	PLAZO ACTUALIZADO:	304
PLAZO TRANSCURRIDO:	200 EQUIVALE AL 65,8%	PLAZO TRANSCURRIDO:	200 EQUIVALE AL 65,8%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00	VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/12/2023	25/12/2023	-21
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	1/04/2024		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	11/12/2023	15/01/2024	-35
				-56,00

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 946.694.771,52	62,86%	-24,24%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 581.674.681,94	38,62%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante
ISRAEL MARTINEZ MONROY	93.128.802	Ayudante
JOSE HERRERA	5.843.980	Ayudante
JHON HERNANDEZ	1.110.531.154	Ayudante
JACOBO VARGAS	1.110.443.170	Ayudante
MIYER ADALBER ARIAS SANCHEZ	1.193.517.973	Ayudante
HENRY VARON BORDA	93.382.205	Ayudante

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,00%	26,67%	4
	TECNICO	1	1	6,67%	6,67%	2
	M.O/N.C	9	0	60,00%	0,00%	9
	TOTALES	**10**	**5**	**66,67%**	**33,33%**	**15**
	TOTAL	**15**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se continuó el hincado de postes del aislamiento en el predio Veraguas vereda Santa Lucía del municipio de Neiva, se tienen la totalidad de postes hincados en el predio de Himalaya; también se continuó con limpia y ahoyado en el aislamiento del predio La Carolina vereda La Plata del municipio de Neiva; se realizó hincado de postes en el aislamiento del predio El Mirador vereda San Miguel. Además, se continuó con la restauración activa en el predio del Resguardo Indígena vereda Rio Negro del municipio de Iquira.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados continúan en proceso de verificación por parte de la Interventoría. Se insiste al contratista en mejorar rendimientos en la ejecución de las actividades, ya que se esta presentando un atraso significativo.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



AVANCE - RNSC VERAGUAS - NEIVA



AISLAMIENTO HIMALAYA - VDA LA PLATA - NEIVA



AVANCE RESTAURACION ACTIVA - RESGUARDO RIO NEGRO - IQUIRA



AHOYADO - LA CAROLINA - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	3-jun-24	PERIODO No.	29	DEL	27/05/2024	AL	2/06/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	437 DE 2023	CONTRATO No.:	423 DE 2023
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	PLAZO INICIAL (5 MESES):	304
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DÍAS POR EJECUTAR	97	DÍAS POR EJECUTAR	97
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	304	PLAZO ACTUALIZADO:	304
PLAZO TRANSCURRIDO:	207 EQUIVALE AL 68,1%	PLAZO TRANSCURRIDO:	207 EQUIVALE AL 68,1%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00	VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/12/2023	25/12/2023	-21
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	1/04/2024		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	11/12/2023	15/01/2024	-35
				-56,00

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 995.788.924,89	66,12%	-26,69%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 593.775.670,41	39,43%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante
ISRAEL MARTINEZ MONROY	93.128.802	Ayudante
JOSE HERRERA	5.843.980	Ayudante
JHON HERNANDEZ	1.110.531.154	Ayudante
JACOBO VARGAS	1.110.443.170	Ayudante
MIYER ADALBER ARIAS SANCHEZ	1.193.517.973	Ayudante
HENRY VARON BORDA	93.382.205	Ayudante


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,00%	26,67%	4
	TECNICO	1	1	6,67%	6,67%	2
	M.O/N.C	9	0	60,00%	0,00%	9
	TOTALES	**10**	**5**	**66,67%**	**33,33%**	**15**
	TOTAL	**15**		**100%**		

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se continuaron actividades en los predios del municipio de Neiva, tales como: continúa el hincado de postes para el aislamiento en el predio Veraguas vereda Santa Lucía, se terminó el hincado de postes para los 907m del predio El Mirador vereda San Miguel, se terminó el hincado de postes para los 1280m del predio de Himalaya; también se continuó con limpia y ahoyado para el aislamiento del predio La Carolina vereda La Plata. Además, se terminó con la restauración activa de las 3 ha que faltaban en el predio del Resguardo Indígena vereda Rio Negro del municipio de Iquira.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados continúan en proceso de verificación por parte de la Interventoría. Se insiste al contratista en mejorar rendimientos en la ejecución de las actividades, ya que se continúa presentando un atraso significativo. Con respecto a la restauración activa del municipio de Iquira se solicitó mejorar el plateo conforme a las especificaciones del contrato.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



HINCADO DE POSTES - RNSC VERAGUAS - NEIVA



AISLAMIENTO HIMALAYA - VDA LA PLATA - NEIVA



RESTAURACION ACTIVA - RESGUARDO RIO NEGRO - IQUIRA



HINCADO DE POSTES - LA CAROLINA - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

CQ Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/2

ACTA No.11	CONTRATO DE OBRA No.423 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM	Firma listado de asistencia adjunto
LESLYE MUÑOZ (LM) - Profesional SGA CAM	Firma listado de asistencia adjunto
CARLOS A. QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto
ISABEL CHAVES (IC) - Profesional apoyo Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto
ARIEL ALBEIRO ARIAS (AA) - Técnico campo Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No se generaron compromisos en el comité anterior.

V. TEMAS TRATADOS

JC solicita información sobre el seguimiento y verificación en la ejecución de los aislamientos y reforestación que se han realizado hasta la fecha; además, sobre las dificultades y/o inconvenientes en la ejecución.

CQ manifiesta que a la fecha ha transcurrido más del 50% del plazo contractual, siendo por tanto importante dar solución definitiva a las situaciones que persisten actualmente, en cuanto a los predios de Santa María y el cierre de contratación de mano de obra con el personal que realizará las actividades en los predios de las veredas San Bartolo, Tuquila y el predio La Carolina vereda La Plata del municipio de Neiva, con el fin de ir cerrando procesos para la continuidad de las actividades y cumplir con el objeto contractual en el plazo establecido.

LM informa que la Corporación ha hecho la gestión ante la Gobernación del Huila y el municipio de Santa María y dado que no se tiene avance en la definición y respuesta, ante la solicitud de solucionar con otros predios, se recibio listado y la Corporación adelantó revisión y no dan cumplimiento con las áreas específicas del contrato; adicionalmente, el Supervisor por parte del Convenio de la Gobernación, renunció a su cargo, generando que el proceso sea más lento. Lo anterior y la espera de una nueva designación de Supervisor se generan demoras en respuestas definitivas y satisfactorias para poder iniciar la actividad, lo que implica que se pueda ver afectado el contratista de obra en la ejecución de las mismas en el plazo contractual. En atención a la situación, propone suspender el contrato hasta tanto se logre una solución definitiva por parte de la Gobernación del Huila.

CQ aclara que es improcedente realizar una suspensión del contrato, teniendo en cuenta que el contratista de obra actualmente se encuentra con materiales en las zonas y ejecutando actividades de aislamiento y reforestación en otros predios que no están incluidos dentro del Convenio, lo cual podría generar afectación técnica y económica en las actividades. Por tanto, propone que la Entidad envíe otro oficio, esta vez de manera determinante, solicitando la definición puntual de los predios que cumplan con las áreas requeridas y establecer si estos continúan en la programación de ejecución o si por el contrario se requiere que sean retirados, dando respuesta por escrito y tiempo de entrega, dado que el plazo contractual sigue avanzando y puede afectar la programación de obra.

En cuanto a los predios de las veredas San Bartolo y Tuquila del municipio de Neiva, JC informa que como no se ha logrado concertar con el personal de la zona, se determinó en el caso de la vereda Tuquila ejecutar los metros lineales en la vereda San Miguel, la cual cuenta con predios donde se puede realizar el aislamiento según los metros lineales que no se han podido ejecutar, para el caso de la vereda San Bartolo solicita establecer contacto directo con los colindantes (privados) de los predios para que sean ellos los que realicen la actividad. Con respecto al predio La Carolina vereda La Plata, recuerda que estos aislamientos son para la delimitación y protección de reservas propiedad del municipio y no para beneficios partículares, por lo cual se debe realizar el callejon de servidumbre con el ancho requerido para cumplir lo mencionado, que serían de 3 metros; por tanto, buscará el acercamiento entre las partes para evitar inconvenientes en el desarrollo de la actividad.

AA informa que no han podido iniciar con la actividad de reforestación de las 3 ha faltantes en el municipio de Iquira, debido a que el personal de la comunidad del resguardo han dilatado dicho inicio por otras actividades propias de la comunidad, teniendo en cuenta que hace 2 semanas se encuentra todo el material en la zona.

LM se compromete a realizar acerecamiento con personal del resguardo mediante el profesional de campo de la CAM, con el fin de solicitar agilidad y dinámica en la ejecución de la reforestación.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los seis (06) días del mes de mayo de 2024.

LISTADO DE ASISTENTES	Código:	T-CAM-097
	Versión:	4
	Fecha:	____ de ____ de 2022

TEMA: Seguimiento y Avance Cto. 423 de 2023 | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: CAM - Interventoría

SITIO DEL EVENTO: CAM | MUNICIPIO: Neiva | FECHA: 6-Mayo-2024 | HORA: 4:30 pm

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
	Adelso A. Quiza	x		83.142300	INTERV.	Resp. Legal	Neiva	3032142291	aquizaca@gmail.com	si	
	Javier Cordoba Gutierrez	x		7694587	CAM	PVSCA	Neiva	3107552090	proyectos1@cam.gov.co	Si	
	Isabel Chaux S.		x	1.082.363.165	Sofoy	Asesora proyecto	Neiva	3167419077	ifehsa@gmail.com	Si	
	Ariel Alberto Rios	x		93382899	sofor.	Tecnico		3158359??	soforag@gmail.com		
	Leslye Munoz.		x	36212743	CAM.	Prof. Univ.	Neiva.	3118372313	Lymunoz@cam.gov.co	Si	
	Lindsay Daza S.		x	49609.707	Interventt.	Apoyo Profes	Neiva	3183826935	cquiza@gmail.com	Si	

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: _____ MUJERES: _____

ACTA No.12	CONTRATO DE OBRA No.423 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM	
CARLOS A. QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría	
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo Interventoría	
GEMBER CARDOZO CRUZ (GC) - Representante Legal Contratista de Obra	
ISABEL CHAVES (IC) - Profesional apoyo Contratista de Obra	Isabel Chaves S.

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No se generaron compromisos en el comité anterior.

V. TEMAS TRATADOS

JC solicita información sobre el seguimiento y verificación en la ejecución de los aislamientos y reforestación que se han realizado hasta la fecha; además, sobre las dificultades y/o inconvenientes en la ejecución.

CQ manifiesta que en la presente reunión se desarrollarán 4 temas importantes para la definición y continuidad de las actividades contractuales, para su correcta ejecución; el primer tema es sobre la definición por parte de la Gobernación de las áreas de reforestación en el municipio de Santa María; el segundo con respecto a unas actividades adicionales que debe ejecutar el contratista de obra, en atención a una certificación expedida por el representante legal de SOFOR INGENIEROS SAS en el proceso de licitación para puntuación por factor técnico; el tercer es informar sobre el robo de unos rollos de alambre presentando en el predio Veraguas de la vereda Santa Lucía del municipio de Neiva y por último es el atraso que a la fecha se está presentando en el desarrollo de las actividades.

CQ informa que es preocupante la lentitud de los procesos de la Gobernación en la definición de los predios para la ejecución de las actividades en el municipio de Santa María, por tanto, el día de hoy se envió a la Corporación un oficio solicitando nuevamente un requerimiento por escrito a la Gobernación del Huila de manera determinante, donde definan puntualmente los predios que cumplan con las áreas requeridas y se establezca si estos continúan en la programación de ejecución o si por el contrario se requiere que sean retirados, dado que el plazo sigue avanzando y se podrían generar situaciones contractuales no previstas; de manera que, estamos a la espera que se pueda dar pronta solución.

JC manifiesta que es un situación que depende de las definiciones que suministre la Gobernación del Huila, la Corporación ha estado gestionando y presionando para lograr obtener lo más pronto posible dichas definiciones para ejecutar la actividad de reforestación en dicha zona; sin embargo, solicitará a la Supervisora del Convenio por parte de la CAM, para que se logre obtener respuesta definitiva durante las próximas semanas del presente mes.

De acuerdo a las actividades adicionales que el contratista de obra debe ejecutar, JC informa que las actividades corresponden a las establecidas en una certificación firmada por GC que obró dentro de la licitación pública LP-007-CAM-2023 "*Anexo 19 - Certificado para acreditar factores de calidad objeto de ponderación*", las cuales son: 200 metros lineales adicionales de aislamiento a los contractuales, 300 metros lineales de cerca viva, un establecimiento de 1 hectárea de reforestación protectora adicional a las contractuales y un establecimiento adicional de 100 metros lineales de aislamiento; los cuales deben ser ejecutados en el predio La Colonia vereda La Plata del municipio de Neiva, la próxima semana se les enviará un oficio con las especificaciones y especies a utilizar en el cerco vivo.

Con respecto al robo del material presentado en el predio Veraguas, CQ informa que es un hecho imprevisto el cual el contratista debe resolver de manera directa y adecuada con la persona a la que se le entregó dicho material, con el propósito de solucionar y cumplir con la totalidad de los metros lineales de aislamiento, ya que dentro de las consideraciones presupuestales se establece un porcentaje de imprevistos, para que las actividades contractuales se puedan culminar satisfactoriamente.

IC manifiesta que se hará lo respectivo por parte de SOFOR para suministrar el material que fue hurtado, para cumplir con la culminación del aislamiento en el predio Veraguas. Con respecto al tema de Santa María expresa también la preocupación por los tiempos de ejecución que requiere la actividad y entiende la gestión realizada por la Entidad para solucionar, pero que es fundamental tener una definición pronta para que no se vea afectada la ejecución ni el componente económico de la empresa.

En cuanto al avance de ejecución a la fecha, CQ informa que se presenta un atraso cercano al 20%; de manera que, solicita al contratista implementar acciones encaminadas a mejorar los rendimientos en las actividades que se están desarrollando actualmente en los predios del municipio de Neiva; además, presentar una reprogramación de las actividades en la cual se garantice la terminación en el plazo contractual y teniendo en cuenta que se pueda dar una definición durante las próximas semanas con los predios del municipio de Santa María.

Teniendo en cuenta que ya se pudo superar el inconveniente de mano de obra en la zona de Neiva, IC manifiesta que se ha desarrollado la logística durante la presente semana para transportar y entregar materiales con el fin de ejecutar las actividades y cumplir con el objeto contractual; de igual manera, se presentará la reprogramación solicitada, considerando que la situación con los predios de Santa María se pueda resolver las próximas semanas.

Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/2

ACTA No.12	CONTRATO DE OBRA No.423 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Reprogramación actividades de obra	Contratista de obra	Por definir

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los dieciseis (16) días del mes de mayo de 2024.

SGC-CP-16327-24
Neiva, mayo 03 de 2024

Señores
SOFOR INGENIERÍA S.A.S
R.L GEMBER CARDOZO CRUZ
Contratista de Obra

Ref.: Contrato de obra No.423 de 2023
Asunto: Citación comité técnico

Cordial saludo.

Se convoca a comité técnico para el día martes 07 de mayo de 2024 a las 10:00 am, en las instalaciones de la CAM de la ciudad de Neiva, con el fin de tratar aspectos técnicos y avance del contrato de la referencia, fundamental la asistencia del representante legal.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

SGC-CP-16329-24
Neiva, mayo 08 de 2024

Señores
SOFOR INGENIERÍA S.A.S
R.L GEMBER CARDOZO CRUZ
Contratista de Obra

Ref.: Contrato de obra No.423 de 2023
Asunto: Solicitud ejecución actividades certificadas para puntuación por factor técnico

Cordial saludo.

En atención al documento que obró dentro de la licitación pública LP-007-CAM-2023 "*Anexo 19 - CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD OBJETO DE PONDERACIÓN*", se solicita la ejecución de las siguientes actividades, las cuales deben ser incluidas en la programación de obra:

1. 200 metros lineales adicionales de aislamiento a los contractuales y 300 metros lineales de cerca viva.
2. Un establecimiento de 1 hectárea de reforestación protectora adicional a las contractuales y un establecimiento adicional de 100 metros lineales de aislamiento.

Por lo anterior, próximamente serán notificados los sitios que designe la Corporación para la ejecución de las actividades mencionadas.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

Anexo (1) folio - Certificado

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

SGC-CP-16330-24
Neiva, mayo 16 de 2024

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA-CAM
Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
Coordinador Proyecto Ceibas – Supervisor

Ref.: Contrato de obra No.423 de 2023
Asunto: Solicitud definición predios municipio Santa María

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que, al inicio del contrato de la referencia, en las visitas diagnóstica se corroboró que los predios asignados para la ejecución de las 24 hectáreas de reforestación en el municipio de Santa María, el cual hace parte del *CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 062 DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA CAM Y EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MINERIA*, no cumplían con las condiciones para realizar la actividad por lo que se encontraban en total cobertura de vegetación con zonas de bosque primario, por lo anterior, se informó a la Entidad para iniciar con los trámites ante la Gobernación del Huila para el cambio de los predios, proceso que fue demorado por las diferentes definiciones y documentación entre la Entidad y la Gobernación.

Así mismo, podemos señalar que, una vez suministrada la información y aprobación por parte de la Gobernación, la CAM realizó los trámites necesarios para la modificación al contrato de obra por el cambio de predios.


De acuerdo a esto, el contratista de obra, Interventoría y CAM procedieron a realizar la visita de verificación de los sitios a reforestar, encontrando la imposibilidad de ejecución en los nuevos predios, debido a que no hay claridad en la propiedad de los mismos por parte de la Gobernación y el municipio de Santa María.

Es de conocimiento por parte del contratista de obra y de esta Interventoría, que la Entidad ha venido adelantando la gestión necesaria ante la Gobernación del Huila y el municipio de Santa María, con el fin de dar solución y poder suministrar los predios que cumplan con las condiciones técnicas para la reforestación de las 24 Ha; sin embargo, por diferentes procesos y trámites propios de los Entes Territoriales, la solución se ha dilatado y no se ha dado la solución definitiva para su ejecución.

Por tanto, se solicita a la CAM realizar nuevamente un requerimiento por escrito a la Gobernación del Huila esta vez de manera determinante, donde definan

puntualmente los predios que cumplan con las áreas requeridas y se establezca si estos continúan en la programación de ejecución o si por el contrario se requiere que sean retirados, dado que el plazo contractual sigue avanzando y se podrían generar situaciones contractuales no previstas e incluso reclamaciones.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniera LESLYE MUÑOZ - Profesional SGA CAM Supervisora Convenio Gobernación CAM

Gmail **Carlos Quiza <cquizac@gmail.com>**

SGC-CP-16330-24- Contrato de obra No.423 de 2023 - Solicitud definición predios municipio Santa María

1 mensaje

correspondencia-e@cam.gov.co <correspondencia-e@cam.gov.co> 17 de mayo de 2024, 7:21
Para: cquizac@gmail.com

Estimado ciudadano, de conformidad con el artículo 14 de la LEY 2080 DE 2021, le informamos que la comunicación enviada por usted a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, fue recibida satisfactoriamente y ha sido registrado en nuestro sistema de gestión documental con el número de radicado:

14350

Por favor si requiere información adicional sobre su solicitud, indicar este número de radicado. Puede hacer seguimiento al trámite de su solicitud dentro de los plazos establecidos en la Ley, en los siguientes canales:BC31B06F

Página WEB https://www.cam.gov.co/, en el chat en línea o por medio telefónico 018000960260, Sede Neiva: (608) 8664454, Sede Garzón: (608) 8332444, Sede La Plata: 608) 8370080 y Sede Pitalito: (608) 8354422.

Cuéntanos cómo fue tu experiencia de servicio con la CAM. Tus respuestas son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar el servicio que prestamos. Te invitamos a hacer clic en el link: https://forms.gle/7Df7MNVfRHA4envVA



- *Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos.*
- *Si necesita imprimir, recicla el papel. Es un recurso renovable.*
- *La sostenibilidad del planeta no depende de no usar sus recursos naturales, sino de hacerlo de manera consciente y totalmente respetuosa.*

Neiva, 30 de mayo de 2024

Numero de radicado: 15247 2024-S
Fecha y Hora: 07/06/2024 9:43:07

Señor
CARLOS ARTURO QUIZA
Contratista de Interventoría Contrato No. 423 de 2023
Teléfono: 875700
Dirección: Carrera 8C No. 34-05
Correo Electrónico: cquiza@gmail.com
Neiva

Asunto: Respuesta a solicitud con radicado CAM No. 14350 2024-E del 17 de mayo de 2024.

Cordial saludo,

En respuesta a su solicitud, le manifestamos que desde la Corporación estamos prestos a la gestión y apoyo requerido para el cumplimiento de las obligaciones definidas dentro del Convenio 062 suscrito con la Gobernación del Huila, y del contrato No. 423 de 2023 entre la CAM y Sofor Ingenieros SAS. En este sentido se ha solicitado a la Gobernación del Huila indicar el avance del trámite del pago de los predios definidos y viabilizar la ejecución de las acciones de Restauración ecológica en el municipio de Santa María, departamento del Huila. Por tanto, estamos a la espera de una respuesta formal que permita avanzar en la ejecución contractual.

Finalmente, relacionamos el oficio con radicado de salida CAM No. 13515 2024-S del 22 de mayo del 2024 con acuse de recibido por parte de la Gobernación del Huila el 14 de mayo de 2024 soporte de envío de 472. (Anexo 1)

Sin otro particular,

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Subdirectora de Gestión Ambiental

Proyecto: Leslye Muñoz, Prof. Universitario SGA

Neiva, 21 de mayo de 2024

Ingeniero
CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Secretario de Agricultura y Minería
Gobernación del Huila
Teléfono: 8671300 Ext. 1150/52
Dirección: Carrera 4 Calle 8 Esquina (Piso 1)
Neiva

Numero de radicado: 13515 2024-S
Fecha y Hora: 22/05/2024 8:08:38

Asunto: Convenio Interadministrativo No. 062 de 2022 entre Gobernación del Huila (Secretaria de Agricultura y de Minería) y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM)

Cordial Saludo,

En atención del asunto, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos institucionales y económicos para la ejecución del proyecto –Fortalecimiento de los ecosistemas estratégicos en el Macizo Colombiano del Departamento del Huila" nos permitimos indicar que actualmente se encuentra un componente pendiente de cumplimiento total el cual corresponde a:

Objetivo especifico	Producto	Medido a través de	Cantidad	Actividades asociados al producto
Implementar medidas piloto para aumentar las áreas de conservación a través de la restauración ecológica y la conversión productiva sostenible, en el Macizo Colombiano del Departamento del Huila.	Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.	Piloto con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados (Número de pilotos)	30	3. Implementar acciones de restauración activa

De las 30 hectáreas proyectadas para la implementación de acciones de restauración activa, 24 corresponden a predios de propiedad del municipio de Santa María, incluidos mediante Otrosí No. 1 suscrito en diciembre de 2023, según documentación adjunta, en ejecución del Contrato de Obra Pública No. 423 de 2023, suscrito entre la CAM y Sofor Ingenieros SAS, así:

No.	No. Matricula Inmobiliaria	Predio	Cedula Catastral	Área	Área para Restauración Activa
1	200-90347	La Milagrosa	41676000000000002000800000000	32,48	4
2	200-118914	Buenavista	41676000000000031001600000000	30,87	11,31
3	200-55906	Buenos Aires	41676000000000037001100000000	27,35	8,73

Lo anterior, en consideración a que el contratista no ha logrado a la fecha, viabilidad por parte de los anteriores propietarios para intervenir los predios, en espera del trámite pendiente de desembolso correspondiente al pago de los mismos.

Así las cosas, de manera atenta nos permitimos solicitar información acerca de dicho trámite, con el único interés de resolver la ejecución del contrato de Obra Pública No. 423 de 2023, suscrito entre la CAM y SOFOR Ingenieros SAS.

De igual manera, solicitamos comedidamente, considerar una ampliación de plazo del convenio No. 062 de 2022 el cual vence el 30 de junio de 2024, para equipararlo con el plazo del contrato No. 423 de 2023 que vence 07 de septiembre de 2024, más dos meses para la liquidación del mismo.

De antemano, agradecemos su atención.

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Subdirectora de Gestión Ambiental

Proyecto: Leslye Muñoz, Prof. Universitario SGA
Revisó: Javier Cardoso, Prof. Universitario SGA

Acta de Envío y Entrega de Correo Electrónico

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S Certifica que ha realizado por encargo de **DARSY JULIETH ROMERO PENAGOS** identificado(a) con **C.C. 1003951202** el servicio de envío de la notificación electrónica, a través de su sistema de registro de ciclo de comunicación Emisor-Receptor.

Según lo consignado los registros de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S el mensaje de datos presenta la siguiente información:

Resumen del mensaje

Id mensaje:	24362
Emisor:	oficiosdesalida@cam.gov.co
Destinatario:	secretario.agricultu@huila.gov.co - CARLOS ALBERTO CUELLAR MEDINA
Asunto:	Convenio Interadministrativo No. 062 de 2022 entre Gobernación del Huila (Secretaria de Agricultura y de Minería) y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) RAD 13515 2024S
Fecha envío:	2024-05-23 08:35
Estado actual:	El destinatario abrio la notificacion

Trazabilidad de notificación electrónica

Evento	Fecha Evento	Detalle
Estampa de tiempo al envio de la notificacion El mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de información que no esté bajo control del iniciador o de la persona que envió el mensaje de datos en nombre de éste - **Artículo 23 Ley 527 de 1999.**	**Fecha: 2024/05/23** **Hora: 08:38:32**	**Tiempo de firmado:** May 23 13:38:32 2024 GMT **Política:** 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.2.8.0.
Acuse de recibo Con la recepción del presente mensaje de datos en la bandeja de entrada del receptor, se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos legales de acuerdo con las normas aplicables vigentes, especialmente el **Artículo 24 de la Ley 527 de 1999** y sus normas reglamentarias.	**Fecha: 2024/05/23** **Hora: 08:38:35**	May 23 08:38:35 cl-t205-282cl postfix/smtp[2524]: EE85812486E4: to=<secretario.agricultu@huila.gov.co & gt;, relay=huila-gov-co.mail.protection.outlo o k.com[52.101.8.36]:25, delay=2.4, delays=0.25/0/0. 37/1.7, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 <120931bef40ef3c5ab802b83f636d60a1e27 1 3b33962f9f0c873896d41882ef1@correocerti fi cado4-72.com.co> [InternalId=10028748669638, Hostname=IA0PR11MB8420.namprd11.prod.out l ook.com] 980484 bytes in 0.485, 1972.729 KB/sec Queued mail for delivery)
El destinatario abrio la notificacion	**Fecha: 2024/05/23** **Hora: 16:40:25**	**Dirección IP:** 190.143.75.82 **Agente de usuario:** Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

De acuerdo con los artículos 20 y 21 de la Ley 527 de 1999 se presumirá que el destinatario ha recibido el mensaje, cuando el emisor del mismo recepcione el acuse de recibo que puede ser automatizado, en ese orden de ideas, el presente documento constituye acuse de recibo automatizado y constituye prueba de entrega del mensaje de correo electrónico así como sus archivos adjuntos en la fecha y hora indicadas anteriormente.

Importante: En el aparte Acuse de Recibo, en los casos en que aparece la frase "Queued mail for delivery" se debe a las características del servidor de correo electrónico Microsoft Exchange, en estos casos, si el mensaje no pudo ser entregado dicho servidor enviará una segunda respuesta indicando que no fue exitosa la entrega del mensaje, si no hay una segunda respuesta del servidor de correo electrónico, quiere decir que tu mensaje fue entregado satisfactoriamente por lo que este documento pasa a constituir acuse de recibo

Contenido del Mensaje

Asunto: Convenio Interadministrativo No. 062 de 2022 entre Gobernación del Huila (Secretaria de Agricultura y de Minería) y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) RAD 13515 2024S

Cuerpo del mensaje:

Estimado Ciudadano,

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM remite respuesta a su comunicación, favor no responder ni escribir a esta dirección de correo, cualquier inquietud comunicarse a los canales habilitados, correo electrónico radicacion@cam.gov.co, en el chat en línea o por medio telefónico 018000960260, Sede Neiva: (608) 8664454, Sede Garzón: (608) 8332444, Sede La Plata: 608) 8370080 y Sede Pitalito: (608) 8354422, dentro del horario de atención de lunes a Jueves: 07:00 a.m. a 11:30 m. y 01:00 p.m. a 4:30 p.m.
Viernes: 07:00 a.m. a 12:00 m. y 01:00 p.m. a 04:00 p.m.

Cuéntanos cómo fue tu experiencia de servicio con la CAM. Tus respuestas son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar el servicio que prestamos.

Te invitamos a hacer clic en el siguiente link: https://forms.gle/7Df7MNVfRHA4envVA

Adjuntos

Nombre	Suma de Verificación (SHA-256)
RAD_13515_2024S.pdf	68551c893f01511901ceac0747abc883f4399b98ef0b015437b445e2c47be380

Descargas

--

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 527 de 1999, la presente notificación electrónica como los documentos adjuntos a esta, son documentos íntegros, ya que es posible determinar que los mismos no han sido modificados ni alterados desde el momento en que fue enviado el mensaje de datos por parte del emisor del mensaje, por lo tanto dichos documentos tienen plena validez jurídica y probatoria.

www.4-72.com.co

SGC-CP-16331-24
Neiva, mayo 20 de 2024

Señores
SOFOR INGENIERÍA S.A.S
R.L GEMBER CARDOZO CRUZ
Contratista de Obra

Ref.: Contrato de obra No.423 de 2023
Asunto: Información ejecución actividades puntuación licitación.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta las actividades certificadas para la puntuación por factor técnico, dentro de la licitación pública LP-007-CAM-2023, se informa que se deben ejecutar en el predio La Colonia vereda La Plata del municipio de Neiva, en el plazo contractual y bajo las siguientes especificaciones:

1. 200 metros lineales adicionales de aislamiento, según las especificaciones técnicas establecidas en el contrato de obra.
2. 300 metros lineales de cerca viva, se requiere un distanciamiento de 2 metros con un total de 150 individuos arbóreos protectores que ayuden como fuente de nutrientes al sector apícola, con especies forestales como: de Aguilo (Delostoma integrifolium D. Don), Chachafruto (Erythrina edulis Triana ex Micheli), Arboloco (Smallanthus pyramidalis (Triana) H. Rob.) y Botón de oro (Tithonia diversifolia (Hemsl) A. Gray).
3. Un establecimiento de 1 hectárea de reforestación protectora, se requiere un distanciamiento de 4mx4m con un total de 625 individuos arbóreos distribuidos en las especies de Aguilo (Delostoma integrifolium D. Don), Chachafruto (Erythrina edulis Triana ex Micheli), Pinoromerón (Retrophyllum rospigliosii (Pilg.) C.N. Page), Arboloco (Smallanthus pyramidalis (Triana) H. Rob.) y Sangregao (Croton schiedeanus Schltdl.); y un establecimiento adicional de 100 metros lineales de aislamiento, conservando las especificaciones técnicas contractuales.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

SGC-CP-16332-24
Neiva, mayo 23 de 2024

Señores
SOFOR INGENIERÍA S.A.S
R.L GEMBER CARDOZO CRUZ
Contratista de Obra

Ref.: Contrato de obra No.423 de 2023
Asunto: Respuesta al caso predios de Santa María.

Cordial saludo.

En atención al oficio enviado el día 15 de mayo de 2024, solicitando respuesta definitiva a las áreas de Santa María para la correcta ejecución del contrato de la referencia, se informa que se sigue gestionando ante la Entidad para obtener una respuesta por parte de la Gobernación a cerca de las 24 hectáreas para el desarrollo de la actividad de reforestación en el municipio de Santa María; por lo cual las respuestas que ha emitido la CAM de la situación actual al respecto, se les han comunicado de manera verbal y mediante comités técnicos.

Además, se procedió a enviar a la CAM un oficio con radicado No.14350 el día 16 de mayo del año en curso, donde se solicitó realizar nuevamente un requerimiento por escrito a la Gobernación del Huila, que fuera de manera determinante, donde definan puntualmente los predios que cumplan con las áreas requeridas y se establezca si estos continúan en la programación de ejecución o si por el contrario se requiere que sean retirados, dado que el plazo contractual sigue avanzando y se podrían generar situaciones contractuales no previstas.

La gestión anteriormente mencionada, fue manifestada por parte de esta Interventoría a ustedes en el comité de seguimiento realizado el día 16 de mayo de 2024, quedando como compromiso por parte de la Entidad seguir gestionando ante la Gobernación y dar respuesta a lo solicitado a más tardar durante las últimas semanas del presente mes; por tanto, inmediatamente se tenga solución se les dará a conocer.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

Ibagué, mayo 9 de 2024

Señor
CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de Interventoría

REFERENCIA: Contrato de obra No. 0423 de 2023
ASUNTO: Respuesta solicitud de ejecución de actividades certificadas para puntuación por factor técnico

Cordial Saludo,

En atención al asunto en mención se manifiesta que las actividades descritas en el anexo "Anexo 19 - CERTIFICADO PARA ACREDITAR FACTORES DE CALIDAD OBJETO DE PONDERACIÓN" bajo el marco de la licitación pública LP-007-CAM-2023, se ejecutaran bajo los parámetros que se mencionaran a continuación:

1. 200 metros lineales de aislamiento y 300 metros lineales de cerca viva. La actividad de aislamiento se ejecutará bajo las especificaciones contractuales y los 300 metros lineales se ejecutarán con una distancia lineal de siembra de 3 metros entre individuo para establecer un total de 100 árboles, las especies más utilizadas paras las cercas vivas son las especies de samán, guásimo, igual, matarratón y nogal.
2. Un establecimiento de 1 hectárea de reforestación protectora adicional contractuales y un establecimiento adicional de 100 metros lineales de aislamiento. Técnicamente se establece la actividad de reforestación y aislamiento por lo cual las especificaciones de la hectárea de reforestación serán de 625 árboles por hectárea ubicándose a una distancia de siembra de 4x4 metros.

Con lo anterior se mencionan las especificaciones bajo las cuales se ejecutarán las actividades certificadas para puntuación del factor técnico además los sitios designados para tales actividades deberán ser de mutuo acuerdo.

Atentamente,

SOFOR INGENIEROS S.A.S
R.L: GEMBER CARDOZO CRUZ
C. C. No. 93.374.732 de Ibagué
Matrícula profesional No. 15.046 de Min. Agricultura.

Ibagué, mayo 22 de 2024

Señor
CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de Interventoría

REFERENCIA: Contrato de obra No. 0423 de 2023
ASUNTO: Solicitud sobre ejecución actividades puntuación licitación.

Cordial Saludo,

En atención al asunto en mención, y en respuesta del documento "SGC-CP16331-24-Información ejecución actividades puntuación" enviado por la interventoría el día lunes 20 de mayo del presente año, solicitamos respetuosamente acompañamiento técnico al predio la Colonia vereda la plata del Municipio de Neiva con el fin de la verificación de los puntos exactos y zonas para la ejecución de dichas actividades adicionales (200 metros lineales de aislamiento, 300 metros lineales de cerca viva, un establecimiento de 1 ha de reforestación protectora y un establecimiento de 100 metros lineales de aislamiento), con el fin de iniciar estas labores lo más pronto posible.

Cordialmente,



SOFOR INGENIEROS S.A.S
R.L: GEMBER CARDOZO CRUZ
C. C. No. 93.374.732 de Ibagué
Matrícula profesional No. 15.046 de Min. Agricultura.

Ibagué, mayo 23 de 2024

Señor
CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de Interventoría

REFERENCIA: Contrato de obra 0423 de 2023 entre la CAM Y SOFOR INGENIEROS S.A.S

ASUNTO: Solicitud respuesta oficio técnico presentado el día 15 de mayo con asunto "Documento técnico con el fin de obtener una respuesta definitiva a las áreas de Santa maría para la correcta ejecución del proyecto."

Por medio de la presente y conforme a la reunión virtual sostenida el día jueves 16 de mayo del año 2024, solicitamos comedidamente, respuesta del oficio del asunto, esto con el fin de dar solución a este tema, y conforme a esto presentar reprogramación del contrato de la referencia, debido a que día de hoy no se ha recibido una respuesta concreta a esta situación.

Cordialmente,

SOFOR INGENIEROS S.A.S
R.L: GEMBER CARDOZO CRUZ
C. C. No. 93.374.732 de Ibagué
Matrícula profesional No. 15.046 de Min. Agricultura.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-05	29789167	I	2024-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	406.900	500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29789167	2024-06-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-05	29789167	I	2024-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	406.900	500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29789167	2024-06-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	200	0	224.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	200	0	224.200
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	200	0	175.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	200	0	175.200
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	100	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	100	0	7.500
Gran Total					406.400	0	500	0	406.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30001132	E	2024-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.943.600	3.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	30001132	2024-06-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	194.500	S	5711001
2	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
3	CC 1075221485	VARELA RAMOS SANDRA LICETH	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
4	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
5	CC 1077865950	BARRERA PALENCIA FABIAN LEONARDO	2.000.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.527.778	101.200	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	640.400	S	5711001
6	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.000	280.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
7	CC 1121917315	LUNA PINZON JULIAN RICARDO	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30001132	E	2024-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.943.600	3.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	30001132	2024-06-06	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.300.000	13.600.000	13.600.000	14.127.778	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				6	1.968.000	0	1.700	0	1.969.700
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.448.000	0	1.200	0	1.449.200
PROTECCION	230201	800229739	0	2	520.000	0	500	0	520.500
EPS(Administradoras: 3)				7	544.000	0	600	0	544.600
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	160.000	0	200	0	160.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	174.000	0	200	0	174.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	210.000	0	200	0	210.200
ARP(Administradoras: 1)				7	862.900	0	700	0	863.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	7	862.900	0	700	0	863.600
CCF(Administradoras: 1)				7	565.200	0	500	0	565.700
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	7	565.200	0	500	0	565.700
Gran Total					3.940.100	0	3.500	0	3.943.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30001301	E	2024-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.580.500	1.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
3	30001301	2024-06-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
2	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30001301	E	2024-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.580.500	1.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
3	30001301	2024-06-06	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	816.000	0	700	0	816.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	200	0	208.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	608.000	0	500	0	608.500
EPS(Administradoras: 2)				3	204.000	0	300	0	204.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	152.000	0	200	0	152.200

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	100	0	52.100
ARP(Administradoras: 1)				3	355.000	0	300	0	355.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	3	355.000	0	300	0	355.300
CCF(Administradoras: 1)				3	204.000	0	200	0	204.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	204.000	0	200	0	204.200
Gran Total					1.579.000	0	1.500	0	1.580.500

ASOPAGOS s.a.
PAGADO
