SGC-CP-16226-24
Neiva, junio 13 de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Ciudad

Ref.: Contrato de Interventoría No.434 de 2023.
Asunto: Informe de interventoría No.7

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 06 al 31 de mayo de 2024, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe mensual interventoría No.7
2. Informes semanales el periodo
3. Acta de comité
4. Correspondencia
5. Seguridad social

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

7

Ingeniería & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	7	Periodo comprendido entre el :	6 de mayo de 2024	y el:	31 de mayo de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**Objeto:**	"ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
Contrato Nº:	434 DE 2023	**Contrato Nº:**	416 DE 2023
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**Contratista:**	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES	**Plazo Inicial:**	DIEZ (10) MESES
Fecha de Inicio:	NOVIEMBRE 8 DE 2023	**Fecha de Inicio:**	NOVIEMBRE 8 DE 2023
Fecha de Terminación:	SEPTIEMBRE 7 DE 2024	**Fecha de Terminación:**	SEPTIEMBRE 7 DE 2024
Valor Inicial:	$ 85.481.726,00	**Valor Inicial:**	$ 842.938.161,00
Valor adicional:	$ -	**Valor adicional:**	
Valor total:	$ 85.481.726,00	**Valor total:**	$ 842.938.161,00
Valor pagado:	$ 27.191.736,96	**Valor pagado:**	
Valor por pagar:	$ 58.289.989,04	**Valor por pagar:**	$ 842.938.161,00
Nombre Supervisor:	ING. JAVIER CARDOSO GUTIERREZ	**Nombre Interventor:**	ING. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Calidad del servicio	8/11/2023	9/09/2029	$ 8.548.180,00
Cumplimiento	8/11/2023	12/03/2025	$ 25.644.540,00
Prestaciones sociales	8/11/2023	9/09/2027	$ 8.548.180,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	8/11/2023	10/03/2025	$ 168.587.632,20
Pago salarios, prestaciones sociales e ind.	8/11/2023	10/09/2027	$ 84.293.816,10
Estabilidad y calidad de la obra	Un año mas		$ 168.587.632,20
Calidad del servicio	8/11/2023	10/03/2025	$ 168.587.632,20
Responsabilidad civil extracontractual	8/11/2023	7/09/2024	$ 232.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA No1	30/05/2024	$ 27.191.736,96
		$ 27.191.736,96

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
ACTA No1	Pendiente	$ 268.103.355,00
		$ 268.103.355,00

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

7

Ingeniería & Construcción

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	40,79%	16,98%	57,77%
% Ejecutado	31,81%	29,31%	61,11%
Diferencia	-8,98%	12,33%	3,34%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 343.819,75	$ 143.128,85	$ 486.948,59	57,77%
% Ejecutado	$ 268.103,36	$ 247.030,90	$ 515.134,26	61,11%
Diferencia	$ (75.716,39)	$ 103.902,06	$ 28.185,66	3,34%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Se ejecutaron las actividades de mantenimiento de los aislamientos en los siguientes municipios:

Tello: Vereda El cadillo, predio Primavera (1.500 de 3.200) y vereda Rio Negro, predio La Argentina (200m de 2.118m)
Neiva: Vereda San Bartolo, predio El Concilio (100 de 500m), predio Los Piscos (500 ml), predio La Albania (1.600m de 2.300m) y predio La Esperanza (550 de 800m); **vereda Motilón**, predio Las Pavas (180m de 600m) y predio El trigal (600m de 1000m); **vereda Alto Motilón**, predio Soledad (800m de 1.689m), **vereda Pueblo Nuevo**, predio San Agustín (240m de 1200m), **vereda La Plata**, predio Filo Frío (190m de 200m) y predio Himalaya (1.022m de 1.509m), **vereda Floragaita**, predio La Gironda (450 de 1.525m), **vereda San Miguel**, predio La Lorena (450 de 1.275m).

Se inició mantenimiento a restauración activa en el municipio de Neiva en los siguientes predios:

Vereda Motilón, predio La Hondina (2,8ha de 4ha), **vereda Alto Motilón**, predio Providencia (23ha de 24ha), predio Australia (3,4ha de 4ha); **vereda La Plata**, predio La Carolina (8ha de 9ha), predio Lote No.4 La Corporación (1ha de 2ha) y predio La Colonia (0,8ha de 1ha); **vereda Pueblo Nuevo**, predio Barcelona (16,2ha de 18ha) y **vereda Santa Lucia**, predio Gramales (3ha de 3ha).

Se inició mantenimiento a las barreras de fique en el predio La Hondina de la vereda Motilón con un avance de 4.700m de 9.400m.

2. PERSONAL


CONTRATO DE CONSULTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	1		33,33%	0,00%	1
TÉCNICO	2		66,67%	0,00%	2
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	3	0	100,00%	0,00%	3
TOTALES	3		100,00%		


CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		1	0,00%	7,14%	1
TÉCNICO	2		14,29%	0,00%	2
M.O.N.C.	11		78,57%	0,00%	11
TOTAL	13	1	92,86%	7,14%	14
TOTALES	14		100,00%		


TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	**7**	Ingeniería & Construcción

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

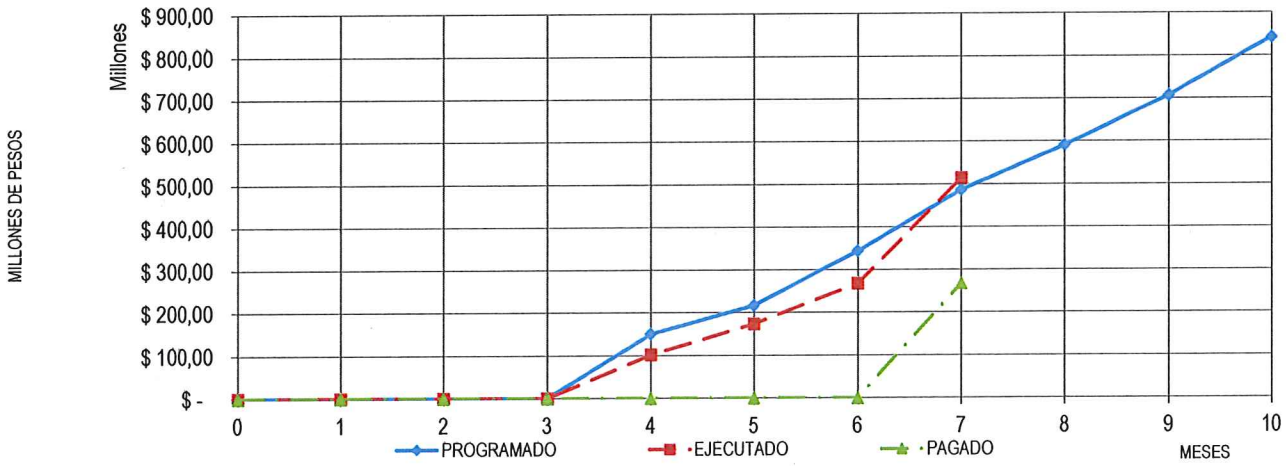

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo se iniciaron las actividades de mantenimiento a restauración activa y se continuó el mantenimiento a los aislamientos en la zona de Ceibas en Neiva. Se sigue realizando revisión y verificación por parte de la interventoría. El contratista de obra realizó la entrega de la justificación técnica con los respectivos soportes, considerando los diferentes motivos por la cual en los municipios de Rivera y Hobo no se puede ejecutar la actividad; además, el balance de mayores y menores cantidades en los aislamientos, que por las condiciones reales encontradas en cada uno, algunos cercos tienen metros lineales inferiores a los establecidos en el contrato; por tanto, la Corporación con base a la verificación que realiza la Interventoría y atendiendo al alcance y objeto contractual, proporcionó un listado de predios para cumplir con la totalidad allí establecida, a los cuales se les esta haciendo visita de diagnóstico para determinar el porcentaje de deterioro de los aislamientos.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Humberto Quiza Camacho **Cargo:** Inspector de Interventoría	**Nombre:** Hermencia zambrano serrato **Cargo:** Coordinador de Interventoría	**Nombre:** Carlos Arturo Quiza Camacho **Cargo:** Contratista de Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

7

Ingeniería & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	416 DE 2023	**Contratista:**	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
Periodo:	6 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Coordinador de obra:	MAURICIO LOPEZ RUIZ	**Coordinador de Interventoria:**	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	PRELIMINARES				$ 670.910.102,00				$ 213.388.428,00	$ 196.616.473,00	$ 410.004.901,00		$ 260.905.201,00
1	Mantenimiento aislamiento	ML		$ 10.241	$ -	0,00	0,00	0,00				0,00	
2	Mantenimiento aislamiento cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales	ML		$ 6.064	$ -	0,00	0,00	0,00				0,00	
3	Mantenimiento restauracion activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	HA	65	$ 1.730.481	$ 112.481.265,00	0,00	59,00	59,00		$ 102.098.379,00	$ 102.098.379,00	6,00	$ 10.382.886,00
4	Mantenimiento de barreras vivas de fique (Ha)	ML	9400	$ 3.155	$ 29.657.000,00	0,00	4.700,00	4.700,00		$ 14.828.500,00	$ 14.828.500,00	4.700,00	$ 14.828.500,00
NP1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	ML	6.118	$ 10.878	$ 66.551.604,00	0,00	2.250,00	2.250,00		$ 24.475.500,00	$ 24.475.500,00	3.868,00	$ 42.076.104,00
NP2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	ML	5.023	$ 10.232	$ 51.395.336,00	0,00	1.600,00	1.600,00		$ 16.371.200,00	$ 16.371.200,00	3.423,00	$ 35.024.136,00
NP3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	ML	1.689	$ 9.582	$ 16.184.732,00	0,00	800,00	800,00		$ 7.665.600,00	$ 7.665.600,00	889,08	$ 8.519.132,00
NP4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	ML	2.226	$ 10.089	$ 22.458.114,00	0,00	1.140,00	1.140,00		$ 11.501.460,00	$ 11.501.460,00	1.086,00	$ 10.956.654,00
NP5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	ML	1.000	$ 10.041	$ 10.041.000,00	0,00	0,00	0,00				1.000,00	$ 10.041.000,00
NP6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	ML	1.275	$ 9.295	$ 11.851.125,00	0,00	450,00	450,00		$ 4.182.750,00	$ 4.182.750,00	825,00	$ 7.668.375,00
NP7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	ML	1.000	$ 8.905	$ 8.905.000,00	0,00	600,00	600,00		$ 5.343.000,00	$ 5.343.000,00	400,00	$ 3.562.000,00
NP8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	ML	600	$ 9.357	$ 5.614.200,00	0,00	180,00	180,00		$ 1.684.260,00	$ 1.684.260,00	420,00	$ 3.929.940,00
NP9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	ML	500	$ 9.263	$ 4.631.500,00	0,00	250,00	250,00		$ 2.315.750,00	$ 2.315.750,00	250,00	$ 2.315.750,00
NP10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	ML	3.100	$ 8.049	$ 24.951.900,00	0,00	0,00	0,00				3.100,00	$ 24.951.900,00
NP11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	ML	211	$ 6.551	$ 1.382.261,00	0,00	0,00	0,00				211,00	$ 1.382.261,00
NP12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	ML	737	$ 5.854	$ 4.314.398,00	0,00	0,00	0,00				737,00	$ 4.314.398,00
NP13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	ML	160	$ 4.791	$ 766.560,00	0,00	0,00	0,00				160,00	$ 766.560,00
NP14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	ML	500	$ 4.676	$ 2.338.000,00	0,00	0,00	0,00				500,00	$ 2.338.000,00
NP15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	ML	1.200	$ 4.277	$ 5.132.400,00	0,00	950,00	950,00		$ 4.063.150,00	$ 4.063.150,00	250,00	$ 1.069.250,00
NP16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	ML	1.509	$ 2.042	$ 3.081.378,00	0,00	1.022,00	1.022,00		$ 2.086.924,00	$ 2.086.924,00	487,00	$ 994.454,00
NP17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	ML	8.128	$ 11.407	$ 92.716.096,00	7.332,00	0,00	7.332,00	$ 83.636.124,00		$ 83.636.124,00	796,00	$ 9.079.972,00
NP18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	ML	2.069	$ 10.986	$ 22.730.034,00	1.783,00	0,00	1.783,00	$ 19.588.038,00		$ 19.588.038,00	286,00	$ 3.141.996,00
NP19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	ML	2.576	$ 11.317	$ 29.152.592,00	0,00	0,00	0,00				2.576,00	$ 29.152.592,00
NP20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	ML	852	$ 10.277	$ 8.756.004,00	0,00	0,00	0,00				852,00	$ 8.756.004,00
NP21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	ML	747	$ 8.998	$ 6.721.506,00	690,00	0,00	690,00	$ 6.208.620,00		$ 6.208.620,00	57,00	$ 512.886,00
NP22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	ML	1.809	$ 8.845	$ 16.000.605,00	1.295,00	0,00	1.295,00	$ 11.454.275,00		$ 11.454.275,00	514,00	$ 4.546.330,00
NP23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	ML	1.500	$ 8.677	$ 13.015.500,00	1.266,00	0,00	1.266,00	$ 10.985.082,00		$ 10.985.082,00	234,00	$ 2.030.418,00
NP24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	ML	1.624	$ 8.858	$ 14.385.392,00	1.624,00	0,00	1.624,00	$ 14.385.392,00		$ 14.385.392,00	0,00	
NP25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	ML	5.400	$ 7.343	$ 39.652.200,00	4.855,00	0,00	4.855,00	$ 35.650.265,00		$ 35.650.265,00	545,00	$ 4.001.935,00
NP26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	ML	6.700	$ 6.872	$ 46.042.400,00	4.581,00	0,00	4.581,00	$ 31.480.632,00		$ 31.480.632,00	2.119,00	$ 14.561.768,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				$ 670.910.102,00				$ 213.388.428,00	$ 196.616.473,00	$ 410.004.901,00		$ 260.905.201,00
	ADMINISTRACION		20,00%		$ 134.182.020,00				$ 42.677.686,00	$ 39.323.295,00	$ 82.000.980,00		$ 52.181.040,00
	IMPREVISTOS		1,00%		$ 6.709.101,00				$ 2.133.884,00	$ 1.966.165,00	$ 4.100.049,00		$ 2.609.052,00
	UTILIDAD		3,90%		$ 26.165.494,00				$ 8.322.149,00	$ 7.668.042,00	$ 15.990.191,00		$ 10.175.303,00
	IVA		19,00%		$ 4.971.444,00				$ 1.581.208,00	$ 1.456.928,00	$ 3.038.136,00		$ 1.933.308,00
	COSTO AIU (24.90%)				$ 172.028.059,00				$ 54.714.927,00	$ 50.414.430,00	$ 105.129.356,00		$ 66.898.703,00
	COSTO TOTAL DE OBRA				$ 842.938.161,00				$ 268.103.355	$ 247.030.903	$ 515.134.257		$ 327.803.904,00

cam	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 1**	7

Ingeniería & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato N°:	416 DE 2023	**Contratista:**	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS
Periodo:	6 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Coordinador de obra:	MAURICIO LOPEZ RUIZ	**Coordinador de Interventoría:**	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

31,81% 29,31% 61,11% 38,89%

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 842.938.161,00
V/R ADICIONES: $ 0,00
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 842.938.161,00

V/R ANTICIPO: $ 0,00
% ANTICIPO: 0,00%
% RETEGARANTIA: 0,00%

N°	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA N°	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No1	FV1	30/05/2024	$ 268.103.355,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 268.103.355,00	$ 574.834.806,00	31,81%
					$ 0,00	N/A	N/A	$ 0,00		
	TOTAL				**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 268.103.355,00**	**$ 574.834.806,00**	**31,81%**

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 85.481.726,00
V/R ADICIONES: $ 0,00
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 85.481.726,00

V/R ANTICIPO: NA
% ANTICIPO: NA
% RETEGARANTIA: 10,00%

N°	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA N°	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA No1	FVE - 65	30/05/2024	$ 27.191.736,96	$ 0,00	N/A	N/A	$ 27.191.736,96	$ 58.289.989,04	31,81%
						N/A	N/A	$ 0,00		31,81%
	TOTAL			**$ 27.191.736,96**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 27.191.736,96**	**$ 58.289.989,04**	**31,81%**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
ANEXO 2

7

Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	UNION TEMPORAL REFOCEIBAS	Coordinador de obra:	MAURICIO LOPEZ RUIZ
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Coordinador de Interventoria:	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO
Fecha del registro fotográfico:	6 de mayo de 2024	al	31 de mayo de 2024

FOTOGRAFÍA No.1



FILO FRIO - VDA LA PLATA - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.2



HIMALAYA - VDA LA PLATA - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.3



GRAMALES - VDA SANTA LUCIA - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.4



LOS PISCOS - VDA SAN BARTOLO - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.5



BARCELONA - VDA PUEBLO NUEVO - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.6



PROVIDENCIA - VDA ALTO MOTILON - NEIVA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

Ingeniería & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	14-may-24	PERIODO No.	24	DEL	6/05/2024	AL	12/05/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	118			DÍAS POR EJECUTAR	118		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	186	EQUIVALE AL	61,2%	PLAZO TRANSCURRIDO:	186	EQUIVALE AL	61,2%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			no iniciado
1	Mantenimiento aislamientos			no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales	12/02/2024	5/02/2024	7
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	21/04/2024	29/04/2024	-8
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)	20/05/2024		no iniciado
NP1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	20/05/2024	29/04/2024	21
NP7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	20/05/2024		no iniciado
NP8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	3/06/2024		no iniciado
NP14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	20/05/2024		no iniciado
NP17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
				14,00

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 382.887.627,90	45,42%	-1,69%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 368.673.864,52	43,74%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
LUISA FERNANDA MILLAN	1.110.543.520	Técnico de campo
ANDRES MAURICIO MEZA TARAZONA	1.098.605.272	Inspector
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Maestro
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Inspector
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Maestro
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Maestro
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante
LIDA MARIANA CASTAÑEDA	1.095.907.269	Ayudante
YESENIA MARIA GARCIA	63.526.989	Ayudante
YARALIT VANESA RODRIGUEZ	1.097.304.967	Inspector

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	5,9%	1
	TECNICO	8	0	47,1%	0,0%	8
	M.O/N.C	8	0	47,1%	0,0%	8
	TOTALES	**16**	**1**	**94,1%**	**5,9%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se realizaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Tello** vereda El Cadillo predio La primavera 320m de 3.200m. Se continuaron actividades en los aislamientos de **Neiva** tales como: Los Piscos 500m, La Albania 350m de 2.300m, La Esperanza 120m de 800m de la vereda San Bartolo, Filo Frio de la vereda La Plata 190m de 200m y La Lorena 130m de 1.275m de la vereda San Miguel. Se están realizando labores de limpia en los predios de mantenimiento de restauración activa en los predios de Neiva tales como: Providencia y Australia de la vereda Alto Motilón, Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo y Los Gramales de la vereda Santa Lucia.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría en este periodo continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas en el periodo.


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO LOS PISCOS - VDA SAN BARTOLO - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO FILO FRIO - VDA LA PLATA - MUNICIPIO DE NEIVA

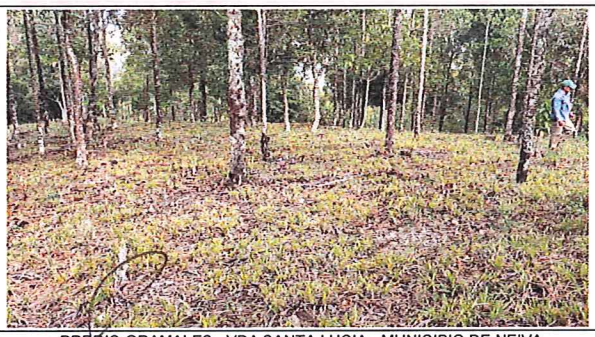

PREDIO GRAMALES - VDA SANTA LUCIA - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO BARCELONA - VDA PUEBLO NUEVO - MUNICIPIO DE NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	20-may-24	PERIODO No.	25	DEL	13/05/2024	AL	19/05/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	111			DÍAS POR EJECUTAR	111		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	193	EQUIVALE AL	63,5%	PLAZO TRANSCURRIDO:	193	EQUIVALE AL	63,5%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			no iniciado
1	Mantenimiento aislamientos			no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales	12/02/2024	5/02/2024	7
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	21/04/2024	29/04/2024	-8
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)	20/05/2024		no iniciado
NP1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	20/05/2024	29/04/2024	21
NP7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	20/05/2024		no iniciado
NP8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	27/04/2024	13/05/2024	-16
NP10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	3/06/2024		no iniciado
NP14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	20/05/2024	13/05/2024	7
NP17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
				5,00

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 420.364.044,41	49,87%	-2,69%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 397.661.371,70	47,18%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
LUISA FERNANDA MILLAN	1.110.543.520	Técnico de campo
ANDRES MAURICIO MEZA TARAZONA	1.098.605.272	Inspector
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Maestro
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Inspector
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Maestro
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Maestro
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante
LIDA MARIANA CASTAÑEDA	1.095.907.269	Ayudante
YESENIA MARIA GARCIA	63.526.989	Ayudante
YARALIT VANESA RODRIGUEZ	1.097.304.967	Inspector

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	5,9%	1
	TECNICO	8	0	47,1%	0,0%	8
	M.O/N.C	8	0	47,1%	0,0%	8
	TOTALES	**16**	**1**	**94,1%**	**5,9%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se realizaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Tello** vereda El Cadillo predio La primavera 630m de 3.200m y **Neiva** vereda La Plata predio Filo Frío 190m. Se continuaron labores de limpia en los aislamientos de **Neiva** tales como: Los Piscos 500m, La Albania 700 de 2.300m, La Esperanza 240m de 800m, El concilio 50m de 500m de la vereda San Bartolo, Himalaya 1.022m de la vereda La Plata, La Gironda 75m de 1.526m de la vereda Floragaita y La Lorena 195m de 1.275m de la vereda San Miguel. Se están realizando labores de limpia en los predios de mantenimiento de restauración activa en los predios de Neiva tales como: Providencia Australia de la vereda Alto Motilón, Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo y se terminó el mantenimiento de restauración activa en Los Gramales de la vereda Santa Lucia.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas en el periodo.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO LA ALBANIA - VDA SAN BARTOLO - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO HIMALAYA - VDA LA PLATA - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO GRAMALES - VDA SANTA LUCIA - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO BARCELONA - VDA PUEBLO NUEVO - MUNICIPIO DE NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

Ingenieria & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	27-may-24	PERIODO No.	26	DEL	20/05/2024	AL	26/05/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	104			DÍAS POR EJECUTAR	104		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	200	EQUIVALE AL	65,8%	PLAZO TRANSCURRIDO:	200	EQUIVALE AL	65,8%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			no iniciado
1	Mantenimiento aislamientos			no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales	12/02/2024	5/02/2024	7
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	21/04/2024	29/04/2024	-8
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)	20/05/2024		no iniciado
NP1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	27/04/2024	20/05/2024	-23
NP4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	20/05/2024	29/04/2024	21
NP7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	20/05/2024		no iniciado
NP8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	27/04/2024	13/05/2024	-16
NP10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	3/06/2024		no iniciado
NP14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	27/04/2024	17/05/2024	-20
NP16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	20/05/2024	13/05/2024	7
NP17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
				-15,00

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 454.086.848,33	53,87%	-2,86%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 430.001.167,61	51,01%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
LUISA FERNANDA MILLAN	1.110.543.520	Técnico de campo
ANDRES MAURICIO MEZA TARAZONA	1.098.605.272	Inspector
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Maestro
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Inspector
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Maestro
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Maestro
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante
LIDA MARIANA CASTAÑEDA	1.095.907.269	Ayudante
YESENIA MARIA GARCIA	63.526.989	Ayudante
YARALIT VANESA RODRIGUEZ	1.097.304.967	Inspector

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	5,9%	1
	TECNICO	8	0	47,1%	0,0%	8
	M.O/N.C	8	0	47,1%	0,0%	8
	TOTALES	**16**	**1**	**94,1%**	**5,9%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se realizaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Tello** vereda El Cadillo predio La primavera 950m de 3.200m y **Neiva** en los predios La Albania 1.400 de 2.300m, La Esperanza 360m de 800m, El Concilio 100m de 500m de la vereda San Bartolo; en el predio La Gironda 150m de 1.526m de la vereda Floragaita; en el predio La Lorena 260m de 1.275m de la vereda San Miguel; en predio La Soledad 600m de 1.689m de la vereda Alto Motilón y en el predio San Agustín 240m de 1.200m de la vereda Pueblo Nuevo. Se continuó labores de limpia en los predios de mantenimiento de restauración activa en el municipio de Neiva tales como: Providencia y Australia de la vereda Alto Motilón; y Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La interventoría continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas en el periodo.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO LA ALBANIA - VDA SAN BARTOLO - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA PRIMAVERA - VDA EL CADILLO - MUNICIPIO DE TELLO



PREDIO BARCELONA - VDA PUEBLO NUEVO - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO AUSTRALIA - VDA ALTO MOTILON - MUNICIPIO DE NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 416 DE 2023

Ingeniería & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	3-jun-24	PERIODO No.	27	DEL	27/05/2024	AL	2/06/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARHIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS Y CUENCAS ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	434 DE 2023			CONTRATO No.:	416 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (10 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DIAS POR EJECUTAR	97			DIAS POR EJECUTAR	97		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	207	EQUIVALE AL	68,1%	PLAZO TRANSCURRIDO:	207	EQUIVALE AL	68,1%
VALOR INICIAL :	$ 85.481.726,00			VALOR INICIAL :	$ 842.938.161,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 85.481.726,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 842.938.161,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 85.481.726,00			VALOR POR PAGAR:	$ 842.938.161,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DIAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			no iniciado
1	Mantenimiento aislamientos			no iniciado
2	Mantenimiento aislamientos cuencas abastecedoras de acueductos veredales y/o municipales	12/02/2024	5/02/2024	7
3	Mantenimiento restauración activa para la conectividad en la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) (Ha)	21/04/2024	29/04/2024	-8
4	Mantenimiento barreras vivas de fique (Ha)	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP1	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP2	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 99,9% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP3	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 93% de postes	27/04/2024	20/05/2024	-23
NP4	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 92,3% de postes	27/04/2024	29/04/2024	-2
NP5	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 91,8% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP6	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 90% de postes	20/05/2024	29/04/2024	21
NP7	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 86% de postes	20/05/2024	27/05/2024	-7
NP8	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 85% de postes	27/05/2024	27/05/2024	0
NP9	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 84% de postes	27/04/2024	13/05/2024	-16
NP10	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 77% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP11	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 61,2% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP12	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 54% de postes	27/05/2024		no iniciado
NP13	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 40% de postes	3/06/2024		no iniciado
NP14	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 39% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP15	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 35% de postes	27/04/2024	17/05/2024	-20
NP16	Mantenimiento Aislamiento Ceibas con reposición del 13,1% de postes	20/05/2024	13/05/2024	7
NP17	Mantenimiento Aislamiento Cuencas con reposición del 100% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP18	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 92% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP19	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 85% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP20	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 79% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP21	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 55% de postes	27/04/2024		no iniciado
NP22	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 52% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP23	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 49% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP24	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 42% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP25	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 24% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
NP26	Mantenimiento Aislamientos Cuencas con reposición del 15% de postes	27/04/2024	27/04/2024	0
				-52,00

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 486.948.593,13	57,77%	3,34%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 515.134.256,36	61,11%	

3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
MAURICIO LOPEZ RUIZ	19.303.707	Coordinador
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA SAMPABLO	1.110.568.563	Técnico de campo
LUISA FERNANDA MILLAN	1.110.543.520	Técnico de campo
ANDRES MAURICIO MEZA TARAZONA	1.098.605.272	Inspector
CAMILO JOSE ROPERO	1.091.672.864	Maestro
JOSE NORBEY SANCHEZ	1.091.673.579	Inspector
JORGE ANDRES MANTILLA	1.095.931.406	Ayudante
VICTOR ANDRES VILLALBA	1.098.657.324	Maestro
PABLO ANDRES MEDINA	1.130.600.680	Ayudante
GUILLERMO ROJAS RODRIGUEZ	13.497.197	Ayudante
FEDERICO GARCIA ARBELAEZ	7.544.804	Ayudante
JHON JAIRO RIVERA	91.018.696	Ayudante
CRISTIAN MAURICO RANGEL	91.159.501	Maestro
DARIO GUERRERO MANTILLA	91.240.841	Ayudante
LIDA MARIANA CASTAÑEDA	1.095.907.269	Ayudante
YESENIA MARIA GARCIA	63.526.989	Ayudante
YARALIT VANESA RODRIGUEZ	1.097.304.967	Inspector

3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	1	0,0%	5,9%	1
	TECNICO	8	0	47,1%	0,0%	8
	M.O/N.C	8	0	47,1%	0,0%	8
	TOTALES	**16**	**1**	**94,1%**	**5,9%**	**17**
	TOTAL	**17**		**100%**		





4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se realizaron labores en los aislamientos de los municipios de: **Tello** vereda El Cadillo predio La primavera 1.500m de 3.200m, vereda Rio Negro predio La Argentina 200m de 2118m y **Neiva** en los predios El Concilio 100m de 500m, La Albania 1.600 de 2.300m y La Esperanza 550m de 800m de la vereda San Bartolo; en el predio Las Pavas 180m de 600m y predio el Trigal 600m de 1000m de la vereda Motilón; en el predio La Soledad 800m de 1.689m de la vereda Alto Motilón; en el predio San Agustín 240m de 1.200m de la vereda Pueblo Nuevo; en el predio La Gironda 450m de 1.526m de la vereda Floragaita; en el predio La Lorena 450m de 1.275m de la vereda San Miguel. También se continuó labores de limpia en los predios de mantenimiento de restauración activa en el municipio de Neiva tales como: La Hondina de la vereda Motilón; Providencia y Australia de la vereda Alto Motilón; La Carolina, Lote No.4 La Corporación y la Colonia de la vereda La Plata; y Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo. Además se inició el mantenimiento a las barreras de fique del cual se tiene un avance del 50%.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La Interventoría continúa la revisión y verificación de las actividades realizadas en el periodo.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




PREDIO LA ALBANIA - VDA SAN BARTOLO - MUNICIPIO DE NEIVA



PREDIO LA PRIMAVERA - VDA EL CADILLO - MUNICIPIO DE TELLO



PREDIO BARCELONA - VDA PUEBLO NUEVO - MUNICIPIO DE NEIVA

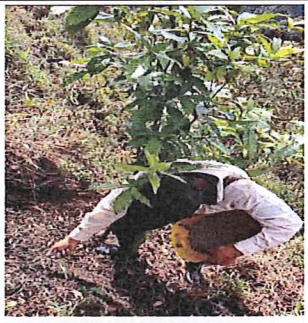

PREDIO AUSTRALIA - VDA ALTO MOTILON - MUNICIPIO DE NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HUMBERTO QUIZA CAMACHO

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

CQ Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.8	CONTRATO DE OBRA No.416 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM.	
CARLOS A. QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría	
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo de Interventoría	
DIEGO FAJARDO PERILLA (DF) - RL Contratista de Obra	
MIGUEL ANGEL CATAÑEDA (MA) - Técnico campo Contratista de Obra	

II. OBJETO

Aspectos administrativos, inicio de actividades y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No se generaron compromisos anteriores.

V. TEMAS TRATADOS

JC solicita información sobre el seguimiento y verificación en la ejecución de los mantenimientos a la restauración pasiva y activa que se ha realizado hasta la fecha; además, sobre las dificultades y/o inconvenientes en la ejecución.

Teniendo en cuenta que el plazo contractual se encuentra a más del 50% CQ manifiesta que es importante dar solución definitiva a las situaciones que han presentado en el desarrollo de las actividades, en cuanto a la dificultad de acceso en el predio Santa Librada vereda Tambillo del municipio de Rivera, al igual que el predio La Buchica vereda Estoracal del municipio de Hobo; además, la dificultad para concretar la contratación de mano de obra con el personal de la zona para realizar la actividad de mantenimiento a la reforestación de las 4 ha en el predio La Hondina vereda Motilón.

JC informa que dada la dificultad manifestada por el contratista de obra y corroborada por la Interventoría en los municipios de Rivera y Hobo, es pertinente realizar el cambio de estos predios, con el fin de dar cumplimiento a las metas físicas y presupuestales de la Corporación, atendiendo al objeto contractual; por lo tanto, el contratista de obra debe presentar la justificación técnica con los respectivos soportes, considerando los diferentes motivos por la cual en los municipios mencionados no se puede ejecutar la actividad, para que así la Corporación analice y determine la realización de los cambios a que haya lugar.

De igual manera CQ, solicita al contratista realizar un balance definitivo para el caso de los mantenimientos a los aislamientos ejecutados y/o en ejecución, que por las condiciones reales encontradas en cada aislamiento, algunos cercos tienen metros lineales inferiores a los establecidos en el contrato; de manera que, actualmente estarían faltando por ejecutar de manera aproximada. Esto con el fin de presentar en la misma justificación técnica la posibilidad de ejecutar dichos metro lineales en otros predios que asigne la Corporación.

DF manifiesta estar de acuerdo con las definiciones que se han logrado establecer para dar cumplimiento a la ejecución total del contrato, por lo cual se compromente a entregar la documentación solicitada, para que los trámites obren dentro del tiempo y las actividades se ejecuten dentro del plazo contractual.

LD solicita al contratista información sobre el inicio de las actividades para subsanar las observaciones realizadas a algunos postes del aislamiento del predio Providencia vereda Bombonal del municipio de Palermo. A lo cual MA manifiesta que presentarán una propuesta a la interventoría con la metodología a utilizar para dar solución y garantizar la estabilidad de la obra.

Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.8	CONTRATO DE OBRA No.416 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Acta de Justificación cambio de predios	Contratista de obra	Por definir
Balance de obra	Contratista de obra	Por definir
Metodología subsanación Bombonal - Palermo	Contratista de obra	Por definir

VI. PRÓXIMA REUNIÓN							
FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los siete (07) días del mes de mayo de 2024.

SGC-CP-16224-24
Neiva, mayo 03 de 2024

Señores
UNION TEMPORAL REFORCEIBAS
DIEGO ÉDISON FAJARDO PERILLA
Representante Legal
Ciudad

Ref.: Contrato de obra No.416 de 2023.
Asunto: Citación comité técnico.

Cordial saludo.

Se convoca a comité técnico para el día martes 07 de mayo de 2024 a las 9:00 am, en las instalaciones de la CAM de la ciudad de Neiva, con el fin de tratar aspectos técnicos y avance del contrato de la referencia, fundamental la asistencia del representante legal.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-05	29789167	I	2024-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	406.900	500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29789167	2024-06-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-05	29789167	I	2024-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	406.900	500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	29789167	2024-06-06	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	200	0	224.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	200	0	224.200
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	200	0	175.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	200	0	175.200
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	100	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	100	0	7.500
Gran Total					406.400	0	500	0	406.900

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30001132	E	2024-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.943.600	3.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	30001132	2024-06-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	194.500	S	5711001
2	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
3	CC 1075221485	VARELA RAMOS SANDRA LICETH	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
4	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
5	CC 1077865950	BARRERA PALENCIA FABIAN LEONARDO	2.000.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.527.778	101.200	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	640.400	S	5711001
6	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.000	280.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
7	CC 1121917315	LUNA PINZON JULIAN RICARDO	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30001132	E	2024-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.943.600	3.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
7	30001132	2024-06-06	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.300.000	13.600.000	13.600.000	14.127.778	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				6	1.968.000	0	1.700	0	1.969.700
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.448.000	0	1.200	0	1.449.200
PROTECCION	230201	800229739	0	2	520.000	0	500	0	520.500
EPS(Administradoras: 3)				7	544.000	0	600	0	544.600
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	160.000	0	200	0	160.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	174.000	0	200	0	174.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	210.000	0	200	0	210.200
ARP(Administradoras: 1)				7	862.900	0	700	0	863.600
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	7	862.900	0	700	0	863.600
CCF(Administradoras: 1)				7	565.200	0	500	0	565.700
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	7	565.200	0	500	0	565.700
Gran Total					3.940.100	0	3.500	0	3.943.600

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30001301	E	2024-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.580.500	1.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
3	30001301	2024-06-06	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
2	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-05	2024-06	30001301	E	2024-06-06	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.580.500	1.500	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
3	30001301	2024-06-06	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	816.000	0	700	0	816.700
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	200	0	208.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	608.000	0	500	0	608.500
EPS(Administradoras: 2)				3	204.000	0	300	0	204.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	152.000	0	200	0	152.200

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	100	0	52.100
ARP(Administradoras: 1)				3	355.000	0	300	0	355.300
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	3	355.000	0	300	0	355.300
CCF(Administradoras: 1)				3	204.000	0	200	0	204.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	204.000	0	200	0	204.200
Gran Total					1.579.000	0	1.500	0	1.580.500

ASOPAGOS s.a.
PAGADO
