Municipio de Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

Acta de supervisión al contrato 399-2024, celebrado entre el Municipio de Villamaría, Caldas y RS CONSTRUCCIONES S.A.S

**ACTA DE SUPERVISION Y PAGO No. 2**

**(junio de 2024)**

<table>
<tr><th colspan="3">INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Tipo de contrato: INVITACION PUBLICA DE MINIMA CUANTIA No: 399-2024</td><td rowspan="2">Adición:</td><td>Dinero: $ 49.939.097</td></tr>
<tr><td>Tiempo: 1 mes</td></tr>
<tr><td>Contratista: RS CONSTRUCCIONES S.A.S</td><td colspan="2">C.C/NIT: 900.854.254</td></tr>
<tr><td>OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A SUMINISTRAR MATERIALES Y REALIZAR LA REMODELACION Y ADECUACION DE LA SEDE NUESTRA SEÑORA DE LA FLORIDA DE LA INSTITUCION NAZARIO RESTREPO DE LA VEREDA GALLINAZO, AFECTADA POR EVENTOS NATURALES DEL DIA 14 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS.</td><td colspan="2">VIGENCIA:<br>Desde: 10/05/2024<br>Hasta. 08/06/2024</td></tr>
</table>

**FORMA DE PAGO** El valor del contrato es por la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEICIENTOS CUARENTA PESOS ($ 99.995.640)** los cuales se cancelaran de la siguiente manera, en actas parciales actas parciales conforme a avance y ejecución del contrato, previa presentación de informes de actividades avaladas por el supervisor para el pago cada contratista deberá aportar: a) copia de los comprobantes de pago y planilla de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y riesgos laborales en el porcentaje establecido por el Gobierno Nacional. B) Informe actividades del periodo mediante el cual se pretende tramitar el cobro.

Que el día 23 de mayo de 2023 se celebró el Otro sí N° 1 el cual establece las siguientes modificaciones: **PRIMERA:** Adicionar el valor del contrato Urgencia Manifiesta 399-2024 en la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($49.934.737) M/CTE.

**CLAUSULA CUARTA:** El valor del presente contrato será la suma de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($ 149.934.737) M/CTE, Incluido el IVA y todo el tributo que se generen con ocasión a la celebración a la

Powered by CamScanner

celebración, ejecución y liquidación del convenio; los cuales serán a cargo del contratista.

**SEGUNDA:** prorrogar del plazo de ejecución del contrato Urgencia Manifiesto 339-2024 en SESENTA (60 DIAS CALENDARIO)

**LA CLAUSULASEXTA: EJECUCION DEL CONTRATO:** El plazo para la ejecución será desde la firma del acta de inicio y hasta por NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO en la vigencia fiscal 2024. PARAGRAFO PRIMERO: se da por iniciación la ejecución del presente contrato a la presentación total de la documentación y suscripción del acta de inicio.

| RUBRO: 2.3.2.01.01.001.03 | CDP: 440 | CRP: 994 y 1187 |
|---|---|---|
| **VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA # 2**<br>**$ 66.409.200** | **VALOR DESEMBOLSOS EFECTUADOS:**<br>***$33.586.440*** | |

**INFORMACIÓN A REPORTAR**

**Nombre del supervisor JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE, de Infraestructura y Vias,** actuando en calidad de supervisor he constatado el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito entre el contratista y el Municipio de Villamaría, para lo cual el contratista realizo las siguientes actividades que han sido verificadas y supervisadas de la siguiente manera:

**REGISTRO FOTOGRAFICO Y UBICACIÓN**




VEREDAS GALLINAZO (CENTRO POBLADO)

| VEREDA GALLINAZO | COORDENADA | |
|---|---|---|
| UBICACIÓN | 5° 0'59,83" N | 75° 26'15,18 "O |

Powered by CamScanner



**Panorama de Cubierta y Lateral**



**Panorama de Estructura**



**Panorama de Canales**

De las actividades realizadas según el registro fotográfico en el informe, he adelantado acciones de verificación personal y documental, confrontando la información con la que reposa en los archivos físicos de la entidad, lo que me da certeza en certificar que el contratista ha cumplido con las obligaciones contempladas en el objeto tipificado en el contrato en mención, de igual manera la contratista ha efectuado los aportes y pagos correspondientes a Salud, Pensión y Riesgos laborales Junio de 2024 en el porcentaje establecido por el gobierno Nacional.

Los residuos sólidos fueron dispuestos en lugar autorizado por la autoridad ambiental según recibos número 281226 y 281356 como lo presenta el contratista en su informe (escombreras y canteras)

Powered by CamScanner

Municipio de
Villamaría
Secretaría de INFRAESTRUCTURA Y VÍAS

# ANALISIS DE EJECUCION

## RESUMEN CONTRARTO

CONTRATO 399-2024 (URGENCIA MANIFIESTA - ESCUELA NAZARIO RESTREPO)

| | |
|---|---|
| CONTRATO INICIAL | $ 99.995.640,00 |
| ADICION | $ 49.939.097,00 |
| VALOR CONTRATO | $ 149.934.737,00 |
| VALOR EJECUTADO | $ 99.995.640,00 |
| VALOR POR EJECUTAR | $ 49.939.097,00 |

| ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmontar cielo raso total | $M^2$ | 385 | $ 7.740,00 | $ 2.979.900 |
| 2 | Desmontar cubierta de fibrocemento | $M^2$ | 385 | $ 9.030,00 | $ 3.476.550 |
| 3 | Desmontar estructura de madera | $M^2$ | 385 | $ 11.610,00 | $ 4.469.850 |
| 4 | Desmontar canales | $M^L$ | 46 | $ 7.740,00 | $ 356.040 |
| 5 | Instalacion de cubierta arquitectonica en Aluzinc calibre 19 (MATERIAL PRIMA) | $M^2$ | 385 | $ 90.300,00 | $ 34.765.500 |
| 6 | Instalacion de canales galvanizadas | $M^L$ | 82 | $ 109.650,00 | $ 8.991.300 |
| 7 | Instalacion de bajantes en PVC | $M^L$ | 24 | $ 77.400,00 | $ 1.857.600 |
| 8 | Fabricacion e instalacion de estructura metalica para cubierta en tubo 8*4 cal 16, sin pintar | $M^2$ | 385 | $ 103.200,00 | $ 39.732.000 |
| 9 | Retiro de escombros | M3 | 18 | $ 187.050,00 | $ 3.366.900 |
| 10 | Suministro y transporte de Lamina de PVC | M2 | 317,00 | $ 43.024 | $ 13.638.762 |
| 11 | Suministro y transporte de estructura galvanizada y tornillería para cielo raso | M2 | 317,00 | $ 32.323 | $ 10.246.439 |
| 12 | Suministro tubería conduic de 1/2 y 1" | ML | 171,00 | $ 4.638 | $ 793.177 |
| 13 | Suministro de lamparas LED de 21 W | UN | 42,00 | $ 35.318 | $ 1.483.359 |
| 14 | Suministro de cable electrico para acometida electrica trenzado 14,3 conductores encauchetado | ML | 117,00 | $ 7.991 | $ 934.983 |
| 15 | Suministro de cable dupleX # 12 | ML | 115,00 | $ 6.297 | $ 724.112 |
| 16 | Suministro cable alambre cal 14 tres colores | ML | 240,00 | $ 8.364 | $ 2.007.322 |
| 17 | Jornales de 2 Oficiales | DIA | 30,00 | $ 153.727 | $ 4.611.801 |
| 18 | Jornales 2 ayudantes | DIA | 30,00 | $ 97.298 | $ 2.918.945 |
| 19 | Transporte de desplazamiento del personal ala vereda ( cuatro personas) | DIA | 30,00 | $ 25.420 | $ 762.607 |
| 20 | Transporte de material trayecto Manizales Cullinao | UN | 1,00 | $ 177.969 | $ 177.969 |
| 21 | Salario maestro | DIA | 30,00 | $ 175.312 | $ 5.259.360 |
| 22 | Andamios completos certificados | DIA | 30,00 | $ 66.399 | $ 1.991.983 |
| 23 | Equipos de seguridad industrial para 4 personas | DIA | 30,00 | $ 146.276 | $ 4.388.279 |
| TOTAL | | | | | $ 149.934.737 |

Powered by CamScanner

**EJECUTADO**

| ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmontar cielo raso total | $M^2$ | 385 | $ 7.740,00 | $ 2.979.900 |
| 2 | Desmontar cubierta de fibrocemento | $M^2$ | 385 | $ 9.030,00 | $ 3.476.550 |
| 3 | Desmontar estructura de madera | $M^2$ | 385 | $ 11.610,00 | $ 4.469.850 |
| 4 | Desmontar canales | $M^L$ | 46 | $ 7.740,00 | $ 356.040 |
| 5 | Instalacion de cubierta arquitectonica en Aluzinc calibre 19 (MATERIAL PRIMA) | $M^2$ | 385 | $ 90.300,00 | $ 34.765.500 |
| 6 | Instalacion de canales galvanizadas | $M^L$ | 82 | $ 109.650,00 | $ 8.991.300 |
| 7 | Instalacion de bajantes en PVC | $M^L$ | 24 | $ 77.400,00 | $ 1.857.600 |
| 8 | Fabricacion e instalacion de estructura metalica para cubierta en tubo 8*4 cal 16, sin pintar | $M^2$ | 385 | $ 103.200,00 | $ 39.732.000 |
| 9 | Retiro de escombros | M3 | 18 | $ 187.050,00 | $ 3.366.900 |
| TOTAL | | | | | $ 99.995.640 |

**EJECUCIÓN PRESENTE ACTA 2**

| ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Instalacion de cubierta arquitectonica en Aluzinc calibre 19 | $M^2$ | 138 | $ 90.300,00 | $ 12.461.400 |
| 6 | Instalacion de canales galvanizadas | $M^L$ | 82 | $ 109.650,00 | $ 8.991.300 |
| 7 | Instalacion de bajantes en PVC | $M^L$ | 24 | $ 77.400,00 | $ 1.857.600 |
| 8 | Fabricacion e instalacion de estructura metalica para cubierta en tubo 8*4 cal 16, sin pintar | $M^2$ | 385 | $ 103.200,00 | $ 39.732.000 |
| 9 | Retiro de escombros | M3 | 18 | $ 187.050,00 | $ 3.366.900 |
| TOTAL | | | | | $ 66.409.200 |

Powered by CamScanner

**ACUMULADA**

| ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desmontar cielo raso total | $M^2$ | 385 | $ 7.740,00 | $ 2.979.900 |
| 2 | Desmontar cubierta de fibrocemento | $M^2$ | 385 | $ 9.030,00 | $ 3.476.550 |
| 3 | Desmontar estructura de madera | $M^2$ | 385 | $ 11.610,00 | $ 4.469.850 |
| 4 | Desmontar canales | $M^L$ | 46 | $ 7.740,00 | $ 356.040 |
| 5 | Instalacion de cubierta arquitectonica en Aluzinc calibre 19 | $M^2$ | 385 | $ 90.300,00 | $ 34.765.500 |
| 6 | Instalacion de canales galvanizadas | $M^L$ | 82 | $ 109.650,00 | $ 8.991.300 |
| 7 | Instalacion de bajantes en PVC | $M^L$ | 24 | $ 77.400,00 | $ 1.857.600 |
| 8 | Fabricacion e instalacion de estructura metalica para cubierta en tubo 8*4 cal 16, sin pintar | $M^2$ | 385 | $ 103.200,00 | $ 39.732.000 |
| 9 | Retiro de escombros | M3 | 18 | $ 187.050,00 | $ 3.366.900 |
| TOTAL | | | | | $ 99.995.640 |

**ANALISIS DE VALOR DE LA PRESENTE ACTA**

| ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Instalacion de cubierta arquitectonica en Aluzinc calibre 19 | $M^2$ | 138 | $ 90.300,00 | $ 12.461.400 |
| 6 | Instalacion de canales galvanizadas | $M^L$ | 82 | $ 109.650,00 | $ 8.991.300 |
| 7 | Instalacion de bajantes en PVC | $M^L$ | 24 | $ 77.400,00 | $ 1.857.600 |
| 8 | Fabricacion e instalacion de estructura metalica para cubierta en tubo 8*4 cal 16, sin pintar | $M^2$ | 385 | $ 103.200,00 | $ 39.732.000 |
| 9 | Retiro de escombros | M3 | 18 | $ 187.050,00 | $ 3.366.900 |
| TOTAL | | | | | $ 66.409.200 |

*En virtud de lo anterior, emito el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago del valor adeudado al contratista según la presente acta, que corresponde al pago No. 1*

**FIRMA:**

**JORGE ELIECER BUITRAGO URIBE**
**SUPERVISOR**

Powered by CamScanner

Villamaría junio 12 del 2024

**INFORME # 2, AVANCE FINAL DE OBRA**

**CONTRATO URGENCIA MANIFIESTA, # 399-2024**

**CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE VILLAMARIA CALDAS, NIT, 890801_52-8

**CONTRATISTA:** RS CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT # 900,854,254

**REP LEGAL:** CARLOS JULIO RUBIO MORENO C. C. # 79.425.352

**ASPECTOS GENERALES DE LA OBRA:**

De acuerdo al objeto del contrato concerniente a, suministro de materiales para realizar la remodelación y adecuación de la Sede Nuestra Señora de La Florida de La Institución Nazario Restrepo, de La Vereda Gallinazo, afectada por eventos naturales el día 14 de abril, en el Municipio de Villamaría Caldas.

Se dio inicio a la obra el día 10 de mayo del 2024, efectuando el desmonte de: cielo raso total, cubierta de fibrocemento, canales, bajantes y estructura de madera respectivamente. Retiro de la madera del cielo raso y parte de la estructura.

Una vez desmontada la cubierta, se procedió al suministro e instalación de: Estructura metálica, canales, bajantes y cubierta total de teja UPVC; Se retira los escombros y se finiquita la obra de acuerdo a lo contratado.

Teniendo en cuenta el pago del acta #1, los ítems pendientes por cancelar son:


Powered by CamScanner

| ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalación de cubierta arquitectónica de UPVC | $M^2$ | 138 | $ 70.000,00 | $ 9.660.000 |
| 2 | Instalación de canales galvanizadas | $M^L$ | 82 | $ 85.000,00 | $ 6.970.000 |
| 3 | Instalación de bajantes en PVC | $M^L$ | 24 | $ 60.000,00 | $ 1.440.000 |
| 4 | Fabricación e instalación de estructura metálica para cubierta en tubo 8*4 cal 16, sin pintar | $M^2$ | 385 | $ 80.000,00 | $ 30.800.000 |
| 5 | Retiro de escombros | M3 | 18 | $ 145.000,00 | $ 2.610.000 |

| | |
|---|---|
| **Costo directo** | **51.480.000** |
| **A.U (29%)** | **14.929.200** |
| **Costo Total** | **66.409.200** |

## REGISTRO FOTOGRAFICO

## ESTRUCTURA, CANALES Y CUBIERTA

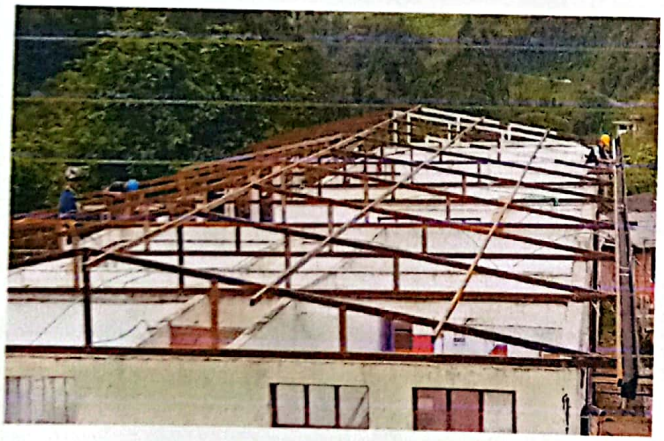





Powered by CamScanner









Powered by CamScanner



CARLOS JULIO RUBIO MORENO
Representante legal

Powered by CamScanner

| ITEM | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instalacion de cubierta arquitectonica de UPVC | $M^2$ | 138 | $ 70.000,00 | $ 9.660.000 |
| 2 | Instalacion de canales galvanizadas | $M^1$ | 82 | $ 85.000,00 | $ 6.970.000 |
| 3 | Instalacion de bajantes en PVC | $M^1$ | 24 | $ 60.000,00 | $ 1.440.000 |
| 4 | Fabricacion e instalacion de estructura metalica para cubierta en tubo 8*4 cal 16, sin pintar | $M^2$ | 385 | $ 80.000,00 | $ 30.800.000 |
| 5 | Retiro de escombros | M3 | 18 | $ 145.000,00 | $ 2.610.000 |
| | | | | | |
| | | | Costo directo | | 51.480.000 |
| | | | A.U (29%) | | 14.929.200 |
| | | | Costo Total | | 66.409.200 |

Powered by CamScanner

# Factura Electrónica de Venta 102

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764069542967 de 24/04/2024 - 24/04/2026 autoriza -101 a -200

R S CONSTRUCCIONES SAS NIT 900854254
Actividad Económica Principal 4290
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 14/06/2024 08:38 |
| Fecha de Vencimiento | 14/06/2024 08:38 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Efectivo |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | R S CONSTRUCCIONES SAS |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 900854254 |
| Obligación | IVA |
| Email | rsconstruccionessas@gmail.com |
| Teléfono | 3105592337 |
| Dirección | CR 72 BIS 73 36 AP 104 B |
| Ciudad, Depart. | BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | Villa Maria Caldas |
| Nombre Comercial | Villa Maria Caldas |
| NIT | 890801152 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | tesoreria@villamaria-caldas.gov.co |
| Teléfono | 3117628544 |
| Dirección | calle 9 carrera 4 esquina |
| Ciudad, Depart. | VILLAMARIA, CALDAS (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | Nº 399-2024 | 1 | EA | $66,409,200.00 | | $66,409,200.00 | $66,409,200.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $66,409,200.00 |
| Total a Pagar | $66,409,200.00 |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE:
0d6711d2b27ede69126dd840be6a59a7b20c65e809a8c0cfa1ae9dc5b744c17af8d00d3647b8af3f50816a17fcf3b0a5

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



Powered by CamScanner

ESCOMBRERAS
Y CANTERAS
S.A.S. E.S.P.
NIT. 900846577-3 Régimen Común

Recibo
Nº 281226

56000

Fecha: Día 6 Mes 6 Año 24

Placa Vehículo: HMB015

M3 Entregados

| 1 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Firma Responsable Escombrera

Powered by CamScanner

ESCOMBRERAS
Y CANTERAS
S.A.S. E.S.P.
NIT. 900846577-3 Régimen Común

# Recibo

Nº 281356

$ 56000

Fecha: Día 05 Mes 6 Año 24

Placa Vehículo: HMB015

M3 Entregados

| 1 | 7 | 8 | 9 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | / | | | |

atherine Orozco

Powered by CamScanner

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **ANA ESLEY TOBAR OME**, identificada con cédula de ciudadanía N°36.279.923 en calidad de CONTADORA con T.P. No. 106393-T de la empresa R.S CONSTRUCCIONES SAS con NIT 900.854.254-3; me permito certificar que durante los últimos seis (6meses calendario legalmente exigibles), la empresa ha tenido personal afiliado al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá D.C a los seis (06) días del mes de junio de 2024.



ANA ESLEY TOBAR OME
C.C. 36.279.923 de Pitalito H.
Contadora
TP 106393-T
RS CONSTRUCCIONES SAS

Powered by CamScanner

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 9 1 6 7 7 3 E 5 0 5 9 A E 1 2

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA ESLEY TOBAR OME** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 36279923 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 106393-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner




Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36279923

TOBAR OME
APELLIDOS

ANA ESLEY
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 17-NOV-1970
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.53 | O+ | F |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

02-FEB-1989 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-44700100-07008701-F-00362700231-20050211 03292020428 01 109317075

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner
