
PROGRAMACIÓN DE OBRA - CONTRATO FDLSF-COP-304-2023(SIPSE 92620)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		**CONTRATO FDLSF-COP-304-2023**	**182 días**	**lun 15/01/24**	**dom 14/07/24**
2		INICIO CTO FDLSF-COP-304-2023	0 días	lun 15/01/24	lun 15/01/24
3		DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN	42 días	lun 15/01/24	dom 25/02/24
4		**EL ROCÍO BAJO**	**159 días**	**mié 7/02/24**	**dom 14/07/24**
5		Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, Etc., incluye respectivos tapones tanto sanitario como potable, Disposición, Cargue Y Retiro De Escombros	2 días	lun 4/03/24	mar 5/03/24
6		Desmonte puerta metálica marco+puerta (Incluye trasiego y retiro)	2 días	jue 7/03/24	vie 8/03/24
7		Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes	5 días	sáb 9/03/24	mié 13/03/24
8		Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes Etc., (Incluye cargue, andamios	18 días	jue 2/05/24	dom 19/05/24
9		Desmonte y retiro de tuberías hidrosanitarias existentes De 4", 3", 2". (Incluye Excavación, Retiro Del Relleno, Cargue Y Retiro De Escombros)	2 días	mié 27/03/24	jue 28/03/24
10		Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelera)	2 días	mié 6/03/24	jue 7/03/24
11		Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	1 día	mié 6/03/24	mié 6/03/24
12		Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes	5 días	dom 17/03/24	jue 21/03/24
13		Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes	3 días	jue 14/03/24	sáb 16/03/24
14		Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías, cableado, aparatos y luminarias)	3 días	jue 2/05/24	sáb 4/05/24
15		Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV (ml)<0.70Alt	10 días	lun 3/06/24	mié 12/06/24
16		Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios)	7 días	lun 4/03/24	dom 10/03/24
17		Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 cielo raso (3 manos)(incluye andamios y accesorios propios para la instalación)	5 días	dom 23/06/24	jue 27/06/24
18		Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	8 días	dom 23/06/24	dom 30/06/24
19		Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	7 días	sáb 6/07/24	vie 12/07/24
20		Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	7 días	sáb 6/07/24	vie 12/07/24
21		Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00 mts (3 manos) (incluye andamios y accesorios propios para la instalación)	8 días	lun 1/07/24	lun 8/07/24
22		Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeo blanco o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte)	5 días	dom 14/04/24	jue 18/04/24
23		Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acesco o similar cal.26 prepintada	10 días	jue 13/06/24	sáb 22/06/24
24		Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	3 días	dom 23/06/24	mar 25/06/24
25		Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos	2 días	vie 29/03/24	sáb 30/03/24
26		Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT	2 días	jue 13/06/24	vie 14/06/24
27		Limpieza tuberia existente (sondeo)	1 día	lun 4/03/24	lun 4/03/24
28		Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye griferia)	2 días	jue 13/06/24	vie 14/06/24
29		Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar, incluye griferia y accesorios	2 días	jue 13/06/24	vie 14/06/24

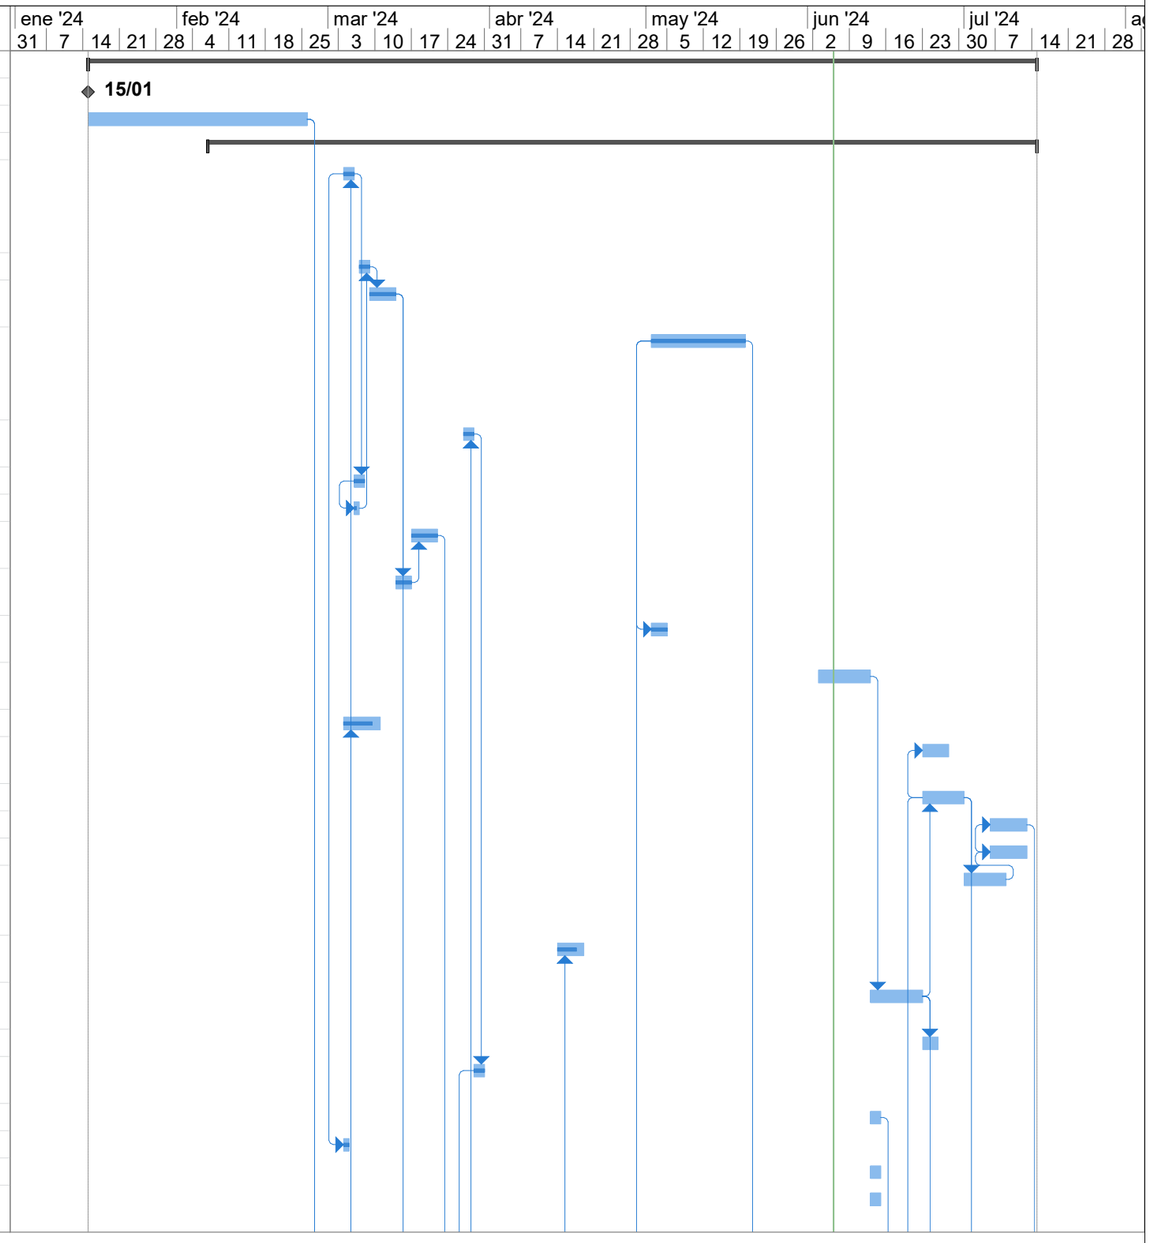


Proyecto: msproj11
Fecha: jue 6/06/24

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	

PROGRAMACIÓN DE OBRA - CONTRATO FDLSF-COP-304-2023(SIPSE 92620)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
30		Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de distribución, 120V Incluye caja 5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. (No incluye luminaria)	7 días	dom 23/06/24	sáb 29/06/24
31		Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT (Incluye interruptor)	7 días	dom 23/06/24	sáb 29/06/24
32		Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-6K (100-277v) sobreponer	5 días	dom 30/06/24	jue 4/07/24
33		PAÑETE LISO SOBRE MUROS	5 días	mar 9/04/24	sáb 13/04/24
34		PINTURA EPÓXICA (2 MANOS)	3 días	dom 23/06/24	mar 25/06/24
35		LIMPIEZA DE CANAL (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS)	2 días	lun 20/05/24	mar 21/05/24
36		ASEO GENERAL DE OBRA	2 días	sáb 13/07/24	dom 14/07/24
37		ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	7 días	lun 26/02/24	dom 3/03/24
38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	3 días	lun 1/07/24	mié 3/07/24
39		SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANO DE MÁRMOL FORMATO 33X33 PULIDO Y BRILLADO	7 días	mar 2/04/24	lun 8/04/24
40		MEDIACAÑA GRANITO PULIDO H=0.10	5 días	mar 2/04/24	sáb 6/04/24
41		MEDIACAÑA EN MORTERO H=0.10	5 días	mar 9/04/24	sáb 13/04/24
42		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR PARA TANQUE	2 días	sáb 15/06/24	dom 16/06/24
43		PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2"	2 días	vie 29/03/24	sáb 30/03/24
44		SALIDA SANITARIA 2"	2 días	vie 29/03/24	sáb 30/03/24
45		SALIDA SANITARIA 4"	2 días	vie 29/03/24	sáb 30/03/24
46		ALISTADO DE PISO H = 2 A 4CM	2 días	dom 31/03/24	lun 1/04/24
47		PASAMANOS EN TUBO REDONDO 2"	5 días	lun 1/07/24	vie 5/07/24
48		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO ADRIATICO (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	2 días	sáb 15/06/24	dom 16/06/24
49		BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE SUPERIOR	2 días	sáb 15/06/24	dom 16/06/24
50		BARRA DE SEGURIDAD MURO 18"	2 días	sáb 15/06/24	dom 16/06/24
51		REJILLA DE VENTILACIÓN PLÁSTICA 20X20	1 día	sáb 15/06/24	sáb 15/06/24
52		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 D=25CM	3 días	dom 23/06/24	mar 25/06/24
53		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 24W	3 días	dom 30/06/24	mar 2/07/24
54		DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS (INCLUYE MEMORIAS DE CÁLCULO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROFESIONAL EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA)	30 días	mar 27/02/24	mié 27/03/24
55		DISEÑO ARQUITECTÓNICO E HIDROSANITARIO DE BAÑO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	18 días	mié 7/02/24	sáb 24/02/24
56		DEMOLICIÓN DE SOBREPISO H=4CM	5 días	vie 22/03/24	mar 26/03/24
57		DEMOLICIÓN DE PAÑETE	3 días	jue 14/03/24	sáb 16/03/24
58		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA (INCLUYE: FABRICACIÓN, MONTAJE DE CERCHAS, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, TORNILLERÍA SEGÚN DISEÑO)	18 días	jue 2/05/24	dom 19/05/24
59		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CORREDIZA EN COLD ROLLED CAL. 18, INCLUYE REFUERZOS, RIELES, RODACHINAS, FALLEBAS, PATAS DE ANCLAJE, CERRADURA PICO DE LORO, TORNILLOS HILTI, PINTURA ELECTROESTÁTICA	10 días	lun 1/07/24	mié 10/07/24

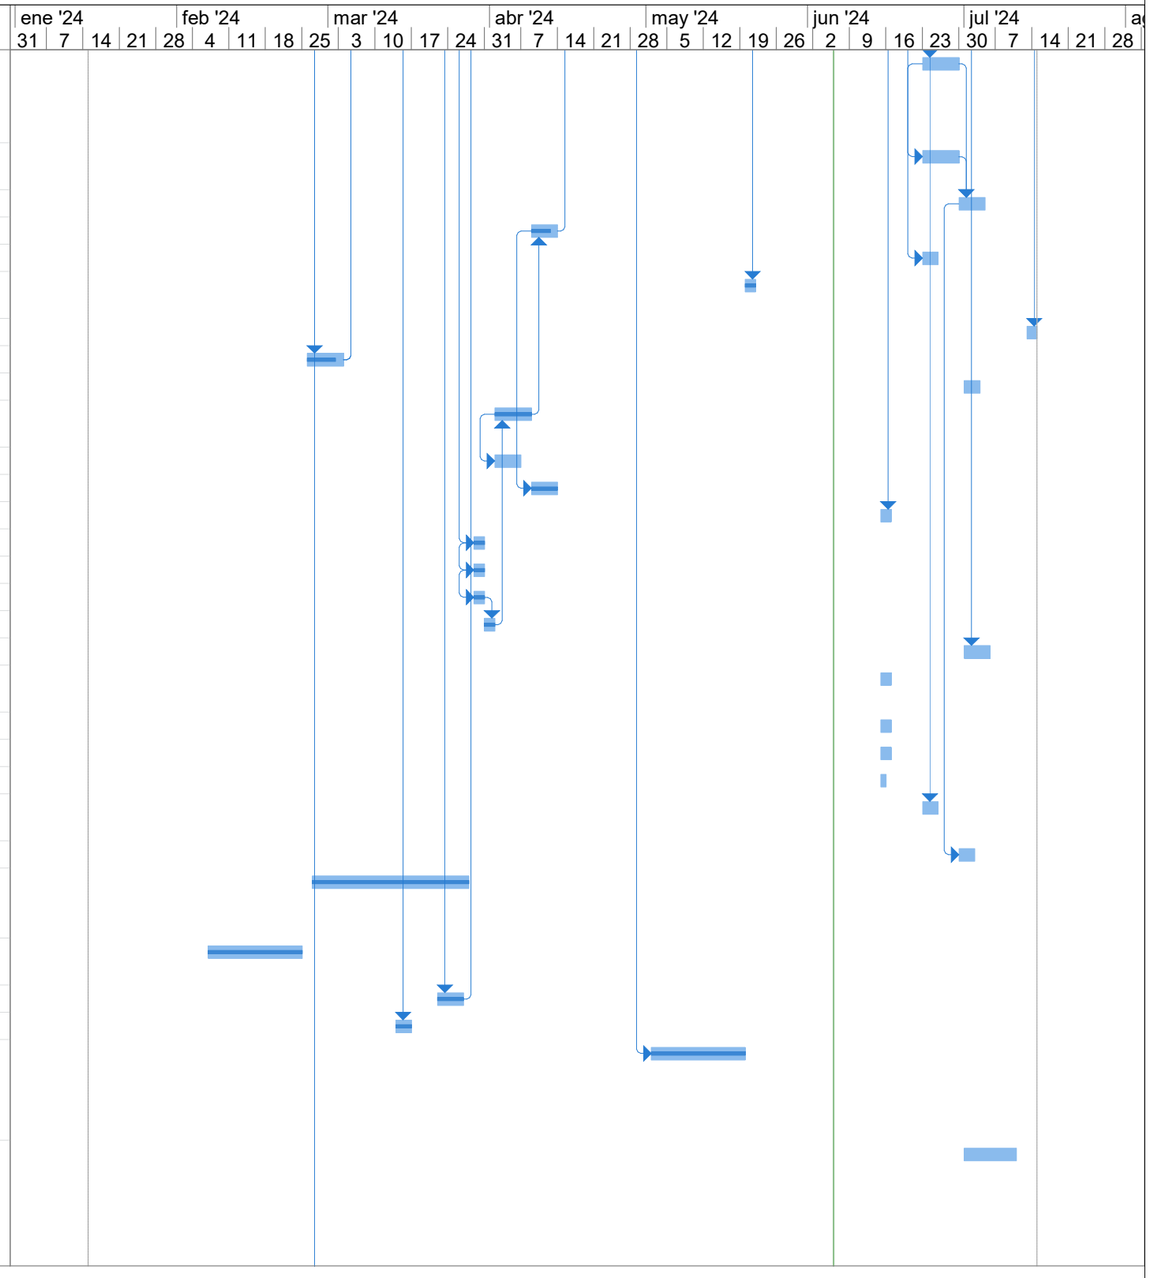


Proyecto: msproj11
Fecha: jue 6/06/24

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	

PROGRAMACIÓN DE OBRA - CONTRATO FDLSF-COP-304-2023(SIPSE 92620)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
60		**CARTAGENA**	**129 días**	**mié 7/02/24**	**vie 14/06/24**
61		Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, Etc., incluye respectivos tapones tanto sanitario como potable, Disposición, Cargue Y Retiro De Escombros	2 días	sáb 16/03/24	dom 17/03/24
62		Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes	5 días	mar 19/03/24	sáb 23/03/24
63		Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	1 día	lun 18/03/24	lun 18/03/24
64		Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes	2 días	dom 24/03/24	lun 25/03/24
65		Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV (ml)<0.70Alt	3 días	mié 22/05/24	vie 24/05/24
66		Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios)	5 días	lun 11/03/24	vie 15/03/24
67		Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 cielo raso (3 manos)(incluye andamios y accesorios propios para la instalación)	5 días	sáb 20/04/24	mié 24/04/24
68		Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 (3 manos sobre estuco)	5 días	jue 25/04/24	lun 29/04/24
69		Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	5 días	mar 30/04/24	sáb 4/05/24
70		Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	5 días	mar 30/04/24	sáb 4/05/24
71		Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00 mts (3 manos) (incluye andamios y accesorios propios para la instalación)	5 días	sáb 8/06/24	mié 12/06/24
72		Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeo blanco o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte)	5 días	sáb 6/04/24	mié 10/04/24
73		Suministro e instalación vigacinta de remate en concreto 3000 PSI reforzada secc<300 cm2	6 días	sáb 25/05/24	jue 30/05/24
74		Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos	2 días	jue 28/03/24	vie 29/03/24
75		Limpieza tuberia existente (sondeo)	2 días	jue 28/03/24	vie 29/03/24
76		Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye griferia)	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24
77		Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar	2 días	jue 11/04/24	vie 12/04/24
78		Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar, incluye griferia y accesorios	2 días	sáb 13/04/24	dom 14/04/24
79		PAÑETE LISO SOBRE MUROS	7 días	lun 4/03/24	dom 10/03/24
80		PINTURA EPÓXICA (2 MANOS)	3 días	dom 5/05/24	mar 7/05/24
81		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA CIRCULAR D=45CM	4 días	mar 4/06/24	vie 7/06/24
82		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA CONCERTINA EN ANGULO DE 1-1/2"x1/8" PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE	4 días	vie 31/05/24	lun 3/06/24
83		DESHIERBE MANUAL DE TERRENO	7 días	lun 1/04/24	dom 7/04/24
84		ASEO GENERAL DE OBRA	2 días	jue 13/06/24	vie 14/06/24
85		ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	7 días	lun 26/02/24	dom 3/03/24
86		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	2 días	mié 17/04/24	jue 18/04/24
87		SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANO DE MÁRMOL FORMATO 33X33 PULIDO Y BRILLADO	7 días	sáb 30/03/24	vie 5/04/24
88		PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2"	2 días	jue 28/03/24	vie 29/03/24
89		SALIDA SANITARIA 2"	2 días	jue 28/03/24	vie 29/03/24
90		SALIDA SANITARIA 4"	2 días	jue 28/03/24	vie 29/03/24
91		LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS	20 días	mié 7/02/24	lun 26/02/24
92		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED REDONDO 24W	1 día	sáb 1/06/24	sáb 1/06/24

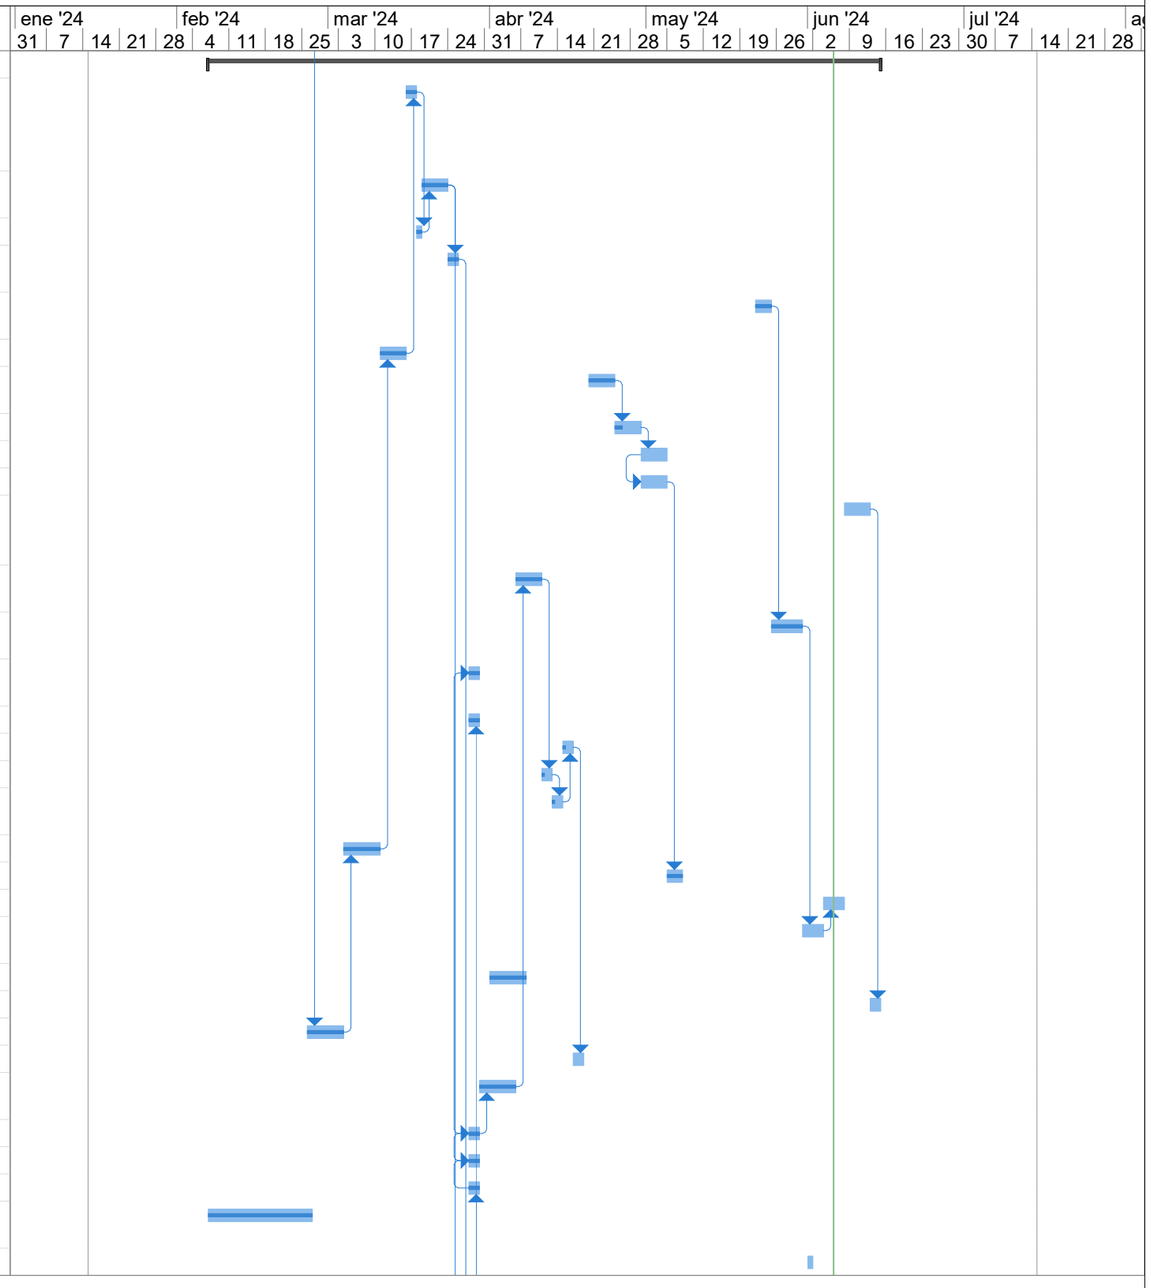


Proyecto: msproj11
Fecha: jue 6/06/24

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	

PROGRAMACIÓN DE OBRA - CONTRATO FDLSF-COP-304-2023(SIPSE 92620)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
93		DEMOLICIÓN DE SOBREPISO H=4CM	2 días	mar 26/03/24	mié 27/03/24
94		DEMOLICIÓN DE PAÑETE	2 días	dom 24/03/24	lun 25/03/24
95		**EL VERJÓN BAJO**	**129 días**	**mié 7/02/24**	**vie 14/06/24**
96		Desmonte y desconexión de aparatos sanitarios y equipos como lavaplatos, lavamanos, sanitarios, estufas, Etc., incluye respectivos tapones tanto sanitario como potable, Disposición, Cargue Y Retiro De Escombros	2 días	sáb 23/03/24	dom 24/03/24
97		Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes	5 días	lun 25/03/24	vie 29/03/24
98		Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes Etc., (Incluye cargue, andamios	2 días	mié 1/05/24	jue 2/05/24
99		Desmonte y retiro de tuberías hidrosanitarias existentes De 4", 3", 2". (Incluye Excavación, Retiro Del Relleno, Cargue Y Retiro De Escombros)	5 días	dom 7/04/24	jue 11/04/24
100		Desmonte de accesorios de baño (Dispensador papel, jabón, papelera)	2 días	sáb 23/03/24	dom 24/03/24
101		Desmonte de vidrio y/o espejo (Incluye trasiego y retiro)	2 días	sáb 23/03/24	dom 24/03/24
102		Desmonte lámina policarbonato (Incluye cargue y retiro)	1 día	mié 1/05/24	mié 1/05/24
103		Demolición de acabados de piso, incluye retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes	5 días	sáb 30/03/24	mié 3/04/24
104		Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios)	5 días	mar 23/04/24	sáb 27/04/24
105		Suministro e instalación pintura vinilo tipo 1 cielo raso (3 manos)(incluye andamios y accesorios propios para la instalación)	7 días	vie 3/05/24	jue 9/05/24
106		Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	7 días	vie 10/05/24	jue 16/05/24
107		Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	7 días	vie 10/05/24	jue 16/05/24
108		Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00 mts (3 manos) (incluye andamios y accesorios propios para la instalación)	7 días	lun 27/05/24	dom 2/06/24
109		Suministro e instalación enchape sobre pared (30x60cm) referencia egeo blanco o similar (Incluye pegacor, boquilla, materiales y transporte)	5 días	mar 30/04/24	sáb 4/05/24
110		Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintetica)	5 días	lun 25/03/24	vie 29/03/24
111		Suministro E Instalación De Teja transparente No 10, (Incluido Accesorios De Instalación, Andamio, Herramientas Y Equipos)	2 días	mar 11/06/24	mié 12/06/24
112		Suministro e instalación cubierta en teja policarbonato ajover o similar	2 días	mar 11/06/24	mié 12/06/24
113		Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" incluye accesorios	3 días	mié 17/04/24	vie 19/04/24
114		Suministro e instalación punto agua fría PVC 1/2" para lavamanos o lavaplatos	3 días	mié 17/04/24	vie 19/04/24
115		Lavado+ desinfección de tanque 1000 LT	1 día	mié 1/05/24	mié 1/05/24
116		Limpieza tuberia existente (sondeo)	1 día	sáb 6/04/24	sáb 6/04/24
117		Suministro e instalación lavamanos blanco de colgar (incluye griferia)	2 días	dom 12/05/24	lun 13/05/24
118		Suministro e instalación sanitario blanco, referencia avanti corona o similar	2 días	mié 8/05/24	jue 9/05/24
119		Suministro e instalación de orinal blanco, referencia santafe corona o similar, incluye griferia y accesorios	2 días	vie 10/05/24	sáb 11/05/24
120		PAÑETE LISO SOBRE MUROS	3 días	sáb 20/04/24	lun 22/04/24
121		ESMALTE SOBRE MUROS (2 MANOS)	7 días	vie 17/05/24	jue 23/05/24
122		PINTURA EPÓXICA (2 MANOS)	3 días	vie 24/05/24	dom 26/05/24
123		DESHIERBE MANUAL DE TERRENO	3 días	lun 27/05/24	mié 29/05/24
124		ASEO GENERAL DE OBRA	3 días	mié 12/06/24	vie 14/06/24
125		ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	5 días	lun 18/03/24	vie 22/03/24

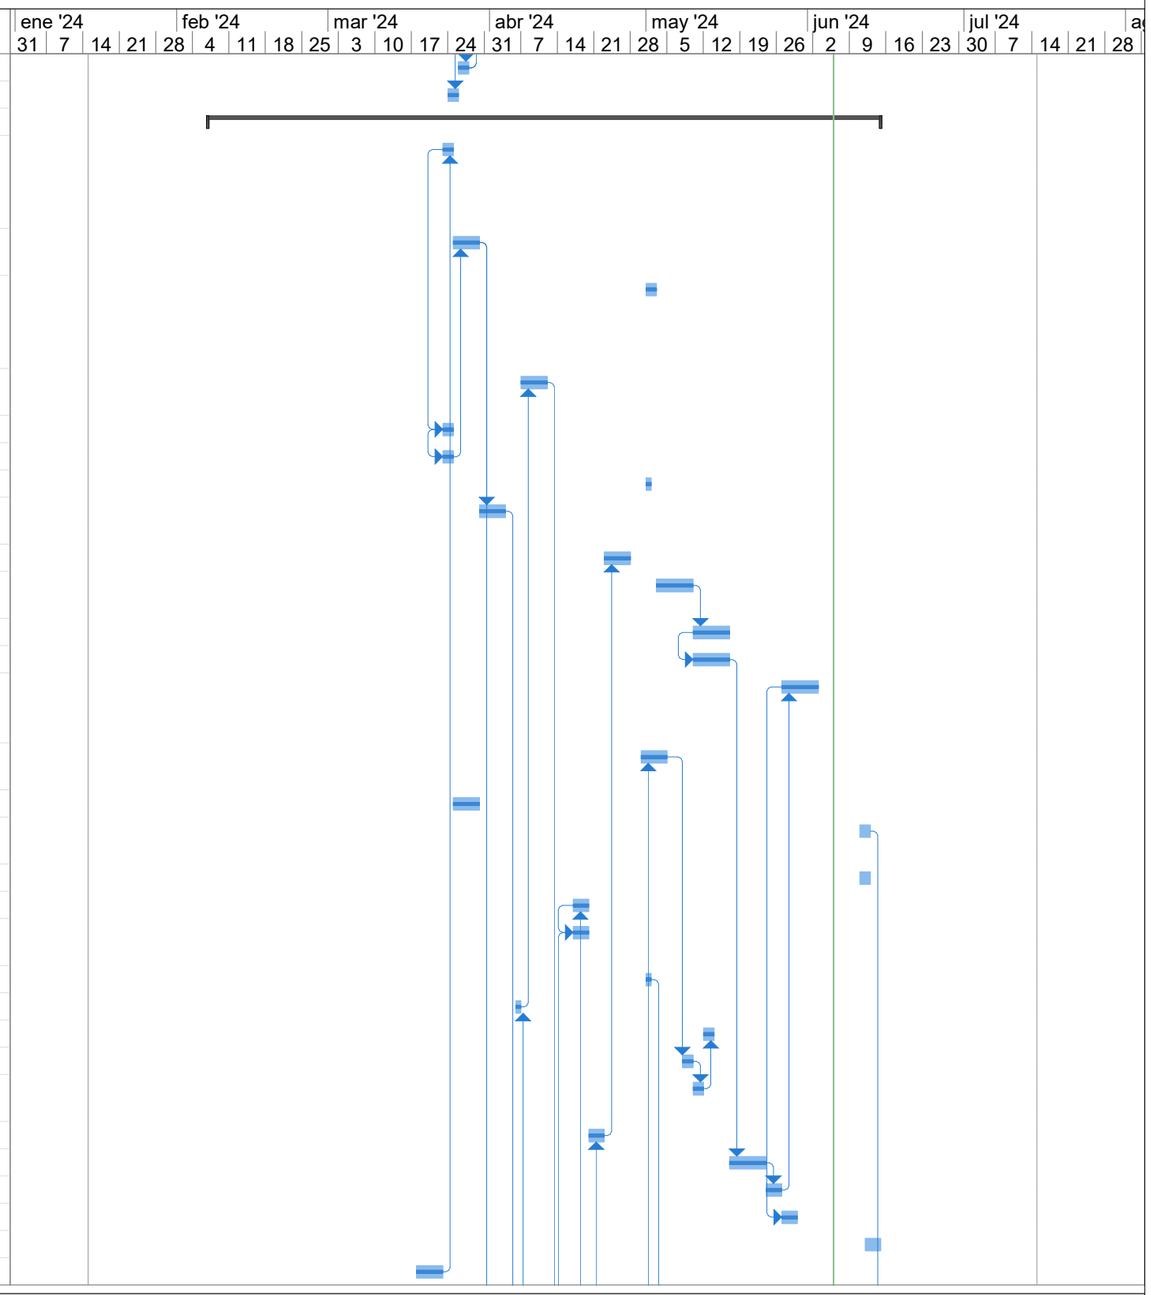


Proyecto: msproj11
Fecha: jue 6/06/24

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	

PROGRAMACIÓN DE OBRA - CONTRATO FDLSF-COP-304-2023(SIPSE 92620)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
126		SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANO DE MÁRMOL FORMATO 33X33 DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO	6 días	mié 24/04/24	lun 29/04/24
127		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 4MM	3 días	mar 11/06/24	jue 13/06/24
128		REGATA EN PISO O MURO	5 días	vie 12/04/24	mar 16/04/24
129		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR PARA TANQUE	1 día	jue 2/05/24	jue 2/05/24
130		PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2"	3 días	mié 17/04/24	vie 19/04/24
131		SALIDA SANITARIA 2"	3 días	mié 17/04/24	vie 19/04/24
132		SALIDA SANITARIA 4"	3 días	mié 17/04/24	vie 19/04/24
133		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO EN YEE DE COBRE 2"	1 día	vie 3/05/24	vie 3/05/24
134		LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS	20 días	mié 7/02/24	lun 26/02/24
135		DEMOLICIÓN DE SOBREPISO H=4CM	2 días	jue 4/04/24	vie 5/04/24
136		DEMOLICIÓN DE PAÑETE	2 días	sáb 30/03/24	dom 31/03/24
137		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 D=25CM	1 día	jue 13/06/24	jue 13/06/24
138		PLACA EN CONCRETO 3000 PSI H=10CM CON MALLA ELECTROSOLDADA	4 días	sáb 20/04/24	mar 23/04/24
139		**TURBAY AYALA**	**159 días**	**mié 7/02/24**	**dom 14/07/24**
140		Desmonte de todo tipo de cubierta existente, incluye el desmonte de la estructura metálica o de madera, los amarres, cerchas, correas y/o perfilería metálica, instalaciones eléctricas o tuberías adosadas, canales y bajantes Etc., (Incluye cargue, andamios	35 días	vie 10/05/24	jue 13/06/24
141		Desmonte reja metálica h=3.0 m (Incluye trasiego y retiro)	2 días	vie 10/05/24	sáb 11/05/24
142		Demolición de muros, incluye retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes	3 días	vie 14/06/24	dom 16/06/24
143		Desmonte de salidas eléctricas existentes (Incluye desmonte de tuberías, cableado, aparatos y luminarias)	5 días	vie 14/06/24	mar 18/06/24
144		Suministro e instalación muro en bloque #5 11.5cm santefe +Andamio H>2.5M	7 días	vie 14/06/24	jue 20/06/24
145		Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios)	5 días	mié 26/06/24	dom 30/06/24
146		Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	7 días	vie 14/06/24	jue 20/06/24
147		Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	2 días	vie 21/06/24	sáb 22/06/24
148		Suministro e instalación teja arquitectónica trapezoidal acesco o similar cal.26 prepintada	5 días	lun 1/07/24	vie 5/07/24
149		Suministro e instalación bajante aguas lluvias Ø 4" PVC	1 día	vie 12/07/24	vie 12/07/24
150		Suministro e instalación salidas para iluminación desde el tablero de distribución, 120V Incluye caja 5800, adaptadores, ducto EMT de 1" y/o 3/4", cableado en HFFR #12 AWG+tierra e interruptor COLOR BLANCO asociado a la salida. (No incluye luminaria)	5 días	vie 21/06/24	mar 25/06/24
151		Suministro e instalación salida para interruptor sencillo, en tubería EMT (Incluye interruptor)	3 días	vie 21/06/24	dom 23/06/24
152		Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-6K (100-277v) sobreponer	3 días	mié 26/06/24	vie 28/06/24
153		PAÑETE LISO SOBRE MUROS	5 días	vie 21/06/24	mar 25/06/24
154		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 D=50 CM	2 días	mié 10/07/24	jue 11/07/24
155		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 D=100 CM	2 días	mié 10/07/24	jue 11/07/24
156		ASEO GENERAL DE OBRA	2 días	sáb 13/07/24	dom 14/07/24

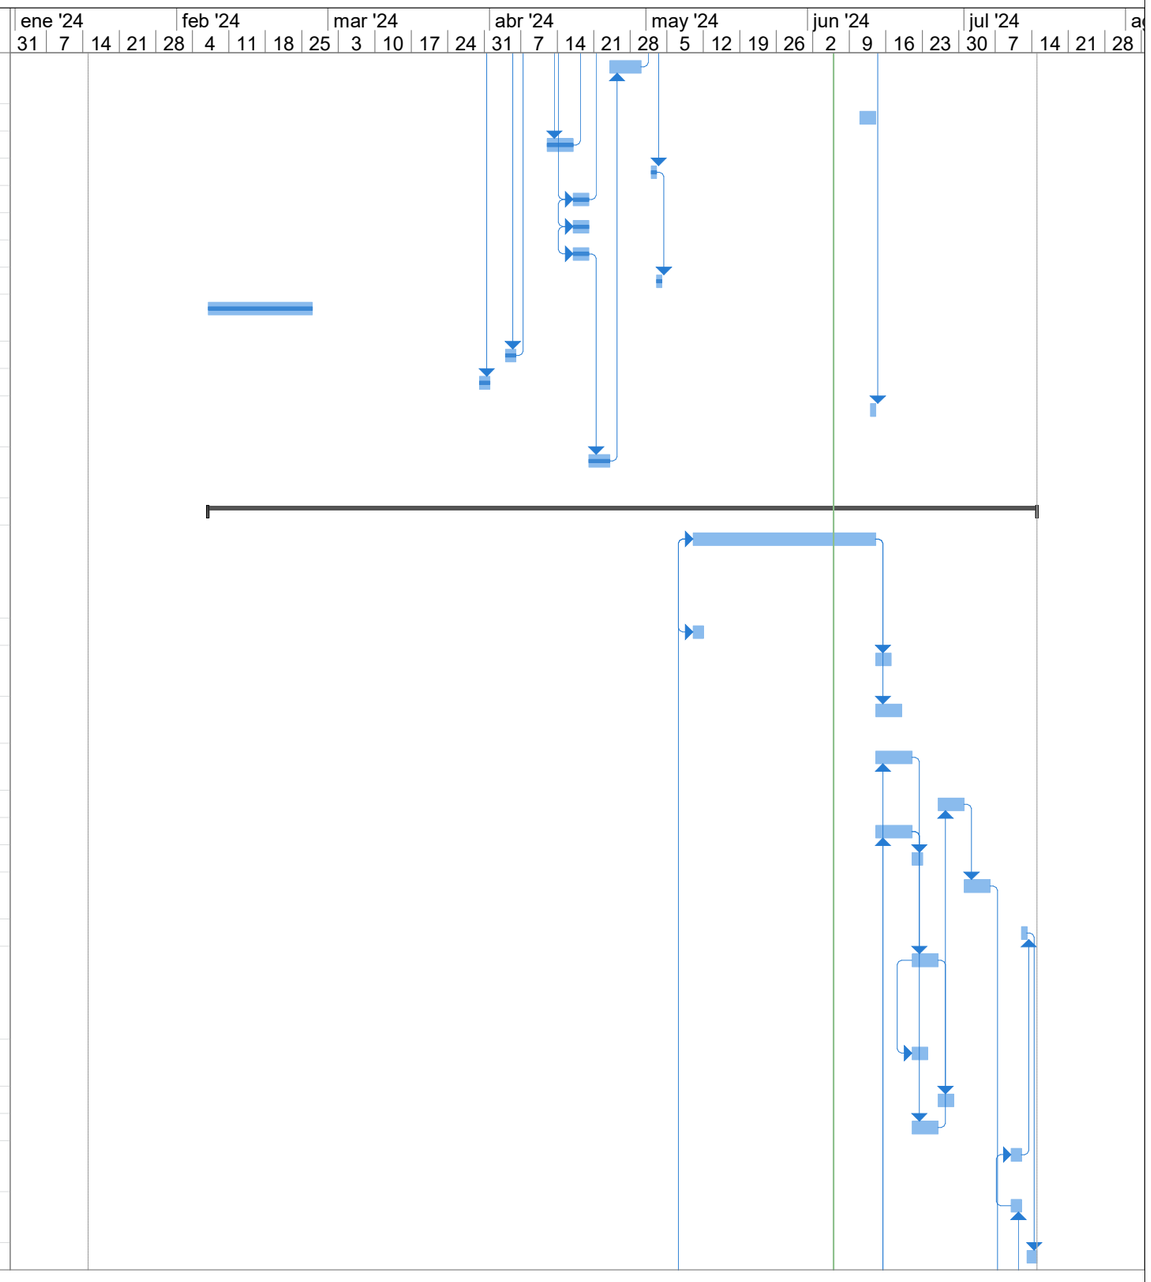


Proyecto: msproj11
Fecha: jue 6/06/24

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Progreso manual
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin	

PROGRAMACIÓN DE OBRA - CONTRATO FDLSF-COP-304-2023(SIPSE 92620)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
157		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 D=25CM	4 días	sáb 6/07/24	mar 9/07/24
158		LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS	20 días	mié 7/02/24	lun 26/02/24
159		DISEÑO ESTRUCTURAL DE CUBIERTAS (INCLUYE MEMORIAS DE CÁLCULO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PROFESIONAL EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA)	30 días	mar 27/02/24	mié 27/03/24
160		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA (INCLUYE: FABRICACIÓN, MONTAJE DE CERCHAS, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, TORNILLERÍA SEGÚN DISEÑO)	35 días	vie 10/05/24	jue 13/06/24
161		DADO EN CONCRETO 3000 30X30X100CM	3 días	vie 10/05/24	dom 12/05/24
162		**EL MIRADOR**	**131 días**	**lun 5/02/24**	**vie 14/06/24**
163		Demolición de enchape de muros y pega, incluye cargue y retiro de escombros de acuerdo a las disposiciones técnicas vigentes	2 días	sáb 25/05/24	dom 26/05/24
164		Suministro e instalación muro e=0.12 ladrillo prensado SantaFe 2CV (ml)<0.70Alt	3 días	lun 27/05/24	mié 29/05/24
165		Suministro e instalación estuco sobre pañete (Incluye andamios)	5 días	sáb 25/05/24	mié 29/05/24
166		Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica lineal	5 días	mar 4/06/24	sáb 8/06/24
167		Suministro e instalación pintura en esmalte sobre lamina metálica llena	5 días	mar 4/06/24	sáb 8/06/24
168		Suministro e instalación pintura para fachada tipo Koraza sobre pañete H= 7.00 mts (3 manos) (incluye andamios y accesorios propios para la instalación)	3 días	dom 9/06/24	mar 11/06/24
169		Suministro e instalación win de aluminio crudo	4 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
170		Suministro e impermeabilización cubiertas (membrana sintetica)	5 días	jue 6/06/24	lun 10/06/24
171		Suministro e instalación giferia lavamanos tipo push de mesa	3 días	mié 12/06/24	vie 14/06/24
172		Suministro e instalación panel led (60x60) 45W-6K (100-277v) sobreponer	2 días	mar 11/06/24	mié 12/06/24
173		PAÑETE LISO SOBRE MUROS	4 días	jue 30/05/24	dom 2/06/24
174		ESMALTE SOBRE MUROS (2 MANOS)	5 días	jue 30/05/24	lun 3/06/24
175		PINTURA EPÓXICA (2 MANOS)	2 días	mar 4/06/24	mié 5/06/24
176		LIMPIEZA DE CANAL (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS)	3 días	sáb 1/06/24	lun 3/06/24
177		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA CIRCULAR D=45CM	3 días	mié 12/06/24	vie 14/06/24
178		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 D=50 CM	3 días	mié 12/06/24	vie 14/06/24
179		ASEO GENERAL DE OBRA	3 días	mié 12/06/24	vie 14/06/24
180		ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	4 días	mar 21/05/24	vie 24/05/24
181		ENCHAPE CERÁMICO PARED	4 días	lun 3/06/24	jue 6/06/24
182		MURO EN SUPERBOARD DE 6MM - 1 CARA	5 días	vie 7/06/24	mar 11/06/24
183		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA TIPO PUSH PARA ORINAL	3 días	mié 12/06/24	vie 14/06/24
184		LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS	20 días	lun 5/02/24	sáb 24/02/24
185		FIN CTO FDLSF-COP-304-2023	0 días	dom 14/07/24	dom 14/07/24

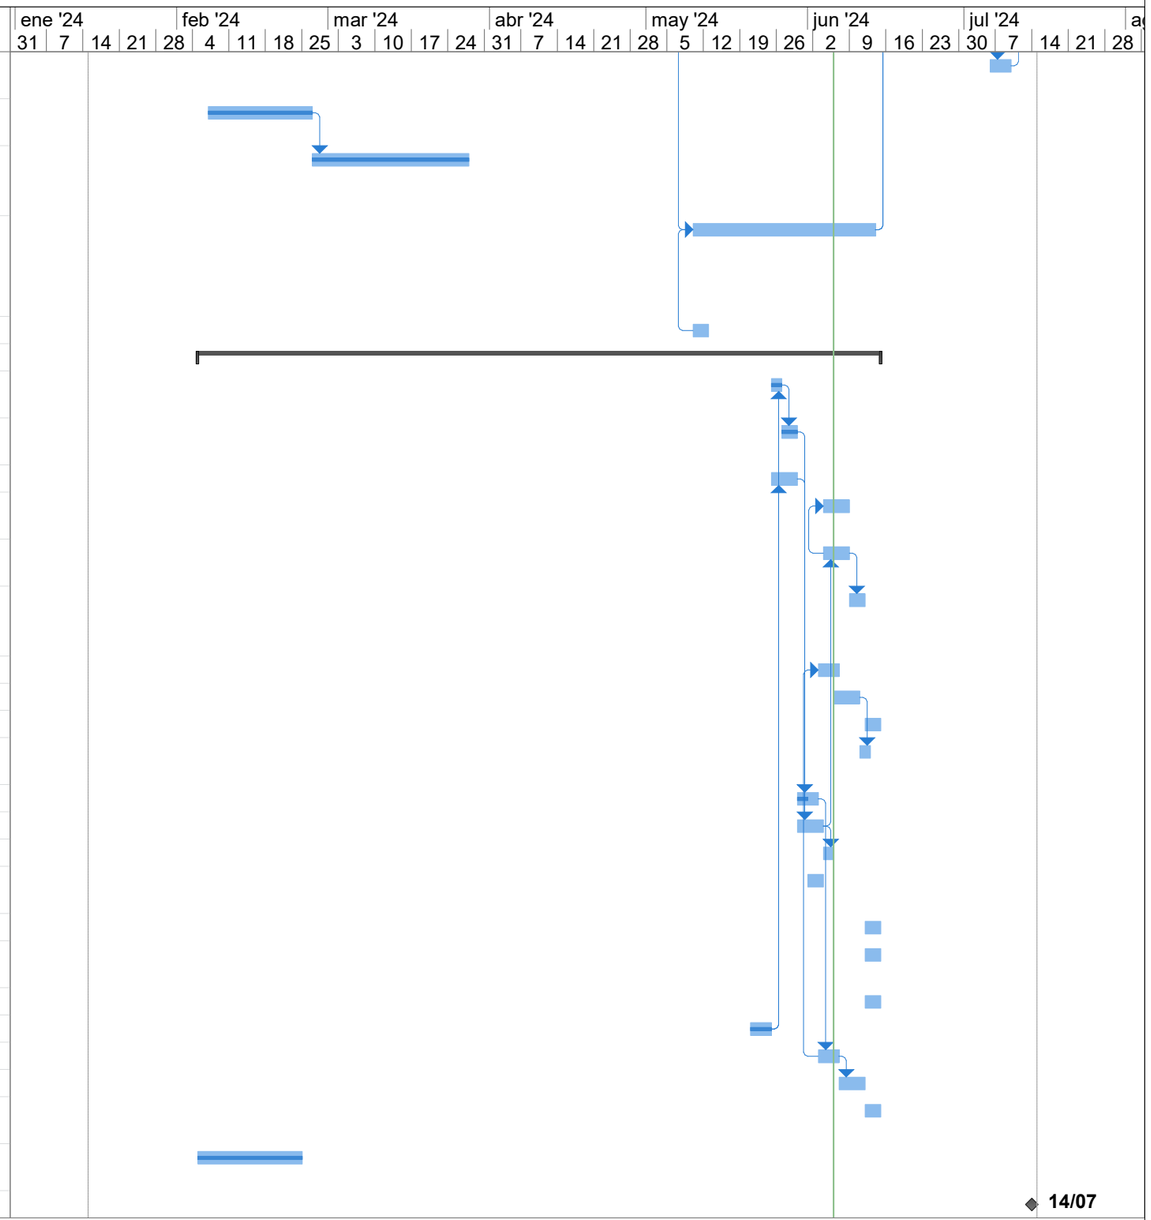

Proyecto: msproj11
Fecha: jue 6/06/24

Tarea	Resumen del proyecto	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Fecha límite	
División	Tareas externas	Resumen inactivo	Resumen manual	Progreso	
Hito	Hito externo	Tarea manual	Sólo el comienzo	Progreso manual	
Resumen	Tarea inactiva	Sólo duración	Sólo fin		
