F. Informes semanales

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

CB INGENIEROS S.A.	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
		Fecha	2/12/2022

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

FECHA: 8/04/2024

Semana No.	**23**	**Del :**	lunes, 1 de abril de 2024	AL:	domingo, 7 de abril de 2024
Plazo Total		240	días		
Plazo Transcurrido		161			
Nombre del Supervisor :	Ing. Ferney Jiménez Neira				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	3,00%	66,00%	**(%) Ejecutado**	3,00%	49,00%
Valor programado ($)	$ 214.288.548,01	$ 4.633.098.340,18	**Valor ejecutado ($)**	$ 120.910.515,62	$ 2.539.747.313,36
			Evaluación	-17,00%	Atraso en la ejecución

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CLARIDAD	**Contratista:**	CB INGENIEROS S.A.S
Contrato No:	CO1.PCCNTR.5305904	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.5313332
Valor del contrato:	$ 7.608.734.174	**Valor del contrato:**	$ 504.428.924,00
Plazo:	8 meses	**Plazo:**	9 meses
Fecha de iniciación:	30 de octubre de 2023	**Fecha de iniciación:**	19 de octubre de 2023
Fecha de terminación:	29 de junio de 2024	**Fecha de terminación:**	18 de julio de 2024
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Plazo final:	N/A	**Plazo final:**	N/A
Fecha de vencimiento final:	N/A	**Fecha de vencimiento final:**	N/A
Fecha de suspensión Nº 2:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 2:**	N/A
Suspensión N. 3	N/A	**Suspensión N. 3**	N/A
Fecha reinicio N. 2	N/A	**Fecha reinicio N. 2**	N/A
Prórroga Nº 2:	N/A	**Prórroga Nº 2:**	N/A
Plazo final:	N/A	**Plazo final:**	N/A
Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A	**Nueva Fecha de vencimiento final:**	N/A
Valor total contrato	$ 7.608.734.174	**Valor actualizado contrato**	$ 504.428.924

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	Usminia sede B	535	Usme	$ 349.948.209,00	100,00%	100,00%	Instalación de lavamanos y barras en baños de PMR. Subsanación de observaciones.	Culminación de subsanación de observaciones
2	Fernando Gonzaléz Ochoa	580	Usme	$ 353.157.411,00	100,00%	92,00%	Durante la semana no se realizaron actividades.	Culminación de cambio de bombas, desmonte e instalación de piso en danzas
3	Diego Cuellar sede B	541	Usme	$ 542.722.842,00	100,00%	92,00%	Instalaciones eléctricas: instalación de acometida para baños, instalación de cajas de paso, instalación de paneles, cableado Pintura de muros internos en boque de aulas (4). Excavación manual en bloque aulas (4). Instalación de malla electrosoldada para placas de contrapiso en bloque aulas (4). Fundida de placa de contrapiso en bloque aulas (4). Fundida de andén entre cancha y bloque aulas (4)	Instalaciones eléctricas, detalles de pintura, entre otros
4	Chuniza	512	Usme	$ 236.826.369,00	100,00%	100,00%	Pintura de media y mini cancha.	Instalación de rejillas en cárcamos, observaciones del acta parcial.
5	DILE Sumapaz	2010	Sumapaz	$ 15.242.011,00	100,00%	11,00%	Instalación de estructura metálica para rampa de acceso.	Cerramiento, mantenimiento de pozo, instalación de piso podotacktil.
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	2006	Sumapaz	$ 750.000.000,00	100,00%	52,00%	Instalación de teja en bloque laboratorio.	Instalación de teja, instalaciones eléctricas, entre otros.
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	2022	Sumapaz	$ 811.831.873,00	100,00%	55,00%	Pañete en muros de bloque garita y bloque emisora, Instalación de malla electrosoldada en anden entre edificio almacén y bloque emisora. Fundida de anden entre edificio almacén y bloque emisora. Cuchillas en mampostería en bloque vivienda docente. Suministro de teja.	Aguas lluvias, intervención en vivienda docente, instalaciones eléctricas, entre otras.
8	Vivienda docente - Campamento	570	Usme	$ 411.446.316,00	100,00%	7,00%	Durante la semana no realizaron actividades	Suministro e instalación de estructura metálica, instalaciones eléctricas hidrosanitarias, entre otras
9	Diego Cuellar sede A	576	Usme	$ 253.419.631,00	100,00%	100,00%	Durante la semana realizaron actividades de las observaciones del acta de entrega física	Detalles de la entrega física de la obra
10	San José de Usme - Don Bosco 2	567	Usme	$ 635.000.000,00	31,00%	0,00%	No han iniciado actividades	Cerramiento, demolición, desmonte, entre otras.
11	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	2003	Sumapaz	$ 210.861.638,00	30,00%	0,00%	No han iniciado actividades	Cerramiento, demolición, desmonte, entre otras.

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

FECHA: 8/04/2024

Semana No. 23 **Del :** lunes, 1 de abril de 2024 **AL:** domingo, 7 de abril de 2024

Plazo Total 240 días

12	Rural Las Mercedes	534	Usme	$ 447.180.697,00	30,00%	0,00%	No han iniciado actividades	Cerramiento, demolición, desmonte, entre otras.
13	Emergencias	E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A:la emergencia fue atendida a cabalidad.	
		E			100,00%	98,00%	San Juan: durante la semana no se realizaron actividades.	Emboquillada de los dos sanitarios que se instalaron, pintura de las chapas que se instalaron, pegada de vidrio en baño de profesores, pegada de vidrio baño de niños, instalación de manto y colocar las dos tapas de los inodoros
		E			100,00%	100,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.	
		E			100,00%	100,00%	Nazareth: durante la semana no se realizaron actividades.	
20		E			100,00%	95,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.	Revisión de la rejilla del sifon y punto eléctrico de la nevera.
21		E			100,00%	95,00%	Auras: instalación de carcamos	Instalación de pisos.
22		E			100,00%	100,00%	Betania: durante la semana no se realizaron actividades.	
24								

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

Revisión documentos de ingreso del personal (Seguridad social vigente, consulta de antecedentes, examenes medicos de ingreso).
Remisión de base de datos a la SED de aprobación de personal para ingreso a los colegios.
Verificación e inspección cumplimiento de normas SST, referente a inducciones, notificación de riesgos, charlas, pausas activas, entrega de Epps, firma de permisos de trabajo.
Inspección señalización implementada en frentes de trabajo e instalación de cerramiento de obra.
Inspección punto de hidratación para el personal, en cada uno de los colegios.
Verificación entrega de dotación al personal.
Revisión informes de gestión SST semanal y mensual.
Inspección de actos y condiciones inseguras y medidas de seguridad implementadas.
A la fecha no se ha podido dar aprobación al informe mensual del mes de enero de 2024, del contratista, debido que carece de anexos que soporten la gestión realizada.
A la fecha el contratista ha hecho entrega parcial de planillas de seguridad social del personal minimo requerido.

Incidentes y/o accidentes:
El dia 21 de marzo de 2024, se reporto un (1) accidente de trabajo Leve, a la inspectora SST de la sede LA UNIÓN, debido a un golpe en la cara que recibio por una pieza de andamio que se encontraba recostada en la pared y resbalo al momento que paso por el lugar, este accidente genero (5) cinco dias de incapacidad, a la decha la investigación del accidente de trabajo se esta realizando por parte del contratista.

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Seguimiento y control de la programación de obra.
Remisión de solicitudes al constructor.
Acta de comité de obra.

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	30 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023	$ 69.413.115,00
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	$ 482.429.484,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	$ 1.022.204.883,00
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	$ 867.459.592,00
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$**	**2.441.507.074,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 7.608.734.174,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 2.441.507.074,00
% Avance facturado Acumulado
32%
Saldo por Facturar
$ 5.167.227.100,00

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	10 de octubre d e2023 a 29 de noviembre de 2023	$ 4.539.860,00
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	$ 32.031.237,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	$ 67.795.247,00
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	$ 57.504.897,00
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$**	**161.871.241,00**


AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 504.428.924,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 161.871.241,00
% Avance facturado Acumulado
32%
Saldo por Facturar
$ 342.557.683,00

CB INGENIEROS S.A.	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	VERSIÓN	1
		Fecha	2/12/2022

UNIDAD EJECUTORA:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** **Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE**			**FECHA:**	8/04/2024
Semana No.	**23**	**Del :**	lunes, 1 de abril de 2024	AL:	domingo, 7 de abril de 2024
Plazo Total		240	días		

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. La relación de la programación presentada en el capitulo "EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES", corresponden al avance de las actividades teniendo en cuenta los recursos necesarios para su ejecución.



FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Ándres Felipe Mackenzie Fuentes

BALANCE FINANCIERO					
SEMANA No.	23	DEL	1-abr-24	AL	7-abr-24

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	$ 349.948.209,00	$ 362.904.046,35	$ 12.955.837,35
2	Fernando Gonzaléz Ochoa		Usme	$ 353.157.411,00	$ 351.430.683,39	-$ 1.726.727,61
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	$ 542.722.842,00	$ 712.176.519,23	$ 169.453.677,23
4	Chuniza		Usme	$ 236.826.369,00	$ 330.206.750,54	$ 93.380.381,54
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	$ 15.242.011,00	$ 15.242.011,00	$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	$ 750.000.000,00	$ 628.487.851,57	-$ 121.512.148,43
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	$ 811.831.873,00	$ 840.105.168,56	$ 28.273.295,56
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	$ 411.446.316,00	$ 411.446.316,00	$ 0,00
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 253.419.631,00	$ 140.173.912,66	-$ 113.245.718,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	$ 799.914.269,00	$ 799.914.269,00	$ 0,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	$ 344.210.600,00	$ 344.210.600,00	$ 0,00
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	$ 337.709.778,00	$ 337.709.778,00	$ 0,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	$ 635.000.000,00	$ 635.000.000,00	$ 0,00
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	$ 210.861.638,00	$ 210.861.638,00	$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	$ 447.180.697,00	$ 447.180.697,00	$ 0,00
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	$ 599.909.029,00	$ 599.909.029,00	$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 7.099.380.673,00**	**$ 7.166.959.270,29**	**$ 67.578.597,29**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 5.198.994,76	$ 4.708.361,95	-$ 490.632,81
2	San Juan		Sumapaz	$ 5.379.289,20	$ 4.568.398,72	-$ 810.890,48
3	IED JAIME GARZON SEDE TABACO		Sumapaz	$ 7.539.117,09	$ 7.539.117,09	$ 0,00
4	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	$ 4.431.089,03	$ 4.431.089,03	$ 0,00
5	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	$ 1.423.309,88	$ 1.423.309,88	$ 0,00
6	Por definir			$ 485.121.979,04	$ 499.817.018,33	$ 14.695.039,29
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				**$ 509.093.779,00**	**$ 522.487.295,00**	**$ 13.393.516,00**

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO	$ 7.608.734.174	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 7.689.446.565
		DIFERENCIA	-$ 80.712.391

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado el balance del presupuesto de los colegios Chuniza, La Unión, Auras, Diego A, Diego B, Fernando González Ochoa y Usminia, en aras de equilibrar el contrato de obra, sin embargo, este no es definitivo, por lo cual, en los próximos informes continuaremos presentando el balance de estos y demás colegios.


En cuanto a las emergencias, los balances fueron ajustados conforme a la necesidad de cada frente.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN
GRUPO 5

SEMANA No.	23	DEL	01-abr-24	AL	7-abr-24

PROGRAMACIÓN DE OBRA

	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
				PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	**$ 7.099.380.673**	**240,00**	**65,26%**	**35,77%**	**-29,49%**	**85,86**	**156,63**	**-70,77**
1	Usminia sede B	$ 349.948.209	92,00	100,00%	93,05%	-6,95%	85,60	92,00	-6,40
2	Fernando Gonzaléz Ochoa	$ 353.157.411	92,00	100,00%	81,60%	-18,40%	75,08	92,00	-16,92
3	Diego Cuellar sede B	$ 542.722.842	60,00	100,00%	124,97%	24,97%	74,98	60,00	14,98
4	Chuniza	$ 236.826.369	92,00	100,00%	138,63%	38,63%	127,54	92,00	35,54
5	DILE Sumapaz	$ 15.242.011	50,00	100,00%	0,00%	-100,00%	0,00	50,00	-50,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	$ 750.000.000	92,00	100,00%	50,21%	-49,79%	46,19	92,00	-45,81
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	$ 811.831.873	90,00	100,00%	47,42%	-52,57%	42,68	90,00	-47,32
8	Vivienda docente - Campamento	$ 411.446.316	90,00	100,00%	5,41%	-94,59%	4,87	90,00	-85,13
9	Diego Cuellar sede A	$ 253.419.631	60,00	100,00%	53,49%	-46,51%	32,09	60,00	-27,91
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	$ 799.914.269	90,00	54,77%	0,00%	-54,77%	0,00	49,29	-49,29
11	Diego Cuellar sede C	$ 344.210.600	90,00	10,79%	0,00%	-10,79%	0,00	9,71	-9,71
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	$ 337.709.778	92,00	11,85%	0,00%	-11,85%	0,00	10,91	-10,91
13	San José de Usme - Don Bosco 2	$ 635.000.000	90,00	39,42%	0,00%	-39,42%	0,00	35,48	-35,48
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	$ 210.861.638	89,00	12,47%	0,00%	-12,47%	0,00	11,10	-11,10
15	Rural Las Mercedes	$ 447.180.697	89,00	3,38%	0,00%	-3,38%	0,00	3,01	-3,01
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	$ 599.909.029	86,00	10,76%	0,00%	-10,76%	0,00	9,25	-9,25
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
	VALOR PRESUPUESTADO	**$ 7.099.380.673**							

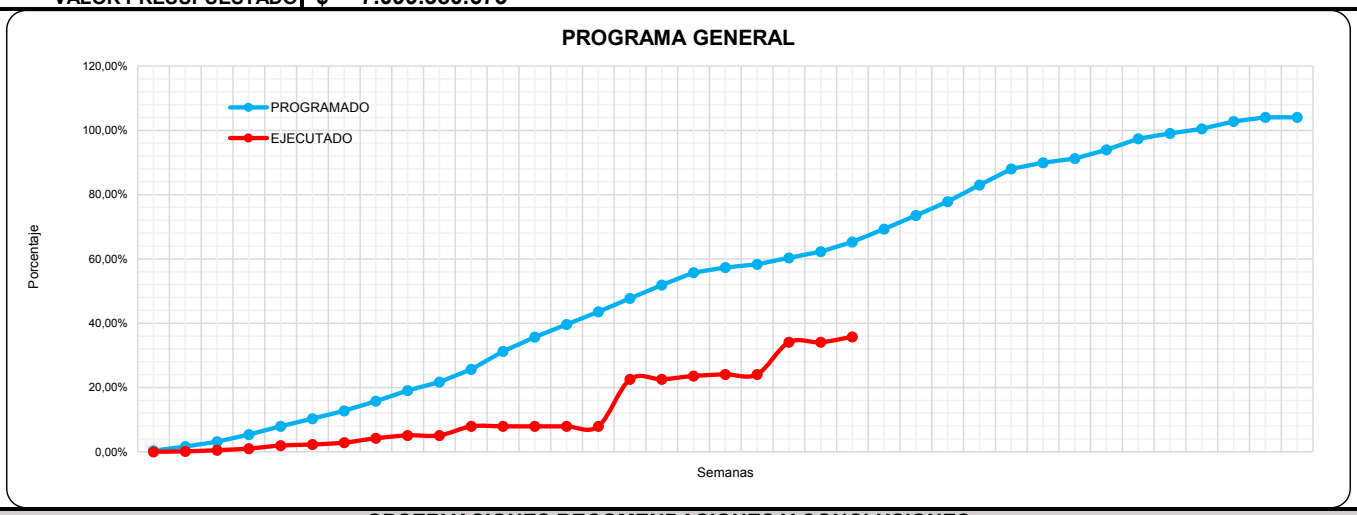

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Los porcentajes presentados en el informe gráfico están relacionados con el flujjo de caja de cada colegio.

Los porcentajes de ejecutado acumulado son acordes con la descripción de los ítems del presupuesto, es decir, abarcan integradamente el suministro y la instalación y solo así son contemplados para la relación en los flujos de caja.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

PERSONAL CONTRATO OBRA
FIRMA CONSORCIO CLARIDAD

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA

LISTADO PERSONAL CONTRATO OBRA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE IDENTIFICACIOI	TELEFONO	CARGO	EPS	ARL	caja de compensacion	FPC	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA	80222352	3112783471	DIRECTOR DE OBRA	SANIDAD PN	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
2	GUILLERMO ALBERTO VELANDIA CORDOBA	19418347	3134047300	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	N/A
3	DAVID ESTEBAN NULEZ CANO	1013644565	3053961793	RESIDENTE DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	8/01/2024
4	JULIO OSWALDO TORRES SUAREZ	79458867	3002066044	ASESOR ESTRUCTURAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
5	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	AESOR AMBIENTAL	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
6	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	ASESOR SST	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
7	JORGE ERNESTO CASTIBLANCO MARTINEZ	10073655	3134227162	ASESOR EN REDES ELECTRICAS	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
8	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	26593081	3125212497	ASESOR REDES HIDROSANITARIAS	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
9	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	79450429	3134412819	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
10	JULY PAOLA OVALLE DIAZ	1026594061	3203720883	TECNICO SST	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	28/12/2023
11	NUBIA SANTAMARIA SANTAMARIA	53037373	3203655707	TECNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	4/11/2023
12	ROBERTO ROSAS CONDIA	79499052	3115698784	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
13	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	1033749854	3106139631	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	N/A
14	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63394516	3222953159	MAESTRO DE OBRA	ALIANSALUD	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
15	ORLANDO ROSAS CONDIA	19442965	3115181794	MAESTRO DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	N/A	PORVENIR	30/10/2023	N/A
16	LAURA YERALDINE RAMIREZ OCAMPO	1006118750	3124514525	INSPECTORA SST	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/12/2023	N/A
17	JOHANA KATERINE MARTINEZ VARELA	1069739376	31254566995	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	10/01/2024	N/A
18	LEONARDO TORRES LARA	88279853	3112783471	RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	20/02/2024	N/A
	1. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO USMINIA SEDE B Y DIEGO MONTAÑA SEDE A									
18	YITZA DANIELA CABALLERO CASTILLO	1.014.262.805	3144064083	INGENIERA DE APOYO	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	8/01/2024
19	LUIS FELIPE RONCANCIO	19.293.563	3126505053	MAESTRO	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
20	JHON DEIBY ROA	1.006.321.288	3026681420	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	11/11/2023
21	JOSE DOMINGO SEPULVEDA MARQUEZ	19.478.962	3132806995	OFICIAL	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
22	LUIS ENRIQUE GALAN RAMIREZ	79.243.511	3106159832	G. OPERACIONES	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	28/02/2024
23	RODOLFO CORTES RICO	79.495.028	3138709928	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	N/A
24	LUZ ELENA ROMERO LEE	39564668	3003965967	APOYO SST	FOMAG	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	31/10/2023	31/01/2024
25	LUIS EDUARDO HUERTAS	19376454	3132677144	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	9/11/2023	N/A
26	DANIEL ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	1015458062	3022256611	INGENIERO DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/11/2023	31/01/2024
27	DANIELA RODRIGUEZ NAVARRETE	1026304071	3057899636	INSPECTOR SST DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	21/11/2023	29/11/2023
28	JAMER ENRIQUE ACOSTA VANEGAS	1038113875	3125478958	OPERARIO DE MONTAJES	FAMISANAR	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	21/11/2023	28/02/2024
29	YOISER ANTONIO VEGA ACOSTA	1007713132	3012454555	AUXILIAR DE OBRA	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/11/2023	30/12/2023
30	WILSON VANEGAS RAMOS	1049932351	3057925465	SOLDADOR	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	30/11/2023	28/02/2024
31	ALBERTO MOJICA	13460675	3021455888	OFICIAL DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/01/2024	31/01/2024
32	HECTOR FABIO OCAMPO PINTO	79370662	3047899875	OFICIAL ELECTRICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
33	JHON FREDDY QUINTERO BUSTAMANTE	80374914	3052563251	CONTRATISTA ELECTRICO	COMPENSAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
34	SEBASTIAN DAVID GIL SOLAQUE	1024600603	3012456365	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
35	KEVIN DAILUBER RODRIGUEZ OROZCO	1024528977	3102458579	APOYO INSPECTOR DE OBRA	EPS COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	5/02/2024	N/A
36	CHRISTIAN JOSE ARIAS RAMIREZ	1079034445	3145789869	INSTALADOR DE CUBIERTA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
37	JORGE LUIS ALVARADO TAPIA	1063960598	3102354569	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
38	LUIS ENRIQUE CARRILLO PEREZ	6804864	3057924540	INSTALADOR DE CUBIERTAS	ASMET SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/03/2024	N/A
	2. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO CHUNIZA Y FERNANDO GONZALÉZ OCHOA									
36	JHYSMARTH LEAO ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000788547	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/10/2023	N/A
37	KEVIN STIVEN HERNANDEZ PARRA	1027535995	3042182761	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	17/11/2023	N/A
38	FREDY ALEXANDER AMADO SANCHEZ	1049614186	3016526365	AUXILIAR DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLFONDOS	21/11/2023	2/01/2024
39	EDUARD GIOVANNY TALERO MOLINA	1022998642	3057924546	CONDUCTOR VOLQUETA	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
40	HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA	79669915	3014568589	CONDUCTOR VOLQUETA	SANITAS	SURA	CAFAM	PORVENIR	20/11/2023	N/A
41	JHOSYMARTH ANDREE ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000792895	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	15/11/2023	N/A
42	EDWIN ALEXANDER MOLINA GUTIERREZ	1097723887	3102569632	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	15/11/2023	30/12/2023
43	GABRIEL FELIPE HERRERA SANCHEZ	1031183292	3054875525	PINTOR SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	9/01/2024	N/A
44	MILTON EDUARDO CANTOR URIBE	1012422520	3102544899	SOLDADOR	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	10/01/2024	31/01/2024
45	OSCAR FABIAN FORERO GONZALEZ	14011756	3057924658	SOLDADOR	FAMISANAR	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	10/01/2024	N/A
46	YIDUAR STIVEN MARTINEZ CERQUERA	1006158996	3102544896	SOLDADOR	SALUDTOTAL	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	N/A
47	JHON FREDY GOMEZ RUIZ	93412459	3057898744	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	12/01/2024	30/12/2023
48	OSCAR FABIAN MANCIPE CALLEJAS	79989407	3054878777	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	29/01/2024	N/A
49	RUBEN DARIO OSPINO MENDOZA	73476370	3156988548	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	29/01/2024	N/A
50	DANIEL FELIPE ROJAS GOMEZ	1003518255	3102456585	OPERARIO	SANITAS	SURA	CAFAM	PROTECCION	1/02/2024	11/03/2024
51	JORGE ENRIQUE MURCIA CARVAJAL	83231760	3125412556	OFICIAL	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	2/02/2024	N/A
52	ARCADIO CARVAJAL CANO	83232849	3112414554	OFICIAL	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	COLFONDOS	2/02/2024	N/A
53	JOHN SEBASTIAN RODRIGUEZ SANTOS	1022421246	3114111221	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVEMIR	5/02/2024	N/A
54	JAIR ESNEIDER CAMACHO PADILLA	1122124132	3124587488	TECNICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	N/A
55	CARLOS JOSE BUELVAS MARTINEZ	1101446456	3054899663	TECNICO	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	N/A
56	OSWALDO SILVA ARIAS	1026264278	3114587879	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	20/02/2024	N/A
57	BRAYAN MANUEL GONZALEZ MORENO	1070019081	3147957758	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLFONDOS	23/03/2024	N/A
58	EDWAR STIVEN GONZALEZ MORENO	1003527513	3165587890	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	23/03/2024	N/A
59	WILLIAM DUVAN GALINDO PARRA	1070010754	3008095677	INGENIERO	EPS COMPENSAR	SURA	NO ANEXA	PROTECCIÓN	23/03/2024	N/A
	3. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B									
54	CARLOS ALBERTO QUINTERO CASTRO	1012357647	3133398783	JEFE DE PRODUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	N/A
55	HUMBERTO QUINTERO CASTRO	6031624	3107541181	PINTOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	30/12/2023
56	JOSE DEL CARMEN QUINTERO CASTRO	1108150056	3134656898	AYUDANTE AVANZADO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	6/11/2023	N/A
57	ANDRES LANCHEROS SANCHEZ	1.033.692.581	3106139633	CONTRATISTA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	COLFONDOS	15/11/2023	N/A
58	NORMA CONSTANZA CHILATRA RODRIGUEZ	52.200.992	3102456365	ENCARGADO DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
59	JUAN DAVID GRANADOS CARO	1033688532	3103113125	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	12/12/2023	N/A
60	BRAYAN STEVEN LOPEZ TRUJILLO	1000792613	3018968584	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	14/12/2023	N/A

61	MAICOL ANTONIO VELASQUEZ RACERO	1000456168	3106254878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	19/12/2023	N/A
62	GINO SAMIR OBANDO	16929250	3014857889	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	19/12/2023	N/A
63	ARNOL DAVID QUEJADA MOSQUERA	1003969572	3105897878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	30/12/2023
64	DAGOBERTO PALACIOS MOSQUERA	80170132	3112254565	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
65	DAVINSON ORTEGA ECHAVEZ	1082370985	3102569786	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	15/01/2024
66	HERNAN ENRIQUE BARRIOS CAMACHO	1079884516	3104878589	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
67	MAURICIO JOSE PEÑA DE LA CRUZ	1079885010	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/12/2023	30/12/2023
68	RODRIGO ANDRES VELASQUEZ RACERO	1001199012	3112589897	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
69	RONAL JOSE VALDEZ MANCILLA	19600457	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
70	SERGIO ALEXANDER URREGO OLAYA	1033706865	3125485896	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	28/12/2023	N/A
71	MELISSA LEAL BARRIOS	1019149140	3102366569	AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	16/01/2024	N/A
72	YEISON STIBEN RODRIGUEZ LINARES	1077320160	3057414144	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	16/01/2024	29/02/2024
73	ANDERSON PALACIOS CORDOBA	1193235465	3136988588	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/01/2024	N/A
74	CARLOS DANIEL LEON DIAZ	1000932887	3059877444	AUXILIAR AVANZADO	EPS SURA	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	18/01/2024	N/A
75	DAVID CARRILLO QUIÑONES	1005854583	3154714519	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
76	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA SUAREZ	1024554929	3112033322	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
77	BRANDON ESTEBAN QUINTERO MUÑOZ	1024592418	3104587888	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	N/A
78	CARLOS ANDRES BALLEN PERDOMO	100335948	3057748926	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/02/2024	N/A
79	WILMER RUIZ HERNANDEZ	1000972780	3202455877	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
80	MICHAEL ESTY GARCIA PINTO	1024601987	3154788999	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
81	CRISTIAN PAVA HERNANDEZ	1024601987		OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	NO ANEXA	PORVENIR	19/03/2024	N/A
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ										
81	PAULO CESAR JIMENEZ PINEDA	9.398.481	3057924540	MAESTRO DE OBRA DE APOYO	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLPENSIONES	21/11/2023	N/A
82	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1.012.349.430	3054568584	INSPECTOR DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	21/11/2023	N/A
83	WILMAN HURTADO PALACIOS	1.022.932.247	3202545654	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	24/11/2023	N/A
84	JOSE LUIS ARGOTY ORTIZ	1000780687	3054898587	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/11/2023
85	BRAYAN ALONSO OSORIO REY	1193577927	3154858785	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/12/2023
86	TIBER ALEXANDER PINCHAO SALAMANCA	80065344	3059872627	MAESTRO	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	28/11/2023	31/01/2024
87	ANGELO STYBEN PINCHAO CARREÑO	1023027952	3059872627	AYUDANTE DE OBRA	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	PORVENIR	26/12/2023	30/12/2023
88	WILMAN HURTADO PALACIOS	1022932247	3015687844	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	31/01/2024
89	FELIX DE JESUS CAVADIAS URANGO	1003212733	3014596897	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	30/12/2023
90	EDUWIN ALVEIRO SANCHEZ MORA	3172104	3214122115	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/11/2023	30/11/2023
91	JHON JAIRO DAZA CABRERA	1024588739	3012544777	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
92	RUSBEL FABIAN GARAVITO YATE	80730583	3157899698	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
93	JOHN ALEXANDER QUINTERO CIFUENTES	80209937	3014577496	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
94	EDINSON BUSTOS OVIEDO	14478587	3215625522	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
95	DIEGO FERNANDO QUINTERO CIFUENTES	80213189	3102544418	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	6/12/2023	N/A
96	CARLOS EDUARDO FLOR FLOR	1082214776	3125468596	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	14/12/2023	N/A
97	PABLO CESAR JIMENEZ ROSAS	1007420552	3057994888	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	19/12/2023	30/12/2023
98	ERICK LEONARDO RUIZ ROJAS	1024572771	3058796412	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/01/2024	1/02/2024
99	JOHANA KATERINE MARTINEZ VARELA	1069739376	3125456695	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	10/01/2024	N/A
100	DAVID NICOLAS SOLORZA DIAZ	1110585392	3112415444	APOYO RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	N/A
101	LUIS ANTONIO BARAJAS BARRERA	6768943	3102355241	ENCARGADO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	15/01/2024	28/02/2024
102	YESID BELTRAN AROCA	80810518	3112544547	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
103	VICTOR ZENON SANTAMARIA SANCHEZ	7120569	3058797474	MAESTRO DE APOYO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	N/A
104	BRAYAN CAMILO USMA MUNEVAR	1073684515	3136356999	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
105	WILLIAM ALEXANDER DUEÑAS ARRIGUI	1022947420	3057899885	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/01/2024	28/02/2024
106	JOHN FREDDY PATIÑO DAVILA	80252966	3056987426	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	2/02/2024	28/02/2024
107	CRISTIAN PAVA HERNANDEZ	1024536127	3136598788	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
108	LUIS EINER PAVA HERNANDEZ	1024495430	3124122129	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
109	JAVIER ROLANDO HERNANDEZ MARTINEZ	1026553072	3129876767	OPERARIO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	7/02/2024	N/A
110	SEBASTIAN ZAPATA TRUJILLO	1023937840	3059882818	AUXILIAR	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	7/02/2024	N/A
111	JUAN CAMILO MEDINA SANCHEZ	1026255495	3054788788	OPERARIO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	13/02/2024	N/A
112	DAVID ALEJANDRO NIETO PEÑA	1012437189	3126955884	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	28/02/2024
113	LUIS JOHNSON GONZALEZ SANABRIA	79868903	3058976458	SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	N/A
110	PEDRO ALONSO ORJUELA DIAZ	1032656115	3157898478	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
111	JONATAN ESTIBEN ORJUELA DIAZ	1032656119	3156989896	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
112	WILLIAM MORALES BEDOYA	80061991	3125487996	OPERARIO	FOSYGA	SURA	N/A	PROTECCIÓN	26/02/2024	N/A
113	OLIVER EDUARDO ORJUELA DIAZ	1032656116	3057998246	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	N/A	PROTECCIÓN	15/03/2024	N/A
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO AURAS - SUMAPAZ										
112	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	1012436533	3101526365	OFICIAL	FAMISANAR	POSITIVA	CAFAM	COLPENSIONES	14/12/2023	30/12/2023
113	WILMAR YATE MARTINEZ	1015992927	3017899898	AYUDANTE DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	14/12/2023	N/A
114	JOHN EDWIN HERRERA DAVILA	79714742	3124125663	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	N/A
115	LEONARDO PULECIO OTAVO	1022929250	3102123221	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	N/A
116	LUIS CARLOS GUERRERO SEPULVEDA	73146615	3102144144	OFICIAL DE PINTURA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	N/A
117	LUIS MANUEL DIAZ	1116376663	3056458871	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
118	JEFERSON ALEXANDER DUQUE TANGARIFE	1000990376	3007845246	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
119	GERMAN EMILIO GONZALEZ OSPINO	1082853834	3002648264	INSTALADOR	COOSALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A

6. LISTADO DE TRABAJADORES VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE										
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 136										
Observaciones:										

	NOVEDADES	
	INGRESOS	RETIROS
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATUAL	**0**	**0**
COLEGIO USMINIA SEDE B:	0	0
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A:	0	0
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	0	0
COLEGIO CHUNIZA:	0	0
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ	0	0
COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ:	0	0
COLEGIO AURAS - SUMAPAZ:	0	0
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE:	0	0
TOTAL INGRESOS DE PERSONAL:	**0**	
TOTAL RETIROS DE PERSONAL:		**0**

Por motivo de la semana santa en el presente informe solo se laboro el dia Lunes festivo 25, Martes 26 y Miercoles 27 de marzo de 2024.

No se tuvieron novedades de ingreso o retiro de personal.

El mismo personal que se encuentra activo dentro del presente listado, estuvo presente en la atención de las emergencias en las sedes de TABACO y NAZARETH

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO

COLEGIO USMINIA SEDE B



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO CHUNIZA



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA









ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNIÓN



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED CAMPESTRES JAIME GARZÓN - AURAS



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

VIVIENDA DOCENTE - CAMPAMENTO



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

DILE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

EMERGENCIAS



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO









AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



ESTADO INICIAL: BETANIA



AVANCE: BETANIA



AVANCE: BETANIA



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B




AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	23	DEL	1-abr-24	AL	7-abr-24

OBRAS PROGRAMADAS

		Modo de tarea	Nombre de tarea	% compl	% espera FED (Text	Estado	Comienzo
	1		I.E.D GENERAL	49%	66%	Retrasada	lun 30/10/23
	1.1		INICIO OBRA	0%	100%	Retrasada	lun 30/10/23
✓	1.2		IED USMINIA	100%	100%	Completada	lun 30/10/23
	1.3		IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	92%	100%	Retrasada	mar 31/10/23
✓	1.4		IED CHUNIZA	100%	100%	Completada	mar 31/10/23
	1.5		IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	92%	100%	Retrasada	mar 31/10/23
	1.6		DILE SUMAPAZ	11%	100%	Retrasada	mar 7/11/23
	1.7		IED CAMPESTRE JAIME GARZON AURAS	52%	100%	Retrasada	mar 7/11/23
	1.8		IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNION	55%	100%	Retrasada	mar 7/11/23
	1.9		VIVIENDA DOCENTE CAMPAMENTO	7%	100%	Retrasada	mié 8/11/23
✓	1.1		IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	100%	100%	Completada	vie 1/12/23
	1.1		CED SAN JOSE DE USME SEDE A - DON BOSCO 2	0%	31%	Retrasada	jue 29/02/24
	1.1		IED CAMPESTRE JAIME GARZON - RAIZAL	0%	30%	Retrasada	vie 1/03/24
	1.1		RURAL DE LAS MERCEDES	0%	30%	Retrasada	vie 1/03/24

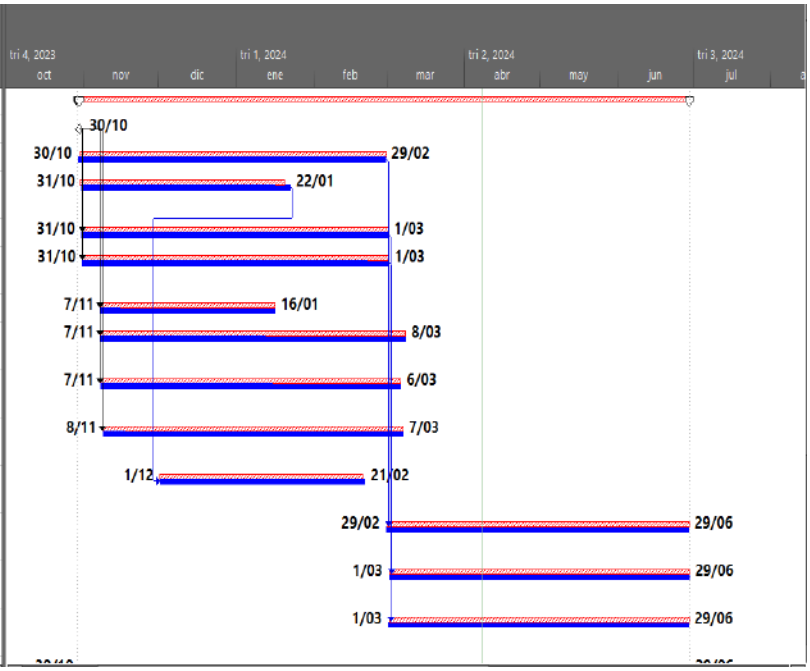

PROGRAMACIONES

COLEGIO (SEDE)	Fecha de inicio	Fecha real de inicio	Días de retraso
COLEGIO (SEDE)	30/10/2023		
Usminia sede B	30/10/2023	30/10/2023	0
Fernando Gonzaléz Ochoa	31/10/2023	15/11/2023	-15
Diego Cuellar sede B	31/10/2023	7/11/2023	-7
Chuniza	31/10/2023	15/11/2023	-15
DILE Sumapaz	7/11/2023	7/04/2024	-152
IED Campestres Jaime Garzón - Auras	7/11/2023	17/12/2023	-40
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	7/11/2023	20/11/2023	-13
Vivienda docente - Campamento	8/11/2023	3/01/2024	-56
Diego Cuellar sede A	1/12/2023	11/12/2023	-10
San José de Usme - Don Bosco 2	29/02/2024		
IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	1/03/2024		
Rural Las Mercedes	1/03/2024		
Emergencias		4/01/2024	62

Nota: El constructor solicito la liberación de espacios para intervenir en la sede El Toldo, la cual fue remitia a la SED y esta a su vez al rector del colegio. Mediante el comunicado S-2024-77846, la SED envía la respuesta del rector, la cual no aprueba dicha liberación; por lo cual, la supervisión del contrato solicita no tener en cuenta en la programación en este informe las sedes Erasmo Valencia, Toldo, Tunal Alto y Diego C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTA

PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA
FIRMA CB INGENIEROS

NUMERO	NOMBRE	CARGO	PROCEDENCIA	INGRESO	RETIRO	PAZ Y SALVO	OBSERVACION
1	CRISTIAN CAMILO BARRAGAN PEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA II	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
2	ANDRES FELIPE MACKENZIE FUENTES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
3	DIANA MAYERLY ARGUELLO ROMERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA I	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
4	MANUEL RICARDO GOMEZ CARRILLO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
5	BIBIANA ANDREA JIMENEZ CHAPARRO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
6	BIBIANA ANDREA JIMENEZ CHAPARRO	ESPECIALISTA SST	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
7	CESAR AUGUSTO BOLAÑO TAFUR	ESPECIALISTA ELECTRICO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
8	NELSON FELIPE MORENO CARDONA	ESPECIALISTA HIDRAULICO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
9	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	PROF. COSTOS Y PRESUPUESTOS	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
10	OSCAR CAMILO GOMEZ LOPEZ	ABOGADO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
11	CINDY PAOLA DIAZ VALENCIA	TECNICO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
12	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR I	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
13	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR II	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
PERSONAL COMPLEMENTARIO QUE NO SE INCLUYE DENTRO DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO							
14	CINDY MILENA DUARTE VELANDIA	APOYO SST	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
15	CRISTIAN FERNEY LESMES VACA	AUXILIAR	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
16	MANUEL ANTONIO MUÑOZ CRUZ	INSPECTOR	BOGOTA D.C	27/11/2023	N/A	N/A	
TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 16							

Observaciones: Durante el periodo del presente informe no se presentaron novedades con el personal de interventoria.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

MAQUINARIA - EQUIPOS - VEHICULOS DE OBRA

PERIODO DEL INFORME:	SEMANAL No. 23
SEMANA REPORTADA: lunes, 1 de abril de 2024	AL domingo, 31 de marzo de 2024

COLEGIO USMINIA SEDE B

			SEMANAL No. 23						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			25	26	27	28	29	30	31
1	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	D	D	D	D	D	D	
2	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	X	X	X	X	X	X	
3	PULIDORA 9"	BOSCH - 00094	X	X	X	X	X	X	
4	PULIDORA 9"	BOSCH 90B - 66200134	X	X	X	X	X	X	
5	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	MEINENG - 3016	D	D	D	D	D	D	
6	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	D	D	D	D	D	D	
7	SOLDADORA	KIN 200M - BAUKER	T	T	T	T	T	T	
8	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	CINBELL	X	X	X	X	X	X	
10	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	T	T	T	T	T	T	
11	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	T	T	T	T	T	T	

COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA

			SEMANAL No. 23						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			25	26	27	28	29	30	31
1	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
3	VOLQUETA	PLACA: SQB000 COLOR: NARANJA	X	X	X	X	X	X	
4	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
5	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
6	CANGURO APISONADOR	H 80 - HAUSSEN	X	X	X	X	X	X	
7	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
8	CAMIÓN MEZCLADOR	WNW141 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
9	CAMIÓN HORMIGONERO	WCU234 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
10	BOMBA PARA HORMIGÓN	TK 40 AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
11	SOPLETE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
12	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	N/A	N/A	X	X	X	X	
13	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
14	TRONZADORA	DEWALT M9355	X	X	X	X	X	X	
15	SOLDADORA	FOX WELD	X	X	X	X	X	X	
16	HIDROLAVADORA	2	X	X	X	X	X	X	
17	PULIDORA	MAKITA 4"	X	X	X	X	X	X	
18	PULIDORA	DEWALT 4"	X	X	X	X	X	X	
19	TALADRO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
20	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
21	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
22	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
23	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B

			SEMANAL No. 23						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			25	26	27	28	29	30	31
1	COMPRESOR 2 HP	BAUKER - 002	T	T	T	T	T	T	
2	MARTILLO PERFORADOR	TA 16386 - DEWALT	D	D	D	D	D	D	
3	SOLDADORA INVERSOR	KMIG1802 -UBERMAN	D	D	D	D	D	D	
4	TALADRO ROTOMARTILLO	D25133-B3 - DEWALT	T	T	T	T	T	T	
5	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	T	T	T	T	T	T	
6	TRONZADORA	232000249 12/2022 - BOSCH	D	D	D	D	D	D	

7	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	T	T	T	T	T	T	
8	PULVERIZADOR DE PINTURA SIN AIRE	WAGNER CONTROL PRO 190 HEA	X	X	X	X	X	X	
9	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	T	T	T	T	T	T	
10	PULIDORA	CINBELL	T	T	T	T	T	T	
11	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	T	T	T	T	T	T	
12	HIDROLAVADORA	BLACK DECKER 7185	X	X	X	X	X	X	
13	VIBROCOMPACTADOR	01MASALTA	T	T	T	T	T	T	
14	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	T	T	T	T	T	T	
COLEGIO CHUNIZA									
			SEMANAL No.		**23**				
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA			**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
1	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
2	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
3	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
4	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
5	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	MTCOD1029	X	X	X	X	X	X	
6	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
7	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
8	EQUIPO DE SOLDADORA	LINCOLN ELECTRIC MMA35O	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	001 4"	X	X	X	X	X	X	
10	COMPRESOR	DEWALT DWFP55126	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR DE AIRE	PRETUL 20L 135PSI	X	X	X	X	X	X	
13	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
14	APISONADOR CANGURO	KAMA DIESEL KM173FKK210909088	X	X	X	X	X	X	
14	SONDA ELECTRICA	LYCTOOLS	X	X	X	X	X	I	
LA UNIÓN SUMAPAZ									
			SEMANAL No.			**23**			
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA			**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
1	PLANTA ELECTRICA	C08000-GG-AE	D	D	D	D	D	D	
2	TALADRO ROTOMARTILLO	DEWALT TAI5386	D	D	D	D	D	D	
3	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	I	X	I	X	X	
4	TROMPO MEZCLADOR	001 - COLOR NARANJA	T	T	T	T	T	T	
5	CANGURO APISONADOR	CORMAG - 20A300	T	T	T	T	T	T	
6	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT	D	D	D	D	D	D	
7	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	D	D	D	D	D	D	
8	EQUIPO DE SOLDADURA	NO SE TIENE INFORMACIÓN	D	D	D	D	D	D	
9	COMPRESOR PARA PINTURA	2020121301 BM-24 L	D	D	D	D	D	D	
10	BRILLADORA INDUSTRIAL	ELECTROLUX 137-402	D	D	D	D	D	D	
AURAS - SUMAPAZ									
			SEMANAL No.			**23**			
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA			**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
1	COMPRESOR PARA PINTURA	SERIAL H112200639 MARCA KARSON	T	T	T	T	T	T	
2	EQUIPO DE SOLDADURA	KIN160M BAUKER	T	T	T	T	T	T	
3	EQUIPO DE SOLDADORA	BAUKER - IEC60974-1:20212	T	T	T	T	T	T	
COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A									
			SEMANAL No.			**23**			
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA			**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
1	SOPLETE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
3	CANGURO APISONADOR		X	X	X	X	X	X	
4	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
5	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
6	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	X	X	
7	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	X	X	
8	SOLDADORA	UBERMANN KMIG1802	X	X	X	X	X	X	
9	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
10	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
11	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	

12	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE									
			SEMANAL No.			**23**			
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA			**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	I	X	X	X	X	
2									
3									
4									
5									
INTERVENTORIA									
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA INTERVENTORIA			**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
OBSERVACIÓN:		OBSERVACIONES: N/A							
X: RETIRADA DE OBRA									
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA									
V: VARADO									
T: TRABAJANDO									
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA									

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **DEL** lunes, 01-abr.-24 **AL** domingo, 07-abr.-24

SEMANA REPORTADA:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

Usminia sede B

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	1/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	2/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	3/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	4/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	5/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	6/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	7/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Fernando Gonzaléz Ochoa

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	1/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	2/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	3/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	4/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	5/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	6/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	7/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Diego Cuellar sede B

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	1/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	2/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	3/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	4/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	5/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	6/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	7/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A

OBSERVACIÓN :

Chuniza

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	1/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	2/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	3/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	4/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	5/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	6/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	7/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A

OBSERVACIÓN :

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	1/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	2/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	3/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	4/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	5/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	6/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	7/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Diego Cuellar sede A

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	1/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	2/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	3/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	4/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	5/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	6/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	7/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A

OBSERVACIÓN :

IED Campestres Jaime Garzón - Auras

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	1/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	2/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	3/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	4/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	5/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	6/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	7/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A

OBSERVACIÓN :

Vivienda docente - Campamento

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	1/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	2/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	3/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	4/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	5/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	6/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	7/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

DILE Sumapaz

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	1/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	2/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	3/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	4/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	5/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	6/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	7/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A

OBSERVACIÓN :

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

CB INGENIEROS S.A.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
	Fecha	2/12/2022

UNIDAD EJECUTORA:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE**			**FECHA:**	15/04/2024
Semana No.	**24**	**Del :**	lunes, 8 de abril de 2024	AL:	domingo, 14 de abril de 2024
Plazo Total		240	días		
Plazo Transcurrido		168			
Nombre del Supervisor :	Ing. Ferney Jiménez Neira				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	3,00%	69,00%	**(%) Ejecutado**	3,00%	52,00%
Valor programado ($)	$ 285.776.270,40	$ 4.918.874.610,58	**Valor ejecutado ($)**	$ 0,00	$ 2.539.747.313,36
			Evaluación	-17,00%	Atraso en la ejecución

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CLARIDAD	**Contratista:**	CB INGENIEROS S.A.S
Contrato No:	CO1.PCCNTR.5305904	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.5313332
Valor del contrato:	$ 7.608.734.174	**Valor del contrato:**	$ 504.428.924,00
Plazo:	8 meses	**Plazo:**	9 meses
Fecha de iniciación:	30 de octubre de 2023	**Fecha de iniciación:**	19 de octubre de 2023
Fecha de terminación:	29 de junio de 2024	**Fecha de terminación:**	18 de julio de 2024
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Plazo final:	N/A	**Plazo final:**	N/A
Fecha de vencimiento final:	N/A	**Fecha de vencimiento final:**	N/A
Fecha de suspensión Nº 2:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 2:**	N/A
Suspensión N. 3	N/A	**Suspensión N. 3**	N/A
Fecha reinicio N. 2	N/A	**Fecha reinicio N. 2**	N/A
Prórroga Nº 2:	N/A	**Prórroga Nº 2:**	N/A
Plazo final:	N/A	**Plazo final:**	N/A
Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A	**Nueva Fecha de vencimiento final:**	N/A
Valor total contrato	$ 7.608.734.174	**Valor actualizado contrato**	$ 504.428.924

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	Usminia sede B	535	Usme	$ 349.948.209,00	100,00%	100,00%	Culminación de subsanación de observaciones	Culminación de subsanación de observaciones
2	Fernando Gonzaléz Ochoa	580	Usme	$ 353.157.411,00	100,00%	95,00%	Instalación de piso y guardaescoba de madera en sala de danzas.	Culminación de cambio de bombas
3	Diego Cuellar sede B	541	Usme	$ 542.722.842,00	100,00%	94,00%	Instalaciones eléctricas: instalación de paneles, cableado Pintura de muros internos en boque de aulas (4). Instalación de espejos en baños de profesores en bloque administración. Instalación de bajante en bloque aulas (4). Picada de muros de fachada.	Instalaciones eléctricas, detalles de pintura, entre otros
4	Chuniza	512	Usme	$ 236.826.369,00	100,00%	100,00%	Instalación de reja de gimnasio.	Instalación de rejillas en cárcamos, observaciones del acta parcial
5	DILE Sumapaz	2010	Sumapaz	$ 15.242.011,00	100,00%	25,00%	Instalación de estructura metálica para rampa de acceso. Suministro de piso podotacktil	Mantenimiento de pozo, instalación de piso podotacktil
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	2006	Sumapaz	$ 750.000.000,00	100,00%	54,00%	Instalación de teja en bloque laboratorio. Pintura en muros internos. Instalaciones eléctricas.	Instalación de teja, instalaciones eléctricas, pintura, entre otros
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	2022	Sumapaz	$ 811.831.873,00	100,00%	56,00%	Conformación de cajas de inspección. Picado y pañete de muros de bloque garita y bloque emisora.	Aguas lluvias, intervención en vivienda docente, instalaciones eléctricas, entre otras
8	Vivienda docente - Campamento	570	Usme	$ 411.446.316,00	100,00%	10,00%	Excavación manual, figurado de acero y fundida de dados de estructura metálica	Suministro e instalación de estructura metálica, instalaciones eléctricas hidrosanitarias, entre otras
9	Diego Cuellar sede A	576	Usme	$ 253.419.631,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Detalles de la entrega física de la obra
10	San José de Usme - Don Bosco 2	567	Usme	$ 635.000.000,00	37,00%	0,00%	No han iniciado actividades	Cerramiento, demolición, desmonte, entre otras.
11	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	2003	Sumapaz	$ 210.861.638,00	36,00%	0,00%	No han iniciado actividades	Cerramiento, demolición, desmonte, entre otras.

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

FECHA: 15/04/2024

Semana No. 24 **Del :** lunes, 8 de abril de 2024 **AL:** domingo, 14 de abril de 2024

Plazo Total 240 días

12	Rural Las Mercedes	534	Usme	$ 447.180.697,00	36,00%	10,00%	Demolición de placa de patio. Demolición de mesón de cocina. Desmonte de puertas y ventanas. Demolición de enchape.	Cerramiento, demolición, desmonte, entre otras.
13	Emergencias	E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A:la emergencia fue atendida a cabalidad.	
		E			100,00%	98,00%	San Juan: durante la semana no se realizaron actividades.	Emboquillada de los dos sanitarios que se instalaron, pintura de las chapas que se instalaron, pegada de vidrio en baño de profesores, pegada de vidrio baño de niños, instalación de manto y colocar las dos tapas de los inodoros
		E			100,00%	100,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.	
		E			100,00%	100,00%	Nazareth: durante la semana no se realizaron actividades.	
20		E			100,00%	95,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.	Revisión de la rejilla del sifon y punto eléctrico de la nevera.
21		E			100,00%	95,00%	Auras: instalación de carcamos	Instalación de pisos.
22		E			100,00%	100,00%	Betania: durante la semana no se realizaron actividades.	
24		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede B: fundida de placa, instalación de enchape	

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

Revisión documentos de ingreso del personal (Seguridad social vigente, consulta de antecedentes, examenes medicos de ingreso).
Remisión de base de datos a la SED de aprobación de personal para ingreso a los colegios.
Verificación e inspección cumplimiento de normas SST, referente a inducciones, notificación de riesgos, charlas, pausas activas, entrega de Epps, firma de permisos de trabajo.
Inspección señalización implementada en frentes de trabajo e instalación de cerramiento de obra.
Inspección punto de hidratación para el personal, en cada uno de los colegios.
Verificación entrega de dotación al personal.
Revisión informes de gestión SST semanal y mensual.
Inspección de actos y condiciones inseguras y medidas de seguridad implementadas.
A la fecha no se ha podido dar aprobación al informe mensual del mes de enero de 2024, del contratista, debido que carece de anexos que soporten la gestión realizada.
A la fecha el contratista ha hecho entrega parcial de planillas de seguridad social del personal minimo requerido.

Incidentes y/o accidentes:
Durante la semana no se presento accidentes, ni incidentes, ni daños a terceros.

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Seguimiento y control de la programación de obra.
Remisión de solicitudes al constructor.
Apertura de presunto incumplimiento al contratista de obra.
Acta de comité de obra.

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	30 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023	$ 69.413.115,00
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	$ 482.429.484,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	$ 1.022.204.883,00
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	$ 867.459.592,00
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$**	**2.441.507.074,00**

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Obra
$ 7.608.734.174,00
Valor facturado Contrato Obra
$ 2.441.507.074,00
% Avance facturado Acumulado
32%
Saldo por Facturar
$ 5.167.227.100,00

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	10 de octubre d e2023 a 29 de noviembre de 2023	$ 4.539.860,00
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	$ 32.031.237,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	$ 67.795.247,00
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	$ 57.504.897,00
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$**	**161.871.241,00**


AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 504.428.924,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 161.871.241,00
% Avance facturado Acumulado
32%
Saldo por Facturar
$ 342.557.683,00

INGENIEROS S.A.	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** **INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA**	VERSIÓN	1
		Fecha	2/12/2022

UNIDAD EJECUTORA:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO** **Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE**			**FECHA:**	15/04/2024
Semana No.	**24**	**Del :**	lunes, 8 de abril de 2024	AL:	domingo, 14 de abril de 2024
Plazo Total		240	días		

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. La relación de la programación presentada en el capitulo "EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES", corresponden al avance de las actividades teniendo en cuenta los recursos necesarios para su ejecución.



FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Ándres Felipe Mackenzie Fuentes

BALANCE FINANCIERO					
SEMANA No.	24	DEL	8-abr-24	AL	14-abr-24

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	$ 349.948.209,00	$ 362.904.046,35	$ 12.955.837,35
2	Fernando Gonzaléz Ochoa		Usme	$ 353.157.411,00	$ 351.430.683,39	-$ 1.726.727,61
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	$ 542.722.842,00	$ 712.176.519,23	$ 169.453.677,23
4	Chuniza		Usme	$ 236.826.369,00	$ 330.206.750,54	$ 93.380.381,54
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	$ 15.242.011,00	$ 15.242.011,00	$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	$ 750.000.000,00	$ 628.487.851,57	-$ 121.512.148,43
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	$ 811.831.873,00	$ 840.105.168,56	$ 28.273.295,56
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	$ 411.446.316,00	$ 411.446.316,00	$ 0,00
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 253.419.631,00	$ 140.173.912,66	-$ 113.245.718,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	$ 799.914.269,00	$ 799.914.269,00	$ 0,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	$ 344.210.600,00	$ 344.210.600,00	$ 0,00
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	$ 337.709.778,00	$ 337.709.778,00	$ 0,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	$ 635.000.000,00	$ 635.000.000,00	$ 0,00
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	$ 210.861.638,00	$ 210.861.638,00	$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	$ 447.180.697,00	$ 447.180.697,00	$ 0,00
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	$ 599.909.029,00	$ 599.909.029,00	$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 7.099.380.673,00**	**$ 7.166.959.270,29**	**$ 67.578.597,29**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 5.198.994,76	$ 4.708.361,95	-$ 490.632,81
2	San Juan		Sumapaz	$ 5.379.289,20	$ 4.568.398,72	-$ 810.890,48
3	IED JAIME GARZON SEDE TABACO		Sumapaz	$ 7.539.117,09	$ 7.539.117,09	$ 0,00
4	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	$ 4.431.089,03	$ 4.431.089,03	$ 0,00
5	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	$ 1.423.309,88	$ 1.423.309,88	$ 0,00
6	Por definir			$ 485.121.979,04	$ 499.817.018,33	$ 14.695.039,29
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				**$ 509.093.779,00**	**$ 522.487.295,00**	**$ 13.393.516,00**

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO	$ 7.608.734.174	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 7.689.446.565
		DIFERENCIA	-$ 80.712.391

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado el balance del presupuesto de los colegios Chuniza, La Unión, Auras, Diego A, Diego B, Fernando González Ochoa y Usminia, en aras de equilibrar el contrato de obra, sin embargo, este no es definitivo, por lo cual, en los próximos informes continuaremos presentando el balance de estos y demás colegios.


En cuanto a las emergencias, los balances fueron ajustados conforme a la necesidad de cada frente.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN
GRUPO 5

SEMANA No.	24	DEL	08-abr-24	AL	14-abr-24

PROGRAMACIÓN DE OBRA

	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
				PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	**$ 7.099.380.673**	**240,00**	**69,29%**	**35,77%**	**-33,51%**	**85,86**	**166,29**	**-80,43**
1	Usminia sede B	$ 349.948.209	92,00	100,00%	93,05%	-6,95%	85,60	92,00	-6,40
2	Fernando Gonzaléz Ochoa	$ 353.157.411	92,00	100,00%	81,60%	-18,40%	75,08	92,00	-16,92
3	Diego Cuellar sede B	$ 542.722.842	60,00	100,00%	124,97%	24,97%	74,98	60,00	14,98
4	Chuniza	$ 236.826.369	92,00	100,00%	138,63%	38,63%	127,54	92,00	35,54
5	DILE Sumapaz	$ 15.242.011	50,00	100,00%	0,00%	-100,00%	0,00	50,00	-50,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	$ 750.000.000	92,00	100,00%	50,21%	-49,79%	46,19	92,00	-45,81
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	$ 811.831.873	90,00	100,00%	47,42%	-52,57%	42,68	90,00	-47,32
8	Vivienda docente - Campamento	$ 411.446.316	90,00	100,00%	5,41%	-94,59%	4,87	90,00	-85,13
9	Diego Cuellar sede A	$ 253.419.631	60,00	100,00%	53,49%	-46,51%	32,09	60,00	-27,91
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	$ 799.914.269	90,00	66,73%	0,00%	-66,73%	0,00	60,06	-60,06
11	Diego Cuellar sede C	$ 344.210.600	90,00	17,14%	0,00%	-17,14%	0,00	15,43	-15,43
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	$ 337.709.778	92,00	15,22%	0,00%	-15,22%	0,00	14,00	-14,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2	$ 635.000.000	90,00	49,24%	0,00%	-49,24%	0,00	44,31	-44,31
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	$ 210.861.638	89,00	16,52%	0,00%	-16,52%	0,00	14,70	-14,70
15	Rural Las Mercedes	$ 447.180.697	89,00	4,61%	0,00%	-4,61%	0,00	4,10	-4,10
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	$ 599.909.029	86,00	24,17%	0,00%	-24,17%	0,00	20,79	-20,79
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
	VALOR PRESUPUESTADO	**$ 7.099.380.673**							

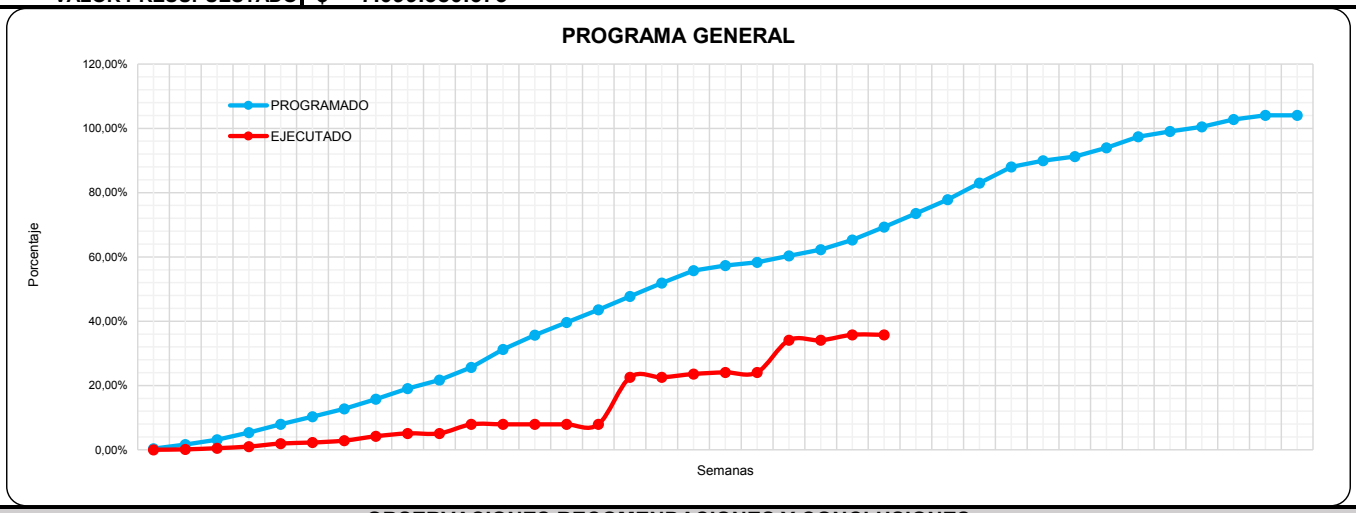

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Los porcentajes presentados en el informe gráfico están relacionados con el flujjo de caja de cada colegio.

Los porcentajes de ejecutado acumulado son acordes con la descripción de los ítems del presupuesto, es decir, abarcan integradamente el suministro y la instalación y solo así son contemplados para la relación en los flujos de caja.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

PERSONAL CONTRATO OBRA
FIRMA CONSORCIO CLARIDAD

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA

LISTADO PERSONAL CONTRATO OBRA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE IDENTIFICACIO	TELEFONO	CARGO	EPS	ARL	caja de compensacion	FPC	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA	80222352	3112783471	DIRECTOR DE OBRA	SANIDAD PN	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
2	GUILLERMO ALBERTO VELANDIA CORDOBA	19418347	3134047300	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	N/A
3	DAVID ESTEBAN NULEZ CANO	1013644565	3053961793	RESIDENTE DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	8/01/2024
4	JULIO OSWALDO TORRES SUAREZ	79458867	3002066044	ASESOR ESTRUCTURAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
5	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	AESOR AMBIENTAL	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
6	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	ASESOR SST	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
7	JORGE ERNESTO CASTIBLANCO MARTINEZ	10073655	3134227162	ASESOR EN REDES ELECTRICAS	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
8	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	26593081	3125212497	ASESOR REDES HIDROSANITARIAS	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
9	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	79450429	3134412819	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
10	JULY PAOLA OVALLE DIAZ	1026594061	3203720883	TECNICO SST	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	28/12/2023
11	NUBIA SANTAMARIA SANTAMARIA	53037373	3203655707	TECNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	4/11/2023
12	ROBERTO ROSAS CONDIA	79499052	3115698784	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	6/01/2024
13	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	1033749854	3106139631	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	6/01/2024
14	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63394516	3222953159	MAESTRO DE OBRA	ALIANSALUD	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
15	ORLANDO ROSAS CONDIA	19442965	3115181794	MAESTRO DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	N/A	PORVENIR	30/10/2023	N/A
16	LAURA YERALDINE RAMIREZ OCAMPO	1006118750	3124514525	INSPECTORA SST	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/12/2023	N/A
17	JOHANA KATERINE MARTINEZ VARELA	1069739376	31254566995	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	10/01/2024	N/A
18	LEONARDO TORRES LARA	88279853	3112783471	RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	20/02/2024	N/A
	1. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO USMINIA SEDE B Y DIEGO MONTAÑA SEDE A									
18	YITZA DANIELA CABALLERO CASTILLO	1.014.262.805	3144064083	INGENIERA DE APOYO	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	8/01/2024
19	LUIS FELIPE RONCANCIO	19.293.563	3126505053	MAESTRO	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
20	JHON DEIBY ROA	1.006.321.288	3026681420	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	11/11/2023
21	JOSE DOMINGO SEPULVEDA MARQUEZ	19.478.962	3132806995	OFICIAL	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
22	LUIS ENRIQUE GALAN RAMIREZ	79.243.511	3106159832	G. OPERACIONES	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	28/02/2024
23	RODOLFO CORTES RICO	79.495.028	3138709928	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	N/A
24	LUZ ELENA ROMERO LEE	39564668	3003965967	APOYO SST	FOMAG	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	31/10/2023	31/01/2024
25	LUIS EDUARDO HUERTAS	19376454	3132677144	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	9/11/2023	N/A
26	DANIEL ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	1015458062	3022256611	INGENIERO DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/11/2023	31/01/2024
27	DANIELA RODRIGUEZ NAVARRETE	1026304071	3057899636	INSPECTOR SST DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	21/11/2023	29/11/2023
28	JAMER ENRIQUE ACOSTA VANEGAS	1038113875	3125478958	OPERARIO DE MONTAJES	FAMISANAR	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	21/11/2023	28/02/2024
29	YOISER ANTONIO VEGA ACOSTA	1007713132	3012454555	AUXILIAR DE OBRA	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/11/2023	30/12/2023
30	WILSON VANEGAS RAMOS	1049932351	3057925465	SOLDADOR	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	30/11/2023	28/02/2024
31	ALBERTO MOJICA	13460675	3021455888	OFICIAL DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/01/2024	31/01/2024
32	HECTOR FABIO OCAMPO PINTO	79370662	3047899875	OFICIAL ELECTRICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	31/03/2024
33	JHON FREDDY QUINTERO BUSTAMANTE	80374914	3052563251	CONTRATISTA ELECTRICO	COMPENSAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
34	SEBASTIAN DAVID GIL SOLAQUE	1024600603	3012456365	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
35	KEVIN DAILUBER RODRIGUEZ OROZCO	1024528977	3102458579	APOYO INSPECTOR DE OBRA	EPS COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	5/02/2024	N/A
36	CHRISTIAN JOSE ARIAS RAMIREZ	1079034445	3145789869	INSTALADOR DE CUBIERTA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
37	JORGE LUIS ALVARADO TAPIA	1063960598	3102354569	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
38	LUIS ENRIQUE CARRILLO PEREZ	6804864	3057924540	INSTALADOR DE CUBIERTAS	ASMET SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/03/2024	N/A
	2. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO CHUNIZA Y FERNANDO GONZALÉZ OCHOA									
36	JHYSMARTH LEAO ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000788547	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/10/2023	N/A
37	KEVIN STIVEN HERNANDEZ PARRA	1027535995	3042182761	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	17/11/2023	N/A
38	FREDY ALEXANDER AMADO SANCHEZ	1049614186	3016526365	AUXILIAR DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLFONDOS	21/11/2023	2/01/2024
39	EDUARD GIOVANNY TALERO MOLINA	1022998642	3057924546	CONDUCTOR VOLQUETA	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
40	HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA	79669915	3014568589	CONDUCTOR VOLQUETA	SANITAS	SURA	CAFAM	PORVENIR	20/11/2023	N/A
41	JHOSYMARTH ANDREE ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000792895	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	15/11/2023	N/A
42	EDWIN ALEXANDER MOLINA GUTIERREZ	1097723887	3102569632	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	15/11/2023	30/12/2023
43	GABRIEL FELIPE HERRERA SANCHEZ	1031183292	3054875525	PINTOR SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	9/01/2024	N/A
44	MILTON EDUARDO CANTOR URIBE	1012422520	3102544899	SOLDADOR	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	10/01/2024	31/01/2024
45	OSCAR FABIAN FORERO GONZALEZ	14011756	3057924658	SOLDADOR	FAMISANAR	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	10/01/2024	N/A
46	YIDUAR STIVEN MARTINEZ CERQUERA	1006158996	3102544896	SOLDADOR	SALUDTOTAL	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	N/A
47	JHON FREDY GOMEZ RUIZ	93412459	3057898744	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	12/01/2024	30/12/2023
48	OSCAR FABIAN MANCIPE CALLEJAS	79989407	3054878777	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	29/01/2024	N/A
49	RUBEN DARIO OSPINO MENDOZA	73476370	3156988548	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	29/01/2024	N/A
50	DANIEL FELIPE ROJAS GOMEZ	1003518255	3102456585	OPERARIO	SANITAS	SURA	CAFAM	PROTECCION	1/02/2024	11/03/2024
51	JORGE ENRIQUE MURCIA CARVAJAL	83231760	3125412556	OFICIAL	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	2/02/2024	N/A
52	ARCADIO CARVAJAL CANO	83232849	3112414554	OFICIAL	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	COLFONDOS	2/02/2024	N/A
53	JOHN SEBASTIAN RODRIGUEZ SANTOS	1022421246	3114111221	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVEMIR	5/02/2024	N/A
54	OSWALDO SILVA ARIAS	1026264278	3114587879	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	20/02/2024	N/A
55	BRAYAN MANUEL GONZALEZ MORENO	1070019081	3147957758	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLFONDOS	23/03/2024	N/A
56	EDWAR STIVEN GONZALEZ MORENO	1003527513	3165587890	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	23/03/2024	N/A
57	WILLIAM DUVAN GALINDO PARRA	1070010754	3008095677	INGENIERO	EPS COMPENSAR	SURA	NO ANEXA	PROTECCIÓN	23/03/2024	N/A

3. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B										
54	CARLOS ALBERTO QUINTERO CASTRO	1012357647	3133398783	JEFE DE PRODUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	N/A
55	HUMBERTO QUINTERO CASTRO	6031624	3107541181	PINTOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	30/12/2023
56	JOSE DEL CARMEN QUINTERO CASTRO	1108150056	3134656898	AYUDANTE AVANZADO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	6/11/2023	31/03/2024
57	ANDRES LANCHEROS SANCHEZ	1.033.692.581	3106139633	CONTRATISTA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	COLFONDOS	15/11/2023	N/A
58	NORMA CONSTANZA CHILATRA RODRIGUEZ	52.200.992	3102456365	ENCARGADO DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
59	JUAN DAVID GRANADOS CARO	1033688532	3103113125	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	12/12/2023	15/03/2024
60	BRAYAN STEVEN LOPEZ TRUJILLO	1000792613	3018968584	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	14/12/2023	N/A
61	MAICOL ANTONIO VELASQUEZ RACERO	1000456168	3106254878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	19/12/2023	N/A
62	GINO SAMIR OBANDO	16929250	3014857889	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	19/12/2023	N/A
63	ARNOL DAVID QUEJADA MOSQUERA	1003969572	3105897878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	30/12/2023
64	DAGOBERTO PALACIOS MOSQUERA	80170132	3112254565	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
65	DAVINSON ORTEGA ECHAVEZ	1082370985	3102569786	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	15/01/2024
66	HERNAN ENRIQUE BARRIOS CAMACHO	1079884516	3104878589	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
67	MAURICIO JOSE PEÑA DE LA CRUZ	1079885010	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/12/2023	30/12/2023
68	RODRIGO ANDRES VELASQUEZ RACERO	1001199012	3112589897	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
69	RONAL JOSE VALDEZ MANCILLA	19600457	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
70	SERGIO ALEXANDER URREGO OLAYA	1033706865	3125485896	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	28/12/2023	N/A
71	MELISSA LEAL BARRIOS	1019149140	3102366569	AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	16/01/2024	3/03/2024
72	YEISON STIBEN RODRIGUEZ LINARES	1077320160	3057414144	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	16/01/2024	29/02/2024
73	ANDERSON PALACIOS CORDOBA	1193235465	3136988588	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/01/2024	N/A
74	CARLOS DANIEL LEON DIAZ	1000932887	3059877444	AUXILIAR AVANZADO	EPS SURA	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	18/01/2024	N/A
75	DAVID CARRILLO QUIÑONES	1005854583	3154714519	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
76	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA SUAREZ	1024554929	3112033322	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	31/03/2024
77	BRANDON ESTEBAN QUINTERO MUÑOZ	1024592418	3104587888	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	N/A
78	CARLOS ANDRES BALLEN PERDOMO	100335948	3057748926	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/02/2024	N/A
79	WILMER RUIZ HERNANDEZ	1000972780	3202455877	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
80	MICHAEL ESTY GARCIA PINTO	1024601987	3154788999	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
81	CRISTIAN PAVA HERNANDEZ	1024536127	3136598788	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
82	LUIS EINER PAVA HERNANDEZ	1024495430	3124122129	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
83	JAIR ESNEIDER CAMACHO PADILLA	1122124132	3124587488	TECNICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	N/A
84	CARLOS JOSE BUELVAS MARTINEZ	1101446456	3054899663	TECNICO	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	N/A
	ADRIAN MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ	11443863		APOYO RESIDENTE DE OBRA	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	12/04/2024	N/A
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ										
81	PAULO CESAR JIMENEZ PINEDA	9.398.481	3057924540	MAESTRO DE OBRA DE APOYO	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLPENSIONES	21/11/2023	N/A
82	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1.012.349.430	3054568584	INSPECTOR DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	21/11/2023	N/A
83	WILMAN HURTADO PALACIOS	1.022.932.247	3202545654	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	24/11/2023	N/A
84	JOSE LUIS ARGOTY ORTIZ	1000780687	3054898587	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/11/2023
85	BRAYAN ALONSO OSORIO REY	1193577927	3154858785	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/12/2023
86	TIBER ALEXANDER PINCHAO SALAMANCA	80065344	3059872627	MAESTRO	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	28/11/2023	31/01/2024
87	ANGELO STYBEN PINCHAO CARREÑO	1023027952	3059872627	AYUDANTE DE OBRA	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	PORVENIR	26/12/2023	30/12/2023
88	WILMAN HURTADO PALACIOS	1022932247	3015687844	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	31/01/2024
89	FELIX DE JESUS CAVADIAS URANGO	1003212733	3014596897	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	30/12/2023
90	EDUWIN ALVEIRO SANCHEZ MORA	3172104	3214122115	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/11/2023	30/11/2023
91	JHON JAIRO DAZA CABRERA	1024588739	3012544777	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
92	RUSBEL FABIAN GARAVITO YATE	80730583	3157899698	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
93	JOHN ALEXANDER QUINTERO CIFUENTES	80209937	3014577496	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
94	EDINSON BUSTOS OVIEDO	14478587	3215625522	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
95	DIEGO FERNANDO QUINTERO CIFUENTES	80213189	3102544418	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	6/12/2023	N/A
96	CARLOS EDUARDO FLOR FLOR	1082214776	3125468596	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	14/12/2023	N/A
97	PABLO CESAR JIMENEZ ROSAS	1007420552	3057994888	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	19/12/2023	30/12/2023
98	ERICK LEONARDO RUIZ ROJAS	1024572771	3058796412	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/01/2024	1/02/2024
99	JOHANA KATERINE MARTINEZ VARELA	1069739376	3125456695	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	10/01/2024	N/A
100	DAVID NICOLAS SOLORZA DIAZ	1110585392	3112415444	APOYO RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	N/A
101	LUIS ANTONIO BARAJAS BARRERA	6768943	3102355241	ENCARGADO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	15/01/2024	28/02/2024
102	YESID BELTRAN AROCA	80810518	3112544547	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
103	VICTOR ZENON SANTAMARIA SANCHEZ	7120569	3058797474	MAESTRO DE APOYO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	N/A
104	BRAYAN CAMILO USMA MUNEVAR	1073684515	3136356999	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
105	WILLIAM ALEXANDER DUEÑAS ARRIGUI	1022947420	3057899885	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/01/2024	28/02/2024
106	JOHN FREDDY PATIÑO DAVILA	80252966	3056987426	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	2/02/2024	28/02/2024
107	JAVIER ROLANDO HERNANDEZ MARTINEZ	1026553072	3129876767	OPERARIO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	7/02/2024	N/A
108	SEBASTIAN ZAPATA TRUJILLO	1023937840	3059882818	AUXILIAR	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	7/02/2024	N/A
109	JUAN CAMILO MEDINA SANCHEZ	1026255495	3054788788	OPERARIO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	13/02/2024	N/A
110	DAVID ALEJANDRO NIETO PEÑA	1012437189	3126955884	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	28/02/2024
111	LUIS JOHNSON GONZALEZ SANABRIA	79868903	3058976458	SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	N/A
112	PEDRO ALONSO ORJUELA DIAZ	1032656115	3157898478	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
113	JONATAN ESTIBEN ORJUELA DIAZ	1032656119	3156989896	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
114	WILLIAM MORALES BEDOYA	80061991	3125487996	OPERARIO	FOSYGA	SURA	N/A	PROTECCIÓN	26/02/2024	N/A
115	OLIVER EDUARDO ORJUELA DIAZ	1032656116	3057998246	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	N/A	PROTECCIÓN	15/03/2024	N/A
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO AURAS - SUMAPAZ										
116	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	1012436533	3101526365	OFICIAL	FAMISANAR	POSITIVA	CAFAM	COLPENSIONES	14/12/2023	30/12/2023
117	WILMAR YATE MARTINEZ	1015992927	3017899898	AYUDANTE DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	14/12/2023	N/A
118	JOHN EDWIN HERRERA DAVILA	79714742	3124125663	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	N/A
119	LEONARDO PULECIO OTAVO	1022929250	3102123221	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	N/A
120	LUIS CARLOS GUERRERO SEPULVEDA	73146615	3102144144	OFICIAL DE PINTURA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	N/A
121	LUIS MANUEL DIAZ	1116376663	3056458871	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
122	JEFERSON ALEXANDER DUQUE TANGARIFE	1000990376	3007845246	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
123	GERMAN EMILIO GONZALEZ OSPINO	1082853834	3002648264	INSTALADOR	COOSALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A

6. LISTADO DE TRABAJADORES VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE										
124	OSCAR TIBADUIZA OCHOA	79217256	3123456575	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/04/2024	N/A
125	LUIS ALEJANDRO PINEDA GARCIA	1104696373	3109875678	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	5/04/2024	N/A
126	HERNALDO ROJAS VELANDIA	79208636	3157656445	OFICIAL DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	5/04/2024	N/A
7. LISTADO DE TRABAJADORES RURAL LAS MERCEDES										
127	JOSE LUIS SAENZ TRUJILLO	12134668	3057924540	TECNICO OPERATIVO	FAMISANAR	SURA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	9/04/2024	N/A
128	HERNAN RIVERA LOZANO	12122361	3057924541	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	FAMISANAR	SURA	COLPENSIONES	COMFAMILIAR	9/04/2024	N/A
TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 138										
Observaciones:										

	NOVEDADES		
	INGRESOS	**RETIROS**	
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATUAL	**0**	**2**	El contrastista reporto el retiro de 2 inspectores de obra con fecha del 06 de enero de 2024
COLEGIO USMINIA SEDE B:	0	0	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A:	0	0	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	1	0	Se reporta 1 ingreso
COLEGIO CHUNIZA:	0	0	
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ	0	0	
COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ:	0	0	
COLEGIO AURAS - SUMAPAZ:	0	0	
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE:	3	0	se reporta 3 ingresos
RURAL LAS MERCEDES	2	0	Se reporta 2 ingresos
TOTAL INGRESOS DE PERSONAL:	**6**		
TOTAL RETIROS DE PERSONAL:		**2**	

Se iniciaron ejecución de actividades en Vivienda Campamento Docente y Rural las Mercedes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO

COLEGIO USMINIA SEDE B



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO CHUNIZA



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNIÓN



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED CAMPESTRES JAIME GARZÓN - AURAS



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

VIVIENDA DOCENTE - CAMPAMENTO



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

DILE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

LAS MERCEDES



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

EMERGENCIAS



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



ESTADO INICIAL: BETANIA



AVANCE: BETANIA



AVANCE: BETANIA



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B




AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	24	DEL	8-abr-24	AL	14-abr-24

OBRAS PROGRAMADAS

Nombre de tarea	% compl	% espera FED (Text	Estado	Comienzo	Comienzo real	% físico complet
I.E.D GENERAL	**52%**	**69%**	**Retrasada**	**lun 30/10/23**	**lun 30/10/23**	**0%**
INICIO OBRA	0%	100%	Retrasada	lun 30/10/23	NOD	0%
IED USMINIA	100%	100%	Completada	lun 30/10/23	lun 30/10/23	99%
IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	94%	100%	Retrasada	mar 31/10/23	mar 31/10/23	89%
IED CHUNIZA	100%	100%	Completada	mar 31/10/23	mar 31/10/23	96%
IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	95%	100%	Retrasada	mar 31/10/23	mar 31/10/23	92%
DILE SUMAPAZ	25%	100%	Retrasada	mar 7/11/23	mar 7/11/23	0%
IED CAMPESTRE JAIME GARZON AURAS	54%	100%	Retrasada	mar 7/11/23	mar 7/11/23	25%
IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNION	56%	100%	Retrasada	mar 7/11/23	mar 7/11/23	53%
VIVIENDA DOCENTE CAMPAMENTO	10%	100%	Retrasada	mié 8/11/23	mié 8/11/23	7%
IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	100%	100%	Completada	vie 1/12/23	vie 1/12/23	100%
CED SAN JOSE DE USME SEDE A - DON BOSCO 2	0%	37%	Retrasada	jue 29/02/24	NOD	0%
IED CAMPESTRE JAIME GARZON - RAIZAL	0%	36%	Retrasada	vie 1/03/24	NOD	0%
RURAL DE LAS MERCEDES	10%	36%	Retrasada	vie 1/03/24	vie 1/03/24	0%

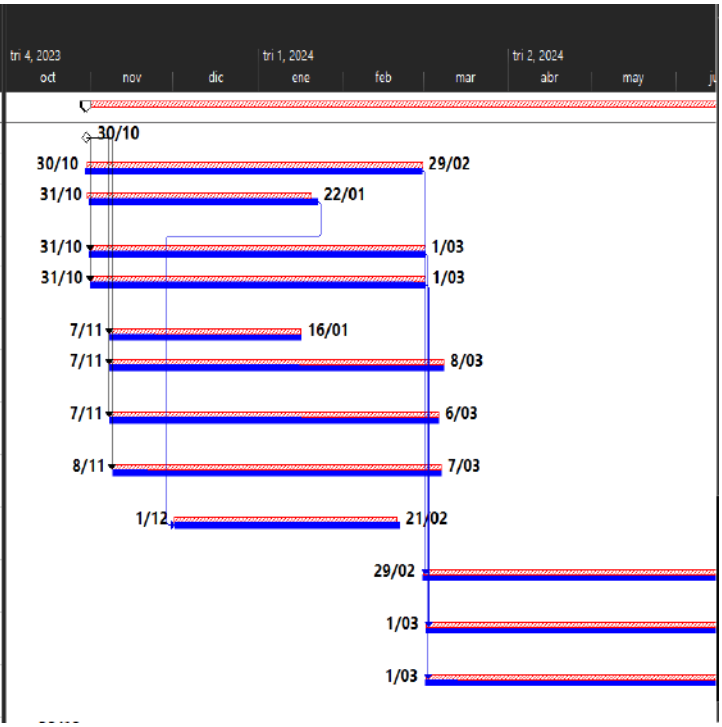

PROGRAMACIONES

COLEGIO (SEDE)	Fecha de inicio	Fecha real de inicio	Días de retraso
COLEGIO (SEDE)	30/10/2023		
Usminia sede B	30/10/2023	30/10/2023	0
Fernando Gonzaléz Ochoa	31/10/2023	15/11/2023	-15
Diego Cuellar sede B	31/10/2023	7/11/2023	-7
Chuniza	31/10/2023	15/11/2023	-15
DILE Sumapaz	7/11/2023	7/04/2024	-152
IED Campestres Jaime Garzón - Auras	7/11/2023	17/12/2023	-40
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	7/11/2023	20/11/2023	-13
Vivienda docente - Campamento	8/11/2023	3/01/2024	-56
Diego Cuellar sede A	1/12/2023	11/12/2023	-10
San José de Usme - Don Bosco 2	29/02/2024		
IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	1/03/2024		
Rural Las Mercedes	1/03/2024	8/04/2024	-38
Emergencias		4/01/2024	62

Nota: El constructor solicito la liberación de espacios para intervenir en la sede El Toldo, la cual fue remitia a la SED y esta a su vez al rector del colegio. Mediante el comunicado S-2024-77846, la SED envía la respuesta del rector, la cual no aprueba dicha liberación; por lo cual, la supervisión del contrato solicita no tener en cuenta en la programación en este informe las sedes Erasmo Valencia, Toldo, Tunal Alto y Diego C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA
FIRMA CB INGENIEROS

NUMERO	NOMBRE	CARGO	PROCEDENCIA	INGRESO	RETIRO	PAZ Y SALVO	OBSERVACION
1	CRISTIAN CAMILO BARRAGAN PEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA II	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
2	ANDRES FELIPE MACKENZIE FUENTES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
3	DIANA MAYERLY ARGUELLO ROMERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA I	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
4	MANUEL RICARDO GOMEZ CARRILLO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
5	BIBIANA ANDREA JIMENEZ CHAPARRO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
6	BIBIANA ANDREA JIMENEZ CHAPARRO	ESPECIALISTA SST	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
7	CESAR AUGUSTO BOLAÑO TAFUR	ESPECIALISTA ELECTRICO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
8	NELSON FELIPE MORENO CARDONA	ESPECIALISTA HIDRAULICO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
9	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	PROF. COSTOS Y PRESUPUESTOS	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
10	OSCAR CAMILO GOMEZ LOPEZ	ABOGADO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
11	CINDY PAOLA DIAZ VALENCIA	TECNICO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
12	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR I	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
13	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR II	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
PERSONAL COMPLEMENTARIO QUE NO SE INCLUYE DENTRO DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO							
14	CINDY MILENA DUARTE VELANDIA	APOYO SST	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
15	CRISTIAN FERNEY LESMES VACA	AUXILIAR	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
16	MANUEL ANTONIO MUÑOZ CRUZ	INSPECTOR	BOGOTA D.C	27/11/2023	N/A	N/A	

TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 16

Observaciones: Durante el periodo del presente informe no se presentaron novedades con el personal de interventoria.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

MAQUINARIA - EQUIPOS - VEHICULOS DE OBRA

PERIODO DEL INFORME:	SEMANAL No. 24
SEMANA REPORTADA: lunes, 8 de abril de 2024	AL domingo, 14 de abril de 2024

COLEGIO USMINIA SEDE B

			SEMANAL No. 24						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			08	09	10	11	12	13	14
1	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	D	D	D	D	D	D	
2	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	X	X	X	X	X	X	
3	PULIDORA 9"	BOSCH - 00094	X	X	X	X	X	X	
4	PULIDORA 9"	BOSCH 90B - 66200134	X	X	X	X	X	X	
5	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	MEINENG - 3016	D	D	D	D	D	D	
6	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	D	D	D	D	D	D	
7	SOLDADORA	KIN 200M - BAUKER	T	T	T	T	T	T	
8	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	CINBELL	X	X	X	X	X	X	
10	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	T	T	T	T	T	T	
11	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	T	T	T	T	T	T	

COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA

			SEMANAL No. 24						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			08	09	10	11	12	13	14
1	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
3	VOLQUETA	PLACA: SQB000 COLOR: NARANJA	X	X	X	X	X	X	
4	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
5	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
6	CANGURO APISONADOR	H 80 - HAUSSEN	X	X	X	X	X	X	
7	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
8	CAMIÓN MEZCLADOR	WNW141 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
9	CAMIÓN HORMIGONERO	WCU234 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
10	BOMBA PARA HORMIGÓN	TK 40 AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
11	SOPLETE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
12	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	N/A	N/A	X	X	X	X	
13	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
14	TRONZADORA	DEWALT M9355	X	X	X	X	X	X	
15	SOLDADORA	FOX WELD	X	X	X	X	X	X	
16	HIDROLAVADORA	2	X	X	X	X	X	X	
17	PULIDORA	MAKITA 4"	X	X	X	X	X	X	
18	PULIDORA	DEWALT 4"	X	X	X	X	X	X	
19	TALADRO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
20	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
21	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
22	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
23	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
24	ACOLILLADORA	DEWALT - 247516	X	T	T	X	X	X	
25	LIJADORA	DEWALT - DW317	X	T	T	X	X	X	

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B									
			SEMANAL No.			24			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			08	09	10	11	12	13	14
1	COMPRESOR 2 HP	BAUKER - 002	T	T	T	T	T	T	
2	MARTILLO PERFORADOR	TA 16386 - DEWALT	D	D	D	D	D	D	
3	SOLDADORA INVERSOR	KMIG1802 -UBERMAN	D	D	D	D	D	D	
4	TALADRO ROTOMARTILLO	D25133-B3 - DEWALT	T	T	T	T	T	T	
5	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	T	T	T	T	T	T	
6	TRONZADORA	232000249 12/2022 - BOSCH	D	D	D	D	D	D	
7	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	T	T	T	T	T	T	
8	PULVERIZADOR DE PINTURA SIN AIRE	WAGNER CONTROL PRO 190 HEA	X	X	X	X	X	X	
9	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	T	T	T	T	T	T	
10	PULIDORA	CINBELL	T	T	T	T	T	T	
11	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	T	T	T	T	T	T	
12	HIDROLAVADORA	BLACK DECKER 7185	X	X	X	X	X	X	
13	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	T	T	T	T	T	T	
14	VIBROCOMPACTADOR	01MASALTA	T	T	T	T	T	T	
15	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	T	T	T	T	T	T	
COLEGIO CHUNIZA									
			SEMANAL No.			24			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			08	09	10	11	12	13	14
1	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
2	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
3	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
4	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
5	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	MTCOD1029	X	X	X	X	X	X	
6	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
7	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
8	EQUIPO DE SOLDADORA	LINCOLN ELECTRIC MMA35O	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	001 4"	X	X	X	X	X	X	
10	COMPRESOR	DEWALT DWFP55126	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR DE AIRE	PRETUL 20L 135PSI	X	X	X	X	X	X	
13	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
14	APISONADOR CANGURO	KAMA DIESEL KM173FKK210909088	X	X	X	X	X	X	
14	SONDA ELECTRICA	LYCTOOLS	X	X	X	X	X	I	
LA UNIÓN SUMAPAZ									
			SEMANAL No.			24			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			08	09	10	11	12	13	14
1	PLANTA ELECTRICA	C08000-GG-AE	D	D	D	D	D	D	
2	TALADRO ROTOMARTILLO	DEWALT TAI5386	D	D	D	D	D	D	
3	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	I	X	I	X	X	
4	TROMPO MEZCLADOR	001 - COLOR NARANJA	T	T	T	T	T	T	
5	CANGURO APISONADOR	CORMAG - 20A300	T	T	T	T	T	T	
6	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT	D	D	D	D	D	D	
7	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	D	D	D	D	D	D	
8	EQUIPO DE SOLDADURA	NO SE TIENE INFORMACIÓN	D	D	D	D	D	D	
9	COMPRESOR PARA PINTURA	2020121301 BM-24 L	D	D	D	D	D	D	
10	BRILLADORA INDUSTRIAL	ELECTROLUX 137-402	D	D	D	D	D	T	T
AURAS - SUMAPAZ									
			SEMANAL No.			24			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			08	09	10	11	12	13	14
1	COMPRESOR PARA PINTURA	SERIAL H112200639 MARCA KARSON	D	D	D	D	D	D	
2	EQUIPO DE SOLDADURA	KIN160M BAUKER	D	D	D	D	D	D	
3	EQUIPO DE SOLDADORA	BAUKER - IEC60974-1:20212	D	D	D	D	D	D	
COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A									
			SEMANAL No.			24			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			08	09	10	11	12	13	14
1	SOPLETE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	

2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	X	X	X	X	X	X	
4	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
5	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
6	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	X	X	
7	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	X	X	
8	SOLDADORA	UBERMANN KMIG1802	X	X	X	X	X	X	
9	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
10	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
11	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
12	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE									
			SEMANAL No.			**24**			
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA			**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	I	X	X	X	X	
2									
3									
4									
5									
RURAL LAS MERCEDES									
			SEMANAL No.			**24**			
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA			**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	I	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	I	X	I	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	D	D	D	D	D	D	
4	TALADRO DEMOLEDOR	ROTARY HAMMER CDS-32H-A	D	D	D	D	D	D	
5	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	T	T	T	T	T	T	
INTERVENTORIA									
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA INTERVENTORIA			**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**

OBSERVACIÓN:	OBSERVACIONES: N/A
X: RETIRADA DE OBRA	
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA	
V: VARADO	
T: TRABAJANDO	
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA	

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **DEL** lunes, 08-abr.-24 **AL** domingo, 14-abr.-24

SEMANA REPORTADA:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

Usminia sede B

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	8/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	9/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	10/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	11/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	12/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	13/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	14/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Fernando Gonzaléz Ochoa

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	8/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	9/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	10/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	11/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	12/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	13/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	14/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Diego Cuellar sede B

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	8/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	9/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	10/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	11/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	12/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	13/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	14/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A

OBSERVACIÓN :

Chuniza

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	8/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	9/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	10/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	11/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	12/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	13/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	14/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A

OBSERVACIÓN :

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	8/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	9/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	10/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	11/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	12/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	13/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	14/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Diego Cuellar sede A

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	8/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	9/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	10/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	11/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	12/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	13/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	14/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

IED Campestres Jaime Garzón - Auras

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	8/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	9/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	10/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	11/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	12/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	13/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	14/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Vivienda docente - Campamento

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	8/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	9/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	10/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	11/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	12/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	13/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	14/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

DILE Sumapaz

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	8/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	9/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	10/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	11/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	12/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	13/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	14/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

INGENIEROS S.A.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	VERSIÓN	1
	Fecha	2/12/2022

UNIDAD EJECUTORA:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE**			**FECHA:**	22/04/2024
Semana No.	**25**	**Del :**	lunes, 15 de abril de 2024	AL:	domingo, 21 de abril de 2024
Plazo Total		240	días		
Plazo Transcurrido		175			
Nombre del Supervisor :	Ing. Ferney Jiménez Neira				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	3,00%	72,00%	**(%) Ejecutado**	1,00%	53,00%
Valor programado ($)	$ 301.448.910,93	$ 5.220.323.521,51	**Valor ejecutado ($)**	$ 5.000.000,00	$ 2.544.747.313,36
			Evaluación	-19,00%	Atraso en la ejecución

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CLARIDAD	**Contratista:**	CB INGENIEROS S.A.S
Contrato No:	CO1.PCCNTR.5305904	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.5313332
Valor del contrato:	$ 7.608.734.174	**Valor del contrato:**	$ 504.428.924,00
Plazo:	8 meses	**Plazo:**	9 meses
Fecha de iniciación:	30 de octubre de 2023	**Fecha de iniciación:**	19 de octubre de 2023
Fecha de terminación:	29 de junio de 2024	**Fecha de terminación:**	18 de julio de 2024
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Plazo final:	N/A	**Plazo final:**	N/A
Fecha de vencimiento final:	N/A	**Fecha de vencimiento final:**	N/A
Fecha de suspensión Nº 2:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 2:**	N/A
Suspensión N. 3	N/A	**Suspensión N. 3**	N/A
Fecha reinicio N. 2	N/A	**Fecha reinicio N. 2**	N/A
Prórroga Nº 2:	N/A	**Prórroga Nº 2:**	N/A
Plazo final:	N/A	**Plazo final:**	N/A
Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A	**Nueva Fecha de vencimiento final:**	N/A
Valor total contrato	$ 7.608.734.174	**Valor actualizado contrato**	$ 504.428.924

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	Usminia sede B	535	Usme	$ 349.948.209,00	100,00%	100,00%	Culminación de subsanación de observaciones	Culminación de subsanación de observaciones
2	Fernando Gonzaléz Ochoa	580	Usme	$ 353.157.411,00	100,00%	95,00%	De los compromisos fijados en el acta de entrega parcial: ajuste de puertas del patio de preescolar	Culminación de cambio de bombas
3	Diego Cuellar sede B	541	Usme	$ 542.722.842,00	100,00%	95,00%	Instalaciones eléctricas: instalación de paneles, cableado Pintura de muros internos en boque de aulas (4). Picada de muros de fachada. Pañete de muros de fachada. Pintura de muros de fachada. Instalación de puertas en aulas (4). Instalación de flauta de los bajantes del bloque administración y bloque 1 (aulas). Desmonte de ventas en bloque aulas (4). Instalación marcos de estructura metálica para ventanas del bloque aulas (4).	Instalaciones eléctricas, detalles de pintura, entre otros
4	Chuniza	512	Usme	$ 236.826.369,00	100,00%	100,00%	De las observaciones realizadas por interventoría: cambio parcial de rejillas de cárcamos.	Instalación de rejillas en cárcamos, observaciones del acta parcial
5	DILE Sumapaz	2010	Sumapaz	$ 15.242.011,00	100,00%	25,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Mantenimiento de pozo, instalación de piso podotacktil
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	2006	Sumapaz	$ 750.000.000,00	100,00%	62,00%	Desmonte de teja de bloque laboratorio Instalación de teja en bloque laboratorio y bloque administración. Pintura y estuco en muros internos en bloque biblioteca. Desmonte de luminarias en bloque laboratorio. Instalaciones eléctricas: instalación de tubería EMT, instalación de cajas metálicas, cableado y acometida principal.	Pintura, instalación de caballete, instalaciones eléctricas, entre otros
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	2022	Sumapaz	$ 811.831.873,00	100,00%	56,00%	Cuchillas en mampostería en bloque emisora. Soldadura de estructura metálica en el bloque emisora. Atención de fuga de agua en baño de rectoría. Destronque de piso de baños niños y niñas.	Aguas lluvias, intervención en vivienda docente, instalaciones eléctricas, entre otras

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

FECHA: 22/04/2024

Semana No. 25 **Del :** lunes, 15 de abril de 2024 AL: domingo, 21 de abril de 2024

Plazo Total 240 días

8	Vivienda docente - Campamento	570	Usme	$ 411.446.316,00	100,00%	12,00%	Excavación manual, figurado de acero y fundida de dados de estructura metálica Instalación de estructura metálica para cubierta.	Suministro e instalación de estructura metálica, instalaciones eléctricas hidrosanitarias, entre otras
9	Diego Cuellar sede A	576	Usme	$ 253.419.631,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Detalles de la entrega física de la obra
10	San José de Usme - Don Bosco 2	567	Usme	$ 635.000.000,00	43,00%	0,00%	No han iniciado actividades	Cerramiento, demolición, desmonte, entre otras.
11	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	2003	Sumapaz	$ 210.861.638,00	42,00%	0,00%	No han iniciado actividades	Cerramiento, demolición, desmonte, entre otras.
12	Rural Las Mercedes	534	Usme	$ 447.180.697,00	43,00%	16,00%	Demolición de placa de patio. Excavación manual en patio.	Cerramiento, demolición, desmonte, entre otras.
13	Emergencias	E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A:la emergencia fue atendida a cabalidad.	
		E			100,00%	98,00%	San Juan: durante la semana no se realizaron actividades.	Emboquillada de los dos sanitarios que se instalaron, pintura de las chapas que se instalaron, pegada de vidrio en baño de profesores, pegada de vidrio baño de niños, instalación de manto y colocar las dos tapas de los inodoros
		E			100,00%	100,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.	
		E			100,00%	100,00%	Nazareth: durante la semana no se realizaron actividades.	
20		E			100,00%	95,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.	Revisión de la rejilla del sifon y punto eléctrico de la nevera.
21		E			100,00%	95,00%	Auras: pintura en aula	Ajuste de puertas
22		E			100,00%	100,00%	Betania: durante la semana no se realizaron actividades.	
24		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede B: instalación de enchape	
		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A: reparación de fuga de agua en placa	

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

Revisión documentos de ingreso del personal (Seguridad social vigente, consulta de antecedentes, examenes medicos de ingreso).
Remisión de base de datos a la SED de aprobación de personal para ingreso a los colegios.
Verificación e inspección cumplimiento de normas SST, referente a inducciones, notificación de riesgos, charlas, pausas activas, entrega de Epps, firma de permisos de trabajo.
Inspección señalización implementada en frentes de trabajo e instalación de cerramiento de obra.
Inspección punto de hidratación para el personal, en cada uno de los colegios.
Verificación entrega de dotación al personal.
Revisión informes de gestión SST semanal y mensual.
Inspección de actos y condiciones inseguras y medidas de seguridad implementadas.
A la fecha no se ha podido dar aprobación al informe mensual del mes de enero de 2024, del contratista, debido que carece de anexos que soporten la gestión realizada.
A la fecha el contratista ha hecho entrega parcial de planillas de seguridad social del personal minimo requerido.

Incidentes y/o accidentes:
Durante la semana no se presento accidentes, ni incidentes, ni daños a terceros.

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Seguimiento y control de la programación de obra.
Remisiòn de solicitudes al constructor.
Apertura de presunto incumplimiento al contratista de obra.
Acta de comité de obra.

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	30 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023	$ 69.413.115,00
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	$ 482.429.484,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	$ 1.022.204.883,00
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	$ 867.459.592,00
5		
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$**	**2.441.507.074,00**

AVANCE FINANCIERO	
Valor Total Contrato Obra	
$ 7.608.734.174,00	
Valor facturado Contrato Obra	
$ 2.441.507.074,00	
% Avance facturado Acumulado	
32%	
Saldo por Facturar	
$ 5.167.227.100,00	

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	10 de octubre d e2023 a 29 de noviembre de 2023	$ 4.539.860,00
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	$ 32.031.237,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	$ 67.795.247,00

AVANCE FINANCIERO
Valor Total Contrato Interventoría
$ 504.428.924,00
Valor facturado Contrato Interventoría

UNIDAD EJECUTORA: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

FECHA: 22/04/2024


Semana No. **25** **Del :** lunes, 15 de abril de 2024 AL: domingo, 21 de abril de 2024

Plazo Total 240 días

4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	$ 57.504.897,00		$ 161.871.241,00
5				**% Avance facturado Acumulado**
6				32%
7				**Saldo por Facturar**
8				$ 342.557.683,00
Total Acumulado	**$**	**161.871.241,00**		

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. La relación de la programación presentada en el capitulo "EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES", corresponden al avance de las actividades teniendo en cuenta los recursos necesarios para su ejecución.



FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Ándres Felipe Mackenzie Fuentes

BALANCE FINANCIERO					
SEMANA No.	25	DEL	15-abr-24	AL	21-abr-24

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	$ 349.948.209,00	$ 362.904.046,35	$ 12.955.837,35
2	Fernando Gonzaléz Ochoa		Usme	$ 353.157.411,00	$ 351.430.683,39	-$ 1.726.727,61
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	$ 542.722.842,00	$ 712.176.519,23	$ 169.453.677,23
4	Chuniza		Usme	$ 236.826.369,00	$ 330.206.750,54	$ 93.380.381,54
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	$ 15.242.011,00	$ 15.242.011,00	$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	$ 750.000.000,00	$ 628.487.851,57	-$ 121.512.148,43
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	$ 811.831.873,00	$ 840.105.168,56	$ 28.273.295,56
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	$ 411.446.316,00	$ 411.446.316,00	$ 0,00
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 253.419.631,00	$ 140.173.912,66	-$ 113.245.718,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	$ 799.914.269,00	$ 799.914.269,00	$ 0,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	$ 344.210.600,00	$ 344.210.600,00	$ 0,00
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	$ 337.709.778,00	$ 337.709.778,00	$ 0,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	$ 635.000.000,00	$ 511.765.332,00	-$ 123.234.668,00
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	$ 210.861.638,00	$ 210.861.638,00	$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	$ 447.180.697,00	$ 447.180.697,00	$ 0,00
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	$ 599.909.029,00	$ 599.909.029,00	$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 7.099.380.673,00**	**$ 7.043.724.602,29**	**-$ 55.656.070,71**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 5.198.994,76	$ 4.708.361,95	-$ 490.632,81
2	San Juan		Sumapaz	$ 5.379.289,20	$ 4.568.398,72	-$ 810.890,48
3	IED Jaime Garzón sede Tabaco		Sumapaz	$ 7.539.117,09	$ 7.539.117,09	$ 0,00
4	IED Jaime Garzón sede Nazareth		Sumapaz	$ 4.431.089,03	$ 4.431.089,03	$ 0,00
5	IED Juan de La Cruz Varela sede Tunal Alto		Sumapaz	$ 1.423.309,88	$ 1.423.309,88	$ 0,00
6	Diego Cuellar sede B	B	Usme	$ 45.253.968,69	$ 45.253.968,69	$ 0,00
7	Por definir			$ 439.868.010,35	$ 441.169.533,64	$ 1.301.523,29
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				**$ 509.093.779,00**	**$ 509.093.779,00**	**$ 0,00**

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO	$ 7.608.734.174	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 7.552.818.381
		DIFERENCIA	$ 55.915.793

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado el balance del presupuesto de los colegios Chuniza, La Unión, Auras, Diego A, Diego B, Fernando González Ochoa y Usminia, en aras de equilibrar el contrato de obra, sin embargo, este no es definitivo, por lo cual, en los próximos informes continuaremos presentando el balance de estos y demás colegios.

En cuanto a las emergencias, los balances fueron ajustados conforme a la necesidad de cada frente.


CONTROL DE PROGRAMACIÓN
GRUPO 5

BOGOTÁ

SEMANA No.	25	DEL	15-abr-24	AL	21-abr-24

PROGRAMACIÓN DE OBRA

	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
				PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	**$ 7.099.380.673**	**240,00**	**73,53%**	**35,84%**	**-37,69%**	**86,03**	**176,48**	**-90,45**
1	Usminia sede B	$ 349.948.209	92,00	100,00%	93,05%	-6,95%	85,60	92,00	-6,40
2	Fernando Gonzaléz Ochoa	$ 353.157.411	92,00	100,00%	81,60%	-18,40%	75,08	92,00	-16,92
3	Diego Cuellar sede B	$ 542.722.842	60,00	100,00%	124,97%	24,97%	74,98	60,00	14,98
4	Chuniza	$ 236.826.369	92,00	100,00%	138,63%	38,63%	127,54	92,00	35,54
5	DILE Sumapaz	$ 15.242.011	50,00	100,00%	32,80%	-67,20%	16,40	50,00	-33,60
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	$ 750.000.000	92,00	100,00%	50,21%	-49,79%	46,19	92,00	-45,81
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	$ 811.831.873	90,00	100,00%	47,42%	-52,57%	42,68	90,00	-47,32
8	Vivienda docente - Campamento	$ 411.446.316	90,00	100,00%	5,41%	-94,59%	4,87	90,00	-85,13
9	Diego Cuellar sede A	$ 253.419.631	60,00	100,00%	53,49%	-46,51%	32,09	60,00	-27,91
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	$ 799.914.269	90,00	77,73%	0,00%	-77,73%	0,00	69,96	-69,96
11	Diego Cuellar sede C	$ 344.210.600	90,00	25,11%	0,00%	-25,11%	0,00	22,60	-22,60
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	$ 337.709.778	92,00	17,57%	0,00%	-17,57%	0,00	16,16	-16,16
13	San José de Usme - Don Bosco 2	$ 635.000.000	90,00	60,44%	0,00%	-60,44%	0,00	54,40	-54,40
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	$ 210.861.638	89,00	20,17%	0,00%	-20,17%	0,00	17,95	-17,95
15	Rural Las Mercedes	$ 447.180.697	89,00	5,32%	0,00%	-5,32%	0,00	4,73	-4,73
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	$ 599.909.029	86,00	40,18%	0,00%	-40,18%	0,00	34,55	-34,55
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
	VALOR PRESUPUESTADO	**$ 7.099.380.673**							

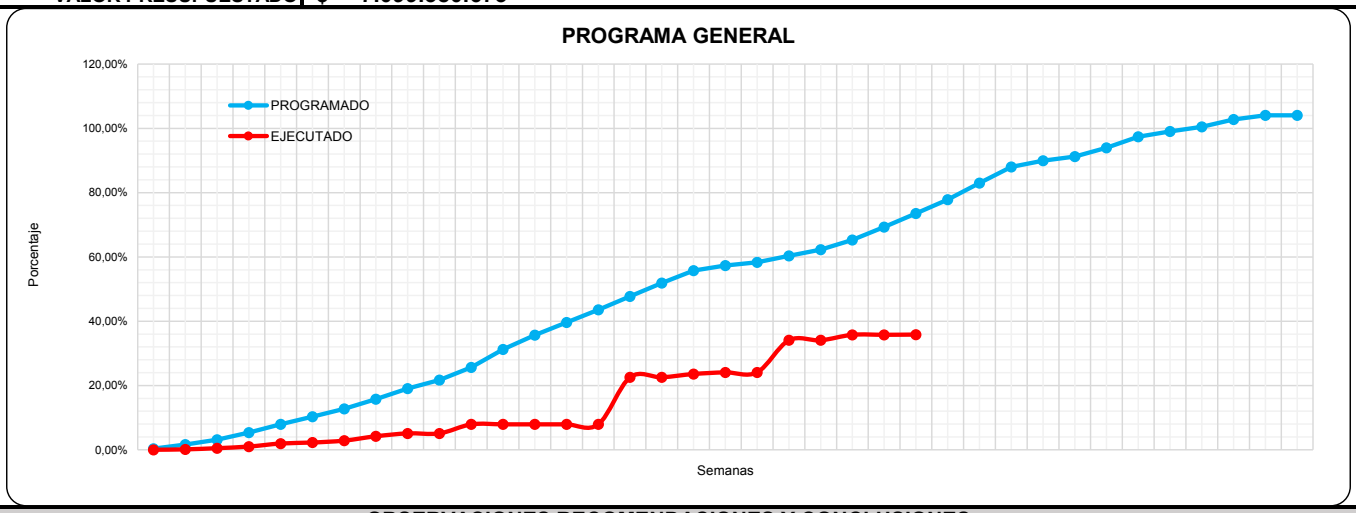

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Los porcentajes presentados en el informe gráfico están relacionados con el flujjo de caja de cada colegio.

Los porcentajes de ejecutado acumulado son acordes con la descripción de los ítems del presupuesto, es decir, abarcan integradamente el suministro y la instalación y solo así son contemplados para la relación en los flujos de caja.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

PERSONAL CONTRATO OBRA
FIRMA CONSORCIO CLARIDAD

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA

LISTADO PERSONAL CONTRATO OBRA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE IDENTIFICACIO	TELEFONO	CARGO	EPS	ARL	caja de compensacion	FPC	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA	80222352	3112783471	DIRECTOR DE OBRA	SANIDAD PN	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
2	GUILLERMO ALBERTO VELANDIA CORDOBA	19418347	3134047300	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	N/A
3	DAVID ESTEBAN NULEZ CANO	1013644565	3053961793	RESIDENTE DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	8/01/2024
4	JULIO OSWALDO TORRES SUAREZ	79458867	3002066044	ASESOR ESTRUCTURAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
5	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	AESOR AMBIENTAL	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/04/2024
6	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	ASESOR SST	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/04/2024
7	JORGE ERNESTO CASTIBLANCO MARTINEZ	10073655	3134227162	ASESOR EN REDES ELECTRICAS	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
8	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	26593081	3125212497	ASESOR REDES HIDROSANITARIAS	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
9	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	79450429	3134412819	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
10	JULY PAOLA OVALLE DIAZ	1026594061	3203720883	TECNICO SST	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	28/12/2023
11	NUBIA SANTAMARIA SANTAMARIA	53037373	3203655707	TECNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	4/11/2023
12	ROBERTO ROSAS CONDIA	79499052	3115698784	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	6/01/2024
13	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	1033749854	3106139631	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	6/01/2024
14	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63394516	3222953159	MAESTRO DE OBRA	ALIANSALUD	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
15	ORLANDO ROSAS CONDIA	19442965	3115181794	MAESTRO DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	N/A	PORVENIR	30/10/2023	N/A
16	LAURA YERALDINE RAMIREZ OCAMPO	1006118750	3124514525	INSPECTORA SST	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/12/2023	N/A
17	JOHANA KATERINE MARTINEZ VARELA	1069739376	3125456995	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	10/01/2024	N/A
18	LEONARDO TORRES LARA	88279853	3112783471	RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	20/02/2024	N/A
19	NIDIAN YONETH AREVALO ROJAS	52834633	3204596676	ASESORA SST	SIN INFORMACIÓN	SURA	SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN	17/04/2024	N/A
	1. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO USMINIA SEDE B Y DIEGO MONTAÑA SEDE A									
18	YITZA DANIELA CABALLERO CASTILLO	1.014.262.805	3144064083	INGENIERA DE APOYO	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	8/01/2024
19	LUIS FELIPE RONCANCIO	19.293.563	3126505053	MAESTRO	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
20	JHON DEIBY ROA	1.006.321.288	3026681420	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	11/11/2023
21	JOSE DOMINGO SEPULVEDA MARQUEZ	19.478.962	3132806995	OFICIAL	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
22	LUIS ENRIQUE GALAN RAMIREZ	79.243.511	3106159832	G. OPERACIONES	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	28/02/2024
23	RODOLFO CORTES RICO	79.495.028	3138709928	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	N/A
24	LUZ ELENA ROMERO LEE	39564668	3003965967	APOYO SST	FOMAG	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	31/10/2023	31/01/2024
25	LUIS EDUARDO HUERTAS	19376454	3132677144	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	9/11/2023	N/A
26	DANIEL ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	1015458062	3022256611	INGENIERO DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/11/2023	31/01/2024
27	DANIELA RODRIGUEZ NAVARRETE	1026304071	3057899636	INSPECTOR SST DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	21/11/2023	29/11/2023
28	JAMER ENRIQUE ACOSTA VANEGAS	1038113875	3125478958	OPERARIO DE MONTAJES	FAMISANAR	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	21/11/2023	28/02/2024
29	YOISER ANTONIO VEGA ACOSTA	1007713132	3012454555	AUXILIAR DE OBRA	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/11/2023	30/12/2023
30	WILSON VANEGAS RAMOS	1049932351	3057925465	SOLDADOR	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	30/11/2023	28/02/2024
31	ALBERTO MOJICA	13460675	3021455888	OFICIAL DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/01/2024	31/01/2024
32	HECTOR FABIO OCAMPO PINTO	79370662	3047899875	OFICIAL ELECTRICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	31/03/2024
33	JHON FREDDY QUINTERO BUSTAMANTE	80374914	3052563251	CONTRATISTA ELECTRICO	COMPENSAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
34	SEBASTIAN DAVID GIL SOLAQUE	1024600603	3012456365	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
35	KEVIN DAILUBER RODRIGUEZ OROZCO	1024528977	3102458579	APOYO INSPECTOR DE OBRA	EPS COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	5/02/2024	N/A
36	CHRISTIAN JOSE ARIAS RAMIREZ	1079034445	3145789869	INSTALADOR DE CUBIERTA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
37	JORGE LUIS ALVARADO TAPIA	1063960598	3102354569	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
38	LUIS ENRIQUE CARRILLO PEREZ	6804864	3057924540	INSTALADOR DE CUBIERTAS	ASMET SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/03/2024	N/A
	2. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO CHUNIZA Y FERNANDO GONZALÉZ OCHOA									
36	JHYSMARTH LEAO ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000788547	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/10/2023	N/A
37	KEVIN STIVEN HERNANDEZ PARRA	1027535995	3042182761	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	17/11/2023	N/A
38	FREDY ALEXANDER AMADO SANCHEZ	1049614186	3016526365	AUXILIAR DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLFONDOS	21/11/2023	2/01/2024
39	EDUARD GIOVANNY TALERO MOLINA	1022998642	3057924546	CONDUCTOR VOLQUETA	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
40	HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA	79669915	3014568589	CONDUCTOR VOLQUETA	SANITAS	SURA	CAFAM	PORVENIR	20/11/2023	N/A
41	JHOSYMARTH ANDREE ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000792895	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	15/11/2023	N/A
42	EDWIN ALEXANDER MOLINA GUTIERREZ	1097723887	3102569632	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	15/11/2023	30/12/2023
43	GABRIEL FELIPE HERRERA SANCHEZ	1031183292	3054875525	PINTOR SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	9/01/2024	N/A
44	MILTON EDUARDO CANTOR URIBE	1012422520	3102544899	SOLDADOR	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	10/01/2024	31/01/2024
45	OSCAR FABIAN FORERO GONZALEZ	14011756	3057924658	SOLDADOR	FAMISANAR	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	10/01/2024	N/A
46	YIDUAR STIVEN MARTINEZ CERQUERA	1006158996	3102544896	SOLDADOR	SALUDTOTAL	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	N/A
47	JHON FREDY GOMEZ RUIZ	93412459	3057898744	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	12/01/2024	30/12/2023
48	OSCAR FABIAN MANCIPE CALLEJAS	79989407	3054878777	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	29/01/2024	N/A
49	RUBEN DARIO OSPINO MENDOZA	73476370	3156988548	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	29/01/2024	N/A
50	DANIEL FELIPE ROJAS GOMEZ	1003518255	3102456585	OPERARIO	SANITAS	SURA	CAFAM	PROTECCION	1/02/2024	11/03/2024
51	JORGE ENRIQUE MURCIA CARVAJAL	83231760	3125412556	OFICIAL	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	2/02/2024	N/A
52	ARCADIO CARVAJAL CANO	83232849	3112414554	OFICIAL	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	COLFONDOS	2/02/2024	N/A
53	JOHN SEBASTIAN RODRIGUEZ SANTOS	1022421246	3114111221	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVEMIR	5/02/2024	N/A
54	OSWALDO SILVA ARIAS	1026264278	3114587879	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	20/02/2024	N/A
55	BRAYAN MANUEL GONZALEZ MORENO	1070019081	3147957758	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLFONDOS	23/03/2024	N/A
56	EDWAR STIVEN GONZALEZ MORENO	1003527513	3165587890	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	23/03/2024	N/A
57	WILLIAM DUVAN GALINDO PARRA	1070010754	3008095677	INGENIERO	EPS COMPENSAR	SURA	NO ANEXA	PROTECCIÓN	23/03/2024	N/A

3. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B										
54	CARLOS ALBERTO QUINTERO CASTRO	1012357647	3133398783	JEFE DE PRODUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	N/A
55	HUMBERTO QUINTERO CASTRO	6031624	3107541181	PINTOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	30/12/2023
56	JOSE DEL CARMEN QUINTERO CASTRO	1108150056	3134656898	AYUDANTE AVANZADO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	6/11/2023	31/03/2024
57	ANDRES LANCHEROS SANCHEZ	1.033.692.581	3106139633	CONTRATISTA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	COLFONDOS	15/11/2023	N/A
58	NORMA CONSTANZA CHILATRA RODRIGUEZ	52.200.992	3102456365	ENCARGADO DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
59	JUAN DAVID GRANADOS CARO	1033688532	3103113125	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	12/12/2023	15/03/2024
60	BRAYAN STEVEN LOPEZ TRUJILLO	1000792613	3018968584	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	14/12/2023	N/A
61	MAICOL ANTONIO VELASQUEZ RACERO	1000456168	3106254878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	19/12/2023	N/A
62	GINO SAMIR OBANDO	16929250	3014857889	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	19/12/2023	N/A
63	ARNOL DAVID QUEJADA MOSQUERA	1003969572	3105897878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	30/12/2023
64	DAGOBERTO PALACIOS MOSQUERA	80170132	3112254565	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
65	DAVINSON ORTEGA ECHAVEZ	1082370985	3102569786	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	15/01/2024
66	HERNAN ENRIQUE BARRIOS CAMACHO	1079884516	3104878589	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
67	MAURICIO JOSE PEÑA DE LA CRUZ	1079885010	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/12/2023	30/12/2023
68	RODRIGO ANDRES VELASQUEZ RACERO	1001199012	3112589897	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
69	RONAL JOSE VALDEZ MANCILLA	19600457	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
70	SERGIO ALEXANDER URREGO OLAYA	1033706865	3125485896	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	28/12/2023	N/A
71	MELISSA LEAL BARRIOS	1019149140	3102366569	AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	16/01/2024	3/03/2024
72	YEISON STIBEN RODRIGUEZ LINARES	1077320160	3057414144	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	16/01/2024	29/02/2024
73	ANDERSON PALACIOS CORDOBA	1193235465	3136988588	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/01/2024	N/A
74	CARLOS DANIEL LEON DIAZ	1000932887	3059877444	AUXILIAR AVANZADO	EPS SURA	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	18/01/2024	N/A
75	DAVID CARRILLO QUIÑONES	1005854583	3154714519	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
76	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA SUAREZ	1024554929	3112033322	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	31/03/2024
77	BRANDON ESTEBAN QUINTERO MUÑOZ	1024592418	3104587888	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	N/A
78	CARLOS ANDRES BALLEN PERDOMO	100335948	3057748926	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/02/2024	N/A
79	WILMER RUIZ HERNANDEZ	1000972780	3202455877	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
80	MICHAEL ESTY GARCIA PINTO	1024601987	3154788999	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
81	CRISTIAN PAVA HERNANDEZ	1024536127	3136598788	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
82	LUIS EINER PAVA HERNANDEZ	1024495430	3124122129	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
83	JAIR ESNEIDER CAMACHO PADILLA	1122124132	3124587488	TECNICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	N/A
84	CARLOS JOSE BUELVAS MARTINEZ	1101446456	3054899663	TECNICO	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	N/A
85	ADRIAN MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ	11443863	3102545463	APOYO RESIDENTE DE OBRA	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	12/04/2024	N/A
86	CESAR DAVID ARROYO CAPACHERO	1068819836	3079877412	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	16/04/2024	NA
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ										
87	PAULO CESAR JIMENEZ PINEDA	9.398.481	3057924540	MAESTRO DE OBRA DE APOYO	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLPENSIONES	21/11/2023	N/A
88	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1.012.349.430	3054568584	INSPECTOR DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	21/11/2023	N/A
89	WILMAN HURTADO PALACIOS	1.022.932.247	3202545654	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	24/11/2023	N/A
90	JOSE LUIS ARGOTY ORTIZ	1000780687	3054898587	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/11/2023
91	BRAYAN ALONSO OSORIO REY	1193577927	3154858785	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/12/2023
92	TIBER ALEXANDER PINCHAO SALAMANCA	80065344	3059872627	MAESTRO	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	28/11/2023	31/01/2024
93	ANGELO STYBEN PINCHAO CARREÑO	1023027952	3059872627	AYUDANTE DE OBRA	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	PORVENIR	26/12/2023	30/12/2023
94	WILMAN HURTADO PALACIOS	1022932247	3015687844	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	31/01/2024
95	FELIX DE JESUS CAVADIAS URANGO	1003212733	3014596897	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	30/12/2023
96	EDUWIN ALVEIRO SANCHEZ MORA	3172104	3214122115	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/11/2023	30/11/2023
97	JHON JAIRO DAZA CABRERA	1024588739	3012544777	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
98	RUSBEL FABIAN GARAVITO YATE	80730583	3157899698	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
99	JOHN ALEXANDER QUINTERO CIFUENTES	80209937	3014577496	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
100	EDINSON BUSTOS OVIEDO	14478587	3215625522	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
101	DIEGO FERNANDO QUINTERO CIFUENTES	80213189	3102544418	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	6/12/2023	N/A
102	CARLOS EDUARDO FLOR FLOR	1082214776	3125468596	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	14/12/2023	N/A
103	PABLO CESAR JIMENEZ ROSAS	1007420552	3057994888	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	19/12/2023	30/12/2023
104	ERICK LEONARDO RUIZ ROJAS	1024572771	3058796412	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/01/2024	1/02/2024
105	DAVID NICOLAS SOLORZA DIAZ	1110585392	3112415444	APOYO RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	N/A
106	LUIS ANTONIO BARAJAS BARRERA	6768943	3102355241	ENCARGADO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	15/01/2024	28/02/2024
107	YESID BELTRAN AROCA	80810518	3112544547	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
108	VICTOR ZENON SANTAMARIA SANCHEZ	7120569	3058797474	MAESTRO DE APOYO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	N/A
109	BRAYAN CAMILO USMA MUNEVAR	1073684515	3136356999	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
110	WILLIAM ALEXANDER DUEÑAS ARRIGUI	1022947420	3057899885	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/01/2024	28/02/2024
111	JOHN FREDDY PATIÑO DAVILA	80252966	3056987426	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	2/02/2024	28/02/2024
112	JAVIER ROLANDO HERNANDEZ MARTINEZ	1026553072	3129876767	OPERARIO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	7/02/2024	N/A
113	SEBASTIAN ZAPATA TRUJILLO	1023937840	3059882818	AUXILIAR	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	7/02/2024	N/A
114	JUAN CAMILO MEDINA SANCHEZ	1026255495	3054788788	OPERARIO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	13/02/2024	N/A
115	DAVID ALEJANDRO NIETO PEÑA	1012437189	3126955884	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	28/02/2024
116	LUIS JOHNSON GONZALEZ SANABRIA	79868903	3058976458	SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	N/A
117	PEDRO ALONSO ORJUELA DIAZ	1032656115	3157898478	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
118	JONATAN ESTIBEN ORJUELA DIAZ	1032656119	3156989896	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
119	WILLIAM MORALES BEDOYA	80061991	3125487996	OPERARIO	FOSYGA	SURA	N/A	PROTECCIÓN	26/02/2024	N/A
120	OLIVER EDUARDO ORJUELA DIAZ	1032656116	3057998246	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	N/A	PROTECCIÓN	15/03/2024	N/A
121	ROBERTO JAIRO CARABALLO CARCAMO	1050845674		OFICIAL DE OBRA	FAMISANAR	SURA	N/A	PROTECCIÓN	19/04/2024	N/A
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO AURAS - SUMAPAZ										
122	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	1012436533	3101526365	OFICIAL	FAMISANAR	POSITIVA	CAFAM	COLPENSIONES	14/12/2023	30/12/2023
123	WILMAR YATE MARTINEZ	1015992927	3017899898	AYUDANTE DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	14/12/2023	N/A
124	JOHN EDWIN HERRERA DAVILA	79714742	3124125663	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	N/A
125	LEONARDO PULECIO OTAVO	1022929250	3102123221	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	N/A
126	LUIS CARLOS GUERRERO SEPULVEDA	73146615	3102144144	OFICIAL DE PINTURA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	N/A
127	LUIS MANUEL DIAZ	1116376663	3056458871	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
128	JEFERSON ALEXANDER DUQUE TANGARIFE	1000990376	3007845246	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
129	GERMAN EMILIO GONZALEZ OSPINO	1082853834	3002648264	INSTALADOR	COOSALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A

6. LISTADO DE TRABAJADORES VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE										
130	OSCAR TIBADUIZA OCHOA	79217256	3123456575	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/04/2024	N/A
131	LUIS ALEJANDRO PINEDA GARCIA	1104696373	3109875678	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	5/04/2024	N/A
132	HERNALDO ROJAS VELANDIA	79208636	3157656445	OFICIAL DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	5/04/2024	N/A
133	JOSE DAVID SAENZ MEDINA	1075276566	3057898687	AUXILIAR TECNICO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	19/04/2024	N/A
134	GABRIELA HERNANDEZ JIMENEZ	1003802004	3124125748	ANALISTA DE PRODUCCIÓN RESIDENTE	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	19/04/2024	N/A
135	ANDRES AUGUSTO ALVARADO TRIANA	1016008629	3112454141	ANALISTICA DE LOGISTICA Y ALMACEN	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	19/04/2024	N/A
7. LISTADO DE TRABAJADORES RURAL LAS MERCEDES										
136	JOSE LUIS SAENZ TRUJILLO	12134668	3057924540	TECNICO OPERATIVO	FAMISANAR	SURA	PROTECCIÓN	COMFAMILIAR	9/04/2024	N/A
137	HERNAN RIVERA LOZANO	12122361	3057924541	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	FAMISANAR	SURA	COLPENSIONES	COMFAMILIAR	9/04/2024	N/A
TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 141										

Observaciones:

	NOVEDADES		
	INGRESOS	**RETIROS**	
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATUAL	**0**	**2**	El contrastista reporto el retiro de 2 inspectores de obra con fecha del 06 de enero de 2024
COLEGIO USMINIA SEDE B:	0	0	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A:	0	0	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	1	0	Se reporta 1 ingreso
COLEGIO CHUNIZA:	0	0	
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ	0	0	
COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ:	0	0	
COLEGIO AURAS - SUMAPAZ:	0	0	
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE:	3	0	se reporta 3 ingresos
RURAL LAS MERCEDES	2	0	Se reporta 2 ingresos
TOTAL INGRESOS DE PERSONAL:	**6**		
TOTAL RETIROS DE PERSONAL:		**2**	

Se iniciaron ejecución de actividades en Vivienda Campamento Docente y Rural las Mercedes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO

COLEGIO USMINIA SEDE B



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO CHUNIZA



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNIÓN



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED CAMPESTRES JAIME GARZÓN - AURAS



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

VIVIENDA DOCENTE - CAMPAMENTO



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

DILE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

LAS MERCEDES



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

EMERGENCIAS



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



ESTADO INICIAL: BETANIA



AVANCE: BETANIA



AVANCE: BETANIA



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A




AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	25	DEL	15-abr-24	AL	21-abr-24

OBRAS PROGRAMADAS

Nombre de tarea	% compl	% espe FED (Text	Estado	Comienzo	Comienzo real	% físico complet	Comienz de línea base1
I.E.D GENERAL	**53%**	**72%**	**Retrasada**	**lun 30/10/23**	**lun 30/10/23**	**0%**	**NOD**
INICIO OBRA	0%	100%	Retrasada	lun 30/10/23	NOD	0%	NOD
IED USMINIA	100%	100%	Completada	lun 30/10/23	lun 30/10/23	99%	lun 30/10/
IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	95%	100%	Retrasada	mar 31/10/23	mar 31/10/23	89%	mar 7/11/23
IED CHUNIZA	100%	100%	Completada	mar 31/10/23	mar 31/10/23	96%	mié 15/11
IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	95%	100%	Retrasada	mar 31/10/23	mar 31/10/23	92%	mié 15/11/23
DILE SUMAPAZ	25%	100%	Retrasada	mar 7/11/23	mar 7/11/23	0%	NOD
IED CAMPESTRE JAIME GARZON AURAS	62%	100%	Retrasada	mar 7/11/23	mar 7/11/23	25%	NOD
IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNION	56%	100%	Retrasada	mar 7/11/23	mar 7/11/23	53%	NOD
VIVIENDA DOCENTE CAMPAMENTO	12%	100%	Retrasada	mié 8/11/23	mié 8/11/23	7%	NOD
IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	100%	100%	Completada	vie 1/12/23	vie 1/12/23	100%	NOD
CED SAN JOSE DE USME SEDE A - DON BOSCO 2	0%	43%	Retrasada	jue 29/02/24	NOD	0%	NOD
IED CAMPESTRE JAIME GARZON - RAIZAL	0%	42%	Retrasada	vie 1/03/24	NOD	0%	NOD
RURAL DE LAS MERCEDES	16%	43%	Retrasada	vie 1/03/24	vie 1/03/24	0%	NOD

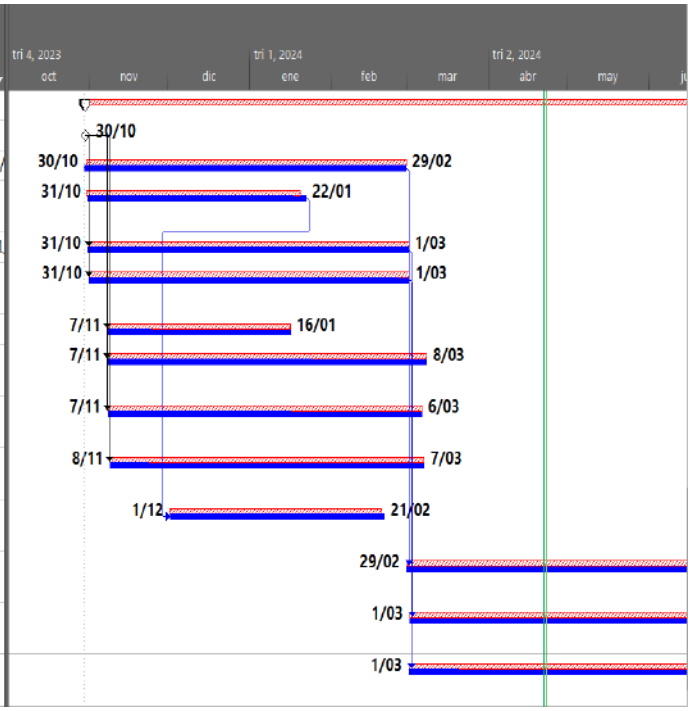

PROGRAMACIONES

COLEGIO (SEDE)	Fecha de inicio	Fecha real de inicio	Días de retraso
COLEGIO (SEDE)	30/10/2023		
Usminia sede B	30/10/2023	30/10/2023	0
Fernando Gonzaléz Ochoa	31/10/2023	15/11/2023	-15
Diego Cuellar sede B	31/10/2023	7/11/2023	-7
Chuniza	31/10/2023	15/11/2023	-15
DILE Sumapaz	7/11/2023	7/04/2024	-152
IED Campestres Jaime Garzón - Auras	7/11/2023	17/12/2023	-40
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	7/11/2023	20/11/2023	-13
Vivienda docente - Campamento	8/11/2023	3/01/2024	-56
Diego Cuellar sede A	1/12/2023	11/12/2023	-10
San José de Usme - Don Bosco 2	29/02/2024		
IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	1/03/2024		
Rural Las Mercedes	1/03/2024	8/04/2024	-38
Emergencias		4/01/2024	62

Nota: El constructor solicito la liberación de espacios para intervenir en la sede El Toldo, la cual fue remitia a la SED y esta a su vez al rector del colegio. Mediante el comunicado S-2024-77846, la SED envía la respuesta del rector, la cual no aprueba dicha liberación; por lo cual, la supervisión del contrato solicita no tener en cuenta en la programación en este informe las sedes Erasmo Valencia, Toldo, Tunal Alto y Diego C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTA

PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA
FIRMA CB INGENIEROS

NUMERO	NOMBRE	CARGO	PROCEDENCIA	INGRESO	RETIRO	PAZ Y SALVO	OBSERVACION
1	CRISTIAN CAMILO BARRAGAN PEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA II	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
2	ANDRES FELIPE MACKENZIE FUENTES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
3	DIANA MAYERLY ARGUELLO ROMERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA I	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
4	MANUEL RICARDO GOMEZ CARRILLO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
5	BIBIANA ANDREA JIMENEZ CHAPARRO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
6	BIBIANA ANDREA JIMENEZ CHAPARRO	ESPECIALISTA SST	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
7	CESAR AUGUSTO BOLAÑO TAFUR	ESPECIALISTA ELECTRICO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
8	NELSON FELIPE MORENO CARDONA	ESPECIALISTA HIDRAULICO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
9	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	PROF. COSTOS Y PRESUPUESTOS	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
10	OSCAR CAMILO GOMEZ LOPEZ	ABOGADO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
11	CINDY PAOLA DIAZ VALENCIA	TECNICO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
12	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR I	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
13	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR II	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
PERSONAL COMPLEMENTARIO QUE NO SE INCLUYE DENTRO DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO							
14	CINDY MILENA DUARTE VELANDIA	APOYO SST	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
15	CRISTIAN FERNEY LESMES VACA	AUXILIAR	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
16	MANUEL ANTONIO MUÑOZ CRUZ	INSPECTOR	BOGOTA D.C	27/11/2023	N/A	N/A	
TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 16							

Observaciones: Durante el periodo del presente informe no se presentaron novedades con el personal de interventoria.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

MAQUINARIA - EQUIPOS - VEHICULOS DE OBRA

PERIODO DEL INFORME:	SEMANAL No. 25
SEMANA REPORTADA: lunes, 15 de abril de 2024	AL domingo, 21 de abril de 2024

COLEGIO USMINIA SEDE B

			SEMANAL No. 25						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			15	16	17	18	19	20	21
1	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	D	D	D	D	D	D	
2	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	X	X	X	X	X	X	
3	PULIDORA 9"	BOSCH - 00094	X	X	X	X	X	X	
4	PULIDORA 9"	BOSCH 90B - 66200134	X	X	X	X	X	X	
5	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	MEINENG - 3016	D	D	D	D	D	D	
6	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	D	D	D	D	D	D	
7	SOLDADORA	KIN 200M - BAUKER	X	X	X	X	X	X	
8	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	CINBELL	X	X	X	X	X	X	
10	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
12	BRILLADORA INDUSTRIAL	2	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA

			SEMANAL No. 25						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			15	16	17	18	19	20	21
1	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
3	VOLQUETA	PLACA: SQB000 COLOR: NARANJA	X	X	X	X	X	X	
4	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
5	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
6	CANGURO APISONADOR	H 80 - HAUSSEN	X	X	X	X	X	X	
7	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
8	CAMIÓN MEZCLADOR	WNW141 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
9	CAMIÓN HORMIGONERO	WCU234 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
10	BOMBA PARA HORMIGÓN	TK 40 AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
11	SOPLETE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
12	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	N/A	N/A	X	X	X	X	
13	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
14	TRONZADORA	DEWALT M9355	X	X	X	X	X	X	
15	SOLDADORA	FOX WELD	X	X	X	X	X	X	
16	HIDROLAVADORA	2	X	X	X	X	X	X	
17	PULIDORA	MAKITA 4"	X	X	X	X	X	X	
18	PULIDORA	DEWALT 4"	X	X	X	X	X	X	
19	TALADRO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
20	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
21	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
22	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
23	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
24	ACOLILLADORA	DEWALT - 247516	X	T	T	X	X	X	
25	LIJADORA	DEWALT - DW317	X	T	T	X	X	X	

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B									
			SEMANAL No.			25			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			15	16	17	18	19	20	21
1	COMPRESOR 2 HP	BAUKER - 002	T	T	T	T	T	T	
2	MARTILLO PERFORADOR	TA 16386 - DEWALT	D	D	D	D	D	D	
3	SOLDADORA INVERSOR	KMIG1802 -UBERMAN	D	D	D	D	D	D	
4	TALADRO ROTOMARTILLO	D25133-B3 - DEWALT	T	T	T	T	T	T	
5	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	T	T	T	T	T	T	
6	TRONZADORA	232000249 12/2022 - BOSCH	D	D	D	D	D	D	
7	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	T	T	T	T	T	T	
8	PULVERIZADOR DE PINTURA SIN AIRE	WAGNER CONTROL PRO 190 HEA	X	X	X	X	X	X	
9	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	T	T	T	T	T	T	
10	PULIDORA	CINBELL	T	T	T	T	T	T	
11	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	T	T	T	T	T	T	
12	HIDROLAVADORA	BLACK DECKER 7185	X	X	X	X	X	X	
13	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	T	T	T	T	T	T	
14	VIBROCOMPACTADOR	01MASALTA	D	D	D	D	D	D	
15	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	D	D	D	D	D	D	
16	MAQUINA DE SOLDAR	CORMAG	T	T	T	T	T	T	
17	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	T	T	T	T	T	T	
COLEGIO CHUNIZA									
			SEMANAL No.			25			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			15	16	17	18	19	20	21
1	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
2	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
3	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
4	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
5	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	MTCOD1029	X	X	X	X	X	X	
6	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
7	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
8	EQUIPO DE SOLDADORA	LINCOLN ELECTRIC MMA35O	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	001 4"	X	X	X	X	X	X	
10	COMPRESOR	DEWALT DWFP55126	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR DE AIRE	PRETUL 20L 135PSI	X	X	X	X	X	X	
13	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
14	APISONADOR CANGURO	KAMA DIESEL KM173FKK210909088	X	X	X	X	X	X	
14	SONDA ELECTRICA	LYCTOOLS	X	X	X	X	X	X	
LA UNIÓN SUMAPAZ									
			SEMANAL No.			25			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			15	16	17	18	19	20	21
1	PLANTA ELECTRICA	C08000-GG-AE	D	D	D	D	D	D	
2	TALADRO ROTOMARTILLO	DEWALT TAI5386	D	D	D	D	D	D	
3	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	I	X	I	X	X	
4	TROMPO MEZCLADOR	001 - COLOR NARANJA	T	T	T	T	T	T	
5	CANGURO APISONADOR	CORMAG - 20A300	T	T	T	T	T	T	
6	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT	D	D	D	D	D	D	
7	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	D	D	D	D	D	D	
8	EQUIPO DE SOLDADURA	NO SE TIENE INFORMACIÓN	D	D	D	D	D	D	
9	COMPRESOR PARA PINTURA	2020121301 BM-24 L	D	D	D	D	D	D	
10	BRILLADORA INDUSTRIAL	ELECTROLUX 137-402	D	D	D	D	D	T	T
AURAS - SUMAPAZ									
			SEMANAL No.			25			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			15	16	17	18	19	20	21
1	COMPRESOR PARA PINTURA	SERIAL H112200639 MARCA KARSON	D	D	D	D	D	D	
2	EQUIPO DE SOLDADURA	KIN160M BAUKER	D	D	D	D	D	D	
3	EQUIPO DE SOLDADORA	BAUKER - IEC60974-1:20212	D	D	D	D	D	D	
4	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	I	X	X	

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A									
			SEMANAL No.			25			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			15	16	17	18	19	20	21
1	SOPLETE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	X	X	X	X	X	X	
4	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
5	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
6	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	X	X	
7	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	X	X	
8	SOLDADORA	UBERMANN KMIG1802	X	X	X	X	X	X	
9	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
10	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
11	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
12	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE									
			SEMANAL No.			25			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			15	16	17	18	19	20	21
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	I	X	X	X	X	
2	MAQUINAS DE SOLDAR	1	X	X	X	T	T	T	
3	TROMPO MEZCLADOR	2	X	X	X	T	T	T	
4									
5									
RURAL LAS MERCEDES									
			SEMANAL No.			25			
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			15	16	17	18	19	20	21
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	I	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	I	X	I	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	D	D	D	D	D	D	
4	TALADRO DEMOLEDOR	ROTARY HAMMER CDS-32H-A	D	D	D	D	D	D	
5	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	T	T	T	T	T	T	
6	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	T	T	T	T	T	T	
INTERVENTORIA									
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA INTERVENTORIA			15	16	17	18	19	20	21
OBSERVACIÓN:		OBSERVACIONES: N/A							
X: RETIRADA DE OBRA									
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA									
V: VARADO									
T: TRABAJANDO									
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA									

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **DEL** lunes, 15-abr.-24 **AL** domingo, 21-abr.-24

SEMANA REPORTADA:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

Usminia sede B

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	15/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	16/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	17/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	18/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
VIERNES	19/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	20/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	21/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Fernando Gonzaléz Ochoa

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	15/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	16/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	17/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	18/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
VIERNES	19/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	20/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	21/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Diego Cuellar sede B

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	15/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	16/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	17/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	18/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
VIERNES	19/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	20/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	21/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A

OBSERVACIÓN :

Chuniza

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	15/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	16/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	17/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	18/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	19/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	20/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	21/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A

OBSERVACIÓN :

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	15/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	16/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	17/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	18/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
VIERNES	19/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	20/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	21/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A

OBSERVACIÓN :

Diego Cuellar sede A

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	15/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	16/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	17/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	18/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
VIERNES	19/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	20/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	21/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

IED Campestres Jaime Garzón - Auras

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	15/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	16/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	17/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	18/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
VIERNES	19/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	20/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	21/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Vivienda docente - Campamento

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	15/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	16/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	17/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	18/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
VIERNES	19/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	20/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	21/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

DILE Sumapaz

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	15/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	16/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	17/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	18/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
VIERNES	19/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	20/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	21/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

CB INGENIEROS S.A.S

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

VERSIÓN	1
Fecha	2/12/2022

UNIDAD EJECUTORA: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

FECHA: 29/04/2024

Semana No.	**26**	**Del :**	lunes, 22 de abril de 2024	AL:	domingo, 28 de abril de 2024
Plazo Total		240	días		
Plazo Transcurrido		182			
Nombre del Supervisor :	Ing. Ferney Jiménez Neira				

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	3,00%	75,00%	**(%) Ejecutado**	1,00%	55,00%
Valor programado ($)	$ 304.630.414,91	$ 5.524.953.936,42	**Valor ejecutado ($)**	$ 369.725.057,07	$ 2.914.472.370,43
			Evaluación	-20,00%	Atraso en la ejecución

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista:	CONSORCIO CLARIDAD	**Contratista:**	CB INGENIEROS S.A.S
Contrato No:	CO1.PCCNTR.5305904	**Contrato No:**	CO1.PCCNTR.5313332
Valor del contrato:	$ 7.608.734.174	**Valor del contrato:**	$ 504.428.924,00
Plazo:	8 meses	**Plazo:**	9 meses
Fecha de iniciación:	30 de octubre de 2023	**Fecha de iniciación:**	19 de octubre de 2023
Fecha de terminación:	29 de junio de 2024	**Fecha de terminación:**	18 de julio de 2024
Fecha de suspensión Nº 1:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 1:**	N/A
Fecha de reinicio Nº 1:	N/A	**Fecha de reinicio Nº 1:**	N/A
Prórroga Nº 1:	N/A	**Prórroga Nº 1:**	N/A
Plazo final:	N/A	**Plazo final:**	N/A
Fecha de vencimiento final:	N/A	**Fecha de vencimiento final:**	N/A
Fecha de suspensión Nº 2:	N/A	**Fecha de suspensión Nº 2:**	N/A
Suspensión N. 3	N/A	**Suspensión N. 3**	N/A
Fecha reinicio N. 2	N/A	**Fecha reinicio N. 2**	N/A
Prórroga Nº 2:	N/A	**Prórroga Nº 2:**	N/A
Plazo final:	N/A	**Plazo final:**	N/A
Nueva Fecha de vencimiento final:	N/A	**Nueva Fecha de vencimiento final:**	N/A
Valor total contrato	$ 7.608.734.174	**Valor actualizado contrato**	$ 504.428.924

EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES

No.	COLEGIO (SEDE)	C.P.F.	LOCALIDAD	ALCANCE PROPUESTO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DESCRIPCION ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN PENDIENTES
1	Usminia sede B	535	Usme	$ 349.948.209,00	100,00%	100,00%	Culminación de subsanación de observaciones	Culminación de subsanación de observaciones
2	Fernando Gonzaléz Ochoa	580	Usme	$ 353.157.411,00	100,00%	95,00%	Capacitación de uso de las bombas instaladas.	Culminación de cambio de bombas
3	Diego Cuellar sede B	541	Usme	$ 542.722.842,00	100,00%	98,00%	Instalaciones eléctricas: instalación de paneles, cableado Pintura de muros internos en boque de aulas (4). Pintura de muros de fachada. Instalación de puertas y ventanas en aulas (4). Instalación de flauta y bajante del bloque administración y bloque 1 (aulas). Instalación de bajantes en baños del primer piso. Reinstalación de rejas en ventanas del bloque de aulas (4). Instalación de divisiones livianas en coordinación 2 del bloque administración. Pañete parcial de cara externa de cuchillas del bloque administración. Instalación de persianas en bloque de aulas (4). Instalación de tableros en aulas.	Instalaciones eléctricas, detalles de pintura, entre otros
4	Chuniza	512	Usme	$ 236.826.369,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Instalación de rejillas en cárcamos, observaciones del acta
5	DILE Sumapaz	2010	Sumapaz	$ 15.242.011,00	100,00%	25,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Mantenimiento de pozo, instalación de piso podotacktil
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	2006	Sumapaz	$ 750.000.000,00	100,00%	73,00%	Pintura y estuco en muros internos en bloque biblioteca. Instalaciones eléctricas: instalación de tubería EMT, instalación de cajas metálicas, cableado y acometida principal.	Pintura, instalación de caballete, instalaciones eléctricas, entre otros

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

FECHA: 29/04/2024

Semana No. 26 **Del :** lunes, 22 de abril de 2024 AL: domingo, 28 de abril de 2024

Plazo Total 240 días

7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	2022	Sumapaz	$ 811.831.873,00	100,00%	59,00%	Cuchillas en mampostería en bloque emisora. Pañete de cuchillas en mampostería en bloque emisora. Ajuste de canal en edificio emisora. Instalación de canal en edificio almacén.	Aguas lluvias, intervención en vivienda docente, instalaciones eléctricas, entre otras
8	Vivienda docente - Campamento	570	Usme	$ 411.446.316,00	100,00%	14,00%	Excavación manual, figurado de acero y fundida de dados de estructura metálica Instalación de estructura metálica para cubierta.	Suministro e instalación de estructura metálica, instalaciones eléctricas hidrosanitarias, entre otras
9	Diego Cuellar sede A	576	Usme	$ 253.419.631,00	100,00%	100,00%	Durante la semana no realizaron actividades.	Detalles de la entrega física de la obra
10	San José de Usme - Don Bosco 2	567	Usme	$ 635.000.000,00	49,00%	0,00%	No han iniciado actividades	Cerramiento, demolición, desmonte, entre otras.
11	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	2003	Sumapaz	$ 210.861.638,00	48,00%	0,00%	No han iniciado actividades	Cerramiento, demolición, desmonte, entre otras.
12	Rural Las Mercedes	534	Usme	$ 447.180.697,00	49,00%	19,00%	Instalación de rajón Relleno para conformación de placa de comedor. Figurado de acero y fundida de concreto para cárcamo.	Fundida de placa, construcción de cocina
13	Emergencias	E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A:la emergencia fue atendida a cabalidad.	
		E			100,00%	98,00%	San Juan: durante la semana no se realizaron actividades.	Emboquillada de los dos sanitarios que se instalaron, pintura de las chapas que se instalaron, pegada de vidrio en baño de profesores, pegada de vidrio baño de niños, instalación de manto y colocar las dos tapas de los inodoros
		E			100,00%	100,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.	
		E			100,00%	100,00%	Nazareth: durante la semana no se realizaron actividades.	
20		E			100,00%	95,00%	Tabaco: durante la semana no se realizaron actividades.	Revisión de la rejilla del sifon y punto eléctrico de la nevera.
21		E			100,00%	95,00%	Auras: pintura en aula	Ajuste de puertas
22		E			100,00%	100,00%	Betania: durante la semana no se realizaron actividades.	
24		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede B: instalación de enchape	
		E			100,00%	100,00%	Diego Cuellar sede A: reparación de fuga de agua en placa	

RESUMEN DE ACTIVIDADES

COMPONENTE SG-SST

Revisión documentos de ingreso del personal (Seguridad social vigente, consulta de antecedentes, examenes medicos de ingreso).
Remisión de base de datos a la SED de aprobación de personal para ingreso a los colegios.
Verificación e inspección cumplimiento de normas SST, referente a inducciones, notificación de riesgos, charlas, pausas activas, entrega de Epps, firma de permisos de trabajo.
Inspección señalización implementada en frentes de trabajo e instalación de cerramiento de obra.
Inspección punto de hidratación para el personal, en cada uno de los colegios.
Verificación entrega de dotación al personal.
Revisión informes de gestión SST semanal y mensual.
Inspección de actos y condiciones inseguras y medidas de seguridad implementadas.
A la fecha no se ha podido dar aprobación al informe mensual del mes de enero de 2024, del contratista, debido que carece de anexos que soporten la gestión realizada.
A la fecha el contratista ha hecho entrega parcial de planillas de seguridad social del personal minimo requerido.
El 18 de abril de 2024, se realizo mesa de trabajo con la nueva Asesora SST, con el fin de revisar cada uno de los compromisos que se tienen pendientes.

Incidentes y/o accidentes:
Durante la semana no se presento accidentes, ni incidentes, ni daños a terceros.

ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORÍA:

Seguimiento y control de la programación de obra.
Remisiòn de solicitudes al constructor.
Apertura de presunto incumplimiento al contratista de obra.
Acta de comité de obra.

REPORTE DE PERSONAL CONTRATISTA - INTERVENTORIA - EQUIPOS Y MAQUINARIA

PERSONAL OBRA	PERSONAL INTERVENTORIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS
Anexo Control de Personal Contrato de Obra	Anexo Personal Contrato Interventoría	Anexo Control de Equipos

SEGUIMIENTO FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	30 de octubre de 2023 a 29 de noviembre de 2023	$ 69.413.115,00
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	$ 482.429.484,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	$ 1.022.204.883,00
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	$ 867.459.592,00
5	1 de marzo de 2024 a 29 de marzo de 2024	$ 623.934.436,00
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$**	**3.065.441.510,00**

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra	
$ 7.608.734.174,00	
Valor facturado Contrato Obra	
$ 3.065.441.510,00	
% Avance facturado Acumulado	
40%	
Saldo por Facturar	
$ 4.543.292.664,00	

UNIDAD EJECUTORA: **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**
Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos - DCCEE

FECHA: 29/04/2024

Semana No. **26** **Del :** lunes, 22 de abril de 2024 AL: domingo, 28 de abril de 2024

Plazo Total 240 días

AVANCE FINANCIERO - CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de Interventoría No.	Periodo	Costo Total
1	10 de octubre d e2023 a 29 de noviembre de 2023	$ 4.539.860,00
2	30 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023	$ 32.031.237,00
3	30 de diciembre de 2023 a 29 de enero de 2024	$ 67.795.247,00
4	30 de enero de 2024 a 29 de febrero de 2024	$ 57.504.897,00
5	1 de marzo de 2024 a 29 de marzo de 2024	$ 41.363.172,00
6		
7		
8		
Total Acumulado	**$**	**203.234.413,00**

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Interventoría
$ 504.428.924,00
Valor facturado Contrato Interventoría
$ 203.234.413,00
% Avance facturado Acumulado
40%
Saldo por Facturar
$ 301.194.511,00

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1. La relación de la programación presentada en el capitulo "EJECUCIÓN SEMANAL POR FRENTES", corresponden al avance de las actividades teniendo en cuenta los recursos necesarios para su ejecución.

FIRMA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: Ándres Felipe Mackenzie Fuentes

BALANCE FINANCIERO					
SEMANA No.	26	DEL	22-abr-24	AL	28-abr-24

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	$ 349.948.209,00	$ 362.904.046,35	$ 12.955.837,35
2	Fernando Gonzaléz Ochoa		Usme	$ 353.157.411,00	$ 351.430.683,39	-$ 1.726.727,61
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	$ 542.722.842,00	$ 712.176.519,23	$ 169.453.677,23
4	Chuniza		Usme	$ 236.826.369,00	$ 330.206.750,54	$ 93.380.381,54
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	$ 15.242.011,00	$ 15.242.011,00	$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	$ 750.000.000,00	$ 628.487.851,57	-$ 121.512.148,43
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	$ 811.831.873,00	$ 840.105.168,56	$ 28.273.295,56
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	$ 411.446.316,00	$ 411.446.316,00	$ 0,00
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 253.419.631,00	$ 140.173.912,66	-$ 113.245.718,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	$ 799.914.269,00	$ 799.914.269,00	$ 0,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	$ 344.210.600,00	$ 344.210.600,00	$ 0,00
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	$ 337.709.778,00	$ 337.709.778,00	$ 0,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	$ 635.000.000,00	$ 511.765.332,00	-$ 123.234.668,00
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	$ 210.861.638,00	$ 210.861.638,00	$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	$ 447.180.697,00	$ 447.180.697,00	$ 0,00
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	$ 599.909.029,00	$ 599.909.029,00	$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				$ 7.099.380.673,00	$ 7.043.724.602,29	-$ 55.656.070,71

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 5.198.994,76	$ 4.708.361,95	-$ 490.632,81
2	San Juan		Sumapaz	$ 5.379.289,20	$ 4.568.398,72	-$ 810.890,48
3	IED Jaime Garzón sede Tabaco		Sumapaz	$ 7.539.117,09	$ 7.539.117,09	$ 0,00
4	IED Jaime Garzón sede Nazareth		Sumapaz	$ 4.431.089,03	$ 4.431.089,03	$ 0,00
5	IED Juan de La Cruz Varela sede Tunal Alto		Sumapaz	$ 1.423.309,88	$ 1.423.309,88	$ 0,00
6	Diego Cuellar sede B	B	Usme	$ 45.253.968,69	$ 45.253.968,69	$ 0,00
7	Por definir			$ 439.868.010,35	$ 441.169.533,64	$ 1.301.523,29
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				$ 509.093.779,00	$ 509.093.779,00	$ 0,00

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO	$ 7.608.734.174	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 7.552.818.381
		DIFERENCIA	$ 55.915.793

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado el balance del presupuesto de los colegios Chuniza, La Unión, Auras, Diego A, Diego B, Fernando González Ochoa y Usminia, en aras de equilibrar el contrato de obra, sin embargo, este no es definitivo, por lo cual, en los próximos informes continuaremos presentando el balance de estos y demás colegios.


En cuanto a las emergencias, los balances fueron ajustados conforme a la necesidad de cada frente.

CONTROL DE PROGRAMACIÓN
GRUPO 5

SEMANA No.	26	DEL	22-abr-24	AL	28-abr-24

PROGRAMACIÓN DE OBRA

	ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	DURACIÓN EN DÍAS	% AVANCE			AVANCE EN DÍAS		
				PROGRAMADO	EJECUTADO	(+) (-)	EJECUTADO	PROGRAMADO	ADELANTO/ ATRASO
	PROGRAMA GENERAL	**$ 7.099.380.673**	**240,00**	**73,53%**	**41,05%**	**-32,48%**	**98,53**	**176,48**	**-77,95**
1	Usminia sede B	$ 349.948.209	92,00	100,00%	102,78%	2,78%	94,56	92,00	2,56
2	Fernando Gonzaléz Ochoa	$ 353.157.411	92,00	100,00%	84,70%	-15,30%	77,93	92,00	-14,07
3	Diego Cuellar sede B	$ 542.722.842	60,00	100,00%	134,65%	34,65%	80,79	60,00	20,79
4	Chuniza	$ 236.826.369	92,00	100,00%	150,06%	50,06%	138,05	92,00	46,05
5	DILE Sumapaz	$ 15.242.011	50,00	100,00%	32,80%	-67,20%	16,40	50,00	-33,60
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	$ 750.000.000	92,00	100,00%	70,33%	-29,67%	64,70	92,00	-27,30
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	$ 811.831.873	90,00	100,00%	52,88%	-47,11%	47,59	90,00	-42,40
8	Vivienda docente - Campamento	$ 411.446.316	90,00	100,00%	13,64%	-86,36%	12,28	90,00	-77,72
9	Diego Cuellar sede A	$ 253.419.631	60,00	100,00%	53,49%	-46,51%	32,09	60,00	-27,91
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia	$ 799.914.269	90,00	90,99%	0,00%	-90,99%	0,00	81,89	-81,89
11	Diego Cuellar sede C	$ 344.210.600	90,00	27,75%	0,00%	-27,75%	0,00	24,98	-24,98
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo	$ 337.709.778	92,00	19,14%	0,00%	-19,14%	0,00	17,61	-17,61
13	San José de Usme - Don Bosco 2	$ 635.000.000	90,00	79,26%	0,00%	-79,26%	0,00	71,34	-71,34
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	$ 210.861.638	89,00	21,63%	0,00%	-21,63%	0,00	19,25	-19,25
15	Rural Las Mercedes	$ 447.180.697	89,00	13,07%	3,59%	-9,48%	3,20	11,63	-8,44
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto	$ 599.909.029	86,00	44,67%	0,00%	-44,67%	0,00	38,42	-38,42
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
	VALOR PRESUPUESTADO	**$ 7.099.380.673**							

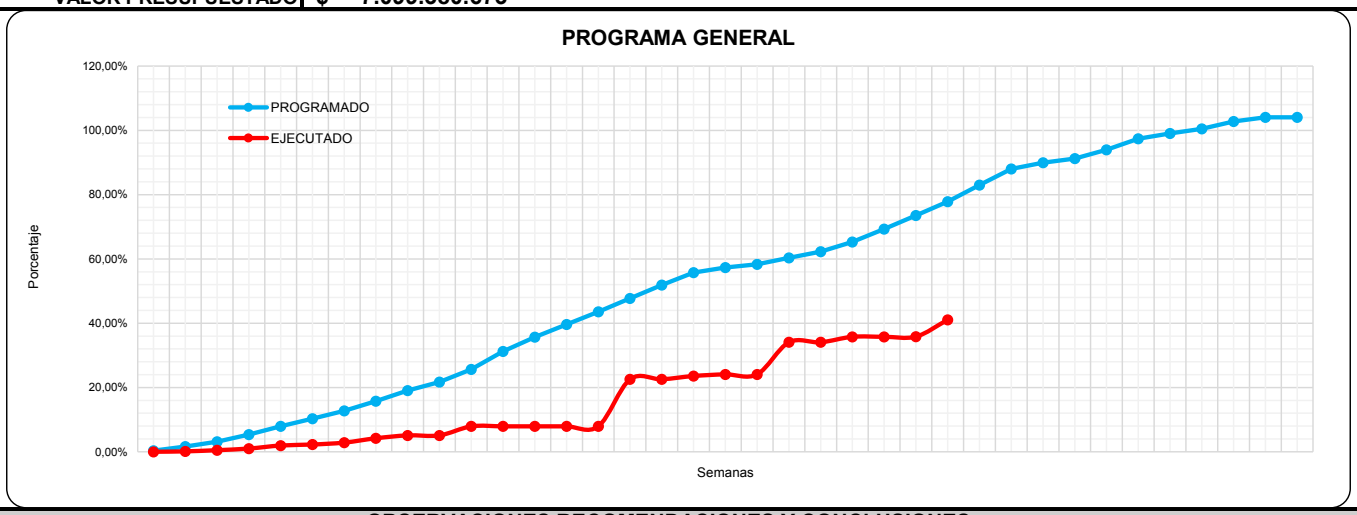

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Los porcentajes presentados en el informe gráfico están relacionados con el flujjo de caja de cada colegio.

Los porcentajes de ejecutado acumulado son acordes con la descripción de los ítems del presupuesto, es decir, abarcan integradamente el suministro y la instalación y solo así son contemplados para la relación en los flujos de caja.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

PERSONAL CONTRATO OBRA
FIRMA CONSORCIO CLARIDAD

PERSONAL CONTRATISTA EN OBRA

LISTADO PERSONAL CONTRATO OBRA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DE IDENTIFICACIO	TELEFONO	CARGO	EPS	ARL	caja de compensacion	FPC	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA	80222352	3112783471	DIRECTOR DE OBRA	SANIDAD PN	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
2	GUILLERMO ALBERTO VELANDIA CORDOBA	19418347	3134047300	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	N/A
3	DAVID ESTEBAN NULEZ CANO	1013644565	3053961793	RESIDENTE DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	8/01/2024
4	JULIO OSWALDO TORRES SUAREZ	79458867	3002066044	ASESOR ESTRUCTURAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
5	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	AESOR AMBIENTAL	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/04/2024
6	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	3014319355	ASESOR SST	EPS SANITAS	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	30/10/2023	10/04/2024
7	JORGE ERNESTO CASTIBLANCO MARTINEZ	10073655	3134227162	ASESOR EN REDES ELECTRICAS	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
8	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	26593081	3125212497	ASESOR REDES HIDROSANITARIAS	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
9	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	79450429	3134412819	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	N/A
10	JULY PAOLA OVALLE DIAZ	1026594061	3203720883	TECNICO SST	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	28/12/2023
11	NUBIA SANTAMARIA SANTAMARIA	53037373	3203655707	TECNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	4/11/2023
12	ROBERTO ROSAS CONDIA	79499052	3115698784	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	6/01/2024
13	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	1033749854	3106139631	INSPECTOR DE OBRA	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	6/01/2024
14	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63394516	3222953159	MAESTRO DE OBRA	ALIANSALUD	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	30/10/2023	N/A
15	ORLANDO ROSAS CONDIA	19442965	3115181794	MAESTRO DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	N/A	PORVENIR	30/10/2023	N/A
16	LAURA YERALDINE RAMIREZ OCAMPO	1006118750	3124514525	INSPECTORA SST	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/12/2023	N/A
17	JOHANA KATERINE MARTINEZ VARELA	1069739376	3125456995	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	10/01/2024	N/A
18	LEONARDO TORRES LARA	88279853	3112783471	RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	20/02/2024	N/A
19	NIDIAN YONETH AREVALO ROJAS	52834633	3204596676	ASESORA SST	SIN INFORMACIÓN	SURA	SIN INFORMACIÓN	SIN INFORMACIÓN	17/04/2024	N/A
20	LEIDI CONSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ	39583712	3133093871	TÉCNICO SST	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	24/04/2024	N/A
	1. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO USMINIA SEDE B Y DIEGO MONTAÑA SEDE A									
21	YITZA DANIELA CABALLERO CASTILLO	1.014.262.805	3144064083	INGENIERA DE APOYO	COMPENSAR EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	8/01/2024
22	LUIS FELIPE RONCANCIO	19.293.563	3126505053	MAESTRO	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	10/04/2024
23	JHON DEIBY ROA	1.006.321.288	3026681420	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	30/10/2023	11/11/2023
24	JOSE DOMINGO SEPULVEDA MARQUEZ	19.478.962	3132806995	OFICIAL	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	10/04/2024
25	LUIS ENRIQUE GALAN RAMIREZ	79.243.511	3106159832	G. OPERACIONES	FAMISANAR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR	COLPENSIONES	30/10/2023	28/02/2024
26	RODOLFO CORTES RICO	79.495.028	3138709928	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/10/2023	10/04/2024
27	LUZ ELENA ROMERO LEE	39564668	3003965967	APOYO SST	FOMAG	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	31/10/2023	31/01/2024
28	LUIS EDUARDO HUERTAS	19376454	3132677144	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	9/11/2023	10/04/2024
29	DANIEL ALBERTO GUERRERO SANCHEZ	1015458062	3022256611	INGENIERO DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	8/11/2023	31/01/2024
30	DANIELA RODRIGUEZ NAVARRETE	1026304071	3057899636	INSPECTOR SST DE APOYO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	21/11/2023	29/11/2023
31	JAMER ENRIQUE ACOSTA VANEGAS	1038113875	3125478958	OPERARIO DE MONTAJES	FAMISANAR	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	21/11/2023	28/02/2024
32	YOISER ANTONIO VEGA ACOSTA	1007713132	3012454555	AUXILIAR DE OBRA	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	COLFONDOS	30/11/2023	30/12/2023
33	WILSON VANEGAS RAMOS	1049932351	3057925465	SOLDADOR	SALUDTOTAL	COLPATRIA	COMPENSAR	PORVENIR	30/11/2023	28/02/2024
34	ALBERTO MOJICA	13460675	3021455888	OFICIAL DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/01/2024	31/01/2024
35	HECTOR FABIO OCAMPO PINTO	79370662	3047899875	OFICIAL ELECTRICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	31/03/2024
36	JHON FREDDY QUINTERO BUSTAMANTE	80374914	3052563251	CONTRATISTA ELECTRICO	COMPENSAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
37	SEBASTIAN DAVID GIL SOLAQUE	1024600603	3012456365	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	11/12/2023	N/A
	2. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO CHUNIZA Y FERNANDO GONZALÉZ OCHOA									
38	JHYSMARTH LEAO ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000788547	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/10/2023	N/A
39	KEVIN STIVEN HERNANDEZ PARRA	1027535995	3042182761	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	17/11/2023	N/A
40	FREDY ALEXANDER AMADO SANCHEZ	1049614186	3016526365	AUXILIAR DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLFONDOS	21/11/2023	2/01/2024
41	EDUARD GIOVANNY TALERO MOLINA	1022998642	3057924546	CONDUCTOR VOLQUETA	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
42	HENRY EDUARDO TALERO CASTAÑEDA	79669915	3014568589	CONDUCTOR VOLQUETA	SANITAS	SURA	CAFAM	PORVENIR	20/11/2023	N/A
43	JHOSYMARTH ANDREE ESTUPIÑAN HERNANDEZ	1000792895	3213923732	OPERARIO	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	15/11/2023	N/A
44	EDWIN ALEXANDER MOLINA GUTIERREZ	1097723887	3102569632	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	15/11/2023	30/12/2023
45	GABRIEL FELIPE HERRERA SANCHEZ	1031183292	3054875525	PINTOR SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	9/01/2024	N/A
46	MILTON EDUARDO CANTOR URIBE	1012422520	3102544899	SOLDADOR	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	10/01/2024	31/01/2024
47	OSCAR FABIAN FORERO GONZALEZ	14011756	3057924658	SOLDADOR	FAMISANAR	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	10/01/2024	N/A
48	YIDUAR STIVEN MARTINEZ CERQUERA	1006158996	3102544896	SOLDADOR	SALUDTOTAL	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	N/A
49	JHON FREDY GOMEZ RUIZ	93412459	3057898744	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	12/01/2024	30/12/2023
50	OSCAR FABIAN MANCIPE CALLEJAS	79989407	3054878777	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	29/01/2024	N/A
51	RUBEN DARIO OSPINO MENDOZA	73476370	3156988548	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	29/01/2024	N/A
52	DANIEL FELIPE ROJAS GOMEZ	1003518255	3102456585	OPERARIO	SANITAS	SURA	CAFAM	PROTECCION	1/02/2024	11/03/2024
53	JORGE ENRIQUE MURCIA CARVAJAL	83231760	3125412556	OFICIAL	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	2/02/2024	N/A
54	ARCADIO CARVAJAL CANO	83232849	3112414554	OFICIAL	SALUDTOTAL	POSITIVA	CAFAM	COLFONDOS	2/02/2024	N/A
55	JOHN SEBASTIAN RODRIGUEZ SANTOS	1022421246	3114111221	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVEMIR	5/02/2024	N/A
56	OSWALDO SILVA ARIAS	1026264278	3114587879	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COLSUBSIDIO	PROTECCIÓN	20/02/2024	N/A
57	BRAYAN MANUEL GONZALEZ MORENO	1070019081	3147957758	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLFONDOS	23/03/2024	N/A
58	EDWAR STIVEN GONZALEZ MORENO	1003527513	3165587890	OPERARIO	EPS SURA	SURA	NO ANEXA	COLPENSIONES	23/03/2024	N/A
59	WILLIAM DUVAN GALINDO PARRA	1070010754	3008095677	INGENIERO	EPS COMPENSAR	SURA	NO ANEXA	PROTECCIÓN	23/03/2024	N/A

3. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B										
60	CARLOS ALBERTO QUINTERO CASTRO	1012357647	3133398783	JEFE DE PRODUCCIÓN	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	N/A
61	HUMBERTO QUINTERO CASTRO	6031624	3107541181	PINTOR	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	6/11/2023	30/12/2023
56	JOSE DEL CARMEN QUINTERO CASTRO	1108150056	3134656898	AYUDANTE AVANZADO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	6/11/2023	31/03/2024
60	BRAYAN STEVEN LOPEZ TRUJILLO	1000792613	3018968584	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	14/12/2023	N/A
61	MAICOL ANTONIO VELASQUEZ RACERO	1000456168	3106254878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	19/12/2023	N/A
62	GINO SAMIR OBANDO	16929250	3014857889	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	19/12/2023	N/A
63	ARNOL DAVID QUEJADA MOSQUERA	1003969572	3105897878	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	30/12/2023
64	DAGOBERTO PALACIOS MOSQUERA	80170132	3112254565	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
65	DAVINSON ORTEGA ECHAVEZ	1082370985	3102569786	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	15/01/2024
66	HERNAN ENRIQUE BARRIOS CAMACHO	1079884516	3104878589	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
67	MAURICIO JOSE PEÑA DE LA CRUZ	1079885010	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/12/2023	30/12/2023
68	RODRIGO ANDRES VELASQUEZ RACERO	1001199012	3112589897	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
69	RONAL JOSE VALDEZ MANCILLA	19600457	3014788789	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/12/2023	N/A
71	MELISSA LEAL BARRIOS	1019149140	3102366569	AUXILIAR RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	16/01/2024	3/03/2024
72	YEISON STIBEN RODRIGUEZ LINARES	1077320160	3057414144	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	16/01/2024	29/02/2024
73	ANDERSON PALACIOS CORDOBA	1193235465	3136988588	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/01/2024	N/A
74	CARLOS DANIEL LEON DIAZ	1000932887	3059877444	AUXILIAR AVANZADO	EPS SURA	SURA	COLSUBSIDIO	PORVENIR	18/01/2024	N/A
75	DAVID CARRILLO QUIÑONES	1005854583	3154714519	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
76	VICTOR ALFONSO CASTAÑEDA SUAREZ	1024554929	3112033322	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	31/03/2024
77	BRANDON ESTEBAN QUINTERO MUÑOZ	1024592418	3104587888	AYUDANTE	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	N/A
78	CARLOS ANDRES BALLEN PERDOMO	100335948	3057748926	INSTALADOR DE CUBIERTAS	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	27/02/2024	N/A
79	WILMER RUIZ HERNANDEZ	1000972780	3202455877	AYUDANTE	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
80	MICHAEL ESTY GARCIA PINTO	1024601987	3154788999	OFICIAL	EPS COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	16/03/2024	N/A
81	CRISTIAN PAVA HERNANDEZ	1024536127	3136598788	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
82	LUIS EINER PAVA HERNANDEZ	1024495430	3124122129	OFICIAL	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	5/02/2024	N/A
83	JAIR ESNEIDER CAMACHO PADILLA	1122124132	3124587488	TECNICO	NUEVA EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	N/A
84	CARLOS JOSE BUELVAS MARTINEZ	1101446456	3054899663	TECNICO	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	PORVENIR	14/02/2024	N/A
85	ADRIAN MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ	11443863	3102545463	APOYO RESIDENTE DE OBRA	SANITAS EPS	SURA	CAFAM	COLPENSIONES	12/04/2024	N/A
86	CESAR DAVID ARROYO CAPACHERO	1068819836	3079877412	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	16/04/2024	19/09/2024
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ										
87	PAULO CESAR JIMENEZ PINEDA	9.398.481	3057924540	MAESTRO DE OBRA DE APOYO	NUEVA EPS	SURA	COLSUBSIDIO	COLPENSIONES	21/11/2023	N/A
88	CHRISTER ANDERSON ROJAS MAHECHA	1.012.349.430	3054568584	INSPECTOR DE OBRA	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PORVENIR	21/11/2023	N/A
89	WILMAN HURTADO PALACIOS	1.022.932.247	3202545654	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	24/11/2023	N/A
90	JOSE LUIS ARGOTY ORTIZ	1000780687	3054898587	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/11/2023
91	BRAYAN ALONSO OSORIO REY	1193577927	3154858785	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	25/11/2023	30/12/2023
92	TIBER ALEXANDER PINCHAO SALAMANCA	80065344	3059872627	MAESTRO	COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	COLFONDOS	28/11/2023	31/01/2024
93	ANGELO STYBEN PINCHAO CARREÑO	1023027952	3059872627	AYUDANTE DE OBRA	COMPENSAR	SURA	PORVENIR	PORVENIR	26/12/2023	30/12/2023
94	WILMAN HURTADO PALACIOS	1022932247	3015687844	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	31/01/2024
95	FELIX DE JESUS CAVADIAS URANGO	1003212733	3014596897	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	28/11/2023	30/12/2023
96	EDUWIN ALVEIRO SANCHEZ MORA	3172104	3214122115	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	28/11/2023	30/11/2023
97	JHON JAIRO DAZA CABRERA	1024588739	3012544777	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
98	RUSBEL FABIAN GARAVITO YATE	80730583	3157899698	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
99	JOHN ALEXANDER QUINTERO CIFUENTES	80209937	3014577496	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
100	EDINSON BUSTOS OVIEDO	14478587	3215625522	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	6/12/2023	N/A
101	DIEGO FERNANDO QUINTERO CIFUENTES	80213189	3102544418	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	6/12/2023	N/A
102	CARLOS EDUARDO FLOR FLOR	1082214776	3125468596	AYUDANTE DE OBRA	SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	14/12/2023	N/A
103	PABLO CESAR JIMENEZ ROSAS	1007420552	3057994888	AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	19/12/2023	30/12/2023
104	ERICK LEONARDO RUIZ ROJAS	1024572771	3058796412	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/01/2024	1/02/2024
105	DAVID NICOLAS SOLORZA DIAZ	1110585392	3112415444	APOYO RESIDENTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	N/A
106	LUIS ANTONIO BARAJAS BARRERA	6768943	3102355241	ENCARGADO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	15/01/2024	28/02/2024
107	YESID BELTRAN AROCA	80810518	3112544547	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
108	VICTOR ZENON SANTAMARIA SANCHEZ	7120569	3058797474	MAESTRO DE APOYO	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	N/A
109	BRAYAN CAMILO USMA MUNEVAR	1073684515	3136356999	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	15/01/2024	28/02/2024
110	WILLIAM ALEXANDER DUEÑAS ARRIGUI	1022947420	3057899885	AYUDANTE	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	31/01/2024	28/02/2024
111	JOHN FREDDY PATIÑO DAVILA	80252966	3056987426	OFICIAL	CAPITAL SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	2/02/2024	28/02/2024
112	JAVIER ROLANDO HERNANDEZ MARTINEZ	1026553072	3129876767	OPERARIO	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	7/02/2024	N/A
113	SEBASTIAN ZAPATA TRUJILLO	1023937840	3059882818	AUXILIAR	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	7/02/2024	N/A
114	JUAN CAMILO MEDINA SANCHEZ	1026255495	3054788788	OPERARIO	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	13/02/2024	N/A
115	DAVID ALEJANDRO NIETO PEÑA	1012437189	3126955884	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	28/02/2024
116	LUIS JOHNSON GONZALEZ SANABRIA	79868903	3058976458	SOLDADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	17/02/2024	N/A
117	PEDRO ALONSO ORJUELA DIAZ	1032656115	3157898478	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
118	JONATAN ESTIBEN ORJUELA DIAZ	1032656119	3156989896	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	22/02/2024	N/A
119	WILLIAM MORALES BEDOYA	80061991	3125487996	OPERARIO	FOSYGA	SURA	N/A	PROTECCIÓN	26/02/2024	N/A
120	OLIVER EDUARDO ORJUELA DIAZ	1032656116	3057998246	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	N/A	PROTECCIÓN	15/03/2024	N/A
121	ROBERTO JAIRO CARABALLO CARCAMO	1050845674	3105668482	OFICIAL DE OBRA	FAMISANAR	SURA	N/A	PROTECCIÓN	19/04/2024	N/A
122	DANIEL FELIPE GARCIA GARCIA	1024474942		AYUDANTE DE OBRA	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/04/2024	NO INGRESO
123	JHON EDWIN APONTE TORRES	1069230085	3214994825	AYUDANTE DE OBRA	EPS SANITAS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	23/04/2024	N/A
5. LISTADO DE TRABAJADORES COLEGIO AURAS - SUMAPAZ										
124	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	1012436533	3101526365	OFICIAL	FAMISANAR	POSITIVA	CAFAM	COLPENSIONES	14/12/2023	30/12/2023
125	WILMAR YATE MARTINEZ	1015992927	3017899898	AYUDANTE DE OBRA	EPS SURA	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	14/12/2023	N/A
126	JOHN EDWIN HERRERA DAVILA	79714742	3124125663	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PROTECCIÓN	11/01/2024	N/A
127	LEONARDO PULECIO OTAVO	1022929250	3102123221	AYUDANTE DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	11/01/2024	N/A
128	LUIS CARLOS GUERRERO SEPULVEDA	73146615	3102144144	OFICIAL DE PINTURA	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	12/02/2024	N/A
129	LUIS MANUEL DIAZ	1116376663	3056458871	INSTALADOR	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
130	JEFERSON ALEXANDER DUQUE TANGARIFE	1000990376	3007845246	INSTALADOR	SALUDTOTAL	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
131	GERMAN EMILIO GONZALEZ OSPINO	1082853834	3002648264	INSTALADOR	COOSALUD	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	23/03/2024	N/A
132	ANDRES LANCHEROS SANCHEZ	1.033.692.581	3106139633	CONTRATISTA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	COLFONDOS	15/11/2023	N/A
133	NORMA CONSTANZA CHILATRA RODRIGUEZ	52.200.992	3102456365	ENCARGADO DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	20/11/2023	N/A
134	JUAN DAVID GRANADOS CARO	1033688532	3103113125	OFICIAL DE OBRA	SALUDTOTAL	SURA	CAFAM	PORVENIR	12/12/2023	15/03/2024
135	SERGIO ALEXANDER URREGO OLAYA	1033706865	3125485896	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	CAFAM	PROTECCIÓN	28/12/2023	N/A
136	CHRISTIAN JOSE ARIAS RAMIREZ	1079034445	3145789869	INSTALADOR DE CUBIERTA	NUEVA EPS	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
137	JORGE LUIS ALVARADO TAPIA	1063960598	3102354569	INSTALADOR DE CUBIERTAS	FAMISANAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	4/03/2024	N/A
138	LUIS ENRIQUE CARRILLO PEREZ	6804864	3057924540	INSTALADOR DE CUBIERTAS	ASMET SALUD	SURA	COMPENSAR	COLPENSIONES	4/03/2024	N/A

6. LISTADO DE TRABAJADORES VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE										
139	JOSE LUIS SAENZ TRUJILLO	12134668	3152943678	TECNICO OPERATIVO	NUEVA EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
140	ANDRES AUGUSTO ALVARADO TRIANA	1016008629	3208626856	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
141	ANDRES FELIPE NIÑO CANO	1015440804	3152957485	INGENIERO	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	COLPENSIONES	4/04/2024	22/04/2024
142	PABLO JOSE GUAYAN POLO	1000241613	3106945375	GESTOR DE COMPRAS Y LOGISTICA	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/04/2024	22/04/2024
143	JUAN DANIEL MORA PEÑALOZA	1073671343	3106845376	TECNICO DE MONTAJE	FAMISANAR	SURA	N/A	PROTECCION	4/04/2024	22/04/2024
144	JOSE DAVID SAENZ MEDINA	1075276566	3017934675	AUXILIAR TECNICO	SANITAS EPS	SURA	N/A	COLFONDOS	4/4/2024	N/A
145	GABRIELA HERNANDEZ JIMENEZ	1003802004	3102540065	ANALITA DE PRODUCCION RESIDENTE	SANITAS EPS	SURA	N/A	PROTECCION	4/4/2024	N/A
146	ADRIAN ORLANDO POLO MURCIA	79956551	3208765334	JEFE DE PRODUCCIÓN	SANITAS EPS	SURA	COMFAMILIAR HUILA	PROTECCION	4/4/2024	N/A
147	HERNAN RIVERA LOZANO	12122361	3106286754	ANALISTA DE LOGISTICA Y ALMACEN	FAMISANAR	SURA	N/A	COLPENSIONES	4/4/2024	N/A
7. LISTADO DE TRABAJADORES RURAL LAS MERCEDES										
148	KEVIN DAILUBER RODRIGUEZ OROZCO	1024528977	3102458579	APOYO INSPECTOR DE OBRA	EPS COMPENSAR	SURA	COMPENSAR	PORVENIR	5/02/2024	N/A
149	BRIAN LEONARDO AVELLANEDA OROZCO	1026298909	3057719914	OFICIAL	COMPENSAR EPS	SURA	N/A	PORVENIR	8/4/2024	N/A
150	OSCAR TIBADUIZA OCHOA	79217256	3216295647	OFICIAL	SALUD TOTAL	SURA	N/A	PROTECCION	8/4/2024	N/A
151	LUIS ALEJANDRO PINEDA GARCIA	1104696373	3206845379	AYUDANTE	NUEVA EPS	SURA	N/A	COLPENSIONES	9/4/2024	N/A
152	HERNALDO ROJAS VELANDIA	79208636	3214967485	OFICIAL	FAMISANAR	SURA	N/A	COLFONDOS	10/4/2024	N/A
TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 140										

Observaciones:

	NOVEDADES		
	INGRESOS	**RETIROS**	
PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRATUAL	**0**	**2**	El contrastista reporto el retiro de 2 inspectores de obra con fecha del 06 de enero de 2024
COLEGIO USMINIA SEDE B:	0	0	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A:	0	0	
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	1	0	Se reporta 1 ingreso
COLEGIO CHUNIZA:	0	0	
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ	0	0	
COLEGIO LA UNIÓN - SUMAPAZ:	0	0	
COLEGIO AURAS - SUMAPAZ:	0	0	
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE:	3	0	se reporta 3 ingresos
RURAL LAS MERCEDES	2	0	Se reporta 2 ingresos
TOTAL INGRESOS DE PERSONAL:	**6**		
TOTAL RETIROS DE PERSONAL:		**2**	

Se iniciaron ejecución de actividades en Vivienda Campamento Docente y Rural las Mercedes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TÉCNICO

COLEGIO USMINIA SEDE B



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO CHUNIZA



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNIÓN



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

IED CAMPESTRES JAIME GARZÓN - AURAS



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

VIVIENDA DOCENTE - CAMPAMENTO



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

DILE



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE

LAS MERCEDES



ESTADO INICIAL



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE



AVANCE

EMERGENCIAS



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



AVANCE: GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN



ESTADO INICIAL: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



AVANCE: NAZARETH



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



ESTADO INICIAL: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: TABACO



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



AVANCE: AURAS



ESTADO INICIAL: BETANIA



AVANCE: BETANIA



AVANCE: BETANIA



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B



ESTADO INICIAL: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A



AVANCE: DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A




AVANCE:DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A

PROGRAMACION GENERAL

SEMANA No.	26	DEL	22-abr-24	AL	28-abr-24

OBRAS PROGRAMADAS

Modo de tarea	Nombre de tarea	% compl	% esper FED (Text	Estado	Comienzo
	I.E.D GENERAL	55%	75%	Retrasada	lun 30/10/23
	INICIO OBRA	0%	100%	Retrasada	lun 30/10/23
	IED USMINIA	100%	100%	Completada	lun 30/10/23
	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	98%	100%	Retrasada	mar 31/10/23
	IED CHUNIZA	100%	100%	Completada	mar 31/10/23
	IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	95%	100%	Retrasada	mar 31/10/23
	DILE SUMAPAZ	25%	100%	Retrasada	mar 7/11/23
	IED CAMPESTRE JAIME GARZON AURAS	73%	100%	Retrasada	mar 7/11/23
	IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNION	59%	100%	Retrasada	mar 7/11/23
	VIVIENDA DOCENTE CAMPAMENTO	14%	100%	Retrasada	mié 8/11/23
	IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	100%	100%	Completada	vie 1/12/23
	CED SAN JOSE DE USME SEDE A - DON BOSCO 2	0%	49%	Retrasada	jue 29/02/24
	IED CAMPESTRE JAIME GARZON - RAIZAL	0%	48%	Retrasada	vie 1/03/24
	RURAL DE LAS MERCEDES	19%	49%	Retrasada	vie 1/03/24

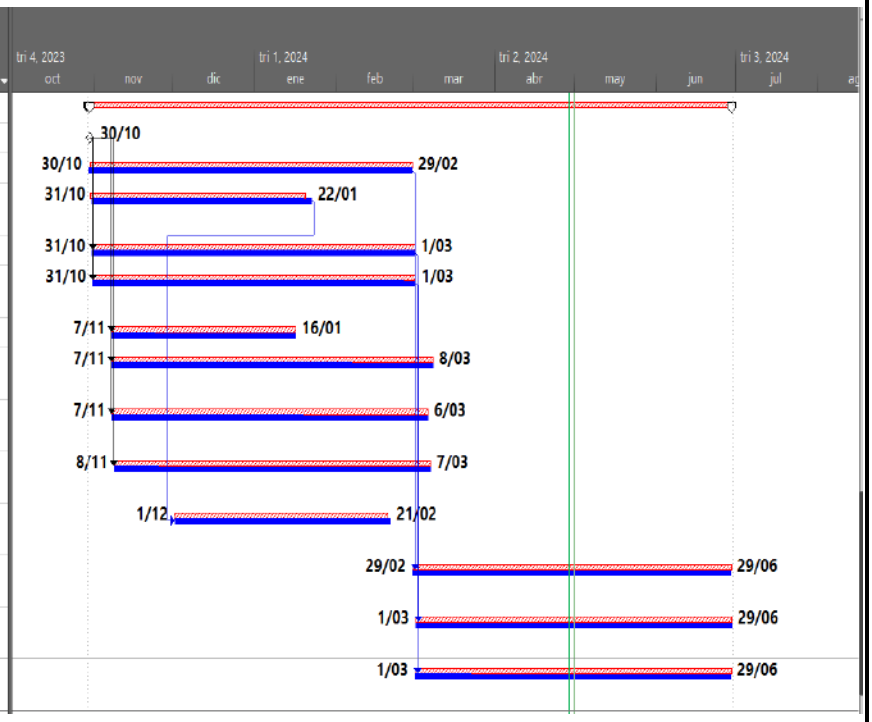

PROGRAMACIONES

COLEGIO (SEDE)	Fecha de inicio	Fecha real de inicio	Días de retraso
COLEGIO (SEDE)	30/10/2023		
Usminia sede B	30/10/2023	30/10/2023	0
Fernando Gonzaléz Ochoa	31/10/2023	15/11/2023	-15
Diego Cuellar sede B	31/10/2023	7/11/2023	-7
Chuniza	31/10/2023	15/11/2023	-15
DILE Sumapaz	7/11/2023	7/04/2024	-152
IED Campestres Jaime Garzón - Auras	7/11/2023	17/12/2023	-40
IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	7/11/2023	20/11/2023	-13
Vivienda docente - Campamento	8/11/2023	3/01/2024	-56
Diego Cuellar sede A	1/12/2023	11/12/2023	-10
San José de Usme - Don Bosco 2	29/02/2024		
IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	1/03/2024		
Rural Las Mercedes	1/03/2024	8/04/2024	-38
Emergencias		4/01/2024	62

Nota: El constructor solicito la liberación de espacios para intervenir en la sede El Toldo, la cual fue remitia a la SED y esta a su vez al rector del colegio. Mediante el comunicado S-2024-77846, la SED envía la respuesta del rector, la cual no aprueba dicha liberación; por lo cual, la supervisión del contrato solicita no tener en cuenta en la programación en este informe las sedes Erasmo Valencia, Toldo, Tunal Alto y Diego C.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
BOGOTÁ

PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA
FIRMA CB INGENIEROS

NUMERO	NOMBRE	CARGO	PROCEDENCIA	INGRESO	RETIRO	PAZ Y SALVO	OBSERVACION
1	CRISTIAN CAMILO BARRAGAN PEÑA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA II	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
2	ANDRES FELIPE MACKENZIE FUENTES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
3	DIANA MAYERLY ARGUELLO ROMERO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA I	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
4	MANUEL RICARDO GOMEZ CARRILLO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
5	BIBIANA ANDREA JIMENEZ CHAPARRO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
6	BIBIANA ANDREA JIMENEZ CHAPARRO	ESPECIALISTA SST	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
7	CESAR AUGUSTO BOLAÑO TAFUR	ESPECIALISTA ELECTRICO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
8	NELSON FELIPE MORENO CARDONA	ESPECIALISTA HIDRAULICO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
9	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO	PROF. COSTOS Y PRESUPUESTOS	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
10	OSCAR CAMILO GOMEZ LOPEZ	ABOGADO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
11	CINDY PAOLA DIAZ VALENCIA	TECNICO	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
12	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR I	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
13	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR II	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
PERSONAL COMPLEMENTARIO QUE NO SE INCLUYE DENTRO DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO							
14	CINDY MILENA DUARTE VELANDIA	APOYO SST	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
15	CRISTIAN FERNEY LESMES VACA	AUXILIAR	BOGOTA D.C	30/10/2023	N/A	N/A	
16	MANUEL ANTONIO MUÑOZ CRUZ	INSPECTOR DE APOYO	BOGOTA D.C	27/11/2023	N/A	N/A	
17	CARLOS JULIO MACANA SECHAGUA	INSPECTOR DE APOYO	BOGOTA D.C	19/04/2023	N/A	N/A	
TOTAL DE PERSONAL PROMEDIO EN OBRA: 17							

Observaciones: Durante el periodo del presente informe no se presentaron novedades con el personal de interventoria.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

MAQUINARIA - EQUIPOS - VEHICULOS DE OBRA

PERIODO DEL INFORME:	SEMANAL No. 26	
SEMANA REPORTADA: lunes, 22 de abril de 2024	AL	domingo, 28 de abril de 2024

COLEGIO USMINIA SEDE B

			SEMANAL No. 26						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			22	23	24	25	26	27	28
1	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
2	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	X	X	X	X	X	X	
3	PULIDORA 9"	BOSCH - 00094	X	X	X	X	X	X	
4	PULIDORA 9"	BOSCH 90B - 66200134	X	X	X	X	X	X	
5	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	MEINENG - 3016	X	X	X	X	X	X	
6	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	X	X	X	X	X	X	
7	SOLDADORA	KIN 200M - BAUKER	X	X	X	X	X	X	
8	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	CINBELL	X	X	X	X	X	X	
10	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
12	BRILLADORA INDUSTRIAL	2	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO FERNANDO GONZALÉZ OCHOA

			SEMANAL No. 26						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			22	23	24	25	26	27	28
1	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
3	VOLQUETA	PLACA: SQB000 COLOR: NARANJA	X	X	X	X	X	X	
4	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
5	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
6	CANGURO APISONADOR	H 80 - HAUSSEN	X	X	X	X	X	X	
7	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
8	CAMIÓN MEZCLADOR	WNW141 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
9	CAMIÓN HORMIGONERO	WCU234 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
10	BOMBA PARA HORMIGÓN	TK 40 AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
11	SOPLETE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
12	PULIDORA 4"	AG820E - BAUKER	N/A	N/A	X	X	X	X	
13	COMPRESOR 2 HP	PRETUL	X	X	X	X	X	X	
14	TRONZADORA	DEWALT M9355	X	X	X	X	X	X	
15	SOLDADORA	FOX WELD	X	X	X	X	X	X	
16	HIDROLAVADORA	2	X	X	X	X	X	X	
17	PULIDORA	MAKITA 4"	X	X	X	X	X	X	
18	PULIDORA	DEWALT 4"	X	X	X	X	X	X	
19	TALADRO	MAKITA	X	X	X	X	X	X	
20	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
21	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
22	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
23	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
24	ACOLILLADORA	DEWALT - 247516	X	X	X	X	X	X	
25	LIJADORA	DEWALT - DW317	X	X	X	X	X	X	

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B

			SEMANAL No. 26						
NUMERO	EQUIPO	REFERENCIA	LU	MA	MIE	JU	VI	SA	DO
HERRAMIENTA			22	23	24	25	26	27	28
1	COMPRESOR 2 HP	BAUKER - 002	X	X	X	X	X	X	
2	MARTILLO PERFORADOR	TA 16386 - DEWALT	X	X	X	X	X	X	
3	SOLDADORA INVERSOR	KMIG1802 -UBERMAN	X	X	X	X	X	X	

4	TALADRO ROTOMARTILLO	D25133-B3 - DEWALT	X	X	X	X	X	X	
5	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	X	X	X	X	X	X	
6	TRONZADORA	232000249 12/2022 - BOSCH	X	X	X	X	X	X	
7	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	T	T	T	T	T	T	
8	PULVERIZADOR DE PINTURA SIN AIRE	WAGNER CONTROL PRO 190 HEA	X	X	X	X	X	X	
9	TALADRO INALAMBRICO	UBERMANN	T	T	T	T	T	T	
10	PULIDORA	CINBELL	T	T	T	T	T	T	
11	TALADRO INALAMBRICO	MAKITA	T	T	T	T	T	T	
12	HIDROLAVADORA	BLACK DECKER 7185	X	X	X	X	X	X	
13	TROMPO MEZCLADOR	DY186FA	T	T	T	X	X	X	
14	VIBROCOMPACTADOR	01MASALTA	X	X	X	X	X	X	
15	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	X	X	X	X	X	X	
16	MAQUINA DE SOLDAR	CORMAG	T	T	T	T	T	T	
17	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	T	T	T	T	T	T	
	PULIDORA	SKIL 9002-231	T	T	T	T	T	T	
	MAQUINA DE SOLDAR	CORMAG	T	T	T	T	T	T	

COLEGIO CHUNIZA									
			SEMANAL No.		**26**				
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA			**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
1	VOLQUETA	PLACA: SRL 286 COLOR:AMARILLO	X	X	X	X	X	X	
2	MINICARGADOR BOBCAT	S570	X	X	X	X	X	X	
3	RODILLO VIBRATORIO	BW 161 D - BOMAG	X	X	X	X	X	X	
4	HIDROLAVADORA A GASOLINA	LAGAS-2800 - TRUPER	X	X	X	X	X	X	
5	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	MTCOD1029	X	X	X	X	X	X	
6	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
7	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
8	EQUIPO DE SOLDADORA	LINCOLN ELECTRIC MMA35O	X	X	X	X	X	X	
9	PULIDORA	001 4"	X	X	X	X	X	X	
10	COMPRESOR	DEWALT DWFP55126	X	X	X	X	X	X	
11	COMPRESOR DE AIRE	PRETUL 20L 135PSI	X	X	X	X	X	X	
13	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
14	APISONADOR CANGURO	KAMA DIESEL KM173FKK210909088	X	X	X	X	X	X	
14	SONDA ELECTRICA	LYCTOOLS	X	X	X	X	X	X	

LA UNIÓN SUMAPAZ									
			SEMANAL No.		**26**				
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA			**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
1	PLANTA ELECTRICA	C08000-GG-AE	D	D	D	D	D	D	
2	TALADRO ROTOMARTILLO	DEWALT TAI5386	D	D	D	D	D	D	
3	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	I	X	I	X	X	
4	TROMPO MEZCLADOR	001 - COLOR NARANJA	D	D	D	D	D	D	
5	CANGURO APISONADOR	CORMAG - 20A300	D	D	D	D	D	D	
6	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT	D	D	D	D	D	D	
7	PULIDORA 4"	06 2020 TRUPER	D	D	D	D	D	D	
8	EQUIPO DE SOLDADURA	NO SE TIENE INFORMACIÓN	D	D	D	D	D	D	
9	COMPRESOR PARA PINTURA	2020121301 BM-24 L	D	D	D	D	D	D	
10	BRILLADORA INDUSTRIAL	ELECTROLUX 137-402	X	X	X	X	X	X	
11	PULIDORA 4"	TRUPER	T	T	T	T	T	T	
12	PULIDORA 9"	BOSCH	T	T	T	T	T	T	
13	EQUIPO DE SOLDURA	WALL QUUALITY TOOLS	T	T	T	T	T	T	
14	EQUIPO DE SOLDURA	WEST ALCO	D	D	D	T	T	T	
15	TALADRO ROTOMARTILLO DEMOLEDOR	DELWAT	X	X	X	X	X	X	
16	COMPACTADOR TIPO CANGURO	HONDA	D	D	D	D	D	D	
17	COMPRESOR	DISC VER	D	D	T	D	T	T	

AURAS - SUMAPAZ									
			SEMANAL No.			**26**			
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA			**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
1	COMPRESOR PARA PINTURA	SERIAL H112200639 MARCA KARSON	D	D	D	D	D	D	
2	EQUIPO DE SOLDADURA	KIN160M BAUKER	D	D	D	D	D	D	
3	EQUIPO DE SOLDADORA	BAUKER - IEC60974-1:20212	D	D	D	D	D	D	
4	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	I	X	X	

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE A									
			SEMANAL No.			**26**			
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA			**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
1	SOPLETE A GAS CON PIPETA	N/A	X	X	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	X	X	X	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	X	X	X	X	X	X	
4	CAMIÓN HORMIGONERO	VKK764 BLANCO	X	X	X	X	X	X	
5	BOMBA ESTACIONARIA	2106T3843 PUTZMEISTER TK-70	X	X	X	X	X	X	
6	COMPRESOR	PRETUL 135 PSI	X	X	X	X	X	X	
7	MAQUINAS DE SOLDAR	CORMAG	X	X	X	X	X	X	
8	SOLDADORA	UBERMANN KMIG1802	X	X	X	X	X	X	
9	SACANUCLEOS	FERTON TLNC200 - BROCA UIUSTOOLS	X	X	X	X	X	X	
10	LIJADORA	TRUPER LIOR14A2	X	X	X	X	X	X	
11	ACOLILLADORA	RYOBI 001	X	X	X	X	X	X	
12	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	X	X	X	X	X	X	
VIVIENDA CAMPAMENTO DOCENTE									
			SEMANAL No.			**26**			
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA			**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	I	X	X	X	X	
2	MAQUINAS DE SOLDAR	1	T	T	T	T	T	T	
3	TROMPO MEZCLADOR	2	T	T	T	T	T	T	
RURAL LAS MERCEDES									
			SEMANAL No.			**26**			
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA			**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
1	VOLQUETA	PLACA: SAA 989 COLOR AZUL	X	I	X	X	X	X	
2	VOLQUETA	PLACA: AJB925 COLOR VERDE	X	I	X	I	X	X	
3	CANGURO APISONADOR	1	D	D	D	D	D	D	
4	TALADRO DEMOLEDOR	ROTARY HAMMER CDS-32H-A	D	D	D	D	D	D	
5	TALADRO DEMOLEDOR	DEWALT D25601K	D	D	D	D	D	D	
6	PLACA VIBRATORIA A GASOLINA	002 MOTOR HONDA	T	T	T	T	T	T	
INTERVENTORIA									
NUMERO	**EQUIPO**	**REFERENCIA**	**LU**	**MA**	**MIE**	**JU**	**VI**	**SA**	**DO**
HERRAMIENTA INTERVENTORIA			**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
OBSERVACIÓN:		OBSERVACIONES: N/A							
X: RETIRADA DE OBRA									
D: DISPONIBLE PERO NO TRABAJA									
V: VARADO									
T: TRABAJANDO									
I: INGRESA Y SALE EL MISMO DIA									

REPORTE DE LLUVIAS

PERIODO DEL INFORME: **DEL** lunes, 22-abr.-24 **AL** domingo, 28-abr.-24

SEMANA REPORTADA:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ

Usminia sede B

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	22/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	23/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	24/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	25/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	26/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
SÁBADO	27/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	28/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Fernando Gonzaléz Ochoa

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	22/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	23/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	24/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	25/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
VIERNES	26/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	27/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	28/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Diego Cuellar sede B

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	22/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	23/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	24/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	25/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
VIERNES	26/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	27/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A
DOMINGO	28/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m				x	N/A

OBSERVACIÓN :

Chuniza

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	22/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	23/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	24/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	25/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	26/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	27/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	28/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	22/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x		x		N/A
MARTES	23/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	24/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	25/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x				N/A
VIERNES	26/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x				N/A
SÁBADO	27/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m	x				N/A
DOMINGO	28/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Diego Cuellar sede A

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	22/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	23/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	24/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	25/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	26/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	27/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	28/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

IED Campestres Jaime Garzón - Auras

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	22/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x		x		N/A
MARTES	23/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	24/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	25/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x				N/A
VIERNES	26/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m	x				N/A
SÁBADO	27/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m	x				N/A
DOMINGO	28/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

Vivienda docente - Campamento

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	22/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	23/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	24/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	25/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	26/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	27/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	28/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

DILE Sumapaz

DÍA	FECHA	HORA INICIO	HORA TERMINA	LLUVIA FUERTE	LLUVIA LEVE	LLUVIA MODERADA	SECO	ESTADO MATERIAL
LUNES	22/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MARTES	23/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
MIÉRCOLES	24/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
JUEVES	25/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m				x	N/A
VIERNES	26/04/2024	7:00 a.m	5 :00 p.m			x	x	N/A
SÁBADO	27/04/2024	7:00 a.m	12 :00 p.m			x	x	N/A
DOMINGO	28/04/2024	NO SE REALIZAN ACTIVIDADES						

OBSERVACIÓN :

G. Pólizas

G.1. Interventoría

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101284899	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	10	2023	05	09	2023	00:00	05	06	2029	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CB INGENIEROS S A S	NIT: 860.509.943-7	CL 98 NRO. 22 - 64 OFICINA 503	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7040592

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	NIT: 899.999.061-9	Avenida El Dorado No. 66-63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO NO CO1.PCCNTR.5313332 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EL LOTE NO 5.

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE 19 DE OCTUBRE DE 2023 SE MODIFICAN LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(2,093,380.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(401,542.00)	$ *******(2,514,922.00)	$ ****(252,214,462.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101284899

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101284899	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	10	2023	05	09	2023	00:00	05	06	2029	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CB INGENIEROS S A S	NIT: 860.509.943-7

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 98 NRO. 22 - 64 OFICINA 503	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7040592

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
Avenida El Dorado No. 66-63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · CODENSA

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *(2,093,380.00)	$ ****(20,000.00)	$ ***(401,542.00)	$ *******(2,514,922.00)	$ ****(252,214,462.00)	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101284899	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	10	2023	05	09	2023	00:00	05	06	2029	23:59	ANEXO DE MODIFICACION

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CB INGENIEROS S A S		**NIT: 860.509.943-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 98 NRO. 22 - 64 OFICINA 503		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7040592

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	Avenida El Dorado No. 66-63		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3241000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101284899

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101284899, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 25 días del mes de OCTUBRE de 2023

15-44-101284899

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101284899	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	10	2023	19	10	2023	00:00	19	07	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CB INGENIEROS S A S	NIT: 860.509.943-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 98 NRO. 22 - 64 OFICINA 503	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7040592

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
Avenida El Dorado No. 66-63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO NO CO1.PCCNTR.5313332 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.

LA PRESENTE POLIZA CUBRE EL LOTE NO 5.

NOTA: EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL DE LA OBRA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**19/10/2023**	**21/03/2025**	**$100,885,784.80**	
CALIDAD DEL SERVICIO	**19/07/2024**	**19/07/2029**	**$100,885,784.80**	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**19/10/2023**	**19/07/2027**	**$50,442,892.40**	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE INICIO DE 19 DE OCTUBRE DE 2023 SE MODIFICAN LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,093,380.00	$ ******20,000.00	$ *****401,542.00	$ *********2,514,922.00	$ ******252,214,462.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101284899

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101284899	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	10	2023	19	10	2023	00:00	19	07	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CB INGENIEROS S A S	NIT: 860.509.943-7

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 98 NRO. 22 - 64 OFICINA 503	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7040592

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
Avenida El Dorado No. 66-63	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***2,093,380.00	$ ******20,000.00	$ *****401,542.00	$ *********2,514,922.00	$ ******252,214,462.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11002613374883(3900)000002514922(96)20241018

REFERENCIA PAGO:

1100261337488-3

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-44-101284899	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
25	10	2023	19	10	2023	00:00	19	07	2029	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CB INGENIEROS S A S		**NIT: 860.509.943-7**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 98 NRO. 22 - 64 OFICINA 503		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		7040592

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		**NIT: 899.999.061-9**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	Avenida El Dorado No. 66-63		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		3241000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-44-101284899

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101284899, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 25 días del mes de OCTUBRE de 2023

15-44-101284899

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

G.2. Obra

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3605319775

PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000028999 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA** COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	11	2023	09	11	2023

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **CONSORCIO CLARIDAD** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.745.447-4**

DIRECCIÓN: CR 80 A 25 C 19 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3134412819

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

BENEFICIARIO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS CONTRATO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO	05/09/2023	01/03/2025	1,521,746,834.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	05/09/2023	29/06/2027	760,873,417.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		VER NOTA ACLARATORIA	1,521,746,834.80

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 901059450 - C H M INGENIERIA SAS - PART: 33.00%
NIT 901241893 - MARVA CONSTRUCCIONES SAS - PART: 33.00%
CC 79109085 - ORTIZ BELLO, NESTOR ALFONSO - PART: 34.00%

BENEFICIARIOS
NIT 899999061 - BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ *3,804,367,087.00	$ **********0	$*********0.00	$ **********0	$ **********0

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART
DPS ASESORES LTDA	8806	100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000360531977

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CDDE207D0B0DFC7D5E

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000028999** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO CLARIDAD** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.745.447-4**

ASEGURADO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

BENEFICIARIO: **BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION** IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.061-9**

TEXTO ITEM 1

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305904 DE FECHA 05/09/2023 CUYO OBJETO ES: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. GRUPO # 5

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

POR DISPOSICIÓN DEL ARTIULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

MODIFICACIÓN

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 QUEDANDO LOS AMPAROS ASI:

CUMPLIMIENTO DESDE 30/10/2023 AL 01/03/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DESDE EL 30/10/2023 AL 29/06/2027.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

..... LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3605320138

PÓLIZA No: 360 -74 - 994000008142 ANEXO:1

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA** COD. AGE: 360 RAMO: 74 PAP:

DIA	MES	AÑO		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO
09	11	2023	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	05	05	2024	23:59		29	06	2024	23:59	55	09	11	2023
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	DIAS	FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

TIPO DE MOVIMIENTO PRORROGA

	DIA	MES	AÑO	HORAS		DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
VIGENCIA DEL ANEXO	05	05	2024	23:59		29	06	2024	23:59	55
	VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA			A LAS	

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:: **CONSORCIO CLARIDAD** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.745.447-4**

DIRECCIÓN: CR 80 A 25 C 19 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 3134412819

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CONSORCIO CLARIDAD** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.745.447-4**

DIRECCIÓN: CR 80 A 25 C 19 CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: 3134412819

BENEFICIARIO: IDENTIFICACIÓN:

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: CONSORCIO CLARIDAD NIT : 901745447

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: DISTRITO CAPITAL CIUDAD: BOGOTÁ, D.C.

DIRECCION: LOCALIDAD DE USME - COLEGIO CPF 535 USMINIA - LORENZO ALCANTUZ

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO TIPO DE RIESGO: COMERCIAL MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		$ 580,000,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	580,000,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	58,000,000.00		
	RCE PATRONAL	58,000,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	58,000,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES IMPUTABLES AL TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA POLIZA, CAUSADOS A BIENES DE TERCEROS O TERCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA No.CO1.PCCNTR.5305904 DE FECHA 05/09/2023 CUYO OBJETO ES: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LASPLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LAATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAINFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. GRUPO # 5

CONSORCIO CLARIDAD CONFORMADO POR:
CHM INGENIERIA SAS NIT:901059450-4 PART:33%
MARVA CONSTRUCCIONES SAS NIT:901241893-2 PART:33%
NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO CC 79.109.085 PART:34%

NOTA:
ASEGURADO:CONSORCIO CLARIDAD Y BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION NIT:899999061-9
BENEFICIARIO:TERCEROS AFECTADOS Y BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION NIT:899999061-9

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
$ ***580,000,000.00	$ **********0	$*******0.00	$ **********0	$ **********0

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	%PART
DPS ASESORES LTDA	8806	100.00

COASEGURO CEDIDO

NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)000000000007000360532013

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CDDE207D0B0DFC7A5A

CLIENTE

LAPEREZ 0

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SANTA PAULA COD. AGENCIA: 360 RAMO: 74 No PÓLIZA: **994000008142** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **CONSORCIO CLARIDAD** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.745.447-4**

ASEGURADO: **CONSORCIO CLARIDAD** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.745.447-4**

BENEFICIARIO: IDENTIFICACIÓN:

TEXTO ITEM 1

LA PRESENTE PÓLIZA AMPARA:
-COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE.
-COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.
-COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS,SALVO QUE LA SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.
-COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
-COBERTURA EXPRESA DE VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

MODIFICACIÓN

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIA A LOS AMPAROS DE LA CITADA POLIZA, SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2023 QUEDANDO LOS AMPAROS ASI:

DESDE 30/10/2023 AL 29/06/2024

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

CLIENTE

LISTADO DE ASEGURADOS
POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

No. POLIZA: **994000008142** ANEXO: 1 TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA

TOMADOR: **CONSORCIO CLARIDAD** IDENTIFICACION: **901.745.447-4**

ASEGURADOS

ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	CONSORCIO CLARIDAD	901745447-4	LOCALIDAD DE USME - COLEGIO CP	BOGOTÁ, D.C.	580,000,000.00	0	0

PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
0	**0**

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de seguridad: vQ6r8MRKFnXioTpPgT80Sg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: (601) 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000007-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100000074	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	270132354	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/09/2023	24:00 Horas Del	06/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CLARIDAD	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.745.447-4
DIRECCIÓN	CRA 80 25C 19	**TELÉFONO**	3134412819
ASEGURADO	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON - BOGOTA DC	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66-63	**TELÉFONO**	2670114
BENEFICIARIO	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	**No. DOC. IDENTIDAD**	899.999.061-9
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 66-63	**TELÉFONO**	2670114

OBJETO DE CONTRATO

RIESGO : 1

VIGENCIA (DESDE) VIGENCIA (HASTA) 05/09/2023 06/12/2024AMPARO SUMA ASEGURADA MONEDA

DAÑOS MATERIALES	-7,608,734,174.00	$
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA	-7,608,734,174.00	$
CICLÓN, HURACÁN, INUNDACIÓN, TEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL	-7,608,734,174.00	$
AMIT - HMACC	-7,608,734,174.00	$
MANTENIMIENTO	-7,608,734,174.00	$
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS MATERIALES	-2,000,000,000.00	$
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS PERSONALES	-2,000,000,000.00	$
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	-1,000,000,000.00	$

ES OBLIGATORIO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE SEGUN CIRCULAR 034 DE AGOSTO 27 DE 2004 DE LA SUPERBANCARIA.

Los valores asegurados establecidos como limites para los amparos adicionales otorgados en la presente póliza (si los hubiere) forman parte del valor asegurado total establecido para el amparo básico que se considera el límite máximo de responsabilidad de la aseguradora y por lo tanto no se consideran valores asegurados adicionales.

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
DPS ASESORES LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	-9.130.481,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-9.130.481,01
GASTOS EXP.	$	-10.000,00
IVA	$	-1.736.691,39
TOTAL A PAGAR	$	-10.877.172,40

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **(601) 327 4712 - (601) 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-12-PPSUS14R00000007-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100000074	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	270132354	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/09/2023	24:00 Horas Del	06/12/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE REVOCA PÓLIZA POR TRASLADO DE VIGENCIA.

CONTINUACION AMPAROS...

AMPARO	LIM POR EVENTO	LIM POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
REMOCIÓN DE ESCOMBROS	0.00	-1,000,000,000.00	-1,000,000,000.00	0.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	270132354

Fecha de Facturación	08/11/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE	
Póliza No.	CBC–100000074
Periodo Facturado	05/09/2023 — 06/12/2024

Fecha Límite de Pago	08/12/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	–9.140.481,01
IVA	–1.736.691,39
VALOR TOTAL A PAGAR $	–10.877.172,40

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO CLARIDAD
CRA 80 25C 19	901745447
Intermediario	DPS ASESORES LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **08/12/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	270132354

Fecha de Facturación	08/11/2023
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO CONSTRUCCION Y MONTAJE	
Póliza No.	CBC–100000074
Periodo Facturado	05/09/2023 — 06/12/2024

Fecha Límite de Pago	08/12/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	–9.140.481,01
IVA	–1.736.691,39
VALOR TOTAL A PAGAR $	–10.877.172,40

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	CONSORCIO CLARIDAD
CRA 80 25C 19	901745447
Intermediario	DPS ASESORES LTDA

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000270132354(3900)000–10877172(96)20231208

Bancos Corresponsales OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990270132354(3900)000–10877172(96)20231208

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

H.
Correspondencia

H.1. Enviada

GRUPO EMPRESARIAL

03/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-078-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL NO. 4, MES DE FEBRERO 2024.

Respetado ingeniero Jiménez,

Informamos que una vez revisado el informe mensual No. 4, remitido mediante oficio No. CONS-CLARIDAD-089-2023 del 20 de marzo de 2024, nos permitimos remitir las siguientes observaciones:

- COMPONENTE TÉCNICO

Se solicita ajusta la tabla de contenido puesto que no contemplan todos los colegios que están relacionados en el cuerpo del informe y la numeración no es continua.

I.E.D FERNADO GONZÁLEZ OCHOA

- Ajustar el gráfico del *1.1.1. CONTROL FINANCIERO I.E.D FERNANDO GONZALEZ OCHOA* de acuerdo con el acta parcial de obra No. 4.
- La descripción de la actividad no corresponde en el ítem 7.2.4, 7.2.31.
- Las fechas no corresponden al periodo del informe en el ítem 7.2.4, 7.2.31, 13.2.9, 13.4.2. Retirar dichas actividades si estas corresponden al mes de marzo o meses anteriores al de febrero.
- En el NP-001 mencionan que la actividad ya fue completada pero aún falta la puesta en funcionamiento de dichos equipos, informar las actividades faltantes.
- El numeral *1.1.3. VALOR EJECUTADO DURANTE EL PERIODO* no se presenta valor ejecutado de acuerdo con el acta parcial de obra No. 4.

I.E.D USMINIA SEDE B

- Ajustar el gráfico del *2.1.1. CONTROL FINANCIERO I.E.D USMINIA SEDE B* de acuerdo con el acta parcial de obra No. 4.
- En el numeral *2.1.1. CONTROL FINANCIERO I.E.D USMINIA SEDE B* mencionan que el atraso presentado se ajustará en el transcurso del mes de febrero, pero dicho atraso corresponde al mes de febrero por lo que se deberá ajustar en el mes de marzo, corregir.
- Las fechas no corresponden al periodo del informe en el ítem 3.1.19, 4.3.17, 11.1.14. Retirar dichas actividades si estas corresponden al mes de marzo o meses anteriores al de febrero.
- En el ítem 7.2.101, 13.1.1 y 13.1.12 el porcentaje de ejecución es menor al 100% pero la fecha de terminación programada ya se cumplió, no es coherente, aclarar situación o ajustar fecha.
- El numeral 2*.1.3. VALOR EJECUTADO DURANTE EL PERIODO* no se presenta valor ejecutado de acuerdo con el acta parcial de obra No. 4.
- Los numerales *2.1.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES* y *2.1.5. ENSAYOS DE LABORATORIO* son los mismo del informe mensual No. 3. ajustar de acuerdo con la actualidad del proyecto

I.E.D DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B

- Ajustar el gráfico del *3.1.1. CONTROL FINANCIERO I.E.D DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B* de acuerdo con el acta parcial de obra No. 4.
- En el numeral *3.1.1. CONTROL FINANCIERO I.E.D DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B* ajustar la información financiera de acuerdo con el acta No. 4 de obra.
- En el ítem *1.2.3., 1.2.4., 1.2.6* y *1.2.31* el bloque demolido fue el deportes y bodega, ajustar.
- En el ítem *1.2.28, 1.2.33* el bloque en mención es el de salones detrás de baños.
- Ajustar registro fotográfico de acuerdo con el tipo de actividad descrita en el ítem *1.2.18*, *1.2.20*, *1.2.33, 13.1.11* y 13.1.12.
- El ítem *1.2.47* no se realizó, retirar.
- El ítem *5.1.18, 5.1.72* y *5.1.78* es en bloque de salones, ajustar.
- El ítem 13.1.11, está repetido.
- La descripción de las actividades no corresponde al ítem 13.1.12.
- Ajustar los valores del numeral *3.1.3. VALOR EJECUTADO DURANTE EL PERIODO* de acuerdo con el acta de obra No. 4.

IED JAIME GARZÓN – SEDE AURAS

- En el numeral *4.1.1. CONTROL FINANCIERO IED JAIME GARZÓN – SEDE AURAS* ajustar de acuerdo con el acta de obra No. 4.
- En el ítem *1.2.26* según la fecha de terminación programada corresponde al mes de marzo, por lo que el porcentaje de ejecución no puede ser del 100%.
- El ítem 2.5.2 mejorar la calidad del registro fotográfico.
- En el ítem 1.4.7, 3.3.5, 13.4.4 y 17.1.50 la fecha de terminación ya se cumplió, pero el porcentaje de ejecución no es del 100% y se menciona que se cumple con el alcance, pero no es así, aclarar y ajustar.

- En el ítem 17.1.29 informan que la actividad está al 100% y cumple con el alcance, pero no es así, falta aun una gran parte de la nueva cubierta por terminarse, ajustar esta información.
- Ajustar los valores del numeral *4.1.3. VALOR EJECUTADO DURANTE EL PERIODO* de acuerdo con el acta de obra No. 4.
- En el numeral *4.1.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES* se solicita mencionar el atraso respecto a la programación aprobada por la interventoría y se solicita la presentación del Plan de Contingencia para subsanar dicho atraso.
- Se solicita el informe del ensayo de líquidos penetrantes.

IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A

- En el numeral *4.1.1. CONTROL FINANCIERO IED JAIME GARZÓN – SEDE AURAS* ajustar de acuerdo con el acta de obra No. 4.
  Mencionan que no se presentó atrasos para la entrega de la sede educativa cosa que no es cierta si se toma en cuenta la programación general aprobada por la interventoría, aclarar esta situación.
- Puesto que las cantidades de los trabajos realizados deberán ser revisadas una vez se presente dicha acta, solicitamos que en la descripción de las actividades no se coloquen las cantidades de lo ejecutado.
- En el ítem 3.3.5, 7.1.1, 7.2.75 ajustar fechas de inicio y terminación de la actividad.
- El ítem 17.1.16 no se realizó, retirarlo del informe.
- En el ítem 4.8.5 y 20.1.1 ajustar registro fotográfico.
- El numeral *5.1.3.* VALOR EJECUTADO DURANTE EL PERIODO ajustar de acuerdo con el acta de obra No. 4.
- El numeral *5.1.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES* es el mismo del informe mensual de enero.
- Se solicita el informe del ensayo de líquidos penetrantes.

IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LA UNIÓN

- En el numeral *6.1.1. CONTROL FINANCIERO IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LA UNIÓN* ajustar de acuerdo con el acta de obra No. 4.
- El ítem *1.4.7, 1.2.31* y *19.1.1* tiene fechas de inicio y terminación que no corresponden al periodo del informe en revisión.
- En el ítem *4.6.1* cambiar la fotografía puesto que no se muestra los puntos de agua fría al que corresponde según el ítem.
- En el ítem 2.2.4, 2.2.16 ajustar el registro fotográfico de acuerdo con el ítem.
- El numeral *6.1.3. VALOR EJECUTADO DURANTE EL PERIODO* ajustar de acuerdo con el acta de obra No. 4.

I.E.D CHUNIZA

- En el numeral *2.1.1. CONTROL FINANCIERO I.E.D CHUNIZA* ajustar de acuerdo con el acta de obra No. 4.
- En el numeral *2.1.3. VALOR EJECUTADO DURANTE EL PERIODO* ajustar de acuerdo con el acta de obra No. 4.
- El numeral *2.1.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES* mencionar la situación referente para la terminación de la pintura de las canchas.

EMERGENCIA IED JAIME GARZON SD TABACO

- En el numeral *VALOR TOTAL DE LAS EMERGENCIAS VS EJECUTADO* ajustar la gráfica de acuerdo con la programación de esta emergencia.
- El ítem 17.1.9 no se realizó, retirar del informe.
- En el ítem 19.1.1 ajustar las observaciones e incluir todo lo que se incluyó en el transporte, cerramiento y demás.

EMERGENCIA IED JAIME GARZON SD NAZARETH

- En el numeral *VALOR TOTAL DE LAS EMERGENCIAS VS EJECUTADO* ajustar la gráfica de acuerdo con la programación de esta emergencia.

No hay información de sobre Vivienda Campamento Docente.

En el numeral *41. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO* presentar un Plan de Contingencia con el cual esperan subsanar los atrasos que bien mencionan en este numeral.

Ajustar la tabla del numeral *41.1. ACTAS PARCIALES DE OBRA* de acuerdo con el acta parcial No. 4.

- **COMPONENTE AMBIENTAL**

1. No existe señalización clara en el área de acopio de materiales, lo que dificulta determinar si se trata de materiales pétreos o RCD.

2. La tabla No. 4 no ha sido completada de manera adecuada. Resulta ilógico que solo se registre la disposición de residuos peligrosos para el mes de febrero.

3. La Tabla 6, muestra el consolidado de los RCD, generados en la obra, presenta información incompleta para el mes de febrero.

4. En el informe se menciona que "**se adjunta el certificado de mantenimiento de baños en el anexo 6. Sin embargo, se aclara que el certificado correspondiente al periodo de febrero de 2024 será enviado en el próximo informe"**. Esta afirmación debe ser corregida, ya que efectivamente se ha adjuntado el certificado mencionado.

5. Durante la limpieza de los cárcamos existentes, se observa evidencia de afectación en dichos sumideros, cárcamos, rejillas etc.

6. El tema de la capacitación es "La importancia de cuidar las zonas verdes". Sin embargo, en el numeral 10, relacionado con el manejo de fauna, vegetación y paisaje, se indica que no se identificaron impactos negativos. Esto genera una contradicción, ya que es evidente que si se ve afectadas las zonas verdes.

7. En el anexo 2, los certificados y vales presentados no se encuentran organizados ni completos. Además, no se incluyen los certificados correspondientes al mes de febrero de 2024.

8. El control de los RCD solo registra 20 m3 de material para el mes de febrero. Se sugiere revisar este dato en relación con las actas parciales.

9. De acuerdo con el Anexo No. 5, se observa que los indicadores ambientales no están debidamente completados, ya que no se especifican las cantidades correspondientes. Esta falta de información precisa dificulta determinar el porcentaje de cumplimiento, el cual se presume en un 100%. Por esta razón, es importante proporcionar los datos cuantitativos necesarios en los indicadores ambientales.

- COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
CONTENIDO	**Contiene**	**No contiene**	**Observaciones**
1. Aspectos Generales Del Proyecto y del contratista			
PERSONAL APROBADO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL	X		Revisar. July Paola Ovalle Diaz ya fue retirada del proyecto y el Residente de obra LEONARDO TORRES LARA fue aprobado por interventoría el 08 de febrero de 2024 y no lo menciona en el informe
PERSONAL APROBADO OPERATIVO			No se menciona que personal ingreso en el mes de febrero 2024.
LISTA DE SUBCONTRATISTAS	X		No menciona el personal administrativo contractual de CONSORCIO CLARIDAD
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL	X		Se debe agregar las planillas de los profesionales independientes de CONSORCIO CLARIDAD
MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS	X		El punto 11 y el punto 23 no coinciden los listados de inspección con equipos, maquinaria y vehículos.
2. Anexos			
BASE DE DATOS DEL PERSONAL	X		No anexa
PLAN DE EMERGENCIA	X		No se encuentra diligenciado
NOVEDAD PERSONAL RETIRADO		X	Dentro del informe no notifican que personal se retiró en febrero 2024.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO	X		Incompletas, no vienen subrayadas, no contienen un seguimiento debido a que hay unas de ENERO-FEBRERO y otras de FEBRERO-MARZO.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL		X	No se evidencian la presentación de todas las planillas de seguridad social.
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PAGO DE PARAFISCALES Y DE SALARIOS		X	No hay ningún anexo
PAZ Y SALVOS Y NOTIFICACIÓN DE EXAMEN MEDICO DE RETIRO O CARTA DE TRASLADO		X	No anexan paz y salvo o carta de traslado

GRUPO EMPRESARIAL

03/04/2024
Bogotá D.C.

De acuerdo con la trazabilidad y revisión de las planillas de seguridad social entregadas a esta interventoría, del personal mínimo requerido, a la fecha no se ha subsanado las observaciones que se mencionan a continuación:

Cantidad	Cargo	Porcentaje de dedicación	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24
Director de Obra	JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA	30%	23/11/2023	12/12/2023	16/01/2024	14/02/2024	14/03/2024 no tiene fecha de pago
Residente de Obra	GUILLERMO ALBERTO VELANDIA CORDOBA	100%	24/11/2023	12/12/2023	16/01/2024	14/02/2024	14/03/2024 no tiene fecha de pago
Residente de Obra	LEONARDO TORRES LARA	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	14/03/2024 no tiene fecha de pago
Asesor Estructural	JULIO OSWALDO TORRES SUAREZ	10%	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	5/02/2024	NO PRESENTO
Asesor Ambiental	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	20%	NO PRESENTO	NO PRESENTO	16/01/2024	14/02/2024	14/03/2024 no tiene fecha de pago
Asesor en seguridad y salud en el trabajo.	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	20%	NO PRESENTO	NO PRESENTO	16/01/2024	14/02/2024	14/03/2024 no tiene fecha de pago
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	JORGE ERNESTO CASTIBLANCO MARTINEZ	10%	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	4/03/2024
Asesor en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	10%	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	12/03/2024
Profesional de costos, presupuestos y programación de obra	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	20%	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	8/03/2024
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.	LAURA YERALDINE RAMIREZ OCAMPO	100%	N/A	12/12/2023	16/01/2024	14/02/2024	14/03/2024 no tiene fecha de pago
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.	JOHANNA KATERINE MARTINEZ VARELA	100%	N/A	N/A	16/01/2024	14/02/2024	14/03/2024 no tiene fecha de pago
Inspector de obra	ROBERTO ROSAS CONDIA	100%	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO
Inspector de obra	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	100%	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO
Maestros de obra	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	100%	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO
Maestros de obra	ORLANDO ROSAS CONDIA	100%	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO	NO PRESENTO

COMPONENTE SOCIAL: No se encuentra información de este componente, dentro del informe remitido.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita dar respuesta a las anteriores observaciones en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles de recibir el presente comunicado.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: N.A.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

01/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-079-2024

Señores,


CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **PRESENTACIÓN DE APUS NO PREVISTOS**

Respetado ingeniero Jiménez,

Teniendo en cuenta lo socializado en la reunión No.44 del 14 de marzo *(…) "En cuanto al NP de la cocina de Don Bosco el apoyo de la supervisión solicita que deberá discriminar los elementos que conforman la cocina puesto que redes eléctricas e hidrosanitarias ya se encuentran en el presupuesto. El contratista de obra manifiesta que está evaluando la posibilidad de dicha discriminación puesto que no lo ven viable, se solicita al contratista de obra que se haga dicho análisis puesto que probablemente no se aceptará por parte de la entidad". (...)* y las observaciones del correo electrónico del 27 de marzo:

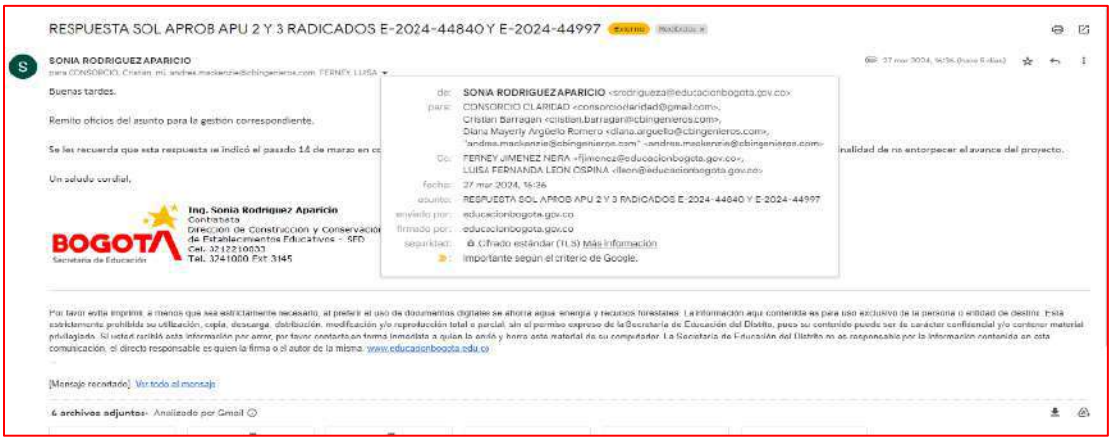
RESPUESTA SOL APROB APU 2 Y 3 RADICADOS E-2024-44840 Y E-2024-44997

SONIA RODRIGUEZ APARICIO

Buenas tardes.

Remito oficios del asunto para la gestion correspondiente.

Se les recuerda que esta respuesta se indicó el pasado 14 de marzo en cc

Un saludo cordial,

Ing. Sonia Rodriguez Aparicio
Contratista
Direccion de Construccion y Conservación de Establecimientos Educativos - SED
Cel. 3212100551
Tel. 3241000 Ext. 3145

de: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <srodriguezal@educacionbogota.gov.co>
para: CONSORCIO CLARIDAD <consorcioclaridad@gmail.com>, Cristian Barragan <cristian.barragan@cbingenieros.com>, Diana Mayerly Argüello Romero <diana.arguello@cbingenieros.com>, "andres.mackenzie@sbingenieros.com" <andres.mackenzie@cbingenieros.com>
Cc: FERNEY JIMENEZ NERA <fjimenez@educacionbogota.gov.co>, LUISA FERNANDA LEON OSPINA <lleon@educacionbogota.gov.co>
fecha: 27 mar 2024, 16:36
asunto: RESPUESTA SOL APROB APU 2 Y 3 RADICADOS E-2024-44840 Y E-2024-44997
enviado por: educacionbogota.gov.co
firmado por: educacionbogota.gov.co
seguridad: Cifrado estándar (TLS) Más información
importante según el criterio de Google.

nalidad de no entorpecer el avance del proyecto.

Por favor evita imprimir, a menos que sea estrictamente necesario, al preferir el uso de documentos digitales se ahorra agua, energía y recursos forestales. La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría de Educación del Distrito, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió y borre este material de su computador. La Secretaría de Educación del Distrito no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. www.educacionbogota.edu.co

[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

6 archivos adjuntos Analizado por Gmail

Solicitamos el envío de manera inmediata de los APUs no previstos de la cocina modular del colegio San José (Don Bosco) conforme a las siguientes observaciones de la SED:


<u>Cocina modular del colegio San José (Don Bosco), archivo adjunto S-2024-118461 RTA E-2024-44997 OBS NP 3:</u>

Ítem	Descripción	Unidad	Valor Unitario
NP 003	Conjunto estructural para cocina escolar 91 m2 prefabricado en estructura metálica en acero A36 y Panel metálico para fachadas con poliuretano inyectado expandido de alta densidad (40Kg/m3) PUR, espesor de 50mm y ambas caras con lámina de acero galvanizado pre-pintado calibre 28 RAL 9002 área operativa de 61,4 m2. Cubierta Panel metálico para cubiertas, tipo sándwich, con poliuretano inyectado expandido de alta densidad (40Kg/m3) PUR, espesor de 30mm o superior, cara externa y cara interna en lámina de acero galvanizado pre-pintado, Incluye marco estructural de piso y general perimetral, paneles, piso en placa concreto de 3000 PSI altura=8 cm del fondo sobre lámina colaborante 2", con malla electrosoldada y acabado en piso vinílico de trafico pesado. 2 Puertas metálicas de 1,2*2 metros, 2 ventanas de aluminio, una deslizante 1,3*1,1, otra de 2,5*1,3 con una base apoyo de acero inoxidable para entregas de alimentos, 6 rejillas de ventilación con angeo de 30x30 cm y 4 rejillas de verticales de 2,15 m x 0,4 m. Incluye redes eléctricas, hidrosanitarias y de gas. Instalado en sitio Colegio USME. Incluye rampas y plataformas de acceso frontal. con equipo fijo de cocina.	UN	$489.853.916,00

Se informa que el área de estudios previos de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos educativos señala NO APROBAR el Ítem propuesto "debido a que no cuentan con información para realizar su análisis y poder ser tramitados (Especificación Técnica, detalle y cotizaciones)"; se requiere verificar la conveniencia económica (relación beneficio/costo) explorando otras alternativas para garantizar que la actividad esté enmarcada dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados

Es así como, en atención a la reunión realizada el pasado jueves 14 de marzo, se les mostró una alternativa que cubre las necesidades presentadas para el módulo de cocina, basados en la experiencia de los resultados de otras intervenciones de la SED para espacios similares en otros mejoramientos y que presenta una relación beneficio/costo más optimizada.

En cuanto al APU no previsto del mantenimiento RCI del colegio Fernando González Ochoa, reiteramos lo mencionado en el correo del 19 de marzo de 2024: *(…) "le manifestamos sobre la necesidad de presentar el diagnóstico para el mantenimiento de la RCI del colegio Fernando González Ochoa y a la fecha este no ha sido remitido, por lo tanto, hasta que dicho informe sea presentado no será evaluado el APU del asunto".*

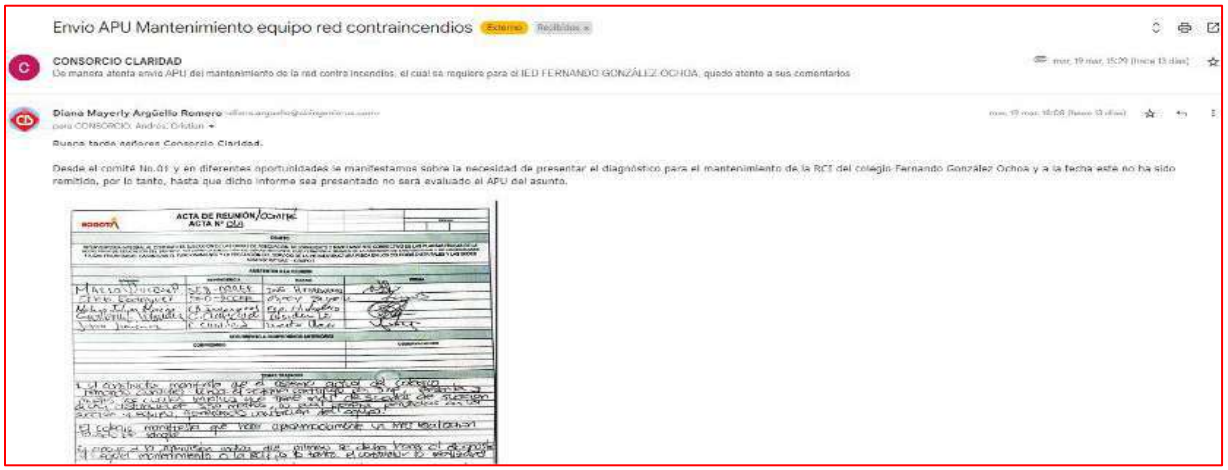

Cabe mencionar que, los APUs no previstos anteriormente descritos fueron identificados desde la visita de diagnostica realizada en cada colegio.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: N.A.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co
Adjunto: S-2024-118461 RTA E-2024-44997 OBS NP 3

GRUPO EMPRESARIAL

03/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-081-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **ALCANCE OFICIO SED-US-073-2024**

Respetado ingeniero Jiménez,

Dando alcance al comunicado SED-US-073-2024, en el cual fueron aprobados dos inspectores de obra por esta interventoría, la SED manifiesta lo siguiente:

(…) "Al respecto del oficio remitido en copia a la Secretaría de Educación, nos permitimos manifestar desacuerdo en la decisión de la interventoría para la aceptación de los profesionales propuestos como inspectores de obra toda vez que el Anexo Técnico de la licitación en la que fue adjudicado el contrato de obra, señala que:

2	Inspector de obra	Técnico o tecnólogo profesional en Construcción	N. A	Tres (3) años de experiencia a partir de la expedición de la matricula correspondiente.	Dos (2) años de experiencia como inspector en construcción en proyectos de MEJORAMIENTO, Y/O CONSTRUCCION, Y/O REPARACIONES LOCATIVAS Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.	100%

Agradecemos por favor presentar a la entidad los soportes y razones técnicas y de soporte por las cuales fueron aprobados los profesionales citados en el oficio, para ejercer tareas de Inspector o en caso contrario, ajustarse al cumplimiento del marco contractual". (…)

Por ende, los profesionales presentados para los cargos de inspectores de obra descritos en el comunicado CONS-CLARIDAD-084-2023 no son aprobados, razón por la cual, le solicitamos al Consorcio Claridad el cambio de los profesionales para desarrollar las labores de dichos cargos, en un plazo no mayor a tres (3)

días hábiles contados a partir del recibo de este comunicado, en aras de evaluar y remitir la respectiva aprobación

Lo anterior, teniendo en cuenta el siguiente párrafo extraído del anexo técnico del contrato de obra:

> Durante la ejecución del contrato, el contratista podrá sustituir cualquier miembro del equipo de trabajo, previa autorización del interventor y si así lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las exigidas en el presente documento y exista una causa que justifique el cambio. Teniendo en cuenta que la SED podrá aplicar los descuentos o realizar sanciones de conformidad con lo establecido en el presente documento

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: Hoja de vida personal mencionado.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

03/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-082-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: RESPUESTA OFICIO CONS-CLARIDAD-088-2023 OBSERVACIONES INFORME MENSUAL DE ENERO SST, AMBIENTAL Y SOCIAL V3.

Respetado ingeniero Jiménez,

Una vez revisado el informe mensual No. 3 del mes de enero V3, remitido mediante oficio No. CONS-CLARIDAD-088-2023 del 19 de marzo de 2024, nos permitimos remitir las siguientes observaciones, del componente ambiental, de Seguridad y Salud en el trabajo y Social.

<u>COMPONENTE AMBIENTAL:</u>

1. De acuerdo con el Anexo No. 5, se observa que los indicadores ambientales no están adecuadamente diligenciados, ya que no se especifican las cantidades correspondientes. Esta información no es precisa del porcentaje de cumplimiento, el cual se presume en un 100%. Por tal razón, es importante proporcionar los datos cuantitativos necesarios en los indicadores ambientales.
2. Se requiere incluir control y certificados de los materiales adquiridos, este enunciado hace referencia al material que el contratista adquirió para realizar las actividades. En el Anexo 2 se observa que los certificados son de RCD.
3. En el anexo 2 los certificados y vales presentados no se encuentran organizados ni completos.
4. En la tabla No. 4 no se ha diligenciado de manera completa. Es importante recordar que esta información debe ser coherente con los datos presentados ante la SDA. Para asegurar la integridad de los registros y cumplir con los requisitos establecidos, se recomienda organizar y completar los certificados en el Anexo 2, así como diligenciar de forma completa la tabla No. 4, asegurándose de que la información sea coherente.

5. Al revisar nuevamente los informes RCD, no se encuentran bien diligenciados de acuerdo con lo que se había indicado en mesa de trabajo, posteriormente se había remitido mediante correo SED-US-070-2024 del día 19 de marzo de 2024, la siguiente tabla par el diligenciamiento completo de dichos informes mensuales de RCD. Cabe recordar que esta información es revisada de acuerdo con los certificados que presenta el contratista, sin embargo, nuevamente se informa que las cantidades que se presentan en las actas parciales no concuerdan.

A continuación, se remite la tabla para diligenciar adecuadamente

Mes de informe	RCD entregados a	Tipo de residuos	Toneladas de RCD entregado a una planta de aprovechamiento	Toneladas de RCD entregado en sitio de disposición final	Vale	Certificado	Total RCD generados en el mes
noviembre	Cemex	1.1	10,84			x	98,62
	Cemex	1.1		10,26		x	
	Cemex	1.3		32,52		x	
	Máquinas amarillas	1.1		45	x	x	
diciembre	CBC	1.4	2,248			x	402,798
	Cemex	1.3	21,67			x	
	Cemex	1.1		20,52		x	
	Cemex	1.3		43,36		x	
	Máquinas amarillas	1.1		315	x		
enero	Máquinas amarillas	1.1		45		x	144,55
	Tracol	2.2		2,26		x	
	Tracol	2.2		2,05		x	
	Cemex	1.1		41,04		x	
	Cemex	1.3		54,2		x	

6. La Tabla 6, que muestra el consolidado de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) generados en la obra, presenta información incompleta. Se solicita amablemente que se diligencie en su totalidad las tablas correspondientes.
7. En el Anexo 2 de este informe se detallan las volquetas utilizadas y las fechas de los viajes realizados durante el período cubierto por este informe. Al verificar dicha información, se observa que el Anexo 2 se refiere a los RCD, pero no cuenta con todos los datos correspondientes al mes de enero. Se recuerda nuevamente la importancia de mantener coherencia entre este anexo y el anexo de volquetas presentado en el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
8. Con respecto a los consumos de agua el contratista indica lo siguiente “Así mismo el consumo de agua en las actividades constructivas se registra en los diseños de mezcla y el uso parcial de baños por parte de los trabajadores” De acuerdo con la justificación, presentar los consumos de agua para las actividades constructivas.

9. No es claro para interventoría la siguiente respuesta. “Se reportarán en el informe cuando sean obtenidos por interventoría”.
10. En el numeral 10, referente al manejo de fauna, vegetación y paisaje, se identificaron impactos negativos debido a la falta de medidas de protección adecuadas para la zona, las zonas verdes intervenidas se vieron afectadas.

A continuación, se detalla la naturaleza de dicha afectación, en las sedes de CHUNIZA, FERNANDO GONZALEZ, DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A.





COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
CONTENIDO	**Contiene**	**No contiene**	**Observaciones**
1. Aspectos Generales Del Proyecto y del contratista			
Cargo de quien elabora el informe	X		Cumple
Periodo del informe	X		Cumple
¿Mencionan las actividades realizadas durante el mes?	X		Cumple
¿Menciona personal que ingreso en el mes?	X		No lo mencionan dentro del informe
¿Menciona personal que se retiro en el mes?	X		No lo mencionan dentro del informe
Listado personal aprobado contractual	X		Cumple
Lista de subcontratistas	X		Cumple
Planillas de seguridad social	X		NO ANEXARON PLANILLAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NI OPERATIVO COMPLETAS
Indicadores de accidentalidad	X		Cumple
Menciona maquinaria, vehículos y equipos	X		el punto 11. INSPECCIONES PREOPERACIONALES no coincide con el punto 23.
2. Anexos			
BASE DE DATOS DEL PERSONAL	X		NO HAY NINGUNO ANEXO
INDUCCIONES	X		NO HAY NINGUN ANEXO
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN		X	No hay ningún anexo
CAPACITACIONES		X	Cumple
INSPECCIONES PREOPERACIONALES	X		Cumple
PERMISOS DE TRABAJO Y ATS	X		Cumple
REUNIONES COPASST		x	No hay ningún anexo
REUNIONES COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL		x	Cumple

PLAN DE EMERGENCIA		x	no esta diligenciado
REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	X		Cumple
PLAN ANUAL DE TRABAJO	X		Cumple
NOVEDAD PERSONAL RETIRADO		X	No hay ningún anexo
REGISTRO FOTOGRAFICO	X		Cumple
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL OPERATIVO	X		Cumple
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL		X	Observación reiterativa, no anexan planillas de este personal: Asesor estructural: JULIO OSWALDO TORRES SUAREZ Asesor redes eléctricas JORGE ERNESTO CASTIBLANCO MARTINEZ Asesor en redes hidrosanitarias: MARILUZ VARGAS GONZALEZ Profesional de costos y presupuestos: CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ Inspector de obra 1 ROBERTO ROSAS CONDIA Inspector de obra 2: SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES Maestro de obra 1: CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO Maestro de obra 2: ORLANDO ROSAS CONDIA
REGISTRO FOTOGRAFICO	X		Cumple
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PAGO DE PARAFISCALES Y DE SALARIOS	X		Cumple
PAZ Y SALVOS Y NOTIFICACIÓN DE EXAMEN MEDICO DE RETIRO O CARTA DE TRASLADO		X	El contratista no entrego paz y salvo de personal retirado.
COMITES DE OBRA, MESA DE TRABAJO		X	No hay ningún anexo

A continuación, se relacionan las planillas de seguridad social personal contractual mínimo requerido., que a la fecha no han remitido.

Cantidad	Cargo	Porcentaje de dedicación	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24
Director de Obra	JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA	**30%**	23/11/2023	12/12/2023	16/01/2024	14/02/2024
Residente de Obra	GUILLERMO ALBERTO VELANDIA CORDOBA	**100%**	24/11/2023	12/12/2023	16/01/2024	14/02/2024
Residente de Obra	LEONARDO TORRES LARA	**100%**	N/A	N/A	N/A	N/A
Asesor Estructural	JULIO OSWALDO TORRES SUAREZ	**10%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	5/02/2024
Asesor Ambiental	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	**20%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	16/01/2024	14/02/2024
Asesor en seguridad y salud en el trabajo.	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	**20%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	16/01/2024	14/02/2024
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	JORGE ERNESTO CASTIBLANCO MARTINEZ	**10%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**
Asesor en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	**10%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**
Profesional de costos, presupuestos y programación de obra	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	**20%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.	LAURA YERALDINE RAMIREZ OCAMPO	**100%**	N/A	12/12/2023	16/01/2024	14/02/2024
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.	JOHANNA KATERINE MARTINEZ VARELA	**100%**	N/A	N/A	16/01/2024	14/02/2024
Inspector de obra	ROBERTO ROSAS CONDIA	**100%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**
Inspector de obra	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	**100%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**
Maestros de obra	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	**100%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**
Maestros de obra	ORLANDO ROSAS CONDIA	**100%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**

De la gestión social no hay ningún anexo ni informe.

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita dar respuesta a las anteriores observaciones en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles de recibir el presente comunicado.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: N.A.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

09/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-083-2024

Señores:
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ – SED
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No 66-63
Bogotá D.C.

Asunto: **INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305904 - CONSORCIO CLARIDAD.**

La empresa **CB INGENIEROS S.A.S.,** en su calidad de Interventor del ***CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305904***, cuyo objeto es *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"*, y en cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en el ***CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332*** y sus anexos**,** se permite presentar informe que contiene los hechos que originan un presunto incumplimiento e imposición de una multa para el contratista **CONSORCIO CLARIDAD** de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico de obra (ANEXO 1) y la Minuta de contrato (ANEXO 2); a pesar de que en reiteradas oportunidades se ha requerido para el cumplimiento de las obligaciones adquiridas al momento de la suscripción del citado contrato. Lo anterior, de conformidad con los hechos y argumentos que se enumeran a continuación:

I. INFORMACIÓN CONTRACTUAL GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5305904	
"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"	
CONTRATISTA	CONSORCIO CLARIDAD
DIRECTOR DE OBRA	JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
FECHA DE FIRMA ACTA DE INICIO	30 DE OCTUBRE DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE FINALIZACIÓN	29 DE JUNIO DE 2024
VALOR CONTRATO	$7.608.734.174

II. OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS POR EL CONTRATISTA

1. INCUMPLIMIENTO EN EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"12. Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra. *Para las obras programadas el contratista dará inicio a las intervenciones respectivas en cada sede cuando en obra se encuentren todos los materiales requeridos para la misma. Lo anterior con el propósito de no generar retrasos o traslados sin que se estén desarrollando las mismas."*

*"**21. Advertencia anticipada.** El contratista deberá advertir al interventor en un término no mayor tres (3) días hábiles a partir de que tenga conocimiento sobre posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, el cronograma planteado y los demás elementos del contrato, y las estrategias a implementar para ser analizadas por parte del interventor y la sed para reducir el impacto en el desarrollo del proyecto de dicho evento.*

El interventor deberá analizar y de ser necesario plantear las alternativas que den a lugar para presentar a la SED dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo del informe del contratista de obra, lo cual podrá dar lugar a la convocatoria de mesa de trabajo conjunta para la toma de decisiones.

El contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia anticipada pertinente."

La Interventoría mediante Oficio No. SED-US-022-2023 (ANEXO 3) de fecha 03 de noviembre de 2023, informó al contratista de obra su preocupación por la demora en el inicio de las intervenciones en cada uno de los frentes de obra (IE Chuniza, Fernando González Ochoa y Diego Montaña Cuellar Sede B) debían haberse iniciado para la fecha señalada según la programación aprobada (ANEXO 15) mediante Oficio No. SED-US-027-2023 (ANEXO 4) de fecha 30 de octubre de 2023, pero hasta la fecha en que se remitió dicho oficio, estas instituciones aún no se estaban interviniendo.

Como consecuencia de lo anterior, mediante Oficio No. SED-US-026-2023 (ANEXO 5) de fecha 15 de noviembre de 2023, le fue notificado al contratista de obra el atraso presentado en la intervención en los colegios de Usminia, Diego Montaña Cuellar sede B, Chuniza, Fernando González Ochoa, DILE Sumapaz, Campestre Jaime Garzón sede Auras, Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela sede La Unión y Vivienda Campamento Docente, de conformidad con el seguimiento que esta interventoría realiza la programación de obra aprobada (ANEXO 15).

El contratista presentó nuevamente atraso en la programación de la obra (ANEXO 15) respecto de las sedes de Campestre Jaime Garzón sede Auras y Vivienda Campamento Docente esto se comunicó mediante

Oficio No. SED-US-039-2023 (ANEXO 6) de fecha 15 de diciembre de 2023. Mediante Oficio No. SED-US-021-2024 (ANEXO 7) de fecha 27 de enero de 2024, se le informó al contratista de obra el atraso de las intervenciones en DILE Sumapaz e IED Campestre Jaime Garzón sede Erasmo Valencia, reiterando nuevamente los atrasos presentados anteriormente.

Teniendo en cuenta los atrasos presentados, se solicitó un Plan de Contingencia por los atrasos presentados en los colegios que se encontraban en intervención y se solicitó información como planos y esquemas para el futuro inicio de los colegios Rural Las Mercedes y CED San José de Usme sede A - Don Bosco 2 en pro de no retrasar dichas intervenciones.

A pesar de los múltiples requerimientos realizados por la Interventoría, el contratista de obra sigue presentado demoras en la entrega de las intervenciones que se han realizado, por lo que se puede evidenciar un atraso del 17% de acuerdo con el informe semanal No. 23 (ANEXO 8) con fecha de corte del 31 de marzo de 2024.

De acuerdo con la programación aprobada por esta interventoría (ANEXO 15), a continuación, se presenta la situación de avance para cada una de las instituciones que debieron ser intervenidas hasta la fecha del presente informe:

Tabla 1. Estado de ejecución de los frentes.

No.	COLEGIO (SEDE)	LOCALIDAD	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
1	Usminia sede B	Usme	100,00%	100,00%
2	Fernando González Ochoa	Usme	100,00%	92,00%
3	Diego Cuellar sede B	Usme	100,00%	92,00%
4	Chuniza	Usme	100,00%	100,00%
5	DILE Sumapaz	Sumapaz	100,00%	11,00%
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras	Sumapaz	100,00%	52,00%
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión	Sumapaz	100,00%	55,00%
8	Vivienda docente - Campamento	Usme	100,00%	7,00%

No.	COLEGIO (SEDE)	LOCALIDAD	% PROGRAMADO	% EJECUTADO
9	Diego Cuellar sede A	Usme	100,00%	100,00%
10	San José de Usme - Don Bosco 2	Usme	25,00%	0,00%
11	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal	Sumapaz	23,00%	0,00%
12	Rural Las Mercedes	Usme	24,00%	0,00%

Fuente: Propia

Teniendo en cuenta la información presentada en la Tabla No. 1, la situación de cada frente de obra se encuentra de la siguiente manera:

A. FRENTES ACTIVOS

1. USMINIA

Corresponde a la primera institución en iniciarse la intervención planteada, la fecha de inicio correspondió al 30 de octubre de 2023, y se esperaba entregar en su totalidad el 29 de febrero de 2024, no obstante, conforme al comité de obra No. 16 (ANEXO 34) de fecha 8 de marzo del año en curso, el **CONSORCIO CLARIDAD** se comprometió a realizar su entrega total el miércoles 13 de marzo de 2024, pero a la fecha no se ha realizado entrega parcial ni total.

De conformidad con los recorridos que esta interventoría realiza con el fin de identificar detalles o faltantes para la entrega definitiva de esta institución, aún se tienen las siguientes observaciones y/o faltantes:

- Detalles con la terminación de los pisos de baños niños y niñas. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- Tapa filos en espejos baños. Fecha de entrega el 1 de abril de 2024. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- Ajuste de puertas cubículo 2 baño niñas. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- Detalles de pintura en: bajantes, marcos de ventanas, bajo placa escaleras, puerta y marcos de ventanas en salones y baños y detalles de fachada. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- Ajuste de pintura de canal en cubierta. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- Arreglo de soldadura y nivel en canal. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- Limpieza de cubierta bloque baños. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- Corte de aclopes barandas escaleras. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**

- Sellar juntas que se presentan entre muros y nuevos marcos de las puertas y entre los marcos de las ventanas de los salones. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- Pintura en la nueva estructura metálica de los baños. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- Reparar daño de los vidrios de las ventanas en bodega de 2° piso y salón Platón. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- Tapones para agujeros de las cajas eléctricas. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- Aseo general. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- Pintura pasamanos. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- OBSERVACIONES DE RECTORA. **Fecha de entrega el 12 de abril de 2024.**
- Adecuaciones OTIC. POSTERIOR AL ACTA DE ENTREGA **(PARA EL 21 DE ABRIL)**

De dichos retrasos atribuibles al constructor, esta interventoría junto con el apoyo a la supervisión le indicó al **CONSORCIO CLARIDAD** sobre la baja cantidad de personal operativo, esto quedó mencionado en el acta de comité de obra No. 15 (ANEXO 35) y el stock en obra, pues no había comunidad estudiantil.

A corte del 07 de abril de 2024, el contratista presenta un avance ejecutado de 100% y programado de 100% pero falta por subsanar las observaciones anteriores, por lo que para esta sede educativa se tiene un atraso de 40 días a corte del presente comunicado, todos ellos imputables al contratista puesto que se han tenido demoras en la ejecución de las obras planteadas, las cuales persisten a la fecha de presentación del presente informe.

2. FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA

De acuerdo con la programación inicial aprobada (ANEXO 15), la fecha de inicio de este frente era el 31 de octubre de 2023 y fecha de terminación el 1 de marzo de 2024, sin embargo, la fecha de inicio real fue del 15 de noviembre de 2023. No obstante, el pasado 15 de febrero de 2024, mediante acta de entrega física parcial de obra (ANEXO 9) se llevó a cabo la entrega parcial a la SED y a la rectora del colegio, presentando varias observaciones para la culminación de este frente, dentro de ellas las siguientes:

- La culminación del cambio de sistema de bombeo.
- La instalación de piso de madera en aula de danzas.
- Instalación de tierra negra fecha de entrega según acta de entrega parcial el 17 de febrero de 2023.
- Ajuste de puerta de baño de preescolar, fecha de entrega según acta de entrega parcial el 22 de febrero de 2023.
- Instalación de enchape en patio de preescolar, fecha de entrega según acta de entrega parcial el 20 de febrero de 2023.

A corte de 07 de abril de 2024, el contratista de obra presenta un avance ejecutado de 92% y programado de 100%. Se logra evidenciar que hay un atraso de 39 días con corte a la fecha de este comunicado, todos ellos atribuibles al contratista por las demoras en la ejecución de las obras planteadas.

3. CHUNIZA

La fecha de inicio de esta institución conforme a la programación aprobada por esta interventoría (ANEXO 15) era el 31 de octubre de 2023, con fecha de terminación del 1 de marzo de 2024, pero su fecha real de inicio fue el 15 de noviembre de 2023.

La entrega parcial fue llevada a cabo mediante acta de entrega física parcial de obra (ANEXO 10) el pasado el pasado 11 de marzo de 2024, con varias observaciones presentadas para culminar este frente:

- Ajuste de tapas de cajas de inspección: manijas, sello y nivelación.
- Ajuste de rejillas de cárcamos.
- Instalación de cerramiento de gimnasio.
- Ajuste de puerta de almacén debajo de escalera.
- Reposición de talud.
- Ajuste de listones de sillas y reposición de estas.
- Tapa de registro detrás del cerramiento contra impacto.

NOTA: Las observaciones relacionadas anteriormente, según acta de entrega parcial (ANEXO 10) debieron ser entregadas el 16 de marzo de 2023.

A corte de 07 de abril de 2024, el contratista presenta un avance ejecutado de 100% y programado de 100% pero falta por subsanar las observaciones anteriores. De acuerdo con la fecha de entrega se determina que hay un atraso de 39 días con corte a la fecha de este comunicado, todos ellos endosables al contratista puesto que se han tenido demoras en la ejecución de la fundición de todas las placas ara la zona deportiva y de espacio común.

4. DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B

Este frente estaba contemplado para ser iniciado el 30 de octubre de 2023, con fecha de finalización del 20 de enero de 2024. Sin embargo, en aras de habilitar aulas para mejorar el acceso de todos los estudiantes, fue programada una entrega parcial, la cual se llevó a cabo mediante Acta de entrega física parcial de obra (ANEXO 11) el pasado 8 de marzo de 2024, en esta acta se dejaron las siguientes observaciones:

Bloque aulas:

- Reposición de vidrios rotos: fecha de entrega el 10 de marzo de 2024.

Bloque administración:

- Instalación de bajantes en la nueva canal de la nueva cubierta del bloque administrativo y de salones: fecha de entrega el 10 de marzo de 2024.
- Aplicar pañete y pintura en muro del último salón del segundo piso del bloque administrativo: fecha de entrega el 10 de marzo de 2024.
- Cielo raso en baño: fecha de entrega el 16 de marzo de 2024.
- Elevar las cuchillas y muros en la zona de las oficinas. fecha de entrega el 23 de marzo de 2024.

Bloque baños:

- Instalación de persiana en los costados de los baños del primer piso: fecha de entrega el 16 de marzo de 2024.

Generales:

- Aplicación de pintura en las puertas de los salones: fecha de entrega el 23 de marzo de 2024.
- Malla encima de las canales instaladas: fecha de entrega el 16 de marzo de 2024.
- Instalación de flanche en la viga superior de las escaleras del costado sur para evitar el posicionamiento de palomas: fecha de entrega el 16 de marzo de 2024.
- Ajuste de pintura en canal: fecha de entrega el 16 de marzo de 2024.
- Tapas de las bandejas portacables: fecha de entrega el 16 de marzo de 2024.
- Detalles de pintura en escalera de administración
- Ajustar detalles de pintura en fachada, salones de bloque administrativo y de bloque de salones: fecha de entrega el 23 de marzo de 2024.

Para culminar la entrega total de esta sede educativa, está pendiente las actividades del bloque de aulas detrás de los baños del primer piso.

Además de lo anterior, se evidenció la necesidad de contar con una placa de contrapiso en los salones detrás de los baños del primer piso, ya que se encontró material en mal estado, teniendo el contratista que demoler, excavar y construir la nueva placa que puede conllevar a un tiempo aproximado de 20 días.

Dentro de los inconvenientes del desarrollo del proyecto hemos evidenciado que el estado de las instalaciones eléctricas no eran las adecuadas y por ello fue necesario la intervención integral, en aras del funcionamiento correcto de la infraestructura; además, para la cubierta del bloque de las 4 aulas y baños, fue necesario instalar columnas para no afectar los muros existentes, pues estos no garantizaban la estabilidad necesaria para soportar la estructura metálica. Otro hecho significativo, fue la intervención en

la bodega y almacén, pues los muros y placa de estos espacios presentaban grietas de dimensiones considerables.

A corte de 07 de abril de 2024, el contratista presenta un avance ejecutado de 92% y programado de 100% en esta institución, en virtud de la fecha de entrega inicialmente establecida se determina que hay un atraso de 80 días con corte a la fecha de este comunicado. El atraso en la ejecución de obra de este frente es atribuible al contratista por las demoras en la ejecución instalación de la red eléctrica, escasez de materiales y la culminación de las nuevas cubiertas.

5. DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A

La fecha de inicio para la intervención de esta institución era el 1 de diciembre de 2023, pero esta empezó el 11 de diciembre de 2023 y la fecha de terminación de acuerdo con la programación (ANEXO 15) era el 20 de febrero de 2024, pero la entrega total fue llevada a cabo el pasado el pasado 8 de marzo de 2024, mediante acta de entrega física de obra (ANEXO 12) donde quedaron descritas las observaciones:

- Instalar guardaescoba de madera en las columnas de los salones de preescolar A y B: fecha de entrega 10 de marzo de 2024.
- Ajustar pintura en marquesinas entrada a terrazas de preescolar A y preescolar B: fecha de entrega 17 de marzo de 2024.
- Ajustar detalles de pintura en puerta salones de preescolar A y preescolar B: fecha de entrega 17 de marzo de 2024.
- Instalación de gárgolas en terrazas de preescolar A y preescolar B: fecha de entrega 10 de marzo de 2024.
- Colocar 2 tapas tanque sanitarios baños niñas y niños, uno en cada uno. Cabe mencionar que estas tapas no estaban cuando se inició la intervención: fecha de entrega 11 de marzo de 2024.
- Recuperación de la zona verde del costado oriental de la salida del bloque: fecha de entrega 16 de marzo de 2024.

De acuerdo con la fecha de entrega, se puede establecer que hay un atraso de 49 días con corte a la fecha de este comunicado para la entrega sin observaciones y definitiva de la sede educativa, cabe mencionar que se presentaron situaciones como la filtración de agua en las terrazas de preescolar causada por una falla, lo anterior conllevó a la excavación en la zona hasta lograra retirar todo el material afectado y debiéndose instalar nuevo material granular, conllevando así a la conformación de relleno con piedra rajón, subbase y filtros, este trabajo demandó un tiempo de 10 días.

Esta interventoría evidenció que los demás días de atraso por parte del contratista obedeció a las demoras en la fundición de las nuevas placas de las terrazas puesto que en el comité de obra No. 12 (ANEXO 36) el

contratista de obra informó que las placas se fundirían el 05 de febrero de 2024 pero no fue así y en el acta de comité No. 13 (ANEXO 37) el contratista de obra prorrogó la fecha de fundición para el 09 de febrero de 2024 fecha en la que finalmente fueron fundidas las placas.

6. IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LA UNIÓN

La fecha de inicio estaba prevista para el 7 de noviembre de 2023, pero esta empezó el 20 de noviembre de 2023 y su fecha de terminación de acuerdo con la programación (ANEXO 15) era el 6 de marzo de 2024. En esta institución y de conformidad con la fecha de entrega, el contratista presenta un atraso de 34 días con corte a la fecha de este comunicado. Esta institución presenta un avance del 55% pero según programación (ANEXO 15), ya debió cumplirse el 100% de lo proyectado.

Hubo cambios en la nueva distribución de la vivienda docente debajo de la garita de seguridad y la necesidad de construir elementos estructurales como columnas y vigas lo cual ha demandado 10 días adicionales en la ejecución de estos trabajos, los demás días de atraso atribuibles al contratista de obra corresponden a las demoras en la intervención de los baños y la culminación de las nuevas cubiertas, la cual inició 13 días más tarde afectando la programación aprobada (ANEXO 15). Se espera que el atraso aumente, puesto que el contratista no ha entregado ningún espacio intervenido.

El 22 de enero de 2024, se realizó una reunión (ANEXO 38) con directivas del colegio, representantes de la comunidad, SED, contratista de obra e interventoría, en donde el **CONSOCIO CLARIDAD** se había comprometido en la entrega de los baños de esta sede para el 12 de febrero de 2024, fecha que incumplió presuntamente por escasez de personal en obra y problemas en el transporte de material al sitio.

En la intervención de este colegio, se han presentado retrasos por situaciones particulares encontradas en obra y atribuibles al constructor; esta última debido a la escasez de materiales y falta de personal, puesto que el contratista cambia constantemente de personal allí como se estipula en la relación de personal que esta interventoría a aprobado para esta sede (ANEXO 39), lo cual dificulta la continuidad en los trabajos.

En cuanto a las situaciones particulares, durante la demolición de las placas de la vivienda docente que se encuentra debajo de la garita de seguridad fue posible evidenciar el estado del suelo el cual presentaba un alto grado de humedad en varios puntos la placa de contrapiso era de 5 cm de espesor por lo que se debió construir una nueva placa de contrapiso que no estaba contemplada realizar.

En este mismo espacio se solicitó modificar la distribución de lo que allí se encontraba y al realizar el retiro de la cubierta se pudo evidenciar que este bloque no contaba con elementos estructurales que permitieran confinar los muros de mampostería por lo que se están construyendo zapatas, columnas y vigas para mejorar el estado estructural de la edificación, se ha solicitado al contratista de obra los planos

actualizados de las estructuras metálicas de los bloques de bodega y emisora pero hasta la fecha del presente comunicado, esta interventoría no ha recibido dichos informes.

Además de estos trabajos extras y de la falta de personal del contratista de obra en ciertos momentos por lo que en la reunión del 30 de enero de 2024 (ANEXO 40) el apoyo a la supervisión solicitó incrementar el personal en obra, las directivas de la institución informaron que no habilitarían más espacios para intervenir hasta que se entreguen los que actualmente se tienen intervenido por lo que espacios como el edificio de vivienda docente no ha podido ser intervenido.

Para la culminación de este, faltan las siguientes cosas:

- Terminación del piso de ambos baños.
- Terminación de los trabajos de manejo de aguas que se realizan en toda la institución.
- Instalación de la nueva cubierta en bloques de emisora y vivienda docente, salones y bodega; cabe mencionar que se espera la entrega de los planos y memorias de cálculo y demás documentos necesarios de estas estructuras.
- Cambio de pisos en los bloques de emisora y vivienda docente y bodega.
- Aplicación de pintura en los bloques de emisora y vivienda docente, salones y bodega.
- Instalación de nueva red eléctrica en los bloques de emisora, salones y bodega.
- Culminación de pintura e instalación de ventanas en salón de inclusión.
- Intervención del edificio de vivienda docente.

7. IED JAIME GARZÓN SEDE AURAS

Al igual que el IED Juan De La Cruz Varela Sede La Unión, estaba previsto para iniciar el 7 de noviembre de 2023, pero empezó el 17 de diciembre de 2023 y la fecha de terminación de acuerdo con la programación aprobada (ANEXO 15) era del 8 de marzo de 2024.

En la ejecución de este frente, se han presentado retrasos atribuibles al constructor; puesto que la escasez de materiales ha sido evidente, por ejemplo, la instalación de la teja se demora varios días aun cuando la estructura metálica para la nueva cubierta ha sido terminada, lo cual ha generado problemas por las lluvias, esta situación fue notificada por esta interventoría al contratista de obra mediante el comunicado No. SED-US-067-2024 (ANEXO 13).

En la reunión realizada el 22 de enero de 2024 (ANEXO 14) con las directivas de la institución, el contratista de obra, la SED y la interventoría, el constructor informó que entregaría el bloque de biblioteca y de laboratorios el 28 de febrero de 2024 pero hasta la fecha del presente comunicado solo una parte de la cubierta ha sido terminada, falta aún:

- Instalación de nueva cubierta en el bloque de laboratorios, bloque de salones y bloque administrativo.
- Toda la parte eléctrica en el bloque de laboratorios, bloque de salones y bloque administrativo.
- Aplicación de pintura en el bloque de laboratorios, bloque de salones y bloque administrativo.
- Manejo de aguas que recogerá la nueva cubierta.

De acuerdo con la programación aprobada (ANEXO 15) y tomando en cuenta la fecha de entrega, hay un atraso de 32 días con corte a la fecha de este comunicado; que son atribuibles al contratista de obra puesto que se han tenido demoras en la instalación de la nueva cubierta y por ende en los trabajos eléctricos y pintura.

B. FRENTES INACTIVOS

1. IED JAIME GARZÓN SEDE RAIZAL

De acuerdo con la programación de obra (ANEXO 15), la fecha de inicio para la intervención de este colegio fue el 1 de marzo de 2024, sin embargo, el contratista de obra a la fecha no ha presentado a esta interventoría el esquema general detallado de la estructura a construir de manera que esta pueda ser evaluada por el asesor estructural de manera que se pueda ir avanzando en este aspecto.

Según la programación de obra (ANEXO 15), la sede Auras debió ser iniciada el 7 de noviembre de 2023 y terminada el 8 de marzo de 2024, lo cual, no fue cumplido pues la ejecución empezó el 17 de diciembre de 2023 y el avance no ha sido el esperado y como se expuso en el apartado *7.IED JAIME GARZÓN SEDE AURAS* del presente comunicado, esta sede aún presenta trabajos por realizar por lo que la demora en la entrega de esta sede hace que a su vez se demore el inicio en la sede de Raizal.

En esta institución educativa y de acuerdo con la fecha de inicio de su intervención, el contratista presenta un atraso de 39 días con corte a la fecha de este comunicado; este atraso obedece a la demora en la entrega de la Sede de Las Auras puesto que, por falta de disponibilidad, el colegio no puede tener dos sedes intervenidas de manera simultánea.

2. IED SAN JOSÉ

La necesidad de la creación del NP de la cocina modular fue creada desde octubre de 2023. Además, desde el 26 de diciembre de 2023 (ANEXO 41), la supervisión del contrato remitió información para la cocina de San José con el fin de la evaluación y presentación de la propuesta, pero solo hasta el 17 de febrero de 2024 el Consorcio Claridad presentó el NP a esta interventoría mediante comunicado No. CONS-CLARIDAD-075-2024 (ANEXO 16).

EL APU no previsto respondido por parte de la SED mediante radicado No. I-2024-33555 (ANEXO 30).

En el comité de obra No. 18 (ANEXO 43) se establecieron los ítems y manera de presentar los NP respectivos y el compromiso era que el contratista lo entregaría el 02 de abril de 2024 pero hasta la fecha del presente comunicado no se ha recibido.

De acuerdo con la fecha de inicio, hay un atraso de 40 días con corte a la fecha de este comunicado; este atraso se debe a que el contratista como ya se mencionó presentó el NP hasta el mes de febrero y aún no se tiene la aprobación de este para dar inicio con la intervención.

3. CAMPAMENTO VIVIENDA DOCENTE

Este frente debió empezar su intervención el 8 de noviembre de 2023, pero el contratista de obra solicitaba la entrega del predio para poder tomar el espacio para guardar materiales, es así como el 22 de enero de 2024 se hizo la entrega al contratista de obra (ANEXO 42) y este inició con el desmonte de la cubierta existente, demolición del piso existente, retiro de red eléctrica existente y demolición de enchape en baños y cocina.

Los esquemas de la estructura metálica a emplear fueron remitidos de manera informal (vía WhatsApp) a esta interventoría en una primera versión el 26 de febrero de 2024 y estos a su vez fueron observados el 28 de febrero de 2024 mediante comunicado No. SED-US-052-2024 (ANEXO 17). El contratista de obra mediante oficio No. CONS-CLARIDAD-078-2023 (ANEXO 18) del 29 de febrero de 2024 emitió respuesta al oficio No. SED-US-052-2024, en dicho comunicado se presentaban argumentos y respuestas por parte del contratista de obra los cuales esta interventoría respondió mediante oficio No. SED-US-053-2024 (ANEXO 20), en dicho oficio se informa de manera clara que: *"la instalación de la estructura metálica en Campamento no está autorizada por esta interventoría, hasta tanto sean respondidas nuestras observaciones."*.

El 04 de marzo de 2024 mediante comunicado No. CONS-CLARIDAD-080-2023 (ANEXO 19), el contratista de obra emitió respuesta al oficio No. SED-US-053-2024. Esta interventoría argumentó a través del oficio No. SED-US-058-2024 (ANEXO 21) la necesidad de memorias de cálculo y planos según lo menciona la NSR-10.

El contratista de obra remitió mediante oficio No. CONS-CLARIDAD-083-2023 (ANEXO 22) una serie de documentos como planos y memorias de cálculo los cuales fueron observados por esta interventoría mediante oficio No. SED-US-065-2024 (ANEXO 23), en este comunicado se mencionaban de manera clara observaciones puntuales a las memorias y planos que debe tener esta nueva estructura metálica.

Lo anterior demuestra que esta interventoría no ha impedido el inicio de la instalación de la estructura metálica en esta sede, sino que ha velado porque la estructura sea segura y cumpla con lo necesario para ser instalada, siendo el contratista de obra quien ha dilatado la situación para presentar los diseños y memorias conforme se le han solicitado.

En cuanto al material en obra, este fue a riesgo del Consorcio Claridad puesto que no había enviado con antelación los esquemas en aras de obtener la aprobación por parte de esta interventoría.

De acuerdo con todo lo anterior, es posible definir que, de acuerdo con la fecha de terminación programada, hay un atraso de 33 días con corte a la fecha de este comunicado; este atraso se debe únicamente al contratista de obra puesto que no entregó los diseños a tiempo y además no inició a tiempo con la intervención como ya se expuso.

En esta sede falta todo lo contemplado inicialmente que es:

- Instalación de nueva cubierta.
- Instalación de nueva red eléctrica.
- Aplicación de pintura en todo el bloque.
- Instalación de nuevos pisos en la zona intervenida.
- Manejo de aguas servidas.

4. DILE

Según la programación de obra (ANEXO 15), la fecha de inicio y terminación era 7 de noviembre de 2023 y 16 de enero de 2024, respectivamente. Además, a la fecha, para la intervención en esta dirección local ya se cuenta con el permiso de Parques Nacionales Naturales el cual otorgó permiso mediante comunicado No. 20232002341231 del 28 de diciembre de 2023 (ANEXO 23).

En esta sede, y de acuerdo con la fecha de terminación, hay un atraso de 84 días con corte a la fecha de este comunicado; este atraso se debe únicamente al contratista de obra puesto que no ha intervenido aun cuando ya se tiene el permiso para dicha intervención.

5. DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

Este frente estaba previsto iniciar el 20 de febrero de 2024, pero no ha sido posible intervenir dado que está supeditado a la entrega de la sede B que como se menciona al inicio de este comunicado ha presentado demoras por el estado de los espacios que se van a intervenir y por la demora en la entrega de las intervenciones por parte del contratista de obra.

Por causa de que se está interviniendo aún la sede B, esta sede no puede ser intervenida aún puesto que el colegio no cuenta con más salones para hacer una contingencia a una nueva intervención. De acuerdo con la fecha de inicio, hay un atraso de 49 días con corte a la fecha de este comunicado, este atraso se debe a la situación descrita en este mismo comunicado para la SEDE B.

6. LAS MERCEDES

Este frente estaba previsto iniciar el 1 de marzo de 2024, pero se inició hasta el 08 de abril de 2024, por lo tanto, el atraso en este frente es netamente atribuible al contratista de obra.

En esta sede educativa, y de acuerdo con la fecha de inicio, había un atraso de 38 días con corte a la fecha en que se inició la intervención, este atraso es atribuible al contratista de obra puesto que la institución siempre ha estado presta a otorgar el espacio para la intervención en la cocina.

2. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES

"4. Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental, 4.4 Residuos de construcción y demolición RCD *Garantizar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 de la SDA y Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto a las demás que modifique o adicione y a los lineamientos internos de la SED. Deberá hacer entrega y actualización, según se requiera y conforme avance la obra, del PGRCD, formatos RCD y cargue mensual en aplicativo web de la SDA e informe de No cumplimiento de aprovechamiento RCD, desde la apertura hasta el cierre del PIN de obra que sea asignado. Los reportes mensuales deberán ser revisados y avalados por la Interventoría previo envío a la Supervisión de la SED."*

La Interventoría ha notificado al contratista de obra que el cargue mensual en aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) sobre la información correspondiente los RCD que se han producido durante las intervenciones, ha presentado cantidades diferentes a las pagadas en las actas parciales de obra; esto fue notificado al contratista de obra mediante Oficio No. 2023 SED-US-036-2024 (ANEXO 24) del 14 de febrero de 2024, allí se mencionaba que:

> *"(…) la interventoría desea informar que, según la información suministrada por el área técnica y asesora ambiental, no se han remitido todos los certificados correspondientes a los informes presentados de noviembre y diciembre de 2023. (…)"*

A la fecha del presente comunicado, no se ha podido dar claridad con las cantidades reportadas a la SDA versus a las pagadas por esta interventoría.

A continuación, se presenta la relación de las cantidades reportadas versus las cargadas a la SDA.

Tabla 2. Cantidades de RCD.

Mes de informe	Sitio de entrega de RCD	Tipo de residuos	Toneladas de RCD entregado a una planta de aprovechamiento	Toneladas de RCD entregado en sitio de disposición final	Vale	Certificado	RCD generados según interventoría toneladas
Nov	Cemex	1.1	10,84			x	216,38
	Cemex	1.1		10,26		x	
	Cemex	1.3		32,52		x	
	Máquinas amarillas	1.1		45	x	x	
Dic	CBC	1.4	2,248			x	696,85
	Cemex	1.3	21,67			x	
	Cemex	1.1		20,52		x	
	Cemex	1.3		43,36		x	
	Máquinas amarillas	1.1		315	x		
Ene	Máquinas amarillas	1.1		45		x	699,16
	Tracol	2.2		2,26		x	
	Tracol	2.2		2,05		x	
	Cemex	1.1		41,04		x	
	Cemex	1.3		54,2		x	

*"**4.4 Residuos de construcción y demolición RCD** Garantizar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 de la SDA y Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Decreto 507 de 2023, Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones, junto a las demás que modifique o adicione y a los lineamientos internos de la SED. Deberá hacer entrega y actualización, según se requiera y conforme avance la obra, del PGRCD, formatos RCD y cargue mensual en aplicativo web de la SDA e informe de No cumplimiento de aprovechamiento RCD, desde la apertura hasta el cierre del PIN de obra que sea asignado. Los reportes mensuales deberán ser revisados y avalados por la Interventoría previo envío a la Supervisión de la SED."*

Teniendo en cuenta lo anterior, el Decreto 507 de 2023 fue expedido el 31 de octubre de 2023, en este nuevo decreto se solicita que los informes que se presentaban trimestralmente ahora sean mensuales. Este decreto entró en vigencia el 01 de noviembre de 2023, y por ende todas las empresas que ejecuten proyectos a nivel distrital deben dar cumplimiento a esta normatividad.

El contratista de obra ha presentado estos informes, pero estos no han tenido el VoBo. por parte de la interventoría y han presentado algunas observaciones:

- En primer lugar, mediante comunicado No. SED-US-030-2024 (ANEXO 25) del 08 de febrero de 2022, le fueron remitidas observaciones al contratista de obra por el informe correspondiente al mes de noviembre - diciembre.
- El 14 de febrero de 2024 mediante comunicado No. SED-US-036-2024 (ANEXO 24), esta interventoría informó que se mantiene la discrepancia entre las cantidades reportadas y las pagas, por lo que se solicitó al contratista de obra lo siguiente:

  " (…)

  que el área técnica y el área ambiental establezcan una comunicación directa para verificar las cantidades de RCDS y materiales pétreos presentados tanto en los informes ambientales como en los informes de RCD de los meses de noviembre y diciembre de 2023. Se ha observado que las cantidades presentadas no concuerdan con el material retirado y los certificados (…)"

- Ante la falta de una respuesta concreta y acertada a las observaciones anteriores, el 19 de marzo de 2024 mediante oficio No. SED-US-070-2024 (ANEXO 26), esta interventoría remitió un apremio al contratista de obra por el presunto incumplimiento en las obligaciones contractuales en el área ambiental y SST.

3. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SST

"9. Obligaciones administrativas. *Cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral (Salud, pensión y riesgos laborales) de todo el personal vinculado a la obra."*

De conformidad con el personal mínimo aprobado por esta Interventoría mediante Oficio No. SED-US-007-2023 (ANEXO 27) de fecha 24 de octubre de 2023, mensualmente se ha solicitado al contratista de obra que en los informes mensuales se presente las planillas de seguridad social que permitan establecer que todo el personal aprobado por esta interventoría cumple y está al día con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral (Salud, pensión y riesgos laborales), pero dicho requerimiento no se ha presentado para los asesores, inspectores y maestros de obra que se aprobaron

por esta interventoría. Le fue solicitada esta información al contratista de obra mediante oficio No. SED-US-039-2024 (ANEXO 28) del 16 de febrero de 2024, allí se menciona que: *"(…) Las planillas de seguridad que se anexaron están incompletas. (…)"* .

Ante la falta de respuesta por parte del contratista de obra, esta interventoría mediante comunicado No. SED-US-043-2024 (ANEXO 29) del 21 de febrero de 2024, reiteró la solicitud para que se presentara dicha documentación, pero aún no se ha presentado dicha documentación. Dichas planillas de seguridad debieron presentarse para el primer informe mensual que se debió entregar el 07 de diciembre de 2023, por lo que se evidencia un atraso de 104 días respecto a la fecha del presente comunicado.

III. NORMAS VIOLADAS O CLÁUSULAS INCUMPLIDAS

En general las obligaciones contractuales anteriormente señaladas, así como las normas que rigen la contratación estatal en Colombia.

Ley 80 de 1993:

*"**ARTÍCULO 3.- De los Fines de la Contratación Estatal.** Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.*

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones."

***"ARTÍCULO 5.-** De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 3o. de esta Ley, los contratistas:*

"(...)

***2o.** Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse.*

"(...)

***4o.** Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.*

ARTÍCULO 52.- *De la Responsabilidad de los Contratistas Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley. Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7o. de esta Ley."*

IV. CONSECUENCIAS DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO

Según lo expuesto a lo largo del presente comunicado, esta Interventoría recomienda a la Secretaría de Educación Distrital – SED el inicio del trámite del proceso de presunto incumplimiento contractual al contratista de obra **CONSORCIO CLARIDAD**.

Por lo anterior, una vez probado el incumplimiento del contratista podrá hacerse acreedor de las siguientes consecuencias jurídicas:

"CLÁUSULA 15. MULTAS

"(…) En caso de incumplimiento originado en causas distintas a las anteriormente previstas, se impondrá una multa equivalente hasta el 0,1% del valor del contrato por cada día de atraso o mora, hasta que se dé cumplimiento a la obligación que se predica incumplida.

(…)"

V. PRUEBAS

DOCUMENTO	FECHA	RESPUESTA
ANEXO 1 - Anexo técnico de obra	N.A.	N.A.
ANEXO 2 - Minuta del Contrato	N.A.	N.A.
ANEXO 3 - SED-US-022-2023	03 de noviembre de 2023	CONS-CLARIDAD-025-2023
ANEXO 4 - SED-US-027-2023	30 de octubre de 2023	Sin respuesta
ANEXO 5 - SED-US-026-2023	15 de noviembre de 2023	Sin respuesta
ANEXO 6 - SED-US-039-2023	15 de diciembre de 2023	CONS-CLARIDAD-049-2023
ANEXO 7 - SED-US-021-2024	27 de enero de 2024	Sin respuesta
ANEXO 8 - Informe semanal No. 23	27 de marzo de 2024	N.A.
ANEXO 9 - Acta de entrega física FGO	15 de febrero de 2024	N.A.
ANEXO 10 - Acta de entrega física CHU	11 de marzo de 2024	N.A.
ANEXO 11 - Acta de entrega física Diego B	08 de marzo de 2024	N.A.
ANEXO 12 - Actas de entrega física Diego A	08 de marzo de 2024	N.A.
ANEXO 13 - SED-US-067-2024	16 de marzo de 2024	Sin respuesta

DOCUMENTO	FECHA	RESPUESTA
ANEXO 14 - Reunión Auras	22 de enero de 2024	N.A.
ANEXO 15 - Programación de obra	N.A.	N.A.
ANEXO 16 - CONS-CLARIDAD-075-2024	17 de febrero de 2024	I-2024-33555
ANEXO 17 - SED-US-052-2024	28 de febrero de 2024	CONS-CLARIDAD-078-2023
ANEXO 18 - CONS-CLARIDAD-078-2023	29 de febrero de 2024	SED-US-053-2024
ANEXO 19 - CONS-CLARIDAD-080-2023	04 de marzo de 2024	SED-US-058-2024
ANEXO 20 - SED-US-053-2024	04 de marzo de 2024	CONS-CLARIDAD-078-2023
ANEXO 21 - SED-US-058-2024	12 de marzo de 2024	CONS-CLARIDAD-083-2023
ANEXO 22 - CONS-CLARIDAD-083-2023	12 de marzo de 2024	SED-US-065-2024
ANEXO 23 - SED-US-065-2024	15 de marzo de 2024	N.A.
ANEXO 24 - SED-US-036-2024	14 de febrero de 2024	Sin respuesta
ANEXO 25 - SED-US-030-2024	08 de febrero de 2024	CONS-CLARIDAD-071-2023
ANEXO 26 - SED-US-070-2024	19 de marzo de 2024	Sin respuesta
ANEXO 27 - SED-US-007-2023	24 de octubre de 2023	Sin respuesta
ANEXO 28 - SED-US-039-2024	16 de febrero de 2024	CONS-CLARIDAD-081-2023
ANEXO 29 - SED-US-043-2024	21 de febrero de 2024	Sin respuesta
ANEXO 30 - Respuesta NP cocina	15 de marzo de 2024	Sin respuesta
ANEXO 31 - AUTORIZACION PNN	28 de diciembre de 2023	N.A.
ANEXO 32 - Póliza de cumplimiento	09 de noviembre de 2023	N.A.
ANEXO 33 - Póliza de R C E	09 de noviembre de 2023	N.A.
ANEXO 34 - Acta de comité de obra 16	08 de marzo de 2024	N.A.
ANEXO 35 - Acta de comité de obra 15	27 de febrero de 2024	N.A.
ANEXO 36 - Acta de comité de obra 12	31 de enero de 2024	N.A.
ANEXO 37 - Acta de comité de obra 13	24 de febrero de 2024	N.A.
ANEXO 38 - Reunión La Unión	22 de enero de 2024	N.A.
Anexos de Presunto incumplimiento contractual	N.A.	N.A.
ANEXO 40 - Reunión en La Unión	30 de enero de 2024	N.A.
ANEXO 41 - PROPUESTA COCINA IED SAN JOSE USME	26 de diciembre de 2023	N.A.
ANEXO 42 - Acta de entrega del lote Campamento	22 de enero de 2024	N.A.
ANEXO 43 - Acta de comité de obra 18	01 de abril de 2024	N.A.

VI. GARANTÍAS

El ***CONTRATO DE OBRA No. 5305904-2023*** cuenta con las siguientes pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual:

COMPAÑÍA ASEGURADORA	No. PÓLIZA	AMPARO Y/O COBERTURA	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	360-47-994000028999	CUMPLIMIENTO	05/09/2023	01/03/2025	$ 1.521.746.834,80
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	05/09/2023	29/06/2027	$ 760.873.417,40
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Dos (2) años a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra.		$ 1.521.746.834,80
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	360-47-994000008142	R.C.E ENTIDAD ESTATAL (PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES)	30/10/2023	29/06/2024	$ 580.000.000,00

VII. TASACIÓN DEL PERJUICIO

Teniendo en cuenta lo pactado contractualmente, en la ***CLÁUSULA 15. MULTAS:***

> *"(…)*
>
> *En caso de incumplimiento originado en causas distintas a las anteriormente previstas, se impondrá una multa equivalente hasta el 0,1% del valor del contrato por cada día de atraso o mora, hasta que se dé cumplimiento a la obligación que se predica incumplida.*
>
> *(…)"*

Tomando en cuenta que el ***CONTRATO DE OBRA No. 5305904-2023*** tiene un valor de **$ 7.608.734.174**, y que los días de atraso ascienden a ochenta (80) días, teniendo en cuenta el frente de Diego Montaña Cuellar sede B, es posible establecer que la tasación de la multa aplicable al contratista es por la suma de **SEISCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 608.698.734).**

GRUPO EMPRESARIAL

09/04/2024
Bogotá D.C.

CUANTIFICACIÓN DE LA MULTA A IMPONER POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES	
FECHA DE INICIO DE LA MULTA A IMPONER	20 de enero de 2024
FECHA DE CORTE DE LA MULTA A IMPONER	09 de abril de 2024
DIAS DE INCUMPLIMIENTO	80 días
PORCENTAJE DE LA MULTA ESTABLECIDA	0.1% por cada día
PORCENTAJE DE LA MULTA ESTABLECIDA	8,0% del total del contrato de obra
SUBTOTAL MULTA	$ 608.698.734

Sin otro particular, me suscribo y quedo atento a cualquier observación que se presente.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB INGENIEROS S.A.S.

Anexos: Informe de incumplimiento contrato de obra
Anexos de Presunto incumplimiento contractual.rar
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

03/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-084-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **EJECUCIÓN DE OBRA EN DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C**

Respetado ingeniero Jiménez,

Teniendo en cuenta las fechas de inicio y terminación de la programación de obra de los frentes Diego Montaña Cuellar sede A, B y C, además de las actividades adicionales surgidas durante la ejecución de obra en la sede B, durante los últimos reportes de avance semanales no hemos tenido en cuenta dentro del análisis el frente de la sede C, es decir, no se contempla dentro del avance general programado ni ejecutado, toda vez que las directivas del colegio establecieron como condicionante la entrega de la sede B para iniciar en la sede C.

Sin embargo, las actividades iniciales contempladas en el presupuesto de la sede B debieron culminarse desde enero de 2024, por lo tanto, solicitamos nos presente un cronograma de culminación de actividades en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del recibo de este comunicado, con el fin de establecer una fecha final de entrega física total del colegio Diego Montaña Cuellar sede B.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: Hoja de vida personal mencionado.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

05/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-085-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **OBSERVACIONES DE ASESOR ELÉCTRICO DE INTERVENTORÍA.**

Respetado ingeniero Jiménez,

El pasado 01 de abril de 2024 nuestro asesor eléctrico, el ingeniero Cesar Augusto Bolaño Tafur, realizó recorridos por las diferentes instituciones que se encuentran en intervención en la localidad de Usme; de acuerdo con estas inspecciones, el asesor eléctrico realizó las siguientes observaciones y recomendaciones:

1. Colegio Usminia sede B

- En compañía del personal del contratista de obra, se definió que el sitio para la puesta a tierra será al lado de la columna que se encuentra al lado de portería, esto con el fin de evitar que los elementos que componen este sistema puedan ser hurtados. En la siguiente fotografía se indica el sitio seleccionado.

Ilustración 1. Sitio para puesta a tierra.



- Tapar los agujeros y espacios de las nuevas cajas, toma corrientes e interruptores instalados.
- En la tabla que se encuentra en la tapa del nuevo tablero eléctrico (frente al salón 102) se debe dejar marcado el circuito que maneja cada breaker.
- El nuevo tablero eléctrico (frente al salón 102) es uno trifásico, pero el de la acometida es monofásico, justificar la decisión de instalar este tipo de tablero eléctrico.
- En el nuevo tablero eléctrico (frente al salón 102) hay un totalizador de 75 Amperios, de acuerdo con la carga instalada es una protección muy alta.
- Se espera por la certificación RETIE y RETILAP de las nuevas redes eléctricas del bloque de salones y baños.
- Medición de luxes en los salones.
- Se solicita reja para proteger el nuevo tablero eléctrico (frente al salón 102).
- Para la conexión de los conductores en el totalizador se deben instalar terminales apropiados.

2. Colegio Diego Montaña Cuellar sede B

- Se solicita la tapa de la bandeja portacables.
- Se solicita reja para proteger los nuevos tableros eléctricos.
- Para la conexión de los conductores en el totalizador se deben instalar terminales apropiados.
- En una tabla que se encuentre en la tapa de los nuevos tableros eléctricos se debe dejar marcado el circuito que maneja cada interruptor.
- Al igual que la tubería EMT, señalizar la bandeja portacables.
- La acometida para el tablero eléctrico de los baños se deberá tomar directamente desde el tablero eléctrico principal de la institución.

3. Colegio Fernando González Ochoa

- En los tableros eléctricos que fueron intervenidos como parte de los trabajos de los equipos de bombeo hidráulico, se solicita la marcación de los interruptores e interruptores que allí se encuentran, de manera tal que sea claro que maneja cada uno de estos elementos.

Estaremos atentos a su respuesta y atención a cada uno de los puntos mencionados.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: N.A.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

05/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-086-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: OBSERVACIONES DE MUROS DE MAMPOSTERÍA EN COLEGIO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LA UNIÓN EN BLOQUE DE EMISORA.

Respetado ingeniero Jiménez,

Como parte de los recorridos y revisiones que esta interventoría realiza en el colegio del asunto, se pudo evidenciar que los nuevos muros de mampostería del bloque de emisora tenían observaciones por las juntas y la manera que fueron construidos como se puede ver a continuación:



Como se puede ver en las imágenes anteriores, las juntas horizontales llegan a tener un espesor hasta de 4 cm y en algunas juntas verticales no hay mortero que permita la adherencia entre los bloques, estas observaciones fueron realizadas por esta interventoría y se dejó constatado en la bitácora de obra. Ante esta situación, nuestro asesor estructural nos informó la siguiente:

"El requisito es que tengan las juntas un mortero de pega con espesor de 10mm de con una tolerancia de +- 4mm y debe haber mortero de pega tanto en las juntas horizontales como verticales. (en cuanto a las fotos) *Si se puede ver que el muro no fue construido de la mejor manera."*

Por lo anterior, solicitamos se subsanen las observaciones mencionadas para que estos muros queden de manera adecuada para los trabajos de detalle final

Estaremos atentos a su respuesta y atención a cada uno de los puntos mencionados.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: N.A.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

07/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-087-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **MANTENIMIENTO RCI FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA**

Respetado ingeniero Jiménez,

Con el diagnostico presentado del estado actual de la red contra incendio del colegio Fernando González Ochoa, se puede concluir que el mantenimiento a realizar consta de cambios de empaques, sellos, rodamientos, entre otros, por lo cual, le sugerimos emplear ítems de la lista de precios contractuales, tal como 18.1.13.

Así las cosas, quedamos atentos al envío de los ítems a emplear.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: NA.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

08/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-088-2024

Señores

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL NO. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

Respetado ingeniero Jiménez,

Por medio de la presente, esta interventoría en cumplimiento de sus compromisos de vigilancia seguimiento y control del contrato de obra No. CO1. PCCNTR 5305904, nos permitimos remitir la solicitud de entrega del informe mensual de gestión del mes de marzo de 2024, dentro del plazo máximo estipulado en el anexo técnico.

Bajo este panorama, se conmina al contratista de hacer entrega del informe mensual No. 5, debido a que se está presentando incumplimiento del **Capítulo 18. Obligaciones de información;** *El contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener como mínimo, por cada frente de trabajo lo siguiente:*

- *Avance de cada una de las actividades programadas.*
- *Balance presupuestal que muestre lo ejecutado, lo proyectado para terminar las obras y el total, conforme no excede del valor total contractual.*
- *Registros fotográficos.*

- *Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.*
- *Seguimiento del plan de calidad técnica de la obra.*
- *Fotocopia de la bitácora o libro de obra.*
- *Resumen de las actividades realizadas en el mes.*
- *Relación del personal empleado en la ejecución de la obra y el pago de contraprestaciones y parafiscales por cada uno de ellos.*
- *Informe de seguridad industrial.*
- *Informe de manejo ambiental y del PGRCD.*
- *Informe de gestión social.*
- *Informe del seguimiento actualización del programa de ejecución de obra con sus alertas respectivas.*

Nota 2: Los informes mensuales deben ser entregados durante los cinco (5) días hábiles siguientes posterior al vencimiento de cada mes.

Se le recuerda al contratista que es de carácter urgente, presentar cada uno de los insumos mencionados anteriormente, para realizar la respectiva aprobación y así evitar sanciones por parte de la entidad contratante.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.

CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co y Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

08/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-089-2024

Señores

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **NO CONFORMIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL - COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B**

Respetado ingeniero Jiménez,

De acuerdo con el seguimiento permanente que realiza la interventoría a la ejecución de las actividades contractuales por parte del contratista de obra CONSORCIO CLARIDAD, en la inspección realizada el 05 de abril del presente año, en las instalaciones del colegio IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B, se tienen las siguientes observaciones:

1. Se evidencia que a la fecha no han realizado mantenimiento a la batería sanitaria portátil para el uso del personal de obra hace veinte (20) días aproximadamente, presentándose un incumplimiento con lo descrito en el anexo técnico **Numeral 7 Obligaciones administrativas** *"Contar con servicios sanitarios en proporción de uno (1) por cada quince (15) trabajadores diferenciados para hombres y mujeres y dotados de los elementos indispensables para su uso, con mínimo dos aseos semanales para cada baño".*



Registro fotográfico: Observación 1

2. Se evidencia que el personal de obra civil carece de elementos de protección personal y dotación (camibuso) que los identifique como personal de obra, esta observación ha sido reiterativa.



3. Se recomienda realizar jornadas de orden y aseo que permitan tener un mejor uso de las instalaciones, y no se generen accidentes, incidentes y contaminación por el mal manejo de materiales y residuos, como se evidencia en el registro fotográfico, materiales sin cubrir, el sitio no cuenta con un orden y aseo adecuado, no se está dando cumplimiento a lo indicado en las fichas del Plan de Manejo Ambiental aprobado.

PROGRAMA MANEJO DE CAMPAMENTOS Y ACOPIO FICHA 4 A *"Implementar acciones que garanticen que el campamento y puntos de acopio permanezcan permanentemente ordenados, aseados y seguros.*

PROGRAMA MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN *FICHA 5 A* *3. Almacenamiento Solo se mantendrán en el frente de obra los materiales de construcción necesarios para un mes de trabajo, estos materiales no deben interferir con las actividades constructivas, ni generar condiciones de riesgos para los trabajadores del Consorcio. Los materiales de construcción en el área de trabajo permanecerán perfectamente acopiados y debidamente cubiertos con plástico. Cuando por las condiciones específicas de*

la institución educativa NO se cuente con un sitio adecuado para el depósito temporal de materiales, se acopiará en zonas adyacentes, siempre y cuando, los sitios estén previamente identificados y con aval de la interventoría.

Basuras que no se les ha hecho disposición final	Material de obra a la intemperie sin cubrir
	

Material de obra sin cubrir	No se realiza jornada de orden y aseo
	

4. El cerramiento debe contar con un mantenimiento que permita siempre cumplir su función, de acuerdo con la inspección realizada, la madera rolliza que sostiene la polisombra, en algunas zonas se encuentra caída.

GRUPO EMPRESARIAL

08/04/2024
Bogotá D.C.



Teniendo en cuenta las anteriores observaciones, se conmina al contratista, manera INMEDIATA de remitir la subsanación de cada una de las observaciones reportadas por esta interventoría.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.

CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co y Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

09/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-090-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **SOLICITUD CAMBIO DE ASESOR SST Y ASESOR AMBIENTAL.**

Respetado ingeniero Jiménez,

Con referencia en nuestras obligaciones como interventoría al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5305904, dando cumplimiento con lo descrito en el **ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL**, Numeral 9. ¨***La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio***¨** y a las actividades y obligaciones de cada profesional, entre ellas las siguientes:

➢***Asesor Ambiental:*** *Deberá elaborar y administrar los planes de manejo ambiental en la ejecución de las obras. Diseñar e implementar el plan de manejo ambiental, en la ejecución en el proyecto. Deberá acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con el manejo ambiental en la ejecución de las obras.*
➢ ***Asesor en Seguridad y salud en el trabajo:*** *Deberá administrar los riesgos del protocolo de bioseguridad en la ejecución de las obras. Diseñar e implementar el plan del protocolo de Bioseguridad en la ejecución de las obras. Deberá acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con el cumplimiento de los protocolos de seguridad en la ejecución de las obras, soporte de realización de exámenes médicos (ingreso y egreso) de los trabajadores, programar e implementar las capacitaciones con el SG-SST, suministro de elementos de protección personal y realizar inspecciones en las áreas de trabajo Deberá elaborar el plan de Seguridad y Salud en el trabajo.*
Deberá emitir conceptos y soluciones técnicas ante las consultas que se requiera por parte de la interventoría o la SED para la ejecución de las obras.

Se solicita el cambio inmediato de la asesora en seguridad y salud en el trabajo y asesora ambiental, la ingeniera María Cristina Páez Rodríguez, por las razones que se exponen a continuación:

GRUPO EMPRESARIAL

09/04/2024
Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD SOLICITUDES COMPONENTE AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Desde el 07 de febrero de 2024, la interventoría ha solicitado a la profesional del contratista la validación de las cantidades de los Residuos de construcción y demolición (RCD) que se están reportando en el aplicativo de la Secretaria Distrital de Ambiente, además de la totalidad de certificaciones de disposición de los mismo, mediante los siguientes comunicados que no han tenido respuesta:

SOLICITUD REALIZADA POR INTEVENTORIA	FECHA	ASUNTO	RESPUESTA POR EL CONTRATISTA
SED-US-030-2024	8/02/2024	Respuesta oficio CONS-CLARIDAD-070-2023 Observaciones al Informe de RCD del 7 de febrero de 2024	OBSERVACIÓN NO ATENDIDA
SED-US-036-2024	14/02/2024	RESPUESTA OFICIO CONS-CLARIDAD-071-2023 OBSERVACIONES AL INFORME DE RCDS.	OBSERVACIÓN NO ATENDIDA
SED-US-039-2024	16/02/2024	RESPUESTA OFICIO CONS-CLARIDAD-072-2023 OBSERVACIONES A INFORME MENSUAL No. 3 DE OBRA MES DE ENERO 2024, COMPONENTE AMBIENTAL, SST Y SOCIAL.	OBSERVACIÓN NO ATENDIDA
SED-US-040-2024	19/02/2024	Remisión observaciones apertura PIN AMBIENTAL por parte de la SED.	OBSERVACIÓN NO ATENDIDA
SED-US-044-2024	21/02/2024	Reiteración remisión observaciones apertura PIN AMBIENTAL por parte de la SED.	OBSERVACIÓN NO ATENDIDA
SED-US-078-2024	3/04/2024	OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL NO. 4, MES DE FEBRERO 2024.	OBSERVACIÓN NO ATENDIDA

El pasado 13 de marzo de 2024, mediante oficio SED-US-051-2024 se notificó al contratista el apremio No. 1 por el presunto incumplimiento en las obligaciones contractuales en el componente ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo, a la fecha no se obtuvo respuesta de las solicitudes, de acuerdo con el plazo que se indicó. Incumpliendo la obligación contractual que se incluye a continuación: **PRIMERA:** ***ANEXO TECNICO Numeral "4. Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental, 4.4 Residuos de construcción y demolición RCD*** *Garantizar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 de la SDA y Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto a las demás que modifique o adicione y a los lineamientos internos de la SED. Deberá hacer entrega y actualización, según se requiera y conforme avance la obra, del PGRCD, formatos RCD y cargue mensual en aplicativo web de la SDA e informe de No cumplimiento de aprovechamiento RCD, desde la apertura hasta el cierre del PIN de obra que sea asignado. Los reportes mensuales deberán ser revisados y avalados por la Interventoría previo envío a la Supervisión de la SED."*

La falta de información de los RCD, no ha permitido la aprobación de los informes en el componente ambiental, incumpliendo con las siguiente clausula contractual: **SEGÚNDA*: ANEXO TECNICO* 16. Obligaciones de información:** El contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener como mínimo, por cada frente de trabajo lo siguiente:

(…) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra y el pago de contraprestaciones y parafiscales por cada uno de ellos.

➢ *Informe de seguridad industrial.*

➢ *Informe de manejo ambiental y del PGRCD.*

➢ *Informe de gestión social.*

Además de los requerimientos realizados en los comunicados mencionados anteriormente, la interventoría ha realizado las siguientes mesas de trabajo sin respuesta por parte del contratista:

GESTIÓN INTERVENTORIA	FECHA	ASUNTO	RESPUESTA POR EL CONTRATISTA
MESA DE TRABAJO	19/01/2024	EL PROPÓSITO DE ESTA REUNIÓN FUE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGULACIONES EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	NO SE OBTUVO RESPUESTA DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
MESA DE TRABAJO	13/02/2024	SE REALIZO MESA DE TRABAJO ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA SOCIALIZANDO LAS OBSERVACIONES DEL INFORME SST	NO SE OBTUVO RESPUESTA DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
MESA DE TRABAJO	11/03/2024	SE REALIZO MESA DE TRABAJO ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA SOCIALIZANDO OBSERVACIONES QUE SE HAN TENIDO REFERENTE A LA ENTREGA DEL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SST Y SOCIAL	FECHA: 19-03-2024 OFICIO: CONS-CLARIDAD-088-2023

A pesar de las mesas de trabajo y oficios remitidos, dando las observaciones en cada uno de los comunicados, no se ha podido dar aprobación a los informes de gestión Ambienta y de Seguridad y Salud en el trabajo, de los meses de enero, febrero, marzo de 2024, hasta no contar con los soportes de cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales en el componente de Seguridad y Salud en el trabajo y Ambiental.

En el componente de seguridad y salud en el trabajo la profesional ha venido incumpliendo las siguientes obligaciones contractuales:

TERCERA: ***ANEXO TECNICO Numeral 9. Obligaciones administrativas.*** *Cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral (Salud, pensión y riesgos laborales) de todo el personal vinculado a la obra."*

ANEXO TECNICO Numeral 14. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: *36. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del Contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar,*

cuando sea requerido por la Entidad, el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (artículo 50 Ley 789 de 2002) que le corresponda.

Como se relaciona a continuación, desde la aprobación de las hojas de vida el 24 de octubre de 2023, el contratista ha venido incumpliendo en la presentación de los soportes de pago de seguridad social del personal clave para la ejecución del contrato y no se ha realizado el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las mesas de trabajo, que se relacionan a continuación:

GESTIÓN INTERVENTORIA	FECHA	ASUNTO	RESPUESTA POR EL CONTRATISTA
OFICIO SED-US-007-2023	24/10/2023	APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DE CONTRATISTA DE OBRA.	N/A
MESA DE TRABAJO	19/01/2024	EL PROPÓSITO DE ESTA REUNIÓN FUE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS Y REGULACIONES EN LAS ÁREAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL	NO SE OBTUVO RESPUESTA DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
OFICIO SED-US-043-2023	21/02/2024	SOLICITUD CUMPLIMIENTO ENTREGA DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO CONTRACTUAL.	NO SE OBTUVO RESPUESTA
MESA DE TRABAJO	13/02/2024	SE REALIZO MESA DE TRABAJO ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORIA SOCIALIZANDO LAS OBSERVACIONES DEL INFORME SST	NO SE OBTUVO RESPUESTA DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
MESA DE TRABAJO	11/03/2024	SE REALIZO MESA DE TRABAJO ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA SOCIALIZANDO OBSERVACIONES QUE SE HAN TENIDO REFERENTE A LA ENTREGA DEL INFORME DE GESTIÓN MENSUAL DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SST Y SOCIAL	FECHA: 19-03-2024 OFICIO: CONS-CLARIDAD-088-2023
SED-US-051-2024	13/03/2024	APREMIO No. 1 POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES	FECHA: 14-03-2024 OFICIO: CONS-CLARIDAD-086-2023
SED-US-070-2024	19/03/2024	RESPUESTA OFICIO CONS-CLARIDAD-086-2023 OBSERVACIONES APREMIO No.1 POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL AREA AMBIENTAL Y SST.	NO SE OBTUVO RESPUESTA

De acuerdo con la trazabilidad presentada, actualmente está interventoría no se cuenta con las planillas de seguridad social de todo el personal administrativo contractual.

CUARTA: *Soporte de realización de exámenes médicos (ingreso y egreso) de los trabajadores, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas*.

En la mesa de trabajo realizada el pasado 19 de enero del presente año, quedo contemplado el compromiso de: *"Interventoría informa que a la fecha no ha recibido información de personal retirado, y no ha recibido paz y salvos del personal, notificación de examen médico de retiro y/o carta de traslado. El contratista informa que realizara el reporte de manera mensual debe poner la fecha de retiro y presentara una paz y salvo por subcontratista. El certificado que emitan debe contener como mínimo, datos del personal y notificar si está activo, retirado o trasladado".*

A la fecha se tiene un total de sesenta y dos (62) personas con retiradas del proyecto y no se ha obtenido documentos como paz y salvo y examen medico de retiro o con carta de traslado a otro proyecto.

Dadas las condiciones, hechos y situaciones anteriormente descritas de las cuales evidenciamos el incumplimiento de la profesional aprobada por esta interventoría para el cargo de Asesora de Seguridad y salud en el trabajo y Asesora ambiental del contratista de obra, debido a que en repetidas ocasiones se han realizado solicitudes de las cuales siempre dice desconocer, esta interventoría, solicita el cambio de manera INMEDIATA de la profesional que actualmente ocupa estos cargos, toda vez que desde la fecha de inicio del contrato de obra el 30 de octubre de 2023, no se ha realizado la gestión pertinente relacionada al cumplimiento ambiental ni de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: Soporte de oficios actas mencionados
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

09/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-091-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: SOLICITUD DE DISEÑOS ESTRUCTURALES DEL COLEGIO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNIÓN

Respetado ingeniero Jiménez,

Durante las inspecciones y recorridos realizados al proyecto de la sede La Unión se ha solicitado los diseños de las estructuras metálicas que soportarán las nuevas cubiertas de los bloques de emisora y bodega; el 08 de abril de 2024 mediante correo electrónico se nos remitió los planos de las estructura del bloque de bodega pero según se pudo identificar en campo, la estructura metálica necesitará de apoyos verticales que se deberán instalar en el piso puesto que la estructura del bloque no cuenta con pórticos o elementos estructurales como vigas y columnas que puedan soportar la carga de esta nueva estructura metálica, es decir, la nueva estructura metálica será independiente por lo que se solicitamos los planos y memorias de cálculo de esta estructura metálica para la respectiva revisión por esta interventoría.

Aunado a lo anterior, durante el comité de obra No. 18 del 01 de abril de 2024, se solicitó los planos y memorias de cálculo de la estructura metálica del bloque de emisora, para que estos puedan ser revisados por el asesor estructural de esta interventoría de manera que si se cumple con lo exigido se pueda dar liberación por parte de esta interventoría y se continue con el trabajo de instalación de la teja, pero aún no se han recibido estos diseños.

Por todo lo anterior, solicitamos los diseños y memorias de cálculo tanto del bloque de emisora como de bodega para la respectiva revisión.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: Acta de comité No. 18.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

09/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-092-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **Intervención en Campamento**

Respetado ingeniero Jiménez,

Vemos con bastante preocupación que la estructura metálica a instalar en Campamento fue liberada desde la reunión del 14 de marzo del año en curso y solo hasta hoy ingresaron a obra dos (2) personas para realizar la excavación manual de los pedestales.

Aunado a lo anterior, a la fecha no hemos recibido la respuesta del comunicado *SED-US-065-2024,* en la cual solicitamos la siguiente información de la estructura metálica:

1- **Memorias de Calculo:**

Nuevamente se hace el llamado al calculista para que se complete adecuadamente la memoria de cálculo cumpliendo con el numeral A.1.5.2.1 de la NSR-10. En tal sentido es necesario que se presente explícitamente datos de extrema importancia tales como:

- Grado de Capacidad de Disipación de energía.
- Calculo de la fuerza sísmica.
- Tipo de análisis estructural utilizado (Incluyendo Periodos de vibración, % de masa,etc)
- Datos de entrada al procesador (incluyendo, definición de materiales, definición de cada una de las secciones transversales y asignación al modelo).
- Falta el chequeo de las conexiones.
- No se presenta tampoco el diseño de las conexiones a la base.
- Falta firma del profesional responsable del diseño.

- **Planos:**

  En general los planos presentan los despieces de los elementos y las platinas, sin embargo, no se presenta especificación alguna de las conexiones y placas base (Soldaduras, pernos, etc). Dado que los planos son de taller dada la necesidad de fabricación, deben contener lo establecido en F.2.13.1 de la NSR-10.

  No se está incluyendo las especificaciones de la protección contra la corrosión por lo que es necesario definirla (Pintura y/o galvanizado?).

  Los planos deben venir firmados por el profesional responsable.

Razón por la cual, le requerimos de manera inmediata la respuesta del comunicado *SED-US-065-2024* y el plan de contingencia de la intervención en Campamento, toda vez que la fecha prevista de terminación era el 7 de marzo del año en curso.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: N.A.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

15/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-093-2024

Señores

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: SEGÚNDO APREMIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE INFORME MENSUAL NO. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

Respetado ingeniero Jiménez,

Por medio de la presente, esta interventoría en cumplimiento de sus compromisos de vigilancia seguimiento y control del contrato de obra No. CO1. PCCNTR 5305904, nos permitimos remitir el segundo apremio por el presunto incumplimiento entrega del informe mensual de gestión del mes de marzo de 2024, dentro del plazo máximo estipulado en el anexo técnico.

El pasado 08 de abril de 2024, mediante oficio SED-US-088-2024 fue solicitado de manera urgente la remisión de esta información, a la fecha no se ha obtenido respuesta, teniendo un atraso de entrega de diez (10) días.

Bajo este panorama, se conmina al contratista de hacer entrega del informe mensual No. 4, debido a que se está presentando incumplimiento del **Capítulo 18. Obligaciones de información;** *El contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener como mínimo, por cada frente de trabajo lo siguiente:*

- *Avance de cada una de las actividades programadas.*
- *Balance presupuestal que muestre lo ejecutado, lo proyectado para terminar las obras y el total, conforme no excede del valor total contractual.*
- *Registros fotográficos.*
- *Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas.*
- *Seguimiento del plan de calidad técnica de la obra.*
- *Fotocopia de la bitácora o libro de obra.*
- *Resumen de las actividades realizadas en el mes.*
- *Relación del personal empleado en la ejecución de la obra y el pago de contraprestaciones y parafiscales por cada uno de ellos.*
- *Informe de seguridad industrial.*
- *Informe de manejo ambiental y del PGRCD.*
- *Informe de gestión social.*
- *Informe del seguimiento actualización del programa de ejecución de obra con sus alertas respectivas.*

Nota 2: Los informes mensuales deben ser entregados durante los cinco (5) días hábiles siguientes posterior al vencimiento de cada mes.

Se le recuerda al contratista que es de carácter urgente, presentar cada uno de los insumos mencionados anteriormente, para realizar la respectiva aprobación y así evitar sanciones por parte de la entidad contratante.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: SED-US-088-2024 SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORME MENSUAL NO. 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co y Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

15/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-094-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **RESPUESTA OFICIO CONS-CLARIDAD-093-2023 CAMBIO HOJAS DE VIDA PERSONAL MINIMO REQUERIDO INSPECTOR DE OBRA CIVIL, ASESORA SST Y ASESOR AMBIENTAL.**

Respetado ingeniero Jiménez,

Dando respuesta al oficio CON-CLARIDAD-093-2023 remitido el 10 de abril de 2024, donde se remite el cambio hoja de vida, personal mínimo requerido inspector de obra civil, asesora SST y asesor ambiental, se tienen las siguientes observaciones:

1. El día 02 de abril de 2024, mediante oficio SED-US-073-2024 con asunto: RESPUESTA OFICIO CONS CLARIDAD-084-2023 APROBACIÓN CAMBIO HOJAS DE VIDA INSPECTORES DE OBRA, fue remitida la aprobación de los profesionales Melissa Leal Barrios y David Nicolas Solorza Diaz, debido a que para aprobación del personal mínimo requerido también requiere autorización de la entidad, el pasado 03 de abril de 2024, mediante oficio SED-UD-081-2024, dando alcance al oficio SED-US-073-2024, esta interventoría notifico la respuesta que brindo la entidad mostrando desacuerdo debido a que, los profesionales propuestos como inspectores no cumplen con los especificado en el Anexo Técnico, por lo tanto no aprueban estos profesionales para dicho cargo.

2. ADRIAN MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ, no se aprueba como inspector de obra por las siguientes observaciones:

- No cuenta con un título como Técnico o tecnólogo profesional en Construcción.
- No hay más certificaciones para sustentar la experiencia de la profesional, que acredite Dos (2) años de experiencia como inspector en construcción en proyectos de MEJORAMIENTO, Y/O CONSTRUCCION, Y/O REPARACIONES LOCATIVAS Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.
- Los Tres (3) años de experiencia a partir de la expedición de la matricula correspondiente, debe ser como Técnico o tecnólogo profesional en Construcción.

3. NIDIA YANETH AREVALO ROJAS, No se aprueba como Asesora ambiental, por las siguientes observaciones:

- No cuenta con título de Ingeniero civil o ingeniero ambiental.
- El Posgrado en el área del Medio Ambiente (aplica únicamente para el ingeniero civil)
- No cuenta con tarjeta profesional.

4. Se debe presentar paz y salvo donde se especifique fecha de inicio y finalización del vínculo laboral del personal que se menciona como retirado MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: N.A.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

15/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-095-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No 66-63
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332. "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: INFORME MENSUAL NÚMERO 5 DE INTERVENTORÍA.

Respetado señor Pinzón,

Por medio del presente, me permito radicar el informe mensual No. 5 de interventoría del periodo entre el 1 de marzo de 2024 al 29 de marzo de 2024 del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5313332. Se adjunta el informe mensual junto con los anexos respectivos.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: Informe mensual de interventoría No. 5. zip
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co y Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

18/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-096-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **RESPUESTA OFICIO CONS-CLARIDAD-092-2023 OBSERVACIONES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO**

Respetado ingeniero Jiménez,

Dando respuesta al oficio CON-CLARIDAD-092-2023 remitido el 10 de abril de 2024, remitimos las siguientes observaciones:

1. El contratista sí remitió oficio No. CONS-CLARIDAD-025-2023 mediante el cual daba sus argumentos por el atraso en el proyecto.

2. Si bien es cierto que el contratista de obra remitió el oficio No. CONS-CLARIDAD-049-2023, es importante resaltar que en dicho oficio el contratista de obra mencionaba qué:

   "Para la ejecución de la obra en estas instalaciones se proyectaba una entrega total del predio, de tal forma, que los obreros se pudieran alojar en las instalaciones dado la distancia con la zona urbana de la ciudad, con el fin de aumentar rendimientos y entregar los mantenimientos y adecuaciones en los tiempos programados, sin embargo; la Secretaría nos informó que no era posible que los trabajadores se quedarán en las instalaciones."

Pero el 22 de enero de 2024 la SED entregó el predio y este quedó a cargo del contratista de obra para que a su vez pudiera ser usado para alojar al personal que trabajara en esta edificación, pero se pudo evidenciar en cada uno de los recorridos realizados por esta interventoría que nunca hubo personal alojado en la sede y por ende los trabajos iniciales como demoliciones se hicieron de manera tardía.

3. Si bien es cierto que en los comunicados No. CONS-CLARIDAD-067 2023 y CONS-CLARIDAD-082-2023 el contratista de obra remitía la respuesta frente al atraso del proyecto, es importante mencionar que el atraso que se expone en el presunto incumplimiento enviado por esta interventoría mediante oficio No. SED-US-071-2024 es sin tomar en cuenta las sedes de El Toldo, Erasmo Valencia y Tunal Alto puesto que como bien manifiesta el contratista de obra no fueron entregadas para la intervención por situaciones ajenas al contrato. Las demás sedes sí hacen parte del análisis del atraso puesto que estas si han podido intervenirse de haberse cumplido con el cronograma.

4. USMINIA: este colegio fue entregado el 15 de abril de 2024, de acuerdo al acta de entrega física que adjunta al presente documento (ANEXO 1), aun cuando estaba prevista la entrega para el 29 de febrero de 2024, dicha entrega se realizó un acta de reunión (ANEXO 1) en la cual se determinaban algunas faltantes como ajuste en el canal de los baños. Por tal motivo se supera el incumplimiento en la entrega de este Colegio.

5. FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA: como bien menciona el contratista de obra la visita preliminar se realizó el 11 de septiembre de 2023 y en ella se definió que parte del alcance en esta institución era el piso de madera en el salón de danzas, desde aquel momento se sabía que esta intervención demandaría un NP para el piso de madera que el contratista de obra quería proponer pero no fue sino hasta el 02 de febrero de 2024, casi 5 meses después, que el contratista de obra presentó dicho NP lo que marca que si se presentó una demora.

   Esta sede sigue sin ser entregada en su totalidad.

6. DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B: el atraso que se presentó en el presunto incumplimiento enviado por esta interventoría mediante oficio No. SED-US-071-2024 corresponde al avance físico en obra, puesto que el avance financiero solo demuestra que las intervenciones han demandado más recursos, pero no establece si la intervención esta acorde a la programación.

   Esta sede debía ser entregada el 20 de enero de 2024 pero sigue sin ser entregada en su totalidad.

7. CHUNIZA: como bien menciona el contratista, se sigue sin entregar de manera definitiva esta institución que debía ser entregada el 01 de marzo de 2023. Aunque se han subsanado algunas observaciones mencionadas oficio No. SED-US-071-2024, hay situaciones como recuperación de la zona verde y cambio de rejillas de los cárcamos que se siguen manteniendo.

   En esta sede persiste el incumplimiento en la entrega por parte del contratista.

8. DILE SUMAPAZ: a la fecha de este comunicado solo se ha instalado las rampas. Esta sede debió entregarse el 07 de noviembre de 2023.

   En esta sede persiste el incumplimiento en la entrega por parte del contratista.

9. DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A: aunque faltan observaciones por atender que no estaban dentro del alcance inicial, como las tapas de los tanques de dos sanitarios, es también verdad que no se han atendido otras propias de la intervención como la recuperación de la zona verde utilizada como acopio y paso de los materiales.

10. IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LA UNIÓN: es verdad que los trabajos adicionales y los inconvenientes en la entrega de los demás espacios han demandado más tiempo en la intervención de la sede, pero la atención a estos trabajos ha demandado más tiempo del normal puesto que como se ha dejado claro en varias actas de comité de obra y de reuniones, el contratista de obra se comprometía a entregar espacios en determinadas fechas, pero estas cada vez eran prorrogadas.

    En esta sede persiste el incumplimiento en la entrega por parte del contratista.

11. JAIME GARZÓN SEDE AURAS: si bien es cierto que el colegio demoró la entrega de los espacios, el contratista de obra entró a intervenir hasta el 17 de diciembre de 2023, es decir, un mes después de la entrega por parte de la institución.

    El 8 de marzo de 2024 según el cronograma aprobado por esta interventoría debía entregarse la institución, pero a la fecha del presente comunicado no se ha entregado.

    En esta sede persiste el incumplimiento en la entrega por parte del contratista.

12. JAIME GARZÓN SEDE EL RAIZAL: en el comunicado No. CONS-CLARIDAD-082-2023 el contratista de obra si mencionó la situación de en la que solicitaba la entrega de la sede para la intervención. Cabe mencionar que la entrega de toda la intervención de la sede de Auras era para el 8 de marzo de 2024 y la entrega de la sede del Raizal dependía de esa

entrega puesto que el colegio necesitaba la sede de Auras como sitio de contingencia para albergar los estudiantes del Raizal.

En esta sede aún no se inicia la intervención y se espera el diseño de la estructura que soportará la futura cubierta en pro de avanzar con la intervención.

13. SAN JOSÉ: es verdad que en el comité No. 13 la SED presentó modelos de la cocina que necesitaban en este colegio y que mediante oficio No. CONS-CLARIDAD-075-2023, el contratista de obra presentó la primera versión del del APU de los ítems No Previstos.

    Se continua a la espera de que se inicie la intervención en esta sede.

14. CAMPAMENTO VIVIENDA DOCENTE: Como se mencionó al inicio de este comunicado, el 22 de enero de 2024 la SED entregó el predio y este quedó a cargo del contratista de obra para que a su vez pudiera ser usado para alojar al personal que trabajara en esta intervención, pero se pudo evidenciar en cada uno de los recorridos realizados por esta interventoría que nunca hubo personal alojado en la sede y por ende los trabajos iniciales como demoliciones se hicieron de manera tardía, es decir, que aun cuando se entregó el predio no iniciaron intervenciones.

    Esta interventoría solicitó los diseños de esta sede puesto que es la manera de en que se pude verificar y asegurar que las estructuras propuestas podrán soportar las futuras cubiertas.

    En esta sede aún se sigue trabajando en el montaje de la estructura, hasta la fecha del presente comunicado se han fundido los primeros dados que soportarán los apoyos verticales de la nueva cubierta.

    En esta sede persiste el incumplimiento en la entrega por parte del contratista.

15. DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C: para la intervención de esta sede se sabía que debía entregarse la intervención de la sede B puesto que el colegio no contaba con más aulas para la contingencia que debe hacerse para atender a los estudiantes. De hecho, el cronograma aprobado por interventoría demostraba que la intervención de esta sede sería una vez finalicen las actividades en la sede A y sede B, pero ante la falta de entrega por parte de la sede B no se ha podido iniciar en la sede C.

    Hasta la fecha del presente comunicado, aun no se ha iniciado la intervención en esta sede.

16. LAS MERCEDES: en esta sede se entregaron todos los espacios que se piensan intervenir y ya se encuentran en intervención, esta interventoría realiza el control y seguimiento para establecer que los trabajos se hagan acorde a lo planeado.

17. ASPECTOS GENERALES: como se mencionó en este comunicado, no se toman en cuenta las sedes de El Toldo, Tunal Alto y Erasmo Valencia para establecer el atraso en el que se encuentra el proyecto que de acuerdo con el informe semanal No. 24 con corte al 14 de abril de 2024 tiene un porcentaje de atraso del 17%, se reitera que este porcentaje es sin tomar en cuenta las sedes de El Toldo, Tunal Alto y Erasmo Valencia.

18. Se solicitaron diseños de las estructuras metálicas puesto que es necesario para el cumplimiento de la NSR-10 como lo estipula el anexo técnico el cual menciona que:

    "(…)

    7.4 Método Constructivo

    La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:
    1. La estabilidad de la obra contratada.
    2. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.
    3. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.
    4. El cumplimiento de los aspectos de acuerdo con la ***NSR vigente*** *siempre y cuando se requiera.* (negrilla fuera de texto)

    (…)

    27. Cumplimiento de los códigos y normativas.

    Para el desarrollo del proyecto, el contratista será responsable de aplicar la normativa técnica correspondiente a cada una de las disciplinas, en las versiones vigentes y actualizadas. Se enumera a continuación parte de la normativa técnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecución y desarrollo del proyecto y objeto de seguimiento por parte de la interventoría:

    Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia."

COMPONENTE SST

El contratista en su respuesta no aporta documentación que sustente el pago de seguridad social de los siguientes profesionales, por eso persiste el incumplimiento. Como lo podemos verificar en la tabla que se adjunta a continuación:

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	ID	% DEDICACIÓN	oct-23	nov-23	SEGURIDAD SOCIAL DIC-ENE	SEGURIDAD SOCIAL ENE-FEB	SEGURIDAD SOCIAL FEB-MAR	SEGURIDAD SOCIAL MAR-ABRIL
Director de Obra	JAIRO ERNESTO JIMENEZ PINEDA	80222352	**30%**	23/11/2023	12/12/2023	16/01/2024	14/02/2024	EPS Y FP 74960813 ARL 75403423	75848584 75741375
Residente de Obra	GUILLERMO ALBERTO VELANDIA CORDOBA	19418347	**100%**	24/11/2023	12/12/2023	16/01/2024	14/02/2024	EPS Y FP 74961659 ARL 75403423	75848584 75741498
Residente de Obra	LEONARDO TORRES LARA	88279853	**100%**	N/A	N/A	N/A	N/A	EPS Y FP 74965628 ARL 75403423	75848584 75805884
Asesor Estructural	JULIO OSWALDO TORRES SUAREZ	79458867	**10%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	5/02/2024	NO PRESENTO	NO PRESENTO
Asesor Ambiental	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	**20%**	12/10/2023	20/11/2023	16/01/2024	14/02/2024	9463141892	6/03/2024
Asesor en seguridad y salud en el trabajo.	MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ	52336611	**20%**	13/10/2023	20/11/2023	16/01/2024	14/02/2024	9463141892	7/03/2024
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	JORGE ERNESTO CASTIBLANCO MARTINEZ	10073655	**10%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	75123094	NO PRESENTO
Asesor en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio	MARILUZ VARGAS GONZALEZ	26593081	**10%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	29260094	NO PRESENTO
Profesional de costos, presupuestos y programación de obra	CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	79450429	**20%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	75029057	NO PRESENTO
Técnico en Seguridad y	LAURA YERALDINE	1,006E+09	**100%**	N/A	12/12/2023	16/01/2024	14/02/2024	75401798	75847828

GRUPO EMPRESARIAL

18/04/2024
Bogotá D.C.

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	ID	% DEDICACIÓN	oct-23	nov-23	SEGURIDAD SOCIAL DIC-ENE	SEGURIDAD SOCIAL ENE-FEB	SEGURIDAD SOCIAL FEB-MAR	SEGURIDAD SOCIAL MAR-ABRIL
Salud en el trabajo.	RAMIREZ OCAMPO								
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo.	JOHANNA KATERINE MARTINEZ VARELA	1,07E+09	**100%**	N/A	N/A	16/01/2024	14/02/2024	75401798	75847828
Inspector de obra	ROBERTO ROSAS CONDIA	79499052	**100%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	REPORTADOS COMO RETIRADOS EL 16 DE ENERO DE 2024	
Inspector de obra	SERGIO MAURICIO UBAQUE BENAVIDES	1,034E+09	**100%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**		
Maestros de obra	CARMEN RUTH CAICEDO CAICEDO	63394516	**100%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	NO PRESENTO	NO PRESENTO
Maestros de obra	ORLANDO ROSAS CONDIA	19442965	**100%**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	**NO PRESENTO**	NO PRESENTO	NO PRESENTO

Como se evidencia no se está cumpliendo con la presentación de los pagos de seguridad de los siguientes profesionales, tecnólogos y técnicos:

1. Maestros de obra.
2. Inspectores de obra.
3. Profesional de costos, presupuestos y programación de obra.
4. Asesor en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio.
5. Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos.
6. Asesor Estructural.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: ANEXO 1 -Entrega Usminia
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

17/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-097-2024

Señores

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No 66-63
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: APROBACIÓN CAMBIO DE ASESOR SST CONSORCIO CLARIDAD CONTRATISTA DE OBRA.

Respetado señor Pinzón,

Por medio de la presente se notifica cambio del profesional al cargo Asesor SST, presentada por el contratista de obra CONSORCIO CLARIDAD mediante oficio CONS-CLARIDAD-093-2023, el pasado 10 de abril del presente año, notificamos que, conforme a los pliegos de condiciones, el profesional que se menciona a continuación cumple con los requisitos exigidos y es aprobada por la interventoría.

Documentos anexos como soporte:
- 1. Cedula de ciudadanía
- 2. Diploma de grado
- 3. Licencia de prestación de Servicios de Seguridad y Salud en e trabajo.
- 4. Certificaciones laborales
- 5. Consulta de antecedentes disciplinarios.

GRUPO EMPRESARIAL

17/04/2024
Bogotá D.C.

Cantidad	Cargo	Identificación	Título profesional	Título de posgrado	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)	Porcentaje de dedicación
1	**Asesor en seguridad y salud en el trabajo.**		**Profesional o administrador en Seguridad y Salud en el Trabajo o HSEQ o profesional en ingeniería o arquitectura**	**Postgrado en el área en Seguridad y Salud en el Trabajo o HSEQ (aplica para profesional en ingeniería o arquitectura).**	**Cuatro (4) años de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional y licencia en Seguridad y Salud en el trabajo vigente**	**Dos (2) años de experiencia como Residente o Asesor en seguridad y salud en el trabajo. en proyectos de MEJORAMIENTO, Y/O CONSTRUCCION, Y/O REPARACIONES LOCATIVAS Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES.**	**20%**
1	NIDIAN YONETH AREVALO ROJAS	52834633	Administradora en Salud ocupacional	N/A	Resolución No. 3395 de 21-03-2019 Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo. Higiene Industrial, Seguridad Industrial, Investigación en accidentes de trabajo de acuerdo con su competencia, Educación y capacitación, Diseño, Administración y ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo **GRAN TOTAL EXP : 5 AÑOS**	EXP1: CONSORCIO EXACTITUD 901501510-3 RESIDENTE SST : CONTRATO: C01.PCCNTR.2645877 OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". FI: 09-08-2021 AL FT: 06-10-2023 TOTAL: 0,57 GRAN TOTAL: 2,16AÑOS	CUMPLE

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexo: Hoja de vida NIDIAN YONETH AREVALO ROJAS
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

17/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-098-2024

Señores

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No 66-63
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: Estado de la intervención en Fernando Gonzalez Ochoa.

Respetado señor Pinzón,

De acuerdo con el comunicado de la rectora (E) del colegio Fernando Gonzalez Ochoa, referente a la intervención realizada en este plantel educativo, manifestamos lo siguiente:

1. Piso aulas danzas: el desmonte del piso existente y la instalación del nuevo piso, además del guardaescoba para este espacio fue llevado a cabo los días 9, 10 y 11 de abril.



Ilustración 1. Aula danzas

2. Techo comedor escolar: respecto a la afirmación que hace la rectora (E) del colegio, referente a *"sigue la gotera después del cambio del tramo de teja",* nos permitimos aclarar que en ningún momento se hizo el

cambio de teja, el trabajo realizado en cubierta fue meramente mantenimiento, así como lo describe el contratista de obra en el comunicado *CONS-CLARIDAD-095-2023* del contratista de obra*:*

(…)" -Con relación al evento presentado por goteras en el área de comedor se realizaron reparaciones el día xxxxx por parte de personal especializado en cubiertas, donde de acuerdo con el diagnóstico inicial emitido por el estado general de la cubierta termo acústica tipo sándwich de Hunter duglas, compuesta por capa intermedia de fibra de 4 cm, bandeja inferioren lamina cal 22 a tope y bandeja superior en cal 20, grafada por presión con sistema de ajuste mecánico. Se evidenció que por deterioro generado por el paso del tiempo la capa de fibra de 4 cm se auto compacto generando un vacío de 2 cm entre la bandeja inferior y la bandeja superior, ocasionando filtraciones en juntas de las bandejas compuestas, evitando así la posibilidad de transitar con seguridad sobre la superficie de la cubierta, teniendo en cuenta genera el desgrafado de las bandejas, ya que simplemente es un acople mecánico que al transitar sobre las bandejas se suelta la bandeja superior generando vacíos internos y separaciones, lo cual originan filtraciones o goteras.

Frente a esta situación el especialista en cubiertas realizó ajuste en la totalidad de la cubierta del comedor, adicionando un ajuste con tornillos autoperforante en el trayecto del empate junto con sellado con Sika Flex, para los sectores con mayor goteo se instaló cinta multi seal de alta adherencia.

Sin embargo, es claro que el desgaste de la fibra de vidrio genera problemas por desgrafado de la lámina inferior y superior, por lo tanto, no puede ser transitada, toda vez que esta actividad es la causa principal de las goteras y filtraciones.

Con fin de dar solución los problemas de filtración reportados, se efectuará nueva revisión y reparación menor de cubierta con fin de identificar las áreas afectadas y solucionar nuevamente las filtraciones presentadas, una vez realizada está nueva reparación y teniendo como referencia el estado de desgaste actual de la cubierta, el Consorcio Claridad no se compromete con nuevas reapariciones, dejando como recomendación principal que la cubierta no puede ser transitada." (…)

Por ende, el contratista de obra realizará nuevamente el mantenimiento en la cubierta el 4de mayo de 2024.

3. Piso paso a baños primaria: si bien es cierto, la instalación del piso en grano caucho quedo obstaculizando la apertura de dos (2) puertas de las baterías sanitarias, pero esto no implica que el área intervenida no pueda ser utilizada para el uso recreativo de la comunidad estudiantil. Por consiguiente, el contratista de obra ajustará la apertura de dichas puertas el 20 de abril del año en curso.

4. Piso ludoteca: el guardaescoba había sido instalado con anterioridad, sin embargo, estaban pendiente unos ajustes, razón por la cual, el contratista de obra subsano las observaciones el 11 de abril de 2024:



Ilustración 2. Ludoteca



Ilustración 3. Ludoteca

5. Sistema de bombas: las cuatro (4) bombas fueron instaladas, dos (2) para agua potable y dos (2) para agua lluvias; está pendiente la capacitación y la entrega del manual de uso y conservación de los equipos instalados, la cual se llevará a cabo el día 26 de abril de 2024

6. Cancha múltiple: conforme al comunicado del constructor *CONS-CLARIDAD-097-2023,* la segunda aplicación de vulken en las juntas lo realizarán el 20 de abril del año curso.

Aunado a lo anterior, adjuntamos el comunicado del contratista de obra.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.

CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co
Anexo: 24-04-17 CONS-CLARIDAD-097-2023 Respuesta intervención FGO

GRUPO EMPRESARIAL

20/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-099-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **ALCANCE A OFICIO No. SED-US-096-2024 - RESPUESTA OFICIO CONS-CLARIDAD-092-2023 OBSERVACIONES DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO**

Respetado ingeniero Jiménez,

Nos permitimos dar alcance al oficio citado en el asunto donde remitimos respuesta al oficio CON-CLARIDAD-092-2023 remitido el 10 de abril de 2024, a continuación, nos permitimos remitir dicha respuesta referente al componente ambiental:

Esta interventoría realiza la revisión del informe de incumplimiento relacionado con el componente ambiental, con un enfoque principal en el tema de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

La Interventoría indica que la respuesta proporcionada por el contratista carece de coherencia por las siguientes razones:

1. El oficio CONS-CLARIDAD-046-2023 presentado por el contratista no se refiere a lo indicado, ya que el asunto del oficio corresponde a la respuesta de un correo y envío PMA V3. Estas son las clases de inconsistencias que se han estado presentando continuamente en cada una de las versiones enviadas por el contratista.

2. El Consorcio Claridad, a través del comunicado CONS-CLARIDAD-070-2023, con el asunto "Informe RCD Trimestral No. 01. Periodo noviembre a diciembre de 2023", presentó la siguiente información sin presentar todos los certificados.

Periodo reportado:
Noviembre -Diciembre del 2023

TIPO DE RESIDUO (Total del periodo)	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD						
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.			32,51		106,66	139,17
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.						
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.						
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos				2,248		2,248
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.						
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.					4,31	4,31
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0	0	0	0	0	

2.2 METAS

NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t)	145,73	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)	-	
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t)	32,51	22%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t)	2,25	2%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor	-	
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t)	110,97	76%
7	Meta total de aprovechamiento : No aplica meta de aprovechamiento por ser pequeños generadores, sin embargo se determina el % de aprovechaminto para el periodo asi : 145,73*0,25= 36,43 ton	34,76	95%

Cordialmente,

NIT 901700454447-4
NOMBRE: Jairo Jimenez / Director de Obra

3. A través del oficio SED-US-011-2024, fechado el 16 de enero de 2024, se enviaron las observaciones correspondientes al informe No. 2, solicitando los ajustes necesarios al informe mensual.

4. Hasta la fecha actual, se esperaba tener como mínimo los certificados de disposición emitidos por el gestor autorizado para el mes de noviembre de 2023. Sin embargo, los certificados de disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD) no se adjuntaron al informe.
5. No se adjunta la certificación del suministro de materiales, lo cual es necesario para verificar la procedencia y calidad de estos.
6. No se presenta una relación de los materiales utilizados como donación. Es importante incluir esta información para tener un registro completo de los materiales.

4. El día 23 de enero de 2024 se envió un Apremio debido al presunto incumplimiento en la entrega del informe mensual No. 2 correspondiente al mes de diciembre de 2023. Esto se debe a la falta de entrega de los informes ambientales y de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

5. El 25 de enero de 2024, a través del oficio SED-US-020-2024, se emitió un segundo Apremio por el presunto incumplimiento en la entrega del informe mensual No. 2 correspondiente al mes de diciembre de 2023.

6. Mediante el oficio CONS-CLARIDAD-071-2023 con fecha del 09 de febrero de 2024, el contratista emite informes correspondientes a los RCD de los meses de noviembre y diciembre de 2023, dando respuesta al oficio SED-US-030-2024. Se adjuntan los informes.

Reporte noviembre 2023.

Periodo reportado: Noviembre de 2023						
TIPO DE RESIDUO *(Total del periodo)*	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	TOTAL RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD						
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.					42,78	42,78
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.						
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.				10,84		10,84
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos						
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.						
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.						
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.	0	0	0	0	0	

2.2 METAS			
NÚMERO	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**TONELADA (t)**	**PORCENTAJE**
1	Cantidad de RCD generado en obra (t)	53,62	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)	-	
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t)	-	0%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t)	10,84	20%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor	-	
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t)	42,78	80%
7	Meta total de aprovechamiento : No aplica meta de aprovechamiento por ser pequeños generadores, sin embargo se determina el % de aprovechaminto para el periodo asi : RCD generdo sin tener encuenta excavacion : 10,84 ton x 25% = 2,71 ton	2,71	400%

Reporte diciembre 2023.

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE RCD						
Se deberá remitir el reporte de implementación del Programa de Manejo Ambiental de RCD a la Autoridad Ambiental competente, con las						
2.1 ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO (EN OBRA O ENTREGADO A UN GESTOR) Y DISPOSICIÓN FINAL						
Periodo reportado: Diciembre de 2023						
TIPO DE RESIDUO *(Total del periodo)*	TONELADAS DE RCD APROVECHADAS EN OBRA	TONELADAS DE RCD ENTREGADAS A RECEPTOR	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN PUNTO LIMPIO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO A UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO	TONELADAS DE RCD ENTREGADO EN SITIO DE DISPOSICION FINAL	TOTAL RCD (t)
1. Residuos de construcción y demolición - RCD						
1.1 Productos de excavación y sobrantes de la adecuación del terreno: coberturas vegetales, tierras, limos y materiales pétreos productos de la excavación, entre otros.					63,88	63,88
1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás.						
1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, cantos, pétreos asfalticos, trozos de ladrillos y bloques, cerámicas, sobrantes de mezcla de cementos y concretos hidráulicos, entre otros.				21,67		21,67
1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimiento de zinc o estaño, plásticos				2,45		2,45
2. Residuos de construcción y demolición - RCD no						
2.1 Los contaminados con residuos peligrosos.						
2.2. Los que por su estado no pueden ser aprovechados.						0
2.3 Los que tengan características de peligrosidad, estos se regirán por la normatividad ambiental especial establecida para su gestión.						

2.2 METAS

NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t)	88,00	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)	-	
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t)	-	0%
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t)	24,12	27%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor	-	
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t)	63,88	73%
7	Meta total de aprovechamiento : No aplica meta de aprovechamiento por ser pequeños generadores,sin embargo se determina el % de aprovechamiento para el periodo asi :88 ton -63,88 ton (RCD excavacion) = 24,12 ton x 25% = 6,03 ton	6,03	400%

Cordialmente,

NIT 90170045447-4
NOMBRE: Jairo Jimenez / Director de Obra

7. Se ha registrado Residuos de Construcción y Demolición (RCD) en la obra, lo cual representa un cumplimiento parcial, de acuerdo con las cantidades presentadas en los certificados. Sin embargo, es importante destacar que no se han registrado todos los certificados, ya que en la obra se ha evidenciado la existencia de cantidades de RCD enviadas a la escombrera de maquinarias amarillas.

8. A través del oficio SED-US-039-2024 de febrero, se ha dado respuesta al oficio CONS-CLARIDAD-072-2023. En donde se remiten las observaciones correspondientes al informe mensual No. 3 de la obra, que abarca el mes de enero de 2024, centrándose en los aspectos ambientales, de salud y seguridad ocupacional (SST) y sociales.

> 5. Se requiere incluir los vales y/o certificados de los materiales adquiridos durante el periodo cada uno de los periodos que lleva el proyecto.
>
> 6. En relación con el retiro de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), existen discrepancias entre la descripción del numeral 6 y la información presentada en la Tabla No. 5 del informe. Se solicita alinear la información en el documento. Se debe revisar y ajustar las cantidades correspondiente mes por mes de acuerdo con vales ya actas parciales.
>
> 7. No se remitieron los vales y/o certificados de RCD (excavación y/o demolición) generados durante el periodo.

9. El contratista emite oficio CONS-CLARIDAD-089-2023 del 20 de marzo de 2024, correspondiente al informe No.4. La interventoría mediante oficio SED-US-078-2024, remite observaciones

> 2. La tabla No. 4 no ha sido completada de manera adecuada. Resulta ilógico que solo se registre la disposición de residuos peligrosos para el mes de febrero.
>
> 3. La Tabla 6, muestra el consolidado de los RCD, generados en la obra, presenta información incompleta para el mes de febrero.

Es fundamental aclarar que, según las certificaciones que el contratista ha presentado hasta el momento, la Interventoría ha llevado a cabo la revisión correspondiente. Sin embargo, se ha observado una falta de coherencia entre dichas certificaciones, las evidencias encontradas en la obra y las actas parciales. Esta situación ha generado un proceso agotador debido a las múltiples versiones de los informes ambientales y de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), así como a las reuniones de trabajo realizadas, sin lograr una solución adecuada para la respectiva aprobación de los informes.

Por otro lado, es importante señalar que los informes de RCD presentan deficiencias en su diligenciamiento. A continuación, se enseña el control que la Interventoría lleva a cabo sobre los RCD, basado en los certificados presentados.

GRUPO EMPRESARIAL

19/04/2024
Bogotá D.C.

Mes de informe	RCD entregados a	Tipo de residuos	Toneladas de RCD aprovechado en obra	Toneladas de RCD entregadas a receptor	Toneladas de RCD entregado en punto limpio	Toneladas de RCD entregado a una planta de aprovechamiento	Toneladas de RCD entregado en sitio de disposición final	Vale	Certificado	Total RCD generados en el mes	Observaciones
noviembre	Cemex	1.1				10,84			x	98,62	N/A
	Cemex	1.1					10,26		x		
	Cemex	1.3					32,52		x		
	Máquinas amarillas	1.1					45	x	x		
diciembre	CBC	1.4				2,248			x	402,798	N/A
	Cemex	1.3				21,67			x		
	Cemex	1.1					20,52		x		
	Cemex	1.3					43,36		x		
	Máquinas amarillas	1.1					315	x			
enero	Máquinas amarillas	1.1					45		x	144,55	La certificación de máquinas amarillas es de 405 ton, es decir certifican: 2 viajes de noviembre, 14 viajes de diciembre y 2 viajes de enero. (La densidad es de 1,5)
	Tracol	2.2					2,26		x		
	Tracol	2.2					2,05		x		
	Cemex	1.1					41,04		x		
	Cemex	1.3					54,2		x		

Sin otro particular, me suscribo.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: N.A.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

20/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-100-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: FALTA DE PERSONAL EN LOS FRENTES DE INTERVENCIÓN.

Respetado ingeniero Jiménez,

Por medio del presente y como resultado de los recorridos y seguimiento que esta interventoría realiza a cada uno de los frentes de obra activos, evidenciamos que entre los días 15, 16 y 17 de abril de 2024 se ha presentado una baja cantidad de personal operativo específicamente en las sedes de Vivienda Campamento Docente y Juan de la Cruz Varela - sede La Unión.


En la primera sede solo se tuvo registro de 2 trabajadores que desarrollaron trabajos de fundición de los dados en los que se soportará la futura estructura metálica. En cuanto a la sede de La Unión solo hubo dos oficiales presentes y solo hasta el 17 de abril se presentó un soldador para continuar con los trabajos en la estructura metálica; de hecho, en el recorrido realizado con el apoyo a la supervisión el 16 de abril de 2024 se identificó una posible fuga de agua en la oficina de rectoría, el 18 de abril de 2024 se atendió esta fuga con los dos oficiales disponibles por lo que los trabajos en el bloque emisora y de bodega quedaron sin atenderse. Estas situaciones han quedado plasmadas en las bitácoras de obra de cada sede.

Lo anterior genere preocupación puesto que estos son frentes que presentan atrasos en el cronograma considerables y la falta de personal no ayuda a que se mejore el ritmo de trabajo.

Por ello, solicitamos que se aumente el personal operativo en estas sedes con el fin de subsanar los atrasos.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: N.A.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

23/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-101-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: RESPUESTA OFICIO CONS-CLARIDAD-098-2023 CAMBIO DE HOJAS DE VIDA PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO TÉCNICO SST.

Respetado ingeniero Jiménez,

Dando respuesta al oficio CON-CLARIDAD-098-2023 remitido el 23 de abril de 2024, donde se remite el cambio hoja de vida, personal mínimo requerido técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, esta interventoría aprueba el cambio de la hoja de vida del siguiente profesional:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	PROFESIÓN
LEIDI CONSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ	39583712	ADMINISTRADORA EN SALUD OCUPACIONAL

Se hace la observación que, dentro de los documentos de Leidy Bejarano, no anexan certificado de trabajador autorizado actualizado con la normatividad legal vigente, tampoco el curso de Coordinador de trabajo en alturas. Se solicita en menos de cinco (05) días calendario, la entrega de estos certificados, documentos necesarios para las funciones del profesional.

GRUPO EMPRESARIAL

23/04/2024
Bogotá D.C.

Por otro lado, se le recuerda al contratista remitir el paz y salvo del profesional que mencionan como retirado y la notificación de exámenes médicos de retiro.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: Hoja de vida personal mencionado.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

23/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-102-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

Respetado ingeniero Jiménez,

De acuerdo con las fechas estipuladas con anterioridad referente a la entrega de las actividades pendientes en las SEDES que tenían observaciones en la entrega y las SEDES que se encuentran en ejecución, presentamos los siguientes incumplimientos:

1. Fernando Gonzalez Ochoa

Técnico:

- Ajuste de puertas de baño de preescolar, aula y deposito en patio de preescolar: **14 de abril de-2024,** sin embargo, hay dos puertas que presentan roce con el piso de grano caucho instalado.
- Instalación de enchape en patio de preescolar: desde el acta de entrega parcial fue estipulado el ajuste para el **20 de febrero de 2024**, al no cumplir con el compromiso solicitaron prórroga, la cual fue para el **20 de abril de 2024.**
- Reparación de gotera en el comedor: conforme a la visita realizada al plantel educativo, la gotera persiste en el punto donde fue inicialmente intervenido, por lo tanto, le recordamos que el **4 de mayo de 2024** es la fecha máxima de intervención.
- Sistema de bombeo: durante las últimas semanas han presentado prorrogas a las fechas establecidas para tal fin, por lo cual, el plazo máximo para la capacitación y entrega de manual de mantenimiento **26 de abril de 2024 a las 11 am.**
- Bombas eyectoras: puesta en funcionamiento **20 de abril de 2024**.
- Cancha múltiple: aplicación de vulken ss45 en las juntas para el sábado **20 de abril de 2024.**

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de zonas verdes (costado izquierdo de la cancha) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo: **17 de febrero de 2024**
- No se retiraron los residuos del cambio del piso laminado en el aula de danzas.

2. Chuniza

Técnico:

- Ajuste de tapas de cajas de inspección: en reiteradas oportunidades le hemos indicado al constructor sobre el ajuste de varias tapas de las cajas de inspección, en aras que no se conviertan en tropezaderos para la comunidad estudiantil.
- Ajuste de rejillas de cárcamos: si bien es cierto, durante la semana del 15 al 21 de abril de 2024 cambiaron pocas rejillas y aún hay muchas que están fisuradas y rotas, incumpliendo así la fecha establecida con anterioridad, **14 de abril 2024.**
- Ajuste de puerta de almacén debajo de la escalera: el Consorcio Claridad ajustó una hoja de la puerta, sin embargo, la otra hoja de la puerta está rozando con el andén construido.
- Ajuste de listones de sillas y reposición: **16 de marzo de 2024.**
- Reposición de tapa registro detrás del cerramiento contra impacto: **16 de marzo de 2024.**
- Detalles de pintura en canchas y cerramiento contra impacto.
- Ajuste de bordillos.

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de la zona verde y talud que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo: **14 de marzo de 2024.**

3. Diego Montaña Cuellar sede B

Técnico:

Bloque aulas

- Reposición de vidrios rotos: inicialmente habían establecido el **10 de marzo de 2024**, posterior a ello, solicitaron prórroga para el **8 de abril de 2024.**

Bloque administración

- Tapas de las bandejas portacables.
- Instalación de persianas en la luz que se presenta en la viga del segundo piso del bloque administrativo: si bien es cierto, realizaron la actividad pero no dejaron la persiana al borde de la viga en aras de evitar el alojamiento de palomas.

- Instalación de bajantes en la nueva canal de la nueva cubierta del bloque administrativo y de salones: inicialmente la fecha de entrega era el **10 de marzo de 2024,** no obstante, el Consorcio Claridad solicito prórroga para el **15 de abril 2024.** El domingo 21 de abril de 2024 procedieron a llevar a cabo la actividad pero esta fue inconclusa, pues hace falta la terminación de a la instalación de la tubería y la bajante del bloque de aulas.
- Cielo raso en baño: **13 de abril de 2024.**
- Elevar las cuchillas y muros en las zonas de las oficinas: **20 de abril de 2024.**
- Pañete externo: **20 de abril de 2024.**

Baños primer piso

- Instalación de persiana en los costados de los baños del primer piso: **14 de abril de 2024.**

Bloque aulas (4)

- Pisos, enchape, pintura, puertas, persiana en los costados: **14 de abril de 2024.**

Generales

- Aplicación de pintura en las puertas de los salones: **20 de abril de 2024.**
- Malla encima de las canales instaladas: **14 de abril de 2024.**
- Instalación de flanche en la viga superior de las escaleras del costado sur para evitar el posicionamiento de palomas: **14 de abril de 2024.**
- Ajuste de pintura en canal: **14 de abril de 2024.**
- Detalles de pintura en escalera de administración: **14 de abril de 2024.**
- Ajustar detalles de pintura en fachada, salones de bloque administrativo y de bloque de salones: **14 de abril de 2024.**

4. Diego Montaña Cuellar sede A

Técnico:

- Eliminación de abultamiento del piso instalado en las aulas de preescolar: **1 de marzo de 2024.**
- Ajustar pintura en marquesinas entrada a terrazas de preescolar A y preescolar B: **17 de marzo de 2024.**
- Ajustar detalles de pintura en puerta salones de preescolar A y preescolar B: **17 de marzo de 2024.**
- Instalación de gárgolas en terrazas de preescolar A y preescolar B: la fecha establecida en el acta de entrega física era el **10 de marzo de 2024,** sin embargo, el Consorcio Claridad solicitó prórroga para el **14 de abril de 2024.**
- Colocar 2 tapas tanque sanitarios baños niñas y niños, uno en cada uno. Cabe mencionar que estas tapas no estaban cuando se inició la intervención, pero dado que no fue posible hallar las tapas, el Consorcio Claridad hará el cambio de dos sanitarios para el **20 de abril de 2024.**

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de zonas verdes (costado oriental salida bloque preescolar) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra,

estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo: **16 de marzo de 2024.**

5. Usminia

Técnico:

- Detalles con la terminación de los pisos de baños niños y niñas: **12 de abril de 2024.**
- Tapa filos en espejos baños: fecha inicial de entrega el **1 de abril de 2024,** pero el Consorcio Claridad solicitó prórroga para el **12 de abril de-2024.**
- Detalles de pintura en: bajantes, marcos de ventanas, bajo placa escaleras, puerta y marcos de ventanas en salones y baños y detalles de fachada: **12 de abril de-2024.**
- Arreglo de soldadura y nivel en canal: **12 de abril de-2024.**
- Limpieza de cubierta bloque baños: **12 de abril de-2024.**
- Reparar daño de los vidrios de las ventanas en bodega de 2° piso y salón Platón: **12 de abril de-2024.**
- Tapones para agujeros de las cajas eléctricas: **12 de abril de-2024.**
- Pintura barandas escaleras: **20 de abril de-2024.**
- Tapar hueco en la escalera para evitar alojamiento de palomas: **20 de abril de-2024.**
- Ajustes cerraduras de las puertas: **20 de abril de-2024.**
- Flanches en fachada externa: **27 de abril de 2024.**
- Interruptor para luminarias de pasillos: **27 de abril de 2024.**
- Adecuaciones OTIC, posterior al acta de entrega: **21 de abril de-2024.**

6. Gimnasio del Campo Juan de La Cruz Varela (IED) - La Unión

Técnico:

- Instalación de toda la nueva estructura metálica: **17 de abril de-2024.**
- Instalación de tejas: **17 de abril de-2024.**
- Instalación de pisos en bloques de salones y emisoras: **23 de abril de-2024.**
- Resane y pintura de zonas intervenidas: **23 de abril de-2024.**
- Intervención de edificio docente.
- Intervención eléctrica: **30 de abril de 2024.**
- Terminación de manejo de aguas a lo largo del colegio: **30 de abril de 2024.**
- Observaciones de la entrega baños: **25 de abril de-2024.**

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de zonas verdes (acopio de material pétreo, acopio de RCD's, jardines de los pasillos) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo.

7. Campestre Jaime Garzon (IED) - Auras

Técnico:

- Entrega total: **23 de abril de-2024.**
- Instalación de la teja: **11 de abril de-2024.**
- Instalación de red eléctrica: **23 de abril de-2024.**
- Manejo de aguas por nuevas cubiertas: **17 de abril de-2024.**
- Resane y pintura de zonas intervenidas: **23 de abril de-2024.**

SST y ambiental:

- Limpieza de las zonas donde se encuentra RCDs.

8. Vivienda docente - Campamento

Técnico:

- Instalación de estructura metálica: **23 de abril de-2024.**
- Instalación de teja **30 de abril de 2024.**
- Envío de documentación faltante de diseño de la estructura metálica: **14 de marzo de-2024.**

9. DILE

Técnico:

- Entrega total: **16 de abril de-2024.**
- Instalación de piso podotacktil: **15 de abril de-2024.**
- limpieza del pozo séptico: **15 de abril de-2024.**

Aunado a lo anterior y conforme al informe de presunto incumplimiento, en el cual se tenía un atraso del 17% de acuerdo con el informe al informe semanal 23, a la fecha evidenciamos que el atraso aumento al 19% con corte al domingo 21 de abril de 2024.

Así las cosas, le requerimos al contratista de obra presentar el plan de contingencia, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción de esta comunicación.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: N.A.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

25/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-103-2024

Señores

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **NO CONFORMIDADES INCUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B**

Respetado ingeniero Jiménez,

De acuerdo con el seguimiento permanente que realiza la interventoría a la ejecución de las actividades contractuales por parte del contratista de obra CONSORCIO CLARIDAD, en la inspección realizada el 25 de abril del presente año, en las instalaciones del colegio IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B, se tienen las siguientes observaciones del componente de Seguridad y Salud en el trabajo.

Se encuentra personal realizando actividades de alto riesgo como lo son de trabajo en alturas, encontrándose a una altura de aproximadamente 4,5 metros, de acuerdo con lo que se indicó se está incumpliendo con la normatividad legal vigente para labores en alturas, por las siguientes razones:

1. El personal no cuenta con exámenes médicos con énfasis en alturas Anexo 1.
2. Actualmente está interventoría desconoce si el personal es idóneo para realizar labores en alturas, al momento de presentar los documentos no anexaron certificado de formación y entrenamiento para labores en alturas, de este personal de cuerdo con el decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y normatividad legal vigente Resolución 4272 de 2021, para el desarrollo de trabajo en alturas.
3. El personal no cuenta con elementos de protección contra caídas ni elementos de protección personal de acuerdo con la actividad realizada entre ellos el casco de seguridad con barbuquejo.

4. No se encontró permisos de trabajo firmados por el inspector SST o coordinador de trabajo en alturas.
5. El andamio multidireccional, no cuenta con las piezas diagonales que hacen que aporte estabilidad y seguridad.

A continuación, se anexa el registro fotográfico de las observaciones anteriormente expuestas.

1. Evidencia exámenes médicos presentados por el contratista


SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 15-feb.-2024 HORA 07:26:53
EMPRESA Cristian Pava Hernandez Nit.1.024.536.127-6
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Michael Esty Garcia Pinto
Edad 24 años 6 meses 2 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1024601987
Cargo OFICIAL

APTO PARA LABORES ASIGNADAS

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Uso de protección auditiva.

Optometria
Vision Lejana: Emétrope cumple con las condiciones visuales para el cargo, no requiere corrección visual. Control optométrico anual.
Vision Cercana: Emétrope cumple con las condiciones visuales para el cargo, no requiere corrección visual. Control optométrico anual.

Otras Recomendaciones: 1. Practicar ejercicio físico en forma habitual (Mínimo tres veces a la semana)
2. Incluir y hacer seguimiento en los sistemas de vigilancia implementados en la empresa de acuerdo con la exposición laboral.
3. Capacitar en higiene postural y permitir la realización de recesos saludables durante 10 a 15 minutos cada 4 horas durante la jornada laboral o según programa de la empresa.
4. Uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) durante jornada de trabajo según exposición y actividad laboral.
5. Este concepto no tiene alcance para aptitud en trabajo en alturas.
MÉDICO: Normal OSTEOMUSCULAR: Normal
Remisión a EPS: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS


SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 3-feb.-2024 HORA 09:44:34
EMPRESA Cristian Pava Hernandez Nit.1.024.536.127-6
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: David Carrillo Quiñones
Edad 34 años 11 meses 19 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1005854583
Cargo AYUDANTE

APTO PARA LABORES ASIGNADAS

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Uso de protección auditiva.

Optometria
Vision Lejana: Emétrope cumple con las condiciones visuales para el cargo, no requiere corrección visual. Control optométrico anual.
Vision Cercana: Emétrope cumple con las condiciones visuales para el cargo, no requiere corrección visual. Control optométrico anual.

Otras Recomendaciones: 1. Practicar ejercicio físico en forma habitual (Mínimo tres veces a la semana)
2. Incluir y hacer seguimiento en los sistemas de vigilancia implementados en la empresa de acuerdo con la exposición laboral.
3. Capacitar en higiene postural y permitir la realización de recesos saludables durante 10 a 15 minutos cada 4 horas durante la jornada laboral o según programa de la empresa.
4. Uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) durante jornada de trabajo según exposición y actividad laboral.
5. Este concepto no tiene alcance para aptitud en trabajo en alturas.
MÉDICO: Normal OSTEOMUSCULAR: Normal
Remisión a EPS: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS


SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 3-feb.-2024 HORA 09:41:35
EMPRESA Cristian Pava Hernandez Nit.1.024.536.127-6
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Luis Einer Pava Hernandez
Edad 34 años 4 meses 1 dia
Documento de Identificación: CC Número: 1024495430
Cargo OFICIAL

APTO PARA LABORES ASIGNADAS

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Uso de protección auditiva.

Optometria
Vision Lejana: Emétrope cumple con las condiciones visuales para el cargo, no requiere corrección visual. Control optométrico anual.
Vision Cercana: Emétrope cumple con las condiciones visuales para el cargo, no requiere corrección visual. Control optométrico anual.

Otras Recomendaciones: 1. Practicar ejercicio físico en forma habitual (Mínimo tres veces a la semana)
2. Incluir y hacer seguimiento en los sistemas de vigilancia implementados en la empresa de acuerdo con la exposición laboral.
3. Capacitar en higiene postural y permitir la realización de recesos saludables durante 10 a 15 minutos cada 4 horas durante la jornada laboral o según programa de la empresa.
4. Uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) durante jornada de trabajo según exposición y actividad laboral.
5. Este concepto no tiene alcance para aptitud en trabajo en alturas.
MÉDICO: Normal OSTEOMUSCULAR: Normal
Remisión a EPS: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico
Firma
Nombre: JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
RM Res 3508 de 19-07-; Lic.SO:

Trabajador
Firma
Nombre: Luis Einer Pava Hernandez
CC N° 1024495430
Huella


SERVISALUD OCUPACIONAL IPS

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 3-feb.-2024 HORA 09:44:34
EMPRESA Cristian Pava Hernandez Nit.1.024.536.127-6
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: David Carrillo Quiñones
Edad 34 años 11 meses 19 dias
Documento de Identificación: CC Número: 1005854583
Cargo AYUDANTE

APTO PARA LABORES ASIGNADAS

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Audiometria: Su capacidad auditiva es adecuada para la ocupación.
Uso de protección auditiva.

Optometria
Vision Lejana: Emétrope cumple con las condiciones visuales para el cargo, no requiere corrección visual. Control optométrico anual.
Vision Cercana: Emétrope cumple con las condiciones visuales para el cargo, no requiere corrección visual. Control optométrico anual.

Otras Recomendaciones: 1. Practicar ejercicio físico en forma habitual (Mínimo tres veces a la semana)
2. Incluir y hacer seguimiento en los sistemas de vigilancia implementados en la empresa de acuerdo con la exposición laboral.
3. Capacitar en higiene postural y permitir la realización de recesos saludables durante 10 a 15 minutos cada 4 horas durante la jornada laboral o según programa de la empresa.
4. Uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP) durante jornada de trabajo según exposición y actividad laboral.
5. Este concepto no tiene alcance para aptitud en trabajo en alturas.
MÉDICO: Normal OSTEOMUSCULAR: Normal
Remisión a EPS: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico
Firma
Nombre: JOSE GERARDO GUZMAN ROMANO
RM Res 3508 de 19-07-; Lic.SO:

Trabajador
Firma
Nombre: David Carrillo Quiñones
CC N° 1005854583
Huella

GRUPO EMPRESARIAL

25/04/2024
Bogotá D.C.

2. Actividades realizadas sin contar con los permisos necesarios para trabajo en alturas, personal sin elementos de protección contra caídas, ni cascos con barbuquejo, andamio sin contar con todas las medidas de seguridad.



El posible incumplimiento del área de Seguridad y Salud en el trabajo, esta basado en las evidencias reportadas en el presente comunicado, de acuerdo con los lineamientos exigidos por la entidad contratante y la legislación aplicable. Por lo tanto, se conmina al contratista, subsanar cada una de las observaciones de manera inmediata.

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.

CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co y Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

23/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-104-2024

Señores

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No 66-63
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: APROBACIÓN CAMBIO DE TECNICO SST CONTRATISTA DE OBRA CONSORCIO CLARIDAD

Respetado señor Pinzón,

Por medio de la presente se notifica cambio del profesional al cargo Técnico SST, presentada por el contratista de obra CONSORCIO CLARIDAD mediante oficio CONS-CLARIDAD-098-2023, el día 23 de abril del presente año, notificamos que, conforme a los pliegos de condiciones, el profesional que se menciona a continuación cumple con los requisitos exigidos y es aprobada por la interventoría.

Documentos anexos como soporte:
- 1. Cedula de ciudadanía.
- 2. Diploma de grado.
- 3. Licencia de prestación de Servicios de Seguridad y Salud en e trabajo.
- 4. Certificaciones laborales.
- 5. Consulta de antecedentes disciplinarios.

GRUPO EMPRESARIAL

23/04/2024
Bogotá D.C.

Nombre	Identificación	Título profesional	Experiencia general (años mínimos)	Experiencia específica (años mínimos)	Porcentaje de dedicación
LEIDI CONSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ	39583712	Administradora en Salud ocupacional	RESOLUCIÓN 14451 de 30 de noviembre 2017	EXP 1: CONSORCIO EXACTITUD NIT: 901501510-3 Técnico SST: contrato No. C01.PCCNTR.2645877 OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO". FI : 01-08-2020 AL 18-08-2023 GRAN TOTAL: 3 AÑOS	100%

Sin otro particular, nos suscribimos y de antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexo: Hoja de vida LEIDI CONSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

27/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-105-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **OBSERVACIONES DE ASESOR ELÉCTRICO DE INTERVENTORÍA.**

Respetado ingeniero Jiménez,

El pasado 25 de abril de 2024 nuestro asesor eléctrico, el ingeniero Cesar Augusto Bolaño Tafur, realizó recorrido por el colegio (IED) CAMPESTRE JAIME GARZON - SEDE LAS AURAS; de acuerdo con esta inspección, el asesor eléctrico realizó las siguientes observaciones y recomendaciones:

- Se planteó la posibilidad de emplear cable No. 6 para la parcial que llevará energía desde el tablero principal hasta el bloque de administración; solicitamos la justificación para el uso de este tipo de cable.
- Se solicita que se instale protección (totalizador) en los dos tableros que están planeados instalarse.
- Se deberá poner interruptor para la salida que irá hacía el tablero del bloque de administración.
- Justificar el por qué en el tablero de biblioteca no se colocó protección (totalizador).

Aunado a lo anterior, mediante oficio No. SED-US-085-2024 del 5 de abril de 2024, se remitieron las observaciones del área eléctrica de los colegios de Usme, pero aún no se tiene respuesta a estos requerimientos, por ende, solicitamos la respuesta respectiva.

Estaremos atentos a su respuesta y atención a cada uno de los puntos mencionados.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: N.A.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

30/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-106-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No 66-63
Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **APU NO PREVISTO DE COCINA DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE USME - DON BOSCO 2 (CED).**

Respetado señor Pinzón,

Conforme con las prioridades establecidas en la visita de diagnóstico y dada la condición actual del colegio San José De Usme - Don Bosco 2, el cual necesita una cocina y en vista de que la infraestructura existente no permite mayores modificaciones para tener un espacio con las condiciones necesarias, el contratista de obra mediante el comunicado No. CONS-CLARIDAD-098-2023 del 18 de abril de 2024 remite el APU no previsto de la cocina prefabricada.

Se anexan las cotizaciones sobre las cuales el contratista de obra realizó el análisis del no previsto junto con el editable del análisis realizado en hoja de cálculo. Por su parte, esta interventoría anexa una cotización con el fin de complementar el estudio de mercado.

De acuerdo con lo anterior, esta interventoría aprueba el APU presentado y lo remite a la entidad para su respetiva aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.

Anexo: 18-04-2024 - CONS-CLARIDAD-098-2023
1. BCO24-050-CONSORCIO CLARIDAD-PANEL COCINA USME
2. COTIZACION 2. INFAMEC LTDA
3. COTIZACION 3. S2P INGENIERIA SAS
COTI 003589 CB INGENIEROS
NP 002 - PANELES COCINA

CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

27/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-107-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No 66-63
Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 5

Respetado señor Pinzón,

Por medio del presente, me permito remitir el acta parcial de obra No. 5 correspondiente al contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5305904, adjunto al presente documento, remito la siguiente documentación:

- Acta parcial de obra No. 5.
- Memoria de cantidades.
- Acta de autorización.
- Soportes parafiscales.
- RIT.
- RUT.
- Certificación bancaria.
- FURC.
- Resolución Facturas de Venta.
- Prefactura.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Adjuntos: los mencionados
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co y apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

27/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-108-2024

Señores,

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación De Establecimientos Educativos
Av. El Dorado No 66-63
Bogotá D.C.

Referencia: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: ACTA PARCIAL NÚMERO 5 INTERVENTORÍA

Respetado señor Pinzón,

Por medio del presente, me permito remitir el acta parcial de interventoría No.05 correspondiente al contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5305904, adjunto al presente documento, remito la siguiente documentación:

- Acta CB No.05.
- Prefactura.
- Consolidado planillas de CB INGENIEROS.
- FURC
- RIT

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: lo enunciado
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co y apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

GRUPO EMPRESARIAL

29/04/2024
Bogotá D.C.

SED-US-109-2024

Señores,

CONSORCIO CLARIDAD
Ing. Jairo Ernesto Jiménez Pineda
Director de obra
Carrera 80 A No. 25C -19
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.5313332 "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5.

Asunto: **INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

Respetado ingeniero Jiménez,

De acuerdo con las fechas estipuladas con anterioridad referente a la entrega de las actividades pendientes en las SEDES que tenían observaciones en la entrega y las SEDES que se encuentran en ejecución, presentamos los siguientes incumplimientos:

1. Fernando Gonzalez Ochoa

Técnico:

- Ajuste de puertas de baño de preescolar, aula y deposito en patio de preescolar: **14 de abril de-2024,** sin embargo, hay dos puertas que presentan roce con el piso de grano caucho instalado.
- Instalación de enchape en patio de preescolar: desde el acta de entrega parcial fue estipulado el ajuste para el **20 de febrero de 2024**, al no cumplir con el compromiso solicitaron prórroga, la cual fue para el **20 de abril de 2024.**
- Reparación de gotera en el comedor: conforme a la visita realizada al plantel educativo, la gotera persiste en el punto donde fue inicialmente intervenido, por lo tanto, le recordamos que el **4 de mayo de 2024** es la fecha máxima de intervención.
- Sistema de bombeo: el 26 de abril fue realizada la capacitación, sin embargo, no entregaron el manual de mantenimiento y nuevamente solicitaron prórroga para el **8 de mayo de 2024.**
- Bombas eyectoras: puesta en funcionamiento **20 de abril de 2024**.
- Cancha múltiple: aplicación de vulken ss45 en las juntas para el sábado **20 de abril de 2024.**

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de zonas verdes (costado izquierdo de la cancha) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo: **17 de febrero de 2024**
- No se retiraron los residuos del cambio del piso laminado en el aula de danzas.

2. Chuniza

Técnico:

- Ajuste de tapas de cajas de inspección: en reiteradas oportunidades le hemos indicado al constructor sobre el ajuste de varias tapas de las cajas de inspección, en aras que no se conviertan en tropezaderos para la comunidad estudiantil.
- Ajuste de rejillas de cárcamos: si bien es cierto, durante la semana del 15 al 21 de abril de 2024 cambiaron pocas rejillas y aún hay muchas que están fisuradas y rotas, incumpliendo así la fecha establecida con anterioridad, **14 de abril 2024.**
- Ajuste de puerta de almacén debajo de la escalera: el Consorcio Claridad ajustó una hoja de la puerta, sin embargo, la otra hoja de la puerta está rozando con el andén construido.
- Ajuste de listones de sillas y reposición: **16 de marzo de 2024.**
- Reposición de tapa registro detrás del cerramiento contra impacto: **16 de marzo de 2024.**
- Detalles de pintura en canchas y cerramiento contra impacto.
- Ajuste de bordillos.

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de la zona verde y talud que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo: **14 de marzo de 2024.**

3. Diego Montaña Cuellar sede B

Técnico:

Bloque aulas

- Reposición de vidrios rotos: inicialmente habían establecido el **10 de marzo de 2024**, posterior a ello, solicitaron prórroga para el **8 de abril de 2024.**

Bloque administración

- Tapas de las bandejas portacables.
- Instalación de persianas en la luz que se presenta en la viga del segundo piso del bloque administrativo: si bien es cierto, realizaron la actividad pero no dejaron la persiana al borde de la viga en aras de evitar el alojamiento de palomas.
- Cielo raso en baño: **13 de abril de 2024.**

- Pañete externo: el pasado jueves 25 de abril inició esta actividad, sin embargo, fue suspendida pues no cumplían con los requisitos mínimos de trabajo en alturas, así como se les manifestó en el comunicado SED-US-103-2024.

Baños primer piso

- Instalación de persiana en los costados de los baños del primer piso: la instalaron parcialmente el 28 de abril del año en curso y tiene observaciones.

Bloque aulas (4)

- Pisos, enchape, pintura, puertas, persiana en los costados: **14 de abril de 2024.**

Generales

- Aplicación de pintura en las puertas de los salones: **20 de abril de 2024.**
- Malla encima de las canales instaladas: **14 de abril de 2024.**
- Instalación de flanche en la viga superior de las escaleras del costado sur para evitar el posicionamiento de palomas: **14 de abril de 2024.**
- Ajuste de pintura en canal: **14 de abril de 2024.**
- Detalles de pintura en escalera de administración: **14 de abril de 2024.**
- Ajustar detalles de pintura en fachada, salones de bloque administrativo y de bloque de salones: **14 de abril de 2024.**

4. Diego Montaña Cuellar sede A

Técnico:

- Eliminación de abultamiento del piso instalado en las aulas de preescolar: **1 de marzo de 2024.**
- Ajustar pintura en marquesinas entrada a terrazas de preescolar A y preescolar B: **17 de marzo de 2024.**
- Ajustar detalles de pintura en puerta salones de preescolar A y preescolar B: **17 de marzo de 2024.**
- Instalación de gárgolas en terrazas de preescolar A y preescolar B: la fecha establecida en el acta de entrega física era el **10 de marzo de 2024,** sin embargo, el Consorcio Claridad solicitó prórroga para el **14 de abril de 2024.**
- Colocar 2 tapas tanque sanitarios baños niñas y niños, uno en cada uno. Cabe mencionar que estas tapas no estaban cuando se inició la intervención, pero dado que no fue posible hallar las tapas, el Consorcio Claridad hará el cambio de dos sanitarios para el **20 de abril de 2024.**

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de zonas verdes (costado oriental salida bloque preescolar) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo: **16 de marzo de 2024.**

5. Usminia

Técnico:

- Tapa filos en espejos baños: fecha inicial de entrega el **1 de abril de 2024,** pero el Consorcio Claridad solicitó prórroga para el **12 de abril de-2024.**
- Detalles de pintura en: bajantes, marcos de ventanas, bajo placa escaleras, puerta y marcos de ventanas en salones y baños y detalles de fachada: **12 de abril de-2024.**
- Arreglo de soldadura y nivel en canal: **12 de abril de-2024.**
- Limpieza de cubierta bloque baños: **12 de abril de-2024.**
- Reparar daño de los vidrios de las ventanas en bodega de 2° piso y salón Platón: **12 de abril de-2024.**
- Tapones para agujeros de las cajas eléctricas: **12 de abril de-2024.**
- Tapar hueco en la escalera para evitar alojamiento de palomas: **20 de abril de-2024.**
- Ajustes cerraduras de las puertas: **20 de abril de-2024.**
- Flanches en fachada externa: **27 de abril de 2024.**
- Interruptor para luminarias de pasillos: **27 de abril de 2024.**
- Adecuaciones OTIC, posterior al acta de entrega: **21 de abril de-2024.**

6. Gimnasio del Campo Juan de La Cruz Varela (IED) - La Unión

Técnico:

- Instalación de toda la nueva estructura metálica: **17 de abril de-2024.**
- Instalación de tejas: **17 de abril de-2024.**
- Instalación de pisos en bloques de salones y emisoras: **23 de abril de-2024.**
- Resane y pintura de zonas intervenidas: **23 de abril de-2024.**
- Intervención de edificio docente.
- Intervención eléctrica: **30 de abril de 2024.**
- Terminación de manejo de aguas a lo largo del colegio: **30 de abril de 2024.**
- Observaciones de la entrega baños: **25 de abril de-2024.**

SST y ambiental:

- Realizar recuperación de zonas verdes (acopio de material pétreo, acopio de RCD's, jardines de los pasillos) que sufrieron afectaciones por las intervenciones realizadas, se debe recuperar con semilla, abono o tierra negra, estas deben quedar en iguales o mejores condiciones en que se encontró y realizar el seguimiento de recuperación respectivo.

7. Campestre Jaime Garzon (IED) - Auras

Técnico:

- Entrega total: **23 de abril de-2024.**
- Instalación de la teja: **11 de abril de-2024.**
- Instalación de red eléctrica: **23 de abril de-2024.**
- Manejo de aguas por nuevas cubiertas: **17 de abril de-2024.**
- Resane y pintura de zonas intervenidas: **23 de abril de-2024.**

SST y ambiental:

- Limpieza de las zonas donde se encuentra RCDs.

8. Vivienda docente - Campamento

Técnico:

- Instalación de estructura metálica: **23 de abril de-2024.**
- Instalación de teja **30 de abril de 2024.**
- Envío de documentación faltante de diseño de la estructura metálica: **14 de marzo de-2024.**

9. DILE

Técnico:

- Entrega total: **16 de abril de-2024.**
- Instalación de piso podotacktil: **15 de abril de-2024.**
- limpieza del pozo séptico: **15 de abril de-2024.**

Aunado a lo anterior y conforme al informe de presunto incumplimiento, en el cual se tenía un atraso del 17% de acuerdo con el informe al informe semanal 23, a la fecha evidenciamos que el atraso aumento al 20% con corte al domingo 28 de abril de 2024.

Así las cosas, le reiteramos el requerimiento al contratista de obra presentar el plan de contingencia, dado que este debió ser enviado el viernes 26 de abril del año en curso.

Sin otro particular, nos suscribimos y estaremos atentos a su respuesta.

Cordialmente,



ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
CB Ingenieros S.A.S.
Anexos: N.A.
CC: Supervisor contrato interventoría Ferney Jiménez Neira fjimenez@educacionbogota.gov.co
Apoyo a la supervisión Sonia Rodríguez Aparicio srodrigueza@educacionbogota.gov.co

H.2. Recibida

Bogotá D.C., 10 de abril de 2024

CONS-CLARIDAD-092-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Asunto: Respuesta oficio No SED-US-071-2024 presunto incumplimiento

En atención a la comunicación oficial SED-US-071-2024 del 02 de abril del 2024, donde informan de un presunto incumplimiento, es importante efectuar una génesis del proyecto con el fin de dar a conocer el alcance inicial pactado frente a la ejecución real de cada frente de obra y los aspectos técnicos que surgieron, así como también, situaciones de planeación y coordinación en la entrega de sedes educativas y exigencias que están siendo capitalizadas en programación aún cuando no corresponden al objeto contractual.

De acuerdo con lo anterior, se da respuesta en el orden presentado por interventoría:

Frente a la comunicación oficial referida por la interventoría (SED-US-022-2023 de fecha 03 de noviembre de 2023) (ver anexo 1) A esta comunicación oficial se le dio respuesta mediante oficio CONS-CLARIDAD-025-2023, del 07 de noviembre de 2023 (ver anexo 2), donde se informó de las actividades ejecutadas en cada frente de obra.

De acuerdo con la comunicación oficial SED-US-026-2023 DE 15 de noviembre de 2023, (ver anexo 3) es claro que en diferentes colegios no se había iniciado la intervención puesto que no se contaba con propuestas esquematizadas o diseños para ejecución, en consecuencia, para dar inicio a las actividades fue necesario efectuar propuestas sobre la marcha de todas las actividades a ejecutar en cada frente, como se evidencia en los correos enviados tanto a interventoría como a la entidad.

Esquemas de cubiertas diseño de red hidrosanitaria y aguas lluvias del IED USMINIA (ver anexo No. 4)


Gmail CONSORCIO CLARIDAD <consorcioclaridad@gmail.com>

Esquemas cubiertas y redes hidrosanitarias - aguas lluvias

1 mensaje

CONSORCIO CLARIDAD <consorcioclaridad@gmail.com> 16 de noviembre de 2023, 17:21

Para: Ardila Farfan Wesley Jair Fuentes <arquitecto.medellin@cbingenieros.com>, Cristian Barragan <cristian.barragan@cbingenieros.com>, Diana Mayerly Arg?elio Romero <diana.arguello@cbingenieros.com>

Cc: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <sradriguezo@educacionbogota.gov.co>

Cordial saludo envio esquemas solicitados para colegio asignado sede B mencionados en el asunto , quedo atento a cualquier solicitud adicional

Atentamente,

ING CIVIL JAIRO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad
Celular 3112783471

3 adjuntos

I.E.D USMINIA SEDE B - CUBIERTAS 15-11-2023.pdf
1.4 K

PLANO BAÑOS RED HIDRAULICA -IED USMINIA 15-11-2023.pdf
130K

PLANO BAÑOS RED SANITARIA Y RED PLUVIAL -IED USMINIA 15-11-2023.pdf
128K

Imagén No. 1

Manejo de aguas lluvias IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LA UNIÓN (ver Anexo No. 5)


Gmail

Esquema manejo de aguas Colegio La Union

Imagén 2

Propuesta cubierta IED JAIME GARZON sede Auras


Gmail

Presentaciones y propuesta AURAS

ING CIVIL JAIRO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad
Celular 3112783471.

Lo anterior, evidencia que fue necesario efectuar esquemas y diseños de las disciplinas a intervenir, por lo cual, es claro que siempre se estuvo trabajando en pro del proyecto, aunado a lo anterior, los colegios no fueron entregados para intervención en los tiempos solicitados mediante programación entregada, aspectos que generaron traumatismos en la logística diseñada para el proyecto y que serán tratados a fondo en el desarrollo de la justificación en cada institución educativa.

EL oficio SED-US-039-2023, del 15 de diciembre de 2023, (ver anexo 6) se dio respuesta mediante comunicación oficial CONS-CLARIDAD-049-2023, (ver anexo 7) explicando las circunstancias propias de cada frente, las cuales impedían en su momento las intervenciones solicitadas, entre la cuales podemos resaltar que DILE no contaba con permiso de Parques Nacionales, por lo cual era imposible iniciar en ese frente, IED JUAN DE LA CRUZ VARELA sede AURAS, se adelantó en taller gran parte de la estructura de cubierta y Campamento no fue posible ubicar un arriendo en las zonas periféricas del predio, por lo que se estaban evaluando diferentes opciones.


De acuerdo con el oficio SED-US-021-2024 del 27 de enero de 2024, (ver anexo 8) se remitió comunicación oficial CONS-CLARIDAD-067-2023 del 05 de febrero de 2024, (ver anexo 9) donde se entregaron esquemas del I.E.D JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE ERASMO VALENCIA, y sede el TOLDO, para iniciar intervención inmediata en cumplimiento a la programación aprobada; sin embargo, no fue posible que entregará por situaciones ajenas al Consorcio Claridad y que fueron expuestas en el oficio S-2024-77846 del 28/02/2024. En respuesta al radicado E-2024-31371. (ver anexo 10 y 10.1)

De acuerdo a las comunicaciones oficiales relacionadas por la firma interventora CB INGENIEROS, es claro que el Consorcio Claridad siempre ha estado presto a dar solución y respuesta oportuna en busca del cumplimiento del objeto contractual; sin embargo, es importante indicar que con el presunto incumplimiento se está dejando al margen el verdadero origen de los atrasos presentados, puesto que la interventoría no menciona que no ha sido posible entregar frentes de obra al Consorcio Claridad aún cuando se han solicitado mediante comunicaciones oficiales CONS-CLARIDAD-067-2023 del 05 de febrero de 2024 (ver anexo 9)y CONS-CLARIDAD-082-2023 del 12 de marzo de 2024,(ver anexo 11) del cual no se recibió respuesta alguna, lo cual está generando sobrecostos al Consorcio Claridad por acuerdos que toco cancelar con proveedores de diferentes especialidades (estructura, cubierta y obra civil).

En este entendido es inaudito que se genere un presunto incumplimiento en respuesta a una solicitud de apertura frentes de obra para intervenir, por lo cual, se efectuará un análisis de cada Colegio objeto de intervención en el orden informado por interventoría.

IED USMINIA

Para abordar la intervención de este Colegio es necesario partir del alcance inicial, el cual se evidencia en la siguiente acta del 11 de septiembre de 2023.

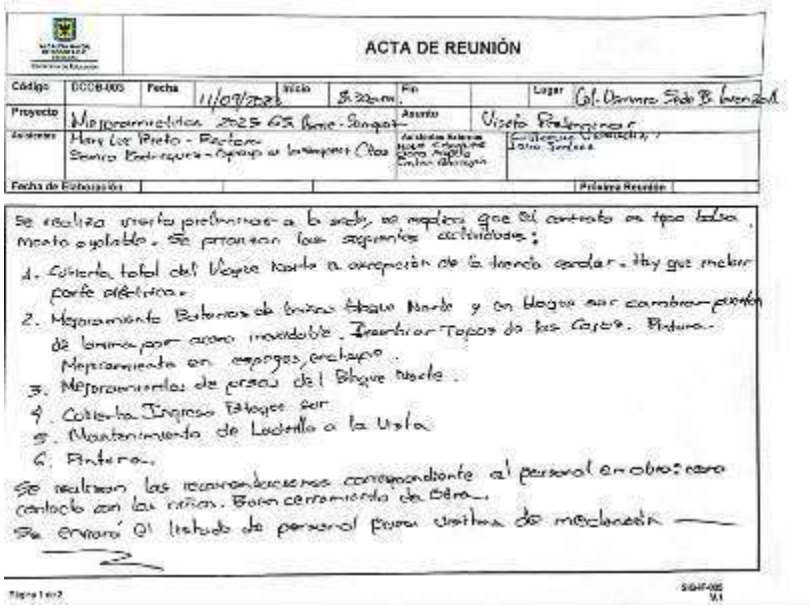

ACTA DE REUNIÓN

Código: DCCB4005 Fecha: 11/09/2023 Inicio: 8:30 a.m. Fin: Lugar: Col. Usminia Sede B Localidad

Proyecto: Mejoramientos 2023 G3 Bmc - Sangat Asunto: Visita Preliminar

Asistentes: Mary Luz Prieto - Rectora. Sandra Rodriguez - Apoyo a Interventoría Obra

Se realiza visita preliminar a la sede se explica que el contrato es tipo bolso monto cerrado. Se proponen las siguientes actividades:

1. Cubierta total del Bloque hasta la excepción de la tienda escolar. Hay que mejorar parte eléctrica.
2. Mejoramiento Baterías de baños Bloque Norte y en Bloque sur cambiar puertas de lámina por algo inoxidable. Enchapar Topes de las Gradas. Pintura. Mejoramiento en espejos, enchape.
3. Mejoramientos de pisos del Bloque Norte.
4. Cubierta Ingreso Bloque sur
5. Mantenimiento de Ladrillo a la Vista
6. Pintura.

Se realizan las recomendaciones correspondiente al personal en obra: cero contacto con los niños. Buen cerramiento de obra.

Se enviará el listado de personal para visitas de seguridad.

Una vez iniciada la intervención en este centro educativo se evidenció que la red de alcantarillado estaba combinada con aguas lluvias, asimismo, se encontró que había solo una caja de 60*60 para recepción de aguas negras y grises, en este entendido, fue necesario diseñar un red de alcantarillado para garantizar un óptimo funcionamiento de la baterías de baños, lo cual conllevo a la demolición de placa de contrapiso y excavaciones y rellenos, lo cual se evidencia en el acta de diagnóstico no se tenía previsto.

Las puertas de las aulas y baños no eran aptas para mantenimiento por cuanto se encontraban en un estado de oxidación que generaba desmoronamiento, por lo cual, fue necesario remplazarlas por puertas nuevas, actividad que no se tenía contemplada.

La adecuación del baño de discapacitados y cambio de distribución baterías de baños, si bien es cierto se tenía proyectado la intervención de batería de baños, la idea inicial era conservar la distribución existente, sin embargo, como fue necesario la instalación de nuevas redes sanitarias y aguas lluvias se modificó su planta arquitectónica con el fin de garantizar espacios más funcionales, lo cual incluía rampas de acceso.

Mantenimiento de ventanería existente, este mantenimiento fue definido las últimas semanas de intervención.


Como se evidencia el alcance inicial fue modificado con el avance y las necesidades de la obra, lo cual generó tiempos adicionales en su intervención por aspectos logísticos y disponibilidad de mano de obra, por lo que si nos enfocamos únicamente en el alcance inicial es claro que todas las actividades ya se encuentran terminadas, a la fecha se están subsanando observaciones menores emitidas por la interventoría.

PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 349.948.209,00
PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA: $ 353.439.722,58
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO A LA FECHA: 101%

Lo anterior, evidencia que se superó el alcance inicialmente proyectado y se ejecutaron actividades adicionales que no estaban contempladas, lo cual altera la operación de la cadena logística del Consorcio Claridad y al ser un aspecto no imputable a nosotros no entendemos el presunto incumplimiento sobre este frente el cual ustedes mismos aceptan que están al 99% de ejecución y su no entrega han sido por hechos no reprochables al contratista si no a hechos externos.

IED FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA

En este frente de obra el alcance esta enfocado en 7 actividades de las cuales dos dependían de la presentación de ítems no previstos, por lo cual no se podían iniciar estas actividades de forma inmediata, las actividades quedaron plasmada en el acta de diagnóstico inicial así:

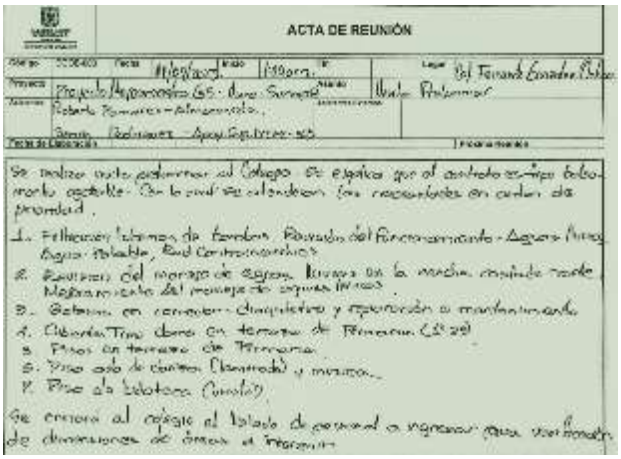
ACTA DE REUNIÓN

De acuerdo con lo anterior, se presentó el NP de bombas el 30 de noviembre mediante comunicación oficial CONS-CLARIDAD-040-2023 del 30 de noviembre de 2023, (ver anexo 12) el cual luego de solicitud de ajustes y reunión en la sede de la Secretaría fue aprobado MEDIANTE RADICADO S-2024-1758 el 24 de enero de 2024, (ver anexo 13) por lo cual, luego de esta fecha se programó la instalación de las bombas sin ningún tipo de contratiempo.

El NP 002 que correspondía a un piso en madera adecuado para una sala de danzas se radicó el 02 de febrero de 2024, mediante comunicación oficial CONS-CLARIDAD-063-2023, (ver anexo 14) luego de efectuar un estudio de mercado del piso más adecuado en una sala de danzas.

Luego de ajustes correspondientes a las cotizaciones, se radicó definitivamente el NP 002 el 15 de febrero de 2024, mediante comunicación oficial CONS-CLARIDAD-074-2023, (ver anexo 15) el cual fue aprobado por interventoría y radicado el 28 de febrero de 2024 mediante comunicación oficial SED-US-048-2024, (ver anexo 16) donde la interventoría también anexa una cotización.

Frente a lo anterior, la entidad emitió respuesta mediante radicado S-2024-118454, el 27 de marzo de 2024 (ver anexo 17) indicando lo siguiente *…(Se informa que el área de estudios previos de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos educativos* ***señala NO APROBAR*** *este ítem y solicita adelantar un estudio de conveniencia económica (relación beneficio/costo) explorando otras alternativas para garantizar que la actividad este enmarcada dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratado).*

De igual forma, en reunión llevada a cabo el 14 de marzo de 2024, en instalaciones de la Secretaría de Educación, la funcionaria de apoyo a la supervisión da una alternativa de piso en madera Garapa; sin embargo, al efectuar el estudio de mercado este piso no se encuentra disponible y se demora 80 (ver anexo 17.1) días hábiles en llegar a Bogotá desde el sur de Bolívar y el proceso de secado tarda 40 días más por lo cual no es viable y se encontraría fuera de los tiempos contractuales.


En reunión llevada a cabo apenas el 01 de abril de 2024, en instalaciones de la interventoría CB INGENIEROS, se definió que el piso que se utilizaría era laminado tráfico 5, el cual se encuentra contractual en el ítem 7.1.15 PISO SPC DE 4 MM TRAFICO COMERCIAL PARA TARIMA Y CAMERINOS AUDITORIO.

Por tal razón, una vez definido el piso, la instalación se efectuará en la semana comprendida entre el 8 y el 14 de abril de 2024, de acuerdo con lo anterior y a la trazabilidad descrita en este colegio, no es dable que se endilgue la responsabilidad del atraso por la no instalación del piso al Consorcio Claridad, cuando la definición del piso se dio el 1 de abril de 2024, fecha que lógicamente esta por fuera de la programación y es un hecho evidente que los retrasos han sido por trámites administrativos de la entidad donde hasta un día antes del presente incumplimiento definieron el tipo de piso a instalar, así mismo la sede cuenta con un 92% de avance físico a la fecha del 1 de abril y se han realizado otras actividades las cuales aumentan dicho porcentaje y de acuerdo con los compromisos adquiridos la presente semana se hará la instalación del piso del salón de danzas.

PRESUPUESTO ASIGNADO: $353.157.411,00
PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA: $291.508.655,84
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO: 82,54%

DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B

La intervención Planteada en visita preliminar para este colegio estaba enfocada en cambio de cubierta de los bloques 1, 2 y aulas del primer piso y mantenimiento estructura metálica del bloque No. 1 y cambio de estructura en los demás, lo cual quedó plasmado en el acta de visita inicial (ver imagen) Anexo No. 8

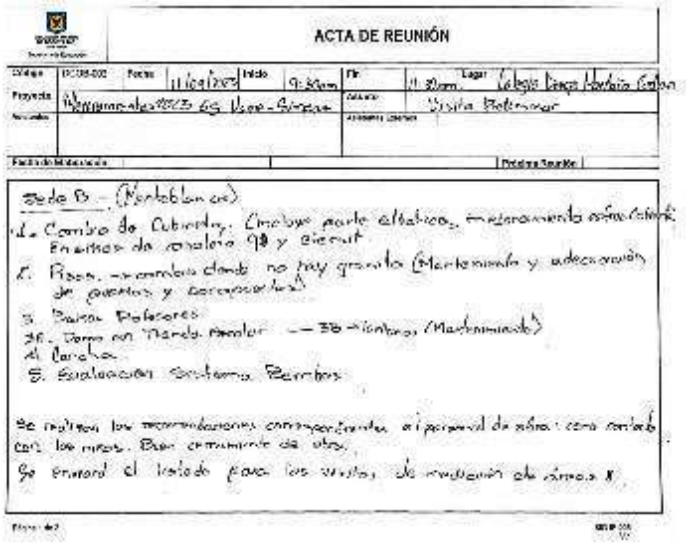

ACTA DE REUNIÓN

Sede B - (Montebianco)
1. Cambio de Cubierta: Cambiar parte eléctrica, mantenimiento estructural
En ambos de canaleta 90 y circuit
2. Pisos. - cambio donde no hay granito (Mantenimiento y adecuación de puertas y correspondiente)
3. Bancos Profesores
4. Techo en Madera Machiembrado — 3B = techos (Machiembrado)
el Techos
5. Evaluación Sistema Eléctrico

Se realizan las recomendaciones correspondientes al personal de obra: como contacto con los niños. Buen comportamiento de obra.
Se entrega el listado para los visitas de inspección de obras X

Como se evidencia en el acta de diagnóstico inicial se tenía únicamente proyectado el mantenimiento y adecuación de la estructura de cubierta a dos aguas del bloque 1 de 326 m2, y el cambio total de los otros bloques; sin embargo, por manejo de aguas lluvias no era posible descargar a la vía pública, toda vez no hay red de aguas grises, por tal motivo, fue necesario dejar la cubierta a una sola agua, para recoger el agua lluvia mediante canal y descargarlo por bajantes en la parte interna del Colegio, situación que conllevo a la demolición de una mampostería que se encontraba como soporte de la cubierta existente, todos estos aspectos técnicos que generaron obras adicionales y alteraron la programación son de pleno conocimiento de la entidad e interventoría puesto que las decisiones técnicas para ejecutar obra o efectuar modificaciones se consultaban para la correspondiente aprobación y no son actividades imputables al contratista si no imprevistos en sitio que se identificaron e informaron por parte del Consorcio.

Aunado a lo anterior, el cambio de cubierta de dos aguas a un agua aumento la captación pluvial de la cubierta, por lo cual, ya no se podía entregar directamente a las zonas duras del colegio, siendo necesario efectuar un manejo de aguas mediante tubería tipo flauta con el fin de entregar el agua a cárcamos y cajas existentes y evitar filtración de aguas que cusen sedimentación y lavado de finos.

Por otro lado, una vez se inició la intervención en las aulas se identificó que los muros de mampostería son dobles y carecen de un sistema estructural aporticado, situación que modificó la intervención inicialmente planteada, siendo necesario utilizar perfiles verticales que garanticen la estabilidad de la estructura y la teja, aunado a lo anterior, cuando se estaba llevando a cabo la intervención descrita los pisos se levantaron observando una placa fracturada sin refuerzo, siendo necesario demoler pisos, sobrepisos y placa para hacer un mejoramiento de terreno y fundir una nueva placa con los correspondientes acabados, lo cual corresponde a actividades que no estaban previstas en el alcance inicial.

Como se evidencia el alcance inicial se modificó notoriamente por aspectos técnicos propios de la intervención y no previstos al inicio del contrato, y los cuales no era posible avizorar con una simple inspección visual y que son de vital importancia para el funcionamiento óptimo de estos espacios educativos y en cumplimiento a la normatividad vigente y que es una obligación como Consorcio entregarlo en óptimas condiciones y funcional para las actividades escolares que se desarrollarán en la sede.

Por otro lado, las observaciones presentadas en el oficio de presunto incumplimiento están totalmente desactualizadas, así mismo, no mencionan que muchas de las observaciones correspondían a actividades no previstas en el presupuesto inicial, situación que descontextualiza el estado actual de la obra agudizado por demoras de interventoría para definir aspectos técnicos, lo cual también ha perjudicado de forma notable el avance. En este sentido, en el comunicado CB Ingenieros menciona todas las actividades adicionales que ha sido necesario realizar para garantizar obras de calidad, sin embargo, es preocupante que se atribuya todo al Consorcio Claridad.


Dado lo anterior, es claro que el presupuesto asignado inicialmente para este Colegio ya fue superado, por lo cual, no es claro cuál es el porcentaje de atraso presentado por interventoría, puesto que financieramente ya se superó el 100% de inversión, por lo cual, para el Consorcio Claridad no

es claro bajo que parámetros está midiendo la interventoría el atraso, si no hay definido un nuevo presupuesto sobre el cual se realice una programación para realizar el correspondiente seguimiento.

Programado: $ 542.722.842,00
Ejecutado a la fecha: $ 756.491.621,22
Porcentaje ejecutado a la fecha: 139,4%

IED CHUNIZA

Durante la visita de diagnóstico se estableció efectuar la intervención de las zonas duras, cancha, media cancha y zonzas pasivas, las cuales tenían adoquín y presentaban diferentes fallos por sedimentación, lavado de finos y empozamientos por manejo de aguas lluvias inadecuado, como queda evidenciado en la siguiente acta de visita:

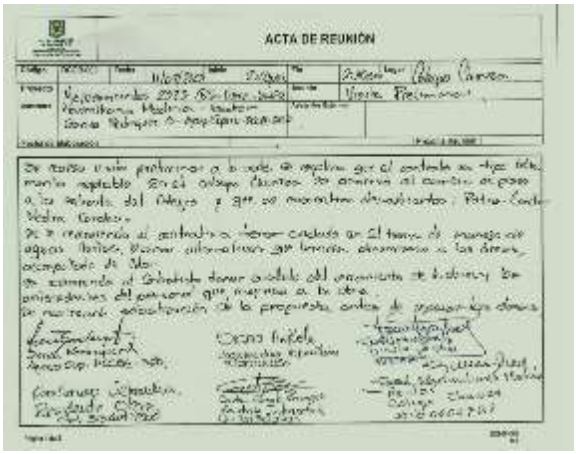
ACTA DE REUNIÓN

La intervención de este Colegio ya se culminó quedan pendientes ajustes menores que se realizarán en la semana comprendida entre el 08 al 13 de abril de 2024, en este Colegio se superó el presupuesto asignado por lo que lo previsto inicialmente en el contrato ya se encuentra ejecutado en un 100% y como bien lo sabe la entidad y la interventoría las actividades no previstas no son imputables al Contratista que como hemos mencionado hemos cumplido con estos imprevistos para entregar las sedes funcionales y de la mejor calidad.

Registro fotográfico






PRESUPUESTO ASIGNADO: $ 236.826.369,00
PRESUPUESTO EJECUTADO A LA FECHA: $394.959.109,39
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO A LA FECHA: 166,77%

DILE SUMAPAZ

La intervención de este frente de obra estaba enfocada en limpieza de canales, bajantes y pozo séptico e instalación de pisos podotáctil, de acuerdo con el acta de visita de diagnóstico:

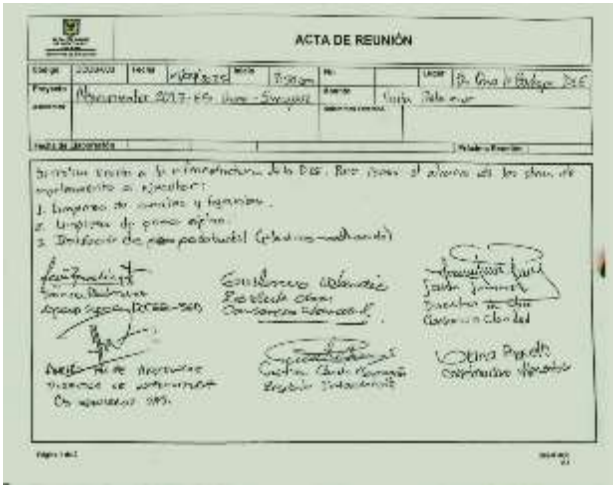
ACTA DE REUNIÓN

Las actividades se iniciaron con la instalación de rampas para accesibilidad al área administrativa de la Dirección Local, se espera culminar actividades el domingo 14 de abril, con la instalación del piso y mantenimiento al pozo séptico.

Registro fotográfico






PRESUPUESTO INICIAL: 15.242.011,00
PRESUPUESTO EJECUTADO: 9.893.281,50
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO A LA FECHA: 65%

DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A

El mantenimiento en este Colegio incluía cambio de pisos de aulas, terrazas, cambio de cubierta traslucida, cambio de puertas y mantenimiento zona parque como se evidencia en la siguiente acta:

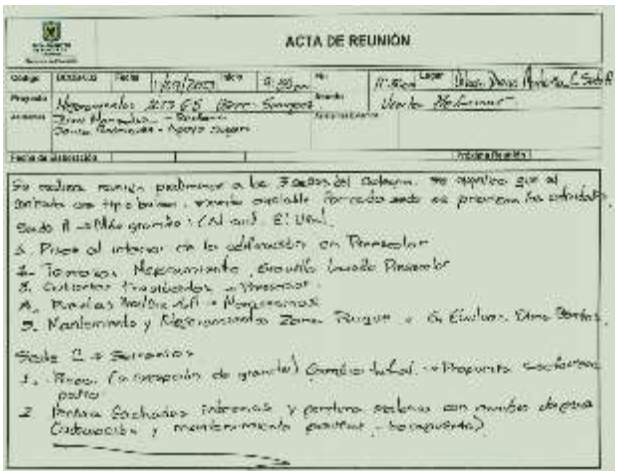
ACTA DE REUNIÓN


Las actividades de este colegio se ejecutaron en su totalidad y al 100%, sin embargo, se están atendiendo observaciones de las cuales muchas no tienen que ver con la intervención realizada, como cambio de tapa de baños, push, ajuste de puertas y persianas en aluminios, etc y otras que ya se ejecutaron, por lo cual, el listado de observaciones no corresponde a la fecha del oficio sino a la entrega realizada al colegio.

PROGRAMADO: 253.419.631,00
EJECUTADO: 136.847.110,46
PORCENTAJE FINANCIERO EJECUTADO: 100% este colegio ya se entregó a la fecha del presente oficio

De acuerdo con prioridades evidenciadas, el alcance fue reducido, toda vez que con lo invertido se satisficieron todas las necesidades priorizadas de infraestructura del Colegio.

IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LA UNIÓN

De acuerdo con el acta de visita diagnóstico se tenía proyectado cambio de cubierta, manejo de aguas lluvias, baterías de baños, vivienda docente y cocina, entre otras como se evidencia en el acta de diagnóstico:

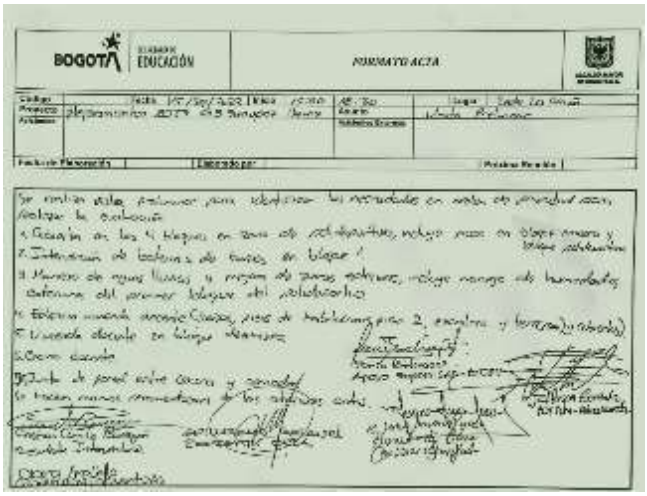

Las actividades en este Colegio iniciaron el 15 de noviembre, sin embargo, se tuvieron los trabajadores en la Unión sin poder ingresar a las instalaciones, por motivo de clausuras y actividades administrativas propias del colegio que no corresponde a actuaciones del contratista y están fuera de nuestra órbita contractual, frente a las obras en este Colegio no es posible que la interventoría desestime el avance a la fecha con todas **las dificultades técnicas del proyecto aunado a que las directivas del colegio no habilitan espacios para la intervención**, por lo cual, es necesario efectuar una descripción detallada de las actividades ejecutadas toda vez que hay aspectos endógenos y exógenos que han afectado la ejecución en este Centro Educativo. Así mismo la imposibilidad de que habiliten espacios para la intervención por parte de las directivas del colegio no es imputable a nosotros como contratistas ya que en diferentes espacios hemos manifestado esta problemática la cual no solo retrasa la ejecución en sede sino nos genera gastos administrativos que hemos tenido que asumir sin que se hayan realizado gestiones efectivas por parte de los responsables de esta situación, generando cada día mayores gastos administrativos teniendo en cuenta la lejanía del proyecto, su difícil acceso y todos los pormenores que hemos manifestado respecto a esta sede y las demás donde las directivas han impedido un avance efectivo de las obras.

ASPECTOS TÉCNICOS

En la intervención de las baterías de baños se encontró una tubería en gres totalmente tapada, razón por la cual, la batería de niñas estaba fuera de servicio, este aspecto genero cambios sustanciales en la intervención, lo cual conllevo a demolición de placas, ubicación de red hidrosanitaria y diseño de una nueva red que incluía el cambio total de la existente, lo cual implicó construcción de cajas y redes externas hasta entregar en un pozo existente, estas actividades no estaban presupuestadas por lo cual, no se entiende como la interventoría atribuye estos tiempos al Consorcio Claridad cuando fueron actividades que no se encontraban en el proyecto contratado inicialmente.

En el manejo de aguas lluvias se han encontrado diferentes fallos causados por sedimentación y lavado de finos, por lo cual, ha sido necesario llevar piedra rajon y hacer filtros para conducir el agua a la red de aguas grises, es importante indicar que la interventoría ha estado enterada de todas estas dificultades que se han presentado en obra, sin embargo, no se entiende porque no son mencionadas en su comunicado.

Bloque de emisora, vivienda docente que se encuentra debajo de la garita solo se tenía proyectado el cambio de cubierta y pisos, sin embargo, se encontraron asentamientos diferenciales considerables con fracturas de placas, así mismo, una vez retirada la cubierta, se evidenció que los muros no estaban aporticados y algunos presentaban peligro de colapso, lo anterior genero nuevas obras de cimentación y estructura para confinar la mampostería existente, otro aspecto que se modifico fue la estructura de cubierta puesto que no habían elementos estructurales donde se pudiera apoyar. Claramente los diez días mencionados por la interventoría en actividades no previstas en el presupuesto no corresponden a las actividades mencionadas por la interventoría.


ASPECTOS EXTERNOS

Frente a este factor es el más crítico para el Consorcio Claridad, puesto que no hay ningún plan de contingencia que sirva para mitigar el atraso, toda vez que las directivas del Colegio no habilitan más zonas para la intervención hasta que no se les entregue las que actualmente están en intervención, lo cual no ha sido posible por todas las situaciones de orden técnico presentadas, es claro que esta condicionante en la entrega de espacios no es contractual y está afectando al Consorcio Claridad, puesto que el rendimiento no va cambiar así se aumente el personal o se cuente con todo el material necesario en obra.

Dado lo anterior, en este colegio ningún atraso es atribuible al contratista de obra, puesto que se han intentado intervenir otras zonas con el fin de avanzar paralelamente en las diferentes disciplinas, pero las directivas del colegio no lo han permitido, en este sentido, las limitaciones en la entrega de espacios no permiten avanzar adecuadamente, aún cuando se han habilitado diferentes espacios intervenidos en el manejo de aguas lluvias, lo anterior es de conocimiento de la interventoría y de la supervisión y estamos a la espera que realicen las gestiones pertinentes para que las directivas del colegio dejen de retrasar las actividades.

JAIMER GARZÓN SEDE AURAS

Las actividades priorizadas en visita de diagnóstico en este frente de obra fueron cambio de cubierta, instalaciones eléctricas y pintura.

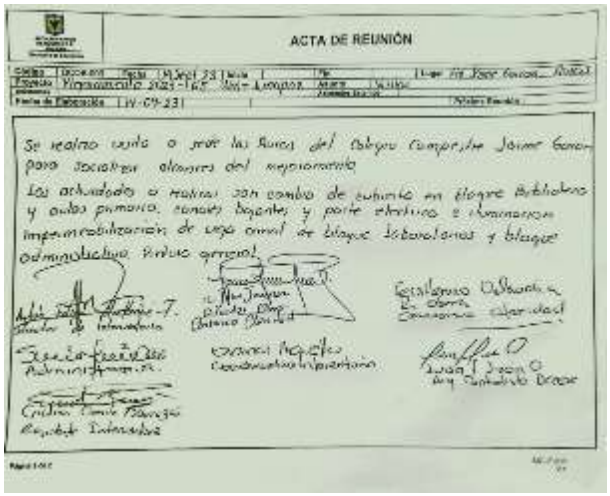
ACTA DE REUNIÓN

Las actividades de obra de este colegio iniciaban el 07 de noviembre de 2024, sin embargo, fueron entregadas hasta el 17 de noviembre de 2023, por motivo de clausuras y actividades culturales del Colegio, la estructura de cubierta se instaló en el tiempo programado, se ha presentado atrasos en la instalación de la teja por fuertes precipitaciones en la zona, toda vez que al ser trabajo en alturas y en cubierta una vez inicia a llover se suspenden actividades, se plantea plan de contingencia para poder culminar las actividades de este Colegio

Cubierta: fecha de entrega domingo 14 de abril de 2024
Instalaciones eléctricas: 22 de abril de 2024
Acabados: 30 de abril de 2024.

Por otro lado, es claro que la intervención del IED AURAS fue condicionada por bloques, lo cual impidió una intervención integral que abarcará todas las actividades requeridas y unificará la cadena logística para su finalización y entrega final.

Frente a este aspecto y con el fin de avanzar se tomó la decisión de instalar la estructura metálica sin retirar teja existente en cada bloque.

IED JAIME GARZÓN SEDE EL RAIZAL

Para la intervención de este Colegio el Consorcio Claridad cuenta con el personal de estructura para iniciar actividades, el Colegio debió ser entregado el 01/03/2024, lo cual se solicitó mediante comunicación oficial CONS-CLARIDAD-082-2023 del 12 de marzo de 2024, (ver anexo 11) sin embargo, no se ha emitido respuesta a la fecha por parte de la interventoría hasta la presente fecha.

El inicio de este Colegio está condicionado a la instalación de unas aulas prefabricadas, en este entendido, es claro que el contratista de obra cuenta con toda la capacidad logística y técnica para recibir las instalaciones, e inmediatamente iniciar actividades. Por otro lado, es claro que la intervención del IED AURAS fue condicionada por bloques, lo cual impidió una intervención integral que abarcará todas las actividades requeridas y unificará la cadena logística para su finalización y entrega final.

En este sentido, no se entiende como calculan un atraso y tasan un incumplimiento al Consorcio Claridad por un Colegio que no ha sido entregado aun cuando se cuenta con toda la logística y talento humano para su intervención, más aún cuando mediante comunicado ya se solicitaron las instalaciones para iniciar actividades y nos imputan aspectos externos que no han sido solucionados ni por la interventoría ni por la entidad.

Los atrasos por no entregas de las instalaciones no pueden ser atribuibles al contratista puesto que no se está obligado a lo imposible, por lo cual, desde el 12 de marzo de 2024, se solicitó la entrega de todos los frentes pendientes, sin que a la fecha se tenga respuesta alguna.

IED SAN JOSÉ

Teniendo en cuenta la visita de diagnóstico se identifico la necesidad de una cocina modular en un espacio disponible ubicado al lado del auditorio, como se evidencia en la siguiente acta:



ACTA DE REUNIÓN

Frente a la ubicación del módulo el Consorcio Claridad entrego propuesta a la a la interventoría con copia a la entidad el 19 de diciembre de 2023 mediante correo electrónico (ver imagen), puesto que se debía definir el diseño antes de iniciar las cotizaciones de todos los componentes implícitos el mismo.



Gmail

CONSORCIO CLARIDAD <consorcioclaridad@gmail.com>

PROPUESTA COCINA IED SAN JOSE USME

8 mensajes

CONSORCIO CLARIDAD <consorcioclaridad@gmail.com> 19 de diciembre de 2023, 16:40
Para: SONIA RODRIGUEZ APARICIO <sirodriguezca@educacionbogota.gov.co>, Diana Mayerly Arguello Romero <diana.arguello@cbingenieros.com>, Cristian Barragan <cristian.barragan@cbingenieros.com>, Andres Felipe Madarriaga Fuentes <andres.madarriaga@cbingenieros.com>

Buenas Tardes
De manera atenta se envía propuesta de la cocina modular para el colegio san jose -usme, para su revisión y aprobación. Quedamos atentos a sus sugerencias u observaciones, de igual forma, se requiere de manera urgente con el fin de iniciar la elaboración de los previstos.

Atentamente,

ING CIVIL. **JAIRO JIMÉNEZ PINEDA**
Director de Obra Consorcio Claridad
Celular 3112783471

PLANO COCINA IED SAN JOSE-USME.pdf
254K

Frente a lo anterior, la entidad dio respuesta con un diseño ajustado el 26 de diciembre de 2023, donde se dio inicio al estudio de mercado con el diseño entregado por la Secretaría de Educación, sin embargo, se cito reunión la cual quedó plasmada mediante acta de comité No. 13 del 05 de febrero de 2024 donde asistieron asesores de la SED, se presentó la cocina como se tenia planteada y cotizada y se efectuaron algunas claridades frente a elementos que no iban a ser adquiridos por el contrato de obra si no por el contrato de dotación, por lo cual, era necesario ajustar cotizaciones, para dar claridad frente al diseños de la cocina se proyecto una visita al Colegio IED Argelia ubicado en la localidad de Bosa, el 12 de febrero de 2024, , allí se definieron los últimos detalles y el mismo día el señor Arq Alejandro Herrera envío el último diseño de la cocina San José.

Es importante tener en cuenta esta trazabilidad, toda vez que como se evidencia no era claro el diseño a implantar, más aún en una disciplina tan especializada como la cocina, la cual tiene unas condiciones de funcionamiento especiales, por ello una vez entregado el diseño, se ajustó el estudio de mercado y se presentó el APU No previsto de la cocina el 17 de febrero de 2024, mediante comunicación oficial CONS-CLARIDAD-075-2023 (ver anexo 18).

Frente a lo anterior, es claro que la demora se debió a que el diseño debía ser aprobado por la Secretaría de Educación, es allí donde la trazabilidad evidenciada genera la intervención en diferentes etapas de los asesores de la entidad.

Es importante aclarar que la interventoría aprobó el NP -003 que correspondía a la cocina, teniendo en cuenta que ellos han sido parte integral de todo ese proceso, así mismo, la supervisión también aprobó y radico el mencionado NP, lo cual indica que el procedimiento de presentación del No previsto se ajustó a los parámetros e indicaciones dadas por la interventoría y entidad.

El 27 de marzo de 2024, la entidad mediante radicado I-2024-33555, (ver anexo 19) responde que no aprueba el NP teniendo en cuenta lo siguiente *…(de acuerdo con la descripción del ítem no previsto, se indica que este contiene actividades contractuales tales como: Marco estructural de piso, piso en placa de concreto de 3000 PSI sobre lamina colaborante, malla electrosoldada, piso en vinilo, puertas, rejillas, entre otras, por tanto, se solicita revisar y ejecutar la actividad conforme a los valores unitarios establecidos contractualmente).* En este sentido, no es posible que se atribuya un atraso al Consorcio Claridad cuando se han seguido todos los lineamientos y directrices emanados por la interventoría y la supervisión, lo cual indica que el procedimiento que se llevo a cabo durante los meses de diciembre enero y febrero no era el adecuado.

Dado lo anterior no es dable que se endilgue la responsabilidad del atraso al Consorcio Claridad, cuando es claro que se han seguido las indicaciones dadas por la interventoría y entidad, por lo cual, si a la fecha el resultado no ha sido el esperado aun con todo el esfuerzo desplegado para la realización del estudio de mercado, es claro que la planeación de esta cocina no fue la apropiada, sin embargo, el consorcio Claridad cuenta con toda la capacidad técnica, administrativa y financiera, para el desarrollo de este proyecto, por ello desde el 27 de marzo de 2024 que la entidad dio respuesta, se inicio un plan de contingencia con el fin de recuperar los tiempos que se han perdido y que de ninguna manera son atribuibles al contratista de obra.

CAMPAMENTO VIVIENDA DOCENTE

Las actividades en este frente se tenían proyectadas para dar inicio el 08 de noviembre de 2023, fecha desde la que se inicio a buscar una casa para arrendar para los trabajadores con el fin de optimizar el rendimiento, situación que fue imposible, por lo cual se solicitó a la Supervisión del Contrato explorar la posibilidad de entregar el predio en su totalidad para la intervención.


ACTA DE REUNIÓN

La intervención de retiro de cubierta dio inicio el 23 de enero de 2024, con actividades de desmonte de cubierta; sin embargo, se evidencio que no había sistema estructural sobre el cual apoyar la estructura metálica, aunado a que son muros en tapia pisada, por lo cual, fue necesario modificar de manera inmediata el plan inicialmente acordado, siendo necesario un nuevo esquema que incluía columnas metálicas de 100*100, con sus correspondientes pedestales, teniendo en cuenta que esta actividad no estaba contemplada en el presupuesto se remitió vía whatsap a la interventoría el 26 de febrero de 2024, con el fin de dar celeridad al proceso de fabricación y no suspender actividades y dado que en la inspección visual no se podía dimensionar la totalidad de la intervención, lo cual queda evidenciado ya que ninguna de las partes advirtió sobre estas actividades no contempladas en el presupuesto inicial.

Posteriormente la interventoría solicita aclaraciones del esquema presentado y solicita mediante oficio SED-US-052-2024 (ver anexo 20) donde solicita que se presentar diseños con viga coronaria, el consorcio Claridad da respuesta mediante comunicación oficial CONS-CLARIDAD-078-2023 del 29 de febrero de 2024, (ver anexo 21) indicando que no era posible presentar un diseño sobre una

viga coronaria teniendo en cuenta que no habían elementos estructurales de apoyo vertical que garanticen el anclaje de la viga a la mampostería y la trasmisión adecuada de esfuerzos mediante columnas a la cimentación

Por otro lado, se propuso a la interventoría entregar diseños o propuesta por parte de ellos o que se solicitará a la entidad, sin embargo, no se recibió respuesta a la solicitud. Dado que el contrato es de mejoramiento y su objeto contractual no tiene previsto diseños.

Mediante comunicación oficial No SED-US-053-2024 del 04 de marzo de 2024, (ver anexo 22) solicitan suspender todas las actividades en campamento en cuanto a instalación de estructura, por lo cual el Consorcio Claridad retiro el personal del frente de obra, sin embargo y en aras de continuar con el proyecto el Consorcio Claridad y con el conocimiento que las exigencias de diseños por parte de la **interventoría estaban extralimitando sus funciones y modificando sin ningún tipo de sustento el alcance del contrato se presentaron diseños mediante comunicación oficial CONS-CLARIDAD-080-2023 el 04 de marzo de 2024** (ver anexo 23).

El 04 de marzo de 2024, mediante comunicación oficial SED-US-058-2024, (ver anexo 24) el contratista hace observaciones y solicitudes las cuales no son contractuales, haciendo exigencias técnicas para expedición de licencias de construcción de acuerdo con la NSR-10, lo cual no solo es un desconocimiento del contrato, sino también con esta exigencia se extralimita el objeto contractual, de igual forma, la interventoría ratifica que no esta autorizada la instalación de la estructura metálica.

Dadas las condiciones y con el ánimo siempre de culminar el proyecto, el Consorcio Claridad mediante comunicación oficial CONS-CLARIDAD-083-2023 del 12 de marzo de 2023, (ver anexo 25) entrega los complementos de los diseños, sin embargo, las solicitudes efectuadas por el contratista corresponden a las exigencias de la NSR-10 para expedición de licencias de construcción de una obra nueva, lo cual se recalca esta fuera del objeto contractual y afecto directamente la programación.

De acuerdo con la dinámica en la cual entro el proyecto por las exigencias de unos diseños que no son contractuales, la interventoría nuevamente observo los diseños mediante comunicación oficial SED-US-065-2024 del 15 de marzo de 2024, (ver anexo 26) por lo cual, ha sido imposible continuar con las actividades de obra en Campamento.

De acuerdo a lo anterior, la interventoría tasa un atraso de 20 días por la no entrega de diseños a tiempo, lo cual no es responsabilidad del Consorcio Claridad, ya que estas actividades se han realizado en pro del proyecto, por lo cual, no se puede descontextualizar lo sucedido en este frente de obra, ya que directamente y como se evidencia en la trazabilidad de oficios la interventoría ha impedido el avance de este frente de obra con exigencias técnicas que están por fuera del acuerdo de voluntades.

Es preocupante que se tasen incumplimientos si apegarse al contrato el cual es ley para las partes ejerciendo presión en la etapa final cuando no hubo una planeación adecuada para este tipo de intervenciones.

Por otro lado, un diseño de este tipo con una dedicación del 100% del estructural atendiendo observaciones se efectúa en 45 días, los cuales no pueden ser atribuibles al contratista, más cuando en las comunicaciones oficiales mencionadas se solicitó suspender de inmediato la programación de este frente, sin obtener respuesta, por lo cual se concluye que está suspendida.

En conclusión, no se puede castigar al contratista de obra con un incumplimiento cuando ha asumido responsabilidades que no le correspondían, más aún cuando en el contrato solo solicitan un asesor estructura que cumpla las siguientes funciones:


➢ *Asesor Estructural: Deberá emitir conceptos, soluciones técnicas y elaborar los detalles constructivos correspondientes con las estructuras para la correcta ejecución de las obras y ante las consultas que se requiera por parte de la SED. Deberá acordar con el profesional asesor de la interventoría las soluciones a las consultas e inconvenientes que se presenten con la estructura de las edificaciones donde se ejecutarán los proyectos.*

En este entendido, es claro que dentro de las funciones del asesor estructural no esta diseñar, por lo cual, no se entiende las exigencias efectuadas por la interventoría, dado lo anterior es claro que el atraso de este frente es atribuible a quien suspendió las actividades, aun cuando el diseño presentado inicialmente nunca fue modificado y se está actuando por fuera de la esfera del contrato que suscribimos.

Programado: $411.446.316,00
Ejecutado: $57.027.168,00
Porcentaje ejecutado: 13,86%

DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C

Para este Colegio el Consorcio Claridad cuenta con toda la logística para su intervención, las actividades de obra de este frente las va a ejecutar el contratista que intervino el IED CHUNIZA, toda vez que la ruta crítica de este frente es urbanismo, también se ejecutarán otras actividades como cambio de acabado de pisos entre otros como se evidencia en el acta de visita diagnóstico.

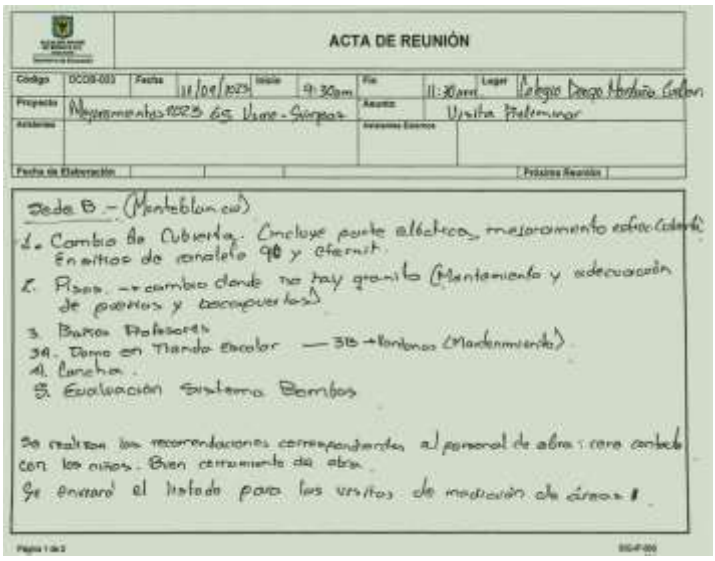

ACTA DE REUNIÓN

Código: DCOB-003 | Fecha: 11/09/2023 | Inicio: 9:30am | Fin: 11:30am | Lugar: Colegio Diego Montaño Cuellar

Proyecto: Mejoramientos 2023 65 Usme - Grupo 2 | Asunto: Visita Preliminar

Asistentes | Asistentes Externos | Fecha de Elaboración | Próxima Reunión

Sede B - (Manteblanco)

1. Cambio de Cubierta. Incluye parte eléctrica, mejoramiento estructural En altos de canaleta 90 y eternit.
2. Pisos. - cambio donde no hay granito (Mantenimiento y adecuación de puertas y cerraduras)
3. Bancos Profesores
3A. Tomo en Tienda Escolar — 38 → Unidades (Mantenimiento)
4. Cancha.
5. Evaluación Sistema Bombas

Se realizan las recomendaciones correspondientes al personal de obra: cero contacto con los niños. Bien cerramiento de obra.

Se entrega el listado para las visitas de medición de áreas.

Frente a la intervención de este colegio y a que el Consorcio cuenta con toda la capacidad técnica, administrativa y financiera para su inicio, se condiciona su entrega a la finalización del IED Diego Cuellar sede B, lo cual desde el funcionamiento de las sedes educativas es entendible, sin embargo, esta condicionante que efectivamente esta generando un atraso no es contractual, por lo cual, se solicita a la interventoría indicar en que aparte del contrato se condiciona la entrega de un Colegio a la terminación del otro.

Dado lo anterior y a todas las actividades imprevistas en el IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B, que han sido omitidas en el oficio de la interventoría, que han generado obras adicionales y mayor ejecución presupuestal, se espera entregar las instalaciones el 15 de abril de 2024, donde quedarán observaciones mínimas por subsanar, con el fin de que se entreguen las instalaciones del IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C.

En atención a que la sede no ha sido entregada por parte de la SED al Consorcio Claridad para su intervención, no es dable que se endilgue un atraso, toda vez que como se indicó, el contratista de obra ya cuenta con toda la operación logística para su intervención y como ya se indico no se esta obligado a lo imposible, es decir si no se entregan las instalaciones no se puede tasar un atraso, por cuenta de factores externos al contratista de obra los cuales son más que claros frente a las imposibilidades técnicas y administrativas que se han puesto para entregar esta sede.

IED LAS MERCEDES

En este frente de obra ya se iniciaron actividades, se plantea plan de contingencia de trabajos los fines de semana con el fin de recuperar el tiempo perdido, se esta haciendo seguimiento minucioso para entregar el colegio de 29 de junio de 2024 como se tenía proyectado.

Las actividades priorizadas en este frente de obra tienen que ver con adecuación de cocina, mejoramiento espacios de comedor, vivienda docente y almacén.


ACTA DE REUNIÓN

Registro fotográfico inicio de actividades





Teniendo en cuenta el alcance de este Colegio, se tiene proyectado que la intervención no exceda los 3 meses, ya se iniciaron actividades de cerramiento y demolición, sin embargo, las directivas del colegio no entregaron todos los espacios objeto de intervención, razón por la cual se informó a la interventoría y supervisión, se esta a la espera de dar solución a esta situación que sin duda alguna limitará el avance de las obras.

Presupuesto visita de diagnóstico: 544.874.131,00
Se iniciaron obras preliminares el 8 de abril de 2024

ASPECTOS GENERALES

Por último, se envió comunicación oficial CONS-CLARIDAD-082-2023 del 12 de marzo de 2024, solicitando la entrega de frenes de obra faltante, (IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE EL TOLDO, TUNAL ALTO Y ERASMO VALENCIA) sin embargo no se ha obtenido respuesta estos colegios tienen el siguiente presupuesto:

COLEGIO	VALOR ASIGNADO
Erasmo valencia	**$799.914.269,00**
Tunal alto	**$599.909.029,00**
El Toldo	**$337.709.778,00**
TOTAL	**$1.737.533.076,00**

Estos Colegios no han sido entregados para la intervención, por razones ajenas al Consorcio Claridad, por lo cual, este presupuesto no puede ser contemplado en las programaciones.

En este sentido, tenemos un presupuesto oficial ($7.608.734.174,00) al cual le restamos el valor total de los tres colegios ($1.737.533.076,00) que no ha sido posible intervenir, quedando un presupuesto ejecutable de $5.871.201.098, lo cual no es atribuible a nosotros como contratistas que firmamos un contrato bajo unas condiciones y un presupuesto con AIU incluido el cual por la no entrega de estas sedes no se está cumpliendo lo pactado. Esto afecta tanto nuestras obligaciones como nuestros derechos como contratistas que hasta la presente fecha no se haya dado la solución definitiva de estos colegios que necesitan una intervención tal y como se pactó y que por terceros como las directivas de los colegios se impida el avance efectivo del contrato afectando el objeto contractual y los deberes que tiene la entidad hacia el Consorcio Claridad.

Teniendo en cuenta el valor total del presupuesto ejecutable y que la ruta crítica que marca el proyecto son diseños de estructura metálica y que los mayores atrasos son relacionados con esta disciplina es pertinente aclarar estos conceptos de acuerdo con la ley 80 de 1993, en su título III DEL CONTRATO ESTATAL, artículo 32, numeral 1 y 2. Que su letra dicen.

1o. Contrato de Obra

Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.

2o. Contrato de consultoría

Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato.

Una vez aclarada la definición de contrato de obra y consultoría y teniendo que el objeto del contrato es *"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".* Se solicita a la interventoría indicar cual es la argumentación enmarcada en el acuerdo de voluntades para exigir diseños, toda vez que los atrasos endilgados al Consorcio Claridad están dados por la no presentación de estudios y diseños de los diferentes frentes de obra en cumplimiento a la NSR-10, aunado a lo anterior están solicitando la presentación de todos los requisitos que únicamente son exigibles para la solicitud de licencia de construcción de obra nueva, situación que se ha agudizado y ha generado el mayor atraso el cual es evidenciado el la obra de vivienda campamento que representa el 7% del valor del contrato que se puede ejecutar. Lo anterior si tenemos en cuenta que nosotros firmamos un contrato donde no se solicitaban diseños si no obras de adecuación, mantenimiento, mejoramiento y no un objeto que incluyera diseños, no existe posibilidad jurídica que nosotros analicemos donde se endilgue un retraso por no presentar unos diseños que en nuestro entendido y con base en la Ley 80 no corresponden a un contrato de obra ni al objeto del actual contrato.

Es claro que los tiempos de diseño no corresponden a este contrato, en tal sentido, no se pueden asumir tiempos que demoran en revisar los profesionales especialistas tanto de interventoría como de obra y lo que conllevan las observaciones de acuerdo con cada criterio, en este sentido, el contrato entro en una dinámica de un contrato de consultoría y no de obra que corresponde únicamente a la ejecución.

Por otro lado, no es claro que procedimiento están utilizando para calcular los atrasos reportados, puesto que en el informe se evidencian colegios que el avance financiero está por encima del físico, en este sentido, lo cual no es posible, asimismo, no indican sobre que valor del contrato se esta calculando el atraso y no hay operaciones aritméticas que permitan dar transparencia y claridad al supuesto incumplimiento.

Se anexa presupuesto ejecutado al 05 de abril de 2025 como anexo 27

2. COMPONENTE AMBIENTAL

De acuerdo con el oficio relacionado con el componente ambiental, a continuación, se describe los respectivos comentarios para cada observación emitida por la interventoría resaltada en color azul y subrayada:

Observación interventoría No 1.

La Interventoría ha notificado al contratista de obra que el cargue mensual en aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) sobre la información correspondiente los RCD que se han producido durante las intervenciones, ha presentado **cantidades diferentes a las pagadas** en las actas parciales de obra; esto fue notificado al contratista de obra mediante Oficio No. 2023 SED-US-036-2024 (ANEXO 24) del 14 de febrero de 2024, allí se mencionaba que:

"(…) la interventoría desea informar que, según la información suministrada por el área técnica y asesora ambiental, **no se han remitido todos los certificados correspondientes a los informes presentados de noviembre y diciembre de 2023**. (…)" A la fecha del presente comunicado, no se ha podido dar claridad con las cantidades reportadas a la SDA versus a las pagadas por esta interventoría.

A la fecha del presente comunicado, **no se ha podido dar claridad** con las cantidades reportadas a la SDA versus a las pagadas por esta interventoría entre noviembre y diciembre de 2023

Respuesta Consorcio Claridad a observación No 01.

De acuerdo con la observación relacionada con la claridad y/o diferencia de cantidades pagadas, el consorcio Claridad manifiesta lo siguiente:

El consorcio claridad mediante oficio **CONS-CLARIDAD-046-2023** presenta a la interventoría, los informes de noviembre y diciembre de 2023 con sus respectivos certificados de disposición final en el formato V del anexo técnico de la resolución 1257 de 2021. Las cantidades de RCD generadas y con certificado de disposición final son de 121.12 ton para noviembre de 2023 y 519.80 para diciembre de 2023.

	2.2 METAS		
NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t)	121,12	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)	-	
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t)	-	
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t)	10,84	9%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor	-	
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t)	110,28	91%
7	Meta total de aprovechamiento : No aplica meta de aprovechamiento por ser pequeños generadores, sin embargo se determina el % de aprovechaminto para el periodo asi : RCD generdo sin tener encuenta excavacion : 121,12 ton x 25% = 30,28 ton	30,28	36%

Imagen No 01. Informe RCD en formato Anexo V de la resolución 1257 de 2021 correspondiente a noviembre de 2023.

	2.2 METAS		
NÚMERO	NOMBRE DEL INDICADOR	TONELADA (t)	PORCENTAJE
1	Cantidad de RCD generado en obra (t)	519,80	100%
2	Cantidad de RCD aprovechado en la obra (t)	-	
3	Cantidad de RCD entregado en punto limpio (t)	-	
4	Cantidad de RCD entregado en planta de aprovechamiento de RCD (t)	87,80	17%
5	Cantidad de RCD gestionado por receptor	-	
6	Cantidad de RCD llevado a sitio de disposición final de RCD (t)	432,00	83%
7	Meta total de aprovechamiento : No aplica meta de aprovechamiento por ser pequeños generadores, sin embargo se determina el % de aprovechaminto para el periodo asi : RCD generdo sin tener encuenta excavacion : 519,80 ton x 25% = ton	129,95	68%

Cordialmente

Imagen No 01. Informe RCD en formato Anexo V de la resolución 1257 de 2021 correspondiente a diciembre de 2023.

1. El informe Ambiental No 04 correspondiente a febrero de 2024 enviado a interventoría mediante oficio CONS-CLARIDAD-072-2023, describe en el numeral 6, las cantidades de RCD entregadas a gestores autorizados con certificados de disposición final para los meses de noviembre y diciembre de 2023. Las cuales coinciden con los informes RCD reportados para los meses de noviembre y diciembre de 2023.

   La interventoría mediante oficio SED-US-078-2024 de fecha 03-04-2024 remite observaciones del informe No 4 ambiental, pero estas no incluyen sus comentarios frente a las cantidades reportadas por el consorcio Claridad, salvo en el oficio SED-US-080-2024, donde declara un incumplimiento por falta de claridad en la información presentada.

2. De acuerdo con las cantidades reportadas, mediante oficio SED-US-080-2024, las cuales se describen en la siguiente imagen:

A continuación, se presenta la relación de las cantidades reportadas versus las cargadas a la SDA.

Tabla 2. Cantidades de RCD.

Mes de informe	Sitio de entrega de RCD	Tipo de residuos	Toneladas de RCD entregado a una planta de aprovechamiento	Toneladas de RCD entregado en sitio de disposición final	Vale	Certificado	RCD generados según interventoría toneladas
Nov	Cemex	1.1	10,84			x	216,38
	Cemex	1.1		10,26		x	
	Cemex	1.3		32,52		x	
	Máquinas amarillas	1.1		45	x	x	
Dic	CBC	1.4	2,248			x	696,85
	Cemex	1.3	21,67			x	
	Cemex	1.1		20,52		x	
	Cemex	1.3		43,36		x	
	Máquinas amarillas	1.1		315	x		

Imagen No 03. Cantidad de RCD reportados por interventoría mediante oficio SED-US-080-2024, para noviembre y diciembre de 2023.


Se evidencia que la interventoría no tiene en cuenta las cantidades reportadas en los informes RCD de noviembre y diciembre de 2023 como se muestra en la siguiente tabla

Periodo	**Cantidad reportada por Consorcio Claridad informe RCD anexo V Oficio** CONS-CLARIDAD-072-2023 **Informe Ambiental No 4**	**Cantidad según interventoría reportada por el contratista descrita en la imagen No 3**	**RCD generado según interventoría**
Noviembre 2023	121.12 ton	98.62	**216.38**
Diciembre 2023	519.80 ton	402.79	**696.85**

Así mismo las diferencias de cantidades podrían tener las siguientes consideraciones

1. Las cantidades que se establecen en los cortes de obra se encuentran en unidades de área o volumen, por lo tanto, se debe asumir un espesor en algunas ocasiones o una densidad para establecer el peso de los RCD generados. La información reportada por el consorcio Claridad está sujeta al reporte del gestor autorizado en el respectivo certificado de disposición, el cual puede tener una densidad diferente a la de la interventoría. Se resalta que a la fecha no se conoce la memoria de cálculo de la interventoría solo el valor total de RCD generados, en el mes.

2. El proyecto ha realizado entregado RCD aprovechable a la comunidad con aprobación de la interventoría y este valor no se ha tenido en cuenta en el consolidado de RCD presentado por el consorcio Claridad.
3. Los valores RCD presentados por la interventoría en el oficio SED-US-080-2024, no permiten la trazabilidad al ítem del corte de obra (demolición, desmonte, excavación) que se tiene en cuenta en el cálculo de los RCD generados, ni las densidades asumidas, ni los RCD entregados a terceros con previa autorización.
4. Para los meses de noviembre y diciembre de 2023 se realizó desmonte de cubierta, pero estos RCD solo se empezaron a disponer en enero de 2024 debido a que se requiere un volumen considerable para el transporte del mismo. En ese orden de ideas los RCD se generaron, pero no se dispusieron en dicho periodo.
5. La interventoría después de revisar las cantidades reportadas en el informe Ambiental No 4 , mediante oficio SED-US-078-2024 recibido el 3 de abril de 2024, tal como se muestra en la imagen No.04, emite lineamientos generales y cualitativos " adecuada", " ilógico" "incompleta", los cual no permite establecer el criterio de evaluación frente a las cantidades de RCD reportadas.

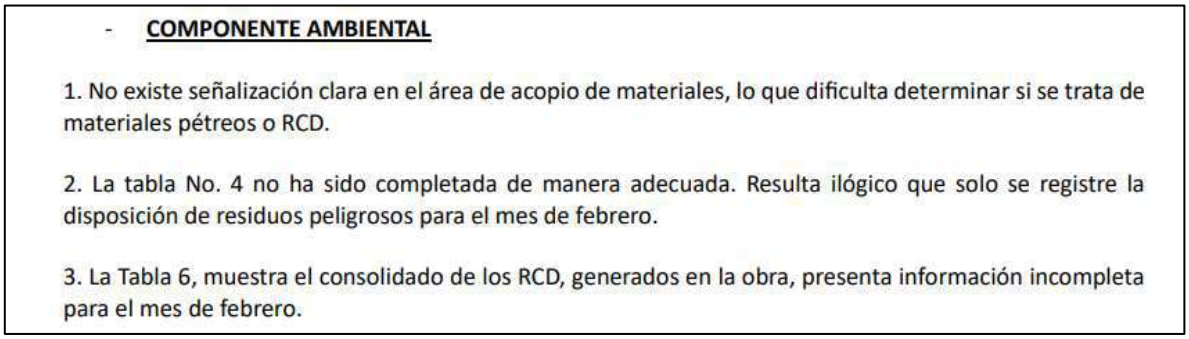

- **COMPONENTE AMBIENTAL**

1. No existe señalización clara en el área de acopio de materiales, lo que dificulta determinar si se trata de materiales pétreos o RCD.

2. La tabla No. 4 no ha sido completada de manera adecuada. Resulta ilógico que solo se registre la disposición de residuos peligrosos para el mes de febrero.

3. La Tabla 6, muestra el consolidado de los RCD, generados en la obra, presenta información incompleta para el mes de febrero.

Imagen No 04 Observaciones de la interventoría al informe Ambiental No. 04 componente ambiental. Oficio SED-US-078-2024

6. La interventoría mediante oficio SED-US-082-2024 enviado el 3 de abril de 2024 a pesar de recibir los informes RCD ambiental mensuales correspondientes a noviembre y diciembre de 2024, nuevamente emite conceptos cualitativos "…. nuevamente se informa que las cantidades que se presentan en las actas parciales no concuerdan", pero no expone un valor con el fin de concretar cuáles de las consideraciones expuestas en este comunicado está afectando las diferencias con la interventoría.

GRUPO EMPRESARIAL

03/04/2024
Bogotá D.C.

5. Al revisar nuevamente los informes RCD, no se encuentran bien diligenciados de acuerdo con lo que se había indicado en mesa de trabajo, posteriormente se había remitido mediante correo SED-US-070-2024 del día 19 de marzo de 2024, la siguiente tabla par el diligenciamiento completo de dichos informes mensuales de RCD. Cabe recordar que esta información es revisada de acuerdo con los certificados que presenta el contratista, sin embargo, nuevamente se informa que las cantidades que se presentan en las actas parciales no concuerdan.

A continuación, se remite la tabla para diligenciar adecuadamente

Mes de informe	RCD entregados a	Tipo de residuos	Toneladas de RCD entregado a una planta de aprovechamiento	Toneladas de RCD entregado en sitio de disposición final	Vale	Certificado	Total RCD generados en el mes
noviembre	Cemex	1.1	10,84			x	98,62
	Cemex	1.1		10,26		x	
	Cemex	1.3		32,52		x	
	Máquinas amarillas	1.1		45	x	x	
diciembre	CBC	1.4	2,248			x	402,798
	Cemex	1.3	21,67			x	
	Cemex	1.1		20,52		x	
	Cemex	1.3		43,36		x	
	Máquinas amarillas	1.1		315	x		
enero	Máquinas amarillas	1.1		45		x	144,55
	Tracol	2.2		2,26		x	
	Tracol	2.2		2,05		x	
	Cemex	1.1		41,04		x	
	Cemex	1.3		54,2		x	

Imagen No 05 Observaciones al informe enero 2024 emitidas por la interventoría mediante oficio SED-US-082-2024

Observación interventoría No 2.

El contratista de obra ha presentado estos informes, pero estos no han tenido el VoBo. por parte de la interventoría y han presentado algunas observaciones:

• En primer lugar, mediante comunicado No. SED-US-030-2024 (ANEXO 25) del 08 de febrero de 2022, le fueron remitidas observaciones al contratista de obra por el informe correspondiente al mes de noviembre - diciembre.

• El 14 de febrero de 2024 mediante comunicado No. SED-US-036-2024 (ANEXO 24), esta interventoría informó que se mantener la discrepancia entre las cantidades reportadas y las pagas, por lo que se solicitó al contratista de obra lo siguiente:

que el área técnica y el área ambiental establezcan una comunicación directa para verificar las cantidades de RCDS y materiales pétreos presentados tanto en los informes ambientales como en los informes de RCD de los meses de noviembre y diciembre de 2023. Se ha observado que las cantidades presentadas no concuerdan con el material retirado y los certificados (…)"

• Ante la falta de una respuesta concreta y acertada a las observaciones anteriores, el 19 de marzo de 2024 mediante oficio No. SED-US-070-2024 (ANEXO 26), esta interventoría remitió un apremio al contratista de obra por el presunto incumplimiento en las obligaciones contractuales en el área ambiental y SST.

Respuesta Consorcio Claridad a observación No 02

Los requerimientos de los oficios No. SED-US-030-2024 y SED-US-036-2024 se presentaron en el informe Ambiental No 04 y en el informe mensual radicado a la SDA mediante oficio CONS-CLARIDAD-089-2023. La interventoría en las cantidades reportadas mediante oficio SED-US-080-2024, no incluye las 5 consideraciones que se describen en los comentarios del consorcio claridad realizados a la observación No 1

Teniendo en cuenta lo anterior, la falta de claridad en las cantidades de RCD generadas en noviembre y diciembre de 2023, obedece a las 5 consideraciones que se describen en este documento, las cuales se deben gestionar durante el desarrollo del contrato y no en la etapa inicial del proyecto como se declara en este incumplimiento.

El Consorcio Claridad ha presentado las cantidades y certificados de disposición para los meses de noviembre y diciembre de 2023 en los informes RCD y se solicita amablemente a la interventoría establecer las cantidades de RCD teniendo en cuenta las 5 consideraciones del presente comunicado e informar al Consorcio Claridad de manera concreta la diferencia en cantidades y peso de RCD no reportados en los respectivos informes, con el fin de establecer las causas que generan las diferencias entre las partes relacionadas con cantidades de RCD pagados y entregados a gestores autorizados.

ver anexos Anexos 27 Y 28 Informes RCD mes de noviembre y diciembre de 2024 con certificados de disposición final a gestores autorizados

3. COMPONENTE SST

Observación interventoría No 3. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SST

"9. Obligaciones administrativas. Cumplir con las obligaciones de afliación y cotzación al sistema de seguridad social Integral (Salud, pensión y riesgos laborales) de todo el personal vinculado a la obra."

De conformidad con el personal mínimo aprobado por esta Interventoría mediante Oficio No. SED-US-007- 2023 (ANEXO 27) de fecha 24 de octubre de 2023, mensualmente se ha solicitado al contratista de obra que en los informes mensuales se presente las planillas de seguridad social que permitan establecer que todo el personal aprobado por esta interventoría cumple y está al día con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral (Salud, pensión y riesgos laborales), pero dicho requerimiento no se ha presentado para los asesores, inspectores y maestros de obra que se aprobaron por esta interventoría.


Le fue solicitada esta información al contratista de obra mediante oficio No. SEDUS-039-2024 (ANEXO 28) del 16 de febrero de 2024, allí se menciona que: x"(…) Las planillas de seguridad que se anexaron están incompletas. (…)" . Ante la falta de respuesta por parte del contratista de obra, esta interventoría mediante comunicado No. SED-US-043-2024 (ANEXO 29) del 21 de febrero de 2024, reiteró la solicitud para que se presentara dicha documentación, pero aún no se ha presentado dicha documentación.

Dichas planillas de seguridad debieron presentarse para el primer informe mensual que se debió entregar el 07 de diciembre de 2023, por lo que se evidencia un atraso de 104 días respecto a la fecha del presente comunicado.

Respuesta Consorcio Claridad a observación No 03

El consorcio Claridad presenta a la interventoría antes del ingreso de cada trabajador a la obra los registros de afiliación a seguridad social con el fin de solicitar aprobación, el personal que ingresa a obra siempre cuenta con afiliaciones a seguridad social, porque de no ser así la interventoría solicita el retiro de dichas personas de obra o no autoriza el ingreso, esta dinámica se ha implementado desde el inicio del proyecto y en los informes semanales remitidos por el Consorcio Claridad, se presenta el listado de personal activo en los proyectos.

Es importante resaltar que de dichos informes semanales a la fecha no se tiene observaciones por parte de interventoría relacionados con registros de afiliación o cobertura de riesgos, por lo tanto, **no es válido** para el consorcio la observación emitida por la interventoría en el oficio SED-US-080-2024. De ser este hecho cierto, se podría deducir que el personal ha laborado en el proyecto sin cobertura del sistema de seguridad social y esto no es cierto ya que el proyecto cuenta con la aprobación de la interventoría de 108 trabajadores aproximadamente.

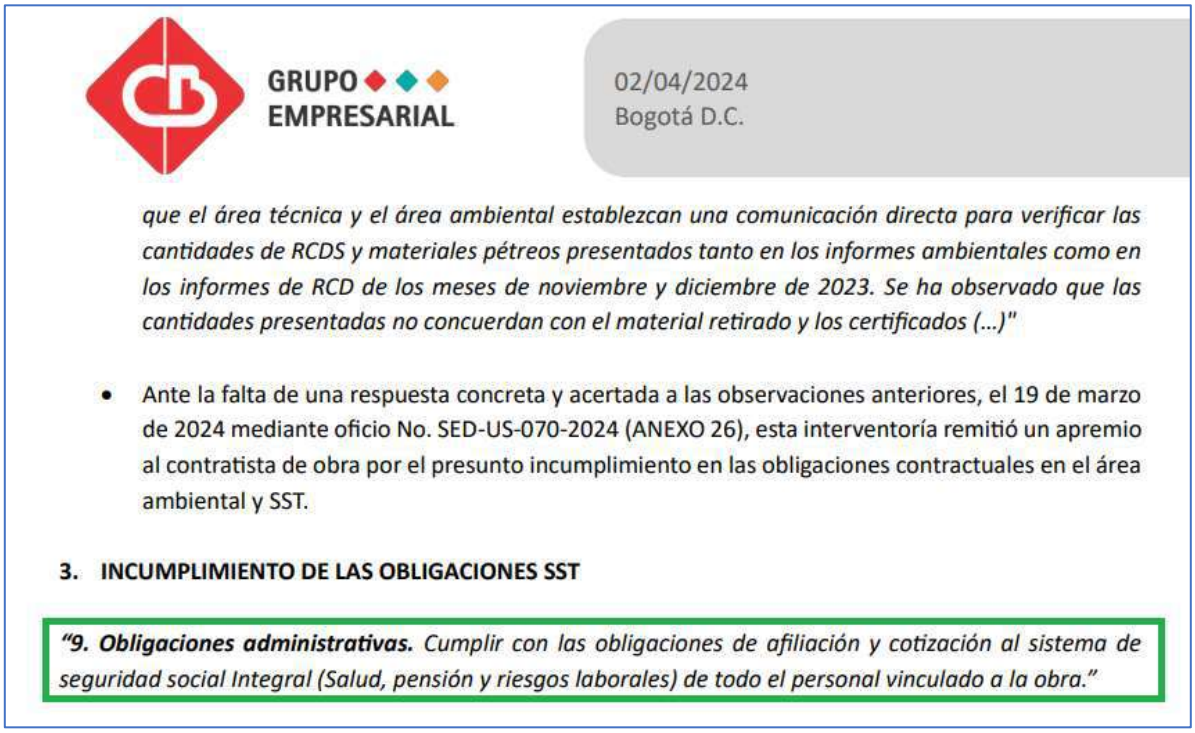

GRUPO EMPRESARIAL

02/04/2024
Bogotá D.C.

que el área técnica y el área ambiental establezcan una comunicación directa para verificar las cantidades de RCDS y materiales pétreos presentados tanto en los informes ambientales como en los informes de RCD de los meses de noviembre y diciembre de 2023. Se ha observado que las cantidades presentadas no concuerdan con el material retirado y los certificados (...)"

- Ante la falta de una respuesta concreta y acertada a las observaciones anteriores, el 19 de marzo de 2024 mediante oficio No. SED-US-070-2024 (ANEXO 26), esta interventoría remitió un apremio al contratista de obra por el presunto incumplimiento en las obligaciones contractuales en el área ambiental y SST.

3. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SST

"9. Obligaciones administrativas. *Cumplir con las obligaciones de afiliación y cotización al sistema de seguridad social Integral (Salud, pensión y riesgos laborales) de todo el personal vinculado a la obra."*

Imagen No 06. Observación incumplimiento SST emitido por interventoría mediante oficio SED-US-080-2024.

En este orden de ideas los trabajadores o personal que ingresa a obra tienen aprobación de interventoría y en consecuencia están afiliados a riesgos laborales, con respecto a los asesores quienes, por su porcentaje de dedicación al proyecto, que no supera el 20%, el tipo de vinculación entre el consorcio y ellos no es laboral, por lo tanto, no se obliga a presentar pago de planillas mensual como evidencia de la asesoría que prestan al proyecto. En consecuencia, no es válido establecer un vínculo al proyecto a través de la presentación de planillas de pago de seguridad social cuando la relación contractual con los asesores no puede ser "laboral" debido a la dedicación de cada profesional según las directrices del contrato.

Ver Anexo 29 Listado de personal aprobado por interventoría.

Finalmente, y dadas las consideraciones anteriores, rectificamos que no hay motivos por parte de la interventoría para solicitar un presunto incumplimiento al Consorcio Claridad teniendo en cuenta que gran cantidad de las observaciones e incumplimientos que señalan corresponden a situaciones ajenas al Consorcio o que no se abarcan en el objeto del contrato firmado con la entidad, han surgido imprevistos tanto externos como la no entrega de sedes por parte de las directivas de los colegios quienes además en algunas sedes no permiten realizar obras al ritmo requerido para un contrato de este tipo.

Así mismo, los imprevistos técnicos que han surgido y que son de conocimiento de todos los actores del contrato han retrasado ciertas actividades de obra, la exigencia de diseños (los cuales jurídicamente no han sido justificados al salirse de la órbita del contrato) que no abarca el contrato también han afectado el avance del mismo, y como se mencionó que en algunas sedes por cuestiones administrativas no se han aceptado algunos NP´S o no se aprueban en los tiempos requeridos, es decir pasa bastante tiempo desde la presentación del NP hasta la aprobación del mismo. Somos conscientes de que estos trámites requieren estudios técnicos minuciosos más sin embargo estos tiempos que todos sabemos retrasan la ejecución del contrato no son culpa en ningún caso del Consorcio. Dicho lo anterior, recalcamos que el Consorcio ha cumplido con sus compromisos contractuales, cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera para ejecutar el contrato y llevarlo a cabalidad en su totalidad por lo que respetuosamente solicitamos no tener en encuentra el presunto incumplimiento que se solicitó por la interventoría, avanzar con el proyecto y realizar las gestiones pertinentes para la entrega de las sedes faltantes y que las directivas de los colegios intervenidos no retrasen la entrega de las mismas y no impidan el avance efectivo de las que se encuentran en ejecución y que han puesto los problemas que mencionamos.

Atentamente,



Ing Civil. CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTÍNEZ
Representante Legal Consorcio Claridad

Anexo:

Bogotá D.C., 10 de abril de 2024

CONS-CLARIDAD-093-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Asunto: cambio hojas de vida personal mínimo requerido inspector de obra civil, asesora sst y asesor ambiental.

En atención a los compromisos del personal profesional del CONSORCIO CLARIDAD, de manera atenta envío hojas de vida de las siguientes personas,

1. **ADRIAN MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ** inspector de obra.
2. **NIDIA YANETH AREVALO ROJAS** asesora SST y asesora ambiental

Lo anterior debido a que los profesionales que estaban aprobados por la interventoría y que se relacionan a continuación no continúan en el proyecto:


1. **MELISSA LEAL BARRIOS** inspectora de obra
2. **MARIA CRISTINA PAEZ RODRIGUEZ** asesora sst y asesora ambiental

Es importante resaltar que el personal propuesto cumple con el perfil solicitado, o en su defecto tienen un perfil superior de acuerdo en el contrato, lo cual garantiza mayor capacidad técnica apoyados en conocimientos adquiridos en la academia. Lo anterior, en cumplimiento al contrato anexo numeral 9.2 nota número 2. por lo anterior, se anexan los siguientes documentos: por lo anterior, se anexan los siguientes documentos:

Hoja de vida
Diploma
Acta de grado
Cedula

Quedamos atentos a su revisión y aprobación.

Atentamente,



IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

consorcioclaridad@gmail.com
Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	PÁGINA 1 de 1
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 14-04-2024

Bogotá D.C., 14 de abril de 2024

CONS-CLARIDAD-094-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Asunto: entrega informe cubierta de almacén y vivienda docente- sede la unión-Sumapaz

la presente tiene como fin realizar la entrega del informe de avaluó y planos estructurales de cubierta almacén y vivienda docente de la I.E.D gimnasio del campo juan de la cruz Varela sede la unión- localidad de Sumapaz

1. Informe avaluó zona de almacén
2. Plano estructural de cubierta zona almacén
3. Informe avaluó zona de vivienda docente
4. Plano estructural de cubierta zona vivienda docente

Agradezco la atención prestada y me suscribo muy atentamente

Atentamente,

IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

consorcioclaridad@gmail.com
Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

Bogotá D.C., 18 de abril de 2024

CONS-CLARIDAD-098-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Asunto: envío NP 02 panel tipo sándwich para cocina

En atención al desarrollo del contrato de la referencia y teniendo en cuenta la intervención proyecta en el IED SAN JOSÉ, de manera atenta se remite NP de panel tipo Sándwich.

RESUMEN APUS NO PREVISTOS			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR UNITARIO
NP-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL METÁLICO TIPO SANDWICH PARA FACHADAS CON POLIURETANO INYECTADO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (40 KG/M3) PUR, ESPESOR 50 MM Y AMBAS CARAS CON LÁMINADE ACERO GALVANIZADA CAL 28 PREPINTADA RAL 9002 CON PROCESO DE FABRICACIÓN CERTIFICADOEN CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. INCLUYE ÚES, PERFILES, BOCELES, SELLAMIENTO, MEDIACAÑA PARA MONTAJE Y RECUBRIMIENTO PLÁSTICO PARA PROTEGER EL MATERIAL EN EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN, EL PANEL DEBE INCLUIR DUCTOS O TUBERÍA PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS A 110 VAC EMBEBIDAS EN EL PANEL SEGÚN DISEÑO.	UNIDAD	$ 552.680,26

I. JUSTIFICACIÓN: En atención a la visita realizada al IED SAN JOSÉ, se evidenció que es imposible adecuar una cocina en las instalaciones existentes, teniendo en cuenta las limitaciones de la infraestructura del sistema constructivo del colegio, lo cual dificulta efectuar modificaciones parciales, en este entendido, se encuentra un espacio aledaño a las instalaciones existentes donde es viable técnicamente adecuar un módulo de cocina con todos los servicios y capacidades para atender la demanda del colegio integrando y aprovechando los espacios de la institución educativa. De igual forma, todos los servicios serán integrados a las instalaciones del colegio, garantizando una optimización de recursos.


En este entendido, se requiere el panel metálico tipo sándwich para fachadas teniendo en cuenta que este ítem no está en el presupuesto contractual, por lo cual, se efectuó un estudio de mercado, orientado a suplir la necesidad de la cocina de acuerdo con las especificaciones técnicas entregadas por la entidad.

MATERIALES.

Los materiales utilizados provienen de un estudio de mercado.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.

Las herramientas y equipos utilizados en la actividad para la estructura del APU es contractual



Atentamente,

IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

consorcioclaridad@gmail.com
Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. / BOGOTÁ	**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**	CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	**Código:** **Versión: 0** **Fecha: 20/10/2023** **Página: 1 de 1**

A. DATOS GENERALES			
FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AA)	**2/02/2024**		
CONTRATO No.	**C01.PCCNTR.5305904**		
OBJETO	**"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. - GRUPO 5"**		
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA		**ITEMS NO PREVISTOS**	**NP°003**

B. DATOS ESPECIFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO
NP-002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL METÁLICO TIPO SANDWICH PARA FACHADAS CON POLIURETANO INYECTADO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (40 KG/M3) PUR, ESPESOR 50 MM Y AMBAS CARAS CON LÁMINADE ACERO GALVANIZADA CAL 28 PREPINTADA RAL 9002 CON PROCESO DE FABRICACIÓN CERTIFICADOEN CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. INCLUYE ÚES, PERFILES, BOCELES, SELLAMIENTO, MEDIACAÑA PARA MONTAJE Y RECUBRIMIENTO PLÁSTICO PARA PROTEGER EL MATERIAL EN EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN, EL PANEL DEBE INCLUIR DUCTOS O TUBERÍA PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS A 110 VAC EMBEBIDAS EN EL PANEL SEGÚN DISEÑO.	**M2**	**552.680,26**

1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNIT	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		$ 1.051,56	0,50	$ 525,78
PULIDORA	h	3701,5	0,50	$ 1.850,74
TALADRO INHALÁMBRICO	h	4395,5	0,50	$ 2.197,75
				SUB-TOTAL $ 4.574,27

2. MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL METÁLICO TIPO SANDWICH PARA FACHADAS CON POLIURETANO INYECTADO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (40 KG/M3) PUR, ESPESOR 50 MM Y AMBAS CARAS CON LÁMINADE ACERO GALVANIZADA CAL 28 PREPINTADA RAL 9002 CON PROCESO DE FABRICACIÓN CERTIFICADOEN CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. INCLUYE ÚES, PERFILES, BOCELES, SELLAMIENTO, MEDIACAÑA PARA MONTAJE Y RECUBRIMIENTO PLÁSTICO PARA PROTEGER EL MATERIAL EN EL TRANSPORTE E INSTALACIÓN, EL PANEL DEBE INCLUIR DUCTOS O TUBERÍA PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS A 110 VAC EMBEBIDAS EN EL PANEL SEGÚN DISEÑO.	GLB	$ 432.119,94	1,00	$ 432.120,00
				$ -
				SUBTOTAL $ 432.120,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	TARIFA	REND/UNIDAD	VR.UNITARIO
		$ -		$ -
				SUB-TOTAL $ -

4. MANO DE OBRA

CUADRILLA	UNIDAD	H/C	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO
	H	$ -		$ -
				SUB-TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO			**$ 436.694,27**
AIU	26,56%		**$ 115.986,00**
		TOTAL	**$ 552.680,26**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

1. JUSTIFICACIÓN: En atención a la visita realizada al IED SAN JOSÉ, se evidenció que es imposible adecuar una cocina en las instalaciones existentes, teniendo en cuenta las limitaciones de la infraestructura del sistema constructivo del colegio, lo cual dificulta efectuar modificaciones parciales, en este entendido, se encuentra un espacio aledaño a las instalaciones existentes donde es viable técnicamente adecuar un módulo de cocina con todos los servicios y capacidades para atender la demanda del colegio integrando y aprovechando los espacios de la institución educativa. De igual forma, todos los servicios serán integrados a las instalaciones del colegio, garantizando una optimización de recursos.

En este entendido, se requiere el panel metálico tipo sandwich para fachadas teniendo en cuenta que este ítem no está en el presupuesto contractual, por lo cual, se efectuó un estudio de mercado, orientado a suplir la necesidad de la cocina de acuerdo a las especificaciones técnicas entregadas por la entidad.

CONTRATISTA		**APROBACIÓN INTERVENTORÍA**	
Firma		Firma	
Nombre	ING. CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTINEZ	Nombre	MIGUEL ANGEL SALGADO PACHECO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado		Representante Legal del Contratista o su Apoderado	
Nombre de la Empresa	CONSORCIO CLARIDAD	Nombre de la Empresa	CB INGENIEROS S.A.S.
NIT ó Cédula	901745447-4	NIT ó Cédula	860509943-7

APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Firma	
Nombre	

NOTAS

La información para ítem no previsto debe ser certificada por los responsables de estructurar y aprobar los APU, teniendo en cuenta que:

a) Se verifique que no tenga equivalencia técnica con ninguno de lo ítems o actividades contractuales.
b) Para estructurar los APU se debe tener en cuenta en primera instancia los insumos contractuales.
c) La descripción del ítem debe contener la especificación particular y/o norma técnica que lo regula.
d) El Contratista de obra deberá entregar a la Interventoría y/o Supervisión todos los documentos que soporten el análisis de precios unitarios.
e) Se debe indicar en el espacio "Observaciones de la Interventoría o Supervisor" la fecha en la cual se evidenció la necesidad de la actividad no prevista.
f) En los anexos o soportes de cotizaciones debe ser visible la vigencia en la cual se expidió dicha cotización.

consorcioclaridad@gmail.com
Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	PÁGINA 1 de 1
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 23-03-2024

Bogotá D.C., 23 de abril de 2024

CONS-CLARIDAD-098-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

REFERENCIA: ***CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".***

Asunto: Cambio de hojas de vida personal mínimo requerido inspectores SST.

En atención a los compromisos del personal profesional del CONSORCIO CLARIDAD, de manera atenta envío hoja de vida de la siguiente persona,

1. **LEIDI CONSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ**


Se anexan los siguientes documentos:

- **Hoja de vida**
- **Cedula**
- **Diploma**
- **Licencia**
- **Certificados laborales según lo solicitado en el pliego de condiciones**

quien a la fecha iniciara labores con el consorcio claridad y se desempeñara como inspectora SST en el proyecto, esto debido a que la señora **JOHANNA KATHERINE MARTINEZ VARELA** que estaba aprobada por la interventoría decidió no continuar en el proyecto.

Atentamente,

,



IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

consorcioclaridad@gmail.com
Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

consorcioclaridad@gmail.com
Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	PÁGINA 1 de 1
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 23-03-2024

Bogotá D.C., 23 de abril de 2024

CONS-CLARIDAD-098-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

REFERENCIA: ***CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".***

Asunto: Cambio de hojas de vida personal mínimo requerido inspectores SST.

En atención a los compromisos del personal profesional del CONSORCIO CLARIDAD, de manera atenta envío hoja de vida de la siguiente persona,

1. **LEIDI CONSTANZA BEJARANO RODRIGUEZ**


Se anexan los siguientes documentos:

- **Hoja de vida**
- **Cedula**
- **Diploma**
- **Licencia**
- **Certificados laborales según lo solicitado en el pliego de condiciones**

quien a la fecha iniciara labores con el consorcio claridad y se desempeñara como inspectora SST en el proyecto, esto debido a que la señora **JOHANNA KATHERINE MARTINEZ VARELA** que estaba aprobada por la interventoría decidió no continuar en el proyecto.

Atentamente,

,



IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

consorcioclaridad@gmail.com
Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

consorcioclaridad@gmail.com
Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

Bogotá D.C., 15 de abril de 2024

CONS-CLARIDAD-095-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".


Asunto: respuesta oficio colegio IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA, actividades pendientes

EN atención al desarrollo del contrato de la referencia y teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Colegio, de manera ateta se emite respuesta de cada uno de los ítems así:

Ítem No.1.

Sala danzas. - Para la sala de danzas la actividad se realizó, los día10 y 11 de abril de 2024. Junto con la instalación de guarda escoba en madera.

La actividad se ejecutó de acuerdo con las especificaciones solicitadas en ítem 7.1.15 PISO SPC DE 4 MM TRAFICO COMERCIAL PARA TARIMA Y CAMERINOS AUDITORIO. Debidamente autorizado por la interventoría y supervisión del contrato en comité técnico de obra el día 1 de abril de 2024.

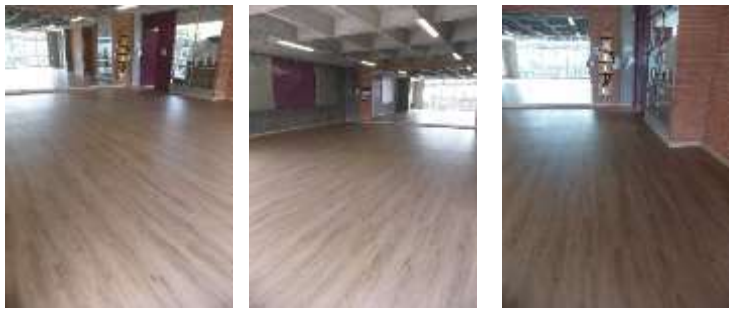

Piso sala danzas instalado

itemNo.2.

Cubierta 3 nivel edificio comedor.

-Con relación al evento presentado por goteras en el área de comedor se realizaron reparaciones el día xxxxx por parte de personal especializado en cubiertas, donde de acuerdo con el diagnóstico inicial emitido por el estado general de la cubierta termo acústica tipo sándwich de Hunter duglas, compuesta por capa intermedia de fibra de 4 cm, bandeja inferior en lamina cal 22 a tope y bandeja superior en cal 20, grafada por presión con sistema de ajuste mecánico. Se evidenció que por deterioro generado por el paso del tiempo la capa de fibra de 4 cm se auto compacto generando un vacío de 2 cm entre la bandeja inferior y la bandeja superior, ocasionando filtraciones en juntas de las bandejas compuestas, evitando así la posibilidad de transitar con seguridad sobre la superficie de la cubierta, teniendo en cuenta genera el desgrafado de las bandejas, ya que simplemente es un acople mecánico que al transitar sobre las bandejas se suelta la bandeja superior generando vacíos internos y separaciones, lo cual originan filtraciones o goteras.

Frente a esta situación el especialista en cubiertas realizó ajuste en la totalidad de la cubierta del comedor, adicionando un ajuste con tornillos autoperforante en el trayecto del empate junto con sellado con Sika Flex, para los sectores con mayor goteo se instaló cinta multi seal de alta adherencia.

Sin embargo, es claro que el desgaste de la fibra de vidrio genera problemas por desgrafado de la lámina inferior y superior, por lo tanto, no puede ser transitada, toda vez que esta actividad es la causa principal de las goteras y filtraciones.

Con fin de dar solución los problemas de filtración reportados, se efectuará nueva revisión y reparación menor de cubierta con fin de identificar las áreas afectadas y solucionar nuevamente las filtraciones presentadas, una vez realizada está nueva reparación y teniendo como referencia el estado de desgaste actual de la cubierta, el Consorcio Claridad no se compromete con nuevas reapariciones, dejando como recomendación principal que la cubierta no puede ser transitada.



itemNo.3.

Piso patio Preescolar. – piso en grano de goma con base de 3 cm en grano llanta reciclada, por condición de sus características la altura de terminación más o menos de 4 cm, ocasiono interferencia en dos puertas para las áreas de ingreso en baterías de baños.
Es necesario realizar el juste respectivo en las puertas para que su apertura se realice de

manera apropiada, la actividad se realizará el día 20 de abril para realizar la reparación integral para así subsanar el evento.



itemNo.4.
Sala Ludoteca. - piso en Mipolan, rematado en guarda escoba en madera, la instalación del guarda escoba se realizó el día 11 de abril de 2024, en la totalidad del área de la sala – ludoteca.



itemNo.5.

Cuarto de Bombas. - mantenimiento y reparación de los equipos de bombeo para agua potable, aguas lluvias, sistema de bombas eyectoras para pozo de recolección de aguas lluvias, equipo de red contra incendio.

Frente a esta intervención manifestamos:

- Equipo de bombeo agua potable, en el mantenimiento de este equipo se realizaron las siguientes actividades;
    a. Cambio de redes de suministro de tanque a sistema distribución.
    b. Cambio de flauta de distribución de tubería galvanizada a tubería PVC presión RD 21.
    c. Cambio de accesorios en flautas como registro de control y cheques de paso.
    d. Cambio de T de 3” donde se encuentra las cebadoras del equipo de la red de incendio, junto con el cambio del registro de control de 1”

e. Elaboración del baipás de conexión del sistema de bombeo de agua potable al sistema de bombeo de aguas lluvias para alimentación de la red de distribución para sanitarios en baterías de baños.
f. Tableros de control de equipo de bombeo agua potable se automatizó de tal forma que las bombas trabajen de forma alterna, se realizaron cambios de cableado y reorganización de interruptores termomagnéticos pilotos y de encendido.

- Equipo de bombeo aguas lluvias, para el mantenimiento de este equipo se realizaron las siguientes actividades;
-
    a. Cambio de las dos bombas externas de 1 ½" por dos electrobombas sumergible de 3".
    b. Cambio tanque hidroacumulador.
    c. Cambio redes de suministro de tubería galvanizada a tubería en PVC presión RD-21.
    d. Cambio de flauta de distribución de tubería galvanizada a tubería PVC presión RD 21.
    e. Cambio de accesorios en flautas como registro de control y cheques de paso.
    f. Cambio de registro cortina de 3" para la red de distribución a sanitarios en baterías de baños.
    g. Tableros de control de equipo de bombe agua potable se automatizó de tal forma que las bombas trabajen de forma alterna, se realizaron cambios de cableado y reorganización de interruptores termomagnéticos pilotos y de encendido con el sistema automatizado.
- Equipo red de incendio, para el mantenimiento de este equipo, se realizaron las siguientes actividades:

    a. Desmonte de bombas.
    b. Cambio de rodamientos
    c. Cambio de empaquetaduras
    d. Cambio de sellos
    e. Cambio en redes eléctricas de control
    f. Limpieza y cambio accesorios
    g. Mantenimiento soporteria.
    h. Para bomba joker, cambio de sello en motor, por condición comercial de esta bomba fue necesario importar los sellos ya que no se consiguen en el comercio.
    i. Mantenimiento de redes de succión y autocebado del sistema.

  Nota hasta el sábado 20 de abril se instalarán los sellos de la bomba jokey, ya que el día viernes son entregados por el proveedor.

- Para el sistema de bombas eyectoras, se realizaron las siguientes actividades:

    a. Desmonte bombas, las cuales se encontraban completamente colapsadas y una de ellas no funcional

b. Fue necesario mandar a reparación una de ellas. La otra es necesario cambiarla en su totalidad, el sábado 20 de abril será montado el sistema, para su correcto funcionamiento.
c. El tablero eléctrico ya se le realizo el mantenimiento y rearmado para su automatización.







- **itemNo.5.**
-
- Cancha múltiple, para el sábado 20 de abril de 2024, se desplazará personal para realizar una segunda aplicación de vulken ss45 en las juntas.

Atentamente,

IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

consorcioclaridad@gmail.com
Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	PÁGINA 1 de 1
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 15-04-2024

Bogotá D.C., 15 de abril de 2024

CONS-CLARIDAD-096-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Asunto: informe mensual No. 5

1. Informe técnico
2. Acta de comité
3. Bitácoras
4. Certificado de calidad

Atentamente,

IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

Bogotá D.C., 17 de abril de 2024

CONS-CLARIDAD-097-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".


Asunto: respuesta oficio colegio IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA, actividades pendientes

EN atención al desarrollo del contrato de la referencia y teniendo en cuenta las observaciones presentadas por el Colegio, de manera ateta se emite respuesta de cada uno de los ítems así:

Ítem No.1.

Sala danzas. - Para la sala de danzas la actividad se realizó, los día10 y 11 de abril de 2024. Junto con la instalación de guarda escoba en madera.

La actividad se ejecutó de acuerdo con las especificaciones solicitadas en ítem 7.1.15 PISO SPC DE 4 MM TRAFICO COMERCIAL PARA TARIMA Y CAMERINOS AUDITORIO. Debidamente autorizado por la interventoría y supervisión del contrato en comité técnico de obra el día 1 de abril de 2024.

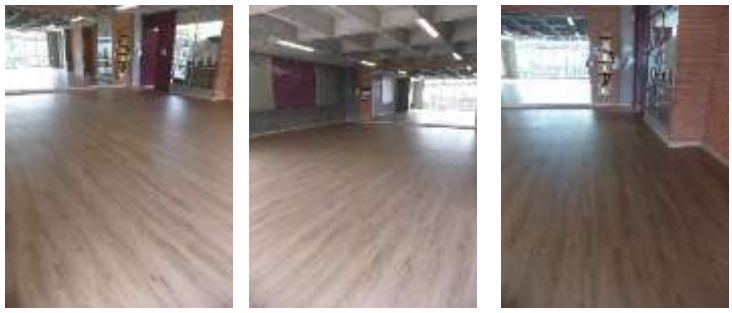

Piso sala danzas instalado

itemNo.2.

Cubierta 3 nivel edificio comedor.

-Con relación al evento presentado por goteras en el área de comedor se realizaron reparaciones por parte de personal especializado en cubiertas, donde de acuerdo con el diagnóstico inicial emitido por el estado general de la cubierta termo acústica tipo sándwich de Hunter duglas, compuesta por capa intermedia de fibra de 4 cm, bandeja inferior en lamina cal 22 a tope y bandeja superior en cal 20, grafada por presión con sistema de ajuste mecánico. Se evidenció que por deterioro generado por el paso del tiempo la capa de fibra de 4 cm se auto compacto generando un vacío de 2 cm entre la bandeja inferior y la bandeja superior, ocasionando filtraciones en juntas de las bandejas compuestas, evitando así la posibilidad de transitar con seguridad sobre la superficie de la cubierta, teniendo en cuenta genera el desgrafado de las bandejas, ya que simplemente es un acople mecánico que al transitar sobre las bandejas se suelta la bandeja superior generando vacíos internos y separaciones, lo cual originan filtraciones o goteras.

Frente a esta situación el especialista en cubiertas realizó ajuste en la totalidad de la cubierta del comedor, adicionando un ajuste con tornillos autoperforante en el trayecto del empate junto con sellado con Sika Flex, para los sectores con mayor goteo se instaló cinta multi seal de alta adherencia.

Sin embargo, es claro que el desgaste de la fibra de vidrio genera problemas por desgrafado de la lámina inferior y superior, por lo tanto, no puede ser transitada, toda vez que esta actividad es la causa principal de las goteras y filtraciones.

Con fin de dar solución los problemas de filtración reportados, se efectuará nueva revisión y reparación menor de cubierta el 04 de mayo de 2024, con fin de identificar las áreas afectadas y solucionar nuevamente las filtraciones presentadas, una vez realizada está nueva reparación y teniendo como referencia el estado de desgaste actual de la cubierta, el Consorcio Claridad no se compromete con nuevas reapariciones, dejando como recomendación principal que la cubierta no puede ser transitada.



itemNo.3.

Piso patio Preescolar. – piso en grano de goma con base de 3 cm en grano llanta reciclada, por condición de sus características la altura de terminación más o menos de 4 cm, ocasiono interferencia en dos puertas para las áreas de ingreso en baterías de baños.
Es necesario realizar el juste respectivo en las puertas para que su apertura se realice de

manera apropiada, la actividad se realizará el día 20 de abril para realizar la reparación integral para así subsanar el evento.



itemNo.4.
Sala Ludoteca. - piso en Mipolan, rematado en guarda escoba en madera, la instalación del guarda escoba se realizó el día 11 de abril de 2024, en la totalidad del área de la sala – ludoteca.



itemNo.5.

Cuarto de Bombas. - mantenimiento y reparación de los equipos de bombeo para agua potable, aguas lluvias, sistema de bombas eyectoras para pozo de recolección de aguas lluvias, equipo de red contra incendio.

Frente a esta intervención manifestamos:

- Equipo de bombeo agua potable, en el mantenimiento de este equipo se realizaron las siguientes actividades;
    a. Cambio de redes de suministro de tanque a sistema distribución.
    b. Cambio de flauta de distribución de tubería galvanizada a tubería PVC presión RD 21.
    c. Cambio de accesorios en flautas como registro de control y cheques de paso.
    d. Cambio de T de 3” donde se encuentra las cebadoras del equipo de la red de incendio, junto con el cambio del registro de control de 1”

e. Elaboración del baipás de conexión del sistema de bombeo de agua potable al sistema de bombeo de aguas lluvias para alimentación de la red de distribución para sanitarios en baterías de baños.
f. Tableros de control de equipo de bombeo agua potable se automatizó de tal forma que las bombas trabajen de forma alterna, se realizaron cambios de cableado y reorganización de interruptores termomagnéticos pilotos y de encendido.

- Equipo de bombeo aguas lluvias, para el mantenimiento de este equipo se realizaron las siguientes actividades;
-

a. Cambio de las dos bombas externas de 1 ½" por dos electrobombas sumergible de 3".
b. Cambio tanque hidroacumulador.
c. Cambio redes de suministro de tubería galvanizada a tubería en PVC presión RD-21.
d. Cambio de flauta de distribución de tubería galvanizada a tubería PVC presión RD 21.
e. Cambio de accesorios en flautas como registro de control y cheques de paso.
f. Cambio de registro cortina de 3" para la red de distribución a sanitarios en baterías de baños.
g. Tableros de control de equipo de bombe agua potable se automatizó de tal forma que las bombas trabajen de forma alterna, se realizaron cambios de cableado y reorganización de interruptores termomagnéticos pilotos y de encendido con el sistema automatizado.

- Equipo red de incendio, para el mantenimiento de este equipo, se realizaron las siguientes actividades:

a. Desmonte de bombas.
b. Cambio de rodamientos
c. Cambio de empaquetaduras
d. Cambio de sellos
e. Cambio en redes eléctricas de control
f. Limpieza y cambio accesorios
g. Mantenimiento soporteria.
h. Para bomba joker, cambio de sello en motor, por condición comercial de esta bomba fue necesario importar los sellos ya que no se consiguen en el comercio.
i. Mantenimiento de redes de succión y autocebado del sistema.

Nota hasta el sábado 20 de abril se instalarán los sellos de la bomba jokey, ya que el día viernes son entregados por el proveedor.

- Para el sistema de bombas eyectoras, se realizaron las siguientes actividades:

a. Desmonte bombas, las cuales se encontraban completamente colapsadas y una de ellas no funcional

b. Fue necesario mandar a reparación una de ellas. La otra es necesario cambiarla en su totalidad, el sábado 20 de abril será montado el sistema, para su correcto funcionamiento.
c. El tablero eléctrico ya se le realizo el mantenimiento y rearmado para su automatización.







La capacitación del manejo de equipos hidroneumáticos se efectuará el 26 de abril a las 11:00am, así mismo, se harpa entrega del manual de mantenimiento, con las observaciones referidas en este documento.

- **itemNo.5.**

- Cancha múltiple, para el sábado 20 de abril de 2024, se desplazará personal para realizar una segunda aplicación de vulken ss45 en las juntas.

Atentamente,

IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

consorcioclaridad@gmail.com
Carrera 80 A No. 25C -19 Barrio Modelia Bogotá
Teléfono 3099941

CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	PÁGINA 1 de 1
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 26-04-2024

Bogotá D.C., 26 de abril de 2024

CONS-CLARIDAD-098-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.comCalle 98
22-64 Oficina 507

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA ENLOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Asunto: entrega acta parcial No. 5

En atención al desarrollo del contrato de la referencia, de manera atenta envío acta parcial de acuerdo al avance del presente corte, de igual forma, se anexan los siguientes documentos:

1. Acta parcial y memorias de cantidades
2. Parafiscales
3. RIT
4. RUT
5. Certificación bancaria
6. FURC
7. Resolución de facturación
8. Factura proforma

Quedo atentos a cualquier solicitud adicional

Atentamente,

IC. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

Anexo: documentos relacionados

CONSORCIO CLARIDAD NIT 901.745.447-4	CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904	PÁGINA 1 de 1
	COMUNICACIONES OFICIALES	FECHA: 23-03-2024

Bogotá D.C., 29 de abril de 2024

CONS-CLARIDAD-101-2023

Señores
CB INGENIEROS S.A.S.
ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES
Director de Interventoría
andres.mackenzie@cbingenieros.com
Calle 98 # 22-64 Oficina 507

REFERENCIA: ***CONTRATO DE OBRA No. CO1. PCCNTR 5305904 cuyo objeto es "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓNDEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".***

Asunto: solicitud prórroga contrato de obra por 64 días calendario

En atención al desarrollo del contrato de la referencia, y teniendo en cuenta que a la fecha no han sido entregados 3 colegios para su intervención por razones ajenas al Consorcio Claridad, de manera atenta se solicita la prórroga mencionada en el asunto, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:


1. Mediante comunicación oficial CONS-CLARIDAD-067-2023 del 05 de febrero de 2024 se solicitó la entrega del IED JUAN de la CRUZ VARELA sede el Toldo, teniendo en cuenta que no había sido posible la entrega de la sede ERASMO VALENCIA, es de anotar que la solicitud en comento fue escalada ante la Secretaría de Educación mediante radicado E-2024-31371, sin embargo, la respuesta emitida por la SED mediante radicado S-2024-77846 del 28/02/2024, indica que la solicitud fue elevada al rector del Colegio, indicándole que no era posible intervenir las sedes de forma lineal, por la afectación presupuestal que tendría el proyecto.

   De acuerdo con lo anterior, el rector del Colegio manifiesta que, por decisión del Consejo Directivo en pleno, no se autoriza la intervención de más espacios hasta que se entregarán los frentes activos.

   En este entendido, la no entrega de las sedes del Colegio Juan de la Cruz Varela Sedes Erasmo Valencia y el Toldo, genera un atraso no atribuible al Consorcio Claridad, puesto que como se indicó en la comunicación oficial CONS-CLARIDAD-067-2023 del 05 de febrero de 2024, se contaba con el personal y la cadena logística para intervenirlos y cumplir con la programación entregada.

Así mismo, es importante aclarar que se solicitarán los mismos tiempos que estaban planteados en las programaciones iniciales entregadas a la interventoría, por lo cual, se presentará la programación inicial del contrato por colegio y la propuesta de prórroga, toda vez que se requiere garantizar la culminación del contrato sin afectar las condiciones iniciales aprobadas.


PROGRAMACIÓN INICIAL CON FLUJO DE INVERSIÓN DE LA SEDE ERASMO VALENCIA (VALOR 799.914.265,97)

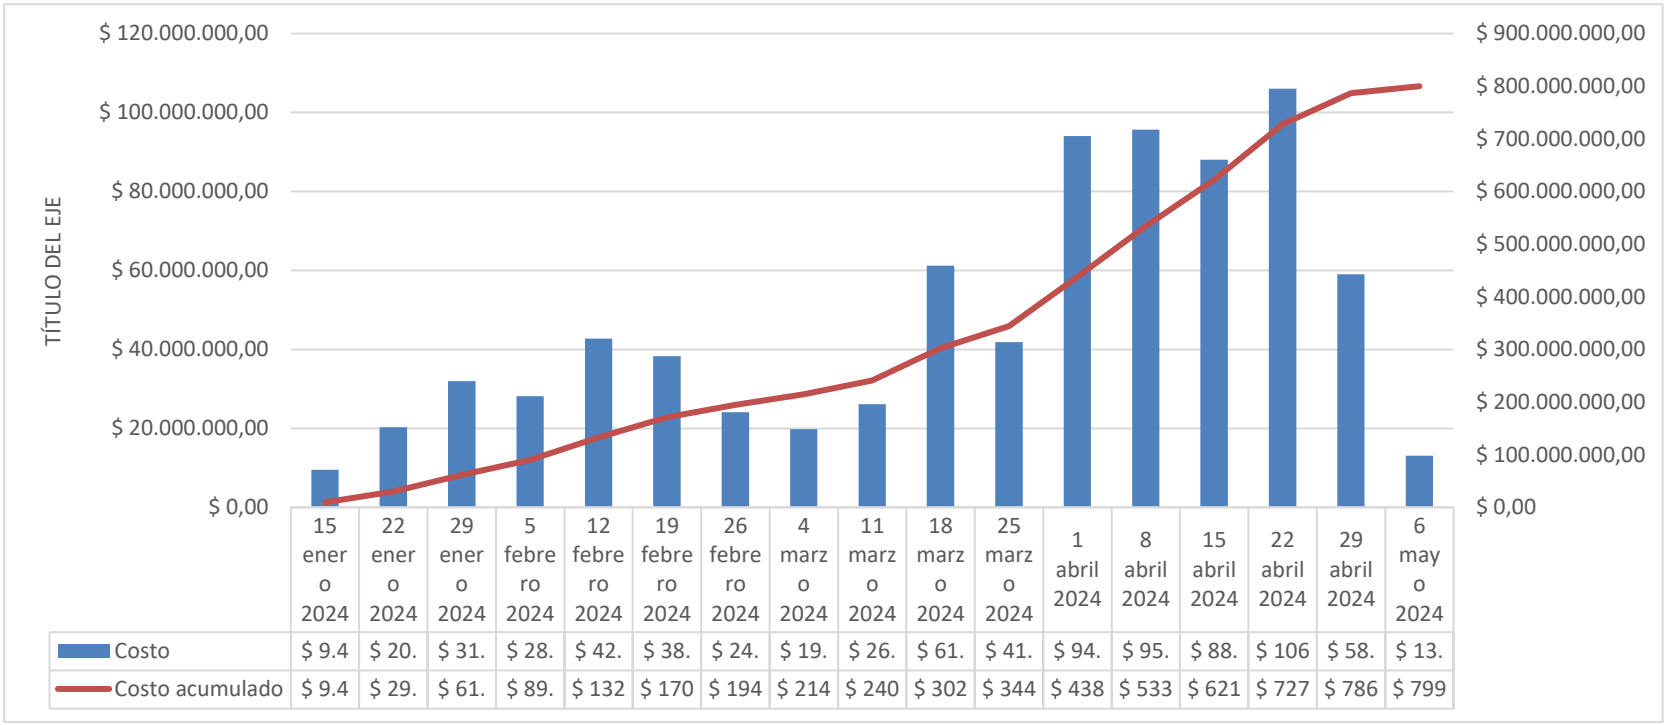

	15 enero 2024	22 enero 2024	29 enero 2024	5 febrero 2024	12 febrero 2024	19 febrero 2024	26 febrero 2024	4 marzo 2024	11 marzo 2024	18 marzo 2024	25 marzo 2024	1 abril 2024	8 abril 2024	15 abril 2024	22 abril 2024	29 abril 2024	6 mayo 2024
Costo	$ 9.4	$ 20.	$ 31.	$ 28.	$ 42.	$ 38.	$ 24.	$ 19.	$ 26.	$ 61.	$ 41.	$ 94.	$ 95.	$ 88.	$ 106	$ 58.	$ 13.
Costo acumulado	$ 9.4	$ 29.	$ 61.	$ 89.	$ 132	$ 170	$ 194	$ 214	$ 240	$ 302	$ 344	$ 438	$ 533	$ 621	$ 727	$ 786	$ 799

Frente a lo anterior, es claro que la intervención de la sede Erasmo valencia de acuerdo con el análisis inicial se efectuaría en un tiempo estimado de 117 días, una vez sean entregadas las instalaciones para inicio de actividades, por lo cual, se aclara que en la programación no se estimaron demoras en la entrega de instalaciones, ni se contempló alguna limitación de intervención en los espacios objeto de adecuación o mantenimiento.


PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN CON FLUJO DE CAJA DE ERASMO VALENCIA DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA SOLICITADA (VALOR 799.914.265,97)

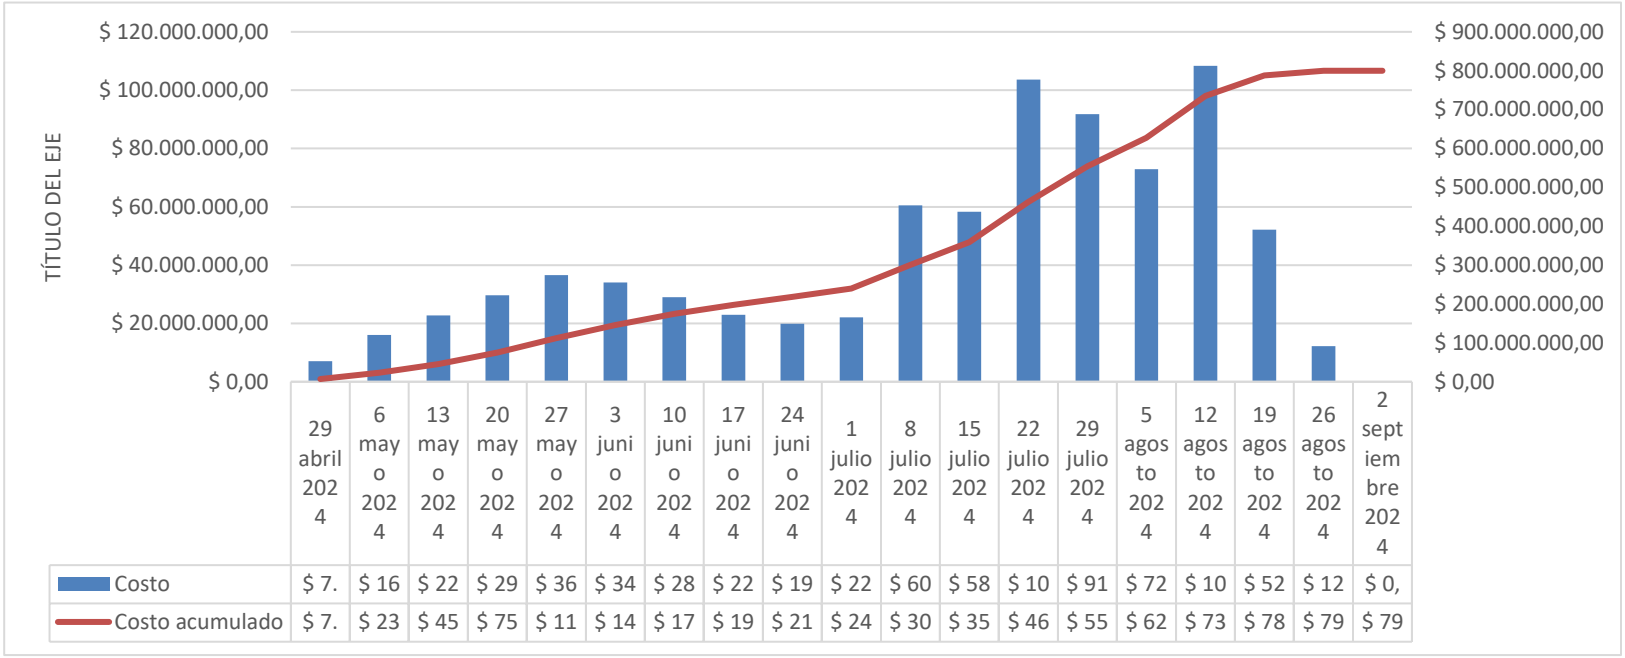

	29 abril 2024	6 mayo 2024	13 mayo 2024	20 mayo 2024	27 mayo 2024	3 junio 2024	10 junio 2024	17 junio 2024	24 junio 2024	1 julio 2024	8 julio 2024	15 julio 2024	22 julio 2024	29 julio 2024	5 agosto 2024	12 agosto 2024	19 agosto 2024	26 agosto 2024	2 septiembre 2024
Costo	$ 7.	$ 16	$ 22	$ 29	$ 36	$ 34	$ 28	$ 22	$ 19	$ 22	$ 60	$ 58	$ 10	$ 91	$ 72	$ 10	$ 52	$ 12	$ 0,
Costo acumulado	$ 7.	$ 23	$ 45	$ 75	$ 11	$ 14	$ 17	$ 19	$ 21	$ 24	$ 30	$ 35	$ 46	$ 55	$ 62	$ 73	$ 78	$ 79	$ 79

De acuerdo con la prórroga solicitada la programación de este Colegio terminaría el 02 de septiembre de 2024, manteniendo las condiciones inicialmente planteadas, proyectando la entrega de las instalaciones educativas o espacios a intervenir al Consorcio Claridad el 02 de mayo de 2024, con el fin de poder cumplir con la programación propuesta


PROGRAMACIÓN INICIAL CON FLUJO DE INVERSIÓN DE LA SEDE EL TOLDO (VALOR $337.709.778,14)

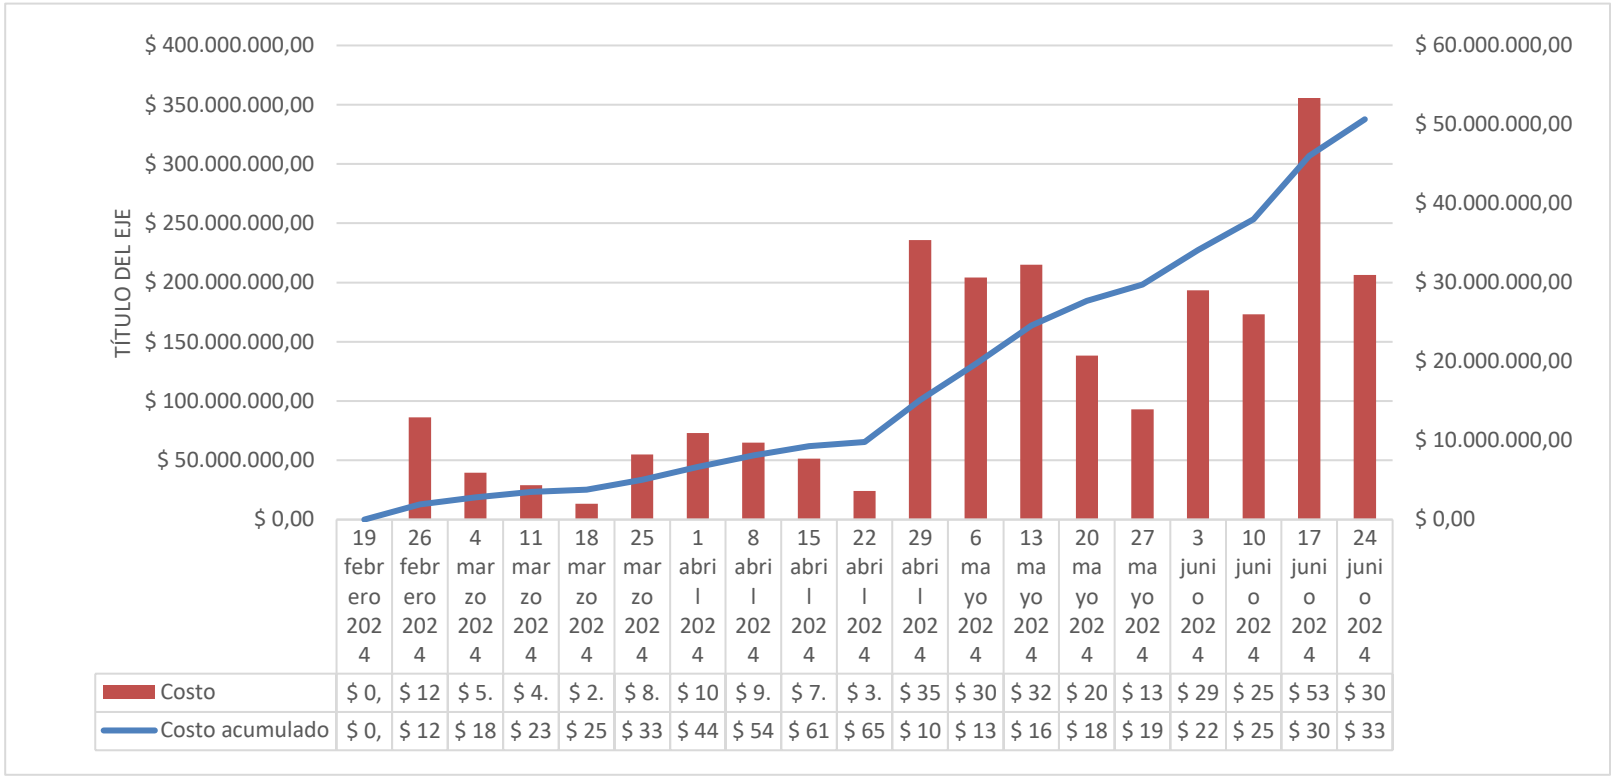

	19 febrero 2024	26 febrero 2024	4 marzo 2024	11 marzo 2024	18 marzo 2024	25 marzo 2024	1 abril 2024	8 abril 2024	15 abril 2024	22 abril 2024	29 abril 2024	6 mayo 2024	13 mayo 2024	20 mayo 2024	27 mayo 2024	3 junio 2024	10 junio 2024	17 junio 2024	24 junio 2024
Costo	$ 0,	$ 12	$ 5.	$ 4.	$ 2.	$ 8.	$ 10	$ 9.	$ 7.	$ 3.	$ 35	$ 30	$ 32	$ 20	$ 13	$ 29	$ 25	$ 53	$ 30
Costo acumulado	$ 0,	$ 12	$ 18	$ 23	$ 25	$ 33	$ 44	$ 54	$ 61	$ 65	$ 10	$ 13	$ 16	$ 18	$ 19	$ 22	$ 25	$ 30	$ 33

El tiempo de ejecución proyectado al inicio de la obra era de 116 días calendario una vez entregadas las instalaciones, por lo cual, se estiman 4 meses en atención al alcance definido en el acta de visita de diagnóstico, de igual forma, para este Colegio se cuenta con toda la logística disponible una vez sean entregadas las instalaciones.

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN CON FLUJO DE CAJA SEDE EL TOLDO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA SOLICITADA (VALOR $337.709.778,14).

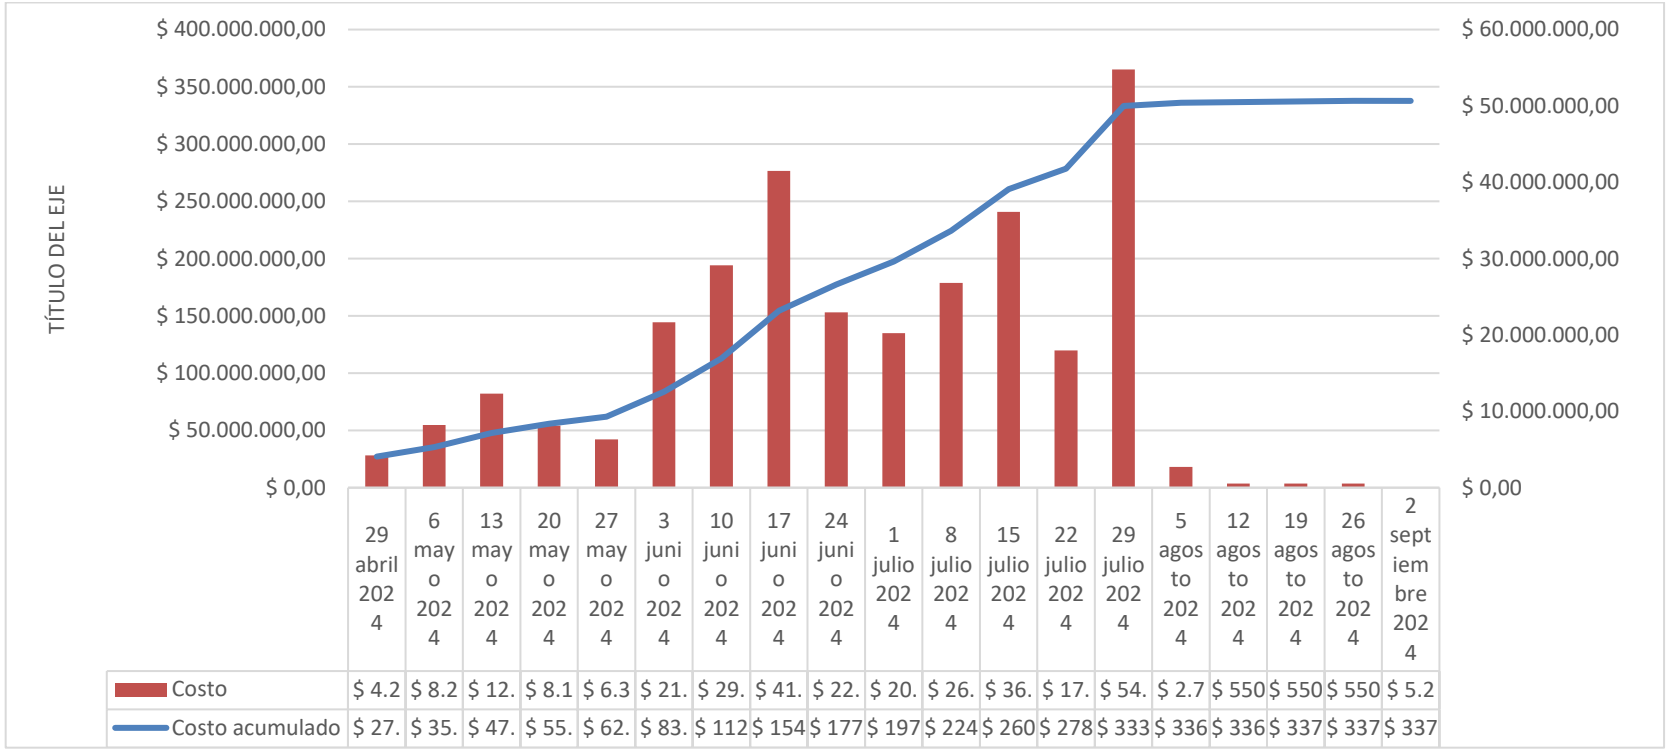

Se mantiene el mismo tiempo de ejecución inicial para esta institución educativa, teniendo en cuenta la ubicación y logística especial para el suministro de materiales y pernotada de los trabajadores, en este sentido, se proyectan 116 días de ejecución una vez se entregue la sede educativa o los espacios a intervenir, la actual programación inicia el 2 de mayo finalizando el 02 de septiembre de 2024.


2. Por otro lado, mediante comunicación oficial CONS-CLARIDAD-082-2023 del 12 de marzo de 2024, se solicitó de manera perentoria la entrega de frentes de obra faltante, (IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE EL TOLDO, TUNAL ALTO Y ERASMO VALENCIA), sin embargo, por situaciones generadas por un tercero en este caso las directivas del Colegio, no fue posible la entrega de estas sedes educativas.

Por lo anterior, teniendo en cuenta que esta sede educativa tenía que haber iniciado actividades el 06 de marzo de 2024 y finalizaba el 29 de junio del 2024, con un tiempo de ejecución de 104 días calendario, se solicita que esta sede sea entregada el 02 de mayo de 2024, con el fin de efectuar la intervención sin afectar los tiempos inicialmente programados.

De acuerdo con la intervención programada, se tiene una inversión de **$599.909.029,00,** por lo cual, se recalca que el Consorcio Claridad cuenta con el personal y la cadena logística para la intervención de este Colegio.

Dadas las circunstancias se presenta la programación entregada dado que se mantendrán los tiempos inicialmente pactados, recalcando que la nueva programación no incluye demoras en la entrega de instalaciones o las afectaciones causadas por la no entrega de espacios, por lo cual, si se llegaré a presentar una situación de este tipo la programación se verá afectada y se realizará el análisis pertinente para dar trámite correspondiente.


PROGRAMACIÓN INICIAL CON FLUJO DE INVERSIÓN DE LA SEDE TUNAL ALTO (VALOR $ 598.876.265,00)

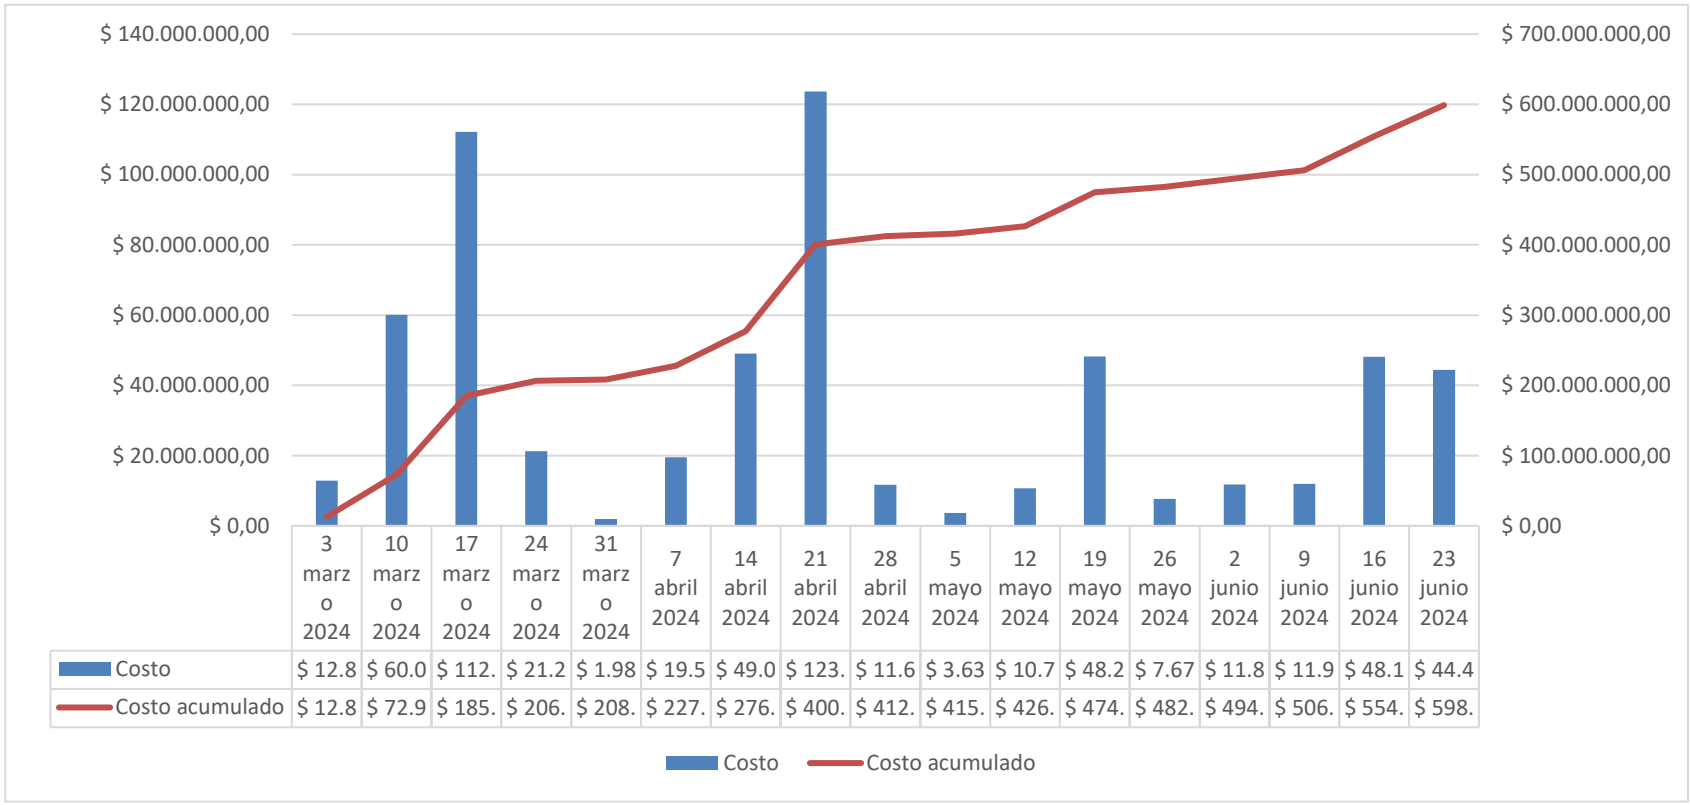

	3 marzo 2024	10 marzo 2024	17 marzo 2024	24 marzo 2024	31 marzo 2024	7 abril 2024	14 abril 2024	21 abril 2024	28 abril 2024	5 mayo 2024	12 mayo 2024	19 mayo 2024	26 mayo 2024	2 junio 2024	9 junio 2024	16 junio 2024	23 junio 2024
Costo	$ 12.8	$ 60.0	$ 112.	$ 21.2	$ 1.98	$ 19.5	$ 49.0	$ 123.	$ 11.6	$ 3.63	$ 10.7	$ 48.2	$ 7.67	$ 11.8	$ 11.9	$ 48.1	$ 44.4
Costo acumulado	$ 12.8	$ 72.9	$ 185.	$ 206.	$ 208.	$ 227.	$ 276.	$ 400.	$ 412.	$ 415.	$ 426.	$ 474.	$ 482.	$ 494.	$ 506.	$ 554.	$ 598.

Esta programación tenía una duración de 104 días calendario iniciando el 06 de mazo y finalizando el 29 de junio de 2024, es claro que los tiempos en la nueva programación no cambiaran y se mantendrán las mismas condiciones siempre y cuando las entregas no se vean afectadas por ninguna circunstancia.

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN CON FLUJO DE CAJA SEDE TUNAL ALTO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA SOLICITADA (VALOR $599.909.029,00).

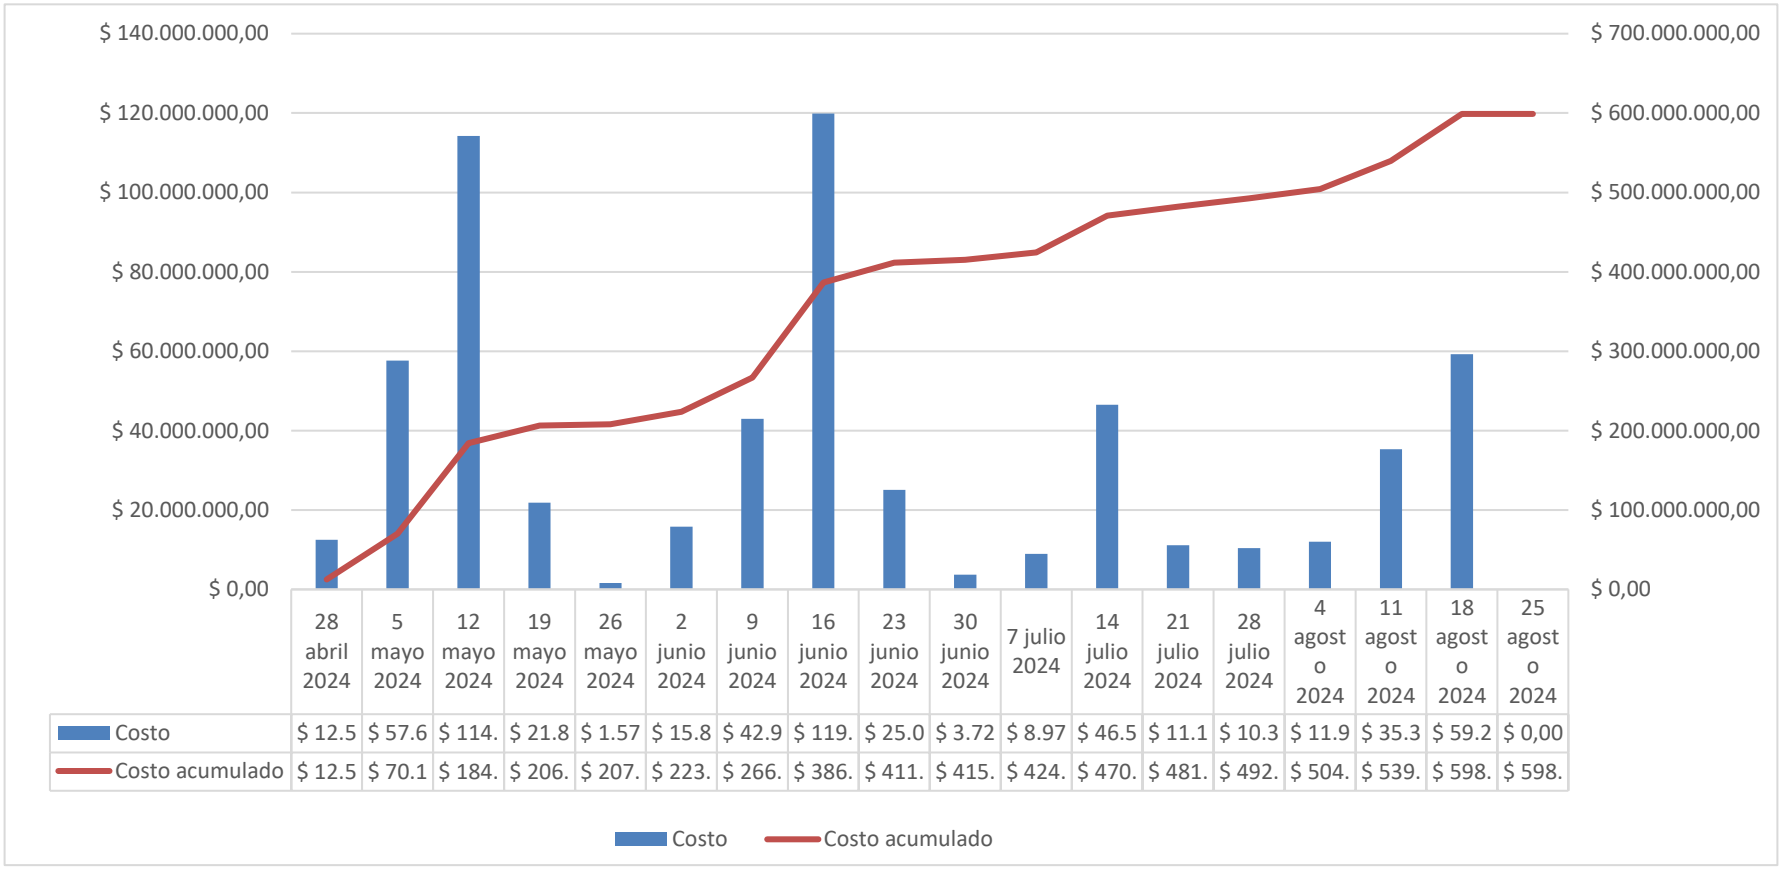

	28 abril 2024	5 mayo 2024	12 mayo 2024	19 mayo 2024	26 mayo 2024	2 junio 2024	9 junio 2024	16 junio 2024	23 junio 2024	30 junio 2024	7 julio 2024	14 julio 2024	21 julio 2024	28 julio 2024	4 agosto 2024	11 agosto 2024	18 agosto 2024	25 agosto 2024
Costo	$ 12.5	$ 57.6	$ 114.	$ 21.8	$ 1.57	$ 15.8	$ 42.9	$ 119.	$ 25.0	$ 3.72	$ 8.97	$ 46.5	$ 11.1	$ 10.3	$ 11.9	$ 35.3	$ 59.2	$ 0,00
Costo acumulado	$ 12.5	$ 70.1	$ 184.	$ 206.	$ 207.	$ 223.	$ 266.	$ 386.	$ 411.	$ 415.	$ 424.	$ 470.	$ 481.	$ 492.	$ 504.	$ 539.	$ 598.	$ 598.

La programación propuesta estima los mismos tiempos, es decir 104 días calendario iniciando el 05 de Mayo y finalizando el 25 de agosto de 2024.

3. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD PROGRAMACIÓN PROPUESTA

La solicitud prórroga en concreto corresponde a 64 días calendario una vez finalizado el tiempo del contrato principal, es decir, este tiempo iniciará a partir del 29 de junio de 2024 y finalizará el 02 de septiembre de 2024.

De acuerdo con lo esbozado en la presente solicitud, los hechos generados por un tercero han ocasionado un atraso importante en la intervención de los colegios ya mencionados, por lo cual, es imperativo revindicar los tiempos perdidos, con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual, en tal sentido, los colegios a intervenir tienen una logística especial que requiere una cadena logística integrada, dadas las condiciones topográficas y sociales que en definitiva han impactado negativamente el proyecto.

Los Colegios objeto de la solicitud de prórroga tienen un presupuesto de **$1.737.533.076,00,** lo cual corresponde al 22,84% del valor total del contrato.

COLEGIO	VALOR ASIGNADO
Erasmo valencia	**$799.914.269,00**
Tunal alto	**$599.909.029,00**
El Toldo	**$337.709.778,00**
TOTAL	**$1.737.533.076,00**


Es claro que no es posible intervenir en el tiempo contractual (8 meses) las cuatro sedes del IED JUAN DE LA CRUZ VARELA, (la Unión, Erasmo Valencia, el Toldo y Tunal Alto) en forma lineal, por lo cual, la propuesta de las tres sedes es ejecutar las actividades de obra de forma paralela, de igual forma, con el fin de generar rendimientos adecuados no es dable que se generen condicionamientos para la entrega de espacios para su intervención, puesto que estas actividades no están calculadas en las programaciones propuestas.

4. CONCLUSIONES

Como se evidencia la solicitud de prórroga corresponde únicamente al tiempo de ejecución perdido por la no entrega de las sedes en la localidad de Sumapaz, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias ya mencionadas y tomando como referencias las programaciones de los colegios entregadas al inicio del contrato.

Los tiempos solicitados corresponden a un análisis estricto del contrato, por lo cual, si se efectúan solicitudes ajenas al mismo, es de pleno conocimiento que no están calculadas en las programaciones entregadas, en tal sentido, los atrasos que se ocasionen por este tipo de situaciones no serán asumidos por el Consorcio Claridad, tomando como referencia que el objeto de nuestro contrato es ***"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".***

Atentamente,



IC JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA
Director de Obra Consorcio Claridad

	LISTA DE CHEQUEO - INFORME MENSUAL DE CONTRATO Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos	Fecha: 28/11/2023 Versión 01

Contratista	CB INGENIEROS S.A.				
Supervisor	ING. FERNEY JIMENEZ NEYRA				
Número de contrato/vigencia	CO1.PCCNTR.5313332				
Informe N°	4	Periodo del informe	1/02/2024	Hasta el	29/02/2024

CONTENIDO	Contiene	No contiene	Observaciones
1. Aspectos Generales Del Proyecto	CUMPLE		CUMPLE
2. Aspectos Generales Del Contrato De La Interventoría	CUMPLE		CUMPLE
Obligaciones específicas del contrato	CUMPLE		CUMPLE
Informes semales	CUMPLE		CUMPLE
Personal Aprobado	CUMPLE		CUMPLE
Verificación de licencias y permisos vigentes	NO APLICA		NO APLICA
Pólizas actualizadas con modificaciones	CUMPLE		CUMPLE
Cumplimiento articulo 3 del decreto 332 del 2020	CUMPLE		CUMPLE
Directiva distrital N° 1 de 2011	CUMPLE		CUMPLE
Incumplimientos o apremios del contrato vigilado	NO APLICA		NO APLICA
Verificacion de la matriz de riesgos	CUMPLE		CUMPLE
Descripción de actividades desarrolladas en el periodo	CUMPLE		CUMPLE
Actas de comité generadas en el desarrollo del contrato	CUMPLE		CUMPLE
Relación de correspondencia (entrada, salida e interNO APLICA)	CUMPLE		CUMPLE
Bitácora	CUMPLE		CUMPLE
Reseña fotográfica del periodo por semana	CUMPLE		CUMPLE
Actividades no previstas del proyecto	CUMPLE		CUMPLE
Ponderación de elementos de calidad	CUMPLE		CUMPLE
Dificultades presentadas durante el desarrollo del contrato del interventor	CUMPLE		CUMPLE
Programación y control de obra	CUMPLE		CUMPLE
Aspectos Técnicos	CUMPLE		CUMPLE
Control del plan de calidad y ensayos de material	CUMPLE		CUMPLE
Estado de Servicios públicos, trámites y licencias	NO APLICA		NO APLICA
Pago Parafiscales	CUMPLE		CUMPLE
Verificación de la amortización del anticipo	NO APLICA		NO APLICA
Estado financiero del contrato de obra	CUMPLE		CUMPLE
Aspectos Sociales	CUMPLE		CUMPLE
Aspectos ambientales PIGA (Plan Institucional de Gestión Ambiental) Y PGRCD (Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición)	CUMPLE		CUMPLE
Seguridad y salud en el trabajo	CUMPLE		CUMPLE
Evaluación estadística de ejecución del presupuesto	CUMPLE		CUMPLE
registro climatico	CUMPLE		CUMPLE
Informes de control diario elaborados por los inspectores	CUMPLE		CUMPLE
Registro fílmico con la secuencia de construcción.	CUMPLE		CUMPLE
4. Conclusiones y recomendaciones			
5. Anexos			
6. Documentos Secop II			
Acta de inicio	X		
Garantías	X		
Designación del supervisor	X		
Informes mensuales	X		
Actas parciales	X		
Modificaciones	NO APLICA		
Suspensión (si aplica)	NO APLICA		
Prorroga a la suspensión	NO APLICA		
Acta de terminación	NO APLICA		
Acta de entrega	NO APLICA		
Reinicio a la suspensión	NO APLICA		
Acta de liquidación	NO APLICA		

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá D.C., abril 2024

Radicado N° **S-2024-130567**
Fecha: 09-04-2024 - 13:17
Folios: 1 Anexos: 1
Radicador: SONIA RODRIGUEZ APARICIO - 4300
Destino: CB INGENIEROS S.A.S.
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: ORBZE

Señores
CB INGENIEROS SAS
Atn.: MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO (R.L.)
Dirección: carrera 10 Nº87A-13
Teléfono: 7040592
Ciudad: Distrito Capital de Bogotá
Correo electrónico: info@cbingenieros.com

Asunto: Respuesta Radicado E-2024-53961 INFORME MENSUAL 4 CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1.PCCNTR.5313332 - SED-US-063-2024. APROBACION.

Referencia: Contrato de interventoría CO1.PCCNTR.5313332. Objeto: *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"*

Cordial Saludo,

En el marco de las competencias de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED descritas en el artículo 31 del Decreto 310 de 2022 y en atención al radicado del asunto en el que remiten el informe mensual 4 de interventoría, se informa que el mismo ha sido recibido y cumple con lo señalado en el DOCUMENTO COMPLEMENTO AL PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRÓNICO del CONCURSO DE MÉRITOS No. SED-CM-A-DCCEE-022-2023 del cual resulta asignado el contrato de interventoría de la referencia, suscrito con ustedes.

Lo anterior en cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED

Reviso: Ing. Ferney Jiménez Neira-Profesional Universitario DCCEE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá D.C., abril 2024

Radicado Nº S-2024-133792
Fecha: 11-04-2024 - 11:35
Folios: 1 Anexos:
Radicador: SONIA RODRIGUEZ APARICIO - 4300
Destino: CB INGENIEROS S.A.S.
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: QDJWV

Señores
CB INGENIEROS SAS
Atn.: MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO (R.L.)
Dirección: carrera 10 Nº87A-13
Teléfono: 7040592
Ciudad: Distrito Capital de Bogotá
Correo electrónico: info@cbingenieros.com

Asunto: Respuesta Radicado E-2024-55532 APERTURA DE FRENTES.

Referencia: Contrato de interventoría CO1.PCCNTR.5313332. Objeto: *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"*

Cordial Saludo,

En el marco de las competencias de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED descritas en el artículo 31 del Decreto 310 de 2022 y en relación con el oficio del asunto, se solicita por favor la evaluación del impacto en días de responsabilidad del contratista y el impacto por la no entrega de los frentes. Para esto último, por favor presentar el análisis de si procede la solicitud de apertura de un proceso de incumplimiento contractual, para proceder en concordancia.

De igual forma, agradecemos por favor presentar alternativas de solución para finalizar el contrato en las mejores condiciones, teniendo en cuenta la situación presentada con el Colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela y contemplando análisis de costos y tiempos si se prorroga el contrato y de no prorrogarse el contrato y las modificaciones que podrían llevarse a cabo.

Lo anterior en el marco de las condiciones contractuales vs costo beneficio para la entidad.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED

Reviso: Ing. Ferney Jiménez Neira-Profesional Universitario DCCEE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Bogotá D.C., abril 2024

Radicado Nº S-2024-133800
Fecha: 11-04-2024 - 11:39
Folios: 1 Anexos:
Radicador: SONIA RODRIGUEZ APARICIO - 4300
Destino: CB INGENIEROS S.A.S.
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: B46JX

Señores
CB INGENIEROS SAS
Atn.: MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO (R.L.)
Dirección: carrera 10 Nº87A-13
Teléfono: 7040592
Ciudad: Distrito Capital de Bogotá
Correo electrónico: info@cbingenieros.com

Asunto: Respuesta Radicado E-2024-58283 de asunto: ALCANCE A OFICIO No. SED-US-060-2024.

Referencia: Contrato de interventoría CO1.PCCNTR.5313332. Objeto: *"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"*

Cordial Saludo,

En el marco de las competencias de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos de la SED descritas en el artículo 31 del Decreto 310 de 2022, en relación con el oficio del asunto, teniendo en cuenta el comité de obra adelantado el pasado lunes 01 de abril en las oficinas de la interventoría y la reunión realizada en la SED con el contratista de obra, el contratista de interventoría y la supervisión del contrato, se solicita la presentación y actualización del informe para la apertura del Proceso de Incumplimiento contractual por cuenta de los días de atraso contados por la falta de material y personal en los frentes de obra.

Finalmente, por favor remitir el concepto jurídico sobre la mejor solución a contemplar en el marco de la ley 80 de 1993 y los documentos contractuales, que permitan dilucidar la mejor alternativa de solución para la entidad.

Cordialmente,

LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos – SED

Reviso: Ing. Ferney Jiménez Neira-Profesional Universitario DCCEE

I. Bitácora

BITÁCORA DE OBRA

CAMPESTRE JAIME GARZÓN - LAS AURAS **SEDE A**

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5.

Se realiza pintura anticorrosivo en canales, se realiza instalación de canal en laboratorio, se realiza trasiego de teja para cubierta.
Clima Tiempo Se
Firma Contratista Interventoria
Miercoles 27 de Marzo 2024
Personal de obra: 1 Director de obra, 1 Residente de obra 1 inspector de obra, 1 inspector interventoria, 1 Maestro de obra, 1 Ayudante de obra.
EQUIPOS: 1 Camion
Actividades: Se realiza desmontaje de puertas con Marco, se realiza instalacion de puertas en Aluminio 3 puertas en cosina Emergencia, se realizo la instalación de 3 pedales llaves, en baño hombres, baño mujeres y dispensador, se realiza descargue de Materiales puertas Aluminio para cosina Emergencia.
Clima: Tiempo Seco
Firma Contratista Interventoria
Jueves 28 de Marzo 2024
No se realizaron Actividades. dia festivo
Firma Contratista Interventoria
Viernes 29 de Marzo 2024
No se realizaron actividades. dia Festivo
(Sa) Firma Contratista Interventoria
Sabado 30 de Marzo 2024
No se realizaron Actividades, se compenso el tiempo por ser semana santa.
Firma Contratista Interventoria
Domingo 31 de Marzo 2024
No se realizaron Actividades, dia Festivo
Lunes 1 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Recidente de obra, 1 inspector Interventoria, 3 personas de cubierta.
EQUIPOS: NA
Actividades: Se realiza instalación de canal en laboratorio, se realiza subida de teja cubierta

primera capa laboratorio.
Clima: Tiempo seco
Firma Contratista Interventoria
Martes 02 de Abril 2024
No se realizaron actividades.
Firma Contratista Interventoria
Miercoles 03 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Residente de obra, 1 SST, 1 Apoyo ingeniero, 1 Inspector Interventoria, 4 personas de cubierta.
EQUIPOS: NA
Actividades: Se realiza subida de teja para cubierta laboratorio, se realiza instalacion de cubierta laboratorio, se realiza instalacion de canal bloque administración, se realiza pintura anticorrosiva en canales, se realiza charla de seguridad y salud en el trabajo, se realiza consolidación de medidas
Clima: Se presentan lluvias suaves durante el dia
Firma Contratista Interventoria
Jueves 04 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Apoyo ingeniero, 1 Residente Interventoria 1 Inspector de obra, 5 operarios de cubierta.
EQUIPOS: NA
Actividades: se realiza armado de canal, se realiza instalación de canal biblioteca #2, se realiza instalación de soscos y conexion a bajantes se realiza subida de teja a cubierta biblioteca se realiza instalacion de cubierta en biblioteca #2
Clima Tiempo Seco
NOTA: INTERVENTORIA ve con preocupación el avance de la obra, puesto que se an presentado lluvias fuertes y constantes en la zona y aun no se an terminado la cubierta de biblioteca, por lo que se siguen presentando problemas de humedad y filtraciones en el primer piso de este bloque.
* se solicita al contratista mantener los brotes

Powered by CamScanner

del cerramiento cerrados puesto que hay circulación de Alumnos por las zonas cercanas a estos espacios.
*Se evidencia que los pisos de los salones tienen un color oxido causado por dejar a la intemperie estos espacios.
Firma Contratista ____ Interventoria ____
Viernes 05 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Apoyo ingeniero, 1 inspector Interventoria, 3 Operarios de Cubierta
EQUIPOS: NA
Actividades: se realiza instalación de cubierta laboratorio se realiza armado de canal, se realiza instalación de canal bloque laboratorio interno, se realiza subida de canal al bloque laboratorio.
Clima Tiempo Seco
Firma Contratista ____ Interventoria ____
Sabado 06 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Apoyo ingeniero, 1 inspector Interventoria 2 operarios de Cubierta.
EQUIPOS: NA
Actividades: se realiza instalación de cubierta bloque laboratorio primera capa.
Clima: Tiempo Secó
Firma Contratista ____ Interventoria ____
Domingo 7 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Apoyo ingeniero, 1 Inspector interventoria Maestro 1, Ayudante de obra 1.
EQUIPOS: NA
Actividades: se realiza instalación de piso vinisol Tipo puzzle salón preescolar Emergencia Aulas.
Clima: Tiempo Secó
Firma Contratista ____ Interventoria ____
Lunes 8 de Abril 2024
No se realizan actividades de obra. No hay personal.
Firma Contratista ____ Interventoria

Martes 9 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Apoyo ingeniero, 1 inspector Interventoria 3 Personas de cubierta.
EQUIPOS: 1 Camión
Actividades: se realiza instalación de cubierta segunda capa modulo laboratorio, se realiza instalación de Tapas en Acero inoxidable para cocina en cocina Emergencia Aulas, se realiza descargue de Material Camion con: bloque, Cemento, estuco.
Clima: Tiempo Seco
Firma Contratista ____ Interventoria ____
Miercoles 10 de Abril 2024
Personal de obra: Recidente Interventoria, 1 Apoyo ingeniero 1 Inspector Interventoria, 2 Operarios de cubierta, 2 electricos, Maestro de obra, 3 Ayudante.
EQUIPOS: NA
Actividades: se realiza instalación de cubierta segunda capa bloque laboratorio, se realiza raspeo de pintura y estuco de paredes, se realiza encofrado de vigas perimetrales, se realiza instalación de Tuberia y cajas EMT, para luminarias biblioteca Modulo 1, 2.
Clima: Tiempo Secó
Firma Contratista ____ Interventoria ____
Jueves 11 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Apoyo ingeniero, 1 Inspector Interventoria 2 operarios de cubierta, 2 Maestro de obra, 1 Ayudante, 2 electricos.
EQUIPOS: Herramienta de mano
Actividades: instalación de cubierta bloque laboratorio segunda capa, Raspeo de pintura y estucado de paredes bloque biblioteca. instalación de Tablero monofasico para punto Electrico Aulas, Salones, biblioteca.
Clima: Tiempo Secó
NOTA: El Apoyo ingeniero hace la siguiente observación:

Powered by CamScanner

• Se evidencia luminaria de pasillos segundo Nivel dañadas por lo cual se debera realizar el cambio por nuevas Tipo hermeticas de 2X16.
• Con el fin de independizar la zona de administración con los bloques de salones biblioteca, laboratorio, se realizara instalacion de dos tableros manofasicos independientes para las dos Areas Nombradas.
• **INTERVENTORIA:** Se analizo la posibilidad de hacer manejo de Aguas por medio de cajas de paso con soportar algo de sedimentación para soportar el volumen de liquido que pueden manejar.

Firma Contratista [signature] Interventoria [signature]
Viernes 12 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Apoyo ingeniero, 1 Inspector Interventoria 3 Operarios de Cubierta, 9 Maestros de Obra, 2 electricos.
EQuipos: NA
Actividades: se realiza instalacion de cubierta primera capa blogue administración, zarpeo de cintura y estuco de paredes blogue biblioteca, salones primer piso area ducto de bajante, area tarima luminarias, conformacion de encoroce de vigas perimetrales bloque biblioteca, modulo #1, Desmontaje de luminarias Tarima, instalacion de Tuberia emt salón #2 y Tarima.
Clima: Tiempo seco
Firma Contratista [signature] Interventoria [signature]
Sabado 13 de Abril 2024
Personal de Obra: 1 Apoyo ingeniero, 1 Inspector Interventoria 5 operarios de Cubierta.
EQuipos: NA
Actividades: se realizu instalacion de cubierta segunda capa modulo administración.
Clima: Tiempo Seco
Firma Contratista [signature] Interventoria [signature]
Domingo 14 de Abril 2024
Personal de Obra: 1 Apoyo ingeniero, 1 Inspector Interventoria

5 operarios de cubierta, 3 oficial de obra, 1 Encargada de obra.
EQuipos: NA
Actividades: Instalación de Cubierta segunda capa Modulo administración, resane y estuco, Pintura de muros Aulas, biblioteca, salón preescolar.
Clima: Tiempo Seco
Firma Contratista [signature] Interventoria [signature]
Lunes 15 de Abril 2024
Personal de obra: Apoyo ingeniero 1, inspector interventoria 1 operarios de cubierta 3, electricos 2, oficial obra 3
EQuipos: NA
Actividades: se realiza instalación de cubierta blogue administración segunda capa, se realizan trabajos electricos en biblioteca 1, 2, salón 1, 2 se realizan remates de estuco y pintura en biblioteca
Clima: Tiempo seco
Firma Contratista [signature] Interventoria [signature]
Martes 16 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Apoyo ingeniero, 1 inspector Interventoria Personal Cubierta 3, Electricos 2, Oficial 3
EQuipos: NA
Actividades: se realiza instalacion de cubierta blogue administración segunda capa, se realizan trabajos Electricos en biblioteca 1, 2, salon 1, 2 se realizan remates de estuco y pintura en biblioteca
Clima: Tiempo Seco
Nota: Se evidencia que la instalación de cubierta en laboratorio y administración, segunda capa quedo soplada la teja, se solicita al contratista hacer las respectivas correcciones. Falta la instalacion de los flanches de canal biblioteca y salón de segundo Falta corregir la soldadura de soportes de canal blogue laboratorio interno, salon 1, 2, biblioteca. Se evidencia canaleta dañada en biblioteca. se solicita hacer las correcciones de las canales.

Powered by CamScanner

Firma Contratista Interventoria
Miercoles 17 de Abril 2024
Personal de obra: Apoyo ingeniero 1, 1 inspector Interventoria 3 oficial, 3 electricos.
EQuipos: NA
Actividades: se realiza desmontaje de cubierta bloque laboratorio, se realiza desmontaje de luminarias bloque laboratorio, se realiza estuco y pintura biblioteca salon 2, se realiza ajuste de cubierta biblioteca salon 1,2 se realiza instalacion de flanches cubierta biblioteca salón 1,2 se realiza pintura de canales se retira material sobrante de las cubiertas. estuco de antepechos tarima impriminación con impermeabilizante, impermeabilización de muros ductos salon primer piso aula jardin, Aplicación de pintura interior salon preescolar, primera capa modulo 1 biblioteca Desmontaje de cubierta bloque carnicos
Clima: Tiempo seco
Firma Contratista Interventoria
Jueves 18 de Abril 2024
Personal de obra: Apoyo ingeniero, inspector interventoria 5 oficial de obra, 3 electricos.
EQuipos: 1 camión
Actividades: suministro y aplicacion de pintura esterior Tarima, estuco de ductos salon primer piso preescolar Modulo 1 biblioteca, instalacion de tuberia y puntos electricos laboratorio. descargue de Materiales.
Clima: Tiempo seco
Firma Contratista Interventoria
viernes 19 de Abril 2024
Personal de obra: Apoyo ingeniero, inspector Interventoria 5 oficial de obra, 3 electricos
EQuipos: NA
Actividades: suministro y aplicación de pintura esterior ante pecho bloque laboratorio y Hall de ingreso salon 1,2 biblioteca estucado de columnas aplicación

de pintura y remates biblioteca pintura de guarda escoba en esmalte blanco salon biblioteca, instalación de tuberia y puntos electricos laboratorio, carnicos.
Clima: se presentan durante el dia
Firma Contratista Interventoria

Nota 1: El dia 11 de Abril 2024, se perdieron luminarias de Tarima, segundo nivel danados. por lo cual se deben realizar el respectivo cambio por herméticos 2x16 (4 unidades).
Nota 2: El dia 10 de Abril 2024, Con el fin de independizar la zona Admo con los bloques de salones / biblioteca / Laboratorios, se realizara instalación de 2 tableros Monofasicos; se debe tener en cuenta que la linea principal de tablero a tablero, debera realizarse en calibre #6 teniendo en cuenta la trayectoria.
Nota 3: Se realizo inspección de torres Modulo Carnicos, zona mezanine por la humedad presente y el estado de ellos se procede a realizar cambio en acometido nuevo. con tubo emt, En misión de mejoramiento se debera realizar mantenimiento y cambio de tomacorrientes 6ta2. debido al mal funcionamiento de estas asi como en bloque laboratorios.
FIRMA CONTRATISTA INTERVENTORIA
El dia Sabado 20 de Abril 2024
No se realizaron actividades de obra
Firma Contratista Interventoria
Domingo 21 de Abril 2024
No se realizaron actividades de obra
Firma Contratista Interventoria
Lunes 22 de Abril 2024
No se realizaron actividades de obra
Firma Contratistas Interventoria
Martes 23 de Abril 2024
Personal de obra: Apoyo ingeniero 1, inspector interventoria 1 Oficial de obra 3
EQuipos: NA
Actividades: se realiza armado de andamio certificado para pintura bloque administración, se realiza raspado de pintura preescolar #2, se realiza aplicación decanal preescolar #2, se realiza aplicación de estuco, preescolar 2 se realiza raspado de pintura salon quimica, se realiza aplicación de acanal salon quimica, se

Powered by CamScanner

realiza aplicacion de estuco quimica, se realiza aplicacion de estuco biblioteca columnas, se realiza consolidacion de medidas para memoria. Contratista interventoria
Clima: se presentan lluvias suaves 3 horas
Firma Contratista Interventoria
Miercoles 24 de Abril 2024
Personal de obra: Apoyo ingeniero 1, interventoria inspector 1 3 oficiales de obra.
EQUIPOS: NA
Actividades: se realiza armado de andamio certificado para pintura bloque administración, se realiza raspado de pintura preescolar #2, se realiza aplicacion de actonal preescolar #2 se realiza resane y conformación de filos fachada posterior bloque administración Aplicación de pintura primera capa salon preescolar #2 y quimica instalación de inteructor doble y toma corriente Modulo biblioteca.
Clima Tiempo seco
Firma Contratista Interventoria
NOTA 1 → SE APRUEBA POR PARTE DE SECRETARIA DE EDUCACION, CAMBIO DE COLOR VERDE DE ACUERDO CON SOLICITUD DE RECTORIA DEL COLEGIO, DEBIDO A QUE LA TONALIDAD DEL TONO APROBADO POR LA (SED) NO CUMPLIA CON LA REFERENCIA ENMARCADA EN LA INSTITUCIÓN.
SE REALIZA PROCESO DE ESTUCADO EN SALON PRESCOLAR 2, EL DIA MARTES 23 DE ABRIL, SIN EMBARGO EL DIA DE HOY SE EVIDENCIA EN CAMPO, HUMEDAD EN EL MASILLADO, EL CUAL ES PROVENIENTE DEL TERRENO, DEBIDO A QUE DICHO SALON SE ENCUENTRA A UN NIVEL INFERIOR, POR LO TANTO SE PROPONE LA CONSTRUCCION DE UN FILTRO PERIMETRAL, Y UN SOBREMURO, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DRENAJE DE LAS AGUAS PROVENIENTES DE LA ESCORRENTIA DEL SUBSUELO.

Jueves 25 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Residente de obra, 1 Residente interventoria, 1 inspector Interventoria, Apoyo ingeniero 2, 2 Personal de cubierta, 5 oficial, 3 electricos
EQUIPOS: NA
Actividades: se realiza pintura 3 en 1 and, se realiza pintura en salon preescolar #2 Quimica, Jardin A, B se realiza raspado de pintura Jardin A, B se realiza estuco en Jardin A, B, se realiza instalacion de tomas suiches y luminarias biblioteca, se realiza corrección de observaciones en canal, se realiza cellado de canal, se realiza inspeccion de Red electrica.
Clima: se presentan lluvias suaves 3 horas
Nota: la inspección eléctrica fue realizada por el ingeniero eléctrico Cesar Ochoa
NOTA 1 → EL DIA 25 DE ABRIL SE SOCIALIZARA ANTE PERSONAL DE INTERVENTORIA, CON EL FIN DE ANALIZAR Y DAR UNA PRONTA SOLUCION ANTE LA SITUACION PRESENTE.
NOTA 2 → SE EVIDENCIA DAÑO EN TOMACORRIENTE EXISTENTE EN MODULO 2 DE BIBLIOTECA, POR MODULO 2 DE BIBLIOTECA, POR LO TANTO SE DEBERA REALIZAR EL RESPECTIVO CAMBIO DEL INTERRUPTOR.
FIRMA CONTRATISTA FIRMA INTERVENTORIA
Viernes 26 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Apoyo ingeniero, 1 inspector Interventoria 5 oficial de obra, 3 electricos
EQUIPOS: NA
Actividades: Aplicacion de pintura exterior bloque posterior administración, Aplicación segunda capa de pintura salon Jardin A, B, Perfilación y remate de filos bloque biblioteca y salones, instalacion de luminarias panel LED, 12 x 30 40 w Salón primero y segundo instalacion de flauche salón segundo.
Clima: Tiempo seco.
FIRMA CONTRATISTA FIRMA INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

NOTA: SE EVIDENCIA DAÑO EN TOMACORRIENTE EXISTENTENTE SALON SEGUNDO, POR LO TANTO SE DEBERA REALIZAR EL RESPECTIVO CAMBIO DE INTERRUPTOR.
NOTA2: DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS NO SE HA PODIDO REALIZAR EL RESPECTIVO SELLO FINAL DE LAS CANALES EN SALON BIBLIOTECA Y SALONES, LO QUE HA IMPEDIDO EL CIERRE FINAL DEL DUCTO; SE PROYECTA EN LAMINA SUPERBOARD.

FIRMA CONTRATISTA FIRMA INTERVENTORIA

Sabado 27 de Abril 2024
Personal de obra: Apoyo ingeniero, inspector interventoria, 3 Electricos, 1 operario de cubierta, 5 oficiales de obra.
EQUIPOS: NA
ACTIVIDADES: Aplicacion de pintura en esmalte Marco de ventaneria salón Jardin A, B, instalacion de Plauche Biblioteca Modulo #2, Perfilacion y remate de filos salones, instalación de luminarias panel LED 120x30 40 w salon segundo instalación de parciales desde tablero biblioteca a salones primero y segundo, sellado de soscos y canales.
Clima: se presentan lluvias durante el dia
Firma Contratista Interventoria
Domingo 28 de Abril 2024
Personal de obra: Apoyo ingeniero, inspector interventoria 3 electricos.
EQUIPOS: NA
Actividades: instalación de luminaria salón segundo, Apuntateo de interuptores y toma corriente. Suministro de cableado para parciales salón primero y segundo.
Clima: se presentan lluvias durante el dia
Firma Contratista Interventoría
Lunes 29 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Apoyo ingeniero, Residente Interventoria 1 SST Interventoria, 1 inspector Interventoria, 2 soldador, 3 electricos.

EQUIPOS: NA
Actividades: instalación de piso vinisol Tipo puzzle salon Jardín B, Resoldada de soportes biblioteca Modulo #2, entrega 3 en 1 en soportes Tarima, instalación de luminarias panel LED 170x30 40 W informatica Modulo laboratorio, desmontaje de Plauche informatica.
Clima: se presentan lluvias durante el dia 5 horas
Firma Contratista Interventoria
Martes 30 de Abril 2024
Personal de obra: Apoyo ingeniero, inspector Interventoria 3 electricos, 3 oficial de obra.
EQUIPOS: NA
Actividades: Pintura de estructura en salón 1, 2 biblioteca, instalación de luminarias informatica Modulo laboratorio, sellado de canal salón 1, 2 biblioteca, cableado en laboratorio, Aseo en biblioteca cambio de luminaria salón segundo por garantia se evidencia infesfecto en luminaria, trasiego de luminarias desmontadas, se realiza instalación de suiches y tomas informatica laboratorio.
Clima: Tiempo seco
Firma Contratista Interventoria
Miercoles 01 de Mayo 2024
Personal de obra: 1 Apoyo ingeniero, 1 inspector Interventoria 3 oficiales de obra, 2 electricos, 2 soldadores.
EQUIPOS: NA
Actividades: instalacion de Muro dorwall seccion bajantes de Aguas lluvias modulo biblioteca. Aseo fino lavado de pisos y ventaneria modulo, tarima, instalacion de luminarias laboratorio ensayos, instalacion de puerta cilindros degas
Clima: Tiempo seco
Firma Contratista Interventoria
Jueves 02 de Mayo 2024
Personal de obra: Apoyo ingeniero, 2 inspectos Interventoria

Powered by CamScanner

VIVIENDA CAMPAMENTO
Docentes.

Constructor: Consorcio Claridad

Interventoria: CB INGenieros

Residente de obra: Guillermo Velandia
Residente de Interventoria: Cristian Barragan
Firmas: Interventoria:
Contratista

Powered by CamScanner

MES Abril del 2024

- 26 de marzo del 2024

Clima:

No se realizaron actividades.

observacion: se realizo retiro de 1 viaje de RCDs. y se hace (1 viaje) viaje de 4 m³ de material mixto: Firma contratista Interventoria

- 27 de marzo al 04 Abril de 2024

Clima:

No se realizaron actividades.

Firma contratista Interventoria.

- 05 de Abril al 08 Abril de 2024
- Clima

No se realizaron actividades.

Firma contratista Interventoria

- 09 de Abril del 2024

Clima: seco 24 hora.

personal: 2 oficiales, Residente de obra, Inspector, SST, Interventoria: Residente, Inspector, SST.

Actividades: Excavacion manual para pedestales. de estructura metalica.

Firma contratista Interventoria.

- 10 de Abril del 2024

Clima:

personal: Oficiales de Estructura 2, Inspector de obra, SST Interventoria, Residente, Inspector de obra, SST

Actividades: Se continua excavacion manual de dados de cimentacion para Estructura. metalica

observación: No se realizaron trabajos desde los 1:00 pm los trabajadores se retiraron

Firma Contratista Interventoria

- 11 de Abril del 2024

Clima:

Personal: 2 oficiales de Estructura, Inspector de obra, 1 SST Interventoria; Residente de obra, Inspector SST.

Actividades: se realiza figurado de acero para vigas de los dados de cimentación

Observación: se le hace la observación por parte de Interventoria a contratista que acero que estan figurando para los vigas de dados cimentación estan siendo reciclados por (hende) esta circunstancias se pide cambio por uno (bien) nuevo y en buen estado.

Firma contratista [signature] Interventoria [signature]

- 12 de Abril del 2024

Clima

Personal: 2 oficiales de Estructura, Inspector de obra, SST, Interventoria; Residente, Inspector, SST

Actividades: se continua con figurado de acero. Sin ser subsanada la observacion de acero reciclado, se realiza fundida del 20% de los dados de cimentación.

Firma Contratista [signature] Interventoria [signature]

- 13 de Abril del 2024

Clima:

Personal: 2 oficiales, Inspector, SST, Interventoria Residente, Inspector, SST

Actividades: se realiza fundida de dados de cimentación para ESTRUCTURA, se realiza mezclado en trompo para fundida de dados.

Firma contratista [signature] Interventoria [signature]

Powered by CamScanner

- 14 de Abril 2024
  Clima:
  No se realizaron actividades.
  Firma contratista Interventoría
- 15 de Abril 2024
  Clima: Contratista Interventoría
  (V) No se realizaron Actividades.
- 16 de Abril del 2024
  Clima:
  No se realizaron actividades.
  Firma contratista Interventoría
- 17 de Abril del 2024.
  Clima:
  Personal: 2 oficiales, Inspector de obra, SST
  Interventoría: Residente, Inspector, SST
  Actividades: se continua (d) Fundida de dados de cimentación para estructura se continua realizando figurado de acero para dado de cimentación
  Firma Contratista Interventoría
- 18 de Abril del 2024
  Clima:
  Personal: 5 oficiales de Estructura, 1 Ingeniero de apoyo de subcontratista, Inspector de obra, SST; Interventoría: Residente, Inspector, SST
  Actividades: se realiza montaje de estructura metalica. se realiza [illegible]struccion de pedestales
  Firma contratista Interventoría
- (18)19 de Abril del 2024
  Clima:
  No se realizaron actividades.
  Observación: Platinas fuera de los dados, Oxido de Estructura metalica
  Firma Contratista Interventoría

Powered by CamScanner

- 20 de Abril del 2024
  Clima:
  (personal:) No se realizaron actividades
  Firma contratista Interventoría

- 21 de Abril del 2024
  Clima:
  No se realizaron actividades.
  Firma contratista Interventoría
- 22 de Abril del 2024
  Clima:
  personal 3 oficiales de estructura, Ingeniero de apoyo Inspector de obra, SST, Interventoría; Residente de obra, Inspector, SST
  Actividades: Se realizaron excavaciones del bloque 2 para dados de cimentación
  Firma contratista Interventoría
- 23 de Abril del 2024.
  Clima:
  personal: 3 oficiales, Ing de apoyo, Inspector de obra, SST Interventoría: Residente de obra, Inspector SST.
  Actividades: Continua con excavación manual de dados.
  Firma contratista Interventoría
- 24 de Abril 2024.
  Clima:
  Personal: 3 oficiales, Ing de Apoyo, Inspector de obra, SST, Interventoría: Residente, Inspector, SST
  Actividades: Se continua con excavación man. de dados de cimentación, se realiza recepción de concreto para dados de cimentación, el subcontratista toma muestras de concreto.
  Firma contratista Interventoría

Powered by CamScanner

- 25 de Abril del 2024
Clima:
Personal: 3 oficiales, Ing de apoyo, Inspector de obra, SST, Interventoria; Residente, Inspector, SST.
Actividades: se realiza figurado de acero para dados de cimentación, se realiza fundida de dados faltantes en parte de ejes de bloque.
Observación: se le hace la observación al contratista que sigue instalando acero con oxido para dados. Firma contratista Interventoria.
- 26 de Abril del 2024.
Clima:
Personal 3 oficiales, Ing Apoyo Inspector de obra SST, Interventoria, Residente de obra, Inspector, SST
Actividades: Continua fundida de dados de cimentación, en la parte de ejes del bloque., Engrofado para fundida.
Firma: contratista Interventoría
- 27 de Abril del 2024
Clima:
Personal: 3 oficiales, Inspector de obra, SST, Interventoria Inspector de obra, Residente, SST.
Actividades: Se continua el fundida de dados cimentación para estructura metalica en segundo bloque.
Firma contratista Interventoría
- 28 de Abril del 2024.
Clima:
NO se realizaron actividades.
Firma contratista Interventoría

- 29 de Abril del 2024
Clima:
No se realizaron actividades
Firma contratista [signature] Interventoría [signature]
- 30 de Abril del 2024.
Clima:
No se realizaron actividades

Mes de Mayo 2024

- 01 de mayo del 2024.
Clima:
No se realizaron actividades.
llegada de estructura metalica.
Firma Contratista [signature] Interventoría [signature]
- 02 de mayo 2024
Clima:
Personal 3 de obra civil, Inspector, SST, Interventor Residente, Inspector, SST.
Actividades. Desmonte de madera de la corona en los dos bloque dorentes, llegada de Estructura.
Firma contratista [signature] Interventoría [signature]
- 03 de mayo del 2024
Clima:
Personal 3 de obra civil Inspector de obra, Residente, SST. Interventoria Residente, Inspector, SST
Actividades: se continua desmonte de madera en corona, fijando de viga roja viga corona.
Firma Contratista [signature] Interventoría [signature]

BITÁCORA DE OBRA

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR (IED) SEDE B

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5.

Powered by CamScanner

Se realizo recorrido con cesar Electrico de la Interventoria Ing Cesar Augusto Bolaño, con inspector del contratista de obra y Residente de la Interventoria, con el fin de verificar aperturas electricas y puntos

Firma: Interventoria. Contratista.

- Martes, 02 de Abril de 2024
Clima: Tiempo seco 24 Horas.
Personal de Obra: 5 Oficiales de Obra civil, 2 Electricos, 1 Inspector de Apoyo, 1 Residente de Obra, 1 SST, Interventoria 1 Residente y SST, 1 Inspector.
Actividades: Se realizo fundida de sobre piso, Instalacion de luminarias en Aula 3, Se realizo excavacion manual de 0.31 m, llegada de 1 viaje de mixto
Observaciones y Notas: Se hace observacion de encuentro de fallo en aula 1.

Firma: Interventoria. Contratista.

- Miercoles, 03 de Abril de 2024
Clima: Tiempo seco 24 Horas.
Personal en Obra: 5 Oficiales de Obra civil, 1 Inspector de Apoyo, 1 SST. 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Obra, Interventoria, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Se realiza trabajo manual de excavacion a punto de acopio Continua excavacion manual en fallo aula de 0.30 m, Se realizo instalacion de Geotextil en salon detras de los baños, Se realizo relleno de base en aula detras de los baños, Se realizo retiro de 3 viajes por 8m3 c/u material de excavacion.
Observaciones y Notas:

Firma: Interventoria. Contratista.

- Jueves, 04 de Abril de 2024
Clima: Tiempo Seco 22 Horas y lluvia suave 2 Horas

Personal en Obra: 5 Obra civil, 2 Electricos, 1 Apoyo, Inspeccion de obra 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Obra, 1 SST, Interventoria, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Instalacion de tuberia y cableado electrico en salones, Aplicacion de pintura en aulas y cubiculos, Picada en columnas entrada a bodega, Relleno de base en bodega, llegada de 1 viaje de 8m3 recebo B400.
Se realizo compactacion de recebo en salon con rana compactadora.
Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria. Contratista.

- Viernes, 05 de Abril de 2024
Clima: Tiempo seco 21 Horas, lluvia fuerte 3 Horas.
Personal de Obra: 5 de Obra civil, 2 Electricos, 3 Estructura Metalica, 1 Inspector de apoyo, 1 Residente de obra, 1 SST, Interventoria, 1 Residente de obra, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Se realizo fundida de placa en salon, Aplicacion de pintura segunda mano en Aula 2, Instalacion de bajantes en entrada de bodega
Observaciones y notas:

Firmas: Interventoria. Contratista.

- Sabado, 06 de Abril de 2024
Clima: Tiempo seco 24 Horas.
Personal de obra: 4 Oficiales de obra civil, 1 Electro, 1 Oficial de estuco y pintura, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de obra, 1 SST, Interventoria: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Se realizo fundida de placa piso en cuarto bodega, Instalacion de persianas en bloque administrativo Inicio detalles de pintura en bloque baños.
Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: Contratista.

Powered by CamScanner

- Domingo; 07 de Abril de 2024
Clima: Tiempo seco 24 Horas
Personal en obra: 2 Electricos, 1 SST, Interventoria 1 Residente
Actividades: Instalación de pared electrica de baños administración.
Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: Contratista:

- Lunes; 08 de Abril de 2024
Clima Tiempo seco 21 Horas, lluvia suave 3.
Personal en Obra 4 de Obra civil, 1 Electrico, 1 Residente de Obra, 1 SST, 1 Inspector, Interventoria: 1 Residente, 1 SST, 1 Inspector.
Actividades se realiza instalación de aparatos en baño bloque administrativo. Se realiza raspado de muro en salones, Instalacion de cajas electricas en salón No 3, Inicia instalación duo piso en salón, se realiza limpieza de salón.
Observaciones y Notas:

Firmas Interventoria. Contratista:

- Martes; 09 de Abril de 2024
Clima: Tiempo seco 24 Horas.
Personal en Obra: 5 de Obra, 2 Electricos, 1 Residente, 1 Inspector de obra, 1 SST, Interventoria, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
Actividades Continua instalación de duo piso, Se realiza tapa de muros entre salones y baños se realiza embaquillado de duo piso en salones, Instalación de guarda escoba en salones, Instalación de paneles led en aula detras de baños se realiza alistado de piso para instalar duo piso en salón.
Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoria: Contratistas:

- Miercoles, 10 de Abril de 2024
Clima: Tiempo seco 24 Horas

personal en Obra: 5 de Obra civil, 2 Electricos, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Obra, 1 SST, Interventoria, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Se realiza aplicación de pintura en aulas tercera mano, Se realiza Demolición de placa huecra tapas, para tubería bajante, Instalación de tubería electrica en salones, para luminaria tipo led, se realiza picheta en cuchilla, interseccion baños y salones, Acabado tubería bajante.
Observaciones y Notas: Se realiza atención de la Emergencia: Inspección de caja, donde se evidenciaba filtración de agua.

Firmas: Interventoria: Contratista:

- Jueves, 11 de Abril de 2024.
Clima: Tiempo seco 24 Horas
Personal en Obras 5 Obra civil, 2 Electricos, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Obra, 1 SST, Interventoria, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Continua aplicación de pintura en aulas, Se da inicio a picado muro fachada bloque salones y baños, se realiza instalación de duo piso en salón, se realiza marcación de tubería eléctrica, Se realiza retiro de un (1) viaje de RCD's y basuras
Observaciones y Notas:

Firmas Interventoria. Contratista

- Viernes, 12 de Abril de 2024
Clima: Tiempo seco 24 Horas
Personal en Obra: 5 Obreros de Obra civil, 2 Electricos, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Obra, 1 SST Interventoria: 1 Residente, 1 Inspector de Interventoria 1 SST.
Actividades. Continua picado muro fachada bloque salones, se realiza instalación de tubería electrica, Instalación de duo piso en salón, se realiza filos boca puesto con gravilla se realiza embaquetado de salón, se realiza instalación de guarda escoba en salón detras de los baños

Powered by CamScanner

Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoría: Contratista:

- Sabado, 13 de Abril 2024.
Clima: Tiempo seco 24 Horas
Personal 3 Oficiales de Obra civil, 2 Electricos, 1 Residente de Obra 1 Inspector de Obra, 1 SST Interventoría: 1 Residente 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Continua instalación de estructura metalica en salones, se realiza enfierrado de muro fachada bloque salones, se realiza fundida de sobre piso en aulas, Continua picado de muro fachada.
Observaciones y Notas: Para Hoy atendiendo la emergencia por filtración de agua, se realiza excavación manual para atender emergencia, se realiza cambio a la caja inspeccionada.

Firmas: Interventoría: Contratista:

- Domingo, 14 de Abril 2024
Clima:

- Lunes, 15 de Abril 2024.
Clima: Tiempo seco 24 Horas
Personal en Obra: 3 personas de Obra civil, 2 Electricos 1 Residente, 1 Obra civil 1 SST, Interventoría: 1 Residente, 1 SST, 1 Inspector de Inter.
Actividades: Se realiza aplicación de pintura sobre fachada, Instalación de puertas en salones, se realiza enfierrado en fachada muro, se evidencia, que realizan instalación de bajantes sobre las humedades, Reparo en muro.
Observaciones y Notas:

Firmas Interventoría: Contratista:

- Martes, 16 de Abril 2024.
Clima:
Personal en Obra: 3 personas de Obra civil, 1 Electrico, 1 Residente, 1 Inspector 1 SST, Interventoría: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Se realiza aplicación de pintura en aulas, Instalación de paneles led en aulas, Se realiza instalación de marcos de puertas en aulas.
Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoría: Contratista:

- Miercoles, 17 de Abril 2024. Clima: Tiempo seco 24 Horas
Clima: 4 personas oficiales de obra, 1 Ayudante de obra, 1 Residente de Obra 1 Inspector de Obra, 1 SST, Interventoría, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST
Actividades: Se realiza picado en fachada, bloque salones, Instalación de puertas metalicas, y marcos Instalación de duro piso en bloques salones Instalación de persianas en aulas, Se realiza aplicación de pintura
Se realiza jornada de orden y Aseo en zona donde se ejecutan obras
Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoría: Contratista:

- Jueves, 18 de Abril 2024 Clima Tiempo seco 24 Horas.
Clima: 4 Oficiales de Obra civil, 2 Ayudante de obra, 2 Soldadores, 1 Residente 1 Inspector de Obra, 1 SST, Interventoría, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Se realiza filos en columnas antigua bodegas, Se realiza Embaquillado. e instalación de guarda escoba, Relleno de gravilla en boca puerta, Se inicia desmonte de ventanas en bloque salones
Se a realizo un (1) retiro de RCD's.
Observaciones y Notas:

Firmas: Interventoría: Contratista:

Powered by CamScanner

- Viernes, 19 de Abril de 2024

Clima: Tiempo seco 24 Horas.
Personal en Obra: 4 Oficiales de Obra civil, 1 Ayudante de Obra, 2 Soldadores, 1 Residente, 1 Inspector de Obra, 1 SST, Interventoria. 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Aplicación de pintura gris en bloque salones, se realizo pintura en viga de coronación en bloque salones, se realizan soldadura de perfiles metalicos para marcos de ventanas.
Se realizo recorrido de Obra comite No. 20.
Observaciones y Notas.

Firmas: Interventoria: Contratista:

- Sabado, 20 de Abril de 2024

Clima: Tiempo seco 24 Horas
Actividades:
Personal en Obra: Continua desmonte de marcos y ventanas en bloque aulas, se realizan soldadura, en armado de perfiles para marcos de ventanas.
Personal en Obra: 4 Oficiales 1 Ayudante, 2 Soldadores, 1 Residente de Obra 1 Inspector de Obra, 1 SST, Interventoria: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Firmas: Interventoria: Contratista:

- Domingo, 21 de Abril de 2024

Clima: Tiempo seco 24 Horas
Personal en Obra: 2 Oficiales, 2 Soldadores, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Interventoria: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Instalación de flautas faltantes en bajantes bloque administrativo Aplicacion de pintura en marcos ventanas, Instalación de marcos en ventanas bloque aulas.

Firmas: Interventoria: Contratista:

- Lunes, 22 de Abril de 2024

Clima: Tiempo seco 24 Horas.
Personal en Obra: 4 Oficiales, 2 Soldadores, 1 Instaladores de aluminio 1 Residente, 1 Inspector. 1 SST, Interventoria, 1 Residente, 1 SST, 1 Inspector.
Actividades: Inicio de filos en marcos de las ventanas bloque aulas Instalación de flautas de la bajante, Inicio de instalación ventaneria en bloque aulas, Aplicación de pintura en puertas bloques aulas
Observaciones y Notas: Interventoria hace la observación al contratista. CONSORCIO CLARIDAD, que las ventanas en aluminio quedo con luz en la parte de arriba.

Firmas: Interventoria: Contratista:

- Martes, 23 de Abril de 2024

Clima: Tiempo seco 21 Horas, lluvia suave 3 Horas.
Personal en Obra: 5 Oficiales, 1 Soldador, 1 Residente de obra, 1 Inspector 1 SST, Interventoria: 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Se realizo aplicacion de pintura en vanos de las ventanas Se dio inicio de sócalo gris en fachada, se realiza aplicacion de pintura en persianas.
Observaciones y Notas: Interventoria hace la observación al contratista que hay luz en las ventanas de aluminio de bloque aulas.

Firmas: Interventoria: Contratista:

- Miercoles: 24 de Abril de 2024

Clima:
Personal en Obra: 4 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Soldador, 1 Residente, 1 Electricista Inspector de Obra, 1 SST, Interventoria, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Se realiza, trasiego de arena, donde se aplica mezcla en puertas que se instalaron en los salones. Instalacion de ventaneria en bloque salones, se realizo corte de juntas en bloque bano para bajantes se realizo aplicación de pintura en fachada antiguas bodegas.
Observaciones y Notas:

Powered by CamScanner

Firmas Interventoria: Contratista:

- Jueves 25 de Abril de 2024.
Clima Tiempo seco 24 Horas.
Personal: 4 Oficiales, 2 Estructura metalica, 1 Instalador de ventanas. 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Obra, 1 SST, Interventoria 1 Residente, 1 Inspector 1 SST.
Actividades: Se realizo instalacion de persianas, se realizo pegue en parte de cuchillas fachada, se realizo ajuste de ventanas, en bloque aulas, se realizo limpieza e instalacion de tableros electricos llegan laminas superboard para cuchillas bloque administrativo.
Observaciones y Notas: Interventoria hace la observacion que algunas puertas de bloque aulas, presenta algunos detalles de pintura.
->2). El area de Seguridad y Salud en el Trabajo Interventoria dispende, las actividades que el contratista CONSORCIO CLARIDAD realizaba en fechas de hasta debido a que: - El personal no cuenta con examenes medicos con enfasis en Alturas. - Actualmente esta interventoria desconoce si el personal es idoneo para realizar labores en alturas, al momento de presentar certificados para labores en alturas. - El personal no cuenta con elementos de protección contra caidas, ni elementos de protección personal de acuerdo a la actividad realizada, ante ellos el caso de Seguridad con Barbuguejo. - No se encontro permisos de trabajo firmados por el Inspector SST o coordinador de trabajo en alturas. - Se evidencia que el andamio multidireccional no cuenta con los pines diagonales que hacen aporte estabilidad y seguridad - Altura de la actividad 5 mts Aprox. Milena Duque V. INTERVENTORIA SST.
— " — o — " — " — " —

Firmas: Interventoria: Contratista:

- Viernes, 26 de Abril de 2024.
Clima: Tiempo. Seco 24 Horas
Personal en Obra: 4 Oficiales de obra civil, 2 de Estructura Metalica, 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra, 1 Inspector, 1 SST.
Interventoria, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Actividades: Se realizo aplicacion de pintura en marcos de las ventanas, se inicia instalación de divisiones para oficinas con laminas superboard muro en bloque administrativo.

Firmas: Interventoria: Contratistas

- Sabado, 27 de Abril 2024.
Clima: Tiempo seco 24 Horas.
Personal: 4 Obra civil, 1 Ayudante de obra, 2 Electricos, 1 Residente de Obra, 1 Inspector de Obra, 1 SST, Interventoria, 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.
Actividades: Se realizo instalación de laminas de superboard. en divisiones bloque administrativo se realizo Desmonte de puertas de baños bloque administrativo.
Observaciones y Notas: Interventoria hace la observacion al contratista de Obra consorcio CLARIDAD, debido a que el momento de desinstalar las puertas, se quemo el enchape instalado en bloque administrativo.

Firmas: Interventoria: Contratistas:

- Domingo, 28 de Abril de 2024.
Clima: Tiempo seco 20 Horas, lluvia duro 4 Horas
Personal 2 Estructura Metalica, 2 Oficiales, 1 Residente, 1 Inspector 1 SST.
Actividades: Instalacion flautas de aguas lluvias, instalacion de rejas en ventanas, Instalación de vidrios en puertas, Pintura en estructura Metalica, Pintura en tuberia bajantes.

Firmas: Interventoria: Contratista:

- Lunes, 29 de Abril de 2024
Clima: Tiempo seco 24 Horas
Personal 4 Oficiales, 1 Ayudante, 1 Electrico, 1 Residente de Obra 1 Inspector, 1 SST Interventoria 1 Residente, 1 Inspector, 1 SST.

Powered by CamScanner

Actividades: Inicio de pañete en cuchilla fachada exterior Instalación de persianas en bloque aulas. Finaliza instalación de muro en Superboard en oficina de administracion

Firmas Interventoría: Contratista:

- Martes, 30 de Abril de 2024.
  Clima: Tiempo seco 24 Hrs.
  Personal en Obra: 4 Oficiales, 1 Ayudante, 1 de estructura metalica, 1 Residente de Obra, 1 Inspector, 1 SST
  Actividades: Macillado en muro Superboard bloque administrativo Continua pañete cuchilla fachada exterior, Instalacion de urdimbres en persianas.
  Notas y observaciones: Se realiza entrega de 4 aulas del bloque que se estaba interviendo. Se contó con la asistencia de Representantes de la IED, Rector Residente del Contratista y Residente de Interventoria

Firmas Interventoría: Contratista:

Powered by CamScanner

Colegio las Mercedes.

Constructor: Consorcio Claridad

Interventoria: CB Ingenieros.

Residente de obra: Guillermo velandia
Residente de Interventoria: Cristian Barragan
Oana Arqüello

Powered by CamScanner

Mes Abril de 2024
(IAS MERCEDES)


* Viernes 05 Abril 2024:
Clima: Seco 24 horas
Personal en obra: Inspector de obra, Inspector de Interventoria, SST, Conductor de obra
Actividades: llegada de material para obra cemento, Gracilla, Polisombra, Tablas barras de madera.
Firma Contratista: Interventoría: OCMA

* Sabado 06 de abril 2024:
Clima:
No se realizaron actividades, llegada de viaje de mixto
Firma: Contratista: Interventoría: OCMA

* Domingo 07 de Abril 2024:
Clima:
No se realizaron actividades.
Firma: Contratista Interventoría OCMA

* lunes 08 de Abril 2024:
Clima:
Personal: Inspector de obra, SST, 2 oficiales, 1 ayudante.
Interventoria: Residente de obra, Inspector, SST
Actividades: Demolicion de placa en patio comedor con taladro demoledor, Demolicion de placa Entrada
Observacion: se realizo un medio cerramiento en (S9) zona de Intervencio se hace la observación al contratista que lo mejore. para prevencion a personal externo a obra.
Firma Contratista Interventoría OCMA

* martes 09 de Abril 2024:
Clima:
Personal: 2 oficiales, 1 Ayudante, Inspector de obra, Interventoria Residente de obra, Inspector, 1 SST
Actividades: se realiza demolicion de placa patio en comedor el 20% se realiza acopio de RCDS se realizo Demolicion de piso de la cocina docentes y

Enchape de cocina docentes. Mamposteria de cocina.
Firma contratista  Interventoría Obra Á

* Miercoles 10 de Abril 2024:
Clima: seco 24 horas.
Personal: (2) 2 oficiales, 1 Ayudante, Inspector de obra 1 SST, Interventoria: Residente, Inspector de obra, SST
Actividades: Se realiza cerramiento perimetral en entrada de zona de Intervención, Demolicion de meson de cocina docentes. Se continua Demolición de placa en patio comedor un 80% Desmonte de ventana sala docentes. Inicio de demolicion de muro en sala docente Desmonte de cielo rezo en techo en sala docentes. Demolicción de Enchape baño docente.
Observación: 1- Poner (U) señalizacion usual donde se tenga el cerramiento 2- realiza Inducciones en SST y Ambiental 3- señalizar puntos de acopio de material y Rcds y cubrir 4- realizar protección de sumideros que se encuentran cerca donde se esta realizando actividades de obra 5 (real) Mantener los zonas verdes en buenas condiciones.
Firma: Contratista  Interventoría Obra Á

* Jueves 11 de abril 2024
Clima:
personal: 2 Oficiales, 1 ayudantes, Inspector de obra, SST.
Interventoria: Residente de obra, Inspector de obra, SST
Actividades. Demolición de Viga en patio comedor con Taladro demoledor, se realiza charla SST en obra.
(Firma contratista) (Interventoria)
Se realiza (2a) retiro de Rcds de donacion al colegio e comunidad.
Firma contratista  Interventoria: Obra Á

* Viernes 12 de Abril 2024
Clima:
Personal: 2 oficiales, Ayudante, 1 Inspector de obra, SST
Interventoria: Residente de obra, Inspector, (x) 1 SST
Actividades: Demolicion de viga en patio, Demolicion de viga, hiso ingreso de material: Geotextil y Cemento. Se realizo Trasiego de Rcds y acopio de Rcds.
Firma contratista  Interventoria. Diana A

* Sabado 13 de Abril 2024
Clima:
Personal: 2 oficiales, Ayudantes Inspector de obra,
Interventoria: Residente de obra, Inspector; SST
Actividades: Se continua con demolicion de placa en patio; se realiza Trasiego de Rcds. hacia punto de acopio.
Firma Contratista  Interventoria Diana A

* Domingo 14 de Abril 2024
Clima:
No se realizaron actividades.
Firma contratista  Interventoria. Diana A

* lunes 15 de Abril 2024
Clima:
Personal: 2 oficiales, 1 Ayudante, Inspector de obra, sst
Interventoria 1 Residente, Inspector, SST
Actividades: Continua Demolicion de vigas en patio y Trasiego de Rcds a punto de acopio.

(*) (Martes 16 de Abril)
Firma Contratista  Interventoria. Diana A

* Martes 16 de Abril del 2024
Clima:
Personal: 2 Ayudantes) oficiales, 1 Ayudante, Inspector de obra, SST, Interventoria: 1 Residente, Inspector, SST
Actividades: Se realiza Excavacion manual de material en patio, Trasiego de material de Excavación a punto de acopio, Se realiza retiro de (Vigas) Viga de Rcds.

Powered by CamScanner

de 7 m3, Continua demolicion de vigas faltantes en patio. Se realiza el segundo viaje de retiro de Rcds de 7 m3. se realiza Nivelación de excavación manual de 0.30 cm.
observación: se evidencia por parte de la interventor Estrato de tierra negra se hace la observación al contratista que debe excavar 0.10 cm mas.
Firmas Contratista [signature] Interventoría Diana Â

* (17) Miercoles 17 de Abril 2024
Clima:
Personal: 2 oficiales. 1 Ayudante. Inspector de obra, 1 SST, Interventoria: Residente, Inspector, 1 SST
Actividades: se continua con excavacion manual 50 cm hacia quitar Estrato de tierra negra
Observacion: El contratista hace saber a Interventoria de propuesta de esquera para fundir relleno compactacion y fundida de placa
(Jueves 18 de Abril de)
Firma Contratista [signature] Interventoría Diana Â
Jueves 18 de Abril de 2024
Clima
Personal: 2 oficiales, 1 Ayudante, Inspector, SST Interventor Residente, Inspector, SST
Actividades: Se continua con excavación manual de tierra negra, llegada de recebo b200 el dia de ayer. Se realiza Retiro de (Rcds) material tierra negra de excavacion de patio. llegada de malla (electrosoldada) electrosoldada.
Firma Contratista [signature] Interventoría. Diana Â





* Viernes 19 de Abril 2024
Clima:
personal: 2 oficiales, 1 Ayudante, Director de obra, Inspector de obra, 1 SST Interventoria: Residente de obra, Inspector de obra, SST
Actividades: Se continua excavacion manual de tierra negra se da aprovacion por parte de Interventoria esquema para relleno de materiales instalación de (polietileno), y fundida de placa esquema: Rajon sellado con subase de 0.20cm capa de B200 de 0.30cm (Placa de concreto de 2500) Polietileno placa de concreto de 0.10. llegada de Piedra Rajon
Firma contratista Interventoria. OBRA A
* (20) Sabado 20 de Abril 2024
Clima:
personal: 2 oficiales, 1 Ayudante, Inspector de obra, SST, Interventoria: Inspector de obra, R. SST
Actividades: Se realiza relleno de piedra rajon en patio Trasiego de piedra rajon hacia relleno de patio
Firma contratista Interventoria. OBRA A
* Domingo 21 de Abril del 2024
Clima:
No se realizaron actividades:
Firma contratista Interventoria. OBRA A
* lunes 22 de Abril del 2024
Clima:
personal. 2 oficiales, 1 Ayudante, Inspector de obra, SST Interventoria Residente de obra, Inspector de obra, SST
Actividades: Continua con excavacion manual con relleno de piedra rajon en patio.
Firma contratista Interventoria OBRA A

* Martes 23 de Abril del 2024
Clima:
personal: 7 Oficiales 1 Ayudante Inspector de obra Interventoria Residente, Inspector, SST
Actividades: se finaliza el 100% de relleno de piedra rajon. se realiza sello de rajon en subase granular.
Firma contratista  Interventoría: Diana A

* Miercoles 24 de Abril del 2024
Clima:
Personal 7 Oficiales, 1 Ayudante, Inspector Tecnico de obra 1 SST Interventoria; Residente de obra, Inspector de obra, SST.
Actividades: Se realiza conformacion y compactacion de material en patio. Se realizo figurado de acero para carcamo. Se realizo compactacion con maquina compactadora (rana).
Firma contratista  Interventoría Diana A

* Jueves 25 de Abril del 2024
Clima:
Personal: 7 oficiales, 1 Ayudante, Inspector Tecnico de obra Interventoria, Residente de obra, Inspector de obra, SST
Actividades: se continua con relleno de base en patio. Excavacion manual de (00) zanja para carcamo. llegada de viaje de material B200. llegada de Trompo mezclador para futura fundida de placa en patio. llegada de Tuberia hidraulica para (instalacion) instalación en cocina. Instalacion de acero para fundida de carcamo. inicio de mezclado para fundida de poled (s (interna de carcamo) Piso de carcamo.
Firma contratista  Interventoría Diana A

/ / /

* Viernes 26 de Abril del 2024
Clima:
Personal 2 oficiales, 1 Ayudante, Inspector de obra, SST
Interventoria: Residente, Inspector de obra, SST
Actividades: Engrafado de carcamo para Fundida de pared interna y Terminacion de correcciones al lado del carcamo. Firma: Contratista  Interventoría Olaya
* Sabado 27 de Abril del 2024
Clima:
personal: 2 oficiales, 1 Ayudante, Inspector de obra, SST
Interventoria: Inspector Tecnico de obra, SST.
Actividades: Fundida de pared interna del carcamo en pedio mezclado con trompo (en) para Fundida de pared interna de carcamo.
Firma Contratista  Interventoría Olaya
* Domingo 28 de Abril del 2024
Clima:
No se realizaron actividades.
Firma Contratista  Interventoría Olaya
* Lunes 29 de Abril del 2024
Clima:
Personal: 2 oficiales, 1 Ayudante, Inspector de obra SST. Interventoria: Residente de obra, Inspector, SST
Actividades: Instalacion de malla electrosoldada y poliuretano. Inicio de mezclado con trompo para Fundida de placa en patio de 0.10cm fueron un 20% de placa.
Firma Contratista  Interventoría. Olaya
* Martes 30 de Abril del 2024.
Clima:
personal: 2 oficiales, 1 Ayudante, Inspecto de obra, SST
Interventoria: Residente, Inspector, SST
Actividades: se realizo mezclado en trompo para Fundida del otro 20% de la placa, inicio de Fundida de placa 20% de patio
Firma Contratista  Interventoría Olaya

BITÁCORA DE OBRA

JUAN DE LA CRUZ VARELA – LA UNIÒN SEDE A

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5.

No se realizaron actividades, se hubieo Compensado Tiempo para descanso por ser semana Santa
Firma Contratista Interventoria
Domingo 31 de Marzo 2024
No se realizaron actividades, dia Festivo
Firma Contratista Interventoria
Lunes 01 de Abril 2024
Personal de obra: 1 SST, 1 Inspector interventoria, 1 Maestro de obra, 3 Ayudantes de obra.
EQuipos: NA
Actividades: se realiza retiro de pañete en baño Enfermeria, se realiza retiro de RED baño Emisora, se realiza Picado de muro y retiro de pintura en baño apto #2, se realiza pañete de muros blogue Emisora, apto 1, 2 y Muro divisorio. se realiza Trasiego de Arena Amarilla para pañete.
Clima: Tiempo seco
Firma Contratista Interventoria
Martes 02 de Abril 2024
Personal de Obra: 1 SST, 1 Residente de obra, 1 Inspector interventoria, 1 Maestro, 3 Ayudantes de obra
EQuipos: NA
Actividades: se realiza pañete de muro frente a garita de seguridad y se realiza afinado se realiza Pañete en apto #2 baño, muro divisorio y entrada, se realiza afinado, se realiza pañete en frente de Enfermeria y se realiza afinado, se realiza Trasiego de arena Amarilla Para pañete.
Clima: Se presentan lluvias suaves despues de las 2:50 PM.
Firma Contratista Interventoria
Miercoles 03 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Residente de obra, 1 Apoyo ingeniero 1 SST, 1 Inspector Interventoria.
EQuipos: 1 Camión
Actividades: se realiza pañete de muro baño enfermeria

se realiza afinado de muro en sala emisora, se realiza Trasiego de Arena para pañete, se realiza corte con Pulidora en piso pasillo emisora, se realiza excavacion manual en piso pasillo frente a emisora, se realiza nivelación de piso en pasillo frente a emisora.
Clima: se presentan lluvias suaves y fuertes durante el dia.
Firma Contratista Interventoria
Jueves 04 de Abril 2024
Personal de obra: Residente de obra, 1 Residente Interventoria Apoyo ingeniero, 1 SST, 1 Inspector Interventoria, 2 Maestro de obra, 2 Ayudantes de obra.
EQuipos: Mezclador 1
Actividades: se realiza pañete de baño en emisora, se realiza afinado de muro en Aula #1 blogue Emisora se realiza Fundida de Rampa en medio de salones Frente a blogue Emisora, se realiza Fundida de Rampa en pasillo emisora, se realiza Mezclado y trasiego de concreto para Fundida, se realiza demolicion de muro de puerta en apto #1 Emisora, se realiza recorrido de obra Contratista, Interventoria
Clima: se presentan 2 horas de lluvias suaves
NOTA: El RESIDENTE DE INTERVENTORIA hace las siguientes observaciones.
- se evidencia que la placa de contrapiso del blogue Emisora esta Nivelada por lo que no se nesecitara alistado de piso para la instalación del durapiso.
- se evalvara la posibilida de demoler el pañete existente de los muros viejos de blogue Emisora Puesto que presentan problemas de Nivelación
- se solicita al contratista de obra intervenir la parte posterior del blogue Almacén para el manejo de aguas, se debera retirar primero el escombro que se encuentra allí.
- se observa que aun falta por terminar la estructura metalica del blogue Almacen, Puesto

Powered by CamScanner

que aún no se an instalado los elementos metalicos que amarraran la estructura metalica al portico existente del blogue.
- se solicito al contratista hacer los apiques en el blogue Almacen para garantizar que existen columnas y vigas de amarre. donde iran los soportes de la estructura, de igual manera se solicito la entrega de planos para revisar la estructura del blogue Almacen y blogue Emisora garita seguridad.
- En los baños se evidencia que los Agujeros de los mesones de policuarzo no coinciden con los Agujeros de los desagues sanitarios y los puntos de Agua potable, se evidencia que la junta de los meson en baño de niños se ve muy mal y se solicita corregir
- Aun no se an corregido las baldosas de granito en el pasillo baño niños y niñas.
- No se a echo la correccion del anden frente alos baños niños y ~~[illegible]~~ ajuste de resillas cargamo.

Firma Contratista [signature] Interventoria [signature]

Viernes 05 de Abril 2024
Personal de Obra: Residente de obra, 1 SST, 1 inspector Interventoria, 2 Maestros de obra, 2 Ayudante de obra.
EQuipos: NA
Actividades: se realiza pañete de muro en baño enfermeria, se realiza pañete de muro en entrada a enfermeria, se realiza pañete en muro entrada a apartamento #2 se realiza demolicion de placa para caja frente almacen, se realiza excavación manual de caja y sunja para conexion de aguas lluvias frente a almacen, se realiza armado de testero para fundida de caja, se realiza instalación de malla electrosoldada en caja, se realiza instalación de tuberia 4" conexion Aguas lluvias.
Clima: se presentan 3 horas de lluvias suaves

Firma Contratista [signature] Interventoria [signature]

Sabado 06 de Abril 2024
Personal de Obra: 1 SST, 1 inspector Interventoria, 2 Maestros de obra, 1 Ayudante, 1 Ayudante cubierta
EQuipos: 1 Camión
Actividades: Se realiza descargue de Materiales para Cubierta, se realiza mamposteria de blogue apto #1 blogue Emisora, se realiza Fabricación de teja en el cuarto donde se trajo el material, y la teja se ingreso al colegio.
Clima: se presentan lluvias suaves durante el dia
Firma Contratista [signature] Interventoria [signature]
Domingo 07 de Abril 2024
Personal de Obra: 1 SST, 1 inspector Interventoria, 1 Maestro de obra, 1 Ayudante de obra.
EQuipos: NA
Actividades: se realiza mocheta de blogue en baño apto #2, se realiza mamposteria de blogue apto #1 Emisora muro perimetral
Lunes 08 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Residente de obra, 1 Apoyo ingeniero 1 SST, 1 inspector Interventoria, 2 Maestro de obra 3 Ayudante de obra.
EQuipos: 1 Mezclador, volqueta 1 Arena, RCD cargue
Actividades: se realiza afinado de muros en apto #2, pegada de blogue Division cocina Comedor apto #2, Fundida de caja Frente a almacen se realiza picada de muro entrada a emisora, se realiza sacado de filas apto #2, Reseta para soportes de estructura blogue Almacen se realiza descargue de Arena Amarilla, se realiza cargue de RCD, se realiza Mezclada para Fundida de caja polideportivo Almacen, se realiza trasiego de concreto.
Clima: Tiempo seco
Firma Contratista [signature] Interventoria [signature]
Martes 09 de Abril 2024
Personal de obra: 1 SST, 1 inspector Interventoria.

Powered by CamScanner

2 Maestros de obra, 1 Ayudante de obra.
EQuipos: 1 Mezclador, 1 Camión paneles Metalicos
Actividades: Se realiza cargue de sobre piso en aula #1, Emisora, Enfermeria, se realiza Mezclado de Mortero y trasiego para cargue de piso, se realiza instalación de griferia baño niños y niñas se realiza orden y Aseo.
Clima: Tiempo Seco
Firma Contratista Interventoria
Miercoles 10 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Recidente de obra, 1 SST, 1 Inspector Interventoria, 2 Maestros de obra, 3 Ayudante de obra.
EQuipos: NA
Actividades: Se realiza Pañete de cajas Inspección atras de vivienda de docentes, se realiza Pañete de Cajas Frente a almacen, se realiza pañete de muros para nivelar paredes en bloque Emisora, se realiza instalación de griferia baño niños y niñas, se organiza cerramiento entrada almacen y polideportivo.
Clima Tiempo Seco.
NOTA: Ingreso Recidente de interventoria.
Firma Contratista Interventoria
Jueves 11 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Recidente de obra, 1 SST, 1 Inspector Interventoria, 2 Maestros de obra, 3 Ayudantes de obra
EQuipos: NA
Actividades: Se realiza arreglo de piso granito frente a baño de niñas, se realiza pañete y afinado de vigas, Sacado de Filos, bloque Emisora, Arreglo de Tuberia desagüe lavamanos baño de niñas y Tuberia conexion Agua potable, se realiza picado de muros para pañete bloque Emisora.
Clima Tiempo Seco
Firma Contratista Interventoria
Viernes 12 de Abril 2024
Personal de obra: 1 SST, 1 Inspector de obra Interventoria

Maestro de obra: 2, 3 Ayudantes de obra
EQuipos: NA
Actividades: Se realiza picado de muros para pañete bloque Emisora, se realiza Pañete y Afinado de vigas y sacado de filos bloque Emisora.
Clima Tiempo Seco
Firma Contratista Interventoria
Sabado 13 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Recidente de obra, 1 SST, 1 Inspector Interventoria, 1 Soldador, 1 Ayudante, 2 personas destronque de piso granito.
EQuipos: 1 EQuipo de Soldadura, 1 Destroncador de Piso granito
Actividades: Se realiza resoldada de estructura bloque Emisora, se realiza pañete en boca puerta Aula #1 bloque Emisora, se realiza pulida y brillado de piso granito baño niños y niñas.
Clima: Tiempo Seco
NOTA: EL RECIDENTE DE INTERVENTORIA le habia hecho la solicitud al contratista de hacer el destronque de piso de granito y pulida de Media Caña se evidencia que Trajeron fué una maquina brilladora. se habia solicitado hacer la corrección en la unión del lavamanos de policuarzo en baño de niños y se evidencia que no sea realizado se nota mucho la unión de los dos morteros.
Firma Contratista Interventoria
Domingo 14 de Abril 2024
Personal de obra: 1 SST, 1 Inspector Interventoria 2 oficial piso granito, 1 Ayudante de obra.
EQuipos: brilladora de piso.
Actividades: Se realiza pulida y brillado de Media caña y piso de granito baño niños y niñas.
Clima: Tiempo Seco
Firma Contratista Interventoria
Lunes 15 de (Marzo) 2024 Abril
Personal de obra: 1 SST, 1 Inspector interventoria

Powered by CamScanner

Soldador 1, Ayudante de obra 1
EQUIPOS: NA
Actividades: se realiza aseo en baño niños y niñas, Se realiza armado de soportes para estructura se realiza soldadura de soportes en estructura bloque Emisora
Clima: Tiempo seco
Firma Contratista [illegible] Interventoria [illegible]
Martes 16 de (Marzo) 2024 Abril
Personal de Obra: Residente de obra 1, Residente e Interventoria SST 1, 1 inspector Interventoria, 1 Soldador, 2 Ayudante
EQUIPOS: Equipo de soldadora 1, 1 camión
Actividades: se realiza Entrega de perfiles para soportes de canal, se realiza orden y aseo, se realiza arreglo de cerramientos, se organiza Material de obra, se realiza descargue de camión y trasiego de Materiales, se realiza recorrido de obra, se realiza reunion con el colegio, comunidad, SED, Consorcio claridad, Interventoria.
Clima: Tiempo seco
Nota: se realizo entrega de los baños niños y niñas, pasillo de escaleras y escaleras junto a baño de niñas quedando como observacion:
- baranda baño niños y niñas Movilidad Reducida
- instalacion lámpara Hermetica baño niñas
- soporte division Orinales baño niños
- cambio de arbol baño de niñas
- 3 y 4 escalón en escaleras presenta acumulamiento de agua.

Firma Contratista [illegible] Interventoria [illegible]
Miercoles 17 de (Marzo) 2024 Abril
Personal de obra: Residente 1, SST 1, 1 inspector interventoria Soldador 1, Ayudante de obra 1
EQUIPOS: Equipo soldadora 1
Actividades: se realiza armado y soldadura de soportes de canal, se realiza organizacion de cerramientos

Se realiza arreglo de lavamanos en baño niños y niñas, se realiza orden y aseo
Clima: Tiempo seco
Firma Contratista [illegible] Interventoria [illegible]
Jueves 18 de (Marzo) 2024 Abril
Personal de obra: 1 Residente de obra, 1 SST, 1 inspector Interventoria, 2 soldador, 2 Ayudante
Equipo: Equipo de soldadura 1
Actividades: se realiza soldadura de perfil tipo C bloque Emisora. Armado de soporte para canal. demolición de piso granito Emergencia, Fuga de Agua Emergencia Rectoria.
Clima: Se presentan lluvias viernes 1 hora
Firma Contratista [illegible] Interventoria [illegible]
Viernes 19 de Abril 2024
Personal de obra: 1 SST, 1 inspector Interventoria, 2 soldadores, 2 oficial de obra, 2 Ayudante de obra
EQUIPOS: Compresor 1, Equipo soldadura 1
Actividades: se realiza atención de Emergencia Rectoria arreglo de escape de agua, arreglo de piso granito, arreglo de guarda escoba, resane de muro, pegada de baldosa en baño de niñas, instalacion de accesorios lavamanos Mamposteria perimetral bloque Emisora Entrega de soportes de canal soldadura perfil tipo C.
Clima: se presentan lluvias durante el dia 5 horas
Firma Contratista [illegible] Interventoria [illegible]
Sabado 20 de Abril 2024
Personal de obra: 1 SST, 1 inspector Interventoria, 2 soldador 2 oficial, 2 Ayudante.
EQUIPOS: Equipo de soldadura 2
Actividades: Mamposteria perimetral bloque Emisora, Soldadura de soportes para canal Emisora, Armado de canal para bloque Emisora. Trasiego de arena para pegada de bloque, Armado de bolardo
Clima: se presentan lluvias durante el dia.
Firma Contratista [illegible] Interventoria [illegible]

Powered by CamScanner

21 de abril 2024 (Sabado) Domingo
Personal de obra: 1 SST, 1 inspector Interventoria
2 soldador, Oficial 1, 1 Ayudante
EQuipos: 1 Compresor, 1 Equipo Soldadora
Actividades: Se realiza armado de canal, se realiza
Pintura de soportes para canal, se realiza
Manposteria de bloque Perimetral Emisora.
Clima: Tiempo Seco, se presentan lluvias durante el dia
Firma Contratista Interventoria
(Domingo) 22 de Abril 2024 (Lunes)
Personal de obra: Residente de obra 1, 1 inspector Interventoría
Soldador 2, Maestro de obra 1, Oficial 2, Ayudante de obra 2
EQuipos: Camión Cemento
Actividades: Se realiza Pintura de canal anticorrosivo y
Pintura 3 en 1 canales Almacen bloque Emisora, se
realiza trabajo bloque perimetral Emisora, se
realiza Pañete Perimetral bloque Emisora, se realiza
desmontaje de ventana baño Emisora, se realiza
Manposteria en baño ventana Emisora, se realiza
pañete en baño ventana Emisora.
Clima: Se presentan lluvias durante el dia 4 horas
Firma Contratista Interventoria
(Lunes) 23 de Abril 2024 Martes
Personal de Obra: Residente de obra 1, inspector Interventoria
2 Soldador, 1 Maestro de Obra, 2 Oficial de obra, 2
Ayudante de obra.
EQuipos: Compresor 1, Equipo Soldadora 1
Actividades: Se realiza Pintura de canal anticorrosivo
y Pintura 3 en 1 canales Almacen, bloque Emisora, se
realiza bloque Perimetral Emisora, Pañete Perimetral
bloque Emisora, se realiza desmontaje de ventana
baño Emisora, se realiza Manposteria en ventana
Emisora, se realiza pañete ventana Emisora
Clima: Se presentan lluvias durante el dia
Firma Contratista Interventoria

(Martes) 24 de Abril 2024 Miercoles
Personal de obra: Residente de obra, inspector Interventoria, 2
Soldadores, 1 Maestro de obra, 2 oficial de obra, 3 Ayudante obra
EQuipos: Compresor 1, Equipo Soldadora 1
Actividades: Armado de canal, instalación de canal Almacen
bloque Emisora, Pintura 3 en 1 en canales, Pañete de
bloque perimetral Emisora, Consolidación de Medidas
Interventoria, Contratistas.
Clima: Se presentan lluvias durante el dia 4 horas
Firma Contratista Interventoria
(Miercoles) 25 de Abril 2024 Jueves
Personal de Obra: Residente de obra, SST, Inspector Interventoria
1 Maestro de obra, 2 oficial de obra, 3 Ayudante de obra
EQuipos: NA
Actividades: se realiza pañete bloque perimetral Emisora
se realiza Picado de vigas, se realiza pañete de viga
Emisora, se realiza orden y Aseo, se realiza organiza-
cion de cerramientos, se realiza trasiego de Arena
Amarilla para pañete.
Clima: Seco
Firma Contratista Interventoria
(Jueves) 26 de Abril 2024 Viernes
Personal de Obra: 1 Residente, 1 SST, Inspector interventoria
Soldador 2, 1 Maestro de obra, 2 oficial de obra
3 Ayudante de obra.
EQuipos: Camión perfiles, super board.
Actividades: se realiza armado de canal Emisora
instalacion sosco en canal Emisora, Pintura 3 en 1, Pañete
viga Perimetral Emisora, Pañete Perimetral bloque Emisora
consolidacion de Medidas interventoria, Residente de obra
descargue de Materiales Camión. Perfiles, super board
Clima: Se presentan lluvias durante el dia 5 horas.
Firma Contratista Interventoria
(Viernes) 27 de Abril 2024 Sabado
Personal de obra: Residente obra, SST, Inspector Interventoria
2 Soldador, 1 Maestro de obra, 2 oficial de obra, 3 Ayudantes obra

Powered by CamScanner


EQUIPOS: Compresor pintura 1, Equipo soldadura 1
Actividades: se realiza pintura 3 en 1 en estructura bloque Emisora, se realiza instalacion de soscos de cunal Emisora, se realiza pañete de bloque perimetral Emisora, se realiza enchape de piso duro piso enfermeria se realiza picado de viga y pañete de viga perimetral Emisora.
Clima: Tiempo seco medio dia y lluvias despues del Medio dia 5 horas.
Firma Contratista Interventoria
28 de Abril 2024 Domingo
Personal de obra: Recidente de obra, inspector Interventoria, 2 soldador, 1 Maestro, 2 oficiales de obra, 1 Ayudante de obra.
EQUIPOS: NA
Actividades: Pintura 3 en 1 estructura bloque emisora, instalación de soscos bloque Emisora, enchape enfermeria duro piso, pañete bloque perimetral Emisora.
Clima: Tiempo lluvioso 5 horas durante el dia
Firma Contratista Interventoria
Lunes 29 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Residente de obra, 1 Residente Interventoria, 1 SST contratista, 1 SST Interventoria, 1 inspetor Interventoria 2 Soldador, 1 Maestro de obra, 2 Oficial de obra, 3 Ayudantes
EQUIPOS: NA
Actividades: Pintura 3 en 1 perfil metalico Almacen pañete viga perimetral bloque emisora, pañete perimetral bloque emisora interno, pañete fuente emisora regata de piso apto #1, 2 conexión desague, se realiza apertura de ventana baño apto #1 emisora, se realiza trasiego de Arena amarilla para pañete, se realiza pañete en baño emisora ventana.
Clima: se presentan lluvias durante el dia 5 horas.
Firma Contratista Interventoria
Martes 30 de Abril 2024
Personal de obra: 1 Residente obra, 1 SST, 1 inspector

Interventoria, 1 Maestro de obra, 2 oficial obra, 4 ayudantes de obra
EQUIPOS: NA
Actividades: pañete Frente de bloque emisora, pañete interno bloque emisora, orden y aseo en punto de acopio sacado de filos, instalacion de tuberias hidraulicas, arreglo de ceramientos, trasiego de RCD, Regatas instalacion Agua potable conexión Sanitaria bloque emisora instalación de tuberias para lavaplatos, lavadero, lavamanos, inodoro.
Clima: Tiempo seco
Firma Contratista Interventoria
Miercoles 1 de Mayo 2024
Personal de obra: 1 Residente de obra, 1 inspector Interventoria 1 SST contratista, 1 Maestro, 2 oficial, 3 Ayudante de obra, 1 Soldador, 2 electricos.
EQUIPOS: 1 compresor pintura, 1 equipo soldadura
Actividades: Pintura 3 en 1 en Aleros, soldadura de Aleros bloque garita, instalacion de tuberia PPH cajas bloque emisora Aula #1, emisora enfermeria, baño y sala pañete fuente a emisora, pañete interno bloque emisora sacado de filos, demolicion de anden atras de salones polideportivo, excavación manual de zapatas atras del bloque salones polideportivo, corte de Acero y figurado de Acero para zapatas bloque salones Amarre y Armado de parrillas para zapatas.
Clima: Tiempo seco.
Firma Contratista Interventoria
Jueves 02 de Mayo 2024
Personal de obra: 1 Residente de obra, 1 SST contratista, 1 inspetor Interventoria, 1 Maestro de obra, 2 oficial de obra 4 Ayudante de obra, 2 soldador, 2 electricos.
EQUIPOS: Compresor pintura, Equipo soldadura
Actividades: pañete de viga perimetral bloque emisora pañete interno bloque emisora, enchape duro piso sala emisora, emisora, picado de viga bloque emisora demolicion de anden atras de salones polideportivo trasiego de RCD Sacado de filos bloque emisora

Powered by CamScanner

J. Programación general

Id	ED	Modo de tarea	ite	Nombre de tarea	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1	**1**			**I.E.D GENERAL**	**$ 7.608.734.174,00**	**182 días**	**30/10/23**	**29/06/24**
2	1.1			INICIO OBRA	$ 0,00	0 días	30/10/23	30/10/23
3	1.2			IED USMINIA	$ 349.948.209,00	92 días	30/10/23	29/02/24
4	1.3			IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B	$ 542.722.842,00	60 días	30/10/23	20/01/24
5	1.4			IED CHUNIZA	$ 236.826.369,00	92 días	31/10/23	1/03/24
6	1.5			IED FERNANDO GONZALEZ OCHOA	$ 353.157.411,00	92 días	31/10/23	1/03/24
7	1.6			DILE SUMAPAZ	$ 15.242.011,00	50 días	7/11/23	16/01/24
8	1.7			IED CAMPESTRE JAIME GARZON AURA	$ 750.000.000,00	92 días	7/11/23	8/03/24
9	1.8			IED GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA - LA UNION	$ 811.831.873,00	90 días	7/11/23	6/03/24
10	1.9			VIVIENDA DOCENTE CAMPAMENTO	$ 411.446.316,00	90 días	8/11/23	7/03/24
11	1.1			IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE C	$ 344.210.600,00	90 días	20/02/24	19/06/24
12	1.1			IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A	$ 253.419.631,00	60 días	1/12/23	20/02/24
13	1.1			CED SAN JOSE DE USME SEDE A - DON BOSCO 2	$ 635.259.722,00	90 días	29/02/24	29/06/24
14	1.1			IED CAMPESTRE JAIME GARZON - RAIZ	$ 210.861.638,00	89 días	1/03/24	29/06/24
15	1.1			IED CAMPESTRE JAIME GARZON - TOLI	$ 337.709.778,00	92 días	27/02/24	29/06/24
16	1.1			IED CAMPESTRE JAIME GARZON - ERASMO VALENCIA	$ 799.914.269,00	90 días	16/01/24	11/05/24
17	1.1			IED CAMPESTRE JAIME GARZON - TUNAL ALTO	$ 599.909.029,00	86 días	6/03/24	29/06/24
18	1.1			RURAL DE LAS MERCEDES	$ 447.180.697,00	89 días	1/03/24	29/06/24
19	1.1			EMERGENCIAS	$ 509.093.779,00	182 días	30/10/23	29/06/24

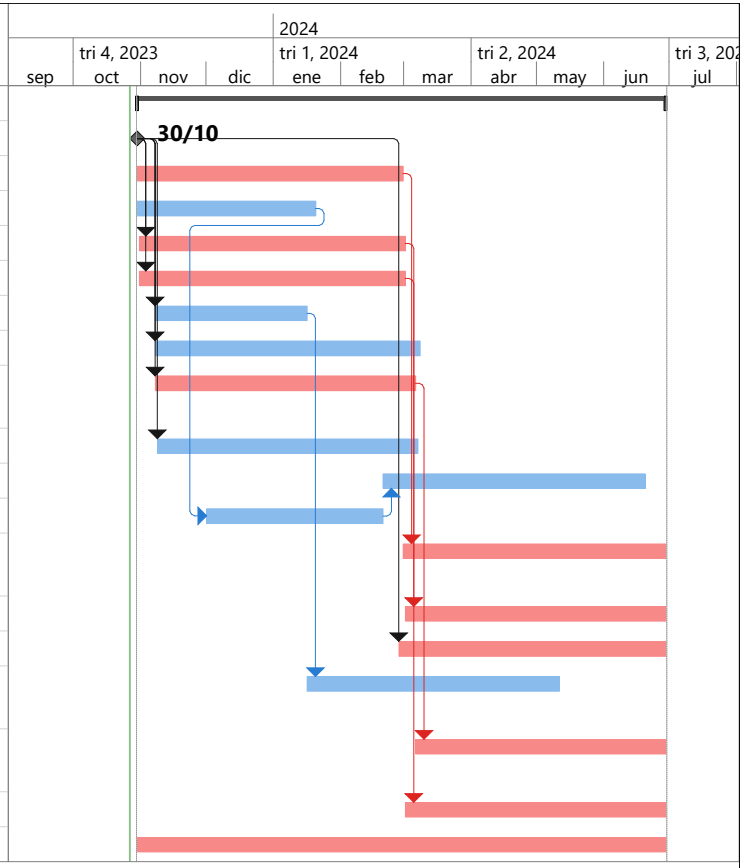

Proyecto: Caisson Universidad D
Fecha: 27/10/23

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica		
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso		
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual		
Resumen	solo duración	Hito externo			
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite			
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas			

K. Informes diarios

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 73 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 01-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aguas

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		los dias 28, 29, 30, 31 No se realizo actividades dias festivos y descanso semana santa
Inspector	0	1			
P. Cubierta	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo instalación de canal en laboratorio, se realizo subida de Teja para Cubierta, se realizo instalación de Teja Cubierta primera capa laboratorio

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSAORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 74 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 03-04-2022 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón Los Arcos

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		el dia: 2 NO se realizo actividades
SST	1	0			
P. Cubierta	4	0			
Inspector	0	1			
Apoyo ingeniero	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	7	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA	
TIEMPO SECO	20
LLUVIA SUAVE	4
LLUVIA FUERTE	

OBSERVACIONES:

se presentan lluvias suaves durante el dia

EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
NA		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza subida de teja para cubierta laboratorio
se realiza instalacion de cubierta laboratorio, se realiza instalacion de canal bloque administracion
se realiza pintura anticorrosivo en canales. se realiza charla de seguridad y salud en el trabajo
se realiza consolidacion de medidas Emergencia

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOS A ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 75 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 04-04-2022 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aguas

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Obaervaciones
	Contratista	Interventoria			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
Residente	0	1			
Inspector	0	1			
P. Cubierta	5	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	2	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	18	NA		
LLUVIA SUAVE	6			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentan lluvias continuas durante la mañana				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza armado de canal, se realiza instalación de canal biblioteca #2, se realiza instalación de soscos y conexión a bajante, se realiza subida de teja a cubierta biblioteca, se realiza instalacion de cubierta en biblioteca #2

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 76 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 6	FECHA 05-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aguas

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
Inspector	0	1			
P. Cubierta	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA	
TIEMPO SECO	21
LLUVIA SUAVE	3
LLUVIA FUERTE	

EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
NA		

OBSERVACIONES:

se presentan lluvias suaves durante el dia

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza instalación de cubierta laboratorio
se realiza armado de canal, se realiza instalación de canal bloque laboratorio interno
se realiza subida de canal al bloque laboratorio

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLOSAORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 77 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NEGECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 06-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aguas

PERSONAL CONTRATO OBRA Y INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
inspector	0	1			
P-Cubierta	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCION	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza instalación de cubierta bloque laboratorio primera capa

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 78 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 07-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aguas

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza instalación de piso vinisol Tipo puzzle Salón preescolar Emergencia

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 79 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 09-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Auras

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Apoyo ingeniero	1	0	NH		el dia 08 no se realizaron actividades.
Inspector	0	1			
P. cubierta	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Camion	1	Bloque, cemento estuco
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza instalacion de cubierta segunda capa modulo laboratorio, se realiza instalación de Tapas en Acero inoxidable para cercano en cozina Emergencia, se realiza descargue de Materiales camión, cemento, bloque, estuco.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No 80 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 10-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aguas

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	0	1	NA		
Apoyo ingeniero	1	0			
Inspector	0	1			
P. Cubierta	2	0			
Electrico	2	0			
Maestro	2	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
TOTAL	10	2	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza instalacion de cubierta segunda capa bloque laboratorio, Se realiza raspado de pintura y estuco de paredes, se realiza encorote, vigas perimetrales, se realiza instalacion de tuberia y cajas emt para luminarias Biblioteca modulo 1, 2

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 81 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 11-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón los Arces

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Apoyo Ingeniero	1	0	NA		
Inspector	0	1			
P. Cubierta	2	0			
Maestro	2	0			
Ayudante	1	0			
Electricos	2	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	8	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

instalacion de cubierta bloque laboratorio segunda capa, Raspao de pintura y estucado de paredes bloque biblioteca.
instalacion de tablero monofasico, para punto electrico aulas, salones, biblioteca

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 82 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 12-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón (a) Aures

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
Inspector	0	1			
P. Cubierta	3	0			
Maestro	1	0			
Ayudante	1	0			
Electricos	2	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	8	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza instalación de cubierta primera capa bloque administración y raspao de pintura y estuco de paredes bloque biblioteca, salones primer piso area ducto de bajante area Tarima luminarias, conformación de escorace vigas perimetrales Bloque biblioteca modulo #1, Demontaje luminarias Tarima, instalacion de tuberia emt salón segundo y Tarima

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 83 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 13-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Auras

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
Inspector	0	1			
P. Cubierta	5	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza instalación de cubierta segunda capa modulo administración

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTY TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 84 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 14-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aulas

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
Inspector	0	1			
P. Cubierta	5	0			
Oficial	3	0			
Encargada	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	10	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de cubierta segunda capa Modulo administración, Resane y estuco, pintura de muros Aulas biblioteca, salón preescolar

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 85 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 15-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Auras

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
Inspector	0	1			
P. cubierta	3	0			
Electricos	2	0			
Oficial	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	9	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza instalación de cubierta bloque administración segunda capa. Se realizan trabajos electricos en biblioteca 1, 2, Salón 1, 2, se realizan Resanes de estuco y pintura en biblioteca

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTY DOS ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 86 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 16-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aguas

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	0	1	NA		
Apoyo ingeniero	1	0			
SST	0	1			
Inspector	0	1			
Electrico	2	0			
P. Cubierta	3	0			
Oficial	3	0			
	0	0			
TOTAL	9	3	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza desmontaje de cubierta bloque laboratorio
Se realiza desmontaje de luminarias bloque laboratorio
Se realiza estuco y pintura biblioteca, salón 2, se realiza ajuste de cubierta biblioteca, salón 1, 2
Se realiza instalación de flanches cubierta biblioteca salón, 1, 2. Se realiza pintura de canales, se retira Material sobrante de las cubiertas

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 87 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 17-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aves

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Oficial	3	0			
Electricos	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	7	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

estuco de antepechos Tarima e. Imprimación con impermeabilizante. Impermeabilizacion de muros ductos Salón primer Piso aula Jardin, Aplicación de pintura interior Salón preescolar primera capa Modulo 1 biblioteca, Desmontaje de cubierta bloque carnicos.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTY OLOS A ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 88 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 18-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Auras

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Oficial	5	0			
Electricos	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	9	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Camión	1	insumos electricos
LLUVIA SUAVE				Pintura, laminas
LLUVIA FUERTE				superboard, estuco
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Suministro y aplicacion de pintura exterior fachada estuco de ductos, salón primer piso preescolar Modulo 1 biblioteca, instalacion de Tuberia y puntos electricos laboratorio

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 89 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 19-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aguas

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Apoyo ingeniero	1	0	N A		
inspector	0	1			
Oficial	5	0			
Electricos	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	9	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	19	NA		
LLUVIA SUAVE	5			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Suministro y aplicación de pintura exterior antepecho bloque laboratorio y Hall de ingreso Salones, Biblioteca estucado de columnas Aplicación de pintura y remates biblioteca. Pintura de guarda escoba en esmalte blanco salón biblioteca, instalación de tuberia y puntos electricos laboratorio y carnicos

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLOS ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 90 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 23-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón Los Arces

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		los dias 20, 21, 22 No se realizo actividades en obra
inspector	0	1			
Oficial	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	21	NA		
LLUVIA SUAVE	3			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentaron lluvias suaves durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza armado de andamio Certificado para pintura bloque administracion, se realiza raspado de pintura preescolar #2, se realiza aplicacion de acrovinil preescolar #2, se realiza aplicacion de estuco preescolar #2, se realiza raspado de pintura salon quimica, se realiza aplicado de acrovinil salón quimica, se realiza aplicación de estuco, se realiza aplicación de estuco biblioteca columnas, Se realiza consolidación de medidas para memoria Contratista, Interventoria

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTY TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 91 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 24-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzon las Aurus

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Oficiales	3	0			
Electricos	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	7	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Resane y conformación de filos fachada posterior bloque administración, Aplicación de impermeabilizante muro antepecho fachada posterior bloque administración, Aplicacion de pintura primera capa salon preescolar #2 y Quimica, instalacion de interruptores dobles y toma corriente Modulo biblioteca

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTO LOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 92 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 25-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aguas

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	1	NA		Ingreso ing. Electrico Interventoria
Inspector	0	1			
Apoyo ingeniero	1	0			
P. Cubierta	2	0			
Oficial	5	0			
Electrico	3	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	12	2	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA	
TIEMPO SECO	21
LLUVIA SUAVE	3
LLUVIA FUERTE	

OBSERVACIONES:

Se presentan lluvias suaves durante el dia

EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
NA		-

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza pintura en salon preescolar #2 Quimica, Jardin A, B, se realiza resanado de pintura Jardin A, B, se realiza estuco en jardin A, B, se realiza instalacion de Tomas, suiches, luminarias biblioteca, se realiza correccion de observaciones en canal, se realiza calfado de canal, se realiza inspeccion de Red electrica intervencion Aguas

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 93 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 26-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aguas

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
inspector	0	1			
oficiales	5	0			
Electricos	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	9	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Aplicación de pintura exterior bloque posterior administración, Aplicacion segunda capa de pintura salon Jardin A y B, perfilacion y remate de filos bloque biblioteca y salones, instalacion de luminaria panel LED 120 x 30 40 w, Salon primero y segundo instalacion de Blanche salón segundo

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 94 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 27-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aguas

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Electricos	3	0			
P. Cubierta	1	0			
OF. civil	5	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	10	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20	NA		
LLUVIA SUAVE	4			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentan lluvias suaves durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Aplicación de pintura en esmalte Marco de ventaneria Salón Jardín A, B, instalacion de flanche Biblioteca Modulo #2, perfilación y remate de filos Salones. instalacion de luminarias LED 120 x 30 40 w, Salon #2 instalación de curvas desde tablero biblioteca a Salones Primero y Segundo, sellado de roscas y canales.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 95 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 28-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón Las Aves

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
inspector	0	1			
TOTAL			TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	21	NA		
LLUVIA SUAVE	3			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentan lluvias durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalacion de luminaria Salón Segundo, Aparateo de interruptores y toma corrientes. Suministro de cableado para parciales Salón primero y segunda

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 96 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 29-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Aguas

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
Residente	0	1			
SST	0	1			
inspector	0	1			
Soldador	2	0			
Electricos	3	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	19	NA		
LLUVIA SUAVE	5			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias suaves durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

instalacion de piso vinisol Tipo puzzle salón Jardin B, resoldada de soportes biblioteca Modulo #2 pintura 3 en 1 en soportes tarima, instalación de luminarias panel LED 120 x 30 40W informatica Modulo laboratorio, Desmontaje de flanches, informatica

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTEZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 97 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 30-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO Jaime Garzón las Auras

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Apoyo ingeniero	1	0	NA		
inspector	0	1			
Electricos	3	0			
Oficial	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	7	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Pintura de estructura en salón 1, 2, biblioteca. instalación de luminarias informatica Modulo laboratorio, sellado de canal salón 1, 2, biblioteca, cableado en laboratorio Aseo en biblioteca, cambio de luminaria salón segundo por garantia, se evidencia imperfecto en luminaria Instalacion de luminarias desmontadas. se realiza instalación de suiches y Tomas informatica, laboratorio

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSAORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 78 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 1-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
SST	1	0	NA		los dias 28,29,30,31 de Marzo no se realizaran actividades dias festivos descanso de la semana santa
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA	
TIEMPO SECO	24
LLUVIA SUAVE	
LLUVIA FUERTE	
OBSERVACIONES:	

EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
NA		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza retiro de pañete en baño Enfermeria
Se realiza retiro de RCD baño Emisora Enfermeria
se realiza picado de muro y retiro de pintura en baño apto #2, se realiza pañete de muro) bloque emisora apto 1,2 baño y muros divisorios
se realiza trasiego de Arena Amarilla para pañete

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 79 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 2-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
SST	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	3	0			
Residente	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA	
TIEMPO SECO	23
LLUVIA SUAVE	1
LLUVIA FUERTE	

OBSERVACIONES:

Se presentan lluvias suaves despues de las 3:50 PM

EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
NA		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza pañete de muro frente a garita de seguridad y se realiza afinado, se realiza pañete en apartamento #2 baño y muro divisorio y entrada, se realiza afinado, se realiza pañete en frente de enfermeria y se realiza afinado. se realiza trasiego de arena para pañeteo.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLOSDORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 80 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 03-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO La Unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		
Apoyo ingeniero SST	1	0			
Inspector	0	1			
Maestro	2	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	8	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	21	Camión	1	Descargue de cemento
LLUVIA SUAVE	2			
LLUVIA FUERTE	1			
OBSERVACIONES:				
Se presentan lluvias suaves y fuertes 3 horas en el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza puente baño Enfermeria, se realiza afinado de muro sala Emisora, se realiza transiego de Arena Amarilla para puente, se realiza corte con pulidora en pasillo Emisora, se realiza excavación manual en pasillo frente a emisora, se realiza nivelación de piso pasillo frente a emisora

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.

INFORME DIARIO No. 81

FECHA: 04-04-2024 DD/MM/AAAA

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INTRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad Contratista	Cantidad Interventoría
Residente	1	1
Apoyo ingeniero	1	0
SST	1	0
Inspector	0	1
Maestro	2	0
Ayudante	2	0
	0	0
	0	0
TOTAL	7	2

PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

Cargo	Cantidad	Observaciones
N A		En bloque Emisora se evidencia que los Muros estan desplomados. Toca Ajustar aquñete en los muros
TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	22
LLUVIA SUAVE	2
LLUVIA FUERTE	

OBSERVACIONES:

Se presentan lluvias suaves durante el dia

EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Mezclador	1	Concreto Pasillo Emisora

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza Cañete de baño en Emisora, se realiza cafinado de muro en Aula #1 bloque Emisora se realiza Fundida de Rampa en medio de Salones frente a bloque Emisora, se realiza Fundida de rampa frente a bloque Emisora pasillo, se realiza Mezclado de concreto1 y trasiego para fundida, se realiza demolición de muro Marco de puerta en apto #1 bloque emisora, se realiza recorrida de obra Contratista, Interventoria

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 82 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 05-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL		
Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría
Residente	1	0
SST	1	0
Inspector	0	1
Maestros	2	0
Ayudante	2	0
	0	0
	0	0
	0	0
TOTAL	6	1

PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad	Observaciones
NA		
TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA	
TIEMPO SECO	21
LLUVIA SUAVE	3
LLUVIA FUERTE	

EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
NA		

OBSERVACIONES:

Se presentan lluvias suaves durante el dia

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza pañete de muro en baño Enfermería se realiza pañete de muro en entrada a enfermería se realiza pañete en muro entrada a apartamento #2 se realiza demolicion de placa para caja frente a almacen, se realiza excavación manual de caja y zanja para conexion aguas lluvias frente a almacen la unión, se realiza armada de testero para salida de caja, se realiza instalación de malla electrosoldada en caja, se realiza instalación de Tubería y ll, conexión aguas lluvias

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSAORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 83 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 06-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORIA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
SST	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Maestro	2	0			
Ayudante	1	0			
P. Cubierta	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA	
TIEMPO SECO	22
LLUVIA SUAVE	2
LLUVIA FUERTE	

OBSERVACIONES:
Se presentan lluvias suaves durante el dia

EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Camión	1	descargue de Materiales para Cubierta, Fabricacion de teja. Maquina

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza descargue de Materiales para cubierta se realiza manposteria de bloque apartamento #1 bloque garita seguridad, Se realiza Fabricación de teja en el carro y se ingresa al colegio

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 84 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 07-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
SST	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Maestro	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	3	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza Macheta de bloque en baño apto #2
se realiza pañete de muros en apto #2
se realiza Mampostería de bloque apto #1 Emisora
Muro perimetral.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 85 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 8-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		
SST	1	0			
Apoyo ingeniero	1	0			
Inspector	0	1			
Maestro	9	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	8	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Volqueta	1	Arena Amarilla
LLUVIA SUAVE		Volqueta	1	Salida RCD
LLUVIA FUERTE		Mezclador	1	Concreto caja
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza afinado de muros en apto #2, pegada de bloque División cocina comedor apto #2, fundida de caja frente a almacen, Se realiza pegada de muro entrada de Emisora, sacada de filos apto#2 regata para soportes de estructura bloque Almacen Se realiza descargue de Arena Amarilla, se realiza cargue de RCD, Se realiza Mezclado para fundida de caja polideportivo almacen, se realiza trasiego de concreto

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 86 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 09-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO La Union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
SST	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Maestro	2	0			
Ayudantes	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Mezclador	1	Mortero cargue sobre piso
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE		Camión	1	Perfiles Metalicos
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza cargue de sobre piso, en Aula #1, Emisora enfermeria, se realiza Mezclado de Mortero para cargue de piso, se realiza trasiego de Mortero para blogue emisora, se realiza instalación de griferia baño niños y niñas, se realiza orden y Aseo

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTY OLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 87 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 10-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	1	NA		
SST	1	0			
Inspector	0	1			
Maestro	2	0			
AYudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	7	2	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza fundete de cajas inspeccion otras de vivienda de docentes, se realiza fundete de caja frente a almacen, se realiza fundete de muros para nivelar paredes en bloque cimisora, se realiza instalación de griferia baño niños y niñas, se organiza cerramiento entrada almacen y polideportivo

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 88 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 11-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		
SST	1	0			
Inspector	0	1			
Maestro	2	0			
Ayudantes	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	7	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza arreglo de piso granito frente a baño de niñas, se realiza pañete y afinado de vigas, sacado de filos bloque Emisora, arreglo de tubería desague lavamanos baño de niñas y tubería agua potable. Se realiza picado de muros para pañete bloque Emisora

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 89 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 12-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
SST	1	0	NA		
Inspecto	0	1			
Maestro	2	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA	
TIEMPO SECO	24
LLUVIA SUAVE	
LLUVIA FUERTE	
OBSERVACIONES:	

EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
NA		

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza picado de muros bloque Emisora se realiza pañete, Afinado de vigas y sacado de filos bloque Emisora

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 91 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 14-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
SST	1	0	NA		el dia 13-04-24 Reportaron una Maquina destroncadora y es una Maquina brilladora de piso
Inspector	0	1			
Oficial	2	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	brilladora piso	1	baño niños y niñas
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza pulida y brillado de medicaña y piso de granito baño niños y niñas

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 92 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 15-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
SST	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Soldador	1	0			
AYudante	1	0			
		0			
		0			
		0			
		0			
TOTAL		1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza aseo en baño niños y niñas
Se realiza armado de soportes para estructura
Se realiza soldadura de soportes en estructura
bloque Emisora

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLOSAORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 93 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 16-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO La Unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	1	NA		Ingreso Ing. Sonia Rodriguez
SST	1	1			
Soldador	1	0			
Ayudante	2	0			
Inspector	0	1			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	3	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Camión	1	bloque, perfiles Metalicos
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE		Equipo soldadura	1	Soldadura bloque Emisora
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza entrega de perfiles para soporte de canal, se realiza orden y Aseo, se realiza arreglo de cerramientos, se organiza material de obra, se realiza descargue de camión y trasiego de material se realiza recorrido de obra, se realiza reunion con el colegio, comunidad, SED, Consorcio Interventoria,

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTY LOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 94 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA A-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO La Union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
SST	1	0			
Inspector	0	1			
Soldador	1	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	Equipo de Soldadura	1	Soportes Canales
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza armado y Soldadura de soportes de canal, se realiza organización de cerramientos, se realiza arreglo de tendidos en baño niños y niñas, se realiza Orden y Aseo.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 95 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 18-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO La unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	N/A		Ingreso 1 soldador William Morales
SST	1	0			
Inspector	0	1			
Soldador	2	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	23	Equipo Soldadura	1	bloque Emisora
LLUVIA SUAVE	1			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presento lluvia suave 12:30 PM, 1.30 PM				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Soldadura de perfil tipo C bloque Emisora
Armado soporte para canal
demolicion de piso granito Emergencia Fuga de Agua rectoria

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 96 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 14-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO La unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
SST	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Soldador	2	0			
oficial	2	0			
Ayudantes	2	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	4	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	19	Compresor	1	Pintura Soportes
LLUVIA SUAVE	5	Equipo Soldadura	1	Soldadura Perfiles
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias suaves durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza atención de emergencia Rectoria arreglo escape de agua, arreglo piso granito, arreglo guarda escoba, resane de muro, pegada de baldosa en baño de niñas, instalación accesorios lavamanos Mamposteria perimetral bloque Emisora, Pintura soportes de canal, Soldadura de perfil tipo C

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 97 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 20-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
SST	1	0	NA		
Inspector	0	1			
soldador	2	0			
oficial	2	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	19	Equipo soldadura	1	soldadura soportes
LLUVIA SUAVE	5	Equipo soldadura	1	Armado de canal
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Mamposteria perimetral bloque Emisora, Soldadura de soportes para canal Emisora, Armado de canal para bloque Emisora. Trasiego de arena para pegada de bloque, Armado de andamio para Trabajo de Mamposteria

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTY OLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 98 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 21-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
SST	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Soldador	2	0			
Maestro	1	0			
Ayudante	1	0			
	0	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	5	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	19	Compresor	1	Pintura soportes
LLUVIA SUAVE	5	Equipo soldadura	1	Armado de canal
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza armado de canal, se realiza pintura de soportes para canal, se realiza Hampostería de bloque perimetral, bloque en sisa

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 99 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 22-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO La Union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Soldador	2	0			
Maestro	1	0			
Oficial	2	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	8	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20	Camión	1	Cemento
LLUVIA SUAVE	4			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentan lluvias suaves durante el dia 4 horas				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza pintura de canal anticorrosivo y pintura 3 en 1 canales Almacen, bloque Emisora e se realiza bloque perimetral Emisora, Se realiza cuarto perimetral bloque Emisora, Se realiza desmontaje de ventanas baño Emisora, Se realiza Mamposteria en baño ventana Emisora, Se realiza cuarto en baño ventana Emisora

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 100 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 23-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO La Unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		
Inspector	0	1			
Soldador	2	0			
Maestro	1	0			
oficial	2	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	8	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20	Compresor	1	Pintura 3 en 1
LLUVIA SUAVE	4	Equipo soldadura	1	Armado canal
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
Se presentan lluvias durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza Pintura de canal anticorrosivo y Pintura 3 en 1 canales Almacen, bloque Emisora, Se realiza bloque perimetral Emisora, Se realiza cuarteo perimetral Emisora, Se realiza desmontaje de ventana baño Emisora, Se realiza Mampostería en baño emisora ventana, Se realiza cuarteo ventana baño Emisora

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 101 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 24-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		
inspector	0	1			
Soldador	2	0			
Maestro	1	0			
Oficial	2	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	9	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	20	Compresor	1	Pintura canal
LLUVIA SUAVE	4	Equipo Soldadura	1	Canales Armado
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias durante el dia lluvia suave				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Armado de canal, instalacion de canal Almacen, bloque Emisora, pintura 3en1 en canales, fuñete de bloque perimetral Emisora, consolidacion de medidas interventoria, Contratista.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTY OLOS PORTIL	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 102 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 25-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		
Inspector	0	1			
SST	1	0			
Maestro	1	0			
Oficial	2	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	8	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza cañete de bloque perimetral en Emsora se realiza fisado de viga, se realiza cañete de viga Emisora, Se realiza orden y Aseo, se realiza organizacion de cerramientos, se realiza transiego de arena Amarilla para cañete

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLOS ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 103 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 26-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
SST	1	0			
inspector	0	1			
Soldador	2	0			
Maestro	1	0			
oficial	2	0			
Ayudante	2	0			
	0	0			
TOTAL	9	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	19	Camion	1	Perfiles, Super board, Masilla
LLUVIA SUAVE	5			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias durante el				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza Armado de canal bloque Emisora, instalación de sosco en canal Emisora, pintura 3 en 1, se realiza cuñete de viga bloque Emisora, se realiza cuñete bloque perimetral Emisora, se realiza consolidacion de medidas Contratista interventoria.
descargue de Materiales, Perfiles, Masilla, Super board

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSAORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 104 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 27-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
SST	1	0			
soldador	2	0			
Maestro	1	0			
oficial	2	0			
Ayudante	3	0			
Inspector	0	1			
	0	0			
TOTAL	10	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA	
TIEMPO SECO	19
LLUVIA SUAVE	5
LLUVIA FUERTE	

EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Equipo soldadura	1	bloque Emisora
Compresor	1	pintura

OBSERVACIONES:

se presentan lluvias durante el dia

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

se realiza pintura 3er 1 en estructura bloque Emisora, Se realiza instalación de Sascos de canal Emisora, se realiza cuneta de bloque perimetral Emisora, se realiza enchape de piso duro piso enfermeria, se realiza picado de viga y cuñete de viga perimetral Emisora

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 105 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 28-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO La union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	0	NA		
Soldador	2	0			
Maestro	1	0			
Oficial	1	0			
Ayudante	1	0			
inspector	0	1			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	6	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	19	Compresor	1	Pintura 3en1
LLUVIA SUAVE	5			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias durante el dia				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Pintura 3 en 1 estructura bloque Emisora, instalación de soportes bloque Emisora, enchape en Fermacem existe bloque perimetral Emisora

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTO LOS AOTLIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

CB INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 106 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 29-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la union

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoria			
Residente	1	1	NA		
SST	1	1			
Inspector	0	1			
Soldador	2	0			
Maestro	1	0			
Oficial	2	0			
Ayudante	3	0			
	0	0			
TOTAL	10	3	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	19	NA		
LLUVIA SUAVE	5			
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				
se presentan lluvias durante el dia 5 horas				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Pintura 3 en 1 en perfil Metalico almacen, Pañete de viga perimetral bloque Emisora, Pañete perimetral bloque Emisora, Pañete Puerta emisora, regata de piso apto #1, 2, Conexion desagüe, se realiza apertura de ventana baño a Pto #1 Emisora, se realiza trasiego de Arena Amarilla para Pañete, Se realiza Pañete en baño emisora ventana.

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTTTOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 107 INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	FECHA 30-04-2024 DD/MM/AAAA

COLEGIO la unión

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL			PERSONAL OPERATIVO EN OBRA		
Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	Observaciones
	Contratista	Interventoría			
Residente	1	0	NA		
SST	1	0			
Inspector	0	1			
1 Maestro	1	0			
Oficial	2	0			
Ayudante	4	0			
	0	0			
	0	0			
TOTAL	9	1	TOTAL		

ESTADO DEL CLIMA		EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
TIEMPO SECO	24	NA		
LLUVIA SUAVE				
LLUVIA FUERTE				
OBSERVACIONES:				

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Pañete Frente de blogue Emisora, Pañete interno blogue emisora, Mezclado para pañete, Orden y Aseo en cuarto de acopio, Sacado de Filas, instalacion de tuberia hidraulicas, arreglo de cerramientos, Traslado de RCD Regatas, instalacion Agua potable y conexion sanitaria blogue emisora, instalacion de tuberia para lavaplatos, lavadora, lavamanos, inodoro

ESPACIO PARA GRAFICO

ELABORADO POR:	LOTT TOLOSA ORTIZ	INSPECTOR DE OBRA	

Powered by CamScanner

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 141	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	lunes, 1 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Apoyo de residente	1	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza recorrido con asesor electrico
S e realiza inspección de red electrica
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**22**	
LLUVIA SUAVE	**2**	Observaciones
LLUVIA FUERTE		Inicio de lluvia a las 2:00 pm hasta 4:00pm

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se realiza recorrido con asesor electrico



S e realiza inspección de red electrica



N/A

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	4	
Electrico	2	
Oficiales de estuco y pintura	2	
Apoyo a residente	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Compactación con canguro de base en aula 1
Pañete viga coronación en bloque aulas 2
Se continua recorrido de asesor electrico
Se realiza juntas de para fundidad de sobre piso
Llegada de viaje B200
Llegada de viaje de arena de rio

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**22**	Observaciones
LLUVIA SUAVE	**2**	
LLUVIA FUERTE		Inicio de lluvia a las 2:00 pm hasta 4:00pm

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Compactación con canguro de base en aula 1



Pañete viga coronación en bloque aulas 2



Se continua recorrido de asesor electrico



Se realiza juntas de para fundidad de sobre piso



Llegada de viaje B200



Llegada de viaje de arena de rio



ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 142	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	martes, 2 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A	**TIEMPO SECO**	**24**	
N/A	**LLUVIA SUAVE**		Observaciones
N/A	**LLUVIA FUERTE**		
N/A			
N/A			

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Obra civil	5	**Se hace la observación de encuentro de fallo en aula1**	N/A	N/A	N/A
Electricos	2		N/A	N/A	N/A
Apoyo a residente	1		N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Inicio de fundida de sobre piso	TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
Instalación de luminarias en aula 3	LLUVIA SUAVE		
Llegada de viaje de mixto	LLUVIA FUERTE		
Se realiza escavación manual de 0.31 cm			

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Inicio de fundida de sobre piso	Instalación de luminarias en aula 3	Llegada de viaje de mixto
		
Se realiza escavación manual de 0.31 cm		
	N/A	**N/A**

CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	**No hicieron actividades**	Volqueta	1	Retiro de RCDs y llegada material
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Se realiza retiro de viaje de asbesto	TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
Llegada de material de arena de rio	LLUVIA SUAVE		
N/A	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se realiza retiro de viaje de asbesto	Llegada de material de arena de rio	

		N/A	
ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 143	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	miércoles, 3 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Maestro	1	
Soldadores	2	
Apoyo a residente	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Taladro	2	Intalación de barras y anclaje de rampa
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de barandas de baño de movilidad reducida
Llegada de caja de polo a tierra
Instalación de poliretano en ventanas de aluminio y ventanas de aulas
Subsanación de nivelación de rampa de movilidad reducida
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

Instalación de barandas de baño de movilidad reducida



Llegada de caja de polo a tierra



Instalación de poliretano en ventanas de aluminio y ventanas de aulas



Subsanación de nivelación de rampa de movilidad reducida



N/A

N/A

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	**Se realizo retiro de 3 viajes (RCDs y material de excavación)**
Apoyo a residente	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Volqueta	1	N/A
Maquina de compactación (Rana)	1	campactación de base
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza retiro de material de esxcavación manual
Continua excavación manual en fallado en aula de 0.30 cm
Culmina excavación manual de de fallado
Instalación de geotextil en salon detrás de los baños
Se realizo retiro de 3 viajes (RCDs y material de excavación)
Se iinicia relleno de base en aula detrás de los baños

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se realiza retiro de material de esxcavación manual



Continua excavación manual en fallado en aula de 0.30 cm



Culmina excavación manual de de fallado



Instalación de geotextil en salon detrás de los baños

Se iinicia relleno de base en aula detrás de los baños

		**N/A**

CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACTIVIDADES**
N/A	N/A	**No hicieron actividades**	N/A	N/A	Retiro de RCDs y llegada material
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
	TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
	LLUVIA SUAVE		
	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A	N/A	N/A

ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 144	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	jueves, 4 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Maestro	1	
Apoyo a residente	1	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Taladro	2	Intalación de barras y anclaje de rampa
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Inicio de emboqillado de puertas en bloque baños
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	22	
LLUVIA SUAVE	2	Observaciones
LLUVIA FUERTE		Inicio de lluvias 3:00 pm hasta 5:00 pm

REGISTRO FOTOGRAFICO

Inicio de emboqillado de puertas en bloque baños



N/A

N/A

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	
Electricos	2	
Apoyo a residente	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Volqueta	1	N/A
Maquina de compactación (Rana)	1	campactación de base
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de tuberia y cableado en salones
Pintura en aulas y cuchillas
Pañete en columna de entrada a bodega
Llegada de material B400
Relleno de base en bodega
Compactación con (Rana) en bodega

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	22	Observaciones
LLUVIA SUAVE	2	
LLUVIA FUERTE		Inicio de lluvias 3:00 pm hasta 5:00 pm

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de tuberia y cableado en salones



Pintura en aulas y cuchillas



Pañete en columna de entrada a bodega



Llegada de material B400



Relleno de base en bodega



Compactación con (Rana) en bodega



CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES

N/A	N/A	**No hicieron actividades**	N/A	N/A	Retiro de RCDs y llegada material
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			**4. ESTADO DEL CLIMA**		
			TIEMPO SECO	**22**	Observaciones
			LLUVIA SUAVE	**2**	Inicio de lluvias 3:00 pm hasta 5:00 pm
			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ELABORADO POR:		**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**		**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 145	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	viernes, 5 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**NO se hicieron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A	**TIEMPO SECO**	**21**	
N/A	**LLUVIA SUAVE**		Observaciones
N/A	**LLUVIA FUERTE**	**3**	
N/A			Inicio de lluvias 01:00 pm hasta 3:00 pm
N/A			

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
obra civil	5	
Electricos	2	
Soldadores	3	
Apoyo a residente	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Fundidad de placa en salon detrás de los baños	TIEMPO SECO	**21**	Observaciones
Aplicación de segunda mano en aula 2	LLUVIA SUAVE		Inicio de lluvias 01:00 pm hasta 3:00 pm
Instalación de bajantes en entradas de bodega	LLUVIA FUERTE	**3**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fundidad de placa en salon detrás de los baños	Aplicación de segunda mano en aula 2	Instalación de bajantes en entradas de bodega
		

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No hicieron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A	TIEMPO SECO	**21**	Observaciones
N/A	LLUVIA SUAVE		Inicio de lluvias 01:00 pm hasta 3:00 pm
N/A	LLUVIA FUERTE	**3**	

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 146	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	sábado, 6 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Maestro	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Resane de caja de polo a tierra
- Instalación de lavamanos en baños movilida reducida
- N/A
- N/A
- N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

		Observaciones
TIEMPO SECO	24	
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

Resane de caja de polo a tierra



Instalación de lavamanos en baños movilida reducida



N/A

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	4	
Electrico	1	
Oficial de estuco y pintura	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Mezcaldora de trompo	1	Mezclado de material a cemento
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Fundidad de placapiso en anden bodega
- Instalación de persianas en bloque administrativo
- Inicio de detalles de pintura en bloque baños

4. ESTADO DEL CLIMA

		Observaciones
TIEMPO SECO	24	
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fundidad de placapiso en anden bodega



Instalación de persianas en bloque administrativo



Inicio de detalles de pintura en bloque baños



COLEGIO CHUNIZA

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Pintores	2	
Residente de obra	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inicio de aplicación pintura en cancha en lateral norte
- Se realiza observaciones de la malla contra impacto en canchas

4. ESTADO DEL CLIMA

		Observaciones
TIEMPO SECO	24	
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Inicio de aplicación pintura en cancha en lateral norte

Se realiza observaciones de la malla contra impacto en canchas





N/A

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLA SEDE A

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Maestro	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Inicio de preparación de granito para meson terraza B	TIEMPO SECO	24	Observaciones
N/A	LLUVIA SUAVE		
N/A	LLUVIA FUERTE		
N/A			

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Inicio de preparación de granito para meson terraza B



N/A

N/A

CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	**No hicieron actividades**	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
	TIEMPO SECO	24	Observaciones
	LLUVIA SUAVE		
	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	**No hicieron actividades**	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
	TIEMPO SECO	24	Observaciones
	LLUVIA SUAVE		
	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

N/A

ELABORADO POR: **JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL** **INSPECTOR DE OBRA**

jairo A duarte C
1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 147	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	domingo, 7 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	NO se hicieron actividades
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Electrico	2	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de parcial electrica de baños

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de parcial electrica de baños



N/A

N/A

COLEGIO CHUNIZA

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Pintores	3	
Residente de obra	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Dermacación de cancha lateral norte
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	24	Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Dermacación de cancha lateral norte



Dermacación de cancha lateral norte



N/A

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLA SEDE A

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Maestro	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Pulida de granito de meson terraza preescolar B

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	Observaciones

Instalación de lavamanos en meson terraza preescolar B	LLUVIA SUAVE		
N/A	LLUVIA FUERTE		
N/A			

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Pulida de granito de meson terraza preescolar B	Instalación de lavamanos en meson terraza preescolar B	
		N/A

CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	**No hicieron actividades**	N/A	N/A	Retiro de RCDs y llegada material
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
	TIEMPO SECO	24	Observaciones
	LLUVIA SUAVE		
	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	N/A	N/A

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	**No hicieron actividades**	N/A	N/A	Retiro de RCDs y llegada material
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
	TIEMPO SECO	24	Observaciones
	LLUVIA SUAVE		
	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 148	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	lunes, 8 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Instaladores de vidrios	2	
Apoyo a residente	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Reposición de vidrios rotos en (salones y bodega 2 piso)
Llegada de vidrio espejo baño movilidad reducida
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

		Observaciones
TIEMPO SECO	**21**	
LLUVIA SUAVE	**3**	
LLUVIA FUERTE		Inicio de lluvia 2:00 pm hasta las 5:00 pm

REGISTRO FOTOGRAFICO

Reposición de vidrios rotos en (salones y bodega 2 piso)



Llegada de vidrio espejo baño movilidad reducida



N/A

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	4	
Eléctricos	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de vidrios espejos en baño bloque administrativo
Se realiza raspado de muro en salones
Instalación de cajas en salón 3
Inicio de instalación de duro piso en bloque salones
Avance de instalación de duro piso en salones
Limpieza en salón de material de muro

4. ESTADO DEL CLIMA

		Observaciones
TIEMPO SECO	**21**	
LLUVIA SUAVE	**3**	
LLUVIA FUERTE		Inicio de lluvia 2:00 pm hasta las 5:00 pm

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de vidrios espejos en baño bloque administrativo



Se realiza raspado de muro en salones



Instalación de cajas en salón 3



Inicio de instalación de duro piso en bloque salones



Avance de instalación de duro piso en salones



Limpieza en salón de material de muro



COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLA SEDE A

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Instaladores de vidrios	2	**Se realiza la observación al contratista que no han hecho recuperación**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	de zona verde	N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			**4. ESTADO DEL CLIMA**		
Estado de mesón con instalación de granito terraza preescolar B			TIEMPO SECO	**21**	Observaciones
Se realiza la observación que punch de lavamos no quedo bien pegado con el granito			LLUVIA SUAVE	**3**	Inicio de lluvia 2:00 pm hasta las 5:00 pm
Instalación de nuevas manijas en ventanas			LLUVIA FUERTE		
REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Estado de mesón con instalación de granito terraza preescolar B		Se realiza la observación que punch de lavamos no quedo bien pegado con el granito		Instalación de nuevas manijas en ventanas	
					

CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			**2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS**		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACTIVIDADES**
N/A	N/A	**No hicieron actividades**	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			**4. ESTADO DEL CLIMA**		
			TIEMPO SECO	**21**	Observaciones
			LLUVIA SUAVE	**3**	Inicio de lluvia 2:00 pm hasta las 5:00 pm
			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			**2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS**		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACTIVIDADES**
Oficiales	2		Martillo demoledor	1	demolición de placa
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			**4. ESTADO DEL CLIMA**		
Inicio de demolición de placa en patio con (taladro demoledor)			TIEMPO SECO	**21**	Observaciones
			LLUVIA SUAVE	**3**	Inicio de lluvia 2:00 pm hasta las 5:00 pm
			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Inicio de demolición de placa en patio con (taladro demoledor)		Inicio de demolición de placa en patio con (taladro demoledor)			
				N/A	

ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 149	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	martes, 9 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	
Eléctrico	2	
Residente administrativo	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Continua Instalación de duro piso para emboquillada
Se realiza tapa de muros entre salones y baños
Emboquillado de duro piso en salones
Instalación de guarda escobas en salones
Instalación de paneles led aula detrás de los baños
Se realizo alistado de piso para instalación de duro piso

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Continua Instalación de duro piso para emboquillada



Se realiza tapa de muros entre salones y baños



Emboquillado de duro piso en salones



Instalación de guarda escobas en salones



Instalación de paneles led aula detrás de los baños



Se realizo alistado de piso para instalación de duro piso



CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	2	
Apoyo a residente	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Excavación manual para dados de estructura metálica

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Excavación manual para dados de estructura metálica

Excavación manual para dados de estructura metálica

		N/A

RURAL LAS MERCEDES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2		Martillo demoledor	1	Demolición de placa en patio
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Continua demolición de placa en patio			TIEMPO SECO	24	Observaciones
Acopio de RCD			LLUVIA SUAVE		
			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
Continua demolición de placa en patio		Acopio de RCD			

		N/A	
ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 150	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	miércoles, 10 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A	**TIEMPO SECO**	**24**	
N/A	**LLUVIA SUAVE**		Observaciones
N/A	**LLUVIA FUERTE**		
N/A			
N/A			

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	
Eléctrico	2	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Aplicación de pintura en aulas (3ra mano)	TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
Demolición de placa hacia caja para tubería bajante	LLUVIA SUAVE		
Instalación de tubería eléctrica para luminaria led	LLUVIA FUERTE		
Pañete en cuchilla intersección baños y salones			
Inspección de caja de donde se esta filtrando el agua			
Acabado de la tubería bajante			

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Aplicación de pintura en aulas (3ra mano)



Demolición de placa hacia caja para tubería bajante



Instalación de tubería eléctrica para luminaria led



Pañete en cuchilla intersección baños y salones



Inspección de caja de donde se esta filtrando el agua



Acabado de la tubería bajante



CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	2	
Apoyo a residente	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Continua excavación manual para dados de estructura metálica	TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
N/A	LLUVIA SUAVE		
N/A	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Continua excavación manual para dados de estructura metálica

	N/A	N/A

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	3		Taladro demoledor	1	Demolición de enchape en baños
Ayudante	1		Martillo demoledor	1	Demolición de placa en patio
Apoyo a residente	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Continua demolición de placa en patio juegos	TIEMPO SECO	24	Observaciones
Desmonte de cielo Razo en sala cuarto docente	LLUVIA SUAVE		
Desmonte de enchape en paredes baño docente	LLUVIA FUERTE		
Demolición de muro en cuarto docente			

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Continua demolición de placa en patio juegos	Desmonte de cielo Razo en sala cuarto docente	Desmonte de enchape en paredes baño docente
		
Demolición de muro en cuarto docente		
	N/A	N/A

ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 151	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	jueves, 11 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	
Eléctricos	2	
Apoyo a residente	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Continua aplicación de pintura aulas
Picado de mampostería
Retiro RCDs y basuras
Instalación de duro piso en detrás de los baños
Marcación de tubería eléctrica

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Continua aplicación de pintura aulas



picado de mampostería



Retiro RCDs y basuras



Instalación de duro piso en detrás de los baños



Marcación de tubería eléctrica



N/A

CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	2	
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Figurado de acero para bases de estructura
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Figurado de acero para bases de estructura

	N/A	N/A

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2		Martillo demoledor	1	demolición de placa
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Demolición de viga en patio	TIEMPO SECO	24	Observaciones
Se realiza retiro de RCDs de donación por parte de la comunidad	LLUVIA SUAVE		
	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Demolición de viga en patio	Se realiza retiro de RCDs de donación por parte de la comunidad	
		N/A

FERNANDO GONZALEZ OCHOA

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Instaladores de piso	2	**Se hace la observación que dejaron materiales desmontados en piso**	N/A	N/A	N/A
Residente de obra	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Instalación de guarda escobas en salón de ludoteca	TIEMPO SECO	24	Observaciones
Instalación de guarda escobas en patio preescolar	LLUVIA SUAVE		
	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de guarda escobas en salón de ludoteca	Instalación de guarda escobas en patio preescolar	
		N/A

ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 152	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	viernes, 12 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	2	
Apoyo a residente	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Pulida de piso en baño niñas
- pulida de piso baños niños
- pulida de baños movilidad reducida
- N/A
- N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

Pulida de piso en baño niñas



pulida de piso baños niños



pulida de baños movilidad reducida



COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	
Eléctricos	2	
Apoyo a residente	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Picado en pared de fachada
- Instalación de tubería eléctrica
- Instalación de duro piso en salón
- Gravilla en boca puerta
- Emboquillado de salón detrás de los baños
- Instalación de guarda escobas en salón detrás de los baños

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Picado en pared de fachada



Instalación de tubería eléctrica



Instalación de duro piso en salón



Gravilla en boca puerta



Emboquillado de salón detrás de los baños



Instalación de guarda escobas en salón detrás de los baños



CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2	Se le hace la observación del cambio de acero por estar en malas condiciones	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Se realizo fundida de dados para nueva estructura	TIEMPO SECO	24	Observaciones
Continua figurado de acero para nueva estructura	LLUVIA SUAVE		
N/A	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se realizo fundida de dados para nueva estructura	Continua figurado de acero para nueva estructura	
		N/A

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2		Martillo demoledor	1	demolición de placa
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Avance de demolición de patio	TIEMPO SECO	24	Observaciones
Llegada de materiales	LLUVIA SUAVE		
Acopio de RCDs	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Avance de demolición de patio	Llegada de materiales	Acopio de RCDs
		

ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 153	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	sábado, 13 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	
Eléctricos	2	
Apoyo a residente	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de tubería eléctrica
Zafarreo de fachada
Fundida de sobre piso en aulas
Continua picado de muro en fachada
Excavación manual para atención de emergencia
Cañuelas en caja de inspección para atender emergencia

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de tubería eléctrica



Zafarreo de fachada



Fundida de sobre piso en aulas



Continua picado de muro en fachada



Excavación manual para atención de emergencia



Cañuelas en caja de inspección para atender emergencia



CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
p	2	
Apoyo a residente	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Mezclado de concreto para fundida de dados para estructura
Fundida de dados para futura estructura

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Mezclado de concreto para fundida de dados para estructura

Fundida de dados para futura estructura

		N/A

RURAL LAS MERCEDES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			**2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS**		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACTIVIDADES**
Oficiales	2		Martillo demoledor	1	demolición de placa
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A
Apoyo de residente	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	**4. ESTADO DEL CLIMA**		
Continua demolición de viga en patio juegos	TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
Trasiego de RCDs	LLUVIA SUAVE		
Retiro de recebo de patio	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Continua demolición de viga en patio juegos	Trasiego de RCDs	Retiro de recebo de patio
		

ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 154	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	lunes, 15 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Soldador	1	
Apoyo residente	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inicio de detalles en puertas
- Aplicación de pintura en canal cubierta
- Se realiza entrega total el colegio a rectoría
- N/A
- N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

Inicio de detalles en puertas



Aplicación de pintura en canal cubierta



Se realiza entrega total el colegio a rectoría



COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	
Eléctricos	2	
Apoyo a residente	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Aplicación de pañete sobre fachada
- Instalación de algunas puerta en bloque
- Zafarreo en fachada
- Instalación de bajantes (solo horizontales)
- Pañete en fachada bloque detrás de los baños
- Resane de muro

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Aplicación de pañete sobre fachada



Instalación de algunas puerta en bloque



Zafarreo en fachada



Instalación de bajantes (solo horizontales)



Pañete en fachada bloque detrás de los baños



Resane de muro



CHUNIZA

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Soldador	1	**No se realizaron actividades**
Residente de obra	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Instalación de malla en gimansió			TIEMPO SECO	24	Observaciones
			LLUVIA SUAVE		
			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
RURAL LAS MERCEDES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2		Taladro demoledor	1	demolición de placa
Ayudantes	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			4. ESTADO DEL CLIMA		
Inicio de excavación manual de patio comedor			TIEMPO SECO	24	Observaciones
			LLUVIA SUAVE		
			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
ELABORADO POR:		JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL		INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 155	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	martes, 16 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	
Eléctrico	1	
Apoyo a residente	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Aplicación de pintura en aulas
Instalación de paneles led en aulas
Instalación de marcos de puerta en aulas

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Aplicación de pintura en aulas



Instalación de paneles led en aulas



Instalación de marcos de puerta en aulas



CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se hicieron actividades 2. se realiza la observación que aun no se ha hecho el cambio de**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No se a echo cambio de acero





N/A

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	2	**Se realiza la observación que el material es estrato de tierra negra que toca excavar 0.10cm mas**
Ayudante	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza excavación manual de material de comedor
Llegada de volqueta para retiro de RCDs
Nivelación de excavación manual de comedor

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO			
Se realiza excavación manual de material de comedor	Llegada de volqueta para retiro de RCDs	Nivelación de excavación manual de comedor	
			
ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 156	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	miércoles, 17 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A	**TIEMPO SECO**	**24**	
N/A	**LLUVIA SUAVE**		Observaciones
N/A	**LLUVIA FUERTE**		
N/A			
N/A			

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Obra civil	4		N/A	N/A	N/A
Ayudante de obra	1		N/A	N/A	N/A
Apoyo a residente	1		N/A	N/A	N/A
SST	1		N/A	N/A	N/A
			N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Pañete en fachada bloque salones	TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
Instalación de puertas y marcos bloque salones	LLUVIA SUAVE		
Instalación de duro piso en bloque salones	LLUVIA FUERTE		
Instalación de persianas en aulas			
Jornada de orden y aseo			
Aplicación de pintura en fachada			

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Pañete en fachada bloque salones



Instalación de puertas y marcos bloque salones



Instalación de duro piso en bloque salones



Instalación de persianas en aulas



Jornada de orden y aseo



Aplicación de pintura en fachada



CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A	TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
N/A	LLUVIA SUAVE		
N/A	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	3		N/A	N/A	N/A
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A
Apoyo a residente	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Excavación manual de patio comedor	TIEMPO SECO	24	Observaciones
	LLUVIA SUAVE		
	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Excavación manual de patio comedor	Excavación manual de patio comedor		
		N/A	
ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 157	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	jueves, 18 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	
Soldadores	2	
Ayudante de obra	1	
Apoyo a residente	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Filos de columna antigua bodega
Emboquillado y instalación de guardar escobas
Relleno de granito en boca puerta
Llegada de volqueta para retiro de RCDs y basura
Desmonte de ventanas en bloque salones
Inicio de algunos marcos para ventanas

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Filos de columna antigua bodega



Emboquillado y instalación de guardar escobas



Relleno de granito en boca puerta



Llegada de volqueta para retiro de RCDs y basura



Desmonte de ventanas en bloque salones



Inicio de algunos marcos para ventanas



CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	6	
Apoyo a residente	1	
SST	1	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Montaje de estructura metálica
Construcción de pedestales
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Montaje de estructura metálica

Construcción de pedestales





N/A

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2				
Ayudante	1				
Apoyo a residente	1		N/A	N/A	N/A
SST	1		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Continua excavación de comedor (se evidencia que es estrato de tierra negra)	TIEMPO SECO	24	Observaciones
Se evidencia llegada de viaje recebo B200	LLUVIA SUAVE		
Se realiza retiro de tierra negra de excavación patio	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Continua excavación de comedor (se evidencia que es estrato de tierra negra	Se evidencia llegada de viaje recebo B200	Se realiza retiro de tierra negra de excavación patio
		

ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 158	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	viernes, 19 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se inicia recorrido de comité N°20
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

Se inicia recorrido de comité N°20



N/A

N/A

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	
Soldadores	2	
Ayudante de obra	1	
Apoyo a residente	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Aplicación de pintura gris en bloque salones
Segunda mano en muro antigua bodega
Pintura en viga de coronación en bloque salones
Soldadura de perfiles metálicos para marcos de ventanas
Se continua recorrido de comité N °20
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Aplicación de pintura gris en bloque salones



Segunda mano en muro antigua bodega



Pintura en viga de coronación en bloque salones



Soldadura de perfiles metálicos para marcos de ventanas



Se continua recorrido de comité N °20



N/A

CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	6	**Se hace la**

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A

Apoyo a residente	1	**observación de platinas fuera de los dados de cimentación**	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	**4. ESTADO DEL CLIMA**		
Instalación de estructura metálica en dados de cimentación	TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
N/A	LLUVIA SUAVE		
N/A	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de estructura metálica en dados de cimentación		
	N/A	N/A

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			**2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS**		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACTIVIDADES**
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A
Apoyo a residente	1		N/A	N/A	N/A
SST	1		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	**4. ESTADO DEL CLIMA**		
Continua excavación manual de patio comedor	TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
N/A	LLUVIA SUAVE		
N/A	LLUVIA FUERTE		
N/A			
N/A			
N/A			

ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 159	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	sábado, 20 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	No se realizaron actividades	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
N/A	TIEMPO SECO	24	
N/A	LLUVIA SUAVE		Observaciones
N/A	LLUVIA FUERTE		
N/A			
N/A			

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Obra civil	5		N/A	N/A	N/A
Soldadores	2		N/A	N/A	N/A
Ayudante de obra	1		N/A	N/A	N/A
Apoyo a residente	1		N/A	N/A	N/A
SST	1		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Continua desmonte de marcos y ventanas en bloque aulas	TIEMPO SECO	24	Observaciones
Soldadura en armado de perfiles para marcos en las ventanas	LLUVIA SUAVE		
N/A	LLUVIA FUERTE		
N/A			
N/A			
N/A			

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Continua desmonte de marcos y ventanas en bloque aulas	Soldadura en armado de perfiles para marcos en las ventanas	
		N/A

COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLA SEDE A

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Obra civil	4		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Instalación de superboad en techo (emergencia)	TIEMPO SECO	24	Observaciones
Aplicación de pintura en bancas terraza preescolar A	LLUVIA SUAVE		
Aplicación de pintura en bancas terraza preescolar B	LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de superboad en techo (emergencia)	Aplicación de pintura en bancas terraza preescolar A	Aplicación de pintura en bancas terraza preescolar B
		

CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			**4. ESTADO DEL CLIMA**		
N/A			TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE		
N/A			LLUVIA FUERTE		
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO					
RURAL LAS MERCEDES					
1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			**2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS**		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACTIVIDADES**
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
3. ACTIVIDADES REALIZADAS			**4. ESTADO DEL CLIMA**		
N/A			TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
N/A			LLUVIA SUAVE		
N/A			LLUVIA FUERTE		
N/A					
N/A					
N/A					
ELABORADO POR:		**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**		**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 160	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	domingo, 21 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades se Realizaron actividades de arreglo de griferías en baños**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	2	
Soldadores	2	
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de flautas faltantes en bajante bloque administrativo
Aplicación de pintura de marcos ventanas
Instalación de marcos en ventanas bloque aulas
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de flautas faltantes en bajante bloque administrativo



Aplicación de pintura de marcos ventanas



Instalación de marcos en ventanas bloque aulas



CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se hicieron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A		

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se hicieron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 161	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	lunes, 22 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	4	**Se hace la observación a contratista que las ventanas en aluminio quedo con**
Soldadores	2	
Instaladores de alumno	1	
Inspector de residente	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Inicio de filos en marcos de las ventanas bloque aulas
Instalación de Flautas de la bajante
Inicio de instalación ventanera en bloque aulas
Aplicación de pintura en puertas bloque aulas
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Inicio de filos en marcos de las ventanas bloque aulas



Instalación de Flautas de la bajante



Inicio de instalación ventanera en bloque aulas



Aplicación de pintura en puertas bloque aulas



N/A

N/A

COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Ajuste de puertas patio preescolar
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ajuste de puertas patio preescolar

Ajuste de puertas patio preescolar

Ajuste de puertas patio preescolar







CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales de estructura	3	Se hace la observación de las platinas no están puestas en los dados de cimentación	Equipo de soldadura	1	Soldadura en estructura metálica
Ingeniera de apoyo	1		Tronzadora	1	Corte de estructura metálica
Apoyo a residente	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Excavación manual en el otro bloque	TIEMPO SECO	24	Observaciones
Instalación de perfiles de estructura metálica	LLUVIA SUAVE		
N/A	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Excavación manual para dados de cimentación	Instalación de perfiles de estructura metálica	





N/A

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2		N/A	N/A	N/A
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A
Inspector técnico a residente	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Relleno de piedra con rajón en Comedor	TIEMPO SECO	24	Observaciones
Llegada de malla electrosoldada	LLUVIA SUAVE		
N/A	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Relleno de piedra con rajón en Comedor	Llegada de malla electrosoldada	





N/A

ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 162	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	martes, 23 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	**Se hace la observación por parte de la interventoría que hay luz en las**
Soldador	1	
Inspector técnico de obra	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Compresor	1	pintura en persianas
Equipo de soldadura	1	Soldadura en persianas
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Aplicación de pintura en vanos de las ventanas

Inicio de sócalo gris en fachada

Aplicación de pintura en persianas

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**21**	Observaciones
LLUVIA SUAVE	**3**	
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Aplicación de pintura en vanos de las ventanas



Inicio de sócalo gris en fachada



Aplicación de pintura en persianas



CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Estructura metálica	4	
Ingeniera de subcontratista	1	
Inspector técnico de obra	1	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Figurado de acero para dados de cimentación

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**21**	Observaciones
LLUVIA SUAVE	**3**	
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

N/A

N/A

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	2	
Ayudantes	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

4. ESTADO DEL CLIMA

Relleno de piedra rajón en patio comedor	TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
Relleno de recebo para compactación	LLUVIA SUAVE		
	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Relleno de piedra rajón en patio comedor	Relleno de recebo para compactación		
		N/A	
ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 163	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	miércoles, 24 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	
Eléctrico	2	
SST	1	
Inspector técnico de obra	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Trasiego de arena de rio
Masilla en futuras puerta bloque salones
Instalación de ventaneria en bloque salones
Corte de juntas en bloque baños para bajantes
Aplicación de pintura en bajante antigua bodega

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Trasiego de arena de rio



Masilla en futuras puerta bloque salones



Instalación de ventaría en bloque salones



Corte de juntas en bloque baños para bajantes



Aplicación de pintura en bajante antigua bodega



N/A

CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	3	
Ingeniera de subcontratista	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Volqueta	1	llegada de viaje de mixto
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Fundida de dados para columnas
Mezclado de concreto para fundida de dados
Excavación manual para dados segundo bloque

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fundida de dados para columnas | Mezclado de concreto para fundida de dados | Excavación manual para dados segundo bloque







RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACTIVIDADES**
Oficiales	3		Maquina compactadora (rana)	1	Compactación de base en patio
Ayudante	1		N/A	N/A	N/A
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Conformación y compactación de material con (rana)	TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
Figurado de acero para cárcamo	LLUVIA SUAVE		
N/A	LLUVIA FUERTE		
N/A			
N/A			
N/A			

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Conformación y compactación de material con (rana)



Figurado de acero para cárcamo



N/A

ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 164	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	jueves, 25 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	4	**Se hace la observación que cierta puertas de bloque aulas presentan detalles**
Estructura	2	
Instalador de ventanas	1	
Apoyo técnico de obra	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de persianas
Pañete en parte de cuchillas fachas
Ajuste de ventaneria en bloque aulas
Limpieza y instalación de tableros acrílicos
Llegada de laminas de superboad para cuchillas bloque administrativo

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de persianas



Pañete en parte de cuchillas fachas



Ajuste de ventaneria en bloque aulas



Limpieza y instalación de tableros acrílicos



Llegada de laminas de superboad para cuchillas bloque administrativo



N/A

CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	3	**Se le hace la observación al contratista que aun esta haciendo figurado de acero hay**
Ingeniera de subcontratista	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Fundida de dados segundo bloque
Figurado de acero para dados
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

TIEMPO SECO	**24**	Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fundida de dados segundo bloque

Figurado de acero para dados

		N/A

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA			2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS		
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2				
Ayudante	1				
Inspector técnico de obra	1		N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Relleno de base en patio	TIEMPO SECO	24	Observaciones
Excavación manual para cárcamo	LLUVIA SUAVE		
Llegada de material B200	LLUVIA FUERTE		
Instalación de malla para fundida de cárcamo			
Inicio de mezclado de concreto para cárcamo en patio			

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Relleno de base en patio	Excavación manual para cárcamo	Llegada de material B200
		
Instalación de malla para fundida de cárcamo	Inicio de mezclado de concreto para cárcamo en patio	
		N/A

ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 165	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	viernes, 26 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	4	
Estructura metálica	2	
Inspector técnico de obra	1	
SST	1	
Director de obra	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Aplicación de pintura en marcos de las ventanas
Inicio de instalación de divisiones para oficinas bloque administrativo

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Aplicación de pintura en marcos de las ventanas



Inicio de instalación de divisiones para oficinas bloque administrativo



N/A

CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	3	
Ingeniera de subcontratista	1	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

engrofado para dados de cimentación
Fundida de pedestales para estructura metálica
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

engrofado para dados de cimentación



Fundida de pedestales para estructura metálica



N/A

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	2	
Ayudante	1	
Inspector técnico de obra	1	
	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Engrofado de cárcamo para fundida	TIEMPO SECO	24	Observaciones
	LLUVIA SUAVE		
	LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Engrofado de cárcamo para fundida	Engrofado de cárcamo para fundida		
			
ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 166	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	sábado, 27 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Eléctrico	1	**No se realizaron actividades**
Inspector técnico de obra	1	
SST	1	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de redes eléctricas hacia el rack
N/A
N/A
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		
LLUVIA SUAVE		Observaciones
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Obra civil	5	**Se hace la observación que al momento de desinstalar las puertas se quemo**
Eléctricos	2	
Apoyo a residente	1	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación de laminas de superboad en divisiones bloque administrativo
Desmonte de puertas de baños bloque administrativo

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de laminas de superboad en divisiones bloque administrativo



Desmonte de puertas de baños bloque administrativo



CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	3	
Ingeniera de subcontratista	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Fundida de dados de cimentación segundo bloque
N/A
N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

	24	
TIEMPO SECO		Observaciones
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fundida de dados de cimentación segundo bloque



Fundida de dados de cimentación segundo bloque



N/A

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Oficiales	2	
Ayudantes	1	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Maquina mezcladora (trompo)	1	Fundida de cárcamo
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
Fundida de pared de cárcamo	TIEMPO SECO	24	Observaciones
	LLUVIA SUAVE		
	LLUVIA FUERTE		

ELABORADO POR:	**JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL**	**INSPECTOR DE OBRA**	jairo A duarte C 1105671697

INGENIEROS S.A.S.	INFORME DIARIO No. 167	FECHA
	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION ,MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO ,Y ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES,QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NESECIDADES FISICAS PRIORITARIAS,GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DE SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS GRUPO 5	domingo, 28 de abril de 2024

PERSONAL CONTRATO OBRA E INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL

Cargo	Cantidad		Cargo	Cantidad	
	Contratista	Interventoría		Contratista	Interventoría
Director	0	0	Técnico en SST	1	0
Residente de Obra	0	1	Inspector	0	0
Asesor Ambiental	0	0	Maestro	0	0
asesor SST	0	0	Auxiliar	0	1
Asesor en redes eléctricas	0	0	Apoyo ingeniería	1	0
Profesional de costos, presupuestos	0	0	Apoyo SST	0	1
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	1	TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	**2**	**2**

COLEGIO USMINIA SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Estructura metálica	1	
Inspector técnico de obra	1	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Cubrimiento de huecos en puertas
- Pintura en barandas de las escaleras
- Arreglo de tuberia de los lavamos
- N/A
- N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

		Observaciones
TIEMPO SECO	20	
LLUVIA SUAVE	4	
LLUVIA FUERTE		

REGISTRO FOTOGRAFICO

Cubrimiento de huecos en puertas



Pintura en barandas de las escaleras



Arreglo de tuberia de los lavamos



COLEGIO DIEGO CUELLAR SEDE B

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Estructura metálica	2	
Oficiales	2	
SST	1	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Instalación flautas de aguas lluvias
- Instalación de rejas en ventanas
- Instalación de vidrios en puertas
- Pintura en estructura metálica
- Pintura en tubería bajantes

4. ESTADO DEL CLIMA

		Observaciones
TIEMPO SECO	20	
LLUVIA SUAVE	4	
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación flautas de aguas lluvias



Instalación de rejas en ventanas



Instalación de tubería bajante



CAMPAMENTO DE DOCENTES (DLE)

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
N/A	N/A	**No se realizaron actividades**
N/A	N/A	
N/A	N/A	
N/A	N/A	

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

- N/A
- N/A
- N/A

4. ESTADO DEL CLIMA

		Observaciones
TIEMPO SECO	24	
LLUVIA SUAVE		
LLUVIA FUERTE		

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

RURAL LAS MERCEDES

1. PERSONAL OPERATIVO EN OBRA

2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ACTIVIDADES
Oficiales	2	No se realizaron actividades			
Ayudantes	1				
			N/A	N/A	N/A
N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

3. ACTIVIDADES REALIZADAS	4. ESTADO DEL CLIMA		
	TIEMPO SECO	20	Observaciones
	LLUVIA SUAVE	4	
	LLUVIA FUERTE		

ELABORADO POR:	JAIRO ANDRES DUARTE CARVAJAL	INSPECTOR DE OBRA	jairo A duarte C 1105671697

L. Matriz de riesgos

MATRIZ 2 - RIESGOS
CONCURSO DE MERITOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Código CCE-EICP-FM-118 Versión No.1
MATRIZ 2 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

INTERVENTORÍA	FECHA ELABORACIÓN	1/11/2016
INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS	FECHA ACTUALIZACIÓN	31/03/2021
MATRIZ DE RIESGOS DE INTERVENTORÍA	QUIEN ACTUALIZÓ:	

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-S-P-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTOCONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTA	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCAILES / POLITICOS	SE PRESENTAN ACCIONES JUDICIALES O DE OPOSICIÓN AL PROYECTO, QUE IMPIDEN EL INICIO O DETERMINAN LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. GRUPOS DE INTERÉS ACUDEN ANTE LA AUTORIDAD O JUEZ DEL CASO QUIEN PROFIERE UNA ORDEN CONTRA LOS INTERESES DE LAS INTERVENCIONES, O LA COMUNIDAD REALIZA ACCIONES DE HECHO, A PESAR DE LA DEBIDA DILIGENCIA DE LOS CONTRATISTAS, OPORTUNA ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES Y ACCIONES QUE CORRESPONDEN.	EVENTUALES REPROGRAMACIONES O RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EVENTUAL SUSPENSIÓN DE TRABAJOS.	3	1	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / SED	SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS PARA CREAR PLANES DE CONTINGENCIA. PREVIO ANÁLISIS E INFORME POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA FRENTE A LA EVENTUALIDAD, PLANTEAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES PARA PRESENTAR A LA SED.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / SED	EVENTUALIDAD	SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA, PRESENTACIÓN DE INFORMES, COMITÉS DE OBRA, MESAS DE TRABAJO PARTE TÉCNICA, JURÍDICA Y FINANCIERA	CUANDO OCURRA EL EVENTO
2	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS QUE SE PRESENTEN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL CONTRATO.	EVENTUALES REPROGRAMACIONES O RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. EVENTUAL SUSPENSIÓN DE TRABAJOS .	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / SED	EL CONTRATISTA DE OBRA DEBE ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO, PREVIA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO PARA SU POSTERIOR REVISIÓN FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES, DE LO CUAL SE PRESENTARÁ A LA SED LA POSIBILIDAD DE REQUERIR EL PERSONAL IDÓNEO Y ACTIVIDADES A EJECUTAR PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN, Y DE ESTA FORMA REALIZARÁ EL ANÁLISIS DE LA APROPIACIÓN DE RECURSOS.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / SED	EVENTUALIDAD	LA INTERVENTORÍA VIGILARÁ LA IMPLEMENTACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROTOCOLO, POR MEDIO DE UN INFORME PARA PRESENTAR A LA SUPERVISIÓN.	CUANDO OCURRA EL EVENTO
3	GENERAL	INTERNA	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS A EDIFICACIONES ALEDAÑAS O DAÑOS EN ESPACIO PÚBLICO O DAÑOS EN LA EDIFICACIÓN INTERVENIDA POR EFECTO DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADA	POSIBLES RECLAMACIONES POR PARTE DE VECINOS, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS O DE LA SED	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZARÁ LOS ARREGLOS REQUERIDOS, BAJO LA SUPERVISIÓN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORÍA. LA INTERVENTORÍA DEBERÁ VIGILAR QUE DICHOS EVENTOS SE MITIGUEN, EVITEN O CORRIJAN UNA VEZ OCURRIDOS, MANTENIENDO INDEMNE A LA SED POR LAS FALENCIAS DEL SEGUIMIENTO QUE PUDIERAN HABERSE PRESENTADO EN LA AFECTACIÓN A TERCEROS.	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	MÁXIMO HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA CONTRATADA REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN DE LOS ARREGLOS REQUERIDOS, Y SE ELABORARÁ ACTA DONDE SE RECIBAN A SATISFACCIÓN LOS TRABAJOS ADELANTADOS POR LA PARTE AFECTADA (VECINA, ESPACIO PÚBLICO O LA SED ENTRE OTROS)	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
4	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD FISCAL POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	INCREMENTO EN EL COSTO DEL CONTRATO POR PAGO DE NUEVAS CARGAS TRIBUTARIAS	1	4	5	RIESGO MEDIO	INTERVENTORÍA /SED	EL CONTRATISTA PRESENTARÁ UN INFORME DE LAS NUEVAS CARGAS IMPOSITIVAS, EL CUAL SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN-SED PARA EVALUAR LA VIABILIDAD DE LA APROPIACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LA SED PARA SUPLIR LOS COSTOS DE LA NUEVA CARGA IMPOSITIVA, EN CASO QUE APLIQUE.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y SED	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	CUANTIFICAR EL MAYOR O MENOR COSTO DEBIDO A LOS CAMBIOS EN NORMAS FISCALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	MENSUALMENTE.
5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	CONDICIONES CLIMÁTICAS O AMBIENTALES EXTREMAS	POSIBLES RETRASOS EN LA EJECUCIÓN, DAÑOS A OBRAS YA EJECUTADAS	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA /SED	EL CONTRATISTA DE OBRA IMPLEMENTARÁ UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA RECUPERAR LOS TIEMPOS PERDIDOS Y REALIZAR LOS ARREGLOS NECESARIOS POR ESTAS CAUSAS. DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO. EL PLAN DE CONTINGENCIA, SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, PREVIA PRESENTACIÓN A LA SED.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA /SED	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SE EVALÚAN LOS DAÑOS, LAS ACCIONES DE CONTINGENCIA Y LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	FALLOS DE LOS TRABAJOS POR ASPECTOS LEGALES, INDISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS QUE TENGAN IMPACTO DIRECTO CON LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. PRORROGAS DEL CONTRATO, SUSPENSIONES DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA /SED	EL CONTRATISTA DE OBRA ELABORARÁ EL PLAN DE CONTINGENCIA CON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PLANTEANDO LAS SOLUCIONES TÉCNICAS QUE NO AFECTEN EL PLAZO DE EJECUCIÓN NI EL PRESUPUESTO ASIGNADO. EL PLAN DE CONTINGENCIA, SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA, PREVIA PRESENTACIÓN A LA SED.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA /SED	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO A LA AFECTACIÓN PRESENTADA Y CUANTIFICACIÓN DEL TIEMPO Y VALOR.	MENSUALMENTE.

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTA	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuando?
7	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DAÑOS AMBIENTALES DEBIDO A INADECUADAS PRÁCTICAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.	AFECTACIONES JURÍDICAS Y ECONÓMICAS	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	1 EL CONTRATISTA DE OBRA DESARROLLARÁ UN PLAN DE MEJORA QUE PERMITA ASEGURAR LA RECUPERACIÓN DE LOS DAÑOS AMBIENTALES CAUSADOS POR EL MISMO. 2. EL CONTRATISTA DE OBRA DEBERÁ CUMPLIR A CABALIDAD LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRACTUALES Y DEMÁS NORMATIVIDAD AMBIENTAL 3. LA INTERVENTORÍA REALIZARÁ UN INFORME DIAGNÓSTICO SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y EL TRATAMIENTO DE LOS POSIBLES RIESGOS A PRESENTARSE. 4. DE RESULTAR INEFICACES LOS TRATAMIENTOS DE LOS NUMERALES ANTERIORES, LA ENTIDAD HARÁ EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO, ASÍ COMO TODAS LAS DEMÁS ACCIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR (EN CASO DE QUE EL CONSTRUCTOR RENUNCIE O TRASLADE A UN TERCERO COMPROMISOS POR ÉL ADQUIRIDOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, CUANDO ASÍ DIERA LUGAR AL INICIO DE UN PROCESO DE DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO).	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA /SED	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN SED A LAS ACTUACIONES DEFINIDAS ANTE EL RIESGO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
8	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	DEMORAS EN EL TRÁMITE DE PERMISOS Y/O AUTORIZACIONES, POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ENTIDADES DISTRITALES, INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO.	AFECTACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	EL CONTRATISTA DE OBRA DEBERÁ INICIAR CON LA ANTELACIÓN SUFICIENTE LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS, REITERANDO Y HACIENDO SEGUIMIENTO A LA OPORTUNA RESPUESTA. A SU VEZ, REALIZARÁ CON DILIGENCIA Y PERICIA LOS AJUSTES Y SUBSANACIONES REQUERIDAS. LA INTERVENTORÍA HARÁ EL SEGUIMIENTO Y LOS REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA DE OBRA PARA EL IMPULSO Y PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS TRÁMITES.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN	VERIFICACIÓN MEDIANTE CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LOS TRÁMITES ADELANTADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA. EN CASO DE DETECTAR INCUMPLIMIENTOS EN LAS FECHAS PLANEADAS, SE DEBERÁN ADELANTAR REUNIONES CON LAS EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO O LA CORRESPONDIENTE.	DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PRESENTADAS
9	ESPECIICO	INTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	RECLAMACIÓN DE INDEMNIZACIONES Y REPARACIONES POR PARTE DE ALGUNO DE SUS COLABORADORES.	AFECTACIÓN PATRIMONIAL DE LA INTERVENTORÍA Y EVENTUALMENTE LLAMAMIENTO SOLIDARIO A LA SED	1	3	4	RIESGO BAJO	INTERVENTORÍA / SED	ATENDER LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PAGO A PROVEEDORES Y COLABORADORES REGULADAS EN EL CONTRATO, ACORDE CON LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	INTERVENTORÍA / SED	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	COMITÉ DE SEGUIMIENTO	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
10	GENERAL	EXTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	VARIACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL O DIFICULTAD EN LA CONSECUCIÓN DEL PERSONAL	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PROYECTO	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	EL PERFIL DEL PROFESIONAL DEBE SER IGUAL O SUPERIOR AL QUE SE RETIRE POR FUERZA MAYOR. EL INTERVENTOR ASUME COMO PARTE DEL CONOCIMIENTO DE SU NEGOCIO SI EXISTE MAYOR VALOR POR CUENTA DE DAR CUMPLIMIENTO AL PERFIL DEL PERSONAL SOLICITADO Y OFRECIDO POR EL INTERVENTOR.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUCIÓN	APROBACIONES Y REQUERIMIENTOS A TRAVES DE LA SUPERVISIÓN REALIZADA POR LA SED	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
11	ESPECIICO	EXTERNO	CONTRATACION - EJECUCION	OPERACIONALES	INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	NO SUSCRIPCIÓN, CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO	4	4	8	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA INTERVENTORÍA /	UNA VEZ VERIFICADA POR LA SUPERVISION DEL CONTRATO LA INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD SOBREVINIENTE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA- SE PROCEDERA A REALIZAR LAS ACCIONES JURIDICAS PERTINENTES.	2	3	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	FECHA DEL ACTA DE TERMINACION	DETERMINAR LAS CONSECUENCIAS EN LAS CONDICIONES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EVALUAR LAS SOLUCIONES JURÍDICAS DEL CASO.	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
12	ESPECIFICO	EXTERNO	CONTRATACION	OPERACIONALES	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA DE	EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, SO PENA DE APLICACIÓN DE MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SED	DESDE EL ACTA DE ADJUDICACION	EL EQUIPO CONFORMADO EN LA DIRECCION DE CONTRATATACION, Y LA SUPERVISION DEL CONTRATO, REALIZARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
13	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIOS	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN SOPORTE EN PROCESOS DE PAGO	NO ADECUADA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD. POSIBLE FALTA DE LIQUIDEZ DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON LOS PLAZOS CONTRACTUALES PARA DICHOS PROCESOS Y ACATAR LAS RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISIÓN DE LA SED, EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLEZCAN PARA TAL FIN	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION	DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INTERVENTORIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN SOBRE EL PORCENTAJE DE LO FACTURADO	MENSUALMENTE
14	GENERAL	EXTERNO	CONTRATACION	REGULATORIOS	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA NO MANTIENE GARANTÍAS ACTUALIZADAS	LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS NO CUMPLEN CON LOS AMPAROS DE CALIDAD, CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD DE LEY, REQUERIDOS PARA GARANTIZAR LOS RECURSOS INVERTIDOS.	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA DE	EN EL EVENTO QUE SE REQUIERA PRORROGAR, SUSPENDER Y MODIFICAR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, LA SUPERVISIÓN DEBERÁ VIGILAR Y EXIGIR QUE EL INTERVENTOR MANTENGA ACTUALIZADAS LAS GARANTÍAS PREVISTAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA / SUPERVISION DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION	LA INTERVENTORÍA PRESENTA A LA SED INFORME SOBRE EL ESTADO DE LAS GARANTÍAS, EN LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y EN EL EVENTO QUE SE PRESENTO MODIFICACIONES.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTA	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuando?
15	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	REGULATORIOS	CONTRATISTA NO ALLEGA O DEMORA DOCUMENTACIÓN PRELIMINAR PARA SUSCRICIÓN DEL ACTA DE INICIO	DEMORA EN LA INICIACIÓN Y SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y DE INTERVENTORÍA	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	EL CONTRATISTA DEBERÁ APORTAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDO EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PROCESO, SO PENA DE APLICACIÓN MULTAS O SANCIONES CONTRACTUALES	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SED / SUPERVISION DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	EL EQUIPO CONFORMADO EN LA DIRECCION DE CONTRATATACION, Y LA SUPERVISION DEL CONTRATO, REALIZARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
16	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DEMORAS EN EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA Y EN LOS PROCESOS DE PAGO, INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	CONTROL METODOLÓGICO Y SISTEMÁTICO DE LA INFORMACIÓN, CON BASE EN EL MANUAL DECONTRATACIÓN DE LA SED Y DE LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS, POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DE LA SED. LA INFORMACIÓN DEL AVANCE DE LOS CONTRATOS DEBERÁ REPOSAR EN UNA NUBE CON EL FIN DE EVITAR PERDIDA SIGNIFICATIVA DE INFORMACIÓN.	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA / SUPERVISION DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA LA LIQUIDACION	CUANTIFICAR LOS DÍAS DE RETRASO CON RESPECTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN POR LA DEMORA, LA APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN O PÉRDIDA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.	MENSUALMENTE
17	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURALEZA	EMERGENCIA SANITARIA Y/O AMBIENTAL DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O DISTRITAL	POSIBLE INCREMENTO EN EL VALOR DEL CONTRATO. DEMORAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO.	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA SED	EL CONTRATISTA DEBERÁ IMPLEMENTAR EL PLAN DE APLICACIÓN DE PROTOCOLO SANITARIO QUE SE ESTABLEZCA POR LAS ENTIDADES COMPETENTES. EL PLAN DE ACCIÓN, SERÁ OBJETO DE ANÁLISIS POR PARTE DE LA INTERVENETORÍA, PREVIA PRESENTACIÓN A LA SED.	3	2	5	RIESGO MEDIO	SI	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA SED	HASTA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	LA SUPERVISIÓN SED, REALIZA EL CONTROL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS SANITARIOS ESTABLECIDOS POR LAS ENTIDADES COMPENTENTES.	SI SE PRESENTA LA EVENTUALIDAD
18	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES QUE INCIDEN EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.	SANCIONES ECONÓMICAS, RETRASOS, IMPOSIBILIDAD DE DAR INICIO AL CONTRATO.	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA DE OBRA / CONTRATISTA	EL CONTRATISTA DEBERÁ APLICAR EN DEBIDA FORMA LOS DIFERENTES LINEAMIENTOS Y REGLAMENTACIONES QUE RIGEN LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR. LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ EL SEGUIMIENTO A ESTA OBLIGACIÓN, REQUIRIENDO DE MANERA OPORTUNA SU CUMPLIMIENTO.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA &SED	HASTA LA LIQUIDACIÓN	LA SUPERVISIÓN REALIZA INFORME SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO BAJO EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO.	MENSUALMENTE.
19	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	ECONÓMICO	VARIACIÓN NORMATIVA QUE AFECTE SUSTANCIALMENTE EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO.,	POSIBLE AFECTACIÓN AL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO	4	5	9	RIESGO EXTREMO	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA &SED	ASUMIDO POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA QUIEN DEBE PREVER ESTOS EFECTOS DESDE EL MOMENTO DE FORMULAR SU OFERTA, APLICANDO LAS FÓRMULAS PREVISTAS PARA EL INCREMENTO DE LOS ITEMS. REVISIÓN DE PROCEDENCIA DEL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES: I). QUE EL DESEQUILIBRIO ALEGADO SEA SIGNIFICATIVO O SUSTANCIAL. II) QUE EL EVENTO GENERADOR DEL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO SEA EXTRAORDINARIO, III). QUE SEA POSTERIOR A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, IV). QUE EL EVENTO GENERADOR DEL DESEQUILIBRIO SEA IMPREVISTO E IMPREVISIBLE Y V) QUE ESE EVENTO NO SEA ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA.	3	4	7	RIESGO ALTO	SI	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA &SED	ETAPA DE EJECUCIÓN Y/O LIQUIDACIÓN	MESA DE TRABAJO INTEGRADA DE OBRA E INTERVENTORÍA JUNTO A LOS FUNCIONARIOS A CARGO DE LA SED (TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA) PARA EL ANÁLISIS DE LA SOLICITUD E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES NECESARIOS.	SE DEBE REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL / ANTE LA SOLICITUD
20	ESPECICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES O POLITICOS	ALTERACIONES DEL ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL	DAÑOS AL PERSONAL DEL PROYECTO Y A LA INFRAESTRUCTURA. RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PERDIDA DE MATERIALES Y DE INFORMACIÓN.	1	3	4	RIESGO BAJO	SED	SOLICITUD DE APOYO INTERINSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DE POLICIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL DEL LUGAR, EN TODO CASO, DEBERÁ QUEDAR PLENAMENTE DEMOSTRADO QUE EL CONTRATISTA ACOMETIÓ CON LA DEBIDA DILIGENCIA LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES A SU ALCANCE EN PROCURA DE MITIGAR EN MAYOR GRADO LA OCURRENCIA Y/O MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO. EL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA DEBERÁN APOYAR LOS INSUMOS PARA INTERPONER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES EL CONTRASITAS DE OBRA E INTERVENTORÍA DEBERÁN PRESENTAR UN DIAGNÓSTICO EN LA AFECTACIÓN DEL CRONOGRAMA, ANALIZAR LAS ACCIONES QUE DAN LUGAR PARA TRAMITAR UNA POSIBLE MODIFICACIÓN.	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA DE OBRA - CONTRATISTA DE INTERVENTORIA/SED	FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	INFORME MENSUALES Y EXTRAORDINARIOS SOBRE INCIDENTES DE ORDEN PÚBLICO Y SOCIAL QUE AFECTEN AL PERSONAL DEL CONTRATISTA, INTERVENTOR O LA SED, EN EL LUGAR DE LA OBRA.	CUANDO SE PRESENTE LA EVENTUALIDAD
21	ESPECIFICO	INTERNO/EXTERNO	PLANEACIÓN - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN	FINANCIERO - LEGAL - REPUTACIONAL	HECHOS DE CORRUPCIÓN DENTRO DEL PROYECTO	CONFLICTOS JURÍDICOS Y/O ECONÓMICOS. NO EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORIA, DESFINANCIACIÓN DEL PROYECTO, EJECUCIÓN SIN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, PERDIDA DE CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL.	3	2	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA DE OBRA - CONTRATISTA DE	ADECUADO SEGUIMIENTO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES / ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS	1	2	3	RIESGO BAJO	SI	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA/SED	ACTA DE LIQUIDACIÓN	SEGUIMIENTO DETALLADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, TÉCNICA, DE CALIDAD, ENTRE OTROS	SEMANALMENTE

M. Actas de cobro

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

ACTA PARCIAL No. 5

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CO1.PCCNTR.5313332 DE 2023

PERIODO AL QUE PERTENECE EL ACTA: 1 DE MARZO DE 2024 A 29 DE MARZO DE 2024

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CB INGENIEROS SAS

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5.

DIRECCION : Cll 98 # 22-64 oficina 507

C.C. ó NIT : 860.509.943-7

TELEFONO : 6017040592

SUPERVISOR : FERNEY JIMÉNEZ NEIRA

DIRECCION : AV. EL DORADO No.66-63 PISO 3

C.C. ó NIT : 11.339.805

TELEFONO : 3212583708

ESTABLECIMIENTO : USME Y SUMAPAZ

LOCALIZACION : LOCALIDAD 5 Y 20

VR. INICIAL : $ 504.428.924,00

ANTICIPO

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 504.428.924,00

PLAZO INICIAL : 9 MESES

FECHA INICIACION : 19 de octubre de 2023

FECHA TERMINAC.INICIAL : 18 de julio de 2024

PLAZO ADICIONAL :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 9 MESES

FECHA FINAL : 18 de julio de 2024

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2454	12-abr-23	4332	6-sep-23	$ 504.428.924,00	$ 342.507.240,00	$ 41.363.172,00	$ 301.144.068,00
TOTALES				$ 504.428.924,00	$ 342.507.240,00	$ 41.363.172,00	$ 301.144.068,00

A PAGAR **$ 41.363.172,00** CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	X	AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nª	
REGIMEN SIMPLIFICADO		GRAN CONTIBUYENTE		RESOLUCION Nª	

ICA [X] CODIGO 70201

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO DAVIVIENDA SUCURSAL CALLE 100 CUENTA CORRIENTE [ ] CUENTA DE AHORROS [X] CTA. Nª 466900067367

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CONSULTORIA EJECUTADA – PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
1	**PAGOS POR % DE AVANCE DE** INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS". GRUPO 5.	%	95,00%	$ 423.889.852,10	$ 402.695.359,50	8,20%	$ 34.758.967,87	32,10%	$ 136.068.642,52	40,30%	$ 170.827.610,40	42,42%
2	La Entidad realizará al contratista de interventoría el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del contrato de interventoría, el cual se hará una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría y sea suscrita la correspondiente acta de terminación	%	5,00%	$ 423.889.852,10	$ 21.194.492,60							
3												
COSTO TOTAL CONTRATO INCLUIDO IVA					**$ 423.889.852,10**		**$ 34.758.967,87**		**$ 136.068.642,52**		**$ 170.827.610,40**	**40,30%**

RESUMEN EJECUTIVO

		PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR TOTAL DIRECTO	$ 423.889.852,10	$ 34.758.967,87	$ 136.068.642,52	$ 170.827.610,39	40,30%
IVA SOBRE EL COSTO DIRECTO 19%)	$ 80.539.071,90	$ 6.604.203,90	$ 25.853.042,08	$ 32.457.245,98	40,30%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	$ 504.428.924,00	$ 41.363.171,77	$ 161.921.684,60	$ 203.284.856,37	40,30%
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006		$ 0,23	-$ 0,60	-$ 0,37	
VALOR A PAGAR EN ACTA		$ 41.363.172,00	$ 161.921.684,00	$ 203.284.856,00	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION	301.144.068	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	

CONTRATISTA — CB INGENIEROS SAS
Nit/ C.C — 860.509.943-7
REP. LEGAL — MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO
C.C. — 11.202.387

SUPERVISOR — FERNEY JIMÉNEZ NEIRA
Nit/ C.C — 11.339.805

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 5

CONTRATO DE OBRA No. 5305904-2023

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 29 DE FEBRERO DE 2024 HASTA 29 DE MARZO DE 2024

CONTRATISTA : CONSORCIO CLARIDAD

OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

DIRECCION : Carrera 80 A No. 25C -19

C.C. ó NIT : 901.745.447-4

TELEFONO : 6017040592 - 3134

INTERVENTOR : CB INGENIEROS S.A.S.

DIRECCION : Cll 98 # 22-64 Oficina 507

C.C. ó NIT : **8605099437**

TELEFONO : **6017040592**

ESTABLECIMIENTOS	:	GRUPO No. 5	**PLAZO INICIAL**	:	8 MESES
LOCALIZACION	:	LOCALIDAD 5 Y 20	**FECHA INICIACION**	:	30 DE OCTUBRE DE 2023
VR. INICIAL	:	$ 7.608.734.174,00	**FECHA TERMINAC.INICIAL**	:	29 DE JUNIO DEL 2024
ANTICIPO			**PLAZO ADICIONAL(MODF.CONTRAC**	:	
VR. ADICIONAL	:		**TIEMPO SUSPENDIDO**	:	
VR. FINAL	:	$ 7.608.734.174,00	**PLAZO TOTAL**	:	8 MESES
			FECHA FINAL	:	29 DE JUNIO DEL 2024

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2420	4-abr-23	4330	6-sep-23	$ 7.608.734.174,00	$ 5.166.238.054,00	$ 623.934.436,00	$ 4.542.303.618,00
				$ 7.608.734.174,00	$ 5.166.238.054,00	$ 623.934.436,00	$ 4.542.303.618,00

VALOR TOTAL A PAGAR **$ 623.934.436,00** SON: SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
I	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".	GL	1,00	$ 7.099.640.395,00	$ 7.099.640.395,00							
II	EMERGENCIAS GRUPO No. 5	GL	1,00	$ 509.093.779,00	$ 509.093.779,00							
1	IED FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 30.872,00				95,00	$ 2.932.840,00	95,00	$ 2.932.840,00	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 76.548,00				232,10	$ 17.766.790,80	232,10	$ 17.766.790,80	
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.665,00				206,51	$ 6.745.649,15	206,51	$ 6.745.649,15	
1.2.57	DESMONTE Y REINSTALACION DE TABLETA (INCLUYE TRASIEGO Y BASE EN ARENA)	M2		$ 55.855,00				51,69	$ 2.887.144,95	51,69	$ 2.887.144,95	
1.2.62	DESMONTE DE PISO EN MADERA	M2		$ 20.868,00		90,67	$ 1.892.101,56			90,67	$ 1.892.101,56	
1.3.1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2		$ 42.620,00				148,50	$ 6.329.070,00	148,50	$ 6.329.070,00	
1.3.3	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	M2		$ 35.918,00				108,40	$ 3.893.511,20	108,40	$ 3.893.511,20	
1.3.8	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO	M		$ 8.754,00				21,10	$ 184.709,40	21,10	$ 184.709,40	
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 66.628,00				34,82	$ 2.319.986,96	34,82	$ 2.319.986,96	
2.1.12	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 199.302,00				34,82	$ 6.939.695,64	34,82	$ 6.939.695,64	
2.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE PIEDRA	M3		$ 140.339,00				10,80	$ 1.515.661,20	10,80	$ 1.515.661,20	
2.3.17	CINTA EN CONCRETO 3000 PSI DE 10 X 10 CM (INCLUYE FORMALETAS, Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO).	M		$ 19.318,00		5,70	$ 110.112,60	21,10	$ 407.609,80	26,80	$ 517.722,40	
2.3.20	PERFORACIÓN NÚCLEO 2" E = 0.10 M	UN		$ 35.441,00		-2,00	$ 70.882,00	10,00	$ 354.410,00	8,00	$ 283.528,00	
2.3.22	PERFORACIÓN NÚCLEO 4" E = 0.10 M	UN		$ 151.294,00		2,00	$ 302.588,00			2,00	$ 302.588,00	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.194,00				482,77	$ 3.473.047,38	482,77	$ 3.473.047,38	
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 18.820,00				804,62	$ 15.142.948,40	804,62	$ 15.142.948,40	
4.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 3"	UN		$ 75.806,00				2,00	$ 151.612,00	2,00	$ 151.612,00	
4.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA 3"	UN		$ 958.195,00				1,00	$ 958.195,00	1,00	$ 958.195,00	
4.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 3/4"	UN		$ 70.748,00				1,00	$ 70.748,00	1,00	$ 70.748,00	
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		$ 36.989,00				6,00	$ 221.934,00	6,00	$ 221.934,00	
4.8.8	RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION	UN		$ 65.638,00				6,00	$ 393.828,00	6,00	$ 393.828,00	
7.1.11	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO. (INVLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E = 10 CM	M2		$ 122.244,00				232,10	$ 28.372.832,40	232,10	$ 28.372.832,40	
7.1.12	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M		$ 29.721,00				108,20	$ 3.215.812,20	108,20	$ 3.215.812,20	
7.1.15	PISO SPC DE 4 MM TRAFICO COMERCIAL PARA TARIMA Y CAMERINOS AUDITORIO	M2		$ 310.757,00		90,67	$ 28.176.337,19			90,67	$ 28.176.337,19	

7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MADERA PARA AREA DE PISO EN CAUCHO H = 0.10 M	M		$ 17.286,00		41,61	$ 719.270,46	38,71	$ 669.141,06	80,32	$ 1.388.411,52	
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 3 CM PARA EXTERIORES	M2		$ 594.960,00				116,44	$ 69.277.142,40	116,44	$ 69.277.142,40	
7.2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2		$ 107.023,00				232,10	$ 24.840.038,30	232,10	$ 24.840.038,30	
7.2.66	PISO GOMA DE 7 MM TRAFICO PESADO	M2		$ 147.895,00				90,07	$ 13.320.902,65	90,07	$ 13.320.902,65	
7.2.84	SUMINISTRO DE PISO NIPOLAM DE 2MM HOMOGENEO INCLUYE PÉGANTE, MASTICO Y MANO DE OBRA.	M2		$ 315.784,00				90,07	$ 28.442.664,88	90,07	$ 28.442.664,88	
7.2.109	AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL - E: 0.08 M.	M2		$ 63.965,00				90,07	$ 5.761.327,55	90,07	$ 5.761.327,55	
13.1.14	CAÑUELA PARA MURO DE LIMPIEZA ESMALTADA 0,12 X 0,20 M CON MEDIACAÑA EN CONCRETO DE 3000 PSI	M		$ 49.992,00				21,10	$ 1.054.831,20	21,10	$ 1.054.831,20	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2		$ 23.133,00				115,05	$ 2.661.451,65	115,05	$ 2.661.451,65	
16.1.20	SUMINISTRO E INSTLACIÓN SOPORTE MALLA VOLEIBOL CON TENSOR	UN		$ 424.253,00				2,00	$ 848.506,00	2,00	$ 848.506,00	
16.1.59	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE UNIDAD DE ARCO Y TABLERO DE BALANCESTO. INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA Y REFUERZO DE LA ESTREUCTURA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO.	UN		$ 504.748,00				2,00	$ 1.009.496,00	2,00	$ 1.009.496,00	
16.1.62	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA NYLON PROTECCION CANCHAS	M2		$ 38.612,00				9,50	$ 366.814,00	9,50	$ 366.814,00	
17.1.26	TEJA TRASLUCIDA EN POLIESTER TERMOESTABLE CON CON REFUERZO EN FIBRA DE VIDRIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 118.425,00				81,35	$ 9.633.873,75	81,35	$ 9.633.873,75	
17.1.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 25 CM (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA MENOR)	M		$ 55.397,00				24,00	$ 1.329.528,00	24,00	$ 1.329.528,00	
18.1.20	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3		$ 59.029,00				23,10	$ 1.363.569,90	23,10	$ 1.363.569,90	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.498,00				437,59	$ 1.968.279,82	437,59	$ 1.968.279,82	
20.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE OBRA CON CARACTERISTICAS PELIGROSAS CONTAMINANTES Y/O NO BIO DEGRADABLES (VIDRIOS, ESPEJOS, PVC, ETC)	KG		$ 1.981,00				594,00	$ 1.176.714,00	594,00	$ 1.176.714,00	
2.	**IED USMINIA SEDE B**											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 30.872,00				21,84	$ 674.244,48	21,84	$ 674.244,48	
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 46.664,00				46,21	$ 2.156.343,44	46,21	$ 2.156.343,44	
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.665,00				246,29	$ 8.045.062,85	246,29	$ 8.045.062,85	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.496,00				65,31	$ 1.795.763,76	65,31	$ 1.795.763,76	
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15.568,00				47,27	$ 735.899,36	47,27	$ 735.899,36	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 9.835,00				47,27	$ 464.900,45	47,27	$ 464.900,45	
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.416,00				22,92	$ 467.934,72	22,92	$ 467.934,72	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.671,00		10,56	$ 313.325,76	16,08	$ 477.109,68	26,64	$ 790.435,44	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15.730,00				2,59	$ 40.740,70	2,59	$ 40.740,70	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 16.844,00				17,00	$ 286.348,00	17,00	$ 286.348,00	
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 18.992,00				39,95	$ 758.730,40	39,95	$ 758.730,40	
1.2.32	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE DESCONEXIÓN, ACCESORIOS DE TAPONAMIENTO, ANDAMIO CERTIFICADO, DISPOSICIÓN Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 118.537,00				1,00	$ 118.537,00	1,00	$ 118.537,00	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m2		$ 32.492,00				151,04	$ 4.907.591,68	151,04	$ 4.907.591,68	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS	UN		$ 9.784,00		18,00	$ 176.112,00	20,00	$ 195.680,00	38,00	$ 371.792,00	
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN		$ 79.795,00				1,00	$ 79.795,00	1,00	$ 79.795,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.669,00				22,00	$ 124.718,00	22,00	$ 124.718,00	
1.2.65	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/8", 1/2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 12.370,00				72,28	$ 894.103,60	72,28	$ 894.103,60	
1.2.68	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS	UN		$ 11.210,00				2,00	$ 22.420,00	2,00	$ 22.420,00	
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2		$ 116.287,00		10,30	$ 1.197.756,10			10,30	$ 1.197.756,10	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 16.241,00				23,96	$ 389.134,36	23,96	$ 389.134,36	
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 27.594,00				76,23	$ 2.103.490,62	76,23	$ 2.103.490,62	
1.4.11	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 14.166,00				48,26	$ 683.651,16	48,26	$ 683.651,16	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 78.085,00				1,68	$ 131.182,80	1,68	$ 131.182,80	
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 50.516,00				57,01	$ 2.879.917,16	57,01	$ 2.879.917,16	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3		$ 74.819,00				6,21	$ 464.625,99	6,21	$ 464.625,99	
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 886.007,00				0,09	$ 79.740,63	0,09	$ 79.740,63	

2.2.5	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3		$	905.487,00					0,34	$	307.865,58	0,34	$	307.865,58	
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M		$	78.778,00					13,01	$	1.024.901,78	13,01	$	1.024.901,78	
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CM. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M		$	82.769,00					4,90	$	405.568,10	4,90	$	405.568,10	
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$	100.255,00					36,80	$	3.689.384,00	36,80	$	3.689.384,00	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$	6.524,00					148,83	$	970.966,92	148,83	$	970.966,92	
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$	7.194,00					76,55	$	550.700,70	76,55	$	550.700,70	
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$	18.820,00					2.192,07	$	41.254.757,40	2.192,07	$	41.254.757,40	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2		$	54.318,00					26,97	$	1.464.956,46	26,97	$	1.464.956,46	
3.1.5	MURO BLOQUE HUECO No.4 (HASTA 30 CM)	M		$	29.965,00		4,87	$	145.929,55	75,03	$	2.248.273,95	79,90	$	2.394.203,50	
3.1.8	MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL E = 0.15 M (A LA VISTA DOS CARAS)	M2		$	143.460,00					3,69	$	529.367,40	3,69	$	529.367,40	
3.1.17	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$	7.967,00		201,39	$	1.604.474,13				201,39	$	1.604.474,13	
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2		$	33.445,00					211,98	$	7.089.671,10	211,98	$	7.089.671,10	
3.2.14	DOVELA EN MUROS CON CONCRETO FLUIDO 3000 PSI Y ACERO DE REFUERZO DE 1/2", INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO HASTA 5M DE ALTURA	M		$	20.787,00					5,00	$	103.935,00	5,00	$	103.935,00	
3.3.9	ANCLAJES EPOXICOS D= 1/2 " X L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	UN		$	68.406,00					86,00	$	5.882.916,00	86,00	$	5.882.916,00	
4.1.22	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 6" INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE RELLENO)	M		$	121.037,00					9,30	$	1.125.644,10	9,30	$	1.125.644,10	
4.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	119.355,00					21,77	$	2.598.358,35	21,77	$	2.598.358,35	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	68.520,00					16,54	$	1.133.320,80	16,54	$	1.133.320,80	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	70.429,00					7,32	$	515.540,28	7,32	$	515.540,28	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	42.706,00					33,58	$	1.434.067,48	33,58	$	1.434.067,48	
4.2.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 3"	UN		$	56.738,00					5,00	$	283.690,00	5,00	$	283.690,00	
4.2.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2"	UN		$	56.739,00					11,00	$	624.129,00	11,00	$	624.129,00	
4.3.13	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 21 DE 1" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	17.584,00					17,22	$	302.796,48	17,22	$	302.796,48	
4.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	12.686,00					10,24	$	129.904,64	10,24	$	129.904,64	
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$	12.855,00					20,96	$	269.440,80	20,96	$	269.440,80	
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$	50.113,00					9,00	$	451.017,00	9,00	$	451.017,00	
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$	50.113,00					10,00	$	501.130,00	10,00	$	501.130,00	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN		$	139.642,00					7,00	$	977.494,00	7,00	$	977.494,00	
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN		$	78.799,00					16,00	$	1.260.784,00	16,00	$	1.260.784,00	
4.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1"	UN		$	77.380,00					5,00	$	386.900,00	5,00	$	386.900,00	
4.8.5	CAJA DE INSPECCIÓN 0.70 M X 0.70 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1.50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E = 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN		$	971.645,00					3,00	$	2.914.935,00	3,00	$	2.914.935,00	
4.8.6	CAJA DE INSPECCIÓN 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1,50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E = 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN		$	1.185.009,00					1,00	$	1.185.009,00	1,00	$	1.185.009,00	
4.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$	14.705,00					31,48	$	462.913,40	31,48	$	462.913,40	
4.11.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LTS	UN		$	1.305.446,00					1,00	$	1.305.446,00	1,00	$	1.305.446,00	
4.11.21	SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES	M		$	4.284,00					11,00	$	47.124,00	11,00	$	47.124,00	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$	202.801,00					4,00	$	811.204,00	4,00	$	811.204,00	
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$	199.528,00					3,00	$	598.584,00	3,00	$	598.584,00	
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$	203.028,00					15,00	$	3.045.420,00	15,00	$	3.045.420,00	
5.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$	657.146,00					1,00	$	657.146,00	1,00	$	657.146,00	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN		$	38.729,00					9,00	$	348.561,00	9,00	$	348.561,00	
5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$	48.227,00					29,91	$	1.442.469,57	29,91	$	1.442.469,57	
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$	27.656,00					29,91	$	827.190,96	29,91	$	827.190,96	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$	185.231,00		6,00	$	1.111.386,00	34,00	$	6.297.854,00	40,00	$	7.409.240,00	
5.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$	118.069,00		-3,00	$	354.207,00	3,00	$	354.207,00				
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$	229.252,00		6,00	$	1.375.512,00	20,00	$	4.585.040,00	26,00	$	5.960.552,00	

5.1.85	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 225.283,00		3,00	$ 675.849,00			3,00	$ 675.849,00	
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE TUBOS LED, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 192.420,00		1,00	$ 192.420,00	13,00	$ 2.501.460,00	14,00	$ 2.693.880,00	
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN		$ 56.481,00		26,00	$ 1.468.506,00			26,00	$ 1.468.506,00	
5.1.104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE PUESTA A TIERRA 0.3X0.3 M, INCLUYE MARCO Y TAPA	UN		$ 271.175,00		1,00	$ 271.175,00			1,00	$ 271.175,00	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		$ 30.277,00				248,48	$ 7.523.228,96	248,48	$ 7.523.228,96	
7.1.17	RESANE DE PLACA DE ENTREPISO (BAJO PLACA SE DEBE LIMPIAR, PICAR Y RESANAR)	M2		$ 43.030,00				69,63	$ 2.996.178,90	69,63	$ 2.996.178,90	
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2		$ 165.341,00				27,32	$ 4.517.116,12	27,32	$ 4.517.116,12	
7.2.39	WIN DE ALUMINIO	M		$ 13.689,00				20,40	$ 279.255,60	20,40	$ 279.255,60	
7.2.44	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M		$ 20.077,00				158,74	$ 3.187.022,98	158,74	$ 3.187.022,98	
7.2.51	ENCHAPE EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CM, ANTIDESLIZANTE E = 5 MM TIPO TRÁFICO PESADO	M2		$ 114.860,00				222,19	$ 25.520.743,40	222,19	$ 25.520.743,40	
7.2.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M		$ 72.857,00				36,74	$ 2.676.766,18	36,74	$ 2.676.766,18	
7.2.95	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2		$ 52.510,00		27,32	$ 1.434.573,20			27,32	$ 1.434.573,20	
7.2.101	CONSTRUCCION DE BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO PARA ACCESO A SALONES ANCHO 10 CM	M		$ 36.104,00				10,56	$ 381.258,24	10,56	$ 381.258,24	
7.2.104	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE 25 X 35 HASTA UN ANCHO DE 60CM	M		$ 60.924,00				45,84	$ 2.792.756,16	45,84	$ 2.792.756,16	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$ 105.690,00				62,13	$ 6.566.519,70	62,13	$ 6.566.519,70	
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 738.375,00		10,56	$ 7.797.240,00			10,56	$ 7.797.240,00	
9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, CON BISAGRAS Y PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 723.485,00		6,68	$ 4.832.879,80			6,68	$ 4.832.879,80	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 670.634,00				1,93	$ 1.294.323,62	1,93	$ 1.294.323,62	
9.3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TAMAÑO MAXIMO 1.00 X 1.00 EN LAMINA DE ALFAJOR ANTIDESLIZANTE CAL 12 PARA PISOS, TAPAS, ESCLUSAS. INCLUYE ESTRUCTURA DE REFUERZO	UN		$ 278.647,00		3,00	$ 835.941,00			3,00	$ 835.941,00	
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M		$ 1.022.481,00				6,96	$ 7.116.467,76	6,96	$ 7.116.467,76	
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)	UN		$ 362.911,00		8,00	$ 2.903.288,00			8,00	$ 2.903.288,00	
11.1.41	GRIFERIA EXPUESTA PARA ORINAL TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2" DOCOL O SIMILAR.	UN		$ 316.814,00		2,00	$ 633.628,00			2,00	$ 633.628,00	
11.1.65	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO Y LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, INCLUYE ASIENTO SANITARIO, SISTEMA Y VALVULA PUSH PARA SANITARIO Y GRIFERIA PARA LAVAMANOS.	UN		$ 3.314.037,00		1,00	$ 3.314.037,00			1,00	$ 3.314.037,00	
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2		$ 1.154.718,00				22,98	$ 26.535.419,64	22,98	$ 26.535.419,64	
12.1.11	INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	UN		$ 76.722,00				8,00	$ 613.776,00	8,00	$ 613.776,00	
12.1.12	SUMINISTRO E INSTALACION BARRA MOVILIDAD REDUCIDA FIJA A MURO L= 60 CM	UN		$ 193.980,00		1,00	$ 193.980,00			1,00	$ 193.980,00	
12.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA ABATIBLE A MURO EN ACERO INOXIDABLE - MOVILIDAD REDUCIDA	UN		$ 655.345,00		1,00	$ 655.345,00			1,00	$ 655.345,00	
12.1.23	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA EN ACERO DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20 M CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40 CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M		$ 959.930,00		5,35	$ 5.135.625,50			5,35	$ 5.135.625,50	
12.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 1.221.257,00				0,94	$ 1.147.981,58	0,94	$ 1.147.981,58	
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 32.665,00				99,83	$ 3.260.946,95	99,83	$ 3.260.946,95	
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 15.835,00				2,65	$ 41.962,75	2,65	$ 41.962,75	
13.1.12	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.413,00				130,25	$ 2.658.793,25	130,25	$ 2.658.793,25	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 19.956,00				204,61	$ 4.083.197,16	204,61	$ 4.083.197,16	
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 14.139,00				458,04	$ 6.476.227,56	458,04	$ 6.476.227,56	
13.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 22.834,00				32,46	$ 741.191,64	32,46	$ 741.191,64	
13.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 15.595,00				354,94	$ 5.535.289,30	354,94	$ 5.535.289,30	
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 13.906,00				16,54	$ 230.005,24	16,54	$ 230.005,24	
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 26.338,00				15,39	$ 405.341,82	15,39	$ 405.341,82	
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2		$ 177.128,00		0,30	$ 53.138,40	5,88	$ 1.041.512,64	6,18	$ 1.094.651,04	
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2		$ 87.205,00		10,70	$ 933.093,50			10,70	$ 933.093,50	
17.1.23	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA	M		$ 20.856,00		47,48	$ 990.242,88			47,48	$ 990.242,88	

17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGUN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 226.106,00				185,93	$ 42.039.888,58	185,93	$ 42.039.888,58	
17.1.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 25 CM (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA MENOR)			$ 55.397,00				31,38	$ 1.738.357,86	31,38	$ 1.738.357,86	
17.1.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 HASTA UN DESARROLLO DE 80CM,INCLUYE TAPAS Y SOSCOS,SOPORTE EN U Y ANDAMIO CERTIFICADO. NO INCLUYE PINTURA NI ESTRUCTURA	M		$ 260.357,00				19,24	$ 5.009.268,68	19,24	$ 5.009.268,68	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.498,00		276,85	$ 1.245.271,30			276,85	$ 1.245.271,30	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 2.041,00				4.516,00	$ 9.217.156,00	4.516,00	$ 9.217.156,00	
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG		$ 2.445,00				4.516,00	$ 11.041.620,00	4.516,00	$ 11.041.620,00	
3.	**IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B**											
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 101.571,00				2,60	$ 264.084,60	2,60	$ 264.084,60	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 76.548,00				3,74	$ 286.289,52	3,74	$ 286.289,52	
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 46.664,00				43,87	$ 2.047.149,68	43,87	$ 2.047.149,68	
1.2.11	DEMOLICIÓN ALFAÍA EN CONCRETO E = 15 CM, H = 15 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 19.843,00				345,32	$ 6.852.184,76	345,32	$ 6.852.184,76	
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.665,00				27,12	$ 885.874,80	27,12	$ 885.874,80	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.496,00				218,94	$ 6.019.974,24	218,94	$ 6.019.974,24	
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15.568,00				24,71	$ 384.685,28	24,71	$ 384.685,28	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 9.835,00				22,42	$ 220.500,70	22,42	$ 220.500,70	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.671,00				8,52	$ 252.796,92	8,52	$ 252.796,92	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15.730,00		11,38	$ 179.007,40	6,45	$ 101.458,50	17,83	$ 280.465,90	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 16.844,00				8,00	$ 134.752,00	8,00	$ 134.752,00	
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 18.992,00				13,86	$ 263.229,12	13,86	$ 263.229,12	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.492,00				873,44	$ 28.379.812,48	873,44	$ 28.379.812,48	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.254,00				187,00	$ 4.722.498,00	187,00	$ 4.722.498,00	
1.2.36	DESMONTE DE BARANDA METALICA ALTURA NO MAYOR A 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 17.302,00				17,22	$ 297.940,44	17,22	$ 297.940,44	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 9.784,00				131,00	$ 1.281.704,00	131,00	$ 1.281.704,00	
1.2.43	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO	UN		$ 79.795,00				2,00	$ 159.590,00	2,00	$ 159.590,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.669,00		76,00	$ 430.844,00			76,00	$ 430.844,00	
1.4.6	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 7.060,00		328,41	$ 2.318.574,60			328,41	$ 2.318.574,60	
1.2.65	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/8", 1/2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 12.370,00				41,58	$ 514.344,60	41,58	$ 514.344,60	
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 27.594,00				100,08	$ 2.761.607,52	100,08	$ 2.761.607,52	
2.2.12	VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 78.206,00				131,20	$ 10.260.627,20	131,20	$ 10.260.627,20	
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 100.255,00				4,53	$ 454.155,15	4,53	$ 454.155,15	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 6.524,00				382,72	$ 2.496.865,28	382,72	$ 2.496.865,28	
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 18.820,00				9.637,15	$ 181.371.163,00	9.637,15	$ 181.371.163,00	
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2		$ 54.318,00				61,81	$ 3.357.395,58	61,81	$ 3.357.395,58	
3.1.5	MURO BLOQUE HUECO No.4 (HASTA 30 CM)	M		$ 29.965,00				80,07	$ 2.399.297,55	80,07	$ 2.399.297,55	
3.1.17	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 7.967,00				234,51	$ 1.868.341,17	234,51	$ 1.868.341,17	
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2		$ 33.445,00				234,51	$ 7.843.186,95	234,51	$ 7.843.186,95	
3.1.24	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2		$ 10.856,00				25,20	$ 273.571,20	25,20	$ 273.571,20	
3.3.5	ANCLAJE PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UN		$ 16.662,00				476,00	$ 7.931.112,00	476,00	$ 7.931.112,00	
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 50.113,00				2,00	$ 100.226,00	2,00	$ 100.226,00	

4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 50.113,00				2,00	$ 100.226,00	2,00	$ 100.226,00	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 139.642,00				2,00	$ 279.284,00	2,00	$ 279.284,00	
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 78.799,00				4,00	$ 315.196,00	4,00	$ 315.196,00	
4.11.20	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		$ 162.314,00				2,00	$ 324.628,00	2,00	$ 324.628,00	
5.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 152.454,00		4,00	$ 609.816,00	1,00	$ 152.454,00	5,00	$ 762.270,00	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE N°12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 202.801,00				14,00	$ 2.839.214,00	14,00	$ 2.839.214,00	
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 203.028,00		12,00	$ 2.436.336,00	44,00	$ 8.933.232,00	56,00	$ 11.369.568,00	
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 819.936,00				2,00	$ 1.639.872,00	2,00	$ 1.639.872,00	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN		$ 38.729,00				18,00	$ 697.122,00	18,00	$ 697.122,00	
5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	UN		$ 48.227,00				20,00	$ 964.540,00	20,00	$ 964.540,00	
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN	M		$ 27.656,00		517,41	$ 14.309.490,96	211,97	$ 5.862.242,32	729,38	$ 20.171.733,28	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 185.231,00		26,00	$ 4.816.006,00	67,00	$ 12.410.477,00	93,00	$ 17.226.483,00	
5.1.73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA LED, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 117.122,00		1,00	$ 117.122,00	2,00	$ 234.244,00	3,00	$ 351.366,00	
5.1.80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 229.252,00		24,00	$ 5.502.048,00	48,00	$ 11.004.096,00	72,00	$ 16.506.144,00	
5.1.85	SUMINISTRO LAMPARA DE EMERGENCIA DOS LUMINARIAS DE 1.6 W TIPO LED. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 225.283,00		3,00	$ 675.849,00			3,00	$ 675.849,00	
5.1.88	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA TIPO LED 2X18W - HERMETICA. INCLUYE TUBOS LED, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	UN		$ 192.420,00				19,00	$ 3.655.980,00	19,00	$ 3.655.980,00	
5.1.98	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT DE GUAYAS PARA PANEL LED	UN		$ 56.481,00		24,00	$ 1.355.544,00	50,00	$ 2.824.050,00	74,00	$ 4.179.594,00	
5.1.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE, EN LÁMINA GALVANIZADA CON TAPA CAL.20, 20 X 10 CM, CON ESCALERILLA INTERNA, INCLUYE SOPORTES Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN (RED CABLE DATOS).	M		$ 187.506,00				60,00	$ 11.250.360,00	60,00	$ 11.250.360,00	
7.2.51	ENCHAPE EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CM, ANTIDESLIZANTE E = 5 MM TIPO TRÁFICO PESADO	M2		$ 114.860,00				4,53	$ 520.315,80	4,53	$ 520.315,80	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$ 105.690,00				16,72	$ 1.767.136,80	16,72	$ 1.767.136,80	
9.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO CON REJILLA SUPERIOR, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 670.634,00				1,54	$ 1.032.776,36	1,54	$ 1.032.776,36	
11.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE PEDESTAL COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA, GRIFERÍA TIPO PUSH Y SELLANTE)	UN		$ 620.620,00				2,00	$ 1.241.240,00	2,00	$ 1.241.240,00	
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 946.209,00				2,00	$ 1.892.418,00	2,00	$ 1.892.418,00	
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UN		$ 33.830,00				2,00	$ 67.660,00	2,00	$ 67.660,00	
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 32.665,00				132,12	$ 4.315.699,80	132,12	$ 4.315.699,80	
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M		$ 15.130,00		246,91	$ 3.735.748,30	54,31	$ 821.710,30	301,22	$ 4.557.458,60	
13.1.3	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 36.167,00		84,60	$ 3.059.728,20			84,60	$ 3.059.728,20	
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 12.818,00				283,98	$ 3.640.055,64	283,98	$ 3.640.055,64	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		$ 7.909,00				266,46	$ 2.107.432,14	266,46	$ 2.107.432,14	
13.1.12	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.413,00				81,42	$ 1.662.026,46	81,42	$ 1.662.026,46	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 19.956,00				572,52	$ 11.425.209,12	572,52	$ 11.425.209,12	
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 14.139,00		591,11	$ 8.357.704,29	1.095,52	$ 15.489.557,28	1.686,63	$ 23.847.261,57	
13.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 22.834,00		113,54	$ 2.592.572,36	205,51	$ 4.692.615,34	319,05	$ 7.285.187,70	
13.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 15.595,00		66,30	$ 1.033.948,50	324,48	$ 5.060.265,60	390,78	$ 6.094.214,10	
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 13.906,00				4,97	$ 69.112,82	4,97	$ 69.112,82	
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 9.557,00		113,54	$ 1.085.101,78			113,54	$ 1.085.101,78	
13.4.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 11.705,00				46,15	$ 540.185,75	46,15	$ 540.185,75	
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 26.338,00				77,30	$ 2.035.927,40	77,30	$ 2.035.927,40	
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 69.566,00				64,95	$ 4.518.311,70	64,95	$ 4.518.311,70	
14.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO 6 MM	M2		$ 85.787,00				32,38	$ 2.777.783,06	32,38	$ 2.777.783,06	

15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2		$ 177.128,00		0,58	$ 102.734,24			0,58	$ 102.734,24	
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 226.106,00				660,50	$ 149.343.013,00	660,50	$ 149.343.013,00	
17.1.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH	M		$ 113.886,00				15,50	$ 1.765.233,00	15,50	$ 1.765.233,00	
17.1.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF UPVC BLANCA 2,5MM (INCLUYE ANDAMIOS, TEJA Y TORNILLERIA)	M2		$ 134.353,00				326,00	$ 43.799.078,00	326,00	$ 43.799.078,00	
17.1.62	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 HASTA UN DESARROLLO DE 80CM,INCLUYE TAPAS Y SOSCOS,SOPORTE EN U Y ANDAMIO CERTIFICADO. NO INCLUYE PINTURA NI ESTRUCTURA	M		$ 260.357,00				95,60	$ 24.890.129,20	95,60	$ 24.890.129,20	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.498,00				278,02	$ 1.250.533,96	278,02	$ 1.250.533,96	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 2.041,00				11.810,00	$ 24.104.210,00	11.810,00	$ 24.104.210,00	
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG		$ 2.445,00				11.810,00	$ 28.875.450,00	11.810,00	$ 28.875.450,00	
20.1.6	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES	M3		$ 5.007,00				139,01	$ 696.023,07	139,01	$ 696.023,07	
4.	**IED JAIME GARZON SEDE AURAS**											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 30.872,00		16,20	$ 500.126,40	99,60	$ 3.074.851,20	115,80	$ 3.574.977,60	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.496,00				8,46	$ 232.616,16	8,46	$ 232.616,16	
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.416,00		5,70	$ 116.371,20	44,40	$ 906.470,40	50,10	$ 1.022.841,60	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.492,00		193,97	$ 6.302.473,24	188,75	$ 6.132.865,00	382,72	$ 12.435.338,24	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 9.784,00		19,00	$ 185.896,00			19,00	$ 185.896,00	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.669,00		46,00	$ 260.774,00			46,00	$ 260.774,00	
1.264	REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 5.538,00		137,61	$ 762.084,18			137,61	$ 762.084,18	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 16.241,00		2,00	$ 32.482,00			2,00	$ 32.482,00	
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 27.594,00		31,53	$ 870.038,82	130,97	$ 3.613.986,18	162,50	$ 4.484.025,00	
1.4.11	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 14.166,00				16,92	$ 239.688,72	16,92	$ 239.688,72	
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 18.820,00				11.585,43	$ 218.037.792,60	11.585,43	$ 218.037.792,60	
3.3.5	ANCLAJE PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UN		$ 16.662,00				112,00	$ 1.866.144,00	112,00	$ 1.866.144,00	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 202.801,00		4,00	$ 811.204,00			4,00	$ 811.204,00	
5.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE Nº12 LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 199.528,00		4,80	$ 957.734,40			4,80	$ 957.734,40	
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 203.028,00		24,00	$ 4.872.672,00			24,00	$ 4.872.672,00	
5.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN		$ 594.876,00		0,80	$ 475.900,80			0,80	$ 475.900,80	
5.1.39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA 15X15X10CM CON PUERTA Y CERRADURA.	UN		$ 38.729,00		10,00	$ 387.290,00			10,00	$ 387.290,00	
5.1.51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M		$ 48.227,00		66,44	$ 3.204.201,88			66,44	$ 3.204.201,88	
5.1.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T)	M		$ 17.079,00		79,00	$ 1.349.241,00			79,00	$ 1.349.241,00	
5.1.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 1Nº10 (F) + 1Nº10 (N) + 1Nº12 (T) AWG THHN	M		$ 20.757,00		79,00	$ 1.639.803,00			79,00	$ 1.639.803,00	
5.1.62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS 3Nº6 (F) + 1Nº6 (N) + 1Nº8 (T) AWG THHN	M		$ 72.938,00		9,42	$ 687.075,96			9,42	$ 687.075,96	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE 1Nº12 (F) + 1Nº12 (N) + 1Nº12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 185.231,00		57,00	$ 10.558.167,00			57,00	$ 10.558.167,00	
5.1.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RAWELT ALUMINIO 2400 INCLUYE TAPA 10X10 Y TAPAS DE COSTADOS	UN		$ 52.241,00		17,00	$ 888.097,00			17,00	$ 888.097,00	
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 12.818,00		137,61	$ 1.763.884,98			137,61	$ 1.763.884,98	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		$ 7.909,00		517,03	$ 4.089.190,27			517,03	$ 4.089.190,27	
13.1.12	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.413,00		119,73	$ 2.444.048,49			119,73	$ 2.444.048,49	

13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 19.956,00		180,57	$ 3.603.454,92			180,57	$ 3.603.454,92	
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 14.139,00		511,14	$ 7.227.008,46			511,14	$ 7.227.008,46	
13.2.4	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 22.834,00		199,26	$ 4.549.902,84			199,26	$ 4.549.902,84	
13.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 15.595,00		80,38	$ 1.253.526,10			80,38	$ 1.253.526,10	
13.2.11	PINTURA EN ESMALTE PARA GUARDAESCOBA EN CUALQUIER MATERIAL, H= 0.10 M. INCLUYE PREVIA LIJADA DE LA SUPERFICIE.	M		$ 6.789,00		90,37	$ 613.521,93			90,37	$ 613.521,93	
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 9.557,00		180,57	$ 1.725.707,49			180,57	$ 1.725.707,49	
17.1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).	M2		$ 226.106,00		502,70	$ 113.663.486,20	95,36	$ 21.561.468,16	598,06	$ 135.224.954,36	
17.1.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO (80 A 100) CM. INCLUYE SOPORTES METÁLICOS PARA FIJAR LA CANAL EN LA FACHADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE.	M		$ 304.720,00		67,20	$ 20.477.184,00			67,20	$ 20.477.184,00	
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		$ 1.731,00		3.033,63	$ 5.251.213,53	20.863,79	$ 36.115.220,49	23.897,42	$ 41.366.434,02	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 2.041,00		3.300,00	$ 6.735.300,00	4.310,00	$ 8.796.710,00	7.610,00	$ 15.532.010,00	
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG		$ 2.445,00		3.300,00	$ 8.068.500,00	4.310,00	$ 10.537.950,00	7.610,00	$ 18.606.450,00	
5.	**IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A**											
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 30.872,00				55,89	$ 1.725.436,08	55,89	$ 1.725.436,08	
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 62.252,00				48,06	$ 2.991.831,12	48,06	$ 2.991.831,12	
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E = 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.855,00				94,76	$ 2.165.739,80	94,76	$ 2.165.739,80	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.496,00				9,20	$ 252.963,20	9,20	$ 252.963,20	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.671,00				11,99	$ 355.755,29	11,99	$ 355.755,29	
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 18.992,00				21,00	$ 398.832,00	21,00	$ 398.832,00	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.492,00				47,19	$ 1.533.297,48	47,19	$ 1.533.297,48	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.254,00				54,01	$ 1.363.968,54	54,01	$ 1.363.968,54	
1.2.38	DESMONTE DE BANCAS INCLUYE DEMOLICION DE BASES EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 120.790,00				2,00	$ 241.580,00	2,00	$ 241.580,00	
1.4.3	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 3 MM, PROFUNDIDAD DE 2 A 3 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 14.008,00				23,10	$ 323.584,80	23,10	$ 323.584,80	
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 27.594,00				156,70	$ 4.323.979,80	156,70	$ 4.323.979,80	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 78.085,00				30,67	$ 2.394.866,95	30,67	$ 2.394.866,95	
2.1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN RECEBO COMPACTADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 117.078,00				1,97	$ 230.643,66	1,97	$ 230.643,66	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3		$ 74.819,00				4,32	$ 323.218,08	4,32	$ 323.218,08	
2.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		$ 147.970,00				4,32	$ 639.230,40	4,32	$ 639.230,40	
2.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE PIEDRA	M3		$ 140.339,00				6,11	$ 857.471,29	6,11	$ 857.471,29	
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 100.255,00				44,24	$ 4.435.281,20	44,24	$ 4.435.281,20	
2.3.2	MESÓN EN CONCRETO E = 0.10 M HASTA 0.6 M DE ANCHO ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO.	M		$ 129.268,00				3,41	$ 440.803,88	3,41	$ 440.803,88	
2.3.20	PERFORACIÓN NÚCLEO 2" E = 0.10 M	UN		$ 35.441,00				13,00	$ 460.733,00	13,00	$ 460.733,00	
2.4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2,96 kg/m2)	M2		$ 21.297,00				44,24	$ 942.179,28	44,24	$ 942.179,28	
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 18.820,00				661,41	$ 12.447.736,20	661,41	$ 12.447.736,20	
3.1.19	TRATAMIENTO DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA CONSISTE EN: REEMBOQUILLADO JUNTAS, LAVADO CON RINSE Y ADITIVOS PARA RETIRO DE SUCIEDAD, MANCHAS, HONGOS, DEJANDO UNA SUPERFICIE APTA PARA APLICACIÓN DE HIDROFUGO 12 AÑOS. (INCLUYE PRODUCTOS DE LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION, EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA)	M2		$ 33.445,00				9,86	$ 329.767,70	9,86	$ 329.767,70	
3.1.22	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M2		$ 16.614,00				1,50	$ 24.921,00	1,50	$ 24.921,00	
3.3.5	ANCLAJE PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UN		$ 16.662,00				120,00	$ 1.999.440,00	120,00	$ 1.999.440,00	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 68.520,00				9,00	$ 616.680,00	9,00	$ 616.680,00	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 42.706,00				6,00	$ 256.236,00	6,00	$ 256.236,00	
4.2.14	SUMINISTRO E INSTALACION SIFON DE PISO 4" INCLUYE ACCESORIOS	UN		$ 151.558,00				1,00	$ 151.558,00	1,00	$ 151.558,00	
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 50.113,00				2,00	$ 100.226,00	2,00	$ 100.226,00	
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4"	UN		$ 139.642,00				1,00	$ 139.642,00	1,00	$ 139.642,00	

4.8.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METALICA E = 0.20 M	UN		$ 767.423,00				1,00	$ 767.423,00	1,00	$ 767.423,00	
4.8.5	CAJA DE INSPECCIÓN 0.70 M X 0.70 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1.50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E = 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN		$ 971.645,00				2,00	$ 1.943.290,00	2,00	$ 1.943.290,00	
4.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$ 14.705,00				86,39	$ 1.270.364,95	86,39	$ 1.270.364,95	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		$ 30.277,00				43,20	$ 1.307.966,40	43,20	$ 1.307.966,40	
7.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDA ESCOBA EN MADERA PARA AREA DE PISO EN CAUCHO H = 0.10 M	M		$ 17.286,00				26,11	$ 451.337,46	26,11	$ 451.337,46	
7.2.36	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M		$ 19.555,00				25,40	$ 496.697,00	25,40	$ 496.697,00	
7.2.75	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PISO EN TABLON TRADICION EN GRESS	M2		$ 114.476,00				43,20	$ 4.945.363,20	43,20	$ 4.945.363,20	
7.2.84	SUMINISTRO DE PISO NIPOLAM DE 2MM HOMOGENEO INCLUYE PÉGANTE, MASTICO Y MANO DE OBRA.	M2		$ 315.784,00				94,76	$ 29.923.691,84	94,76	$ 29.923.691,84	
7.2.109	AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL - E: 0.08 M.	M2		$ 63.965,00				94,76	$ 6.061.323,40	94,76	$ 6.061.323,40	
9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 791.567,00				4,10	$ 3.245.424,70	4,10	$ 3.245.424,70	
9.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HOJA PARA PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON DOBLE ANTIMACHUCON, CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2		$ 869.706,00				7,72	$ 6.714.130,32	7,72	$ 6.714.130,32	
11.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN		$ 45.126,00				2,00	$ 90.252,00	2,00	$ 90.252,00	
12.1.11	INSTALACIÓN DE APARATOS EXISTENTES PREVIAMENTE DESMONTADOS	UN		$ 76.722,00				1,00	$ 76.722,00	1,00	$ 76.722,00	
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MURO 1:4 E = 20 A 50 CM	M		$ 15.130,00				29,32	$ 443.611,60	29,32	$ 443.611,60	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		$ 7.909,00				247,51	$ 1.957.556,59	247,51	$ 1.957.556,59	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 19.956,00				247,51	$ 4.939.309,56	247,51	$ 4.939.309,56	
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 14.139,00				27,65	$ 390.943,35	27,65	$ 390.943,35	
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 13.906,00				59,45	$ 826.711,70	59,45	$ 826.711,70	
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 69.566,00				140,45	$ 9.770.544,70	140,45	$ 9.770.544,70	
17.1.8	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 156.471,00				10,75	$ 1.682.063,25	10,75	$ 1.682.063,25	
17.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA TIPO ECOROOF O SIMILAR DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M		$ 105.198,00				8,55	$ 899.442,90	8,55	$ 899.442,90	
17.1.26	TEJA TRASLUCIDA EN POLIESTER TERMOESTABLE CON CON REFUERZO EN FIBRA DE VIDRIO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 118.425,00				70,68	$ 8.370.279,00	70,68	$ 8.370.279,00	
17.1.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 25 CM (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA MENOR)	M		$ 55.397,00				8,00	$ 443.176,00	8,00	$ 443.176,00	
17.1.61	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE TAPA MURO CAL 22. DESARROLLO 61 CM PARA UNION ENTRE EDIFICIOS, INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, TRANSPORTE, MANO DE OBRA ANTICORROSIVO Y ESMALTE	M		$ 123.033,00				42,09	$ 5.178.458,97	42,09	$ 5.178.458,97	
18.1.20	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3		$ 59.029,00				4,42	$ 260.908,18	4,42	$ 260.908,18	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.498,00				138,98	$ 625.132,04	138,98	$ 625.132,04	
6.	**IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LA UNIÓN**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	m		$ 30.872,00		42,20	$ 1.302.798,40	106,49	$ 3.287.559,28	148,69	$ 4.590.357,68	
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 298.850,00				0,10	$ 29.885,00	0,10	$ 29.885,00	
1.2.3	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 101.571,00				6,48	$ 658.180,08	6,48	$ 658.180,08	
1.2.4	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 76.548,00				161,51	$ 12.363.267,48	161,51	$ 12.363.267,48	
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 46.664,00				215,22	$ 10.043.026,08	215,22	$ 10.043.026,08	
1.2.8	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.30 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 93.313,00				15,90	$ 1.483.676,70	15,90	$ 1.483.676,70	
1.2.13	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E = 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 22.855,00				44,96	$ 1.027.560,80	44,96	$ 1.027.560,80	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.496,00				60,40	$ 1.660.758,40	60,40	$ 1.660.758,40	
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15.568,00		39,93	$ 621.630,24	1,05	$ 16.346,40	40,98	$ 637.976,64	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 9.835,00				167,39	$ 1.646.280,65	167,39	$ 1.646.280,65	
1.2.23	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, POYOS, PREFABRICADOS,ETC (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 15.730,00				4,00	$ 62.920,00	4,00	$ 62.920,00	
1.2.26	DEMOLICION DE ENCOROZADO DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 20.416,00				10,96	$ 223.759,36	10,96	$ 223.759,36	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.671,00				22,74	$ 674.718,54	22,74	$ 674.718,54	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15.730,00				0,90	$ 14.157,00	0,90	$ 14.157,00	

1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 16.844,00				15,00	$ 252.660,00	15,00	$ 252.660,00	
1.2.31	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDROSANITARIAS EXISTENTES DE 6", 4", 3", 2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 18.992,00				60,23	$ 1.143.888,16	60,23	$ 1.143.888,16	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.492,00				355,14	$ 11.539.208,88	355,14	$ 11.539.208,88	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.254,00				75,09	$ 1.896.322,86	75,09	$ 1.896.322,86	
1.2.63	DEMOLICION DE PISOS PISO BALDOSA VIBROPRENSADA GRANO MARMOL 30*30 PERLATO CLARO	M2		$ 16.926,00				45,82	$ 775.549,32	45,82	$ 775.549,32	
1.2.64	REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 5.538,00				54,47	$ 301.654,86	54,47	$ 301.654,86	
1.2.68	DESMONTE DE GRIFERIAS EXISTENTES INCRUSTADAS EN MURO TIPO LAVAMANOS U ORINALES CORRIDOS INCLUYE RETIRO DE LAS MISMAS	UN		$ 11.210,00				12,00	$ 134.520,00	12,00	$ 134.520,00	
1.2.69	DESMONTE Y REINSTALACION DE ADOQUINES USADOS (INCLUYE CONFORMACION DE NIVEL)	M2		$ 52.845,00				1,68	$ 88.779,60	1,68	$ 88.779,60	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 16.241,00				30,79	$ 500.060,39	30,79	$ 500.060,39	
1.4.7	TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.	M3		$ 27.594,00		24,55	$ 677.432,70	427,52	$ 11.796.986,88	452,07	$ 12.474.419,58	
1.4.11	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 14.166,00				111,65	$ 1.581.633,90	111,65	$ 1.581.633,90	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 78.085,00				77,40	$ 6.043.779,00	77,40	$ 6.043.779,00	
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 50.516,00				140,47	$ 7.095.982,52	140,47	$ 7.095.982,52	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3		$ 74.819,00		0,87	$ 65.092,53	20,06	$ 1.500.869,14	20,93	$ 1.565.961,67	
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 78.778,00		75,21	$ 5.924.893,38			75,21	$ 5.924.893,38	
2.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		$ 147.970,00		0,87	$ 128.733,90	8,37	$ 1.238.508,90	9,24	$ 1.367.242,80	
2.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE PIEDRA	M3		$ 140.339,00				1,33	$ 186.650,87	1,33	$ 186.650,87	
2.1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RAJÓN 30-40, INCLUYE TRANSPORTE	M3		$ 168.335,00				3,40	$ 572.339,00	3,40	$ 572.339,00	
2.2.4	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 886.007,00				2,58	$ 2.285.898,06	2,58	$ 2.285.898,06	
2.2.5	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 905.487,00				3,83	$ 3.468.015,21	3,83	$ 3.468.015,21	
2.2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 78.778,00				39,36	$ 3.100.702,08	39,36	$ 3.100.702,08	
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CM. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 82.769,00				0,80	$ 66.215,20	0,80	$ 66.215,20	
2.2.17	ESCALERA MACIZA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, CURADO Y DESMOLDEANTE. NO INCLUYE ACERO)	M3		$ 1.286.776,00				2,39	$ 3.075.394,64	2,39	$ 3.075.394,64	
2.2.21	RAMPA EN CONCRETO 3000 PSI E = 0.15 M (INCLUYE FORMALETA, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN NO INLUYE REFUERZO).	M2		$ 174.410,00		8,44	$ 1.472.020,40	4,57	$ 797.053,70	13,01	$ 2.269.074,10	
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 100.255,00				177,03	$ 17.748.142,65	177,03	$ 17.748.142,65	
2.2.26	PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION (NO INCLUYE ACERO)	M2		$ 145.853,00				57,91	$ 8.446.347,23	57,91	$ 8.446.347,23	
2.2.30	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO Y DESMOLDANTE. NO INCLUYE ACERO).	M3		$ 1.068.505,00				0,06	$ 64.110,30	0,06	$ 64.110,30	
2.2.31	PUENTE DE ADHERENCIA CON ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONCRETO FRESCO A ENDURECIDO – INCLUYE ESCARIFICADO DE SUPERFICIE	M2		$ 107.209,00				0,84	$ 90.055,56	0,84	$ 90.055,56	
2.3.10	CONSTRUCCION CÁRCAMO EN CONCRETO CON REJILLA SUPERIOR EN ANGULO Y PLATINA 0.3 M ANCHO CON SEPARACIÓN INSPECCIONABLE, DIMENSION SEGÚN DETALLE	M		$ 447.714,00				3,96	$ 1.772.947,44	3,96	$ 1.772.947,44	
2.3.12	CUNETA EN CONCRETO DE 3.000 PSI, ANCHO 0M PROFUNDIDAD 0.30 M (NO INCLUYE REFUERZO)	M		$ 142.987,00				16,30	$ 2.330.688,10	16,30	$ 2.330.688,10	
2.3.34	ANDEN EN CONCRETO DE E= 0.10 3000PSI ESCOBIADO Y GUALIADO INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y TRANSPORTE	M2		$ 107.501,00		9,01	$ 968.584,01	58,29	$ 6.266.233,29	67,30	$ 7.234.817,30	
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG		$ 6.524,00		207,53	$ 1.353.925,72	554,49	$ 3.617.492,76	762,02	$ 4.971.418,48	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.194,00		51,86	$ 373.080,84	395,13	$ 2.842.565,22	446,99	$ 3.215.646,06	
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 6 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.194,00				122,27	$ 879.610,38	122,27	$ 879.610,38	
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)	KG		$ 18.820,00		192,51	$ 3.623.038,20	2.140,84	$ 40.290.608,80	2.333,35	$ 43.913.647,00	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2		$ 55.770,00		59,31	$ 3.307.718,70	3,55	$ 197.983,50	62,86	$ 3.505.702,20	
3.3.5	ANCLAJE PARA SUJECIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 10 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)	UN		$ 16.662,00		8,00	$ 133.296,00			8,00	$ 133.296,00	
4.1.24	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 119.355,00		4,04	$ 482.194,20			4,04	$ 482.194,20	
4.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 138.381,00				15,13	$ 2.093.704,53	15,13	$ 2.093.704,53	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 68.520,00				121,68	$ 8.337.513,60	121,68	$ 8.337.513,60	
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 4"	UN		$ 35.013,00		10,00	$ 350.130,00	18,00	$ 630.234,00	28,00	$ 980.364,00	
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 3" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 70.429,00				2,13	$ 150.013,77	2,13	$ 150.013,77	
4.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 42.706,00				61,67	$ 2.633.679,02	61,67	$ 2.633.679,02	
4.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 2"	UN		$ 18.207,00		71,00	$ 1.292.697,00			71,00	$ 1.292.697,00	
4.2.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 3"	UN		$ 56.738,00				6,00	$ 340.428,00	6,00	$ 340.428,00	
4.2.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA REDUCIDA 4" X 2"	UN		$ 56.739,00		8,00	$ 453.912,00	9,00	$ 510.651,00	17,00	$ 964.563,00	
4.2.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUJE SOLDADO 4"X2"	UN		$ 25.973,00		1,00	$ 25.973,00	1,00	$ 25.973,00	2,00	$ 51.946,00	
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 12.855,00				79,00	$ 1.015.545,00	79,00	$ 1.015.545,00	
4.3.18	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO PVCP DE 1/2"	UN		$ 4.133,00		96,00	$ 396.768,00			96,00	$ 396.768,00	

4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA SANITARIO TANQUE 1/2"	UN		$ 50.113,00				13,00	$ 651.469,00	13,00	$ 651.469,00		
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 50.113,00				19,00	$ 952.147,00	19,00	$ 952.147,00		
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 4	UN		$ 139.642,00				13,00	$ 1.815.346,00	13,00	$ 1.815.346,00		
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO SANITARIO 2"	UN		$ 78.799,00				17,00	$ 1.339.583,00	17,00	$ 1.339.583,00		
4.8.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METALICA E = 0.20 M	UN		$ 767.423,00		1,00	$ 767.423,00	12,00	$ 9.209.076,00	13,00	$ 9.976.499,00		
4.8.6	CAJA DE INSPECCIÓN 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1,50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA METÁLICA E = 0.20 M (INCLUYE ACERO)	UN		$ 1.185.009,00				1,00	$ 1.185.009,00	1,00	$ 1.185.009,00		
4.8.8	RENIVELACION DE CAJAS DE INSPECCION	UN		$ 65.638,00				3,00	$ 196.914,00	3,00	$ 196.914,00		
4.10.4	SUMINISTRO E INSTALACION INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE 4"	M		$ 124.450,00		18,00	$ 2.240.100,00			18,00	$ 2.240.100,00		
4.10.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000	M2		$ 14.039,00		32,40	$ 454.863,60			32,40	$ 454.863,60		
4.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$ 14.705,00		82,86	$ 1.218.456,30			82,86	$ 1.218.456,30		
4.10.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FILTRO EN TRITURADO 3/4" ANCHO =50CM	M3		$ 178.453,00		2,70	$ 481.823,10			2,70	$ 481.823,10		
4.11.19	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA 1/2"	UN		$ 74.229,00		1,00	$ 74.229,00			1,00	$ 74.229,00		
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		$ 30.277,00		37,46	$ 1.134.176,42	39,85	$ 1.206.538,45	77,31	$ 2.340.714,87		
7.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE GUARDAESCOBA BISELADO	M2		$ 165.341,00				39,85	$ 6.588.838,85	39,85	$ 6.588.838,85		
7.2.39	WIN DE ALUMINIO	M		$ 13.689,00				10,81	$ 147.978,09	10,81	$ 147.978,09		
7.2.85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACIONES EN PLASTICO)	M		$ 72.857,00				42,61	$ 3.104.436,77	42,61	$ 3.104.436,77		
7.2.95	DESTRONQUE, PULIDA Y SELLADA DE PISOS EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE RESANE DE EMPALMES A GUARDA ESCOBA Y MEDIA CAÑA (CURVO Y RECTO) EXISTENTES	M2		$ 52.510,00		41,46	$ 2.177.064,60			41,46	$ 2.177.064,60		
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$ 105.690,00				85,26	$ 9.011.129,40	85,26	$ 9.011.129,40		
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 946.209,00				9,00	$ 8.515.881,00	9,00	$ 8.515.881,00		
11.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS CORRIDO EN POLICUARZO CON SUBDIVISION POR MODULO DE SERVICIO, FALDON FRONTAL DE 30 CM, SALPICADERO DE 6 CM, REENGRUESE DE 3 CM TERMINADO ANCHO 50 CM Y DISTANCIAMIENTO MINIMO ENTRE EJES DE GRIFOS A 60CM	M		$ 1.022.481,00		7,90	$ 8.077.599,90			7,90	$ 8.077.599,90		
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, ACOPLE Y SIFÓN)			$ 362.911,00		11,00	$ 3.992.021,00			11,00	$ 3.992.021,00		
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE 20 X 20 PLASTICA	UN		$ 33.830,00				2,00	$ 67.660,00	2,00	$ 67.660,00		
12.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PUERTAS Y PANELES EN ACERO CALIBRE 20, DIVISIONES PARA BAÑO INSTITUCIONAL, REF. 304 ANTIÁCIDO, ENTAMBORADAS	M2		$ 1.154.718,00				34,09	$ 39.364.336,62	34,09	$ 39.364.336,62		
12.1.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 PARA ORINAL	M2		$ 1.221.257,00				1,17	$ 1.428.870,69	1,17	$ 1.428.870,69		
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 32.665,00				168,63	$ 5.508.298,95	168,63	$ 5.508.298,95		
13.1.3	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M		$ 14.359,00		128,44	$ 1.844.269,96			128,44	$ 1.844.269,96		
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 19.956,00				116,26	$ 2.320.084,56	116,26	$ 2.320.084,56		
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 13.906,00		5,00	$ 69.530,00	20,60	$ 286.463,60	25,60	$ 355.993,60		
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 9.557,00				108,95	$ 1.041.235,15	108,95	$ 1.041.235,15		
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS DOS CARAS	M2		$ 25.309,00				2,25	$ 56.945,25	2,25	$ 56.945,25		
15.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM FLOTANTE CON ESTRUCTURA EN TUBULAR DE 1" EN ALUMINIO	M2		$ 177.128,00		7,78	$ 1.378.055,84			7,78	$ 1.378.055,84		
15.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO 5 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD	M2		$ 97.812,00		1,21	$ 118.352,52			1,21	$ 118.352,52		
15.2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN PLOTTER INSTALADO	M2		$ 119.573,00		0,47	$ 56.199,31			0,47	$ 56.199,31		
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		$ 1.731,00		9.502,35	$ 16.448.567,85	38.297,12	$ 66.292.314,72	47.799,47	$ 82.740.882,57		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.498,00				41,66	$ 187.386,68	41,66	$ 187.386,68		
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 2.041,00		2.770,00	$ 5.653.570,00			2.770,00	$ 5.653.570,00		
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG		$ 2.445,00		2.770,00	$ 6.772.650,00			2.770,00	$ 6.772.650,00		
7.	**IED CHUNIZA**												
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 30.872,00				144,85	$ 4.471.809,20	144,85	$ 4.471.809,20		
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.665,00				753,00	$ 24.596.745,00	753,00	$ 24.596.745,00		
1.3.3	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)	M2		$ 35.918,00		7,20	$ 258.609,60			7,20	$ 258.609,60		
1.3.4	MANTENIMIENTO DE VENTANERIA Y REJAS CONSISTENTE EN: DESMONTE DE REJAS, ADECUACIÓN DE SOPORTES E INSTALACIÓN AL INTERIOR, MANTENIMIENTO CON MASILLA, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE VENTANERIA Y REJAS, SOLDADO DE ELEMENTOS SUELTOS Y REPOSICIÓN DE MANIJAS.	M2		$ 116.287,00		3,00	$ 348.861,00			3,00	$ 348.861,00		
1.3.6	CORTE, MANTENIMIENTO Y PINTURA DE PUERTAS METALICAS EN LAMINA COLDROLLED 0,90 X 2.10 M INCLUYE DESMONTE, TRASLADO, ACOPIO, CORTE, SOLDADURA DE PLATINAS, PINTURA Y REINSTALACIÓN	UN		$ 131.360,00		1,00	$ 131.360,00			1,00	$ 131.360,00		
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, "INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS"	M3		$ 78.085,00				50,00	$ 3.904.250,00	50,00	$ 3.904.250,00		
2.1.4	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 66.628,00				307,45	$ 20.484.778,60	307,45	$ 20.484.778,60		
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3		$ 74.819,00				151,35	$ 11.323.855,65	151,35	$ 11.323.855,65		
2.1.13	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3		$ 210.097,00				134,35	$ 28.226.531,95	134,35	$ 28.226.531,95		
2.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE RAJON DE PIEDRA	M3		$ 140.339,00				13,50	$ 1.894.576,50	13,50	$ 1.894.576,50		
2.3.7	CÁRCAMO PREFABRICADO EN CONCRETO (25 X 40 CM) CON REJILLA PEATONAL.	M		$ 331.421,00				44,15	$ 14.632.237,15	44,15	$ 14.632.237,15		
2.3.15	SUMINISTRO E INSTALACION SARDINEL PREFABRICADO EN CONCRETO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RECEBO (A-10 H=0.40 M)	M		$ 72.799,00				19,02	$ 1.384.636,98	19,02	$ 1.384.636,98		
2.3.39	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUÍN DE 20 X 35 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	M		$ 126.159,00				160,76	$ 20.281.320,84	160,76	$ 20.281.320,84		
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.194,00				1.566,24	$ 11.267.530,56	1.566,24	$ 11.267.530,56		
4.1.32	SEI TUBERIA PVC ALCANTARILLADO CORRUGADA 8" NO INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 119.198,00				5,50	$ 655.589,00	5,50	$ 655.589,00		
4.1.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° NOVAFORT DE 8"	UN		$ 259.330,00				1,00	$ 259.330,00	1,00	$ 259.330,00		

4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 68.520,00					15,60	$ 1.068.912,00		15,60	$ 1.068.912,00	
4.3.17	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 12.855,00					16,00	$ 205.680,00		16,00	$ 205.680,00	
4.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VALVULA DE BOLA 1/2"	UND		$ 52.300,00					1,00	$ 52.300,00		1,00	$ 52.300,00	
4.8.2	CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 M X 0.60 M EN CONCRETO REFORZADO < = 1,00 M CON MARCO Y TAPA METALICA E = 0.20 M	UN		$ 767.423,00					2,00	$ 1.534.846,00		2,00	$ 1.534.846,00	
4.8.6	CAJA DE INSPECCIÓN 1 M X 1 M EN CONCRETO REFORZADO HASTA 1,50 M. DE ALTURA CON MARCO Y TAPA	UN		$ 1.185.009,00					1,00	$ 1.185.009,00		1,00	$ 1.185.009,00	
4.8.7	LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN	UN		$ 36.989,00					2,00	$ 73.978,00		2,00	$ 73.978,00	
4.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$ 14.705,00					314,00	$ 4.617.370,00		314,00	$ 4.617.370,00	
7.1.11	PISO EN CONCRETO A LA VISTA ENDURECIDO Y AFINADO CON HELICÓPTERO. (INVLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, FORMALETAS, ACABADO CON ALLANADORA, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) E = 10 CM	M2		$ 122.244,00					753,00	$ 92.049.732,00		753,00	$ 92.049.732,00	
7.1.12	JUNTA DE DILATACIÓN INDUCIDA PISO EN CONCRETO ALLANADO. (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LOS MATERIALES, MARCACIÓN DE DILATACIONES Y SELLADO, ASÍ COMO LOS INSUMOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN).	M		$ 29.721,00					85,80	$ 2.550.061,80		85,80	$ 2.550.061,80	
7.2.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA PARA REVESTIMIENTO CANCHA MULTIPLE INCLUYE DEMARCACIONES (BALONCESTO - VOLEYBOL)	M2		$ 107.023,00		407,54	$ 43.616.153,42					407,54	$ 43.616.153,42	
9.3.12	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M, (ESTRUCTURA EN TUBO GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES. VIGA 40X30 Y PILOTES CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD.	M		$ 1.866.312,00					25,00	$ 46.657.800,00		25,00	$ 46.657.800,00	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2		$ 23.133,00		14,40	$ 333.115,20					14,40	$ 333.115,20	
16.1.18	CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL (INC. DOS UN FIJAS DE MICROBALONCESTO - MALLA PARA MICRO FUTBOL - JUEGO DE POSTES Y MALLA PARA VOLEIBOL - DEMARCACIÓN DE LA CANCHA - TRANSPORTE - E INSTALACIÓN)	UN		$ 10.997.282,00					1,00	$ 10.997.282,00		1,00	$ 10.997.282,00	
16.1.59	MANTENIMIENTO Y REINSTALACION DE UNIDAD DE ARCO Y TABLERO DE BALANCESTO. INCLUYE APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA Y REFUERZO DE LA ESTREUCTURA EXISTENTE QUE SE ENCUENTRE EN MAL ESTADO.	UN		$ 504.748,00					3,00	$ 1.514.244,00		3,00	$ 1.514.244,00	
18.1.20	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3		$ 59.029,00					81,24	$ 4.795.515,96		81,24	$ 4.795.515,96	
8.	**CAMPAMENTO VIVIENDA DOCENTE**													
1.2.1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 298.850,00					6,04	$ 1.805.054,00		6,04	$ 1.805.054,00	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.496,00					12,81	$ 352.223,76		12,81	$ 352.223,76	
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15.568,00					58,01	$ 903.099,68		58,01	$ 903.099,68	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 9.835,00					127,78	$ 1.256.716,30		127,78	$ 1.256.716,30	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.671,00					33,80	$ 1.002.879,80		33,80	$ 1.002.879,80	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 16.844,00					8,00	$ 134.752,00		8,00	$ 134.752,00	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.492,00					278,67	$ 9.054.545,64		278,67	$ 9.054.545,64	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.254,00					182,15	$ 4.600.016,10		182,15	$ 4.600.016,10	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 9.784,00					12,00	$ 117.408,00		12,00	$ 117.408,00	
1.2.42	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M		$ 6.899,00					17,50	$ 120.732,50		17,50	$ 120.732,50	
1.2.62	DESMONTE DE PISO EN MADERA	M2		$ 20.868,00					121,82	$ 2.542.139,76		121,82	$ 2.542.139,76	
1.2.65	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/8", 1/2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 12.370,00					30,00	$ 371.100,00		30,00	$ 371.100,00	
20.1.2	DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO	KG		$ 2.041,00		7.550,00	$ 15.409.550,00					7.550,00	$ 15.409.550,00	
20.1.3	EMBALAJE DE TEJA DE ASBESTO CEMENTO CON VINIPEL (INCLUYE MARQUILLADO)	KG		$ 2.445,00		7.550,00	$ 18.459.750,00					7.550,00	$ 18.459.750,00	
9	**IED LAS MERCEDES**													
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 30.872,00		47,89	$ 1.478.460,08					47,89	$ 1.478.460,08	
1.2.2	DEMOLICIÓN DE VIGA EN CONCRETO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M3		$ 294.315,00		1,39	$ 409.097,85					1,39	$ 409.097,85	
1.2.6	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 46.664,00		50,54	$ 2.358.398,56					50,54	$ 2.358.398,56	
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 62.252,00		92,67	$ 5.768.892,84					92,67	$ 5.768.892,84	
1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.665,00		19,71	$ 643.827,15					19,71	$ 643.827,15	
1.2.15	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 27.496,00		4,44	$ 122.082,24					4,44	$ 122.082,24	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 9.835,00		17,92	$ 176.243,20					17,92	$ 176.243,20	
1.2.29	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15.730,00		2,04	$ 32.089,20					2,04	$ 32.089,20	
1.2.30	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 16.844,00		2,00	$ 33.688,00					2,00	$ 33.688,00	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.254,00		15,77	$ 398.255,58					15,77	$ 398.255,58	
1.2.41	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)	UN		$ 9.784,00		2,00	$ 19.568,00					2,00	$ 19.568,00	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 78.085,00		59,09	$ 4.614.042,65					59,09	$ 4.614.042,65	
II	**EMERGENCIAS GRUPO No. 5**													
1	**IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE A**													

1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.254,00					13,58	$ 342.949,32	13,58	$ 342.949,32	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		$ 7.909,00					31,47	$ 248.896,23	31,47	$ 248.896,23	
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 14.139,00					40,66	$ 574.891,74	40,66	$ 574.891,74	
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 13.906,00					10,64	$ 147.959,84	10,64	$ 147.959,84	
14.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 69.566,00					32,43	$ 2.256.025,38	32,43	$ 2.256.025,38	
17.1.3	FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 97.925,00					10,64	$ 1.041.922,00	10,64	$ 1.041.922,00	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.498,00					21,28	$ 95.717,44	21,28	$ 95.717,44	
2	**IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN**													
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 9.835,00					0,48	$ 4.720,80	0,48	$ 4.720,80	
1.2.52	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 14.638,00					6,90	$ 101.002,20	6,90	$ 101.002,20	
1.4.1	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M		$ 16.241,00					0,50	$ 8.120,50	0,50	$ 8.120,50	
3.1.32	LAVADO Y RETIRO DE HUMEDAD CON HONGO DE PISO	M2		$ 15.606,00					6,10	$ 95.196,60	6,10	$ 95.196,60	
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UN		$ 50.113,00					1,00	$ 50.113,00	1,00	$ 50.113,00	
4.11.19	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE MANGUERA 1/2"	UN		$ 74.229,00					1,00	$ 74.229,00	1,00	$ 74.229,00	
4.11.20	SONDEO DE UNIDADES SANITARIAS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE APARATOS	UN		$ 162.314,00					2,00	$ 324.628,00	2,00	$ 324.628,00	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$ 105.690,00					0,56	$ 59.186,40	0,56	$ 59.186,40	
11.1.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA AHORRADORA COMPLETA PARA SANITARIO ADULTO	UN		$ 134.312,00					6,00	$ 805.872,00	6,00	$ 805.872,00	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 19.956,00					31,16	$ 621.828,96	31,16	$ 621.828,96	
13.2.5	PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 15.595,00					14,75	$ 230.026,25	14,75	$ 230.026,25	
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SOBREPONER	UN		$ 200.299,00					2,00	$ 400.598,00	2,00	$ 400.598,00	
15.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJOS BISELADOS 1.5 DE E =4 MM	M2		$ 103.135,00					0,80	$ 82.508,00	0,80	$ 82.508,00	
15.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2		$ 87.205,00					0,18	$ 15.696,90	0,18	$ 15.696,90	
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		$ 1.731,00					870,63	$ 1.507.060,53	870,63	$ 1.507.060,53	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.498,00					41,71	$ 187.611,58	41,71	$ 187.611,58	
3	**IED JAIME GARZON SEDE TABACO**													
1.1.3	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)	M		$ 30.872,00					11,40	$ 351.940,80	11,40	$ 351.940,80	
1.2.33	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.492,00					6,66	$ 216.396,72	6,66	$ 216.396,72	
1.3.2	DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO MENOR DE CUBIERTA (INCLUYE REVISION DE AMARRES, FIJACION DE FLANCHES, FISURAS EN TEJAS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS). NO INCLUYE CAMBIO DE TEJAS	UND		$ 9.565,00					18,00	$ 172.170,00	18,00	$ 172.170,00	
3.2.8	PULIDA DE MESONES EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL, (ANCHO < 0.75 M)	M		$ 26.119,00	2,06	$ 53.805,14					2,06	$ 53.805,14	
3.3.9	ANCLAJES EPOXICOS D= 1/2 " X L=0.25M (INCLUYE PERFORACIÓN, EPOXICO Y ACERO)	UN		$ 68.406,00					18,00	$ 1.231.308,00	18,00	$ 1.231.308,00	
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN		$ 25.741,00					1,00	$ 25.741,00	1,00	$ 25.741,00	
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M		$ 25.309,00	2,55	$ 64.537,95					2,55	$ 64.537,95	
7.2.66	PISO GOMA DE 7 MM TRAFICO PESADO	M2		$ 147.895,00	12,18	$ 1.801.361,10					12,18	$ 1.801.361,10	
8.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE SUPERBOARD PRO DE 8 MM, INCLUYE, ANGULO 29X29X24mm C26, PERFIL D OMEGA 60 244 C26, PARAL 39 GUIA GALV. 2,44 mm, PASTA MASTIQUE, ESTUCO PLASTICO PASTA, MASILLA PANEL-ESTUCO, PINTURA EPOXICA, Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2		$ 144.687,00	12,36	$ 1.788.331,32					12,36	$ 1.788.331,32	
9.3.7	REINSTALACION DE TODO TIPO DE VENTANAS O REJAS EXISTENTES	M2		$ 43.583,00	1,76	$ 76.706,08					1,76	$ 76.706,08	
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 12.818,00	10,65	$ 136.511,70					10,65	$ 136.511,70	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		$ 7.909,00	27,90	$ 220.661,10					27,90	$ 220.661,10	
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 29.750,00	35,50	$ 1.056.125,00					35,50	$ 1.056.125,00	
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 13.906,00	38,21	$ 531.348,26					38,21	$ 531.348,26	
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 9.557,00	57,89	$ 553.254,73					57,89	$ 553.254,73	
14.1.1	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 120.012,00	8,77	$ 1.052.505,24					8,77	$ 1.052.505,24	
16.1.22	SUMNINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTO 50 MM FILTRO UV. INCLUYE RELLENO EN CAUCHO GRANULAR	M2		$ 245.762,00					16,81	$ 4.131.259,22	16,81	$ 4.131.259,22	
17.1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA PLÁSTICA ONDULADA NO 6, (INCLUIDO ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2		$ 57.009,00					1,67	$ 95.205,03	1,67	$ 95.205,03	

19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		$ 1.731,00		700,53	$ 1.212.617,43	697,68	$ 1.207.684,08	1.398,21	$ 2.420.301,51	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.498,00		20,95	$ 94.233,10	23,88	$ 107.412,24	44,83	$ 201.645,34	
4	**IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT**											
1.2.18	DEMOLICIÓN DE PAÑETE DE MUROS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 15.568,00				12,77	$ 198.803,36	12,77	$ 198.803,36	
1.2.19	DEMOLICIÓN DE PAÑETE LINEAL COLUMNAS Y VIGAS EXISTENTES DE ANCHO MENOR A 0.35M (POR LAS 4 CARAS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 18.806,00				4,47	$ 84.062,82	4,47	$ 84.062,82	
1.2.20	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 9.835,00				0,72	$ 7.081,20	0,72	$ 7.081,20	
1.2.34	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 25.254,00				2,50	$ 63.135,00	2,50	$ 63.135,00	
1.2.65	DESMONTE RETIRO DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EXISTENTES DE 1-1/2", 1-1/4", 1", 3/8", 1/2". (INCLUYE EXCAVACIÓN, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 12.370,00				0,50	$ 6.185,00	0,50	$ 6.185,00	
1.4.11	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 14.166,00				0,50	$ 7.083,00	0,50	$ 7.083,00	
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"	UND		$ 50.113,00				1,00	$ 50.113,00	1,00	$ 50.113,00	
8.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35CM O APROX	M2		$ 105.690,00				0,72	$ 76.096,80	0,72	$ 76.096,80	
11.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UND		$ 224.670,00				1,00	$ 224.670,00	1,00	$ 224.670,00	
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 15.835,00				36,10	$ 571.643,50	36,10	$ 571.643,50	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		$ 7.909,00				9,25	$ 73.158,25	9,25	$ 73.158,25	
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 29.750,00				37,16	$ 1.105.510,00	37,16	$ 1.105.510,00	
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 9.557,00				37,16	$ 355.138,12	37,16	$ 355.138,12	
17.1.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL 20. DESARROLLO 25 CM (INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, TRANSPORTE Y HERRAMIENTA MENOR)	M		$ 55.397,00				8,00	$ 443.176,00	8,00	$ 443.176,00	
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		$ 1.731,00				631,58	$ 1.093.264,98	631,58	$ 1.093.264,98	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.498,00				16,00	$ 71.968,00	16,00	$ 71.968,00	
5	**IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO**											
2.1.5	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M		$ 50.516,00				1,00	$ 50.516,00	1,00	$ 50.516,00	
4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS	M		$ 68.520,00				1,00	$ 68.520,00	1,00	$ 68.520,00	
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		$ 1.731,00				753,48	$ 1.304.273,88	753,48	$ 1.304.273,88	
6	**IED JAIME GARZON SEDE AURAS**											
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.671,00		7,03	$ 208.587,13			7,03	$ 208.587,13	
1.2.44	DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 5.669,00		18,00	$ 102.042,00			18,00	$ 102.042,00	
1.2.64	REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2		$ 5.538,00		55,09	$ 305.088,42			55,09	$ 305.088,42	
5.1.99	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES	UN		$ 25.741,00		18,00	$ 463.338,00			18,00	$ 463.338,00	
7.1.17	RESANE DE PLACA DE ENTREPISO (BAJO PLACA SE DEBE LIMPIAR, PICAR Y RESANAR)	M2		$ 43.030,00		4,50	$ 193.635,00			4,50	$ 193.635,00	
7.2.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINILICO HETEROGENEO ALTO TRÁFICO	M2		$ 209.153,00		33,50	$ 7.006.625,50			33,50	$ 7.006.625,50	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2		$ 54.969,00		2,35	$ 129.177,15			2,35	$ 129.177,15	
9.3.20	PUERTA EN ALUMINIO TIPO PERSIANA.	M2		$ 862.503,00		4,55	$ 3.924.388,65			4,55	$ 3.924.388,65	
9.3.22	PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 MM	M2		$ 868.303,00		2,01	$ 1.745.289,03			2,01	$ 1.745.289,03	
11.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN		$ 224.670,00		3,00	$ 674.010,00			3,00	$ 674.010,00	
13.1.9	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 15.835,00		4,50	$ 71.257,50			4,50	$ 71.257,50	
13.1.10	ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 12.818,00		32,99	$ 422.865,82			32,99	$ 422.865,82	
13.1.11	ESTUCO FILOS SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS) INFERIORES A ,60CM	M		$ 7.909,00		19,61	$ 155.095,49			19,61	$ 155.095,49	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 19.956,00		102,97	$ 2.054.869,32			102,97	$ 2.054.869,32	
13.2.2	PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)	M		$ 14.139,00		27,90	$ 394.478,10			27,90	$ 394.478,10	
13.2.3	PINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2		$ 29.750,00		112,71	$ 3.353.122,50			112,71	$ 3.353.122,50	
13.2.9	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 13.906,00		20,96	$ 291.469,76			20,96	$ 291.469,76	
13.2.14	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE PARA FACHADAS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 9.557,00		300,55	$ 2.872.356,35			300,55	$ 2.872.356,35	
15.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE SOBREPONER	UN		$ 200.299,00		2,00	$ 400.598,00			2,00	$ 400.598,00	
15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 90.656,00		0,88	$ 79.777,28			0,88	$ 79.777,28	
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		$ 1.731,00		573,94	$ 993.490,14			573,94	$ 993.490,14	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		$ 4.498,00		168,54	$ 758.092,92			168,54	$ 758.092,92	
7	**IED JAIME GARZON SEDE ADELINA GUTIERREZ**											
7.2.66	PISO GOMA DE 7 MM TRAFICO PESADO	M2		$ 147.895,00		28,51	$ 4.216.486,45			28,51	$ 4.216.486,45	
19.1.1	TRANSPORTE TERRESTRE DE INSUMOS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION FUERA DEL PERIMETRO URBANO (APLICA DESDE EL KM 0,00 DE USME, LOCALIDAD DE SUMAPAZ)	M3/KM		$ 1.731,00		179,89	$ 311.389,59			179,89	$ 311.389,59	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2		4341,00		28,51	$ 123.761,91			28,51	$ 123.761,91	
8	**IED DIEGO MONTAÑA CUELLAR SEDE B**											
1.2.7	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 62.252,00		159,62	$ 9.936.664,24			159,62	$ 9.936.664,24	

1.2.14	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 32.665,00		159,62	$ 5.213.987,30			159,62	$ 5.213.987,30	
1.2.28	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 29.671,00		7,11	$ 210.960,81			7,11	$ 210.960,81	
2.1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M3		$ 78.085,00		63,22	$ 4.936.533,70			63,22	$ 4.936.533,70	
2.1.8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3		$ 74.819,00		38,65	$ 2.891.754,35			38,65	$ 2.891.754,35	
2.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBBASE GRANULAR B-600 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).	M3		$ 147.970,00		23,90	$ 3.536.483,00			23,90	$ 3.536.483,00	
2.2.24	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION	M2		$ 100.255,00		159,62	$ 16.002.703,10			159,62	$ 16.002.703,10	
2.4.2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG		$ 7.194,00		329,43	$ 2.369.919,42			329,43	$ 2.369.919,42	
4.10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL TEJIDO 2400	M2		$ 14.705,00		159,62	$ 2.347.212,10			159,62	$ 2.347.212,10	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2		$ 30.277,00		159,62	$ 4.832.814,74			159,62	$ 4.832.814,74	
7.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.10 M. ESCOBEADO INCLUYE DILATACIÓN EN LADRILLO PRENSADO MACIZO	M2		$ 113.864,00		14,35	$ 1.633.948,40			14,35	$ 1.633.948,40	
7.2.44	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M		$ 20.077,00		97,50	$ 1.957.507,50			97,50	$ 1.957.507,50	
7.2.51	ENCHAPE EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CM, ANTIDESLIZANTE E = 5 MM TIPO TRÁFICO PESADO	M2		$ 114.860,00		159,62	$ 18.333.953,20			159,62	$ 18.333.953,20	
	ÍTEMS NO PREVISTOS GRUPO No. 5											
1	**IED FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA**											
NP 001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRO BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP REFERENCIA 4PWP60G 30C36P3 TRIFASICA CON UN CAUDAL DE 90 GALONES POR MINUTO A UNA ALTURA DE 64 METROS.	UN		$ 5.047.544,00				4,00	$ 20.190.176,00	4,00	$ 20.190.176,00	
	COSTO DIRECTO CONTRATO				**$ 7.608.734.174,00**		**$ 623.934.435,86**		**$ 2.442.496.119,20**		**$ 3.066.430.555,06**	**40,30%**

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR COSTO DIRECTO				**$ 7.608.734.174,0**		**$ 623.934.435,86**		**$ 2.442.496.119,20**		**$ 3.066.430.555,06**	**40,30%**
A. I. U.	**(**	**26,56%**	**)**								
VALOR TOTAL				**$ 7.608.734.174,00**		**$ 623.934.435,86**		**$ 2.442.496.119,20**		**$ 3.066.430.555,06**	**40,30%**
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	**(**		**)**								
VALOR A PAGAR						**$ 623.934.435,86**		**$ 2.442.496.119,20**		**$ 3.066.430.555,06**	
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006A PAGAR EN ACTA						**$ 0,14**		**$ 0,80**		**$ 0,94**	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO						**$ 623.934.436,00**		**$ 2.442.496.120,00**		**$ 3.066.430.556,00**	

SALDO DEL CONTRATO	**$ 4.542.303.618,00**	**SALDO POR AMORTIZAR**		**PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**

NOMBRE DE CONTRATISTA : **CONSORCIO CLARIDAD**
C.C. O NIT : **901.745.447-4**
REP. LEGAL : **ING. CHELMAN ROBERT HIGUERA MARTÍNEZ**
C.C. : **79.450.429**

NOMBRE DE INTERVENTORIA : **CB INGENIEROS**
C.C. O NIT : **8605099437**
REP. LEGAL : **ING. MIGUEL ÁNGEL SALGADO PACHECO**
C.C. : **11.202.387**

N. Actas de vecindad

CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD COLEGIO RURAL LAS MERCEDES CED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
4	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED

Entidad Interventora CB INGENIEROS S.A.S.

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad

Localidad: USME Vereda : Las Mercedes

1. LOCALIZACION GEOGRAFICA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:

Tenencia: Propietario ____ Arrendatario ____ Poseedor ____ Otro Cual? ALMACENISTA

Nombre del Propietario SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

Dirección KM 17 VIA USME SAN JUAN DE SUMAPAZ

Teléfono ____ No. de pisos 2

Long. del frente (mts) 60 m

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6, Televisión cable		X	
7, Otros	X		Cuál? INTERNET

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje	SI	NO	X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos			
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como			
4. Institucional	X	Cuál?_____		comercio	SI	NO	X

3. DESCRIPCIÓN GENERAL (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
Estructura (columnas y vigas)	SI	X NO	Bloques en general cuentan con una estructura aporticada en concreto reforzado sin afectación a la misma, en el comedor existe una estructura en madera para soportar la cubierta no se evidencia afectaciones a la misma.
Muros	SI	X NO	Los muros están pintados con vinilo, no se evidencia patologías graves ni desprendimientos.
Ventana y puertas	SI	X NO	Se evidencia puertas metálicas con oxido y descascaramiento de pintura en algunas zonas, pero la afectación no es general, igualmente se evidencia puertas en madera con afectaciones en la pintura y propias del uso.
Piso	X SI	NO	La zona donde se va ubicar el comedor presenta grandes desprendimientos y fracturas en el concreto, se evidencia la baldosa en los pasillos desportillada.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
Cerramiento	SI	X NO	En general se encuentra en buen estado cerramiento metálico, con muestras de oxido en varias zonas.
Andenes	SI	X NO	Se evidencia una rampa de entrada a la edificación, con grietas e inicios de descascaramiento

CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD COLEGIO RURAL LAS MERCEDES CED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
4	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES


PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED **Entidad Interventora** CB INGENIEROS S.A.S.


Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad Localidad: USME Vereda : Las Mercedes

**** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.***

5. DESCRIPCION INTERNA DEL PREDIO Y/O ESPACIO COLINDANTE - MUROS Y PISOS (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

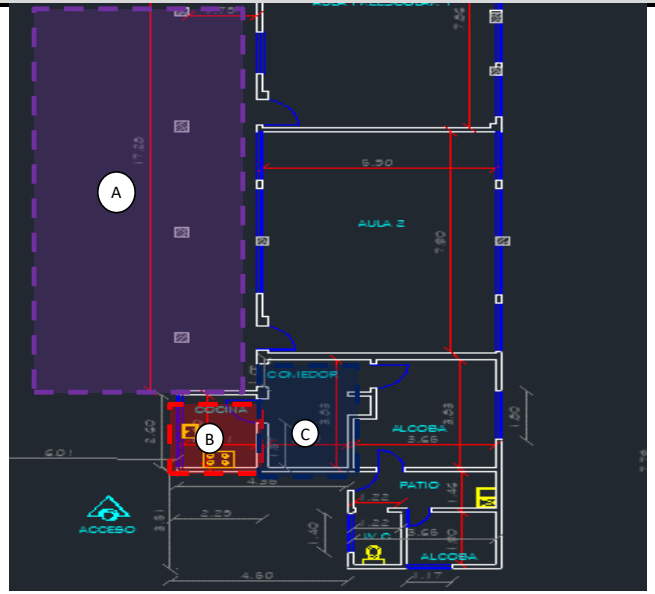

TIPO DE ESPACIO:	NIVEL:	PISO:	MURO:	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN:
(A) PATIO FUTURO COMEDOR	BLOQUE 1	x		En su mayoría está compuesto por losas de concreto, la cual se encuentra en mal estado, con descascaramientos, grietas y hundimientos, perimetralmente existe un pasillo con baldosa, esta presenta desportillamientos, tuberías de agua lluvias cae directamente a una canal perimetral no presentan colmatación
			x	Los muros se encuentran en buen estado, están pintados con vinilo en la parte superior y en la parte inferior tiene un zócalo con enchape cerámico, general en buen estado
(B) COCINA	BLOQUE 1	x		Compuesto por baldosa en buen estado, con afectaciones propias de su antigüedad.
			x	Se evidencia en buen estado, tiene enchape en la zona de la estufa y alacena, y pintura en vinilo, techo en PVC con instalaciones eléctricas en emt, ventana de aluminio con rejillas en buen estado.
(C) SALÓN ADJUNTO A COCINA	BLOQUE 1	x		Compuesto por baldosa en buen estado, con afectaciones propias de su antigüedad.
			x	Se evidencia en buen estado, pintura en vinilo, techo en PVC con instalaciones eléctricas en emt, ventana de aluminio con rejillas en buen estado.

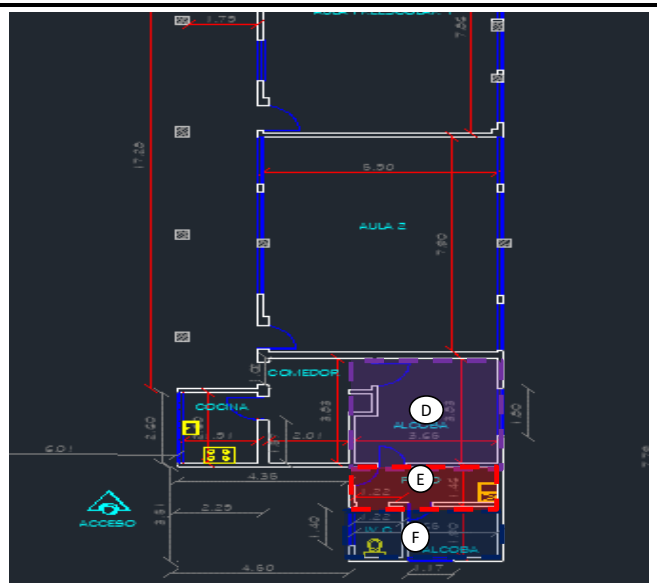

TIPO DE ESPACIO:	NIVEL:	PISO:	MURO:	DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIÓN:
(D) ALCOBA	BLOQUE 1	x		Piso en madera en general buen estado con afectaciones propias de su antigüedad.
			x	Los muros están pintados con vinilo sin afectaciones, y techo en PVC en buen estado sin afectaciones, ventana aluminio en buen estado, tubería emt en buen estado.
(E) PATIO	BLOQUE 1	x		Se evidencia baldosa de dos tipos en general buen estado con afectaciones propias de su antigüedad.
			x	Muros con pintura en vinilo se evidencia afectaciones de humedad y descascaramientos, en la zona de lavadero existe enchape en buen estado, techo en cielo raso en madera presenta desprendimiento de piezas.
(F) BODEGA Y BAÑO	BLOQUE 1	x		En el baño se evidencia baldosa en buen estado, con afectaciones propias de su antigüedad, en la bodega se evidencia baldosa en regular estado con desportillamientos y baldosas fracturadas.
			x	Los muros en el baño son enchapados en buen estado, la bodega esta pintada con vinilo con humedad en la parte baja, techo con cielo raso en madera con desprendimiento de partes.

CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD COLEGIO RURAL LAS MERCEDES CED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
4	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED **Entidad Interventora** CB INGENIEROS S.A.S.

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad Localidad: USME Vereda : Las Mercedes

6. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico o fílmico) SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DESDE LA PAGINA No. 3 HASTA LA PAGINA No. 10

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta de vecindad se realiza a los accesos dentro del colegio y a las zonas a intervenir propiamente.

Como vía de acceso se tiene en cuenta desde la vía principal de llegada, la vía a la vereda Las Mercedes, se planea usar los dos accesos para la entrada y salida de material.

En la cocina existe una chimenea la cual desfoga en la cubierta. Por lo cual la teja fue modificada

FIRMAS


Firma Docente	Firma Director de la institución	Firma Residente de obra	Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Humberto Nieto	Nombre: Julio Moreno Camacho	Nombre: Guillermo Alberto Velandia	Nombre: Cristian Camilo Barragán Peña
C.C. 79.645.900	C.C. 79.947.839	C.C. 19.418.347	C.C. 1.013.653.274

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

FOTO 1: ESTADO ESCALERA PATIO A CANCHA



FOTO 2: PISO ALCOBA

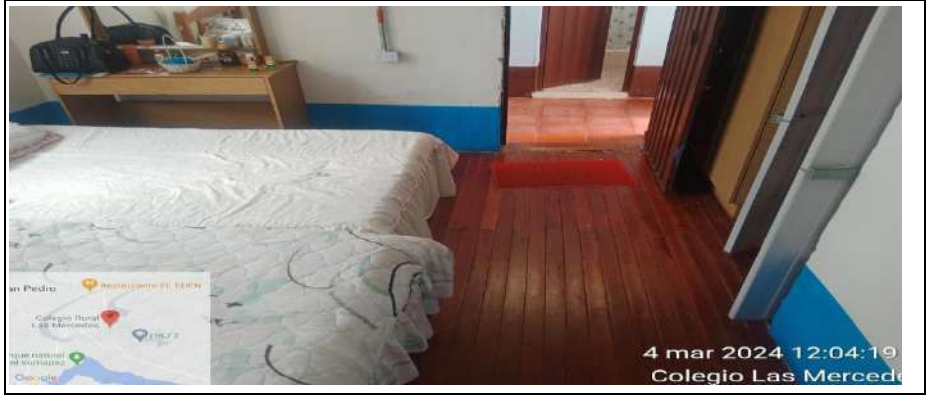

CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD COLEGIO RURAL LAS MERCEDES CED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
4	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED

Entidad Interventora CB INGENIEROS S.A.S.

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad

Localidad: USME

Vereda : Las Mercedes

FOTO 3: VENTANA ALCOBA



FOTO 4: ENTRADA A COMEDOR



REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

FOTO 5: ESTADO CALLE 64 SUR



FOTO 6: ESTADO CARRERA 10 A ESTE



CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD COLEGIO RURAL LAS MERCEDES CED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
4	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED

Entidad Interventora CB INGENIEROS S.A.S.

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad


Localidad: USME

Vereda : Las Mercedes

FOTO 7: ESTADO PISO PATIO



FOTO 8: ESTADO PISO ALCOBA

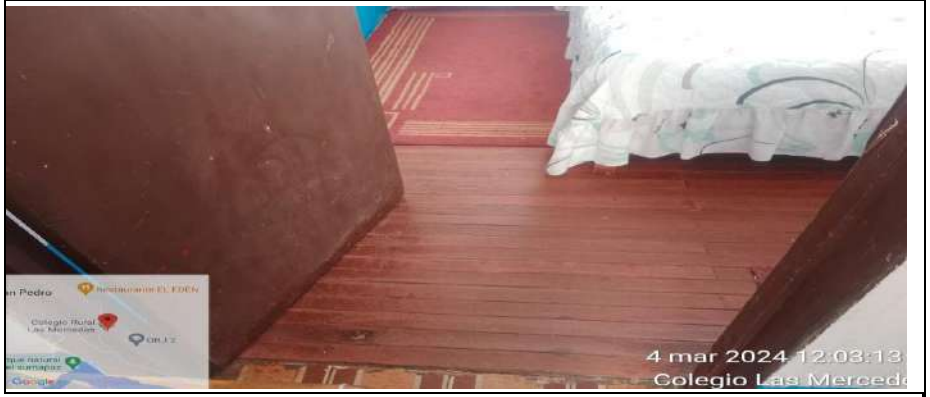

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

FOTO 9: COCINA



FOTO 10: PISO BODEGA



CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD COLEGIO RURAL LAS MERCEDES CED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
4	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED **Entidad Interventora** CB INGENIEROS S.A.S.

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad Localidad: USME Vereda : Las Mercedes

FOTO 11: ESTADO CUBIERTA Y VENTANA COMEDOR



FOTO 12: TECHO Y PAREDES BAÑO



REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

FOTO 13: CHIMINEA SOBRESALIENTO POR CUBIERTA



FOTO 14: MUROS DE BAÑO



CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD COLEGIO RURAL LAS MERCEDES CED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
4	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED

Entidad Interventora CB INGENIEROS S.A.S.

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad

Localidad: USME

Vereda : Las Mercedes

FOTO 15: PATIO DE HABITACION



FOTO 16: AFECTACIONES ESCALERA



REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

FOTO 17: ESTADO CALLE 64 SUR



FOTO 18: ESTADO ESCALERAS CRUCE CALLE 64 SUR CARRERA 10 A ESTE



CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD COLEGIO RURAL LAS MERCEDES CED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
4	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED **Entidad Interventora** CB INGENIEROS S.A.S.

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad Localidad: USME Vereda : Las Mercedes

FOTO 19: ESTADO FACHADA BLOQUE



FOTO 20: FACHADA Y VENTANA BLOQUE



REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

FOTO 21: AFECTACION DE PATIO



FOTO 22: RAMPA ACCESO AL COLEGIO



CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD COLEGIO RURAL LAS MERCEDES CED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
4	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED **Entidad Interventora** CB INGENIEROS S.A.S.

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad Localidad: USME Vereda : Las Mercedes

FOTO 23: ESTADO PISO PATIO DE ALCOBA



FOTO 24: ESTADO GENERAL PISO Y CUBIERTA PATIO



REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

FOTO 25: AFECTACION PATIO



FOTO 26: ESTADO CANAL BLOQUE 1



CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD COLEGIO RURAL LAS MERCEDES CED

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
4	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.:		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED

Entidad Interventora CB INGENIEROS S.A.S.

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad

Localidad: USME

Vereda : Las Mercedes

FOTO 27: ESTADO TECHO DE PATIO ALCOBA



FOTO 28: ESTADO MUROS PATIO ALCOBA



REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

FOTO 29: ESTADO CANAL Y PISO PATIO



FOTO 30: TECHO ALCOBA



CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD IED JAIME GARZON SEDE TABACO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
26	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.: 01		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED

Entidad Interventora CB INGENIEROS S.A.S.

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad

Localidad: SUMAPAZ Vereda : TABACO

1. LOCALIZACION GEOGRAFICA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable del predio o lote:

Tenencia: Propietario _____ Arrendatario _____ Poseedor _____ Otro Cual? ALMACENISTA

Nombre del Propietario SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

Dirección VEREDA EL TABACO - CORREGIMIENTO BETANIA - LOCALIDAD SUMA

Teléfono No. de pisos 1

Long. del frente (mts) 7,00 m

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos			
5. Gas	X		
6, Televisión cable		X	
7, Otros		X	

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES			
1. Residencial		5. Recreacional		Garaje	SI	NO	X
2. Comercial		6. Baldío		Cuantos			
3. Industrial		7. Otro		El garaje se usa como			
4. Institucional	X	Cuál?_____		comercio	SI	NO	X

3. DESCRIPCIÓN GENERAL (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes	Afectación		Descripción de la afectación:
MUROS COCINA	X	NO	LOS MUROS ESTAN CON PINTURA CON VINILO COLOR BLANCO, NO EXISTE FISURAS PERO EN LA PARTE SUPERIOR SE ENCUENTA EN MAL ESTADO
MURO COMEDOR	X	NO	LOS MUROS ESTAN CON PINTURA CON VINILO COLOR BLANCO, NO EXISTE FISURAS PERO EN LA PARTE SUPERIOR SE ENCUENTA EN MAL ESTADO
CUBIERTA COCINA - COMEDOR	SI	X	SE EVIDENCIA EN LA CUBIERTA DE COCINA QUE NO HAY FILTRACIONES Y/O GOTERAS
PUERTA ACCESO PRINCIPAL	SI	NO	SE EVIDENCIA QUE NO ESTA EN MAL ESTADO
PUERTA ACCESO COCINA	X	NO	SE EVIDENCIA QUE LA PUERTA NO ESTA INSTALADA, SOLO EXISTE EL MARCO
PUERTA ACCESO ALMACEN DE ALIMENTOS	X	NO	SE EVIDENCIA QUE EN LA PARTE INFERIOR PRESENTA OXIDO.
MESON DE COCINA	SI	NO	SE EVIDENCIA QUE EL MESON NO PRESENTA FISURAS, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SOLO PRESENTA MANCHAS DE GRASA
LAVAPLATOS Y GRIFERIA	SI	NO	SE EVIDENCIA QUE EL LAVAPLATOS ES EN ACERO INOXIDABLE Y LA GRIFERIA NO PRESENTA DAÑOS.
VENTANA COMEDORES	SI	NO	SE EVIDENCIA QUE LAS VENTANERIA DEL COMEDOR ESTA EN BUEN ESTADO INCLUYENDO VIDRIOS, SOLO PRESENTA MANCHAS DE PINTURA EN ACEITE
PISO EN GRANITO PULIDO/COCINA Y ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	SI	NO	SE EVIDENCIA QUE EL PISO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, NO PRESENTA FISURAS
PISO EN MORTERO/COMEDOR	SI	NO	SE EVIDENCIA QUE EL MORTERO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO PÚBLICO (MARQUE CON (X) SEGÚN CORRESPONDA):

Componentes:	Afectación:		Descripción de la Afectación:
RAMPA ACCESO Y PLATAFORMA EN CONCRETO	X	NO	SE EVIDENCIA UNA RAPA ACCESO A LA INSTITUCION DONDE PRESENTA FISURAS ADICIONAL LA PLATAFORMA SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES, AFECTACIONES PROPIAS DE LA ANTIGÜEDAD

**** NOTA: Si hay otros tipo de daños en la vivienda, favor describirlos al respaldo de esta Acta de Vecindad con los datos exactos de su ubicación.***

CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD IED JAIME GARZON SEDE TABACO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
26	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.: 01		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED **Entidad Interventora** CB INGENIEROS S.A.S.

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad Localidad: SUMAPAZ Vereda : TABACO

5 ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico)

5. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR")

La presente acta de vecindad se realiza a los accesos dentro del colegio y a las zonas a intervenir propiamente.

FIRMAS

Firma Responsable Propietario/poseedor	Firma Residente de obra	Vo.Bo. Representante de la Interventoría
Nombre: Adriana Paola Baquero	Nombre: Leonardo Torres Lara	Nombre: Cristian Camilo Barragán Peña
C.C. O NIT: 20.824.370	C.C. O NIT 88.279.853	C.C. O NIT: 1.013.653.274

REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

FOTO 1: ACCESO A COMEDOR Y COCINA



FOTO 2: PUERTA ACCESO ZONAL ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS



CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD IED JAIME GARZON SEDE TABACO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
26	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.: 01		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED **Entidad Interventora** CB INGENIEROS S.A.S.

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad Localidad: SUMAPAZ Vereda : TABACO

FOTO 3: MURO SUOERIOR COCINA



FOTO 4: MURO SUPERIOR COCINA Y TANQUE ALMACENAMINETO DE AGUA



REGISTRO FOTOGRÁFICO O FILMICO

FOTO 5: ESTADO ACTUAL PARTE INFERIOR DE LOS MUROS COMEDOR



FOTO 6: ESTADO ACTUAL DE LOS PISOS ACCESO COCINA



CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD IED JAIME GARZON SEDE TABACO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
26	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.: 01		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: **Secretaría de Educación Distrital - SED** **Entidad Interventora** **CB INGENIEROS S.A.S.**

Entidad ejecutora de la Obra: **Consorcio Claridad** Localidad: SUMAPAZ Vereda : TABACO

FOTO 7: ESTADO ACTUAL PISOS COMEDOR



FOTO 8: ESTADO ACTUAL VIGA AEREA



FOTO 9: ESTADO ACTUAL LAMPARAS DE ILUMINACION



FOTO 10: ESTADO ACTUAL VENTANAS



CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD IED JAIME GARZON SEDE TABACO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
26	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.: 01		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED

Entidad Interventora CB INGENIEROS S.A.S.

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Claridad

Localidad: SUMAPAZ Vereda : TABACO

FOTO 11: ESTADO CUBIERTA Y VENTANA COMEDOR



FOTO 12: TECHO Y PAREDES BAÑO



FOTO 13: ESTADO ACTUAL LAVAPLATOS Y GRIFERIA



FOTO 14: ESTADO ACTUAL MESON COCINA



CONSORCIO CLARIDAD
NIT 901.745.447-4

ACTA DE VECINDAD IED JAIME GARZON SEDE TABACO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

FECHA		
26	MARZO	2024
DD	MM	AA
ACTA No.: 01		

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES Y LOTES

PROYECTO: OBJETO: ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, SEDES ADMINISTRATIVAS, ASI COMO LA ADECUACIÓN Y O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.

Entidad contratante: **Secretaría de Educación Distrital - SED** **Entidad Interventora** **CB INGENIEROS S.A.S.**

Entidad ejecutora de la Obra: **Consorcio Claridad** Localidad: SUMAPAZ Vereda : TABACO

FOTO 15: ESTADO ACTUAL MUROS COCINA



FOTO 16: ESTADO ACTUAL `PUERTAS METALICAS



O. Balances presupuestales

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

BALANCE FINANCIERO					
SEMANA No.	26	DEL	22-abr-24	AL	28-abr-24

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	$ 349.948.209,00	$ 362.904.046,35	$ 12.955.837,35
2	Fernando Gonzaléz Ochoa		Usme	$ 353.157.411,00	$ 351.430.683,39	-$ 1.726.727,61
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	$ 542.722.842,00	$ 712.176.519,23	$ 169.453.677,23
4	Chuniza		Usme	$ 236.826.369,00	$ 330.206.750,54	$ 93.380.381,54
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	$ 15.242.011,00	$ 15.242.011,00	$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	$ 750.000.000,00	$ 628.487.851,57	-$ 121.512.148,43
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	$ 811.831.873,00	$ 840.105.168,56	$ 28.273.295,56
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	$ 411.446.316,00	$ 411.446.316,00	$ 0,00
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 253.419.631,00	$ 140.173.912,66	-$ 113.245.718,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	$ 799.914.269,00	$ 799.914.269,00	$ 0,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	$ 344.210.600,00	$ 344.210.600,00	$ 0,00
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	$ 337.709.778,00	$ 337.709.778,00	$ 0,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	$ 635.000.000,00	$ 511.765.332,00	-$ 123.234.668,00
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	$ 210.861.638,00	$ 210.861.638,00	$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	$ 447.180.697,00	$ 447.180.697,00	$ 0,00
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	$ 599.909.029,00	$ 599.909.029,00	$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				$ 7.099.380.673,00	$ 7.043.724.602,29	-$ 55.656.070,71

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 5.198.994,76	$ 4.708.361,95	-$ 490.632,81
2	San Juan		Sumapaz	$ 5.379.289,20	$ 4.568.398,72	-$ 810.890,48
3	IED Jaime Garzón sede Tabaco		Sumapaz	$ 7.539.117,09	$ 7.539.117,09	$ 0,00
4	IED Jaime Garzón sede Nazareth		Sumapaz	$ 4.431.089,03	$ 4.431.089,03	$ 0,00
5	IED Juan de La Cruz Varela sede Tunal Alto		Sumapaz	$ 1.423.309,88	$ 1.423.309,88	$ 0,00
6	Diego Cuellar sede B	B	Usme	$ 45.253.968,69	$ 45.253.968,69	$ 0,00
7	Por definir			$ 439.868.010,35	$ 441.169.533,64	$ 1.301.523,29
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				$ 509.093.779,00	$ 509.093.779,00	$ 0,00

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO	$ 7.608.734.174	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 7.552.818.381
		DIFERENCIA	$ 55.915.793

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado el balance del presupuesto de los colegios Chuniza, La Unión, Auras, Diego A, Diego B, Fernando González Ochoa y Usminia, en aras de equilibrar el contrato de obra, sin embargo, este no es definitivo, por lo cual, en los próximos informes continuaremos presentando el balance de estos y demás colegios.

En cuanto a las emergencias, los balances fueron ajustados conforme a la necesidad de cada frente.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	25	DEL	15-abr-24	AL	21-abr-24

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	$ 349.948.209,00	$ 362.904.046,35	$ 12.955.837,35
2	Fernando Gonzaléz Ochoa		Usme	$ 353.157.411,00	$ 351.430.683,39	-$ 1.726.727,61
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	$ 542.722.842,00	$ 712.176.519,23	$ 169.453.677,23
4	Chuniza		Usme	$ 236.826.369,00	$ 330.206.750,54	$ 93.380.381,54
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	$ 15.242.011,00	$ 15.242.011,00	$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	$ 750.000.000,00	$ 628.487.851,57	-$ 121.512.148,43
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	$ 811.831.873,00	$ 840.105.168,56	$ 28.273.295,56
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	$ 411.446.316,00	$ 411.446.316,00	$ 0,00
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 253.419.631,00	$ 140.173.912,66	-$ 113.245.718,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	$ 799.914.269,00	$ 799.914.269,00	$ 0,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	$ 344.210.600,00	$ 344.210.600,00	$ 0,00
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	$ 337.709.778,00	$ 337.709.778,00	$ 0,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	$ 635.000.000,00	$ 511.765.332,00	-$ 123.234.668,00
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	$ 210.861.638,00	$ 210.861.638,00	$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	$ 447.180.697,00	$ 447.180.697,00	$ 0,00
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	$ 599.909.029,00	$ 599.909.029,00	$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 7.099.380.673,00**	**$ 7.043.724.602,29**	**-$ 55.656.070,71**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA				PRESUPUESTO		
ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 5.198.994,76	$ 4.708.361,95	-$ 490.632,81
2	San Juan		Sumapaz	$ 5.379.289,20	$ 4.568.398,72	-$ 810.890,48
3	IED Jaime Garzón sede Tabaco		Sumapaz	$ 7.539.117,09	$ 7.539.117,09	$ 0,00
4	IED Jaime Garzón sede Nazareth		Sumapaz	$ 4.431.089,03	$ 4.431.089,03	$ 0,00
5	IED Juan de La Cruz Varela sede Tunal Alto		Sumapaz	$ 1.423.309,88	$ 1.423.309,88	$ 0,00
6	Diego Cuellar sede B	B	Usme	$ 45.253.968,69	$ 45.253.968,69	$ 0,00
7	Por definir			$ 439.868.010,35	$ 441.169.533,64	$ 1.301.523,29
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				**$ 509.093.779,00**	**$ 509.093.779,00**	**$ 0,00**

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO	$ 7.608.734.174	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 7.552.818.381
		DIFERENCIA	$ 55.915.793

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado el balance del presupuesto de los colegios Chuniza, La Unión, Auras, Diego A, Diego B, Fernando González Ochoa y Usminia, en aras de equilibrar el contrato de obra, sin embargo, este no es definitivo, por lo cual, en los próximos informes continuaremos presentando el balance de estos y demás colegios.

En cuanto a las emergencias, los balances fueron ajustados conforme a la necesidad de cada frente.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

BOGOTÁ

BALANCE FINANCIERO

SEMANA No.	24	DEL	8-abr-24	AL	14-abr-24

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Usminia sede B	B	Usme	$ 349.948.209,00	$ 362.904.046,35	$ 12.955.837,35
2	Fernando Gonzaléz Ochoa		Usme	$ 353.157.411,00	$ 351.430.683,39	-$ 1.726.727,61
3	Diego Cuellar sede B	B	Usme	$ 542.722.842,00	$ 712.176.519,23	$ 169.453.677,23
4	Chuniza		Usme	$ 236.826.369,00	$ 330.206.750,54	$ 93.380.381,54
5	DILE Sumapaz	B	Sumapaz	$ 15.242.011,00	$ 15.242.011,00	$ 0,00
6	IED Campestres Jaime Garzón - Auras		Sumapaz	$ 750.000.000,00	$ 628.487.851,57	-$ 121.512.148,43
7	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - La Unión		Sumapaz	$ 811.831.873,00	$ 840.105.168,56	$ 28.273.295,56
8	Vivienda docente - Campamento		Usme	$ 411.446.316,00	$ 411.446.316,00	$ 0,00
9	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 253.419.631,00	$ 140.173.912,66	-$ 113.245.718,34
10	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Erasmo Valencia		Sumapaz	$ 799.914.269,00	$ 799.914.269,00	$ 0,00
11	Diego Cuellar sede C	C	Usme	$ 344.210.600,00	$ 344.210.600,00	$ 0,00
12	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Toldo		Sumapaz	$ 337.709.778,00	$ 337.709.778,00	$ 0,00
13	San José de Usme - Don Bosco 2		Usme	$ 635.000.000,00	$ 635.000.000,00	$ 0,00
14	IED Campestres Jaime Garzón - Raizal		Sumapaz	$ 210.861.638,00	$ 210.861.638,00	$ 0,00
15	Rural Las Mercedes		Usme	$ 447.180.697,00	$ 447.180.697,00	$ 0,00
16	IED Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela - Tunal Alto		Sumapaz	$ 599.909.029,00	$ 599.909.029,00	$ 0,00
TOTAL OBRAS PROGRAMADAS				**$ 7.099.380.673,00**	**$ 7.166.959.270,29**	**$ 67.578.597,29**

VALOR INICIAL OBRAS PROGRAMADAS	$ 7.099.380.673

OBRAS DE EMERGENCIA — **PRESUPUESTO**

ID	COLEGIO	SEDE	LOCALIDAD	BALANCE INICIAL	BALANCE ACTUALIZADO	DIFERENCIA
1	Diego Cuellar sede A	A	Usme	$ 5.198.994,76	$ 4.708.361,95	-$ 490.632,81
2	San Juan		Sumapaz	$ 5.379.289,20	$ 4.568.398,72	-$ 810.890,48
3	IED JAIME GARZON SEDE TABACO		Sumapaz	$ 7.539.117,09	$ 7.539.117,09	$ 0,00
4	IED JAIME GARZON SEDE NAZAREHT		Sumapaz	$ 4.431.089,03	$ 4.431.089,03	$ 0,00
5	IED JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO		Sumapaz	$ 1.423.309,88	$ 1.423.309,88	$ 0,00
6	Por definir			$ 485.121.979,04	$ 499.817.018,33	$ 14.695.039,29
TOTAL OBRAS EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS				**$ 509.093.779,00**	**$ 522.487.295,00**	**$ 13.393.516,00**

VALOR INICIAL DE EMERGENCIAS Y PRIORITARIAS	$ 509.093.779

VR. TOTAL CONTRATO	$ 7.608.734.174	VR. ASIGNADO OBRA PROGRAMADA + EMERGENCIAS	$ 7.689.446.565
		DIFERENCIA	-$ 80.712.391

Observaciones:

En la periodo del presente informe fue realizado el balance del presupuesto de los colegios Chuniza, La Unión, Auras, Diego A, Diego B, Fernando González Ochoa y Usminia, en aras de equilibrar el contrato de obra, sin embargo, este no es definitivo, por lo cual, en los próximos informes continuaremos presentando el balance de estos y demás colegios.

En cuanto a las emergencias, los balances fueron ajustados conforme a la necesidad de cada frente.

P. Actas de entrega

BOGOTÁ

ACTA DE REUNIÓN
ACTA N° 16

INGENIEROS S.A.S.

FECHA: 15 | 04 | 2024

OBJETO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5

ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
Mary Luz Prieto P	Cd. Usminia	Rectora	
Guillermo Castilla	Usminia	Almacenista	
Guillermo Velasquez	Usminia	Residente Sst	
Dana Aguiello	CB Ingenieros	Residente Inter	

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

COMPROMISO	OBSERVACIONES
Entrega Usminia sede B - entrega total	

TEMAS TRATADOS

Actividades realizadas

PUNTO DE REFRIGERIO : cambio de 2 tomas. GFCI.
Pintura externa.
bajante canal.

PUESTA A TIERRA : Cobre.
tuberías cobre

BAÑOS NIÑOS. : puerta. (roja) con 3 llaves, 2 registros divisiones acero inoxidable.
mesón policuarzo con 4 push y su respectiva griferia.
Pintura interna., espejo.
enchape pared., luminarias, interruptor.
Baldosa granito pulido en pisos, bajante.

BAÑO PMR : Pintura interna., enchapo piso, lavamanos, baldosa granito pulido piso sanitario, puerta con 5 llaves.
barras
espejo
sensor movimiento, rampa ingreso.

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
• Bajantes escalera: pintura.	20-4-24	Consorcio Claridad
• Escaleras: tapa huecos palomas	20-4-24	Consorcio Claridad.
• Parches en fachada externa.	27-4-24	Consorcio claridad
• Ajustes puertas. - cerraduras. (todas).	20-4-24	Consorcio Claridad

Próxima reunión. _____

1/3

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ACTA DE REUNIÓN
ACTA Nº 96

CB INGENIEROS S.A.S.

FECHA: 15 | 01 | 2024

OBJETO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5

ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

COMPROMISO	OBSERVACIONES

TEMAS TRATADOS

BAÑOS NIÑAS: enchape pared, pintura interna, divisiones acero inoxidable, espejo, meson policuarzo con 1 push y antena, poceta, 2 luminarias, interruptor, ventana, persiana, puerta con 5 llaves, 1 registro

SALON 101: puerta (roja) con 4 llaves, 6 paneles, 1 interruptor, enchape piso, muro de ventana pintado interiormente, guardaescoba, mantenimiento ventanas. 4 tomacorrientes

SALON 102: puerta (camanilla) con 4 llaves, 6 paneles, 1 interruptor, enchape piso, muro de ventana pintado interiormente, guardaescoba, mantenimiento ventanas 4 tomacorrientes

PASILLO PRIMER PISO: enchape piso, guardaescoba, tablero, 4 luminarias.

ESCALERAS: pintura barandas, 1 lamparas emergencia., 1 luminaria.

SALON 202: puerta (camanilla) con 5 llaves, 6 paneles, 1 interruptor, enchape piso, muro de ventana pintado interiormente, guardaescoba, mantenimiento ventanas pintura estructura., 4 tomascorrientes

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
• en las puertas de salone 101, 102, 201, 202 tapar los huecos presentados al lado de la cerradura.	20-1-24	Consorcio Claridad.
• Interruptor de lámparas en pasillos.	27-1-24	Consorcio Claridad.

Próxima reunión. _____

2/3

Powered by CamScanner

BOGOTÁ

ACTA DE REUNIÓN
ACTA Nº 16

CB INGENIEROS S.A.S.

FECHA: 15 | 04 | 2024

OBJETO

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 5

ASISTENTES A LA REUNIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES

COMPROMISO	OBSERVACIONES

TEMAS TRATADOS

SALON 201: puerta (roja) con 3 llaves, 6 paneles, 1 interruptor, enchape piso, nivo de ventana pintado intalamente guardaescoba, mantenimiento ventanas, pintura estructura. 4 tomacomentes

BODEGA: puerta Camanital con 5 llaves, 2 paneles, 1 interruptor, enchape piso, 1 tomacomente, guardaescoba

PASILLO SEGUNDO PISO: 1 lampara emergencia, enchape piso guardaescoba.

BODEGA PRIMER PISO: enchape piso, guardaescoba

PATIO: 4 cajas de inspección, bajante.

CUBIERTA BLOQUE AULAS Y BAÑOS: estructura metálica y teja tipo sandwich.

COMPROMISOS PRESENTE ACTA

COMPROMISO	FECHA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

Próxima reunión. _____

3/3

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.5305904
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: Diego Montaña Cuellar sede A
DIRECCIÓN	: Transversal 6b No. 100 c 55 sur
LOCALIDAD	: Usme
FECHA DE ENTREGA	: 2 de febrero de 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. – FERNEY JIMENEZ NEIRA en su calidad de supervisión del contrato.

POR LA INTERVENTORIA. – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría en calidad de Interventor CB Ingenieros.

POR EL CONTRATISTA. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra Consorcio Claridad.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de la emergencia presentada en el colegio Diego Montaña Cuellar sede A, ubicado en la localidad quinta (5) de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número transversal 6b No. 100 c 55 sur que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Auditorio	Marquesina de marco fachada	4 metros aproximadamente	Debido a la humedad presentada en la parte superior de la marquesina, se presentó un desprendimiento del superboard

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [X] **NO** [ ]

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [ ] **NO** [ ] **N.A** [X]

Nota: cabe mencionar que la intervención fue en la fachada exterior del auditorio, por lo cual, no fue intervenida la parte eléctrica ni sanitaria.

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [X] **NO** [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

Dado que la intervención fue en la fachada exterior del auditorio, no se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [X] **NO** [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [ ] **NO** [ ] **N/A** [X]

Nota: no aplica dado que la intervención fue en la fachada exterior del auditorio.

IV. OBSERVACIONES GENERALES

El señor rector solicita retoque de pintura en una parte de la lámina del flanche. El contratista de obra atenderá esta observación: fecha de entrega el 10 de febrero de 2024.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de febrero del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Consorcio Claridad
Director de obra

INTERVENTOR
CB Ingenieros
Director de interventoría

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Supervisión del contrato

Eulogio Munoz R.
COLEGIO DIEGO MONTAÑA CUELLAR
Rector

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.5305904
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: Colegio Campestre Jaime Garzón – Sede Tabaco
DIRECCIÓN	: Corregimiento Betania- Sede Tabaco
LOCALIDAD	: 20 - Sumapaz
FECHA DE ENTREGA	: 19 de febrero de 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. – FERNEY JIMENEZ NEIRA en su calidad de supervisión del contrato.

POR LA INTERVENTORIA. – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría en calidad de Interventor CB Ingenieros S.A.S.

POR EL CONTRATISTA. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra Consorcio Claridad.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de la emergencia presentada en el Colegio Campestre Jaime Garzón – Sede Tabaco, ubicado en la localidad 20 - Sumapaz de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número Vereda Tabaco que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Exterior	Placa de concreto	9 m^2 aproximadamente	Instalación de parque infantil.
Aulas	Edificación de aulas	4 m^2 aproximadamente	Cambio de tejas perforadas.
Exterior	Adyacente a la entrada del colegio.	9 m aproximadamente	Cerramiento de escombros.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

SI [X] **NO** [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [ ] **NO** [ ] **N.A** [X]

Nota: no se intervino ninguna red eléctrica, hidráulica o sanitaria.

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [X] **NO** [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

Solo se instaló el parque infantil con el que ya contaba el colegio.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [X] **NO** [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [ ] **NO** [ ] **N/A** [X]

Nota: no aplica dado que la vigilancia del colegio tenía las llaves para acceder.

IV. OBSERVACIONES GENERALES

V. DECLARACIONES

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Consorcio Claridad
Director de obra

INTERVENTOR
CB Ingenieros
Director de interventoría

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Supervisión del contrato

COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZÓN – SEDE TABACO
Rectora

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.5305904
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: Colegio Campestre Jaime Garzón – Sede Nazareth
DIRECCIÓN	: Calle 3 No 2-05 Nazareth
LOCALIDAD	: 20 - Sumapaz
FECHA DE ENTREGA	: 19 de febrero de 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. – FERNEY JIMENEZ NEIRA en su calidad de supervisión del contrato.

POR LA INTERVENTORIA. – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría en calidad de Interventor CB Ingenieros S.A.S.

POR EL CONTRATISTA. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra Consorcio Claridad.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de la emergencia presentada en el Colegio Campestre Jaime Garzón – Sede Nazareth, ubicado en la localidad 20 - Sumapaz de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número Calle 3 No 2-05 Nazareth que comprende

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Cocina	Pared lateral derecha	30 m^2 aproximadamente	Humedad que se presenta en la superficie.
Cocina	Lavaplatos	0.50 m aproximadamente	Fuga
Cocina	Lavaplatos	2 m aproximadamente	Pintura e instalación de grifería de lavaplatos de pedal.

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

SI [X] **NO** [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [X] **NO** [ ] **N.A** [ ]

Nota: la grifería de pedal instalada quedó funcional.

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [X] **NO** [ ]

4.- Descripción de los equipos entregados

No se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil?

SI [X] **NO** [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

SI [ ] **NO** [ ] **N/A** [X]

Nota: no aplica dado que la vigilancia del colegio tenía las llaves para acceder.

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de febrero del año veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Consorcio Claridad
Director de obra

INTERVENTOR
CB Ingenieros
Director de interventoría

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Supervisión del contrato

COLEGIO CAMPESTRE JAIME GARZÓN – SEDE NAZARETH
Rectora

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA PARCIAL DE LA OBRA

La presente acta de entrega es parcial, por ello, es entregada la cancha múltiple, ludoteca, terraza de ludoteca y patio de preescolar en aras de habilitar el espacio para las jornadas escolares. Una vez culminen los demás espacios intervenidos en el colegio Fernando González Ochoa se realizará el acta de entrega física de la obra.

CONTRATO	: CO1.PCCNTR.5305904
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL	: Fernando González Ochoa
DIRECCIÓN	: Carrera. 4d este No.89 sur 77
LOCALIDAD	: Usme
FECHA DE ENTREGA	: 15 de febrero de 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA PARCIAL DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. – FERNEY JIMENEZ NEIRA en su calidad de supervisión del contrato.

POR LA INTERVENTORIA. – ANDRÉS FELIPE MACKENZIE FUENTES, en su calidad de director de interventoría en calidad de Interventor CB Ingenieros, contrato de interventoría no. CO1.PCCNTR.5313332.

POR EL CONTRATISTA. JAIRO ERNESTO JIMÉNEZ PINEDA en su calidad de director de obra Consorcio Claridad, contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5305904.

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FISICA PARCIAL DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física parcial de las obras del colegio Fernando González Ochoa, ubicado en la localidad quinta (5) de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número carrera. 4d este No.89 sur 77 que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Cancha múltiple	Cancha múltiple	232,1 m2	Demolición de placa existente. Construcción de placa para cancha múltiple. Pintura para cancha múltiple. Pintura de cerramiento contra impacto.
Ludoteca	Ludoteca	90 m2	Desmonte de piso existente. Instalación de neopreno. Instalación de piso mipolam.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA PARCIAL DE LA OBRA

Preescolar	Patio de preescolar y terraza de ludoteca	116 m2	Desmonte de piso existente. Instalación de piso grano caucho. Instalación de estructura metálica y teja traslucida para cubierta

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES. -

1.- ¿Las observaciones realizadas al Constructor en el transcurso de la obra por parte de la Interventoría en consideración a la calidad de la misma se ejecutaron?

SI [X] **NO** [ ]

2.- ¿Se entregan las instalaciones correspondientes a la parte eléctrica, hidráulica, sanitaria, en funcionamiento?

SI [X] **NO** [ ]

Nota: cabe mencionar que la intervención fue en la cancha múltiple, ludoteca, terraza de ludoteca y patio de preescolar, por lo cual, no fue intervenida la parte eléctrica ni sanitaria.

3.- ¿Los acabados corresponden a los indicados en el Pliego de Condiciones y al diseño arquitectónico?

SI [X] **NO** [ ]

Nota: cabe mencionar que la intervención fue en la cancha múltiple, ludoteca, terraza de ludoteca y patio de preescolar, por lo cual, los diseños y los colores fueron socializados y aprobados por las directivas del colegio.

4.- Descripción de los equipos entregados
Dado que la intervención fue en la cancha múltiple, ludoteca, terraza de ludoteca y patio de preescolar no se instaló ningún equipo.

5.- ¿El proyecto cuenta con los medios de acceso requeridos para el debido funcionamiento sin que implique riesgo alguno a la comunidad estudiantil.?

SI [X] **NO** [ ]

6.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas?

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE ENTREGA FÍSICA PARCIAL DE LA OBRA

SI ☐ **NO** ☐ **N/A** [X]

Nota: no aplica dado que la intervención fue en la cancha múltiple, ludoteca, terraza de ludoteca y patio de preescolar.

IV. OBSERVACIONES GENERALES

Reparación de tapa de caja de inspección e instalación de tramo negro para el 17 feb.
Ajuste de puerta de baño preescolar 22 feb
Instalación planche: martes 20 feb.
Instalación de enchape: martes 20 feb

V. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en la ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15) días febrero del año dos mil veinticuatro (2024), por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA
Consorcio Claridad
Director de obra

INTERVENTOR
CB Ingenieros
Director de interventoria

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
Supervisión del contrato

Anais Ferrera e
COLEGIO FERNANDO GONZALEZ OCHOA
Rectora

Powered by CamScanner
