# IDRD

**Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3131 DE 2023**
**SOLIUN INGENIERÍA SAS**
**DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55**
**TELÉFONO: 76530168 – 3013942384**

"***Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".***

## INFORME MENSUAL No 7 – COMPONENTE TÉCNICO
## PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

**TOMO __1___ DE _____**



**TABLA DE CONTROL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| COPIA CONTROLADA | X | COPIA CONTROLADA NO | |

| | Nombre | Cargo | Firma |
|---|---|---|---|
| **ELABORÓ** | Luis Alberto Medrano Bermúdez | Residente de Interventoría | |
| **APROBÓ** | Edna Constanza Cepeda Sánchez | Directora de Interventoría | |

**MARZO DE 2024 / BOGOTÁ D.C.**




INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.06.06 09:30:51 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE


790
696

## CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES ..... 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS ..... 11
3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO: ..... 11
4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO: ..... 12
5. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO ..... 12
5.1 SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES ..... 12
5.2 SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES ..... 12
6. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA: ..... 15
6.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO ..... 15
6.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS: ..... 21
7. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS ..... 42
8. CLIMATOLOGÍA: ..... 42
9. REUNIONES DE SEGUIMIENTO: ..... 42
9.1 ACTAS DE COMITÉ ..... 42
9.2 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME: ..... 43
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO ..... 43
11. TRAZABILIDAD DE LAS LABORES EJECUTADAS ..... 47
12. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS ..... 47
13. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL ..... 48
15. BITÁCORA ..... 50
16. CORRESPONDENCIA ..... 50

***TABLA DE ANEXOS***

**ANEXO 1.** PÓLIZAS
**ANEXO 2.** CONTROL CLIMATOLÓGICO
**ANEXO 3.** COPIA ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA
**ANEXO 4.** INFORMES SEMANALES
**ANEXO 5.** REGISTRO FOTOGRÁFICO
**ANEXO 6.** FORMATO TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES
**ANEXO 7.** ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS – NP
**ANEXO 8.** INFORME DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO
**ANEXO 9.** BITÁCORA DE OBRA
**ANEXO 10.** COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS

## INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. 3131 de 2023 suscrito entre SOLIUN INGENIERÍA SAS y el INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra: CONSORCIO PARQUES BOG de acuerdo con el contrato No. 3099 de 2023.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al séptimo mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 1° de marzo de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de parques IDRD y el Manual de Interventoría del IDRD, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado.

Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra a la fecha de entrega de este informe.

## 1. CONDICIONES CONTRACTUALES

### 1.1. OBJETO DEL CONTRATO

*"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".*

### 1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

En el presente periodo, el proyecto se desarrolla en diferentes escenarios ubicados en la ciudad de Bogotá D.C., que se describen a continuación:

| PARQUE O ESCENARIO | CÓDIGO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN |
|---|---|---|---|
| LA VIDA | 01-012 | USAQUÉN | Calle 165 # 7-76 |
| SERVITA | 01-023 | USAQUÉN | Calle 165 No 14 - 62 *Calle 165 No 7-38 |
| NUEVA AUTOPISTA | 01-064 | USAQUÉN | Carrera 20 # 136- 91 |
| ALTA BLANCA | 01-075 | USAQUÉN | Carrera 8 A # 158- 04 |
| EL COUNTRY | 01-1000 | USAQUÉN | Avenida Calle 127 # 11 D -90 |
| GUSTAVO URIBE | 02-004 | CHAPINERO | Carrera 1 # 70-11 |
| CANAL EL VIRREY-EL CHICO | 02-014 | CHAPINERO | Calle 88 # 13 A -40 |
| SUCRE O HIPPIES | 02-019 | CHAPINERO | Calle 60 # 7-49 |
| LOS LACHES LA MINA | 03-014 | SANTAFÉ | Carrera 8 Este # 4B- 55 |
| PARQUE NACIONAL | 03-035 | SANTAFÉ | Carrera 7 # 37 -04 |
| SENDERO A MONSERRATE | 03-051 | SANTAFÉ | no tiene nomenclatura |
| LAS CRUCES | 03-036 | SANTAFÉ | Carrera 5A #1- 90 |
| INDEPENDENCIA | 03-039 | SANTAFÉ | Calle 24 # 6A -01 |
| TERCER MILENIO | 03-085 | SANTAFÉ | Avenida Jiménez hasta Caracas Calle 6 * Calle 6 Carrera 10 |
| PLAZA DE TOROS | 03-093 | SANTAFÉ | Carrera 5 # 26B- 72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MORALBA | 04-013 | SAN CRISTÓBAL | Carrera 16 B Este # 42 C -55 Sur |
| VILLA DE LOS ALPES | 04-075 | SAN CRISTÓBAL | Carrera 3 B # 35 -04 Sur |
| GAITÁN CORTES | 04-103 | SAN CRISTÓBAL | Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E |
| LA VICTORIA | 04-122 | SAN CRISTÓBAL | Calle 37A Bis Sur # 2A- 04 |
| SAN CRISTÓBAL | 04-127 | SAN CRISTÓBAL | Calle 17A Sur # 2A- 50 E |
| CEFE SAN CRISTÓBAL | | | |
| DEPORTIVO PRIMERA DE MAYO | 04-196 | SAN CRISTÓBAL | Calle 19 Sur # 5 -40 |
| LA AURORA II | 05-002 | USME | Diagonal 69 F Sur # 14U- 45 |
| VALLES DE CAFAM | 05-003 | USME | Calle 92 Sur # 14D -87 |
| LA ANDREA | 05-004 | USME | Calle 81 BIS Sur # 8A- 24 |
| EL VIRREY SUR | 05-016 | USME | Calle 96 B Sur # 8- 10 |
| FAMACO | 05-086 | USME | Calle 90 Sur # 6 -00 |
| VILLA ALEMANA | 05-087 | USME | Calle 100 BIS Sur # 1 -17 |
| SAN CAYETANO | 05-236 | USME | Carrera 15 Este # 74- 00 Sur |
| NUEVO MUZU | 06-017 | TUNJUELITO | Carrera 61 B # 52A -20 Sur |
| EL TUNAL | 06-063 | TUNJUELITO | Calle 48 C Sur # 22D -81 |
| CEFE TUNAL | | | Calle 48 B Sur 22 A 70 |
| LAURELES NARANJOS | 07-035 | BOSA | Calle 70 F S # 80 J- 50 |
| CLARELANDIA | 07-163 | BOSA | Calle 58 J Sur # 80 D -10 |
| PARQUE DEL RIO MARYLAND URBANIZADOR | 07-164 | BOSA | Carrera 86 # 74- 85 S |
| PALESTINA | 07-165 | BOSA | Calle 68 Sur No 9-05 / Calle 68sur No 81G-05 * Calle 68 Sur |
| EL RECREO | 07-260 | BOSA | Carrera 100 Calle 20 |
| TIBANICA | 07-274 | BOSA | Calle 74 Sur # 77 I -31 |
| PORVENIR | 07-391 | BOSA | Avenida Calle 54 S # 97-37 |
| AUTOPISTA SUR (PAVCO) | 07-152 | BOSA | Carrera 72 # 57 H -20 S |

| | | | |
|---|---|---|---|
| LA ESPERANZA | 07-273 | BOSA | Parte central Calle 75 BIS SUR Y CALLE 78 SUR Y ENTRE |
| TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO | 07-036 | BOSA | Carrera 68 D # 54 A -03 Sur |
| PATIO BONITO | 08-034 | KENNEDY | Carrera 101 Calle 34 Bis Sur / Carrera 101 No 34 Bis - 02 |
| EL TINTAL | 08-109 | KENNEDY | Calle 6A # 86- 20 |
| PORVENIR GIBRALTAR PREDIO | 08-110 | KENNEDY | Calle 49 Sur Con Prolongación De La Carrera 100b |
| BELLAVISTA-DINDALITO | 08-144 | KENNEDY | Carrera 96 # 41- 01 Sur |
| CASTILLA | 08-200 | KENNEDY | Carrera 75 # 8 A- 31 |
| LA IGUALDAD | 08-212 | KENNEDY | Carrera 68 F # 3A -30 |
| TIMIZA | 08-219 | KENNEDY | Calle 40 H Sur # 70A -81 |
| CAYETANO CAÑIZARES | 08-241 | KENNEDY | Carrera 80 40 56 Sur |
| LA AMISTAD | 08-355 | KENNEDY | Transversal 79 No 41-10 Sur * Transversal 78J No 41 - 10 Sur |
| GILMA JIMÉNEZ (LAS MARGARITAS) | 08-552 | KENNEDY | Calle 51 A Sur # 82 A- 16 |
| SAN IGNACIO | 08-791 | KENNEDY | Cl 6c con Cra. 94 |
| MARSELLA | 08-066 | KENNEDY | Carrera 69 No 8-28 |
| ESTADIO DE TECHO | 08-554 | KENNEDY | |
| CARMEN DE LA LAGUNA | 09-020 | FONTIBÓN | Diagonal 16 F Bis # 104A-15 |
| CANAL BOYACÁ | 09-050 | FONTIBÓN | Calle 23 G # 73 F- 04 |
| ATAHUALPA | 09-104 | FONTIBÓN | Avenida Calle 24 # 113-51 |
| SAUZALITO | 09-111 | FONTIBÓN | Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal |
| ZONA FRANCA | 09-125 | FONTIBÓN | Diagonal 12 C Carrera 109 |
| VILLA LUZ | 10-018 | ENGATIVÁ | Carrera 77 A # 64 B- 03 |
| VILLAS DE GRANADA | 10-102 | ENGATIVÁ | Calle 77 # 112 -50 |
| EL CARMELO | 10-169 | ENGATIVÁ | Carrera 104 # 71 C- 23 |
| JUAN AMARILLO | 10-171 | ENGATIVÁ | Avenida Calle 90 # 110- 06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TABORA | 10-192 | ENGATIVÁ | Calle 74 #76- 62 |
| BONANZA | 10-215 | ENGATIVÁ | Carrera 70 F # 75 -80 |
| LA SERENA | 10-223 | ENGATIVÁ | Calle 90 A # 85- 70 |
| SAN ANDRÉS | 10-234 | ENGATIVÁ | Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a - |
| UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE SIMÓN BOLÍVAR | 10-290 | ENGATIVÁ | Avenida Calle 63 # 68 -45 |
| LA FLORIDA | 10-311 | ENGATIVÁ | Calle 64 # 128- 90 |
| PTAR SALITRE | 10-531 | ENGATIVÁ | Av. Calle 80 No 119-60 |
| CANAL CÓRDOBA | 11-003 | SUBA | Avenida Carrera 55 # 116- 16 |
| SAN JOSÉ DE BAVARIA | 11-078 | SUBA | Calle 170 # 67 -51 |
| MORATO | 11-113 | SUBA | Calle 107 # 70A- 34 |
| LA GAITANA | 11-205 | SUBA | Transversal 126 # 134- 88 |
| TIBABUYES | 11-212 | SUBA | Calle 139 No 122-46 / Calle 139 No 127C - 48 * Calle 139 No |
| FONTANAR DEL RIO | 11-368 | SUBA | Diagonal 147 # 141A -42 |
| CEFE Fontanar del Rio | | SUBA | Dirección diagonal 145 # 138 a 10 |
| ATABANZA | 11-796 | SUBA | ENTRE LA CALLE 126 A, LA AC 125 A Y LAS UNIDADES |
| CASA BLANCA | 11-069 | SUBA | Carrera 80 # 145-50 |
| CIUDADELA CAFAM II | 11-1101 | SUBA | Carrera 146 No 142A 60 |
| COMETAS | 11-204 | SUBA | Cerros de suba cuchilla |
| CEFE Cometas | | SUBA | Cerros de suba cuchilla |
| CANAL RIO NEGRO | 12-002 | BARRIOS UNIDOS | Calle 90 # 60 B- 44 |
| ALCÁZARES | 12-015 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Carrera 24 # 71 - 25 |
| GIMNASIO DEL NORTE | 12-023 | BARRIOS UNIDOS | Calle 6 38 # 278 - 70 |
| PRD EL SALITRE - UCAD | 12-091 | BARRIOS UNIDOS | Carrera 60 # 63 -75 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| PISTA DE BMX PRD | 12-117 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Carrera 63 # 60 -80 |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | 12-092 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Calle 63 # 45 - 10 |
| COMPLEJO ACUÁTICO | 12-1000 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Calle 63 # 45-10 |
| PALACIO DE LOS DEPORTES | 12-125 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Calle 63 # 45 -10 |
| PARQUE DE LOS NIÑOS | 12-141 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Carrera 63 # 60 -80 |
| LA ESTACIÓN | 12-093 | BARRIOS UNIDOS | Avenida Calle 72 No 23-40 |
| NICOLAS DE FEDERMÁN 3 | 13-038 | TEUSAQUILLO | Carrera 36A # 58- 22 |
| VIRGILIO BARCO | 13-088 | TEUSAQUILLO | Avenida Carrera 60 # 57- 60 |
| SIMÓN BOLÍVAR | 13-089 | TEUSAQUILLO | Avenida Carrera 68 # 53-36 |
| ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN | 13-122 | TEUSAQUILLO | Calle 53 B # 28A- 10 |
| EL CAMPINCITO-CEAD | 13-123 | TEUSAQUILLO | Calle 53 B # 28A- 10 |
| SANTA ISABEL | 14-009 | MÁRTIRES | Avenida Carrera 27 # 1 G- 02 |
| EDUARDO SANTOS | 14-030 | MÁRTIRES | Calle 4A Bis # 18 B- 30 |
| EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO | 14-036 | MÁRTIRES | Avenida Calle 26 # 19 B - 55 |
| RECONCILIACIÓN | 14-037 | MÁRTIRES | Calle 26 Carrera 20 Y 32 |
| CIUDAD JARDÍN | 15-027 | ANTONIO NARIÑO | Carrera 11 B # 11 -88 Sur |
| VILLA MAYOR CEMENTERIO | 15-036 | ANTONIO NARIÑO | Calle 31 Sur # 30- 99 Sur |
| LA FRAGUA | 15-040 | ANTONIO NARIÑO | Carrera 29 A # 14 - 09 Sur |
| UNIDAD DEPORTIVA ALQUERÍA | 16-024 | PUENTE ARANDA | Calle 43 Sur # 52- 20 |
| MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO | 16-099 | PUENTE ARANDA | Carrera 54 # 18- 23 Sur |
| CIUDAD MONTES | 16-112 | PUENTE ARANDA | Carrera 39 # 10- 75 Sur |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EL JAZMÍN | 16-204 | PUENTE ARANDA | Avenida Carrera 50 # 1 D- 28 |
| VERAGUAS PREDIO | 16-221 | PUENTE ARANDA | Kr 34 3- 97 |
| INDUSTRIAL LOS EJIDOS | 16-416 | PUENTE ARANDA | Calle 11A No 36-56 |
| LA CONCORDIA | 17-008 | CANDELARIA | Calle 12 B Bis A # 0- 08 |
| BOSQUE SAN CARLOS | 18-028 | RAFAEL URIBE | Carrera 12 D # 32- 44 Sur |
| DIANA TURBAY | 18-031 | RAFAEL URIBE | Calle 48 X Sur # 2B -00 E |
| PIJAOS JORGE E. CABALIER | 18-090 | RAFAEL URIBE | Carrera 10 D # 34- 50 Sur |
| LOS MOLINOS II | 18-162 | RAFAEL URIBE | Calle 48 P Bis C Sur # 4-30 |
| QUIROGA | 18-205 | RAFAEL URIBE | Calle 31B Sur No 22-07 |
| PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA | 18-207 | RAFAEL URIBE | Calle 22 Sur # 21 -09 |
| GIMNASIO DEL SUR ARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA | 18-452 | RAFAEL URIBE | Carrera 22 Sur No 21-09 / Calle 22 sur hasta 27 Sur Avenida 19 * Carrera 21 No 25-35 Sur |
| SANTA LUCIA | 18-073 | RAFAEL URIBE | Diagonal 36 Sur Carrera 16 B |
| ARBORIZADORA ALTA | 19-188 | CIUDAD BOLÍVAR | Diagonal 73 sur No 40-80 |
| CANDELARIA LA NUEVA | 19-189 | CIUDAD BOLÍVAR | Calle 62B Sur No 22-47 * Calle 62 Sur No 22I-27 |
| ARBORIZADORA ALTA METRP | 19-229 | CIUDAD BOLÍVAR | Diagonal 79 Bis Calle 72f Sur Transversal 34b |
| MEISSEN | 19-230 | CIUDAD BOLÍVAR | Calle 62 Bis Sur # 18 C -32 |
| LA ESTANCIA | 19-231 | CIUDAD BOLÍVAR | Calle 59 A Sur # 86-00 |
| ILLIMANI (PARAÍSO) | 19-346 | CIUDAD BOLÍVAR | Calle 74 B Sur # 27 M- 06 |
| LA JOYA | 19-349 | CIUDAD BOLÍVAR | Carrera 18 H Bis A # 80 B- 13 |
| EL TALLER | 19-348 | CIUDAD BOLÍVAR | Avenida Calle 68 Sur # 70 D -11 |
| BUENA VISTA PORVENIR | 19-347 | CIUDAD BOLÍVAR | Carrera 17 H Bis # 74 B- 66 Sur |
| ALTOS DE LA ESTANCIA | 19-756 | CIUDAD BOLÍVAR | Calle 68 Sur # 75 H -93 |
| SIERRA MORENA | 19-190 | CIUDAD BOLÍVAR | Calle 75 A Sur # 73- 08 |

## 2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS

**CONTRATO DE OBRA**

| | |
|---|---|
| No. de contrato | 3099 DE 2023 |
| Contratista Consultoría y/obra | CONSORCIO PARQUES BOG |
| Objeto | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |
| Etapa preliminar | QUINCE (15) DÍAS |
| Plazo de la ejecución etapa de obra | SEIS MESES (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS |
| Plazo total del contrato | SIETE (7) MESES. |
| Valor etapa de obra | $ 13.733.153.000,00 |
| Valor total del contrato | $ 13.733.153.000,00 |
| Fecha Inicio | 12 de septiembre de 2023 |
| Fecha de Terminación del contrato: | 11 de abril de 2024 |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| | |
|---|---|
| No. de contrato | 3131 DE 2023 |
| Contratista de Interventoría | SOLIUN INGENIERÍA SAS |
| Objeto | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| Etapa preliminar | QUINCE (15) DÍAS |
| Periodo etapa de obra | SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS |
| Plazo de liquidación | UN (01) MES |
| Plazo total del contrato | OCHO (08) MESES |
| Valor etapa de obra | $ 1.192.172.234,00 |
| Valor total del contrato | $ 1.192.172.234,00 |
| Fecha Inicio | 12 de septiembre de 2023 |
| Fecha de Terminación contrato: | 11 de mayo de 2024 |

## 3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO:

Lo primero que se realizó fue un reconocimiento de la zona a intervenir en compañía de los funcionarios del IDRD, representantes de la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS y delegados del contratista Consorcio Parques BOG.

En las visitas realizadas se identificaron los escenarios a intervenir dentro del alcance del presente contrato.

## 4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO:

Durante el desarrollo del presente periodo, correspondiente al Informe N° 7, se continuó realizando verificación, así como ajustes a los presupuestos y a las programaciones para los escenarios priorizados; se atendieron las emergencias que se presentaron durante el mismo periodo. Por otra parte, se iniciaron y continuaron las actividades propias de obra en algunos de los escenarios ya priorizados.

De igual manera como se procedió en el periodo anterior, tanto el Contratista como la Interventoría y con el acompañamiento del Apoyo a la Supervisión del IDRD, se continuaron efectuando las revisiones preliminares de las actividades a ejecutar en cada zona de trabajo; se realizaron actividades de campo complementarias con las de oficina, tales como: medidas en terreno, inventarios, elaboración y ajustes de los presupuestos y programaciones de obra, para los diferentes Escenarios. Por parte de la Interventoría también se realizó acompañamiento permanente en terreno para todas estas las actividades mencionadas, así como la coordinación de reuniones, mesas de trabajo, comités de obra; además, por la parte administrativa, se efectuó la revisión y /o aprobación de documentos inherentes a los contratos; todo esto, para la marcha y el buen desempeño de las obras.

## 5. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe, el contrato de obra pública No. 3099 de 2023 se ha venido desarrollando en concordancia con los términos legales establecidos contractualmente, sin presentar a la fecha ningún tipo de hechos u omisiones, que puedan conllevar a un presunto incumplimiento por parte del contratista.

De acuerdo con lo anterior y con los lineamientos establecidos en la naturaleza del contrato, el pliego de condiciones, documentos previos, y en especial las contenidas en el anexo técnico, en lo referente a las obligaciones del contratista, a continuación, se presenta un breve resumen del estado actual en los siguientes aspectos:

### 5.1 SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Se dio inicio a la etapa de obra, de acuerdo con el seguimiento efectuado por esta interventoría. Durante el trascurso del presente informe, el contrato de obra e interventoría, no presenta ningún cambio, así como ningún tipo de modificación contractual, tales como (Ampliación, suspensión, adición, y/o prorroga).

### 5.2 SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS CONTRACTUALES

Se revisa el estado actual de las pólizas de los contratos de obra e interventoría, y se evidencia que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidas contractualmente a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto: **ANEXO 1**

**5.2.1. CONTRATO DE OBRA: COMPAÑÍA ASEGURADORA - NACIONAL DE SEGUROS**

1. **EMISIÓN ORIGINAL**

| AMPARO | | Emisión inicial | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VALOR (Bruto) | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO No. CBO-11-30-400049988 | Cumplimiento | $4.119.945.900,00 | 18/07/2023 | 20/08/2024 |
| | Salarios y Prestaciones Sociales | $1.373.315.300,00 | 18/07/2023 | 20/02/2027 |
| | Estabilidad de la obra | $2.746.630.600.00 | 24/02/2024 | 20/02/2026 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $5.493.261.200,00 | 18/07/2023 | 20/08/2024 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO-11-15-400049989 | | $686.657.650,00 | 18/07/2023 | 20/02/2024 |

| AMPARO | | Actualización acta de inicio | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VALOR (Bruto) | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO No. CBO-11-30-400049988 | Cumplimiento | $4.119.945.900,00 | 12/09/2023 | 11/10/2024 |
| | Salarios y Prestaciones Sociales | $1.373.315.300,00 | 12/09/2023 | 11/04/2027 |
| | Estabilidad de la obra | $2.746.630.600.00 | 11/04/2024 | 11/04/2026 |
| | Buen manejo y correcta inversión del anticipo | $5.493.261.200,00 | 12/09/2023 | 11/10/2024 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO-11-15-400049989 | | $686.657.650,00 | 12/09/2023 | 11/04/2024 |

A la fecha las garantías se encuentran aprobadas por la entidad en la plataforma Secop II:

**DETALLE DE LA GARANTÍA**

Id de la garantía: CO1.WRT.12693731

Referencia de la garantía: 400049933-400049933

Estado: Aceptado

Justificación:
- Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- Cumplimiento - Pago de salarios
- Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía:
- Contrato de seguro
- Patrimonio autónomo
- Garantía bancaria

Entidad aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS

Número de póliza: 400049933-400049933

Tomador: CONSORCIO PARQUES BOG

Beneficiario: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE

| Justificación | Valor del amparo | Vigencia |
|---|---|---|
| Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 5.423.251.200,00 COP | 11/10/2024 12:00:00 AM (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | 4.119.945.600,00 COP | 11/04/2027 12:00:00 AM (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Pago de salarios | 1.373.315.200,00 COP | 11/04/2027 12:00:00 AM (GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito) |
| Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra | 2.746.630.600,00 COP | 11/04/2026 12:00:00 AM (GMT-05:00) Bogota, Lima, |

### 5.2.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA: COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

#### 1. ACTUALIZACIÓN ACTA DE INICIO

| AMPARO | | Emisión original | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VALOR (Bruto) | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO No. 15-44-101284535 | Cumplimiento | $238.434.646,80 | 28/08/2023 | 28/10/2024 |
| | Salarios y Prestaciones Sociales | $101.217.323,40 | 28/08/2023 | 28/04/2027 |
| | Calidad de servicio | $238.434.646,80 | 28/04/2024 | 28/04/2029 |

| AMPARO | | Actualización acta de inicio | | |
|---|---|---|---|---|
| | | VALOR (Bruto) | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO No. 15-44-101284535 | Cumplimiento | $238.434.646,80 | 12/09/2023 | 12/11/2024 |
| | Salarios y Prestaciones Sociales | $101.217.323,40 | 12/09/2023 | 13/05/2027 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Calidad de servicio | $238.434.646,80 | 13/05/2024 | 13/05/2029 |

A la fecha las garantías se encuentran aprobadas por la entidad en la plataforma Secop II:

Garantías del proveedor:

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | Detalle | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12511121 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 596.086.617,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 13/05/2029 (hora de Bogotá, Lima, Quito) | Aceptado | Detalle | |
| CO1.WRT.12380282 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato | Contrato de seguro | 596.086.617,00 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 28/04/2029 (hora de Bogotá, Lima, Quito) | Aceptado | Detalle | |
| CO1.WRT.12344227 | Seriedad de la oferta | - | 238.434.647,40 COP | - | 10/01/2024 (hora de Bogotá, Lima, Quito) | Caducado | Detalle | Modificar |

## 6. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA:

### 6.1 ANTECEDENTES DEL CONTRATO

El IDRD realiza la presentación de las obras inicialmente priorizados, se solicita verificar en campo y realizar las correspondientes actas de inspección preliminares del estado actual de los escenarios. Verificación y ajustes, acompañado del respectivo presupuesto y la programación de obra para cada frente de trabajo.

Mediante el radicado IDRD No. 20246000077551 del 15 de marzo de 2024, el IDRD solicita aceptación para Adición del Contrato de obra 3099 de 2023, en virtud de que la Subdirección Técnica de Parques en el ejercicio de su gestión ha evidenciado la necesidad de priorizar intervenciones en los distintos parques; considerando lo establecido en el ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO . ***Copia del texto original:***

1 – ANEXO TÉCNICO que hace parte integral del COP No. 3099 de 2023 en los siguientes términos: *"realización del mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques para la recuperación y consolidación de espacios recreo deportivos, de contemplación y ocio, (...) del Sistema Distrital de Parques.*

Como consecuencia de la priorización realizada, se identificaron los parques administrados por el IDRD (pertenecientes al Sistema Distrital de Parques) que requieren intervención a fin de garantizar el disfrute de los habitantes de Bogotá D.C., se evidencian:



747

| PARQUE: PARQUE INDEPENDENCIA - BICENTENARIO | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | SANTAFE | **DIRECCION** | Calle 24 # 6A -01 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 03-039 |
| **Actividad** | Recuperación y mantenimiento de zonas de gimnasios al aire libre | | |

| PARQUE: PARQUE NACIONAL | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | SANTAFE | **DIRECCION** | Carrera 7 # 37 -04 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 03-035 |
| **Actividad** | Reparaciones locativas (zona de baños y administración) | | |

| PARQUE: JUAN AMARILLO | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | ENGATIVÁ | **DIRECCION** | Avenida Calle 90 # 110- 06 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 10-171 |
| **Actividad** | Mantenimiento y reparación en zonas de cancha y mobiliario | | |

| PARQUE: ZONA FRANCA | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | FONTIBÓN | **DIRECCION** | Diagonal 12 C Carrera 109 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 09-125 |
| **Actividad** | Mantenimiento y reparación en zona de gimnasio al aire libre y juegos infantiles | | |

| PARQUE: EL CARMELO | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | ENGATIVÁ | **DIRECCION** | Carrera 104 # 71 C- 23 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 10-169 |
| **Actividad** | Mantenimiento, adecuación y recuperación en zonas de cancha y módulos | | |

| PARQUE: CASA BLANCA | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | SUBA | **DIRECCION** | Carrera 80 # 145-50 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 11-069 |
| **Actividad** | Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de cancha tenis y juegos infantiles | | |

| PARQUE: LA FRAGUA | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | ANTONIO NARIÑO | **DIRECCION** | Carrera 29 A # 14 - 09 Sur |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 15-040 |
| **Actividad** | Recuperación y mantenimientos de zona infantil | | |

| PARQUE: VALLES DE CAFAM | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | USME | **DIRECCION** | Calle 92 Sur # 14D -87 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 05-003 |
| **Actividad** | Mantenimientos en zona gimnasio al aire libre | | |

| PARQUE: VALLES DE CAFAM | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | USME | DIRECCION | Calle 92 Sur # 14D -87 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 05-003 |
| Actividad | Mantenimientos en zona gimnasio al aire libre | | |

| PARQUE: EL RECREO | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | BOSA | DIRECCION | Carrera 100 Calle 20 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 07-260 |
| Actividad | Recuperación y mantenimiento en zona de juegos infantiles | | |

| PARQUE: CASTILLA | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | KENNEDY | DIRECCION | Carrera 75 # 8 A- 31 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 08-200 |
| Actividad | Mantenimiento y adecuación de zonas infantiles, cancha de futbol y gimnasio al aire libre | | |

| PARQUE: TIMIZA SECTOR VILLA DEL RÍO | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | BOSA | DIRECCION | Carrera 68 D # 54 A - 03 Sur |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 07-036 |
| Actividad | Adecuación en senderos peatonales | | |

| PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR PLAZA DE LOS ARTESANOS) | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | BARRIOS UNIDOS | DIRECCION | Av. Calle 63 # 59 A 06 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 12-110 |
| Actividad | Mantenimientos locativos | | |

| PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CENTRAL) | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | TEUSAQUILLO | DIRECCION | Avenida Carrera 68 # 53-36 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 13-089 |
| Actividad | Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de juegos infantiles | | |



298

| PARQUE: GILMA JIMENEZ (LAS MARGARITAS) | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | KENNEDY | **DIRECCION** | Calle 51 A Sur # 82 A - 16 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 08-552 |
| **Actividad** | Adecuación de iluminación en pista de patinaje y senderos, recuperación y mantenimiento de juegos en zona infantil | | |

| PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS) | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | BARRIOS UNIDOS | **DIRECCION** | Avenida carrera 63 # 60 - 80 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 12-141 |
| **Actividad** | Mantenimientos y adecuaciones locativas | | |

| PARQUE: GAITAN CORTES | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | SAN CRISTOBAL | **DIRECCION** | Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 04-103 |
| **Actividad** | Recuperación y adecuación de iluminación en senderos y mantenimiento en zona de gimnasio al aire libre | | |

| PARQUE: VILLA DE LOS ALPES | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | SAN CRISTOBAL | **DIRECCION** | Carrera 3 B # 35 -04 Sur |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 04-075 |
| **Actividad** | Mantenimiento en cancha múltiple. | | |

| PARQUE: SAUZALITO | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | FONTIBON | **DIRECCION** | Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 09-111 |
| **Actividad** | Mantenimiento y adecuación de actividades eléctricas | | |

| PARQUE: SAN ANDRES | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | ENGATIVÁ | **DIRECCION** | Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 10-234 |
| **Actividad** | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | | |

| PARQUE: LA SERENA | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | ENGATIVÁ | **DIRECCION** | Calle 90 A # 85- 70 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 10-223 |
| **Actividad** | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | | |

| PARQUE: NUEVO MUZU | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | TUNJUELITO | **DIRECCION** | Carrera 61 B # 52A -20 Sur |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 06-017 |
| **Actividad** | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | | |

| PARQUE: SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE) | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | BARRIOS UNIDOS | **DIRECCION** | Carrera 60 # 63 - 75 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 12-091 |
| **Actividad** | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | | |

| PARQUE: UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | PUENTE ARANDA | **DIRECCION** | Calle 43 Sur # 52-20 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 16-024 |
| **Actividad** | Mantenimiento y adecuaciones eléctricas | | |

| PARQUE: PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | RAFAEL URIBE | **DIRECCION** | Calle 22 Sur # 21-09 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 18-207 |
| **Actividad** | Mantenimiento juegos infantiles | | |

| PARQUE: CAYETANO CAÑIZARES | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | KENNEDY | **DIRECCION** | Carrera 80 40 56 Sur |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 08-241 |
| **Actividad** | Adecuación y mantenimiento de iluminación en senderos | | |

| PARQUE: ATAHUALPA | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | FONTIBON | **DIRECCION** | Avenida Calle 24 # 113-51 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 09-104 |
| **Actividad** | Mantenimiento y adecuación en zona infantil | | |

| PARQUE: EDUARDO SANTOS | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | LOS MARTIRES | **DIRECCION** | CALLE 4A BIS N 18 B 30 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 14-030 |
| **Actividad** | Recuperación de senderos peatonales | | |

| PARQUE: EL TUNAL | | | |
|---|---|---|---|
| **LOCALIDAD** | TUNJUELITO | **DIRECCION** | CALLE 48 C SUR N 22D 81 |
| **TIPO** | ESTRUCTURANTE | **CÓD. IDRD** | 06-063 |
| **Actividad** | Recuperación y mantenimiento locativo | | |



799
695

| PARQUE: NIZA XII | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | SUBA | DIRECCION | CARRERA 57 # 119B60 |
| TIPO | ESTRUCTURANTE | CÓD. IDRD | 11-191 |
| Actividad | Mantenimiento locativo | | |

Adicional a lo expuesto de acuerdo con lo establecido en el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO del contrato de obra COP 3099 de 2023 en lo referente a la atención de emergencias:

> *(...)" El oferente debe contar con personal, equipo e insumos necesarios para atender en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas cualquier actividad imprevista y que pueda catalogarse como emergencia. Igualmente, deberá estar en disposición de atender casos puntuales de mantenimiento, adecuación, recuperación y reparación o arreglos locativos que se deriven de la emergencia y que estén al margen de la periodicidad antes anotada.*
> *Los oferentes deben informar el número de operarios disponibles para atender este tipo de servicio, la logística disponible y el tiempo mínimo de respuesta. Se aclara que las emergencias deben estar cubiertas los siete días de la semana las 24 horas del día" (...).*

Es oportuno considerar la atención de emergencias que se puedan presentar:

| PARQUE: EMERGENCIAS | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | VARIAS | DIRECCION | VARIAS |
| TIPO | VARIOS | CÓD. IDRD | VARIOS |
| Actividad | Atención de emergencias del sistema distrital de parques. Las cuales surgen de actividades y requerimientos urgentes | | |

De la misma forma, el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO del contrato de obra 3099 de 2023 determina: (...) "*se deben tener en cuenta la atención a las necesidades que se presentan en el transcurso de la ejecución contractual que se ocasionan como consecuencia de los factores climáticos, deterioro por uso y daños por actos vandálicos, situaciones que podrán influir en la priorización inicial*", por lo tanto, es pertinente establecer la atención de mantenimientos preventivos y correctivos para los parques que conforman el Sistema Distrital de Parques:

| PARQUE: VARIOS | | | |
|---|---|---|---|
| LOCALIDAD | VARIAS | DIRECCION | VARIAS |
| TIPO | VARIOS | CÓD. IDRD | VARIOS |
| Actividad | Atención de mantenimientos preventivos y correctivos | | |

En tal sentido, y como bien se evidencia en la descripción de las necesidades identificadas en cada escenario por el IDRD, se estima conveniente que previo al diagnóstico de las necesidades de cada sitio, acordemos los términos de una adición al contrato de obra pública No. 3099 del 2023, teniendo claro que los recursos máximos disponibles corresponden al 50% del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales equivalentes a $ 6.866.576.500.

De acuerdo con la anterior solitud emitida por la Entidad IDRD, el CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG, presenta la **Aceptación de Adición No. 1 y Prórroga al Contrato No. 3099 de 2023**, mediante el oficio **CTO-IDRD- 3099-2023 -284**, con fecha **19 de marzo de 2024.**

Como respuesta a la solicitud de Aceptación interpuesta por el CONSORCIO PARQUES BOG, la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA remite a la Entidad la Carta de Aceptación mediante el comunicado **IDRD-3131-2024-313** de fecha **21 marzo de 2024** y de acuerdo a su estudio, concluye en la misiva lo siguiente:

**Esta interventoría se permite recomendar que dadas las condiciones vigentes del contrato y que, según el análisis antes realizado, se otorgue al CONSORCIO PARQUES BOG la adición por valor de $6.866.576.500,oo m/cte., así como la prórroga de cuatro (04) meses, se recomienda a la entidad contratante IDRD realizar el trámite de esta en el menor tiempo posible.**

A su vez, la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA, mediante el comunicado IDRD-3131-2024-314, de fecha 20 de marzo de 2024, le solicita a la Entidad IDRD, una Adición y Prórroga al Contrato de interventoría 3131 de 2023. ***Lo cual requiere que se genere una prórroga al contrato de interventoría 3099 de 2023, por un plazo de cuatro (04) meses, así como una adición por el valor equivalente al tiempo de dedicación del personal requerido para adelantar el control y seguimiento de las obras a ejecutar, cuyo valor fue calculado mediante el presupuesto, en el cual se evidencia que el costo del personal de interventoría es de Quinientos noventa y seis millones ochenta y seis mil ciento diecisiete pesos m/cte ($596.086.117,00) M/CTE.***

## 6.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

### 6.2.1 Semana del 3 de marzo al 9 de marzo de 2024

PARQUE EL TUNAL - CÓD.: 06-063

Senderos en adoquín costado oriental del parque frente a la puerta de ingreso # 4.

- Se avanza con la instalación del adoquín nuevo y remates de tramos en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4.
- Sendero zona que limita con el árbol sendero hacia la biblioteca, sendero quiosco de la cafetería, se avanza con la instalación de piezas y fundida de cintas de concreto que confinan los tramos, para entrega de tramos a la administración

Casa del adulto mayor

- Se avanza con los remates de observaciones para programar entrega a la administración.



909
606

Zona de Porterías:

- Se avanza con la corrección de observaciones hechas por la interventoría de estuco y pintura en portería # 2 y 3, para entrega y puesta en servicio

Pista de BMX:

- Se terminan los trabajos diagnosticados para este frente, se avanza con la evacuación de las observaciones de la interventoría, para programar entrega a la administración y puesta en servicio para el martes 12 de marzo de 2024.

Kiosco Cafetería

- Se suministra e instala el acrílico de techo que estaba roto y reportado como emergencia.

PARQUE MIRADOR ILLIMANI.

- El contratista no reporto actividades en este parque durante la presente semana.

PARQUE EDUARDO SANTOS

- Se avanza con pintura de muros y cielo rasos en los baños del coliseo, se inicia pulida y brillada de pisos en los baños del coliseo.

PARQUE LA FRAGUA

- Se avanza con la instalación de bordillos en la zona de jugos exterior del parque.
- Se avanza con la instalación de bordillos en concreto perimetral de la pista de patinaje

PARQUE LA VICTORIA

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio y la pintura de módulos de administración.

PARQUE NUEVO MUZU

- Se avanza con la instalación de baranda, tableros en malla y ángulo que complementan de la baranda en zona de juegos, para dejar la zona completamente cerrada la zona.

PARQUE VILLA ALEMANA

- Se instala portón nuevo costado lateral del parque, se instalan y sueldan las tapas de las cajas de inspección, se avanza con la terminación de muros de cierre en la parte posterior del parque.

PARQUE LA VICTORIA:

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio y biosaludables

PARQUE VIRREY SUR:

- Se avanza actividades con mantenimiento y pintura de juegos infantiles e instalación y asegurada de tapas con marcos nuevas en cajas de inspección.

PARQUE GILMA JIMÉNEZ:

- Se realizaron los arreglos de tramos en adoquín, se inician los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo.

PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%
- En este parque ya se colocaron los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sea autorizado por el IDRD.
- El IDRD realiza reubicación y movimiento de los módulos sanitarios
- El Contratista debe ajustar el presupuesto e incluir el valor de las nuevas actividades
- Se deben adecuar las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.

PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%
- Se realizó reunión social de finalización.
- Se realizo Acta de puesta en servicio zona ruta de la vida.

PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD.: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas.



801
682

PARQUE CANAL BOYACÁ

- Se realiza revisión geotécnica y se realizan apiques.
- Se inicia la excavación zona de adoquines (perfilación de terreno).
- Se recibe diagramación para el piso caucho zona juego infantil.

PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Se revisan nuevamente lo vinilos instalados para corroborar su perfecta instalación.
- Está pendiente el inicio de la construcción de la zona del parkour.

PARQUE NACIONAL

- Se inicia el montaje de los juegos .

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

Zona Baños Administrativos

- Pendiente cambio puerta de entrada baños hombres y mujeres.

Zona Bebederos

- Se revisan los bebederos existentes para arreglarlos.

Zona Puente Seco

- Llegaron a la obra los marcos con malla soldada.
- Se retira los marcos y mallas dañadas debajo del puente.
- Se instalan los marcos con mallas nuevas debajo del puente.

Zona Grecorromanos

- Se continua con el suministro e instalación del hierro para fundir la viga zarpa.
- Se continua con la instalación de formaleta metálica para fundir la viga zarpa.

Actividades Eléctricas

- En este parque no se van a realizar actividades eléctricas.

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR – MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Finaliza la aplicación de la membrana Polyurea, con una bomba bimezcladora a alta presión para el revestimiento de los tanques sépticos.
- La Entidad concede permiso para retirar el agua del lago y así realizar el llenado de los tanques sépticos.
- Una vez llenados los tanques sépticos, se le realiza la prueba de estanqueidad por 24 horas, lo cual arrojó resultados favorables.
- De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el ambiental del IDRD, se le aplica una dosis de hipoclorito (3 kg); el ayudante del lago es la persona quien realiza la dosificación.
- La evacuación del agua de los tanques, se realiza con el vertimiento del agua al lago mediante

- Se continúa con el proceso de relleno (material seleccionado de excavación), en capas de 15 cm en el área perimetral de los tanques sépticos. SE realiza la compactación con canguros desde la parte inferior de los tanques, hacia el nivel de piso.

En los baños y Cocineta del Módulo Maná.

- Remates de la caja de inspección, la cual vierte las aguas al pozo séptico. Instalación de tapa en concreto.
- Remates de la caja de inspección, la cual vierte las aguas al pozo séptico. Instalación de tapa en concreto.

En el Sector del lago

- Avance en la lijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas.
- Continúa la aplicación de pintura en esmalte gris para los muros de los kioscos.
- Se le ha solicitado al Contratista realizar limpieza y aseo de los espacios que está interviniendo; especialmente las manchas dejadas en las láminas de acero cuando se está aplicando la pintura en los kioscos de comidas.
- Continúa la aplicación de pintura para las barandas externas acceso a la Capilla del Templete Eucarístico.
- Limpieza de las Casetas de comidas y retiro de las manchas de pintura que resultaron durante el proceso de aplicación del esmalte.
- Continúa el lijado de la pintura en el juego infantil M5 , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.

En el Sector del Módulo del Carbón

- En el área interna de los baños de mujeres, se terminó la instalación de enchape en cerámica para las áreas que se intervinieron.
- Finaliza la ejecución de regatas en muros e inicio de instalaciones hidrosanitarios en los baños de hombres.
- Termina la instalación de las tuberías y accesorios para agua potable en baño de hombres.
- Inicio en la instalación del enchape para baños de hombres.
- Pruebas hidrosanitarias para las redes de tuberías de agua potable en los baños de hombres.

En otros sectores del Parque

- Se hace revisión de la instalación de los bebederos, la Entidad solicita completar las tapas en concreto que faltan en algunas de las cajas donde se alojan los registros para suministro de agua potable.
- Inicio del desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.

PRD – TENIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Se continúan los resanes con mortero de grietas y fisuras a lo largo y ancho del muro.
- Aplicación de recibase, para recubrimiento de piso en las Canchas de Tenis- PRD

PRD - Área Administrativa.

- Se realizan las instalaciones eléctricas en el depósito del Área administrativa.

- Estructuración del cielorraso para instalación del PVC.

PRD - UCAD.

- Finaliza la instalación del enchape de piso en la cocina del Restaurante.
- PRD- Cancha de baloncesto
- Se aplica la rodadura asfáltica 1350 en la cancha; e= cms.
- Instalación de bordillos prefabricados por costado sur, para conformación del sendero.

PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS.)

- Se revisa el cambio de fluxómetros en baños de 1° y 2° piso, en el Velódromo.
- Se detectan nuevos daños en fluxómetros en baños de 1er piso.
- Continúa la instalación de las nuevas luminarias en la cancha de softbol.
- Finaliza la evacuación y traslado de los panales de abejas encontrados en los tres postes de energía.
- Se le solicita al Contratista, continuar con las actividades de desmonte e instalación de luminarias en las Canchas de Beisbol.
- Observaciones de la Interventoría al Administrador del Parque, para que presumiblemente las personas a cargo del Aseo, no retiren los tapones del desagüe del lavamanos

CANAL RIO NEGRO

- Estado final en la Instalación y pintura de la malla eslabonada y pintura por costado sur de la Cancha multifunción.
- Recalce de dados en concreto que estaban fracturados o deteriorados en algunos pedestales de columnetas.

PARQUE DE LOS NIÑOS

- Avance en la instalación de redes de aguas lluvias por costados norte y sur.
- Suministro de grava 3/4"-1", para extendida y compactación en la Zona de las canchas de Vóley-playa.
- Continúa la ejecución de excavaciones para construcción del filtro francés en el área de las canchas.
- Avance en la extendida de la capa de triturado de rio 3/4" -1" (e=15 cm).
- Avance en la construcción del filtro francés (espina de pescado).
- Extendida, compactación y nivelación de la capa de triturado.
- Instalación y cerramiento (cosido y embolsado de la grava ) con el material geotextil 4000.
- En el Parqueadero de los Niños, termina la compactación de la base granular. Toma de densidades en el terreno; resultados satisfactorios.
- Inicio y terminación en la aplicación de la Capa de asfalto de e=8 cm.

- Extendida y compactación del asfalto espesor =cms; PAVI OBRAS- Mezcla MDC 19, Despacho 52213

PARQUE DE LOS NOVIOS

- Amarre de acero para conformar las vigas de cimentación.
- Colocación de formaleta para vigas de cimentación.
- Fundida en concreto de las vigas de cimentación, para el Módulo de baños por costado sur.
- Desencofrado de las vigas que se fundieron en concreto.
- Continúa la excavación para reemplazar tubería averiada que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Relleno y compactación de rellenos al interior de las vigas de cimentación.

PARQUE SERVITA

- Inicio de actividades eléctricas, para realizar el cambio de las luminarias en el Parque- Cancha de futbol F11.

PARQUE ALTA BLANCA

- Se realiza la pulida de la totalidad de la pista de velocidad.
- Instalación de la Valla en la Entrada Principal del parque.

**6.2.2. Semana del 10 de marzo al 16 de marzo**

PARQUE EL TUNAL - CÓD.: 06-063

- Senderos en adoquín Costado Oriental Del Parque Frente A La Puerta De Ingreso # 4.
- Se avanza con la instalación del adoquín nuevo y remates de tramos en sendero zona que limita con el árbol, sendero hacia la biblioteca, sendero quiosco de la cafetería, se avanza con la fundida de cintas de concreto que confinan los tramos, para entrega de tramos a la administración.

Casa del Adulto Mayor

- Se hace entrega a la administración y puesta en servicio.

Zona de Porterías:

- Se hace entrega a la administración y puesta en servicio de las porterías # 2 y 5, se avanza con la corrección de observaciones de la i interventoría para la entrega de la portería # 4.

Pista de BMX:

- Se terminan de evacuar las observaciones para programar entrega y puesta en servicio, se entrega a la administración el día 15 de marzo y puesta en servicio para el martes 19 de marzo de 2024.

Baños UCAD Tunal:

- Se reporta esta semana emergencia en baños UCAD tunal, debido a una fuga de agua potable, se diagnostica y programa arreglo.

PARQUE MIRADOR ILLIMANI

- Se inician trabajos en el módulo de baños, adecuación de cubiertas, instalación de divisiones en acero, que es lo único pendiente en este frente.

PARQUE EDUARDO SANTOS

- Se avanza con remates de muros y cielo rasos en los baños del coliseo, se termina la pulida y brillada de pisos en los baños del coliseo para hacer entrega el martes próximo a la administración.

PARQUE LA FRAGUA

- Se termina la instalación de bordillos en la zona de jugos exterior Y se funde placa de contra piso de esta zona del parque.
- Se termina la instalación de bordillos en concreto perimetral de la pista de patinaje, se hacen arreglos y cambios de tabletas en la pista de baldosín interna, se alista base para imprimación con emulsión asfáltica.

PARQUE LA VICTORIA

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de módulos de baños y mantenimiento interno de los mismos.

PARQUE NUEVO MUZU

- Se avanza con la instalación de parales para nuevo tramo de baranda, se terminan arreglos hidrosanitarios y enchapes en baños del coliseo, llega material de piso caucho.

PARQUE VILLA ALEMANA

- Se avanza con la instalación de parales para nuevo tramo de baranda, se terminan arreglos hidrosanitarios y enchapes en baños del coliseo, llega material de piso caucho.

PARQUE VIRREY SUR

- Se avanza actividades con mantenimiento y pintura de juegos infantiles, pintura de bancas y mesas de ajedrez, e instalación de señales.

PARQUE GILMA JIMÉNEZ

- Se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías.

PARQUE LA PETAR

- Se suministra e instala portón de ingreso doble hoja y valla del parque.

PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

PARQUE PORVENIR - COD. 07-391

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se colocaron los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.
- El IDRD realiza reubicación de sitio para los módulos sanitarios
- El Contratista debe ajustar el presupuesto e incluir el valor de las nuevas actividades
- Se deben adecuar las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.

PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado-
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%
- Se realizó reunión social de finalización.
- Se realizó Acta de puesta en servicio zona ruta de la vida.

PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

PARQUE ESTADIO DE TECHO – COD. 08 554

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD.: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.



804

- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas

PARQUE CANAL BOYACÁ

- Se realiza excavación y perfilada del terreno zona adoquín.
- Llegada de material granular sub base
- Se inicia la colocación de geotextil y colocación de subbase zona del sendero entrada al parque.
- Se inicia compactación de material granular con vibro compactador.

PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Pendiente instalación de vidrio de mm. templado para el módulo de comidas.
- Está pendiente el inicio de la construcción de la zona del parkour.

PARQUE NACIONAL

- Se realiza la instalación y el montaje de los dos (2) juegos.

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

Zona Baños Administrativos
- Pendiente cambio puerta de entrada baños hombres y mujeres.

Zona Bebederos
- Se revisan los bebederos existentes para arreglarlos.

Zona Biosaludables
- Llegada e instalación de tres (3) módulos pendientes por instalar.

Zona Grecorromanos
- Se realiza la colocación de geotextil T- 2100 en zona de los grecorromanos.
- Llega material granular base.
- Se inicia la colocación de base sobre el geotextil en capas de 10 cms.,
- Se inicia la compactación del material granular con el vibro compactador.

Actividades Eléctricas
- En este parque no se van a realizar actividades eléctricas 0,00%

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Se termina el proceso de relleno (material seleccionado de excavación), en capas de 15 cm en el área perimetral de los tanques sépticos. SE realiza la compactación con canguros desde la parte inferior de los tanques, hacia el nivel de piso. Se realiza la toma de densidades en el terreno ya nivelado
- y compactado; se verifican densidades en terreno con buenos resultados y se procede a cubrir con tierra negra el área afectada por la intervención.
- Al interior del tanque séptico, se acondicionan los filtros en grava.
- Retiro de escombros y aseo general en zona externa de los tanques.
- Se le ha solicitado al Contratista, disponer del prado para cubrir de manera urgente el espacio que se interviene y retirar la polisombra y el cerramiento provisional.
- Se revisa el sello de la tubería de aducción al pozo séptico, por posible fuga. Se realiza subsanación y se autoriza realizar el relleno en este sitio.
- Se cubre el área con tierra negra (capa de 10 cm de espesor).
- En los baños y Cocineta del Módulo Maná.
- Se realiza entrega a la Administración la batería de baños de hombres y mujeres del Módulo de Comidas Maná.
- Se realiza Acta de Puesta en servicio Obras Comunidad. (baños y desagüe lavaplatos cocineta del Módulo Maná)

En el Sector del lago

- Continúa la lijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas. No se reciben los kioscos de comidas, por las observaciones que objetó la Interventoría en el acabado de la pintura.
- El Contratista realiza limpieza y aseo de los espacios que está interviniendo; especialmente las manchas dejadas en las láminas de acero cuando se está aplicando la pintura en los kioscos de comidas.
- Finaliza la aplicación de pintura para las barandas externas acceso a la Capilla del Templete Eucarístico.
- Continúa el mantenimiento para el juego infantil M5 , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.

En el Sector del módulo del carbón

- Se realiza entrega a la Administración la batería de baños de hombres del Módulo de Comidas El Carbón.
- Se realiza Acta de Puesta en servicio Obras Comunidad. (baños y desagüe lavaplatos cocineta del Módulo El Carbón)
- Se adecúa la zona exterior del Módulo en tierra negra; se programa empradizar el día 18 de marzo. (tramo del costado sur contra cuartos de bombas)

En otros sectores del Parque

- Se hace entrega a la Administración del Escenario, de 14 bebederos localizados en diferentes sectores. Se revisaron 3 de estos que, durante la entrega, no funcionó el suministro de agua y otro bebedero que tiene roto el tubo de agua que lo alimenta.

- Continúa el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.
- Continúa el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.

PRD – TENIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Alistado de piso para fundir tramo de andén en concreto zona verde hacia Canchas de Tenis.
- Adecuación del terreno; aplicación de tierra negra en zona verde hacia Canchas de Tenis.
- Aplicación de la última capa de recubrimiento sintético en Cancha de Squash
- Recubrimiento sintético Cancha de Squash
- Pintura de muro y demarcación

PRD - Área Administrativa.

- Cielorraso en PVC instalado en el acceso de la Administración PRD
- Cielorraso en PVC instalado en el depósito de la Administración PRD
- Instalación de lámparas de iluminación en baños.
- Instalación eléctrica en Caseta de comidas frente a Cancha de Hockey

PRD - UCAD

- Finaliza la instalación del enchape de piso en la cocina del Restaurante.

PRD - Cancha de Baloncesto

- Alistado para fundir andenes en concreto para la Cancha de baloncesto.

PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS.)

- Se realiza la instalación de fluxómetro en baños de 1° piso del Velódromo.
- En Cancha de beisbol se avanza en el desmonte de luminarias de postes de alumbrado.
- Se realiza la excavación de las cajas para la instalación de las bajantes en tubería EMT 3/4"- puestas a tierra.
- Instalación de las cajas para la instalación de las bajantes en tubería EMT 3/4"- puestas a tierra.

PARQUE CANAL RIO NEGRO

- Acabado de pintura para cerramientos, arcos de canchas de microfútbol y baloncesto
- Revisión y entrega de los deslizaderos en acero inoxidable ubicados en cuatro sectores diferentes del parque .
- Entrega final de los trabajos realizados en el Escenario, al Administrador del Parque, Señor Johan Espinosa
- Elaboración del Acta de la Puesta en Servicio Obras Comunidad con fecha 14 marzo 2024.

PARQUE ALTA BLANCA

- Finaliza la pulida de la totalidad de la pista de velocidad.
- Recolección y transporte de escombros para disposición final.
- Reconstrucción de tramos del cárcamo en concreto.
- Entrega final de los trabajos realizados en el Escenario, al Administrador del Parque, Señor Adonay Palacios.
- Puesta en funcionamiento la Pista de Patinaje, al servicio de la Comunidad.
- Elaboración del Acta de la Puesta en Servicio Obras Comunidad, con fecha 12 de marzo 2024.

PARQUE DE LOS NIÑOS

- Demolición de caja existente que estaba enterrada y que recibía las aguas lluvias del interior del parque, por este costado.
- Excavaciones para construcción del otro pozo de alcantarillado por costado sur.
- Suministro de grava 3/4"-1", para extendida y compactación en la Zona de las canchas de Vóley-playa.
- Continúa la ejecución de excavaciones para construcción del filtro francés en el área de las canchas.
- Avance en la extendida de la capa de triturado de rio 3/4" -1" (e=15 cm).
- Avance en la construcción del filtro francés (espina de pescado).
- Extendida, compactación y nivelación de la capa de triturado.
- Instalación y cerramiento (cosido y embolsado de la grava ) con el material geotextil 4000.
- En obra parte de la tubería metálica para instalación del cerramiento por costado oriental.

PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se ha programado el traslado y ubicación del módulo de baños para el 18 de marzo de 2024
- Se avanza en la excavación para reemplazar tubería averiada que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Construcción de pasamanos metálicos para instalar al interior de la estructura del túnel del Amor.
- Soportes y anclajes de la estructura metálica a los dados en concreto.
- Destapada de cajas de inspección enterradas - verificación de funcionamiento para poder hacer uso de estas.
- Por solicitud de la Coordinación del IDRD, se realiza inspección al Tren de comidas existente en el Parque de los Novios. Se resume en los siguientes aspectos:
  - Deterioro de la estructura externa e interna en los módulos del tren de Comidas.
  - Instalaciones eléctricas y sanitarias en mal estado y sin conexiones, no cumplen Normatividad técnica.
  - Con referencia al aspecto sanitario, este es bastante crítico en los vagones del Tren de Comidas; el olor es bastante desagradable.
  - Láminas de alfajor acomodadas , instalaciones eléctricas y sanitarias inadecuadas, láminas de acero corroídas por oxidación.



806
692

- Pasos de escalera improvisados y en mal estado (no cumplen normatividad); techos de casetas corroídos, desgastados y con evidencia de filtraciones.

PARQUE SERVITA

- Desinstalación y desmonte de luminarias existentes en las cuatro esquinas de la Cancha de futbol 11.

PARQUE SAN JOSÉ DE BAVARIA

- Se inicia el mantenimiento de los Grecorromanos y los Gimnasios biosaludables en este Escenario.

**6.2.3. Semana del 17 de marzo al 23 de marzo de 2024**

UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE

- Finaliza la instalación de fluxómetros en baños del Velódromo.
- No se ha podido realizar la prueba de presión por falta del suministro de agua en la UDS., debido a un daño de tubería por parte de la Empresa de acueducto.

PARQUE SERVITÁ

- Finaliza la desinstalación y desmonte de luminarias existentes en las cuatro esquinas de la Cancha de futbol 11.
- Finaliza la instalación de las nuevas luminarias en los cuatro postes de energía.
- Instalación de los postes en tubería que sirven de soporte para la malla en la Cancha de Tenis.

PARQUE SAN JOSÉ DE BAVARIA

- Continúa en ejecución el mantenimiento de los Grecorromanos y los Gimnasios biosaludables en este Escenario.
- Retiro de pintura, lijado y aplicación de anticorrosivo en Ruta de la Vida y Zona Infantil.

PARQUE RECREO DEPORTIVO EL SALITRE

- PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.
- Fundida en concreto para tramo de andén que fue necesario reconstruir; área que se afectó por tránsito de vehículos, maquinaria y equipos.
- Nivelación del terreno; aplicación de tierra negra en zona verde hacia Canchas de Tenis, por Costado norte.
- Finaliza el recubrimiento sintético en Cancha de Squash
- Termina la aplicación de pintura de muro y la demarcación

- Construcción de cajas de inspección de aguas lluvias
- Remates de cañuela y bordillos contra cajas de inspección.

PRD - Área Administrativa.

- Finaliza la instalación del otro tramo de cielorraso en PVC instalado en el acceso de la Administración del PRD
- Finalizan las instalaciones de las lámparas de iluminación en baños.
- Pendiente protección del tablero de control eléctrico para la Cancha de Hockey
- Pendiente cambio de tomas corrientes GFCI en depósito de servicios del área administrativa.

PRD- Cancha de baloncesto

- Se termina la fundida de andenes en concreto para la Cancha de baloncesto.
- Aseo general, mediante el retiro de elementos sobrantes (escombros y materiales).
- Pendiente reconstrucción de tramo de cuneta exterior a la cancha sobre la vía principal.

PARQUE DE LOS NIÑOS

- Inicio construcción de pozo de alcantarillado aguas lluvias.
- Finaliza el suministro e instalación de grava 3/4"-1"; extendida y compactación en la Zona de las canchas de Vóley-playa.
- Termina la ejecución de excavaciones para construcción del filtro francés en el área de las canchas.
- Finaliza la construcción del filtro francés (espina de pescado).
- Finaliza el cerramiento (cosido y embolsado de la grava ) con el material geotextil 4000.
- Inicia la instalación del cerramiento metálico por costado oriental.
- Excavaciones e instalación de tubería para drenar la cancha existente (conexión al pozo de alcantarillado que se construyó).
- En la zona verde del parqueadero por costado norte, se termina de instalar la tubería de 10", rellenos, colocación de tierra negra y posteriormente empradización del área.
- Colocación de tapas en concreto para las cajas de inspección en Zona del Parqueadero.
- Inicio construcción graderías en prefabricados de concreto sobre terreno.
- Construcción de filtros en grava y geotextil; colocación de capa de 10 cm de grava, instalación de geotextil y relleno en arena tipo Peldar en el arenero del juego de los niños. (arena existente que se había retirado, para su mantenimiento).
- Se termina la construcción de la caja de inspección interna dentro del arenero del Juego de Niños. (mampostería en recocido y pañete.).
- Avance en la construcción del sendero peatonal en adoquín de arcilla.

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Se continúa con la aplicación de tierra negra y la instalación del cespedón en un área aproximada de 400 m2.
- Finaliza la colocación de grava al interior del tanque séptico.
- Se perfilan zonas aledañas en la zona verde, podando el área con guadaña.
- Retiro de las varas rollizas y la polisombra del cerramiento provisional.
- Instalado el cespedón, se realiza el salado de los intersticios o traslapos con tierra negra.
- Colocación de tapa para caja de inspección.

En el Sector del lago

- Continúa la lijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas. No se reciben los kioscos de comidas, por las observaciones que objetó la Interventoría en el acabado de la pintura.
- El Contratista continúa con la limpieza y aseo de los espacios que está interviniendo; especialmente las manchas dejadas en las láminas de acero cuando se está aplicando la pintura en los kioscos de comidas.
- Se realiza Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad para las barandas externas acceso a la Capilla del Templete Eucarístico.
- Continúa el mantenimiento para el juego infantil M5 , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.

En otros sectores del Parque

- Se realiza Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad, de 14 bebederos localizados en diferentes sectores. Se revisarán 3 de estos que, durante la entrega, no funcionó el suministro de agua y otro bebedero que tiene roto el tubo de agua que lo alimenta. Las observaciones, se están subsanando.
- Continúa el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.
- Se realiza Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad para el suministro e instalación de 37 canecas en acero inoxidable, ubicadas en diferentes sectores del Parque. Se programa continuar con las restantes, para el 26 de marzo de 2024. .

En el Sector del Módulo SURTIPOLLO

- Se realiza Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad, para los baños de este Módulo.

En el Sector del Módulo DELIEXPRESS

- Se realiza Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad, para los baños de este Módulo.

PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se realizó el traslado y ubicación del módulo de baños.
- Finaliza la excavación para reemplazar tubería averiada que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Se avanzó en la construcción de pasamanos metálicos al interior de la estructura del túnel del Amor.

- Continuó la construcción de los soportes y anclajes de la estructura metálica a los dados en concreto.
- Se continuó con el cambio de fluxómetros de sanitarios para baños existentes

**6.2.4. Semana del 24 de marzo al 30 de marzo de 2024**

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR

Se hace la observación , que durante el periodo del Evento realizado en el Parque Simón Bolívar "Estéreo Picnic", no fue posible adelantar trabajos, ya que no se permitió el acceso.

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Pendiente tramo de aplicación de tierra negra y la instalación del cespedón en un área aproximada de 200 m2.

En el Sector del lago

- Continúa el mantenimiento para el juego infantil M5 (columpio) , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.
- Se tiene programado continuar con el mantenimiento de los juegos infantiles para el 1° de abril de 2024.

En otros sectores del Parque

- Está en observación y pendiente el arreglo de los bebederos que, durante la entrega, no funcionó el suministro de agua y otro bebedero que tiene roto el tubo de agua que lo alimenta.
- Continúa la ejecución de remates de pintura en los kioscos de comidas y limpieza de las áreas que se puedan manchar durante la intervención.

- Pendiente el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable. Son 23 unidades.

En el Sector del Módulo EL TRENCITO

- Programado el arreglo de los fluxómetros de baños del Módulo El Trencito para iniciar el 1° de abril.

PARQUE SAN JOSÉ DE BAVARIA

- Continúa en ejecución el mantenimiento de los Grecorromanos y los Gimnasios biosaludables en este Escenario.
- Retiro de pintura, lijado y aplicación de anticorrosivo en Ruta de la Vida y Zona Infantil.

PARQUE RECREO DEPORTIVO EL SALITRE

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Retiro del cerramiento provisional en el área perimetral y aferente de la Cancha se Squash.
- Entrega a la Administración del área intervenida en la Cancha de Squash.
- Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad.

PRD - Área Administrativa.

- Se realizó el cambio de tomas corrientes GFCI en depósito de servicios del área administrativa.
- Entrega a la Administración del área intervenida en Cuarto de Servicio trabajadores y porche acceso edificio Administración.
- Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad.

PRD- Cancha de baloncesto

- Finaliza la aplicación del recubrimiento sintético y demarcación de la Cancha.
- Aseo general, mediante el retiro de elementos sobrantes (escombros y materiales).
- Continúa la reconstrucción de tramo de cuneta exterior a la cancha sobre la vía principal.

UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE-UDS.

- Se realiza la prueba de presión y en dos sanitarios, se detecta fuga de agua.
- Se subsana fuga de agua en sanitarios y se realizan nuevamente pruebas de presión, resultando satisfactorias.
- Se programa entrega de arreglos fluxómetros baños del Velódromo, para el 1° de abril de 2024.
- Revisión de cajas de inspección para puesta a tierra en postres de energía en Canchas de Softbol y Beisbol.
- La Instalación de luminarias que están pendientes en Canchas de Softbol, se programan para próxima semana, a partir del 1° de Abril.

PARQUE DE LOS NOVIOS

- Inician las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, para el Módulo de baños que se instaló en el Costado Sur.
- Construcción de caja de inspección para evacuación de sanitarias del módulo de baños.
- Pendiente accesorios para reemplazar en tubería que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Termina la construcción de los soportes y anclajes de la estructura metálica a los dados en concreto en el Túnel del Amor.
- Finaliza la instalación de pasamanos metálicos al interior de la estructura del túnel del Amor.

- Se terminó de realizar cambio de fluxómetros de sanitarios para baños públicos existentes.
- Pendiente rematar enchapes en sitio donde se cambiaron los fluxómetros en baños públicos hombres.

PARQUE DE LOS NIÑOS

- Avance en la construcción de pozo de alcantarillado aguas lluvias.
- Finaliza el suministro e instalación de grava 3/4"-1"; extendida y compactación en el arenero existente en Juego de Niños. e=10 cm.
- Instalación de geotextil sobre capa de grava en el arenero del Juego de Niños.
- Continúa la instalación del cerramiento metálico por costado oriental y sur.
- Finaliza la instalación de tubería para drenar la cancha existente (conexión al pozo de alcantarillado que se construyó).
- Continúa la construcción graderías en prefabricados de concreto sobre terreno.
- Pañetes y remates para cajas de inspección del costado occidental de las Canchas de Vóley playa.
- Continúa la construcción del sendero peatonal en adoquín de arcilla por costado occidental.
- Inicio en la instalación de luminarias tipo LED en postes de alumbrado Canchas Vóley playa.
- Se programa la llegada de la arena tipo PELDAR, para las Canchas de Vóley playa , para el 1° de abril de 2024.
- Aseo y limpieza en los sitios de trabajo; recolección de escombros y disposición final.
- Finaliza la demarcación de los parqueaderos
- Retiro de del cerramiento provisional en el área de los parqueaderos .
- Entrega a la Administración del área intervenida en el Parqueaderos del Parque de los Niños.
- Puesta en servicio Obras Comunidad del Parqueadero del Parque de Los Niños.

PARQUE SERVITÁ

- Pendiente la instalación de luminarias por fachada de la edificación.
- Observaciones de la Interventoría en la instalación de los postes en tubería que sirven de soporte para la malla en la Cancha de Tenis.

PARQUE LA FRAGUA:

- Se avanza con la instalación de cañuelas, y remates de wing en pista de patinaje de baldosín, se asfalta la pista de patinaje, se continua con la instalación de adoquín en los ingresos a la zona de juegos exterior.

PARQUE NUEVO MUZU:

- Se avanza con la instalación de nuevo tramo de baranda, se terminan de atender observaciones de la interventoría en los baños de coliseo para puesta en servicio.

PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se terminan las obras diagnosticadas para este parque, se hacen observaciones por parte de la interventoría para evacuar por parte del contratista y programar entrega a la administración del parque.

PARQUE VIRREY SUR:



809
625

- Se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se programa entrega a la administración.

PARQUE GILMA JIMÉNEZ:

- Se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías. Se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías para llegar a este cuarto.

PARQUE MIRADOR ILLIMANI:

- Se avanza con la adecuación e instalación de cubiertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños.

PARQUE LA VICTORIA

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de módulos de baños y mantenimiento interno de los mismos.

PARQUE LA PETAR

- Se termina la instalación del portón de ingreso doble hoja y valla del parque.

PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

PARQUE PORVENIR

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se colocaron los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.
- El IDRD realiza reubicación de sitio para los módulos sanitarios
- El Contratista debe ajustar el presupuesto e incluir el valor de las nuevas actividades
- Se deben adecuar las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas.

PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Parque totalmente terminado-
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%
- Se realizó reunión social de finalización.

- Se realizo Acta de puesta en servicio zona ruta de la vida.

PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

PARQUE ESTADIO DE TECHO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizaron actividades eléctricas

PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD.: 18-207

- Parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas 0.00%
- Se retiro juego en mal estado y fue llevado a taller.

PARQUE NACIONAL

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizaron actividades eléctricas. 0,00%

PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Pendiente instalación de vidrio de 5 mm. templado para el módulo de comidas.
- Está pendiente el inicio de la construcción de la zona del parkour.
- El contratista manifestó que ya está en puerto los parkour y que se están nacionalizando

PARQUE CANAL BOYACÁ

- Se inicia compactación por capas de material granular sub base con vibro compactador (zona sendero y zona plazoleta).
- Una vez se tenga compactada la capa de la sub base se procederá a realizar la toma de densidades.
- Se inicia excavación para la colación de bordillos (zona infantil).
- Se termina excavaciones para fundir los dados de los juegos zona infantil.
- Se realizó corte en placa zona de juegos infantiles se excava
- Se excavó y se retiró material, se instaló geotextil y se llenó con material granular y se compacto por capas

- Se tomaron las respectivas densidades.

**7. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS**

Al ser un contrato de mantenimiento, se presentan a diario emergencias en cada uno de los escenarios; en consecuencia, durante el periodo se han atendido de manera ágil y oportuna.

A las emergencias que se han atendido, inicialmente se les realiza en el sitio una visita e inspección y se evalúa el daño; dependiendo de la magnitud de la falla y el alcance de los recursos, se resuelven y/o corrigen de manera inmediata.

Previo a la intervención de cada uno de los Escenarios, se realiza una socialización de carácter técnico con el respectivo Administrador, para escuchar y aclarar inquietudes; esto se debe esencialmente a que en su mayoría estos Escenarios están activos y con frecuente afluencia de público. Se coordina el acceso al sitio de intervención, al movimiento de personal, así como el traslado de los materiales y equipos al frente de trabajo.

De acuerdo con el reporte semanal presentado a fecha del 9 de marzo de 2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 84,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 85,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un adelanto del 1.00%, Igualmente se le solicita al Contratista implementar un plan de contingencia para terminar los parques a tiempo ya que falta un mes (1) para terminar el contrato igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que estén a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques, y así evitar atrasos que conlleven a multas y/o sanciones por incumplimiento.

**8. CLIMATOLOGÍA:**

Se ha llevado el control del estado del tiempo durante el presente periodo, el cual está registrado en los formatos de calidad establecidos para tal fin. De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de marzo al 31 de marzo de 2024; en el **(ANEXO 02)** se adjunta formato de control de lluvias.

**9. REUNIONES DE SEGUIMIENTO:**

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de marzo al 31 de marzo de 2024 objeto del presente informe en el **(ANEXO 03)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

**9.1 ACTAS DE COMITÉ**

| Escenario | FECHA |
|---|---|
| Comité de seguimiento No. 21 | 06/03/2024 |
| Comité de seguimiento No. 22 | 13/03/2024 |
| Comité de seguimiento No. 23 | 20/03/2024 |
| Comité de seguimiento No. 24 | 27/03/2024 |

**9.2 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME:**

A continuación, se relacionan los informes semanales realizados por la interventoría en el periodo que se está reportando. **(ANEXO 04)**

| RELACIÓN DE INFORME SEMANALES | |
|---|---|
| **Número** | **Periodo** |
| Informe semanal No. 26 | 03/03/2024 – 09/03/2024 |
| Informe semanal No. 27 | 10/03/2024 – 16/03/2024 |
| Informe semanal No. 28 | 17/03/2024 – 25/03/2024 |
| Informe semanal No. 29 | 24/03/2024 – 30/03/2024 |

**9.3 ACTAS DE PUESTA EN SERVICIO**

| Escenario | FECHA |
|---|---|
| PRD Cancha Squash | 21/03/2024 |
| PRD - UCAD | 21/03/2024 |
| Parque de los niños - Parqueadero | 27/03/2024 |
| Hippies | |
| Simón Bolívar | 02/03/2024 |
| PRD - UCAD | 05/03/2024 |
| Alta blanca | 12/03/2024 |
| Simón Bolívar - Maná | 13/03/2024 |
| Río negro | 14/03/2024 |
| Simón Bolívar | 14/03/2024 |
| Simón Bolívar | 19/03/2024 |
| Simón Bolívar | 19/03/2024 |
| Simón Bolívar | 19/03/2024 |
| Villa de los Alpes | 04/03/2024 |
| Porvenir | 20/01/2024 |
| Velódromo primero de mayo | 02/04/2024 |
| Ciudad Montes | 07/03/2024 |

**10. REGISTRO FOTOGRÁFICO**

En el **(ANEXO 05)** del presente informe se incluye el registro fotográfico efectuado por esta interventoría donde se registran las principales actividades de obra realizadas por el contratista dentro del periodo comprendido entre el 1° de marzo al 31 de marzo de 2024.



077

| REGISTRO FOTOGRÁFICO | |
|---|---|
| 1. Parque El Tunal. Instalación del adoquín nuevo y remates de tramos en sendero zona que limita con el árbol, sendero hacia la biblioteca, sendero quiosco de la cafetería. | 2. Parque El Tunal. Fundida de cintas de concreto que confinan los tramos, para entrega de tramos a la administración. |
| 3. Parque El Tunal. Se hace entrega a la administración y puesta en servicio. | 4. Parque El Tunal. Se hace entrega a la administración y puesta en servicio. |
| 5. Parque El Tunal. Se hace entrega a la administración y puesta en servicio de las porterías # 2 y 5, | 6. Parque El Tunal. Entrega y puesta en servicio, se entrega a la administración el día 15 de marzo y puesta en servicio para el martes 19 de marzo de 2024. |
| 7. Parque El Tunal. Se entrega a la administración el día 15 de marzo y puesta en servicio para el martes 19 de marzo de 2024. | 8. Parque El Tunal. Se reporta esta semana emergencia en baños UCAD Tunal, debido a una fuga de agua potable, se diagnostica y programa arreglo. |
| 9. Parque Eduardo Santos. Se avanza con remates de muros y cielo rasos en los baños del coliseo, se termina la pulida y brillada de pisos en los baños del coliseo. | 10. Parque Eduardo Santos. Se avanza con remates de muros y cielo rasos en los baños del coliseo, se termina la pulida y brillada de pisos en los baños del coliseo. |
| 11. Parque La Fragua. Se termina la instalación de bordillos en la zona de jugos exterior y se funde placa de contra piso de esta zona del parque. | 12. Parque La Fragua. Se termina la instalación de bordillos en la zona de juegos exterior . |
| 13. Parque Villa Alemana. Se instala portón nuevo costado lateral del parque, se instalan y sueldan tapas de las cajas de inspección. | 14. Parque La Victoria. Se avanza con el mantenimiento y pintura de módulos de baños. |
| 15. Parque Gima Jiménez. Se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías. | 16. Parque Nuevo Muzu. Se avanza con la instalación de parales para nuevo tramo de baranda, , llega material de piso caucho. |
| 17. Parque La Petar. Se suministra e instala portón de ingreso doble hoja y valla del parque. | 18. Parque ILLIMANÍ. Se inician trabajos en el módulo de baños, adecuación de cubiertas, instalación de divisiones en acero, que es lo único pendiente en este frente. |
| 19. Parque ILLIMANÍ. Se inician trabajos en el módulo de baños, adecuación de cubiertas, instalación de divisiones en acero, que es lo único pendiente en este frente. | 20. Parque Virrey Sur. Actividades con mantenimiento y pintura de juegos infantiles, pintura de bancas y mesas de ajedrez, e instalación de señales. |
| 21. Parque Virrey Sur. actividades con mantenimiento y pintura de juegos infantiles, pintura de bancas y mesas de ajedrez, e instalación de señales. | 22. Parque Bosques de San Carlos. Preparación formaleta para fundida de viga zarpa zona de grecos y ruta de la vida. |
| 23. Parque Bosques de San Carlos. Suministro e instalación de geotextil T-2100 y base. | 24. Parque Bosques de San Carlos. Compactación con vibro compactador material granular. |

| | |
|---|---|
| 25. Parque Bosques de San Carlos. Suministro e instalación de parales metálicos para cerramiento zona infantil. | 26. Parque Bosques de San Carlos. Revisión instalación módulos biosaludables. |
| 27. Parque Nacional. Arreglo y pintura de juegos Parque Nacional. | 28. Parque Velódromo Primera de Mayo. Canastillas y postes metálicas para luminarias del velódromo. |
| 29. Parque Velódromo Primera de Mayo. Retiro de luminarias del velódromo. | 30. Parque Velódromo Primera de Mayo. Corte de piso en concreto con pulidora. |
| 31. Parque Canal Boyacá. Excavación para dados de concreta zona de juegos infantiles. | 32. Parque Canal de Boyacá. Suministro e instalación de geotextil T-2400 y de subbase granular. |
| 33. Parque Canal Boyacá. Compactación de material granular con vibro compactador | 34. Parque Alta Blanca. Reconstrucción y detallada de tramos de cárcamo en concreto. |
| 35. Parque Alta Blanca. Puesta en funcionamiento la Pista de Patinaje, al servicio de la Comunidad. | 36. Parque Canal Rio Negro. Durante la entrega final de los trabajos realizados en el Escenario, al Administrador del Parque, |
| 37. Parque Canal Rio Negro. Durante la entrega final de los trabajos realizados en el Escenario, al Administrador del Parque, | 38. Parque Canal Rio Negro. Revisión de los deslizaderos en acero inoxidable ubicados en cuatro sectores diferentes del parque. |
| 39. Parque Canal Rio Negro. Revisión de los deslizaderos en acero inoxidable ubicados en cuatro sectores diferentes del parque | 40. Parque Canal rio Negro. Revisión de los deslizaderos en acero inoxidable ubicados en cuatro sectores diferentes del parque . |
| 41. Parque de Los Niños. Extendida y compactación del triturado 3/4", cerramiento de la capa de grava con el manto geotextil 4000. | 42. Parque de Los Niños. El manto geotextil se va cerrando y cosiendo. |
| 43. Parqueadero del Parque de los Niños, una vez terminada la aplicación de la capa de rodadura asfáltica. | 44. Parque Simón Bolívar. Tanques sépticos impermeabilizados interna y externamente. |
| 45. Parque Simón Bolívar. Inicio rellenos al interior y exterior de los tanques sépticos. | 46. Parque San José de Bavaria. En la Ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque, aún no se ha iniciado el mantenimiento. |
| 47. Parque Simón Bolívar. Rellenos con material granular seleccionado. | 48. Parque Simón Bolívar. Remates de enchapes y aseo en baños. |
| 49. Parque Simón Bolívar. Durante la entrega de los bebederos a la Administración. | 50. Parque Simón Bolívar. Arreglo de baños en SURTIPOLLO - cambio de fluxómetro PUSH sanitarios. |
| 51. Simón Bolívar. Suministro e instalación de las canecas en acero inoxidable. | 52. Parque Simón Bolívar. Construcción de pasamanos metálicos para instalar al interior de la estructura del túnel del Amor. |
| 53. Parque Simón Bolívar. Soportes y anclajes de la estructura metálica a los dados en concreto. | 54. Parque de Los Novios. Estado de la estructura de cimentación para instalar Módulo de baños. |
| 55. Parque de Los Novios. Destapada de cajas de inspección enterradas - verificación de funcionamiento para poder hacer uso de estas. | 56. Parque Servitá. Desmonte de luminarias existentes en las cuatro esquinas de la Cancha de futbol. |



912

| | |
|---|---|
| 57. Parque Servitá. Desmonte de luminarias existentes en las cuatro esquinas de la Cancha de futbol. | 58. Parque Recreo deportivo El Salitre. Alistado para fundir andenes en Cancha de baloncesto. |
| 59. Parque Recreo deportivo El Salitre. Cielorraso en PVC instalado en el acceso de la Administración PRD. | 60. Parque Recreo deportivo El Salitre. Instalación de lámparas de iluminación en baños. |
| 61. Parque Recreo deportivo El Salitre. Recubrimiento sintético Cancha de Squash. | 62. Parque san José de Bavaria. Mantenimiento Grecorromanos y Gimnasios biosaludables. |
| 63. Inicio mantenimiento Grecorromanos y Gimnasios biosaludables. | 64. UDS. En Cancha de beisbol se avanza en el desmonte de luminarias de postes de alumbrado. |
| 65. UDS. En Cancha de beisbol se avanza en el desmonte de luminarias de postes de alumbrado. | 66. Parque San José de Bavaria. Lijada y pintura Gimnasios y Ruta de la Vida. |
| 67. PDR. Estado actual Cancha de Squash. | 68. PDR. Reposición del césped por áreas afectadas durante el desarrollo de los trabajos en la Cancha. |
| 69. PDR. Canchas de baloncesto (detallada y remates). | 70. Parque de Los Novios. Reinstalación de cubiertas y barandas (se desmontaron para hacer el traslado del Módulo). |
| 71. Parque de Los Novios. Instalación de pasamanos para estructura metálica del Túnel del Amor. | 72. Parque de Los Novios. Construcción caja de inspección y conexión de instalaciones sanitarias. |
| 73. Parque de Los Niños. Instalación de la malla eslabonada de cerramiento por costados oriental y sur. | 74. Parque de Los Niños. Liberación del geotextil para instalar la arena Peldar. |
| 75. Parque de Los Niños. Proceso constructivo para desmonte de lámparas e instalación de luminarias LED. | 76. Parque de los Niños. Construcción de sendero peatonal y cajas de inspección. |
| 77. Instalación prado costado norte Parqueadero Parque de Los Niños. | 78. Parque de Los Niños. Construcción de graderías en costado occidental de las Canchas de Vóley playa. |
| 79. Parque de Los Niños. Instalación de capa de gravilla+ geotextil y filtros en Arenera de los Juegos de Niños. | 80. Parque San José de Bavaria. Juegos infantiles. Lijada y aplicación de anticorrosivo; faltan los columpios. |
| 81. Parque San José de Bavaria. Lijada y aplicación de anticorrosivo en gimnasios. | 82. Parque San José de Bavaria. Lijada y aplicación de pintura a gimnasios biosaludables. |
| 83. Parque San José de Bavaria. En la Ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque, aún no se ha iniciado el mantenimiento | 84. Parque El Tunal. Se avanza con la corrección de observaciones de la interventoría para la entrega de la portería # 4. |
| 85. Parque El Tunal. se hace entrega y puesta en servicio a la administración y a las escuelas de BMX | 86. Parque El Tunal. se instala tablero de control de iluminación. |

| | |
|---|---|
| 87. Parque Eduardo Santos. Se terminan los remates en los baños del coliseo, para hacer entrega a la administración. | 88. Parque La Fragua. Se avanza con la instalación de cañuelas, y remates de wing en pista de patinaje de baldosín. |
| 89. Parque Villa Alemana. Terminan las obras diagnosticadas para este parque | 90. Parque La Victoria. se avanza con el mantenimiento y pintura de módulos de baños y mantenimiento interno de los mismos, muros en drywall |
| 91. Parque Gilma Jiménez. Se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías para llegar a este cuarto. | 92. Parque Nuevo Muzú. Se avanza con la instalación de nuevo tramo de baranda, se terminan de atender observaciones de la interventoría en los baños de coliseo para puesta en servicio. |
| 93. Parque La Petar. Se termina la instalación del portón de ingreso doble hoja y valla del parque. | 94. Parque Illimani. Se avanza con la adecuación e instalación de cubiertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños. |
| 95. Parque Virrey Sur. Se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se programa entrega a la administración. | 96. Parque Bosques de San Carlos. Compactación material granular base con el vibro compactador zona grecorromana y ruta de la vida |
| 97. Parque Bosques de San Carlos. Construcción rampa de discapacitados zona grecos. | 98. Parque Bosques de San Carlos. Retoques de pintura solicitado por interventoría en los Biosaludables |
| 99. Parque Bosques de San Carlos. Suministro e instalación de baldosas negras caja sanitarias baños de hombres | 100. Parque Nacional. Revisión del estado del juego dañado para recoger |
| 101. Parque Velódromo 1° de Mayo. Adecuación zona con material granular para entrada de camión grúa. | 102. Parque Velódromo 1° de Mayo. Retiro de postes existentes en concreto costado nor oriental. |
| 103. Parque Velódromo 1° de Mayo. Fundida de concreto dado para poste metálico costado sur oriental | 104. Parque Canal Boyacá. Suministro e instalación de bordillos. |

## 11. TRAZABILIDAD DE LAS LABORES EJECUTADAS

En el **ANEXO 6** se presentan los formatos correspondientes a la trazabilidad de las labores ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 1° de marzo al 31 de marzo de 2024.

## 12. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Durante el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de enero de 2023 se realizan revisiones por parte de esta interventoría a los análisis de precios unitarios no previstos presentados por el contratista de obra, se adelantan mesas de trabajo y los APU'S se encuentran en subsanación para remitir el acta de fijación al IDRD.

Producto de las mesas de trabajo y del trámite de revisión por parte del IDRD a la fecha:



913

- El 04 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 2 por parte del IDRD la cual cuenta con 27 precios no previstos legalizados en el contrato.

- El 11 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 3 por parte del IDRD la cual cuenta con 5 precios no previstos legalizados en el contrato.

- EL 25 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 4 por parte del IDRD la cual cuenta con 12 precios no previstos legalizados en el contrato.

- El 30 de enero de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 5 por parte del IDRD la cual cuenta con 9 precios no previstos legalizados en el contrato.

- El 01 de marzo de 2024 se aprueba el acta de fijación de precios no previstos No. 6 por parte del IDRD la cual cuenta con 56 precios no previstos legalizados en el contrato.

- El 08 de marzo de 2024 mediante comunicado IDRD-3131-2024-288 se remite al IDRD el acta de fijación de precios no previstos No. 7 para revisión y aprobación del IDRD, la cual fue objeto de observaciones por la entidad.

  En ese sentido, se remite subsanación a las observaciones solicitadas mediante comunicado IDRD-3131-2024-300 del 13 de marzo de 2024, a la fecha pendiente remisión de observaciones o concepto de probación por parte del IDRD

En el **ANEXO 7** se remite relación de precios unitarios no previstos tramitados a la fecha.

**13. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL**

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido el 1° de marzo al 31 de marzo de 2024 objeto del presente informe.

| CONTRATO DE OBRA 3099 – 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **PERIODO** | **VALOR BRUTO** | **AMORTIZACIÓN ANTICIPO** | **VALOR NETO** | **% EJECUCIÓN** |
| **ADICIÓN** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **PARCIAL 1 OBRA** | 12/09/2023<br>31/10/2023 | $52.355.755,00 | $16.745.804,00 | $35.609.951,00 | 0.38% |
| **PARCIAL 2 OBRA** | 01/11/2023<br>30/11/2023 | $96.726.072,00 | $30.937.493,00 | $65.788.579,00 | 0.70% |
| **PARCIAL 3 OBRA** | 01/12/2023<br>31/12/2023 | $180.169.718,00 | $57.626.649,00 | $122.543.069,00 | 1.31% |
| **PARCIAL 4 OBRA** | 01/01/2024<br>31/01/2024 | $1.398.933.917,00 | $447.444.080,00 | $951.489.837,00 | 10.19% |
| **PARCIAL 5 OBRA** | 01/02/2024<br>29/02/2024 | $4.453.603.463,00 | $1.780.586.704,00 | $2.673.016.759,00 | 32.43% |
| **PARCIAL 6 OBRA** | 01/03/2024<br>31/03/2024 | $3.210.417.471,00 | $2.059.159.830,00 | $1.151.257.641,00 | 23.38% |

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 13.733.153.000,00 |
| **SALDO A FAVOR CONTRATISTA** | $ 4.340.946.604,00 |

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3131- 2023** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **PERIODO** | **VALOR BRUTO** | **IVA** | **VALOR NETO** | **% EJECUCIÓN** |
| **ADICIÓN** | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| **PARCIAL 1 OBRA** | 12/09/2023<br>31/10/2023 | $76.322.867,00 | $12.186.004,00 | $64.136.863,00 | 6.40% |
| **PARCIAL 2 OBRA** | 01/11/2023<br>30/11/2023 | $77.848.847,00 | $12.429.648,00 | $65.419.199,00 | 6.53% |
| **PARCIAL 3 OBRA** | 01/12/2023<br>31/12/2023 | $80.757.748,00 | $12.894.094,00 | $67.863.654,00 | 6.77% |
| **PARCIAL 4 OBRA** | 01/01/2024<br>31/01/2024 | $123.103.705,00 | $19.655.213,00 | $103.448.491,00 | 10.33% |
| **PARCIAL 5 OBRA** | 01/02/2024<br>29/02/2024 | $229.159.347,00 | $36.588.467,00 | $192.570.880,00 | 19.22% |
| **PARCIAL 6 OBRA** | 01/03/2024<br>31/03/2024 | $186.002.712,00 | $29.697.912,00 | $156.304.800,00 | 15.60% |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $ 1.192.172.234,00 | | | | |
| **SALDO A FAVOR CONTRATISTA** | $ 530.468.955,00 | | | | |

## 14. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Conforme a los desembolsos realizados en el mes de enero, se evidencia el reporte de inversión del anticipo en el siguiente cuadro:

| CONCEPTO | VALOR PROGRAMADO | PORCENTAJE | VALOR DESEMBOLSADO | PORCENTAJE | SALDO | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS | $ 4.001.731.037 | 95,90% | $ 4.001.731.037 | 100,00% | $ - | 0,00% |
| ALQUILER EQUIPOS | $ 171.144.445 | 4,10% | $ 171.144.445 | 100,00% | $ - | 0,00% |
| TOTAL | $ 4.172.875.532 | 100% | $ 4.172.875.532 | 100,00% | $ - | 0,00% |

Se remite informe con el reporte consolidado mensual en el **(ANEXO 08)**

## 15. BITÁCORA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de marzo al 31 de marzo de 2024, objeto del presente informe en el **(ANEXO 09)** se adjuntan copias de las bitácoras con el registro de las actividades más relevantes del periodo en cada uno de los Escenarios.

## 16. CORRESPONDENCIA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 1° de marzo al 31 de marzo de 2024, objeto del presente informe en el **(ANEXO 10)** se adjuntan los soportes correspondientes a la correspondencia enviada y recibida.

## 17. PERSONAL DEL CONTRATISTA

Se relaciona el personal del Contratista Consorcio Parques BOG, aprobado y que laboró durante el periodo comprendido del 1° de marzo al 31 marzo de 2024.

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| DIRECTOR DE OBRA | LUIS ALFREDO GRANADOS DONADO |
| RESIDENTE DE OBRA | RODNEY RAMIRO GRANADOS DONADO |
| RESIDENTE DE OBRA | JOSÉ ORLANDO PEÑA BÁEZ |
| RESIDENTE DE OBRA | LUZ STELLA QUINTERO RODRÍGUEZ |
| INSPECTOR DE OBRA | NEFFER ARTURO NOSSA CAMARGO |
| INSPECTOR DE OBRA | MARY JULIETH CONTRERAS CONTRERAS |
| INSPECTOR DE OBRA | CARLOS ANDRÉS ROJAS ROJAS |
| INSPECTOR DE OBRA | BRYAN STEVEN CASTRO MONCADA |
| PROFESIONAL ESTRUCTURAL | YHON EDISON POLO GARZÓN |
| PROFESIONAL SST | INGRID KATHERINE BÁEZ SANABRIA |
| ING. AMBIENTAL | DIANA CAROLINA SANTAMARIA SEGURA |
| ING. CALIDAD | MÓNICA RODRÍGUEZ |
| PROFESIONAL ELÉCTRICO | DIANA ALEJANDRA ARAGÓN |
| ESP. TRANSITO | MARTHA ROCIO CASTILLO FERNÁNDEZ |
| PROFESIONAL HIDRÁULICO | CESAR MAURICIO PRIETO GAMBOA |
| TRABAJADORA SOCIAL | YESICA AGUDELO GONZÁLEZ |
| PROFESIONAL PPTO Y PROGRAMACIÓN | LAURA MARÍA NATALIA ÁVILA CASTILLO |
| GERENCIA DE PROYECTOS | MARYORY PASACHOVA |
| TOPÓGRAFO | HARVEY ENRIQUE TAVERA OCHOA |
| CADENERO | ANDRÉS FELIPE OSPINA BELTRÁN |
| CADENERO | DAVID JOEL MUETE HURTADO |
| SECRETARIA | MARICEL MARTÍNEZ PULIDO |
| CONTADORA | XIMENA PAOLA GARZÓN CASTILLO |
| ABOGADA | NATALIA PARDO DEL TORO |

**18. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA.**

Se relaciona el personal de la Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, aprobado y que laboró durante el periodo comprendido del 1° de marzo al 31 de marzo de 2024.

| CARGO | NOMBRE |
|---|---|
| DIRECTORA DE INTERVENTORÍA | EDNA CONSTANZA CEPEDA SÁNCHEZ |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | LUIS ALBERTO MEDRANO BERMÚDEZ |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | LUIS FERNANDO MONDRAGÓN |
| RESIDENTE DE INTERVENTORÍA | JOHN CUELLAR |
| PROFESIONAL ESTRUCTURAL | GERMAN CAMILO ALFONSO |
| PROFESIONAL HIDRÁULICO | ÁLVARO AUGUSTO VERGARA |
| ING. CALIDAD | VIANNEY LEAÑO |
| PROFESIONAL ELÉCTRICO | YENNY PAOLA REYES |
| ING. AMBIENTAL | SINDY NATALI ESPINOSA |
| ESP. TRANSITO | CARLOS ANDRÉS FIGUEROA |
| PRESUPUESTO | JEISON DELGADO |
| PROFESIONAL SST | YINETH CRUZ ARANZALEZ |
| PROFESIONAL SOCIAL | ROSARIO CÁRDENAS JUNCA |
| INSPECTOR | GUILLERMO GÓMEZ |
| INSPECTOR | JEAN PAUL REYES MORALES |
| INSPECTOR | KAREN ALGECIRAS |
| CADENERO | DIEGO GALE |
| SECRETARIA | LIZETH CASTILLO |
| TOPÓGRAFO | DIEGO VICENTE CORTÉS |
| CADENERO | RUBÉN DARÍO MÁRQUEZ |
| CONTADORA | SOLBEY MAYERLY DUQUE |
| ABOGADA | LINA RODRÍGUEZ |
| CADENERO | YENNIFER BERNAL |

**19. CONCLUSIONES**

- Durante el periodo, se atendieron de manera inmediata las emergencias que han surtido en los diferentes Escenarios y frentes de trabajo.

- La Interventoría SOLIUN INGENIERÍA SAS, ejerce control técnico, administrativo, ambiental contable, calidad, financiero y jurídico, para cada uno de los procesos constructivos que se llevan a cabo en cada uno de los frentes priorizados; todo esto se realiza para garantizar el normal desarrollo del proyecto.

- Se planea, coordina y resuelve en mesas de trabajo entre el Contratista y la Interventoría las diferentes inquietudes que se presentan en los diferentes frentes de obra; se dan alternativas y soluciones acordes, según los lineamientos y especificaciones técnicas, a que haya lugar.

- Para el buen desempeño de las actividades que se desarrollan en los frentes de trabajo, se coordina además, con los administradores de los Escenarios y con Coordinadores y los Supervisores de la Entidad.

- De manera oportuna, se continúan atendiendo las Emergencias que se presentaron durante el periodo en algunos Escenarios. Algunas se han resuelto de manera inmediata y en otras se coordina para el buen desempeño y pronta solución.

- La Interventoría ha velado para que el Contratista entregue a tiempo, los diferentes análisis de precios NO PREVISTOS con los respectivos soportes, para el estudio, análisis y aprobación ante la Entidad.

- Se le verificado que el Contratista, entregue oportunamente las planillas del personal con las afiliaciones a la seguridad social, con el fin de poder validar el ingreso de los trabajadores a los frentes de trabajo. No se han tenido inconvenientes por este aspecto, durante el periodo.

- Se revisaron las memorias de cantidades de obra de acuerdo a los trabajos realizados durante el periodo, en aras de aprobar el Acta Parcial de Obra, según las actividades que se ejecutaron en el presente periodo.

- Durante el periodo, se realizó recorrido e inspección de los Escenarios a intervenir, dando priorización de las actividades a desarrollar en cada uno de ellos; se levantó el Acta correspondiente. Todas las visitas e inspecciones, se realizaron en coordinación del Contratista, la Interventoría y funcionarios encargados de la Entidad IDRD.

- Una vez culminadas las obras que se priorizaron por la Entidad en los diferentes Escenarios, se van efectuando las entregas a los Administradores de los Parques y a su vez, se han levantado de manera conjunta las correspondientes Actas de Puesta en Servicio Obras Comunidad, para cada uno de ellos.

- Durante el periodo, se llevaron a cabo los Comités de obra semanales, con la participación de los profesionales de la Entidad IDRD, Contratista y la Interventoría.

- Se tramitan ante la Entidad, la aprobación de la ADICIÓN Y PRÓRROGA para los Contratos 3099 de 2023 del CONTRATISTA y de la INTERVENTORÍA, el Contrato 3131 de 2023, respectivamente.

- El Acta Parcial de obra No 6, de fecha 31 de marzo 2024, se tramitó ante la entidad por un valor de $3.210.417.471,00.

**ANEXO 1.** PÓLIZAS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | NORTE | 15 | 15-44-101284535 | 0 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09 | 2023 | 28 | 08 | 2023 | 00:00 | 28 | 04 | 2029 | 23:59 | EMISION ORIGINAL |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | SOLIUN INGENIERIA SAS | NIT: 901.114.547-5 | |
| DIRECCIÓN: CR 70 C NRO. 48 - 55 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 7290587 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD | NIT: 860.061.099-1 | |
| DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6605400 |
| ADICIONAL: | | | |

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO NO IDRD-CTO-3131-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIN, REPARACIN, Y RECUPERACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

.

NOTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 28/08/2023 | 28/10/2024 | $238,434,646.80 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 28/04/2024 | 28/04/2029 | $238,434,646.80 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 28/08/2023 | 28/04/2027 | $119,217,323.40 |

### ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***4,200,042.00 | $ ******20,000.00 | $ *****801,808.00 | $ *********5,021,850.00 | $ ******596,086,617.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS | 52848 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT: 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101284535, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



817

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

**PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES NO. _____ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015**

**1. AMPAROS.**

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

**1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.**

**EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:**

**1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.**

**1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.**

**1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.**

**1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

**1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.**

**EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.**

**1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.**

**EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.**

**1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.**

**EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.**

**EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.**

**1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.**

**EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.**

**ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.**

**1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.**

**EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS**



319

**EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.**

**1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO**

**EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.**

**EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.**

**1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.**

**ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.**

**2. EXCLUSIONES.**

**LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:**

**2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.**

**2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.**

**2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.**

**2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.**

**3. SUMA ASEGURADA.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

**4. VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

**5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.**

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

**5.1** RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

**5.2** EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

**5.3** EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

**5.4** EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.



879 706

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

**6. COMPENSACIÓN.**

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

**7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.**

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA; A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

**8. PLAZO PARA EL PAGO.**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

**9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.**

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

**10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.**

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

**11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.**

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

**12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES**

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

**13. COASEGURO**

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _____ A LOS _____ (  ) DÍAS DEL MES DE _____ DEL AÑO _____.



920

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | NORTE | 15 | 15-44-101284535 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09 | 2023 | 12 | 09 | 2023 | 00:00 | 13 | 05 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| SOLIUN INGENIERIA SAS | | NIT: 901.114.547-5 | |
| DIRECCIÓN: CR 70 C NRO. 48 - 55 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 7290587 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD | | NIT: 860.061.099-1 | |
| DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6605400 |
| ADICIONAL: | | | |

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO NO IDRD-CTO-3131-2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIN, REPARACIN, Y RECUPERACIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

NOTA EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 12/09/2023 | 12/11/2024 | $238,434,646.80 | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 13/05/2024 | 13/05/2029 | $238,434,646.80 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 12/09/2023 | 13/05/2027 | $119,217,323.40 | |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN EL ACTA DE INICIO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 3131 DEL 2023 SE MODIFICAN LAS VIGENCIAS DE LA PRESENTE POLIZA.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***4,200,042.00 | $ ******20,000.00 | $ *****801,808.00 | $ *********5,021,850.00 | $ ******596,086,617.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS | 52848 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.***

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | NORTE | 15 | 15-44-101284535 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09 | 2023 | 12 | 09 | 2023 | 00:00 | 13 | 05 | 2029 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| SOLIUN INGENIERIA SAS | | NIT: 901.114.547-5 | |
| DIRECCIÓN: CR 70 C NRO. 48 - 55 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 7290587 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD | | NIT: 860.061.099-1 | |
| DIRECCIÓN: CL 63 NRO. 59 A - 06 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 6605400 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.*

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ADRIANABERNALC 2

827 702

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101284535, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 21 días del mes de SEPTIEMBRE de 2023

15-44-101284535

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145615 | BOGOTÁ D.C. | | 11 | | | 30 | 400049988 | 0 |
| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | | | HOJA |
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | | | | |
| 17 / 8 / 2023 | 18 / 7 / 2023 | 00:00 | 20 / 2 / 2027 | 00:00 | EXPEDICIÓN | | | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 | TELÉFONO | 3192930 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 | TELÉFONO | 3192930 |

**OBJETO DEL SEGURO**

OBJETO DE LA POLIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

TOMADOR AFIANZADO: CONSORCIO PARQUES BOG CONFORMADO POR:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONST. INFRAEST. HIDRAULICA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 18/07/2023 | 20/08/2024 | 4.119.845.900,00 | 12.610.420,71 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 18/07/2023 | 20/02/2027 | 1.373.315.300,00 | 13.832.483,20 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 18/07/2023 | 20/08/2024 | 5.493.261.200,00 | 16.813.894,28 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 24/02/2024 | 20/02/2026 | 2.746.630.600,00 | 15.317.921,23 |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 58.574.719,42 | $ 14.700,00 | $ 11.131.989,69 | $ 69.721.409,11 | Día - Mes - Año 18/08/2023 | 901737545 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 13.733.153.000,00 | TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 40202 | 100,00 | | | |

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LCARDENAS

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400049988 | 0 | BOGOTÁ D.C. | 17 /8 /2023 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL | CL 94 No. 11 - 30 PISO 4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas del 18 /7 /2023 | 00:00 Horas del 20 /2 /2027 | EXPEDICIÓN | TELÉFONO | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |
| ASEGURADO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 |
| DIRECCIÓN | SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 |
| DIRECCIÓN | SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |

JMV INGENIEROS SAS 50% NIT: 800.095.951-9
CJS INGENIEROS SAS 50% NIT: 900.040.825-5

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION

********** FIN PÓLIZA **********

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 69.721.409,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---|---|
| 18/08/2023 | $ 69.721.409,11 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 17 DE 2023

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400049988, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO PARQUES BOG
NIT : 901.737.545 - 4
Asegurado : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT : 860.061.099 - 1

Se expide la presente certificación a los 17 días del mes de Agosto de 2023.

Cordialmente,

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145616 | BOGOTÁ D.C. | | 11 | | 15 | 400049989 | 0 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **VIGENCIA DESDE** | **A LAS Horas** | **VIGENCIA HASTA** | **A LAS** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | | **HOJA** |
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | | Día - Mes - Año | Horas | | | |
| 17 / 8 / 2023 | 18 / 7 / 2023 | 00:00 | 20 / 2 / 2024 | 00:00 | EXPEDICIÓN | | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 | TELÉFONO | 6017333 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 686.657.650,00 | 686.657.650,00 | 686.657.650,00 | 1.224.696,25 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 343.328.825,00 | 686.657.650,00 | 686.657.650,00 | 0,00 |
| ITOS MEDICOS | 125.000.000,00 | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 |
| JUICICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 343.328.825,00 | 686.657.650,00 | 686.657.650,00 | 0,00 |
| PONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 343.328.825,00 | 686.657.650,00 | 686.657.650,00 | 0,00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 343.328.825,00 | 686.657.650,00 | 686.657.650,00 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 343.328.825,00 | 386.657.650,00 | 386.657.650,00 | 0,00 |

**DEDUCIBLES**

| | |
|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.224.696,25 | $ 14.700,00 | $ 235.485,29 | $ 1.474.881,54 | Día - Mes - Año 18/08/2023 | 901737545 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 686.657.650,00 | SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 40202 | 100,00 | | | |

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4 / Bogotá D.C.
(601) 746 3219
Información@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asertación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Cra. 13 # 73-34 Ed. Catania, Of. 202/ Bogotá D.C.
(601) 925 0801
313 799 3500
defensornacionaldeseguros@umcabogados.com

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

LCARDENAS

DIRECCIÓN GENERAL CL 94 No. 11 - 30 PISO 4
TELÉFONO 7463219
www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400049989 | 0 | BOGOTÁ D.C. | Día - Mes - Año 17 8 2023 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 18 7 2023 | 00:00 | 20 2 2024 | 00:00 | EXPEDICIÓN |

| DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

| DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 | TELÉFONO | 6017333 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

SE INCLUYE COBERTURA EXPRESA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
COBERTURA EXPRESA DE GASTOS DE DEFENSA

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9; SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

NOTA: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL 10% DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN NINGUN CASO PUEDA SER SUPERIOR A 2000 SMMLV. (EL DEDUCIBLE MINIMO SERA ASUMIDO POR EL CONTRATISTA).

********** FIN PÓLIZA **********

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|---|---|---|
| 11 | 15 | 400049989 |

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 1.474.882,00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---|---|
| 18/08/2023 | $ 1.474.881,54 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN AGOSTO 17 DE 2.023

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.
DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO: (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148028 | BOGOTA | 11 | | 30 | 400049988 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN | VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO | HOJA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | | |
| 28 / 9 / 2023 | 12 / 9 / 2023 | 00:00 | 11 / 4 / 2027 | 00:00 | MODIFICACIÓN | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-84 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

**DATOS DEL AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-84 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 | TELÉFONO | 3192930 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 | TELÉFONO | 319[illegible] |

**OBJETO DEL SEGURO**

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA DEL CONTRATO N.° 3099 de 2023 , DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

TIPO DE OBLIGACIÓN: CUMP-CONST. INFRAEST. HIDRAULICA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 12/09/2023 | 11/10/2024 | 4.118.845.900.00 | 0.00 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 12/09/2023 | 11/04/2027 | 1.373.315.300.00 | 0.00 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | 12/09/2023 | 11/10/2024 | 5.493.261.200.00 | 0.00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 11/04/2024 | 11/04/2026 | 2.746.630.600.00 | 0.00 |

**ACLARACIONES**

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Día - Mes - Año | |
| $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 29/09/2023 | 901737545 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 13.733.153.000,00 | TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE COMPAÑÍA | % | VALOR ASEGURADO |
| VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 40202 | 100,00 | | | |

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

CANALES DE ATENCIÓN:
Calle 94 # 11-30 Piso 4.
(057 1) 746 3219
Informacion@nacionaldeseguros.com.co
www.nacionaldeseguros.com.co

Pague en línea en:
www.nacionaldeseguros.com.co

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO:
Defensor principal: Liliana Otero
Defensor suplente: Iván Darío Amaya
Calle 82 # 9A-80 Of. 817 Ed. Lourdes Center / Bogotá D.C.
(057 1) 217 4707
defensornacionaldeseguros@umoabogados.com

Nacional de Seguros S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO
LCARDENAS

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400049988 | 1 | BOGOTA | 28 /9 /2023 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | TIPO DE MOVIMIENTO | DIRECCIÓN GENERAL | CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas del 12 /9 /2023 | 00:00 Horas del 11 /4 /2027 | MODIFICACIÓN | TELÉFONO | 7463219 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |
| ASEGURADO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 |
| DIRECCIÓN | SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |
| BENEFICIARIO | INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE | NIT | 860.061.099 - 1 |
| DIRECCIÓN | SIN DIRECCION CONDOR, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 3192930 |

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

TOMADOR AFIANZADO: CONSORCIO PARQUES BOG CONFORMADO POR:
JMV INGENIEROS SAS 50% NIT: 800.095.951-9
CJS INGENIEROS SAS 50% NIT: 900.040.825-5

INCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE DOS (2) AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION

********** FIN PÓLIZA **********

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES DETALLADOS EN EL SIGUIENTE CUADRO.

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 0.00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGÚN CONVENIO |
|---|---|
| 29/09/2023 | $ 0,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA TREINTA DÍAS ( 30 ) CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN SEPTIEMBRE 28 DE 2023

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**NACIONAL DE SEGUROS S.A.**

**CERTIFICA**

Que la garantía de cumplimiento contenida en la póliza No. 400049988, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía.

Tomador : CONSORCIO PARQUES BOG
NIT : 901.737.545 - 4
Asegurado : INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE
NIT : 860.061.099 - 1

Se expide la presente certificación a los 28 días del mes de Septiembre de 2023.

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

VERIFICA TU POLIZA AQUÍ

# PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

nacional de seguros

NIT.: 860.002.527-9
www.nacionaldeseguros.com.co

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C. | DIRECCIÓN GENERAL: CALLE 94 N° 11-30 PISO 4 | TELÉFONO: (601) 7463219

| REFERENCIA | SUCURSAL | | CÓD. SUCURSAL | CÓD.PUNTO DE VENTA | RAMO | No. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148029 | BOGOTA | | 11 | | 15 | 400049989 | 1 |
| **FECHA EXPEDICIÓN** | **VIGENCIA DESDE** | **A LAS Horas** | **VIGENCIA HASTA** | **A LAS** | **TIPO DE MOVIMIENTO** | | **HOJA** |
| Día - Mes - Año | Día - Mes - Año | | Día - Mes - Año | Horas | | | |
| 28 / 9 / 2023 | 12 / 9 / 2023 | 00:00 | 11 / 4 / 2024 | 00:00 | MODIFICACIÓN | | 1 |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-84 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 | TELÉFONO | 6017333 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

| AMPAROS | SUBLIMITE POR EVENTO | SUBLIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA | VALOR PRIMA |
|---|---|---|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 686,657,650.00 | 686,657,650.00 | 686,657,650.00 | 0.00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 343,328,825.00 | 686,657,650.00 | 686,657,650.00 | 0.00 |
| GASTOS MEDICOS | 125,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | 0.00 |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 343,328,825.00 | 686,657,650.00 | 686,657,650.00 | 0.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 343,328,825.00 | 686,657,650.00 | 686,657,650.00 | 0.00 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 343,328,825.00 | 686,657,650.00 | 686,657,650.00 | 0.00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 343,328,825.00 | 386,657,650.00 | 386,657,650.00 | 0.00 |

**DEDUCIBLES**

| | |
|---|---|
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES -PLO | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 POR CIENTO DEL VALOR DE LA PERDIDA MINIMO 5.00 SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES PARA TODA Y CADA PERDIDA |

| VALOR PRIMA | GASTOS | IVA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | No DOCUMENTO PARA PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | Día - Mes - Año 29/09/2023 | 901737545 |

| VALOR ASEGURADO TOTAL | VALOR ASEGURADO EN LETRAS |
|---|---|
| $ 686.657.650,00 | SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS |

| INTERMEDIARIO | | | COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % | NOMBRE | % PARTICIPACIÓN | VALOR ASEGURADO |
| VISION AGENCIA DE SEGUROS LTDA | 40202 | 100,00 | | | |

FIRMA AUTORIZADA
NACIONAL DE SEGUROS S.A.
IVA REGIMEN COMUN- ACTIVIDAD ECONOMICA 6511
TARIFA ICA 11.04/1000

FIRMA TOMADOR

Nacional de Seguros S.A.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
LCARDENAS

nacional de seguros

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 94 N° 11-30 PISO 4
TELÉFONO 7463219

www.nacionaldeseguros.com.co

| No. PÓLIZA | ANEXO | SUCURSAL | FECHA SOLICITUD | CIUDAD DE EXPEDICIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 400049989 | 1 | BOGOTA | Día - Mes - Año 28 9 2023 | BOGOTÁ, D.C. |

| VIGENCIA DESDE | A LAS | VIGENCIA HASTA | A LAS | TIPO DE MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| Día - Mes - Año | Horas | Día - Mes - Año | Horas | |
| 12 9 2023 | 00:00 | 11 4 2024 | 00:00 | MODIFICACIÓN |

**DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 15 NO 90-64 OFC 402, BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO | 6017333 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADO | CONSORCIO PARQUES BOG | NIT | 901.737.545 - 4 | TELÉFONO | 6017333 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | NIT | 000.000.000 - 0 | TELÉFONO | 1000000 |

ANEXO 1:

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA MENCIONADA, DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICIO DERIVADA CONTRATO N.° 3099 DE 2023 DEJA CONSTANCIA DEL INICIO REAL Y EFECTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO A PARTIR DEL DIA 12 DE TIEMBRE DE 2023. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA POLIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y O LESIONES A PERSONAS QUE SE PUEDAN CAUSAR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO No. IDRD-CTO-3099-2023, CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

SE INCLUYE COBERTURA EXPRESA DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
COBERTURA EXPRESA DE GASTOS DE DEFENSA

ASEGURADO: CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9; SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LO DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG NIT: 800.095.951-9 EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS. ADICIONALMENTE, SE TENDRA A INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES NIT:860.061.099-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

TA: EN ESTA POLIZA SOLAMENTE SE PODRAN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MAXIMO DEL 10% DEL VALOR DE CADA PERDIDA SIN QUE EN IGUN CASO PUEDA SER SUPERIOR A 2000 SMMLV. (EL DEDUCIBLE MINIMO SERA ASUMIDO POR EL CONTRATISTA).

********** FIN PÓLIZA **********



828

| SUC. | RAMO | POLIZA No. |
|---|---|---|
| 11 | 15 | 400049989 |

# CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS

## ANEXO NÚMERO 1 QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PÓLIZA

EN VIRTUD DE LA FORMA DE PAGO DE PRIMAS CONVENIDA EN LA SOLICITUD DEL SEGURO, EN LA CARÁTULA Y CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA ARRIBA DETALLADA, SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO QUE LAS OBLIGACIONES DEL PAGO DE PRIMA POR PARTE DEL ASEGURADO SERÁN REALIZADAS EN LAS FECHAS Y POR LOS CORRESPONDIENTES VALORES

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA INICIAL : | $ | 0.00 |
| VALOR TOTAL DE LA PRIMA PAGADA : | $ | 0 |
| FORMA DE PAGO CONVENIDA : | | CONTADO 30 DÍAS |

PLAN DE PAGOS

| FECHA DE PAGO | VALOR DE LA PRIMA SEGUN CONVENIO |
|---|---|
| 29/09/2023 | $ 0,00 |

SEGÚN EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EL PAGO DE LA PRIMERA PRIMA O FRACCIÓN CONVENIDA PARA SU PAGO ES CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA LA INICIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL SEGURO. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O FRACCIÓN CONVENIDA POSTERIORES A LA PRIMERA Y UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE GRACIA ( 30 ) TREINTA DÍAS CALENDARIO TAL COMO SE DEFINE EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO.

SE FIRMA EN BOGOTÁ, D.C. EN SEPTIEMBRE 28 DE 2,023

NACIONAL DE SEGUROS S.A.

**ANEXO 2.** CONTROL CLIMATOLÓGICO

| | REGISTRO DE CLIMA | CÓDIGO: | OBR-FR-07 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 2 |
| | | VIGENCIA: | 2023-07-11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO INTERVENTORIA No: | 3131 de 2023 | CONTRATO DE OBRA No: | 3090 de 2023 |
| INTERVENTOR: | SOLIUN INGENIERÍA SAS | CONTRATISTA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| OBJETO: | "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". | OBJETO: | "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD" |

| | |
|---|---|
| PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE : | 1° de marzo al 31 de marzo de 2024 |

| FRENTE DE OBRA | | | | ESCENARIOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ |
|---|---|---|---|---|
| FECHA | | | | LLUVIAS |
| viernes | 1 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy predominaron las condiciones secas en Bogotá. En lo transcurrido de la mañana continuó el tiempo seco, sin embargo, se presentaron lluvias ligeras en sectores de la localidad de Usme. Para la transcurrido de la tarde predominaron las condiciones secas. |
| sabado | 2 | marzo | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy predominaron las condiciones secas en Bogotá. Para la transcurrido de la tarde predominaron las condiciones secas, sin embargo, se presentaron lluvias ligeras en sectores de las localidades de Usaquén y Barrios Unidos. |
| domingo | 3 | marzo | 2024 | En horas de la tarde se registraron lluvias en sectores de las localidades de Usaquén, Santa Fe, Chapinero, Ciudad Bolívar y Usme. |
| lunes | 4 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy se presentaron lluvias en sectores de las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. En la mañana, especialmente durante las primeras horas, se observaron precipitaciones en sectores de las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Suba, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. Para la transcurrido de la tarde se registraron lluvias en sectores de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar. |
| martes | 5 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy se presentaron lluvias aisladas en sectores de las localidades de San Cristóbal, Usme y Chapinero. En la mañana, se observaron precipitaciones en sectores de las localidades de Puente Aranda y Rafael Uribe Uribe. Para lo transcurrido en horas de la tarde ha predominado el tiempo seco en la ciudad, con excepción de lluvias ligeras en sectores aislados de la localidad de Fontibón. |
| miercoles | 6 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy se presentaron lluvias aisladas en un sector de la localidad de Usme, para el resto de la ciudad predominó tiempo seco. En la mañana se registró tiempo seco en la capital.<br>Para la transcurrido de la tarde se han presentado lluvias en el centro y norte de la capital, con los mayores acumulados en las localidades de Usaquén y Suba. |
| jueves | 7 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy se presentaron lluvias ligeras y aisladas en sectores de las localidades de Suba y Usme, para el resto de la ciudad predominó tiempo seco. Durante la mañana registró tiempo seco en Bogotá, con excepción de lluvias ligeras y aisladas en la localidad de Usme. Para la transcurrido de la tarde ha predominado el tiempo seco en la capital. |
| viernes | 8 | marzo | 2024 | En la madrugada de hoy se presentaron lluvias aisladas en sectores de las localidades de Sumapaz y San Cristóbal, para el resto de la ciudad predominó tiempo seco. En la mañana se registraron lluvias ligeras al noroccidente y suroriente de la capital, en las localidades de Suba, Usme y San Cristóbal, para el resto de la ciudad predominó el tiempo seco. Durante la tarde se han presentado lluvias ligeras en sectores de las localidades de Ciudad bolívar, San Cristóbal y Usme, para el resto da la capital se ha registrado tiempo seco. |
| sabado | 9 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy se presentaron lluvias aisladas en la localidad de San Cristóbal, por el sector del cerro de la Viga, para el resto de la ciudad predominó tiempo seco. En el transcurso de la mañana y tarde, se presentaron lluvias ligeras en la zona oriente y norte de la ciudad, en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Chapinero y Usaquén. |
| domingo | 10 | marzo | 2024 | Durante el transcurso del día, ha predominado el tiempo seco en la ciudad. |
| lunes | 11 | marzo | 2024 | Durante el transcurso del día, ha predominado el tiempo seco en la ciudad. Durante la madrugada de hoy se presentaron lluvias con bajos acumulados a lo largo del distrito capital. Las localidades con mayores acumulados hasta el momento son Usme y Ciudad Bolívar. En el transcurso de la mañana, ha predominado el tiempo seco en Bogotá. En la tarde, se presentaron lluvias ligeras que llegaron a acumulados Moderados en la localidad de Usme. |
| martes | 12 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy predominó el tiempo seco en Bogotá. En el transcurso de la mañana se presentaron lluvias aisladas en la localidad de San Cristóbal. En la tarde, se presentaron lluvias aisladas en la localidad de Santa Fe, y para el resto del territorio, predominó el tiempo seco. |
| miercoles | 13 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy predominó el tiempo seco sobre el Distrito Capital, con algunas lluvias aisladas en los sectores del oriente y sur del territorio, como la localidad de Usme, Sumapaz, San Cristóbal y Usaquén. En el transcurso de la mañana y tarde, ha predominado el tiempo seco en la ciudad. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| jueves | 14 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy, se han presentado lluvias de bajos acumulados a lo largo de la ciudad. Los mayores acumulados hasta el momento se presentan en las localidades de San Cristóbal, Chapinero y Santa Fe. Durante la mañana se han presentado lluvias ligeras a lo largo de los cerros orientales del distrito capital |
| viernes | 15 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy, predominó el tiempo seco en la ciudad. En la mañana se han registrado lluvias aisladas en la zona rural de la localidad de Usme. En el transcurso de la tarde ha predominado el tiempo seco sobre la capital, sin embargo, se observa nubosidad con potencial de lluvia en el sur oriente de la capital. |
| sábado | 16 | marzo | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy, predominó el tiempo seco en la ciudad. En el transcurso de la tarde continuado predominio de tiempo seco sobre la capital. |
| domingo | 17 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy predominaron las condiciones secas en Bogotá. En lo transcurrido de la mañana continuó el tiempo seco, sin embargo, se presentaron lluvias ligeras en sectores de la localidad de Ciudad Bolívar. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| lunes | 18 | marzo | 2024 | Durante la madrugada predominó el tiempo seco en la ciudad. En la mañana se registraron lloviznas en las localidades de Sumapaz y San Cristóbal. En el transcurso de la tarde se han presentado lluvias ligeras al sur de la capital, en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. |
| martes | 19 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy, se presentaron lluvias ligeras en las localidades de Sumapaz y San Cristóbal. En el resto de la ciudad predominó el tiempo seco. En la mañana, continuó predominio de tiempo seco. En el transcurso de la tarde se han presentado lluvias ligeras en la localidad de Sumapaz. |
| miercoles | 20 | marzo | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy predominó tiempo seco en la capital. En el transcurso de la tarde se han presentado lluvias de ligeras a moderadas en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal y Usaquén; lluvias de ligeras a fuertes en la localidad de Chapinero. |
| jueves | 21 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy predominó tiempo seco en la capital, salvo en la localidad de Suba donde se registraron lluvias con acumulados moderados. En la mañana predominó tiempo seco. En el transcurso de la tarde se han presentado lluvias en amplios sectores de la ciudad, las de mayor intensidad en las localidades de San Cristóbal, Suba, Usme y Rafael Uribe Uribe. |
| viernes | 22 | marzo | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy predominó tiempo seco en la capital, salvo algunas lloviznas en las localidades de Fontibón, San Cristóbal, Suba, Chapinero y Usaquén. En la tarde, ha continuado predominio de tiempo seco en la ciudad. |
| sabado | 23 | marzo | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy predominó tiempo seco en la capital. En el transcurso de la tarde se han presentado lluvias de ligeras a moderadas en las localidades de Suba y Usaquén. |
| domingo | 24 | marzo | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy predominó tiempo seco en la ciudad. En la tarde, se han registrado lluvias en múltiples sectores del oriente de la ciudad sobre las localidades de San Cristóbal, Santa Fe y Usaquén. |
| lunes | 25 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy predominó tiempo seco en la ciudad, con presencia de lluvias ligeras y aisladas en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme. En el transcurso de la mañana, predominó el tiempo seco en la ciudad. En la tarde, se han registrado lluvias de variada intensidad en múltiples sectores del Centro Oriente de la ciudad sobre las localidades de Chapinero, San Cristóbal y Santa Fe. |
| martes | 26 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy predominó tiempo seco en la ciudad, con presencia de lluvias ligeras y aisladas en las localidades de Bosa, Chapinero, San Cristóbal, Santa Fe, Usaquén y Usme. En la mañana ha continuado predominio de tiempo seco, salvo algunas lloviznas en la localidad de Usme. En la tarde, se han registrado lluvias ligeras en sectores del Centro Oriente y Norte de la ciudad, en las localidades de Santa Fe, Suba y Usaquén. |
| miercoles | 27 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy predominó tiempo seco en la ciudad, con presencia de lluvias ligeras en la localidad de San Cristóbal. En la mañana predominó de tiempo seco, salvo algunas lloviznas en la localidad de Santa Fe. En la tarde, ha predominado el tiempo seco en la ciudad con presencia de lluvias ligeras y aisladas en la localidad de Tunjuelito. |
| jueves | 28 | marzo | 2024 | Durante la madrugada y mañana de hoy predominó tiempo seco en la ciudad. En la tarde, se han registrado lluvias de variada intensidad en sectores del Centro Oriente y Sur de la ciudad, las principales lluvias se presentaron en las localidades de Barrios Unidos, Chapinero y Usaquén. |
| viernes | 29 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy predominó tiempo seco en la ciudad, con presencia de lluvias ligeras y aisladas en las localidades de Barrios Unidos, San Cristóbal y Usme. En el transcurso de la mañana, continuó el predominio del tiempo seco en la ciudad con presencia de lluvias ligeras y aisladas en la localidad de Ciudad Bolívar. En la tarde, se han registrado lluvias ligeras en sectores del occidente y norte de la ciudad, en las localidades de Bosa, Engativá, Fontibón, Kennedy y Suba. |
| sabado | 30 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy predominó el tiempo seco en la ciudad, con presencia de lluvias ligeras y aisladas en la localidad de Sumapaz. En el transcurso de la mañana, continuó el predominio del tiempo seco en gran parte de la ciudad, con excepción de lluvias ligeras en algunos sectores de las localidades de Usaquén y Suba. En el transcurso de la tarde, ha predominado el tiempo seco en gran parte de Bogotá D.C., con excepción de lluvias ligeras y puntuales en la localidad de San Cristóbal. |
| domingo | 31 | marzo | 2024 | Durante la madrugada de hoy predominó tiempo seco en la ciudad, con presencia de lluvias aisladas en la localidad de Usme. En la mañana predominó de tiempo seco y en la tarde, ha predominado el tiempo seco en la ciudad . |

Firma:

JOSÉ ORLANDO PEÑA
RESIDENTE DE OBRA

Firma:

ING. LUIS A. MEDRANO B.
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

930

**ANEXO 3.** COPIA ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRA

BOGOTÁ

| Si no manejo consecutivo coloque N.A. | COMITÉ/REUNIÓN: | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. 24 | COMITÉ DE SEGUIMIENTO # 24 CTO. OBRA: 3099123 / CDP INF 3131123 | 27 | 03 | 2024 |

LUGAR: VIRTUAL HORA DE INICIO: 3:30 pm. HORA FIN: 6:00 pm.

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. APROBACION ACTA ANTERIOR | 4. COMPONENTE AMBIENTAL |
| 2. COMPONENTE SST. | 5. COMPONENTE SOCIAL |
| 3. COMPONENTE CALIDAD | 6. COMPONENTE TECNICO |

**TEMAS TRATADOS**

1- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

SE APRUEBA EL ACTA POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES SIN OBSERVACIONES.

2- COMPONENTE SST

-DE ACUERDO A LOS RECORRIDOS DE VERIFICACION SE ENCONTRARON 93 TRABAJADORES EN TOTAL EN TODOS LOS FRENTES INTRAMUROS

- EN LOS RECORRIDOS DE ESTA SEMANA, SE HA RESALTADO EL ORDEN Y ASEO, RESALTANDO EL RETIRO DE ESCOMBROS Y LA SOLICITUD DE QUE EL PERSONAL DEL CONTRATISTA TRAIGA LA DOTACION COMPLETA Y EN BUEN ESTADO Y SEÑALIZAR BIEN LOS ESPACIOS DE TRABAJO

- SE EVIDENCIO EN EL PARQUE DE LOS NIÑOS TRABAJADORES SIN PERMISO DE ALTURAS Y SE PROCEDIO A DETENER LA ACTIVIDAD

- SE ENCONTRO EN EL PARQUE DE LOS NIÑOS UN TRABAJADOR SIN PLANILLA NI PERMISO EN ALTURAS (SR: MICHAEL DELGADO) Y SE PROCEDE A SU RETIRO DEL SITIO DE TRABAJO, HASTA SER LEGALIZADO

- SE RECIBIO INFORME MENSUAL SST # 7 PARA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

- LA INGENIERA ANGELICA ROCHERO SOLICITA AL CONTRATISTA QUE INSTALE



831

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| CUANTO ANTES LA SEÑALIZACION DEL PARQUE DE LOS NIÑOS A LO CUAL EL CONTRATISTA INFORMA "QUE SE EJECUTARA LA ACTIVIDAD LA PROXIMA SEMANA A PARTIR DEL LUNES 1-04-24 |
| 3- COMPONENTE CALIDAD: |
| LA INGENIERA VIANNEY NOS INFORMA QUE HAY COMPROMISOS PENDIENTES DE COMITES ANTERIORES COMO SON: |
| A LA ENTREGA DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE LA MEZCLA ASFALTICA M-19 DEL PARQUE DE LOS NIÑOS PARA PODER REVISARLA - Y PROCEDER A LA LIBERACION O NO DE LA ZONA DEL PARQUE DANDO DEL FRENTE EN MENCIÓN |
| B- SE SOLICITO NUEVAMENTE EL ENTREGA DEL INFORME DEL ESTADO DE COMPRAS, QUE NO SE HA RECIBIDO FORMALMENTE, SIENDO UN COMPROMISO DEL COMITE PASADO |
| → HABLA LA INGENIERA ANGELICA ROMERO DEL IDRD Y COMENTA QUE HOY SE ABRIO LA ZONA DE PARQUEADEROS DEL FRENTE DE LOS NIÑOS Y QUE AUN HABIA CERRAMIENTOS PROVISIONALES EN SITIO Y ALGO DE DESORDEN TAMBIEN. |
| → HABLA LA INGENIERA ANGELICA ROMERO; RESPECTO AL TEMA DEL INFORME DEL ESTADO DE COMPRAS Y EXPRESO SU - MOLESTIA CON EL CONTRATISTA POR NO HABER ENVIADO DICHO INFORME A TIEMPO, EXPRESANDO QUE TIENE CIERTAS DUDAS EN LA INFORMACION ANTERIOR DADA POR EL CONTRATISTA Y QUE ES SUMAMENTE IMPORTANTE TENER ACTUALIZADA Y REVISADA DICHA INFORMACION HOY, YA QUE EL CONTRATO SE TERMINA EL 10 DE ABRIL DEL 2024 |
| → EL INGENIERO ANDRES PULIDO DE PARTE DEL CONTRATISTA; ACLARA QUE TODA LA INFORMACION ADJUNTADA A LA FECHA ES - VERIDICA Y QUE HA HOY TODAS LAS COMPRAS GRANDES E IMPORTACIONES ESTAN PAGAS Y EN PROCESO DE NACIONALIZACIÓN |
| C- LA INGENIERA VIANNEY INFORMA QUE A LA FECHA; HAY UNA NO CONFORMIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL NO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS Y ESTABLECIDOS EN LOS COMITES SEMANALES |
| D- A LA FECHA NO SE HA DEFINIDO AUN LA FECHA DE LA 2da AUDITORIA DEL 70% QUE ESTA PENDIENTE |
| E- LA INGENIERA VIANNEY INFORMA QUE SE RECIBIERON Y SE ESTAN |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| REVISANDO MANUALES DE ENTREGA DE PARQUES YA TERMINADOS |
| F- EL CONTRATISTA INFORMA QUE HOY SE ENVIO AL CORREO DE LA INTERVENTORIA EL INFORME # 7 DE CALIDAD |
| G- LA INTERVENTORIA CITA A REUNION EL DIA 7 DE ABRIL/24 AL CONTRATISTA PARA TRATAR TEMAS CONCERNIENTES CON EL COMPONENTE DE CALIDAD. ESTA PENDIENTE DEFINIR LA HORA Y EL LUGAR. |
| |
| 4- COMPONENTE AMBIENTAL: |
| - SE REALIZA ENTREGA DEL INFORME # 7 PARA REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA |
| - SE HACE ANOTACION CON RELACION AL LISTADO DE LUMINARIAS DEL PARQUE EDUARDO SANTOS. |
| - SE SOLICITA AL CONTRATISTA QUE INFORME QUE PASO CON EL TEMA DE LAS ABEJAS, EL CUAL ARGUMENTO E INFORMO A ESTE COMITE QUE YA SE TIENE UN INFORME Y CUANTIFICACION DE LA ENTREGA DE LAS ABEJAS AL PERSONAL RESPONSABLE DEL DESTINO FINAL DE LAS MISMAS Y QUE ESTO PENDIENTE LA INSTALACION DE LAS LUMINARIAS FALTANTES EN EL POSTE EN DONDE ESTABAN LAS ABEJAS - USANDO EL TRAJE ESPECIAL PARA EVITAR ACCIDENTES CON LAS ABEJAS. |
| 5- COMPONENTE SOCIAL: |
| - LA RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA INFORMA QUE EL DIA DE AYER MARTES 26 DE MARZO DE 2024, SE HIZO ENTREGA DEL INFORME # 7 A LA INTERVENTORIA. |
| - SE COMENTA A ESTE COMITE QUE SE DIO APROBACIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA AL FOLLETO DE ENTREGA DEL PARQUE: VIRGILIO SUR Y QUE EL MARTES 2 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 4 PM, SE HARA LA ENTREGA SOCIAL Y TECNICA DE ESTAS OBRAS EN ESTE PARQUE. |
| - LA RESIDENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA COMENTA QUE ESTAN EN PROCESO LOS (4000) FOLLETOS DE ENTREGA DE LOS PARQUES: NACIONAL- EDO. SANTOS - VILLA ALEMANA - HIPPIES Y SE RADICARAN A LA INTERVENTORIA PROXIMAMENTE TAMBIEN: PRD (LAUCHA) - HOKEY - RESTAURANTE |
| - SE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER LAS PUESTAS EN SEGURIDAD DE TODAS LAS ACTIVIDADES YA REALIZADAS EN LOS DISTINTOS PARQUES. |

TEMAS TRATADOS

— LA ARQUITECTA EDNA CEPEDA DE LA INTERVENTORIA SOLICITO AL CONTRATISTA HACER LA ENTREGA DE UN CUADRO DONDE SE REFLEJEN LAS PUESTAS EN SERVICIO DE LAS DISTINTAS OBRAS Y ACTIVIDADES EN LOS PARQUES YA TERMINADOS O POR TERMINAR Y ASI MISMO ENTREGAR LOS ORIGINALES DE ESTAS ACTAS DE PUESTA EN SERVICIO CON FISICO A LA INTERVENTORIA PARA SU SEGUIMIENTO Y CONTROL

6- COMPONENTE TECNICO.

— INICIA RELATO EL INGENIERO LUIS MEDRANO CON EL PARQUE:

*- HDS: SE REALIZO ENTREGA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS BATERIAS DE BAÑOS, QUEDANDO PENDIENTE UNA BOTERA QUE YA SE EVACUO Y SE HARA ENTREGA DE DICHA OBSERVACION EVACUADA.

- LA INGENIERA PAOLA REYES DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTO QUE LA PARTE ELECTRICA DE ESTE PARQUE ESTA PENDIENTE UNOS ALAMBRADOS EN BEISBOL, QUE LLEGUEN LUMINARIAS Y CABLEADO DE LAS MISMAS EN SOTBOLL Y LA INGENIERA PREGUNTA AL CONTRATISTA CUANDO SE TERMINAN ESTAS OBRAS?

FESTA PENDIENTE TAMBIEN ENTREGA FORMAL DEL TABLERO ELECTRICO DE LA PISTA DE HOKEY Y ENTREGA DE LA CANCHA DE BALONCESTO.

*- PARQUE DE LOS NIÑOS:

- EL INGENIERO MEDRANO COMENTA QUE SE AVANZA CON LA INSTALACION DE CERRAMIENTOS — REMATES DE CAJA I DE INSPECCION

-SE COMENZO CON LA INSTALACION DE FILTROS Y GRAVAS EN LA CANCHA DE ARENA

- SE REALIZO EL PASE PENDIENTE Y SE ESTA RELLENANDO CON GRAVA LA ZONA DE JUEGO EXISTENTE PARA POSTERIORMENTE LLENAR NUEVAMENTE CON LA ARENA EXISTENTE.

- EL CONTRATISTA ARGUMENTA QUE ENTRE LUNES 1- Y MARTES 2 DE ABRIL SE TERMINAN ESTAS ACTIVIDADES.

— LA INGENIERA PAOLA REYES DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTA QUE EN ESTE FRENTE (PARQUE) FALTA LA INSTALACION DE PUESTA A TIERRA I QUE FALTA INSTALAR LUMINARIAS EN LOS

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| POSTES DE ALREDEDOR, QUE SOLO SE HA PODIDO INSTALAR EN UN POSTE LUMINARIAS DEBIDO A QUE EL MANLIF DEL CONTRATISTA SE DAÑO Y QUE ESTA ACTIVIDAD SE RETOMARA A PARTIR DEL LUNES 1ro DE ABRIL DEL 2024. PARA VER SI EL MIERCOLES 3 DE ABRIL SE TERMINAN LAS ACTIVIDADES ELECTRICAS EN ESTA ZONA DE NIÑOS |
| |
| * PARQUE SIMON BOLIVAR: |
| - EL INGENIERO LUIS MEDRANO DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTA QUE EN ESTE FRENTE SE REALIZO LA ENTREGA Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS BATERIAS DE BAÑOS DE LOS MODULOS: MANA – CARBON – SUPER POLLO – EXPRESS. |
| - SE REALIZO LA CONEXION A LOS TANQUES SEPTICOS DE MANA |
| - SE REALIZO LA PARTICION DEL CONTORNO DE LOS TANQUES SEPTICOS EN EL SECTOR MANA |
| - SE INSTALARON ESTA SEMANA 37 CAMELAS Y ESTAN PENDIENTES POR INSTALAR 23 MAS. |
| - SE INSTALO Y PUSO EN ENTREGA LAS BARANDAS DEL TRAMPLETE |
| - MODULO DE JUEGOS ESTA PENDIENTE LA ENTREGA FINAL |
| |
| * PARQUE LOS NOVIOS |
| - EL INGENIERO LUIS MEDRANO DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTA QUE SE REALIZO TRASLADO DE LOS MODULOS DE BAÑOS Y SE ESTAN ADECUANDO EN EL SITIO DONDE VAN YA A QUEDAR CON CONEXIONES HIDROSANITARIAS – CUBIERTAS – RAMPAS E INSTALACIONES ELECTRICAS |
| - SE TERMINARON LAS ACTIVIDADES DEL TUNEL Y ESTA PENDIENTE EL ACTA DE PUESTA EN SERVICIO |
| - LA INGENIERA PAOLA REYES DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTA QUE EN EL MODULO DE BAÑOS YA HAY CAJAS DE PAID – TUBERIAS Y DUCTOS POR TIERRA. |
| - LA INGENIERA ANGELICA ROMERO DEL IDRD, SOLICITA AL CONTRATISTA HACER ENTREGA DE PLANOS DE LA PROPUESTA DE EMPRADIZE DEL MODULO DE BAÑOS CON RELACION A LOS SUMIDEROS EXISTENTES, PARA VISUALIZAR EL EMPRADIZE DE LOS MISMOS. |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| * PARQUE SERVITA |
| ... EL ING MEDRANO DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTA; QUE YA SE INSTALARON LAS LAMPARAS - LUMINARIAS EN LA CANCHA DE FUTBALL, QUE ESTA PENDIENTE LA MEDICION FOTOMETRICA Y EL CONTROL DE ILUMINACION, RESPECTO A LA OBRA CIVIL FALTA INSTALAR Y ELECTRIFICAR ESTA PENDIENTE LAS LAMPARAS DE LA FACHADA Y LAS LAMPARAS DEL COLISEO Y LAS LAMPARAS DE LA ADMINISTRACION - TAMBIEN INFORMA QUE SE INSTALARON POSTES Y TAPAS DE CAJAS DE PASO |
| |
| * PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: |
| - EL INGENIERO MEDRANO DE LA INTERVENTORIA Y EL ARQ. NEFER DEL CONTRATISTA NOS INFORMAN QUE SE VIENE TRABAJANDO EN LOS 4 FRENTES ABIERTOS SIMULTANEAMENTE (COTO DE LO. VIDA - BARANDABERS - GORLOS Y JUEGOS INFANTILES) LIJANDO - Y APLICANDO ANTICORROSIVO PARA LUEGO LUMINAR Y PINTAR VIA DEMARCA |
| - EL CONTRATISTA NOS INDICA QUE PARA EL DIA MARTES 2 DE ABRIL ESTARA TERMINANDO ACTIVIDADES EN ESTE PARQUE |
| - EL CONTRATISTA TAMBIEN COMENTO EN ESTE COMITE QUE EN LA 3ra VISITA CON EL APOYO A LA SUPERVISION DEL IDRD Y LA ADMINISTRACION DEL PARQUE SE DECIDIRAN Y APROBARAN MAS PARA MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LOS MISMOS, AUMENTANDO LOS TIEMPOS DE GARANTIA DE ESTE PARQUE |
| - EL INGENIERO MEDRANO CIERRA SU LOCUCION ANTERIORMENTE QUE A LA FECHA DE HOY NO HA RECIBIDO MEMORIAS DE CANTIDADES PARA REVISION |
| - EL CONTRATISTA INFORMA QUE HOY LAS ESTARA ENTREGANDO PARA QUE EL ING MEDRANO REVISE. |
| |
| * PARQUE VELODROMO 1ra DE MAYO |
| - EL INGENIERO LUIS MONTAÑEZ DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTA QUE EN ESTE FRENTE SE REALIZO ESTA SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA EL DESMONTE DE LUMINARIAS, EL RETIRO DE LOS POSTES DE CONCRETO EXISTENTES, LA EXCAVACION DE LOS DADOS |

TEMAS TRATADOS

- LA FUNDICIÓN DE LOS DADOS, SE REALIZO EXCAVACIÓN PARA CAJAS (274)
- LA INGENIERA PAOLA ROJAS DE LA INTERVENTORIA NOS COMENTO QUE YA SE INSTALARON LAMPARAS EN LOS BAÑOS DEL COLISEO Y EN EL COLISEO LUMINARIAS Y QUE ESTA PENDIENTE CITA PARA MEDICION FOTOMETRICA
- TAMBIEN NOS COMENTAN QUE EL DIA LUNES 1- ABRIL SE INICIA EL MONTAJE DE LOS POSTES NUEVOS METALICOS Y SE UBICARA EL ADMINISTRADOR PARA LA PUESTA EN SERVICIO DEL COLISEO

* PARQUE BOSQUE DE SAN CARLOS:
- EL INGENIERO MONDRAGON COMENTO; QUE YA SE ACABO DE INSTALAR BASES COMPACTAS, QUE EL DIA LUNES 1- ABRIL 24 SE TOMARON DENSIMETROS Y SI ESTAN OK EL DIA MARTES SE FUNDIRA PLACA DE CONCRETO
- SE PASO DE RAMPA DE DISCAPACITADOS, SE HICIERON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA ENTREGA DE BIOSALUDABLES Y SE REALIZO LA PUNTURA DE MATERIAS

* CANAL BOYACA
EL INGENIERO MONDRAGON DE LA INTERVENTORIA COMENTO; QUE SE INSTALO GEOTEXTIL, SE TERMINO DE INSTALAR SUB-BASES EN LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES SE REALIZO EL CORTE DE LA PLACA EN MAL ESTADO SE REPARO Y FUNDIO PLACA DE REPARACION, SE INSTALARON BORDILLOS, SE INSTALO JUEGO CIRCUITO MUNDO Y QUE LLEGO AL SITIO LA MALLA NUEVO DEL JUEGO PINBALL

* PARQUE FONTANAR DEL RIO:
EL INGENIERO MONDRAGON NOS COMENTO QUE ESTA PENDIENTE DAR INICIO A LAS OBRAS DEL PARQUE A LO QUE SE CONTRATISTA COMENTO QUE EL DIA LUNES SE INICIAN ACTIVIDADES EN ESTE FRENTE CON LA INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL

| TEMAS TRATADOS |
|---|
| * PARQUE VIRREY DEL NORTE; |
| - SE RECOJIO JUEGO DAÑADO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE ESPERA LLEGUE YA ARREGLADO E INSTALAR EL DIA 5 DE ABRIL-24. |
| |
| * PARQUE EL TUNAL: |
| EL ARQUITECTO JOHN CUELLAR DE LA INTERVENTORIA COMENTO: QUE SALIO UN NUEVO ANILLO POR EMERGENCIA EN LA PORTERIA #2 ARREGLO DE FLUXOMETROS Y 1 PUSH AUTORIZADOS POR EL APOYO A LA SUPERVICION DEL IDRD. (INF. ANGELICA ROMERO) |
| - LAS ACTIVIDADES ELECTRICAS EN CAMPO FUTBOL 11-Y A SE TERMINARON - GOTA PORTERIA X PARTE DEL CONTRATISTA EL DIA DE PUESTA EN SERVICIO |
| - ZONAS DE SALIDAS CON ARQUERIA YA SE TERMINARON INSTALACION SE ESTAN FUNDIENDO CINTAS DE AJUSTE |
| - ZONAS DE PORTERIAS → YA SE TERMINARON ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA - SE ESTAN HACIENDO ACTAS DE PUESTA EN SERVICIO |
| - SE ADELANTAN TRABAJOS EN LA ZONA DE PARKOUR CON ACTIVIDADES DE DESCAPOTE Y EXCAVACION Y FUNDIDOS DE ANCLAJES EN CONCRETO |
| - SE ADELANTAN TRABAJOS FINALES DE PINTURA EN ZONA DE LA RUTA DE LA VIDA PARA CULMINARLA LA PROXIMA SEMANA. |
| |
| * PARQUE FONTANA SALITRE: |
| - SE TERMINARON OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA Y ESTA LISTO PARA HACER ENTREGA A LA ADMINISTRACION DE LA ZONA DE BAÑOS COLISEO Y DE LA ZONA DE BIOSALUDABLES |
| |
| * PARQUE VILLA ALEMANA: |
| - SE TERMINARON ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES DE LAS OBRAS ADELANTADAS EN ESTE PARQUE. ESTA PENDIENTE EL MANEJO O CAMBIO A UNO NUEVO DEL PORTON DE LA ENTRADA PRINCIPAL EL CONTRATISTA QUEDA COMPROMETIDO A EVALUAR EL PRESUPUESTO A VER SI ALCANZA PARA INSTALARLO NUEVO. |

TEMAS TRATADOS

* PARQUE LA FRAGUA:
- SE APLICO LA BASE ASFALTICA A TODA LA PISTA DE PATINAJE
- SE INSTALAN CAÑUELAS PERIMETRALES EN PISTA DE PATINAJE
- SE TERMINA DE INSTALAR DILATADOR EN CONTORNO PISTA DE PATINAJE DE TABLETA Y SE CAMBIAN TABLETAS ROTAS
- ZONA INFANTIL EXTERIOR ⇒ SE TERMINA DE INSTALAR ADOQUIN CON ACCESOS - SE UNICIA INSTALACION DE BARANDAS PERIMETRALES

* PARQUE NUEVO MUZU:
- SE TERMINAN OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BAÑOS COLISEO Y SE HACE ACTA DE PUESTA EN SERVICIO
- SE TERMINA INSTALACION Y PINTURA DE BARANDA PERIMETRAL ZONA DE JUEGOS
- LLEGA MATERIAL PARA EL PISO CAUCHO DE LA ZONA DE JUEGOS.
- SE ESTA A LA ESPERA DE QUE LLEGUEN LOS JUEGOS INFANTILES QUE ESTAN FALTANDO

* PARQUE VILLEMAR:
- ESTA PROXIMO TERMINAR LA PARTE INTERNA DEL MODULO DE BAÑOS INSTALACIONES DE APARATOS HIDRO SANITARIOS - LOUSAMIENTOS Y SANITARIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA
- ESTE PARQUE PRESENTA ATRASOS SIGNIFICATIVOS Y SE SOLICITA AL CONTRATISTA MITIGAR CUANTO ANTES DICHOS ATRASOS
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESUPUESTAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ESTE MODULO EN SU PARTE INTERNA HASTA SALIDA A CUBIERTAS Y PASAR PRESUPUESTO PARA SU APROBACION Y EJECUCION SI ES APROBADO X EL IDRD

* PARQUE GILMA JIMENEZ:
- SE ESTA TRABAJANDO EN EL CUARTO DEL NUEVO TRASFORMADOR TERMINANDO DE INSTALAR PUERTA DE PASO - TRASFORMADOR

VARIOS TRATADOS

- SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE REUBICACION X CAJAS DE PASO ELECTRICO PARA CONECTAR EL NUEVO TRANSFORMADOR
- SE ESTA REALIZANDO EL APUNTALAMIENTO DE LUMINARIAS DE LA CANCHA Y ESTA PENDIENTE PONER EN SERVICIO EL NUEVO TRANSFORMADOR

* VIRREY DEL SUR.:
— ESTA TERMINADO SOLO FALTA REUNION DE ENTREGA QUE ESTA PROGRAMADA PARA EL MIERCOLES 2- ABRIL/24 A LAS 4:00 PM.

* PARQUE LA VICTORIA
- SE ESTA TRABAJANDO EN LA REUBICACION DE LUMINARIAS DE LOS MODULOS DE ADMINISTRACION Y BAÑOS - INCLUYENDO EL MONTAJE/MONTAJE DE VIGAS CANALES (S.E.) Y SE ESTAN TERMINANDO DE INSTALAR LOS MUROS DIVISORIOS INTERNOS DE MODULO DE ADMINISTRACION
- EL CONTRATISTA NOS COMENTO QUE LA OTRA SEMANA QUEDAN TERMINADAS LAS ACTIVIDADES EN ESTE PARQUE

* PARQUE GAITAN CORTES:
— EL CONTRATISTA COMENTA QUE LAS ACTIVIDADES DIAGNOSTICADAS Y APROBADAS PARA ESTE PARQUE YA FUERON TERMINADAS Y QUE ESTA PENDIENTE UNICAMENTE LEGALIZAR LA PUESTA EN SERVICIO CON EL ACTA DE ENTREGA
— SE BUSCARA AL ADMINISTRADOR EL 2-ABRIL PARA QUE FIRME EL ACTA.

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| 1- SEÑALIZACION PARQUE DE LOS NIÑOS | CONTRATISTA | PROXIMA SEMANA DESDE EL LUNES |
| 2-DEFINIR LA FECHA DE LA 2da AUDITORIA 70% | CONTRATISTA | LUNES 1-04-24 |
| 3- REUNION DE COMPONENTE CALIDAD | INTERVENTORIA - CONTRATISTA | JUEVES 7-04-24 |
| 4- CUADRO DE PUESTAS EN SERVICIO Y ENTREGAS | CONTRATISTA | MARTES 2-04-24 |
| 5- ENTREGA DE PROPUESTA DE DISEÑO MODULOS DE BAÑOS PARQUE DE LOS MONOS | CONTRATISTA | MARTES 2-04-24 |
| 6-. ENTREGA DE MANUALES DE PARQUES YA TERMINADOS A LA INTERVENTORIA | CONTRATISTA | A PARTIR MARTES 2-04-24 |
| 7-ENTREGAR INFORME DE AVANCE | CONTRATISTA | MARTES 2-04-24 |
| 8- REUNION VIRTUAL SOBRE NPS | IDRD - INTERV - CONTRATISTA | LUNES 1-04-24 |
| 9- PUESTA EN SERVICIO COLISEO 1ra Etapa | CONTRATISTA | LUNES 1-04-24 |
| 10- PUESTA EN SERVICIO SAN JOSE DE BAVARIA | CONTRATISTA | MARTES 2-04-24 |
| 11- TERMINAR PARTE ELECTRICA PARQUE NIÑOS | CONTRATISTA | MIERC. 3-04-24 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | | |
| Observaciones | | | | | |
| | | | | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | | |
| NOMBRE | | NOMBRE | JOHN LIAN CUELLAR S | |
| CARGO | | CARGO | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | ARQ. JOHN LIAN CUELLAR SALAMANCA |
|---|---|

BOGOTÁ

| ACTA No. | COMITÉ/REUNIÓN: | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| - | Comité de seguimiento # 23 Cto Obra 3099/23 Cto Int 3131/23 | 20 | 03 | 2024 |

LUGAR: Oficina interventoría HORA DE INICIO: 11:00 am HORA FIN.

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Se anexa listado de asistencia. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Aprobación acta anterior | 4. Componente SST |
| 2 Componente social | 5. Componente calidad |
| 3 Componente ambiental | 6. Componente técnico |

**TEMAS TRATADOS**

1 Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta pues no existen observaciones.

2. Componente social.

- Se reporta novedad en Eduardo Santos, se finalizaron las obras para entrega el viernes pasado, sin embargo el lunes se evidencian daños por vandalismo, el contratista está subsanando los daños para poder realizar la entrega el próximo viernes.
- Virrey Sur se podría entregar mañana pues ya se remitió folleto
- Se solicita coordinar las entregas considerando que se aproxima Semana Santa.
- En Eduardo Santos se presenta daño en una división por mal uso.
- Se recomienda realizar los actos de puesta en servicio oportunamente.
- Parque Nacional, Villa Alemana, Virrey Sur y Eduardo Santos se pueden entregar.
- Se han realizado entregas parciales en Simón Bolivar, está pendiente realizar el acta de puesta en servicio de PRD, Squash se tiene previsto para el próximo miercoles. Se solicita programar para el martes, se aclara que

**TEMAS TRATADOS**

-cómo el lunes es festivo, el martes no estaría el administrador del parque.
- Se aclara que se puede hacer entrega del parqueadero parcialmente, se aclara que ya se encuentra aprobada la demarcación.
- Se recomienda que las entregas se realicen el sábado.
- Se solicita revisar si el acta de puesta en servicio de Hockey (PRD) ya se realizó, si no se ha realizado se solicita realizar el acta el día de mañana.
- En cuanto a la concha múltiple se solicita aclarar cuándo se entregaría, el contratista manifiesta que podría el próximo miercoles.
Se recuerda que en semana Santa se puede vandalizar porque el parque estará lleno, se solicita para el martes de ser posible antes.
- En Simón Bolivar faltan las entregas de todos los módulos.
- Alta Blanca se entregó.
- Se recuerda que en Beisbol y Softbol se debe realizar entrega del escenario a las ligas.
- San José de Bavaria aún no.
- Río Negro ya se entregó.
- Servitá concha se programa para el martes, se puede realizar aunque falta el tablero, pero se aclara que es mejor completo.

3. Componente ambiental.
- En cuanto a informes se aclara que ya se tienen aprobados los documentos del periodo 6 y se realizó la radicación correspondiente tanto de obra como interventoría
- Se realizo la reunión con la profesional ambiental de la entidad, se realizó la aclaración respectiva de los temas RCD, el contratista remitió todos los anexos RCD's y se revisaron por parte de la interventoría, se devolvieron por tema de firmas. Se solicita al contratista por parte de interventoría que se allegue la información en digital y editable, ambos firmados, pues el documento se complementa por parte de interventoría. Lo anterior para evitar reprocesos.
-El día de ayer se realizó reunión entre el componente ambiental y el componente de calidad con el fin de realizar el cruce de la trazabilidad de materiales y realizar aclaraciones de cada una de las partes, esto como una acción de mejora frente a la desviación de registros que se presentó en los formatos del componente de calidad cuando se comparan con los formatos del componente



837
734

**TEMAS TRATADOS**

ambiental, se solicita diligenciar los permisos en debida forma para el resto del contrato. Se recuerda que se debe coordinar el componente de calidad y el componente ambiental con la parte técnica para llevar un adecuado seguimiento. Se aclara que todos los profesionales deben tener presente cuales son los proveedores aprobados y cuales son los gestores aprobados para que se realice a través de ellos la adquisición y disposición de los materiales. Se recuerda que el compromiso es socializar lo que se habló ayer en la reunión y socializar la documentación, se solicitan tener puntos de control para verificar el cumplimiento.

- El día de hoy se realizaron nuevamente observaciones de orden, aseo y disposición de RCD's en el frente PRD, se informa que el sábado pasado se realizó brigada de orden y aseo el sábado, se solicita tener presente que estas acciones deben generarse de manera constante. Se solicita registro fotográfico para dejar la evidencia de las acciones realizadas.
- Se siguió revisando el tema de control de las abejas, por temas de gestión de riesgos operacionales se solicitó a los operarios del componente eléctrico usar los trajes de protección para desarrollar las tareas, con el ánimo de no afectar los individuos (abejas) que pudieran estar en la zona de trabajo. Se solicita seguir con las recomendaciones del gestor especializado y adaptar las labores operativas al entorno en dónde se deben desarrollar.
- La última actividad realizada en la zona con presencia de abejas, fue el desmonte y se realizó con los trajes especiales y en la instalación se tiene previsto que se realice de esta manera. Para las abejas que se retiraron se entregaría el informe del Apicultor, las demás seguirán en ese poste. Se aduce que no existe riesgo en el escenario siempre y cuando no se moleste directamente el poste a la altura dónde se encuentran. Se solicita incluir esta precisión en el informe.

Se aduce que se debe gestionar el riesgo, se realizaron las actividades desde el componente ambiental y se debe controlar el riesgo desde la parte técnica.

- Está pendiente instalar las cuerdas y las luminarias, se solicita tomar las medidas correspondientes. Se solicita remitir registro fotográfico del poste afectado por las abejas.
- Se solicita tener en cuenta demarcación y cubrimiento del material.

**TEMAS TRATADOS**

- Se aclara que existen que hay materiales granulares que por estar en uso en la jornada de trabajo no se pueden cubrir, pero existen otros que si, además se evidencia derrame y desorden en las obras.
- Se solicita al personal contractual y SST tomar acciones frente a lo correspondiente.
- Se autoriza por parte de INDEN la disposición final de las canecas retiradas
- En cuanto a las luminarias desmontadas por ahora no se dan de baja, se va a revisar si puede ser reciclado todo el tema de las luminarias.
- Se solicita realizar la relación del material desmontado.
- Se solicita que el material a realizar sea recogido de forma correcta, (material eléctrico o recital)

4 Componente SST.

- No hubo quejas en total para los frentes en intervención cumpliendo el grado de votos.
- Se ha recomendado señalización, orden y aseo de los frentes de trabajo, la labor es constante.
- Se solicita al personal técnico revisar el tema del desorden en obra.
- Se aclara que la dotación es de obligatorio cumplimiento, se solicita al contratista atender las observaciones.
- Se solicita revisar el tema de la subsanación de los exámenes médicos.
- Se solicita orden y aseo en el frente Tunal.
- No se evidencia ejecución de las labores eléctricas por el tema de las obras.

5. Componente calidad.

- Compromisos. Se revisó el informe mensual y se emitió cual sin tener en cuenta la información del PIE.

Se remitirá la información del PIE desde el inicio del contrato con corte al 29 de Febrero, el contratista manifiesta que entregará la información el viernes.

- Se entregó por parte del contratista el resultado de la prueba de estanqueidad, así como los ensayos del material para llenos del tanque, se recibió caracterización inicial de la arena tipo peldar.
- Se solicita realizar una muestra de la arena que llegue a obra considerando la gran cantidad a suministrar.

**TEMAS TRATADOS**

No se cumplió el compromiso, las obras no han iniciado, pusieron a Servita se iniciaría la intervención, de acuerdo con lo informado por el contratista.

6. Velódromo 1 de Mayo.
- Se realizó la excavación de los dados.
- Se funden los 4 dados el próximo viernes
- Por norma los dados quedaron más amplios de lo previsto inicialmente.
- Se levantarán los postes la proxima semana.
- Se instalaron las luminarias de las torres en el coliseo.
- Los cambios de luminarios en baños, pendientes topos negros.

7. PRD
- Pendiente instalación de tomas GFCI
- Ya se realizó puesta en servicio de la cocina.
- Se solicita finalizar las obras que puedan realizarse en todos los frentes.
- Se reitera la solicitud de revisión de acabados.

8. Niños.
- No se ha iniciado la obra eléctrica, se iniciaría mañana.
- No se evidencia elaboración de lava pies ni de la graderia en bordillo.
- Se solicita la propuesta de la señal de la zona deportiva.
- La señalización propuesta y el portón que se debe cambiar no se evidencia.

Se recuerda que hay obras que se pueden cerrar pero no se han rematado detalles.

9. Tunal:
- Se evidencia atraso en el remate de las obras civiles
- Se evidencia atraso en el frente de ParKour, el contratista manifiesta que iniciará la nivelación.

10. Novios:
- Se debe revisar en sitio la instalación de la cubierta.
- El tunel está siendo finalizado entre hoy y mañana

11. Porvenir:
No se pueden realizar las intervenciones hasta tanto se defina el punto de conexión por parte del acueducto al IDRD.

**TEMAS TRATADOS**

-Manuales Palestina y Naranjos los cuales se encuentran en revisión.
-Se solicita que los documentos allegados sean revisados previamente por la profesional de calidad de obra.
-Plan de adquisiciones se encuentra en revisión
- En cuanto al reporte de las compras solicitadas por la supervisión, el cual no está remitido por el contratista, el contratista lo allegará al día de hoy
Se realiza reporte:
* Nuevo Muzú. Juegos (Red). La fecha estimada de llegada a puerto es el 13.
* Parkour. Ya llegaron y entran en proceso de nacionalización
* Se solicita la remisión de los soportes de los atrasos en programación por el suministro de los importados, se deben allegar los soportes con el cronograma de las fechas para finalización de las obras.
* Los juegos de Gulopín llegarían el 2 de abril.
* los elementos de la zona deportiva son importados pues el proveedor no tiene punto de distribución en la nación. Llegaría dentro de los tiempos contractuales la dotación.
* El miércoles se realizo el pago para despacho, de la arena peldar.
* Se solicita precisar el ciclo parqueadero de PTAR.
* Se solicita realizar los trámites en los tiempos adecuados.
* Está pendiente la programación de la auditoría interna
6. Componente técnico:
6.1. UDS - Brisbol - Pendiente tierras y varillas, el contratista informa que se enviarán las luminarias (1 sólo luminaria que está fallando) se envió por garantía a Philips.
- Se recuerda que las cajas de las tierras deben ser certificadas.
6.2. Servitá:
- Finaliza hoy el apuntalamiento de luminarias. El tablero de control se encuentra en elaboración.
6.3 Gilma Jimenez
- La obra civil finalizaría el día viernes, si no llega la puerta se instalará el tablero con chazos.
* Servitá, pendiente la instalación de las tapas y el tablero
6.4. Cayetano Cañizares.

**TEMAS TRATADOS**

3. Illimani:
- Presenta atraso
- No se ha llevado el material ya dehlado.
- Programa general del contrato
  - Programado 91%. / Ejecutado 91%.
  - No se presenta atraso general del contrato.

8. Eduardo Santos:
- Se subsanará el daño realizado por vandalismo para entrega el viernes.

9. La victoria:
- Pendiente drywall y pintura

10. Virrey Sur:
Se entregará el viernes

11. PTAR se instaló la puerta y la valla solicitada por la supervisión

12. Se atendió emergencia en UCAD Tunal

13. En tercer milenio se cambiará un tramo de la acometida para finalizar la emergencia.

- Para el retiro de Hunlift se debe informar por correo a administración.
- Se informa que ya se finaliza en marzo y abril el mantenimiento de los ascensores
- Se presenta atraso en la instalación de vallas, el contratista manifiesta que tomará las medidas correspondientes.
- El acta de NP 7 se encuentra en revisión de IDRD

## COMPROMISOS

| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
|---|---|---|
| Social - Puesta en servicio - Nacional - Virrey Sur - Villa Olímpica - Bolívar | Contratista | 22 - 03 - 24 |
| Social - Puesta en servicio Hockey | Contratista | 21 - 03 - 24 |
| Subsol - Puesta en servicio PPD - Concha múltiple | Contratista | 27 - 03 - 24 |
| Social - Entrega liga beisbol | Contratista | 26 - 03 - 24 |
| Ambiental Orden y aseo | Contratista | Constante. |
| Informes mensuales | Contratista | 27 - 03 - 24 |
| Calidad - Resultados MDL - 19 | Contratista | 26 - 03 - 24 |
| Calidad - Reporte de compras pendiente | Contratista | 20-03-24 |
| ParKour - Llegada a obra | Contratista | 1-04-24 |
| Oficio expedir acceso juegos | Contratista | 26-03-24 |
| Calidad - Programación auditoria interna | Contratista | Pendiente |
| Tableros de control - Social y Velódromo | Contratista. | 04.04-24 |
| Aprobaciones obras eléctricas | Contratista | Pendiente |
| Galpon Jiménez - Finalización / Pruebas | Contratista | 1-04-24 |
| Coqueluno Cañizares - Obras eléctricas / Finaliza. | Contratista | 25-03-24 |
| Niños - Inicio obra eléctrica | Contratista | 21-03-24. |
| Niños - Propuesta social zona deportiva | Contratista | pendiente. |
| Reunión Simón Bolívar / Niños / PPD | Contratista / Interv | 21-03-24 |

### EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | | |
|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones**

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman.

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen Algecira | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algecira | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora de Interventoría | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA EL ACTA: | Inspectora de interventoría. |
|---|---|

## COMPROMISOS

| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN |
|---|---|---|
| Tunal - Tablero electrico | Contratista | 20 03 24 |
| Tunal - Finalización obras civiles | Contratista | 26 - 03 24 |
| Tunal - Ruta de la vida | Contratista | 27-03-24 |
| Tunal - Inicio Parkour / Propuesta de Señal | Contratista | 27-03-24 |
| Nogales - Revisión empalme rompa | Contratista | 27 - 03 - 24 |
| Nogales - Puesta en servicio Tunel | Contratista | 22-03-24 |
| Informes Apuntallamientos | Contratista | 27 - 03 - 24. |
| Manuales de mantenimiento ajustados | Contratista | 22-03-24 |
| Estudios tecnico - económicos | Contratista | Pendiente |
| Eduardo Santos - Puesta en Servicio | Contratista | 22 - 03 24 |
| Virrey Sur - Puesta en servicio | Contratista | 22 - 03 - 24 |
| Villa Alemana - Puesta en servicio | Contratista | 27 - 03 - 24. |
| Acta Parcial | Contratista | 27 - 03 - 24. |
| Tercer Milenio - Emergencia | Contratista | 30 - 03 - 24 |
| Señalización piscinas | Interv / Contratista | 21-03-24 |
| | | |
| | | |
| | | |

**EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN**

| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | |
|---|---|---|---|---|

**Observaciones**

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen Algeciras | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algeciras | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora Inventaria | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algeciras Castro. |
|---|---|

BOGOTÁ

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN

EVENTO: 'comité de seguimiento # 23 COP 3099/13 FECHA: 20 03 2014

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN _____ LUGAR Recorrido Canal Bonanza / PRADO Norte Infraes. Intervenidas.

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD: ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELEFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATALY ESPINOSA TIERRA | PROF AMBIENTAL | INTERVENTORIA | | INGENIUM | | |
| 2 | Rodney Gonzalo Dorado | Ing Residente | Contratista | | Consorcio | rodney2899@hotmail.com | 3118081957 |
| 3 | Jaime L. Cuello S | Riesgo Junior | Interventoria | | Soluciones SAS | | 3203899408 |
| 4 | Raul Andres Gutierrez R | Inspector | Interventoria | | Soluciones | | 3125242026 |
| 5 | Andres Giovanny Cordoba | Inspector | Interventoria | | Soluciones | | 3144572929 |
| 6 | Nelfa Astrid Nova Cardoza | Ing Ambiental | Contratista | | Consorcio Pqu | nelfa.nossa12@hotmail.com | 3003653705 |
| 7 | Ingrid Baez | Residente SST | Contratista | | Consorcio | residentesst3699@.com | 3013509532 |
| 8 | JOSE D PEÑA BAEZ | ING. RES. OBRA | CONTRATISTA | | CONSORCIO | | 3142332441 |
| 9 | Dana Arango Caballero | Ing Electricista | Contratista | | Consorcio | Proyectos.electricos@co | 3013662231 |
| 10 | Martha Pacheco F. | Ing. Civil | Contratista | | Consorcio | ingpacheco@gmail.com | 3133468 |
| 11 | Ing Stella Quintero R. | Ing Residente | Contratista | | Consorcio | consignar.ingeniero | 3165 |
| 12 | Diana C. Santamaria S | Res. Ambiental | Contratista | | Consorcio | diana.santamaria@ | 3 |
| 13 | Yadel Rocio Cordoba J. | Prof. Social | Interventoria | | Soluciones SAS | Social.Soluciones@ | 3103206 |
| 14 | FERNANDO GONZALEZ | RESIDENTE | INTERVENTORIA | | Soluciones SAS | proyectos2@soluciones | 3134926632 |
| 15 | Andrea Rubio | Coordinadora | Contratista | | Consorcio | c.parquesbog@gmail | 3118743220 |
| 16 | Mónica Rodriguez Gaona | Ing Calidad | Contratista | | C. Parques Bog | c.parquesbog@gmail.com | 3108576144 |
| 17 | Vianney Leon | Ing Calidad | Interventoria | | Soluciones SAS | proyectos2@soluciones | 3103249403 |
| 18 | Edna Constanza Chaves | Directora | Interventoria | | Soluciones | | |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL V1

BOGOTÁ

**LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN**

EVENTO Comité de seguimiento # 23 COP 3094/23 FECHA 20 03 24

HORA INICIAL 9:00 am HORA FIN _____ LUGAR Secretaría General Avenida / Aliados / IDRD / Comité Obras Interventoría

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| 1 | Yenetti Gonzalez | Prof. SST | Interventoría | | Soluciones | yenetti.gonzalez@consultor... | 3224585645 |
| 2 | Andrés Fernando Vargas | Coordinador | Contratista | | Consorcio | andres.vargas@consultor... | 3163629419 |
| 3 | Angelica Pinzon H. | Apoyo Seguridad | Sub. IDRD | | IDRD | | |
| 4 | Karen Adriana Algecuras Castro | Inspectora | Interventoría | Karen A | Solun Ing. | proyectos@solunsas.com | 7653016 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquiera dependencia y/o área del mismo, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. La Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD. https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL v.4

BOGOTÁ

| Si no maneja consecutivo coloque 11 A | COMITÉ/REUNIÓN: Acta de comité de seguimiento # 22 CDP 3099123 Cto Int 3131/23 | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. | | 13 | 03 | 2024 |

LUGAR: Parque Metropolitano Simón Bolívar HORA DE INICIO: 10:00am HORA FIN: 2:00 pm

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Se anexa listado de asistencia | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Aprobación acta anterior | 4. Componente social |
| 2. Componente SST | 5. Componente ambiental |
| 3. Componente calidad | 6. Componente técnico. |

**TEMAS TRATADOS**

1. Aprobación acta anterior:

Se aprueba el acta pues no existen observaciones por parte de la entidad y del contratista.

2. Componente SST:

- Compromiso: Subsanación observaciones informe mensual del contratista, se cumplió el compromiso, se subsanaron las observaciones, pendiente radicación en física.

La entidad reitera que se está por fuera de tiempos, pues hoy en 13 de marzo y no se ha radicado en física

- Trabajadores: 109 operativos vinculados.
- Se recomienda nuevamente acompañamiento de un coordinador para el tema de trabajos en alturas, en Servitá no se evidenció acompañamiento, se remitió la documentación de trabajo en alturas pero se reitera que se deben informar las actividades en alturas de forma oportuna a la profesional SST.
- Se recomienda dotación en el frente de Alhablanca, pues se evidenció deterioro en la dotación de algunos trabajadores, el contratista manifiesta



842

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| que se encuentra tomando las medidas correspondientes para la reposición de la dotación. |
| - Se atiende por parte del contratista la recomendación de señalización de las áreas de trabajo. |
| - En Velódromo primero de Mayo se solicita presencia de coordinador en alturas todo el tiempo pues la actividad es de alto riesgo. Se reitera por parte de la supervisión la obligación del componente SST. |
| - Se aclara que a la fecha no se ha podido finalizar el tema de las abejas pues nuevamente se evidencia presencia numerosa de las mismas, se está evaluando si se debe a un tamaño grande de la colmena o si no ha sido posible evaluar la abeja reina. Se emitirá el reporte correspondiente. |
| 3. Componente calidad: |
| - Se remitieron observaciones por parte de interventoria al informe # 6 del contratista. El contratista manifiesta que lo subsanará el día de mañana. |
| - Se solicitó la prueba de tintas a la soldadura de la zona de juegos del parque Nuevo Muzú, se recibió el día de ayer y está en revisión por parte de interventoria. |
| - Se solicita la remisión del listado de materiales oportunamente, se remitió el documento ésta mañana pero no se cumplió con la fecha pactada de compromiso. |
| - Se aprobó el PIE - Plan de inspección y ensayos de acuerdo a las modificaciones de los NP's, se incluyeron todas las de la V11 del presupuesto. |
| - El 6 de marzo estaba el compromiso de entrega de los ensayos de los llenos, el cuál no se cumplió, sin embargo se realizó la actividad en obra. No se tiene reporte de densidades a la fecha. Se solicita cumplir con los procesos constructivos. Se aclara que la estabilidad de los llenos de los tanques es responsabilidad del contratista. |
| - Se realizó la prueba de estanqueidad del tanque hace 8 días y no se ha allegado el resultado de la prueba. El contratista informa que remitirá el documento el día de hoy. Se aclara que la liberación se ha realizado mediante bitácora. Se aclara que la interventoria estuvo presente en los llenos y existe corresponsabilidad. La interventoria aclara que se requiere |

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| el documento para cumplir con los procedimientos. |
| - Se solicita por parte de interventoria cumplir con los procedimientos adecuados, se recuerda que calidad no es llenar formatos, se han evidenciado deficiencias en los acabados de las actividades. Se solicita revisión por parte de los residentes de obra antes de entregar a interventoria. El contratista manifiesta que tomará las medidas correspondiente. |
| - El dia de hoy se remitieron los ensayos de arena de PRD, de manera informal, se radicará el día de mañana. Se aclara por parte de interventoria que aunque se entregue de manera informal se debe radicar y que la radicación se encuentra por fuera de tiempos, por lo cual el contratista se encuentra incumpliendo. |
| - Están pendientes los ensayos de la concha de PRD (Multiple), el contratista manifiesta que se reunirá con el laboratorio para mirar los temas de demoras en la entrega de resultados. La interventoria aclara que si el tema de los laboratorios no es eficiente se solicitará cambio del mismo. |
| - De los manuales de mantenimiento no se cumplió el compromiso que estaba para el 8 de marzo, el dia de hoy se entregaron Naranjos y Palestina en atención a las observaciones pero no han llegado los demás. |
| Pendiente por entregar: Olaya, Cayetano Cañizares, Ciudad Montes, Techo, Villa de los Alpes, Rio Negro, Virrey Norte. |
| Techo se entregaria el dia de mañana. Cayetano Cañizares 22-03-24 |
| Ciudad Montes y Olaya - 19-03-24 Alpes: 19-03-24. |
| Rio Negro: 19-03-24. Virrey Norte: 15-03-24. |
| - Ayer se remitieron observaciones al plan de adquisiciones, el contratista manifiesta que remitirá las subsanaciones el viernes. |
| - Se aclara que los formatos de topografia se podrán suscribir por los residentes de interventoria o los inspectores de interventoria. |
| 4. Componente social: |
| - Se realizó reunión de finalización en Ciudad Montes el 1-3-24 |
| - Se remitió por correo la presentación y el acta, esta mañana se entregó la información al administrador. |
| - Se realiza reunión de socialización en velódromo primero de mayo. |
| - Se realizó acta de vecindad del Velódromo primero de mayo. |

**TEMAS TRATADOS**

- Se entregó casa del adulto mayor en Tunal
- Se programa entrega de pista BMX tunal para el próximo viernes
- Se aclara que tienen observaciones de la parte técnica en BMX Tunal, se manifiesta que los empozamientos existen porque no se puede cambiar la geometría de la pista, el contratista manifiesta que el tema de la pista era claro: realizar mantenimiento, reparcheo donde estaba afectado y aplicación de Slury. El contratista aclara que la comunidad tiene claro que no se podía modificar nada porque se afecta la geometría.
- Se solicitan las actas soportes de los cambios solicitados por los deportistas y el consentimiento de no alteración de la geometría de la pista.
- El IDRD solicita la remisión de un concepto técnico frente a las fisuras de la pista, se debe incluir lo del bordeo. Se debe aclarar cómo se va a solucionar el tema de las fisuras pues se debe garantizar el trabajo realizado con la estabilidad. El contratista manifiesta que teniendo en cuenta que se realizó mantenimiento y no rehabilitación de la pista, al hacer el mantenimiento se presentarían las mismas falencias pues la estructura no está bien. La interventoría manifiesta que dicha situación debía informarse previo a la intervención por parte del contratista, aclarando que la estructura no se encontraba en óptimas condiciones con el fin de informar a la comunidad y al IDRD, situación que no se dió. Se aclara que la propuesta de intervención se realiza por parte del contratista de obra.
- Se programa para el próximo martes la reunión de avance de la Fragua, está pendiente por coordinar la hora y el alcance a la presentación allegada previamente.
- El informe social se encuentra aprobado, pendiente por remitir en físico.

5. Componente ambiental:

- Se encuentra al día la entrega de informes.
- Se subsanaron las observaciones en obra.
- Se realiza seguimiento al tema del tratamiento de las abejas.
- El día de ayer se realizó reunión con la profesional ambiental de IDRD, se reiteró la aplicación de la res. 1257 para el contrato, se remitió la información del IV trimestre de RCD a la interventoría para revisión.
- Se realizó recolección de escombros en los frentes de obra.
- La interventoría manifiesta que remitirá la información del VI trimestre para

TEMAS TRATADOS

cargue en la página de la SDA el día de hoy.
- La documentación pendiente de entrega (proveedores) ya se allegó y se encuentra aprobado.
- Se solicita la remisión del cruce de las cantidades con el componente de calidad.

* El IDRD solicita realizar presentación de finalización para entrega de las obras a administración y comunidad, se solicita coordinar con el componente técnico.
- Para virrey norte se entregará volante a la administración.

* Se solicitan planos récord de acuerdo con el compromiso adquirido.

6. Componente técnico:
- Se recuerda que había un compromiso de entrega de los estudios técnico-económicos del componente eléctrico, el contratista manifiesta que los allegó a la especialista eléctrica de interventoria, se solicita remitir copia al correo oficial de la interventoria.

6.1. Bosque San Carlos:
%. Programado: 57%. %. Ejecutado: 57%.
- Se finalizó la viga zarpa
- Se inició instalación de geotextil y base, zona gradas.
- Pendiente compactación para tomar densidades.
- Se instalaron los mallos bajo el puente
- Se revisaron los bebederos, uno no funciona adecuadamente, se está realizando la revisión correspondiente.

6.2. Velódromo primero de mayo:
%. Programado: 74%. %. Ejecutado: 75%.
- Ya llegaron las canastas y postes metálicos para hacer el cambio de los postes de concreto del velódromo.
- Se instalaron lámparas en los baños del coliseo (Hombres y mujeres) y en la administración.
- El ingreso será por un costado para ingresar, hoy se están desmontando luminarias, la grúa está programado mañana.

6.3. Nacional:

TEMAS TRATADOS

% Programado: 0%  % Ejecutado: 42%

- Se llevaron los juegos y están en proceso de instalación
- Se incluye en el presupuesto un cambio pequeño de caucho en la zona afectada por el desmonte de los juegos.

6.4. Canal Boyacá

% Programado: 54%  % Ejecutado: 54%

- El IDRD no evidencia el avance en sitio pues en recorrido no se evidenció material granular, sólo bordillos y excavación. El contratista manifiesta que el avance se ve por la instalación de la red en la placa que no se demolió. La interventoría verificará el avance, sin embargo se aclara que la red ya está para instalación, ya están los ductos y hay acero en sitio.

6.5. Fontanar del Río:

% Programado: 19%  % Ejecutado: 21%

- Mismo avance pendiente ParKour.
- El contratista manifiesta que iniciaría actividades de nivelación de la zona ParKour el viernes.

6.6. Tunal:

- Ayer se realizó la puesta en servicio de la casa del adulto mayor y los porterios.
- Se realizó puesta en servicio de BMX, con las observaciones que se trataron en el componente social.
- Pendiente subsanación de observaciones en senderos, levantar el contorno de la cafetería, el resto de zonas ya se intervinieron.
- Las puestas en servicio se realizaron con pendientes, en casa de adulto mayor pendiente retoque de pintura, orden y aseo. Las observaciones se subsanarán el próximo viernes.
- El IDRD informa que uno de los gimnasios a los que se realizó mantenimiento está partido, la situación se presenta por mal uso, por lo cual se solicita cotizar y hacer el cambio de la pieza completa. Se solicita por parte de IDRD cambiar el letrero de la casa de adulto mayor tipo Olaya (como las que se instalaron en Olaya).

La tapa del tablero en BMX está pendiente, hoy se instala la señal de BMX.

6.7. Illimaní:

Se iniciaron actividades ayer en la tarde, se está interviniendo cubierta y la puerta para dar seguridad. El plomero ingresó hoy en la mañana, tomando

TEMAS TRATADOS

medidas para ingresar con los aparatos sanitarios en acero que ya se compraron y estaban en taller.

- Se presenta atraso de -23%.
- El IDRD solicita revisar y presupuestar lo eléctrico del módulo (funcionamiento interno). Se solicita cuantificar las cajas eléctricas tapas, marcos con soldadura. Se solicita revisar si hay cajas hidráulicas vandalizadas, se aclara que al momento de la visita todas las cajas vandalizadas eran eléctricas.

6.8. Nuevo Muzú:

% Ejecutado: 78% % Programado: 70%. Avance 8%.

- Se finalizaron las divisiones en baños
- Todo el lema de la baranda se encuentra en sitio
- Pendiente sólo instalación de juegos cuando lleguen.
- Se aclara que se remitió correo electrónico por parte de Biblored argumentando que no se ha podido prestar servicio con normalidad pues hay escombros cerca del PPP. Se aclara por parte de obra e interventoría que esa zona está limpia.

* En cuánto a la simulación pendiente de Velódromo primero de mayo, se aclara que ya no aplica pues no se cambiaron de lugar los postes. Se aclara que no se van a mover los postes pues la simulación arrojó niveles de iluminación muy bajos.

6.9. Fragua:

% Ejecutado: 78% % Programado: 76%.

- Mañana se imprima la zona para instalación de asfalto.
- Se está haciendo prueba de humedad de los placas.
- Se recuerda que en el comité de hace 15 días se definió que el asfalto debía aplicarse por tarde el 11 de marzo, de acuerdo con lo solicitado por IDRD
- Cambio de baldosas en pista ya se subsanó.
- En zona infantil ya se fundió la placa en su totalidad
- Senderos en adoquín se iniciaron el día de hoy
- Se entregaron baños y espejos.

6.10. Cayetano Cañizares:

Presenta atraso por el componente eléctrico. Se inicia el 18, se solicita

TEMAS TRATADOS

- coordinar con la administración los días que se van a necesitar en el escenario.
- Se informa que ya llegaron los circuitos, lo único que no ha llegado son las luminarias de Philips para softbol.

6.11 Eduardo Santos:

- % Programado: 89 %. % Ejecutado 85%.
- Se terminó de pulir el piso
- Se van a rematar observaciones a los baños, aseo y limpieza.
- Pendiente tablero eléctrico, se realizará la compra, és realizar el pago para que los entreguen a finales de la próxima semana.
- El IDRD solicita tener en cuenta que no se pueden contar con los recursos del acta parcial pues estos se pagarían a fin de mes por la entidad, fecha en la que se está finalizando el contrato, por tal razón el contratista debe realizar los pagos desde su capacidad financiero.
- El IDRD solicita remitir un listado de las compras pendientes y cuando se va a comprar.

6.12. La victoria:

- % Programado: 96 %. % Ejecutado: 89 %. - 7 %.
- El atraso se refleja en los muros internos del módulo de adminstración.
- Esta semana se finaliza pintura exterior de dichos muros.
- Se solicita verificar el estado de acabados en el módulo.

6.13. Villa Alemana:

- % Programado: 90%. % Ejecutado 90%.
- Pendiente entrega del muro de confinamiento en la parte de atrás
- El portón de atrás también está pendiente.

6.14. Virrey Sur

- % Programado: 55 %. % Ejecutado: 90%.
- Se realizaron observaciones a los acabados de pintura, las cuales se encuentran en subsanación.
- Pendiente tapas de la piramidal

6.15. Gilma Jimenez:

- Se informa que el transformador ya llegó.
- Pendiente la puerta
- Pendiente terminación del cuarto del transformador.

6.17. Emergencias:

TEMAS TRATADOS

* Tercer Milenio: Se entregó batería de baños en hombres.
- Mañana se sube si el daño se puede arreglar.
* La Puerta de PTAR: Se está realizando, se debe poner la diagonal aunque se demore.

6.18. UDS:
- Del componente eléctrico se aclara que en beisbol se esta haciendo apuntamiento, pendiente puesta a tierra, el escenario se puede usar pues ya cuenta con iluminación.
- Se aclara que se debe hacer acta con la administración aclarando que se puede entrenar desde el próximo lunes en horario diurno en beisbol.
- Se solicita plan de contingencia para instalación de luminarias en Softbol

6.19. Novios:
- Se finalizó la amenlación
- Se está coordinando el tema de la grúa para desplazar el módulo.

6.20. Simón Bolivar:
- Mañana está la brigada de bebederos
- Están en brigada hoy de módulos, no se evidencia trabajo previo a la pintura (lijado, limpieza). Se recomienda revisar el acabado, revisar los rayones y demás, se debe hacer el proceso adecuado de lo contrario no se podrá recibir.

6.21 PRD - Niños:
- En el arenero ayer faltaban 4 viajes de grauilla, con esto queda lleno para instalar el geotextil.
- La arena no se ha empezado a suministrar.
- Se aclara que se debe tener contingencia por Semana Santa, se solicita al contratista revisar las condiciones de trabajo
- El IDRD manifiesta que probablemente la administración no permite ingreso de vehículos al parque por Semana Santa.
- El parqueadero ya se instaló asfalto.
- En PRD se finalizó cocina.
- El tablero de PRD se instaló, pendiente la "cubierta"
- Sigue pendiente la conexión de las areneras antiguos.

6.22. Alta Blanca:

TEMAS TRATADOS

- Se entregó la intervención de acuerdo con lo pactado.

6.23 San José de Bavaria:

- Se aplicó anticorrosivo y se inició con pintura.

6.24. Servitá:

Finalización obras el 27 de marzo.

* Se solicita revisar si hay más máquinas afectadas en San José de Bavaria.

6.25. Vallas

- Inicialmente eran 52 vallas, ya se instalaron 42
- Se aumentaron 9 vallas, para 62 vallas aprox.
- Se está instalando la de la emergencia en San Cristóbal.
- Se está trabajando en PTAR, se finaliza hoy.
- La otra cuadrilla está en Sereno.
- En florida es estructura y láminas, se solicita avisar cuando se realice la actividad.
- Todas las vallas deben quedar de 6x.3

6.26. Señales piscina:

- El día de hoy el IDRD remitió los diseños que hacen falta, se solicita revisar lo correspondiente.

6.27. Precios no previstos:

- El acta de NP 6 ya se suscribió y se remitió por la entidad.
- El acta de NP 7 se remite el día de hoy con la información de los ascensores.
- Se está realizando la subsanación de las cotizaciones.

* Se solicita que las actas parciales se entreguen en físico el día siguiente del trámite digital del IDRD.

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Fraguo – Pruebas humedad Placas | Contratista | Pendiente. |
| UDS - Eléctrico beisbol (Finalizaoión) | Contratista | 13-03-24 |
| UDS - Softbol (Inicio) Eléctrico | Contratista. | 14-03-24 |
| Servitá - Eléctrico (Inicio) | Contratista | 14-03-24. al 22-03-24. |
| Niños - Inicio eléctrico | Contratista | 14-03-24. |
| Cayetano Cañizares - Inicio | Contratista | 18-03-24 |
| Novios - Conexión módulos | Contratista | 29-03-24. |
| UDS - Softbol - Contingenua | Contratista | 20-03-24. |
| Novios - Desplazamiento módulo | Contratista | Próx Semana. |
| Niños - Terminación giavilla | Contratista | 15-03-24 |
| Niños - Inicio arena | Contratista. | 18-03-24 |
| Niños - Contingencia semana Santa | Contratista | Próx Comité. |
| Niños - Conexión areneras anhguas. | Contratista | Próx Comité. |
| Servitá - Finalizaoión | Contratista | 27-03-24. |
| Niños - Plano demarcación parqueadero | Contratista | Próx Comité. |
| San José de Bavaria - Revisión maquinas | Contratista | 14-03-24. |
| Acta NP 7 | Interventoría | 13-03-24 |
| Radicación informes mensuales | Contratista | 15-03-24. |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | | |
| Observaciones | | | | | |
| | | | | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen Algeciras | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algeciras Castro | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora Interventoría | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algeciras Castro. |
|---|---|



847
~~734~~

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Calidad - Subsanación informe mensual | Contratista | 14 - 03 - 24 |
| Calidad - Resultado prueba estanqueidad | Contratista | 15 - 03 - 24. |
| Calidad - Informe llenos tanque | Contratista | 15 - 03 - 24. |
| Calidad - Ensayos arena | Contratista | 14 - 03 - 24. |
| Calidad - Manuales de mantenimiento | Contratista. | 19 - 03 - 24. |
| Calidad - Subsanación plan adquisiciones | Contratista | 15 - 03 - 24 |
| Social - Entrega BMX Tunal | Contratista | 15 - 03 - 24. |
| Social - Informe antes y después BMX Tunal | Contratista | 19 - 03 - 24. |
| Social - Reunión de avance Fragua. | Contratista | 20 - 03 - 24. |
| Ambiental - Cruce cantidades con comp. calidad | Contratista | 15 - 03 - 24. |
| Planos record - 1 eléctrico / 1 civil | Contratista. | 18 - 03 - 24 |
| Técnico - Informes apantallamiento | Contratista | 15 - 03 - 24. |
| Nacional - Instalación juegos (finalización) | Contratista | 15 - 03 - 24. |
| Fontanar - Inicio nivelación ParKour (Primero Tunal, después Fontanar) | Contratista | 25 - 03 - 24 (Fontanar) 15 - 03 - 24 (Tunal). |
| Tunal - Subsanación observaciones | Contratista | 15 - 03 - 24. |
| Tunal - Realización solicitudes adicionales | Contratista | Pendiente. |
| Illimani - Presupuesto adecuación electrica interna módulo | Contratista | 19 - 03 - 24. |
| Tunal - Ruta de la vida junto a ParKour | Contratista | 15 - 03 - 24. |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | |
| Observaciones | | | | |
| | | | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen Algeciras | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algeciras C. | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora interventoria | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algeciras Castro. |
|---|---|

## COMPROMISOS

| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LIMITE PARA SU REALIZACIÓN |
|---|---|---|
| Eduardo Santos - Entrega baños | Contratista | 18 - 03 - 24. |
| Listado de compras pendientes | Contratista | 15 - 03 - 24. |
| Villa Alemana. - Entrega | Contratista | 21 - 03 - 24 |
| Virrey Sur - Entrega (pendiente tapas) | Contratista | Próx Semana. |
| Gilma Jimenez - Finalización cuarto (casola transformador) | Contratista | 19 - 03 - 24. |
| Gilma Jimenez - Instalación transformador | Contratista | 26 - 03 - 24. |
| Emergencia - Tercer Milenio (Finalización) | Contratista | 22 - 03 - 24. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | | |
| Observaciones | | | | | |
| | | | | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen Algecuras | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algecuras Castro | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora interventoria | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algecuras Castro. |
|---|---|

GOBIERNO DE BOGOTÁ

**LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN**

EVENTO: Comité de seguimiento #22 COP 3099/23 FECHA: 13 03 2024

HORA INICIAL: 10:00 am HORA FIN: 2:00 pm LUGAR: Parque Metropolitano Simón Bolívar

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| 1 | Rodney Gonzalez Donado | Ing Res. Obra. | Contratista | | Contratista | rodneygd19@hotmail.com | 300 [illegible] |
| 2 | Andrés Pulido | Coordinador. | Contratista | | contratista | c.parquesbog@gmail.com | 3[illegible]3270 |
| 3 | Andrea Fernanda Vacca | Coordinadora | Contratista | | Contratista | andreavaccaq@gmail.com | 3163690918. |
| 4 | Luz Stella Quintero R. | Resid Obra | Contratista | | Contratista | admparques3@gmail.com | 3163516849 |
| 5 | Johan L. Cuellar S | Residente Ingeniero | Interventoría | | Solium SAS | | 3203857267 |
| 6 | Nelfer Arturo Nossa Camargo | Coord. Emergencias | Contratista | | Consorcio | nelfer-nossa2@hotmail.com | 320365370 9. |
| 7 | Vianney Leano | Ing Calidad | Interventor | | Solium | proyectos2@solium.co | 3103249803 |
| 8 | Edna Constanza Giraldo | Directora. | Interventoría | | Solium. | proyecto@solium.co | 3012440322 |
| 9 | Angelica Ramos Hernandez | Apoyo Juridico | SIP | | IDRD | — | — |
| 10 | Diana Cardona Santamaria | Residente Ambiental | Contratista | | Contratista | residenteambiental.parques@gmail.com | 3202699946 |
| 11 | Mónica Rodriguez Garcia | Ing Calidad | Contratista | | C. Parques Bog | c.parquesbog@gmail.com | 3103376144 |
| 12 | Ingrid Catherine Baez S | Ing SST | Contratista | | C. Parques Bog | residentesst2019@gmail.com | 3023509513 |
| 13 | Yessica Padilla | Trabajadora social | Contratista | | C. Parques Bog | ingpmparques2019@hotmail.com | 3213965517 |
| 14 | Yinetth Cruz Bermudez | Prof. SST | Interventoría | | Solium Ingeniería | yinethcruz2@gmail.com | 3224552545 |
| 15 | Raul Andres Gualtero | Inspector. | Interventoría | | Solium | rgualtero2@hotmail.com | 3125242426 |
| 16 | FERNANDO [illegible] | RESIDENTE | INTERVENTORIA | | SOLIUM COLOMBIA SAS | proyectos2@soliumsas.co | 3134926632 |
| 17 | Andres Cordoba | Inspector | Interventoria | | Solium | — | 3144374991 |
| 18 | Julieth Contreras Contreras | Inspector | Interventoria | | [illegible] | C.Parques.Bog@gmail.com | 3213850780 |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTIÓN DOCUMENTAL -V.4

BOGOTÁ

**LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACIÓN**

EVENTO: Comité de seguimiento # 22 COP 3099/23 FECHA: 13 03 2024

HORA INICIAL 10:00 am HORA FIN. _____ LUGAR Parque Metropolitano Simón Bolívar.

| | | | | | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | ENTIDAD | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| 1 | Diana Aragon C | Ingeniera civil | Contratista | | contratista | | 3003623678 |
| 2 | Hamby Peñaloza S | Profesional PMP | Contratista | | contratista | | 3134763174 |
| 3 | Karen Adriana Algecuras Castro | Inspectora | Interventoria | Karen A. | Soliun Ing | proyectos2@soliunsas.com | 7653016 |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier dependencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales, atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos



8449

BOGOTÁ

| Si no maneja contraseña colocar N.A | COMITÉ/REUNIÓN: Comité de seguimiento # 21 COP 3049123 Cto Int 3131/23 | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|---|
| ACTA No. | | 6 | 03 | 2024 |

LUGAR: Parque recreodeportivo el salitre - PRD HORA DE INICIO: 10:00 a.m. HORA FIN:

**ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Se anexa listado de asistencia | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**ORDEN DEL DIA**

| | |
|---|---|
| 1. Componente ambiental | 4. Componente calidad |
| 2. Componente social | 5. Componente técnico |
| 3. Componente SST | 6. |

**TEMAS TRATADOS**

1. Aprobación acta anterior:
Se aprueba el acta pues no existen observaciones.
2. Componente ambiental:
- Se tenía como compromiso revisar la norma ambiental aplicable al proyecto para el tema de la trazabilidad RCD, se confirmó en la capacitación que se tuvo con la SDA que la norma aplicable es la 1257 de 2021, pues debe tomarse con la fecha de acta de inicio del contrato.
- Se solicita por parte de la supervisión realizar mesa de trabajo con la profesional ambiental de IDRD para verificar estos temas.
- Se recibió el informe #6 del contratista y se respondió con observaciones, lo más importante es aportar todas las certificaciones tanto de RCD como de materiales pues se está realizando el cruce con la trazabilidad y no se ha evidenciado correspondencia. Se solicitan todas las certificaciones con corte a 31 de enero de 2024, para mes de febrero se pueden allegar vales o copia de las solicitudes de certificación.
- En cuanto al tema de las abejas ya se realizó el procedimiento con la empresa correspondiente, todo conforme a la fecha, para iniciar con

**TEMAS TRATADOS**

las actividades eléctricas.
- Se evidencia cerramiento y señalización de los espacios, se solicita manejar el tema de los RCD agrupar para que no se vea desorden, se solicita fortalecer las actividades de orden y aseo, se solicita que esta actividad sea constante y no sólo cuando se solicita en comité.
- Se solicita verificar el estado del trámite del cargue de la información en SDA. A la fecha no se ha cargado información, debería cargarse lo correspondiente al último trimestre de 2023, sólo que aún faltan algunas certificaciones, por lo cual se solicita al contratista la remisión de la información. Se presenta demora en este cargue de información por la transición normativa que se presenta en el momento y la SDA hasta la semana pasada realizó la capacitación correspondiente.
- En cuanto al gestor con permiso de operación y documentos de la ciudad de Cali, se recomienda por parte de interventoría usar un gestor local, para reportar en SDA o CAR que cumpla y esté en el directorio de dichas entidades.
- Se solicita la radicación de los informes mensuales.

3. Componente SST:
- La interventoría en recorrido verifica la vinculación de 75 trabajadores al proyecto
- En PRD concha de baloncesto no se evidencian trabajadores, en la zona de parqueadero no se evidencia avance, no hay rendimiento en esta zona.
- En la zona de arena hay 8 trabajadores, se aclara que la observación no es que no haya personal sino que se presenta problema de suministro por lo cual no se evidencia avance.
- El contratista reporta con los demás frentes de trabajo 93 trabajadores.
- Se recibió el informe mensual del contratista y se remitieron observaciones el día viernes, el contratista manifiesta que hoy subsanará la correspondiente
- La semana pasada se remitió el procedimiento para el tema de las abejas, el viernes se intervino nuevamente el poste pues no salieron todas las abejas. Se solicitó al administrador del parque que no se use la concha lunes, martes y miercoles. Se aclara que el espacio ya está disponible para las actividades de este contrato.
- Se solicita acompañamiento del coordinador para todas las actividades de

TEMAS TRATADOS

trabajo en alturas. El contratista manifiesta que ya implementó esta medida en los frentes de obra.

4. Componente social:

- Se realizó acta de entrega de PPP con Biblored.
- La reunión para la huerta de Ciudad Montes se programó para mañana.
- La reunión final se realizará la próxima semana.
- Ya se encuentra aprobado el informe mensual # 6 del contratista.
- Fragua: Pendiente programación de reunión para el alcance de acuerdo con lo pactado.
- No se han allegado las actas de puesta en servicio de Hippies y Simón Bolivar. Se aclara que Simón Bolivar no está listo para entrega, se cancela la reunión de hoy en la tarde con la administradora.
- De Villa de los Alpes se recibió con acta de puesta en servicio, se solicita la remisión. La puesta se realiza acta el día de hoy.

5. Componente calidad:

- Compromisos:
- Entrega de los ensayos de recicladas industriales, se recibió unicamente de subbase, el contratista aclara que no está usando base de recicladas industriales.
- No se ha recibido la subsanación del PIE, se aclara que se remitió el informe por parte del contratista el día de hoy en la mañana para revisión.
- Se remitieron las observaciones a los manuales de mantenimiento allegadas.
- Se aclara que se programa auditoria interna para el 22 de marzo, porques Fragua, UDS, Simón Bolivar.

Se informa por parte de interventoria que la Ing electricista se encontrará acompañando el contrato de forma virtual, pues estará incapacitada a partir del 13 de marzo de 24. Se designará un inspector para el tema eléctrico.

- Se reitera la solicitud de reporte de materiales de cantera, se solicita revisar con las remisiones. Se recuerda que todos los soportes deben coincidir.
- El informe de calidad se recibió y se emitieron observaciones al mismo el contratista manifiesta que subsana lo correspondiente esta noche.
- La documentación de los proveedores se enviará apartir del informe.

TEMAS TRATADOS

- El contratista informa que el Directa de obra se encuentra incapacitado por un mes, debido a un accidente en bicicleta.
- El listado de materiales no es acorde a la realidad, se solicita realizar el ajuste correspondiente.
- Fallan ensayos de base y subbase de construtor
- Se solicitan las densidades de la concha y ensayos del 1350.

6. Componente técnico:

* Simón Bolívar: Se deben pintar los módulos de yus, porque sólo se pintaron de rojo, se solicita tener presente que se iba a realizar la entrega y no fue posible porque no se encuentran las obras en debida forma. El contratista manifiesta que subsanará lo correspondiente y tomará las medidas a las que haya lugar.
- Se revisarán los registros para el funcionamiento de los bebederos, para dar presión mediante algun accesorio.

* PRD - Niños:
- Se está remolando el muro de la concha de tenis.
- La conexión de tableros se está realizando hoy
- El asfalto se realizó en la concha el lunes pasado, pendiente demarcación para dentro de 20 días.
- Se presenta atraso en el porqueterio
- La grauilla de la zona de arena no ha finalizado.
- La arena se finalizaría el 21.
- El contratista remitirá hoy fecha de entrega de las estructuras móviles.
- Las conexiones de las conchas antiguas no se ha realizado, no se cumplió el compromiso.
- El tema eléctrico se iniciará el 26-3-24.
- En PRD falla que dejen definitivo la emergencia.
- En PRD el tema electrico en la admon, baño cafeteria ya se iniciaron las actividades.

* UDS:
- Se están desmontando luminarias en Softbol
- Se instaló tubería y cableado para el apantallamiento.
- En beisbol se desmontaron las luminarias, se instaló tubería y cableado

TEMAS TRATADOS

para el apuntallamiento, se estaban realizando perforaciones a las estructuras existentes para instalar las luminarias el día de hoy.

- La interventoría presta el apuntador con sus accesorios para orientación de las luminarias.
- Se recuerda que no se autoriza retirar ningún Manlift hasta que se terminen las actividades.

* Navios.
- Se está formaleteando la viga de cimentación para fundir mañana
- Pendiente arreglo de baños.
- La próxima semana se montaría el módulo
- Se solicitan muestras del contrato.

* Alta Blanca:
- Se debe entregar el martes.
- El fin de semana se funde el piso.

* Rio Negro:
- Se finalizaron actividades
- El día de hoy se realiza el acta. Se recuerda que el acta se debe realizar el día que se finalicen las obras.

* Hippias:
- Se entregó y se suscribió acta.

Virrey Norte:
- Se entregó y se suscribió acta.

* San José de Bavaria:
Inicia el lunes.

* Sevilla:
- Se están instalando las tapas, se solicita cubrir el cable.
- Hoy llegó la escalera, para inicio de desmonte de luminarias.

* Portal:
El contratista entrega los soportes de Fontanar y Tunal, se solicita la traducción de los documentos.
- Los diseños de piso aprobados se remiten al grupo de seguimiento del contrato

En cuanto al avance del contrato se aclara:

**TEMAS TRATADOS**

·1. Programado: 78%. Atraso. 15%.

·1. Ejecutado: 63%.

Se informa que se realizó una revisión interna y el atraso es del 3%, se evidencia que project está marcando un valor más alto para el %c programado, se revisará la línea base.

El contratista informa:

·1. Programado: 63,24%. ·1. Atraso: - 1%

·1. Ejecutado: 62,28%.

No obstante, la interventoría manifiesta que se seguirá realizando el reporte con la programación como está hasta tanto se allegue la actuación técnica correspondiente. El contratista manifiesta que revisará la línea base de la programación desde cero, información que se allegará el viernes.

* Bosque San Carlos.
- Se está fundiendo la viga zuipa.
- El martes se extiende base.
- Ya llegó la baranda y los módulos, se instalaron los biosaludables.

* Primero de mayo:
- Se realzó reunión el día lunes para definir el tema de los dados.
- Los postes ya se encuentran en el escenario
- Se solicita calcular la simulación con la nueva ubicación de los postes

* Nacional.
- Se instalan las piezas el día de mañana.

* Canal Boyacá:
- En ejecución, se cuenta con material, se realizó la topografía.
- Se está haciendo excavación de dados y bordillos.

* Fontanar del Río:
- Parkour llega el 23, 1 semana antes se hace nivelación.
- Vidrio se instala el día de mañana.

* Tunal:
- Ya están terminadas las porterías 2 y 4) (3)%.
- Portería 3 en subsanación de observaciones de manto



852

| TEMAS TRATADOS |
| --- |
| - Se está emprudizando |
| - Se entregaría el martes |
| - El policarbonato ya llegó. |
| - Adulto mayor se entregaría el martes |
| - Los senderos se están finalizando, se instalaron las bancas. |
| - Tunal para pintura de bios junto a ParKour se tendrá jornada el sábado. |
| - El parKour llega el 15 de marzo |
| - Se aprueba la propuesta de implantación de ParKour Fontanar y Tunal, sólo se requiere la traducción de los documentos. |
| * Cayetano: |
| - Pendiente obras eléctricas |
| * Fiagua: |
| - Se estan instalando bordillos |
| - El asfalto será fundido el próximo martes |
| - La propuesta de sintético está pendiente por remitir |
| - Se solicita orden y aseo. |
| * Illimani: |
| - Sigue atrasado, el proveedor no ha ingresado, tiene fecha de entrega mañana. |
| * Nuevo Muzú: |
| - Pendiente complemento puerta ornamentación y pintura de baranda |
| * Virrey Sur: |
| En subsanación de observaciones, se entregaría el martes. |
| * Villa Alemana: |
| Se entregaría el próximo viernes. |
| * La victoria: |
| Ya se pinto la administración, pendiente cubierta y rejas módulo de administración. Se finalizaría después del 15 de marzo. |
| * Gaitan Cortés: |
| Pendiente piezas que están en fabricación |
| * Emergencias: |
| Se está atendiendo la emergencia de tercer Milenio |
| * Vallas: |

TEMAS TRATADOS

- Se han instalado 26 vallas, pendiente acta de puesta en servicio. El recorrido lo programaron para el miercoles (recibo).

- Se solicita actuar si aún hay reparos en el ítem de instalaciones hidraulicas, el contratista manifiesta que revisará lo correspondiente.

- Informes de los apuntallamientos, se entregarian el 15.
- Estudio técnico - económico Gilma, UDS, Servitá.
- La fotometria está en revisión de interventoria.

Se recuerda que de acuerdo con lo definido por la entidad el acta parcial del 1 de abril es la última del contrato, se solicitan los memorias de cuantificación.

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| Ambiental - Mesa de trabajo proj amb IDRD | Contratista - Interv - IDRD | 18: Definir |
| Ambental - Aseo, orden - Recolección RCD | Contratista | 8-3-24. |
| Social - Fraguas - reunión de avance | Contratista | Pendiente |
| Calidad - Auditoria interna | Contratista - Interv | 22-3-24 |
| Calidad - Listado de materiales corregido | Contratista | 8-3-24. |
| Calidad - Ensayos constituror | Contratista | 7-3-24 |
| Calidad - Ensayos cancha baloncesto PRD | Contratista | 8-3-24. |
| Calidad - Prueba estanqueidad | Contratista | 7-3-24 |
| Calidad - Ensayos materiales lleno tanque | Contratista | 7-3-24. |
| Simón Bolivar - Entrega baños | Contratista | 9-3-24. |
| Simón Bolivar - Entrega obras | Contratista | 11-3-24. |
| Niños - Finalización gravilla | Contratista | 13-3-24. |
| Niños - Finalización arena | Contratista | 21-3-24. |
| Niños - Fecha entrega estructuras móviles | Contratista | 7-3-24. |
| Niños - Certificados tableros y ensayos arena Peldar | Contratista | 8-3-24. |
| Niños - Inicio eléctrico | Contratista | 26-3-24. |
| PRD - Conexión definitiva emergencia (entrega). | Contratista | 12-3-24 |
| PRD - Entrega componente electrico | Contratista | 12-3-24 |

| EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ¿Se logró el objetivo? | SI | X | NO | | |
| Observaciones | | | | | |
| | | | | | |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen Algeciras | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algeciras C | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora Interventoria | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIEN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algeciras Castro |
|---|---|

| COMPROMISOS | | |
|---|---|---|
| TEMA | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN |
| UDS - Eléctrico / Entrega beisbol | Contratista | 14 - 03 - 24. |
| UDS - Eléctrico / Softbol - Terminación | Contratista | 21 - 03 - 24 |
| Navios - Entrega Cimentación | Contratista | 8 - 03 - 24 |
| Navios - Montaje módulo | Contratista | 15 - 03 - 24 |
| Navios - Montaje túnel | Contratista (12-3-24) | Por Definir |
| Alloblanca - Entrega | Contratista | 12 - 3 - 24. |
| San José de Bavana - Inicio | Contratista | 12 - 3 - 24. |
| Seruló - Finalización obras eléctricas | Contratista | 27 - 3 - 24. |
| Gilma Jimenez - Transformador | Contratista | 18 - 3 - 24. |
| Fraguo - Asfalto | Contratista | 12 - 3 - 24 |
| Cronograma revisado | Contratista | 8 - 3 - 24. |
| Primero de mayo - Simulación | Contratista | 8 - 3 - 24 |
| Primero de mayo - Inicio obra eléctrica. | Contratista | 18 - 3 - 24. |
| Primero de mayo - Finalización obra eléctrica. | Contratista | 26 - 3 - 24. |
| Tunal - Entrega | Contratista | 12 - 3 - 24 |
| Tunal - Pintura bics junto a ParKour | Contratista | 9 - 3 - 24 |
| Tunal - ParKour | Contratista | 15 - 3 - 24. |
| Coyetano - Inicio eléctrico | Contratista | 13 - 3 - 24. |
| **EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN** | | |
| ¿Se logró el objetivo? | SI [X] | NO [ ] |
| **Observaciones** | | |
| Illmani - Terminación | Contratista | 8 - 3 - 24. |
| Informes apantallamiento | Contratista | 15 - 3 - 24 |
| Estudios tecnico - económico | Contratista | 8 - 3 - 24. |
| Planos retenc | Contratista | 8 - 3 - 24. |

Siendo las _____ se da por terminado el comité/reunión, en constancia firman:

| PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIÉN CONVOCA | | SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación colocar N.A. | | |
|---|---|---|---|---|
| FIRMA | | FIRMA | Karen A. | |
| NOMBRE | | NOMBRE | Karen Adriana Algeciras C. | |
| CARGO | | CARGO | Inspectora interventoría | |

| NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: | Karen Adriana Algeciras Castro. |
|---|---|

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE DIVULGACION

EVENTO: Comité de seguimiento # 21 COP 3099123 FECHA: 06 03 2024

HORA INICIAL: 10:00 am HORA FIN: _____ LUGAR: PRD.

| No. | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENTIDAD | CORREO ELECTRONICO | TELEFONO |
| 1 | NAIRU ESPINOSA MERA | RES AMBIENTAL | INTERVENTORIA | | SOLUNG | | |
| 2 | Yenny Paola Reyes C. | Ing. Hidráulica | Interventoría | | Solun Ing. | proyectos@solunsas.com | 3144779[illegible] |
| 3 | Edna Constanza Cepeda | Directora | Interventoría | | Solun Ing | proyectos@solunsas.com | 3017411351 |
| 4 | Yineth Cruz Avendaño | Prof. SST | Interventoría | | Solun Ing | yinethcruzavendano@gmail.com | 3221557[illegible] |
| 5 | Mónica Rodriguez Cano | Ing. Calidad | Contratista | | Con PBG | pmpmbog@gmail.com | 3103376149 |
| 6 | Yesica Agudelo G | Res. Social | Contratista | | Con PBG | gsgoques@gmail.com | 3213907[illegible] |
| 7 | Yulieth Cardenas Contreras | Inspector | Contratista | | Consorcio Parques | Parques6a@gmail.com | 3298607[illegible] |
| 8 | Diana Catalina Santamaria Segura | Residente Ambiental | Contratista | | Consorcio Parques | parques6a@gmail.com | 3202[illegible] |
| 9 | Nelly Antonio Nossa Camelo | Ing. Ambiental | Contratista | | Consorcio Parques 6a | nelly.nossa@hotmail.com | 3001655[illegible] |
| 10 | Sebastian Salamanca Santamaria | Profesional Apoyo | Contratista | | Consorcio Parques | cpsanchez.pg@gmail.com | 3212624315 |
| 11 | Jose Luis Ortiz Rodriguez | Ing Obra | Contratista | | [illegible] | [illegible] | 3[illegible] |
| 12 | Ingrid Rocio Sandoval | Residente SST | Contratista | | residentesst@[illegible] | residentesst@gmail.com | 3023509[illegible] |
| 13 | FERNANDO GUARDIAGON | RESIDENTE | INTERVENTOR | | SOLUN SAS | proyectos2@solunsas.com | 3134912663 |
| 14 | Jhon Cuellar S. | RESIDENTE | INTERV. | | SOLUN SAS | — | 3203868027 |
| 15 | Angelica Ramos H | Apoyo supervisión | SDP | | IDRD | — | — |
| 16 | Vianney Leaño | Ing Calidad | Interventoría | | Solun | proyecto2@solunsas.com | 3103249803 |
| 17 | Diana Alayon Caballos | Ing Electricista | Contratista | | Consorcio Parques | [illegible] | 3[illegible] |
| 18 | LUIS ALBERTO MEDRANO | RECIPIENTE | INTERVENTORIA | | SOLUN ING. | — | 3[illegible] |

Con la suscripción del presente formulario, autorizo al IDRD así como a cualquier descendencia y/o área del Instituto, a realizar el tratamiento sobre mis datos personales con sujeción a lo establecido en sus Políticas de Protección de Datos Personales atendiendo a las finalidades en ellas señaladas. Las Políticas pueden ser consultadas en la página web del IDRD: https://www.idrd.gov.co/politicas-seguridad-y-proteccion-datos

GESTION DOCUMENTAL

LISTADO DE ASISTENCIA / REGISTRO DE SOCIALIZACIÓN

Comité de seguimiento # 24 COD 5099/23 FECHA: 06 03 2024

HORA INI. _____ LUGAR PRD

| | NOMBRE | CARGO | DEPENDENCIA | FIRMA | DILIGENCIAR POR ASISTENTES EXTERNOS AL IDRD | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | NOMBRE | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
| 1 | Pedro B | Asistente | Contratista | | | | |
| 2 | Raquel Bonchoun S | Presidente del | Consejo | | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] Pulido | Contribuidor | Contratista | | a. proyectos | a.proyectos@[illegible] | 3118243 |
| 4 | [illegible] Administrativa Algeciras Castro | Inspector | Interventoria | Karen A | Solen Ing | proyectos2@solensas.com | 7653016 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |

Cuando suministre sus propios formatos, asegure el IDRD pueda a cualquier dispositivo de [illegible] y [illegible] el tratamiento sobre sus datos personales con objetivos [illegible] establecidos en sus Políticas de Protección de Datos Personales, disponibles en los mecanismos en otros establecidos. La Política puede ser consultada en la página web del IDRD [illegible]

GESTIÓN DOCUMENTAL

855

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 19 | 03 | 2024 |
| Página | 1 de | 3 |

**CONTRATO No** 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

**PARQUE** SIMÓN BOLIVAR **CODIGO** 13 - 089 **DIRECCION** Av. Cra 68 N° 53-36

**LOCALIDAD** TEUSAQUILLO **VALOR CTO** $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

**CONTRATISTA** CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** SOLIUN INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

**SUPERVISOR** Coordinador : ANGELICA ROMERO (Escriba el nombre del supervisor designado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION A | | |
| LOS BAÑOS DEL MÓDULO "SURTIPOLLO" | | |
| EN EL PARQUE SIMÓN BOLIVAR SE | | |
| HACE ENTREGA A LA ADMINISTRACION | | |
| DEL PARQUE LO SIGUIENTE : | | |
| - MANTENIMIENTO EN BAÑO HOMBRES | | |
| LAVAMANOS (CAMBIO DE LLAVES PUSH) | UN | 4 |
| SANITARIOS (CAMBIO DE PUSH FLUXOMETROS) | UN | 1 |
| | | |
| - MANTENIMIENTO EN BAÑO MUJERES | | |
| LAVAMANOS (CAMBIO DE LLAVES PUSH) | UN | 2 |
| SANITARIOS (CAMBIO DE FLUXOMETROS) | UN | 4 |

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 19 | 03 | 2024 |
| Página | 2 de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE SIMÓN BOLIVAR CODIGO 13-089 DIRECCION Av. Cra 68 N° 53-36

LOCALIDAD TEUSAQUILLO VALOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| CAMBIO DE SIFONES LAVAMANOS | UN | 2 |
| CAMBIO DE ACOFLEX | UN | 1 |
| DESMONTE Y REINSTALACION DE | | |
| (8) POCETAS DE LAVAMANOS | UN | 8 |
| REVISION DE LLAVES LAVAMANOS | UN | 2 |
| RESANES Y PINTURA | $M^2$ | 2 |
| REMATE Y ENCHAPE CERAMICA MURO | $M^2$ | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

056

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 19 | 03 | 2024 |
| Página 3 | de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (tipo de contrato)

PARQUE SIMON BOLIVAR CODIGO 13-089 DIRECCION Av. Cra 68 N° 53-36

LOCALIDAD TEUSAQUILLO VALOR CTO $13.733.153.000 (indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (indique el valor de la inversión previsto para este parque)

### II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: ADRIANA MILENA OCAMPO ROJAS (Firma)

### III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

### III. ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| LUIS A. MEDRANO B | RESIDENTE INTERVENTORIA | CRA 70C # 48-33 6017653618 | 79396[illegible] |
| JOSE O. PEÑA | TOPOGRAFO | CRA 55 74-30 3133330018 | 3056320 |
| Luis Hernando Ar | Adm. Tec. IDRD | Av Cra 68 # 53-36 | |
| Adriana Ocampo R | Adm. Proy. ASG | Av Cra 68 # 53-36 | |
| | | | |

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 19 | 03 | 2024 |
| Página | 1 de | 3 |

**CONTRATO No** 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

**PARQUE** SIMON BOLIVAR **CODIGO** 13-089 **DIRECCION** Av. Cra 68 N° 53-36

**LOCALIDAD** TEUSAQUILLO **VALOR CTO** $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** (Indique el valor de la inversión pendiente para este parque)

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

**CONTRATISTA** CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** SOLIUN INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

**SUPERVISOR** Coordinador : ANGELICA ROMERO (Escriba el nombre del supervisor encargado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| SE REALIZA ENTREGA DE (37) TREINTA | | |
| Y SIETE CANECAS EN ACERO INOXI | | |
| DABLE EN DIFERENTES SECTORES DEL | | |
| PARQUE SIMON BOLIVAR. | | |
| EN BUEN ESTADO, FUNCIONAMIENTO | | |
| Y FUNDADOS EN DADOS EN CONCRETO | UN | 37 |
| / / / / | | |
| ENTREGA DE BARANDA METALICA UBI- | | |
| CADA EN COSTADOS ORIENTAL Y OCCIDEN- | | |
| TAL DEL TEMPLETE EUCARISTICO (LIJADO | | |
| RETIRO DEL ACABADO EXISTENTE, APLICACION | | |
| DE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL | | |

857

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 19 | 03 | 2024 |
| Página | 2 de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE SIMÓN BOLIVAR CODIGO 13-089 DIRECCION Av. Cra 68N 53-36

LOCALIDAD TEUSAQUILLO VALOR CTO $13.733.163.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

### I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| LA APLICACION DE ESMALTE COLOR | | |
| VERDE RAL | ML | 108.30 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 19 | 03 | 2024 |
| Página | 3 de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (tipo de contrato)

PARQUE SIMON BOLIVAR CODIGO 13-089 DIRECCION Av. Cra 68 N° 53-36

LOCALIDAD TEUSAQUILLO VALOR CTO $13.733.163.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión ejecutada para este parque)

### II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: ADRIANA MILENA OCAMPO RODRIGUEZ Firma

### III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

### III. ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| LUIS A. MEDRANO | RESIDENTE INTERVENTORIA | CRA 70C # 48-55 6011653016 | 1932[illegible] BF |
| JOSE A. ROA | RESIDENTE OBRA | CRA 55 - 44-36 | 3256[illegible] |
| Luis Hernando Ac[illegible] | Aux. Tér. [illegible] | Cra 68 N° 53-36 | |
| Adriana Milena Ocampo | Aux. Profesional | Cra 68 N° 53-36 | |
| | | | |

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 19 | 03 | 2024 |
| Página | 1 de | 3 |

**CONTRATO No** 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

**PARQUE** SIMON BOLIVAR **CODIGO** 13 - 059 **DIRECCION** Av. Cra 68 N° 53-36

**LOCALIDAD** TEUSAQUILLO **VALOR CTO** $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** (Indique el valor de la inversión planeada para este parque)

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

**CONTRATISTA** CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** SOLIUN INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

**SUPERVISOR** Coordinador : ANGELICA ROMERO (Escriba el nombre del supervisor designado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION A | | |
| LOS BAÑOS DEL MÓDULO "DELIEXPRESS" | | |
| UBICADO EN EL PARQUE SIMON BOLIVAR | | |
| SE HACE ENTREGA A LA ADMINISTRACION | | |
| DEL PARQUE LO SIGUIENTE : | | |
| - MANTENIMIENTO EN BAÑO MUJERES | | |
| LAVAMANOS (CAMBIO DE LLAVES PUSH) | UN | 1 |
| SANITARIOS (CAMBIO DE PUSH FLUXÓMETROS) | UN | 2 |
| | | |
| - MANTENIMIENTO EN BAÑO HOMBRES | | |
| LAVAMANOS (CAMBIO DE LLAVES PUSH) | UN | 3 |
| | | |

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 19 | 03 | 2024 |
| Página | 2 de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE SIMON BOLIVAR CODIGO 13-089 DIRECCION Av. Cra 68 N° 53-36

LOCALIDAD TEUSAQUILLO VALOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| RESANES DE PAÑETE Y PINTURA | $M^2$ | 1 |
| REMATE DE ENCHAPE CERAMICA MURO | $M^2$ | 1 |
| CAMBIO DE SIFONES LAVAMANOS | UN | 6 |
| DESMONTE Y REINSTALACION POCETAS | UN | 8 |
| REVISION DE LLAVES LAVAMANOS | UN | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

859
746

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 19 | 03 | 2024 |
| Página | 3 de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (tipo de contrato)

PARQUE SIMON BOLIVAR CODIGO 13-089 DIRECCION Av. Cra 68 N 53-36

LOCALIDAD TEUSAQUILLO VALOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

### II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: ADRIANA MILENA OCAMPO RODRIGUEZ Firma

### III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

### III. ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| LUIS A. MEDRANO B | RESIDENTE INTERVENTORIA | Cra 70C # 48-55 Gci K5 2016 | 1993/617 |
| Jose J. Peña | Res. Obra | Cra 55 #U-30 3133372419 | 329370 |
| Luis Hernando Arego | Adm. Te. IDRD | Av Cra 68 # 53-36 | |
| Adriana Ocampo R. | Adm. Proy. ACSB | Av. 68 #53-36 | |
| | | | |

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 14 | 03 | 2024 |
| Página | 2 de | 3 |

**CONTRATO No** 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

**PARQUE** SIMON BOLIVAR **CODIGO** 13-089 **DIRECCION** Av. Cra 68 N° 53-36

**LOCALIDAD** TEUSAQUILLO **VALOR CTO** $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** (Indique el valor de la inversión previsto para este parque)

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

**CONTRATISTA** CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** SOLIUN INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

**SUPERVISOR** Coordinador : ANGELICA ROMERO (Escriba el nombre del supervisor designado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| SE REALIZÓ EL CAMBIO DE LA RED DE AGUA | | |
| POTABLE PARA LOS BAÑOS DE HOMBRES DEL | | |
| MÓDULO EL CARBON DEL PARQUE SIMON BOLIVAR | | |
| SANITARIOS (PUSH) | UN | 5 |
| LAVAMANOS (GRIFERIA PUSH) | UN | 1 |
| ARREGLOS DE ENCHAPE CERAMICA MUROS PISO | $M^2$ | 16,50 $M^2$ |
| RESANES DE PINTURA MUROS Y TECHO | $M^2$ | 9 |
| REGISTROS DE 1 1/4" | UN | 1 |
| REGISTROS DE 1/2" | UN | 1 |
| TAPA REGISTRO PLÁSTICO | UN | 2 |
| PUNTO HIDRAULICO LAVAPLATOS COCINETA | UN | 1 |
| TORRETAS PARA ILUMINACION | UN | 3 |

960

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 14 | 03 | 2024 |
| Página | 2 de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE SIMON BOLIVAR CODIGO 13-089 DIRECCION Av Cra 68 N° 53-36

LOCALIDAD TEUSAQUILLO VALOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión previsto para este parque)

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| ACOFLEX PARA LAVAMANOS | UN | 2 |
| SIFON LAVAMANOS | UN | 1 |
| REJILLA TIPO CÚPULA METALICA CUBIERTA | UN | 3 |
| CAJA DE INSPECCION 80x80 | UN | 1 |
| DEMOLICION CAJA INSPECCION | UN | 1 |
| PLAZOLETA MÓDULO EL CARBON. | | |
| FUNDIDA CINTAS EN CONCRETO | ML | 5 |
| ADECUACION TABIETA CONCRETO | $M^2$ | 4 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 14 | 03 | 2024 |
| Página 3 | de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE SIMON BOLIVAR CODIGO 13-089 DIRECCION Av. Cra 68 N° 53-36

LOCALIDAD FUSAGASUGA VALOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

### II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: LIDUANA MILENA OCAMPO RODRIGUEZ Firma

### III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

EL DIA LUNES 4 DE MARZO DE 2024, SE ARREGLÓ EL PUSH DEL SANITARIO DE DISCAPACITADOS DEL WC DE MUJERES

### III. ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| LUIS A. MEDRANO | RESIDENTE INTERVENTORIA | CRA 70C # 48-55 Tel 6013942300 | |
| Luis H. Acero M. | Adm. Tec. PCS3 | 3184724873 | |
| Jose Ruiz | Residente Contratista | U 131 A 131-42 | |
| | | | |
| | | | |

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V2

861
748

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 14 | Marzo | 2024 |
| Página | 1 | de 3 |

**CONTRATO No** 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

**PARQUE** CANAL RIO NEGRO **CODIGO** 12-002 **DIRECCION** Calle 90 # 60 B-49

**LOCALIDAD** BARRIOS UNIDOS **VALOR CTO** $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

**CONTRATISTA** CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** SOLIUN INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

**SUPERVISOR** Coordinador : ANGELICA ROMERO (Escriba el nombre del supervisor encargado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION DE OBRA | | | |
| ENTRE CONTRATISTA, ADMINISTRACION DEL PARQUE Y | | | |
| LA INTERVENTORIA SE VERIFICAN LOS TRABAJOS | | | |
| REALIZADOS ASÍ: | | | |
| 1- SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS RODADEROS | | | |
| METÁLICOS UBICADOS ASÍ: | | | |
| DESLIZADERO 1 | DETRAS DEL CAI | UN | 1 |
| DESLIZADERO 2 | COMPOSTAJE FINAL DE LA VIA | UN | 1 |
| DESLIZADERO 3 | CANCHA MULTIPLE CERRAMIENTO | UN | 1 |
| DESLIZADERO 4 | CASTELLANA ZONA JUEGOS INFANTILES | UN | 1 |
| 2- DESMONTE DEL CERRAMIENTO EXISTENTE | | | |
| EN MALLA ESLABONADA POR COSTADOS | | | |

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 14 | MARZO | 2024 |
| Página | 2 | de 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (tipo de contrato)

PARQUE CANAL RIO NEGRO CODIGO 12-002 DIRECCION Calle 90 # 60B-44

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS VALOR CTO $13.733.153.000 (indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (indique el valor de la inversión ejecutada para este parque)

I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| SUR Y ORIENTAL DEL PARQUE. Y EL REEMPLAZO | | |
| POR NUEVO (PINTURA DE ACABADO)/VERDE RAL | | |
| 3. MANTENIMIENTO DE LOS TABLEROS DE | | |
| BALONCESTO Y DE LOS ARCOS DE LA CANCHA DE | | |
| MICROFUTBOL | JGO | 1 C/U. |
| 4- MANTENIMIENTO DE LA MALLA CONTRAINCENDIO | | |
| (REEMPLAZO DE LAS MALLAS DE LA ZONA INFERIOR) | | |
| RESARCIR LAS MALLAS ZONA SUPERIOR/PINTURA | | |
| 5- SUPLEMENTAR TUBERIAS DE SOPORTE DE LA | | |
| MALLA EN SITIOS DONDE ESTABAN PODRIDOS O | | |
| FALTANTES. | GL | 1 |
| 6- REALIZAR LA SOLDADURA PARA PUERTA DEL PARQUE | | |
| DONDE FINALIZA LA CALLE 91B (APLICACION DE UNAS PUNTAS | | |
| LA PUERTA ESTÁ CAIDA). | UN | 20 |
| 7- RESANES DE ALGUNOS PEDESTALES EN EL SITIO DE | | |
| PARALELO DEL ESTADAMIENTO EXTERIOR (CONCRETO) | GL | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

862
704

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 14 | MAR 20 | 2024 |
| Página | 3 de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (tipo de contrato)

PARQUE CANAL RIO NEGRO CODIGO 12-002 DIRECCION Calle 90 # 60B-49

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS VALOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión privada para este parque)

### II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? Si ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: JOHAN SEBASTIAN ESPINOSA Firma Sebastian Espinosa

### III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES:

### III. ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| LUIS A MEDRANO B | RESIDENTE INTERVENTORIA | CRA 70C # 48-33 TEL 6013447300 | [signature] 1.058.[illegible] |
| JOSE O. PEÑA | RESIDENTE SST | 4 1319 121-42 3112332738 | [signature] |
| Johan Espinosa | Administrador | CLL63 # 45 - 10 | Sebastian Espinosa |
| | | | |
| | | | |

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 13 | MARZO | 2024 |
| dd | mm | aaaa |
| Página | 1 de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE SIMON BOLIVAR / MANA CODIGO 13-089 DIRECCION Av. Cra 68 # 53-36

LOCALIDAD TEUSAQUILLO VALOR CTO $ 13733153000 (Indique el valor total del contrato) DIVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

**CONTRATISTA** CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** SOLIUN INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

**SUPERVISOR** Coordinador IDRD - ANGELICA ROMERO (Escriba el nombre del supervisor designado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| SE REALIZO CAMBIO DE FLUXOMETROS EN | | |
| SANITARIOS WC HOMBRES | UN | 4 |
| " WC MUJERES | UN | 5 |
| SANITARIO WC DISCAPACITADOS | UN | 1 |
| CAMBIO LLAVES PUSH LAVAMANOS | | |
| WC HOMBRES Y MUJERES | UN | 2 |
| AJUSTE DE TODAS LAS LLAVES DE PUSH | | |
| EN LAVAMANOS | UN | 9 |
| CAMBIO ACOPLES LAVAMANOS | UN | 2 |
| RESANES Y DETALLADA PANETES | | |
| ENCHAPES EN LAS AREAS DONDE SE | | |
| INTERVINO. | GL | 1 |
| DESTAPADA DE DESAGUE LAVAPLATOS | | |
| EN COCINETA DEL MODULO | | |
| REVISION CAMBIO DE BOMBILLOS PASO A | | |

863

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 13 | MARZO | 2024 |
| dd | mm | aaaa |
| Página | 1 de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE SIMON BOLIVAR/MANA CODIGO 13-089 DIRECCION Av. Cra 68 # 53-36

LOCALIDAD TEUSAQUILLO VALOR CTO $ 137331530000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

| | | |
|---|---|---|
| LUMINARIAS TIPO TORTUGA, SE REALI | | |
| ZON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA | | |
| S/U DE LOS APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANO | | |
| A SATISFACCION. | | |

### II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: ADRIANA MILENA OCAMPO R Firma

### III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 13 | MARZO | 2024 |
| dd | mm | aaaa |
| Página | 1 de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE SIMON BOLIVAR / MONA CODIGO 13-069 DIRECCION Av Cra 68 # 53-36

LOCALIDAD TEUSAQUILLO VALOR CTO $ 13733.153.000 (Indicar el valor total del contrato) DIVERSION PARQUE (Indicar el valor de la inversión prevista para este parque)

III. ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| LUIS A. MEDRANO | RESIDENTE INTERVENTORIA | Cra 70c # 48-55 | |
| JOSE A. PEÑA | RESIDENTE OBRA | CL 131A 121-42 | |
| Adriana M. Ocampo | ADMON RESB-IDRD | Cra 60 # 57-65 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



864
757

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| | MARZO | |
| 13 | MAR 20 | 2024 |
| Página | 1 de | 4 |

**CONTRATO No** 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

**PARQUE** SIMÓN BOLÍVAR **CODIGO** 13- 089 **DIRECCION** Avenida Carrera 68 #53-36

**LOCALIDAD** Teusaquillo **VALOR CTO** $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, . ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

**CONTRATISTA** CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** SOLIUN INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

**SUPERVISOR** Coordinador : ANGELICA ROMERO (Escriba el nombre del supervisor asignado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN DE | | |
| LOS TRABAJOS REFERENTES A LA INSTA- | | |
| LACION Y SUMINISTRO DE LOS BEBE- | | |
| DEROS SE HACE LA ENTREGA DE | | |
| ESTOS UBICADOS EN DIFERENTES | | |
| SECTORES DEL PARQUE. | | |
| BEBEDEROS : | | |
| 1 - CARBON | UN | 1 |
| 2 - CABAÑA | UN | 1 |
| 3 - OVALO | UN | 1 |
| 4 - OVALO | UN | 1 |

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| | ENERO | |
| 13 | MAQ 20 | 2024 |
| Página | 1 de | 4 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR CODIGO 13-089 DIRECCION Avenida Carrera 68 #53-36

LOCALIDAD Teusaquillo VALOR CTO $13.733.163.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión privada para este parque)

### I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| 5-INFANTIL N° 1 | UN | 1 |
| 6-PUESTO MANDO UNIFICADO | UN | 1 |
| 7-ADOQUINADO ANEXO CERCA A CASETA 27 | UN | 1 |
| 8-INFANTIL N°3 PISTA DE TROTE | UN | 1 |
| 9-INFANTIL N°3 AL INTERIOR | UN | 1 |
| 10-INFANTIL N°3 COSTADO OCCIDENTE | UN | 1 |
| 11-POZO PROFUNDO TEMPLETE | UN | 1 |
| 12-ADOQUINADO ANCHO TEMPLETE | UN | 1 |
| 13-PISTA DE TROTE PUERTA 7 | UN | 1 |
| 14-INFANTIL N°2 | UN | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

865
752

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| | ENERO | |
| 13 | Marzo | 2024 |
| Página | 1 de | 4 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR CODIGO 13- 089 DIRECCION Avenida Carrera 68 #53-36

LOCALIDAD Teusaquillo VALOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

**II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO**

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: ADRIANA MILENA OCAMPO RODRIGUEZ Firma

**III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES**

2. CABAÑA : Revisión sin fluido de agua.
4 OVALO : baja presión.
8. INFANTIL #3 PISTA TROTE : Detallar pintura y esposueco bordillos
9. INFANTIL #3 AL INTERIOR : sin fluido de agua / tubo roto solicitan adecuación para suministro de agua al bebedero
11. POZO PROFUNDO TEMPLETE : falta tapa registro en concreto.
13. PISTA TROTE PUERTA 7 : Detallar muro remate / pintura.
14. INFANTIL N°2. : Grifería tapada / registro tiene fuga

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| | ENERO | |
| 13 | MARZO | 2024 |
| Página | 1 de | 4 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE SIMÓN BOLÍVAR CODIGO 13-089 DIRECCION Avenida Carrera 68 #53-36

LOCALIDAD Teusaquillo VALOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) DIVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

III. ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| LUIS A MEDRANO S | RESIDENTE INTERVENTORIA | Tel 6ci 3174230C Cra 70C # 48-53 | |
| JOSE D REÑA | RESIDENTE OBRA | 3123726428 Cl 131 a 101-42 | |
| Adriana Ocampo | APOYO PCSS IDRD | Cra 60 # 57-65 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS -V2

866

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| | MARZO | |
| 12 | 3 | 2024 |
| Página | | de |

**CONTRATO No** 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

**PARQUE** ALTA BLANCA **CODIGO** 01-095 **DIRECCION** Carrera 8A #158-04

**LOCALIDAD** USAQUEN **VALOR CTO** $ 13 733 153 000. (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** — (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

**CONTRATISTA** CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** SOLIUN INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

**SUPERVISOR** Coordinador IDRD - ANGELICA ROMERO (Escriba el nombre del supervisor encargado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| . Cambio de canal en PVC (Costado Norte) | | |
| Instalacion de orinal seco en WC | UN | 1 |
| -Templada de malla electrosoldada | | |
| en Tramos del Costado norte, oriental y sur | TRAMO | — |
| -Cambio de angulos y platinas que se | | |
| encontraron podridas en un sector del | | |
| cerramiento. | ML | — |
| - Reposicion de tubos (encamisado) soportes | | |
| de la malla de cerramiento por costado sur. | UN | — |
| . Revision de fluxometro en WC lavamanos | | |
| - Arreglo de humedad por goteras de | | |
| cubierta en Admon (oficinas y cocineta) | GL. | — |
| - Pintura de muros y cielorraso en cocineta | M² | — |
| - Limpieza de canales ubicadas en cubierta Admon | | |
| . Recuperacion de areas afectadas por | | - |

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| | MARZO | |
| 12 | 3 | 2024 |
| Página | de | |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE ALTA BLANCA CODIGO 01-075 DIRECCION Carrera 8A # 158-04

LOCALIDAD USAQUEN VALOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE — (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

| | | | |
|---|---|---|---|
| dilatacion (grietas en pista de patinaje) - Velocidad. | | | — |
| - Pulida de la totalidad de la pista de velocidad. | | M² | — |
| - Cambio de espejo que estaba roto en WC hombres. | | M² | — |
| - Tapa registro en WC (plástico) | | UN | — |
| - Cambio de señaletica y valla entrada al Parque. | | | |

**II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO**

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: APONAI PALACIOS Firma

**III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES**

Se continuará realizando monitoreo a los trabajos realizados en la pista de patinaje, que pueden surgir como consecuencia de posibles asentamientos y el Contratista CONSORCIO PARQUES BOG, se compromete subsanarlos.

867
754

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| | MARZO | |
| 12 | 3 | 2024 |
| Página | | de |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE ALTA BLANCA CODIGO 01-075 DIRECCION Carrera 8A # 158-04

LOCALIDAD USAQUEN VALOR CTO $13733.153.000 (Indique el valor total del contrato) DIVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

III. ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| LUIS A. MEDRANO | RESIDENTE | Cra 70C # 48-55 Tel 6013972384 | |
| Luis Granados D. | Director de Obra | Cll 74 # 53-47 | |
| ADOLFO [illegible] | ADMINISTR. | 3214969358 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 05 | MAR | 24 |
| dd | mm | aaaa |
| Página | de | |

**CONTRATO No** 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (tipo de contrato)

**PARQUE** PRD - UCAO **CODIGO** 12-091 **DIRECCION** Av. La Esmeralda N°63-63

**LOCALIDAD** Barrios unidos **VALOR CTO** N/A (indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** N/A (indique el valor de la inversión prevista para este parque)

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

**CONTRATISTA** CONSORCIO PARQUES BOG
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** SOLIUN INGENIERÍA SAS
(Escriba el nombre o razón social del interventor)

**SUPERVISOR** JAVIER ORLANDO SUAREZ
(Escriba el nombre del supervisor designado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| - Desmonte cielo raso baños restaurante (Drywall). | M² | 17,71 |
| - Instalación cielo raso en PVC | M² | 17,71 |
| - Desmonte lámparas baños | UND | 3 |
| - Instalación lámparas herméticas baños Sylvania 2x18W | UND | 3 |
| - Reparación enchape en monte antiguo | M² | 1 |
| - Desmonte vidrios UCAO | M² | 6,23 |
| - Instalación vidrios laminados 3+3, 1 en gimnasio, 1 en oficinas, 2 en baños | M² | 6,23 |
| - Sand blasting sobre vidrio oficina admin | M² | 2,81 |
| - Desmonte cielo raso oficinas administración (Drywall) | M² | 81,91 |
| - Instalación cielo raso oficina administración (PVC) | M² | 81,91 |

860
755

BOGOTÁ

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| | ENERO | |
| dd | mm | aaaa |
| Página | de | |

**CONTRATO No** 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (tipo de contrato)

**PARQUE** PRO-UCAO **CODIGO** 12-091 **DIRECCION** Av. la esmeralda Nº 63-63

**LOCALIDAD** Barrios Unidos **VALOR CTO** N/A (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** N/A. (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

**CONTRATISTA** CONSORCIO PARQUES BOG

**INTERVENTOR** SOLIUN INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**SUPERVISOR** JAVIER ORLANDO SUAREZ (Escriba el nombre o razón social del interventor)

(Escriba el nombre del supervisor designado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| - Desmonte lamparas oficina JES, oficina servicios y acceso a obra | UNO | 17 |
| - Instalacion - Suministro lamparas redondas 18W | UNO | 17 |
| - Retiro pintura suelta y aplicacion estuco sobre pared muro oficina JES | M² | 13,51 |
| - Suministro y aplicacion pintura esmalte sintetico. | M² | 65,27 |
| | | |
| | | |
| | | |

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 05 | ABRIL | 24 |
| dd | mm | aaaa |
| Página | | de |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (tipo de contrato)

PARQUE PRD - UCAD CODIGO 12-091 DIRECCION Av. la esmeralda N°63-63

LOCALIDAD Barrios Unidos VALOR CTO N/A (indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE N/A. (indique el valor de la inversión prevista para este parque)

**II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO**

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☒ No ☐

Nombre de quien recibe: José Camilo Sastre Firma

**III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES**

869

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 05 | ABRIL | 24 |
| dd | mm | aaaa |
| Página | | de |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE PRO-UCAB CODIGO 12-091 DIRECCION Av. la esmeralda Nº 63-63

LOCALIDAD Santa Lucía VALOR CTO N/A (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE N/A (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

III. ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| Camilo Sáenz | Sd. profesional | 3101946161 | |
| Carlos D. Rojas R. | Inp. Obra | 3185831985 | C.C. 80.187.857 |
| JOSE PEÑA | RES OBRA | 3157100128 | 3256380 |
| LUIS A MEDRANO | RESIDENTE INTERVENTORIA | 3202218275 | 1130612 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | 03 | | 2024 |
| dd | mm | | aaaa |
| Página | 1 | de | 2 |

**CONTRATO No** 3099 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO** OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

**PARQUE** SIMÓN BOLIVAR **CODIGO** 13-089 **DIRECCION** Av. Cra 68 N° 53-36

**LOCALIDAD** TEUSAQUILLO **VALOR CTO** $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) **INVERSION PARQUE** (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

**OBJETO DEL CONTRATO**

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".

(Describa el objeto del contrato suscrito)

**CONTRATISTA** CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR** SOLIUN INGENIERIA SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

**SUPERVISOR** ANGELICA ROMERO (Escriba el nombre del supervisor designado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| SE REALIZÓ EL CAMBIO DE LA RED DE AGUA | | |
| POTABLE PARA LOS BAÑOS DE DAMAS DEL | | |
| MODULO EL CAMBON DEL PARQUE SIMON BOLIVAR | | |
| SANITARIOS (PUSH) | UN | 9 |
| LAVAMANOS (GRIFERIA PUSH) | UN | 4 |
| REGISTROS 1"/2" | UN | 2 |
| REGISTRO 1/2 | UN | 1 |
| REVILLOS DE PISO / TAPAS REGISTRO | UN | 1 / 2 |
| ARREGLOS DE ENCHAPE CERAMICA MUROS PISO | M² | 16.50 M², |
| RESANES Y PINTURA DE MUROS Y TECHO | M² | 9 M² |
| SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| DE CADA UNO DE LOS APARATOS SANITARIOS Y | | |
| LAVAMANOS INSTALADOS, PARA LA RESPECTIVA | | |
| PUESTA EN SERVICIO. | | |
| | | |
| | | |

870

II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? Si ☐ No ☒

Nombre de quien recibe: LUIS HERNANDO ACERO Firma

III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

EL DIA LUNES 4 DE MARZO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR INSPECCION AL PUSH DEL SANITARIO DEL WC DE DISCAPACITADOS, EL CUAL SE ESTÁ DESCARGANDO LENTAMENTE, PARA LA RESPECTIVA PUESTA EN SERVICIO.

III. ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| LUIS A. MEDRANO B | RESIDENTE INTERVENTORIA | OBRA TOC # 48-55 Tel 601 394 2304 | 93315 |
| JOSE O. PEÑA | RESIDENTE OBRA | OBRA 55 # 74-36 Tel 9370192 | 3056320 |
| LUIS HERNANDO ACERO | Adm. téc. IDRD | AV. 68 Nº 53-36 | 79617958 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

BOGOTÁ

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 27 | 03 | 2024 |
| Página | 1 de | 3 |

**CONTRATO No** 3099 **DE** 2023 **TIPO** OBRA PUBLICA

**PARQUE** EL SALITRE - PRD / UCAD - Administracion **CODIGO** 12-091 **DIRECCION** Cra 60 # 63-75

**LOCALIDAD** BARRIOS UNIDOS **VALOR CTO** $13.733.153.000 **INVERSION PARQUE**

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

**CONTRATISTA** CONSORCIO PARQUES BOG

**INTERVENTOR** SOLIUN INGENIERÍA SAS

**SUPERVISOR** Coordinador : ANGELICA ROMERO

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| CUARTO EMPLEADOS DE SERVICIO | | |
| INSTALACION FOMAS CFCI | UN | 3 |
| INSTALACION LAMPARAS LED | UN | 6 |
| CIELORASO EN PVC | M² | 12 |
| DESMONTE TECHO Y LAMPARAS | GL | 1 |
| | | |
| PORCHE | | |
| DESMONTE TECHO SISTEMA LIVIANO | GL | 1 |
| CIELORASO EN PVC | M² | 10 |
| INSTALACION LAMPARAS LED | UN | 2 |
| | | |
| | | |

971
~~798~~

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 27 | 03 | 2024 |
| Página | 2 | de 3 |

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO OBRA PUBLICA

PARQUE Escenario Deportivo El Salitre - PRD UCAD - Administracion CODIGO 12-091 DIRECCION Cra 60 # 63-75

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS VALOR CTO $13.733.153.000 INVERSION PARQUE

I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

BOGOTÁ

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 27 | 03 | 2024 |
| Página | 3 de | 3 |

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO OBRA PUBLICA

PARQUE ESCENARIO DEPORTIVO El SALITRE - PED UCAD . Administracion CODIGO 12-091 DIRECCION Cra 60 # 63-75

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS VALOR CTO $13.733.153.000

### II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ NO ☑

Nombre de quien recibe: María Isabel Melendro Firma

### III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

### IV. ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| LUIS A. HERRANOS | RESIDENTE INTERVENTORIA | Cra 7bis # 48-35 301 394 23 64 | |
| [illegible] | MM. TC | Cr 60 #63-65 | |
| [illegible] | RESIDENTE [illegible] | Cl 131 # 121-41 | |
| | | | |
| | | | |

872
759

BOGOTÁ

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 27 | 03 | 2024 |
| Página | 1 de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE DECRETO 0070 NO EL SALITRE PRD, UCAD, Concha Iguala CODIGO 12-091 DIRECCION Carrera 60 # 63-75

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS VÁLOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) RIVERDON PARQUE (Indique el valor de la inversión privada para este parque)

**OBJETO DEL CONTRATO**

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

**CONTRATISTA** CONSORCIO PARQUES BOG (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

**INTERVENTOR** SOLIUN INGENIERÍA SAS (Escriba el nombre o razón social del interventor)

**SUPERVISOR** Coordinador : ANGELICA ROMERO (Escriba el nombre del supervisor encargado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**L DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| DEMOLICION PISO EN ASFALTO | $M^2$ | 281 |
| DEMOLICION CONCRETO | $M^2$ | 18 |
| DEMOLICION BORDILLO. LADRILLO | ML | 44 |
| DEMOLICION CUNETA CONCRETO | ML | 48 |
| EXCAVACION MECÁNICA | $M^3$ | 127 |
| INSTALACION GEOTEXTIL | $M^2$ | 313 |
| SUBBASE GRANULAR RECICLADA | $M^3$ | 56 |
| BASE GRANULAR | $M^3$ | 56 |
| RODADURA ASFALTICA 135o | $M^2$ | 281 |
| RECUBRIMIENTO SINTÉTICO | $M^2$ | 281 |
| CUÑUELA PREFABRICADA 12o | ML | 44 |
| BORDILLO PREFABRICADO A-80 | ML | 42 |

BOGOTÁ

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 27 | 03 | 2024 |
| Página | 2 de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE - PRD UCAD Cancha Sqwash CODIGO 12-091 DIRECCION Carrera 60 # 63-75

LOCALIDAD Barrios Unidos VALOR CTO $13.733.153.030 (Indique si este es un convenio) INVERSION PARCIAL (Indique si este es el primer proceso para este predio)

I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| CAJAS DE INSPECCION | UN | 2 |
| FILTROS DRENAJE | ML | 10 |
| RESATAS ARREGLO MURO MAMPOSTERIA | GL | 1 |
| RESANES PANETE MURO | ML | 13 |
| PINTURA MURO CANCHA CORAZA | M2 | 86 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

873
702

BOGOTÁ

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 27 | 03 | 2024 |
| Página 3 | de | 5 |

**CONTRATO No** 3099 **DE** 2023 **TIPO** OBRA PUBLICA

**PARQUE** RECREODEPORTIVO EL SALITRE - PRD UCAD - Canchas Iguales **CODIGO** 12-091 **DIRECCION** Carrera 60 # 68-75

**LOCALIDAD** BARRIOS UNIDOS **VALOR CTO** $13.733.153.000 **INVERSION PARQUE**

**II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO**

Se hace entrega del manual de mantenimiento? Si ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: Martha Isabel Melendro Firma

**III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES**

**III. ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| LUIS A. MEDRANO B | RESIDENTE INTERVENTORIA | CR 70C # 48-35 3013982138 | 19971.037 BTA |
| Martha Melendro | MM. TEC. | CRA 60 # 63-65 | 66990164 |
| JOSE D PEÑA | RESIDENTE VIAL | CL 131B 101-42 | |
| | | | |
| | | | |

BOGOTÁ

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 27 | 03 | 2024 |
| Página | 1 | de 3 |

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO OBRA PUBLICA

PARQUE De Los Niños - Parqueadero CODIGO 12-141 DIRECCION Av. Cra 63 # 60-80

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS VALOR CTO $13.733.153.000 INTERVENCION PARQUE

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

CONTRATISTA CONSORCIO PARQUES BOG

INTERVENTOR SOLUN INGENIERÍA SAS

SUPERVISOR Coordinador : ANGELICA ROMERO

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| DEMOLICION PISO ADOQUIN | $M^2$ | 295 |
| DEMOLICION PLACA CONCRETO | $M^2$ | 76 |
| DEMOLICION ASFALTO | $M^2$ | 58 |
| EXCAVACION MECÁNICA | $M^3$ | 84 |
| INSTALACIÓN GEOTEXTIL | $M^2$ | 360 |
| SUBBASE GRANULAR | $M^3$ | 85 |
| BASE GRANULAR | $M^3$ | 69 |
| RODADURA ASFALTICA MCD 19 | $M^2$ | 344 |
| BOLDILLO PREFABRICADO A 60 | ML | 44 |
| SARDINEL PREFABRICADO A10 | ML | 116 |
| CARCAMO EN CONCRETO | ML | 18 |
| | | |

874
761

BOGOTÁ

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| | | |
| 27 | 03 | 2024 |
| Página | 2 | de 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE De Los Niños - Parqueadero CODIGO 12-141 DIRECCION Av. Cra 63 # 60-80

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS VALOR CTO $13.733.153.000 (Incluye el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Incluye el valor de la inversión privada para este parque)

I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| DEMARCACIÓN PARQUEADERO | | |
| CAJAS DE INSPECCION | UN | 2 |
| INSTALACION TUBERIA Ø 6" | ML | 31 |
| PLACA EN CONCRETO 3000psi. | M² | 28 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

BOGOTÁ

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 27 | 03 | 2024 |
| Página | 3 de | 3 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Clase de contrato)

PARQUE De Los Niños - Parqueadero CODIGO 12-141 DIRECCION Av. Cra 63 # 60-80

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS VALOR CTO $13.733.153.000 (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

### II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: Maria Isabel Melendro Firma

### III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

### III. ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| LUIS A. MEDRANO | RESIDENTE INTERVENTORIA | CR 70 C # 48-35 3115962386 | 1934.630 Bt |
| [illegible] | APM TEC. | CL 60 # 63-65 | 66989614 |
| JOSE D. PUE | RESIDENTE OBRA | CL 131A 131-41 | |
| | | | |
| | | | |

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS V3

895
~~762~~

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

| FECHA | | |
|---|---|---|
| día | mes | año |
| Página 1 | de | 2 |

CONTRATO No 3099 (Número de Contrato) DE 2023 (Año de suscripción) TIPO OBRA PUBLICA (Tipo de contrato)

PARQUE Hippies CODIGO 02-019 DIRECCION

LOCALIDAD Chapinero VALOR CTO N/A (Indique el valor total del contrato) INVERSION PARQUE N/A (Indique el valor de la inversión prevista para este parque)

OBJETO DEL CONTRATO

Contrato mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de las infraestructuras de la red de parques distrital de parque administrado por el IDRD.

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA Consorcio parque hippies (Nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR Soluciones ingenieria SAS (Nombre o razón social del interventor)

SUPERVISOR (Nombre completo y cargo del supervisor designado)

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Se hace entrega de estructuras de señalizacion | UND | 7 |
| aplicados con aplicado anticorrosivo y | | |
| Pintura en esmalte verde | | |
| Se hace entrega de Vinilos instalados | | |
| en estructuras de señalizacion y de | UND | 11 |
| cerramiento del espacio publico | | |
| Se hace entrega de lavado de adoquin. | M2 | |
| Se hace entrega de resane carcamo | ML | |
| Se hace entrega de Demolicion tendon y lagrimal | | |
| Calce y nivelacion de bordillo | | |
| Se hace entrega de Bordillo encamentado ML | UNO | 12 |
| Se hace entrega de pintura Barandas existentes | ML | |
| Señalizacion pintura A protectores de arboles | UNO | 2 |
| Se hace entrega de Adoquin tipo IDU | M2 | |
| Se hace suministro e instalacion de adoquin existente | | |
| Se hace entrega de Mantenimiento preventivo y correctivo | UNO | 18 |

**8. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO**

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☑ NO ☐

Nombre de quien recibe: Franklin Mahyoo Firma

**9. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES**

**10. ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| Franklin | Mantenedor | 3163597516 | |
| Nelta Mesa | R. Emergencias | 3007653309 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

| FECHA | | |
|---|---|---|
| 07 | 03 | 24 |
| dd | mm | aaaa |
| Página | 1 de | 2 |

**CONTRATO No** 3099 **DE** 2023 **TIPO** OBRA PUBLICA

**PARQUE** Ciudad Montes **CODIGO** 16112 **DIRECCION**

**LOCALIDAD** **VALOR CTO** **INVERSION PARQUE**

**OBJETO DEL CONTRATO** Contrato Mediante el Sistema de Precios Unitarios y amparo sobre el mantenimiento, Adecuación, Reparación y Reparación de Infraestructura de los parques Administrados por IDRD

**CONTRATISTA** Consorcio Parques Bog

**INTERVENTOR** Solin Ingeniería SAS

**SUPERVISOR** Arq. Angelica Romero

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**1. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Mantenimiento General de los elementos de la ruta de la Vida. Tejado, cerramos.uo y pintura. | UND | 12 |
| Desmonte, Suministro e instalación de barras abdominales | UND | 3 |
| Pintura de estructuras y Cambio de Vinilos de señales informativos de ruta de la Vida (Vinilos por dos años) Se deja en funcionamiento y buen Estado. | UND | 3 |

Powered by CamScanner

**II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO**

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: Fabio Andres Castro Firma

**III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES**

**III. ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| Jose Stell Quinto | Residente | Ciudad Montes | |
| Fabio A. Castro | Adm profesional | Ciudad montes | |
| FERNANDO | RESIDENTE | Ciudad Montes | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS 42

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

FECHA: 02 (día) 04 (mes) 24 (año)

Página 1 de 2

**CONTRATO No** 3099 **DE** 2023 **TIPO** OBRA PUBLICA

**PARQUE** Velodromo 1 Mayo. **CODIGO** _____ **DIRECCION** _____

**LOCALIDAD** San Cristobal. **VALOR CTO** _____ **EXTENSION PARQUE** _____

**OBJETO DEL CONTRATO**

Contrato mediante el sistema de precios unitarios, y cuyo objeto es el mantenimiento, actualización, reparación y Suministro de la infraestructura de las parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD

**CONTRATISTA** Barrueto Reyes Hoy

**INTERVENTOR** Solin Ingeniería SAS.

**SUPERVISOR** _____

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Desmonte de 12 luminarias | Unid | 12 |
| y se instalaron 20 luminarias | Unid | 20 |
| nuevas. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☑

Nombre de quien recibe: _____ Firma _____

## III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES

## IV. ASISTENTES

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| Rodney Granados | Ing. Residente | 3118081957 | |
| Ivan Camargo | Admin. | 3208383489 | |
| Eduardo | Ing Resid | 3134926657 | |
| Anderson | Instrumentista | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

## PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD

FECHA

| dd | mm | aaaa |
|---|---|---|
| 20 | 01 | 24 |

Página 1 de 3

CONTRATO No 3309 DE 2023 TIPO OBRA PUBLICA

PARQUE Porvenir CODIGO 07-341 DIRECCION

LOCALIDAD Bosa VALOR CTO DIVERSION PARQUE

OBJETO DEL CONTRATO

Contrato mediante el sistema precio unitario y a monto agotable, el mantenimiento preventivo y reparaciones de la infraestructura de los parques y sus integrantes sistema de vigilancia del parque administrado por el IDRD

CONTRATISTA Consorcio parques bog

INTERVENTOR Soluns Ingeniería SAS

SUPERVISOR

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Modulos de Baños mixtos | UNID | 2 |
| Moto bombas | UND | 2 |
| Tanques de agua potable | UNID | 2 |
| Tableros de baños | UND | 2 |
| Sanitarios en acero inoxidable | UNID | 4 |
| Lavamanos en acero | UNID | 4 |
| Cambiador pañal mural | UND | 2 |
| Inodoro en acero | UND | 4-2 |
| Dispensadores Rapiclin | UNID | 2 |
| Lavamanos y espejo empotrado | UNID | 4 |
| Dispensadores | UND | 4 =3 dobles 1 sencillo |
| Puerta en acero inoxidable | UNID | 2 |
| Tanques de pozos | UND | 2 |
| Dispensadores de jabon | UND | 2 |
| Rampas de acceso a baños | UND | 3 3 unidades |
| Puertas con chapas y llaves metalicas | UND | 6 |
| Reflectores exteriores | UNID | 6 |
| Chapa sencilla | UND | 1 / adicional |
| 2 Bombillos | UN | 2 |

Powered by CamScanner

**II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO**

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☒

Nombre de quien recibe: [illegible] Firma [signature]

**III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES**

Se recibe el inventario haciendo la observación que ninguno de los elementos están funcionando porque no hay servicio de energía ni agua. En un aparato de aseo malo. Con algunos repuestos sueltos. Los tubos de Aguas Negras están rotos, Ciertas partes de estructuras metálicas están sueltas

**III. ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | 3124461822 | [signature] 92476422 |
| Luz Stella Cuenca | Residente Obra | Contratista Consorcio Parques BJ SOLIDARIOS | [signature] |
| FERNANDO / [illegible] | RESIDENTE INTERVENTORIA | 3134926630 | |

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS -V2

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**PUESTA EN SERVICIO OBRAS COMUNIDAD**

FECHA

| 4 | 03 | 24 |
|---|---|---|
| dd | mm | aaaa |
| Página | 1 | de 2 |

**CONTRATO No** 3099 **DE** 2023 **TIPO** OBRA PUBLICA

**PARQUE** Villa de los Alpes **CODIGO** 04-075 **DIRECCION** Calle 36 Sur 4-2

**LOCALIDAD** San Cristobal **VALOR CTO** N/A **INVERSION PARQUE** N/A

**OBJETO DEL CONTRATO**

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACION, REPARACION Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

**CONTRATISTA** Consorcio Parques Bog

**INTERVENTOR** Solin Ingeniería SAS.

**SUPERVISOR**

Se deja constancia que fueron terminadas las obras contratadas y se ponen al servicio de la comunidad, quien se compromete a darles un uso adecuado y a desarrollar mecanismos de conservación, acorde con las funciones y destinación de las mismas.

**I. DESCRIPCION OBRAS TERMINADAS**

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Se realiza entrega de las siguientes actividades. | | |
| - Instalación de marco y puerta incluye el demole de la puerta y marco existente de la cafeteria | und | 1. |
| - Instalación de 2 camas dodaminales. Elementos arte de la cocina totalmente nuevos. | Und. | 2. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**II. ENTREGA DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO**

Se hace entrega del manual de mantenimiento? SI ☐ No ☒

Nombre de quien recibe: Jonathan Boyd Firma

**III. INQUIETUDES DE LOS PARTICIPANTES**

Se realizo entrega de 2 juegos de llaves de la puerta de cafeteria. Con esta entrega se dejan finalizadas las actividades contractuales del parque quedando el parque al 100%

**III. ASISTENTES**

| NOMBRE | CARGO | DIRECCION / TELEFONO | FIRMA / CEDULA |
|---|---|---|---|
| FERNANDO [illegible] | RES INTERVENT. | 3134926632 | |
| [illegible] | | | |
| Judith Cardona | Inspector | 3213860780 | |
| Jonathan Bravo | Admin | 3155603557 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**ANEXO 4.** INFORMES SEMANALES

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**Reporte Semanal** 26 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

marzo,3,2024 al marzo,9,2024

1. Datos Generales

PARQUE | Código: | Localidad: | Barrio:

2. Contrato de Obra

Objeto: COP No. 3089-2023

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

| F.I. | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. #02 | F.R.#2 | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 7 MESES | 11-abr-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo Directo | 10.981.251.399,00 | $ 41.864.509,00 | $ 77.343.733,00 | $ 144.066.622,00 | $ 1.118.510.201,00 | 3.561.173.407,00 | |
| A.I.U. (25,06%) | 2.751.901.601,00 | $ 10.491.246,00 | $ 19.382.339,00 | $ 36.103.096,00 | $ 280.323.716,00 | $ 892.430.056,00 | |
| Sub Total | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | $ 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.398.933.917,00 | $ 4.453.603.463,00 | |
| Total Inicial | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | $ 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.398.933.917,00 | $ 4.453.603.463,00 | |
| Adición No. | | | | | | | |
| Total Final | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.398.933.917,00 | $ 4.453.603.463,00 | |
| Anticipo: (40% Sobre costo directo) | 4.392.500.560,00 | $ 16.745.804,00 | $ 30.937.493,00 | $ 57.626.649,00 | $ 447.444.080,00 | $ 1.780.588.704,00 | |
| Total | 4.392.500.560,00 | $ 35.609.951,00 | $ 65.788.579,00 | $ 122.543.069,00 | $ 951.489.837,00 | $ 2.673.015.759,00 | |
| Acumulado | | $ 35.609.951,00 | $ 101.398.530,00 | $ 223.941.599,00 | $ 1.175.431.436,00 | $ 3.848.448.195,00 | |

3. Contrato de Interventoría

Objeto: CI No. 3131-2023

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

| F.I. | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. | F.R. | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 8 MESES | 11-may-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato: | 1.001.825.407,00 | $ 64.136.663,00 | $ 65.419.199,00 | $ 67.963.854,00 | $ 103.448.492,00 | $ 192.570.880,00 | |
| Iva (19%) | 190.346.827,00 | $ 12.186.004,00 | $ 12.429.648,00 | $ 12.894.094,00 | $ 19.655.213,00 | $ 36.588.467,00 | |
| Sub Total | 1.192.172.234,00 | $ 76.322.667,00 | $ 77.848.847,00 | $ 80.757.748,00 | $ 123.103.705,00 | $ 229.159.347,00 | |
| Adición: | | | | | | | |
| Total Final | 1.192.172.234,00 | $ 76.322.667,00 | $ 77.848.847,00 | $ 80.757.748,00 | $ 123.103.705,00 | $ 229.159.347,00 | |
| Retegarantía: | 119.217.223,00 | $ 7.632.267,00 | $ 7.784.885,00 | $ 8.075.775,00 | $ 12.310.371,00 | $ 22.915.935,00 | |
| TOTAL | 1.192.172.234,00 | $ 68.690.580,00 | $ 70.063.962,00 | $ 72.681.973,00 | $ 110.793.334,00 | $ 206.243.412,00 | |
| | | $ 68.690.580,00 | $ 138.754.542,00 | $ 211.436.515,00 | $ 322.229.849,00 | $ 528.473.261,00 | |

4. 26 Fecha de corte: marzo 9, 2024

4.1. Datos Generales

Nombre: PRD- Mure squash/canchas tenis/Canchas Hockey/Administración | Código: 12-091 | Localidad: BARRIOS UNIDOS

Dirección: Carrera 60 # 63-75 | Barrio:

Capítulos:

| Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

188

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 330.780.258,00 | 2,44% | 85,00% | 92,00% | -7,00% | $ | 304.317.835,52 |
| TOTAL | | 330.780.358,00 | | 85,00% | 92,00% | -7,00% | $ | 304.317.835,52 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Datos Generales | Nombre: | Simón Bolívar | Código: | 13-089 | Localidad: | ENGATIVÁ |
| | | Dirección: | Avenida Calle 63 # 68-45 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 869.359.406,00 | 6,41% | 85,00% | 82,00% | 3,00% | $ | 712.874.712,92 |
| TOTAL | | 869.359.406,00 | | 85,00% | 82,00% | 3,00% | $ | 712.874.712,92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3. | Datos Generales | Nombre: | Parque Alta Blanca | Código: | 01-075 | Localidad: | USAQUEN |
| | | Dirección: | Carrera 8 A #158-04 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 154.101.031,00 | 1,14% | 88,00% | 84,00% | 4,00% | $ | 144.854.969,14 |
| TOTAL | | 154.101.831,00 | | 88,00% | 84,00% | 4,00% | $ | 144.854.969,14 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4. | Datos Generales | Nombre: | Parque de las Niñas | Código: | 12-141 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS |
| | | Dirección: | Avenida Carrera 53 # 60-80 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.432.298.903,00 | 10,55% | 64,00% | 52,00% | 12,00% | $ | 744.794.389,56 |
| TOTAL | | 1.432.298.903,00 | | 64,00% | 52,00% | 12,00% | $ | 744.794.389,56 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5. | Datos Generales | Nombre: | Parque de las Nevias | Código: | 12-092 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS |
| | | Dirección: | Avenida Calle 63 # 45-10 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 214.775.258,00 | 1,58% | 68,00% | 77,00% | -9,00% | $ | 165.376.947,12 |
| TOTAL | | 214.775.258,00 | | 68,00% | 77,00% | -9,00% | $ | 165.376.947,12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6. | Datos Generales | Nombre: | Parque Canal Río Negro | Código: | 12-002 | Localidad: | ANDES -RIO NEGRO |
| | | Dirección: | Calle 80 A # 20-57 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 79.062.034,00 | 0,58% | 67,00% | 100,00% | -33,00% | $ | 79.062.034,00 |
| TOTAL | | 79.062.034,00 | | 67,00% | 100,00% | -33,00% | $ | 79.062.034,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7. | Datos Generales | Nombre: | Parque Sucre e Hipolo | Código: | 02-019 | Localidad: | CHAPINERO |
| | | Dirección: | Calle 60 a Cra 7 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 118.088.403,00 | 0,87% | 70,00% | 100,00% | -30,00% | $ 118.088.403,00 |
| TOTAL | | 118.088.403,00 | | 70,00% | 100,00% | -30,00% | $ 118.088.403,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8. | Datos Generales | Nombre: | Parque U06 | Código: | 10-290 | Localidad: | ENGATIVA |
| | | Dirección: | Calle 63 F 88 - 48 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.053.040.861,00 | 7,77% | 81,00% | 76,00% | 5,00% | $ 801.831.130,38 |
| TOTAL | | 1.053.040.861,00 | | 81,00% | 76,00% | 5,00% | $ 801.831.130,38 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9. | Datos Generales | Nombre: | Parque San José de Bavaria | Código: | 11-078 | Localidad: | SUBA |
| | | Dirección: | Ac.170 - Cra.66 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 25.527.265,00 | 0,19% | 33,00% | 1,00% | 31,00% | $ 255.272,65 |
| TOTAL | | 25.527.265,00 | | 32,00% | 1,00% | 31,00% | $ 255.272,65 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10. | Datos Generales | Nombre: | Estadio Diego Historra | Código: | 18-207 | Localidad: | RAFAEL URIBE |
| | | Dirección: | CL 35 #3-50 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 600.483.302,00 | 4,42% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 600.483.302,00 |
| TOTAL | | 600.483.302,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 600.483.302,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11. | Datos Generales | Nombre: | Parque Ciudad Montes | Código: | 16-112 | Localidad: | PUENTE ARANDA |
| | | Dirección: | CL 10 Sur #30-20 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 295.993.778,00 | 2,18% | 85,00% | 100,00% | -15,00% | $ 295.993.778,00 |
| TOTAL | | 295.993.778,00 | | 85,00% | 100,00% | -15,00% | $ 295.993.778,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.12. | Datos Generales | Nombre: | Parque Bosques de San Carlos | Código: | 18-028 | Localidad: | RAFAEL URIBE |
| | | Dirección: | Dirección Cra 13 a # 30-15 S | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 985.049.229,00 | 7,25% | 57,00% | 57,00% | 0,00% | $ 561.478.060,53 |
| TOTAL | 985.049.229,00 | | 57,00% | 57,00% | 0,00% | $ 561.478.060,53 |

4.13. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Estadio de Techo | Código: | 08-554 | Localidad: | KENNEDY |
| Dirección: | Transversal 78K No. 41 A - 04 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 66.643.578,00 | 0,49% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 66.643.578,00 |
| TOTAL | | 66.643.578,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 66.643.578,00 |

4.14. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Lecheros Naranjos | Código: | 07-035 | Localidad: | BOSA |
| Dirección: | Cl. 70 Bis Sur #80K-1 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 26.022.208,00 | 0,19% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 26.022.208,00 |
| TOTAL | | 26.022.208,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 26.022.208,00 |

4.15. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Villa de los Alpes | Código: | 04-075 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 158.478.206,00 | 1,15% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 158.478.206,00 |
| TOTAL | | 158.478.206,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 158.478.206,00 |

4.16. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque el Porvenir | Código: | 07-391 | Localidad: | BOSA |
| Dirección: | Calle 52 Sur - Cra 97 C | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 33.582.453,00 | 0,25% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 33.582.453,00 |
| TOTAL | | 33.582.453,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 33.582.453,00 |

4.17. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Primera de Mayo | Código: | 04-198 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | carrera 5 bis #17-14 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 615.714.752,00 | 4,54% | 74,00% | 75,00% | -1,00% | $ 481.786.064,00 |
| TOTAL | | 615.714.752,00 | | 74,00% | 75,00% | -1,00% | $ 481.786.064,00 |

4.18. Datos Generales

| Nombre: | Parque Nacional | Código: | 03-035 | Localidad: | SANTA FE |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Carrera 7 # 38 - 10 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión Real | % Inversión Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 41.009.192,00 | 0,30% | 0,00% | 42,00% | -42,00% | | | $ 17.220.080,64 |
| TOTAL | | 41.009.192,00 | | 0,00% | 42,00% | -42,00% | | | $ 17.220.080,64 |

4.19. Datos Generales

| Nombre: | Parque Servita | Código: | 01-023 | Localidad: | USAQUEN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Calle 165 # 7 - 32 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 801.248.287,00 | 4,43% | 59,00% | 59,00% | 0,00% | $ | 354.735.309,33 |
| TOTAL | | 801.248.287,00 | | 59,00% | 59,00% | 0,00% | $ | 354.735.309,33 |

4.20. Datos Generales

| Nombre: | Parque Canal Boyaca | Código: | 09-050 | Localidad: | FONTIBON |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cra 74 B # 23 a - 98 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 910.502.844,00 | 0,71% | 54,00% | 54,00% | 0,00% | $ | 491.671.427,76 |
| TOTAL | | 910.502.844,00 | | 54,00% | 54,00% | 0,00% | $ | 491.671.427,76 |

4.21. Datos Generales

| Nombre: | Parque El Virrey Norte | Código: | 02-014 | Localidad: | CHAPINERO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Calle 88 - Cra 7 y Autop Nort | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 28.197.735,00 | 0,21% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 28.197.735,00 |
| TOTAL | | 28.197.735,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 28.197.735,00 |

4.22. Datos Generales

| Nombre: | Parque Fontanar del Rio | Código: | 11-388 | Localidad: | SUBA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Calle 145 B 138 A - 10 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 508.119.341,00 | 3,74% | 18,00% | 21,00% | -3,00% | $ | 106.705.061,61 |
| TOTAL | | 508.119.341,00 | | 18,00% | 21,00% | -3,00% | $ | 106.705.061,61 |

4.23. Datos Generales

| Nombre: | Parque el Tunal | Código: | 06-063 | Localidad: | TUNJUELITO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cra 19D #52B-15 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.185.589.658,00 | 8,74% | 93,00% | 93,00% | 0,00% | $ 1.102.598.380,08 |
| TOTAL | | 1.185.589.658,00 | | 93,00% | 93,00% | 0,00% | $ 1.102.598.380,08 |

4.24. Datos Generales

| Nombre: | Parque La Fragua | Código: | 15-040 | Localidad: | ANTONIO NARIÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cra. 31 #148-57B | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 871.736.911,00 | 6,42% | 76,00% | 78,00% | -2,00% | $ 679.954.790,58 |
| TOTAL | | 871.736.911,00 | | 76,00% | 78,00% | -2,00% | $ 679.954.790,58 |

4.25. Datos Generales

| Nombre: | Mirador Illimani | Código: | 19-768 | Localidad: | CIUDAD BOLIVAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cra. 27b #1 1... | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 224.051.968,00 | 1,65% | 83,00% | 45,00% | 38,00% | $ 100.823.384,70 |
| TOTAL | | 224.051.968,00 | | 83,00% | 45,00% | 38,00% | $ 100.823.384,70 |

4.26. Datos Generales

| Nombre: | Parque Eduardo Santos | Código: | 14-030 | Localidad: | LOS MARTIRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | CALLE 4A BIS N 18 B 30 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 140.357.541,00 | 1,03% | 84,00% | 85,00% | -1,00% | $ 119.303.909,85 |
| TOTAL | | 140.357.541,00 | | 84,00% | 85,00% | -1,00% | $ 119.303.909,85 |

4.27. Datos Generales

| Nombre: | Nuevo Muzu | Código: | 06-017 | Localidad: | TUNJUELITO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | 38 a 52a, Cra. 61B | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 848.409.817,00 | 6,24% | 70,00% | 78,00% | -8,00% | $ 680.199 657,26 |
| TOTAL | | 848.409.817,00 | | 70,00% | 78,00% | -8,00% | $ 680.199 657,26 |

4.28. Datos Generales

| Nombre: | Parque Cayetano | Código: | 06-241 | Localidad: | USME |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cra. 80 #40 55 Sur, | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 214.611.043,00 | 1,58% | 100,00% | 95,00% | 5,00% | $ 203.880.490,85 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 214.811.043,00 | | 100,00% | 95,00% | 5,00% | $ 203.880.490,85 |

**4.29.** Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Villa Alemana | Código: | 05-087 | Localidad: | USME |
| Dirección: | Cra 5 Este # 5 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 43.922.585,00 | 0,34% | 90,00% | 90,00% | 0,00% | $ 41.330.335,50 |
| TOTAL | | 43.922.585,00 | | 90,00% | 90,00% | 0,00% | 41.330.335,50 |

**4.30.** Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Palestina | Código: | 07-165 | Localidad: | BOSA |
| Dirección: | Cale 87 S # 81 G - 09 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.797.573,00 | 0,08% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 10.797.573,00 |
| TOTAL | | 10.797.573,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 10.797.573,00 |

**4.31.** Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Virrey Sur | Código: | 05-016 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | Calle 93 SUR # 3 A - 03 ESTE | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 91.107.585,00 | 0,67% | 55,00% | 90,00% | -35,00% | $ 81.996.808,50 |
| TOTAL | | 91.107.585,00 | | 55,00% | 90,00% | -35,00% | 81.996.808,50 |

**4.32.** Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Olime Jimenez | Código: | 05-016 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | Calle 51AS #65A-00 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 360.308.039,00 | 2,65% | 34,00% | 34,00% | 0,00% | $ 132.704.733,28 |
| TOTAL | | 360.308.039,00 | | 34,00% | 34,00% | 0,00% | 132.704.733,28 |

**4.33.** Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque La Victoria | Código: | 04-122 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | Avenida 1 de Mayo No. 1 a 40 Sur | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 50.851.447,00 | 0,37% | 96,00% | 89,00% | 7,00% | $ 45.257.787,83 |
| TOTAL | | 50.851.447,00 | | 96,00% | 89,00% | 7,00% | 45.257.787,83 |

**4.34** Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Galan Cortes | Código: | 04-103 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | Cl. 18 B - 80 sur | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.000.000,00 | 0,07% | 3,00% | 0,00% | 3,00% | $ - |
| TOTAL | | 10.000.000,00 | | 3,00% | 0,00% | 3,00% | - |

5

| | |
|---|---|
| Fecha Inicial: | 12-sep-23 |
| Fecha de Terminación Inicial: | 11-abr-24 |
| Adición de tiempo en (meses): | |
| Fecha de Terminación Final: | 11-abr-24 |

**8. OBSERVACIONES:**
El presente reporte se ajusta al nuevo balance en el que se incluyen nuevas actividades y se definen nuevos frentes por parte de la entidad, en el cuál se suprimen actividades y se ajustan cantidades, la medición se realizó con la programación remitida por el contratista de obra el día 27-02-2024, sin embargo el mismo debe ajustar a las condiciones actualizadas, por lo que se requirió al CONSORCIO PARQUES BOG, remitir el cronograma actualizado al Balance presupuestal

7. Licencias:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción: | | Ambiental: | N/A | Intervensión del Espacio Público | N/A |

8. Servicios Públicos:

| | CODENSA | | EAAB | | OTROS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONOS | N/A | Informe 50% | | Informe 75% | | Informe 100% |
| DAMA | | | | | | |

| 9. PAC 2023 | | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

10. Observaciones por parques:

1.- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Se continua con las actividades constructivas en la zona de los grecoromanos y ruta de la vida. se solicita la instalación de juegos infantiles e instalación del piso caucho.
2.- PARQUE FONTANAR DEL RIO: Se debe iniciar la construcción el Parkour, ya que se cuenta con el sitio dentro del parque para iniciar esta actividad.
3.- PARQUE CANAL BOYACA: Se realizo estudio geotecnico para observar el estado de la estructura, pendiente la entrega de este informe, se realzia demolicion de placa y excavacipon para la conformacipon de los dado en la zona de los juegos infantiles., llegaron materiales para iniciar activades constructivas.
4.- PARQUE TUNAL: Se encuentra con porcentajes iguales debido al progreso en instalación de adoquín nuevo y en mantenimiento y pintura en Grecos 1, 2, y pista de BMX,
5.- PARQUE FRAGUA: Lleva adelanto en cuanto a las actividades eléctricas
6.- PARQUE EDUARDO SANTOS: Lleva adelanto con respecto a la programación, pero deberia estar ya estar terminando los baños de colisao, que fue un compromiso con la administración del parque y ya se deberia estar terminado la zona de biosaludables.
7.- PARQUE MIRADOR ILLAMINI: Refleja atraso en cuanto que el modulo de baños es el que mas pesa en el presupuesto y en este No se han iniciado actividades en sitio.
8.- PARQUE NUEVO MUZU: Presenta un adelanto debido a el rendimiento de esta semana en la pintura del piso de la zona de juegos y el inicio de la instalación de juegos en la misma zona.
9.- PARQUE VIRREY DEL SUR: Refleja adelanto debido al rendimiento en la actividad de mantenimiento y pintura de juegos infantiles y aparatos biosaludables
10.- PARQUE PRIMERA DE MAYO: En este parque ya llegaron insumos como canastillas y postes metalicos para comenzar las actividades de cambio de posteria en la zona del velodromo..

11. INFORME TECNICO

1.- ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

• PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

SENDEROS EN ADOQUIN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A LA PUERTA DE INGRESO # 4.

- Se avanza con la instalación del adoquín nuevo y remates de tramos en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4, sendero zona que limita con el árbol sendero hacia la bibliotaca, sendero quiosco de la cafeteria, se avanza con la instalación de plazas y fundida de cintas de concreto que confinan los tramos, para entrega de tramos a la adinistracion

CASA DEL ADULTO MAYOR

- Se avanza con los remates de observaciones para programar entrega a la administración.

ZONA DE PORTERIAS:

- Se avanza con la correccion de observaciones hechas por la interventorias de estuco y pintura en porteria # 2 y 3, para entrega y puesta en servicio

PISTA DE BMX:

- Se terminan los trabajos diagnosticados para este frente, se avanza con la evacuacion de las observaciones de la interventoria, para programar entrega a la administracion y puesta en servicio para el martes 12 de marzo de 2024.

KIOSCO CAFETERIA

- Se suministra e instala el acrilico de techo que estaba roto y reportado como emergencia.

• PARQUE MIRADOR ILLIMANI:

- El contratista no reporto actividades en este parque durante la presente semana.

• PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se avanza con pintura de muros y cielo rasos en los baños del coliseo, se inicia pilida y brillado de pisos en los baños del coliseo.

• PARQUE LA FRAGUA:

- Se avanza con la instalación de bordillos en la zona de jugos exterior del parque.
- Se avanza con la instalacion de bordillos en concreto perimetral de la pista de patinaje

• PARQUE LA VICTORIA

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio y la pintura de modulos de administracion.

• PARQUE NUEVO MUZU:

- Se avanza con la instalacion de baranda, tableros en malla y angulo que complementan de la baranda en zona de juegos, para dejar la zona completamente cerrada la zona.

- PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se instala porton nuevo costado lateral del parque, se instalan y soldan las tapas de las cajas de inspeccion, se avanza con la terminacion de muros de cierre en la parte posterios del parque.

- PARQUE LA VICTORIA:

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio y biosaludables

- PARQUE VIRREY SUR:

- Se avanza actividades con mantenimiento y pintura de juegos infantiles e instalacion y aseguradas de tapas con marcos nuevas en cajas de inspeccion.

- PARQUE GILMA JIMENEZ:

- Se realizaron los arreglos de tramos en adoquín, se inician los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo.

- PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%
- En este parque ya se colocarón los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sea autorizado por el IDRD.

- El IDRD realiza reubicación y movimiento de lo módulos sanitarios
- El Contrasita debe ajustar el presupuesto e incluir el valor de las nuevas actilvidades
- Se deben adecuar las instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas.

- PARQUE CIUDAD MONTES - COD 18-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%
- Se realizó reunión social de finalización.
- Se realizo Acta de puesta en servicio zona ruta de la vida.

- PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas 0.00%

• PARQUE CANAL BOYACA

- Se realiza revisión geotecnica y se realizan apiques.
- Se inicia la excavación zona de adoquines (perfilación de terreno).
- Se recibe diagramación para el piso caucho zona juego infantil.

• PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Se revisan nuevamnete lo vinilos instalados para corroborrca su perfecta instalación.
- Esta pendiente el inicio de la construcción de la zona del parkour.

• PARQUE NACIONAL

- Se inicia el montaje de los juegos .

• PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

ZONA BAÑOS ADMINISTRATIVOS

- Pendiente cambio puerta de entrada baños hombres y mujeres.

ZONA BEBEDEROS

- Se revisan los bebederos existentes para arreglarlos.

ZONA PUENTE SECO

- Llegaron a la obra los marcos con malla soldada.
- Se retira los marcos y mallas dañadas debajo del puente.
- Se instalan los marcos con mallas nuevas debajo del puente.

ZONA GRECOROMANOS

- Se continua con el suministro e intalacion del hierro para fundir la viga zarpa.
- Se continua con la instalación de formaleta metalica para fundir la viga zarpa..

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS

- En esta parque no se van a realizar actividades electricas 0,00%

• PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Finaliza la aplicación de la membrana poliurea, con una bomba bimezcladora a alta presión para el revestimiento de los tanques sépticos.
- La Entidad concede permiso para retirar el agua del lago y así realizar el llenado de los tanques septicos.
- Una vez llenados los tanques sépticos, se le realiza la prueba de estanqueidad por 24 horas, lo cual arrojó resultados favorables.
- De acuerdo con las recomendaciones emitidas por el ambiental del IDRD, se le aplica una dosis de hipoclorito (3 kg); el ayudante del lago es la persona quien realiza la dosificación.
- La evacuación del agua de los tanques, se realiza con el vertimiento del agua al lago mediante motobombas.
- Se continúa con el proceso de relleno (material seleccionado de excavación), en capas de 15 cm en el área perimetral de los tanques sépticos. SE realiza la compactación con canguros desde la parte inferior de los tanques, hacia el nivel de piso.

En los baños y Cocineta del Módúlo Maná.

- Ramales de la caja de inspección, la cual vierte las aguas al pozo séptico. Instalación de tapa en concreto.
- Ramales de la caja de inspección, la cual vierte las aguas al pozo séptico. Instalación de tapa en concreto.

En el Sector del lago

- Avance en la lijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas.
- Continúa la aplicación de pintura en esmalte gris para los muros de los kioscos.
- Se le ha solicitado al Contratista realizar limpieza y aseo de los espacios que está interviniendo; especialmente las manchas dejadas en las láminas de acero cuando se está aplicando la pintura en los kioscos de comidas.
- Continúa la aplicación de pintura para las barandas externas acceso a la Capilla del Templete Eucarístico.
- Limpieza de las Casetas de comidas y retiro de las manchas de pintura que resultaron durante el proceso de aplicación del esmalte.
- Continúa el lijado de la pintura en el juego infantil M5 , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.
-

En el Sector del módulo del carbón

- En el área interna de los baños de mujeres, se terminó la instalación de enchape en cerámica para las areas que se intervinieron.
- Finaliza la ejecución de regatas en muros e inicio de instalaciones hidrosanitarios en los baños de hombres.
- Termina la instalación de las tuberías y accesorios para agua potable en baño de hombres.
- Inicio en la instalación del enchape para baños de hombres.
- Pruebas hidrosanitarias para las redes de tuberías de agua potable en los baños de hombres.

En otros sectores del Parque

- Se hace revisión de la instalación de los bebederos, la Entidad solicita completar las tapas en concreto que faltan en algunas de las cajas donde se alojan los registros para suministro de agua potable.
- Inicio del desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.

• PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Se continúan los resanes con mortero de grietas y fisuras a lo largo y ancho del muro.
- Aplicación de recibase, para recubrimiento de piso en las Canchas de Tenis- PRD

PRD - Área Administrativa.

- Se realizan las instalaciones eléctricas en el depósito del Area administrativa.
- Estructuración del ciclorreso para instación del PVC.

PRD - UCAD.

- Finaliza la instalación del enchape de piso en la cocina del Restaurante.

PRD- Cancha de baloncesto

- Se aplica la rodadura asfáltica 1350 en la cancha; e= 5cm.
- Instalación de bordillos prefabricados por costado sur, para conformación del sendero.

PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Se revisa el cambio de fluxómetros en baños de 1° y 2° piso, en el Velódromo.
- Se detectan nuevos daños en fluxómetros en baños de 1er piso.
- Continúa la instalación de las nuevas luminarias en la cancha de softbol.
- Finaliza la evacuación y traslado de los panales de abejas encontrados en los tres postes de energía.
- Se le solicita al Contratista, continuar con las actividades de desmonte e instalación de luminarias en las Canchas de Beisbol.
- Observaciones de la Interventoría al Administrador del Parque, para que presumiblemente las personas a cargo del Aseo, no retiren los tapones del desague del lavamanos

- CANAL RIO NEGRO

- Estado final en la instalación y pintura de la malla eslabonada y pintura por costado sur de la Cancha multifunción.
- Recalce de dados en concreto que estaban fracturados o deteriorados en algunos pedestales de columnetas.

- PARQUE DE LOS NIÑOS

- Avance en la instalación de redes de aguas lluvias por costados norte y sur.
- Suministro de grava 3/4"-1", para extendida y compactación en la Zona de las canchas de Volleyplaya.
- Continúa la ejecución de excavaciones para construcción del filtro francés en el área de las canchas.
- Avance en la extendida de la capa de triturado de rio 3/4" -1" (e=15 cm).
- Avance en la construcción del filtro francés (espina de pescado).
- Extendida, compactación y nivelación de la capa de triturado.
- Instalación y cerramiento (cosido y embolsado de la grava ) con el material geotextil 4000.
- En el Parqueadero de los Niños, termina la compactación de la base granular. Toma de densidades en el terreno; resultados satisfactorios.
- Inicio y terminación en la aplicación de la Capa de asfalto de e=8 cm.
- Extendida y compactación del asfalto espesor =8cm; PAVIOBRAS- Marcia MDC19, Despacho 52213

- PARQUE DE LOS NOVIOS

- Amarre de acero para conformar las vigas de cimentación.
- Colocación de formaleta para vigas de cimentación.
- Fundida en concreto de las vigas de cimentación, para el Módulo de baños por costado sur.
- Desencofrado de las vigas que se fundieron en concreto.
- Continúa la excavación para reemplazar tubería averiada que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Relleno y compactación de rellenos al interior de las vigas de cimentación.

-PARQUE SERVITA

- Inicio de actividades eléctricas, para realizar el cambio de las luminarias en el Parque- Cancha de futbol.

- PARQUE ALTABLANCA

- Se realiza la pulida de la totalidad de la pista de velocidad.
- Instalación de la Valla en la Entrada Principal del parque.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Fecha de corte : al 09 de marzo de 2024

| FECHA | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| 09-03-2024 | 84.00 | 85.00 | 1.00 |
| | | | |

**ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO**

De acuerdo con el reporte semanal presentado a fecha del 09-03-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 84,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 85,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un adelanto del 1.00%,. igualmente se le solicita al Contratista implementar un plan de contingencia para terminar los parques a tiempo ya que falta un mes (1) para terminar el contrato igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que estén a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques, y así evitar atrasos que conlleven a multas y/o sanciones por incumplimiento.

Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados, se observa que de los treinta y cinco (35) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, hay cuatro (4) parques que presentan atraso, pero se aclara que los atrasos evidenciados se estan presentando por los siguientes motivos:

1.- Parque San José de Bavaria: Este parque presenta atraso ya el contratista no ha iniciado las actividades correspondientes del parque en las fechas estipuladas según el project, las cuales debian haber de iniciar el 04/03/2024..
2.- Parque La Victoria: Este parque presenta atraso debido a que el contratista no ha iniciado los enregtos internos el módulo de administración y módulo de baños, igualmente en el módulo bodega esta pendiente la instalación de una lámina de reventilación.
3.- Parque Ilitmani:. Este parque presenta atreso porque no se habia iniciado hasta el dia de hoy actividades en el módulo de baños, y que las actividades que comprenden la ejecución y terminación del módulo de baños no se han realizado en sitio, el contratista manifiesta que estas actividades las esta trabajando en el taller y esta actividad es la mas representativa dentro del presupuesto de este parque.
4,. Parque de los Niños: Este parque presenta atraso debido a que los tave pies no se han inicado a la fecha, ademas el contratista no ha iniciado las actividades eléctricas las cuales debieron quedar terminadas al 100 % el 29 de febrero del 2024.

FRENTES DE TRABAJO :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con doce (12) parques. Siete (7) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Otaya Herrera, Parque Porvenir, Parque Ciudad Montes, Parque Virrey Norte y Parque Villa de los Alpes)), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00% . un (1) parque con actividades significativas (Primero de Mayo) con un avance superior al 75%, Los Parques (Canal Boyaca y Bosques de San Carlos) con un vance del 54% y 57 %. los Parque (Nacional y Fontanar del Rio) con un avance superior del 42% y 21% respectivamente.

FRENTE 2: Esta frente cuenta con diez (10) parques, Los siguiente parques : (Parque Sucre o Hippies, Canal Rio Negro) los cuales presentan terminación de actividades al 100,00 %, el parque( Altablanca) tene porcentajes superiores al 84 %, los parques (Simón Bolivar y PRD) cuentan con un porcentaje del 82% y 92%, el parque (Novios) cuenta con porcentaje superior al 77%, los Pârques (Niños y Sarvita) cuentan con porcentajes superiores al 52% y el parque (San José de Bavaria) cuenta con un porcentaje del 1%,ya que esta hasta ahora se esta iniciando.

FRENTE 3: Esta frente cuenta con doce (12) parques. los Parque (Palestina) ya se encuentran terminados al 100%,el parque (Ceystano) se encuentra al 95%, el parque (Tunal, Villa Alemana, Virrey Sur y La Victoria) presentan un avance superior al 89 %, los parques (Eduardo Santos,Nuevo Muzu, Fregus) presentan porcentajes superiores al 75%, el parque (Nuevo Muzu) presenta porcentaje superiores al 67 % . el parque (Olima Jimenez) tiene un porcentaje del 34% y el parque (Galtan Cortez) tiene un porcentaje del 0.00% .

COMPONENTE SST

Actividades de Interventoría

Actividades de Interventoría
- Verificación de Documentos Ingreso de personal
- Recorridos a los Parques Activos
- Participación en Comité de obra
- Verificación de Trabajos en Alturas
- Verificación Demarcación y Señalización
- Verificación de uso de EPP

Actividades del Contratista

- Capacitación Manejo de Stress
- Entrega de EPP (Guantes)
- Permisos de Trabajos (Alturas)
- Inspección de Arnés
- Jornada de Orden y Aseo
- Señalización y demarcación (Cinta Peligro).

**COMPONENTE AMBIENTAL**

- Durante la semana de reporte se participó en el comité técnico de obra,
- Se realizo seguimiento a los compromisos ambientales,
- Se solicitó al contratista enviar la documentación de los proveedores de materiales,
- Se programó reunión del componente ambiental con la entidad y se recibió el informe 6 en la versión 2 el cual está en revisión por la interventoria.
- Sumado lo anterior se solicitó al contratista enviar registro fotográfico con la implementación de estrategias de recolección de rcds y orden y aseo. El contratista envió el registro fotográfico el día jueves

**COMPONENTE DE CALIDAD**

- Se solicita al contratista se realice corrección de listado de materiales presentado el cual no reporta las cantidades reales de los materiales que ingresan a obra se da ejemplo de lo evidenciado por interventoria con el geotextil ingresado y reportado,
- Se realiza solicitud de realizar cruce de información de los materiales pétreos reportados con remisiones y certificaciones presentadas por parte del componente ambiental lo cual no corresponde
- Se recuerda compromiso de entrega de manuales de mantenimiento y uso de los parques terminados para el 8 de marzo de 2024
- Se presenta plan de inspección y ensayo por parte del contratista incluyendo items de NP aprobados el cual está en revisión por interventoria
- No se recibe por parte del contratista el informe mensual de calidad, por tanto, no se cumple compromiso
- Pendiente la entrega del resultado del material usado para llenoe de tanque séptico de simón Bolivar que evidencie el cumplimiento de recomendaciones del especialista estructural
- Se solicita que la auditoria a realizar al 70% de avance se realice visita a los parques la FRAGUA; UDS; Simón Bolivar,
- Se realiza compromiso de realizar prueba de estanqueidad de tanque séptico de Simón Bolivar el 6 de marzo, pendiente entrega de resultado

**COMPONENTE SOCIAL**

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS
- 04 marzo: Asistencia a reunion parque Nuevo Milzu en el cual se socializa las intervenciones realizadas y se entrega bibliored a lider del proceso.
- 06 marzo: Asistencia a comite de obra en el cual se presentan actividades ejecutadas y se establece compromisos
- 07 marzo: Asistencia a reunion final de parque Ciudad Montes en la cual se conto con la asistencia de lideres de la comunidad, profesionales de interventoria, contratista, se socializa actividades ejecutadas y se escucha las diferentes inquietudes de los asistentes.
- Revisión de presentación para reunion final del parque Ciudad Montes
- Revisión de informe mensual el cual presento observaciones las cuales se remiten al contratista para proceso de subsanación, el dia 04 se recibe y se valida informe mensual
- Elaboración de informe mensual en el cual se consolidada actividades ejecutatas.

**INFORME ANTICIPO**

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana 04 al 10 de marzo de 2024 se describen a continuación:

1. CONTROL DEL ANTICIPO.

Se anexa cuadro correspondiente al control de manejo del anticipo, en el cual se evidencian los valores desembolsados por rubro, el porcentaje, al saldo equivalente de cada uno de estos, el valor aprobado total y el saldo con respecto al valor del anticipo

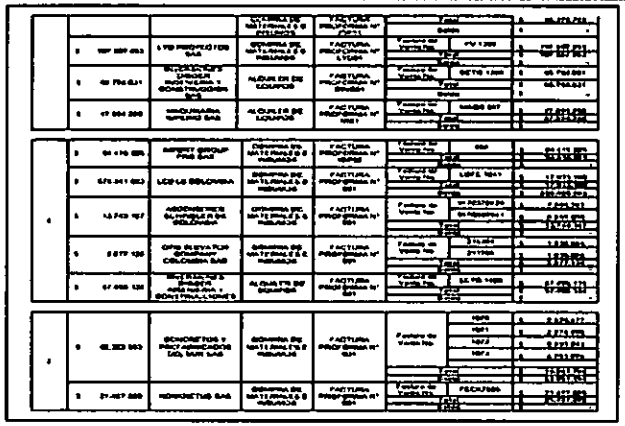
| CONCEPTO | VALOR PRESUPUESTADO | PORCENTAJE | VALOR DESEMBOLSADO | PORCENTAJE | SALDO | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS | $ 4.001.731.007 | 95,92% | $ 4.001.731.007 | 100,00% | $ - | 0,00% |
| ALQUILER EQUIPOS | $ 171.144.643 | 4,10% | $ 171.144.643 | 100,00% | $ - | 0,00% |
| TOTAL | $ 4.172.875.650 | 100% | $ 4.172.875.650 | 100,00% | $ - | 0,00% |

Adicionalmente el siguiente cuadro muestra el total girado y el saldo disponible de los recursos del anticipo correspondientes al contrato: 2. LEGALIZACION DE FACTURAS

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ANTICIPO | $ | 4.292.500.160 |
| CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA DEL 5% | $ | 219.625.029 |
| VALOR GIRADO DEL ANTICIPO | $ | 4.172.875.532 |
| VALOR DESEMBOLSADO | $ | 4.172.875.532 |
| TOTAL SALDO | $ | - |
| VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | $ | 529.306.341 |
| SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO | $ | 3.643.371.191 |






Mediante de los oficios N° CTO-IDRD-3099-2023-210, CTO-IDRD-3099-2023-211 y CTO-IDRD-3099-2023-250 el contratista remite las siguientes facturas legalizando algunos valores del anticipo.





| No. ORDEN | VALOR | ENTIDAD | RUBRO | FACTURA PROFORMA | LEGALIZACION PROFORMA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 46.647.573 | HELECHO SAS | COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS | FACTURA PROFORMA N° 003 | Factura de Venta No. | 778 | $ 46.647.573 |
| | | | | | Total | | $ 46.647.573 |
| | | | | | Saldo | | $ - |
| | $ 39.378.783 | INSIGHT GROUP PRO SAS | | | Factura de Venta No. | 418 | $ 39.378.783 |






REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO



| PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN ) | PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN RECICLADO) |
|---|---|






| | |
|---|---|
|   |   |
| Instalación del adoquín nuevo y remates de tramos en la plazoleta de la puerta de ingreso # 4 | Instalación sendero zona que limita con el árbol sendero hacia la biblioteca, sendero quiosco de la cafetaria |
| PARQUE TUNAL ( CASA DEL ADULTO MAYOR ) | PARQUE TUNAL ( CASA DEL ADULTO MAYOR ) |
|   |   |
| Remates de observaciones para programar entrega a la administración. | Remates de observaciones para programar entrega a la administración. |
| PARQUE TUNAL (ZONA PORTERIAS) | PARQUE TUNAL (ZONA PORTERIAS) |
|   |   |
| Correccion de observaciones hechas por la interventorias de estuco y pintura en porteria # 2 y 3, para entrega y puesta en servicio | Correccion de observaciones hechas por la interventorias de estuco y pintura en porteria # 2 y 3, para entrega y puesta en servicio |
| PARQUE TUNAL (PISTA BMX) | PARQUE TUNAL (KIOSCO CAFETERIA) |



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Se avanza con la evacuacion de las observaciones de la interventoria, para programar entrega a la administracion y puesta en servicio para el martes 12 de marzo de 2024. | | Se suministra e instala el acrilico de techo que estaba roto y reportado como emergencia. | |
| PARQUE EDUARDO SANTOS | | PARQUE EDUARDO SANTOS (COLISEO) | |
|  |  |  |  |
| Se avanza con pintura de muros y cielo rasos en los baños del coliseo, se inicia pilida y brillada de pisos en los baños del coliseo | | Se avanza con pintura de muros y cielo rasos en los baños del coliseo, se inicia pilida y brillada de pisos en los baños del coliseo | |
| PARQUE LA FRAGUA | | PARQUE LA FRAGUA | |
|  |  |  |  |
| Instalación de bordillos en la zona de juegos exterior del parque | | Se avanza con la instalacion de bordillos en concreto perimetral de la pista de patinaje . | |

| PARQUE VILLA ALEMANA | | PARQUE VILLA ALEMANA | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Instala porton nuevo costado lateral del parque, | | Se instalan y soldan las tapas de las cajas de inspeccion | Se avanza con la terminacion de muros de cierre en la parte posterios del parque |
| PARQUE LA VICTORIA | | PARQUE VIRREY SUR | |
|  |  |  |  |
| Se avanza con el mantenimiento y pintura de aparatos en el gimnasio | Se avanza con la pintura de modulos de administracion. | Se avanza actividades con mantenimiento y pintura de juegos infantiles | Se avanza instalacion y asegurada de tapas con marcos nuevas en cajas de inspeccion. |
| PARQUE GILMA JIMENEZ | | | |
|  |  |  |  |
| Se realizaron los arreglos de tramos en adoquin | | Se inician los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo. | |






| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Preparación formaleta para fundida de viga zarpa zona de grecos y ruta de la vida | | Preparación formaleta para fundida de viga zarpa zona de grecos y ruta de la vida | |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | |
|  |  |  |  |
| Fundida de viga zarpa zona de grecos y ruta de la vida | | Fundida de viga zarpa zona de grecos y ruta de la vida | Toma de cilindros fundida de viga zarpa zona de grecos y ruta de la vida |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | |
|  |  |  |  |
| Suministro e instalación malla de cerramiento debajo del puente peatonal | | Suministro e instalación malla de cerramiento debajo del puente peatonal | |

| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | |
|---|---|---|---|
|  |  | N/A | N/A |
| Revisión y arreglo de bebaderos | | | |
| **PARQUE CIUDAD MONTES** | | **PARQUE CIUDAD MONTES** | |
|  |  |  |  |
| Reunión de finalización Parque Ciudad Montes | | Reunión de finalización Parque Ciudad Montes | |
| **PARQUE CIUDAD MONTES** | | **PARQUE CIUDAD MONTES** | |
|  |  |  |  |
| Entrega y puesta en servicio zona ruta de la vida | | | |

| PARQUE NACIONAL | | PARQUE NACIONAL | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Arreglo y pintura de juegos Parque Nacional | | Arreglo y pintura de juegos Parque Nacional | |
| PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | | PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | |
|  |  |  |  |
| Canastillas metalicas para luminarias del velodromo | | Postaria metalicas para luminarias del velodromo | |
| PARQUE CANAL BOYACA | | PARQUE CANAL BOYACA | |
|  |  |  |  |
| Se realizan corte y excavación para fundir dados de concreto zona juegos infantiles | Se realizan corte y excavación para fundir dados de concreto zona juegos infantiles | Se realizan corte y excavación para fundir dados de concreto zona juegos infantiles | Se realizan corte y excavación para fundir dados de concreto zona juegos infantiles |

| PARQUE CANAL BOYACA | | PARQUE CANAL BOYACA | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Excavación para perfilación zona de adoquines | Retiro de material sobrante a punto de acopio de la obra | Excavación para perfilación zona de adoquines | Retiro de material sobrante de la obra |
| **PARQUE ALTABLANCA** | | **PARQUE ALTABLANCA** | |
|  |  |  |  |
| Instalación de la Valla en acceso principal del Parque. | Granito fundido en sitio. | Granito fundido en sitio. | Granito fundido en sitio. |
| **PARQUE ALTABLANCA** | | **PARQUE ALTABLANCA** | |
|  |  |  |  |
| Llenado de granito fundido en sitio, nivelación y pulida. | | Llenado de granito fundido en sitio, nivelación y pulida. | |

868

| PARQUE CANAL RIO NEGRO | | PARQUE CANAL RIO NEGRO | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Pintura de la nueva malla eslabonada - costados sur y oriental del Parque . | | Arreglos de la malla eslabonada y pintura para el cerramiento contraimpacto. | |
| PARQUE CANAL RIO NEGRO | | PARQUE CANAL RIO NEGRO | |
|  |  |  |  |
| Malla contraimpacto instalada por costado occidental, detrás de arco de micofutbol. | | Malla contraimpacto instalada por costado occidental, detrás de arco de micofutbol. | |
| PARQUE CANAL RIO NEGRO | | PARQUE CANAL RIO NEGRO | |
|  |  |  |  |
| Arreglos de ornamentación en cerramiento. | Pintura malla eslabonada costado sur. | Pintura en arcos de microfútbol y baloncesto. | |

PARQUE LOS NIÑOS

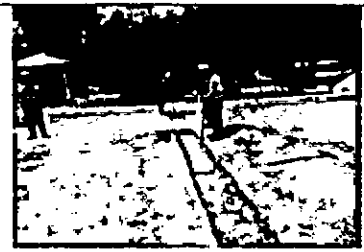


Construcción de caja e inspección.

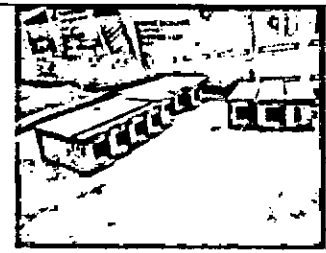


Proceso de instalación del cárcamo prefabricado en concreto en el área del parqueadero.

PARQUEADERO LOS NIÑOS

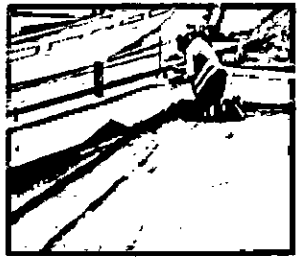


Proceso de instalación del cárcamo prefabricado en concreto en el área del parqueadero.



Proceso de instalación del cárcamo prefabricado en concreto en el área del parqueadero.

PARQUE LOS NIÑOS

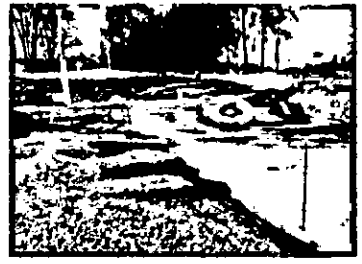


Proceso constructivo para la instalación y nivelación de la grava 3/4"- 1"

PARQUE LOS NIÑOS




PARQUE LOS NIÑOS



Proceso constructivo para la instalación y nivelación de la grava 3/4"- 1"

PARQUE LOS NIÑOS



PARQUE LOS NIÑOS



Nivelación y compactación de la superficie

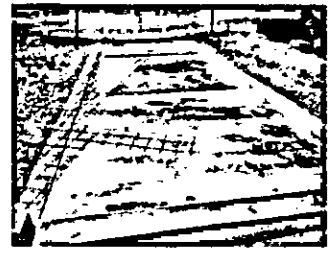


Instalaciones sanitarias, cuyas redes comunican con las cajas de inspección en Zona de Niños y en el

PARQUE LOS NIÑOS







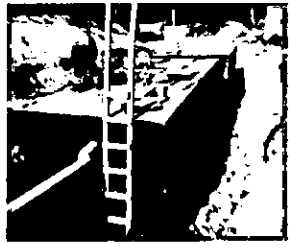

PARQUE LOS NIÑOS








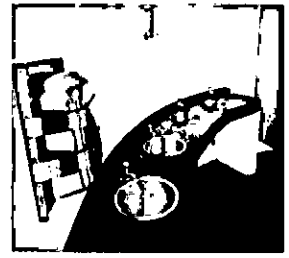
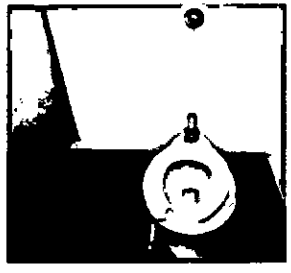
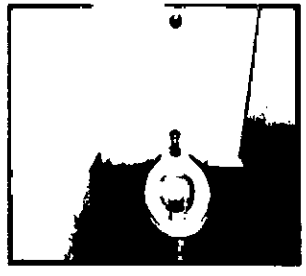
Placa de concreto acceso Parque de Niños, por sector del Parqueadero.


PARQUE LOS NIÑOS





| | |
|---|---|
|   |   |
| Registro de llegada del asfalto a la obra y toma de la temperatura. | Registro de llegada del asfalto a la obra y toma de la temperatura. |
| PARQUE LOS NIÑOS | PARQUE LOS NIÑOS |
|   |   |
| Extendida y compactación del asfalto espesor =8cm; PAVIOBRAS- Mezcla MDC19, Despacho 52213 | Extendida y compactación del asfalto espesor =8cm; PAVIOBRAS- Mezcla MDC19, Despacho 52213 |
| PARQUE LOS NIÑOS | PARQUE LOS NIÑOS |
|   |   |
| Proceso constructivo durante la aplicación del asfalto en el Parqueadero del Parque de los Niños. | Proceso constructivo durante la aplicación del asfalto en el Parqueadero del Parque de los Niños. |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) |



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Finaliza el proceso de aplicación de la Pollurse al interior de los tanques sépticosy llenado de los tanques. | | Disposición de los filtros al interior del tanque séptico. | Pruebas de estanqueidad |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |
|  |  |  |  |
| Vertimiento del agua al lago, despues de realizar pruebas de estanqueidad.- Maná | | Resanes en muros de los baños de hombres- Módulo El Carbón | |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |
|  |  |  | Cambio de  |
| Cambio de instalaciones hidrosanitarias en los baños de hombres- Módulo El Carbón. | | Cambio de las canecas | |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Recorrido e Inspección por parte de la Administración, Contratista y la Interventoría, para verificar las canecas que deben tener cambio. | | Aplicación de Pintura en los Kioscos. | |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |
|  |  |  | N/A |
| Limpieza kioscos de comidas- acero | Desmonte de canecas | Canecas en mal estado para realizar cambio. | |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |
|  |  |  |  |
| ntrega formal a la Administración del Parque , de los baños de mujeres (Instalaciones hidrosanitarias, enchapes e instalación eléctrica). | | Entrega formal a la Administración del Parque , de los baños de mujeres (Instalaciones hidrosanitarias, enchapes e instalación eléctrica). | |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | | PARQUE DE LOS NOVIOS | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Entrega formal a la Administración del Parque, de los baños de mujeres (instalaciones hidrosanitarias, enchapes , pintura e instalación eléctrica), todo en funcionamiento. | | Entrega formal a la Administración del Parque, de los baños de mujeres (instalaciones hidrosanitarias, enchapes , pintura e instalación eléctrica), todo en funcionamiento. | |
| PARQUE SERVITA | | PARQUE SERVITA | |
|  |  |  |  |
| Desmonte de luminarias en postes de la Cancha de Fútbol. | | Desmonte de luminarias en postes de la Cancha de Fútbol. | |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON) | | PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS) | |
|  |  |  |  |
| Se detecta fuga de agua potable en sanitario de baño en 1er Piso. | Inspección de posibles fugas de agua en lavamanos. | Revisión para realizar cambio de fluxómetros en baños . | Se le hace la observación al Administrador, para que las personas a cargo del Aseo, no retiren los tapones del desague del lavamanos |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Aplicación de la capa de rodadura asfáltica 1350- extendida y compactación.; inicio en la instalación de bordillo para sendero peatonal. | | Aplicación de la capa de rodadura asfáltica 1350- extendida y compactación.; inicio en la instalación de bordillo para sendero peatonal. | |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON) | |
|  |  |  | N/A |
| Estructura para soporte de cielorraso en PVC, para bodega en Administración PRD. | | Estructura para soporte de cielorraso en PVC, para | |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON) | |
|  |  |  |  |
| Cilorraso en PVC, para oficina de sistemas en Administración del PRD | | Aplicación de recibase, para recubrimiento de piso en las Canchas de Tenis- PRD | |
| PARQUE LOS NOVIOS | | PARQUE LOS NOVIOS | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Proceso constructivo para las vigas de cimentación- Módulo de baños. | | Proceso constructivo para las vigas de cimentación- Módulo de baños. | |
| PARQUE LOS NOVIOS | | PARQUE LOS NOVIOS | |
|  |  |  |  |
| Fundida en concreto vigas de cimentación. Rellenos al interior. | Amarre de acero para las vigas de cimentación. | | Reparación de tuberías de agua potable que estaban cruzando por el área intervenida. |
| PARQUE LLOS NOVIOS | | PARQUE LLOS NOVIOS | |
|  |  |  |  |
| Instalación de la estrucura metálica al interior del Tunal del Amor. | | Revisión de instalaciones sanitarias . | Inicio de excavaciones en área intermedia de los tanques de almacenamiento de agua potable. |
| REGISTRO FOTOGRAFICO SST | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| | | | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL | | | |
|  |  |  |  |
| Asistencia a reunion parque Nuevo MUzu en el cual se socializa las intervenciones realizadas y se entrega bibliorad a lider del proceso. | | Asistencia a reunion final de parque Ciudad Montes en la cual se conto con la asistencia de lideres de la comunidad, profesionales de interventoria, contratista, se socializa actividades ejecutadas y se escucha las diferentes inquietudes de los asistentes. | |

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**Reporte Semanal** 27 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

marzo 10, 2024 al marzo 16, 2024

1. **Datos Generales**

PARQUE | Código: | Localidad: | Barrio:

2. **Contrato de Obra**

Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

COP No. 3099-2023

| F.I. | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. #02 | F.R.#2 | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 7 MESES | 11-abr-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo Directo | 10.861.251.399,00 | $ 41.864.509,00 | $ 77.343.753,00 | $ 144.068.822,00 | $ 1.116.810.201,00 | 3.561.173.407,00 | |
| A.I.U. (25,06%) | 2.751.901.601,00 | $ 10.491.246,00 | $ 19.382.319,00 | $ 36.103.096,00 | $ 280.323.716,00 | $ 892.430.056,00 | |
| Sub Total | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | $ 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.398.933.917,00 | $ 4.453.603.463,00 | |
| Total Inicial | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | $ 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.398.933.917,00 | $ 4.453.603.463,00 | |
| Adición No. | | | | | | | |
| Total Final | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.398.933.917,00 | $ 4.453.603.463,00 | |
| Anticipo: (40% Sobre costo directo) | 4.392.500.560,00 | $ 16.745.604,00 | $ 30.937.493,00 | $ 57.626.649,00 | $ 447.444.060,00 | $ 1.780.586.704,00 | |
| Total | 4.392.500.560,00 | $ 35.609.951,00 | $ 65.788.579,00 | $ 122.543.069,00 | $ 951.489.837,00 | $ 2.673.016.759,00 | |
| Acumulado | | $ 35.609.951,00 | $ 101.398.530,00 | $ 223.941.599,00 | $ 1.175.431.436,00 | $ 3.848.448.195,00 | |

3. **Contrato de Interventoría**

Objeto: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

CI No. 3131-2023

| F.I. | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. | F.R. | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 8 MESES | 11-may-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato: | 1.001.825.407,00 | $ 64.136.863,00 | $ 65.419.199,00 | $ 67.883.654,00 | $ 103.446.492,00 | $ 192.570.880,00 | |
| Iva (19%) | 190.346.827,00 | $ 12.186.004,00 | $ 12.429.648,00 | $ 12.894.094,00 | $ 19.655.213,00 | $ 36.588.467,00 | |
| Sub Total | 1.192.172.234,00 | $ 76.322.867,00 | $ 77.848.847,00 | $ 80.757.748,00 | $ 123.103.705,00 | $ 229.159.347,00 | |
| Adición: | | | | | | | |
| Total Final | 1.192.172.234,00 | $ 76.322.867,00 | $ 77.848.847,00 | $ 80.757.748,00 | $ 123.103.705,00 | $ 229.159.347,00 | |
| Retegarantía: | 119.217.223,00 | $ 7.632.287,00 | $ 7.784.885,00 | $ 8.075.775,00 | $ 12.310.371,00 | $ 22.915.935,00 | |
| TOTAL | 1.192.172.234,00 | $ 68.690.580,00 | $ 70.063.962,00 | $ 72.681.973,00 | $ 110.793.334,00 | $ 206.243.412,00 | |
| | | $ 68.690.580,00 | $ 138.754.542,00 | $ 211.436.515,00 | $ 322.229.849,00 | $ 528.473.261,00 | |

4. 27 Fecha de corte: marzo 16, 2024

4.1. **Datos Generales**

Nombre: PRD- Muro squash/canchas tenis/Canchas Hockey/Administración | Código: 12-091 | Localidad: BARRIOS UNIDOS

Dirección: Carrera 60 # 63-75 | Barrio:

Ppto. | % Ejecución Acumulado

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 330.780.256,00 | 2,44% | 92,00% | 92,00% | 0,00% | $ 304.317.835,52 |
| TOTAL | | 330.780.256,00 | | 92,00% | 92,00% | 0,00% | $ 304.317.835,52 |

| 4.2 Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Simón Bolívar | Código: | 13-089 | Localidad: | ENGATIVÁ |
| Dirección: | Avenida Calle 63 # 68-45 | | | Barrio: | |

| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
| | | $ 869.359.406,00 | 6,41% | 82,00% | 90,00% | 2,00% | $ 782.423.465,40 |
| TOTAL | | 869.359.406,00 | | 82,00% | 90,00% | 2,00% | $ 782.423.465,40 |

| 4.3. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Alta Blanca | Código: | 01-075 | Localidad: | USAQUEN |
| Dirección: | Carrera 8 A #158-04 | | | Barrio: | |

| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
| | | $ 154.101.031,00 | 1,14% | 100,00% | 95,00% | 5,00% | $ 146.395.979,45 |
| TOTAL | | 154.101.031,00 | | 100,00% | 95,00% | 5,00% | $ 146.395.979,45 |

| 4.4. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque de los Niños | Código: | 12-141 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS |
| Dirección: | Avenida Carrera 53 # 60-80 | | | Barrio: | |

| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
| | | $ 1.432.296.903,00 | 10,55% | 78,00% | 65,00% | 13,00% | $ 930.992.986,95 |
| TOTAL | | 1.432.296.903,00 | | 78,00% | 65,00% | 13,00% | $ 930.992.986,95 |

| 4.5. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque de los Novios | Código: | 12-092 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS |
| Dirección: | Avenida Calle 63 # 45-10 | | | Barrio: | |

| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
| | | $ 214.775.256,00 | 1,58% | 82,00% | 83,00% | -1,00% | $ 178.263.462,48 |
| TOTAL | | 214.775.256,00 | | 82,00% | 83,00% | -1,00% | $ 178.263.462,48 |

| 4.6. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Canal Río Negro | Código: | 12-002 | Localidad: | ANDES -RIO NEGRO |
| Dirección: | Calle 89 A # 20-57 | | | Barrio: | |

| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
| | | $ 79.062.034,00 | 0,58% | 76,00% | 100,00% | -24,00% | $ 79.062.034,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | 79.062.034,00 | | 76,00% | 100,00% | -24,00% | $ | 79.062.034,00 |

4.7. Datos Generales

Nombre: Parque Suera o Hipolo | Código: 02-019 | Localidad: CHAPINERO
Dirección: Calle 60 - Cra 7 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 118.088.403,00 | 0,87% | 89,00% | 100,00% | -11,00% | $ | 118.088.403,00 |
| TOTAL | | 118.088.403,00 | | 89,00% | 100,00% | -11,00% | $ | 118.088.403,00 |

4.8. Datos Generales

Nombre: Parque UDS | Código: 10-290 | Localidad: ENGATIVA
Dirección: Calle 63 # 68 - 45 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.055.040.961,00 | 7,77% | 91,00% | 90,00% | 1,00% | $ | 949.536.864,90 |
| TOTAL | | 1.055.040.961,00 | | 91,00% | 90,00% | 1,00% | $ | 949.536.864,90 |

4.9. Datos Generales

Nombre: Parque San José de Bavaria | Código: 11-078 | Localidad: SUBA
Dirección: Ac 170 - Cra 65 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 25.527.265,00 | 0,19% | 70,00% | 60,00% | 10,00% | $ | 15.316.359,00 |
| TOTAL | | 25.527.265,00 | | 70,00% | 60,00% | 10,00% | $ | 15.316.359,00 |

4.10. Datos Generales

Nombre: Estadio Olaya Herrera | Código: 18-207 | Localidad: RAFAEL URIBE
Dirección: Cl. 35 #3-50 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 600.483.302,00 | 4,42% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 600.483.302,00 |
| TOTAL | | 600.483.302,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 600.483.302,00 |

4.11. Datos Generales

Nombre: Parque Ciudad Montes | Código: 16-112 | Localidad: PUENTE ARANDA
Dirección: Cl. 10 Sur #39-29 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 295.993.778,00 | 2,18% | 93,00% | 100,00% | -7,00% | $ | 295.993.778,00 |
| TOTAL | | 295.993.778,00 | | 93,00% | 100,00% | -7,00% | $ | 295.993.778,00 |

584
888

4.12. Datos Generales

Nombre: Parque Bosques de San Carlos | Código: 18-028 | Localidad: RAFAEL URIBE
Dirección: Dirección no C 19 no 13 a E 30 no 15 S no | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 985.049.229,00 | 7,28% | 67,00% | 65,00% | 2,00% | $ | 640.281.998,85 |
| TOTAL | | 985.049.229,00 | | 67,00% | 65,00% | 2,00% | $ | 640.281.998,85 |

4.13. Datos Generales

Nombre: Estadio de Techo | Código: 08-554 | Localidad: KENNEDY
Dirección: Transversal 78K No. 41 A - 04 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 66.643.578,00 | 0,49% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 66.643.578,00 |
| TOTAL | | 66.643.578,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 66.643.578,00 |

4.14. Datos Generales

Nombre: Parque Laureles Naranjos | Código: 07-035 | Localidad: BOSA
Dirección: Cl. 70 Bis Sur #80K - 1 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 26.022.208,00 | 0,19% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 26.022.208,00 |
| TOTAL | | 26.022.208,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 26.022.208,00 |

4.15. Datos Generales

Nombre: Parque Villa de los Alpes | Código: 04-075 | Localidad: SAN CRISTOBAL
Dirección: Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 156.478.296,00 | 1,15% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 156.478.296,00 |
| TOTAL | | 156.478.296,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 156.478.296,00 |

4.16. Datos Generales

Nombre: Parque el Porvenir | Código: 07-391 | Localidad: BOSA
Dirección: Calle 52 Sur - Cra 97 C | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 33.582.453,00 | 0,25% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 33.582.453,00 |
| TOTAL | | 33.582.453,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 33.582.453,00 |

4.17. Datos Generales

Nombre: Parque Primero de Mayo | Código: 04-196 | Localidad: SAN CRISTOBAL

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dirección: | carrera 5 bis # 17 - 14 | | | Barrio: | | | | |
| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | % Inversión | | |
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | | | | |
| | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | | | | |
| Emergencia | | $ 615.714.752,00 | 4,54% | 100,00% | 90,00% | 10,00% | $ | 554.143.278,80 | | |
| TOTAL | | 615.714.752,00 | | 100,00% | 90,00% | 10,00% | $ | 554.143.278,80 | | |
| 4.18. Datos Generales | | Nombre: | Parque Nacional | Código: | 03-035 | Localidad: | SANTA FE | | | |
| | | Dirección: | Carrera 7 # 36 - 10 | | | Barrio: | | | | |
| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | % Inversión | | |
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | | | | |
| | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | | | | |
| | | $ 41.000.192,00 | 0,30% | 42,00% | 100,00% | -58,00% | $ | 41.000.192,00 | | |
| TOTAL | | 41.000.192,00 | | 42,00% | 100,00% | -58,00% | $ | 41.000.192,00 | | |
| 4.19. Datos Generales | | Nombre: | Parque Servita | Código: | 01-023 | Localidad: | USAQUEN | | | |
| | | Dirección: | Calle 165 # 7 - 32 | | | Barrio: | | | | |
| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | | | |
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión | | |
| | | $ 601.248.287,00 | 4,43% | 84,00% | 89,00% | -5,00% | $ | 535.109.195,43 | | |
| TOTAL | | 601.248.287,00 | | 84,00% | 89,00% | -5,00% | $ | 535.109.195,43 | | |
| 4.20. Datos Generales | | Nombre: | Parque Canal Boyaca | Código: | 09-050 | Localidad: | FONTIBON | | | |
| | | Dirección: | Cra 74 B # 23 A - 06 | | | Barrio: | | | | |
| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | | | |
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión | | |
| | | $ 910.502.644,00 | 6,71% | 70,00% | 65,00% | 5,00% | $ | 591.826.718,60 | | |
| TOTAL | | 910.502.644,00 | | 70,00% | 65,00% | 5,00% | $ | 591.826.718,60 | | |
| 4.21. Datos Generales | | Nombre: | Parque El Virrey Norte | Código: | 02-014 | Localidad: | CHAPINERO | | | |
| | | Dirección: | Calle 88 - Cra 7 y Autop Norte | | | Barrio: | | | | |
| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | | | |
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión | | |
| | | $ 28.197.735,00 | 0,21% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 28.197.735,00 | | |
| TOTAL | | 28.197.735,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 28.197.735,00 | | |
| 4.22. Datos Generales | | Nombre: | Parque Fontanar del Rio | Código: | 11-368 | Localidad: | SUBA | | | |
| | | Dirección: | Calle 145 B 138 A - 10 | | | Barrio: | | | | |

| Capítulos: | Fecha inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 508.119.341,00 | 3,74% | 49,00% | 35,00% | 14,00% | $ 177.841.769,35 |
| TOTAL | | 508.119.341,00 | | 49,00% | 35,00% | 14,00% | $ 177.841.769,35 |

4.23. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque el Tunal | Código: | 06-063 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | Cra.19D #52B-15. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.185.589.858,00 | 8,74% | 97,00% | 95,00% | 2,00% | $ 1.126.310.173,20 |
| TOTAL | | 1.185.589.858,00 | | 97,00% | 95,00% | 2,00% | $ 1.126.310.173,20 |

4.24. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque La Fragua | Código: | 15-040 | Localidad: | ANTONIO NARIÑO |
| Dirección: | Cra.33 #148-57B | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 671.736.911,00 | 6,42% | 81,00% | 78,00% | 3,00% | $ 679.954.790,58 |
| TOTAL | | 671.736.911,00 | | 81,00% | 78,00% | 3,00% | $ 679.954.790,58 |

4.25. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Mirador Bernini | Código: | 19-788 | Localidad: | CIUDAD BOLIVAR |
| Dirección: | Cra.27b #1-1 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 224.051.968,00 | 1,65% | 87,00% | 83,00% | 4,00% | $ 185.963.131,78 |
| TOTAL | | 224.051.968,00 | | 87,00% | 83,00% | 4,00% | $ 185.963.131,78 |

4.26. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Eduardo Santos | Código: | 14-030 | Localidad: | LOS MARTIRES |
| Dirección: | CALLE 4A BIS N 18 B 30 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 140.357.541,00 | 1,03% | 94,00% | 94,00% | 0,00% | $ 131.936.088,54 |
| TOTAL | | 140.357.541,00 | | 94,00% | 94,00% | 0,00% | $ 131.936.088,54 |

4.27. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Nuevo Muzu | Código: | 06-017 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | 38 a 52a..Cra.61B | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 848.409.817,00 | 6,24% | 79,00% | 80,00% | -1,00% | $ 677.127.853,80 |
| TOTAL | | 848.409.817,00 | | 79,00% | 80,00% | -1,00% | $ 677.127.853,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.28. | Datos Generales | Nombre: | Parque Cayetano | Código: | 08-241 | Localidad: | USME |
| | | Dirección: | Cra. 80 #40.55 Sur. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 214.611.043,00 | 1,58% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 214.611.043,00 |
| TOTAL | | 214.611.043,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 214.611.043,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.29. | Datos Generales | Nombre: | Parque Villa Alemana | Código: | 08-087 | Localidad: | USME |
| | | Dirección: | Cra 5 Este # 5 - | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 45.922.585,00 | 0,34% | 96,00% | 96,00% | 0,00% | $ 44.085.691,20 |
| TOTAL | | 45.922.585,00 | | 96,00% | 96,00% | 0,00% | 44.085.691,20 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30. | Datos Generales | Nombre: | Parque Palestina | Código: | 07-165 | Localidad: | BOSA |
| | | Dirección: | Cll. 67 S # 81 G - 09 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.797.573,00 | 0,08% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 10.797.573,00 |
| TOTAL | | 10.797.573,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 10.797.573,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.31. | Datos Generales | Nombre: | Parque Virrey Sur | Código: | 05-016 | Localidad: | TUNJUELITO |
| | | Dirección: | Calle 93 SUR # 3 A - 03 ESTE | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 91.107.585,00 | 0,67% | 72,00% | 93,00% | -21,00% | $ 84.730.035,45 |
| TOTAL | | 91.107.585,00 | | 72,00% | 93,00% | -21,00% | 84.730.035,45 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32. | Datos Generales | Nombre: | Parque Gilma Jimenez | Código: | 05-016 | Localidad: | TUNJUELITO |
| | | Dirección: | Calle 51 AS #55A-00 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 360.308.039,00 | 2,88% | | 55,00% | 52,00% | 3,00% | $ | 202.960.180,28 |
| TOTAL | 360.308.039,00 | | | 55,00% | 52,00% | 3,00% | | 202.960.180,28 |

4.33. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque La Victoria | Código: | 04-122 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 50.851.447,00 | 0,37% | 98,00% | 89,00% | 7,00% | $ | 45.257.787,83 |
| TOTAL | | 50.851.447,00 | | 98,00% | 89,00% | 7,00% | | 45.257.787,83 |

4.34 Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Gaitan Cortes | Código: | 04-103 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | Cl 18 # 5 - 60 sur | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.000.000,00 | 0,07% | 31,00% | 100,00% | -69,00% | $ | 10.000.000,00 |
| TOTAL | | 10.000.000,00 | | 31,00% | 100,00% | -69,00% | | 10.000.000,00 |

5

| | |
|---|---|
| Fecha Inicial: | 12-sep-23 |
| Fecha de Terminación Inicial: | 11-abr-24 |
| Adición de tiempo en (meses): | |
| Fecha de Terminación Final: | 11-abr-24 |

6. OBSERVACIONES:
El presente reporte se ajusta al nuevo balance en el que se incluyen nuevas actividades y se definen nuevos frentes por parte de la entidad, en el cuál se suprimen actividades y se ajustan cantidades, la medición se realizó con la programación remitida por el contratista de obra el día 27-02-2024, sin embargo el mismo debe ajustar a las condiciones actualizadas, por lo que se requirió al CONSORCIO PARQUES BOG, remitir el cronograma actualizado al Balance presupuestal

7. Licencias:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción: | Ambiental: | N/A | Intervención del Espacio Público | | N/A |

8. Servicios Públicos:
TELEFONOS
DAMA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODENSA | N/A | | EAAB | | OTROS | | |
| | Informo 50% | | | Informo 75% | | Informo 100% | |

| 9. | PAC 2023 | | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

10. Observaciones por parques:

1.- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Se continua con las actividades constructivas en la zona de los gracoronanos y ruta de la vida,en estas zonas ya se termino e econstruir la viga zarpa, se instalo geotextil T-2100 y se inicio la colocacion de materikal granular base por capas de e=10cms el cual s eesta compactando con vibrocompactador. llego elpios caucho para su correpondeingte instalación..
2.- PARQUE FONTANAR DEL RIO: Se debe iniciar la construcción el Parkour, ya que se cuenta con el sitio dentro del parque para iniciar esta actividad, esta pendiengte la instalación del vidrio de 6mm templado zona de cafeteria.
3.- PARQUE CANAL BOYACA: Se realizo excavación y perfilacion del terreno en zona del sendero y zona de la plazoleta, se instalo geptextil T-2400 traslapado y se inico la colocación de la subbase reciclada la cual se esta compactando con el vibrocompactador, se tiene en obra bordillos, geptextil subase y base granular y adoquines., se deben tomar las respectivas densidades de las subbase.
4.- PARQUE TUNAL: Se encuentra con un pequeño porcentajes de atraso debido a la instalación de adoquín nuevo y en mantenimiento y pintura en Gracos
5.- PARQUE FRAGUA: Se encuentra con un pequeño porcentajes de atraso debido debido al amntenimeitno de los juegos infantiles
6.- PARQUE EDUARDO SANTOS: Llava un porcentaje igual en el cual se encuentran rematando los baños de colisao, y en la zona de biosaludables.
7.- PARQUE MIRADOR ILLAMINI: Se encuentra con un pequeño porcentajes de atraso debido que el modulo de baños es el que mas pesa en el presupuesto este se encuentra en proceso de ejcución.
8.- PARQUE NUEVO MUZU: Presenta un adelanto debido a el rendimiento de esta semana en la pintura del piso de la zona de juegos y el inicio de la instalación de juegos en la misma zona.
9.- PARQUE VIRREY DEL SUR: Refleja adelanto debido el rendimiento en la actividad de mantenimiento y pintura de juegos infantiles y aparatos biosaludables
10.- PARQUE PRIMERA DE MAYO: En este parque se realizo el desmonte de los postes en concreto y tactualmente se ncuentra en ejcución las ampliación d elk aexcavación para fundir los dados en concreto.
11.- PARQUE NACIONAL: Este Parque se encuentra actualmente terminado el contratista realizo el mantenimiento, pintura e instalación de los dos (2) juegos.

11. INFORME TÉCNICO

I.- ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

- PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

SENDEROS EN ADOQUIN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A LA PUERTA DE INGRESO # 4.

- Se avanza con la instalación del adoquín nuevo y remates de tramos en sendero zona que limita con el árbol, sendero hacia la bibliotaca, sendero quiosco de la cafetaria, se avanza con la fundida de cintas de concreto que confinan los tramos, para entrega de tramos a la adinistracion

CASA DEL ADULTO MAYOR

- Se hace entrega a la administración y puesta en servicio.

ZONA DE PORTERIAS:

- Se hace entrega a la adminitracion y puesta en sercicio de las portarias # 2 y 3, se avanza con la correccion de observaciones de la I ntervenrorla para la entrega de la portaria # 4.

PISTA DE BMX:

- Se terminan de evacuar las observaciones para programar entrega y puesta enn servicio, se entrega a la administracion el dia 15 de marzo y puesta en servicio para el martes 19 de marzo de 2024.

BAÑOS UCAD TUNAL:

- Se reporta esta semana emergencia en baños ucad tunal, debido a una fuga de agua potable, se diagnostica y programa arreglo.

- PARQUE MIRADOR ILLIMANI:

- Se inician trabajos en el módulo de baños, adecuación de cubiertas, instalación de divisiones en acero, que es lo único pendiente en este frente.

- PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se avanza con remates de muros y cielo rasos en los baños del coliseo, se termina la pulida y brillada de pisos en los baños del coliseo para hacer entrega el martes proximo a la administración.

- PARQUE LA FRAGUA:

- - Se termina la instalación de bordillos en la zona de jugos exterior Y se funde placa de contra piso de esta zona del parque.
- Se termina la instalacion de bordillos en concreto perimetral de la pista de patinaje, se hacen arreglos y cambios de tabletas en la pista de baldosin interna, se alista base para imprimacion con emulsion asfaltica.

- PARQUE LA VICTORIA

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de modulos de baños y mantenimiento interno de los mismos.

- PARQUE NUEVO MUZU:

- Se avanza con la instalacion de parales para nuevo tramo de baranda, se terminan arreglos hidrosanitarios y enchapes en baños del coliseo, llega meterial de piso caucho.

204

• PARQUE VILLA ALEMANA:

- Se avanza con la instalacion de paneles para nuevo tramo de baranda, se terminan arreglos hidrosanitarios y enchapes en baños del coliseo, llega material de piso caucho.

• PARQUE VIRREY SUR:

- Se avanza actividades con mantenimiento y pintura de juegos infantiles, pintura de bancas y mesas de ajedrez, e instalacion de señales.

• PARQUE GILMA JIMENEZ:

- Se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías.

• PARQUE LA PETAR

- Se suministra e instala porton de ingreso doble hoja y valla del parque.

• PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100,00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se colocarón los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

- El IDRD realiza reubicación de sitio para los módulos sanitarios
- El Contratista debe ajustar el presupuesto e incluir el valor de las nuevas actividades
- Se deben adecuar las instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas.

• PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado-
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%
- Se realizó reunión social de finalización.
- Se realizo Acta de puesta en servicio zona ruta de la vida.

• PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD.

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas 0,00%

- PARQUE CANAL BOYACA

- Se realiza excavación y perfila ción del terreno zona adoquín.
- Llegada de material granular sub base
- Se inicia la colocación de geotextil y colocación de subbase zona del sendero entrada la perqua.
- Se incia compactación de material granular con vibrocompactador.

- PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Pendiente instalación de vidrio de 6mm gtemoplado para el módulo de comidas.
- Esta pendiente el inicio de la construcción de la zona del parkour.

- PARQUE NACIONAL

- Se realiza la instalación y el montaje de los dos (2) juegos .

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-026

ZONA BAÑOS ADMINISTRATIVOS

- Pendiente cambio puerta de entrada baños hombres y mujeres.

ZONA BEBDEROS

- Se revisan los bebederos existentes para arreglarlos.

ZONA BIOSALUDABLES

- Llegada e instalación de tres (3) módulos pendiente por instalar.

ZONA GRECOROMANOS

- Se realiza la colocación de geotextil T- 2100 en zona d elos grecoromanos.
- Llega material granular base.
- Se inicia la colocación de base sobre el geotextil en capas de 10 cms.,
- Se inicia la compactacipoón del material granular con el vibrocompactador.

ACTIVIDADES ELÉCTRICAS

- En este parque no se van a realizar actividades electricas 0,00%

- PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Se termina el proceso de relleno (material seleccionado de excavación), en capas de 15 cm en el área perimetral de los tanques sépticos. SE realiza la compactación con canguros desde la parte inferior de los tanques, hacia el nivel de piso. Se realiza la toma de densidades en el terreno ya nivelado y compactado; se verifican densidades en terreno con buenos resultados y se procede a cubrir con tierra negra el área afectada por la intervención.
- Al interior del tanque séptico, se acondicionan los filtros en grava.
- Retiro de escombros y aseo general en zona externa de los tanques.
- Se le ha solicitado al Contratista, disponer del prado para cubrir de manera urgente el espacio que se interviene y retirar la polisombra y el cerramiento provisional.
- Se revisa el sello de la tubería de aducción al pozo séptico, por posible fuga. Se realiza subsanación y se autoriza realizar el relleno en este sitio.
- Se cubre el área con tierra negra (capa de 10 cm de espesor).

En los baños y Cocineta del Módulo Maná.

- Se realiza entrega a la Administración la batería de baños de hombres y mujeres del Módulo de Comidas Maná.
- Se realiza Acta de Puesta en servicio Obras Comunidad. (baños y desague lavaplatos cocineta del Módulo Maná)

En el Sector del lago

- Continúa la fijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas. No se reciben los kioscos de comidas, por las observaciones que objetó la interventoría en el acabado de la pintura.
- El Contratista realiza limpieza y aseo de los espacios que está interviniendo; especialmente las manchas dejadas en las láminas de acero cuando se está aplicando la pintura en los kioscos de comidas.
- Finaliza la aplicación de pintura para las barandas externas acceso a la Capilla del Templete Eucarístico.
- Continúa el mantenimiento para el juego infantil M5 , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.

En el Sector del módulo del carbón

- Se realiza entrega a la Administración la batería de baños de hombres del Módulo de Comidas El Carbón.
- Se realiza Acta de Puesta en servicio Obras Comunidad. (baños y desague lavaplatos cocineta del Módulo El Carbón)
- Se adecúa la zona exterior del Módulo en tierra negra; se programa empradizar el día 18 de marzo. (tramo del costado sur contra cuartos de bombas)

En otros sectores del Parque

- Se hace entrega a la Administración del Escenario, de 14 bebederos localizados en diferentes sectores. Se revisaron 3 de estos que durante la entrega, no funcionó el suministro de agua y otro bebedero que tiene roto el tubo de agua que lo alimenta.
- Continúa el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.
- Continúa el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.

- PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Alistado de piso para fundir tramo de andén en concreto zona verde hacia Canchas de Tenis.
- Adecuación del terreno; aplicación de tierra negra en zona verde hacia Canchas de Tenis.
- Aplicación de la última capa de recubrimiento sintético en Cancha de Squash
- Recubrimiento sintético Cancha de Squash
- Pintura de muro y demarcación

PRD - Área Administrativa.

- Cielorraso en PVC instalado en el acceso de la Administración PRD
- Cielorraso en PVC instalado en el depósito de la Administración PRD
- Instalación de lámparas de iluminación en baños.
- Instalación eléctrica en Caseta de comidas frente a Cancha de Hockey

PRD - UCAD

- Finaliza la instalación del enchape de piso en la cocina del Restaurante.

PRD - Cancha de Baloncesto

- Alistado para fundir andenes en concreto para la Cancha de baloncesto.

- PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Se realiza la instalación de fluxómetro en baños de 1° piso del Velódromo.
- En Cancha de beisbol se avanza en el desmonte de luminarias de postes de alumbrado.
- Se realiza la excavación de las cajas para la instalación de las bajantes en tubería EMT 3/4"- puestas a tierra.
- Instalación de las cajas para la instalación de las bajantes en tubería EMT 3/4"- puestas a tierra.

- PARQUE CANAL RIO NEGRO

- Acabado de pintura para cerramintos, arcos de canchas de micofútbol y baloncesto
- Revisión y entrega de los deslizaderos en acero inoxidable ubicados en cuatro sectores diferentes del parque .
- Entrega final de los trabajos realizados en el Escenario, al Administrador del Parque, Señor Johan Espinosa
- Elaboración del Acta de la Puesta en Servicio Obras Comunidad con fecha 14 marzo 2024.

PARQUE ALTA BLANCA

- Finaliza la pulida de la totalidad de la pista de velocidad.
- Recolección y transporte de escombros para disposición final.
- Reconstrucción de tramos del cárcamo dn concreto.
- Entrega final de los trabajos realizados en el Escenario, al Administrador del Parque, Señor Adonay Palacios.
- Puesta en funcionamiento la Pista de Patinaje, al servicio de la Comunidad.
- Elaboración del Acta de la Puesta en Servicio Obras Comunidad, con fecha 12 de marzo 2024.

- PARQUE DE LOS NIÑOS

- Demolición de caja existente que estaba enterrada y que recibía las aguas lluvias del interior del parque, por este costado.
- Excavaciones para construcción del otro pozo de alcantarillado por costado sur.
- Suministro de grava 3/4"-1", para extendida y compactación en la Zona de las canchas de Voleyplaya.
- Continúa la ejecución de excavaciones para construcción del filtro francés en el área de las canchas.
- Avance en la extendida de la capa de triturado de río 3/4" -1" (e=15 cm).
- Avance en la construcción del filtro francés (espina de pescado).
- Extendida, compactación y nivelación de la capa de triturado.
- Instalación y cerramiento (cosido y embolsado de la grava ) con el material geotextil 4000.
- En obra parte de la tubería metálica para instalación del cerramiento por costado oriental.

- PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se ha programado el traslado y ubicación del módulo de baños para el 18 de marzo de 2024
- Se avanza en la excavación para reemplazar tubería averiada que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Construcción de pasamanos metálicos para instalar al interiuor de la estructura del túnel del Amor.
- Soportes y anclajes de la estructura metálica a los dados en concreto.
- Destapada de cajas de inspección enterradas - verificación de funcionamiento para poder hacer uso de estas.
- Por solicitud de la Coordinación del IDRD, se realiza inspección al Tren de comidas existante en el Parque de los Novios. Se resume en los siguientes aspectos:
- 1-Deterioro de la estructura externa e interna en los módulos del tren de Comidas.
- 2-Instalaciones eléctricas y sanitarias en mal estado y sin conexiones, no cumplen Normatividad técnica.
- 3-Con referencia al aspecto sanitario, este es bastante crítico en los vagones del Tren de Comidas; el olor es bastante desagradable.
- 4-Láminas de alfajor acomodadas , instalaciones eléctricas y sanitarias inadecuadas, láminas de acero corroídas por oxidación.
- 5-Pasos de escalera improvisados y en mal estado (no cumplen normatividad); techos de casetas corroídos, desgastados y con evidencia de filtraciones.

-PARQUE BERVITA

- Desinstalación y desmonte de luminarias existentes en las cuatro esquinas de la Cancha de futbol 11.

PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA

- Se inicia el mantenimiento de los Grecorromanos y los Gimnasios biosaludables en este Escenario.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Fecha de corte : al 16 de marzo de 2024

| FECHA | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| 16-03-2024 | 91.00 | 91.00 | 0.00 |
| | | | |

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

De acuerdo con el reporte semanal presentado a fecha del 16-03-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 91,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 91,00%, donde no se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado un porcentaje del 0,00%. Igualmente se le solicita al Contratista implementar un plan de contingencia para terminar los parques a tiempo ya que falta menos de un mes (1) para terminar el contrato igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que estén a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques, y así evitar atrasos que conlleven a multas y/o sanciones por incumplimiento.

Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados, se observa que de los treinta y cinco (35) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, hay cuatro (4) parques que presentan atraso, pero se aclara que los atrasos evidenciados se estan presentando por los siguientes motivos:

1.- Parque San José de Bavaria: Este parque presenta atraso, aunque el contratista ya inicio las actividades correspondientes del parque esta nos las comenzo en las fechas estipuladas según el project, las cuales debian haber de iniciar el 04/03/2024..
2 . Parque de los Niños: Este parque presenta atraso debido a que los tava ples no se han iniciado a la fecha, ademas el contratista no ha iniciado las actividades eléctricas las cuales debieron quedar terminadas al 100 % el 29 de febrero del 2024. Igualmnete se observa atraso en la terminación y colocacipon de la arena Peldar cancha voley playa.
3.- Parque Fontanar: Este parque presenta atraso debido a que todavia no han llegado, loos elemantos o módulos del Parkour los cuales estan por ,llegar a puerto
4.- Parque Primera de mayo:. Este parque presenta un pequeño atraso ya que hasta ahora se iniciaron las actividades en la zona del velodromo. en cuanto el retiro de los postes existantes, la excavación d elos dados y la fundida de los mismos.

FRENTES DE TRABAJO :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con doce (12) parques. Siete (7) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Olaya Herrera, Parque Porvenir, Parque Ciudad Montes, Parque Virrey Norte, Parque Villa de los Alpes y Parque Nacional), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00% . un (1) parque con actividades significativas (Primero de Mayo) con un avance superior al 90%, Los Parques (Canal Boyaca y Bosques de San Carlos) con un vance del 65% y 65 %. los Parque (Fontanar del Rio) con un avance del 35%.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, Los siguiente parques : (Parque Sucre o Hippise, Canal Rio Negro) los cuales presentan terminación de actividades al 100,00 %, el parque( Altablanca) tene porcentajes superiores al 95 %, los parques (Simón Bolivar, UDS y PRD) cuentan con un porcentaje del 90%, 90% y 92%, el parque (Novios) cuenta con porcentaje superior al 83%, los Pârques (Niños y Servita) cuentan con porcentajes de 65% y 89% y el parque (San José de Bavaria) cuenta con un porcentaje del 60%,

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques.los Parques (Palestina, Cayetano ) ya se encuentran terminados al 100%,el parque (Tunal ) se encuentran al 95%, el parque (Villa Alemana, Virrey Sur y La Victoria) presentan los siguientes porcentajes 96%, 93% y 89%, los parques (Eduardo Santos, Nuevo Muzu, Fragua) presentan los siguiente porcentajes 94%, 80% y 78% respectivamente, el parque (Illimani) tiene un porcentaje del 83% el parque (Gilma Jimenez) tiene un porcentaje del 52%

COMPONENTE SST

Actividades de Interventoría

- Aprobación de Informe Mensual SST N°6 del Contratista
- Recorridos a los Parques Activos
- Participación en Comité de obra
- Verificación de Trabajos en Alturas
- Verificación Demarcación y Señalización
- Verificación de uso de EPP
- Recomendaciones SST

Actividades del Contratista

- Capacitación Respeto entre Compañeros
- Entrega de EPP (Reposición)
- Permisos de Trabajos (Alturas)
- Inspección de Arnés
- Jornada de Orden y Aseo
- Señalización y demarcación (Cinta Peligro).

COMPONENTE AMBIENTAL

- Durante la semana se realizó la revisión y aprobación del Informe No. 6 del componente ambiental
* Se recibió y aprobó la documentación de los proveedores
* Se realizó reunión con la profesional ambiental de la entidad para dar claridad frente a la gestión de RCD
* Se recibió por parte del contratista registro fotográfico de las acciones correctivas implementadas frente al tema de orden y aseo, las cuales fueron compartidas a la interventoría y a la supervisión
* El día de hoy se remite la información RCD de la vigencia 2023
* El día viernes se entrega Informe de la interventoría.

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se realiza la revisión del Informe de calidad n°6 de contratista el cual es devuelto con observaciones
- Se realiza solicitud de entrega de informe de tintas de la zona de Juegos parque Muzu
- Se realiza solicitud de actualización del listado de materiales el cual no esta acorde con lo ingresado a obra
- Se recibe por parte del contratista el Plan de inspección y ensayo incluyendo los ítems de los NP aprobados el cual es aprobado para implementación a partir del mes de marzo
- No se recibe por parte del contratista los resultados de laboratorio del material usado para los llenos del tanque séptico de parque Simón Bolivar, por lo cual a envía oficio aclarando que a evento de estabilidad la responsabilidad recae sobre el contratista
- No se ha realizado la entrega de los resultados de cumplimiento de la arena tipo Peldar a instalar en PRD
- Se establecen nuevas fechas de entrega de los manuales de mantenimiento y uso correspondientes a los parques entregados para revisión por parte de la interventoría
- Se envían observaciones por incoherencias al plan de adquisiciones presentado por el contratista
- Se realiza toma de muestra de concreto por parte del contratista a concreto 3000 psi instalado en la placa de la zona infantil parque la fragua

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana se recepcionan PQRS de residente del parque Canal Boyaca en el cual solicita la entrega de juego infantil para ubicación en conjunto residencial.
- 12 marzo: Asistencia a reunion parque Velodromo 1 de mayo en el cual se socializa las intervenciones ha realizar, se realiza recorrido y se establecen actividades sociales a realizar
- 12 marzo: Asistencia a reunion parque tunal en el cual se socializa las intervenciones ealizadas en casa del adulto mayor, BMX, se realiza recorrido y se establecen actividades sociales a realizar
- 15 marzo: Asistencia a reunion de puesta en servicio de la pista BMX parque El Tunal; en la cual se conto con la asistencia de lideres de la comunidad, profesionales de interventoria, contratista, se socializa actividades ejecutadas y se escucha las diferentes inquietudes de los asistentes.
- Revisión de presentación para reunion final del parque Ciudad Montes se evidencia subsanación de observaciones ambientales y técnicas, se da aprobación. Se realiza la entrega de acta a administrador del parque
- Revisión de informes ejecutivos elaborados por la profesional social del contratista, se remiten observaciones las cuales fueron subsanadas, se remiten a profesional social de la entidad.
- Asistencia de profesional social del contratista a comite de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecan compromisos.
- Revisión de plegables informativos para entrega a la comunidad de los parque Virrey sur y Hippia los cuales presentaron obeservaciones las cuales se remiten al contratista.
- Revisión da volante informativo reunión de avance Parque La Fragua.



INFORME ANTICIPO



ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA





Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 11 al 17 de marzo de 2024 se describen a continuación:





Durante la semana del 11 al 17 marzo de 2024, el contratista no remite legalización de las ordenes de operación No. 01, 02 y 03. Se le solicita legalizar las ordenes de operación.

## REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÈCNICO





| PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN ) | | PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN RECICLADO) | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Se avanza con la instalación del adoquin nuevo y remates de tramos en sendero zona que limita con el árbol, sendero hacia la biblioteca, sendero quiosco de la cafetaria | | se avanza con la fundida de cintas de concreto que confinan los tramos, para entrega de tramos a la adinistracion | |
| PARQUE TUNAL ( CASA DEL ADULTO MAYOR ) | | PARQUE TUNAL ( CASA DEL ADULTO MAYOR ) | |
|  |  |  |  |
| Se hace entrega a la administración y puesta en servicio. | | Se hace entrega a la administración y puesta en servicio. | |






| PARQUE TUNAL (ZONA PORTERIAS) | | PARQUE TUNAL (ZONA PORTERIAS) | |
|---|---|---|---|
|  |  |  | N/A |
| Se hace entrega a la administracion y puesta en servicio de las porterias # 2 y 5. | | se avanza con la correccion de observaciones de la I ntervenroria para la entrega de la porteria # 4. | |
| PARQUE TUNAL (PISTA BMX) | | PARQUE TUNAL (KIOSCO CAFETERIA) | |
|  |  |  |  |
| Se terminan de evacuar las observaciones para programar entrega y puesta enn servicio, se entrega a la administracion el dia 15 de marzo y puesta en servicio para el martes 19 de marzo de 2024. | | Se terminan de evacuar las obsservaciones para programar entrega y puesta enn servicio, se entrega a la administracion el dia 15 de marzo y puesta en servicio para el martes 19 de marzo de 2024. | |
| PARQUE TUNAL (UCAD) | | PARQUE TUNAL (UCAD) | |
|  |  |  |  |
| Se reporta esta samana emergencia en baños ucad tunal, debido a una fuga de agua potable, se diagnostica y programa arreglo. | | Se reporta esta samana emergencia en baños ucad tunal, debido a una fuga de agua potable, se diagnostica y programa arreglo. | |
| PARQUE EDUARDO SANTOS (COLISEO) | | PARQUE EDUARDO SANTOS (COLISEO) | |








| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Se avanza con remates de muros y cielo rasos en los baños del coliseo, se termina la pulida y brillada de pisos en los baños del coliseo para hacer entrega el martes proximo a la administración. | | Se avanza con remates de muros y cielo rasos en los baños del coliseo, se termina la pulida y brillada de pisos en los baños del coliseo para hacer entrega el martes | |
| PARQUE LA FRAGUA | | PARQUE LA FRAGUA | |
|  |  |  |  |
| - Se termina la instalación de bordillos en la zona de jugos exterior Y se funde placa de contra piso de esta zona del parque. | | - Se termina la instalación de bordillos en la zona de jugos exterior Y se funde placa de contra piso de esta zona del parque. | |
| PARQUE VILLA ALEMANA | | PARQUE VILLA ALEMANA | |
|  |  |  | N/A |
| Se instala porton nuevo costado lateral del parque, se instalan y soldan las tapas de las cajas de inspeccion, se avanza con la terminacion de muros de cierre en la parte posterios del parque. | | Se instala porton nuevo costado lateral del parque, se instalan y soldan las tapas de las cajas de inspeccion, se avanza con la terminacion de muros de cierre en la parte posterios del parque. | |
| PARQUE LA VICTORIA | | PARQUE LA VICTORIA | |



| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Se avanza con el mantenimiento y pintura de modulos de baños y mantenimiento interno y externos de los mismos. | | Se avanza con el mantenimiento y pintura de modulos de baños y mantenimiento internos y externos de los mismos. | |
| PARQUE GILMA JIMENEZ | | PARQUE GILMA JIMENEZ | |
|  |  |  | N/A |
| Se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías. | | Se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías. | |
| PARQUE NUEVO MUZU | | PARQUE NUEVO MUZU | |
|  |  |   | N/A |
| Se avanza con la instalacion de parales para nuevo tramo de baranda, , llega material de piso caucho | | se terminan arreglos hidrosanitarios y enchapes en baños del coliseo. | |
| PARQUE LA PETAR | | PARQUE LA PETAR | |

96


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  | N/A |
| Se suministra e instala porton de ingreso doble hoja y valla del parque. | | Se suministra e instala porton de ingreso doble hoja y valla del parque. | |
| PARQUE ILLIMANI | | PARQUE ILLIMANI | |
|  |  |  |  |
| Se inician trabajos en el módulo de baños, adecuación de cubiertas, instalación de divisiones en acero, que es lo único pendiente en este frente. | | Se inician trabajos en el módulo de baños, adecuación de cubiertas, instalación de divisiones en acero, que es lo único pendiente en este frente. | |
| PARQUE VIRREY SUR | | PARQUE VIRREY SUR | |
|  |  |  |  |
| Se avanza actividades con mantenimiento y pintura de juegos infantiles, pintura de bancas y mesas de ajedrea, e instalacion de señales. | | Se avanza actividades con mantenimiento y pintura de juegos infantiles, pintura de bancas y mesas de ajedrea, e instalacion de señales. | |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | |

| | |
|---|---|
|   |   |
| Preparación formaleta para fundida de viga zarpa zona de grecos y ruta de la vida | Preparación formaleta para fundida de viga zarpa zona de grecos y ruta de la vida |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS |
|   |   |
| Suministro e instalación de geotetil T-2100 | Suministro e instalación de base sobre geotextil |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS |
|   |   |
| Compactación con vibrocompactador material granular | Suministro e instalación de parales metalicos para cerramiento zona infanti |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Revisión instalación malla cerramiento debajo del puente peatonal | | Revisión instalación módulos biosaludables | |
| PARQUE NACIONAL | | PARQUE NACIONAL | |
|  |  |  |  |
| Arreglo y pintura de juegos Parque Nacional | | Arreglo y pintura de juegos Parque Nacional | |
| PARQUE NACIONAL | | PARQUE NACIONAL | |
|  |  |  | N/A |
| Arreglo y pintura de juegos Parque Nacional | | Arreglo y pintura de juegos Parque Nacional | |
| PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | | PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Canastillas y postes metalicas para luminarias del velodromo | | Retiro de luminarias del velodromo | |
| PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | | PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | |
|  |  |  |  |
| Adecuación del terreno para entrada de la grua | | Corte de piso en concreto con pulidora | |
| PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | | PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | |
|  |  | N/A | N/A |
| Demolición placa para retiro de postes existentes en concretro | | Retiro de luminarias del velodromo | |
| PARQUE CANAL BOYACA | | PARQUE CANAL BOYACA | |





Retiro de material sobrante de la obra juegos en madera

PARQUE CANAL BOYACA





Excavación para perfilación zona de adoquines entrada al sendero

Revisión de niveles zona del sendero

PARQUE CANAL BOYACA





Excavación para dados de concreto zona de juegos infantiles

PARQUE CANAL BOYACA








Llegada de materiales a obra adoquines, bordillos y sub base granular-

PARQUE CANAL BOYACA





Suministro e instalación de geotextil T-2400 - Suminmistro e intalación de subbase granular


PARQUE ALTABLANCA











Compactación de material granular con vibrocompatador

PARQUE ALTABLANCA

| | |
|---|---|
|   |   |
| Recolección y transporte de escombros para disposición final. | Reconstrucción y detallada de tramos de cárcamo en concreto. |
| PARQUE ALTABLANCA | PARQUE ALTABLANCA |
|   |   |
| Durante la entrega final de los trabajos realizados en el Escenario, el Administrador del Parque Sr. Adonay Palacios. | Durante la entrega final de los trabajos realizados en el Escenario, el Administrador del Parque Sr. Adonay Palacios. |
| PARQUE ALTABLANCA | PARQUE ALTABLANCA |
|   |   |
| Puesta en funcionamiento la Pista de Patinaje, al servicio de la Comunidad. | Puesta en funcionamiento la Pista de Patinaje, al servicio de la Comunidad. |
| PARQUE CANAL RIO NEGRO | PARQUE CANAL RIO NEGRO |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Durante la entrega final de los trabajos realizados en el Escenario, al Administrador del Parque. | | Durante la entrega final de los trabajos realizados en el Escenario, al Administrador del Parque. | |
| PARQUE CANAL RIO NEGRO | | PARQUE CANAL RIO NEGRO | |
|  |  |  |  |
| Revisión de los deslizaderos en acero inoxidable ubicados en cuatro sectores diferentes del parque . | | Revisión de los deslizaderos en acero inoxidable ubicados en cuatro sectores diferentes del parque . | |
| PARQUE CANAL RIO NEGRO | | PARQUE CANAL RIO NEGRO | |
|  |  |  |  |
| Revisión de los deslizaderos en acero inoxidable ubicados en cuatro sectores diferentes del parque . | | Revisión de los deslizaderos en acero inoxidable ubicados en cuatro sectores diferentes del parque . | |
| PARQUE LOS NIÑOS | | PARQUEADERO LOS NIÑOS | |






Excavación para construcción pozo de alcantarillado aguas lluvias.


PARQUE LOS NIÑOS






Avance en la extendida de la capa de triturado 3/4"

PARQUE LOS NIÑOS





Extendida y compactación del triturado 3/4", cerramiento de la capa de grava con el manto geotextil 4000.

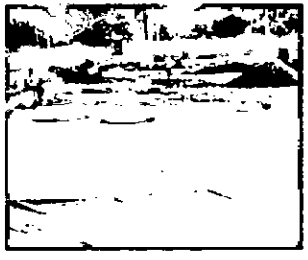
PARQUE LOS NIÑOS





Extendida y compactación del triturado 3/4", cerramiento de la capa de grava con el manto geotextil 4000.

PARQUE LOS NIÑOS





El manto geotextil se va cerrando y cosiendo.

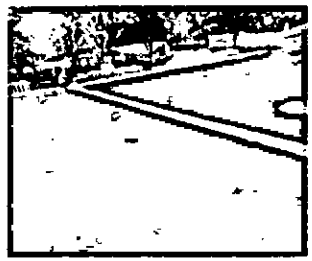
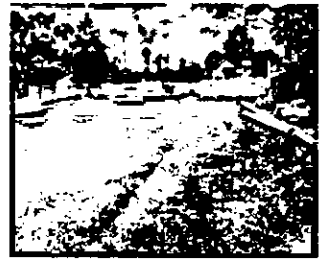
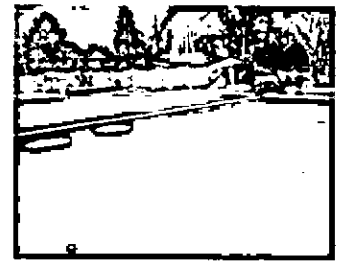

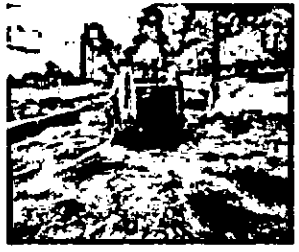
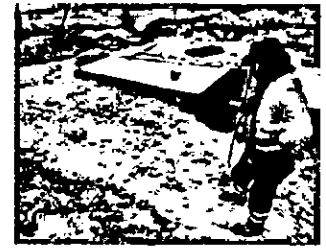
PARQUE LOS NIÑOS










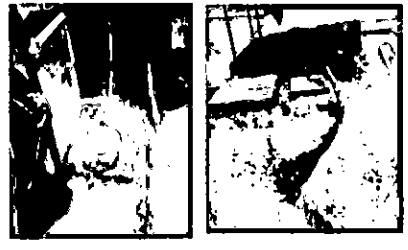

Tubería metálica para instalación del cerramiento

PARQUE LOS NIÑOS

| | |
|---|---|
|   |   |
| Parqueadero del Parque de los Niños, una vez terminada la aplicación de la capa de rodadura asfáltica. | Parqueadero del Parque de los Niños, una vez terminada la aplicación de la capa de rodadura asfáltica. |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) |
|   |   |
| Tanques sépticos impermeabilizados interna y externamente. | Inicio rellenos al interior y exterior de los tanques sépticos. |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) |
|   |   |
| Extendida del material de relleno y compactación | Rellenos con material granular seleccionado. |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Protección de los árboles | Extendida y nivelación con tierra negra. | | |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |
|  |  |  |  |
| Remates de enchapes y aseo en baños. | | Remates de enchapes y aseo en baños. | |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |
|  |  |  |  |
| Durante la entrega de los bebederos a la Administración. | | | Durante la entrega de los bebederos a la Administración. |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |

| | |
|---|---|
|   |   |
| Arreglo de baños en SURTIPOLLO - cambio de fluxómetro PUSH sanitarios. | Suministro e instalación de las canecas en acero inoxidable. |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | PARQUE DE LOS NOVIOS |
|   |   |
| Construcción de pasamanos metálicos para instalar al interiuor de la estructura del túnel del Amor. | Construcción de pasamanos metálicos para instalar al interiuor de la estructura del túnel del Amor. |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | PARQUE DE LOS NOVIOS |
|   |   |
| Soportes y anclajes de la estructura metálica a los dados en concreto. | Soportes y anclajes de la estructura metálica a los dados en concreto. |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | PARQUE DE LOS NOVIOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Estado de la estructura de cimentación para instalar Módulo de baños. | | Destapada de cajas de inspección enterradas - verificación de funcionamiento para poder hacer uso de estas. | |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | | PARQUE DE LOS NOVIOS | |
|  |  |  |  |
| Por solicitud de la Coordinación del IDRD, se realiza inspección al Tren de comidas existente en el Parque de los Novios. | | Deterioro de la estructura externa e interna en los módulos del tren de Comidas. | |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | | PARQUE DE LOS NOVIOS | |
|  |  |  |  |
| Instalaciones eléctricas y sanitarias en mal estado y sin conexiones, no cumplen Normatividad técnica. | Aspecto sanitario es bastante crítico en los vagones del Tren de Comidas. | Láminas de alfajor acomodadas , instalaciones eléctricas y sanitarias inadecuadas, láminas de acero corroidas por oxidación. | Pasos de escalera improvisados y en mal estado (no cumplen normatividad); techos de casetas corroidos, desgastados y con evidencia de filtraciones. |
| PARQUE SERVITA | | PARQUE SERVITA | |





Desmonte de luminarias existentes en las cuatro esquinas de la Cancha de futbol.

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON)





Desmonte de luminarias existentes en las cuatro esquinas de la Cancha de futbol.

PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)










Alistado para fundir andenes en Cancha de baloncesto.

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON)






Cielorraso en PVC instalado en el acceso de la Administración PRD





Cielorraso en PVC instalado en el depósito de la Administración PRD

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON)






Instalación de lámparas de iluminación en baños.



Instalación eléctrica en Caseta de comidas frente a Cancha de Hockey





Alistado de piso y Adecuación del terreno; para fundir tramo de andén - Canchas de Tenis. -








Aplicación de la última capa de recubrimiento sintético en Cancha deTennis

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON)

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON)

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  | N/A |
| Recubrimiento sintético Cancha de Squash | | Recubrimiento sintético Cancha de Squash | |
| PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | | PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | |
|  |  |  |  |
| Inicio mantenimiento Grecorromanos y Gimnasios biosaludables | | Inicio mantenimiento Grecorromanos y Gimnasios biosaludables | |
| PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | | PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | |
|  |  |  |  |
| Inicio mantenimiento Grecorromanos y Gimnasios biosaludables | | Inicio mantenimiento Grecorromanos y Gimnasios biosaludables | |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS) | |






En Cancha de beisbol se avanza en el desmonte de luminarias de postes de alumbrado.

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)






En Cancha de beisbol se avanza en el desmonte de luminarias de postes de alumbrado.

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS)





Instalación de las cajas para la instalación de las bajantes en tubería EMT 3/4"- puestas a tierra.





Instalaciónde fluxómetro en baño de 1er piso - Velódromo

REGISTRO FOTOGRAFICO SST










REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Asistencia a reunion parque Velodromo 1 de Mayo, Parque el Tunal, Puesta en servicio 'pista de BMX Parque el Tunal. | | Asistencia a reunion final de parque Ciudad Montes en la cual se conto con la asistencia de lideres de la comunidad, profesionales de interventoria, contratista, se socializa actividades ejecutadas y se escucha las diferentes inquietudes de los asistentes. | |

BOGOTÁ

**Instituto Distrital de Recreación y Deporte**

**Reporte Semanal** 27 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

marzo 17, 2024 al marzo 23, 2024

1. **Datos Generales**

| PARQUE | Código: | Localidad: / Barrio: | |
|---|---|---|---|

2. **Contrato de Obra**

Objeto:

| COP No. | 3099-2023 |
|---|---|

"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG

| F.I | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. #02 | F.R.#2 | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 7 MESES | 11-abr-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo Directo | 10 981 251 309,00 | $ 41.864.900,00 | $ 77.343.733,00 | $ 144 068 622 00 | $ 1.118 610 201,00 | 3 561.173.407,00 | |
| A.I.U. (25,06%) | 2 751.901.601,00 | $ 10.491.246,00 | $ 19.382.339,00 | $ 36 103 096,00 | $ 280 323 716 00 | $ 892 430 056 00 | |
| Sub Total | 13 733.153 000,00 | $ 52.355.755,00 | $ 96 726.072,00 | $ 180.169 718,00 | $ 1.398 933.917,00 | $ 4 453.603.463,00 | |
| Total Inicial | 13 733.153 000,00 | $ 52.355.755,00 | $ 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.398 933.917,00 | $ 4 453.603.463,00 | |
| Adición No. | | | | | | | |
| Total Final | 13.733 153 000,00 | $ 52 355 755,00 | 96 726 072,00 | $ 180.159 718,00 | $ 1 398 933.917,00 | $ 4 453.603 463,00 | |
| Anticipo: (40% Sobre costo directo) | 4 392.500 560 00 | $ 16.745 904,00 | $ 30 937.493.00 | $ 57 628 649,00 | $ 447.444 060,00 | $ 1.780 586 704,00 | |
| Total | 4.392.500.560,00 | $ 35.609.951,00 | $ 65.788.579,00 | $ 122.543.069,00 | $ 951.489.837,00 | $ 2.673.016.759,00 | |
| Acumulado | | $ 35.609.951,00 | $ 101.398.530,00 | $ 223.941.599,00 | $ 1.175.431.436,00 | $ 3.848.448.195,00 | |

3. **Contrato de Interventoría**

Objeto:

| CI No. | 3131-2023 |
|---|---|

Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS

| F.I. | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. | F.R. | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 8 MESES | 11-may-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato: | 1 001 825.407,00 | $ 64.136 863,00 | $ 65.419.199,00 | 67883634 | $ 103.448.492,00 | $ 192 570.880,00 | |
| Iva (19%) | 190 346 827,00 | $ 12.186.004,00 | $ 12.429.648,00 | 12894094 | $ 19.655.213,00 | $ 36.588.467,00 | |
| Sub Total | 1.192.172.234,00 | $ 76.322.867,00 | $ 77.848.847,00 | $ 80 757.748,00 | $ 123.103.705,00 | $ 229.159.347,00 | |
| Adición: | | | | | | | |
| Total Final | 1.192.172.234,00 | $ 76 322 867,00 | $ 77 848 847,00 | 80757748 | $ 123 103.705,00 | $ 229.159.347,00 | |
| Retegarantía: | 119.217.223,00 | $ 7.632.287,00 | $ 7.784 885,00 | 8075775 | $ 12.310.371,00 | $ 22.915 935,00 | |
| TOTAL | 1.192.172.234,00 | $ 68.690.580,00 | $ 70.063 962,00 | 72681973 | $ 110.793.334,00 | $ 206.243.412,00 | |
| | | $ 68.690.580,00 | $ 138.754.542,00 | $ 211.436.515,00 | $ 322.229.849,00 | $ 528.473.261,00 | |

4. 27 Fecha de corte: marzo 23, 2024

4.1. **Datos Generales**

| Nombre: | PRD- Mure squash/canchas tenis/Canchas Hockey/Administración | Código: | 12-091 | Localidad: / Barrio: | BARRIOS UNIDOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Carrera 80 # 63-76 | | | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 330.780.256,00 | 2,44% | 96,00% | 99,00% | -3,00% | $ | 327.472.453,44 |
| TOTAL | 330.780.256,00 | | 96,00% | 99,00% | -3,00% | $ | 327.472.453,44 |

4.2 Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Simón Bolívar | Código: | 13-089 | Localidad: | ENGATIVÁ |
| Dirección: | Avenida Calle 63 # 59-45 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 869.359.406,00 | 6,41% | 88,00% | 80,00% | 8,00% | $ 782.423.465,40 |
| TOTAL | | 869.359.406,00 | | 88,00% | 80,00% | 8,00% | $ 782.423.465,40 |

4.3. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Alta Blanca | Código: | 01-075 | Localidad: | USAQUEN |
| Dirección: | Carrera 8 A #158-04 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 154.101.031,00 | 1,14% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 154.101.031,00 |
| TOTAL | | 154.101.031,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 154.101.031,00 |

4.4. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque de los Niños | Código: | 12-141 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS |
| Dirección: | Avenida Carrera 53 # 60-80 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.432.296.903,00 | 10,55% | 88,00% | 70,00% | 18,00% | $ 1.002.607.832,10 |
| TOTAL | | 1.432.296.903,00 | | 88,00% | 70,00% | 18,00% | $ 1.002.607.832,10 |

4.5. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque de las Nieves | Código: | 12-092 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS |
| Dirección: | Avenida Calle 53 # 45-10 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 214.775.258,00 | 1,58% | 81,00% | 86,00% | 5,00% | $ 184.706.720,18 |
| TOTAL | | 214.775.258,00 | | 81,00% | 86,00% | 5,00% | $ 184.706.720,18 |

4.6. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Canal Río Negro | Código: | 12-002 | Localidad: | ANDES -RIO NEGRO |
| Dirección: | Calle 89 A # 20-67 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 79.062.034,00 | 0,58% | 86,00% | 100,00% | -14,00% | $ 79.062.034,00 |
| TOTAL | | 79.062.034,00 | | 86,00% | 100,00% | -14,00% | $ 79.062.034,00 |

4.7. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Sucre o Hippies | Código: | 02-019 | Localidad: | CHAPINERO |
| Dirección: | Calle 60 a Cra 7 | | | Barrio: | |

915

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 118.086.403,00 | 0,87% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 118.086.403,00 |
| TOTAL | | 118.086.403,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 118.086.403,00 |

| 4.8. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque UD8 | Código: | 10-290 | Localidad: | ENGATIVA |
| Dirección: | Calle 63 # 94 a 48 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.055.040.961,00 | 7,77% | 97,00% | 93,00% | 4,00% | $ 981.168.083,73 |
| TOTAL | | 1.055.040.961,00 | | 97,00% | 93,00% | 4,00% | $ 981.168.083,73 |

| 4.9. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque San José de Bavaria | Código: | 11-078 | Localidad: | SUBA |
| Dirección: | Ac 170 - Cra 65 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 25.527.265,00 | 0,19% | 93,00% | 67,00% | 26,00% | $ 17.103.267,55 |
| TOTAL | | 25.527.265,00 | | 93,00% | 67,00% | 26,00% | $ 17.103.267,55 |

| 4.10. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Estadio Olaya Herrera | Código: | 18-207 | Localidad: | RAFAEL URIBE |
| Dirección: | Cl 35 #3-50 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 600.483.302,00 | 4,42% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 600.483.302,00 |
| TOTAL | | 600.483.302,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 600.483.302,00 |

| 4.11. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Ciudad Montes | Código: | 16-112 | Localidad: | PUENTE ARANDA |
| Dirección: | Cl 10 Sur #39-29 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 295.993.778,00 | 2,18% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 295.993.778,00 |
| TOTAL | | 295.993.778,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 295.993.778,00 |

| 4.12. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Bosques de San Carlos | Código: | 18-028 | Localidad: | RAFAEL URIBE |
| Dirección: | Dirección: Cra 13 a # 30-15 S | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 965.049.229,00 | 7,28% | 78,00% | 72,00% | 6,00% | $ 709.235.444,88 |
| TOTAL | 965.049.229,00 | | 78,00% | 72,00% | 6,00% | $ 709.235.444,88 |

4.13. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Estadio de Techo | Código: | 08-554 | Localidad: | KENNEDY |
| Dirección: | Transversal 78K No. 43 A - 04 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 66.843.578,00 | 0,49% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 66.843.578,00 |
| TOTAL | | 66.843.578,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 66.843.578,00 |

4.14. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Laureles Naranjos | Código: | 07-035 | Localidad: | BOSA |
| Dirección: | Cl. 70 Bis Sur #60k-1 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 26.022.208,00 | 0,19% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 26.022.208,00 |
| TOTAL | | 26.022.208,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 26.022.208,00 |

4.15. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Villa de los Alpes | Código: | 04-075 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 158.478.296,00 | 1,15% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 158.478.296,00 |
| TOTAL | | 158.478.296,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 158.478.296,00 |

4.16. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque el Porvenir | Código: | 07-391 | Localidad: | BOSA |
| Dirección: | Calle 82 Sur - Cra 97 C | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 33.582.453,00 | 0,25% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 33.582.453,00 |
| TOTAL | | 33.582.453,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 33.582.453,00 |

4.17. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Primero de Mayo | Código: | 04-166 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | carrera 5 b.s #17-14 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emergencia | | $ 615.714.752,00 | 4,54% | 100,00% | 87,00% | 13,00% | $ 535.671.834,24 |
| TOTAL | | 615.714.752,00 | | 100,00% | 87,00% | 13,00% | $ 535.671.834,24 |

946

4.18. Datos Generales

| Nombre: | Parque Nacional | Código: | 03-035 | Localidad: | SANTA FE |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Carrera 7 # 36 - 10 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Ppto. Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 41.000.192,00 | 0,30% | 63,00% | 100,00% | -37,00% | | | $ 41.000.192,00 |
| TOTAL | | 41.000.192,00 | | 63,00% | 100,00% | -37,00% | | | $ 41.000.192,00 |

4.19. Datos Generales

| Nombre: | Parque Bavaria | Código: | 01-023 | Localidad: | USAQUEN |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Calle 156 # 7 - 32 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Ppto. Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 801.246.287,00 | 4,43% | 85,00% | 97,00% | -2,00% | | $ 583.208.896,39 |
| TOTAL | | 801.246.287,00 | | 85,00% | 97,00% | -2,00% | | $ 583.208.896,39 |

4.20. Datos Generales

| Nombre: | Parque Canal Boyacá | Código: | 09-050 | Localidad: | FONTIBON |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cra 74 B # 23 a - 89 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Ppto. Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 810.502.844,00 | 6,71% | 84,00% | 59,00% | 25,00% | | $ 537.196.559,96 |
| TOTAL | | 810.502.844,00 | | 84,00% | 59,00% | 25,00% | | $ 537.196.559,96 |

4.21. Datos Generales

| Nombre: | Parque El Virrey Norte | Código: | 02-014 | Localidad: | CHAPINERO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Calle 86 - Cra 7 y Autop Norte | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Ppto. Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 28.197.735,00 | 0,21% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | | $ 28.197.735,00 |
| TOTAL | | 28.197.735,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | | $ 28.197.735,00 |

4.22. Datos Generales

| Nombre: | Parque Fontanar del Río | Código: | 11-368 | Localidad: | SUBA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cll 145 B 138 A - 10 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Ppto. Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 508.119.341,00 | 3,74% | 59,00% | 31,00% | 28,00% | | $ 157.516.995,71 |
| TOTAL | | 508.119.341,00 | | 59,00% | 31,00% | 28,00% | | $ 157.516.995,71 |

4.23. Datos Generales

| Nombre: | Parque el Tunal | Código: | 06-063 | Localidad: | TUNJUELITO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cra 19D # 52B-15 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.185.589.658,00 | 8,74% | 89,00% | 88,00% | 1,00% | $ 1.181.677.862,68 |
| TOTAL | | 1.185.589.658,00 | | 89,00% | 88,00% | 1,00% | $ 1.181.677.862,68 |

| 4.24. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque La Fragua | Código: | 15-040 | Localidad: | ANTONIO NARIÑO |
| Dirección: | Cra. 31 #148-57S. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 671.738.911,00 | 6,42% | 87,00% | 85,00% | 2,00% | $ 740.976.374,35 |
| TOTAL | | 671.738.911,00 | | 87,00% | 85,00% | 2,00% | $ 740.976.374,35 |

| 4.25. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Mirador Minuri | Código: | 19-788 | Localidad: | CIUDAD BOLIVAR |
| Dirección: | Cra. 27b #1 1 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 224.051.968,00 | 1,55% | 91,00% | 84,00% | 7,00% | $ 188.203.651,44 |
| TOTAL | | 224.051.968,00 | | 91,00% | 84,00% | 7,00% | $ 188.203.651,44 |

| 4.26. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Eduardo Santos | Código: | 14-030 | Localidad: | LOS MARTIRES |
| Dirección: | CALLE 4A BIS N 18 B 30 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 140.357.541,00 | 1,03% | 98,00% | 98,00% | 0,00% | $ 137.550.390,18 |
| TOTAL | | 140.357.541,00 | | 98,00% | 98,00% | 0,00% | $ 137.550.390,18 |

| 4.27. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Nueva Muzu | Código: | 06-017 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | 38 a 52a, Cra. 81B | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 848.409.817,00 | 6,24% | 94,00% | 83,00% | 11,00% | $ 702.520.148,11 |
| TOTAL | | 848.409.817,00 | | 94,00% | 83,00% | 11,00% | $ 702.520.148,11 |

| 4.28. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Cayetano | Código: | 08-241 | Localidad: | USME |
| Dirección: | Cra. 80 #40 65 Sur | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 214.611.043,00 | 1,58% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 214.611.043,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | | 214.611.043,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 214.611.043,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.29. Datos Generales | Nombre: | Parque Villa Alemana | Código: | 05-087 | Localidad: | USME | |
| | Dirección: | Cra 5 Este # 5 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 45.822.585,00 | 0,34% | 100,00% | 98,00% | 2,00% | $ | 45.004.143,10 |
| TOTAL | | 45.822.585,00 | | 100,00% | 98,00% | 2,00% | | 45.004.143,10 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30. Datos Generales | Nombre: | Parque Palestina | Código: | 07-165 | Localidad: | BOSA | |
| | Dirección: | Cile 67 S # 81 G - 09 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.797.573,00 | 0,08% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 10.797.573,00 |
| TOTAL | | 10.797.573,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | | 10.797.573,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.31. Datos Generales | Nombre: | Parque Vitnay Sur | Código: | 05-016 | Localidad: | TUNJUELITO | |
| | Dirección: | Calle 93 SUR # 3 A - 03 ESTE | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 91.107.585,00 | 0,67% | 90,00% | 88,00% | -6,00% | $ | 89.285.413,70 |
| TOTAL | | 91.107.585,00 | | 90,00% | 88,00% | -6,00% | | 89.285.413,70 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32. Datos Generales | Nombre: | Parque Olitos Jimenez | Código: | 05-016 | Localidad: | TUNJUELITO | |
| | Dirección: | Calle 51AS #65A-00 | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 390.308.039,00 | 2,88% | 77,00% | 58,00% | 19,00% | $ | 226.378.662,62 |
| TOTAL | | 390.308.039,00 | | 77,00% | 58,00% | 19,00% | | 226.378.662,62 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33. Datos Generales | Nombre: | Parque La Victoria | Código: | 04-122 | Localidad: | SAN CRISTOBAL | |
| | Dirección: | Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 50.851.447,00 | 0,37% | 96,00% | 96,00% | 0,00% | $ | 48.817.389,12 |
| TOTAL | | 50.851.447,00 | | 96,00% | 96,00% | 0,00% | | 48.817.389,12 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.34 Datos Generales | Nombre: | Parque Galtan Cortes | Código: | 04-103 | Localidad: | SAN CRISTOBAL | |
| | Dirección: | Cl 18 #5 - 60 sur | | | Barrio: | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.000.000,00 | 0,07% | 60,00% | 98,00% | -38,00% | $ 9.800.000,00 |
| TOTAL | | 10.000.000,00 | | 60,00% | 98,00% | -38,00% | 9.800.000,00 |

5

| | |
|---|---|
| Fecha Inicial: | 12-sep-23 |
| Fecha de Terminación Inicial: | 11-abr-24 |
| Adición de tiempo en (meses): | |
| Fecha de Terminación Final: | 11-abr-24 |

6. OSSERVACIONES:
El presente reporte se ajusta al nuevo balance en el que se incluyen nuevas actividades y se definen nuevos frentes por parte de la entidad, en el cuál se suprimen actividades y se ajustan cantidades, la medición se realizó con la programación remitida por el contratista de obra el día 27-02-2024, sin embargo el mismo debe ajustar a las condiciones actualizadas, por lo que se requirió al CONSORCIO PARQUES BOG, remitir el cronograma actualizado al Balance presupuestal

7. Licencias:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción: | | Ambiental: | N/A | Intervensión del Espacio Público | N/A |

8. Servicios Públicos:
TELEFONOS
DAMA

| CODENSA | | EAAB | | OTROS | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Informe 50% | | Informe 75% | | Informe 100% |

| 9. PAC 2023 | | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

10. Observaciones por parques:

1.- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Se continua con las actividades constructivas en la zona de los grecorromanos y ruta de la vida,en estas zonas ya se termino de construir la viga zarpa, se instalo geotextil T-2100 y se esta terminando la colocación de material granular base por capas de e=10 cms, el cuál se esta compactando con vibrocompactador. llego el piso caucho para su correspondeinte instalación..
2.- PARQUE FONTANAR DEL RIO: Se debe iniciar la construcción el Parkour, ya que se cuenta con el sitio dentro del parque para iniciar esta actividad, esta pendiente la instalación del vidrio de 6mm templado zona de cafeteria.
3.- PARQUE CANAL BOYACA: Se realizó excavación y perfilacion del terreno en zona del sendero y zona de la plazoleta, se instalo geotextil T-2400 traslapado y se inico la colocación de la subbase reciclada la cual se esta compactando con el vibrocompactador en la zona del sendero, se tiene en obra bordillos los cuales se iniciaron a colocar, geotextil T-2400, subase y base granular y adoquines., se tomaron densidades en el sendero y en la zoen del parque que no tenia placa de concreto.
4.- PARQUE TUNAL: Se encuentra con un pequeño porcentajes de atraso debido a que faltan algunas activiades por terminar por completo.
5.- PARQUE FRAGUA: Se encuentra con un pequeño porcentajes de atraso debido debido a la terminacipon el mantenimiento de los juegos infantiles
6.- PARQUE EDUARDO SANTOS: Lleva un porcentaje igual en el cual se encuentran rematando los baños de coliseo, y en la zona de bioesfudables.
7.- PARQUE NUEVO MUZU: Presenta un atraso debido a el rendimiento de esta semana en la pintura del piso de la zona de juegos
8.- PARQUE VIRREY DEL SUR: Rafleja adelanto debido al rendimiento en la actividad de mantenimiento y pintura de juegos infantiles y aparatos bioesfudables
9.- PARQUE PRIMERA DE MAYO: Se encuentra con un pequeño porcentajes de atraso debido al desmonte de los postes de concreto existentesy el tiempo de fraguado del concreto de los dados de cimentación
10.- PARQUE VIRREY NORTE: Esta Parque se encuentra actualmente terminado, el contratista realizo el retiro de los elementos de un juego dañado por solicitud del IDRD.
11.- PARQUE DE LOS NIÑOS: Se encuentra con un pequeño porcentajes de atraso debido a que falta la construccipon del cerramiento y el suministro y colocación de la arena peldar en la cancha de volleybol., pendiente las instalaciones eléctricas, las cuales no se han iniciado.

11. INFORME TÉCNICO

L- ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

• PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

SENDEROS EN ADOQUIN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A LA PUERTA DE INGRESO # 4.

- Se avanza con remates de tramos en sendero zona que limita con el árbol, sendero hacia la biblioteca, contorno quiosco de la cafetería puerta 4, se avanza con la fundida de cintas de concreto que confinan las maseras y canecas, para entrega de tramos a la adinistracion.

ZONA DE PORTERIAS:

- se avanza con la correccion de observaciones de la I ntervenrroria para la entrega de la portaria # 4.

PISTA DE BMX:

- se hace entrega y puesta en servicio a la administracion y a las escuelas de bmx.TABLERO DE CONTROL

TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOLL 11 TUNAL:

- se instala tablero de control de iluminacion.

• PARQUE EDUARDO SANTOS:

- Se avanza con remates de muros y cielo rasos en los baños del coliseo, se termina la pulida y brillada de piso en los baños del coliseo para hacer entrega el martes proximo a la administración.

• PARQUE LA FRAGUA:

- se avanza con la instalación de cañuelas, y remates de wing en pista de patinaje de baldosín, se esfalta la pista de patinaje, se continua con la instalación de adoquín en los ingresos a la zona de juegos exterior.

• PARQUE NUEVO MUZU:

- se avanza con la instalacion de nuevo tramo de baranda, se terminan de atender observaciones de la interventoria en los baños de coliseo para puesta en servicio.

• PARQUE VILLA ALEMANA:

- se terminan las obras diagnosticadas para este paque, se hacen observaciones por parte de la interventoria para evacuar por parte del contratista y programar entrega a la administracion del parque.

• PARQUE VIRREY SUR:

- se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se programa entrega a la admistracion.

• PARQUE GILMA JIMENEZ:

- Se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberias.se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberias para llegar a este cuarto.

• PARQUE MIRADOR ILLIMANI:

- se avanza con la adecuación e instalación de cubiertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños.

- PARQUE LA VICTORIA

- Se avanza con el mantenimiento y pintura de modulos de baños y mantenimiento interno de los mismos.

- PARQUE LA PETAR

- se termina la instalacion del porton de ingreso doble hoja y valla del parque.

- PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE PORVENIR - COD.

- Activiades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se colocarón los módulos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán activiades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

- El IDRD realiza reubicación de sitio para los módulos sanitarios
- El Contratista debe ajustar el presupuesto e incluir el valor de las nuevas actividades
- Se deben adecuar las instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas.

- PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado-
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%
- Se realizó reunión social de finalización.
- Se realizo Acta de puesta en servicio zona ruta de la vida.

- PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075
- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En esta parque no se realizarón actividades eléctricas 0.00%
- Se retiro juego en mal estado y fue llevado a taller.

- PARQUE NACIONAL

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este patque no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

- PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Pendiente instalación de vidrio de 5mm templado para el módulo de comidas.
- Esta pendiente el inicio de la construcción de la zona del parkour.
- El contratistra manifesto que ya esta en puerto los parkour y que se estan nacionalizando

- PARQUE CANAL BOYACA

- Se inicia compactación por capas de material granular sub base con vibrocompactador (zona sendero y zona plazoleta).
- Una vez se tenga compactada la capa de la sub base se procedera a realizar la toma de densidades.
- Se inicia excavación para la colación de bordillos (zona infantil).
- Se termina excavaciones para fundir los dados de los juegos zona infantil.
- Se realizo corte en placa zoan de juegos infantilesexcava
- Se excavo y se retrio matrerial, se instalo geotextil y se lleno con material granular y se compacto por capas
- Se tomaron las respectivas densidades.

479

- PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se realizó el retiro de malla eslabonada para la entrada del camión grua.
- Se acondiciono la zona con material granular para evitar daños en el piso.
- Se realizó demolición en las placas de concreto donde se encontraban ubicados los postes en concreto.
- Se realizó el retiro de los postes en concreto con el camion grua
- Se inicia excavación para fundir los dados en concreto.
- Se realizo la construcción de las canastas metalicas para la conformación de los dados.
- Se fundio con concreto los dados de los nuevos postes.

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

ZONA BAÑOS ADMINISTRATIVOS

- Se realizó la colocón de baldosas negras pendientes sobre la caja de inspección baños de hombres.
- Pendiente cambio puerta de entrada baños hombres y mujeres.

ZONA BEBEDEROS

- Pendiente el arreglo de un (1) bebedero.

ZONA BIOSALUDABLES

- Se realizan retoques de pintura por solicitud de interventoría.
- Pendiente la entrega y puesta en servicio de los Biosaludables.

ZONA GRECOROMANOS

- Se continua con la llegada de material granular base.
- Se continua con la colocalón de base sobre el geotextil en capas de 10 cms.,
- Se continua con la compactación del material granular con el vibrocompactador.
- Se construye rampa de discapacidad en concreto

ZONA JUEGOS INFANTILES

- Llegada de material caucho para ser instalado en el piso.

- PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Se continia con la aplicacion de tierra negra y la instalación del cespedón en un área aproximada de 400 m2.
- Finaliza la colocación de grava al interior del tanque séptico.
- Se perfilan zonas aledañas en la zona verde, podando el área con guadaña.
- Retiro de las varas rollizas y la polisombra del cerramiento provisional.
- Instalado el cespedón, se realiza el satado de los intersticios o traslapos con tierra negra.
- Colocación de tapa para caja de inspección.

En el Sector del lago

- Continúa la lijada de la parte metálica y aplicación de pintura para los kioscos de Comidas. No se reciben los kioscos de comidas, por las observaciones que objetó la interventoría en el acabado de la pintura.
- El Contratista continúa con la limpieza y aseo de los espacios que está interviniendo; espectalmente las manchas dejadas en las láminas de acero cuando se está aplicando la pintura en los kioscos de comidas.
- Se realiza Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad para las barandas externas acceso a la Capilla del Templete Eucarístico.
- Continúa el mantenimiento para el juego infantil M5 , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.

En otros sectores del Parque

- Se realiza Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad, de 14 bebederos localizados en diferentes sectores. Se revisaron 3 de estos que durante la entrega, no funcionó el suministro de agua y otro bebedero que tiene roto el tubo de agua que lo alimenta.. Las observaciones, se están subsanando.
- Continúa el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable.
- Se realiza Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad para el suministro e instalación de 37 canecas en acero inoxidable, ubicadas en diferentes sectores del Parque.. Se programa continuar con las restantes, para el 26 de marzo de 2024. .

En el Sector del Módulo Surtipollo

- Se realiza Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad, para los baños de este Módulo.

el Sector del Módulo DELIEXPRESS

- Se realiza Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad, para los baños de este Módulo.

- PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis,

- Fundida en concreto para tramo de andén que fue necesario reconstruir; área que se afectó por transito de vehículos, maquinaria y equipos.
- Nivelación del terreno; aplicación de tierra negra en zona verde hacia Canchas de Tenis, por Costado norte.
- Finaliza el recubrimiento sintético en Cancha de Squash
- Termina la aplicación de pintura de muro y la demarcación
- Construcción de cajas de inspección de aguas lluvias
- Remates de cañuela y bordillos contra cajas de inspección.

PRD - Área Administrativa.

- Finaliza la instalación del otro tramo de cielorreso en PVC instalado en el acceso de la Administración del PRD
- Finalizan las instalaciones de las lámparas de iluminación en baños.
- Pendiente protección del tablero de control eléctrico para la Cancha de Hockey
- Pendiente cambio de tomas corrientes GFCI en depósito de servicios del área administrativa.

PRD - Cancha de baloncesto

- Se termina la fundida de andenes en concreto para la Cancha de baloncesto.
- Aseo general, mediante el retiro de elementos sobrantes (escombros y materiales).
- Pendiente reconstrucción de tramo de cuneta exterior a la cancha sobre la vía principal.

- PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Finaliza la instalación de fluxómetros en baños del Velódromo.
- No se ha podido realizar la prueba de presión por falta del suministro de agua en la UDS, debido a un daño de tubería por parte de la Empresa de acueducto.

- PARQUE SERVITA

- Finaliza la desinstalación y desmonte de luminarias existentes en las cuatro esquinas de la Cancha de futbol 11.
- Finaliza la instalación de las nuevas luminarias en los cuatro postes de energía.
- Instalación de los postes en tubería que sirven de soporte para la malla en la Cancha de Tenis.

- PARQUE SAN JOSE DE VASARIA

- Continúa en ejecución el mantenimiento de los Grecorromanos y los Gimnasios biosaludables en este Escenario.
- Retiro de pintura, lijado y aplicación de anticorrosivo en Ruta de la Vida y Zona Infantil.

970

- PARQUE DE LOS NIÑOS

- Inicio construcción de pozo de alcantarillado aguas lluvias.
- Finaliza el suministro e instalación de grava 3/4"-1"; extendida y compactación en la Zona de las canchas de Voleyplaya.
- Termina la ejecución de excavaciones para construcción del filtro francés en el área de las canchas.
- Finaliza la construcción del filtro francés (espina de pescado).
- Finaliza el cerramiento (cosido y embolsado de la grava ) con el material geotextil 4000.
- Inicia la instalación del cerramiento metálico por costado oriental.
- Excavaciones e instalación de tubería para drenar la cancha existante (conexión al pozo de alcantarillado que se construyó).
- En la zona verde del parqueadero por costado norte, se termina de instalar la tubería de 10", rellenos , colocación de tierra negra y posteriormente empradización del área.
- Colocación de tapas en concreto para las cajas de inspección en Zona del Parqueadero.
- Inicio construcción graderías en prefabricados de concreto sobre terreno.
- Construcción de filtros en grava y geotextil; colocación de capa de 10 cm de grava, instalación de geotextil y relleno en arena tipo peldar en el arenero del juego de los niños. (arean existente que se había retirado, para su mantenimiento).
- Se termina la construcción de la caja de inspección interna dentro del arenenero del Juego de Niños. (mamposteria en recocido y pañeta.).
- Avance en la construcción del sendero peatonal en adoquín de arcilla.

- PARQUE DE LOS NOVIOS

- Se realizó el traslado y ubicación del módulo de baños.
- Finaliza la excavación para reemplazar tubería averiada que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Se avanzó en la construcción de pasamanos metálicos al interiuor de la estructura del túnel del Amor.
- Continuó la construcción de los soportes y enclajes de la estructura metálica a los dados en concreto.
- Se continuó con el cambio de fluxómetros de sanitarios para baños existantes.

ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

Fecha de corte : el 23 de marzo de 2024

| FECHA | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| 23-03-2024 | 94.00 | 93.00 | -1.00 |
| | | | |

ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO

De acuerdo con el reporte semanal presentado a fecha del 23-03-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 94,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 93,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado una diferencia en porcentaje del (-) 1,00%,. Igualmente se le solicita al Contratista implamentar un plan de contingencia para terminar los parques a tiempo ya que falta menos de un mes (1) para terminar el contrato, igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que estén a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques, y así evitar atrasos que conlleven a multas y/o sanciones por incumplimiento.

Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados, se observa que de los treinta y cinco (35) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, hay cuatro (4) parques que presentan atraso, pero se aclara que los atrasos evidenciados se estan presentando por los siguientes motivos:

1.- Parque San José de Bavaria: Este parque presenta atraso, aunque el contratista ya inicio las actividades correspondientes del parque esta nos las comenzo en las fechas estipuladas según el project, las cuales debian haber de iniciar el 04/03/2024..
2 . Parque de los Niños: Este parque presenta atraso debido a que los lava pies no se han inicado a la fecha, ademas el contratista no ha iniciado las actividades eléctricas las cuales debieron quedar terminadas al 100 % el 29 de febrero del 2024. Igualmente se observa atraso en la terminación y colocacipon de la arena Peldar cancha voley playa.
3.- Parque Fontanar: Este parque presenta atraso debido a que todavia no han llegado, los elementos o módulos del Parkour los cuales estan por ,llegar a puerto
4.- Parque Primero de mayo:. Este parque presenta un pequeño atraso ya que hasta ahora se iniciaron las actividades en la zona del velodromo. en cuanto al retiro de los postes existantes, la excavación de los dados y la fundida de los mismos, los cuales se estan realizando.

**FRENTES DE TRABAJO :**

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con doce (12) parques. Ocho (8) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Naranjos, Estadio da Techo, Estadio Olaya Herrera, Parque Porvenir, Parque Ciudad Montes, Parque Virrey Norte, Parque Villa de los Alpes y Parque Nacional), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00% . un (1) parque con actividades significativas (Primero de Mayo) con un avance superior al 87%, Los Parques (Bosques de San Carlos y Canal Boyaca) con un vance del 72% y 59 %. los Parque (Fontanar del Rio) con un avance del 31%.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, Los siguiente parques : (Parque Sucre o Hippies, Parque Canal Rio Negro y Parque Altablanca) los cuales presentan terminación de actividades al 100,00 %, los parques (Salitre, PRD, Servita y UDS) cuentan con un porcentaje del 99%, 99%, 97% y 93%, el parque (Simón Bolivar) cuenta con porcentaje superior al 90% el parque (Novios) cuenta con porcentaje superior al 88%, y el parque (San José de Bavaria) cuenta con un porcentaje del 67%.

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques.los Parques (Palestina, Cayetano ) ya se encuentran terminados al 100%, el parque (Tunal, Eduardo Santos, Virrey Sur, Villa Alemana y Gaitan Cortez) se encuentran todos al 95%, los parques (La Fragua, Illimani y Nuevo Muzu presentan los siguiente porcentajes 85%, 84% y 83% respectivamente, el parque (Gilma Jimenez) tiene un porcentaje del 58%

**COMPONENTE SST**

Actividades de Interventoria

- Recorridos a los Parques Activos
- Participación en Comité de obra
- Verificación de Trabajos en Alturas
- Verificación Demarcación y Señalización
- Verificación de uso de EPP
- Recomendaciones SST

Actividades del Contratista

- Capacitación Orden y Aseo
- Entrega de EPP (Reposición de Guantes)
- Permisos de Trabajos (Alturas)
- Inspección de Arnés
- Jornada de Orden y Aseo
- Señalización y demarcación (Cinta Peligro)

**COMPONENTE AMBIENTAL**

- Durante la semana de reporte se realizó la entrega del informe ambiental de la interventoria.
- Se realizó reunión entre el componente ambiental y componente de calidad tanto de contratista como interventoria para revisar la trazabilidad de materiales y de RCD que han salido y entrado a los frentes de obra.
- Se realizó la revisión de la trazabilidad RCD enviada por el contratista, se realizaron aportes desde la interventoria y se realizó el envio a la entidad para revisión y cargue en la página de secretaria de ambiente.

**COMPONENTE DE CALIDAD**

- Aprobación del informe de calidad N°8 versión 0.2
- Se realiza la revisión de los manuales de mantenimiento y uso presentados por el contratista correspondiente a los parques, ciudad montes, Rionegro, villa de los Alpes, virrey y estado, los cuales no cuentan con observaciones desde el componente de calidad
- Se solicita al contratista presenta los ensayos de la muestra MDC-19 instalada en el parqueadero del parque de los niños
- Se realiza mesa de trabajo con profesionales paras de los componentes ambiental y calidad, para definir criterios e información en cuanto a los materiales ingresados a obra y reporta a interventoria
- Se encuentra pendiente la programación de la segunda auditoria interna
- En visita a obra parque Canal Boyacá, se solicita la toma de muestra de adoquín y subbase granular reciclada

**COMPONENTE SOCIAL**

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Revisión de pregables de los parques Virrey sur, Hippis, virrey Norte los cuales presentaron observaciones las cuales se remiten a profesional social del contratista.
- Asistencia de profesionales sociales del contratista a comite de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecen compromisos.
- Revisión de soportes de reuniones sociales, las cuales se remiten a la entidad

617

INFORME ANTICIPO



ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3089 de 2023 desarrolladas durante la semana del 18 al 24 de marzo de 2024 se describen a continuación:

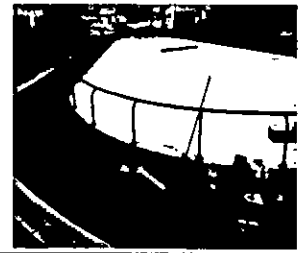


Durante la semana del 18 al 24 marzo de 2024, el contratista no remite legalización de las ordenes de operación No. 01, 02 y 03. Se le solicita legalizar las ordenes de operación.


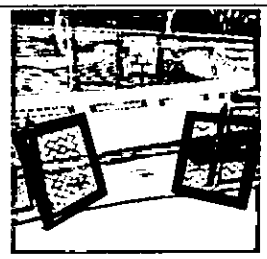
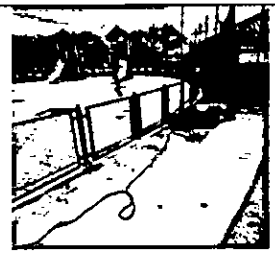

## REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

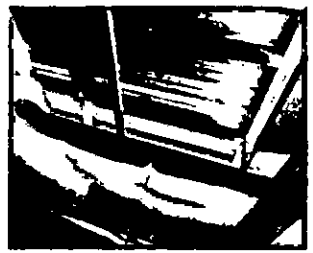

| PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN ) | | PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN RECICLADO) | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| se avanza con remates de tramos en sendero zona que limita con el árbol, sendero hacia la biblioteca, contorno quiosco de la cafetaria puerta 4, | | se avanza con la fundida de cintas de concreto que confinan las maseras y canecas, para entrega de tramos a la adinistracion. | |
| PARQUE TUNAL (ZONA PORTERIAS) | | PARQUE TUNAL (ZONA PORTERIAS) | |
|  |  |  |  |
| se avanza con la correccion de observaciones de la I ntervenrroria para la entrega de la porteria # 4. | | se avanza con la correccion de observaciones de la I ntervenrroria para la entrega de la porteria # 4. | |
| PARQUE TUNAL (PISTA BMX) | | PARQUE TUNAL (KIOSCO CAFETERIA) | |




| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| se hace entrega y puesta en servicio a la administracion y a las escuelas de bmx. | | se hace entrega y puesta en servicio a la administracion y a las escuelas de bmx. | |
| PARQUE TUNAL (CANCHA FUTBOL11) | | PARQUE TUNAL (CANCHA FUTBOL11) | |
|  |  |  | N/A |
| se instala tablero de control de iluminacion. | | se instala tablero de control de iluminacion. | |
| PARQUE EDUARDO SANTOS (COLISEO) | | PARQUE EDUARDO SANTOS (COLISEO) | |
|  |  |  |  |
| se terminan los remates en los baños del coliseo, para hacer entrega el martes proximo a la administracion. | | se terminan los remates en los baños del coliseo, para hacer entrega el martes proximo a la administracion. | |
| PARQUE LA FRAGUA | | PARQUE LA FRAGUA | |



212




| | |
|---|---|
|   |   |
| se avanza con la instalación de cañuelas, y remates de wing en pista de patinaje de baldosín, | se asfalta la pista de patinaje, se continua con la instalación de adoquin en los ingresos a la zona de juegos exterior. |
| PARQUE VILLA ALEMANA | PARQUE VILLA ALEMANA |
|   |   |
| se terminan las obras diagnosticadas para este paque, se hacen observaciones por parte de la interventoria para evacuar por parte del contratista y programar entrega a la administracion del parque. | se terminan las obras diagnosticadas para este peque, se hacen observaciones por parte de la interventoria para evacuar por parte del contratista y programar entrega a la administracion del parque. |
| PARQUE LA VICTORIA | PARQUE LA VICTORIA |
|   |   |
| se avanza con el mantenimiento y pintura de modulos de baños y mantenimiento interno de los mismos, muros en drywall. | se avanza con el mantenimiento y pintura de modulos de baños y mantenimiento interno de los mismos, muros en drywall. |
| PARQUE GILMA JIMENEZ | PARQUE GILMA JIMENEZ |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| vanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías para llegar a este cua | | se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías para llegar a este cuarto. | |
| PARQUE NUEVO MUZU | | PARQUE NUEVO MUZU | |
|  |  |  |  |
| se avanza con la instalacion de nuevo tramo de baranda, se terminan de atander observaciones de la interventoria en los baños de coliseo para puesta en servicio. | | se avanza con la instalacion de nuevo tramo de baranda, se terminan de atander observaciones de la interventoria en los baños de coliseo para puesta en servicio. | |
| PARQUE LA PETAR | | PARQUE LA PETAR | |
|  |  |  | N/A |
| se termina la instalacion del porton de ingreso doble hoja y valla del parque. | | se termina la instalacion del porton de ingreso doble hoja y valla del parque. | |
| PARQUE ILLIMANI | | PARQUE ILLIMANI | |




| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| se avanza con la adecuación e instalación de cubiertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños. | | se avanza con la adecuación e instalación de cubiertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños. | |
| PARQUE VIRREY SUR | | PARQUE VIRREY SUR | |
|  |  |  |  |
| se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se programe entrega a la administracion. | | se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se programa entrega a la administracion. | |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOS - RUTA DE LA VIDA) | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOS - RUTA DE LA VIDA) | |
|  |  |  |  |
| Compacatación material granular base con el vibrocompactador zona grecoromana y ruta de la vida | | Compacatación material granular base con el vibrocompactador zona grecoromana y ruta de la vida | |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | |




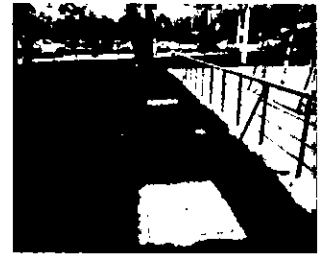
| | |
|---|---|
|   |   |
| Construcción rampa de discapacitados zona grecos | Limpieza y aseo senderos peatonales |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA BIOSALUDABLES) | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZOANA JUEGOS INFANTIL) |
|   |    |
| Ratoques de pintura solicitado por interventoria en los Biosaludables | Suministro de caucho para piso zona infantil |
| PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS | PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS |
|   |   |
| Suministro e instalación de baldosas negras caja sanitarias baños de hombres | Se inicia pintura de mataras |
| PARQUE NACIONAL | PARQUE NACIONAL |




| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Revisión del estado del juego dañado para recoguer | | Retrio de pieza dañada para taller | |
| PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | | PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | |
|  |  |  | N/A |
| Adecuación zona con material granular para entrada de camion grua | | | |
| PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | | PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | |
|  |  |  | N/A |
| Retiro de postes existentes en concreto costado sur oriental | | Retiro de postes existentes en concreto costado sur oriental | |
| PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | | PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | |







| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Retiro de postes existentes en concreto costado nor oriental | | Retiro de postes existentes en concreto costado nor oriental | |
| PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | | PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | |
|  |  |  |  |
| Excavación caja eléctrica costado nor oriental | | Fundida y vibrado de concreto dado para poste metálico costado nor oriental | |
| PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | | PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | |
|  |  |  | N/A |
| Fundida de concreto dado para poste metálico costado sur oriental | | Terminación Fundida de concreto dado para poste metálico costado sur oriental | |
| PARQUE CANAL BOYACA | | PARQUE CANAL BOYACA | |

95
94

| | |
|---|---|
|   |   |
| Compactación material granular sub base con canguro en sendero | Compactación de material granular sub base con vibrocompactador en sendero |
| PARQUE CANAL BOYACA | PARQUE CANAL BOYACA |
|   |   |
| Suministro e instalación de bordillos | Demolición de placa y excavaciones para conformación de dados para anclajes de juegos infantiles |
| PARQUE LOS NIÑOS | PARQUEADERO LOS NIÑOS |
|   |   |
| Parqueadero Parque de los Niños. Se realiza prueba de humedad en el asfalto que se instaló, para poder aprobar el inicio de la demarcación del parqueadero. | Rellenos sobre la tubería de Ø10", para desague del cárcamo hacia el pozo de alcantarillado existente en el parqueadero. Instalación de prado . |
| PARQUE LOS NIÑOS | PARQUE LOS NIÑOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Demarcación de parquaadero | | Demarcación de parquaadero | Construcción de cajas de inspección. |
| PARQUE LOS NIÑOS | | PARQUE LOS NIÑOS | |
|  |  |  |  |
| Concluye la instalación y compactación de la grava o triturado . | | Concluye la instalación y compactación de la grava o triturado . | |
| PARQUE LOS NIÑOS | | PARQUE LOS NIÑOS | |
|  |  |  |  |
| Finaliza la extendida, forrada y cocida del material geotextil en las Canchas de voley playa. | | Finaliza la extendida, forrada y cocida del material geotextil en las Canchas de voley playa. | Cajas de inspección existantes en la Cancha de arena playa |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Suministro e instalación de nuevas canecas en reemplazo de las canecas deterioradas o en mal estado en diferentes sectores del Parque. . | | Suministro e instalación de nuevas canecas en reemplazo de las canecas deterioradas o en mal estado en diferentes sectores del Parque. . | |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |
|  |  |  |  |
| Nivelación del terreno; extendida de tierra negra y siembra del cespedón en el Sector Maná. | | Llegada a la obra del cespedón | Siembra del cespedón |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |
|  |  |  |  |
| Aseo general en el área de los tanques sépticos. | | Aseo general en el área de los tanques sépticos. | |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |

| | |
|---|---|
|   |   |
| Colocación de tapas de caja de inspección y ajuste de tapas en concreto en pozos sépticos. | Colocación de tapas de caja de inspección y ajuste de tapas en concreto en pozos sépticos. |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) |
|   |   |
| Enchape de muros en cerámica por cambio de fluxómetros en sanitarios y lavamanos del Módulo de baños SURTIPOLLO | Recolección de canecas que se cambiaron, para disposición final. |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) |
|   |   |
| Retiro de pintura , lijada y aplicación de pintura en barandas del Templete Eucarístico. | Retiro de pintura , lijada y aplicación de pintura en barandas del Templete Eucarístico. |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | PARQUE DE LOS NOVIOS |





Excavaciones para identificar tubería de conexión en tanques de agua potable subterraneos..

PARQUE DE LOS NOVIOS





Durante el proceso de traslado del Módulo de baños, que estaba ubicado en el costado norte del Parque.

PARQUE DE LOS NOVIOS






Traslado y ubicación del Módulo de baños, cerca a la Entrada principal del Parque, sobre la Calle 63.

PARQUE DE LOS NOVIOS



Excavaciones para identificar tubería de conexión en tanques de agua potable subterraneos..

PARQUE DE LOS NOVIOS




Durante el proceso de traslado del Módulo de baños, que estaba ubicado en el costado norte del Parque.

PARQUE DE LOS NOVIOS



Traslado y ubicación del Módulo de baños, cerca a la Entrada principal del Parque, sobre la Calle 63.

PARQUE DE LOS NOVIOS



Camión grúa para traje del módulo de baños.

PARQUE DE LOS NOVIOS







Durante el proceso de traslado del Módulo de baños, que estaba ubicado en el costado norte del Parque.





PARQUE DE LOS NOVIOS
















Traslado y ubicación del Módulo de baños, cerca a la Entrada principal del Parque, sobre la Calle 63.




PARQUE DE LOS NOVIOS

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  | N/A |
| El módulo de baños reposa sobre las vigas de cimentación ya construidas. | | | |
| PARQUE SERVITA | | PARQUE SERVITA | |
|  |  |  |  |
| Puesta en funcionamiento de las lámparas instaladas en la Cancha de futbol 11. | | Puesta en funcionamiento de las lámparas instaladas en la Cancha de futbol 11. | |
| PARQUE SERVITA | | PARQUE SERVITA | |
|  |  |  |  |
| Durante la instalación de los postes para soporte de la malla en la Cancha de Tenis. | | Durante la instalación de los postes para soporte de la malla en la Cancha de Tenis. | Colocación de tapas en cajas de inspección para tierras de los postes de energía |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Finaliza la instalación del otro tramo de cielorraso en PVC instalado en el acceso de la Administración del PRD | | Finaliza la instalación del otro tramo de cielorraso en PVC instalado en el acceso de la Administración del PRD | Finaliza la instalación del otro tramo de cielorraso en PVC instalado en el acceso de la Administración del PRD |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS - ADMON) | |
|  |  |  |  |
| Cielorraso en acceso a la edificación en PVC | | Cielorraso en PVC para el depósito de servicios. Instalación de lámparas de iluminación. | |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS) | |
|  |  |  |  |
| Recubrimiento sintético y demarcación de la Cancha Squash. | | Recubrimiento sintético y demarcación de la Cancha Squash. | |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Nivelación del terreno y aplicación de tierra negra en área circundante a las Canchas de Tenis. | | | Andén en concreto (tramo de sendero) |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (TENIS) | |
|  |  |  |  |
| Construcción de cajas de inspección y empradización en zonas aledañas. | | Construcción de cajas de inspección y empradización en zonas aledañas. | |
| PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | | PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | |
|  |  |  |  |
| Lijada y aplicación de anticorrosivo en BIOS | | Lijada y aplicación de anticorrosivo en BIOS | |
| PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | | PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Lijada y aplicación de anticorrosivo en BIOS Y GRECORROMANOS | | Lijada y aplicación de anticorrosivo en BIOS Y GRECORROMANOS | |
| PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | | PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | |
|  |  |  |  |
| Lijada y aplicación de anticorrosivo en BIOS y RUTA DE LA VIDA | | Lijada y aplicación de anticorrosivo en BIOS y RUTA DE LA VIDA | |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS) | |
|  |  |  |  |
| Cambio de fluxómetros en baños; remate enchapes de cerámica en muros. | | Cambio de fluxómetros en baños; remate enchapes de cerámica en muros. | |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS) | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Conexiones hidrosanitarias en baño. | Cajas de inspección - puesta a tierra- colocación varilla coper well. | | |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS) | |
|  |  |  |  |
| Colocación de tapas para cajas de inspección; remates | | Colocación de tapas para cajas de inspección; remates | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO SST | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |

BOGOTÁ

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

**Reporte Semanal** 29 Interventor: SOLIUN INGENIERIA SAS

marzo 24, 2024 al marzo 30, 2024

1. **Datos Generales** — PARQUE — Código: — Localidad: — Barrio:

2. **Contrato de Obra**
Objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
Contratista: CONSORCIO PARQUES BOG — COP No. 3089-2023

| F.I. | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. #02 | F.R.#2 | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 7 MESES | 11-abr-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costo Directo | 10.981.251.399,00 | $ 41.664.509,00 | $ 77.343.733,00 | $ 144.068.622,00 | $ 1.116.610.201,00 | 3.561.173.407,00 | |
| A.I.U. (25,06%) | 2.751.901.601,00 | $ 10.491.246,00 | $ 19.382.339,00 | $ 36.103.096,00 | $ 280.323.716,00 | $ 892.430.056,00 | |
| Sub Total | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | $ 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.396.933.917,00 | $ 4.453.603.463,00 | |
| Total Inicial | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | $ 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.396.933.917,00 | $ 4.453.603.463,00 | |
| Adición No. | | | | | | | |
| Total Final | 13.733.153.000,00 | $ 52.355.755,00 | 96.726.072,00 | $ 180.169.718,00 | $ 1.396.933.917,00 | $ 4.453.603.463,00 | |
| Anticipo: (40% Sobre costo directo) | 4.392.500.560,00 | $ 16.745.804,00 | $ 30.937.493,00 | $ 57.626.649,00 | $ 447.444.080,00 | $ 1.780.586.704,00 | |
| Total | 4.392.500.560,00 | $ 35.609.951,00 | $ 65.788.579,00 | $ 122.543.069,00 | $ 951.489.837,00 | $ 2.673.016.759,00 | |
| Acumulado | | $ 35.609.951,00 | $ 101.398.530,00 | $ 223.941.599,00 | $ 1.175.431.436,00 | $ 3.848.448.195,00 | |

3. **Contrato de Interventoría**
Objeto: Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
Contratista: SOLIUN INGENIERIA SAS — CI No. 3131-2023

| F.I. | PLAZO | F.T. | Adición días | F.T. | Suspensión (días) | F.S. | F.R. | F.T. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-sep-23 | 8 MESES | 11-may-24 | | | | | | |

| | Valores Iniciales | Acta 1 | Acta 2 | Acta 3 | Acta 4 | Acta 5 | Acta 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Contrato: | 1.001.825.407,00 | $ 64.136.663,00 | $ 65.419.199,00 | 67.883.654,00 | $ 103.448.492,00 | $ 192.570.880,00 | |
| Iva (19%) | 190.346.827,00 | $ 12.186.004,00 | $ 12.429.648,00 | 12.894.094,00 | $ 19.655.213,00 | $ 36.588.467,00 | |
| Sub Total | 1.192.172.234,00 | $ 76.322.667,00 | $ 77.848.847,00 | $ 80.757.748,00 | $ 123.103.705,00 | $ 229.159.347,00 | |
| Adición: | | | | | | | |
| Total Final | 1.192.172.234,00 | $ 76.322.667,00 | $ 77.848.847,00 | 80.757.748,00 | $ 123.103.705,00 | $ 229.159.347,00 | |
| Retegarantía: | 119.217.223,00 | $ 7.632.287,00 | $ 7.784.885,00 | 8.075.775,00 | $ 12.310.371,00 | $ 22.915.935,00 | |
| TOTAL | 1.192.172.234,00 | $ 68.690.380,00 | $ 70.063.962,00 | 72.681.973,00 | $ 110.793.334,00 | $ 206.243.412,00 | |
| | | $ 68.690.380,00 | $ 138.754.342,00 | $ 211.436.515,00 | $ 322.229.849,00 | $ 528.473.261,00 | |

4. 29 — Fecha de corte: marzo 30, 2024

4.1. **Datos Generales** — Nombre: PRD- Muro aguas lVcanchas tenis/Canchas Hockey/Administración — Código: 12-091 — Localidad: BARRIOS UNIDOS
Dirección: Carrera 50 # 83-75 — Barrio:

Ppto. — % Ejecución Acumulado

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 330.780.258,00 | 2,44% | 97,00% | 99,00% | -2,00% | $ | 327.472.453,44 |
| TOTAL | | 330.780.258,00 | | 97,00% | 99,00% | -2,00% | $ | 327.472.453,44 |

4.2 Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Simón Bolívar | Código: | 13-069 | Localidad: | ENGATIVÁ |
| Dirección: | Avenida Calle 63 # 59-45 | | | Barrio: | |

| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
| | | $ 869.359.406,00 | 8,41% | 98,00% | 90,00% | 8,00% | $ | 782.423.465,40 |
| TOTAL | | 869.359.406,00 | | 98,00% | 90,00% | 8,00% | $ | 782.423.465,40 |

4.3. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Alto Blanco | Código: | 01-075 | Localidad: | USAQUEN |
| Dirección: | Carrera 8 A #158-04 | | | Barrio: | |

| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
| | | $ 154.101.031,00 | 1,14% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 154.101.031,00 |
| TOTAL | | 154.101.031,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 154.101.031,00 |

4.4. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque de los Niños | Código: | 12-141 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS |
| Dirección: | Avenida Carrera 53 # 60-80. | | | Barrio: | |

| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
| | | $ 1.432.296.803,00 | 10,55% | 92,00% | 70,00% | 22,00% | $ | 1.002.607.832,10 |
| TOTAL | | 1.432.296.803,00 | | 92,00% | 70,00% | 22,00% | $ | 1.002.607.832,10 |

4.5. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque de los Novios | Código: | 12-082 | Localidad: | BARRIOS UNIDOS |
| Dirección: | Avenida Calle 63 # 45-10. | | | Barrio: | |

| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
| | | $ 214.775.258,00 | 1,58% | 94,00% | 87,00% | 7,00% | $ | 186.854.472,72 |
| TOTAL | | 214.775.258,00 | | 94,00% | 87,00% | 7,00% | $ | 186.854.472,72 |

4.6. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Canal Río Negro | Código: | 12-002 | Localidad: | ANDES -RIO NEGRO |
| Dirección: | Calle 59 A # 20-67. | | | Barrio: | |

| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | |
| | | $ 79.082.034,00 | 0,58% | 90,00% | 100,00% | -10,00% | $ | 79.082.034,00 |

931

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 79.062.034,00 | | 90,00% | 100,00% | -10,00% | $ | 79.062.034,00 |

4.7. Datos Generales

Nombre: Parque Suiza o Hippies | Código: 02-019 | Localidad: CHAPINERO

Dirección: Calle 60 - Cra 7 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 118.086.403,00 | 0,87% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 118.086.403,00 |
| TOTAL | | 118.086.403,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 118.086.403,00 |

4.8. Datos Generales

Nombre: Parque UD8 | Código: 10-290 | Localidad: ENGATIVA

Dirección: Calle 63 # 68 - 45 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.055.040.981,00 | 7,77% | 99,00% | 94,00% | 5,00% | $ | 991.738.503,34 |
| TOTAL | | 1.055.040.861,00 | | 99,00% | 94,00% | 5,00% | $ | 991.738.503,34 |

4.9. Datos Generales

Nombre: Parque San José de Bavaria | Código: 11-078 | Localidad: SUBA

Dirección: Ac 170 - Cra 55 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 25.527.265,00 | 0,19% | 98,00% | 67,00% | 31,00% | $ | 17.103.267,55 |
| TOTAL | | 25.527.265,00 | | 98,00% | 67,00% | 31,00% | $ | 17.103.267,55 |

4.10. Datos Generales

Nombre: Estadio Olaya Herrera | Código: 18-207 | Localidad: RAFAEL URIBE

Dirección: Cl 35 # 3-50 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 600.463.302,00 | 4,42% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 600.463.302,00 |
| TOTAL | | 600.463.302,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 600.463.302,00 |

4.11. Datos Generales

Nombre: Parque Ciudad Montes | Código: 16-112 | Localidad: PUENTE ARANDA

Dirección: Cl 10 Sur # 39-29 | Barrio:

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 295.993.778,00 | 2,18% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 295.993.778,00 |
| TOTAL | | 295.993.778,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 295.993.778,00 |

4.12. Datos Generales

| Nombre: | Parque Bosques de San Carlos | Código: | 18-028 | Localidad: | RAFAEL URIBE |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Dirección: Cra. 13 a # 30-15 S. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 985.049.229,00 | 7,26% | 85,00% | 83,00% | 2,00% | $ | 817.590.660,07 |
| TOTAL | | 985.049.229,00 | | 85,00% | 83,00% | 2,00% | $ | 817.590.660,07 |

4.13. Datos Generales

| Nombre: | Estadio de Techo | Código: | 08-554 | Localidad: | KENNEDY |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Transversal 78K No. 41 A - 04 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 66.643.578,00 | 0,49% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 66.643.578,00 |
| TOTAL | | 66.643.578,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 66.643.578,00 |

4.14. Datos Generales

| Nombre: | Parque Lourdes Naranjos | Código: | 07-035 | Localidad: | BOSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cl. 70 Bis Sur #80k-1 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 26.022.208,00 | 0,19% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 26.022.208,00 |
| TOTAL | | 26.022.208,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 26.022.208,00 |

4.15. Datos Generales

| Nombre: | Parque Villa de los Alpes | Código: | 04-075 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 158.478.298,00 | 1,15% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 158.478.298,00 |
| TOTAL | | 158.478.298,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 158.478.298,00 |

4.16. Datos Generales

| Nombre: | Parque el Porvenir | Código: | 07-391 | Localidad: | BOSA |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Calle 53 Bis - Cra 97 C | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 33.582.453,00 | 0,25% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 33.582.453,00 |
| TOTAL | | 33.582.453,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 33.582.453,00 |

4.17. Datos Generales

| Nombre: | Parque Primera de Mayo | Código: | 04-196 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dirección: | Carrera 5 bis #17-14 | | | Barrio: | | | | |
| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | | | | |
| | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | | | | |
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | | | | |
| Emergencia | | $ 815.714.752,00 | 4,54% | 100,00% | 90,00% | 10,00% | $ | 554.143.276,80 | | | |
| TOTAL | | 815.714.752,00 | | 100,00% | 90,00% | 10,00% | $ | 554.143.276,80 | | | |
| 4.18. | Datos Generales | Nombre: | Parque Nacional | Código: | 03-035 | Localidad: | SANTA FE | | | | |
| | | Dirección: | Carrera 7 # 36 - 10 | | | Barrio: | | | | | |
| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | | | | |
| | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | | | | |
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | | | | |
| | | $ 41.000.192,00 | 0,30% | 72,00% | 100,00% | -28,00% | $ | 41.000.192,00 | | | |
| TOTAL | | 41.000.192,00 | | 72,00% | 100,00% | -28,00% | $ | 41.000.192,00 | | | |
| 4.19. | Datos Generales | Nombre: | Parque Berrio | Código: | 01-023 | Localidad: | USAQUEN | | | | |
| | | Dirección: | Calle 166 # 7 - 32 | | | Barrio: | | | | | |
| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | | | | |
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | | | | |
| | | $ 601.248.287,00 | 4,43% | 98,00% | 97,00% | -1,00% | $ | 583.208.898,39 | | | |
| TOTAL | | 601.248.287,00 | | 98,00% | 97,00% | -1,00% | $ | 583.208.898,39 | | | |
| 4.20. | Datos Generales | Nombre: | Parque Canal Boyaca | Código: | 09-050 | Localidad: | FONTIBON | | | | |
| | | Dirección: | Cra 74 B # 23 a - 98 | | | Barrio: | | | | | |
| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | | | | |
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | | | | |
| | | $ 910.502.644,00 | 6,71% | 98,00% | 70,00% | 28,00% | $ | 637.351.850,80 | | | |
| TOTAL | | 910.502.644,00 | | 98,00% | 70,00% | 28,00% | $ | 637.351.850,80 | | | |
| 4.21. | Datos Generales | Nombre: | Parque El Virrey Norte | Código: | 02-014 | Localidad: | CHAPINERO | | | | |
| | | Dirección: | Calle 88 - Cra 7 y Autop Norte | | | Barrio: | | | | | |
| | | Ppto. | | % Ejecución Acumulado | | | | | | | |
| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Valor | %/Total | Prog. | Real | Diferencia | % Inversión | | | | |
| | | $ 28.197.735,00 | 0,21% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 28.197.735,00 | | | |
| TOTAL | | 28.197.735,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ | 28.197.735,00 | | | |
| 4.22. | Datos Generales | Nombre: | Parque Fontanar del Rio | Código: | 11-368 | Localidad: | SUBA | | | | |
| | | Dirección: | Cll a 145 # 138 A - 10 | | | Barrio: | | | | | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 508.119.341,00 | 3,74% | 92,00% | 55,00% | 37,00% | $ | 279.465.637,55 |
| TOTAL | | 508.119.341,00 | | 92,00% | 55,00% | 37,00% | $ | 279.465.637,55 |

4.23. Datos Generales

| Nombre: | Parque el Tunal | Código: | 06-063 | Localidad: | TUNJUELITO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cra.19D #62B-15. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 1.185.589.656,00 | 8,74% | 89,00% | 98,00% | 1,00% | $ | 1.181.877.862,88 |
| TOTAL | | 1.185.589.656,00 | | 89,00% | 98,00% | 1,00% | $ | 1.181.877.862,88 |

4.24. Datos Generales

| Nombre: | Parque La Pradera | Código: | 15-040 | Localidad: | ANTONIO NARIÑO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cra.31 #14B-67S. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 871.736.911,00 | 6,42% | 93,00% | 87,00% | 6,00% | $ | 758.411.112,57 |
| TOTAL | | 871.736.911,00 | | 93,00% | 87,00% | 6,00% | $ | 758.411.112,57 |

4.25. Datos Generales

| Nombre: | Mirador Illimani | Código: | 19-788 | Localidad: | CIUDAD BOLIVAR |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | Cra.27b #1-1. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 224.051.966,00 | 1,65% | 94,00% | 84,00% | 10,00% | $ | 188.203.651,44 |
| TOTAL | | 224.051.966,00 | | 94,00% | 84,00% | 10,00% | $ | 188.203.651,44 |

4.26. Datos Generales

| Nombre: | Parque Eduardo Santos | Código: | 14-030 | Localidad: | LOS MARTIRES |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | CALLE 4A BIS N 16 B 30. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 140.357.541,00 | 1,03% | 89,00% | 100,00% | -1,00% | $ | 140.357.541,00 |
| TOTAL | | 140.357.541,00 | | 89,00% | 100,00% | -1,00% | $ | 140.357.541,00 |

4.27. Datos Generales

| Nombre: | Nuevo Muzu | Código: | 06-017 | Localidad: | TUNJUELITO |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección: | 38 a 52a. Cra. 61B. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | % Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 846.409.817,00 | 6,24% | 97,00% | 90,00% | 7,00% | $ 761.768.835,30 |
| TOTAL | | 846.409.817,00 | | 97,00% | 90,00% | 7,00% | $ 761.768.835,30 |

| 4.28. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Cayetano | Código: | 08-241 | Localidad: | USME |
| Dirección: | Cra.80 B40 55 Sur. | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | % Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 214.611.043,00 | 1,58% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 214.611.043,00 |
| TOTAL | | 214.611.043,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 214.611.043,00 |

| 4.29. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Villa Alemana | Código: | 05-087 | Localidad: | USME |
| Dirección: | Cra.5 Este # 5 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | % Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 45.922.595,00 | 0,34% | 100,00% | 98,00% | 2,00% | $ 45.004.143,10 |
| TOTAL | | 45.922.595,00 | | 100,00% | 98,00% | 2,00% | 45.004.143,10 |

| 4.30. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Palestina | Código: | 07-165 | Localidad: | BOSA |
| Dirección: | Cle.67 S # 81 G - 09 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | % Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.797.573,00 | 0,08% | 100,00% | 100,00% | 0,00% | $ 10.797.573,00 |
| TOTAL | | 10.797.573,00 | | 100,00% | 100,00% | 0,00% | 10.797.573,00 |

| 4.31. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Virrey Sur | Código: | 05-016 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | Calle 93 SUR # 3 A - 03 ESTE | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | % Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 91.107.565,00 | 0,67% | 97,00% | 100,00% | -3,00% | $ 91.107.565,00 |
| TOTAL | | 91.107.565,00 | | 97,00% | 100,00% | -3,00% | 91.107.565,00 |

| 4.32. Datos Generales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Gilma Jimenez | Código: | 05-016 | Localidad: | TUNJUELITO |
| Dirección: | Calle 51A S # 55A - 00 | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | % Total | % Ejecución Acumulado Prog. | Real | Diferencia | % Inversión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $ 390.308.039,00 | 2,68% | 82,00% | 80,00% | 2,00% | $ | 312.246.431,20 | | |
| TOTAL | 390.308.039,00 | | 82,00% | 80,00% | 2,00% | | 312.246.431,20 | | |

4.33. Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque La Victoria | Código: | 04-122 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | Avenida 1 de Mayo No. 1 - 40 Sur | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 50.851.447,00 | 0,37% | 98,00% | 92,00% | 6,00% | $ | 46.783.331,24 |
| TOTAL | | 50.851.447,00 | | 98,00% | 92,00% | 6,00% | | 46.783.331,24 |

4.34 Datos Generales

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | Parque Gaitan Cortes | Código: | 04-103 | Localidad: | SAN CRISTOBAL |
| Dirección: | Cl. 18 #5 - 50 sur | | | Barrio: | |

| Capítulos: | Fecha Inicio/Final | Ppto. Valor | Ppto. %/Total | % Ejecución Acumulado Prog. | % Ejecución Acumulado Real | Diferencia | % Inversión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $ 10.000.000,00 | 0,07% | 60,00% | 100,00% | -40,00% | $ | 10.000.000,00 |
| TOTAL | | 10.000.000,00 | | 60,00% | 100,00% | -40,00% | | 10.000.000,00 |

5

| | |
|---|---|
| Fecha Inicial: | 12-sep-23 |
| Fecha de Terminación Inicial: | 11-abr-24 |
| Adición de tiempo en (meses): | |
| Fecha de Terminación Final: | 11-abr-24 |

6. OBSERVACIONES:
El presente reporte se ajusta al nuevo balance en el que se incluyen nuevas actividades y se definen nuevos frentes por parte de la entidad, en el cuál se suprimen actividades y se ajustan cantidades, la medición se realizó con la programación remitida por el contratista de obra el día 27-02-2024, sin embargo el mismo debe ajustar a las condiciones actualizadas, por lo que se requirió al CONSORCIO PARQUES BOG, remitir el cronograma actualizado al Balance presupuestal

7. Licencias:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcción: | Ambiental: | N/A | Intervensión del Espacio Público | | N/A |

8. Servicios Públicos:
TELEFONOS
DAMA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CODENSA | N/A | EAAB | Informe 50% | OTROS | Informe 100% |

| 9. PAC 2023 | | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

10. Observaciones por parques:

1.- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS: Se continua con las actividades constructivas en la zona de los grecoromanos y ruta de la vida,en estas zonas ya se termino la construción de la viga zarpa, se ya ya se instalo geotextil T-2100 y se termino la colocación de material granular base por capas de e=10 cms, la cual ya se compacto con vibrocompactador, se tomaron las densidades correspondientes yse inicio la fundida con concreto. se inicio la colocación del piso caucho negro y la instalación de los modulos complementarios para la baranda en la zona infantil..
2.- PARQUE FONTANAR DEL RIO: Se debe iniciar la construcción el Parkour, ya que se cuenta con el sitio dentro del parque para iniciar esta actividad, esta pendiente la instalación del vidrio de 5mm templado zona de cafeteria.
3.- PARQUE CANAL BOYACA: Se realizó la instalación de bordillos zona infantil, se excavó, se instalo geotextil, se coloco material granular, se compacto con vibrocompactador, se tomaron densidades, se cotoco malla electrosoldada y se fundol placa de concreto en la zona infantil
4.- PARQUE TUNAL: Se encuentra con un pequeño porcentajes de atraso debido a que faltan algunas actividades por terminar por completo.
5.- PARQUE FRAGUA: Se encuentra con un pequeño porcentajes de atraso debido debido a la terminacipon el mantenimiento de los juegos infantiles
6.- PARQUE EDUARDO SANTOS: Lleva un porcentaje igual en el cual se ancuentran rematando los baños de coliseo, y en la zona de biosaludables.
7.- PARQUE NUEVO MUZU: Se realizala instalacion de barandas y puertas en zona de juegos, se entregan y ponen en servicio los baños del coliseo
8.- PARQUE VIRREY DEL SUR: Se terminan actividades de mantenimiento y pintura en este parque, se programa entrega a la admnistración
9.- PARQUE PRIMERA DE MAYO: Se realizaron actividades de desmonte de los postes de concreto existentesy al tiempo de fraguado del concreto de los dados de cimentación
10.- PARQUE VIRREY NORTE: Este Parque se encuentra actualmente terminado, el contratista realizo el retiro de los elementos de un juego dañado por solicitud del IDRD.
11.- PARQUE DE LOS NIÑOS: Se encuentra con un pequeño porcentajes de atraso debido a que falta la construccipon del cerramiento y el suministro y colocación de la arena peldar en la cancha de volleybol., pendiente las instalaciones eléctricas, las cuales no se han iniciado.
12.- PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA: Se realizo el mantenimiento de los Grecorromanos y los Gimnasios biosaludables, también se realizo el retiro de pintura, lijado y aplicación de anticorrosivo en gimnasios y Zona infantil..

11. INFORME TÉCNICO

I.- ACTIVIDADES QUE SE ESTAN EJECUTANDO

• PARQUE EL TUNAL - CÓD: 06-063

SENDEROS EN ADOQUIN COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE FRENTE A LA PUERTA DE INGRESO # 4.

- se avanza con remates de tramos en sendero zona que limita con el contorno del quioseo de la cafeteria puerta 4, se avanza con la fundida de cintas de concreto que confinan las maseras y canecas, para entrega de tramos a la adinistracion.

ZONA DE PORTERIAS:

- se termina y entregan las observaciones de la I ntervenrorta para la la portaria # 4.
- se hace entrega y puesta en servicio a la administracion de la misma.

ZONA DE RUTA DE LA VIDA JUNTO A PISTA DE BMX:

- se avanza con el lijado y pintura de las barandas y los aparatos de esta ruta de la vida.

ZONA DE PARKOURT :

- se avanza con el descapota, excavación y fundida de dados de fijacion de los elementos del parkourt.

• PARQUE EDUARDO SANTOS:

- se hace entrega y puesta en servicio de los baños del coliseo a la administracion, esta pendiente que lleguen unos manifares de las maquinas de biosaludables para terminar todo en este parque

- PARQUE LA FRAGUA:

- se termina la instalación de cañuelas, y remates de wing en pista de patinaje de baldosín, se de estaltar la pista de patinaje, se termina la instalación de adoquín en los ingresos a la zona de juegos exterior, se inicia la instalación de barandas perimetrales en zona de juegos, se instalan cintas antideslizantes en escaleras del coliseo al ingreso del mismo.

- PARQUE NUEVO MUZU:

- se termina la instalacion de barandas y puertas en zona de juegos, se entregan y ponen en servicio los baños del coliseo, llega mterial de piso caucho al parque.

- PARQUE VILLA ALEMANA:

- se terminan las obras diagnosticadas para este paque, se hacen observaciones por parte de la interventoria para evacuar por parte del contratista y programar entrega a la administracion del parque.

- PARQUE VIRREY SUR:

- se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se programa entrega a la admistracion

- PARQUE GILMA JIMENEZ:

- Se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberias.se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberias para llegar a este cuarto.

- PARQUE MIRADOR ILLIMANI:

- se avanza con la adecuación e instalación de cubiertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños.

- PARQUE LA VICTORIA

- se avanza con el mantenimiento y pintura de muros en drywall, modulo de administracion, se continua con el mantenimiento de las cubiertas u canales de los midulos de baño, se termina los mantenimientos de aparatos de gimnasio.

- PARQUE GAITAN CORTES:

- se realizan ya todos los mantenimientos en maquinas de esta parque se hace acta y puesta en servicio por parte del contratista.

- PARQUE LAURELES NARANJO - COD: 07-035

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%

- PARQUE PORVENIR - COD.

- Actividades iniciales terminadas al 100.00%, parque totalmente terminado.
- En este parque ya se colocarón los móduos de baños en los sitios dispuestos por el IDRD.
- No se realizarán actividades eléctricas ni hidrosanitarias hasta tanto no sean autorizadas por el IDRD.

- El IDRD realiza reubicación de sitio para los módulos sanitarios
- El Contrtasita debe ajustar el presupuesto e incluir el valor de las nuevas actilvidades
- Se deben adecuar las instalaciones hidraulicas, sanitarias y eléctricas.

• PARQUE CIUDAD MONTES - COD 16-112

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado-
- Actividad eléctricas realizadas al 100,00%
- Se realizó reunión social de finalización.
- Se realizo Acta de puesta en servicio zona ruta de la vida.

• PARQUE VILLA DE LOS ALPES - COD. 04-075

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE ESTADIO DE TECHO - COD

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este Estadio no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA - CÓD: 18-207

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- Actividades eléctricas realizadas al 100,00%

• PARQUE VIRREY CHICO

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas 0.00%
- Se retiro juego en mal estado y fue llevado a taller para su correspondiente arreglo.

• PARQUE NACIONAL

- Actividades terminadas al 100,00 %, parque totalmente terminado.
- En este parque no se realizarón actividades eléctricas. 0,00%

• PARQUE FONTANAR DEL RIO

- Pendiente instalación de vidrio de 5mm temoplado para el módulo de comidas.
- Esta pendiente el inicio de la construcción de la zona del parkour.
- El contratista manifesto que ya esta en puerto los parkour y que se estan nacionalizando

• PARQUE CANAL BOYACA

- Se inicia la instalación de bordillos (zona infantil).
- Se realizo la liberación de la instalación del geotextil T-2400 (sendero, plazoleta y juego zona infantil el tercio) y de la sub base en el sendero.
- Se termina excavaciones para fundir los dados de los juegos zona infantil.
- Se verificaron alturas cotas de nivel,por parte de interventoria zona juegos infantiles.
- Se realizo la instalacion de malla electrosoldada (zona ajuego infantil al tercio)
- Se fundio concreto premezclado de 3000 PSI zona del tercio juuego infantil,
- Se tomaron las respectivos cilindros de concreto para ser llevados a laboratorio,
- Se inicia excavación para colocación de bordillos zona del sendero

• PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO

- Se termina excavación para fundir los dados en concreto.
- Se realizó excavación para construcción de cajas electricas.
- Una vez fraguado el concreto de los dados se procedio a la instalación con el camión grua de los postes metalicos de 14 mts (4 postes en total),
- Se realizó la instalación de las canastas metalicas (4 canastas en total) en los postes métalicos .
- Se realizo la construcción de las cajas electricas en mampostaria ladrillo

- PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS - COD. 18-028

ZONA BAÑOS ADMINISTRATIVOS

- Se realizó el desmonte de las puertas en madera de la entrada baños hombres y mujeres.
- Se realizó la instalación de las puertas metalicas de la entrada baños hombres y mujeres.

ZONA BEBEDEROS

- Pendiente el arreglo de un (1) bebedero,

ZONA BIOSALUDABLES

- Pendiente la entrega y puesta en servicio de los Biosaludables,

ZONA GRECOROMANOS

- Se continua con la instalación de material granular base.
- Se continua con la compactación de la base granular en capas de 10 cms.,
- Se esta a la espera de la toma de densidades para la instalación del concreto.
- Se solicita al contratista realizar junto con interventoria visita al taller para ver el avance de los grecos y de los elementos de la ruta de la vida.

ZONA JUEGOS INFANTILES

- LLegada de módulos complementarios para instalar bajo baranda en la zona infantil
- Se inicio la colocación de material caucho piso negro EPDM.

- PARQUE SIMON BOLIVAR - MANA

- Se hace la observación , que durante el periodo del Evento realizado en el Parque Simón Bolivar "Estéreo Picnic", no fue posible adelantar trabajos, ya que no se permitió el acceso.

En el sector del Tanque de pozo séptico

- Pendiente tramo de aplicación de tierra negra y la instalación del cespedón en un área aproximada de 200 m2.

En el Sector del lago

- Continúa el mantenimiento para el juego infantil M5 (columpio) , localizado en el costado oriental del Puente de Piedra.
- Se tiene programado continuar con el mantenimiento de los juegos infantiles para el 1° de abril de 2024.

En otros sectores del Parque

- Está en observacion y pendiente el arreglo de los bebederos que durante la entrega, no funcionó el suministro de agua y otro bebedero que tiene roto el tubo de agua que lo alimenta..
- Continúa la ejecución de remates de pintura en los kioscos de comidas y limpieza de las áreas que se puedan manchar durante la intervención.
- Pendiente el desmonte de canecas de basura que están en mal estado y reemplazo por canecas en acero inoxidable. Son 23 unidades.

En el Sector del Módulo EL TRENCITO

- Programado el arreglo de los fluxómetros de baños del Módulo El Trencito para iniciar el 1° de abril.

• PRD - TENNIS

PDR- Muro Squash/Canchas de Tenis.

- Retiro del cerramiento provisional en el área perimetral y aferente de la Cancha se Squash.
- Entrega a la Administración del área intervenida en la Cancha de Squash.
- Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad.

PRD - Área Administrativa.

- Se realizó el cambio de tomas corrientes GFCI en depósito de servicios del área administrativa.
- Entrega a la Administración del área intervenida en Cuarto de Servicio trabajadoras y porche acceso edificio Administración.
- Acta de Puesta en Servicio Obras Comunidad.

PRD - Cancha de baloncesto

- Finaliza la aplicación del recubrimiento sintético y demarcación de la Cancha.
- Aseo general, mediante el retiro de elementos sobrantes (escombros y materiales.
- Se continúa la reconstrucción de tramo de cuneta exterior a la cancha sobre la vía principal.

• PARQUE UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE (UDS)

- Se realiza la prueba de presión y en dos sanitarios, se detecta fuga de agua.
- Se subsana fuga de agua en sanitarios y se realizan nuevamente pruebas de presión, resultando satisfactorias.
- Se programa entrega de arreglos fluxómetros baños del Velódromo, para el 1° de abril de 2024.
- Revisión de cajas de inspección para puesta a tierra en postes de energía en Canchas de Softbol y Beisbol.

- La instalación de luminarias que están pendientes en Canchas de Softbol, se programan para próxima semana, a partir del 1° de Abril.

• PARQUE SERVITA

- Pendiente la instalación de luminarias por fachada de la edificación.
- Observaciones de la interventoría en la instalación de los postes en tubería que sirven de soporte para la malla en la Cancha de Tenis.

• PARQUE SAN JOSE DE VASARIA

- Continúa en ejecución el mantenimiento de los Grecorromanos y los Gimnasios biosaludables en este Escenario.
- Retiro de pintura, lijado y aplicación de anticorrosivo en gimnasios y Zona Infantil.
- Se le solicita al Contratista agilizar el mantenimiento y lubricación de los Juegos; la actividad está bastante atrasada.
- En la Ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque, aún no se ha iniciado el mantenimiento

• PARQUE DE LOS NIÑOS

- Avance en la construcción de pozo de alcantarillado aguas lluvias.
- Finaliza el suministro e instalación de grava 3/4"-1"; extendida y compactación en el arenero existente en Juego de Niños. e=10 cm.
- Instalación de geotextil sobre capa de grava en el arenero del Juego de Niños.
- Continúa la instalación del cerramiento metálico por costado oriental y sur.
- Finaliza la instalación de tubería para drenar la cancha existente (conexión al pozo de alcantarillado que se construyó).
- Continúa la construcción graderías en prefabricados de concreto sobre terreno.
- Peñetes y remates para cajas de inspección del costado occidental de las Canchas de Vóley playa.
- Continúa la construcción del sendero peatonal en adoquín de arcilla por costado occidental.
- Inicio en la instalación de luminarias tipo LED en postes de alumbrado Canchas Vóley playa.

- Se programa la llegada de la arena PELDAR, para las canchas de Voleybol, para el 1 de abril del 2024.
- Aseo y limpieza en los sitios de trabajo: recolección de escombros y disposición final.
- Finaliza la demarcación de los parqueaderos.
- Retiro del cerramiento provisional en el área de los parqueaderos.
- Entrega a la administración del área intervenida en el Parqueadero del Parque de los Niños.
- Puesta en servicio Obras Comunidad del Parqueadero del Parque de Los Niños.

- PARQUE DE LOS NOVIOS

- Inician las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, para el Módulo de baños que se instaló en el Costado Sur.
- Construcción de caja de inspección para evacuación de sanitarias del módulo de baños.
- Pendiente accesorios para reemplazar en tubería que une los dos tanques de agua potable de 20000 lts.
- Termina la construcción de los soportes y anclajes de la estructura metálica a los dados en concreto en el Túnel del Amor.
- Finaliza la instalación de pasamanos metálicos al interior de la estructura del túnel del Amor.
- Se terminó de realizar cambio de fluxómetros de sanitarios para baños públicos existentes.
- Pendiente rematar enchapes en sitio donde se cambiaron los fluxómetros en baños públicos hombres.

**ESTADO GENERAL DEL CONTRATO**

Fecha de corte : al 30 de marzo de 2024

| FECHA | PORCENTAJE PROGRAMADO | PORCENTAJE EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| | % | % | % |
| 30-03-2024 | 97.00 | 94.00 | -3.00 |
| | | | |

**ANALISIS GENERAL DEL CONTRATO**

De acuerdo con el reporte semanal presentado a fecha del 30-03-2024, se evidencia en general un Porcentaje de Obra Programado del 97,00% , contra un Porcentaje de Obra Ejecutado del 94,00%, donde se refleja una diferencia en la Programación de las Obras, la cual da como resultado una diferencia en porcentaje del (-) 3.00%.. Igualmente se le solicita al Contratista implementar un plan de contingencia para terminar los parques a tiempo ya que falta menos de quince (15) días para terminar el contrato, y todavía faltan parque por terminar, Igualmente se debe continuar implementando todos los recursos (materiales, equipos y personal humano) que están a su alcance para que se adelanten las actividades de mantenimientos en todos los parques, y así evitar atrasos que conlleven a multas y/o sanciones por incumplimiento.

Según el cuadro de porcentajes semanales consolidados, se observa que de los treinta y cuatro (34) parques donde actualmente se estan desarrollando actividades, hay cuatro (4) parques que presentan atraso, pero se aclara que los atrasos evidenciados se estan presentando por los siguientes motivos:

1.- Parque San José de Bavaria: En este parque ya se iniciaron las actividades de pintura de los juegos y ruta de la vida, estas actividas del parque nos las comenzsaron en las fechas estipuladas según el project, las cuales debian haber de iniciar el 04/03/2024..
2 . Parque de los Niños: Esta parque presenta atraso debido a que los lava pies no se han inicado a la fecha, ademas el contratista no ha iniciado las actividades eléctricas las cuales debieron quedar terminadas al 100 % el 29 de febrero del 2024. Igualmente se observa atraso en la terminación a la fecha se inicio la colocación de la arena Peldar cancha voley playa.
3.- Parque Fontanar: Este parque presenta atraso debido a que el contratista manifiesta que ya llegaron los elementos o módulos del Parkour los cuales estan por por nacionalizar, pero a fita fecha no han iniciado actividades preliminares.
4.- Parque Primero de mayo:. Este parque ya inicio las actividades en la zona del velodromo. en cuanto se refiere al retiro de los postes existentes, la excavación de los dados y la fundida de los mismos, los cuales se estan realizando, a la fecha ya se colocaron los postes eléctricos con sus resopectivas canastas y se estan realizando las cajas electricas, pendiente terminación de cajas electricas e instalación de luminarias en cada uno de los postes instalados-

FRENTES DE TRABAJO :

Por facilidad y para el buen desempeño del Contrato, se han fijado tres (3) frentes de trabajo en los diferentes Escenarios, discriminados de la siguiente manera:

FRENTE 1: Este frente cuenta con doce (12) parques. Ocho (8) de ellos presentan terminación de actividades (Parque Naranjos, Estadio de Techo, Estadio Obeya Herrera, Parque Porvenir, Parque Ciudad Montes, Parque Virrey Norte, Parque Villa de los Alpes y Parque Nacional), los cuales ya se encuentran terminados al 100,00% . un (1) parque con actvidades significativas (Primero de Mayo) con un avance superior al 90%, Los Parques (Bosques de San Carlos y Canal Boyaca) con un vance del 83% y 70 %. los Parque (Fontanar del Rio) con un avance del 55%.

FRENTE 2: Este frente cuenta con diez (10) parques, Los siguiente parques : (Parque Sucre o Hippies, Parque Canal Rio Negro y Parque Altabianca) los cuales presentan terminación de actividades al 100,00 %, los parques (Salitre, PRD, Servita y UDS) cuentan con un porcentaje del 94%, 90%, 97% y 94%, el parque (Simón Bolivar) cuenta con porcentaje superior al 90% el parque (Novios) cuenta con porcentaje superior al 87%, y el parque (San José de Bavaria) cuenta con un porcentaje del 57%,

FRENTE 3: Este frente cuenta con doce (12) parques.los Parques (Palestina, Cayetano, Eduardo Santos, Virrey Sur y Galtan Cortez ) ya se encuentran terminados al 100%, el parque (Tunal, Villa Alemana y ) se encuentran todos al 98%, los parques (La Fragua, Illimani y Nuevo Muzu presentan los siguiente porcentajes 87%, 84% y 90% respectivamente, el parque (Gilma Jimenez) tiene un porcentaje del 80%

COMPONENTE SST

Actividades de Interventoría

Recorridos a los Parques Activos
Participación en Comité de obra virtual
Verificación de Trabajos en Alturas
Verificación Demarcación y Señalización
Verificación de uso de EPP Recomendaciones SST

Actividades del Contratista

Entrega de EPP y Dotación (Reposición)
Permisos de Trabajos (Alturas)
Inspección de Arnés
Jornada de Orden y Aseo
Señalización y demarcación (Cinta Peligro)

COMPONENTE AMBIENTAL

- Se recibió informe #7, se revisó por parte de la interventoría y se generaron observaciones
- Se recibe hoy el alcance del informe #7
- Se aprobó el proveedor de material mineral y se compartió al componente de calidad la información
- Durante la semana se recibió registro fotográfico por parte de la profesional ambiental de las actividades de orden y aseo que se han adelantado en los frentes de obra, dando alcance a las observaciones que se realizan por parte de la interventoría.
- Se recomienda al componente técnico mantener los frentes de obra en buenas condiciones de orden y aseo, dado que la cuadrilla está adelantando las acciones solicitadas, pero rápidamente se vuelve a generar desorden en los frentes de obra

COMPONENTE DE CALIDAD

- Se recibieron unos ensayos de la mezcla asfáltica densa en caliente (MDC -19).
- Se realiza solicitud de documentación y tratamiento a SNC de la mezcla instalada en parqueadero parque de los niños a espera de esta información
- Informe compras pendientes, no ha sido enviado, el contratista se compromete a hacer entrega el 1 de abril
- Programación auditoría, no se ha enviado plan, el contratista se compromete a informar la programación el 1 de abril
- Se recibe manuales de mto y uso están en revisión
- Informe 7 el contratista lo enviara el día de hoy 27 marzo
- Se confirma reunión para jueves 4 de abril 2:30 of interventoría a la que debe asistir coordinador de proyectos prof calidad de interventoría y contratista

COMPONENTE SOCIAL

- Atención ciudadana no se recepcionan PQRS.
- Asistencia de profesionales sociales del contratista a comite de obra en el cual se presenta actividades ejecutadas y se establecan compromisos.

INFORME ANTICIPO

ANTICIPO: INFRAESTRUCTURA




Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante la semana del 25 al 30 de marzo de 2024 se describen a continuación:



Durante la semana del 25 al 30 marzo de 2024, el contratista no nha remitido la legalización de las ordenes de operación No. 03. Se le solicita legalizar las ordenes de operación.



Interventoiría envia ofico al contratista IDRD-3131-2024-317 - Solicitud legalización documentación para cierre del anticipo.





## REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE TÉCNICO

| PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN ) | PARQUE TUNAL ( SENDEROS EN ADOQUIN RECICLADO) |
|---|---|


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| se avanza con remates de tramos en sendero zona que limita con el contorno del quiosco de la cafeteria puerta 4, | | se avanza con la fundida de cintas de concreto que confinan las mataras y canecas, para entrega de tramos a la adiministracion. | |
| PARQUE TUNAL (ZONA PORTERIAS) | | PARQUE TUNAL (ZONA PORTERIAS) | |
|  |  |  |  |
| se termina y entregan las observaciones de la I ntervenroria para la ta porteria # 4. | | se termina y entregan las observaciones de la I ntervenroria para la la porteria # 4. | |
| PARQUE TUNAL (RUTA DE LA VIDA) | | PARQUE TUNAL (KIOSCO CAFETERIA) | |
|  |  |  | N/A |
| se avanza con el lijado y pintura de las barandas y los aparatos de esta ruta de la vida. | | se avanza con el lijado y pintura de las barandas y los aparatos de esta ruta de la vida. | |
| PARQUE TUNAL (ZONA PARKOUR) | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  | N/A | N/A |
| se avanza con el descapote, excavacion y fundida de dados de fijacion de los elementos del parkour. | | | |
| PARQUE EDUARDO SANTOS (COLISEO) | | PARQUE EDUARDO SANTOS (COLISEO) | |
|  |  |  |  |
| se hace entrega y puesta en servicio de los baños del coliseo a la administracion | | se hace entrega y puesta en servicio de los baños del coliseo a la administracion | |
| PARQUE LA FRAGUA | | PARQUE LA FRAGUA | |
|  |  |  |  |
| se termina la instalación de cañuelas, y remates de wing en pista de patinaje de baldosín, se de asfaltar la pista de patinaje | | se termina la instalación de adoquin en los ingresos a la zona de juegos exterior, | |
| PARQUE VILLA ALEMANA | | PARQUE VILLA ALEMANA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| se terminan las obras diagnosticadas para este paque, se hacen observaciones por parte de la interventoria para evacuar por parte del contratista y programar entrega a la administracion del parque. | | se terminan las obras diagnosticadas para este paque, se hacen observaciones por parte de la interventoria para evacuar por parte del contratista y programar entrega a la administracion del parque. | |
| PARQUE LA VICTORIA | | PARQUE LA VICTORIA | |
|  |  |  |  |
| se avanza con el mantenimiento y pintura de muros en drywall, modulo de administracion, se continua con el mantenimiento de las cubiertas u canales de los midulos de baño, se termina los mantenimientos de aparatos de gimnasio. | | se avanza con el mantenimiento y pintura de muros en drywall, modulo de administracion, se continua con el mantenimiento de las cubiertas u canales de los midulos de baño, se termina los mantenimientos de aparatos de gimnasio. | |
| PARQUE GILMA JIMENEZ | | PARQUE GILMA JIMENEZ | |
|  |  |  |  |
| vanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías para llegar a esta cu | | se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías para llegar a este cuarto | |
| PARQUE NUEVO MUZU | | PARQUE NUEVO MUZU | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  | N/A | N/A |
| se termina la instalacion de barandas y puertas en zona de juegos, se entregan y ponen en servicio los baños del coliseo, llega mterial de piso caucho al parque. | | | |
| PARQUE ILLIMANI | | PARQUE ILLIMANI | |
|  |  |  |  |
| se avanza con la adecuación e instalación de cubiertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños. | | se avanza con la adecuación e instalación de cubiertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños. | |
| PARQUE VIRREY SUR | | PARQUE VIRREY SUR | |
|  |  |  |  |
| se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se programa entrega a la admiistracion para . | | se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se programa entrega a la admiistracion para . | |
| PARQUE GAITAN CORTES | | PARQUE GAITAN CORTES | |





se realizan ya todos los mantenimientos en maquinas de este parque se hace acta y puesta en servicio por parte del contratista.

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA MATERAS)





se realizó pintura de materas sendero administración


PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (BAÑO DE MUJERES)





Cambio sanitario baño de mujeres con canguro y vibrocompactador

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA GRECOS Y RUTA DE LA VIDA)






se realizan ya todos los mantenimientos en maquinas de este parque se hace acta y puesta en servicio por parte del contratista.

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA BAÑOS HOMBRES -MUJERES)










Se realizo cambio de puertas entrada principal baños hombres y mujeres

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA DE BIOSALUDABLES)







Pendiente entrega puesta en servico de los Biosaludables

PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS (ZONA JUEGOS INFANTIL)

que 884

| | |
|---|---|
|   |   |
| Se realiza compactación base con canguro y vibrecompactador zoan grecos y ruta de la vida | Se inicie la instalacipon de piso caucho negro en zona infantil |
| PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO |
|   |   |
| Construcción de cajas eléctricas | Construcción de cajas eléctricas |
| PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO |
|   |   |
| Dados fundidos con concreto premezctado para instalación de los postes metalicos | Dados fundidos con concreto premezclado para instalación de los postes metalicos |
| PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO | PARQUE VELODROMO 1 DE MAYO |





Postes y canastillas metalicos instalados

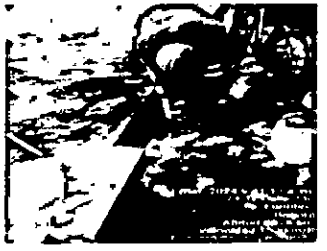
PARQUE CANAL BOYACA





Postes y canastillas metalicos instalados

PARQUE CANAL BOYACA






Instalación de bordillos zona infantil

PARQUE CANAL BOYACA





Se realizarón las excavaciones para fundir los dados de los juegos infantiles

PARQUE CANAL BOYACA










Toma de densidades al metarial granular zona plazoleta

PARQUE CANAL BOYACA






Excavacion al tercio zona infantil



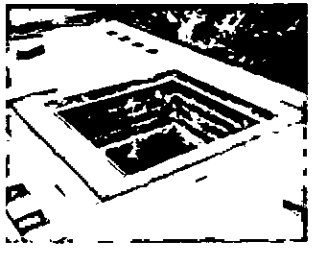
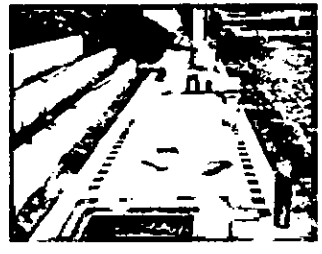
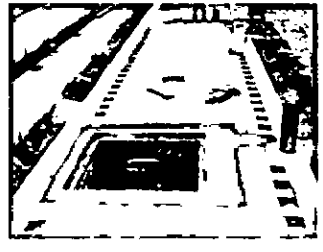
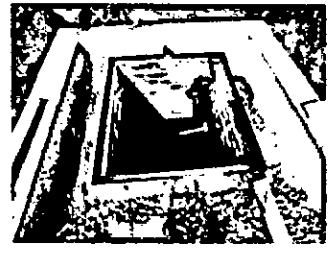





Instalación de geotextil T-2400 al tercio zona infantil


PARQUE CANAL BOYACA

947

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Colocación de material granular sobre geotextil al tercio zona infantil | Extendía de material granular sobre geotextil al tercio zona infantil | Compactación con vibrocompactador material granular | Instalación de malla electrosoldada al tercio zona infantil |
| PARQUE CANAL BOYACA | | PARQUE CANAL BOYACA | |
|  |  |  |  |
| Remisión de concreto premezclado para fundir placa al gtercio zona infantil | Toma de cilindros en concreto para ser llevados a laboratorio para ser fallados | Instalación y vibrado de concreto premezclado al tercio zona infantil | fundida placa en concreto premezclado al tercio zona infantil |
| PARQUE LOS NIÑOS | | PARQUEADERO LOS NIÑOS | |
|  |  |  |  |
| Instalación de la malla eslabonada de cerramiento por costados oriental y sur | | Instalación de la malla eslabonada de cerramiento por costados oriental y sur | |
| PARQUE LOS NIÑOS | | PARQUE LOS NIÑOS | |


| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Liberación del geotextil para instalar la arena Peldar. | | Revisiones de la interventoria en la instalación de la Malla cerramiento. | Demarcación Parqueadero Parque de Los Niños. |
| PARQUE LOS NIÑOS | | PARQUE LOS NIÑOS | |
|  |  |  |  |
| Proceso constructivo para desmonte de lámparas e instalación de luminarias LED | | Proceso constructivo para desmonte de lámparas e instalación de luminarias LED | |
| PARQUE LOS NIÑOS | | PARQUE LOS NIÑOS | |
|  |  |  |  |
| Construcción de sendero peatonal y cajas de inspección. | | Construcción de sendero peatonal y cajas de inspección. | |
| PARQUE LOS NIÑOS | | PARQUE LOS NIÑOS | |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Instalación prado costado norte Parqueadero Parque de Los Niños. | Aseo y retiro de materiales sobrantes. | Construcción de graderías en costado occidental de las Canchas de Vóley playa. | |
| PARQUE LOS NIÑOS | | PARQUE LOS NIÑOS | |
|  |  |  |  |
| Instalación de capa de gravilla+ geotextil y filtros en Arenera de los Juegos de Niños. | | Instalación de capa de gravilla+ geotextil y filtros en Arenera de los Juegos de Niños. | |
| SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | | SIMÓN BOLÍVAR (MANA) | |
|  |  | N/A | N/A |
| Juegos para realizar mantenimiento. | | | |
| PARQUE DE LOS NOVIOS | | PARQUE DE LOS NOVIOS | |





Construcción caja de inspección y conexión de instalaciones sanitarias.






Reinstalación de cubiertas (se desmontaron para hacer el traslado del Módulo).

PARQUE DE LOS NOVIOS


PARQUE DE LOS NOVIOS





Instalación de barandas metálicas y rampa.

Instalación de pasamanos para estructura metálica del Túnel del Amor.






Instalación de pasamanos para estructura metálica del Túnel del Amor.

PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)


PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD - TENIS - ADMON)




















Se continúa la reconstrucción de tramo de cuneta exterior a la cancha sobre la vía principal.











Reposición del césped por áreas afectadas durante el desarrollo de los trabajos en la Cancha.

| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PRD -TENIS - ADMON) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (PED - TENIS - ADMON) | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Canchas de baloncesto (detalles y remates) | | Canchas de baloncesto (detalles y remates) | |
| PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | | PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | |
|  |  |  |  |
| Juegos infantiles. Lijada y aplicación de anticorrosivo; faltan los columpios | | Lijada y aplicación de anticoorrosivo a gimnasio . | |
| PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | | PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | |
|  |  |  |  |
| Lijada y aplicación de pintura a gimnasios biosaludables | | Bicicleta Recumbent falta ajustador de pie | |

| PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | | PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Lijada y aplicación de pintura a gimnasios biosaludables | | Lijada y aplicación de pintura a gimnasios biosaludables | |
| PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | | PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | |
|  |  |  |  |
| En mantenimiento | | En mantenimiento | |
| PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | | PARQUE SAN JOSE DE BAVARIA | |
|  |  |  |  |
| En la Ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque, aún no se ha iniciado el mantenimiento | | En la Ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque, aún no se ha iniciado el mantenimiento | |

| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS) | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Estado actual cancha de beisbol | | Estado actual cancha de beisbol | |
| PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS) | | PARQUE RECREODEPORTIVO EL SALITRE (UDS) | |
|  |  |  | N/A |
| | Arreglo de fluxómetros y enchape pared en baños. | | |
| REGISTRO FOTOGRAFICO SST | | | |
|  |  |  |  |
| | | | |

**ANEXO 5.** REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (1)

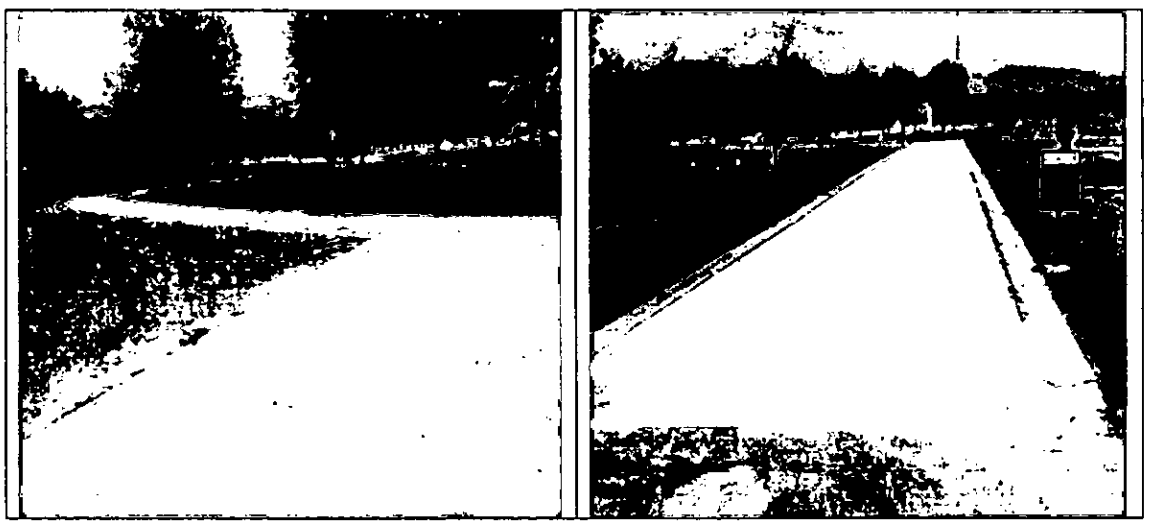


Parque El Tunal. Instalación del adoquín nuevo y remates de tramos en sendero zona que limita con el árbol, sendero hacia la biblioteca, sendero quiosco de la cafetería.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (2)



Parque El Tunal. Fundida de cintas de concreto que confinan los tramos, para entrega de tramos a la administración.

946
933

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (3)



Parque El Tunal. Se hace entrega a la administración y puesta en servicio.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (4)



Parque El Tunal. Se hace entrega a la administración y puesta en servicio.

947

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (5)

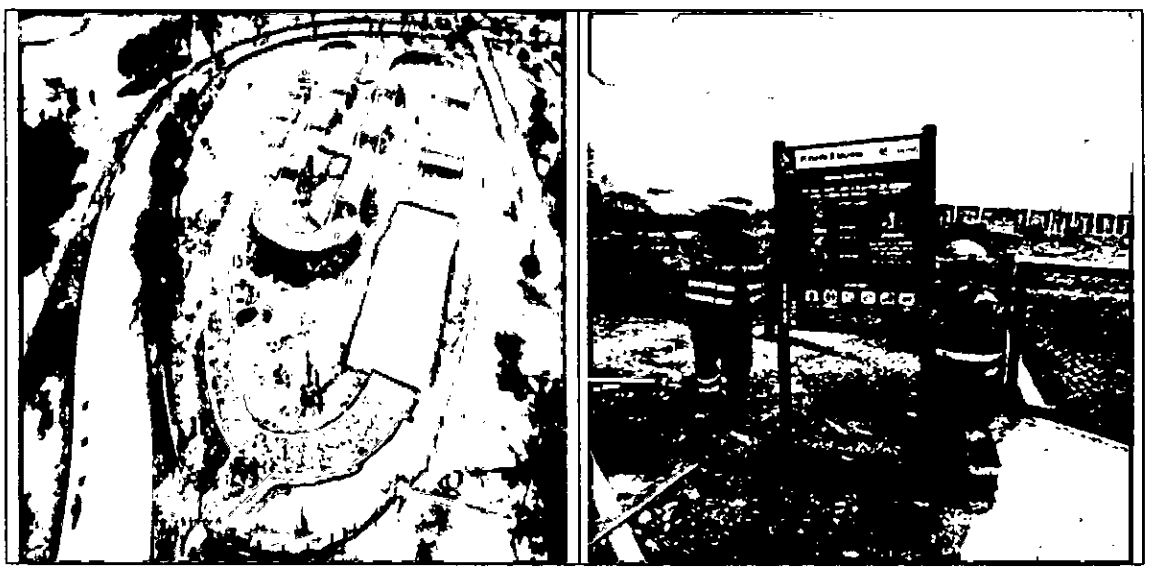


Parque El Tunal. Se hace entrega a la administración y puesta en servicio de las porterías # 2 y 5,

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (6)

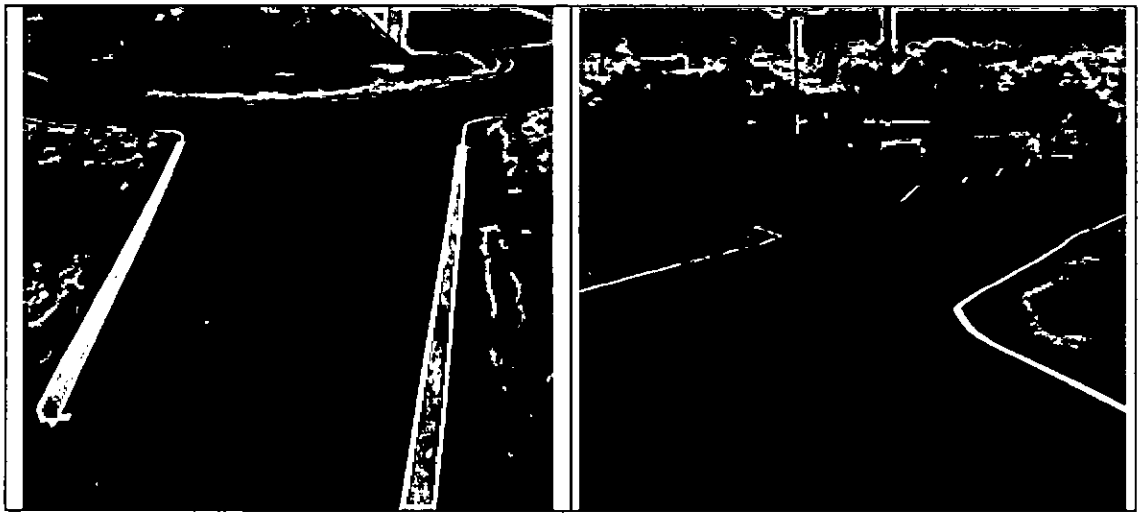


Parque El Tunal. Entrega y puesta en servicio, se entrega a la administración el día 15 de marzo y puesta en servicio para el martes 19 de marzo de 2024.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (7)

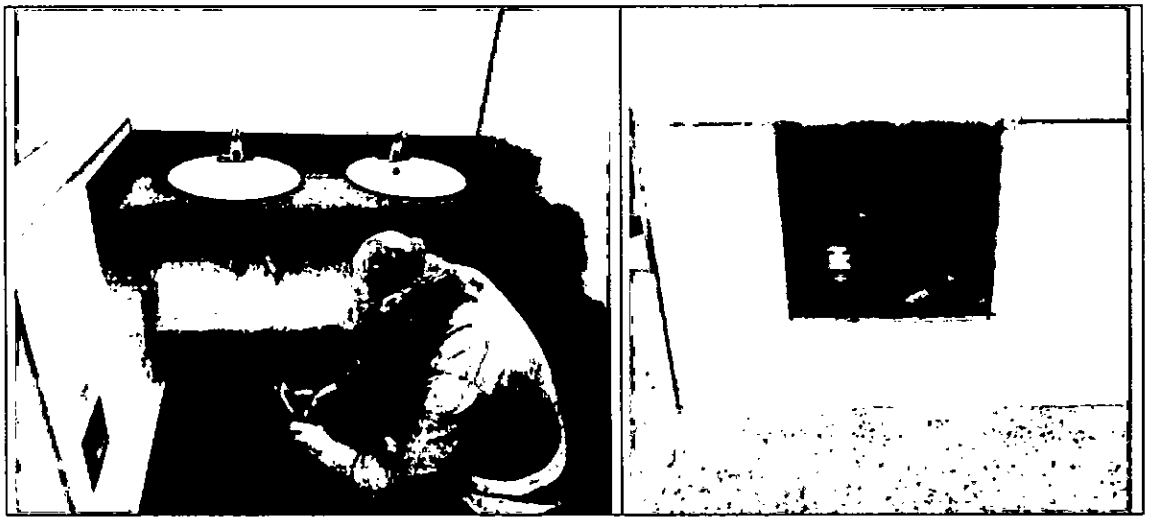


Parque El Tunal. Se entrega a la administración el día 15 de marzo y puesta en servicio para el martes 19 de marzo de 2024.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (8)



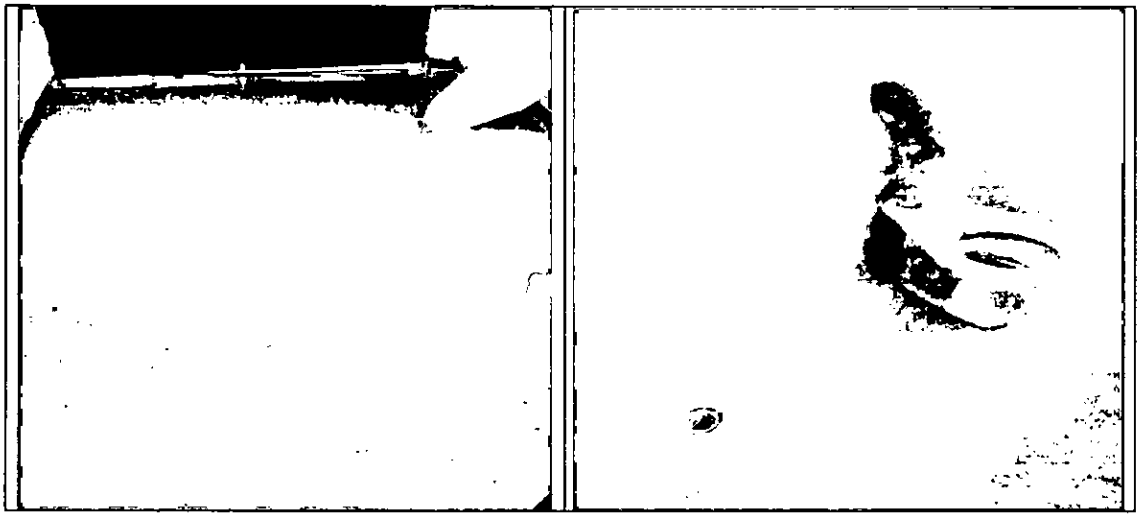
Parque El Tunal. Se reporta esta semana emergencia en baños UCAD Tunal, debido a una fuga de agua potable, se diagnostica y programa arreglo.

949
~~936~~

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (9)

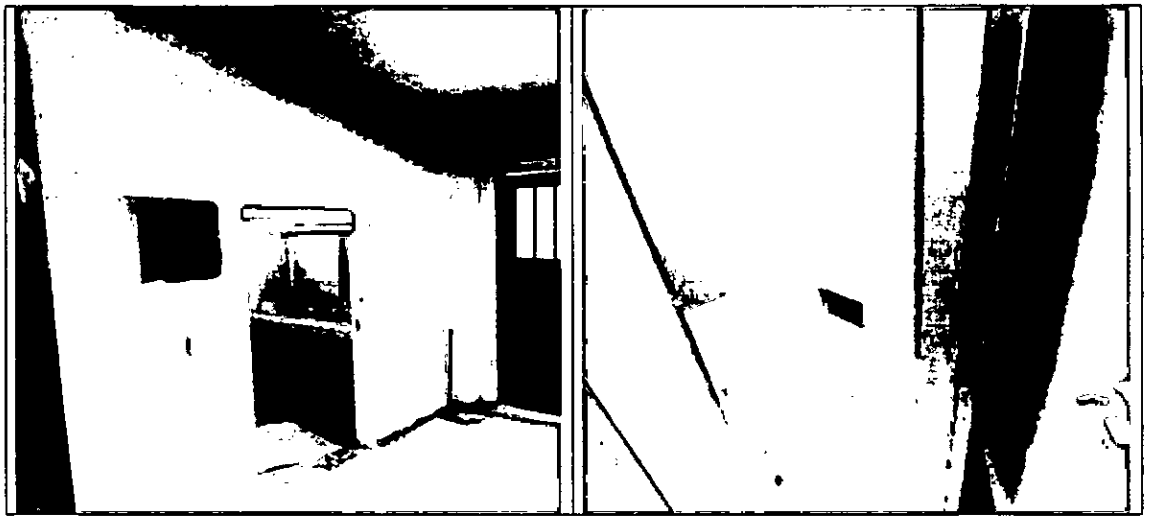


Parque Eduardo Santos. Se avanza con remates de muros y cielo rasos en los baños del coliseo, se termina la pulida y brillada de pisos en los baños del coliseo.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (10)



Parque Eduardo Santos. Se avanza con remates de muros y cielo rasos en los baños del coliseo, se termina la pulida y brillada de pisos en los baños del coliseo.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (11)

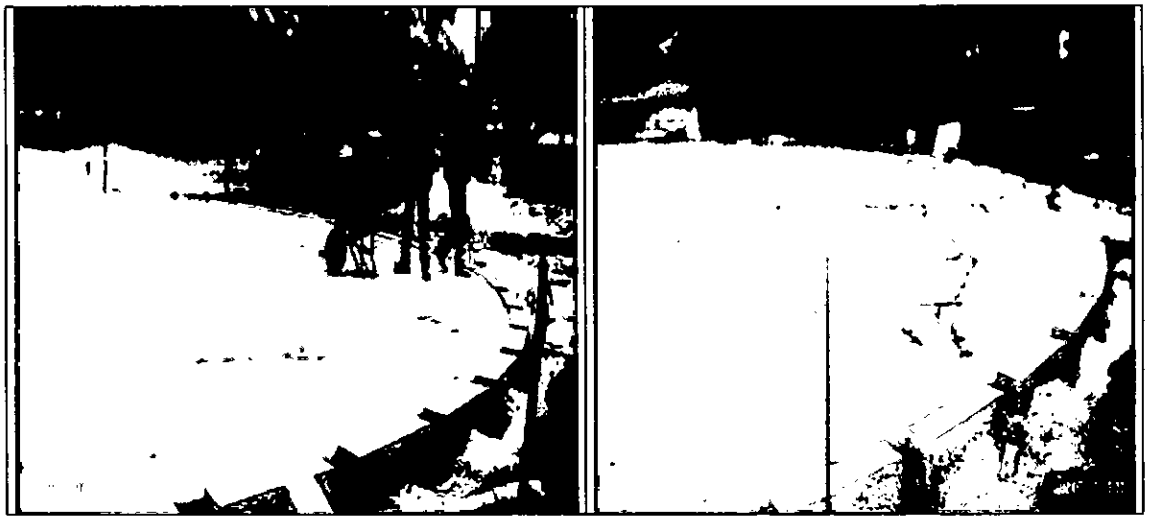


Parque La Fragua. Se termina la instalación de bordillos en la zona de jugos exterior y se funde placa de contra piso de esta zona del parque.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (12)



Parque La Fragua. Se termina la instalación de bordillos en la zona de juegos exterior .

991

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (13)



Parque Villa Alemana. Se instala portón nuevo costado lateral del parque, se instalan y sueldan tapas de las cajas de inspección.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (14)




Parque La Victoria. Se avanza con el mantenimiento y pintura de módulos de baños.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (15)



Parque Gima Jiménez. Se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (16)

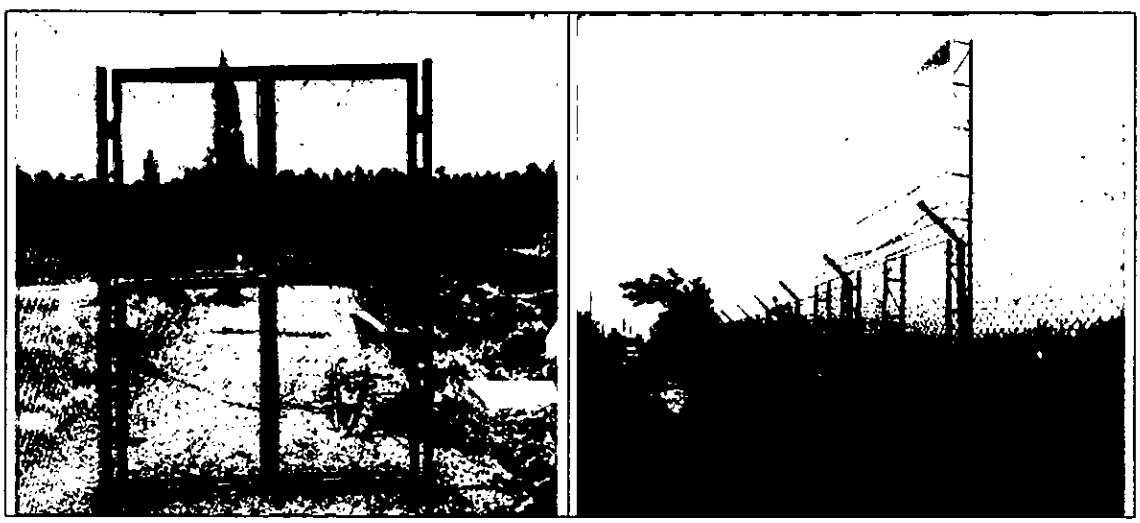


Parque Nuevo Muzu. Se avanza con la instalación de parales para nuevo tramo de baranda, , llega material de piso caucho

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (17)



Parque La Petar. Se suministra e instala portón de ingreso doble hoja y valla del parque.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (18)



Parque ILLIMANÍ. Se inician trabajos en el módulo de baños, adecuación de cubiertas, instalación de divisiones en acero, que es lo único pendiente en este frente.

954

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (19)



Parque ILLIMANÍ. Se inician trabajos en el módulo de baños, adecuación de cubiertas, instalación de divisiones en acero, que es lo único pendiente en este frente.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (20)



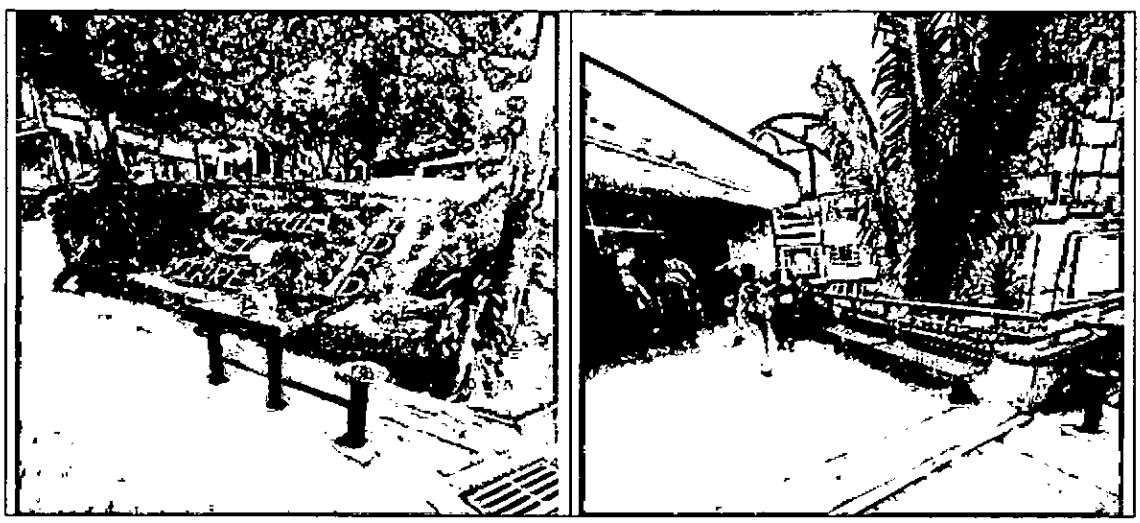
Parque Virrey Sur. Actividades con mantenimiento y pintura de juegos infantiles, pintura de bancas y mesas de ajedrez, e instalación de señales.

955
842

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (21)

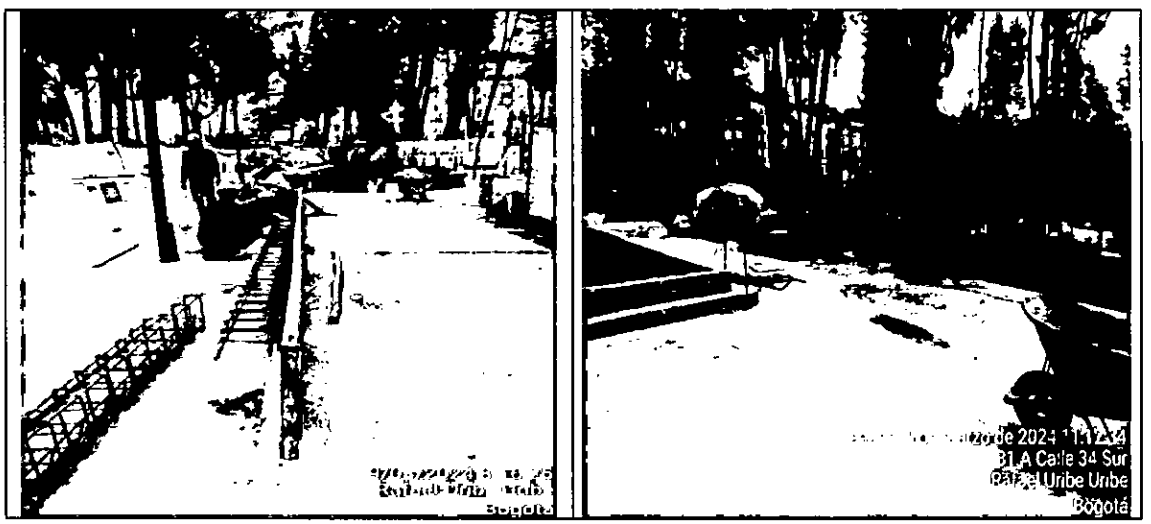


Parque Virrey Sur. actividades con mantenimiento y pintura de juegos infantiles, pintura de bancas y mesas de ajedrez, e instalación de señales.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (22)

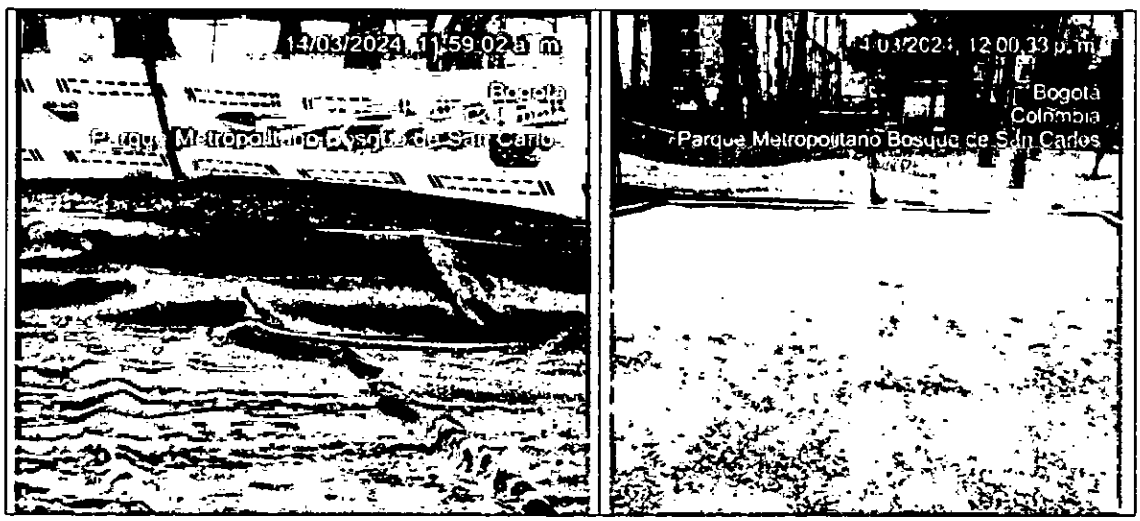



Parque Bosques de San Carlos. Preparación formaleta para fundida de viga zarpa zona de grecos y ruta de la vida

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (23)

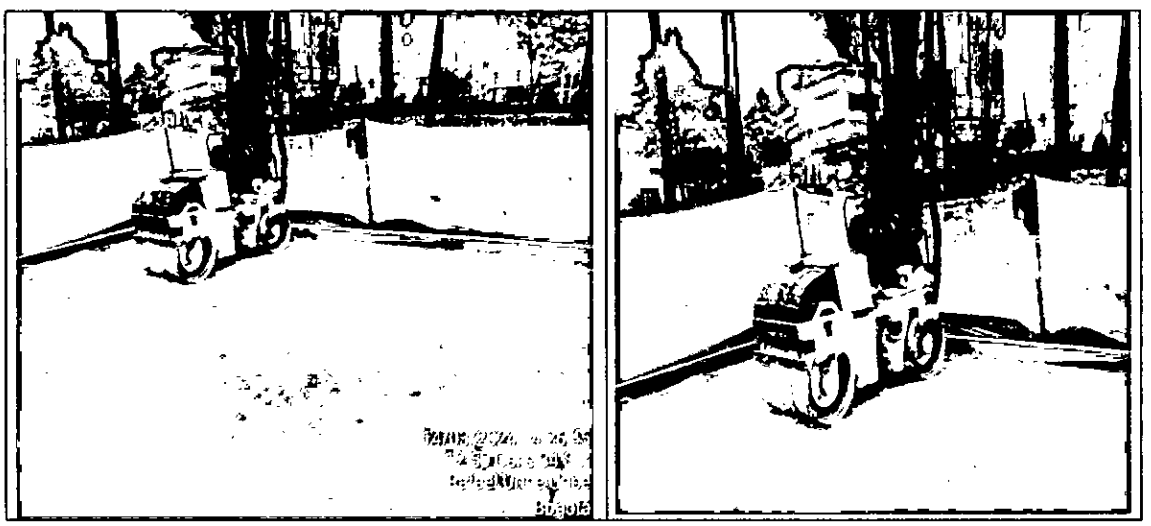



Parque Bosques de San Carlos. Suministro e instalación de geotextil T-2100 y base.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (24)



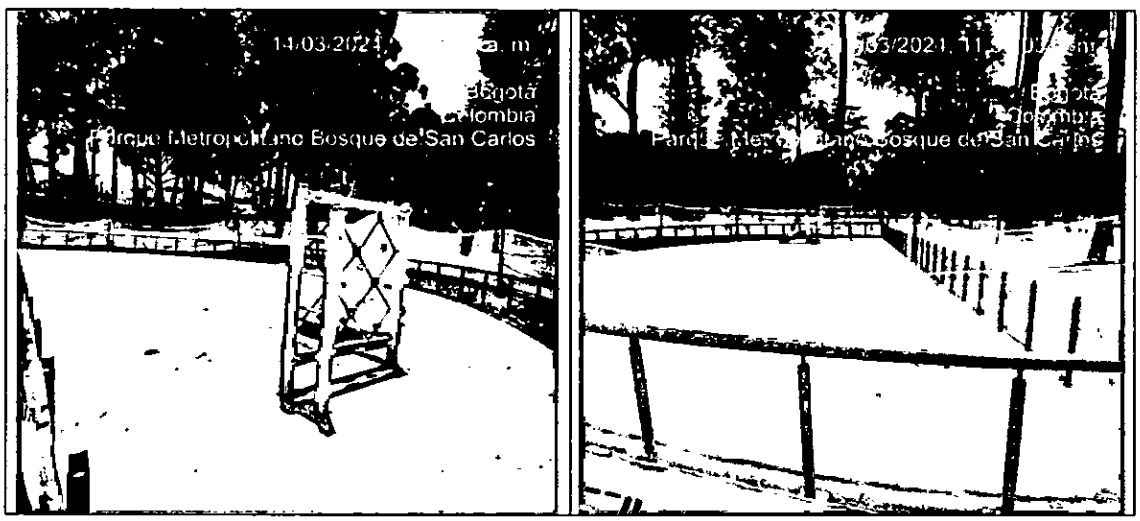
Parque Bosques de San Carlos. Compactación con vibro compactador material granular.

957

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (25)

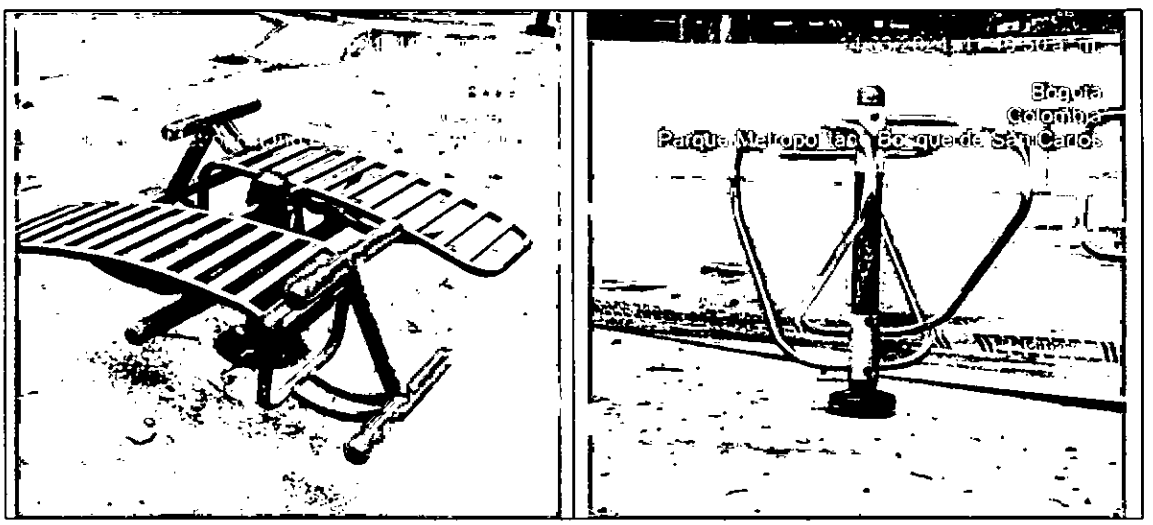



Parque Bosques de San Carlos. Suministro e instalación de parales metálicos para cerramiento zona infantil.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (26)

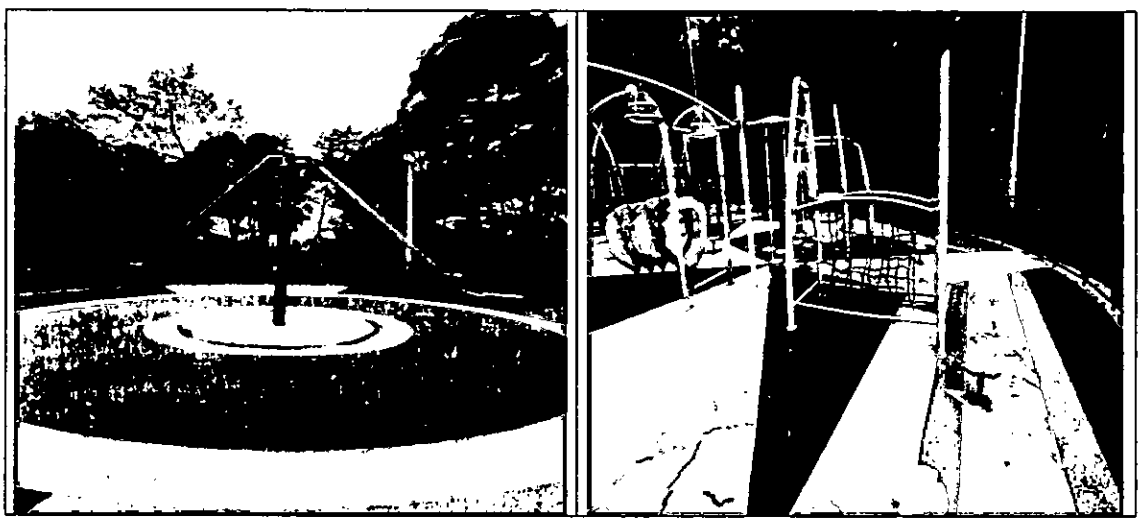



Parque Bosques de San Carlos. Revisión instalación módulos biosaludables.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (27)

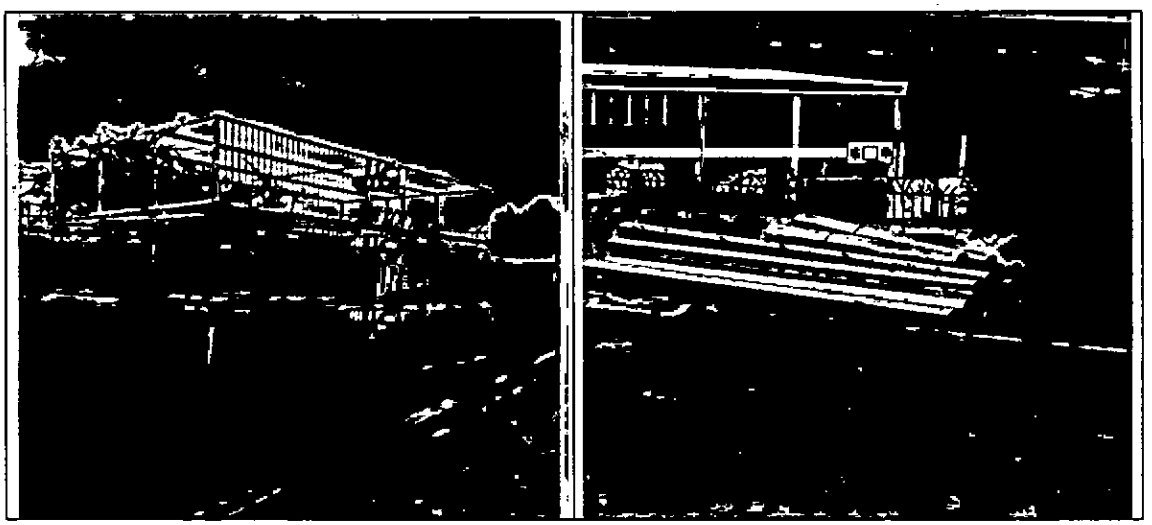


Parque Nacional. Arreglo y pintura de juegos Parque Nacional

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (28)

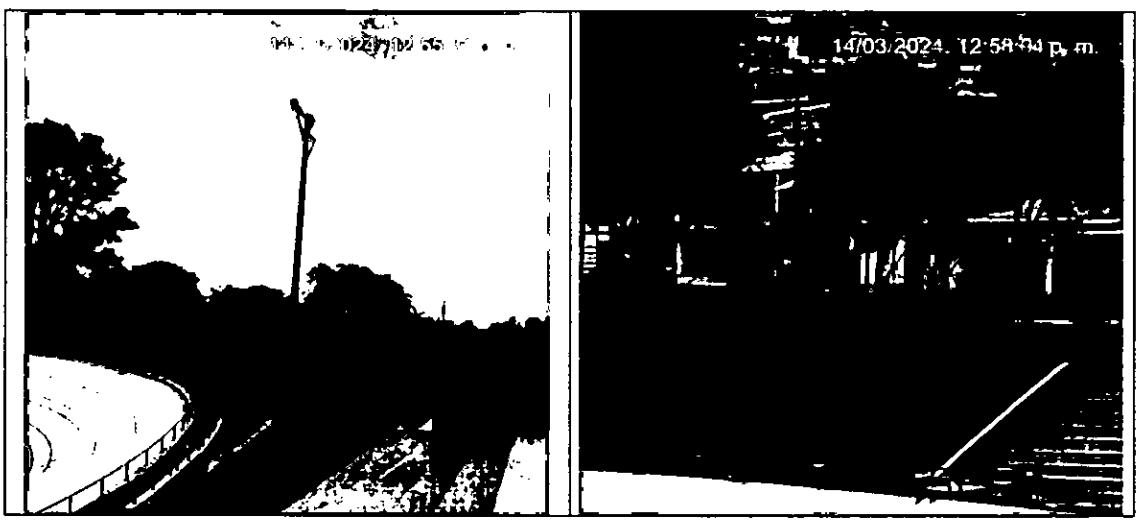


Parque Velódromo Primera de Mayo. Canastillas y postes metálicas para luminarias del velódromo.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (29)




Parque Velódromo Primera de Mayo. Retiro de luminarias del velódromo.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (30)



Parque Velódromo Primera de Mayo. Corte de piso en concreto con pulidora.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (31)




Parque Canal Boyacá. Excavación para dados de concreta zona de juegos infantiles.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (32)



Parque Canal de Boyacá. Suministro e instalación de geotextil T-2400 y de subbase granular.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (33)

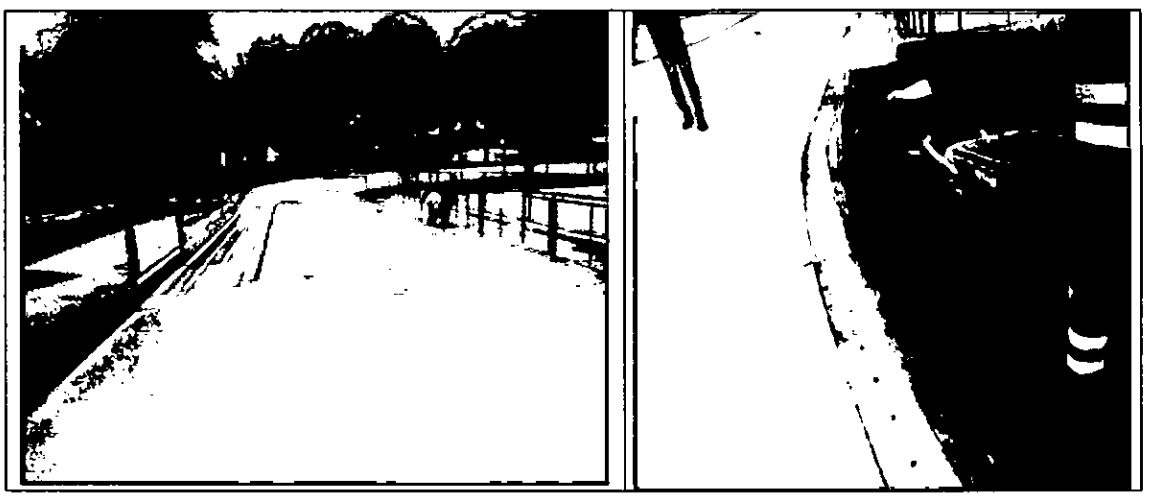


Parque Canal Boyacá. Compactación de material granular con vibro compactador

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (34)

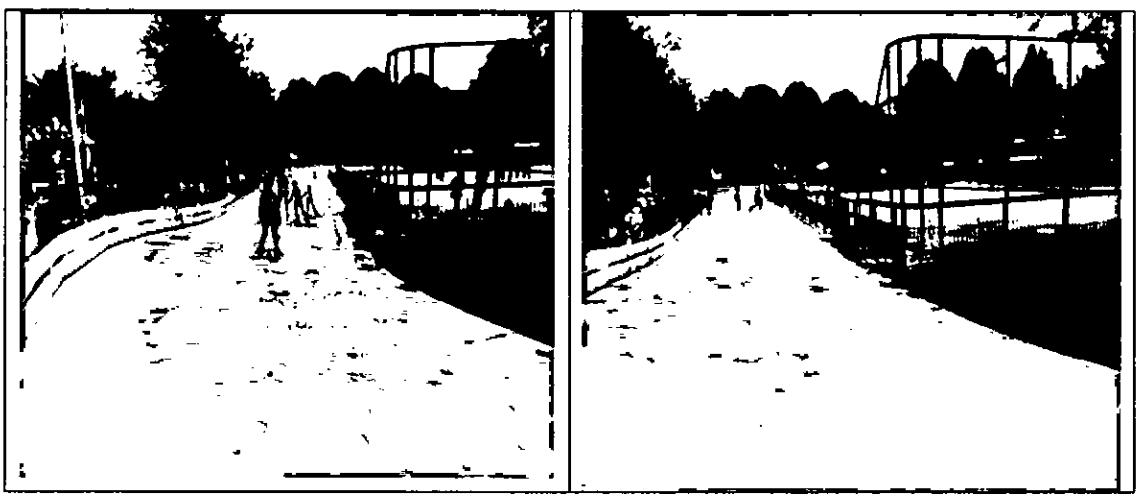


Parque Alta Blanca. Reconstrucción y detallada de tramos de cárcamo en concreto.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (35)



Parque Alta Blanca. Puesta en funcionamiento la Pista de Patinaje, al servicio de la Comunidad.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (36)



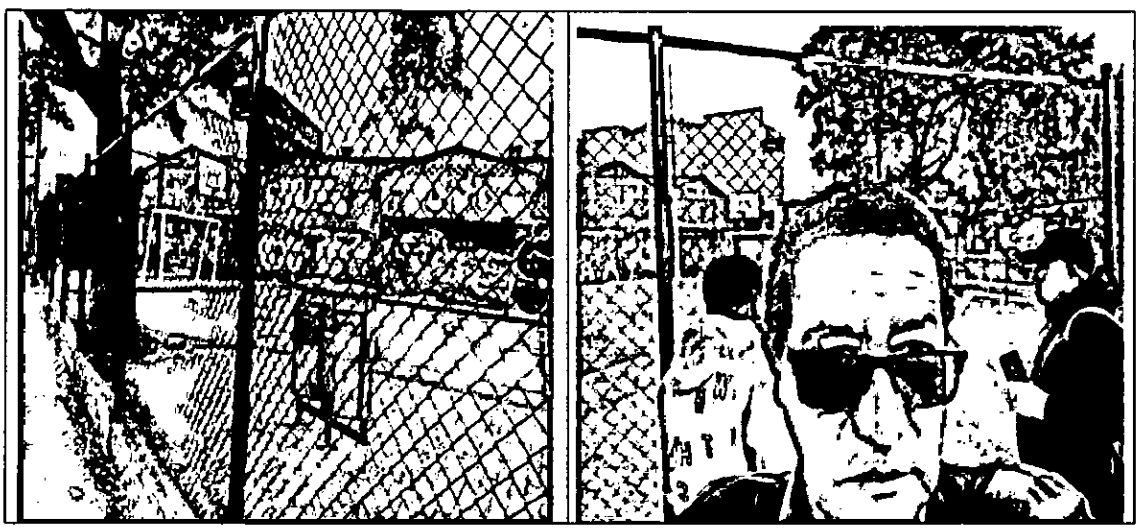
Parque Canal Rio Negro. Durante la entrega final de los trabajos realizados en el Escenario, al Administrador del Parque,

963 952

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (37)



Parque Canal Rio Negro. Durante la entrega final de los trabajos realizados en el Escenario, al Administrador del Parque,

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (38)



Parque Canal Rio Negro. Revisión de los deslizaderos en acero inoxidable ubicados en cuatro sectores diferentes del parque .

964
~~957~~

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (39)



Parque Canal Rio Negro. Revisión de los deslizaderos en acero inoxidable ubicados en cuatro sectores diferentes del parque

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (40)

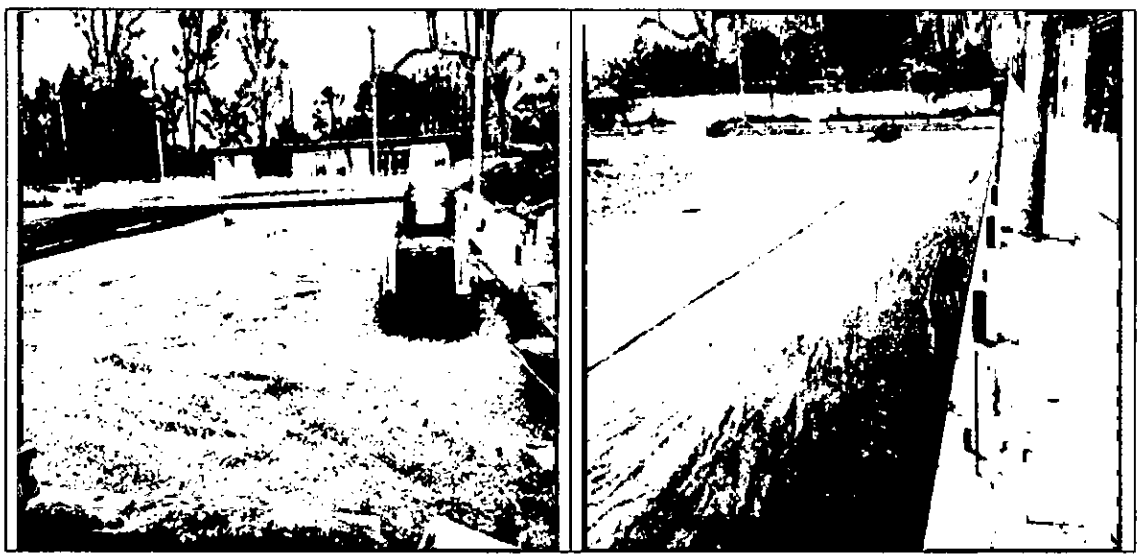


Parque Canal rio Negro. Revisión de los deslizaderos en acero inoxidable ubicados en cuatro sectores diferentes del parque .

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (41)



Parque de Los Niños. Extendida y compactación del triturado 3/4", cerramiento de la capa de grava con el manto geotextil 4000.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (42)



Parque de Los Niños. El manto geotextil se va cerrando y cosiendo.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (43)

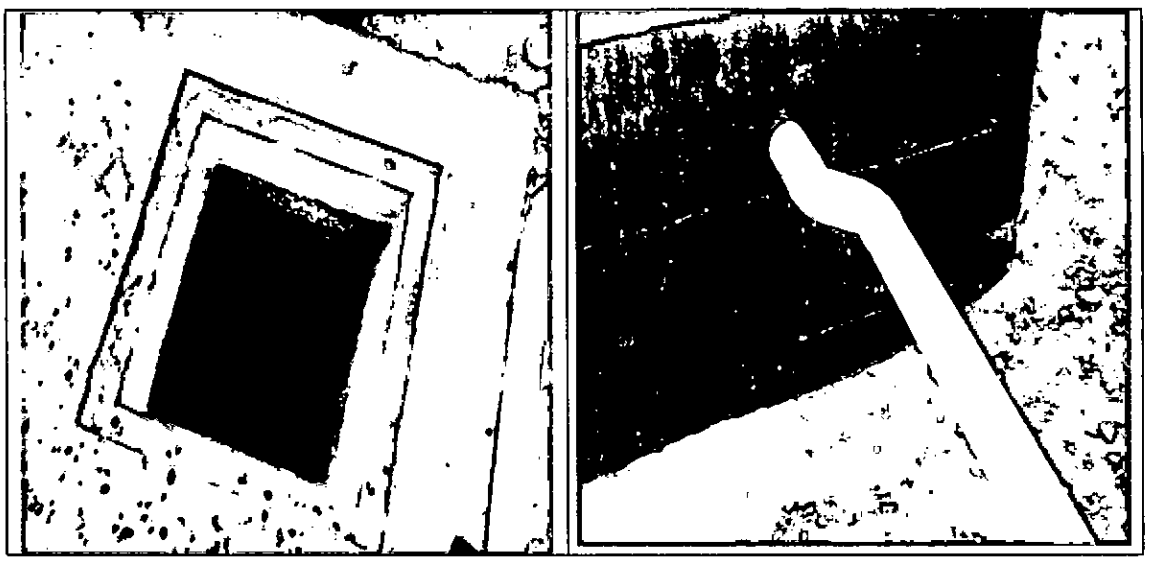


Parqueadero del Parque de los Niños, una vez terminada la aplicación de la capa de rodadura asfáltica.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (44)

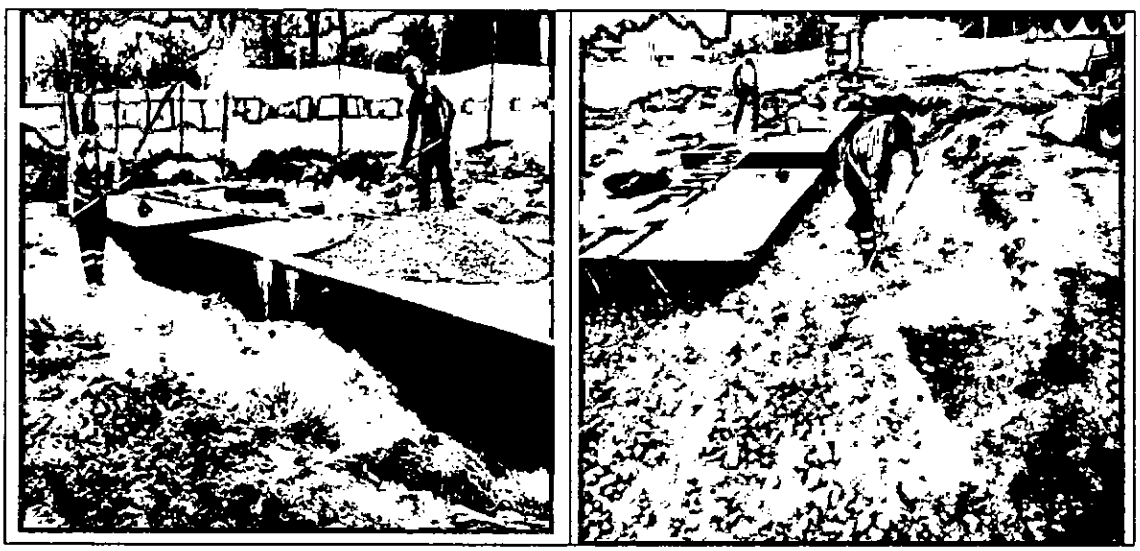


Parque Simón Bolívar. Tanques sépticos impermeabilizados interna y externamente.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (45)



Parque Simón Bolívar. Inicio rellenos al interior y exterior de los tanques sépticos.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (46)

| | |
|---|---|
| | |

| |
|---|
| |

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (47)

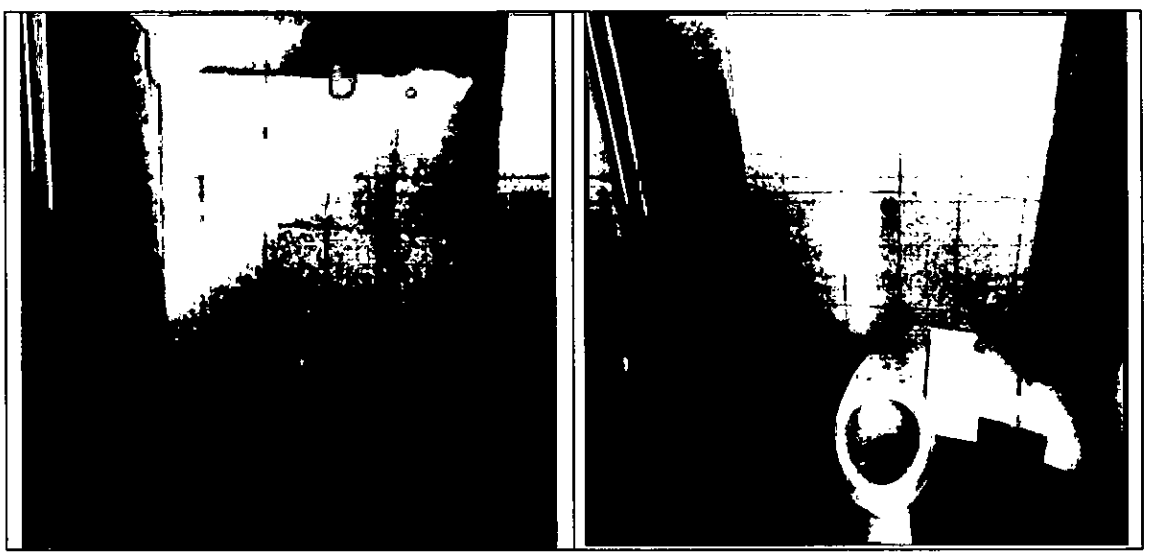


Parque Simón Bolívar. Rellenos con material granular seleccionado.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (48)

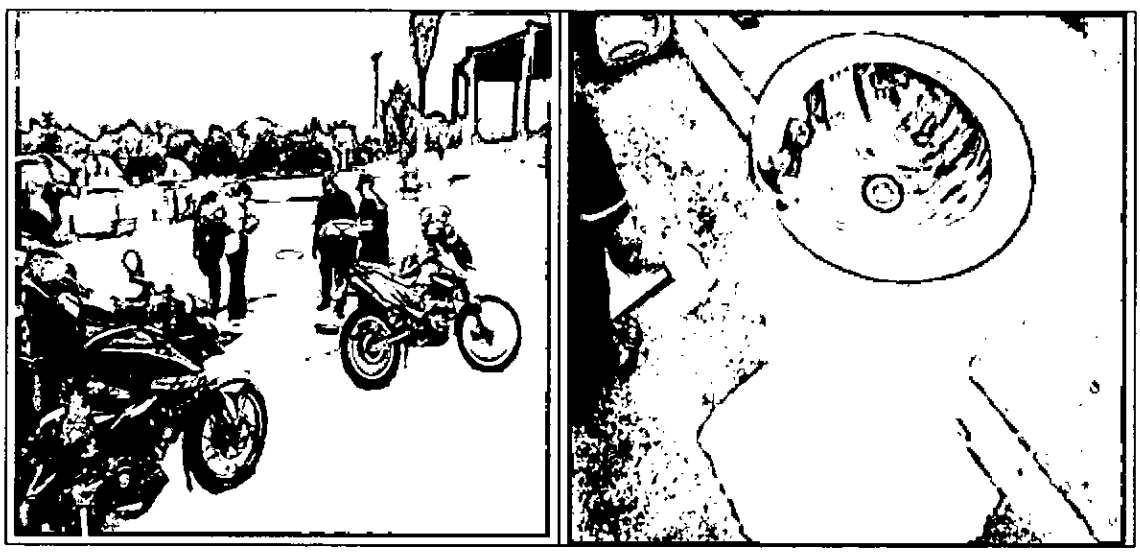


Parque Simón Bolívar. Remates de enchapes y aseo en baños.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (49)

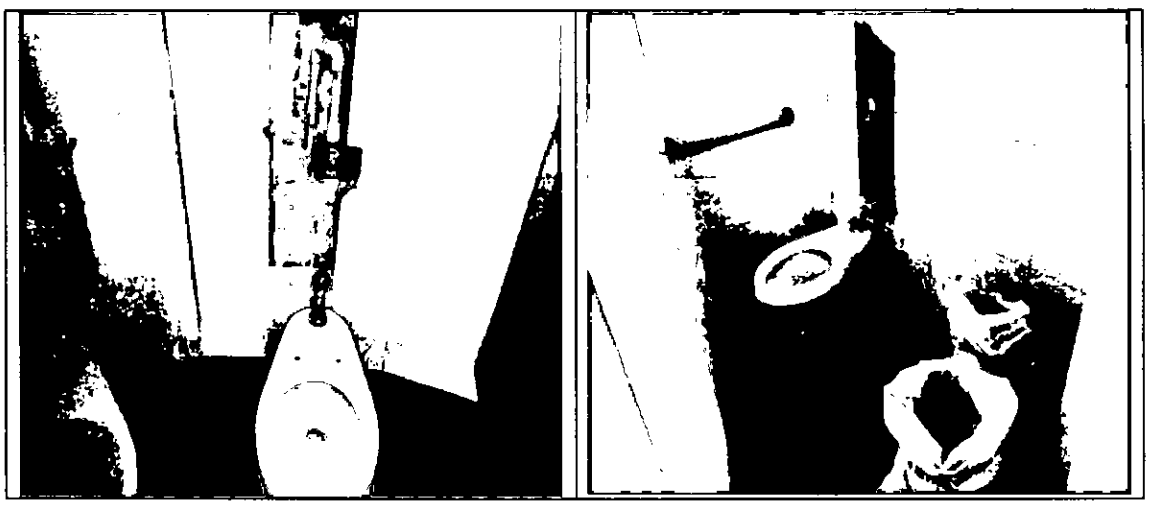


Parque Simón Bolívar. Durante la entrega de los bebederos a la Administración.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (50)



Parque Simón Bolívar. Arreglo de baños en SURTIPOLLO - cambio de fluxómetro PUSH sanitarios.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (51)



Simón Bolívar. Suministro e instalación de las canecas en acero inoxidable.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (52)

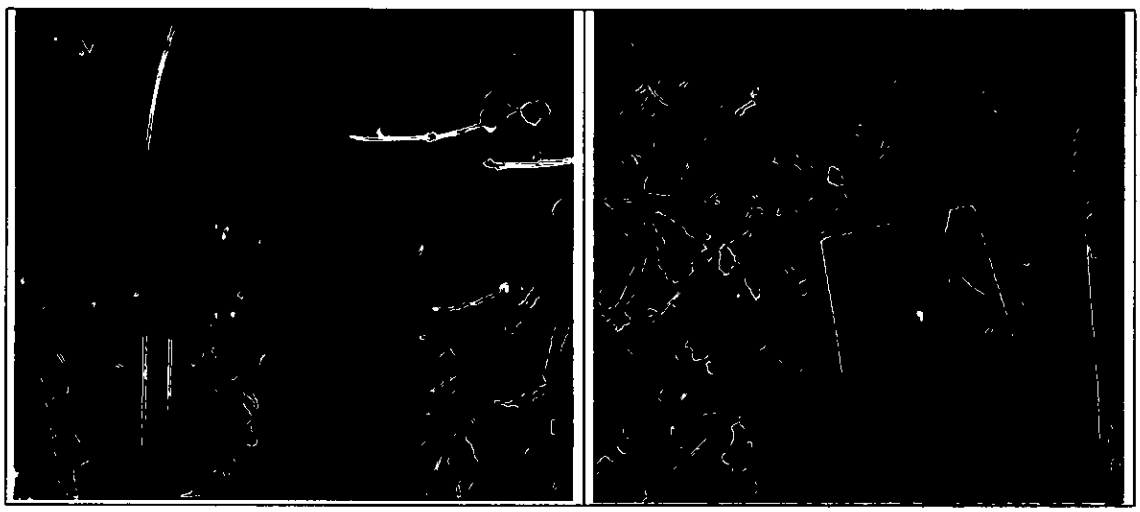


Parque Simón Bolívar. Construcción de pasamanos metálicos para instalar al interior de la estructura del túnel del Amor.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (53)

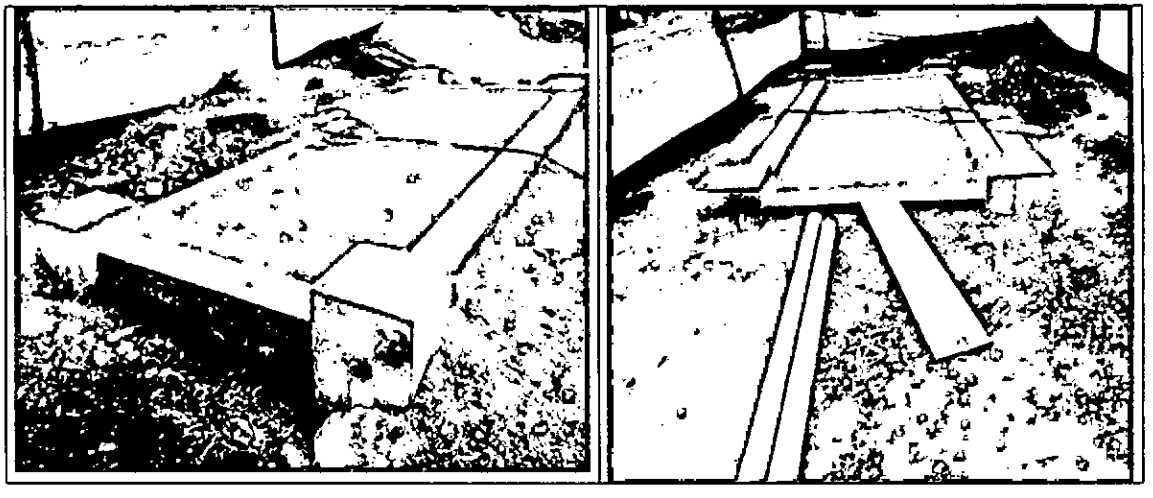


Parque Simón Bolívar. Soportes y anclajes de la estructura metálica a los dados en concreto.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (54)



Parque de Los Novios. Estado de la estructura de cimentación para instalar Módulo de baños.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (55)

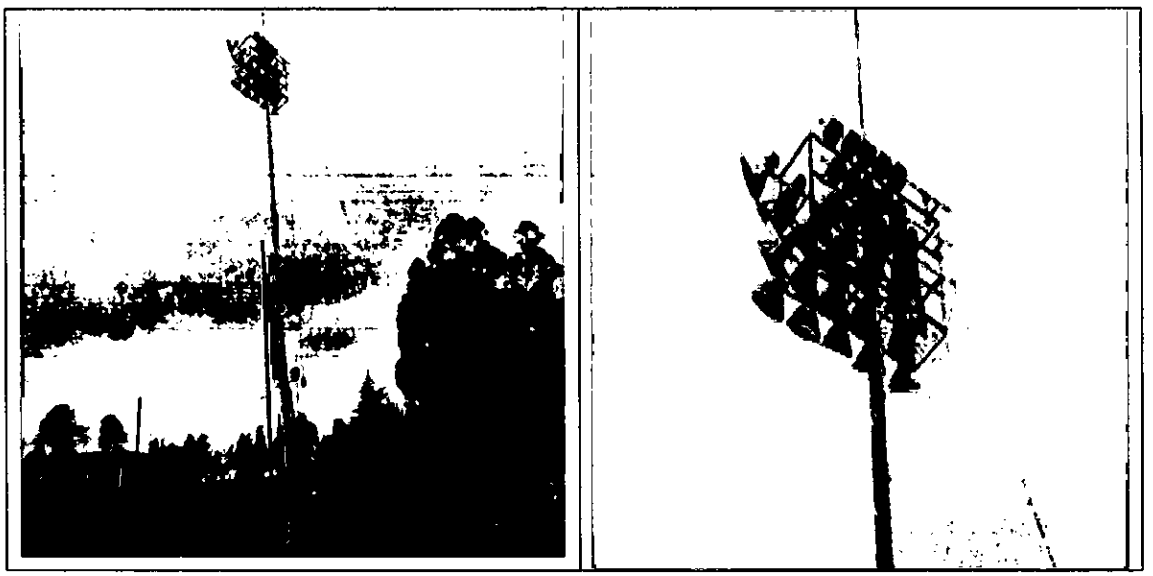


Parque de Los Novios. Destapada de cajas de inspección enterradas - verificación de funcionamiento para poder hacer uso de estas.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (56)



Parque Servitá. Desmonte de luminarias existentes en las cuatro esquinas de la Cancha de futbol.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (57)



Parque Servitá. Desmonte de luminarias existentes en las cuatro esquinas de la Cancha de futbol.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (58)



Parque Recreo deportivo El Salitre. Alistado para fundir andenes en Cancha de baloncesto.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (59)



Parque Recreo deportivo El Salitre. Cielorraso en PVC instalado en el acceso de la Administración PRD

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (60)

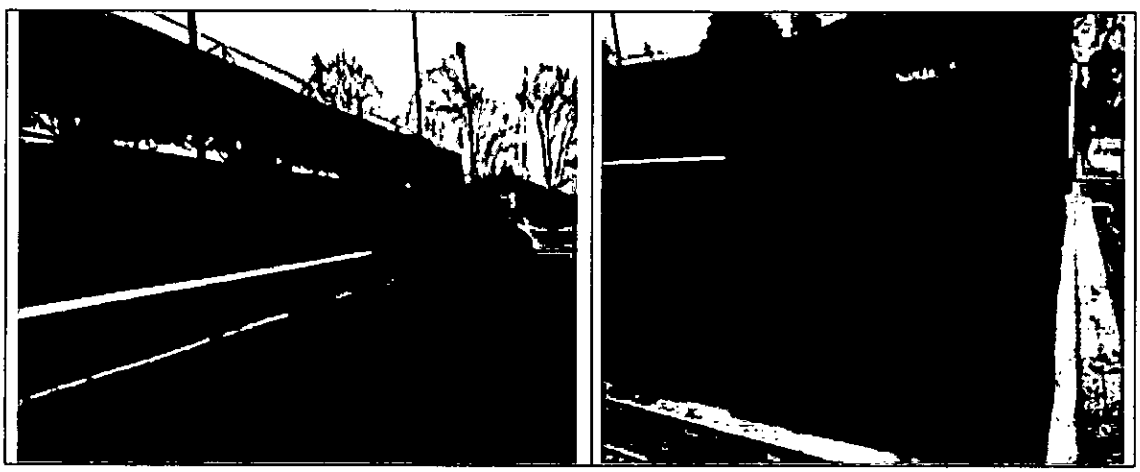


Parque Recreo deportivo El Salitre. Instalación de lámparas de iluminación en baños.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (61)



Parque Recreo deportivo El Salitre. Recubrimiento sintético Cancha de Squash.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (62)



Parque san José de Bavaria. Mantenimiento Grecorromanos y Gimnasios biosaludables.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (63)

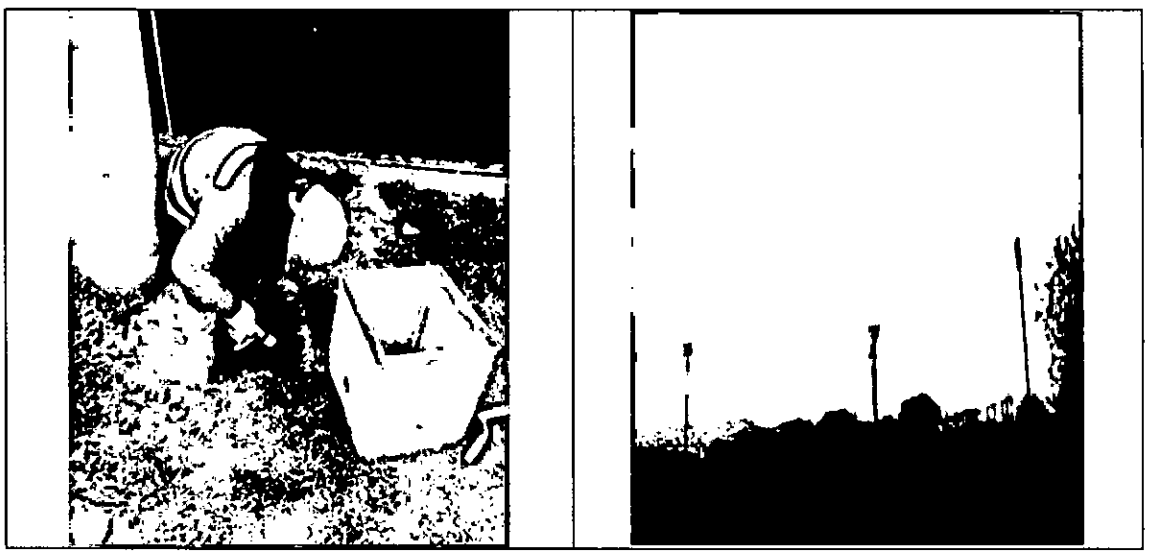


Inicio mantenimiento Grecorromanos y Gimnasios biosaludables.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (64)



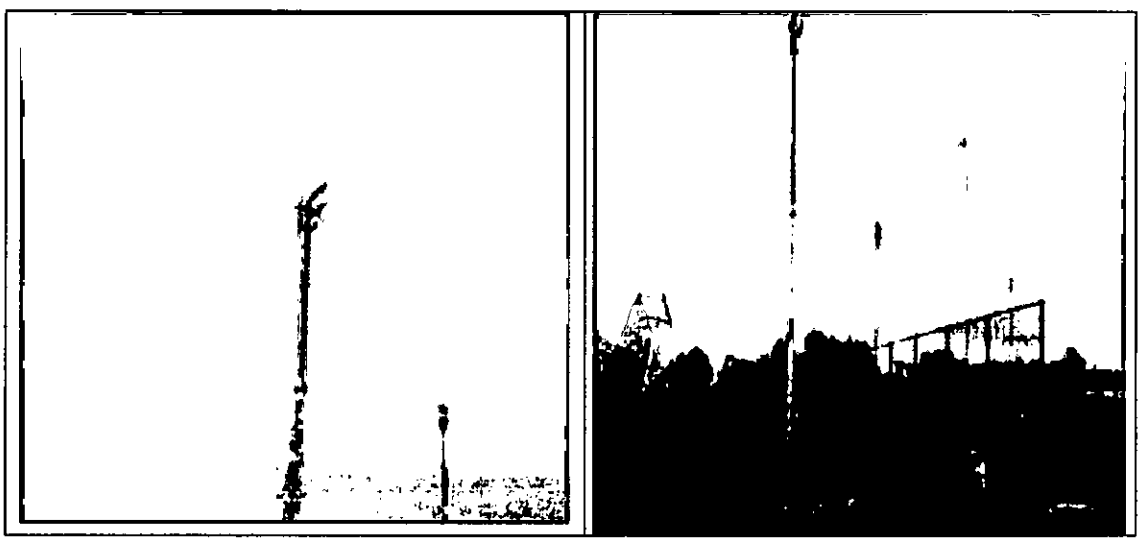
UDS. En Cancha de beisbol se avanza en el desmonte de luminarias de postes de alumbrado.

977 964

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (65)



UDS. En Cancha de beisbol se avanza en el desmonte de luminarias de postes de alumbrado.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (66)

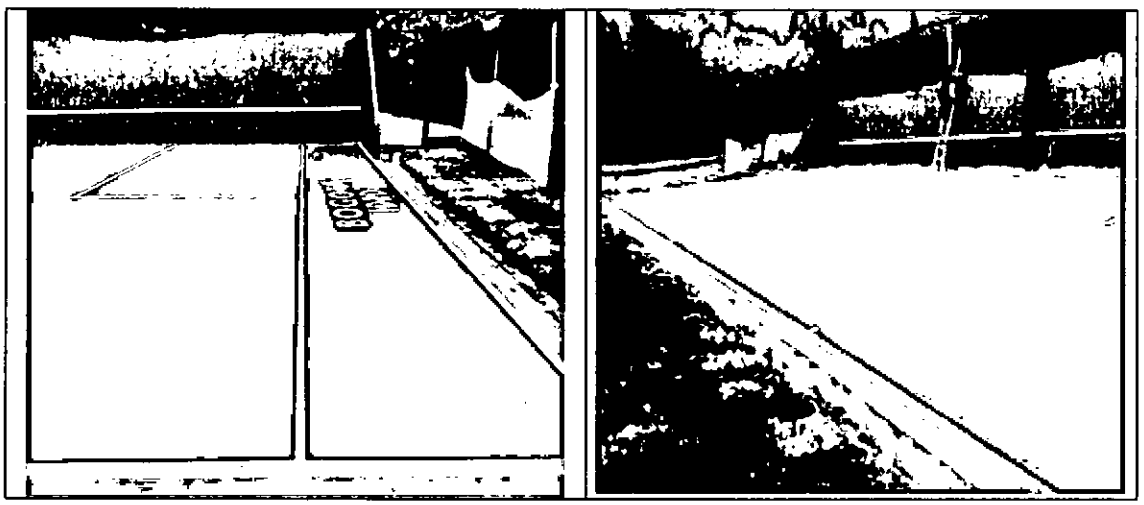


Parque San José de Bavaria. Lijada y pintura Gimnasios y Ruta de la Vida

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (67)

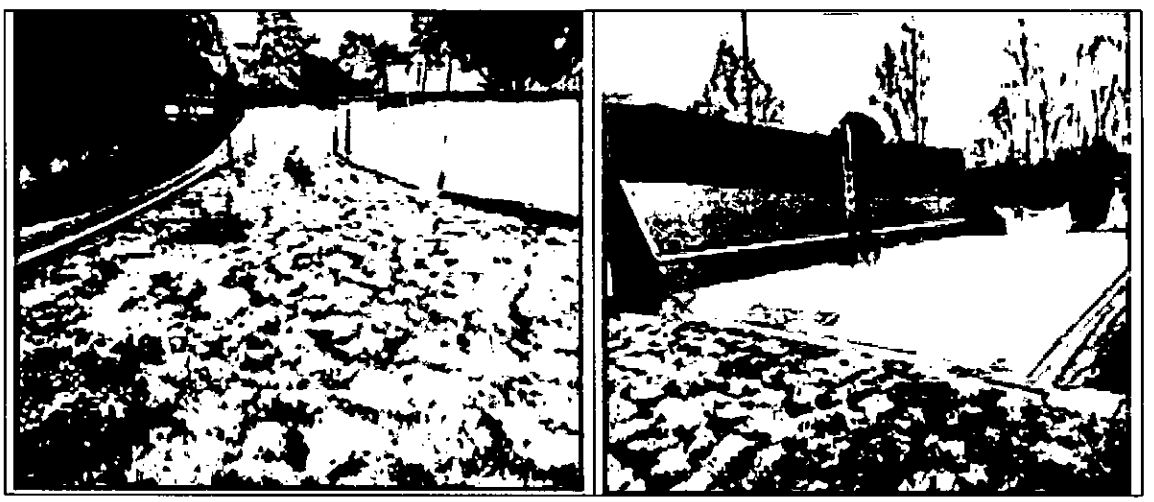


PDR. Estado actual Cancha de Squash.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (68)

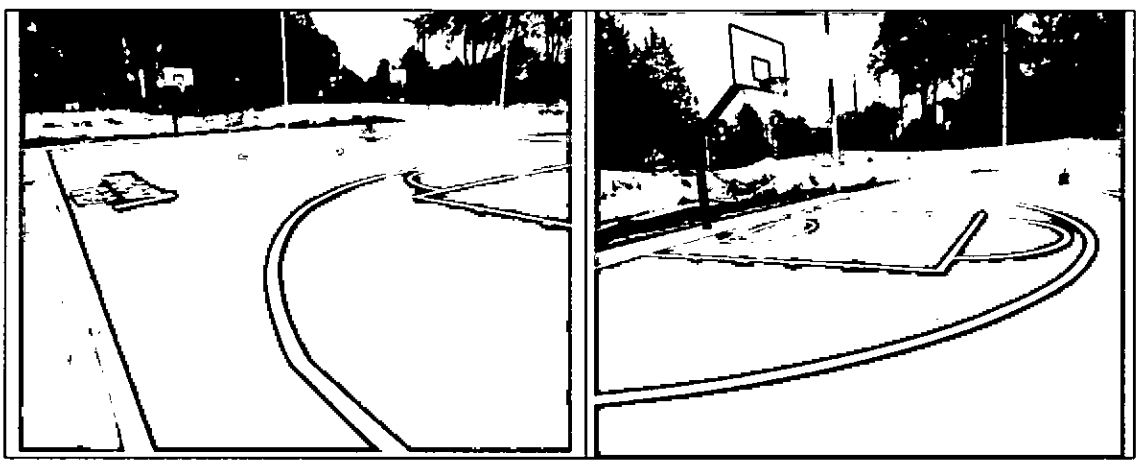


PDR. Reposición del césped por áreas afectadas durante el desarrollo de los trabajos en la Cancha.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (69)



PDR. Canchas de baloncesto (detallada y remates).

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (70)

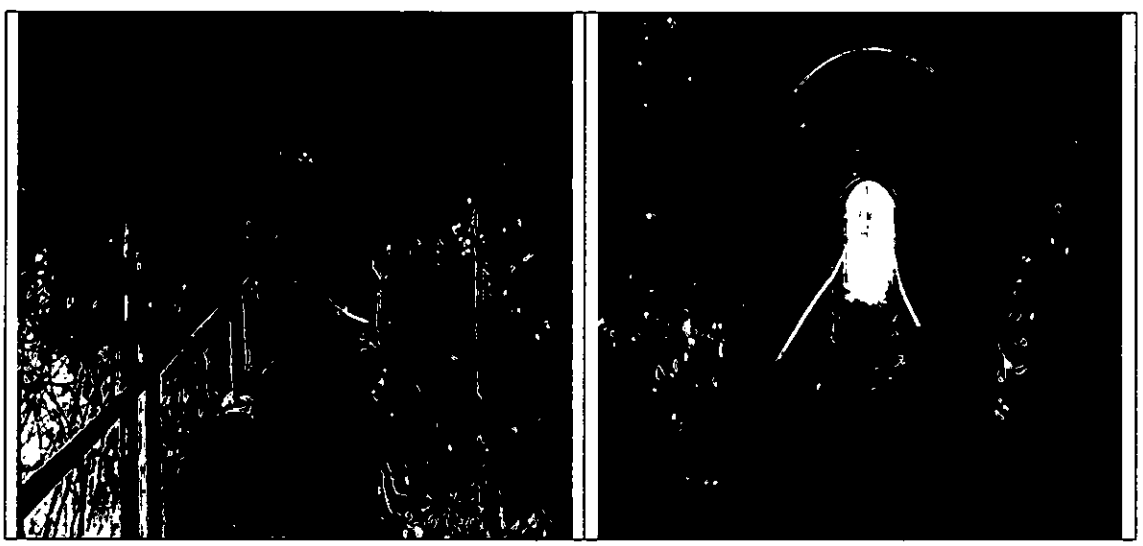


Parque de Los Novios. Reinstalación de cubiertas y barandas (se desmontaron para hacer el traslado del Módulo).

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (71)

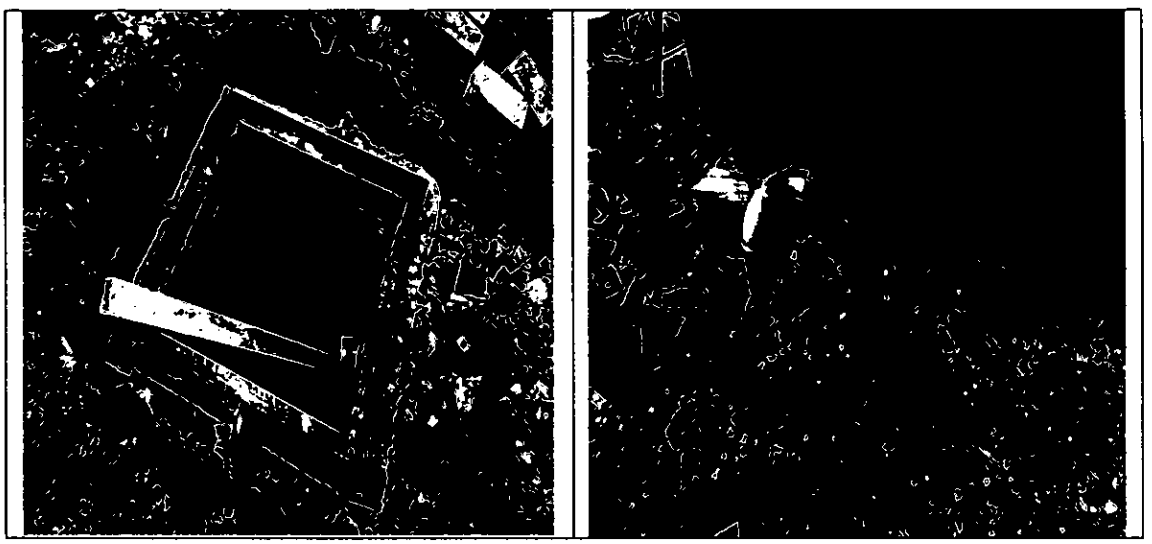


Parque de Los Novios. Instalación de pasamanos para estructura metálica del Túnel del Amor.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (72)



Parque de Los Novios. Construcción caja de inspección y conexión de instalaciones sanitarias.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (73)

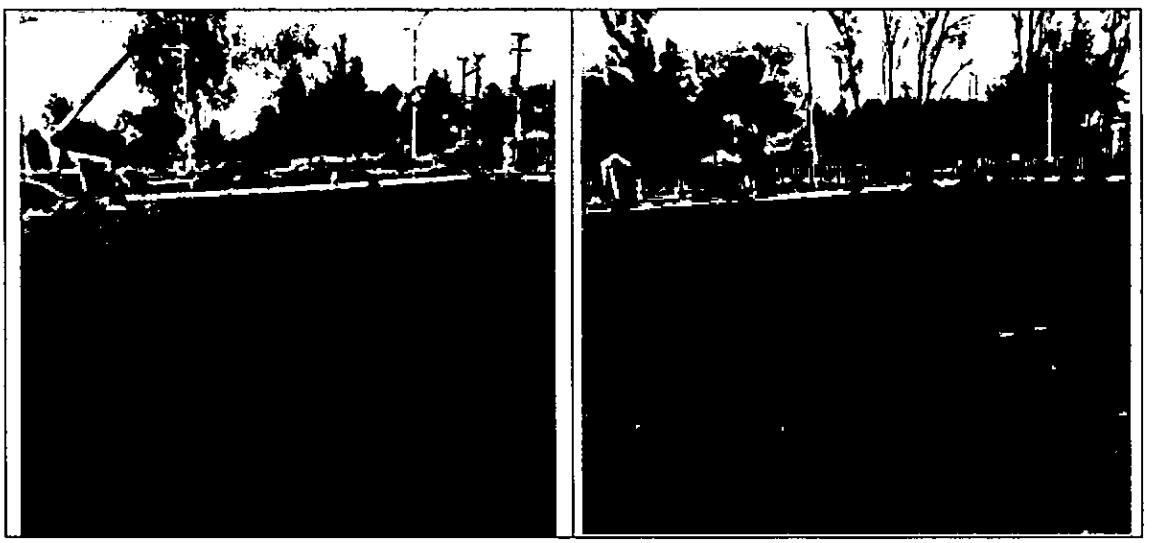


Parque de Los Niños. Instalación de la malla eslabonada de cerramiento por costados oriental y sur.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (74)



Parque de Los Niños. Liberación del geotextil para instalar la arena Peldar.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (75)

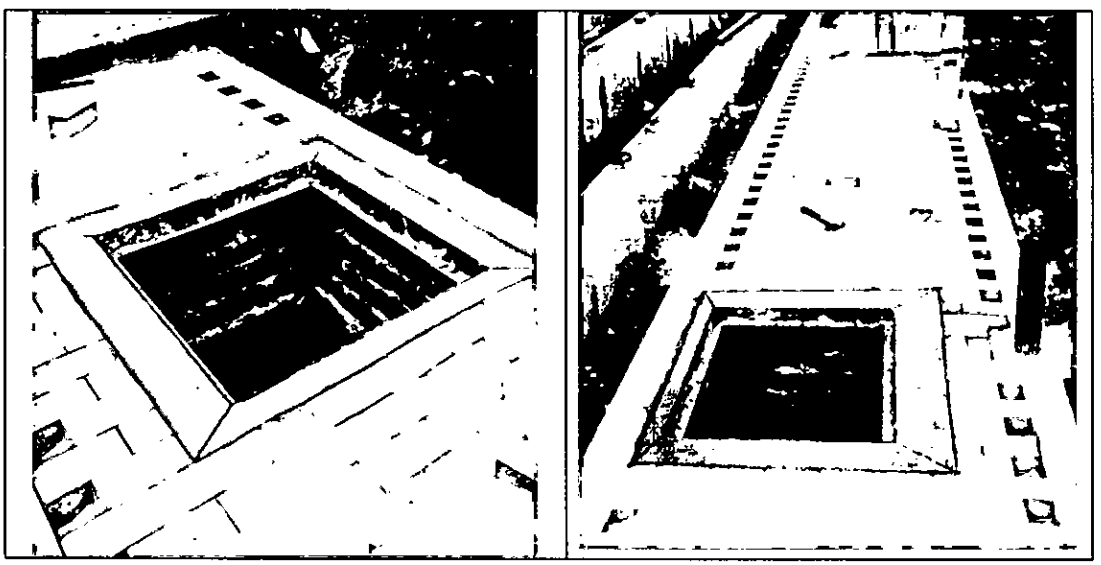


Parque de Los Niños. Proceso constructivo para desmonte de lámparas e instalación de luminarias LED.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (76)

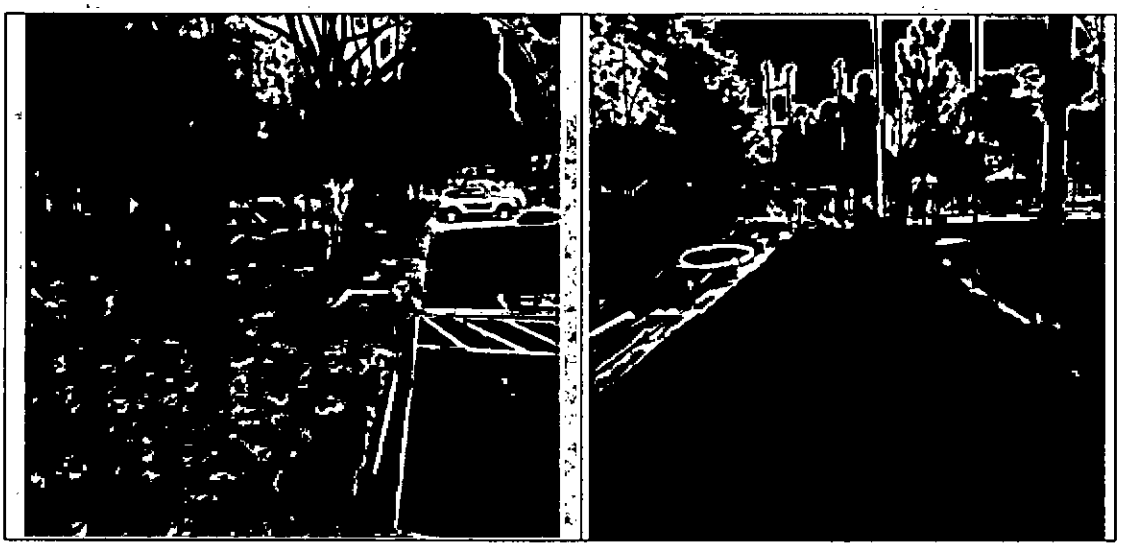


Parque de los Niños. Construcción de sendero peatonal y cajas de inspección.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (77)

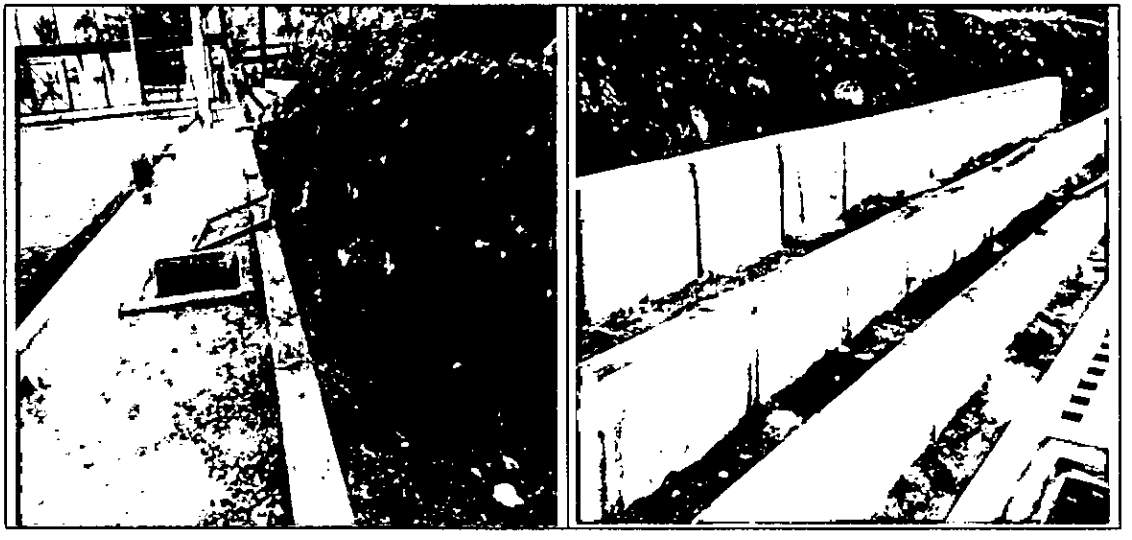


| | |
|---|---|
| Instalación prado costado norte Parqueadero Parque de Los Niños. | Parque de Los Niños. Aseo y retiro de materiales sobrantes. |

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (78)



Parque de Los Niños. Construcción de graderías en costado occidental de las Canchas de Vóley playa.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (79)

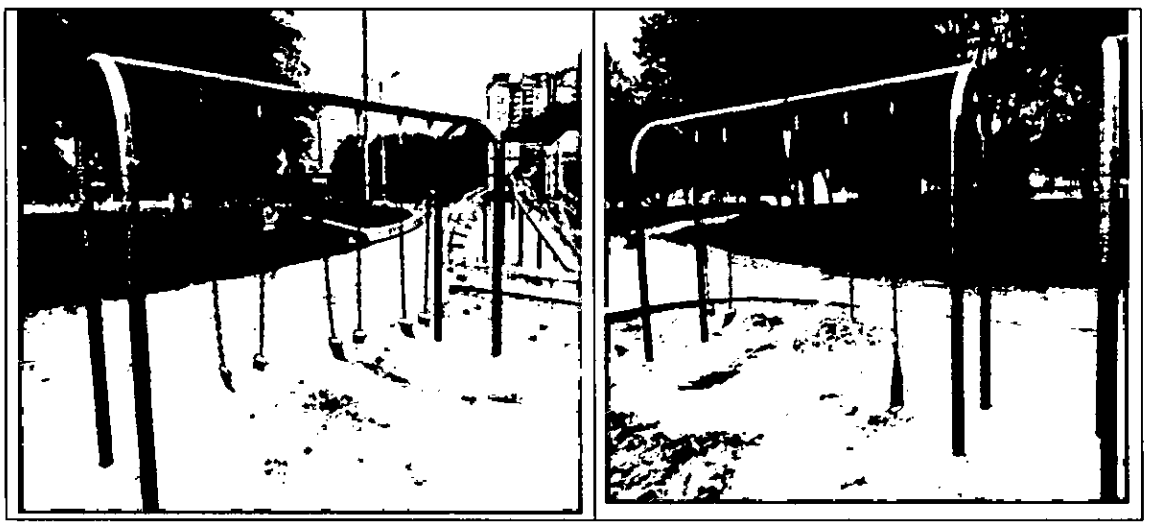


Parque de Los Niños. Instalación de capa de gravilla+ geotextil y filtros en Arenera de los Juegos de Niños.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (80)



Parque San José de Bavaria. Juegos infantiles. Lijada y aplicación de anticorrosivo; faltan los columpios.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (81)

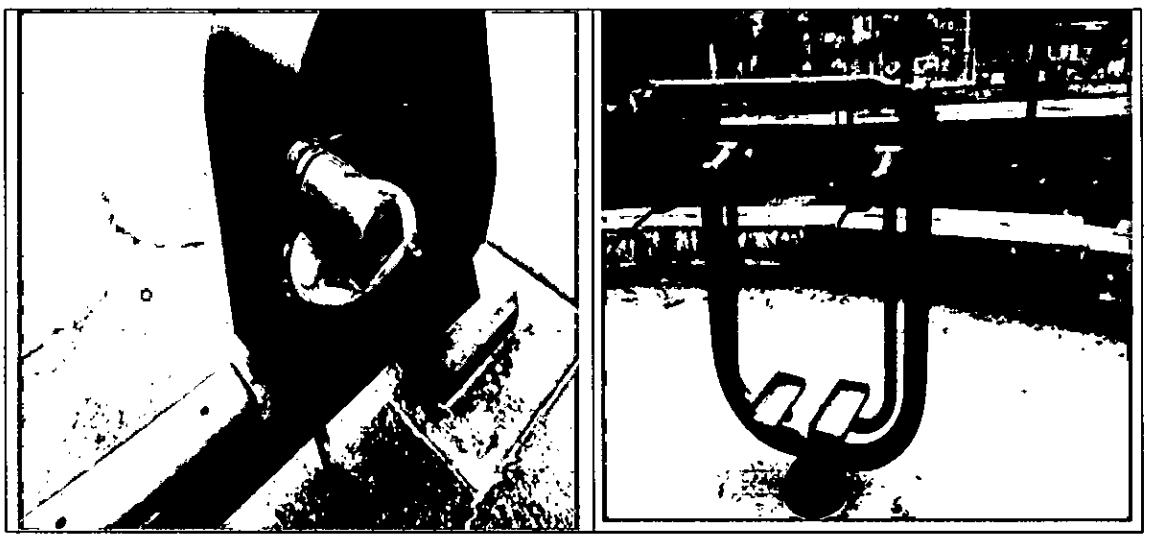


Parque San José de Bavaria. Lijada y aplicación de anticorrosivo en gimnasios

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (82)

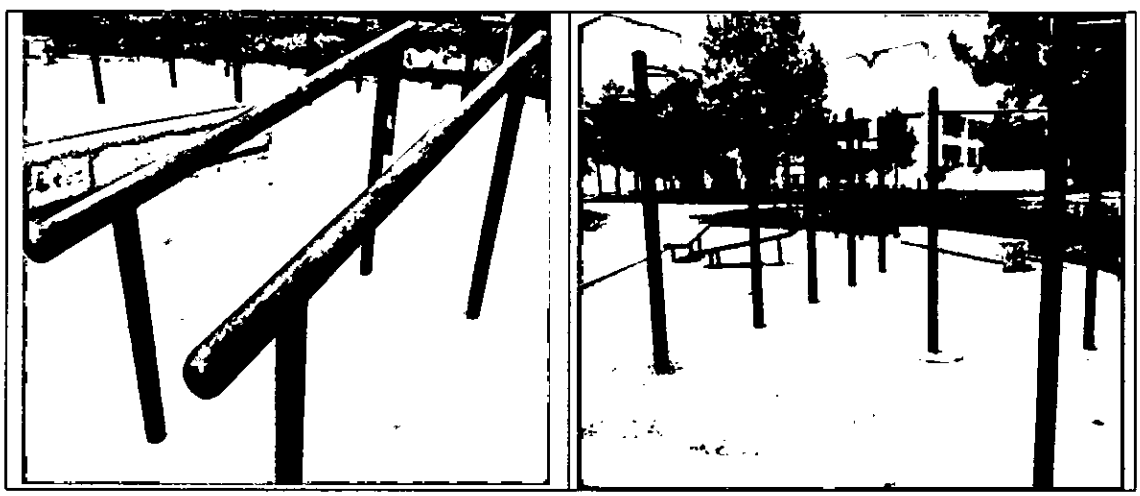


Parque San José de Bavaria. Lijada y aplicación de pintura a gimnasios biosaludables

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (83)

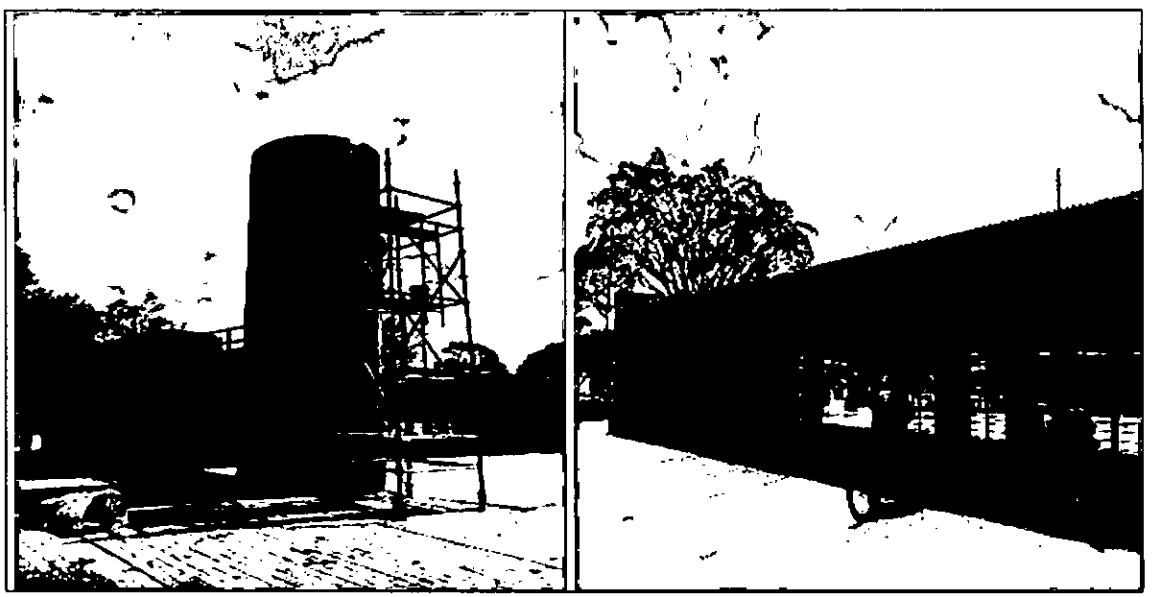


Parque San José de Bavaria. En la Ruta de la vida ubicada en el costado nororiental del parque, aún no se ha iniciado el mantenimiento

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (84)

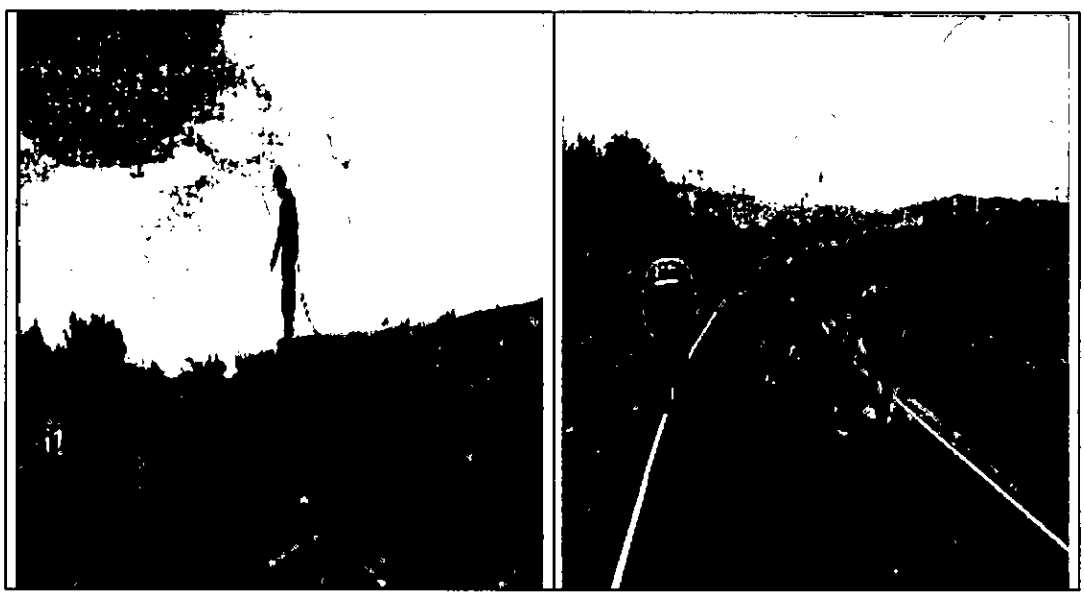


Parque El Tunal. Se avanza con la corrección de observaciones de la interventoría para la entrega de la portería # 4.

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (85)

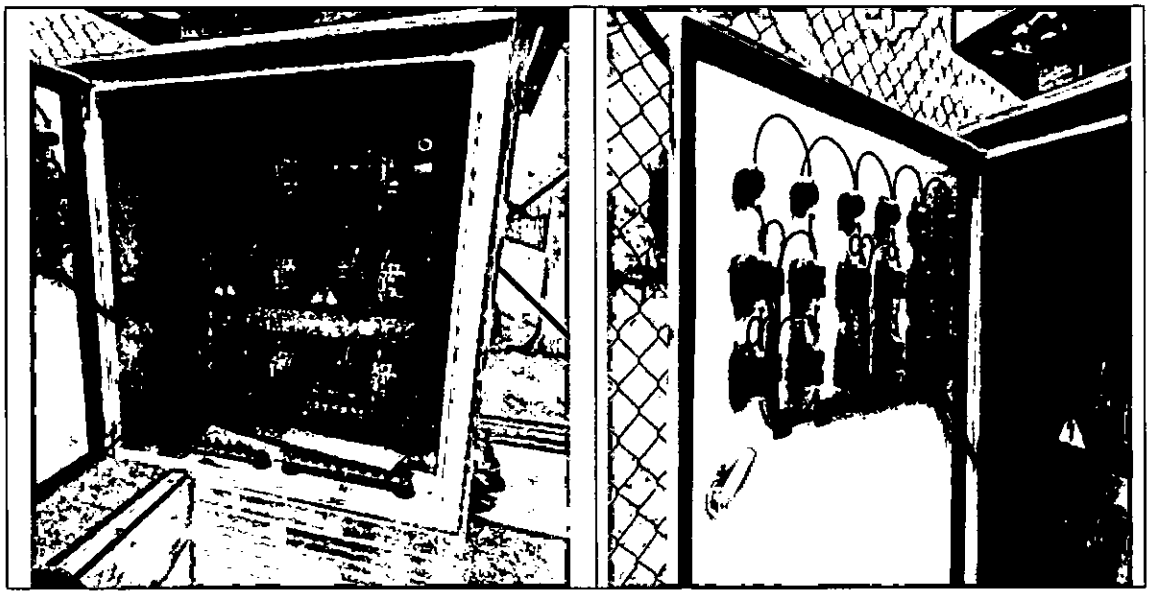


Parque El Tunal. se hace entrega y puesta en servicio a la administración y a las escuelas de BMX.

| SOLIUN INGENIERÍA | REGISTRO FOTOGRÁFICO |
|---|---|
| | SOLIUN INGENIERÍA SAS |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (86)



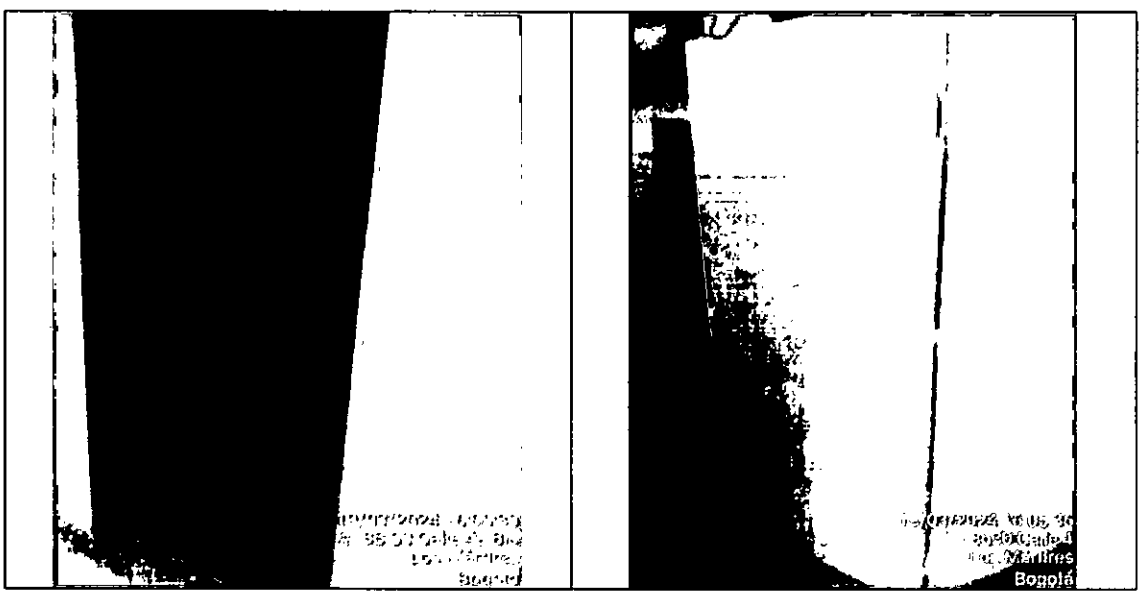
Parque El Tunal. se instala tablero de control de iluminación.

988 ~~876~~

| | |
|---|---|
| SOLIUN INGENIERÍA | **REGISTRO FOTOGRÁFICO** |
| | **SOLIUN INGENIERÍA SAS** |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL PROYECTO: | "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BOGOTÁ D.C. |
| CONTRATISTA OBRA: | CONSORCIO PARQUES BOG |
| CONTRATO INTERVENTORÍA No.: | 3131 DE 2023 |
| MES DEL REPORTE: | 1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024 |

## FOTOGRAFÍA (87)



Parque Eduardo Santos. Se terminan los remates en los baños del coliseo, para hacer entrega a la administración.
