IDRD

Instituto Distrital de Recreación y Deporte

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3131 DE 2023
SOLIUN INGENIERÍA SAS
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 – 3013942384

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

INFORME MENSUAL No 7 – COMPONENTE TÉCNICO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

TOMO __1___ DE _____

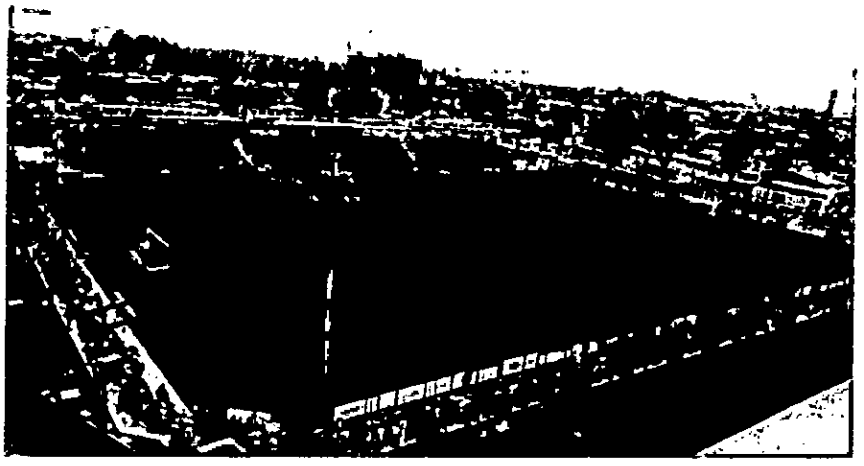


TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	X	COPIA CONTROLADA NO	

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Luis Alberto Medrano Bermúdez	Residente de Interventoría	
APROBÓ	Edna Constanza Cepeda Sánchez	Directora de Interventoría	

MARZO DE 2024 / BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.06.06 09:31:01 COT
Firmado digitalmentè desde SGD-OrfeoJADE

989
876

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (88)



Parque La Fragua. Se avanza con la instalación de cañuelas, y remates de wing en pista de patinaje de baldosín.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (89)




Parque Villa Alemana. Terminan las obras diagnosticadas para este parque

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (90)

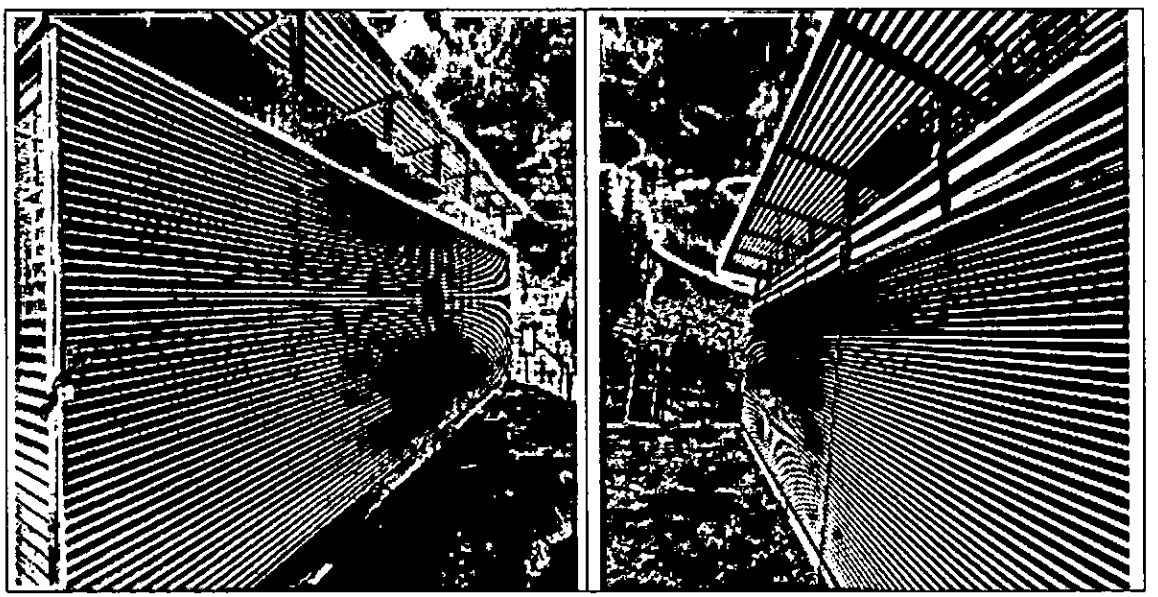


Parque La Victoria. se avanza con el mantenimiento y pintura de módulos de baños y mantenimiento interno de los mismos, muros en drywall

947
898

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (91)

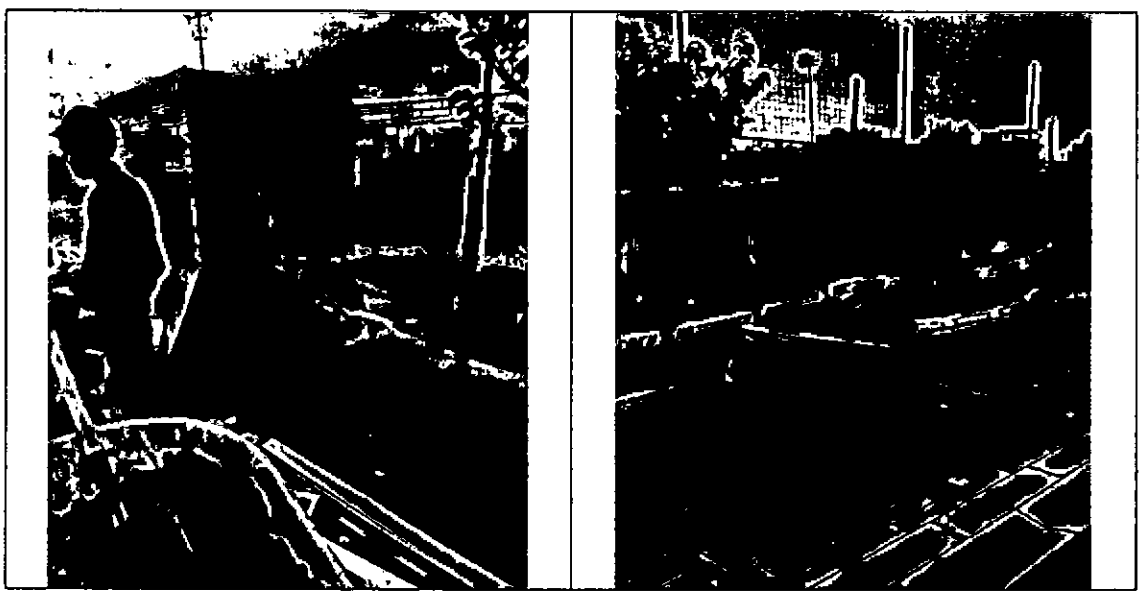


Parque Gilma Jiménez. Se avanza con los trabajos de adecuación y elaboración del cuarto del transformador nuevo y canalización de tuberías para llegar a este cuarto.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (92)

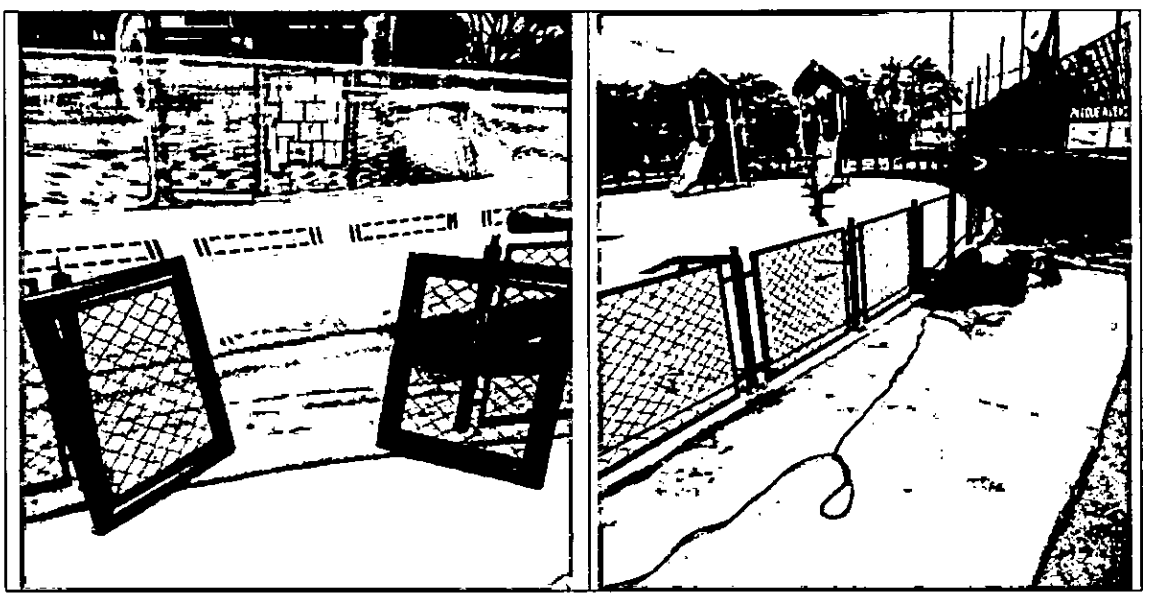


Parque Nuevo Muzú. Se avanza con la instalación de nuevo tramo de baranda, se terminan de atender observaciones de la interventoría en los baños de coliseo para puesta en servicio.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (93)

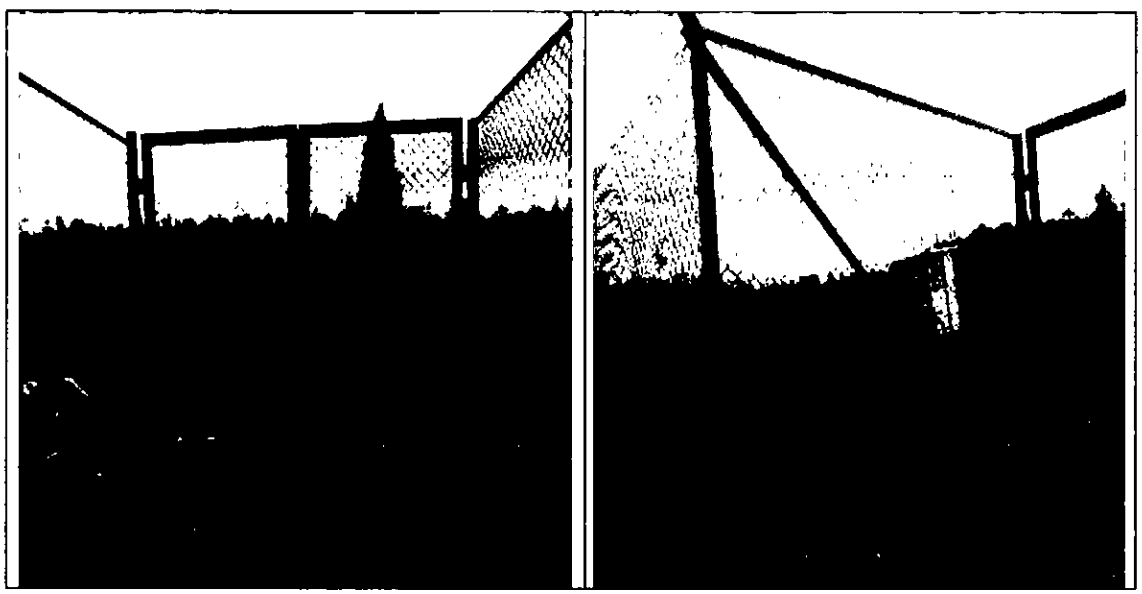


Parque La Petar. Se termina la instalación del portón de ingreso doble hoja y valla del parque.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (94)

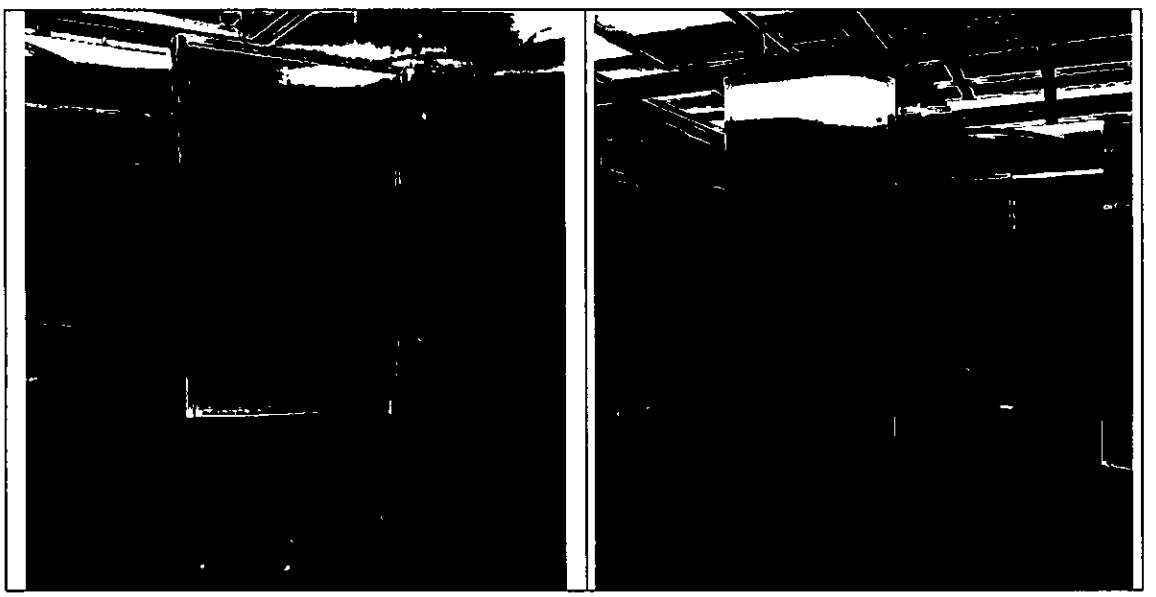

Parque Illimani. Se avanza con la adecuación e instalación de cubiertas, divisiones y accesorios en acero de la parte interna del módulo de baños.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (95)



Parque Virrey Sur. Se terminan actividades de mantenimiento y pintura diagnosticados para este parque y se programa entrega a la administración.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (96)




Parque Bosques de San Carlos. Compactación material granular base con el vibro compactador zona grecorromana y ruta de la vida

994

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (97)

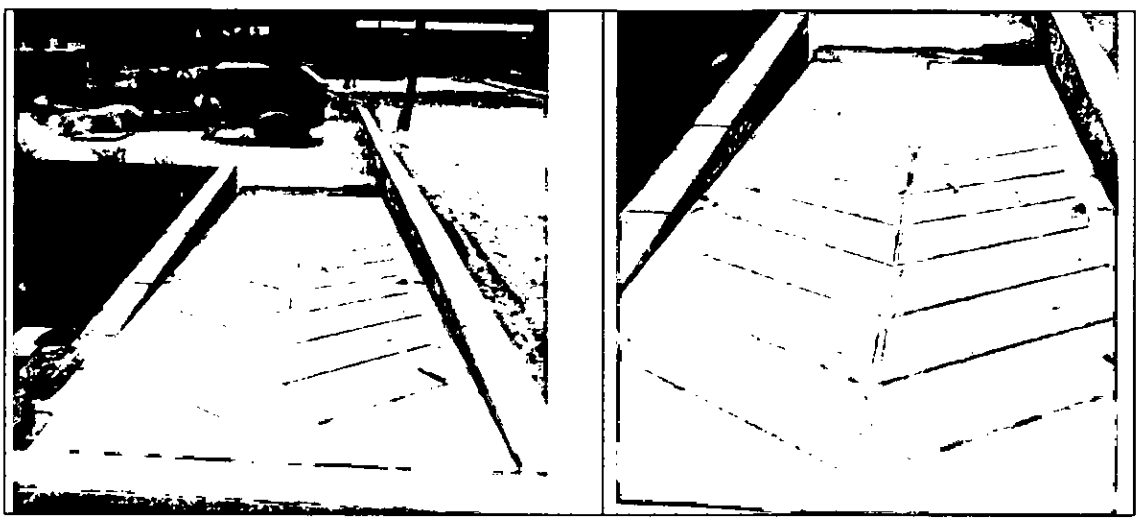

Parque Bosques de San Carlos. Construcción rampa de discapacitados zona grecos.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (98)




Parque Bosques de San Carlos. Retoques de pintura solicitado por interventoría en los Biosaludables

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (99)

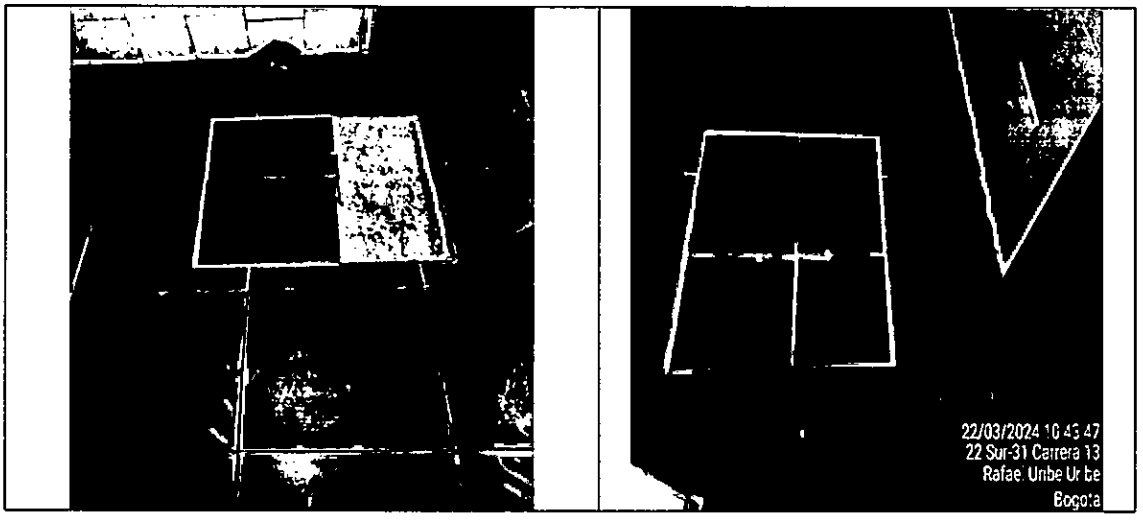

Parque Bosques de San Carlos. Suministro e instalación de baldosas negras caja sanitarias baños de hombres

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (100)




Parque Nacional. Revisión del estado del juego dañado para recoger

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (101)

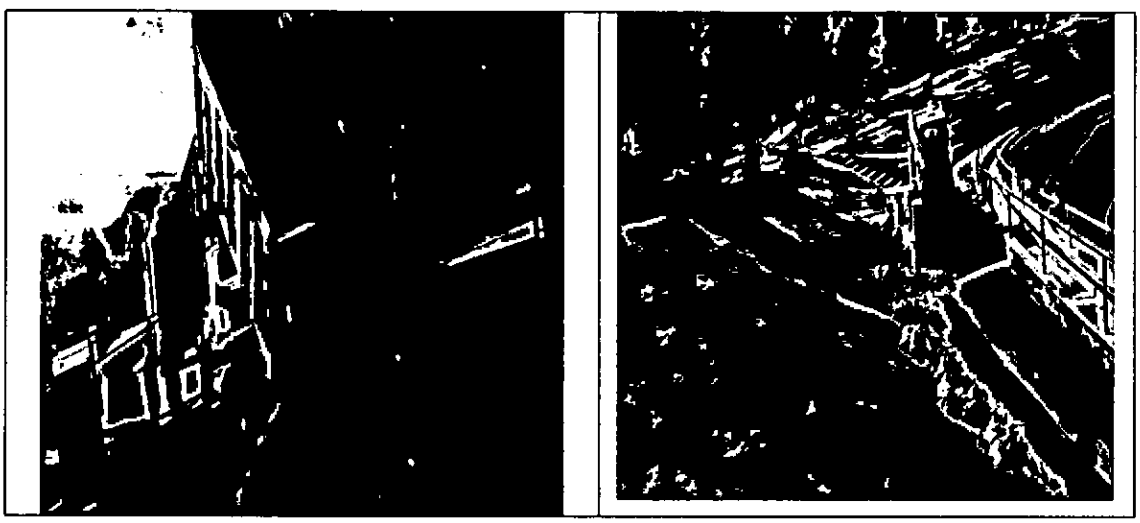


Parque Velódromo 1° de Mayo. Adecuación zona con material granular para entrada de camión grúa.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (102)

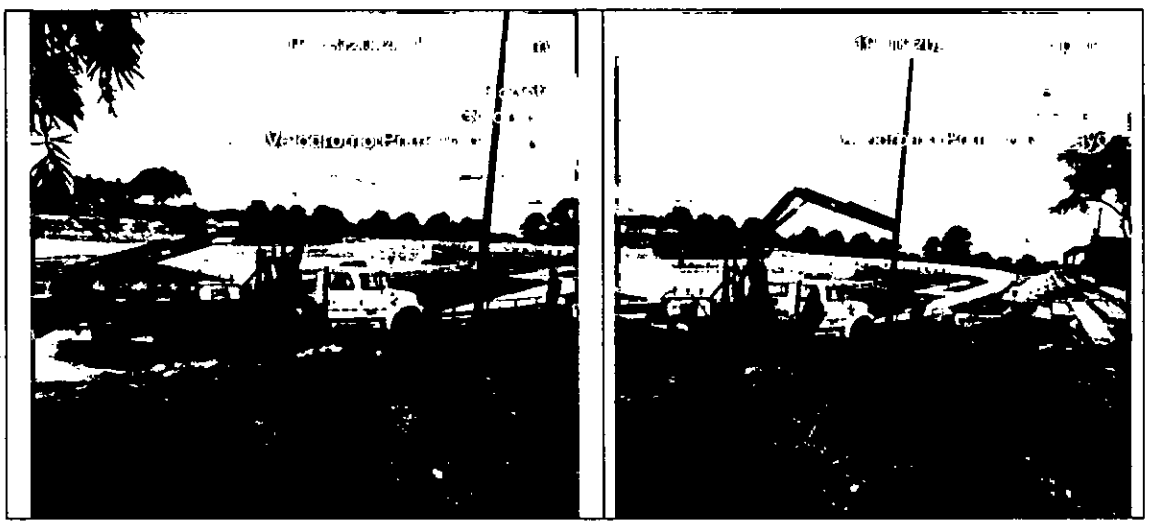


Parque Velódromo 1° de Mayo. Retiro de postes existentes en concreto costado nor oriental.

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (103)

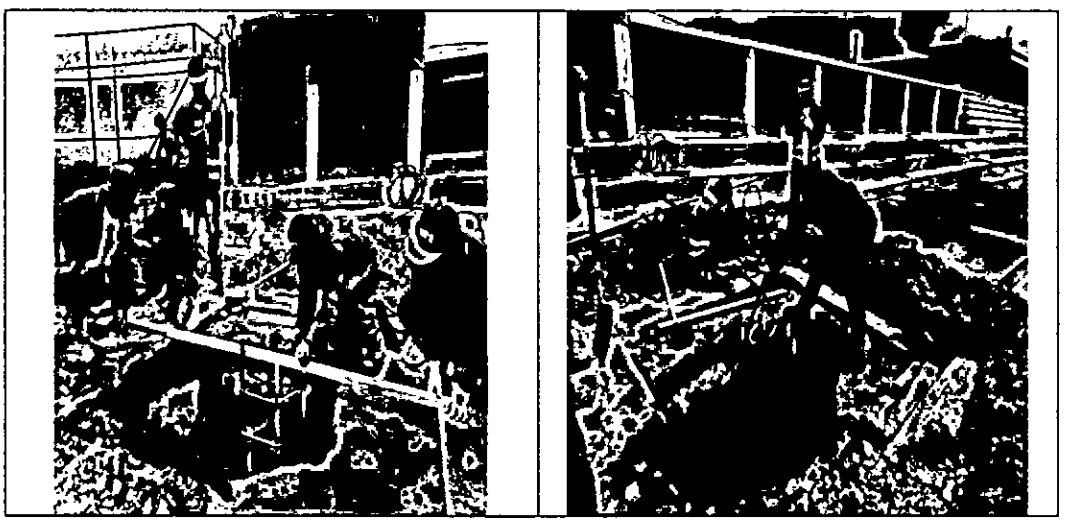

Parque Velódromo 1° de Mayo. Fundida de concreto dado para poste metálico costado sur oriental

SOLIUN INGENIERÍA	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	SOLIUN INGENIERÍA SAS

NOMBRE DEL PROYECTO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA No.:	3131 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1° DE MARZO AL 31 MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (104)



Parque Canal Boyacá. Suministro e instalación de bordillos.

ANEXO 6. FORMATO TRAZABILIDAD DE ACTIVIDADES

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". .

CONTRATO DE OBRA No:	3099-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD

PERIODO:	1° al 31 de marzo de 2024

FRENTE DE OBRA	UDS

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
04/03/2024	65	Desmonte y retiro de luminarias e instalacion de tuberia EMT de puesta a tierrra en cancha de belsbol	en ejecucion
05/03/2024	77	Desmonte y retiro de luminarias en cancha de belsbol	liberación
06/03/2024	78	Inicio desmonte y retiro de luminarias en cancha de softbol	
06/03/2024	79	Instalacion de tuberia EMT de puesta a tierrra en cancha de softbol	en ejecucion
11/03/2024	88	ajuste luminarias belsbol	liberación
12/03/2024	92	ajuste luminarias softbol	liberación
14/03/2024	96	desmonte luminarias alumbrado postes softbol	liberación
14/03/2024	99	Instalación de fluxómetro en WC hombres norte 1er piso velódromo	en ejecucion
15/03/2024	103	instalación puestas a tierra belsbol	en ejecucion
18/03/2024	109	adecuación terreno acceso manliff	
19/03/2024	113	retiro de luminaria en belsbol- garantía	en ejecucion
20/03/2024	117	resane muros por instalación de fluxómetro en WC hombres norte 1er piso velódromo	en ejecucion
21/03/2024	121	regatas, instalación varilla cobre-puesta tierra belsbol	en ejecucion
22/03/2024	125	regatas, instalación varilla cobre-puesta tierra belsbol	liberación
25/03/2024	138	retiro escombros ; se habían adecuado para acceso manliff	liberación
26/03/2024	144	pruebas de presión fluxómetro en WC hombres norte 1er piso velódromo	en ejecucion
27/03/2024	150	pruebas de presión fluxómetro en WC 1er y 2do piso velódromo	liberación

Firma:		Firma:	
Nombre:	ING. JOSÉ PEÑA	Nombre:	ING. LUIS A. MEDRANO B.
Cargo:	RESIDENTE	Cargo:	RESIDENTE
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

999
886

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD

PERIODO:	1° al 31 de marzo de 2024

FRENTE DE OBRA	PARQUE PRD UCAD

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
15/03/2024	454	aplicación recubrimiento sintético -baloncesto	inicio en ejecución
18/03/2024	468	concreto 3000 para andén cuneta -baloncesto	en ejecución
18/03/2024	471	instalación tubería 6"- desague voley arena	liberación
19/03/2024	485	aplicación recubrimiento sintético -baloncesto	liberación
22/03/2024	497	remate cajas inspección squash	en ejecución
22/03/2024	499	desmonte cielorraso porche oficinas Administración e inicio instalación en PVC	en ejecución
26/03/2024	503	estructura puentes tablero control iluminación- canchas hockey	en ejecución
24/03/2024	581	terminan instalaciones eléctricas en area administración	liberación
26/03/2024	582	remate pintura muro squash	liberación
27/03/2024	587	desmonte cerramientos provisionales cnacha de squash	liberación
27/03/2024	588	entrega a la Administración para puesta en servicio -cancha squash	liberación

Firma: _____

Nombre: ING. JOSÉ PEÑA

Cargo: RESIDENTE

CONTRATISTA

Firma: _____

Nombre: ING. LUIS A. MEDRANO B.

Cargo: RESIDENTE

INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD

PERIODO:	1° al 31 de marzo de 2024

FRENTE DE OBRA	PARQUE PRD UCAD

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
01/03/2024	337	Toma de densidades base granular cancha de baloncesto	en ejecución
01/03/2024	338	instalación base granular cancha de baloncesto	liberación
01/03/2024	339	demolición enchape piso cocina	en ejecución
01/03/2024	341	esmalte en barandas canchas arena existentes	en ejecución
02/03/2024	345	instalación bordillo costado sur-baloncesto	en ejecución
02/03/2024	346	imprimación base -baloncesto	en ejecución
03/03/2024	352	instalación de duropiso cocina	en ejecución
04/03/2024	367	imprimación base -baloncesto	liberación
05/03/2024	368	extendida y compactación asfalto 1350 baloncesto	en ejecución
05/03/2024	374	instalación bordillo costado sur-baloncesto	en ejecución
06/03/2024	382	excavación para construcción cajas inspección squash	en ejecución
07/03/2024	391	instalación tablero control canchas hockey	en ejecución
07/03/2024	396	amarre muro cancha squash	en ejecución
08/03/2024	411	prueba de humedad asfalto e inicio aplicación recubrimiento	liberación
11/03/2024	430	estructura techo y la instalación eléctrica /oficinas admon	liberación
12/03/2024	434	instalacín refuerzo andén cuneta baloncesto	en ejecución
12/03/2024	435	instalacín refuerzo andén cuneta baloncesto	liberación
12/03/2024	437	resanes muro cancha squash	liberación
13/03/2024	442	aplicación recubrimiento sintético -squash	en ejecución
14/03/2024	448	demarcación cancha squash	en ejecución
14/03/2024	450	esmalte en barandas canchas arena existentes	en ejecución
15/03/2024	454	aplicación recubrimiento sintético -squash	liberación
15/03/2024	455	cajas de inspección baloncesto	en ejecución

Firma:		Firma:	
Nombre:	ING. JOSÉ PEÑA	Nombre:	ING. LUIS A. MEDRANO B.
Cargo:	RESIDENTE	Cargo:	RESIDENTE
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

1000
602

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD

PERIODO:	1° al 31 de marzo de 2024

FRENTE DE OBRA	PARQUE SIMÓN BOLÍVAR

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
15/03/2024	461	enchape muros y pisos baños hombres- Surtipollo	liberada
15/03/2024	462	pintura barandas Templete	liberación
15/03/2024	463	termina desmonte e instalación de 37 canecas acero	en ejecución
16/03/2024	470	extendida de tierra negra exterior módulo Carbón	en ejecución
18/03/2024	477	instalación de cespedón en Maná	en ejecución
18/03/2024	478	instalación de cespedón en Maná	liberación
19/03/2024	487	mantenimientos en Surtipollo y Delyexpress	liberación
19/03/2024	488	desmonte e instalación de 37 canecas acero	liberación
20/03/2024	498	aplicación pintura kioscos comidas	en ejecución

Firma: _____

Nombre: ING. JOSÉ PEÑA

Cargo: RESIDENTE
CONTRATISTA

Firma: _____

Nombre: ING. LUIS A. MEDRANO B.

Cargo: RESIDENTE
INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
PERIODO:	1° al 31 de marzo de 2024

CONTRATO DE OBRA No:	3099-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD
FRENTE DE OBRA	PARQUE SIMÓN BOLÍVAR

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
02/03/2024	336	cambio red agua potable baño damas WC Carbón	liberada
03/03/2024	342	aplicación de polyurea tanques sépticos	en ejecución
04/03/2024	347	arreglo punto hidráulico discapacitados WC damas Maná	liberada
05/03/2024	348- 355	remates y aseo en kioscos comidas	en ejecución
06/03/2024	359	relleno seleccionado perimetral tanques sépticos- ensayos	en ejecución
06/03/2024	361	inicio llenado agua tanques sépticos	en ejecución
07/03/2024	365	aplicación pintura kioscos comidas	en ejecución
07/03/2024	370	prueba de estanqueidad	en ejecución
07/03/2024	371	finaliza llenado agua tanques sépticos	en ejecución
07/03/2024	375	instalación de bebederos	en ejecución
07/03/2024	376	ensayos compactación rellenos	liberación
08/03/2024	380- 383	prueba de estanqueidad	liberación
08/03/2024	384	puntos hidráulico WC hombres Carbón	en ejecución
08/03/2024	386	inicio instalación de canecas acero	en ejecución
08/03/2024	387	aplicación pintura kioscos comidas	en ejecución
09/03/2024	393	arreglo puntos hidráulico WC hombres Carbón	liberación
09/03/2024	398	instalación de canecas acero	en ejecución
09/03/2024	399	compactación rellenos	en ejecución
11/03/2024	400-404	compactación rellenos	liberación
11/03/2024	406	gravilla filtrante tanque	liberación
11/03/2024	412	cambio push módulo Surtipollo	en ejecución
11/03/2024	413	pintura barandas Templete	en ejecución
12/03/2024	422	enchape muros y pisos baños hombres- Carbón	liberación
12/03/2024	424	pintura barandas Templete	en ejecución
12/03/2024	426	desmonte e instalación de nuevas canecas acero	en ejecución
13/03/2024	431	mantenimiento WC Maná	liberación
13/03/2024	433	perfilada y nivelación terreno Maná	en ejecución
13/03/2024	440	cambio fluxómetros en módulo baños Dely expres	en ejecución
15/03/2024	454	perfilada y nivelación terreno Maná	liberación
15/03/2024	460	mantenimiento WC El Carbón	liberación

Firma:		Firma:	
Nombre:	ING. JOSÉ PEÑA	Nombre:	ING. LUIS A. MEDRANO B.
Cargo:	RESIDENTE CONTRATISTA	Cargo:	RESIDENTE INTERVENTORIA

1007

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-08
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD

PERIODO:	1 al 31 de marzo de 2024
FRENTE DE OBRA	PARQUE DE LOS NOVIOS

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
01/03/2024	227	vaciado de concreto 3000 psi de 4 pedestales	en ejecución
01/03/2024	228	rolado arcos metálicos	en ejecución
02/03/2024	232	desencofrado pedestales	
02/03/2024	234	estado y funcionamiento red desagues baños	liberación
04/03/2024	243	excavación en tanques de almacenamiento	en ejecución
06/03/2024	249	amarre vigas cimentación	en ejecución
06/03/2024	249	amarre vigas cimentación	liberación
06/03/2024	251	perforación platina anclaje -tunel	en ejecución
07/03/2024	255	fundida en concreto vigas cimentación	en ejecución
08/03/2024	261	instalación platina anclaje -tunel	liberación
09/03/2024	267	inicio instalación arcos metálicos-tunel	en ejecución
13/03/2024	285	instalación arcos metálicos-tunel	en ejecución
18/03/2024	310	traslado y montaje módulo baños	
20/03/2024	313	excavación en tanques de almacenamiento	liberación
20/03/2024	315	cambio push fluxómetros WC públicos	en ejecución
21/03/2024	320	cambio push fluxómetros WC públicos	liberación
21/03/2024	321	excavación para tubería gres existente /fundida piso C.I.	en ejecución
22/03/2024	322	excavación para tubería gres existente /fundida piso C.I.	liberación
22/03/2024	326	avance instalación pasamanos- túnel	en ejecución
23/03/2024	330	instalación pasamanos/pintura - túnel	liberación
23/03/2024	332	acometida eléctrica módulo baños	en ejecución
26/03/2024	336	instalación de baranda y cubierta módulo baños	en ejecución

Firma:		Firma:	
Nombre:	ING. JOSÉ PEÑA	Nombre:	ING. LUIS A. MEDRANO B.
Cargo:	RESIDENTE	Cargo:	RESIDENTE
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD

PERIODO:	1° al 31 de marzo de 2024

FRENTE DE OBRA	PARQUE DE LOS NIÑOS

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
23/03/2024	530	base granular compactación sendero occidental	en ejecución
23/03/2024	531	base granular compactación sendero occidental	liberación
23/03/2024	533	filtro y caja de captación arenero juego niños	liberación
23/03/2024	534	instalación de césped	en ejecución
24/03/2024	538	instalación sardinel prefabricado graderías	en ejecución
24/03/2024	539	inicio instalación adoquín sendero occidental	
24/03/2024	541	instalación módulos de malla eslabonada cerramiento	en ejecución
25/03/2024	545	instalación adoquín sendero occidental-tramo sur	liberación
25/03/2024	548	instalación de césped	en ejecución
26/03/2024	551	inicio instalación de luminarias tipo LED	en ejecución
26/03/2024	555	instalación de césped	liberación

Firma: _____
Nombre: ING. JOSÉ PEÑA
Cargo: RESIDENTE
CONTRATISTA

Firma: _____
Nombre: ING. LUIS A. MEDRANO B.
Cargo: RESIDENTE
INTERVENTORIA

1002

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD

PERIODO:	1° al 31 de marzo de 2024

FRENTE DE OBRA	PARQUE DE LOS NIÑOS

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
04/03/2024	406	aplicación de capa de grava Canchas voley playa	en ejecución
05/03/2024	414	instalación de geotextil 4000	en ejecución
05/03/2024	417	inicio excavación para instalación de cárcamo	en ejecución
07/03/2024	428	aplicación de capa de grava Canchas voley playa	en ejecución
07/03/2024	431	instalación de cárcamo	liberación
08/03/2024	437	excavaciones para tubería 6" (cancha arena nororiental).	en ejecución
08/03/2024	439	imprimación base parqueadero	liberación
08/03/2024	440	colocación asfalto MDC 19-parqueadero	en ejecución
09/03/2024	447	colocación asfalto MDC 19-parqueadero- ultimo tramo	en ejecución
12/03/2024	448	aplicación de capa de grava Canchas voley playa	en ejecución
13/03/2024	456	aplicación de capa de grava Canchas voley playa	en ejecución
13/03/2024	457	demolición caja existente de inspección A. lluvias.	en ejecución
14/03/2024	467	excavación tubería 10" -parqueadero	liberación
15/03/2024	473	instalación tubería 10" -parqueadero	en ejecución
16/03/2024	481	aplicación de capa de grava Canchas voley playa	liberación tramo
17/03/2024	483	instalación tubería 10" -parqueadero	liberación
18/03/2024	487	aplicación grava Canchas voley playa y cierre de geotextil	en ejecución
19/03/2024	488	aplicación grava Canchas voley playa y cierre de geotextil	en ejecución
20/03/2024	500	aplicación grava Canchas voley playa y cierre de geotextil 4000	liberación
20/03/2024	502	construcción cajas inspección canchas	en ejecución
20/03/2024	504	inicio instalación parales para cerramiento -oriente y sur	en ejecución
20/03/2024	505	inicio siembra de césped contorno paraqueadero	en ejecución
21/03/2024	509	inicio instalación sardinel para graderías	en ejecución
21/03/2024	511	nivelación y compactación base sendero occidental	en ejecución
21/03/2024	512	instalación módulos para cerramiento -oriente y sur	en ejecución
22/03/2024	521	instalación sardinel prefabricado graderías	en ejecución
23/03/2024	524	demarcación piso parqueadero	en ejecución

Firma:		Firma:	
Nombre:	ING. JOSÉ PEÑA	Nombre:	ING. LUIS A. MEDRANO B.
Cargo:	RESIDENTE	Cargo:	RESIDENTE
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoria técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y juridica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	MARZO
FRENTE DE OBRA	Parque Tunal

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/03/2024	192	APLICACIÓN DE ESMULSION ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZAR CUBIERTA PORTERIA 4	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/03/2024	194	SE INICIA INSTALACION DE MANTO IMPERMEABILIZANTE CUBIERTA PORTERIA 4	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/03/2024	194	SE REALIZA INSTALACION DE POLICARBONATO EN CUNBIERTA DE MIDULO DE CAFÉ	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
6/03/2024	198	SE REALIZAN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA PUESTAS EN SERVICIO DE CASA ADULTO MAYOR	La fecha corresponde al inicio de la actividad
6/03/2024	199	SE REALIZAN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA PUESTAS EN SERVICIO DE PORTERIA # 4	La fecha corresponde al inicio de la actividad
6/03/2024	200	SE REALIZAN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA PUESTAS EN SERVICIO DE LA PISTA DE BMX	La fecha corresponde al inicio de la actividad
7/03/2024	201	SE REALIZAN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA PARA PUESTAS EN SERVICIO DE LA PORTERIA 2 Y 5	La fecha corresponde al inicio de la actividad
12/03/2024	205	SE REALIZA PUESTA EN SERVICIO DE LA CASA DE ADULTO MAYOR	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
12/03/2024	206	SE REALIZA PUESTA EN SERVICIO DE LA PISTA DE BMX	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
14/03/2024	209	SE REALIZA REPARACION DEL CARRUSEL EN LA Z. DE JUEGOS INFANTILES	se realiza la liberacion con la puesta en servico de todas las actividades
15/03/2024	210	SE INICIA CERRAMIENTO PROVISIONAL PARKOUR	La fecha corresponde al inicio de la actividad
16/03/2024	211	SE ATIENDE EMERGENCIA EN LA UCAD	La fecha corresponde al inicio de la actividad
18/03/2024	212	SE INICIA MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LA RUTA DE LA VIDA JUNTO A BMX	La fecha corresponde al inicio de la actividad
27/03/2024	221	SE TERMINA LA IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA PORTERIA # 4	se realiza la liberacion con la puesta en servico de las actividades

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

1003
890

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	MARZO

FRENTE DE OBRA	Parque Mirador Illimani

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
12/03/2024		SE INICIA DESMONTE DE CUBIERTAS ROTAS EN MODULO DE BAÑOS	La fecha corresponde al inicio de la actividad
12/03/2024		REPARACION DE PUERTAS DE ACCESO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
13/03/2024		SE INICIA INSTALACION DE SUB DIVISIONES INTERNAS EN ACERO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
22/03/2024		SE INSTALAN PUERTAS CORREDIZAS EN MODULO DE BAÑOS	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	MARZO	FRENTE DE OBRA	ParqueVilla Alemana

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/03/2024		SE INICIA LA CONSTRUCCION DEL MURO EN LADRILLO PRENSADO EN EL CERRAMIENTO POSTERIOR DEL PARQUE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
4/03/2024		SE INSTALA EL PORTON NUEVO EN EL COSTADO LATERAL DERECHO DE INGRESO AL PARQUE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
6/03/2024		SE TERMINA EL MURO EN LADRILLO DEL CERRAMIENTO POSTERIOR	Actividad liberada
9/03/2024		SE INICIA LA INSTALACION DE TAPAS DE CAJAS DE PASO SOLDANDOLAS	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

1004

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	MARZO
FRENTE DE OBRA	Fragua

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/03/2024	75	SE INICIA INSTALACION Y SERIADO DE BASE EN ZONA INFANTIL	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/03/2024	76	SE TOMAN ENSAYOS DE DENSIDAD A BASES EN ZONA INFANTIL	SE LIBERA LA ACTIVIDAD DENSIDADES DAN POR ENCIMA DEL 95%
4/03/2024	77	EXCAVAXION DE BORDILLO ZONA INFANTIL	La fecha corresponde al inicio de la actividad
4/03/2024	78	SE HACEN OBSERVACIONES A BAÑOS PARA HACER PUESTA EN SERVICIO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
5/03/2024	80	SE INICIA INSTALACION DE BORDILLO EN ZONA INFANTIL	La fecha corresponde al inicio de la actividad
9/03/2024	84	SE TERMINA LA INSTALACION DE BORDILLO EN ZONA INFANTIL	SE LIBERA LA ACTIVIDAD
12/03/2024	88	SE FUNDE PLACA EN CONCRETO EN ZONA INFANTIL	La fecha corresponde al inicio de la actividad, se toman cilindros de ensayo.
13/03/2024	90	SE INICIA INSTALACION DE ADOQUIN EN SENDEROS DE LA ZONA INFANTIL	La fecha corresponde al inicio de la actividad
14/03/2024	91	INSTALACION DE BORDILLO EN PISTA DE PATINAJE	SE TERMINA LA ACTIVIDAD Y SE LIBERA
15/03/2024	92	TOMA DE DENSIDADES PARA INSTALAR ADOQUIN EN SENDEROS ZONA INFANTIL	SE TERMINA LA ACTIVIDAD Y SE LIBERA
21/03/2024	96	SE INICIA LA INSTALACION DE ASFALTO EN ZONA DE PISTA DE PATINAJE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
22/03/2024	97	SE TERMINA LA INSTALACION DE ASFALTO EN PISTA DE PATINAJE	SE TERMINA LA ACTIVIDAD Y SE LIBERA CON OBSERVACIONES
25/03/2024	100	SE INICIA INSTALACION DE BARANDA M-83 EN ZONA INFANTIL	La fecha corresponde al inicio de la actividad
26/03/2024	101	SE INICIA PINTURA DE JUEGOS Z. INFANTIL EXISTENTE FUERA DEL PARQUE	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUZ STELLA QUINTERO	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	[redacted] MARZO [redacted]
FRENTE DE OBRA:	[redacted] Nuevo Muzu [redacted]

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/03/2024	59	SE I NICIA LA INSTALACION DE MODULOS	La fecha corresponde al inicio de la actividad
2/03/2024	61	SE INICIA INSTALACION DE ENCHAPE EN BAÑO DEL COLISEO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
3/03/2024	62	SE REALIZA LA ENTREGA DEL MODULO DE BIBLIORED EN SU NUEVA UBICACIÓN	Se realiza la liberacion de la actividad
5/03/2024	64	SE INICIA LA INSTALACION DE BARANDA M-83 EN ZONA INFANTIL	La fecha corresponde al inicio de la actividad
6/03/2024	65	SE TERMINAN LOS ENCHAPES EN LOS BAÑOS DEL COLISEO	Se realiza la liberacion de la actividad
11/03/2024	70	ORDEN Y ASEO DEL SENDERO CONTIGUO A ZONA INFANTIL	Se realiza la liberacion de la actividad
18/03/2024	76	INSTALACION DE PUERTAS DE ACCESO A ZONA INFANTIL	La fecha corresponde al inicio de la actividad
23/03/2024	82	PINTURA DE ESTRUCTURAS DE VALLAS INFORMATIVAS	La fecha corresponde al inicio de la actividad
25/03/2024	84	LLEGA PISO CAUCHO PARA INSTALACION EN ZONA INFANTIL	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUZ STELLA QUINTERO	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

1005

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	MARZO

FRENTE DE OBRA	Cayetano Cañizares

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
25/03/2024	37	INSTALACION DE 38 LUMINARIAS EN LA CANCHA DE FUTBOL SINTETICA	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	LUZ STELLA QUINTERO	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	MARZO
FRENTE DE OBRA	Eduardo Santos

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
4/03/2024		INSTALACION DE DIVISIONES DE ORINALES EN ACERO INOXIDABLE	La fecha corresponde al inicio de la actividad
5/03/2024		SE INICIA PULIDA DE PISOS EN BAÑOS DE COLISEO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
8/03/2024		SE INICIA PINTURA VINILO EN MUROS DE BAÑOS COLISEO	la fecha corresponde al inicio de la actividad
13/03/2024		SE INICIA INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y FLUXOMETROS EN BAÑOS DE COLISEO	La fecha corresponde al inicio de la actividad
19/03/2024		SE TERMINAN ACTIVIDADES DE PINTURA ASEOS Y REMATES PARA ENTREGA	Actividad liberada
23/03/2024		SE REALIZA ENTREGA A LA ADMINISTRACION DEL PARQUE DE LOS BAÑOS DEL COLISEO	Actividad liberada
			La fecha corresponde al inicio de la actividad
			La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

1006
~~873~~

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	[redacted] MARZO [redacted]
FRENTE DE OBRA:	[redacted] Virrey Sur [redacted]

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/03/2024			

Firma: _____ Firma: _____

Nombre: RODNEY GRANADOS Nombre: ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.

Cargo: RESIDENTE DE OBRA Cargo: RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATISTA INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	[redacted]	MARZO	[redacted]
FRENTE DE OBRA:	[redacted]	La Victoria	[redacted]

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
19/03/2024		SE INICI DEMOLICION DE MUROS INTERNOS EN MODULO DE ADMINISTRACION	La fecha corresponde al inicio de la actividad
20/03/2024		INSTALACION DE LAMINAS DE SUPERBOARD NUEVAS EN MUROS DE MODULO DE ADMINISTRACION	La fecha corresponde al inicio de la actividad
21/03/2024		INICIO DE DESMONTE DE CUBIERTAS MODULOS DE BAÑOS	La fecha corresponde al inicio de la actividad
22/03/2024		INSTALACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE ADMINISTRACION	La fecha corresponde al inicio de la actividad
23/03/2024		INICIO DE ESTUCO Y PINTURA EN MUROS INTERNOS ADMINISTRACION	La fecha corresponde al inicio de la actividad
26/03/2024		INSTALACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN CUBIERTA DE BAÑOS	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

1009
894

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	MARZO
FRENTE DE OBRA	Gilma Jimenez

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/03/2024	8	SE DEJAN INSTALADAS TODAS LAS LUMINARIAS DE FUTBOL 8	Actividad liberada
1/03/2024	8	SE DEJA ARREGLADO EL TRAMO DE SENDERO QUE DAÑO EL MANUF	Actividad liberada
7/03/2024	11	SE INICIAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL CUARTO DE TRANSFORMADOR	La fecha corresponde al inicio de la actividad
12/03/2024	13	SE INICIAN MUROS EN LADRILLO EN CUARTO DE TRANSFORMADOR	La fecha corresponde al inicio de la actividad
13/03/2024	17	SE INICIAN OBRAS DE CANALIZACION POR SENDEROS	La fecha corresponde al inicio de la actividad
20/03/2024	21	SE TERMINA PRIMER TRAMO DE CANALIZACION POR SENDEROS	Actividad liberada
22/03/2024	23	SE TERMINA SEGUNDO TRAMO DE CANALIZACION POR SENDEROS	Actividad liberada
27/03/2024	28	SE INSTALA PUERTA METALICA EN CUARTO DE TRANSFORMADOR	La fecha corresponde al inicio de la actividad

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ARQ. JOHN LIAN CUELLAR S.
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	mar-24

FRENTE DE OBRA	Parque Velodromo primera de Mayo

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
8/03/2024		Llegada de postes metalicos y canastas para instralacion en velodromo	En ejecución
19/03/2024		Se realiza desmonte de los postes en concreto	Actividad liberada
20/03/2024		Se realiza excavación para cajas 274	En ejecución
21/03/2024		Se inicia la construcción de cajas 274	En ejecución

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ING. FERNANDO MONDRAGON
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

1008

695

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	mar-24	FRENTE DE OBRA	PARQUE BOSQUES DE SAN CARLOS

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/03/2024	76	Se continua con la fundida de viga zarpa con acero de refuerzo perimetral a la zona de juegos y gimnasio	En ejecución
1/03/2024	76	se realiza instalación de division de baño hombres	Actividad liberada
2/03/2024	77	Se realiza instalación biosaludables para mantenimiento	En ejecución
6/03/2024	84	Se realiza instalacionde juego m-3 en zona parque externa	En ejecución
12/03/2024	86	Se inicia la instalación de geotextil 2100 para zona de juegos infantiles y gimnasio al aire libre	Actividad liberada
14/03/2024	88	se inicia construccion de rampa de acceso para personas con movilidad reducida en concreto con refuerzo en acero	En ejecución
14/03/2024	88	Se inicia la instalación de la base granular para zona de juegos infantiles y gimnasio al aire libre	En ejecución

Firma:		Firma:	
Nombre:	RODNEY GRANADOS	Nombre:	ING. FERNANDO MONDRAGON
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

	LIBERACIÓN DE ACTIVIDADES	CÓDIGO:	OBR-FR-06
		VERSIÓN:	2
		FECHA DE ELABORACIÓN:	11/07/2023

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	3131-2020
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

CONTRATO DE OBRA No:	3099-20023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"

PERIODO:	mar-24
FRENTE DE OBRA	PARQUE CANAL BOYACA

Fecha	Nota Bitacora	Actividad ejecutada	Actividad liberada
1/03/2024		Se continua con la excavación del sendero de acceso y plazoleta en adoquin	Actividad liberada
4/03/2024		Se continua con la excavación de los dados para cimentacion de juegos infantiles	En Ejecución
12/03/2024		Se inicia la instalación de geotextil 2400 para la zona de sendero de acceso	Actividad liberada
13/03/2024		Se inicia la instalación de sub base granular reciclada en zona de sendero de acceso	Actividad liberada
13/03/2024		Se realiza la demolición de la placa en concreto de la zona fraturada en la zona de juegos infantiles	Actividad liberada
18/03/2024		Se inicia la instalación de geotextil 2400 para la zona de plazoleta en adoquin	Actividad liberada
18/03/2024		Se inicia la instalación de sub base granular reciclada en zona de plazoleta en adoquin	Actividad liberada
19/03/2024		Se inicia la instalación de base granular en zona de sendero de acceso y plazoleta en adoquin	En Ejecución
21/03/2024		Se realiza excavacion manual perimetral a la media luna de la zona de juegos infantiles para la instalacion de bordillo	En Ejecución
22/03/2024		Se realiza instalación de bordillo perimetral a la media luna de la zona de juegos infantiles	En Ejecución
22/03/2024		Se realiza instalación de base granular en zona de juegos infantiles	Actividad liberada
26/03/2024		Se realiza fundida de placa con refuerzo en malla de la zona de juegos infantiles y de los dados de anclaje de juegos	En Ejecución

Firma:		Firma:	
Nombre:	ING. LUZ STELLA QUINTERO	Nombre:	ING. FERNANDO MONDRAGON
Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	Cargo:	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA		INTERVENTORIA

2009
896

ANEXO 7. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS – NP

ESTADO	CONVENCION	
	APROBADO	AP
	RADICADO	RD
	OBSERVADO	OBS
	ANULADO	ANL
CIO	COTIZACION	COTZ

CONTROL DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO OBRA	3099 DE 2023	CONSORCIO PARQUES BOG
CONTRATO INTERVENTORÍA	3131 DE 2023	SOLIUM INGENIERIA SAS

CIO	ACTIVIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	ESTADO	FECHA	No. RADICADO	OBSERVACIONES
NP01	Espejo Cristal Incoloro 5mm (Sum+Inst)	M2	$ 220.150,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP02	Suministro E Instalacion De Banca Concretogrc21mpl-1.93mosquin Diseño Banca Mc	UND	$ 2.631.881,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP03	Lijada, Limp Y Pintura (Estacion Ruta De La Vida)	UND	$ 3.498.888,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP04	limpieza CercaneH=0.30M(Desm4Lad+limp-ret+rep4lad)	ML	$ 25.658,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP05	Demolic.Piso8aMesa6reneMarmo33x33yConst.de nuevo	ML	$ 113.838,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP06	Demolicion piso en granito pulido	M2	$ 17.722,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP07	GRANITO FUNDIDO Y PULIDO EN SITIO + DILAT.BRONCE.	M2	$ 151.436,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP08	Fumigación (Fungicida+Adherente) **	M2	$ 187,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP09	Capa Filtrante en Triturado 3/4"-1" + Compactón	M3	$ 195.882,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP10	Relleno en Subbase Granular Reciclada Tipo A	M3	$ 150.861,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP11	DESMONTE PISO DE CAUCHO(Traslago+Retiro)	M2	$ 8.631,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP12	Excavacion manual con retiro suelo Mando**	M3	$ 70.538,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP13	CerramientoConcretoImpacto h=2.5 + MallaNylon+Pilot	ML	$ 1.194.957,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP14	DESMONTE BEBEDEROS EXISTENTE INC RETIRO/ACARREO	UND	$ 41.756,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP15	Bebedero M-110 Inc.Dado 3000psi(Sumi+ Instal) **	UND	$ 3.718.827,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP16	GRAMA SINT. DESMONTE+RETIRO+DISPOSICION FINAL	M2	$ 21.287,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP17	GRAMA SINT MONOFIL60MM-FIFAPlinc arena+caucho+ins	M2	$ 166.439,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP18	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	$ 84.583,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP19	Desmonte carpintería metálica **	M2	$ 22.784,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP20	MALLA ESLABON. Cal.10; 2"+Pint (sum+inst)	M2	$ 84.530,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP21	Piso Caucho recicl 6cm (EPDM 1cm+SBR 5cm sum+inst)	M2	$ 883.138,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP22	Juegos Infantiles Rueda (Instalac)**	UND	$ 463.338,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP23	Lamina Policarbonato 8mm Calibre(sum+inst)	M2	$ 88.383,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP24	DEMOLICION MUROS 0.15 + Traslago	M2	$ 30.276,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP25	SUCCION, TRANSP. Y DISPOSICION FINAL DE LODOS	M3	$ 337.087,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP26	DESMONTE Y REINSTALACION LOSETA TIPO IDU + ARENA	M2	$ 177.000,00	AP	6/12/2023	Radicado física IDRD No. 20232100419092 el día 19-12-2023	Acta de fijación de precios no previstos No. 1
NP27	Desmonte y reinstalacion, pinetra general y arreglo, reposicion piezas inestables	UND	$ 854.388,00	AP	4/01/2024	Radicado física IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP28	Desmonte e instalac bordillo prefabricado a-80 **	ML	$ 53.738,00	AP	4/01/2024	Radicado física IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP29	Limp. estruct. metalica y pinetra esmalte+ anti**	M2	$ 25.418,00	AP	4/01/2024	Radicado física IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP30	Demolicion cielo raso modular ligera (cargue y ret	M2	$ 7.827,00	AP	4/01/2024	Radicado física IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP31	Valla normas generales campos deportivos 3,00m x 1,00m (incluye dados en concreto)	UND	$ 8.864.140,00	AP	4/01/2024	Radicado física IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP32	Desmonte,corte,reinstalac adoquin pegado con sumin	M2	$ 88.786,00	AP	4/01/2024	Radicado física IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP33	Marco+tapa(3mg+plat+acero+conc_3.000)caja 60x60cm (sum + inst)	UND	$ 223.488,00	AP	4/01/2024	Radicado física IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP34	Llave grival jardin 1/2" 60400	UND	$ 51.576,00	AP	4/01/2024	Radicado física IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP35	Pulida de piso tablon en granito	M2	$ 121.873,00	AP	4/01/2024	Radicado física IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP36	Recuperacion de granito fundido y pulido en sitio + dilat.bronce.	M2	$ 211.388,00	AP	4/01/2024	Radicado física IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP37	Suministro e instalación de tomacorriente GFCI 20 A	UND	$ 88.180,00	AP	4/01/2024	Radicado física IDRD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2

1010
~~845~~

NP38	Suministro e instalación de ducha eléctrica de 110v - 220v	UND	$ 156.791,00	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP39	Tablero/tdrsl-24 circ-conquerta-espacio-cacaltrado	UND	$ 572.823,03	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP40	Desmonte de luminaria para altura hasta 3 metros con escalera	UND	$ 14.775,00	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP41	Desmonte de luminaria altura mayor a 3 metros con andamio certificado	UND	$ 222.217,00	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP42	Instalación de luminaria escenario deportivo hasta 3 mts con escalera	UND	$ 15.586,00	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP43	Instalación de luminaria en altura con escalera tipo extensión altura superior a 4 mts	UND	$ 301.189,00	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP44	Instalación de luminaria escenario deportivo h=2 a 3 mts con andamio certificado	UND	$ 272.848,59	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP45	Instalación de luminaria alumb publica con plataforma trabajo altura	UND	$ 488.784,00	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP46	Desmontes lit de luminaria 400w, arranc, cond, radiactancia	UND	$ 21.698,00	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP47	Sum + inst caja rowelt 4 salidas 3/4"-2.400 (4x4)	UND	$ 25.049,00	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP48	Tecatizador 3 x 60 amp (sum+inst.)	UND	$ 125.580,00	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP49	Acometida en cable aluminio 3#4 + 1#4 awg 600v	UND	$ 31.903,00	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP50	Acometida de cable en aluminio 4(3X350) F + 1X2/0 T THHN-AWG (sum+instalación)	ML	$ 338.147,00	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP51	Simulación fotométrica de calibres	UND	$ 1.380.804,08	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP52	Apuntamiento de proyectores según diseño de iluminación	UND	$ 34.688,00	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP53	Desmonte de luminaria en altura con escalera tipo extensión altura superior a 4 mts	UND	$ 253.429,00	AP	4/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100004002 el día 05-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 2
NP54	Estación de equilibrio Parkour 6 Elementos	UND	$ 157.088.610,00	AP	11/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100021952 el día 23-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 3
NP55	Estación de equilibrio Parkour 5 Elementos	UND	$ 204 109 484,00	AP	11/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100021952 el día 23-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 3
NP56	Estación de equilibrio Parkour 10 Elementos	UND	$ 296 370.756,00	AP	11/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100021952 el día 23-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 3
NP57	Estación de equilibrio Parkour 11 Elementos	UND	$ 188.980.438,00	AP	11/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100021952 el día 23-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 3
NP58	Estación de equilibrio Parkour 13 Elementos,	UND	$ 239 813.838,00	AP	11/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100021952 el día 23-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 3
NP59	Unión universal pvc presion sch 80 3" (sum + instalación)	UND	$ 195.190,00	AP	25/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031272 el día 30-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 4
NP60	Tubería pvc-p sch-80 3" (sum + instalación)	ML	$ 98.942,00	AP	25/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031272 el día 30-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 4
NP61	Adaptador pvcp macho 3" sch80 (sum + instalación)	UND	$ 78.428,00	AP	25/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031272 el día 30-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 4
NP62	Unión lisa pvc presion sch 80 3" (sum + instalación)	UND	$ 88.930,00	AP	25/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031272 el día 30-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 4
NP63	Tee pvc presion sch 80 3" (sum + instalación)	UND	$ 95.930,00	AP	25/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031272 el día 30-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 4
NP64	Tubo pvc presion sch 80 4" (sum + instalación)	ML	$ 129.367,00	AP	25/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031272 el día 30-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 4
NP65	Tee pvc presion sch 80 4" (sum + instalación)	UND	$ 113.736,00	AP	25/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031272 el día 30-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 4
NP66	Reducción pvc presion sch 80 4x3" (sum + instalación)	UND	$ 125.957,00	AP	25/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031272 el día 30-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 4
NP67	Reducción pvc presion sch 80 2x1" (sum + instalación)	UND	$ 48.287,00	AP	25/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031272 el día 30-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 4
NP68	Unión lisa pvc presion sch 80 4" (sum + instalación)	UND	$ 88.882,00	AP	25/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031272 el día 30-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 4
NP69	Unión lisa pvc presion sch 80 1" (sum + instalación)	UND	$ 18.348,00	AP	25/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031272 el día 30-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 4
NP70	Unión universal pvc presion sch 80 4" (sum + instalación)	UND	$ 214.863,00	AP	25/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031272 el día 30-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 4
NP71	Repartado juego balancin marca; galapin (suministro e instalacion)	UND	$ 2.700.000,00	AP	30/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031892 el día 31-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP72	Asiento para juego muelle (incluye tornillería tapones y soporte incluye sum+ins)	UND	$ 3.158.406,00	AP	30/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031892 el día 31-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP73	Barra para juego muelle (incluye tornillería tapones) suministro + instalación	UND	$ 770.530,00	AP	30/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031892 el día 31-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP74	Cable encauchetado 3x4 (sum+ins)	ML	$ 79.416,00	AP	30/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031892 el día 31-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP75	Breaker enchufable de 2x20a, 10 ka, 208 v (sum+ins)	UND	$ 23.717,00	AP	30/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031892 el día 31-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP76	Luminaria led 320w (sum)5700k - 117.000lm - ip66 - ik08 (sum+ins)	UND	$ 8.254.726,00	AP	30/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031892 el día 31-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP77	Luminaria led 580w (sum)5700k - 117.000lm - ip66 - ik08 (sum+ins)	UND	$ 5.066.668,00	AP	30/01/2024	Radicado física IORD No. 20242100031892 el día 31-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5

NP78	Sistema de sonido para parque o escenario deportivo - suministro	UND	$ 207.664.102,00	AP	30/01/2024	Radicado física IDRD No. 20242100031892 el día 31-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP79	Sistema de sonido para parque o escenario deportivo - instalacion	UND	$ 25.966.907,00	AP	30/01/2024	Radicado física IDRD No. 20242100031892 el día 31-01-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 5
NP80	Suministro e instalación baranda pasamanos m-80 con platina y chazo	ML	$ 394.154,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP81	Nivelación y compactación de subrasante (mano+cilin	M2	$ 1.396,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP82	Suministro e instalación baranda m-81 anclada con platina y chazo	ML	$ 398.240,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP83	Cerrammalla m71-fortinet-h=2m, c8m viga+pilotin.** (sum + inst)	ML	$ 372.089,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP84	Desmonte y retiro malla fortinet h=2.00m	ML	$ 16.345,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP85	Cargue y reubicación de materiales granulares existentes (arena tipo paisar / gravilla 3/4")	M3	$ 62.589,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP86	Complemento en malla nylon h= 2,50 m sobre cerramiento (sum +inst)	ML	$ 181.068,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP87	Desmonte cerramiento existente (malla eslabonada+ alambre de púas+ elementos verticales de madera)	M2	$ 13.782,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP88	Juego de cuerdas estrella 2 a 6 años cap: 21 niños (sum + inst)	UND	$ 255.956.289,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP89	Juego balancin doble mas 4años cap:2 niños (sum + inst)	UND	$ 30.015.401,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP90	Juegocuerdaspelledre 5-12a%escap:40niños (sum+ins)	UND	$ 233.682.193,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP91	Piso caucho reciclado 11cm (epdm 1cm+cbr 10cm sum+ins	M2	$ 1.011.292,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP92	Piso caucho reciclado 9cm (epdm 1cm+cbr 8cm sum+inst)	M2	$ 829.477,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP93	Sardinel prefab.a-10 a=0.30 h=0.50+0.8 sin estraqu (sum+ins)	ML	$ 85.177,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP94	Demolición cerramiento contra impacto h=5.0m **	ML	$ 200.883,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP95	Cerram malla nylon h= 5 m+ pilastras (sum +inst)	ML	$ 446.074,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP96	Demarcacion pintura trafico tank e=0.05	M2	$ 4.057,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP97	Desmonte estruc. De cancha multiple + retiro	JGO	$ 334.566,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP98	Pintura esmalte sintética altura hasta 2,00m	M2	$ 23.088,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP99	Señaletica de normas generales para zonas infantiles y area biosaludables 130x80 cmx*2 caras (suministro e instalacion)	UND	$ 1.603.183,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP100	Suministro e instalac. Tapa tanza corriente** (sum+inst)	UND	$ 7.356,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP101	Cerramiento contra impacto IDRD h= $ ** (sum + ins)	ML	$ 1.608.951,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP102	Pintura baranda cerramientos m-83 (sum + ins)	ML	$ 28.574,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP103	Pintura electrostatica para señaletica (sum+ins)	M2	$ 52.090,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP104	Instalacion de señal tág-s (0,60*0,70 dos caras)	UN	$ 95.418,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP105	Desmonte, cambio de laminas + vindas y reinstalacion de señal vella de normas generales (0,80*1,20 dos caras)	UN	$ 1.372.049,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP106	Instalacion de señal sc-80 (0,80*0,40 dos caras)	UN	$ 69.020,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP107	Poral para baranda cerramiento (sum +inst)	ML	$ 65.588,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP108	Sumideroca]a lateral-100 cn ladrillo con excavac	UND	$ 1.178.164,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP109	Tela para cerramiento verde oliva h=2.00 (suministro+instalacion)	ML	$ 10.857,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP110	Desmonce y retiro de tela verde h=2.00	ML	$ 6.432,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP111	Rodadura asfaltica mdc-19 e=0.08 compactado ** (sum+inst)	M2	$ 98.172,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP112	Rodadura asfaltica mdc-12 e=0.08 compactado ** (sum+inst)	M2	$ 98.172,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP113	Rodadura asfaltica 1350 e=0.05 compactado ** (sum+inst)	M2	$ 70.929,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP114	Señal poste direccional (sumin + insta) h.=3.50	UND	$ 428.697,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP115	Pintura anticorrosiva-esmalte tubería 1 1/4"	ML	$ 12.708,00	AP	1/03/2024	Radicado física IDRD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6

NP116	Pintura anticorrosiva+esmalte tubería 4"	ML	$ 25.821,00	AP	1/03/2024	Radicado física IORD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP117	Instalacion de luminaria escenario deportivo superior a 4 mts con andamio certificado	UNO	$ 382.308,00	AP	1/03/2024	Radicado física IORD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP118	Cruceta de 2.40m con abrazadera para 4 reflectores (sum + inst)	UNO	$ 409.908,00	AP	1/03/2024	Radicado física IORD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstas No. 6
NP119	Tubería galvanizada conduit 3/4 " sum + inst	ML	$ 31.017,00	AP	1/03/2024	Radicado física IORD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP120	Instalación de luminaria escenario deportivo h=2 a 3 mts con andamio certificado	UNO	$ 272.846,00	AP	1/03/2024	Radicado física IORD No. 20242100100002 el día 19-03-2024	Acta de fijación de precios no previstos No. 6
NP121	Luminaria tipo led caracteristicas de iluminación tipo proyector 200w (sum+ins)	UN	$ 1.391.352,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP122	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 1 (incluye maceras en concreto = 0,60*0,40*0,30, hidroretenedor y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	$ 515.178,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP123	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 2 (incluye hidroretenedor y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	$ 405.292,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP124	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 3 (incluye hidroretenedor y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	$ 426.065,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP125	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 4 (incluye maceras en concreto = 0,60*0,40*0,30, hidroretenedor y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	$ 511.388,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP126	Suministro e instalación de fachada vegetal tipo 5 (incluye hidroretenedor y cuadrilla de mantenimiento por garantía de 1 mes)	M2	$ 414.013,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP127	Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,77 ancho abajo 6,40 largo 2 metro (SUM+INS)	UN	$ 4.864.970,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP128	Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,50 ancho abajo 5,53 largo 1,90 (SUM+INS)	UN	$ 4.469.051,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP129	Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,50 ancho abajo 5,50 largo 1,87 (SUM+INS)	UN	$ 4.469.051,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP130	Colchoneta protector para poste ancho arriba 2,47 ancho abajo 5,85 largo 2 metros (SUM+INS)	UN	$ 4.925.851,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP131	Caja metalic.de paso(20x20x15cm) lam.cal.18+pint-electros (sum+ins)	UN	$ 88.697,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP132	Adhesivo vidrios vinilo papel microperforado (sum+ins)	M2	$ 192.099,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP133	Piso caucho recid 9cm (epdm 1cm+sbr 8cm sum+inst)	UN	$ 11.541,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP134	Accesorios pvc.p el 1 1/4" (sum + instalación)	UN	$ 1.563.884,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP135	Simulación fotométrica para canchas de futbol 5	UN	$ 84.683,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP136	Válvula de bola 3/2" (sum+inst)	UN	$ 179.619,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP137	Válvula de bola 1 1/4" (sum+inst)	M2	$ 83.896,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP138	Adoquín concreto 8 cm + base de arena (sum+inst)	ML	$ 103.017,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP139	Bordillo Zarpa e=0.15;a=0.40;h=0.35 m -3000 psiobra (Sum+Inst)	UN	$ 43.023,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP140	Buje 1 1/2" x 1 1/4" Sch80 PAVCO ** (Sum+Inst)	UN	$ 740.318,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP141	Caja de inspección .80x.80 h=1.0+encav(ESPEC/IORD)	M3	$ 545.885,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP142	Concreto ciclópeo 3000 psi Cimentac+formaleta **	M2	$ 83.865,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP143	Impermeabili espaldon con igol imprim.on y duroo **	UN	$ 161.832,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP144	Instalación Cicloparqueadero en Concreto + Señal	UN	$ 438.442,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP145	Reparación de goteras existentes en cubiertas (sum+ins)	M2	$ 84.804,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP146	Mortero de rehabilitación + sikatop 121 o similar (espesor de 1 a 2 cm)	M3	$ 159.032,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP147	Relleno en rajón sum+ins;	UN	$ 909.188,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP148	Desmonte, arregle, reposición de piezas para módulos biosaludables grecerremanos, pintura e instalación	M2	$ 43.849,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP149	Pintura poliuretano brocha + rodillo (sum+instalac)	M2	$ 756.937,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP150	Piso Caucho recid 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm (sum+inst)	M2	$ 849.345,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP151	Puertahojaentab.Lam.caldrelledcal.18marcacal.18 (SUM+INS)	M2	$ 826.111,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7

NP152	Puertahojaentreb Lam.caldrolledcal 16 (SUM+INS)	M3	$ 65.430,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP153	Relleno en tierra negra (Suministro + Transporte)	ML	$ 82.536,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP154	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmastm A-500 Grad-C (SUM+INS)	UN	$ 42.217,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP155	Desmonte de Durómetro tipo push	M2	$ 38.536,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP156	Templada y fijación de malla eslabonada en estructura existente (SUM+INS)	ML	$ 262.214,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP157	Filtrotrances(Trinchera)b=0.40minmax=1.20m tub160mm (sum+ins)	M2	$ 324.500,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP158	Modulo complemento en malla eslabonada para baranda (sum+ins)	UND	$ 19.631.764,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP159	Suministro e instalación de poste tronconico de 14m + canastilla para 12 reflectores	UN	$ 70.284.076,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP160	Transformador seco 75 kva con 380/220v (sum+ins)	ML	$ 120.603,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP161	Acometida 3#250 mcm +1#2/0 awc aluminio	ML	$ 264.273,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP162	Acometida 3(3#250 mcm)+1#2/0 awc aluminio	UN	$ 581.480,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP163	Adecuación de modulo sanitario (Incluye desmonta y reinstalación de cubierta + desmonte y reinstalación de rampas de ingreso + carta y desconexión de tuberías hidráulicas, sanitarias y eléctricas)	UN	$ 1.099.534,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP164	Estructura superior canastilla de protección para bajos 1,35m *0,67m + incluye pintura (sum+ins)	UN	$ 3.440.043,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP165	Estructura inferior base canastilla de protección para bajos 2,65m * 1,25m + pintura (sum+ins)	UN	$ 1.812.968,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP166	Estructura inferior base canastilla de protección para bajos 1,36m *0,96m + pintura (sum+ins)	UN	$ 469.557,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP167	Desmonte traslado y reinstalación de estructura módulo de factura	UN	$ 118.648,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP168	Levantamiento de información eléctrica para escenarios deportivos (levantamiento de cajas de inspección, red existente, luminarias, toma de medida de cargas y voltajes, digitalización de información y entrega de informe eléctrico del levantamiento)	UN	$ 4.194.362,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP169	Pintura sintética + anticorrosivo de estructura pérgola y columnas (Incluye desmonte y reinstalación de cubierta en policarbonato con andamio) sum+ins	M2	$ 89.885,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP170	Pedestal en concreto de 0.30x0.30x0.50 para anclaje de estructura. Incluye excavación, dado en concreto, refuerzo interno, elementos de anclaje y platina"	UN	$ 134.752,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP171	Juego circuito red muro escalar rodadero 3-12a/loca30m	UN	$ 133.797.844,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP172	Mantenimiento de ascensores con capacidad para 675 kg, de 2 a 3 paradas por ascensor (Schindler)	MES	$ 605.754,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP173	Mantenimiento de ascensores con capacidad para 675 kg, 4 paradas por ascensor (Schindler)	MES	$ 618.201,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP174	Mantenimiento de ascensores con capacidad para 675 kg, 6 paradas por ascensor (Schindler)	MES	$ 713.628,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP175	Mantenimiento de ascensores con capacidad DE 750 A 1000 kg, 2 paradas por ascensor (Schindler)	MES	$ 674.212,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7
NP176	Mantenimiento de ascensores con capacidad para 7 personas o 1000 kg por ascensor (Otis)	MES	$ 416.500,00	AP	13/03/2024		Acta de fijación de precios no previstos No. 7

BOGOTÁ

FECHA		
01	MARZO	2024
dia	mes	año
Página	1	de 11

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 6

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

OBJETO DEL CONTRATO

"CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD"

CONTRATISTA INTERVENTORÍA (*INTERVENTOR*): SOLUN INGENIERIA SAS

CONTRATISTA CONSULTORÍA Y/O OBRA (CONTRATISTA): CONSORCIO PARQUES BOG

SUPERVISOR: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO

APOYO A LA SUPERVISIÓN: ANGELICA MARIA ROMERO HERNANDEZ

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: SIETE (07) MESES

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: N/A

PLAZO TOTAL INICIAL: SIETE (07) MESES

FECHA DE INICIO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 11 DE ABRIL DE 2024

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
	$ 10.981.251.399,33	25,06%	$ 2.751.901.600,67	$ 13.733.153.000,00

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 13.733.153.000,00

TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	CONSULTORÍA	OBRA	OBSERVACIONES
La Vida	01-012	Usaquen	Calle 165 # 7-76		X	
Servita	01-023	Usaquen	Calle 165 No 14 - 62 *Calle 165 No 7-36		X	
Nueva Autopista	01-054	Usaquen	Carrera 20 # 136- 81		X	
Alta Blanca	01-075	Usaquen	Carrera 8 A # 158- 04		X	
El Country	01-1000	Usaquen	Avenida Calle 127 # 11 D -60		X	
Gustavo Uribe	02-004	Chapinero	Carrera 1 # 70-11		X	
Canal El Virrey- El Chico	02-014	Chapinero	Calle 88 # 13 A -40		X	
Sucre O Hippies	02-018	Chapinero	Calle 60 # 7-49		X	
Los Laches La Mina	03-014	Santafe	Carrera 8 Este # 48- 55		X	
Parque Nacional	03-035	Santafe	Carrera 7 # 37 -04		X	
Sendero A Monserrate	03-051	Santafe	no tiene nomenclatura		X	
Las Cruces	03-036	Santafe	Carrera 5A # 1- 00		X	
Independencia	03-039	Santafe	Calle 24 # 6A -01		X	
Tercer Milenio	03-053	Santafe	Avenida Jimenez hasta Carrera Calle 6 * Calle 6 Carrera 10		X	
Plaza De Toros	03-083	Santafe	Carrera 5 # 26B- 72		X	
Morisba	04-013	San Cristobal	Carrera 16 B Este # 42 C -55 Sur		X	
Villa De Los Alpes	04-075	San Cristobal	Carrera 3 B # 35 -04 Sur		X	
Gaitan Cortes	04-103	San Cristobal	Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E		X	
La Victoria	04-122	San Cristobal	Calle 37A Bis Sur # 2A- 04		X	
San Cristobal	04-127	San Cristobal	Calle 17A Sur # 2A- 50 E		X	
Cafe San Cristobal		San Cristobal			X	
Deportivo Primo Mayo	04-196	San Cristobal	Calle 19 Sur # 5 -40		X	
La Aurora II	05-002	Usme	Diagonal 68 F Sur # 14D- 45		X	
Valles De Cafam	05-003	Usme	Calle 82 Sur # 14D -67		X	
La Andrea	05-004	Usme	Calle 81 BIS Sur # 8A- 24		X	
El Virrey Sur	05-015	Usme	Calle 96 B Sur # 8- 10		X	
Fenaco	05-056	Usme	Calle 90 Sur # 6 -00		X	

BOGOTÁ

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.º 6

FECHA		
01	MARZO	2024
dd	mm	aaaa

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3039 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Villa Alemana	05-087	Usme	Calle 100 BIS Sur # 1 -17		X	
San Cayetano	05-236	Usme	Carrera 15 Este # 74- 00 Sur		X	
Nuevo Mzzu	06-017	Tunjuelito	Carrera 61 B # 52A -20 Sur		X	
El Tunal	06-063	Tunjuelito	Calle 48 C Sur # 22D -81		X	
Calle Tunal		Tunjuelito	Calle 48 B Sur 22 A 70		X	
Laurales Naranjos	07-035	Bosa	Calle 70 F S # 80 J- 50		X	
Clarelandia	07-163	Bosa	Calle 58 J Sur # 80 D -10		X	
Parque Del Rio Maryland Urbanizador	07-164	Bosa	Carrera 86 # 74- 65 S		X	
Palestina	07-165	Bosa	Calle 68 Sur No 9-05 / Calle 68sur No 81G-05 * Calle 68 Sur		X	
El Recreo	07-260	Bosa	Carrera 100 Calle 20		X	
Tibanica	07-274	Bosa	Calle 74 Sur # 77 I -31		X	
Porvenir	07-381	Bosa	Avenida Calle 54 S # 97-37		X	
Autopista Sur (Pevosi)	07-152	Bosa	Carrera 72 # 57 H -20 S		X	
La Esperanza	07-273	Bosa	Pparte central Calle 75 BIS Sur y Calle 76 Sur y entra		X	
Timiza Sector Villa Del Rio	07-036	Bosa	Carrera 68 D # 54 A -03 Sur		X	
Patio Bonito	08-034	Kennedy	Carrera 101 Calle 34 Bis Sur / Carrera 101 No 34 Bis - 02		X	
El Tintal	08-109	Kennedy	Calle 6A # 86- 20		X	
Porvenir Gibraltar Prado	08-110	Kennedy	Calle 48 Sur Con Prolongacion De La Carrera 100b		X	
Bellavista-Olindalito	08-144	Kennedy	Carrera 96 # 41- 01 Sur		X	
Castilla	08-200	Kennedy	Carrera 75 # 6 A- 31		X	
La Igualdad	08-212	Kennedy	Carrera 68 F # 3A -30		X	
Timiza	08-219	Kennedy	Calle 40 H Sur # 70A -81		X	
Cayetano Cañizares	08-241	Kennedy	Carrera 80 40 56 Sur		X	
La Amistad	08-355	Kennedy	Transversal 78 No 41-10 Sur * Transv 78J No 41 - 10 Sur		X	
Gilma Gimanez (Las Margaritas)	08-552	Kennedy	Calle 51 A Sur # 82 A- 15		X	
San Ignacio	08-781	Kennedy	Cl 6c con cr 94		X	
Marsella	08-086	Kennedy	Carrera 88 No 8-28		X	
Estadio De Techo	08-554	Kennedy			X	
Carmen De La Laguna	09-020	Fontibon	Diagonal 16 F Bis # 104A-15		X	
Canal Boyaca	09-050	Fontibon	Calle 23 G # 73 F- 04		X	
Atahualpa	09-104	Fontibon	Avenida Calle 24 # 113-51		X	
Sauzalito	09-111	Fontibon	Transversal 68 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal		X	
Zona Franca	09-125	Fontibon	Diagonal 12 C Carrera 109		X	
Villa Luz	10-018	Engativa	Carrera 77 A # 64 B- 03		X	
Villas De Granada	10-102	Engativa	Calle 77 # 112 -50		X	
El Carmelo	10-188	Engativa	Carrera 104 # 71 C- 23		X	
Juan Amarillo	10-171	Engativa	Avenida Calle 90 # 110- 06		X	
Tabors	10-192	Engativa	Calle 74 #76- 62		X	
Bonanza	10-215	Engativa	Carrera 70 F # 75 -60		X	
La Serena	10-223	Engativa	Calle 90 A # 85- 70		X	
San Andres	10-234	Engativa	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a		X	
Unidad Deportiva El Salitre Simon Bolivar	10-290	Engativa	Avenida Calle 63 # 68 -45		X	
La Florida	10-311	Engativa	Calle 64 # 126- 90		X	
Por Salitre	10-531	Engativa	Av Calle 80 No 119-60		X	
Canal Cordoba	11-003	Suba	Avenida Carrera 55 # 118- 18		X	
San José De Bavaria	11-078	Suba	Calle 170 # 67 -51		X	

1013
900

BOGOTÁ

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 6

FECHA		
01	MARZO	2024
dia	mes	año
Página 3	de	11

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Morato	11-113	Suba	Calle 107 # 70A- 34		X	
La Gaitana	11-205	Suba	Transversal 126 # 134- 66		X	
Tibabuyes	11-212	Suba	Calle 139 No 122-48 / Calle 139 No 127C - 48 * Calle 139 No		X	
Fontanar Del Rio	11-368	Suba	Diagonal 147 # 141A -42		X	
Calle Fontanar Del Rio		Suba	Direccion diagonal 145 # 138 a 10		X	
Atabanza	11-796	Suba	ENTRE LA CALLE 125 A, La AC 125 A y las Unidades		X	
Casa Blanca	11-069	Suba	Carrera 80 # 145-50		X	
Ciudadela Cafam 8	11-1101	Suba	Carrera 146 No 142A 60		X	
Cometas	11-204	Suba	Cerros de suba cuchilla		X	
Calle Cometas		Suba	Cerros de suba cuchilla		X	
Canal Río Negro	12-002	Barrios Unidos	Calle 90 # 60 B- 44		X	
Alcazares	12-015	Barrios Unidos	Avenida Carrera 24 # 71 - 25		X	
Gimnasio Del Norte	12-023	Barrios Unidos	Calle 6 3B # 27B - 70		X	
Prd El Salitre -Ucsd	12-081	Barrios Unidos	Carrera 60 # 63 -75		X	
Plaza De Bmx Prd	12-117	Barrios Unidos	Avenida Carrera 63 # 60 -80		X	
Parque De Los Novios	12-082	Barrios Unidos	Avenida Calle 63 # 45 - 10		X	
Complejo Acuatico	12-1000	Barrios Unidos	Avenida Calle 63 # 45-10		X	
Palacio De Los Deportes	12-125	Barrios Unidos	Avenida Calle 63 # 45 -10		X	
Parque De Los Niños	12-141	Barrios Unidos	Avenida Carrera 63 # 60 -80		X	
La Estacion	12-093	Barrios Unidos	Avenida Calle 72 No 23-40		X	
Nicolas De Federman 3	13-038	Teusaquillo	Carrera 36A # 53- 22		X	
Virgilio Barco	13-086	Teusaquillo	Avenida Carrera 60 # 57- 60		X	
Simon Bolivar	13-089	Teusaquillo	Avenida Carrera 58 # 53-36		X	
Estadio Nemecio Camacho El Campin	13-122	Teusaquillo	Calle 53 B # 28A- 10		X	
El Campincito-Ciad	13-123	Teusaquillo	Calle 53 B # 28A- 10		X	
Santa Isabel	14-008	Martires	Avenida Carrera 27 # 1 C- 02		X	
Eduardo Santos	14-030	Martires	Calle 4A Bis # 18 B- 30		X	
El Renacimiento - Parque Cementerio	14-036	Martires	Avenida Calle 29 # 19 B - 55		X	
Reconciliación	14-037	Martires	Calle 26 Carrera 20 Y 32		X	
Ciudad Jardin	15-027	Antonio Nariño	Carrera 11 B # 11 -68 Sur		X	
Villa Mayor Cementerio	15-036	Antonio Nariño	Calle 31 Sur # 30- 09 Sur		X	
La Fragua	15-040	Antonio Nariño	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur		X	
Unidad Deportiva Alqueria	16-024	Puente Aranda	Calle 43 Sur # 52- 20		X	
Milenta Tejar San Eusebio	16-089	Puente Aranda	Carrera 54 # 18- 23 Sur		X	
Ciudad Montes	16-112	Puente Aranda	Carrera 39 # 10- 75 Sur		X	
El Jazmin	16-204	Puente Aranda	Avenida Carrera 50 # 1 D- 28		X	
Venegues Predio	16-221	Puente Aranda	Kr 34 3- 97		X	
Industrial Los Ejidos	16-416	Puente Aranda	Calle 11A No 36-56		X	
La Concordia	17-008	Candelaria	Calle 12 B Bis A # 0- 06		X	
Bosque San Carlos	18-028	Rafael Uribe	Carrera 12 D # 33- 44 Sur		X	
Diana Turbay	18-031	Rafael Uribe	Calle 48 X Sur # 28 -00 E		X	
Pijaos Jorge E.Caballer	18-090	Rafael Uribe	Carrera 10 D # 34- 50 Sur		X	
Los Molinos II	18-182	Rafael Uribe	Calle 48 P Bis C Sur # 4-30		X	
Quiroga	18-235	Rafael Uribe	Calle 31B Sur No 22-07		X	
Parques Estadio Olaye Herrera	18-207	Rafael Uribe	Calle 22 Sur # 21 -09		X	
Gimnasio Del Surp Arqua Estadio Olaye Herrera	18-452	Rafael Uribe	Carrera 22 Sur No 21-09 / Calle 22 sur hasta 27 Sur Avenida 19 * Carrera 21 No 25-35 Sur		X	

BOGOTÁ

FECHA		
01	MARZO	2024
dia	mes	año
Página	4	de 11

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 6

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Santa Lucia	18-073	Rafael Uribe	Diagonal 36 Sur Carrera 18 B		X	
Arborizadora Alta	19-188	Ciudad Bolivar	Diagonal 73 sur No 40-80		X	
Candelaria La Nueva	19-189	Ciudad Bolivar	Calle 62S Sur No 22-47 * Calle 62 Sur No 22A-27		X	
Arborizadora Alta Metro	19-229	Ciudad Bolivar	Diagonal 79 Bis Calle 72f Sur Transversal 34b		X	
Meissen	19-230	Ciudad Bolivar	Calle 62 Bis Sur # 18 C -32		X	
La Estancia	19-231	Ciudad Bolivar	Calle 58 A Sur # 66-00		X	
Ilimani (Paraiso)	19-346	Ciudad Bolivar	Calle 74 B Sur # 27 M- 06		X	
Mirador Ilimani	18-788	Ciudad Bolivar			X	
La Joya	19-349	Ciudad Bolivar	Carrera 18 H Bis A # 80 B- 13		X	
El Taller	19-348	Ciudad Bolivar	Avenida Calle 68 Sur # 70 D -11		X	
Buena Vista Porvenir	19-347	Ciudad Bolivar	Carrera 17 H Bis # 74 B- 68 Sur		X	
Altos De La Estancia	19-756	Ciudad Bolivar	Calle 68 Sur # 75 H -83		X	
Sierra Morena	19-190	Ciudad Bolivar	Calle 75 A Sur # 73- 08		X	

MODIFICACIONES

PLAZO						ADICIONES		
TIPO Y N.	TIEMPO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	DESDE	HASTA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	VALOR
SUSPENSION 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
PRORROGA 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ -
							TOTAL ADICIONES:	$ -

CONDICIONES ACTUALIZADAS

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO: SIETE (07) MESES

PLAZO DE LIQUIDACIÓN: N/A.

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA DEL CONTRATO: 11 DE ABRIL DE 2024

VALORES FINALES

VALOR FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	VALOR FINAL OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
	$ 10.981.251.399,33	25,06%	$ 2.751.901.600,67	$ 13.733.153.000,00

VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO:	$ 13.733.153.000,00

TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

En Bogotá D.C ; a los UN (01) días del mes de MARZO de 2024 se reunieron:

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA actuando en representación del CONTRATISTA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA actuando en representación del INTERVENTOR

con el fin de evaluar y someter a estudio del IDRD las ACTIVIDADES NO PREVISTAS que se prevean técnicamente necesarias para una correcta ejecución del contrato, las cuales fueron evaluadas y aprobadas por la interventoría una vez cuantificadas, realizados los APU's (si son necesarios) y presupuestadas por el contratista. La interventoría hace entrega de los documentos correspondientes para revisión y aprobación final por parte de la entidad y con base en lo anterior, se concluye que las modificaciones planteadas:

Producen incremento en el valor del contrato? SI ☐ NO ☑

ACTIVIDADES NO PREVISTAS O COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO

ITEM	ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP 80	Suministro e instalación baranda pasamanos m-80 con platina y chazo	ML	1,00	$ 394.154,00	$ 394.154,00
NP 81	Nivelación y compactación de subrasante (mdro+cilin	M2	1,00	$ 1.396,00	$ 1.396,00
NP 82	Suministro e instalación baranda m-81 anclada con platina y chazo	ML	1,00	$ 398.240,00	$ 398.240,00
NP 83	Cerramalla m71-fortinet-h=2m, c/tn viga+pilotin.** (sum + inst)	ML	1,00	$ 372.089,00	$ 372.089,00
NP 84	Desmonte y retiro malla fortinet h=2.00m	ML	1,00	$ 16.345,00	$ 16.345,00

2024

BOGOTÁ

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.º 6

FECHA		
01	MARZO	2024
dd	mm	aaaa
Página 5	de	11

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

NP 85	Cargue y reubicación de materiales granulares existentes (arena tipo patder / gravilla 3/4")	M3	1,00	$ 62.569,00	$ 62.569,00
NP 86	Complemento en malla nylon h= 2,50 m sobre cerramiento (sum +inst)	ML	1,00	$ 181.099,00	$ 181.099,00
NP 87	Desmonte cerramiento existente (malla eslabonada+ alambre de púas+ elementos verticales de madera)	M2	1,00	$ 13.782,00	$ 13.782,00
NP 88	Juego de cuerdas estrella 2 a 6 años cap: 21 niños (sum + inst)	UND	1,00	$ 253.956.289,00	$ 253.956.289,00
NP 89	Juego balancin doble mas 4años cap:2 niños (sum + inst)	UND	1,00	$ 30.015.401,00	$ 30.015.401,00
NP 90	Juegocuerdaspoliedro 5-12añoscap:40niños (sum+ins)	UND	1,00	$ 223.682.193,00	$ 223.682.193,00
NP 91	Piso caucho recid 11cm (epdm 1cm+sbr 10cm sum+ins	M2	1,00	$ 1.011.292,00	$ 1.011.292,00
NP 92	Piso caucho recid 9cm (epdm 1cm+sbr 8cm sum+inst)	M2	1,00	$ 889.477,00	$ 889.477,00
NP 93	Sardinel prefabr-10 a=0,20 h=0,50m=0,8 sin straqu (sum+ins)	ML	1,00	$ 85.177,00	$ 85.177,00
NP 94	Demolición cerramiento contra impacto h=5,0m **	ML	1,00	$ 200.883,00	$ 200.883,00
NP 95	Cerram malla nylon h= 5 m+ pilotines (sum +inst)	ML	1,00	$ 446.074,00	$ 446.074,00
NP 96	Demarcacion pintura trafico tenis a=0,05	M2	1,00	$ 4.057,00	$ 4.057,00
NP 97	Desmonte estruc. De cancha multiple + retiro	JGO	1,00	$ 334.566,00	$ 334.566,00
NP 98	Pintura esmalte sintético altura hasta 2,00m	M2	1,00	$ 23.068,00	$ 23.068,00
NP 99	Señaletica de normas generales para zonas infantiles y zona biosaludables 120x80 cmc*2 caras (suministro e instalacion)	UND	1,00	$ 1.603.183,00	$ 1.603.183,00
NP 100	Suministro e instalac. Tapa toma corriente** (sum+inst)	UND	1,00	$ 7.356,00	$ 7.356,00
NP 101	Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 ** (sum + ins)	ML	1,00	$ 1.608.951,00	$ 1.608.951,00
NP 102	Pintura baranda cerramientos m-83 (sun + ins)	ML	1,00	$ 28.574,00	$ 28.574,00
NP 103	Pintura electrostatica para señaletica (sum+ins)	M2	1,00	$ 52.080,00	$ 52.080,00
NP 104	Instalacion de señal idg-e (0,60*0,70 dos caras)	UN	1,00	$ 85.418,00	$ 85.418,00
NP 105	Desmonte, cambio de tarjetas + vinilos y reinstalacion de señal valla de normas generales (0,80*1,20 dos caras)	UN	1,00	$ 1.375.224,00	$ 1.375.224,00
NP 106	Instalacion de señal sc-80 (0,30*0,40 dos caras)	UN	1,00	$ 69.020,00	$ 69.020,00
NP 107	Panel para baranda cerramiento (sum +inst)	ML	1,00	$ 65.588,00	$ 65.588,00
NP 108	Sumideracoaje tasanist-100 en ladrillo con excavac	UND	1,00	$ 1.178.166,00	$ 1.178.166,00
NP 109	Tela para cerramiento verde oliva h=2,00 (suministro+instalacion)	ML	1,00	$ 10.897,00	$ 10.897,00
NP 110	Desmonte y retiro de tela verde h=2,00	ML	1,00	$ 6.432,00	$ 6.432,00
NP 111	Rodadura estabilizc mdc-19 e=0,08 compactado ** (sum+inst)	M2	1,00	$ 98.172,00	$ 98.172,00

BOGOTÁ
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 6

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

FECHA		
01	MARZO	2024
dia	mes	año
Página 6	de	11

CONTRATO No 3099 (Numero Orden de) DE 2023 (año de suscripción) TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA (Obra Publica, Consultoria, Interventoria)

NP 112	Rodadura asfáltica mdc-12 e=0.08 compactado ** (sum+inst)	M2	1,00	$ 98.172,00	$ 98.172,00
NP 113	Rodadura asfáltica 1350 e=0.05 compactado ** (sum+inst)	M2	1,00	$ 70.929,00	$ 70.929,00
NP 114	Señal poste direccional (suminº + Insta) h.=3.50	UND	1,00	$ 428.697,00	$ 428.697,00
NP 115	Pintura anticorrosivo+esmalte tuberia 1 1/4"	ML	1,00	$ 12.708,00	$ 12.708,00
NP 116	Pintura anticorrosivo+esmalte tuberia 4"	ML	1,00	$ 25.821,00	$ 25.821,00
NP 117	Instalacion de luminaria escenario deportivo superior a 4 mts con andamio certificado	UND	1,00	$ 382.308,00	$ 382.308,00
NP 118	Cruceta de 2.40m con abrazadera para 4 reflectores (sum + inst)	UND	1,00	$ 409.908,00	$ 409.908,00
NP 119	Tuberia galvanizada conduit 3/4 "sum + inst	ML	1,00	$ 31.017,00	$ 31.017,00
NP 120	Instalación de luminaria escenario deportivo h=2 a 3 cds con andamio certificado	UND	1,00	$ 272.846,00	$ 272.846,00

(*) Unidad de medida (Un, metro, cajetin, lote, etc.)

Nota:
1. Asignar solo las Actas No Previstas o Actividades Complementarias, consecutivo a partir del cero (0) de las obras originales del contrato. Cuando las No previstas o Actividades Complementarias tengan adicionalmente que se requieran controles en ítems originales del contrato, de tal manera el mismo podrá ser usado para este caso verificando de cierta manera cada uno de los ítems ejecutados correspondientes.
2. Para las No previstas que generen modificaciones al Plan de Inspección y ensayo, se debe diligenciar la tabla Plan de Inspección y Ensayo, incluyendo los ensayos aplicables a este nuevo además.

METODOS CONSTRUCTIVOS (No aplica o Comentario)

Estas actividades no previstas van de acuerdo a los procesos constructivos establecidos por las especificaciones del IDRD.

NOTA: Las cantidades de las actividades no previstas pueden modificarse de acuerdo a la ejecución y medida en obra.

PLAN INSPECCIÓN Y ENSAYO - ITEM NO PREVISTOS

ITEM NO PREVISTO	INSPECCION Y/O ENSAYO	FRECUENCIA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	ESPECIFICACION TECNICA
Suministro e instalación baranda pasamanos m-80 con platina y chazo	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Nivelación y compactación de subrasante (mdro+dlln	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Ensayos de laboratorio tipo IDU
Suministro e instalación baranda m-81 anclada con platina y chazo	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Cerramalla m71-fontinst-h=2m, cim viga+pilotin,** (sum + inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario

1015
900

BOGOTÁ

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 6

FECHA		
01	MARZO	2024
dd	mm	aaaa
Página	8 de	11

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Desmonte y retiro malla fortinet h=2.00m	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Cargue y reubicación de materiales granulares existentes (arena tipo peletar / gravilla 3/4")	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 3 Preliminares
Complemento en malla nylon h= 2,50 m sobre cerramiento (sum +inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Desmonte cerramiento existente (malla eslabonada+ alambre de púas+ elementos verticales de madera)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Juego de cuerdas estrella 2 a 5 años cap: 21 niños (sum + inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Juego balancin doble mes 4años cap:2 niños (sum + inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Juegocuentaspoliedro 5-12añoscap:40niños (sum+ins)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Piso caucho reciclado 11cm (epdm 1cm+sbr 10cm sum+ins	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Piso caucho reciclado 9cm (epdm 1cm+sbr 8cm sum+inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados

BOGOTÁ

FECHA		
01	MARZO	2024
dia	mes	año
Página	8 de	11

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 6

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 1099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Sardinel prefab.e-10 a=0.20 h=0.50=0.8 sin straqu (sum+ins)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 4 Estructuras de pisos
Demolición cerramiento contra impacto h=5.0m **	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Cerram malla nylon h= 5 m+ pilotines (sum +inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Demarcacion pintura tráfico tanle a=0.05	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Desmonte estruc. De cancha multiple + retiro	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Pintura esmalte sintético altura hasta 2,00m	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Señaletica de normas generales para zonas infantiles y zona biosaludables 120x80 cmc*2 caras (suministro e instalacion)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD - Manual de señaletica del IDRD
Suministro e Instalac. Tapa toma corriente** (sum+Inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 8 Redes electricas de voz y datos
Cerramiento contra impacto IDRD h= 5 ** (sum + Ins)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario

1016
903

BOGOTÁ

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 6

FECHA		
01	MARZO	2024
dd	mm	aaaa
Página 9	de	11

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Pintura baranda cerramientos m-53 (sum + ins)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Pintura electrostatica para señaletica (sum+ins)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Instalacion de señal idg-s (0,60*0,70 dos caras)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD - Manual de señaletica del IDRD
Desmonte, cambio de laminas + vinilos y reinstalacion de señal valla de normas generales (0,80*1,20 dos caras)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD - Manual de señaletica del IDRD
Instalacion de señal sc-50 (0,30*0,40 dos caras)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD - Manual de señaletica del IDRD
Panal para baranda cerramiento (sum +inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 10 Mobiliario
Sumidero caja basalto-100 en ladrillo con excevac	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 8 redes hidraulicas
Tela para cerramiento verde oliva h=2.00 (suministro+instalacion)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 2 Lineamientos particulares
Desmonte y retiro de tela verde h=2.00	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del provedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 2 Lineamientos particulares

BOGOTÁ

FECHA		
01	MARZO	2024
dia	mes	año
Página	11 de	11

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 6

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Rodadura asfáltica mdo-19 e=0.08 compactado ** (sum+inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Rodadura asfáltica mdo-12 e=0.08 compactado ** (sum+inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Rodadura asfáltica 1350 e=0.05 compactado ** (sum+inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Señal poste direccional (sumin + instal) h.=3.50	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD - Manual de señalética del IDRD
Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 1 1/4"	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Pintura anticorrosivo+esmalte tubería 4"	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 7 Enchapes y acabados
Instalacion de luminaria escenario deportivo superior a 4 mts con andamio certificado	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Cruceta de 2.40m con abrazadera para 4 reflectores (sum + inst)	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.
Tubería galvanizada conduit 3/4 " sum + inst	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.

1017
904

BOGOTÁ

ACTA DE APROBACIÓN ACTIVIDADES N.° 6

FECHA		
01	MARZO	2024
dd	mm	aaaa
Página	11	de 11

NO PREVISTAS ☑ COMPLEMENTARIAS AL PRESUPUESTO ☐

CONTRATO No 3099 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

Instalación de luminaria escenario deportivo h=2 a 3 mts con andamio certificado	N/A	N/A	Verificación en campo. Certificado de calidad del proveedor.	Cartilla de especificaciones tecnicas del IDRD capitulo 9 Redes eléctricas de voz y datos.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

LOS ANALISIS DE PRECIOS NO PREVISTOS ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA FUERON VERIFICADOS Y AVALADOS DE MANERA PREVIA, LOS CUALES ESTAN SOPORTADOS CON LISTADO DE INSUMOS Y CIOS DE REFERENCIA IDRD.

DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS

DOCUMENTO	ELABORADO POR	OFICIO Y/O MEMORANDO CON EL QUE SE RADICO EL DOCUMENTO	FECHA (dd/mm/aaaa)
Análisis de precios Unitarios	Contratista	Correo electronico	16-feb-24
Solicitud	Contratista	Correo electronico	16-feb-24
APU	Contratista e Interventoria	Correo electronico	16-feb-24
Documento de aprobación de no previstos o actividades complementarias	Interventoria	Correo electronico	16-feb-24
Documento de aprobación de no previstos o actividades complementarias	Supervisión		

Es responsabilidad de la interventoría del contrato revisar y aprobar los APU que se aprueban en la presente acta y verificar que correspondan a los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato. Cuando el o los insumos requeridos para el Análisis de Precios Unitarios no se encuentre dentro de los insumos contractuales previstos en la etapa licitatoria del contrato, este APU debe ser aprobado de conformidad a lo estipulado contractualmente respecto a el o los insumos, la Interventoría debe revisar y aprobar los rendimientos y estar soportado con los documentos pertinentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de MARZO de 2024 UN

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
SUPERVISOR

Angelica Romero

ANGELICA MARIA ROMERO HERNANDEZ
APOYO A LA SUPERVISION

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
SUBDIRECTOR TECNICO DE PARQUES

SERGIO IVAN URIBARRI RODAS
Vo.Bo. REVISOR PRESUPUESTAL

ANEXO 08. INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

ANTICIPO CONTRATO DE OBRA No. 3099 DE 2023
INFRAESTRUCTURA

INFORME MENSUAL DEL MES DE MARZO 2024

Las actividades relacionadas con el manejo del anticipo del contrato No. 3099 de 2023 desarrolladas durante el 01 al 31 de marzo 2024 se describen a continuación:

1. CONTROL DEL ANTICIPO.

Se anexa cuadro correspondiente al control de manejo del anticipo, en el cual se evidencian los valores desembolsados por rubro, el porcentaje, al saldo equivalente de cada uno de estos, el valor aprobado total y el saldo con respecto al valor del anticipo.

CONCEPTO	VALOR PROGRAMADO	PORCENTAJE	VALOR DESEMBOLSADO	PORCENTAJE	SALDO	PORCENTAJE
COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	$ 4.001.731.087	95,90%	$ 4.001.731.087	100,00%	$ -	0,00%
ALQUILER EQUIPOS	$ 171.144.445	4,10%	$ 171.144.445	100,00%	$ -	0,00%
TOTAL	**$ 4.172.875.532**	**100%**	**$ 4.172.875.532**	**100,00%**	**$ -**	**0,00%**

Adicionalmente el siguiente cuadro muestra el total girado y el saldo disponible de los recursos del anticipo correspondientes al contrato:

VALOR ANTICIPO	**$ 4.392.500.560**
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE OBRA PÚBLICA DEL 5%	**$ 219.625.028**
VALOR GIRADO DEL ANTICIPO	**$ 4.172.875.532**
VALOR DESEMBOLSADO	**$ 4.172.875.532**
TOTAL SALDO	**$ -**
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	**$ 529.504.341**
SALDO POR AMORTIZAR ANTICIPO	**$ 3.643.371.191**

2. INFORME DE INVERSIÓN BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ANTICIPO							
FLUJO DE INVERSION A CORTE: Mes 4,0			SEGUIMIENTO A LA INVERSION				
ITEM (Cuenta)	DESCRIPCION	($) CORTE FLUJO DE INVERSION	($) ACUMULADO A LA FECHA	($) TOTAL APROBADO EN EL PERIODO	($) SALDO POR INVERTIR	% CUMPLIMIENTO DEL FLUJO	OBSERVACIONES DE SEGUIMIENTO
1	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	$ 4.001.731.087	$ -	$ 4.001.731.087	$ -	100,00%	Supero los rubros estipulados en el plan de inversion del anticipo

2	ALQUILER EQUIPOS	$ 171.144.445	$ -	$ 171.144.445	$ -	100,00%	Supero los rubros estipulados en el plan de inversión del anticipo
	TOTALES:	$ 4.172.875.532	$ -	$ 4.172.875.532	$ -	100,00%	

3. LEGALIZACION DE FACTURAS

El contratista no remite facturas de ninguna orden de operación. Por tal motivo, se le envió oficio el día 22 de marzo de 2024 bajo el radicado IDRD-3131-2024-317 solicitando las siguientes facturas proforma y/o cuentas de cobros presentadas en las ordenes de desembolso de anticipo.

ORDEN N°2				
VALOR	ENTIDAD	RUBRO	FACTURA PROFORMA	VALOR POR LEGALIZAR
$ 1,488,556,804.00	LYD PROYECTOS SAS	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° LyD 02	$ 1,488,556,804.00
$ 676,341,663.00	LED LS COLOMBIA	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° 001	$ 658,408,503.00

ORDEN N°3				
VALOR	ENTIDAD	RUBRO	FACTURA PROFORMA	FACTURA PROFORMA
$ 32,561,798.00	CERAMICA GRANITO DE ORO LTDA	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° 001	$ 32,561,798.00
$ 27,885,724.00	EL CONDOR PREFABRICADOS SAS	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° 001	$ 27,885,724.00
$ 16,124,745.00	C.I NEGOCIOS INTERNACIONALES	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° 001	$ 16,124,745.00

$	271,464,728.00	JUAN CARLOS GOMEZ RAMIREZ	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	CUENTA COBRO 01/24	$ 271,464,728.00
$	199,767,764.00	WINGEL ALFONSO CAMARGO TOBIAS	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° 001	$ 199,767,764.00
$	32,486,974.00	CONSTRITURA R SAS	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° 001	$ 32,486,974.00
$	6,664,004.00	WILMAR ALFONSO GARCIA	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° 001	$ 6,664,004.00
$	50,001,673.00	AGGREMAX SAS	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° 001	$ 50,001,673.00
$	24,965,010.00	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° 001	$ 24,965,010.00
$	82,322,993.00	CONCRETOS Y PREFABRICADOS DEL SUR SAS	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° 001	$ 63,061,194.00
$	104,869,738.00	LEDS LS COLOMBIA SAS	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° 002	$ 104,869,738.00

$ 488,071,195.00	LYD PROYECTOS SAS	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° LyD 03	$ 488,071,195.00
$ 178,481,337.00	DISTRIBUCIONES PBB SAS	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	FACTURA PROFORMA N° 001	$ 178,481,337.00

1020

ANEXO 09. BITÁCORA DE OBRA

11

NOTA 59 ACTIVIDAD REALIZADA:
EN EL CAMPO DE FUTBOL
SE ANALIZA EN EL DESMONTE
Y METODO DE LEVANTAMIENTO
Y EN LA VISITA DE LA
SUBGERENTE DE LAS
PUESTAS A TIERRA Y EXTINCION
NOTA 60 EN LA SALIDA DE PRUEBA
EN CONTROL DE CALIDAD
DE OBJETIVOS DE LOS
POSTES

JUEVES 29 DE FEBRERO DE 2024

NOTA 61 PERSONAL DE OBRA: 1 HOM
MEA RESIDENTE, 1 INSPECTOR
1 SST, 1 ENCARGADO DE
ELECTRICOS, 1 OFICIAL, 1
AYUDANTE

NOTA 62 CLIMA: SOLEADO

NOTA 63 HERRAMIENTA MENOR, 1 MANLIFT

NOTA 64 ACTIVIDADES REALIZADAS:

12

EN LOS BANCOS DE VELO-
DROMO SE INICIA EL
MONTAJE E INSTALACION DE
LA LINEA DE 1 FLUORESCENTE
DE 2 BOMBILLOS
NOTA 65 EN EL CAMPO DE BEISBOL
SE REALIZA EL DESMONTE
DE LUMINARIAS Y LA EXCA-
VACION DE LOS CAJAS DE BUCHA
DE TIERRA

VIERNES 01 DE MARZO DE 2024

NOTA 66 PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIE-
RA RESIDENTE, 1 SST, 1
INSPECTOR, 1 ENCARGADO DE
ELECTRICOS

NOTA 67 CLIMA: SOLEADO

NOTA 68 HERRAMIENTA MENOR, 2 MANLIFT

NOTA 69 ACTIVIDADES REALIZADAS:
MONTAJE EL DESMONTE DE
LUMINARIAS Y LA INSTA

[illegible] DE TIERRA ... PUESTA A TIERRA. ...

SABADO 09 DE MARZO DE 2024

NOTA 66 RETIRO DE OBRA: 1 WB-NIVEL RESIDENTE, 1 SST, 1 OFICIAL, 1 ELÉCTRICO

NOTA 67 CHINA: SOLDADO

NOTA 68 MANTENIMIENTO MENOR: 2 MANLIFT

NOTA 69 ACTIVIDADES TECNOLOGAS: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A EQUIPO DE MANLIFT.

LUNES 04 DE MARZO DE 2024

NOTA 70 RETIRO DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 SST, 5 TÉCNICOS ELECTRICISTAS

1 OFICIAL, 1 AYUDANTE.

CHINA SOLDADO

NOTA 71 MANTENIMIENTO MENOR, 1 TELEHOT, 1 PULIDORA, 2 MANLIFT. (2)

NOTA 72 ACTIVIDADES TECNOLOGAS: SE ANDAMIA EN EL DESMONTE DE LAS LUMINARIAS DE LOS POSTES

NOTA 73 SE MANDA EN LA LOGÍSTICA PARA LAS CASAS DE PUESTA A TIERRA

MARTES 05 DE MARZO DE 2024

NOTA 74 RETIRO DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 WB CIVIL, 1 SST, 1 TECNICO ELECTRICISTA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE

NOTA 75 CHINA SOLDADO

NOTA 76 MANTENIMIENTO MENOR, 2 MANLIFT

15

NOTA 77. ACTIVIDADES RECREATIVAS:
SE COMUNICA EL CIERRE DEL PARQUE DE LAS LUMINARIAS DE LA CANCHA DE BÉISBOL

NOTA 78 SE INICIA EL CIERRE DEL PARQUE DE LAS LUMINARIAS DE LA CANCHA DE SOFTBOL

NOTA 79 SE AVISA A LOS VECINOS, CASADAS Y CASADOS DE NUESTRA COLONIA. 30/30

[signature] [signature]

JUEVES 07 Y VIERNES 08 DE MARZO

NOTA 80 PERSONAL DE LIMPIA A VISITAR LAS CASAS.

NOTA 81 CLIMAS SOLEADO

NOTA 82 HUERTO MUJER MEJOR, 2 MUJERES

NOTA 83 ACTIVIDADES: 1
SE AVISA EL CIERRE DEL PARQUE DE LAS LUMINARIAS DE LA CANCHA DE BÉISBOL

16

NOTA 84 SE INICIA EL AJUSTE DE LAS LUMINARIAS DE LA CANCHA DE BÉISBOL

[signature] [signature]

LUNES 11 DE MARZO DE 2024.

NOTA 85 PERSONAL DE LIMPIA A VISITAR LAS CASAS, A MUJERES PRESIDENTE, A TRABAJADORA SOCIAL Y A SUPERVISORA DE ENFERMERAS

NOTA 86 CLIMAS SOLEADO

NOTA 87 HUERTO MUJER MEJOR, 1 PUNTO, 1 TARJETA, 2 MANUFACTURA

NOTA 88 ACTIVIDADES: RECREATIVAS
SE HARÁ AJUSTE DE LUMINARIAS DE BÉISBOL PARA PRACTICAR A LOS NIÑOS.

NOTA 89 SE COMUNICA LOS INSTALACIONES DE LUMINARIAS DE LA CANCHA DE BÉISBOL

[signature] [signature]

1022

17

Martes 12 a miércoles 13 de marzo de 1991

NOTA 89. Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 inspector, 1 SSS, 1 cuadrilla de topógrafos

CLIMA Soleado

NOTA 90 - Trabajos varios. Albañil, 2 ayudantes.

NOTA 91. Actividades realizadas:
- En la losa de techo del sótano se remata la impermeabilización del muro oeste y se rellena con material producto de la excavación.
- En la cancha de softbol se complementa la instalación de luminarias.

[signature]

Jueves 14 de marzo de 1991

NOTA 92. Personal de obra: 1 ingeniero residente, 1 inspector, 1 SSS, 1 cuadrilla de topógrafos

18

CLIMA Soleado

NOTA 93. Herramienta menor: 1 engrapadora, 2 martillos.

NOTA 94. Actividades realizadas:
- En la cancha de softbol se complementa el alumbrado de las luminarias de los postes de alumbrado.

NOTA 95. En la cancha de beisbol se realizan los trabajos para la instalación de tuberías en los bases de los postes de alumbrado.

NOTA 96. En el vestidores se realizan la instalación de los muebles sanitarios.

[signature]

VIERNES 15 DE MARZO DE 2024.

NOTA 100 PERSONAL DE OBRA: 1 MAESTRO MAYOR DE OBRAS, 1 INSPECTOR, 1 ASISTENTE, 1 OFICIAL, 1 ALBAÑIL, 1 AYUDANTE, 1 CARPINTERO, 2 ELECTRICISTAS.

NOTA 101 CLIMA: SOLEADO.

NOTA 102 MANTENIMIENTO MENOR, 1 MANUFACTURA, 1 PULIDORA, 1 CORTADORA.

NOTA 103 REUNIÓN CON ARQUITECTOS: EN LA OBRA DE BIRSOL AVANCE DE LAS OBSERVACIONES DE LOS PLANOS A TIEMPO.

NOTA 104 SE INSTALA FUNDACIÓN EN BASE PARA 1 MURO (VER CROQUIS) SE PROCEDE A SUMINISTRO DE HORMIGÓN EN LA SUMINISTRA DE LA TARDE.

NOTA 105 ACERO DE OBRA Y MADERA USO DE MADERA PARA MANUFACTURA EN OBRA DE BIRSOL

VIERNES 15 DE MARZO DE 2024

NOTA 106 PERSONAL DE OBRA: 1 MAESTRO MAYOR DE OBRAS, 1 TECNICO ELECTRICISTA, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE

NOTA 107 CLIMA: SOLEADO

NOTA 108 MANTENIMIENTO MENOR, 1 MANUFACTURA.

NOTA 109 REUNIÓN CON PROVEEDORES: EN OBRA DE BIRSOL SE ACUERDA LA ENTREGA PARA EL MARTES DE MADERA EN OBRA DE BIRSOL

SE ENTREGA DE PLANOS DE ELECTRICIDAD

SABADO 19 DE MARZO DE 2024

NOTA 110 PERSONAL DE OBRA: 1 INSPECTOR, 1 ASISTENTE, 1 OFICIAL, 1 CARPINTERO DE ESTRUCTURAS

NOTA 111 CLIMA: SOLEADO

NOTA 112 MANTENIMIENTO MENOR, 1 MANUFACTURA.

NOTA 113 ACTIVIDADES REALIZADAS:

en la Cancha de Baloncesto se
realizan el partido de 1-
Warriors para continuar

Marbolles 22 de marzo de 2024

Nota 114 Personal de obra: 1 Maestro
- Responsable, 1 Ingeniero, 1 Jefe,
1 Oficial, 1 Ayudante

Nota 115 Clima: Soleado

Nota 116 Herramientas Menor, 1 Cortadora
Gasolina, 1 Pulidora.

Nota 117 Observaciones Recomendaciones: A
Trabajador, Cargue y retiro
de Escombros deberán
en los Horarios
en la vía no Generar
el Bloqueo de
Peatones en Buen Estado
Norte

Jueves 21 de marzo de 2024

Nota 118 Personal de obra: 1 Maestro
- Responsable, 1 Ingeniero, 1 Jefe,
- 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Cuadrilla

Nota 119 Clima: Soleado

Nota 120 Herramienta Menor, 1 Pulidora

Nota 121 Recomendaciones - Recordar
en la Cancha de Baloncesto
se Prohíben en la Cancha
de Peatones, Instalación de
Vallas de Cobre y Bloques
de Piedra o Piedra

Viernes 22 de marzo de 2024

Nota 122 Personal de obra: 1 Maestro
Responsable, 1 Ingeniero, 1 Jefe,
1 Cuadrilla Electricos

Nota 123 Clima: Soleado

Nota 124 Herramienta Menor, 1 Pulidora

Nota 125 Observaciones Recomendaciones:
en la Cancha de Baloncesto

NOTA 138 [illegible]

NOTA 139 [illegible]

NOTA 140. Equipo y herramienta. Herramienta menor.

NOTA 142. Estado del tiempo: Día soleado y lluvias ligeras en horas de la tarde.

NOTA 143. Actividades realizadas:
Revisión de instalación de Hidrómetros de sanitarios en baños de 1° y 2° piso del Velódromo.

NOTA 144 Prueba de presión; no se había podido realizar ya que no había suministro de agua potable en el Escenario debido a la ruptura de un tubo del acueducto.

NOTA 145. Al realizar la prueba de presión, se evidencia fuga en dos de los aparatos sanitarios.

NOTA 146. Miércoles 27 Marzo de 2024.
Personal de Obra: 1 Ingeniero residente, 1 inspector, 1 oficial de enchapes, 1 plomero, 1 soldadora.

NOTA 147. Equipo y Herramienta: herramienta menor.

NOTA 148. Estado del tiempo: Día soleado.

NOTA 149. Actividades realizadas:
Subsanación de daños que se evidenciaron el día anterior;

NOTA 150 Se realizan pruebas de presión: revisión de instalaciones y ensayos. Liberación actividad. Preparación para realizar entrega a la Administración.

[illegible]

Nota 337 [illegible]

[illegible]

Nota 338 [illegible]

[illegible]

Nota 339 [illegible]

Nota 340 [illegible]

Nota 341 [illegible]

Nota 342 [illegible]

Nota 343 [illegible]

Nota 344 [illegible]

Nota 345 [illegible]

Nota 346 [illegible]

NOTA 347 En cuanto a la relación de Bienes de Muebles se agregará a pie de inventario la descripción de los Bienes, se anotará en las notas para el mismo inventario

NOTA 348 y las fechas de cambio se anotarán en la misma forma y modo de las notas

NOTA 349 Personal de obra: 1 Medico, 1 Enfermera, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Plomero 1 Encargado de Almacen

NOTA 350 Clima: Soleado

NOTA 351 Herramientas Menor, 1 Pala, 1 Talacho, 1 Cortadora

NOTA 352 Observaciones Generales: En Marca: Tractores de Motoconformadora

NOTA 353 Rondas de Area del Muro Frontal de Fondo de la Derecha Izquierda del Terreno

NOTA 354 En Caracteristicas Anotar la Relacion con Polizona Parcial Numero de la Nota Explicativa (Anexar y Punto)

NOTA 355 Anotar en la Relacion y Nota de la Nota Explicativa de Unidades

NOTA 356 Personal de Obra: 1 Ingeniero Residente, 1 Oficial, 1 Maestro, 4 Ayudantes, 1 Plomero 2 Encargados de Pintura

NOTA 357

NOTA 358

NOTA 359

NOTA 360

NOTA 361

NOTA 362

NOTA 363

NOTA 364

NOTA 365 Se anota en el libro, aplicación de pintura una y apoyo a los fijos de cambios

NOTA 366 Pintores de obras 1 hue- lero mayorista, 1 oficial 3 ayudantes, 1 planero, 1 encargado de bodega, 2 encargados de pintura

NOTA 367 Cuenta siendo

NOTA 368 herramienta menor, 1 compresor, 1 pulidora, 1 taladro, 1 bomba sumergible, 1 motobomba de succión 4", 1 motoreta

NOTA 369 Actividad de instalación se excluye la venta de material auxiliar de pintura como pinceles

NOTA 370 con el grado de protección de estanqueidad se debe tener una lectura y planificación en el proyecto inicial de la obra de cumplir de forma obligatoria (ø 6" en adelante). La vida de una pintura depende de muchos factores, así:

1. Selección y calidad de materiales
2. Aplicación de pintura sobre superficies
3. Se debe dejar un tiempo de secado hasta en ambiente de aplicación de imprimantes y sellos con tiempos epóxicos

NOTA 371 se consulte el ficha de los fabricantes técnicos

NOTA 374

NOTA 375

NOTA 376

NOTA 372

NOTA 373

NOTA 377

Ensayos de compactación relleno sele-
cionado permeabilidad fangos sépticos 94.4%, 90.8% y
94.2%. Liberando la capa.

de [illegible], 2
[illegible] de [illegible], 2 pisos
CLAVE: SOLEADO
NOTA 378 [illegible] Mesón, 1 Mos-
trador 4K, 1 Pla-
ca, 1 Tablero, 1 Comedor
NOTA 379 [illegible]
En Nava
Tenderos de Material Depor-
tivo y de Menaje 1 Vitri-
na de Tiendas Adosadas
del Paseo de los Ninos
Crema de Entre Ambos
NOTA 380 Se [illegible] Mediodia de
la Apertura de Establecidos
de las [illegible]
Hora final: 11:15 p.m.
Legajo Final (M) = 2013
Verificación de Medidas
a Unidad de Obra en
Ejecución de Arma
Arrendamiento Liberación Estanqueidad

en primera etapa, la
Conclusión = Nivel constante
NOTA 381 se da inicio al Recito.
del Punto de Interior
de las Tapias de
Vida de Patente con
la Apertura de la Motobomba
y Manguera, Garantizado
que el Agua llegue
a Su Destinatario en
Una Acera Normal a
1,50 m, Por Existencias
y Solicitud del Vb. Comi-
lo (Funcionamiento) y
el Acompañamiento de
Funcionamiento Técnico
Doble Nodo (Cruzado
de Vidrio)
NOTA 382 se da Visto a los
Antecedentes Consignados
en la Nota 378 Folio
109 de la Presente Bi-
tacora, para la Cumple

NOTA 383

NOTA 384

NOTA 385

NOTA 386

NOTA 387

NOTA 388

NOTA 389

NOTA 390

1129

118

119

1030

04-03/24 — #1 = 94,2% — #2 = 93,5%
#3 = 92,8%

COMO DE EVIDENCIA DE CUMPLE!
CON LOS REQUERIMIENTOS
DEL CONTRATO
DE SUMINISTRO "CONTRATO
TECNICO SOBRE EL MANTE-
NIMIENTO PARA
LA ADQUISICION "EQUIPO
DE VENTILACION YOKNA EQUIP
PARA UNIDAD FIRMADO
EL 20-02/24

WAEN 11 DE MARZO DE 2024

NOTA 400: PERSONAL DE OBRA = 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL 5 AYUDANTES, 1 PLANERO, 2 CHOFERES DE BIENES, 2 ALBAÑILES, 1 CHOFER DE INCORPORACION EN RAMPA

1 OPERARIO DE MANIPULADOR,
1 OPERARIO DE VIBROCOMPACTADOR,
1 LABORATORISTA DE SUELOS

NOTA 401: EQUIPO SOLICITADO

NOTA 402: MAESTRO MAYOR, 1 MANIPULADOR, 1 VIBROCOMPACTADOR, 1 RETROEXCAVADORA, 1 CAMIONETA DE SUPERVISION, 1 AYUDANTE.

NOTA 403: ACTIVIDADES:
EN EL SITIO MANIA: TOMA DE DENSIDADES A EL TERRENO COMPACTADO DEL MATERIAL PREEXISTE, SE COMPACTA CON MANUAL Y VIBRO COMPACTADOR Y SE OBTUVIERON LOS SIGUIENTES RESULTADOS

1 = 91,9%
2 = 93,6%
3 = 93,2%

PRUEBA = 1862 "ULTIMA PRUEBA"

NOTA 404: SE LLEVA ACTIVIDAD DE LLENO EN MATERIAL PREEXISTENTE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LOS VESTIDOS SANITARIOS DE HOMBRES

NOTA 118 EN EL MÓDULO DE BAÑO DE SANITARIOS. AUMENTA EL CAMBIO DE 1 A 5 PUSH DE LAVABOS DE BAÑO DE MUJERES

NOTA 114 EN EL TEMPLETE EUCARÍSTICO AUMENTA 1 APLIQUE DE ANTENA DE LA BANDA OCCIDENTAL Y ORIENTAL

NOTA 115 EN LOS TIRANTES DE LOS APLIQUES AUMENTA EL NIVEL Y APLICACIÓN DE ESMALTE (ALUMINIO)

NOTA 116 EN EL COSTADO OCCIDENTAL AUMENTA 1 INSTALACIÓN DE LOS CANTOS EN EL DESNIVEL INOXIDABLE, ENROLLADO EN DESNIVEL

MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE 2014

NOTA 117 PERSONAL DE OBRA: 1 ALBAÑIL, 1 AUXILIO, 3 OFICIALES, 5 AYUDANTES, 1 CARPINTERO DE MOLDES, 2 CARPINTEROS DE ANTENA, 3 ASISTENTES.

NOTA 118 CLIMA: SOLEADO

NOTA 119 HERRAMIENTA: MEZCLA, 1 CORTADORA DE ESCANTE, 1 PULIDORA

NOTA 120 ACTIVIDADES: REALIZADAS EN MANA: CAMBIO E INSTALACIÓN DE ACEROS CARPINTERO, REMATE DE PINTURA Y AJUSTE

NOTA 121 SIC LIBERA ACTIVIDAD DE CAMBIO DE BUJÍA DE FLUJO METROS DE SANITARIOS, LAVABO PUSH, FIJACIÓN DE LAVABO, Y MANTENIMIENTO DE LOS LAVAMANOS EN GENERAL

NOTA 430 ... REMATES DE PINTURA Y ENLUCIDOS
Y ASEO DE LOS MODULOS DE BAÑOS
DE MANZANA

NOTA 431 SE REALIZARA LA ENTREGA
DE LOS MÓDULOS DE BAÑOS
DE MANZANA A SATISFACCION
DE LA SUPERVISIÓN. LA VIVIENDA
DEBERA

NOTA 432 CONTENER MANUAL Y NIVE-
LACION DE MARCA WATERMAN
O SIMILAR PARA INSTALACION DE
TERMO-TANQUE Y CALDERA

NOTA 434 EN LOS COSTOS DE LOS RENGLONES: - SE
REALIZAN LOS REMATES DE
ENLUCIDO, ASEO, PINTURA
Y LIMPIEZA GENERAL

NOTA 435 EN EL TEMPLETE ESTRUCTURAL
SE INCLUYE LA PINTURA DE BARANDALES

NOTA 436 EN LOS MUROS DE CONTRA-
TRABES REMATES DE ENLUCIDO
Y ASEO

NOTA 439 EN EL COSTO DE HONORARIOS
SE INCLUYEN EN LA FUNCION
DE DIRECCION DE OBRA Y
EN CONSTRUCTIVO Y RESTO DE
OBRANTES DE EDIFICACION
Y CALCULO

NOTA 440 EN LOS BAÑOS DE DEPARTA-
MENTOS (DOMUS) SE INCLUYE
EL SUMINISTRO DE LA FIJADO-
RA MUEBLES.

SUMAN 144 DE MANO DE OBRA

NOTA 441 PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE
DE RESIDENTE, 1 SUPERVISOR
1 SST, 1 ADMINISTRATIVO, 3
OFICIALES, 5 AYUDANTES, 2
CARPINTEROS DE PLANTILLA,
2 LABORATORIOS DE PINTURA, 3
ALBAÑILES, 1 MAESTRO ALBAÑIL

NOTA 442 CLIMA: SOLEADO

NOTA 443 INSTALACIONES MECANICAS, 1 ALBAÑIL

130

131

1033

y ... de Milián los mismos
Nota 467 mismos a ... año ... y los
... veces de mitad de
... mismos ... de ... comidas

Sábado ... 16 de ... Marzo de 2014.
Nota 468 Personal de obra: ... 1 ... Ingeniero
... Presidente, ... 1 ... Maestro, ...
... 2 ... Oficiales, ... 5 ... ayudantes,
... 1 ... Ingeniero ... Planeros, ... 2 ...
... Asesores ...
Nota 469 Clima: ... Soleado ...
Nota 470 ... Hemos hecho ... Mezcla ... 1 cuba
... de ... Encofre, 1 ...
... para ...
Nota 471 Actividades ... realizadas
... en ... Mañana ...
... se ... hecho ... 1 ... viaje ... de
... Tierra ... negra, ... 2 ... Plastificados
... Nivelación ... y ... Extendido
... de ... Tierra

Nota 470 ... el ... Cambio: ...
... Extendido ... de ... Tierra negra
Nota 471 en ... el ... Nivel ... de ... Base
... de ... Polyestireno ... Anteriormente
... los ... mismos ... y ... Mismos
Nota 472 ... en ... el ... Costado ... Nor ... Oeste
... Dental ... se ... Extendió
... Tierra ... negra. ... En ... el ... Mismo
... Nivel ... de ... los ... Pasos ... de
... la ... Cantera ...
Nota 473 ... Urgente ... y ... Plano ... de ... Obras,
... Ejemplares, ... Materiales
y ... Cimientos ... Reforzados

... Lunes 18 ... de ... Marzo ... de 2014
Nota 474 Personal ... de ... Obra. ... 1 ... Maestro
... Presidente, 1 ... Ingeniero, 1 ... Prof.
... Civil, 1 ... Maestro, 3 ... Oficiales
... 5 ... Ayudantes, ... 1 ... Cuadrilla ... de
... Planeros, ... 2 ... Asesores
Nota 475. Clima ... Soleado

136

137

Nota 485 ... CLAVO SUCCIÓN ...
Nota 486 HERRAMIENTA MENOR, A EXCEPCIÓN ...
Nota 487 DE CIRUGÍA. REALIZADA ...
SE LIBERA LA ACTIVIDAD ...
DE ... MANGO ... DE BISTURÍ ... SANITARIAS, LLAVES PUNTA, ...
DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ... PUERTAS, MAMPARAS Y ANDAMIOS ...
DE SILLAS Y AJUSTE DE ... LLAVES DE MANDRINO; REPARACIÓN ...
E INSTALACIÓN DE ENCHUFES ...
DE MUEBLES, TRASLADO DE ... PUNTA Y BASE DE LAS ...
MÓDULOS DE BAÑOS OBRA ...
EXPRESS Y SUMINISTRO ...
Nota 488 SE LIBERA LA ACTIVIDAD ...
DE DESMONTE DE ... CARPINTERÍA METÁLICA E INSTALACIÓN ...
DE MAMPARAS: ... M² 12,1 ... EN BLOQUE ... INCLUIDA ...
EN EL COSTO ... NOTA ... DE ...
DENTAL DEL PACIENTE.

Nota 489 ... SE REALIZA LA COLOCACIÓN ...
DE SATISFACCIÓN DE LAS ...
MÓDULOS DE BAÑOS DE OBRA ...
EXPRESS Y SUMINISTRO DE ...
LAS TAPAS ... REMUNERADAS ...
... EN LA NOTA 487, ADICIONAL- ...
MENTE SE ENTREGARON LAS ...
28 ... CARTAS ... INDIVIDUALES ...
EN ACERO INOXIDABLE HASTA- ...
LADAS ... EN EL CUERPO NOR- ...
OCCIDENTAL DE PUERTA Y ...
EL MANTENIMIENTO ... CALIFICADO ...
DE RECUBRIMIENTO, PULIDOS ...
DE ANTIGUAMIENTO Y LISOS ...
Y PUNTA EN CUALQUIER ...
VICTOR TIPO DE LAS BA- ...
NADAS. SE ... DAS. TRAVESAÑOS ...
DEL CUERPO ... OCCIDENTAL ...
Y ORIENTAL DEL TRIPLETE ...
ENCARNADO.
Nota 490 EN MANO. SE ... PUNTA ...
EN LA ... ESTRUCTURA DEL

142

143

1036

1 1 1

BASE GRANULAR PARA LA
NIVELACION DEL TERRENO
NOTA 384 EN LA MANTENIMIENTO DE
MURO LA NIVELACION DEL
EJEMPLO DEL PISO. CON
PISO)

NOTA 385 EN UNA CANCHA DE BASQUET
BOL SE APLICARA LA
APLICACION DE MANTENIMIENTO
DE UN PARQUEO DE CONCRETO

DOMINGO 03 DE MARZO DE 2024

NOTA 384 PERSONAL DE OBRA: 1 INGE-
NIERO - RESIDENTE, 1 INSPECTOR
1 CUADRILLA DE ALBAÑILES

NOTA 386 CLIMA: NUBLADO

NOTA 387 ACTIVIDAD MENOR; CONSTRUC-
CION DE BARANDA, 1 ALBAÑIL

NOTA 388 ACTIVIDADES: ANTES DE INSTA-
LACION DE CERAMICA DE

PISO DEL - MEZANINE (TERRAZA)
NIVELACION DEL PISO BLANCO

LUNES 04 DE MARZO DE 2024

NOTA 383 PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIE-
RO RESIDENTE, 1 INSPECTOR,
1 SST, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL,
3 AYUDANTES, 1 PINTOR,
1 CUADRILLA DE ALBAÑILES,
1 CUADRILLA DE PINTURA, 1
CUADRILLA DE ELECTRICOS, 1 TOPOGRAFO

NOTA 384 CLIMA: SOLEADO CON FUERTES
LLUVIAS ENTRE LAS 3:00 A LAS
3:15 PM.

NOTA 385 PUESTA MICRO MENOR, 1 MAES-
TRO ALBAÑIL, 1 AYUDANTE,
1 PASANTE, 1 ALBAÑIL, 1
PINTOR ELECTRICO, 1 PLOMERO
1 TOPOGRAFO, 1 BENITO, 1
INGENIERO. SUBIR TANQUE

Nota 366. [illegible]

Nota 367. [illegible]

Nota 368. [illegible]

Nota 369. [illegible]

Nota 370. [illegible]

Nota 371. [illegible]

Nota 372. [illegible]

Nota 373. [illegible]

Nota 374. [illegible]

1038

Botella A-80 para el usuario
sur (exterior) y canalizaciones
Nota 325 en la cuenta de hourly
cuanto de empleados y
las bases de la cuenta
se: Aplicación tarea
de electricidad
Nota 326 en la cuenta de activa
existente (costado sanitario)
Anular la implicación de
el monte vector tal

Nota 327 Mitad 06 del mando de bly
personal de obra 1 vuelta
presidente, 1 hospital 1551,
1 maestro, 1 ayudante,
1 paleta, 1 jornada de
mediodía, 1 jornada de
vigilancia/mitad, 1 cuenta
un de avena, 1 vaquita
de avenas de avenas

Nota 328 clima: bolsa


Nota 329 interruptor antena, 1 mini-
cuadro cast, 1 vigilancia
pantalla voltaje tapa, 1
aislador, 1 tanque mez-
clador, 1 compresor, 1 planta
electrica

Nota 330 Anuncios mezclados:
en la cuenta de Balcucha:
Anular instancias de
botella A-80 para
costado sur exterior

Nota 331 en la cuenta de hourly
anular una parada de
electricidad.

Nota 332 en la cuenta de sujeta
anular la colocación de las
costas de vigilancia, el
interior del muro y la
exterior para la estu-
cho del filtro.

Nota 333 en la cuenta de mano

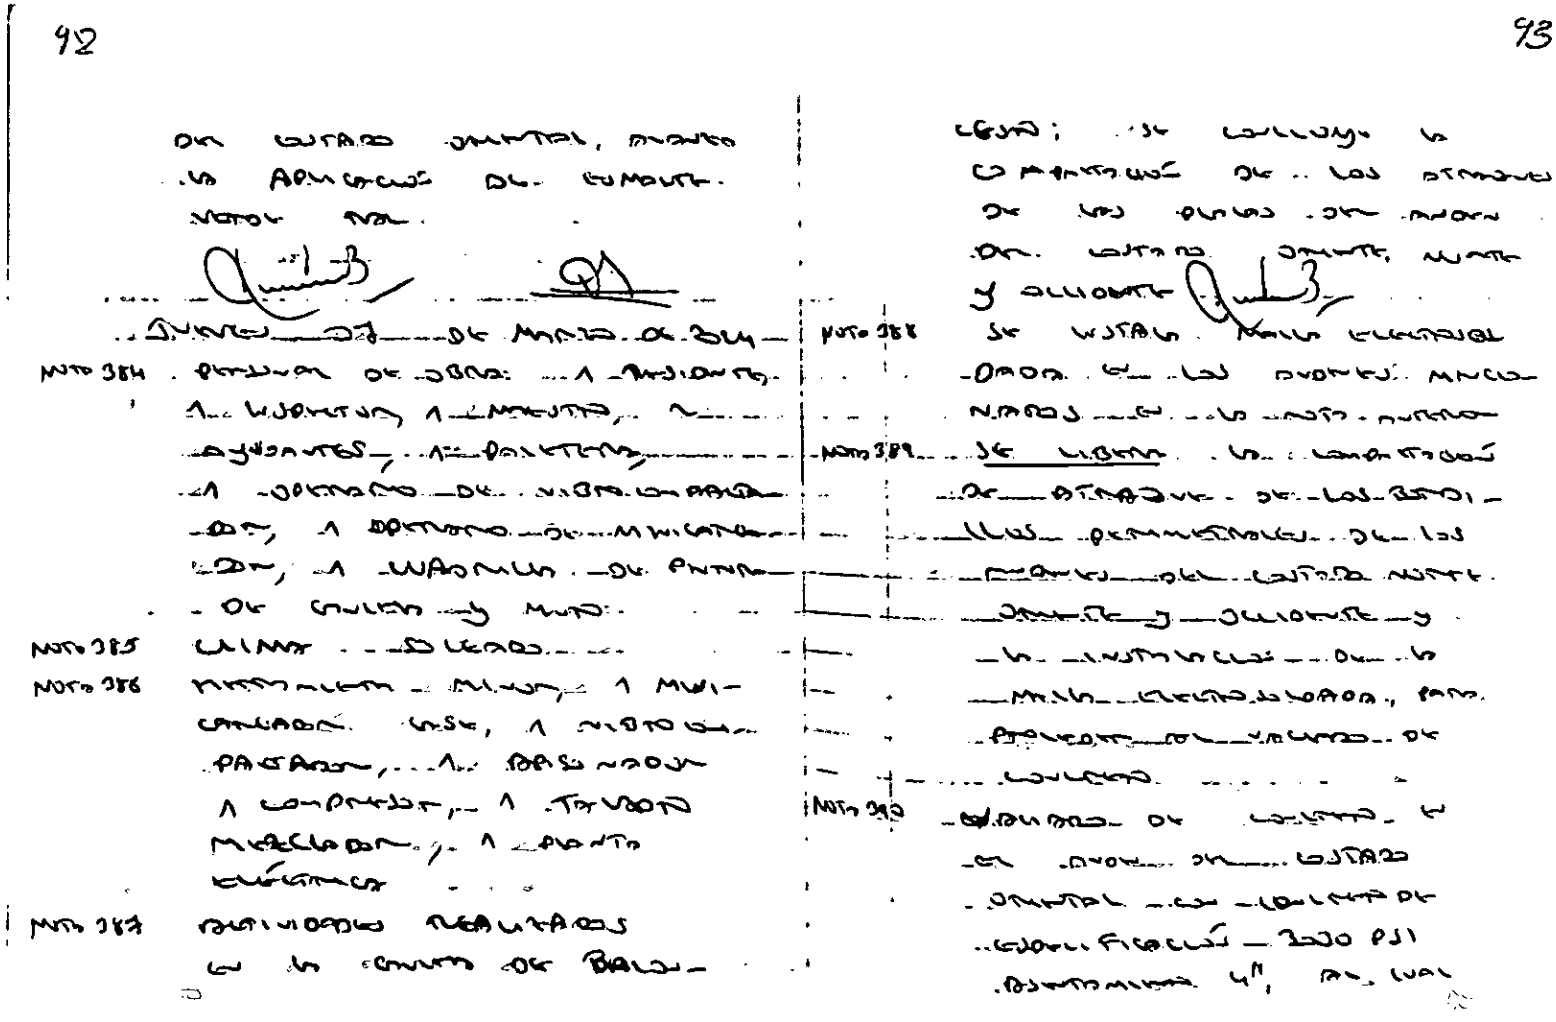

PRUEBA DE HUMEDAD/LIBERACIÓN DE ASFALTO PARA LA

[illegible] - y - [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 11 de marzo de 2024

NOTA 425 Presente de obra: 1 Viviendo Residente, 1 Inspector, 1 Maestro, 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Encofrador, 1 Ferrallista, 1 Operario de PVC, 1 Operario Electricista, 1 Operario Pintura Obra

NOTA 426 Clima: Soleado

NOTA 427 Herramienta Menor, 1 Radial, 1 Taladro Electrico, 1 Amoladora

NOTA 428 Actividades realizadas:

En el dia de hoy se inicia la instalación de pintura con rodillo y el extendido del mismo con [illegible]

NOTA 429 En un dia [illegible]

[illegible] Electro se instala el Radio-taxi

[illegible]

NOTA 430 En el dia de hoy se inicia la demolición de tabiques

Libera: Estructura de techo e instalación eléctrica para proceder a la instalación del techo de PVC

[illegible]

[illegible] 12 de marzo de 2024

NOTA 431 Presencia de obra: 1 Viviendo Residente, 1 Inspector, 1 Maestro, 1 Oficial, 3 Ayudantes, 1 Peón, 1 Operario Pintura Obra

NOTA 432 Clima: Soleado

NOTA 433 Herramienta Menor, 1 Radial, 1 Taladro Electrico, 1 Amoladora

NOTA 434 Actividades realizadas

En el dia de hoy se inicia la

100

101

[illegible]

[illegible] 6" [illegible]
[illegible] DE AGUAS LLUVIAS

SABADO 16 DE MARZO DE 2014

NOTA 458 PERSONAL DE OBRA: 1 MAESTRO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 JEFE, 1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 4 AYUDANTES, 1 CHOFER DE CAMIONETA DE PINTURA, 1 ALBAÑIL, 1 ENCARGADO

NOTA 459 CLIMA: SOLEADO

NOTA 460 MAQUINARIA: MEZCLADORA, 1 NIVEL TOPOGRAFICO, 1 MASO, 1 MARRO, 1 PALA, 1 CARRETILLA, 1 TALADRO ROTOMARTILLO

NOTA 461 ACTIVIDADES REALIZADAS: CONTINUAR TOPOGRAFICO DE LAS AREAS INTERVENIDAS

NOTA 462 EN LA CANCHA DE BALONCESTO

[illegible] DE ATENCION, MAL DE ORINA, [illegible] DE LA PIEL DE LOS OJOS Y [illegible] AVDAS.

NOTA 463 APLICACIÓN DE [illegible] Y [illegible] DE PISO EN ASFALTO [illegible]

NOTA 464 EN LA CANCHA DE VOLEY-BALL [illegible] AVANZA LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE [illegible]

NOTA 465 LUNES 17 DE MARZO DE 2014

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE, 1 MAESTRO, 2 OFICIALES, 4 AYUDANTES, 1 PALETERO, 1 CADENERO, 1 CHOFER DE PINTURA

NOTA 466 CLIMA: SOLEADO

NOTA 467 MAQUINARIA MEZCLADORA, 1 ANTIGUA, 1 TALADRO MAR-

[illegible]

NOTA 483 EN LA CALLE DE [illegible]
SE [illegible] EL CARRIL
[illegible] DE SENTIDO
Y EL [illegible] DE [illegible]
[illegible] DE [illegible] -

MIÉRCOLES 20 DE MARZO DE 2024

NOTA 478 PERSONAL DE OBRA: 1 [illegible]
TO [illegible], 1 INSPECTOR,
1 SST, 1 [illegible], 1 [illegible]
INGENIERO AMBIENTAL, 1 MAESTRO
2 OFICIALES, 6 AYUDANTES
1 [illegible], 1 [illegible]
2 DE DEMARCACIÓN DE CARRIL

NOTA 479 CLIMA: SOLEADO

NOTA 480 MEDIA MAÑANA MAYOR, A PLANTA
ELÉCTRICA, A TAMAÑO MEDIO
A VOLANTE DOBLE TRABAJO,
A [illegible], A MINICARGADOR

NOTA 481 CLIMA: SOLEADO DE
LLUVIAS FUERTES DE 2:40

A LAS 3:15 PM

NOTA 482 MEDIA MAÑANA MEDIA, A PLANTA
ELÉCTRICA, A TAMAÑO MEDIO
A VOLANTE DOBLE TRABAJO,
A [illegible], A MINICARGADOR

NOTA 483 [illegible] DE BALIZAMIENTO
[illegible] Y [illegible] DE
DE EXCAVACIÓN Y [illegible] DE
[illegible]

NOTA 485 SE [illegible] APLICACIÓN DE
[illegible] SINTÉTICO
DE [illegible] DE LA CALZADA

NOTA 486 [illegible] CARRIL DE SENTIDO
SE [illegible] CÉSPED
A TIERRA. No espacio Kikuyo

[illegible] DE CONTRA
INCIDENCIA DE EL PASO
DE VEHÍCULOS DE OBRA

JUEVES 21 DE MARZO DE 2024

NOTA 487 PERSONAL DE OBRA: 1 MAESTRO RESIDENTE, 1 ALBAÑIL, 1 MAESTRO, 4 OFICIALES, 4 AYUDANTES, 1 PINTOR, 2 ALBAÑILES, 1 CARPINTERO DE ESTRUCTURAS, 3 AYUDANTES

NOTA 488 CLIMA SOLEADO CON FUERTE VIENTO ENTRE LAS 3:45 A LAS 4:30 PM.

NOTA 489 INSTALACIÓN MECÁNICA, 1 PUNTO ELÉCTRICO, 1 TABLERO MECÁNICO, 1 ALUMBRADO

NOTA 490 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA CAMARA DE BALANCEO INSTALACIÓN DE CONDUCTO Y TUBERÍA NEGRA DE OBRA

NOTA 491 EN LA CAMARA DE SONIDO SE CONCLUYÓ LA INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE LOS MARCOS DE LOS VIDRIOS

DE INSPECCIÓN Y DE PUNTOS DE LOS MUROS

VIERNES 22 DE MARZO DE 2024

NOTA 492 PERSONAL DE OBRA: 1 MAESTRO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 ALBAÑIL, 1 SSC, 1 AUX. ADMINISTRATIVO, 2 OFICIALES, 5 AYUDANTES, 1 OPERARIO DE MINICARGADOR,

NOTA 493 CLIMA SOLEADO

NOTA 494 INSTALACIÓN MECÁNICA, 1 MUCHACHO AYUDANTE, 1 VOLQUETA PÚBLICA

NOTA 495 ACTIVIDADES REALIZADAS: EN LA CAMARA DE BALANCEO PUNTOS DE CONTROL, M-123 PROLONGACIÓN DEL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR PARA OBRAS CIVILES FINALES

NOTA 496 INICIO DE LA COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE DE

[illegible] y [illegible] de obra

Nota 493 [illegible] en la [illegible] de Jornada.
Se [illegible] del [illegible]
de los [illegible] de [illegible]
los [illegible] de [illegible]
y [illegible] de la
[illegible] de los [illegible]
[illegible] de [illegible]

Nota 498 [illegible] de [illegible], [illegible]
[illegible] de [illegible] y [illegible]
de [illegible]

Nota 499 En [illegible] a las
[illegible] de [illegible].
[illegible] se [illegible] en
ocasiones y las [illegible]
[illegible] en [illegible].

Siendo las 23 [illegible]

Nota 500 [illegible] de obra: 1 [illegible]
[illegible], 1 [illegible], 1 Sist.
1 Maestro 2 [illegible]

[illegible] 1 Palets
1 Pala, 1 [illegible] de mu-
[illegible], 1 [illegible] de
Soldaduras.

Nota 501 Soldador.

Nota 502 Electrónica menor, 1 Pulv
[illegible], 1 Planta Eléctrica,
1 Minicargador [illegible], 1 Grupo

Nota 503 Actividades realizadas:
En la [illegible] de Jornada
[illegible] de [illegible], de Mu-
[illegible] de [illegible] y se
[illegible] [illegible] de [illegible]

Nota 504 En [illegible] de Hockey
[illegible] de [illegible]
de puertas del tablero
de control de [illegible]
para protección contra
la lluvia. (Parcial)

En la [illegible] de [illegible]
Avance excavación de la
rueda. de desagüe y G11

NOTA 575. El tipo y calidad de pasto que se está llevando a la obra para instalar en las zonas verdes, no es propiamente el requerido por la Entidad; pero no reúne las características necesarias para su instalación. El pasto a utilizar debe ser cortado con máquina podadora antes de realizar el corte y cuyas medidas deben ser respetadas de 20 a 50 cm. Cuando se instala se debe procurar no dejar espaciamiento entre ellos y quedar traslapados.

Domingo 24 y Lunes 25 de Marzo.

NOTA 576. Se laboró desarrollando actividades de mampostería para cajas de inspección, pañetes al interior, colocación de marcos metálicos.

NOTA 577 Instalación de espejo en el baño del restaurante, el cual estaba roto; propiamente en la Cocina

NOTA 578 Aseo general de obra en Cancha de Squash y Cancha de baloncesto.

NOTA 579. Martes 26 marzo 2024
Personal de obra: 1 residente, 1 maestro general 1 inspector, 1 SST, 1 BUDI, 2 oficiales, 6 ayudantes 1 operario de minicargador, 1 cuadrilla de electricistas

NOTA 580. Estado del tiempo: Día soleado.

NOTA 581. Actividades realizadas.
En área Administrativa (cuarto de servicios), se completaron las instalaciones eléctricas (redes y tomas GFCI).

NOTA 582 En la Cancha de Squash, se remató pintura del muro por la parte superior. Aseo general.

NOTA 583. En el Tablero control Canchas de Hockey, se inicia la protección de manera parcial.

NOTA 584 En la cancha de baloncesto, se realizó el retiro de escombros y materiales sobrantes. Se inicia la reconstrucción de un tramo de cañuela que estaba obstruido por el paso de vehículos en zona este.

rios de la concha, por costado sur occidental

NOTA 585. Miércoles 27 marzo 2024.

Personal de Obra: 1 residente, 1 inspector, 1 maes
1 SST, 1 Arol, 2 oficiales, 6 ayudantes

NOTA 586 Estado del tiempo: Día soleado

Equipo y herramienta: Herramienta menor.

NOTA 587 Actividades desarrolladas

Desmonte cerramiento provisional del area de la
Concha de Squash. Retiro de varas y lona verde
Aseo general del area

NOTA 588. Entrega a la Administración del Parque del
Escenario; se elabora Acta Puesta en Servicio
Obras Comunidad, firmada por las partes que
intervienen; Administración, Contratista, y la Interv
ventoría.

4

NOTA 44 Sábado 2 de Mayo de 2024.
Tomar detalle en dados de pedestales en mal estado.

NOTA 45 Se realiza el arreglo del muro bajo en ladrillo y pedestales de columnetas en concreto (soporte de las paredes del cerramiento en malla eslabonada)

NOTA 46 8 de Marzo de 2024
Verificación pintura de la malla y pared del cerramiento por costados oriental y sur.
Recalce de dados que estaban fracturados o deteriorados en algunos pedestales de columnas - reposición ladrillos.

NOTA 47 14 de marzo de 2024.
Entrega final de los trabajos realizados en el Escenario al Administrador del Parque, Señor Johan Espinosa.

NOTA 48 Elaboración del Acta de la Puesta en Servicio Obras Comunidad.

1016

VIGENCIA 01 DE MARZO DE 2024.

NOTA 224 PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SUT, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, 2 PEÓN, 1 OPERADOR DE MINICARGADOR.

NOTA 225 CUADRILLA: SOLDADOR

NOTA 226 HERRAMIENTA MENOR, 1 TALADRO, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 MINICARGADOR CON, 1 MARTILLO

NOTA 227 ACTIVIDADES REALIZADAS: EN LA INSTALACIÓN DE MODULO DE BAÑO A INSTALAR: SE REALIZA EL VACIADO DE CONCRETO DE LOS PROTECTORES (4) CON CONCRETO NORMAL DE 2000 PSI REFORZADO CON 4" Y. DE RESPECTIVA MUESTRA A COMPRESIÓN (CILINDROS)

NOTA 228 EN EL PISO DE BAÑO: ANCLAJE DE PERNOS DE ANCLAJE METÁLICOS DE LA INSTALACIÓN.

SÁBADO 02 DE MARZO DE 2024

NOTA 229 PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, 1 OPERADOR DE MINICARGADOR, 1 PEÓN.

NOTA 230 CUADRILLA SOLDADO

NOTA 231 HERRAMIENTA MENOR, 1 MINICARGADOR CON, 1 MARTILLO

NOTA 232 ACTIVIDADES REALIZADAS: DESCARGUE DE LOS PERFILES DE LA ESTRUCTURA DEL MODULO DE BAÑO A INSTALAR. LAS PROTECTORES AL CUADRO DE CONCRETO

NOTA 233 SE LOCALIZA CAJA DE DESAGÜE DE AGUAS NEGRAS Y

Se verificó su funcionamiento.

Nota 234 Se libera el estado y funcionamiento de la red de desagües para la creación de (los desagües) del nuevo barrio.

Nota 235 En los trabajos de alcantarillado se hallaron restos de agua potable que fueron sustituidos por otros nuevos.

Nota 236 Se hicieron análisis de material granulométrico de suelos.

Nota 237 En el punto del canal existe el peligro de las aguas altas de las estaciones meteorológicas.


... uno de ... de ... Marcos ... de ...

Nota 240 - Personal ... de ... obra: ... 1 ... 1 ... 1 ... 2 ... 1 ... 1 ... 2 ... 1 ...

Nota 241 ... horas ... de ... 7:30 a ... 3:45 p.m. ...

Nota 242 ... en ... la ... con ... de ... Obras ... Públicas ... de ... Bahía ... Blanca ... para ... el ... control ... de ... los ... materiales ... y ... trabajos ... de ... la ... Municipalidad ... de ... dicha ... ciudad.

Nota 243 ... en ... los ... trabajos ... de ... mejoramiento ... de ... agua ... para ... Bahía ... Blanca ... en ... el ... tramo ... de ... Nota 244 ... en ... el ... tramo ... de ... Avenida ... el ... Salado ... de ... las ... Aguas ... Metálicas.

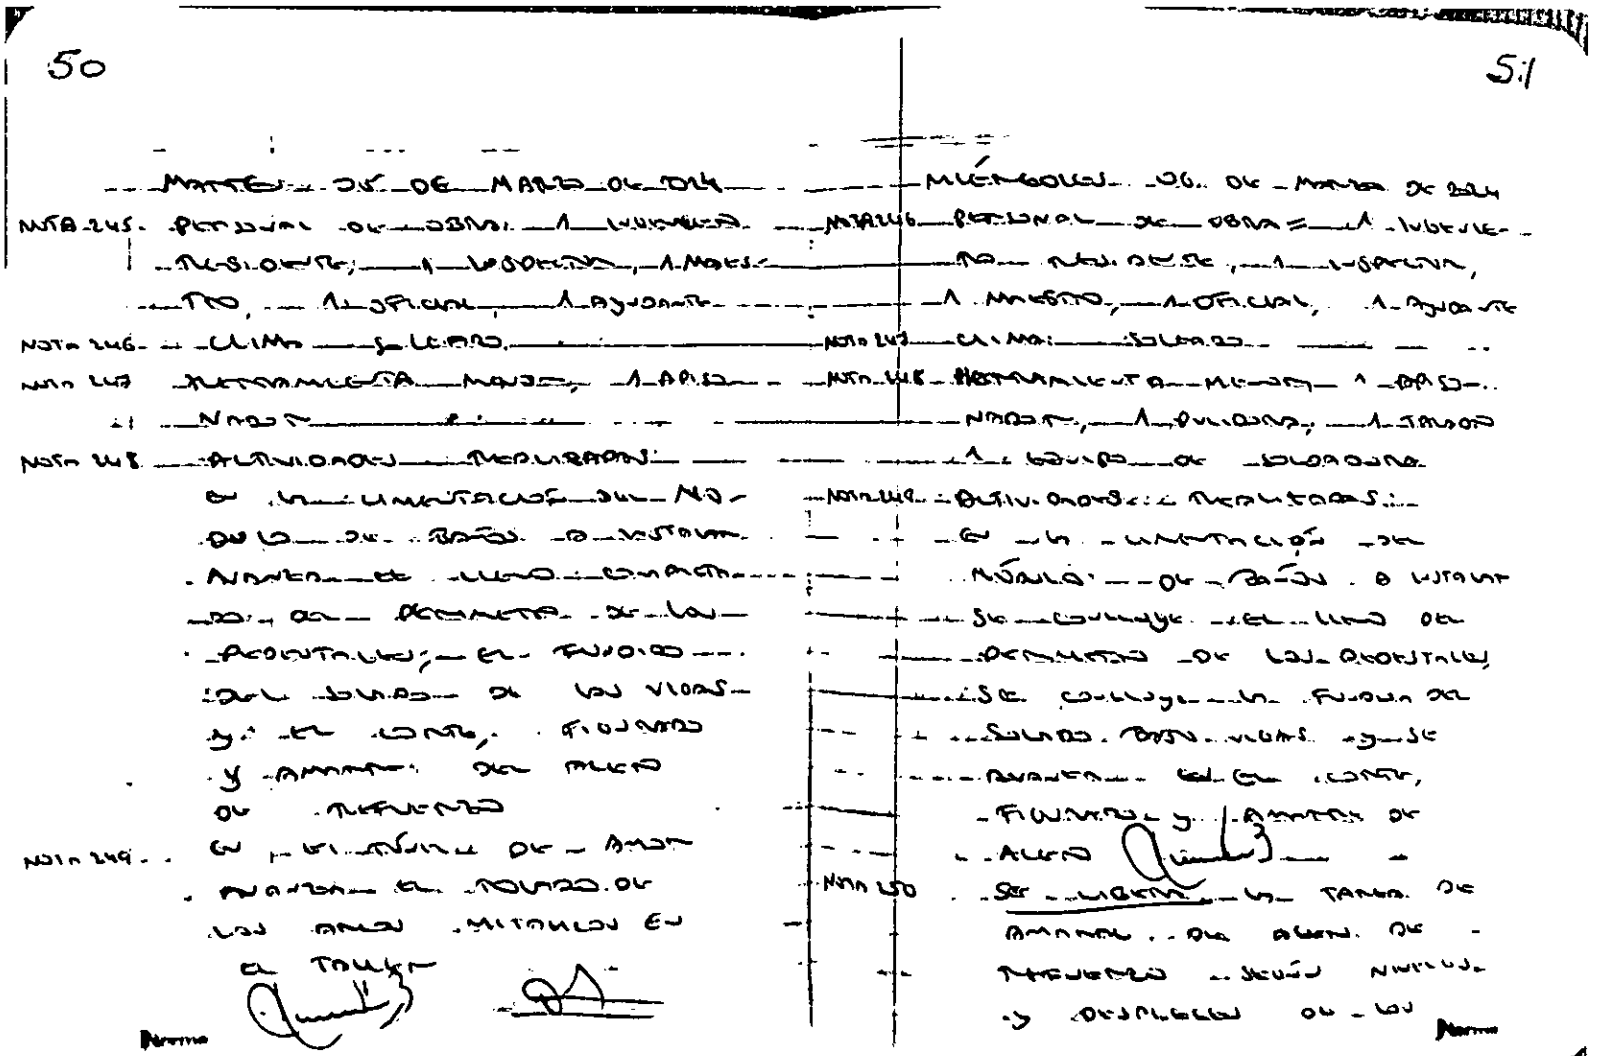

PLANOS Y ESPECIFICACIONES
PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
DE LAS VIAS DE ALIMENTACIÓN

NOTA 151 EN EL TUBO DE AMOR SE INCLUYEN LA INFORMACIÓN DE LAS PLACAS DE LOS DATOS DE LA ALIMENTACIÓN DE LOS AMOS METÁLICOS

Juan 03 de marzo de 84

NOTA 152 PERSONAL DE OBRA: 1 INGENIERO RESIDENTE, 1 INSPECTOR, 1 SST, 1 MAESTRO
2 OFICIALES, 6 AYUDANTES
1 OPERADOR DE MINICARGADOR
2 PINTORES, 1 CARPINTERO DE ACABADOS

NOTA 153 CLIMA: SOLEADO

NOTA 154 ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA, 1 MINICARGADOR USADO, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 VIBRADOR DE CONCRETO, 1 MIXER, 1 CAMIONETA DE SERVICIO.

NOTAS 155 ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTALACIÓN DE PÓLIZA DE BAÑO A INSTALAR SE REALIZA EL VACIADO DE CONCRETO DE LAS VIGAS DE CIMENTACIÓN CON CONCRETO ESPECIFICADO 3000 PSI 6. FINALIZADA ASENTAMIENTO EN SITIO 4½" SE TOMARON LOS RESPECTIVOS CILINDROS PARA SER ENVIADOS A COMPRESIÓN

NOTA 156 EN EL TÍTULO DEL APARTADO ANALIZA LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DATOS DE AMOR.

Juan 03

VIERNES 08 DE MARZO DE 2024.

Nota 258. DIRECCIÓN DE OBRA: 1 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, 1 ARQUITECTO, 1 ARQUITECTO TÉCNICO, 1 OFICIAL, 2 AYUDANTES, 1 CAPATAZ DE ORGANIZACIÓN.

Nota 258 CLIMA: SOLEADO

Nota 259 INSTRUMENTACIÓN MEDIDA, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 EQUIPO DE SOLDADURA, 1 TALADRO, 1 PULIDORA

Nota 260. ACTIVIDADES REALIZADAS:

EN LA CIMENTACIÓN DEL MÓDULO DE ENTRADA

INSTALACIÓN: DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACIÓN. Y: CURADO DE VIGAS MEDIANERAS

ASEO DE OBRA

Nota 261 EN EL PATIO DE LUCES SE COMIENZA LA EJECUCIÓN DE LOS MUROS DE CIMENTACIÓN (PUESTA) DE

LOS MUROS METÁLICOS

Nota 262 SE HACEN LA INSTALACIÓN DE LAS PUESTAS COMPLEMENTARIAS PARA PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS MUROS METÁLICOS

SÁBADO, 09 DE MARZO DE 2024

Nota 263 DIRECCIÓN DE OBRA: 1 INGENIERO TÉCNICO, 1 ARQUITECTO, 1 ARQUITECTO TÉCNICO, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 CAPATAZ DE ORGANIZACIÓN

Nota 264 CLIMA: SOLEADO

Nota 265 INSTRUMENTACIÓN MEDIDA, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 PULIDORA, 1 TALADRO

Nota 266 ACTIVIDADES REALIZADAS:

EN LA CIMENTACIÓN DEL MÓDULO DE ENTRADA SE INSTALA CON MATERIAL AISLANTE DE LOS MUROS DE CIMENTACIÓN

y mano de obra.

Nota 267 En el nivel del mar

Ayuda a la instalación

de los aires acondicionados

Nota 268 Punto de partida en

General se trabaja la

mentalidad de ganar

de los jóvenes

Nota 269 Planear de cobrar: 1 Nuevo

no mensajero, 1 usuario,

1 conductor de mantenimiento

Nota 270 Clima soleado

Nota 271 Mantenimiento menor, equipo

de soldadura, 1 pulidora

1 punto eléctrico

Nota 272 Alrededor entrenados

instalación de aires

acondicionados en todo

el país

Lunes 11 de marzo de 2019

Nota 273 personal de obra: 1 inge-

niero residente, 1 supervi-

sor, 1 oficial, 1 cuadri-

lla de ornamentación

Nota 274 Clima soleado

Nota 275 Mantenimiento menor, equipo de

soldadura, punto eléctrico

Nota 276 Asignaturas realizadas

en la zona de módulo

de ventas a instalar se

incluyen los entregados

e identificación de casas

de visitación para conocer

de desarrollo

Nota 277 El nivel del mar

Ayuda a la instalación de

los aires acondicionados y

programados

NOTA 285 ACTIVIDADES REALIZADAS:
- EL DÍA 13 DE MARZO DE 2024 ...
- ... LOS PRESENTES

NOTA 286 PERSONAL DE OBRA: 1 JEFE DE OBRA, 1 RESIDENTE, 1 ASISTENTE, 1 CAPATAZ DE ALBAÑILERÍA

NOTA 287 CLIMA: SOLEADO

NOTA 288 EQUIPAMIENTO MENOR, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 BOMBA DE AGUA, 1 PULIDORA

NOTA 289 ACTIVIDADES REALIZADAS:
- EL DÍA 14 DE MARZO DE 2024 ...
- ... LOS PRESENTES

NOTA 290 PERSONAL DE OBRA: 1 JEFE DE OBRA, 1 RESIDENTE, 1 ASISTENTE, 1 CAPATAZ DE ALBAÑILERÍA

NOTA 291 CLIMA: SOLEADO

NOTA 292 EQUIPAMIENTO MENOR, 1 EQUIPO DE SOLDADURA, 1 BOMBA DE AGUA

NOTA 293 ACTIVIDADES REALIZADAS

NOTA 294 AVANCE EN TRABAJOS DE LOS MUROS MEDIANEROS PARA EL EJE DE ACCESO DE PERSONAL DE OBRA

NOTA 295 MIÉRCOLES 13 DE MARZO DE 2024

NOTA 296 PERSONAL DE OBRA: 1 JEFE DE OBRA, 1 RESIDENTE, 1 ASISTENTE, 1 CAPATAZ DE ALBAÑILERÍA

NOTA 297 CLIMA: SOLEADO

NOTA 298 EQUIPAMIENTO MENOR, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 PULIDORA, 1 BOMBA DE AGUA

NOTA 299 ACTIVIDADES REALIZADAS:
- EL DÍA 12 DE MARZO DE 2024 ...
- ... LOS PRESENTES

NOTA 300 PERSONAL DE OBRA: 1 JEFE DE OBRA, 1 RESIDENTE, 1 ASISTENTE, 1 CAPATAZ DE ALBAÑILERÍA

NOTA 301 CLIMA: SOLEADO

NOTA 302 EQUIPAMIENTO MENOR, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 BOMBA DE AGUA, 1 PULIDORA, 1 EQUIPO DE SOLDADURA

[illegible] 15 DE MARZO DE 2024

NOTA 245 PERSONAL DE OBRA: 1 MAE-
STRO RESIDENTE, 1 MAESTRO
Y 1 MAESTRO DE ALBAÑILERÍA

NOTA 246 CLIMA SOLEADO

NOTA 244 HERRAMIENTA MENOR, 1 CAMIO-
NETA DE TONELADA Y MEDIA DE
PICK UP ELECTRICA

NOTA 245 PLANIMETRIA: PLANTA DE
CIMENTACIÓN DEL EDIFICIO
PLANTA DE CORTES DE LOS
EJES PRINCIPALES

NOTA 246 CONCRETOS Y FUNDICIÓN DE
DADOS DE PISO DEL
PRIMER NIVEL

SIENDO LAS 16 DE MONTO DE 2024

NOTA 247 PERSONAL DE OBRA: 1 MAESTRO
RESIDENTE, 1 MAESTRO
Y 1 AYUDANTE, 1 OPERADOR

NOTA 248 CLIMA SOLEADO

NOTA 249 HERRAMIENTA MENOR.

NOTA 250 REVISIONES — MEDICIONES
DEL AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO
DE PROCESOS.

NOTA 251 VISITA GUIADA DE ALUMNOS PARA
EL RECORRIDO DEL MONTO
DE OBRA Y LA IMPORTANCIA
DEL USO DE EPP

LUNES 18 DE MARZO DE 2024

NOTA 252 PERSONAL DE OBRA: 1 MAESTRO
RESIDENTE Y MAESTRO, 1
OPERADOR DE GRUA TELESCÓPI-
CA SOBRE CAMIÓN, 1
OFICIAL, 1 AYUDANTE

NOTA 253 CLIMA SOLEADO

NOTA 254 HERRAMIENTA MENOR; 1 GRÚA
CAMION TELESCOPICA BRAZO 18 ML
Y CAMIÓN PLANCHON

NOTA 255 REVISIONES REALIZADAS

Traslado y Mostrenc
de Módulo de Baño
sobre - los ... vicios ... de
cimentación de la
... intervención ...
documento y ... notificación
de ... comunicación ... obra ...

[illegible]

Martes 19 de Marzo de 2024

Nota 306 Personal ... de ... obra: 1 ... Ingeniero
... Ingeniero, 1 ... Arquitecto
1 ... de ... Seguridad ...
Nota 308 ... Claims ... Solicitados ...
Nota 308 Tratamiento ... Menor ...
Nota 309 ... Duplicidad ... Duplicados ...
En la ... Nave ... del ... Almacén ...
... Pantalla ... de ... Almacén de
... los ... Platos ... de ... los
Programas

[illegible]

Miércoles 20 de Marzo de 2024

Nota 310 Personal ... de ... obra: 1 ... Ingeniero
... Ingeniero, 1 ... Arquitecto, 1 ... Arquitecto
... Jefe, 1 ... Ayudante, 1 ... Peón
Nota 311 ... Claims ... Solicitados ...
Nota 312 ... Tratamiento ... Menor ...
Nota 313 ... Duplicidades ... Duplicados ...
En los ... Talleres ... de ... Montaje ...
... Necesidad ... de ... Consumo ...
... la ... Cimentación ... entre Nave
... para ... la ... Verificación ... del
... Estado ... de ... la ... Subestación
... que ... comunica ... dichos Talleres ...
Nota 314 ... En el ... Módulo ... de ... Baño
... Avanza ... la ... Instalación ... de
... la ... Red ... Hidrosanitaria
... Iniciada ... el ... día ... Anterior
Nota 315 En los ... Baños ... Públicos
... se ... Necesita ... la ... Sanitaria
... de ... dos ... Puntos ... Sanitarios
En los ... Baños ... de
... Hombres ... y ... Mujeres ...

...

...

...

ORNAMENTACIÓN

NOTA 324 CLIMA: SOLEADO

NOTA 325 TEMPERATURA MÁXIMA, 1 PUNTO. TEMPERATURA, 1 PUNTO DE SOLEADO, 1 PUNTO

NOTA 326 OBTENIDOS TEMPERATURAS EN EL CENTRO DEL MAR ANTES DE LA VISTA DE DOS ANILLOS Y DE PASAMANOS METÁLICOS

SÁBADO 13 DE MARZO DE 2014

NOTA 327 PERSONAL DE OBRA: 1 VIRTUOSO AL PIANO, 1 VIOLÍN, 1 MAESTRO, 1 ORGANISTA DE MINICONCIERTO, 1 OFICIAL Y 5 AYUDANTES

NOTA 328 CLIMA: SOLEADO

NOTA 329 TEMPERATURA MÁXIMA, 1 MINI CANARIA, 1 ARMA ELÉCTRICA

1 GRUPO DE SOLDADO, 1 PUNTO

NOTA 330 DISTINGUIDOS TEMPERATURAS EN EL CENTRO DEL MAR ANTES DE LA VISTA DE DOS ANILLOS Y DE PASAMANOS CON BARRAS DE PINTURA ANTIVERDE

NOTA 331 EN EL MODELO DE BASES DE MADERA EL TRABAJO DE LA TAMPA, TEJAS Y CIELORRASO PARA TRABAJAR SU RESPECTIVA INSTALACIÓN

NOTA 332 EJECUCIÓN DE EXCAVACIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO ENTRE LA RED DE LUZ DE PASO NOR OCCIDENTAL

Martes 26 de Marzo 2024

NOTA 333. Personal de Obra: residente obra, 1 inspector, 1 maestro obra, 1 cuadrilla ornamentadores

NOTA 334. Estado del tiempo: Dia soleado

NOTA 335 Equipo y maquinaria: Pulidoras, equipo soldadura herramienta menor.

NOTA 336. Actividades realizadas:
Avance en la instalación de todos los elementos que se retiraron para efectuar el traslado del módulo de baños. (rampas, bomdas y rejas). Aplicación de soldaduras y empates de las partes componente del módulo.

NOTA 337. La Interventoria, le solicita al Contratista agilizar remates de enchape en los Baños existentes del Area Administrativa y terminar la pintura de la pared contigua de las Oficinas de la Administración.

NOTA 338 Miercoles 27 Marzo 2024

Personal y equipo: Los mismos del dia anterior

Estado del tiempo: seco

NOTA 339 Actividades realizadas: Continuación de las desarrolladas el dia anterior.

Se le hace observación al Contratista de encorazar con ladrillo el perímetro del módulo de baños en la parte inferior entre la viga de cimentación, antes de empotar la estructura de la baranda al propio módulo.

[illegible] ...

NOTA 445 Se colloca [illegible] del [illegible] y [illegible] de [illegible]

NOTA 443 Se [illegible] en el [illegible] de la [illegible] de [illegible]

NOTA 444 Se [illegible] visado [illegible] [illegible]

[illegible] ...

NOTA 446 [illegible] de [illegible], 1 [illegible] 1 SST, 1 [illegible], 2 [illegible] 5 [illegible], 1 [illegible], 1 [illegible]

NOTA 443 [illegible]

NOTA 444 [illegible]


1 [illegible], 1 [illegible], 1 planta [illegible], 1 vibrador de [illegible], 1 [illegible] 1 [illegible]

NOTA 445 Actividades [illegible]:

- En la [illegible] de [illegible] de [illegible] se [illegible] el volumen del [illegible] de [illegible] 3000 [illegible] a 26 días
- A la [illegible] de [illegible] en [illegible] [illegible] se [illegible] el [illegible] y [illegible] de [illegible] y [illegible]


NOTA 446 Se [illegible] [illegible]


NOTA 447 En el [illegible] se [illegible] un [illegible]

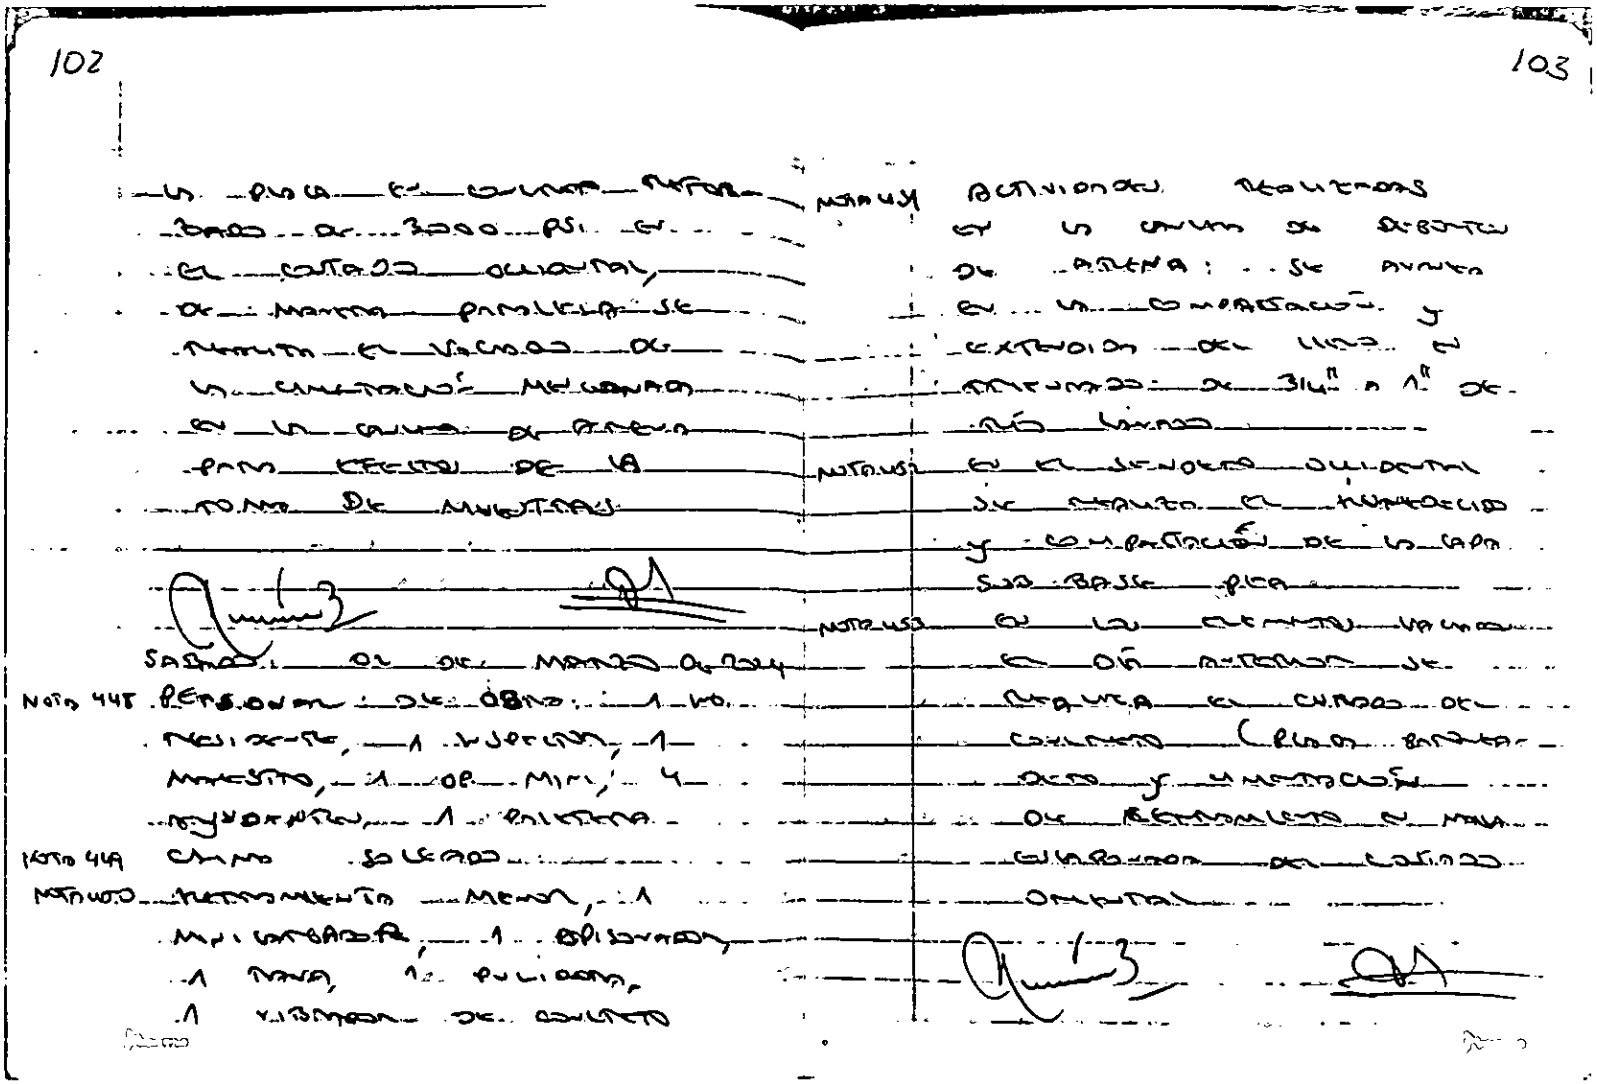



1053


Nota 454 Los resultados de densidades tomados en el terreno se deben comparar con los obtenidos en el laboratorio (proctor corregido), que serán los que finalmente establezcan el grado de compactación del material granular que se ha implementado en el terreno. Es deber que es responsabilidad del Contratista y que deberá garantizar la estabilidad de los carpetas granulares

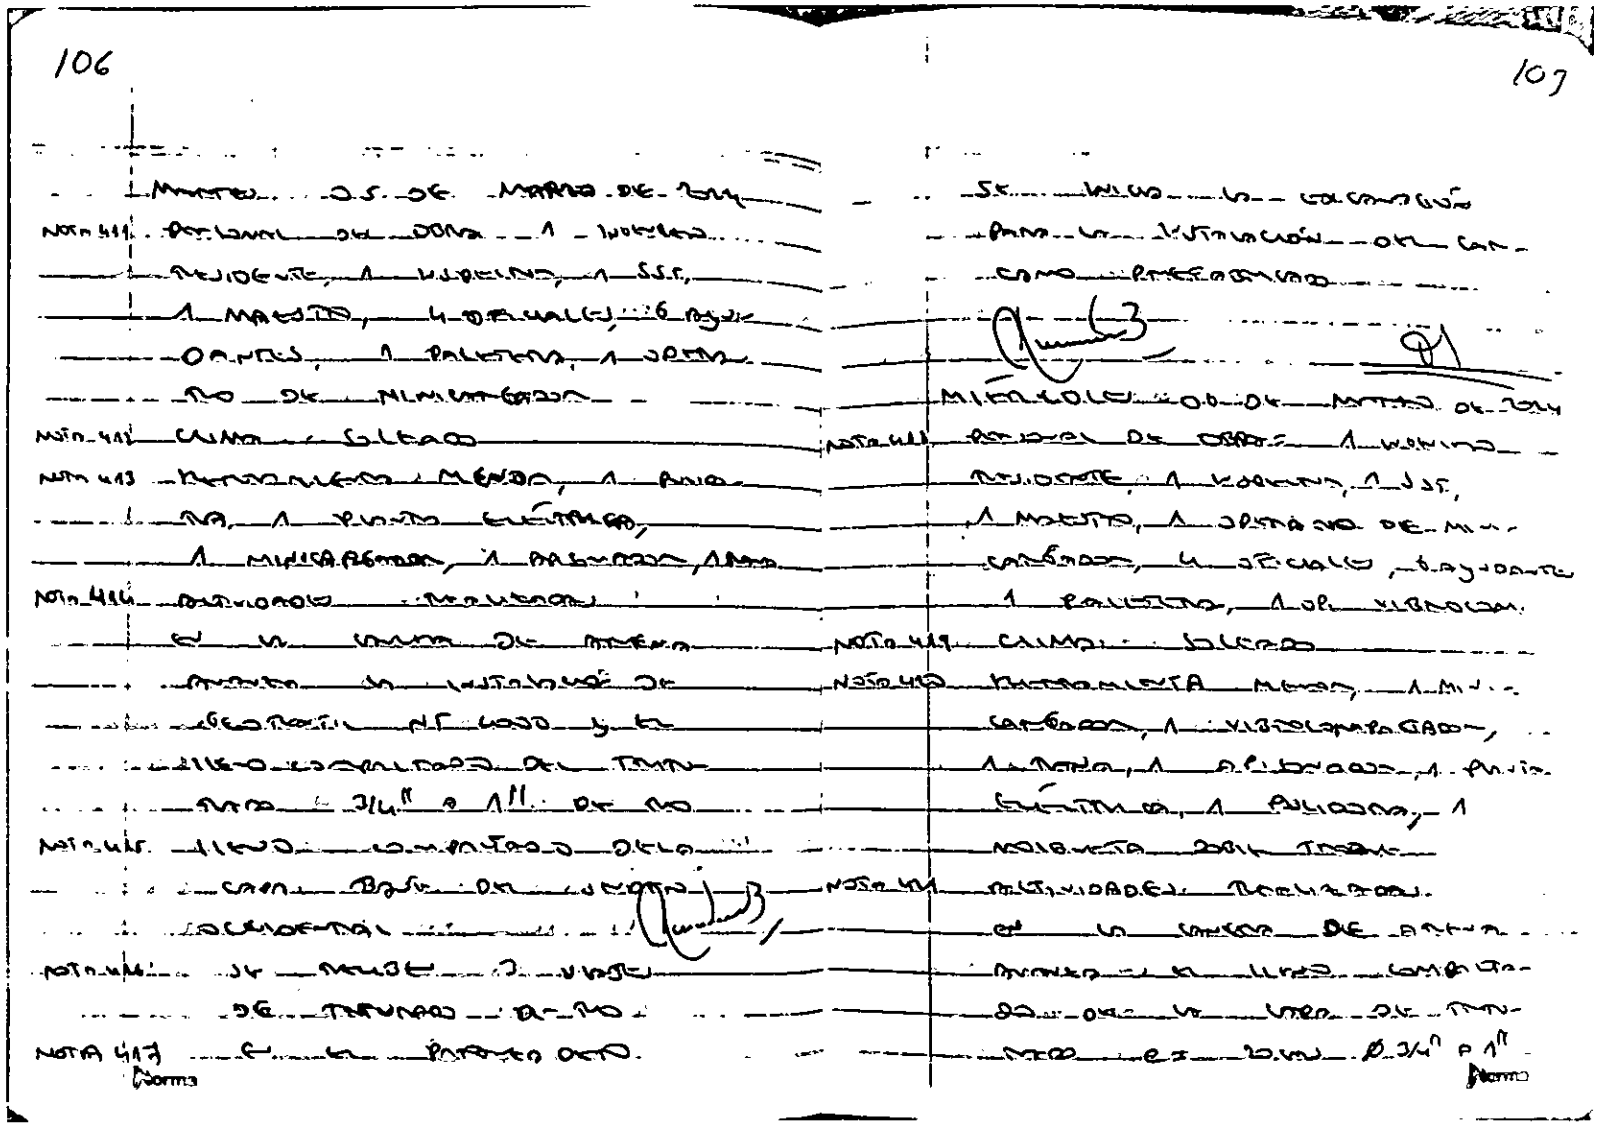

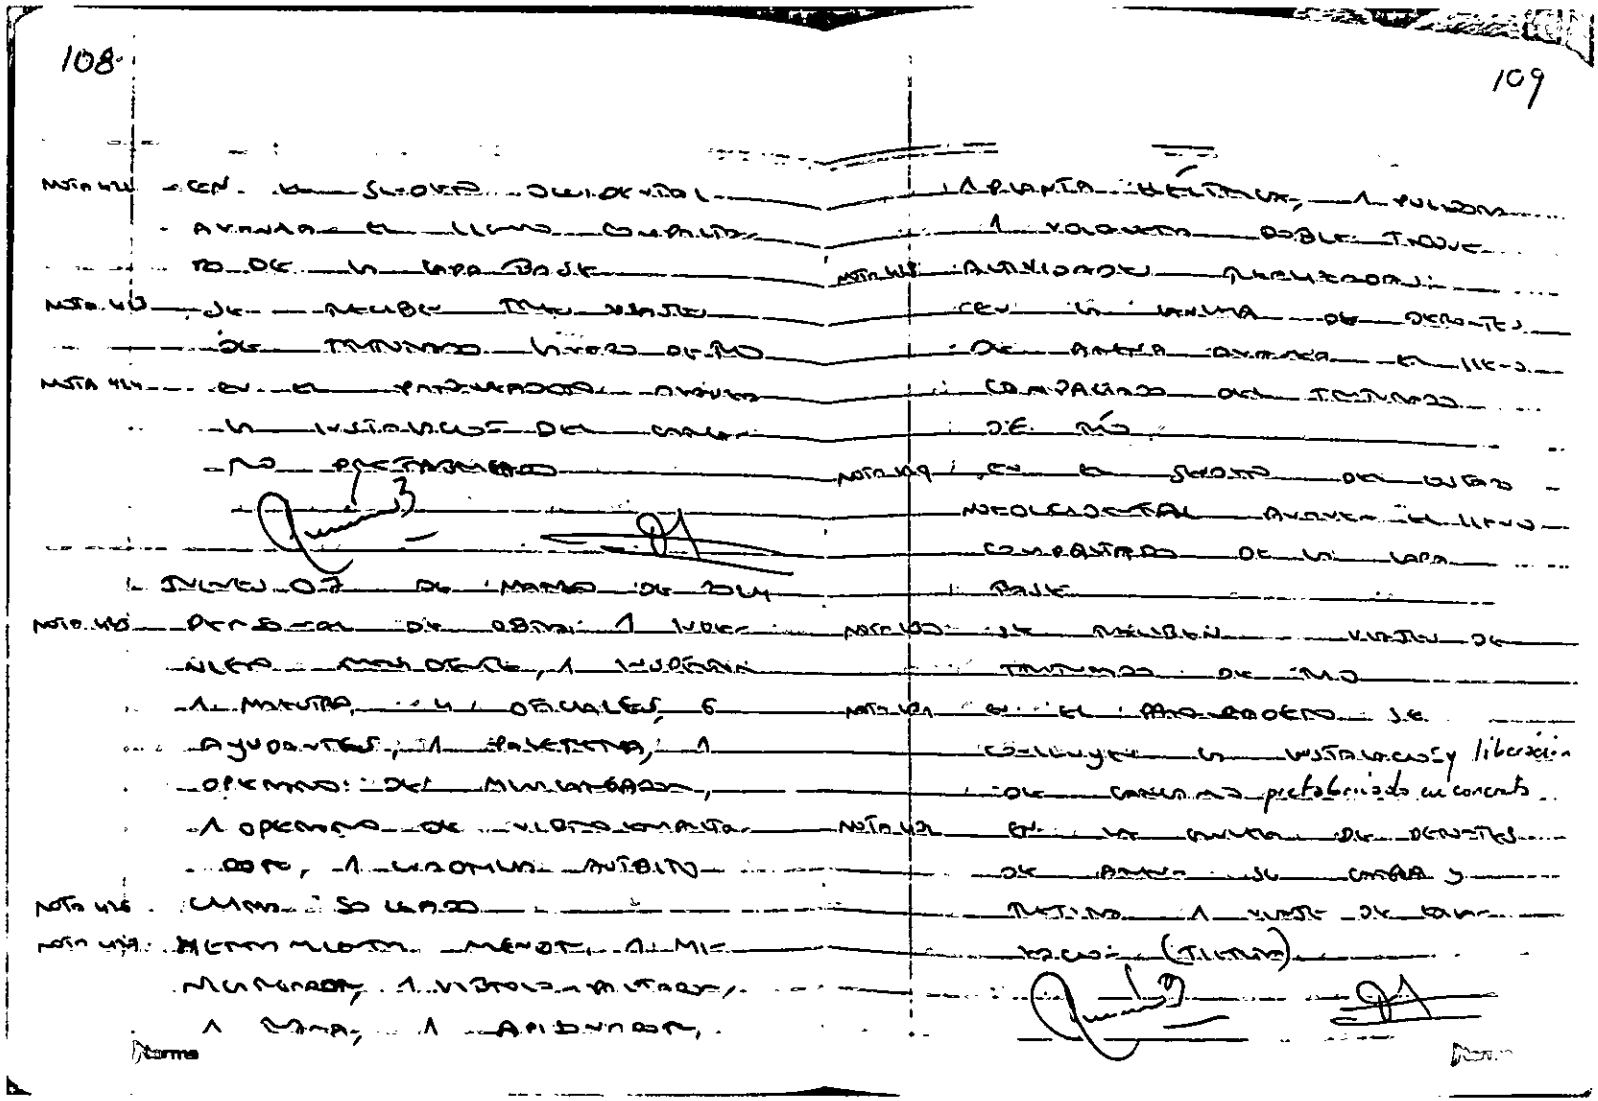

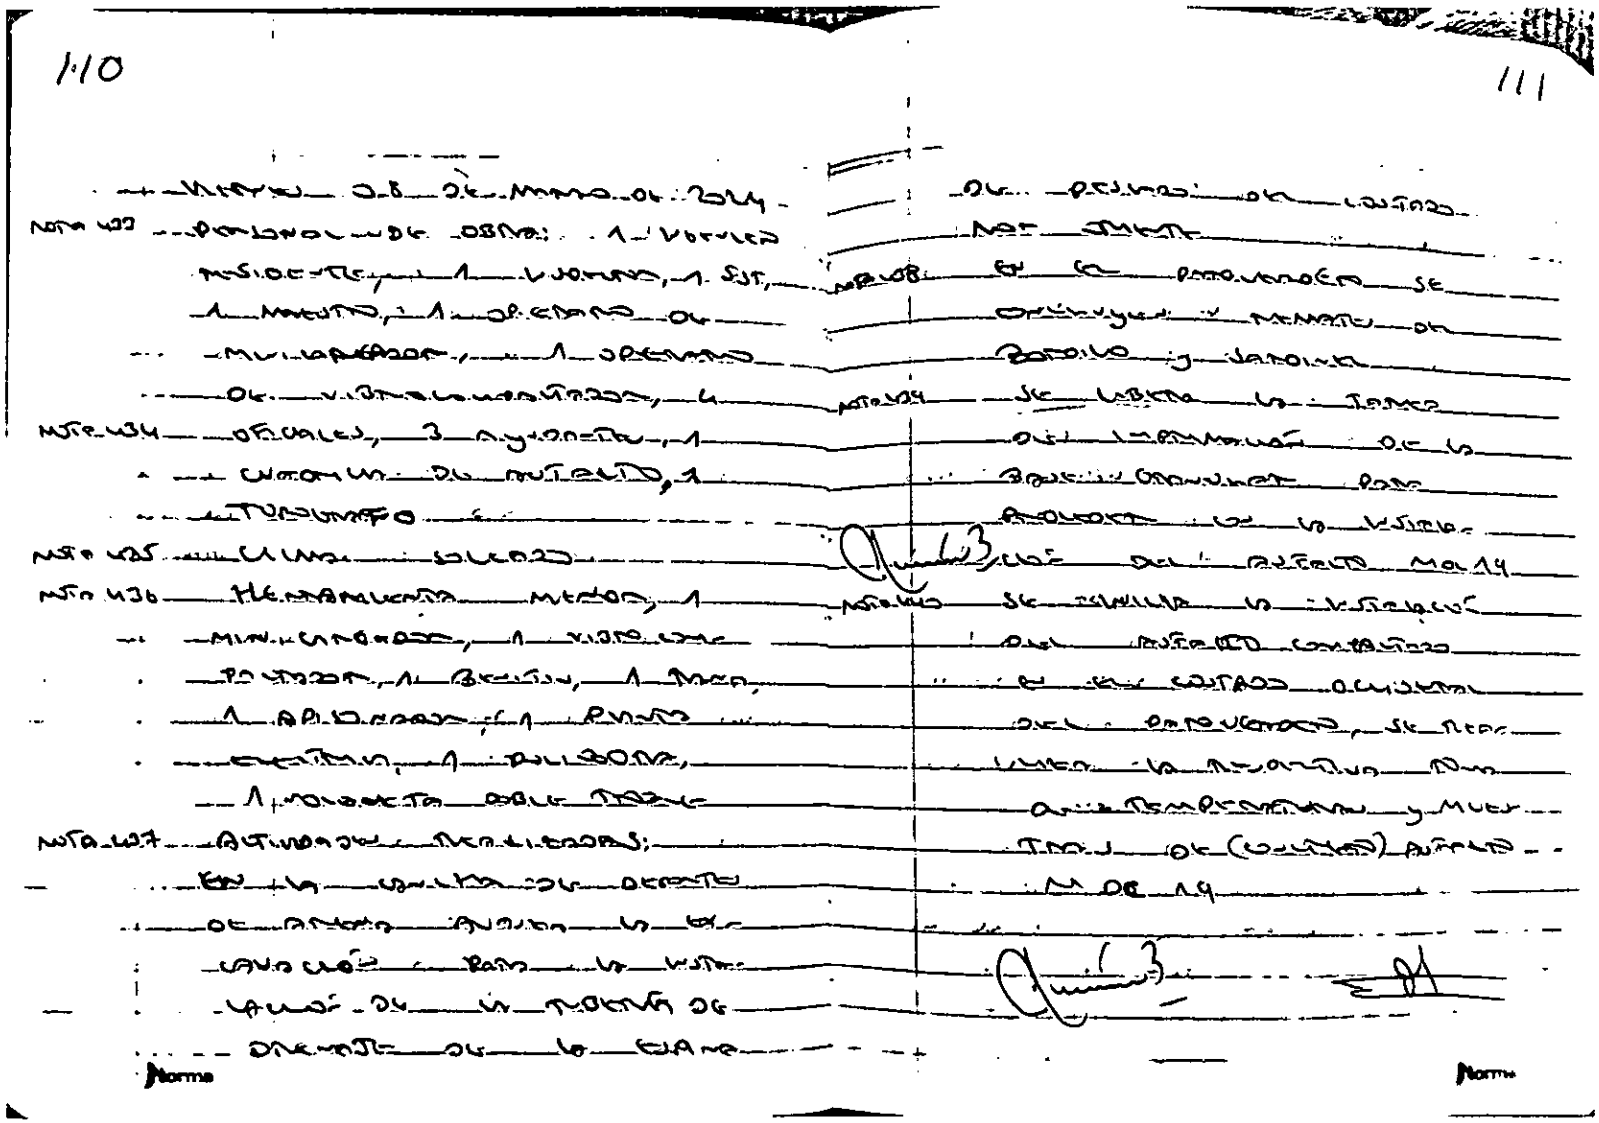

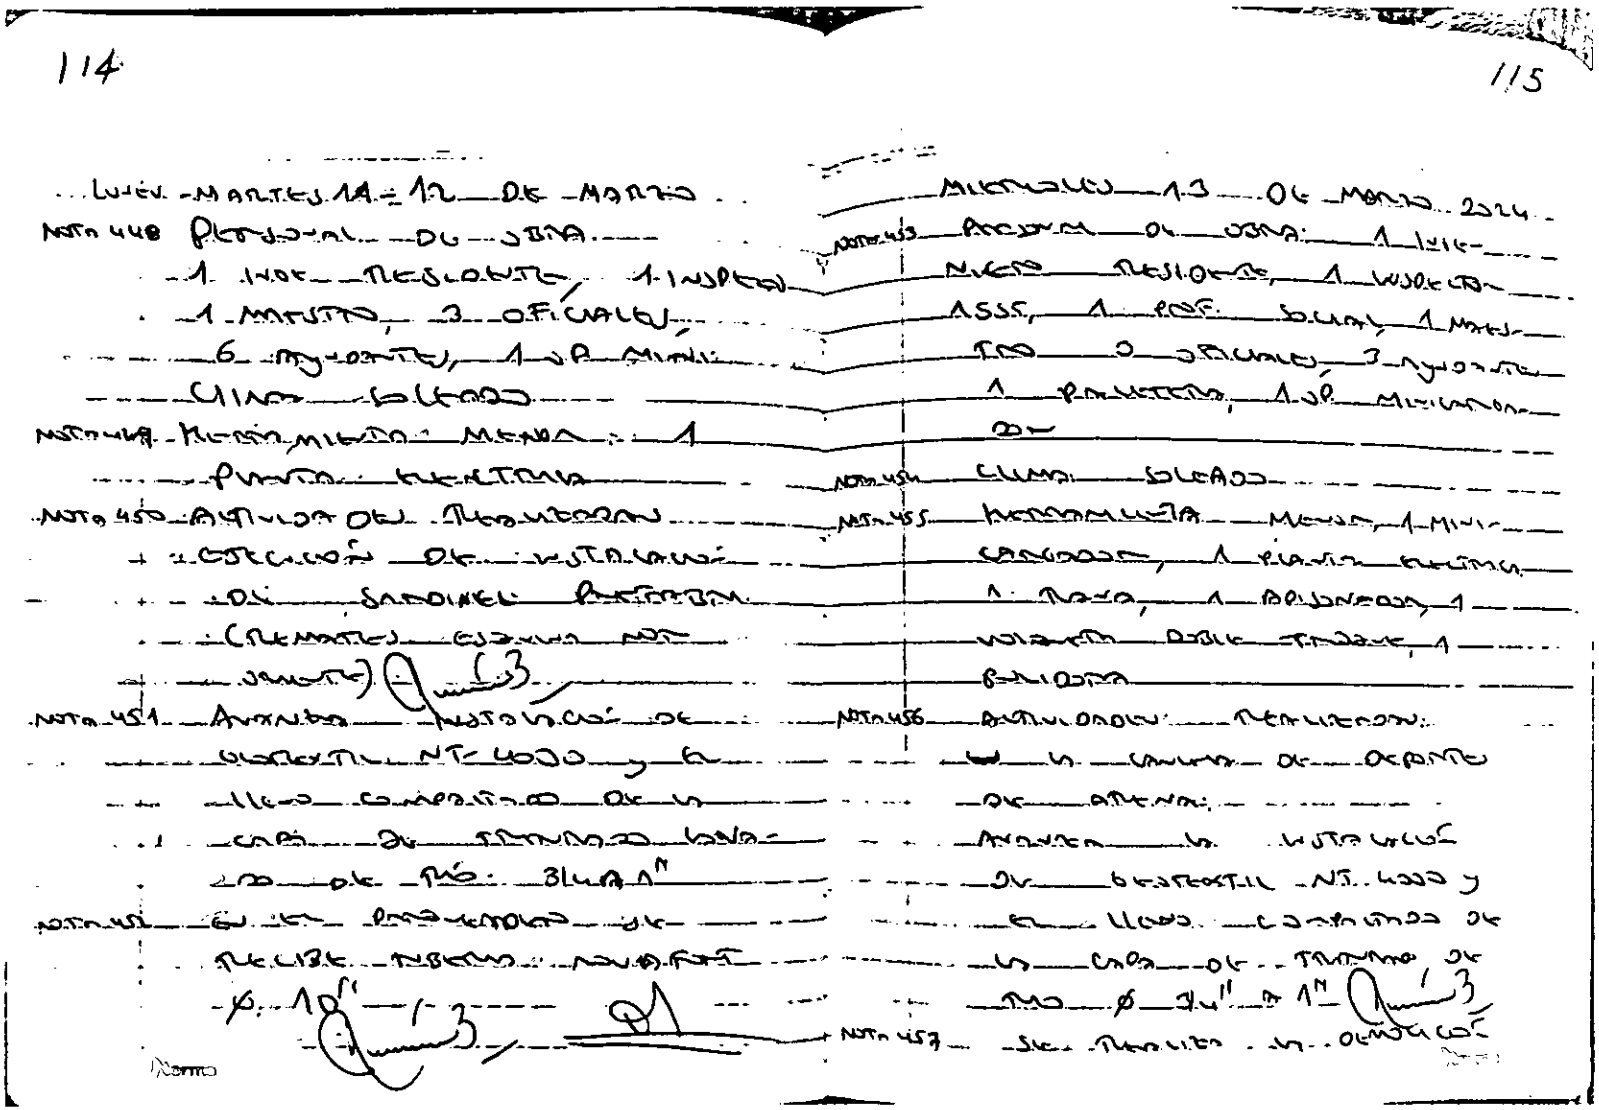

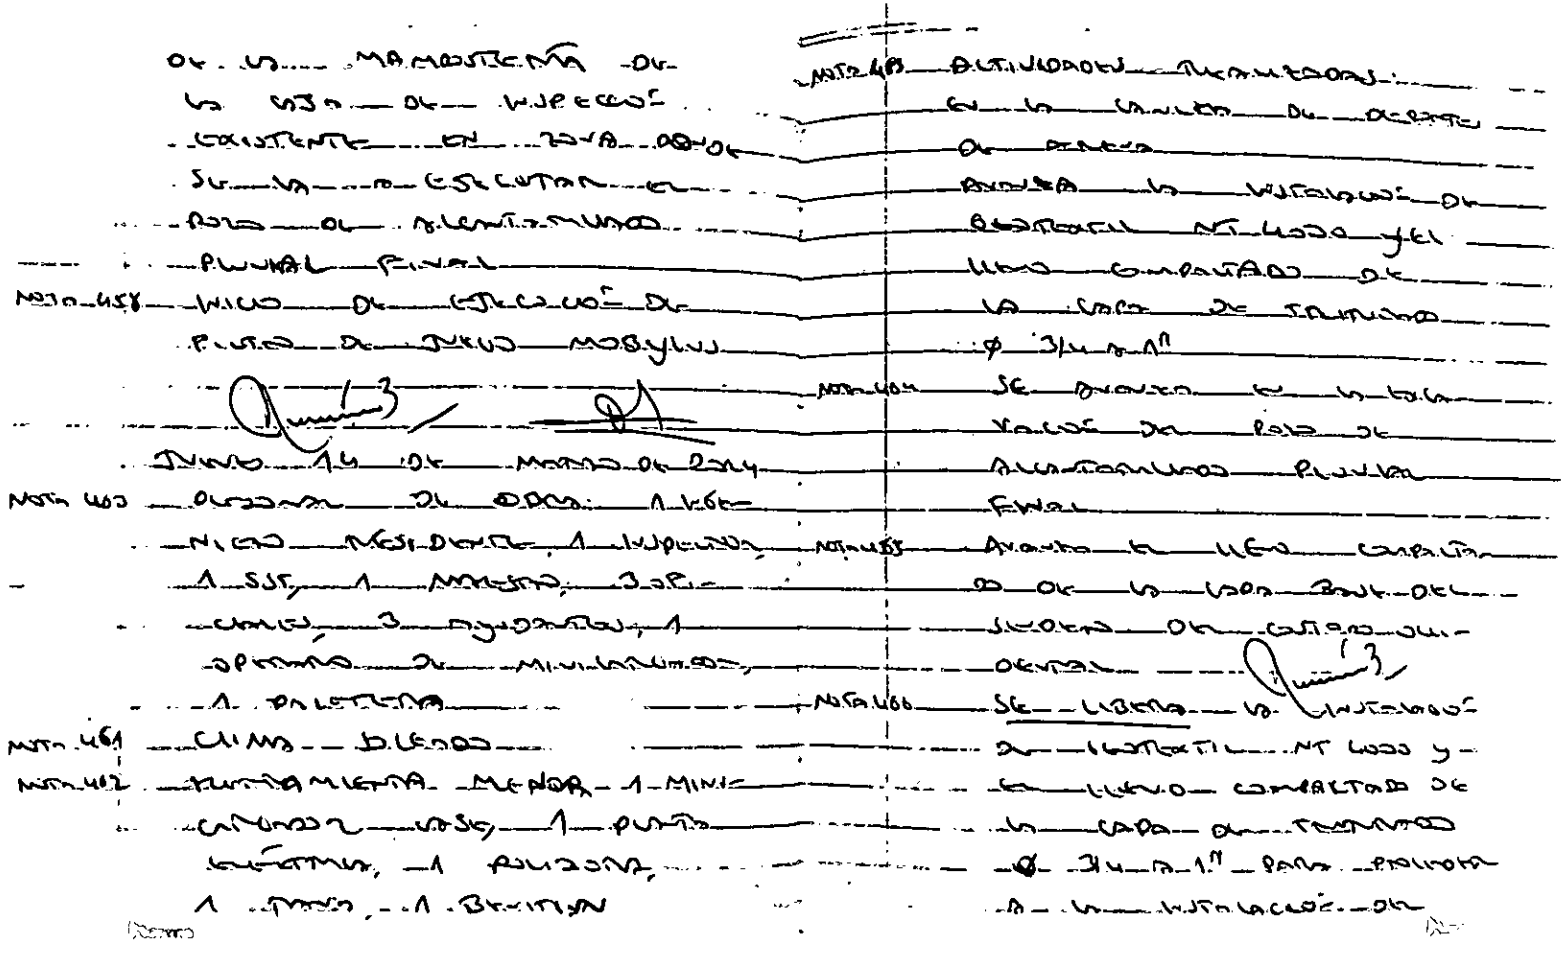

GLOTEXTIL - DVE. COLOR
OLIVA VERDE (CAMUFLADO)
NOTA 467 EN EL PRESUPUESTO
DE OBRA SE VALORA
DE TUBERIA DE DESAGUE
DE LAVADO DE PANTALLA
ADO. Y DE PROTECCIÓN DE
IMPERMEABILIZACIÓN Ø 10" NOVAFONT

VIERNES 15 DE MARZO DE 2024
NOTA 468 PERSONAL DE OBRA: 1 JEFE
DE OBRA MEDIO TIEMPO, 1 ENCARGADA,
1 MAESTRO, 3 OFICIALES, 3
AYUDANTES, 1 PEÓN,
1 OP. MINICARGADOR
NOTA 469 CLIMA: SOLEADO
NOTA 470 MAQUINARIA Y EQUIPOS: 1
MINICARGADORA, 1 GRUA, 1 PLANTA
ELECTRICA, 1 PULIDORA, 1
TALADRO
NOTA 471 ACTIVIDADES REALIZADAS:

AVANCE DE LA INSTALACIÓN DE
GEOTEXTIL NT 4000 Y DE LA
DE TUBERIA Ø 315 A 11
MURAL DE PANTALLA DE DRENAJES
DE LA OBRA EJECUTADA DE-
SDE EL INICIO DEL PROYECTO DEL
COSTADO OCCIDENTAL CERCANO
NOTA 472 A LA CALLE Y AL CAFE.
TAMBIEN LA INSTALACION DE
LA TUBERIA DE DESAGUE.
NOTA 473 EN LA PARROQUIA SE
CONTINUA LA INSTALACIÓN
DE LA TUBERIA NOVAFONT
Ø 10" DEL DESAGUE DEL
CANAL O PUNTO EXISTENTE

SABADO 16 DE MARZO DE 2024
NOTA 474 PERSONAL DE OBRA: 1 JEFE
MEDIO TIEMPO, 1 ENCARGADA, 1 MAES-
TRO, 2 OFICIALES, 4 AYUDANTES

4054

CLIMA: SOLADO

NOTA 484 [illegible] MEDIDOR, 1 PLANTA 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 [illegible], 1 [illegible], 1 [illegible]

NOTA 485 ACTIVIDADES [illegible] EN LA [illegible] DE DE [illegible] SE [illegible] LA [illegible] DE [illegible] DE [illegible] Ø 3/4 A 1"

NOTA 486 SE [illegible] CON DE TUBERÍA [illegible] Ø 3/4 A 1" PARA [illegible] CON LA INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 4000 EN LA PARTE SUPERIOR (TECHADO)

NOTA 487 AMPLIA EL [illegible] DE LA CAPA BASE DEL SUELO GRANULAR EN EL PAVIMENTO

SE [illegible] LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA [illegible] Ø 10"

DE [illegible] PLUVIAL DE [illegible] RECTANGULAR A PVC.

[illegible] 15 A [illegible] DE 2024


NOTA 488 PERSONAL DE OBRA: 1 [illegible], 1 INGENIERO, 1 SST, 3 OFICIALES, 3 AYUDANTES, 1 PALETERO, 1 MAESTRO

NOTA 489 CLIMA: SOLADO

NOTA 490 HERRAMIENTA: MENOR, 1 PLANTA ELÉCTRICA, 1 PULIDORA

NOTA 491 ACTIVIDADES TERAPEUTICAS: EN LA UNIÓN DE GEOTEXTIL DE ARENA ANCLADO EN LA COMPACTACIÓN DE LA CAPA BASE DEL SUELO GRANULAR

NOTA 492 AMPLIA LA INSTALACIÓN DEL GEOTEXTIL NO TEJIDO EN LA PARTE SUPERIOR

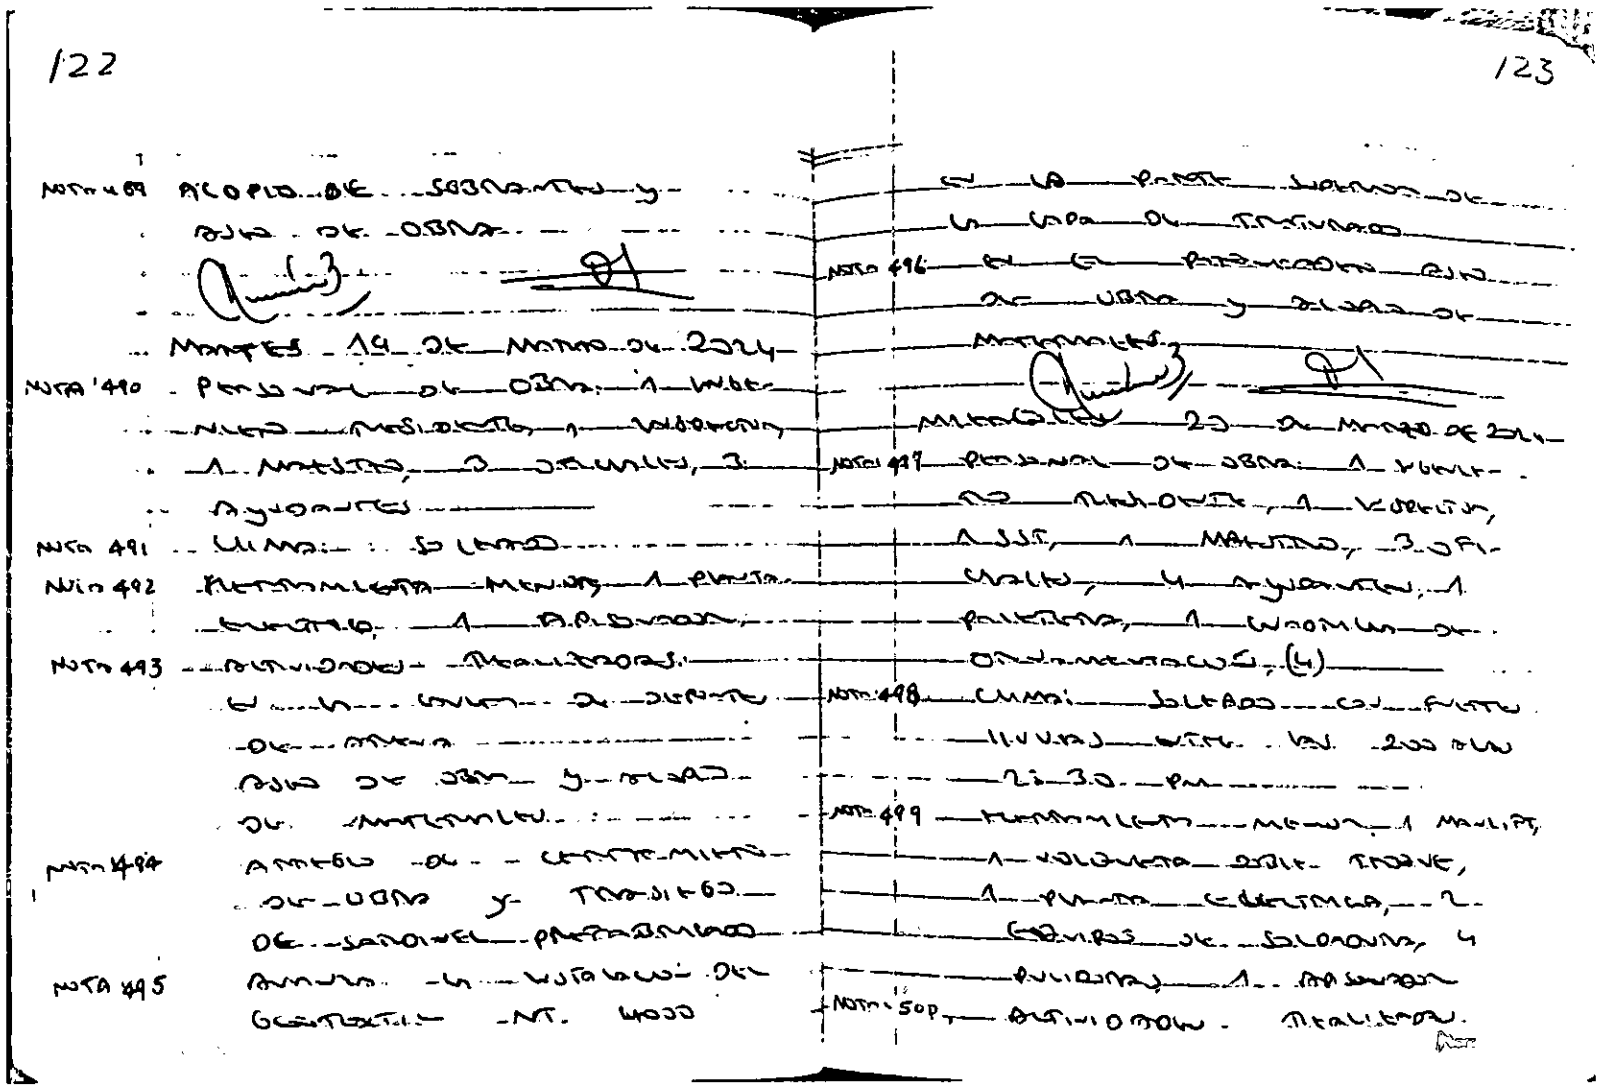

se concluye la visita de
fiscalización al lugar...

NOTA 501 se anuncia en la visita
con el ingeniero [illegible]
encargado en [illegible]

NOTA 502 se anuncia en la casa
vivienda [illegible]
civil de [illegible]
de la fiscalía [illegible]
oficial y la fiscalía
de desarrollo

NOTA 503 se hace la actividad
de visitación de los
textil para dar vida
a la visita de
la mañana [illegible]

NOTA 504 se inicia la visitación
de los [illegible]
levantamiento en [illegible]
[illegible] y notas en
el estado original
[illegible]

NOTA 505 en el [illegible] de
[illegible] lugar

Junio 21 de [illegible] de 2014

NOTA 506 [illegible] de [illegible] 1 [illegible]
[illegible] 1 [illegible], 1 sof,
1 [illegible], 5 de cada, 10
[illegible], 3 [illegible]
1 [illegible] de [illegible]
(3) 1 [illegible]
(2)

NOTA 507 [illegible] [illegible] con [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] 4:30 pm

NOTA 508 [illegible], 1 [illegible],
[illegible], 1 [illegible]
[illegible], 1 [illegible]
[illegible], 3 [illegible],
1 [illegible], 1 [illegible]

NOTA 509 actividades realizadas
en la [illegible]

Nota 510

Nota 511

Nota 512

Nota 513

Nota 514

Nota 515

Nota 516

Nota 517

Nota 518

Nota 519

Nota 520

en la cuenta de electricidad interna. Traslado, cable y tierra de sobrantes.

NOTA 511 Anota la ... valoración de ... para la ... preferentemente para la ... estudios de ... en el ... costo ... calidad ... hilos ... mantenimiento. de ... de ... de ... ornamental ... Anota ... la ... completa de la base granular del ... suelos, la ... valoración de ... partes de ... terminado y ... los ... de ... malla ... reparación y el ... ajuste de ... luminarias a ... las ... calentar ... calentamiento

NOTA 512 Anota la ... valoración de ... cantidad de ... y la ... falda del ... de la ... de ... inspección

... dato del ... del ... Mobylus.

NOTA 513 En la ... parcelación de ... la ... y de ... en ... y el ... de ... material ... sobrante

NOTA 514 Se ... anota ... en la ... clase ... de ... las ... líneas de ... denominación ... de ... proyectada

Sábado 23 de marzo de 2024

NOTA 515 Personal de obra: 1 ingeniero ... 1 ... 1 ... 2 ... 6 ... ayudantes, 1 ... demandas

NOTA 516 ... llamar ... saldrán ...

NOTA 517 ... montaje, 1 ... 1 ... planta ... 1 ... -off, 2 ...

NOTA 518 Actividades realizadas en la ... de ...

130

131

1060

MARTES 26 DE MARZO DE 2024

NOTA 549. Reporte de obra. Residente de Obra

1 Inspector, 1 SST, 1 maestro de obra, 3 oficiales, 6 ayudantes, 1 cuadrilla ornamentadores, 1 cuadrilla eléctricos.

NOTA 550 Estado del tiempo: Día soleado

Equipo y maquinaria: 1 plataforma elevadora tipo "manLIFT", 1 minicargador bobcat, polideras, equipo soldadura, compresor, guadaña, herramienta manual, volquetas, camión, vibrocompactadora.

NOTA 551 Actividades realizadas.

Instalación de lamparas tipo LED en postes (retiro de las existentes) en zona de canchas volyplaya. Avance en la instalación de módulos del cerramiento metálico por costados oriental y sur, (observaciones de la Interventoría referente a la instalación). Revisión de escuadras y plomos. Distanciamiento entre módulos, aplicación de soldadura.

NOTA 552 Instalación de sardinel prefabricado para conformación de graderías (canchas arena playa)

Hechura de cajas de inspección para drenaje de aguas canchas. (remate cintas marco tapas).

NOTA 553. Colocación de filtros en zona de juegos arena niños

Instalación de capa de grava 10 cm.

NOTA 554 Avance en la instalación del adoquín de arcilla en sendero del costado occidental

NOTA 555 Zona Parqueadero.

Aseo general y recolección escombros y material.

Liberación instalación de césped

NOTA 556 Se le ha solicitado al Contratista agilizar la pinturа de los bordes de las Canchas de volyplaya existentes y agilizar además, el suministro e instalación de la arena tipo Peldar.

13

la intervantoria, identificando las cintas y presentan fractura, tomando la decisión de reparar desde abajo los puntos afectados para la entrega a satisfacción a la entidad. se detectan en refuerzo de la pista (juntas de dilatación placa

nota 156. Miércoles 28 de febrero de 2024
Inician a tomar reparaciones en flanjas de grosito afectadas - dilatadas para armar estructura y asentar pasajeros las fisuras en esas juntas de losas.

Jueves 29 de febrero de 2024.
nota 157 Continuan la actividad de ruptura de loso para corregir e instalar parrilla en acero de 1/2" y corregir dilataciones.

Viernes 1 de marzo de 2024.
nota 158 Continuan con la ruptura de la losa

placa contra-peso en poste ubodromo.

Sabado 2 de marzo de 2024
nota 159 Continuan demoliendo losas de contra-peso afectadas figuran acero para al empantillado

nota 160 Lunes 4 de marzo de 2024.
Instalan acero en losa, aplican epoxico para anclar, realizando todo el empantillado y posterior fundida en concreto. se fijan rejillas de earcamo con mortero y fundan cinta para continuar. se le solicito al Contratista por parte de la Interventoria realizar arco al Cárcamo.

Martes 5 de marzo de 2024
nota 161 funden 2 flanjas en concreto armado para evitar dilatación en losa contra peso poste ubodromo.

Miércoles 6 de Marzo 2024.

Nota 162 Localizan el acero en franjas a fundir en piso velodromo y continuan armando pamillas.

Jueves 7 de Marzo 2024.

Nota 163 Fundan franjas en concreto para dar inicio a la fundida de granito el día 8 de marzo, y posterior pulida.

Nota 164 Viernes 8 y Sábado 9 Marzo.
Pulida para realizar en la totalidad de la pista de velocidad.
Instalación de la valla en la Entrada principal del Parque.

Nota 165 Domingo 10 y Lunes 11 Marzo.
Personal: 1 residente 1 cuadrilla de graniteros.
1 oficial, 1 ayudante.
Estado del Tiempo: Días soleados.
Equipo y herramienta: cortadoras, pulideras, herramienta menor.

Nota 166 Actividades desarrolladas: Finaliza la pulida de la totalidad de la pista de velocidad.
Recolección y transporte de escombros para disposición final.
Reconstrucción de frisos en concreto.

Nota 167 Martes 12 de Marzo 2024.
Entrega final de los trabajos realizados en el Escenario al Administrador del Parque Señor Adonay Palacios.
Puesta en funcionamiento la Pista de Patinaje (carril de velocidad, al servicio de la Comunidad.
Elaboración del Acta de la Puesta en Servicio Obras Comunidad

Bitacora de obra

Nombre parque: Velodromo 1° de mayo.
Codigo: 04-196.

Objeto del contrato: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento adecuación, reparación y recuperación de la estructura de los parques que integran el sistema distital de parques administrados por el IDRD.

Contrato de obra N° :3094 de 2023
Contrato de interventoria N° 3131 de 2023
Contratista : Consorcios Parques Bog.
Interventoria: Solun Ingenieria SAS.

Director obra Arq. Luis Alfredo Granados.

Director Interventoria Arq. Edna Cepeda.

Residente obra Ing. Rodney Granados

Residente Interventoria Ing. Luis Mordegan

(5)

Nota 16 Martes 12 de marzo 2024
Personal en Obra = ——
Clima: frio
Herramienta y Equipo: ——
Actividades:
Nota 17. Llego a obra postes metalicos y cuadros metalicos para el reemplazo de los postes en concreto en la zona del velodromo.

TTO INGENIERO DE LA OBRA

Nota 18. Se solicita al contratista cumplir a intervención los certificados de Calidad de los postes y cuadros metalicos.

TTO INGENIERO DE LA OBRA

Nota 19 Jueves 14 de marzo 2024.
Personal en Obra: 1 oficial 1 ayudante
Clima: frio
Herramienta: Herramienta menor

2063


Actividades:

NOTA20 Se realizan y se inician actividades en la zona del velodromo.

NOTA21 Se inicia el desmonte de las luminarias de los postes del velodromo

NOTA22 Se inicia el corte en concreto alrededor del poste en concreto sobre el tunel de acceso.

NOTA23 Se inician actividades de excavacion manual alrededor del poste existente no-ornamental



NOTA24 Viernes 15 marzo/2024
Personal en obra: 1 electricista ayudante 2 electricos.
Clima: Seco
Herramienta: Herramienta menor
Actividades!

NOTA25 Se c
alre
nor

NOTA26 Se
de l
elec

NOTA27 Sal
Pers
1 ofi
clim
Herr
Acti

NOTA28 Se
en
en

NOTA29 Sell
y lo
para
el

(9)

NOTA 25 Se continua con la excavación alrededor del poste estado nov encontrel.

NOTA 26 Se continua en el desarrollo de luminarias de los postes electricos del vecindario

FDO Residente
DES Interventor

NOTA 27 Sabado 16 marzo 2024
Personal en obra: 1 residente
1 oficial 2 ayudantes
clima: Soleado
Herramienta: Herramientas manuales
Actividades

NOTA 28 Se realiza desalojo de placa en concreto alrededor del poste en concreto estado nov-accident

NOTA 29 Se retira por parte del contratista y la interventoria la logistica para entrar el equipo grua y el vehicul

FDO Residente
DES Interventor

1064

NOTA30 Lunes 18 marzo 2024

Personal en Obra: 1 residente +1
Oficial +2 ayudantes +2 electricos
Lluvia: Seco-frio
Herramienta: Herramienta menor
Actividades:

NOTA31 Se continua actividades de
desmonte de luminarias de
los postes electricos del velodromo

NOTA32 Se continua con la excavación
alrededor del poste encontrado del
encuentro de túnel.

NOTA33 Se le comunica al administrador
y se le solicita permiso para
poder sacar una cuneta para
el compresor y el bobcat.
Se concede permiso por parte
del administrador del velodromo.

NOTA34 Parte
Perso
+ lote
Llu
Herra
menor
Activ

NOTA35: Se
estan
para
las
y el

NOTA36 Se in
afect
real
gran
cant

NOTA37 El
excav
y gra
de
poste
al

Martes 19 marzo 2024

Personal en obra: 1 excavadora doble + 1 operario + 2 ayudantes + 2 elect. Cliente. Sheada

Herramienta y equipo: Herramienta menor + Bobcat + volquete

Actividades:

NOTAS: - Se realiza el retiro del malla electrosoldada con ayuda del pago para poder ingresar las volquetes, el bobcat, y el cargador.

NOTAS: Se ingresa la volqueta sin realizar afectaciones al cerramiento realiza el descargue de material granular para acondicionar la entrada del cargador.

NOTAS: El mini cargador bobcat se encargo de pasar el material granular y conformar la rampa de acceso desde el andén peatonal hasta el [illegible] adyacente al cerramiento [illegible]

1065

(10)

Jueves 28 de marzo 2024.

Personal en Obra: 1 Jefe de Obra, 1 Oficial + 2 ayudantes + 1 Electricista

Clima: Frio - Seco

Herramientas: Herramienta menor

Actividades:

NOTA 38 Se colocan las zonas de trabajo con cinta de señalización peligro

NOTA 40 Se continua excavando alrededor del pozo en concreto existente de la zona del tanque subterráneo.

NOTA 41 Se continua con el desarrollo de luminarias de los postes electricos en la zona del sebadero.

NOTA 42 Se inicia actividades de desmonte de cajas electricas existentes en el estado estado nor-occidental.

NOTA 43 Jueves

Personal

Clima:

Herram

Activid

NOTA 44 Se co

de los

NOTA 45 Se ra

lo de

contra

NOTA 46 Se re

dos (2

de do

para p

que

NOTA 47 Se in

bodeg

tener

placa

segu

(10)

24.
dente Obra,
Zelectrica

* menor

s de trabaje
con peligro
ii alrededor
encia de
do por

uente d
s electrico
del

to deshabi
tente) en
n-contactar

(11)

Jueves 21 marzo 2024.

Personal en Obra: 1 capataz +
1 oficial + 2 ayudantes + 2 electricistas
Clima: Soleado
Herramientas: Herramientas menores
Actividades.

NOTA 44: Se continúa con el desmonte de luminarias en el poste de concreto costado suroccidental.

NOTA 45: Se realiza y se continúa con la demolición de cajas eléctricas costado noroccidental.

NOTA 46: Se realiza el desmonte de dos (2) bancas en concreto y de dos (2) canecas en material para permitir la entrada de camión grúa al sitio.

NOTA 47: Se realizo aseo en el limite bahcat de la excavación en terreno y de la adecuación de la placa en concreto se limpia y se libera botadero

1066

(82)

NOTA48 Viernes 22 marzo 2024
Personal en Obra: 1 residente +
1 oficial + 3 ayudantes + 2 electricos de
Clima: frio
Herramienta: Herramienta menor
Actividades:
NOTA49: Se realiza el desmontaje de luminarias electricas en el poste electrico en concreto de costado nor-occidental.
Se da por terminado esta actividad
NOTA50 Se realiza excavacion alrededor del poste en el costado sur-occidental NOTA55
NOTA51 Se realiza corte y aplome a figuras de hierro para la caseta NOTA56
metalica para los pedestales

[signature]
ING RESIDENTE
DAN LUTEIN

NOTA52 Sabado 23 marzo 2024
Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes
Clima: Soleado

NOTA57

(13)

Herramienta: Herramienta menor
Actividades

NOTA53 Se realiza excavación alrededor del poste en cuarto delantero Suroccidental y del cuarto Suroriental.

NOTA54 Lunes 25 marzo 2024 (FESTIVO)
Personal: 1 residente, 1 oficial
3 ayudantes
Clima soleado
Herramienta: Herramienta menor
Actividades.

NOTA55 Se realiza excavación y demolición de cajas eléctricas existentes

NOTA56 Se realiza aseo y aseo se realiza barrido en las zonas afectadas por excavación.

NOTA57 Martes 26 marzo 2024
Personal: 1 residente, 1 oficial + 3 ayudantes

Clima: Soleado
Herramienta: Herramienta Menor
Cavo cruz.
Actividades

NOTA58. Se realizo el desmonte de los cuatro(4) postes en concreto antiguos.

NOTA59 Se realizo la excavacion para los dados en concreto de los postes nuevos metalicos

[signature] [signature]
Fiscalizacion
Dep Interv

NOTA60 Miercoles 27 marzo 2024
Personal: 1 residente + 1 operario
+3 ayudantes
Clima: Soleado
Herramienta: Herramienta menor vibrador, cilindros metalicos para abrahan, mixicargador, carro de concreto.
Actividades

NOTA61 Se real
concret
fundido.

NOTA62 Se rea
abrahan
se ten
de con
labrete

NOTA63 Se va
los re
metali

NOTA64 Se fun
niveles
en se

NOTA65 El co
con el

NOTA66 una v
el al
los 3

[signature]

NOTA 61 Se realizo la instalacion de concreto con concreto premezclado traido de planta.

NOTA 62 Se realizo el ensayo de cono de abrahm por asentamiento y se tomaron seis (6) cilindros de concreto por sencillez a la caracteristica por se fallo das.

NOTA 63 Se vaciaron concreto y se colocaron los respectivos cañamazos metalicos de acero (varillas).

NOTA 64 Se tomaron los respectivos niveles y se afinaron los mismos en superficie.

NOTA 65 El concreto instalado fue vibrado con el equipo vibrador.


NOTA 66 Una vez terminada se repite el mismo procedimiento en los 3 excavaciones.

FRD ADMINISTRADOR
Ing. [illegible]

1063


Nota 67 Jueves 28 marzo 2024

→ Jueves Santo.



Nota 68 Viernes 29 marzo 2024

→ Viernes Santo



Nota 69: Liberación de Actividades mes de Marzo 2024.

FECHA	ACTIVIDAD	LIBERACIÓN
• 19/03/24	Alistamiento Desmonte de Poste en Concreto	Liberado
• 26/03/24	Desmonte de Poste en Concreto	Liberado

BITACORA DE OBRA.

NOMBRE: PARQUE CANAL BOYACA
CÓDIGO: 09-050

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD.

CONTRATO DE OBRA: 3099 DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES BOG.
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3131 DE 2023
INTERVENTORIA: SOLUM INGENIERIA SAS

DIR OBRA.
ARQ. LUIS A. GRANADOS D.
RES OBRA

DIR INTERV.
ARQ. EDNA CEPEDA.
RES INTERV.
ING. FERNANDO PONDRAGON

1069

desinstalación de juegos de madera y el
Trazado de dados en placa existente.

Dr. obra

Nota 61 Jueves 29 de febrero 2024.
Nota 62 Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes.
Nota 63 Clima: Soleado
Nota 64 Herramientas y Equipos: Herramientas menores.
Nota 65 Actividad del día: llegan a obra 300 unidades de adoquín arcilla, continua el trazado de dados en placa existente para juegos infantiles.

Dr. Obra

Nota 66 Viernes 1 de Mayo de 2024
Nota 67 Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes
Nota 68 Clima: Soleado.
Nota 69 Herramientas y Equipos: Herramientas menores.
Nota 70 Actividad del día: Inicio la excavacion de dados en dicha zona de juegos infantiles excavacion en curso

Dr. obra.

Nota 71
Nota 72
Nota 73
Nota 74
Nota 75
Nota 76
Nota 77
Nota 78
Nota 79
Nota 80
Nota 81
Nota 82
Nota 83
Nota 84

(6)

(7)

Nota 71 lunes 4 de Marzo de 2024

Nota 72 Personal en obra: 1 Oficial, 3 ayudantes.

Nota 73 clima: Soleado.

Nota 74 Herramientas y equipos: Herramientas menores.

Nota 75 Actividad del día: Continuan realizando excavaciones de dados y de retiro de excombros, se inicia a fundir estructura de sendero x 1 Pozo de oxigenacion.

Nota 76 Martes 5 de Marzo de 2024.

Nota 77 personal en obra: 1 oficial, 4 ayudantes.

Nota 78 Clima: Soleado.

Nota 79 Herramientas y Equipos: Herramientas menores

Nota 80 Actividad del dia: realizan excavación de dados para el mastil y cajon.

Nota 81 Miercoles 6 de marzo de 2024.

Nota 82 Personal en obra: 1 oficial, 4 ayudantes.

Nota 83 Clima: Soleado.

Nota 84 Herramientas y equipos: 1 minicargador, Herramientas menores.

1040

Actividad del día: Se realiza estructura de sendero y plazoleta de 0.85 cm. Según estudio preliminar de geotecnia, por encontrarse un material suelto y para dar mejor estabilidad al sendero y plazoleta.

Dir obra

FOTOGRAFIA DES/INTEGRAL

Nota 85. Jueves 7 de marzo de 2024

Nota 86. Personal en obra: 1 oficial, 4 ayudantes

Nota 87. Clima: Soleado en la mañana, nublado por la tarde, lloviznas aisladas.

Nota 88 Herramientas y Equipos: 1 mini cargador, Herramientas menores.

Nota 89 Actividad del día: Continuan realizando excavación con maquina en estructura del sendero y plazoleta.

Dir obra

FOTOGRAFIA DES/INTEGRAL

Nota 90 Viernes 8 de marzo de 2024

Nota 91 Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes.

Nota 92 Clima: Soleado.

Nota 93 Herramientas menores: Mini Cargador, Herramientas.

(8)

(9)

menores.

Actividad del día: Continuan retirando material de excavación de la estructura del sótano y plazoleta, continuan realizando excavaciones de dados.

Obra

Lunes 11 de marzo de 2024.

Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes.

Clima: Soleado

Herramientas y Equipos: Herramientas menores.

Actividad del día: realizan excavación y demolición de plantilla para zona de juegos infantiles.

Obra

Martes 12 de marzo del 2024.

Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes.

Clima: Soleada

Herramientas y Equipos: Herramientas menores

1057
958

(10)

nota 104 Actividad del día: Realizan excavaciones para juegos infantiles 361 x personal musical, instalación de geotextil T-2400 TELA NO TEJIDA Vos / INTEGRI

En obra

nota 105 Miércoles 13 de Marzo del 2024

nota 106 Personal en obra: 1 oficial, 3 ayudantes.

nota 107 Clima: Soleado.

nota 108 Herramientas y Equipos: Herramientas menores, Picos, carretillas, palas, barra, etc

nota 109 Actividad del día: Continuan realizando excavaciones para dados juegos CBOID y para el musical. instalacion de subbase zona andadero, demolicion placa concreto pavimento flexible zona infantil. Vos / INTEGRI.

En obra

nota 110 Viernes 15 de Marzo de 2024.

nota 111 personal en obra: 2 oficiales, 4 ayudantes

nota 112. clima: Soleado

nota 113 Herramientas y Equipos: Herramientas menores, 1 Saltarin-Compactador.

Nota 114. Actividad del día: Se compacta, se sella y se rasanta, se instala gaotexit. Tejido 2400, se aplica base tipo PEA e: 020, en zona de Sendero y plazoleta.

Dr. Obra

PEA

Nota 115. Sábado 16 de marzo de 2024.

Nota 116 Personal en Obra: 2 Oficiales, 4 ayudantes.

Nota 117 Clima: Soleado.

Nota 118 Herramientas y Equipos: Herramientas menores y Vibro-compactador.

Nota 119 Actividad del día: Se humedece la PEA en sendero, para proceder a compactar, se continua con el la aplicación de la base tipo PEA en plazoleta.

Dr. Obra

PEA

Nota 120 Lunes 18 de Marzo de 2024

Nota 121 Personal en Obra: 2 oficiales, 4 ayudantes.

Nota 122 Clima: Soleado
Nota 113 Herramientas x Equipos: Herramientas menores, Vobro-compactador:
Nota 114 Actividad del día: Continuan compactando la base reciclada P.E.A. en tendido x Plaeolata. Instalacion geotextil Tzuvex Paralela a la vía
Nota 115 Martes 19 de Marzo del 2024
Nota 116 personal en obra: 2 oficiales, 4 ayudantes
Nota 117 clima: Soleado
Nota 118 Herramientas x Equipos: 1 Vobro-compactador, 1 mini-cargador, Herramientas menores.
Nota 119 Actividad del día: Continuan compactando la base topo-PEA, se realiza jornada de aseo x todos, Haga a obra base TOPO IDRD.

Dr. Obra

Dr. Obra

(12)

(13)

Miercoles 20 de marzo del 2024

Personal en obra: 2 oficiales, 4 ayudantes

Clima: Soleado

Herramientes y Equipos:

Actividades: Se realiza instalacion de bordillos, cuneta, plazoleta y zona juegos infantiles.

Se realiza visita de la supervisora del contrato, Directora de Interventoria especialista de vias de Interventoria se realiza inspeccion y avance de actividades, se define la estructura del 1/3 de la zona infantil faltando hay placa de concreto por parte del especialista

Jueves 21 de marzo del 2024

Personal en Obra: 2 oficiales, 4 ayudantes, 1 operador

Clima: fresco

2033

Nota 129 Herramientas y Equipos: Herramienta menor, 1 bobcat, 1 vibrocompactador

Nota 130 Actividades: Se realiza excavación con el bobcat en el 1/3 zona inferior de donde no hay placa de concreto.

Nota 131 Se compacta fondo de excavación con el vibrocompactador y se instala el geotextil 2400, se coloca material granular x capas y se compacta con el vibrocompactador

Nota 132 Se realiza instalación de bandillas alrededor de la media circunferencia zona inferior.

Ing. Obra.

FIRMA SUPERVISOR DEL INTERV.

Nota 133 Viernes 22 de marzo del 2024

Nota 134 Personal en Obra: Topógrafo, 4 ayudantes, 1 ope. vibrocompactador

Nota 135 Clima: Soleado.

Nota 136 Herramienta y Equipo: vibrocompactador Herramienta menor

mate
pacteda
zacely
infantil.
te.
aracer
y se
se colca.
y se
pacteda
adilles
rferia

padrosa
ntenv.

024
y
da

ompactada

Nota 137 Actividades: Se continua compactando con el vibrocompactador zona del sendero. Se instala y se compacta base zona infantil

Nota 138 Se continua compactando con el vibrocompactador en zona infantil al 1/3 de la zona, instalación de base

Nota 139 Se realizaron toma de densidades sobre material compactado en el 1/3 de la zona infantil y en el sendero.

Dominguez

Dir. Obra.

Nota 140 Sabado 23 de Marzo del 2024

Nota 141 Personal en Obra: Zapateles, y ayudantes, 2 electricistas

Nota 142 Clima: Soleado

Nota 143 Herramientas y Equipos: Herramienta menor.

Nota 144 Actividades: Llega a obra la malla del juego de la pirámide el cual se instala en su debido momento.

1024

Nota145 Se realiza montaje de juego infantil. una(1) unidad.

Nota146 Se realiza compactacion del material granular en conjunto en los bordes en el sendero

Nota147 Se realiza excavacion para instalacion de bordillo en el sendero (se inicia esta actividad)

Nota148 lunes 25 de marzo del 2024

Personal en Obra: 2 operador, 4 ayudantes.

Nota149 Clima: Seco - fresco

Nota150 Herramienta menor: Herramienta menor,

Nota151 Actividades: Se realiza la colocacion de formaleta entre la zona de los juegos infantiles y la plazoleta

Nota152 Se realiza la colocacion de tubos para niveles. Este se retira por intervention.

Nota153 S

Nota154 K

Nota155 Pe

Nota156 C

Nota157 H

Nota158 Ac

Nota159 S

Nota160 S

(16)

juego

del

que en

no

ue instala-

ueleno

).

s/Interv

024

y 4

uricate

la colocación

na de los

plazoleta

del

rense

(17)

Nota 153 Se instala malla electrosoldada en el 1/3 de la zona juegos infantiles para tender con concreto.

Dir. Obra. — Fiscalización Res Interv.

Nota 154 Martes 26 de Marzo del 2024.

Nota 155 Personal en obra: 2 albañiles, 4 ayudantes, 2 electromecánicos

Nota 156 Clima: fresco

Nota 157 Herramienta y Equipo: Herramienta menor

Nota 158 Actividades: Se continua con la instalación de bordillos confinando la 1/2 luna o 1/2 circunferencia en la zona de juegos infantiles.

Nota 159 Se termina la excavación de las huecos para la conformación de los dados en zona juegos infantiles

Nota 160 Se termina la instalación del juego de escalar en zona infantil.

Dir. Obra. — Fiscalización Res Interv.

1075

(18)

Nota161 Afrecales 27 de marzo del 2024
Nota162 Personal en obra: 2 oficiales + 4 ayudantes
Nota163 Clima: Soleado
Nota164 Herramienta y Equipos: Herramienta menor, cilindros de concreto (para abrahan casa terminada), vibrador concreto, boquilleras.
Nota165 Actividades: Se revisa por parte de interventoria, los niveles para la fundida del concreto.
Nota166 Se revisa por parte de interventoria que los materiales y equipos para la fundida esten en obra y esten funcionando.
Nota167 Se revisa por parte de interventoria la malla electrosoldada que este bien instalada y bien colocada
Nota168 Llega el concreto premezclado de planta, se aplica la revision antes de instalarla
Nota169 Se procede a humectar con agua

la zona del 1/3 a fundir en la zona de los juegos infantiles

Nota 170 se realiza el ensayo/deasentamiento con el cono de abrahams...

Nota 171 Se realiza la toma de los cilindros de concreto se toma seis (6) en total.

Nota 172 Se realizo la colocación del concreto se vibro el concreto con el vibrador, se toman los respectivos niveles, se chequea en todo momento

Nota 173 se realizo el afinado del concreto con la boquillera, se revisa en todo momento los respectivos niveles.

FDO RESIDENTE DE OBRA

Fdo. Dir. Obra.

Nota 174 Jueves 28 de marzo del 2024
→ Jueves Santo.

FDO RESIDENTE DE OBRA

Nota 175 Viernes 29 de marzo del 2024
→ Viernes Santo

FDO RESIDENTE DE OBRA

Fdo. Dir. Obra.

BITACORA DE OBRA
PARQUE BOSQUE DE SAN CARLOS

CONTRATO 3099 DEL 2023

Objetivo: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto Agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el Sistema Distrital de parques administrados por el IDRD.

CONTRATISTA - Consorcio Parque Bog.
Directora: Luis Alfredo Granados
Residente: Luz Stella Quintero

Interventoria: Solun SAS.
Contrato: 3031 DE 2023
Residente: FERNANDO FONDEGOA. Director:
Nota: Los profesionales adjuntos en el contrato pueden hacer anotaciones.

58

Jueves 29 Febrero 2024

Personal en obra: 1 ingeniero residente obra, 1 residente interventoria, 1 inspector, 1 oficial y 5 ayudantes:

Herramienta y equipo: 1 polidora, 1 mezcladora, 1 vibrador de concreto, 6 camisas y herramienta menor

Actividades realizadas

- Se realiza flujo de cemento y arenado de concretilla de refuerzo del bordillo con zarpa.
- Se reciben las maquinas biosaludables del mantenimiento para su instalación.

FDO MONDRAGÓN
DEL INTERVENTOR

Viernes 1 Marzo 2024

Personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 2 oficial y 5 ayudantes.

Ultimo Soleado

Actividades realizadas

1077
904

Se realiza fundida de bordillo con zapata
Zona nueva en concreto 3000 psi
mezclado en sitio de acuerdo al
Diseño de mezcla presentado a la
Interventoria Se toman 6 muestras de
(Cilindros) concreto
instalacion de dusion de cinal en
bordo hombres

Nota 77-2 Marzo de 2024
. Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 Residente de obra, 1 inspector, 2 Oficiales y 5 ayudantes.
Clima soleado
Herramientas y equipos: 1 polidora, 1 taladro, 1 mezcladora de concreto, 6 camisas para muestras de concreto, 1 vibrador de concreto, herramienta menor
Actividades realizadas.
- instalacion de maquinas basculables.

- Retiro

Nota 4 Ma
Personal
residente
obra, 2
Clima
Herram
taladro,
Activida
- Instala
bordillo
- Doblad
refuerzo

Nota 5 Ma
Personal
residente

lo con za-pi
o psi
) al
do. a la
stras de

l en

steven-
, 2

Retiro de formaleta de bordillo con zarpa

FOO Residente de Interv

14 Marzo 2024 Lunes

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector de obra, 2 oficiales y 5 ayudantes.

Clima: Soleado en la mañana, lluvia en la tarde.

Herramientas y equipos: Pulidora, 1 taladro, 1 mezclador de concreto, H. menor.

Actividades realizadas

- Instalación de acero de refuerzo de bordillo con zarpa. Anclado con epoxico.
- Doblado de flejes. Para concreto de refuerzo bordillo con zarpa.


FOO Residente de Interv

15 Marzo de 2024 Martes

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector de obra.

1079

2 oficiales y 5 ayudantes de obra civil
2 ayudantes y 1 soldador.
Clima: soleado
Actividades realizadas
Se realiza el retiro de mallas
debajo del puente e instalacion de nuevos
modulos de malla esfalborada.
Instalacion de formaleta para encofrado
de bordillo con tempra zona gimnasio
Instalacion de parales de centramiento
fundido en dados en la zona de
drego existente.



Nota: 806 Marzo de 2024 Miercoles
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoria, inspector 2 oficiales y 5 ayudantes
Clima soleado
Herramientas y equipos: 1 Roladora, 1 cubridor de concreto, 1 taladro

1 mezclador de concreto, Herramienta menor.
Actividades realizadas
Se realiza fundida de bordillo con zapata zona típica en concreto 3000psi mezclado en sitio de acuerdo al diseño de mezclas presentado a la interventoria se toman cilindros de muestras de concreto para ensayo de resistencia.

Fecha 17 Marzo de 2024 Jueves.
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 Inspector, 3 oficiales y 1 ayudantes.
Clima: Soleado.
Herramientas y equipos: 1 Pulidora, 1 vibrador, 1 taladro, 1 mezclador de concreto, Herramienta menor.
Actividades realizadas.
- Se realiza retiro de formaleta de zapata del bordillo y se instala al pie de bordillo

1019

Se funde en concreto de 3000psi de
Acuerdo al diseño de mezclas; se
instala material de relleno como atraque
de bordillo con zarpa.

FOO ALEJANDRA DES INTERV

Ntu82-8 Marzo 2024. Viernes
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1
residente de interventoría, 1 inspector, 3
oficiales y 7 ayudantes. Se
Clima: soleado
Actividades realizadas
- Se retira formaleta zona bordillo y se
instala formaleta hacia zona Sendero para
iniciar a encofrar bordillo con zarpa.
- Instalacion de canastilla de acero de
refuerzo para bordillo con zarpa.
- Se realiza fleje de acero.

FOO ALEJANDRA INTERV DES

Nota 83-9 Marzo 2024 Sábado.


Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 residente de interventoría, 3 oficiales y 7 ayudantes.

Clima: Soleado.

Actividades realizadas

- Se realiza instalación de canastilla de acero de refuerzo y se hacen flejes y cruce de la canastilla de refuerzo del bordillo con zapata.
- Se hace revisión e inspección de los bebederos notando que el bebedero ubicado en la administración está en perfecto estado y funcionalidad y el bebedero cerca de los CAI no cuenta con flujo de agua, se ubicó el registro y se realizó excavación donde se ubica la red hidráulica y desagüe pero no cuenta con suministro de agua, por lo tanto se informa a la interventoría. Si se procede a alimentar con nueva red el bebedero.

Nota 84 El día 6 de marzo se realizó la fundida del juego n3 en la zona de baloncesto del parque que pertenece al polígono del parque.
Se realiza instalación de material de reciclo en la totalidad del área requerida.
Se realiza instalación de formaleta para bordillo con zapata.



Nota 85- 11 marzo de 2024
Personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector, 3 oficiales y 3 ayudantes.
Clima: Soleado
Actividades realizadas
Se realiza fundida de zapata de bordillo con zuncho perimetral de la zona de gimnasio en concreto de 3000 psi de acuerdo al diseño de mezcladora.

Presentado a la interventoría.
Se toman 6 muestras de cilindros de concreto.
Se retira pídisombra de cerramiento en la zona del riego m3 instalado.

FDO RESIDENTE INTERV

Nota 86-12 Marzo de 2024
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector, 3 oficiales y 7 ayudantes.
Clima: Soleado
Herramientas y equipos
- Se realiza suministro e instalacion de geotextil 2100 m2 en zona de gimnasios.
- Se realiza suministro, instalacion, extendido de material base b200 para conformar estructura de zona gimnasios.

FDO RESIDENTE INTERV

1087
988


Nota 87-13 Marzo de 2024

Personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector, 3 oficiales y 7 ayudantes.

Clima: Soleado.

Actividades realizadas

- Se avanza con el extendido de geotextil e instalación de material base para conformar la estructura de los gimnasios.
- Se informa la interventoría que el geotextil esta siendo traslapado entre 0,40 y 0,50 cm.



Nota 88-14 Marzo 2024

Nota 89

Personal en obra: 1 residente de obra 1 residente de interventoría, 3 oficiales y 7 ayudantes.

Clima: Soleado.


Herramientas y equipos: minicargador

vibrocompactador, vibrador de concreto, ...
Camisas para cilindros de concreto.
Actividades realizadas
se realiza fundida de bordillo con
zampa zona gimnasio
instalacion de malla de refuerzo para
rampa de acceso al tanque y gimnasio
Suministro de SBR (caucho negro)
riego para humedecer el material de
base y compactacion con el vibro
compactador
instalacion de material de base y sellado

Nota 89 - 15 marzo, 2024.
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1
residente de interventoria, 1 inspector
de obra, 3 oficiales y 6 ayudantes.
clima: soleado
Actividades realizadas
se realiza fundida de bordillo de

Confinamiento de la rampa de acceso a gimnasio e instalacion de acero de refuerzo

Trasiego de material de base b200 e instalacion y sacado para conformar la estructura:



Nota 9:16 Marzo 2024

Personal de obra: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 inspector de obra, 3 oficiales y 7 ayudantes, 1 operador de minicargador y 1 operario de vibrocompactador

Clima: Soleado

Herramientas y equipos: minicargador, vibrocompactador, vibrador de concreto, formaleta, Herramienta menor.

Actividades realizadas

Se realiza la fundida de rampa para personas con movilidad reducida.

Se compacta material b200 en la estructura

Nota 9:18 Ma

Personal residente oficiales minicarg Clima: Herramie formale menor Actividad Se Se c compac señal gimna

de biosaludables.
Se funde bordillo_orca muro de zona biosaludables.

Folio 91-18 Marzo de 2024
Personal de obra: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector de obra, (3) 2 oficiales y 6 ayudantes; 1 operador de minicargador.
Clima: Soleado.
Herramientas y equipos: Minicargador, vibrocompactador, formaleta, mezcladora de concreto y herramienta menor.
Actividades realizadas:
- Se retira formaleta de bordillo con zona.
- Se continua realizando instalación, extendido y compactación de material base zona y sentado para conformar estructura en zona gimnasio.

Nota 92-19 Marzo 2024:
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente interventoría, 1 inspector, 2 oficiales
y 5 ayudantes, 1 operador de minicargador,
1 operador de vibrocompactador
Clima: Soleado
Herramientas y equipos: minicargador,
Herramienta menor
Actividades realizados:
Compactacion de primera capa de material de
base B200 en zona gimnasio
e instalacion y sisado de material

Nota 93 - Se informa a la interventoria que
durante los dias 20 de marzo al 22 de
marzo se realizo actividad de instalacion y compactacion de cuna de base
Tipo I DRD en zona gimnasio; durante
estos dias se mantuvo un personal de
3 oficiales, 6 oyudantes, 1 operador de

Nota 94-23
Pers
Ses
Of
Cl
Ac
Se
Cab
Se
Por

Firma

minicargador, 1 operador de vibrocompactador sin y el clima estuvo soleado en horas de la mañana y fuertes lluvias durante las horas de la tarde.

FDO RESIDENTE DE OBRA

Nota 94-23 Marzo, 2024.

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 residente de Interventoría, 1 inspector, 2 oficiales y 6 ayudantes.

Clima: lluvias leves

Actividades realizadas

Se realizo el desmonte de placa de cabina eléctrica y se instalo cerramiento perimetral de Obra y cinta en zona de trabajo y en las Casetas

FDO RESIDENTE INTERV.

1084

Nota 95-25 marzo de 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector de obra; 3 oficiales y 6 ayudantes.

Clima: soleado en la mañana, nublado por la tarde.

Actividades realizadas

Debido a fuertes lluvias en horas de la noche del fin de semana se hizo que realizar retiro de agua en la zona de gimnasios donde hubo filtración con material de base.

Se realiza aplicación de concreto gris y roja en todos los muros del parque

Nota 97-2 7

Pe
de
Cl
A
a
m
es
7
de
(P

Nota 96-26 marzo de 2024

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 inspector, 3 oficiales y 6 ayudantes de obra, 1 operador de minicargador, 1 operador de

vibrocompactador.
Clima: Nublado y lluvias leves en la tarde.
Actividades realizadas
Se realiza instalacion de material b200 y compactacion con vibrocompactador y rango en zona gimnasio.

Nota 97 - 27 marzo 2024

Personal en obra: 3 oficiales, 6 ayudantes de obra civil 1 operador de minicargador.
Clima: Soleado en la mañana lluvia en la tarde
Actividades realizadas
Se realiza instalacion y compactacion de material b200 para conformar estructura en zona gimnasio, se finaliza compactacion se programan densidades para el dia lunes 1 abril (por item)

1085
9-18

Nota 98 Se infoma a Interventoria q-e los dias jueves, viernes y sabado Santo no se realizaron actividades; estas seran retomadas el dia lunes 01 obra/ 2024.

FDO RESIDENTE DE OBRA / FDO INTERVENTORIA

Nota 99 - Lunes 01 abril 2024

Personal en obra: 3 oficiales, 6 ayudantes obra civil, 2 soldadores, 1 inspector de obra.

Clima Fuertes lluvias en horas de la tarde

Actividades realizadas

- Instalacion de modulos complementario en la media luna
- Se inicia instalacion de piso caucho SBR en zona de juegos infantiles
- Aplicacion de anticorrosivo y pintura esmalte en baranda de juegos infantiles. media luna
- Instalacion de malla electrosoldada en zona gimnasios para la placa.

FDO RESIDENTE DE OBRA / FDO INTERVENTORIA

Nota 100 Martes
Personal
1 Resi
obra,
Obra
metal.
Clima
Actu
- Insta
- Comp
Lluvia
- Apli
Infa
Se
Gim
P1 =
P4 =
en

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Se [illegible] retiro de [illegible] de los [illegible] de acero inoxidable

Nota 60 Sabado 02 de marzo 2024
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 residente interventoria, 1 inspector electrico 2 Tecnicos electricos, 1 maestro de obra, 1 ayudante de obra civil
Clima Soleado
Actividades realizadas
- Se realiza retiro de enchape, instalacion de sanitario en baños comunes
- instalacion de tapa aseos, toma corrientes, iluminacion en zona baños administracion y baños Comunes

Nota 61 - Faltan fichas ANS de pisos de Servicios de los Chalets y Administracion y Zonas Comunes

Lunes 04 marzo 2024
Nota 62 Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 residente interventoria, 1 ayudante obra civil 2 trabajadores metalmecanica
Clima Soleado
Actividades realizadas
- Se realiza limpieza y [illegible] de acero inoxidable
- Se realiza instalacion de division de Drywall y remates y retoques de estuco, pintura y pintura

Nota 63 Martes 05 marzo 2024
Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 residente de interventoria, 1 ayudante de obra civil, 2 trabajadores de acabados de aseo
Clima. soleado
Actividades realizadas
- Se realizo destanque de piso [illegible] apillado baños hombres comunes

Se realiza retoques de pintura en baños comunes mujeres

Nota 64 Miercoles 06 de marzo 2024
Personal en obra: 1 Residente obra, 1 residente interventoria, 1 inspector, 2 Trabajadores de acabados de piso.
Clima: Soleado
Actividades realizadas
- Se aplican productos cementicios para desbaste y pulida de piso.
- Retoque de pintura unilo blanco y gris en baños Comunes

Nota 65 Jueves 07 de marzo 2024
Personal en obra: 1 Inspector, 1 residente de obra, 1 residente de interventoria, 2 Trabajadores de acabados, 1 ayudante de obra civil.
Clima: Soleado

Actividades realizadas
Se realiza Pulida y brillado de piso y banca baño comun hombres.
retoque de pintura baño comun mujeres.

Nota 66 Jueves 08 marzo 2024
Personal en obra: 1 trabajador de obra civil y 2 trabajadores de Pulida de pisos
Clima Soleado
Actividades realizadas
- Se realiza desbaste de piso baño comun mujeres.
- Se aplica unilo en baño comun hombres

Nota 67 (Viernes) 09 marzo 2024 Sabado
Personal en obra: 3 Trabajadores de acabados
Clima Soleado
Actividades realizadas:

se realiza destranque de piso y se aplican productos removedores para brillado de piso se aplican brocas numero grano y se realiza retoque de granitos en varias partes numeradas hombres

Nota 66 lunes 12 marzo de 2024
Personal en obra. 3 Trabajadores de acabados, 1 inspector de obra, 1 inspector interventoria, 1 residente de obra, 1 residente de interventoria
Clima soleado
Actividades realizadas
- se realiza pulida y brillado de piso pasillo comedor habitaciones y se realiza retoque de pintura en varias; se finaliza el brillado de piso comedor baños mujeres y se continua realizando retoques de vinilo, yeso.

Nota 67 (1 hasta) 13 marzo de 2024
Personal en obra Aplomero, 1 residente de obra, 1 residente interventoria, 1 inspector, 1 arquitecto de obra, 3 trabajadores de acabados
Clima soleado
Actividades realizadas
se realizan instalaciones de sanitarios se debe realizar una regleta y nivelar con piezas de enchape para cumplir con el punto hidraulico de 4" o 4½"
Se realiza capillado y se aplican productos para el destranque, Pulido y brillado de piso en cuarto aseo baños

Nota 70 Jueves 14 de marzo 2024
Personal en obra. 3 Trabajadores de acabados
Clima: Soleado
Personal en obra
Actividades realizadas
- se finaliza actividad de destranque, pulida y

brillado de piso en entrada a los baños de Camerino; se solicita a la administración la colaboración con sellar el piso del colisee por esos entrados debido que estaba siendo manchado el piso; se instalaron luces de forma que la comunidad pisara en rollos para no pasar resbalado.

Nota 71 Viernes 15 Marzo 2024
Personal en obra. 1 Residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector de obra, 1 Plomero y 1 ayudante de obra
Clima: Nublado
Actividades realizadas
- Se realiza instalación de pared de ducha
- Remates de win en mal estado
- Remates de Pintura en baños camerinos
- instalación de fluxómetro en baños camerinos humedad se realiza visita de interventoría como

Presentes y se observan detalles de pega y pintura

Nota 72 Sábado 16 Marzo de 2024
Personal en obra: 1 oficial y 2 ayudantes
Clima: Nublado
Actividades realizadas Se realiza retoques de Pintura en zona entrada a los baños remates de pintura en baños de acuerdo a las observaciones de interventoría el día de ayer

Lunes 18 Marzo 2024
Nota 73- Personal en obra. 1 Residente de obra, 1 residente Interventoría, 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante de obra civil, 1 Social, 2 trabajadores de metalmecánica.
Clima. Soleado
Actividades realizadas
- Se realiza instalación de tapas registros, rejillas sifón, Remates de pintura.

Se realizó la pintura de puertas de acceso a baños y las puertas de entrada a los baños.
Pintura de cerchas de los baños. comerinos

Nota 74 Haito 19 Marzo 2024
Personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector, 1 oficial y 1 ayudante, 1 Baul, 2 trabajadores metalmecánica.
Clima: Soleado.
Actividades realizadas
- Se finaliza Aseo baños comerinos para entrega
- Se finalizan pintura de Puertas baños y entrada
- Se finalizan remates de unidad. en Pintura muros.

Nota 75 - Nota No se pudo realizar entrega debido a un empozado que surgio en baño mujeres donde se vio afectado una pieza de enchape la cual se debe retirar la puerta y muros, retirar la pieza de enchape cambiar y se

debe instalar la puerta nuevamente; se hablo con la administración ya que no se tenia el imprevisto el dia viernes en reunion con la interventoría y se deja claridad con la interventoría y la administración quedando de dar ciertas garantias y trabajos será intervenido para proceder con la entrega.

Interventoría

Nota 76 Jueves 21 Marzo 2024
Personal en obra: 1 residente obra, 1 residente interventoría, 1 inspector, 1 ayudante y 1 Plomero.
Clima Soleado
Actividades realizadas
Se realiza el destape de sifones baños damas y caballeros comerinos y se realiza limpieza tubería de baño discapacitado coliseo

4

(Viernes 22 marzo 2019)

[illegible] de la parte trasera de los baños de damas y varones, las cuales faltan para entregar y poder dar servicio

Viernes 22 - marzo - 2019

Nota: Se informa a la interventoría que el día viernes 22 de marzo se realiza entrega de puesta en servicio de los baños (instalación de fluxometros, partes de acero inoxidable, pintura vinilo, pulida de piso, instalación de registros y sus tapas, instalación de duchas, llaves tipo push y pintura de puertas) quedando algunas observaciones las cuales serán subsanadas durante la semana próxima de abril del presente año.

INTERVENTORIA

4 5

Nota 29 Jueves (4) abril 2019

Se informa a la interventoría que el día de hoy se realizo observaciones de observaciones de puertas varias de baños ya se encuentra funcionando en perfecto estado suministro e instalación de accesorios de baños faltantes

Instalación de pulsante de push en baños varios puertas de los sanitarios los fluxometros

Se realizó revisión de fluxometro de baño discapacitado pero se pidieron el mismo para manipulación en el regulador y revisión de funcionamiento personal de mantenimiento sin guantes golpeo, en este momento el fluxometro no sirve y no se sabe si fue por golpe o por la manipulación del regulador. Se consulte con interventoría si se instala nuevamente y quien lo cobra

10

44

[illegible] Lo [illegible] Se [illegible] de [illegible]
[illegible] el [illegible] [illegible] [illegible]
y [illegible] [illegible] [illegible] y [illegible]

Esta ya se había recibido en [illegible]
Estado y Hacienda [illegible] Estado
Se. Hay presupuesto se debe Reintegrar
Con costo y orden todo en buen
funcionamiento.

[illegible]

Fecha: 29 de Febrero 2024
Parque: La Fragua.
Personal: 1 maestro 1 oficial, 3 ayudantes.
Actividades: Se continua con la excavación e instalación de bordillo en la pista de patinaje, se lleva material base para la zona infantil. Se paran actividades por mal tiempo.

Luz Q.

Fecha: 01 de Marzo 2024
Parque: La Fragua.
Personal: 1 oficial, 3 ayudantes, 2 operarios de maquina.
Equipo: 1 vibro y un minicargador.
Actividades: Se sella el material de base en la zona infantil,

(8)

Fecha: 01 de Marzo de 2024

Nota 8 Parque: Gilma Jimenez

Personal: 3 electricos, 1 oficial y 1 ayudante.

Actividad: Se dejaron instalados todos los luminarios de la cancha de futbol 8, se adecuo zona de cuarto electrico; se subsano el tramo del Sendero que daño el malla f.

Nota 9 Fecha: 02 de Marzo 2024

Personal: 2 ayudantes.

Actividades: Se descargo y dejo en sitio el ladrillo para la construcción del cuarto electrico

(9)

Fecha: 03 - 06 de Marzo 2024

Nota 10 Personal: 1 oficial y 1 ayudante.

Parque: Gilma Jimenez

Actividades: Se retiran tramos de Senderos que fueron dañados por el malla f. Se deja listo y se quita polisombra.

Fecha: 07 de Marzo 2024

Nota 11 Personal: 1 oficial y 1 ayudante, 1 residente.

Actividades. Se deja descapotado y compactado el area para placa de cuarto electrico.

Fecha: 08 - 09 de Marzo de 2024

Nota 12 Personal: 1 oficial y 1 ayudante, 1 residente

Actividades Se inicia con la construcción de cuarto electrico. Se fundo placa de piso.

Fecha: 11 de Marzo 2024
Parque: Gilma Jimenez
Personal: 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades: Se continue con la instalacion del cuarto electrico.

NOTA 13
Fecha: 12 de Marzo 2024
Parque: Gilma Jimenez
Personal: 1 oficial y 1 ayudante, Ksjdt
Actividades: Se continua con la instalacion del cuarto electrico. Se toman medidas para fabricacion de puerta de cuarto electro.

Fecha: 13 de Marzo 2024
NOTA 14
Actividades: Se continua con la instalacion de bandejas para muros de cuarto electrico. Se presentan llamas frontes.

NOTA 15
Fecha: 14 de Marzo de 2024
Parque: Gilma Jimenez
Actividades: Se continua con la construccion de muros para cuarto electrico.
Por favor Ordenar y Aseo En El Sitio.

NOTA 16
Fecha: 15 de Marzo de 2024
Parque: Gilma Jimenez
Personal: 1 oficial y 2 ayudantes.
Actividades: Se continua con la construccion de muros para cuarto electrico
Se realiza cerramiento en polisombra para excavacion de acometida.

NOTA 17
Fecha: 16 de Marzo de 2024
Parque: Gilma Jimenez.
Personal: 1 oficial, 1 ayudante, 1 residente de Obra.

(12)

Actividades: Se inicia con desmonte de adoquin y excavacion para reconstruccion de cuarto electrico, Se continua con la instalacion de muro para cuarto electrico.

Luz O.

Fecha: 17 de Marzo 2024

NOTA 18 Porque: Gilmo Jimenez
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes, 1 vaciadora
Actividades: Se continua construccion de muros para cuarto electrico. Se deja instalado primer tramo de tuberia para cuarto electrico.

Luz O.

Fecha: 19 de Marzo 2024

NOTA 19 Porque: Gilmo Jimenez
Clima: Lluvias fuertes a lo largo.

(13)

Actividades: Se termina la construccion de cuarto electrico, Se Fundieta para pond. Placa de cubierta. Se Continua con la excavacion del segundo tramo para cuarto.

NOTA 20 Se Solicita Cotizacion Mejoras en Luminarias.

Luz O.

Fecha: 20 de Marzo de 2024

NOTA 21 Porque: Gilmo Jimenez
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades: Se resiste adoquin en primer tramo de excavacion.
- Ordenar y aseo en el sitio de trabajo.

Luz O.

Fecha: 21 de Marzo de 2024

NOTA 22 Porque: Gilmo Jimenez
Personal: 1 oficial, 2 ayudantes

(14)

Actividades. Se continúa con excavación del segundo tramo y se instala tubería.

Saul Luna

Nota 23 Fecha. 22 de Marzo de 2024
Parque. Gilmo Jimenez
Actividades Se instala tubería y adoquín en el segundo tramo. Se excava tubería en (Segj) tercer tramo.

Saul Luna

Fecha 23 de Marzo
Nota 24 Personal 1 oficial y 1 ayudante
Se deja fundida la plaza de cubierta de cuarto eléctrico.
Se RASURA y LIMPIA PARA FUNDIDA.
Saul Luna

(15)

Nota 25 Fecha: 25 de Marzo de 2024
Parque. Gilmo Jimenez
Personal. 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades. Se continúa con la instalación de tubería en tercer tramo, y se realiza distribución de piso de cuarto eléctrico.

Saul Luna.

Nota 26 Fecha. 26 de Marzo de 2024
Parque. Gilmo Jimenez
Personal. 1 oficial, 1 ayudante
Actividades. Se realiza el relleno en el tramo 3 donde se instala tubería para acometida y se empieza, se retira caja eléctrica de 40x40 y se instala adoquín.

Saul Luna.

Nota 27 Se solicita al Comunidad Acreditación Bancaria para cambio de titular de los Recibos

(16)

Fecha: 27 de Marzo de 2024

Nota 28 Parque: Palm. Jimenez

Personal: 1 oficial, 1 ayudante y 3 electricistas.

- Actividades: Se realiza montaje cañón en el comienzo de la plaza de pisos de cuarto eléctrico, se prueba caja eléctrica, se instala puerta de cuarto eléctrico pero se debió desmontar por trabajos eléctricos ya que la puerta estaba mal instalados.
- Se solicita dejar bien plomados los puntos.

Nota 29 Fecha: 28 al 31 de Marzo 2024

Actividad: Dias de Semana Santa no se labora.

Nota 30 DEJAR ORDENADO Y ASEADO EL LUGAR DE TRABAJO

Se riega con agua de carro tanque la base para compactar.
Se continua con la instalacion del bordillo en la pista de patinaje.

Luz Q.

Nota 76 Fecha: 02 de Mazo de 2024
Parque: La Fragua.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 operario de maquina.
Actividades: Se realiza la compactacion del material de base en la zona infantil, Se realizaron densidades en horas de la tarde dando resultados por encima de 95%.
Se continua con la instalacion de bordillo en la pista de patinaje.

Fecha: 04 de Mazo de 2024
Nota 77 Parque: La Fragua
Personal: 1 maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes.
Actividades: Se inicia con la excavacion del bordillo en la zona infantil, se continua con la instalacion del bordillo a la pista de patinaje.

Nota 78 Se reciben las actividades de los Baños del coliseo con las siguientes observaciones para ser evacuadas y hacer acto de puesta en servicio
1- Arreglo y cambio de acople de ingreso en oriental # 1. (Esta con una manguera)
2- Aseo de espejos en Baños Hombres y Mujeres (retiro de silicona).
3- Revisar push. Switchado #2.

Nota 79 Se solicita al contratista atender las inquietudes de la comunidad en cuanto a que piensan una alternativa para la cancha externa del parque para pasar a la zona infantil, si se hizo algun daño - favor subsanar.

Nro 81

Fecha 01 de Marzo de 2024

Juego lingual

Personal 1 maestro de obra, 2 ayudantes y ayudantes.

Lugar: Colegio

Actividades: se realiza con la instalación de baño en la 2da intendencia y pintado de pedregal.

Nro 82

Fecha 01 de Marzo 2024

Juego lingual

Personal 1 maestro de obra, 2 ayudantes y ayudantes.

Actividades: se realizan instalación de baño en la 2da intendencia, se realizan la excavación e instalación del baño en la parte de atrás del colegio en la parte de pedregal.

Nro 83

Fecha 01 de Marzo 2024

Juego lingual

Personal 1 maestro de obra, 2 ayudantes y ayudantes.

→ Actividades: Se realizan instalación de baño en la 2da intendencia, se realizan la excavación e instalación del baño en la parte de atrás del colegio en la parte de pedregal.

p.d. de pintura.

Nombre Fecha: 09 de Marzo de 2024
Parque: La fragua. / SABADO
Personal: 1 maestro de Obra, 2 oficiales
4 ayudantes.
Actividades: Se labora horas extras en la jornada de la tarde dejando todo el bordillo de la pista de zona infantil totalmente instalado, Se continua con la instalación del bordillo en la pista de Patinaje. Se realiza nivelación de la estructura en la zona infantil. Fuera / orden y Aseo En los puestos

Nombre Fecha: 10 de Marzo de 2024
Parque: la fragua
Personal: 2 maestros de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes.
Actividades. Se labora el dia domingo Pre. digos nivelada y lista la plaza de la zona infantil para proceder con la instalacion de malla electrosoldada, Se continue con instalación de bordillo en la pista de patinaje.

Nombre Fecha: 11 de Marzo de 2024
Parque: La fragua / LUNES.
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes.
Actividades: Se realiza la instalacion de la malla electrosoldada en la zona infantil y la instalacion de bordillo en los Sectros de la zona infantil

Se deja terminado con instalado el bordillo en la pista de patinaje

NOTA 87 SE SOLICITA RENIVELAR Y RECOMPACTAR CAPAS PARA IMPERMEABILIZACION ASFALTICA

LUZ O.

Marzo 08 Fecha: 12 de Marzo de 2024
Parque: La Fragua.
Personal: 1 maestro de Obra, 1 oficial 5 ayudantes, 1 residente de Obra.
Actividades: Se realiza la fundida de la placa en concreto de 3000 psi en la Zona infantil, Se toman 6 Muestras de Concreto y se realiza 1 prueba de cono de slump obteniendo resultado de 5. Se aplica curasol a las placa despues de la fundida. Se realiza nivelacion de la pista de patinaje y se realiza el atraque del bordillo.

Nota 89 Se Solicita Enviar ocupo de Cenizas a Laboratorio para Tener Resultados de Resistencias a Tiempo, 6 muestras

Nota 90 Fecha: 13 de Marzo de 2024
Parque: La fragua
Personal: 1 maestro de obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 residente Obra.
Actividades: Se inicia la instalacion de adoquin en Senderos peatonales, de la Zona Infantil. Se continua con la instalacion de la Canuela en la pista de patinaje.

LUZ O.

Nota 91 Fecha: 14 de Marzo 2024
Parque: La Fragua
Personal: 1 maestro de obra, 1 oficial, 3 ayudantes
Actividades: Se deja listo todo el perimetro con bordillo en pista de patinaje.

Lº 45

Se continua con excavación para instalación cañada, se deja lista la estructura a 8cm para instalar asfalto en la pista de patinaje.

Sulfuros.

Nota 92 Fecha: 15 de Marzo 2024
Parque: la Fragua
Personal: 1 maestro de obra, 1 oficial, 3 ayudantes.
Clima: Soleado
Actividades: Se realiza prueba de densidades en el Sendero de la Zona infantil, Se continua con la instalación de cañada en la pista de patinaje. Las densidades tomadas estan por arriba del 95% dado aprobación para su instalación y adquisición por parte de la Inspectoria Municipal de Senderos.

Sulfuros

49

Fecha: 16 de Marzo de 2024
Nota 93 Parque: la Fragua
Personal: 1 oficial, 1 maestro de obra 3 ayudantes, 1 residente de Obra.
Actividades. Se continua con la instalación de cañada en la pista de patinaje, Se realiza la aplicación de impermeabilizante en la pista de patinaje.

Sulfuros.

Fecha: 19 de Marzo de 2024
Nota 94 Parque: la Fragua.
Personal: 1 maestro de Obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 residente de Obra.
Actividades: Se continua con instalación de cañada en la pista de patinaje, Se realiza instalación de tablas en grama Se continua la instalación de adoquin en Senderos de la Zona infantil.

50

Fecha: 20 de Marzo de 2024
Notas Parque: La Fragua
Personal y/1 maestro de Obra, 1 oficial
3 ayudantes, 1 residente de Obra
Clima: Lluvias fuertes en horas de la tarde
Personal Actividades: Se continua con instalación de canceta en la pista de patinaje y adoquin en Sanderas de la zona INFANTIL.

Luzo.

Fecha: 21 de Marzo de 2024
Nota 96 Parque: La Fragua
Personal: 1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes, 3 instaladores de asfalto. 1 residente.
Actividades. Se continua con la instalación de canceta en la zona infantil de pista de patinaje. Se inicia la instalación de asfalto en la pista de patinaje. Se detiene actividades

51

en horas de la tarde por fuertes lluvias.
Se deja maestros de apoyo para labordanza

Luzo.

Nota 97 Fecha: 22 de Marzo de 2024
Parque: La Fragua
Personal, 1 maestro de obra, 1 oficial, 3 ayudantes, 1 residente de obra. 3 instaladores de grama polo.
Actividades: Se termina la actividad de asfalto en la pista de patinaje, Se inicia la instalación del grapito en el perimetro de la pista de patinaje, Se continua instalación de adoquin en Sandra de la zona infantil, Se continua con la instalación de canceta.
Se solicita ATENDER OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA

Luzo.

Nota 98 Se Solicita Orden y Aseo en las Zonas Adjuntas a la Zona de la pista y ZONA INFANTIL.

54

Fecha: 28 - 31 de Marzo 2024
Actividades: No se trabaja por los días de Semana Santa.

Sdad. Luz Q. -

Fecha: 01 de Abril de 2024
Parque: la Fragua
Personal: 1 maestro, 10 oficial, 2 peones, 1 Soldador, 1 pintor, 1 residente obra
Actividades: Se inicia pintura de juego M-8 en Zona infantil existente.
Se inicia la instalación del fitness en la Zona infantil, Se realiza recogida de material que se acondiciona sobre el parque adero.
Clima: Se presentan algunos fuertes en horas de la tarde, lo cual impide que se continúe con actividades

Sdad. Luz Q.

intervención que para dar punto de conexión eléctrico a los modulos de cafe y baños se debe contar con disponibilidad ante Codensa y energizar la Subestación la cual tiene contados los conexiones.
Se realiza limpieza debajo del modulo de baños para proceder con la red Sanitaria.

Martes 6 de febrero 2024
Nom.32 Personal en obra: 1 ayudante de obra civil
clima lluvia en horas de la tarde.
Actividades realizadas. Se finaliza la limpieza debajo del modulo de baños.

Miercoles 7 de febrero 2024.
Nom.33 Personal en obra: 1 inspector de obra, 2 ayudantes de obra civil, 1 oficial
clima: lluvias en horas de la tarde.
Actividades realizadas: Se realiza inicio

de mantenimiento en sendero de adoquin.

Jueves 8 febrero 2024
Nom.34 Clima: Nublado
Personal de obra: 1 oficial y 1 ayudante
Actividades realizadas:
Se continua el desmonte y reinstalación de adoquin de color en sendero.
Se realiza corte de piezas.

Viernes 09 febrero 2024
Clima Nublado
Nom.35 Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante
Actividades realizadas
- Se realiza desmonte y reinstalación de adoquines en sendero.

lunes 11 febrero 2024

Norma 36 Clima: soleado
Personal de obra: 1 oficial y 1 ayudantes de obra civil
Actividades realizadas
Se realizan cimientos de concreto en trabes con espesor 10cm y malla de 4mm
y se realiza excavacion para dados de la instalación de cerca de acero inoxidable

Martes 13 febrero 2024

Norma 37 Clima soleado.
Personal en obra: 1 oficial y 2 ayudantes de obra civil.
Actividades realizadas.
Se finalizan los mejoramientos en trabes incluidos los cimientos de concreto.
Se realiza la instalacion de la cerca de

acero inoxidable; se informa de las interferencias que se realizan (radio) taller del modulo de bombeo

Jueves 14 febrero 2024

Norma 38 Se informa a interferencias que se encuentran en todos los pilares se retiran con el modulo de bombeo, y se trabajo de plomeria debera ser trabajados de manera interna para evitar hacer cuele en los terminos establecer en el momento ya y realizar el corte del punto de soldadura para instalar las soportes de lugar para el plomero hace la instalacion de los Push y red sanitaria; el pendiente informar se retira a instalar el dia lunes 4 de marzo 24

Fecha: 29 de Febrero 2024
Turno: Mixto
Personal: 2 soldadores y un ayudante
Obra: Calidu
Actividades: Se continua con la instalación de modulos baranda complemento para baranda M-80. Una material de enchape para baños.

Observaciones: Se solicita terminar la instalación de la baranda M-80 en Zona Turnstile y instalar Baños Colores para Cocina

Fecha: 01 de Marzo 2024
Turno: Mixto
Personal: 2 soldadores y un ayudante
Obra: Calidu
Actividades: Se continua con la instalación de modulos baranda complemento para baranda M-80. Una material de enchape para baños.

Observaciones: Se solicita terminar la instalación de la baranda M-80 en Zona Turnstile y instalar Baños Colores para Cocina

Fecha 02 de Marzo de 2024

Nota 61 Parque Muzu
Personal 1 oficial y 1 ayudante.
Actividades Se inicia con la instalación
de enchape en el baño del sector
1 en el registro de este baño

[signature] — [signature] INSTRUMENTOR

Fecha 03 de Marzo 2024
Parque Muzu
Nota 62 Personal 1 oficial y 1 ayudante
Actividades. Se continua con enchape
de baños en el sector, Se realiza
reunión con interventoría, cabildo y
personal de Bibliored para entregar
la nueva reubicación e instalación
del modulo de lectura

Nota 63 – Se les informa el retiro de Estructura
para la puesta en Servicio de la
Sección del Sendero Lateral a Zona de Juegos

[signature] INSTRUMENTOR

Fecha: 05 de Marzo 2024
Nota 64 Parque Muzu
Personal. 1 oficial de Soldadura y 1
ayudante.
Actividades Se inicia actividad de instalación
de Baranda M-83 En pasos de cebra

[signature] Inter [signature]

Fecha 06 de Marzo 2024
Nota 65 Parque Nuevo Muzu
Personal. 1 oficial de Soldadura y 1
ayudante, 1 oficial de obra
Actividades: Se deja terminado el
enchape de baños en la Zona de
Casinos, se inicia instalación de
pasamanos de baranda M-83.

[signature] Inter

Nota 66 Favor Mantener La Zona En proceso
Orden y Aseo y En Alrededores del Modulo de
Lectura [signature]

[illegible]

[illegible] Fecha [illegible]

[illegible] Parque [illegible]

[illegible] 1 Soldado y 1 ayudante.

[illegible] realizan [illegible] de la
instalación de la banda M-83.

[illegible] se colocaron los pedos de la
banda M-83.

[illegible] Luz Q.

Fecha: 07 de Marzo 2024

Nota 69 Parque: Mozo

Personal: 1 Soldado y 1 ayudante

Actividades: Se realizo [illegible]
y aplicacion de masa [illegible]
banda M-83.

Luz Q.

Fecha: 11 de Marzo 2024

Nota 70 Parque: Mozo

Personal: 1 Soldado y 1 ayudante

Actividades: Se continuo con la
instalacion y chazeda de pedes de
la la banda M-83, Se realizo el
retro de escombros en el perdero del
acoquin.

Luz Q.

[illegible] 2024

[illegible] 1 soldado y 1 ayudante
[illegible] continuaron la instalación
[illegible] personales de M-83.

[illegible]

Fecha 14 de Marzo de 2024
Parque Nuevo
Nota 73 Personal 1 soldador, 1 ayudante.

Fecha 15 de Marzo 2024
Nota 74 Parque: Nuevo Nuevo
Personal Se continua con soldadura de pasamanos y modulos de baranda en Zona infantil.
Se realizo ajustes de enchape en baños de discapacitados.

Fecha: 16 de Marzo 2024
Parque: Nuevo Nuevo
Nota 75 Personal: 1 Soldador y 1 ayudante.

1160

Actividades: Se realiza aseo y lijado de baranda M-80 existente.

Fecha: 18 de Marzo de 2024

Nota 76 Parque: Nuevo Muzu
Personal: 1 Soldador, 1 ayudante y residente de obra.
Actividades: Se continua con instalación de puerta de baranda M-83 y chazado de tubos postes.
Se explica sobre las observaciones de la interventoría.

Fecha: 19 de Marzo 2024

Nota 77 Parque: Nuevo Muzu
Actividades: Se realiza pintura de modulos y baranda M-80.
Ordenado y aseo por favor.

Nota 78 Fecha: 20 de Marzo de 2024
Parque: Nuevo Muzu
Personal: 1 Soldador, 1 ayudante, 1 pintor y residente de Obra.
Actividades: Se continua con instalación de baranda M-83 y con la pintura de baranda M-80 existente en zona infantil.

Nota 79 Hacer correcciones a las soldaduras y empalmes

Fecha: 21 de Marzo 2024

Nota 80 Parque: Muzu
Personal: 1 pintor, 1 soldador, 1 pintor y residente de Obra.
Actividades: Se continua con pintura de baranda y modulos en zona infantil. Se realiza aseo general y recojida de escombros
OK
Interventoría

Fecha 22 de Marzo 2024
Parque: Nuevo
Personal: 1 pintor, 1 Soldador, 1 ayudante
Actividades. Se continua con ajustes de Soldadura de barandas y Modulos de Baranda M83. Se realiza la ligada de de estructuras de valla informativas

Fecha 23 de Marzo 2024
Parque. Nuevo Nuevo
Nota 82 Personal: 1 Soldador, 1 ayudante, 1 pintor 1 residente de obra.
Actividades: Se termina pintura de baranda M 80 y M-83 en zona infantil y se realiza pintura de estructura de vallas informativas.

Nota 83 Favor Comprar instalacion de plastinal de los Marcos de los Cuerpos de la BARANDAS en ZONA INFANTIL

Fecha: 25 de Marzo al 31 de Marzo 2024
Nota 84 Actividades Durante este Semana no hubo trabajos en el parque por Semana Santa y Se estaba a la espera de llegada de Base para instala piso caucho.

Fecha 01 de Abril de 2024.
Notas Parque: Nuevo Nuevo
Personal. 1 operario y 1 ayudante
Actividades. Se descarga el material y herramienta para instala piso caucho.

Nota 86 Fecha: 02 de Abril de 2024
Parque: Nuevo Nuevo
Personal: 4 instaladores de Piso Caucho.
Actividades: Se inicia con la instalacion de SBR del piso caucho en zona infantil

1/2

Fecha: 03 de Abril de 2024
Parque: Nuevo Mozo.
Personal: 4 instaladores de Piso caucho, 1 residente Obra.
Actividades: Se continúa con instalación de SBR de Piso caucho. Nuevo
Clima: Se presentan lluvias fuertes en horas de la tarde lo cual retrasa en la instalación del piso.

Fecha: 04 de Abril 2024
Parque: Nuevo Mozo
Personal: 4 instaladores de Piso caucho.
Actividades: Se continúa con instalación de SBR de Piso caucho, se presentan lluvias fuertes en horas de la tarde lo cual retraza la instalación del piso.

Sendero se culmina con los cortes de acabados de adoquín. sendero caseta. Se continua con el alistado e instalacion de adoquin en el sendero del arbol y alrededor de la caseta Se continua realizando limpieza de la casa adulto mayor se retira todo lo acopiado en sitio. ; se continua con la pintura de la portería 2. en los fachadas se culminan actividades de reparación pista Bmx; se realiza retiro de material sobrante. ; se avanza con la aplicacion de emulsion asfaltica e instalacion de manto asfaltico. ; se hace retiro de material de basuras.

y materiales

Viernes 1 x/marzo/2024

191 Personal de obra: 12 Trabajadores

Clima: soleado

Herramientas y Equipos: Planchon vibratorio, apisonador tipo canguro, Pulidora, Equipo de Pintura

Actividades:
Senderos: se continuo con el alistado e
Foto 192 instalacion de adoquin en el sendero del arbol y al rededor de la Caseta.
Caseta del adulto Mayor: se avanza con la limpieza
Porteria #2: se continuo con pintura. en los fachadas
Porteria #3: se avanza con la aplicación de pintura en los fachadas.
Cubierta Porteria #4: se avanza con la aplicación de emulsión asfaltica e instalación del manto impermeabilizante.

y supervisado

Sabado 2 Marzo/2024
Nota 193 Personal de obra: 12 obreros
Clima: Soleado
Herramientas y Equipos: apisonador Tipo Canguro Planchas vibratorio, Pulidora, Planta electrica Equipo para pintura.

Actividades:
Nota 194 Senderos: se continuo con el alistado e instalacion de adoquin en el sendero del arbol y Caseta, se avanza con los cortes de piezas e instalacion
Caseta del adulto Mayor: se realiza la instalacion de los puertas en los baños, puertas para discapacitados y se avanza con la instalacion de los puertas en el salon.
Porteria #2 y #3: se avanza con la pintura de los fachadas.
Cubierta de la Porteria #4: se avanza con la aplicacion de emulsion asfaltica e instalacion del manto impermeabilizante. se realizo la instalacion del Policarbonato Macizo en la cubierta de la Caseta de comida.

y supervisado

Lunes 4 Marzo/2023
Nota 195 Personal de obra: 18 obreros.

Clima: Soleado
Herramientas y Equipos: Taladro, Plancha Vibratorio, Esmeriladora Tipo Cangura, Pulidora.
Actividades:
Senderos: se continua con la instalación de adoquín en el sendero del arbol, se cuenta con los cortes de piezas e instalación
Casa del adulto Mayor: se culmina con la instalación de los 2 pisos del salon.
Parterre 2 y 3: se avanza con la Pintura, de los fachadas las cuales se le ha aplicado 3 manos de Pintura
Cubierta Parterre 4: se avanza con la instalación del manto asfaltico.

y mitad de obra.

196 Martes 5 Marzo/2024
Personal de obra: 12 obreros.
Clima: Soleado, lluvias de 2:00 pm a 4:00 pm
Herramientas y Equipos: Esmeriladora Tipo Cangura, Planchas Vibratorio, Pulidora, Planta Electrica

Actividades:
Senderos: se avanza con la instalacion de adoquin, se culmina con el sendero contiguo al sendero de adulto Mayor
Casa del adulto Mayor: se retiran los materiales sobrantes de la obra. / por favor Orden y Aseo.
Parterre 2 y 3: se culmina con la Pintura de las fachas a la cual se le aplicaron 3 manos de Pintura, se Esta a la Espera del Visto bueno de la interventoria.

y mitad de obra.

Miercoles 6 Marzo/2024
197 Personal de obra: 10 obreros.
Clima: Soleado.
Actividades:
Senderos: se avanza con la instalacion de adoquin en el sendero del arbol,
Casa del adulto Mayor: se realizo la demacion del toda Platos

Nota 200 Observaciones pista de BMX para Eventos
1- Aseo general de los contornos
2- Instalación de todas las tapas/rejillas de las tapas de las cajas de aguas lluvias
3- Evaluar los daños que aparecieron en la Entrada y en los sitios intervenidos por usuarios para darle la puesta en Servicio / 4- Continuar fijando el Salvaescalon en la pista BMX en Asfalto

Ana Interventoria

Nota 201 Jueves 7 Marzo / 2024
Personal de obra: 12 obreros
Clima: soleado
Herramientas y Equipos: aplanadora Tipo Canguro Plancha vibratoria, Planta electrica, Pulidora
Actividades:
Senderos: se continua con la instalación de adoquin en el sendero del arbol
Cara del cerro Mayor: se realiza limpieza
Porteria 2: se realiza la revisión por parte de la interventoria y hay 0 observaciones
Porteria 5: se realiza revisión por parte

de la interventoria y se dejan observaciones,
Pista de BMX: se inicio con la instalacion de Tierra negra y cesped. se avanza con el alistado para la instalación de los marcos y Tapas de las cajas de aguas lluvias, solo se cambiaron 0/4 se instalaran los Tapas y marcos en mal estado o faltantes como se acordo en reuniones Pasadas, se realiza la limpieza de las cajas de desague; se recomienda hacer el mantenimiento del bordeo en toda la Pista ya que el cesped deteriora el asfalto de la Pista.

Se dejan 4 hay observaciones

y resto de obra.

Interventoria

Nota 202 Viernes 8 Marzo / 2024
Personal de obra: 12 obreros
Clima: Nublado.
Herramientas y Equipos: Plancha vibratoria aplanadora Tipo Canguro, Planta electrica, Pulidora.

Actividades: Se
Senderos: se continua con el alistado e instalacion de adoquin, se avanza con el retiro de escombros.
Casa del adulto Mayor: se realiza la Conexion del tubo Platos, se atienden las observaciones realizadas Por la interventoria. / Por favor Oscar y Aseo.
Pista de BMX: se avanza con la instalacion de Tierranegra y Cesped, se continua con la instalacion de Marcos y Topes de las cajas de desague.

Residente y ret de obra. Interventoria

Nota 203

Sabado 9 Marzo/2024
Personal de obra: 12 Obreros
Clima: Nublado
Actividades:
Senderos: se continua con la instalacion de adoquin y alistado
Casa del adulto Mayor: se continua

Con las Correcciones u observaciones realizadas Por la interventoria.
Pista de BMX: se continua con la instalacion de Tierranegra y cesped.

Residente y ret de obra. Interventoria

Nota 204

Lunes 11 Marzo/2024
Personal de obra: 10 obreros
Clima: Nublado
Herramientas y Equipos: Plancha vibratoria Pisonador Tipo canguro, Planta electrica Pulidora.
Actividades:
Senderos: se continua con la instalacion de adoquin / Favor Ricardo Zamas
Casa del adulto Mayor: se avanza con la limpieza, se culmina con las atenciones de las observaciones realizadas Por la interventoria
Pista de BMX: se avanza con la instalacion

de Tierra negra y Cesped, se cuenta con la instalacion de Marcos y Tapadera de las Cintas de las cajas de desague

[signature]

[signature]
Agente de obra

Marzo 05 Martes 12 Marzo/2024
Personal de obra: 12 obreros
Clima: Nublado.
Actividades:
Senderos: se cuenta con la instalacion de adoquin en el sendero posterior a la Caseta. / FALTAN TERMINAR LOS DE PIEZAS.
Casa del adulto Mayor: se realiza limpieza y embaquetado del Piso donde se encuentre el cafetero, se corrige la fuga de agua en la fachada Norte, se realiza verificación de las actividades realizadas en la casa, esta la realiza la interventoria el administrador del Parque en acompañamiento de la supervisión del contrato, se recibe y se pone en servicio, CON OBSERVACIONES A REVISAR por parte del CONTRATISTA

[signature]

Marzo 06 Pista de BMX: se cuenta con la Tierra negra y cesped, se colocan las Tapas de las cajas de desague, las actividades realizadas se verifican conjuntamente con el contratista interventoria, el administrador del Parque y la supervision del contrato se recibe la pista y se pone en servicio

[signature]
Agente de obra.

Marzo 07 SE ADICIONA AL CRONOGRAMA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE LA PISTA DE BMX SE PONE EN SERVICIO POR LA PRIMERA VEZ LA NEGACION DEL USO POR PARTE DEL PARQUE Y LOS USUARIOS PERO SE TIENEN QUE EJECUTAR LAS OBSERVACIONES QUE SURGIERON EN LA PUESTA EN SERVICIO EN CUANTO A APOZAMIENTOS EN LA PISTA Y LAS FISURAS EN LOS RECORRIDOS DE LA PISTA MISMA. FALTAN CUMPLIR UN CRONOGRAMA DEL PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO DEL CONTRATISTA

[signature]
Res. Interventoria

Nota 208 Miercoles 13 Marzo/2024
Personal de obra: 18 obreros
Clima: Nublado
Actividades:
Senderos: Se avanza con el alistado e instalación de adoquin en el sendero del arbol y sendero contiguo al modulo de cafe,
Casa del adulto Mayor: se repara la fuga de agua de la Tubería se elimina el falso Piso se continua con el enboquillado del Piso
Pista BMX: se continua con la instalación de Tierra negra y Cesped Se culmina con la instalación de los Marcos y Tapas de las Cajas de desague, se continua atendiendo las observaciones, se aplica Sikadur donde se corrigio los dos desconchados, se sellan las fisuras en la pista.

Residente de obra

Jueves 14 Marzo/2024
Personal de obra: 12 obreros

Clima: Nublado
Actividades:
Senderos: se continua con la instalacion de adoquin y fundido de cintas de ajuste con el sendero del arbol y sendero contiguo al modulo de cafe, se enboquilla nuevamente todo el adoquin.
Casa del adulto Mayor: se resana y pinta la pared norte donde estaba la fuga de agua
Pista BMX: se retira la señal existente la cual esta en mal estado y no cumple con la norma.
Cubierta Porteria 4: se avanza con la instalacion del Manto impermeabilizante.
Se realiza retiracion del carrusel en la zona de juegos infantiles

Residente de obra

Viernes 15 Marzo/2024
Personal de obra: 12 obreros
Clima: Nublado
Actividades:

Senderos: se continua con el retiro e instalacion de adoquin en el Modulo de Cafe, se cuenta con la fundido de cintos en concreto, se cuenta con el reembopillado.
Pista BMX: se realizo la instalacion de la valla Modulo, se realizo arreglo en la demarcacion, se realizo la entrega y puesta en servicio a la cual asistieron los clubes, la interventoria, el administrador del Parque y el contratista.
Cubierto Porteria 4: se cuenta con la instalacion del Manto impermeabilizante.
Parkour: se inicio con el cerramiento
Ucad: se inicio con la atencion de la emergencia, se inicio con el estuco del deposito.

Muy mala letra

Sabado 16 Marzo/2024
Personal de obra: 12 obreros.
Clima: Soleado.

211

Actividades
Senderos: se cuenta con el retiro e instalacion del nuevo adoquin, se cuenta con la fundido de cintos de ajuste en concreto, se continua con la instalacion de piezas en el modulo de cafe.
Cubierto Porteria 4: se cuenta con la impermeabilizacion con manto.
Porteria 4: se atienden las observaciones de la interventoria con respecto a la Pintura del cilindro o Torre y muro.
Parkour: se cuenta con el cerramiento de obra.
Ucad: se continua con la atencion de la emergencia.

Muy mala letra

Lunes 18 Marzo/2024
Personal de obra: 12 obreros
Clima: Soleado
Actividades:
Senderos: se cuenta con la instalacion de adoquin, cintos y piezas
Porteria 4: se cuenta con la atencion de las

212

Observaciones realizadas por la interventoria
Parkour: se inicio con el retiro del cesped en mal estado para la renivelacion de la zona.
Ucada: se avanzo con la ejecucion de la excavacion, se continuo con el esterco.
Pista BMX: se continuo con la humectacion del cesped.
Ruta de la vida: se avanza con el mantenimiento de la ruta de la vida contiguo a la pista BMX

Ing. residente de obra.

Martes 19 Marzo/2024
213 Personal de obra: 19 obreros
Clima: Nublado.
Actividades:
Senderos: se avanzo con las instalaciones de alcantarillado, cintas de ajuste y piezas.
Parque 4: se culmino con la ejecucion de las observaciones de pintura.

Parkour: se avanzo con el retiro del cesped para la nivelacion de la zona.
Ucada: se avanzo con el retiro de la tapilla del jacuzzy y se aplico sika flex para evitar la fuga de agua, se culmina con el esterco y se inicia con la pintura de deposito.
Ruta de la vida: se avanza con el mantenimiento de la ruta de la vida contiguo a la BMX
BMX: se avanzo con la humectacion del cesped.

Ing. residente de obra.

Miercoles 20 Marzo/2024
214 Personal de obra: 19 obreros
Clima: Nublado.
Actividades:
Senderos: se continuo con la instalacion de alcantarillado, se avanza con la fundida de cinta en concreto en el sendero contiguo a la plazoleta del parque #4 y contiguo al modulo de cafe.
Parkour: se continua con el retiro del cesped

Para la nivelacion del area del Parkour.
Vcad: Se avanza con la atencion de la Emergencia, se avanza con la pintura del deposito, se retira la boquilla del enchape y se aplica Sika flex para evitar la fuga de agua del jacuzzy.
Pista BMX: se continua con la humedacion del cesped.
Ruta de la Vida: se continua con el mantenimiento de la ruta de la vida contigua a la Pista de bmx.

Jueves 21 Marzo/2024
Nota 215 Personal de obra: 19 obreros
Clima: Nublado, lluvias de 1:00pm a 4:30pm
Actividades:
Senderos: Se avanza con la instalacion de adoquin y cintas de ajuste en concreto en la Plazoleta contigua ala Porteria #4 y Plazoleta contigua al modulo de Cafe

Parkour: Se continua con el retiro del cesped
Vcad: Se avanza con la atencion de la emergencia, se aplica Sika flex y Pintura.
Ruta de la vida: Se avanza con el mantenimiento, rigado y Pintura.

y res de obra

Viernes 22 Marzo/2024
Nota 216 Personal de obra: 20 obreros.
Clima: Nublado.
Actividades
Senderos: se continua con el adoquin, Piezas y cintas en la plazoleta contigua al modulo de Cafe
Parkour: Se culmina con el retiro del cesped. Se inicio con la Excavacion manual para el cerramiento MBO.
Vcad: Se avanza con la emergencia, se culmino con el tarco y Pintura
Ruta de la vida: Se avanza con el mantenimiento rigado y aplicacion de pintura

y res de obra

143

Sabado 23 Marzo/2024
Nota 217 Personal de obra: 16 obreros
Clima: Nublado.
Actividades:
Senderos: se avanza con la instalacion de adoquin, Piezas y fundido de cintas de apoyo en el modulo de cafe.
Parkour: se avanza con la Excavacion manual para los dados del cerramiento M80.
Ruta de la vida: se continua con el mantenimiento, Tijado y Pintura.

Domingo 24 Marzo/2024
Personal: 8 Trabajadores
Nota 218 Clima: Nublado.
Actividades:
Senderos: se avanza con la instalacion de adoquin en la Plazoleta contiguo al modulo de cafe y al rededor del mismo, se fundan cintas y se instalan Piezas de adoquin

144

Lunes 25 Marzo/2024
Nota 219 Personal de obra: 16 obreros
Clima: Nublado.
Actividades:
Senderos: se avanza con la instalacion de adoquin, Piezas y cintas en el modulo de cafe.
Ruta de la vida: se continua con el mantenimiento, Tijado y Pintura en la ruta contigua a la pista de BMX.

Martes 26 Marzo/2024
Nota 220 Personal de obra: 16 obreros
Clima: Nublado.
Actividades:
Senderos: se avanza con la instalacion de adoquin en el modulo de cafe. se avanza con los cintas en concreto y las Piezas de adoquin
Ruta de la vida: se avanza con la Pintura
Parkour: se avanza con la Excavacion manual Para los dados del cerramiento:

Miercoles 27 Marzo/2024

Nota 221

Personal de obra: 16 Obreros
Clima: Nublado.
Actividades: - Se Realiza y Continua Limpieza Capitulo #4
Jardineros: Se continua con la instalacion de adoquin en el modulo de cafe.
Portero: se cuenta con Excavacion manual para los datos del cerramiento.

[signature]
y rub de obra

Lunes 1 Abril/2024

Personal de obra: 10 obreros

Nota 222

Clima: Nublado, lluvias de 2:00pm a 3:30pm
Actividades:
Jardineros: Se cuenta con la instalacion de adoquin fundida de cintas y piezas de adoquin en la caseta o modulo de cafe.
Portero: Se continua con la Excavacion manual para los datos del cerramiento.

[signature]
Inspector

[signature]
y rub de obra

Bitacora de obra

Nombre Parque: La Victoria
Codigo 04-122

Objeto del contrato: Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto optable el mantenimiento, adecuación, reparación y mejoramiento de la estructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD


Contrato de obra 3099 de 2023
Contrato de interventoria 3.31 de 2023
Contratista de obra: Consorcio Parques 309
Contratista de interventoria: Solion Ingenieria SAS

Ing. Residente obra
Rodney Granados D

Arq. Director de obra
Luis Alfredo Granados

Arq. Residente interventoria
John Cuellar

Arq. Directora Interventoria
Edna Cepeda

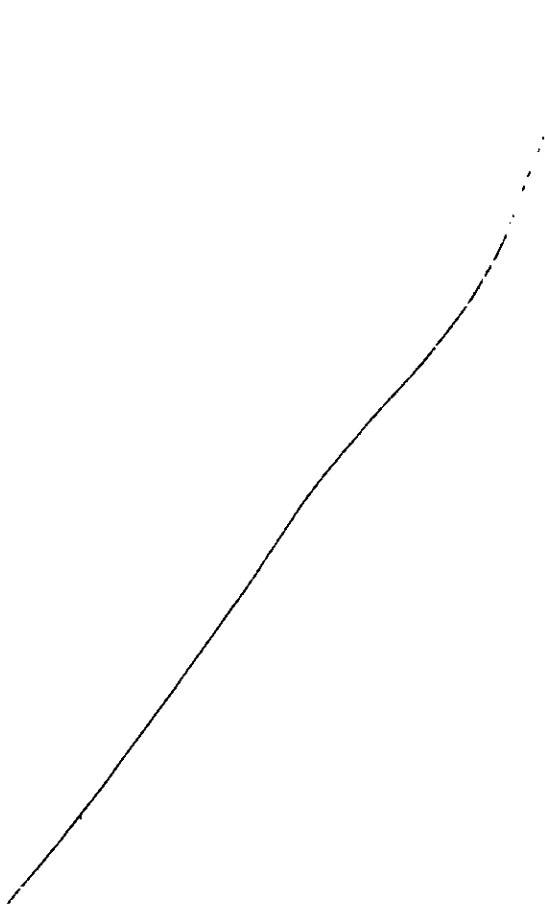

Nota 1

14 Febrero 2024.

Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante de metalmecánica, 1 Residente de obra, 1 residente interventoria, 1 inspector de obra.

Clima: Soleado

Actividades realizadas.

- Se realiza mantenimiento de grecas iniciando lijado de maquinas. NTD. y Greco romanos; se informa a interventoria que las actividades iniciaron el dia 6 de Febrero 2024

Nota 2

15 Febrero 2024

Personal en obra: 1 Inspector de obra, 1 Oficial y 1 ayudante de metalmecánica

Clima: Soleado

Actividades realizadas

- Se avanza con el mantenimiento de maquinas Grecas y Ruta de louida en el cual se lija, y se aplica pintura

se informa a interventoria que la pieza del multifuerza fue pintado y falta Punto de soldadura

y cat de obra.

NOTA 3 - 16 Febrero 2024
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 Residente de obra, y Residente Interventoria, 1 oficial y 1 ayudante de metalmecánica
Clima: Soleado
Actividades realizadas
Se avanza con la pintura de brasilu doble (maquinas Greco romanas) y Maquina NTO.

y cat de obra.

NOTA 4 - 17 Febrero 2024
Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 oficial y 1 ayudante metalmecánica.
Clima Soleado
Actividades realizadas:

-Se realiza limpieza de estructura modulo administración; se realiza acta de Puesta en servicio de maquinas Greco romanas. dejando observación que falta Punto de Soldadura de maquina multifuerza.

y cat de obra.

19 Febrero 2024
NOTA 5 Personal en obra: 1 Residente obra, 1 residente interventoria, 1 inspector, 1 oficial y 1 ayudante metalmecánica
Clima: Soleado.
Actividades realizadas
Se realiza limpieza de estructura de modulo de administración para continuar con mantenimiento de pintura.

y cat de obra

20 Febrero 2024

NOTA 6 Personal en obra 1 Inspector de obra, 1 Oficial y 1 ayudante metalmecánica

Clima Soleado

Actividades realizadas

- Se realiza lijado de estructura modulo administración.

21 Febrero 2024

NOTA 7 Personal en obra: 1 inspector de obra 1 oficial y 1 ayudante metalmecánica

Clima: Soleado

Actividades realizadas

Se realiza lijado de estructura modulo administración; se informa a interventoría que se encuentra en fabricación la rejilla de ventilación

NOTA 8 22 Febrero 2024

Personal en obra: 1 Residente obra, 1 Residente interventoría, 1 inspector, 1 oficial y 1 ayudante metalmecánica

Clima Soleado

Actividades realizadas

- Se aplica Pintura convertidor en modulo de administración y se realiza limpieza de estructura en modulo baños

NOTA 9 23 Febrero 2024

Personal en obra 1 inspector, 1 oficial y ayudante de metalmecánica

Clima Soleado

Actividades realizadas

Se realiza limpieza de estructura modulo de baños.

[illegible] febrero 2024
[illegible] Personal en clase 1 inspector de clases, 1
11 oficial y 1 ayudante de mantenimiento
Clases visitadas
Actividades realizadas
se realizan pruebas en estructuras modulares
Lunes: [illegible]
[illegible]

26 febrero 2024 lunes
Nota Personal en clase 1 inspector, 1 asistente
11 de intendencia, 1 capitán y 1 ayudante de
mantenimiento
Clases visitadas
Actividades realizadas
se realizan con la prueba de estructuras
modulares de buques

21 febrero 2024 [illegible]
Nota Personal en clase 1 asistente de clase, 1
12 asistente de intendencia, 1 capitán y 1 ayudante
de mantenimiento
Clases visitadas
Actividades realizadas
se [illegible] pruebas modulares
estructuradas [illegible]

[illegible]

[illegible] Marzo 2024 Martes
Nota se informa en la intendencia que
13 durante los días de pruebas el
18 Marzo hasta realizarán estructuras
de barcos a [illegible] con el personal
el día de hoy se realizó
demolición de [illegible]
modulo de estructuras
Personal en clase 1 inspector, 1 [illegible]
y 1 ayudante

11

[illegible]

[illegible]

Nota Personal en obra 1 oficial y 1 ayudante
Clima soleado en la mañana, lluvia por la
Nuevas demandas de la tarde
Actividades realizadas
instalacion de laminas de policarbonato
para reconstruccion de nueva de administracion
y mantenimiento de cubierta de
policarbonato

[illegible]

Nota 21 Marzo 2024 Jueves
15 Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante
Clima: Soleado en la mañana, lluvia por la
tarde desde las 1pm hasta las 4:00pm
Actividades realizadas
- Retiro de cubierta de Policarbonato

12

[illegible]

[illegible]

[illegible]

de estuco en muro de administración

y ayudante de obra

NOTA 17 – ORDEN Y ASEO / RETIRO DE SOBRANTES.

Sábado 23 marzo 2024

NOTA 18 Personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente interventoría, 1 inspector, 1 oficial y 1 ayudante de obra

Clima: Soleado

Actividades realizadas

Se continua instalando lamina de Policarbonato y aplicando estuco en muro de administración.

y ayudante de obra.

NOTA 19 Martes 26 marzo de 2024

Se informa a interventoría que el día 25 de Marzo no se realizaron actividades debido al Puente festivo.

Personal de obra: 1 Residente de interventoría, 1 inspector. 1 oficial y 1 ayudante de obra

Clima Soleado

Actividades realizadas

Se realiza limpieza de viga canal la cual estaba totalmente colmatada de sedimentos en modulo de baños y se realiza instalacion de lamina Alurolar. (Policarbonato) en cubierta del mismo modulo

Inspector

NOTA 20 Miercoles 27 marzo 2024

Personal en obra: 1 oficial y 1 ayudante obra civil.

Clima: Soleado.

Actividades realizadas

Aplicacion de estuco y pintado en muro de superboard de administracion

y ayudante.

Nota 22 - Se informa al Contratista [illegible] de la Inmediatez de cuanto a Alcance de [illegible] / orden y Aseo.

Nota 23 - Se informa a la interventoría que debido a las Semana Santa no se realizaron actividades durante los días Jueves 28, Viernes 29 y Sabado 30 de Marzo; las actividades se retomaran el día Lunes 01 abril del presente año.

y Sello de obra

Lunes 01 abril 2024

Nota 24 Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoría, 1 Inspector, 1 oficial y 1 ayudante obra civil

Clima Lluvia en horas de la tarde

Actividades realizadas

Se realizo colocación e instalación de lamina de policarbonato alveolar en cubierta incluido accesorios, aplicación de [illegible] de [illegible]

criminación [illegible] curvas

y - Sello de obra

Nota 25 Martes 02 abril y Miercoles 03 de abril se informa que durante estos dias se realizo la aplicación de Silicon en las canillas, valeros de las lamina de policarbonato instaladas con el fin de sellar y cubrir para no permitir la filtración de agua dejando las actividades finalizadas hasta el momento de hoy a la administración.

y - Sello de obra

Nota 26 - Se informa al Contratista Maria [illegible] Alcance y cantidades de la relación de Administración del [illegible] para que [illegible] Administración

[illegible] la instalación de
[illegible] se inicia con la
[illegible] de la caja.

Viernes 02 de febrero 2024

Personal en obra: 1 inspector, 1 Residente de obra,
NOTA 23 1 Residente de interventoria, 1 oficial, 2 ayudantes.

Clima: Nublado

Actividades Realizadas: Se continua con la fundida de las tapas de las cajas, se inicia con la fundida de las marcos de las cajas recolectoras de agua

NOTA 24 Se REVISA LA INSTALACION DE CANCELAS Y SE LIBERA LA ACTIVIDAD ANTES X REALIZADO

[illegible] Personal en obra: 1 inspector, 1 Residente de obra,
1 Residente de Interventoria, 1 oficial, 2 ayudantes.

Clima Fuertes lluvias

Actividades Realizadas: [illegible]
Se fundieron las cajas de [illegible]
Se dejaron

NOTA 26 Se Liberan las Estructuras de la Instalacion
En Cuanto A Seguridad En Apoyo

Lunes 05 de Febrero 2024

NOTA 27 Personal en obra: 1 inspector, 1 Residente de obra,
1 Residente de Interventoria, 1 oficial, 2 ayudantes.

Clima: Fuertes lluvias

Actividades Realizadas: Se continua con la fundida de los marcos de las cajas recolectoras de agua, se presentan fuertes lluvias se suspenden actividades.

NOTA 28 Se Solicita al contratista MAS CELERIDAD CON LA INSTALACION DE POSTES NUEVO COSTADO LATERAL DEL PARQUE Y EL ARREGLO DEL PORTON PRINCIPAL DE LA ENTRADA PRINCIPAL

Martes 06 de febrero 2024

Nota 29 Personal en obra 1 inspector, 1 Residente de obra, 1 Residente de laboratorio, 1 oficial, 2 ayudantes, Clima: Nublado.

Actividades Realizadas: Se continua con la fundida de los muros de las cajas, se realiza el retiro del cimbramiento de los muros

Nota 30 Toma Ensayo y Rotura de los Cilindros Tratados Diseños del pavimento

Cumplimiento

Miercoles 07 de febrero 2024

Nota 31 Personal en obra 1 inspector, 1 Residente de obra, 1 residente de laboratorio, 1 oficial, 2 ayudantes Clima: Nublado.

Actividades Realizadas: Se continua con la fundida de los muros de las cajas recolectoras de agua

Jueves 08 de febrero 2024

Nota 32 Personal en obra: 1 inspector, 1 Residente de obra, 1 Residente laboratorista, 1 oficial, 3 ayudantes. Clima: Nublado

Actividades Realizadas: Se continua con la fundida de los muros de las cajas recolectoras de agua

Nota 33 Toma Humedad con Balanza Arena Topal Tuvimos para Curar Probetas y Cilindros

Viernes 09 de febrero 2024

Personal en obra 1 inspector, 1 Residente de obra, Nota 34 1 Residente de laboratorio, 1 oficial, 2 ayudantes Clima: Nublado

Actividades Realizadas: Se continua con la fundida de los muros de las cajas recolectoras de agua

Sábado 10 de febrero 2024

Nuria Persona en obra inspector, 1 Residente de obra, 1 Encargado de Soldadura, 1 operario, 2 ayudantes

Plano soldado

Actividades realizadas

Se realiza fondeo de cinco elementos

Nota de marca

37- Se Solicita al Comitente CABEKINO GUERRA Actividades pendientes a realizar Gestión planos Ficha Diagnóstico Ficha planificación

1- INSTALACION DE PORTON Nuevo Control LATERAL Nor occidental del parque

2- ANILLO DE PORTON Entrada principal

3- Enlonado de Muros para Tramos del parque en Cerramiento perimetral

4- INSTALACION DE TAPAS DE CAMARAS DE Inspección Asegurando las Con pasto de Soldadura

Inspector

Martes 12 de febrero 2024

Nuria Persona en obra 1 residente de obra 1 residente de estructura, 1 operario, 2 ayudantes

Plano Soldado

Actividades realizadas

Se realiza con la fundición de dados en la instalación de marcos

-de acuerdo a la visita técnica del día 11 de febrero se comprueba se realizan trabajos de

taller donde se realiza la fabricación del nuevo portón y la malla de cerramiento; De acuerdo al arreglo del portón se informa que debido al costado y tiempo de portón no permite realizar soldadura por lo tanto se procederá el cambio de postes del portón.
Se informa que al a fecha ya se encuentran fundidos los 4 tapas de las cajas de inspección

Miercoles 13 de febrero 2024.
Nota 39 Personal en obra: 1 inspector, 1 residente de obra, 1 residente de instrumentación, 1 oficial y 1 ayudantes
Clima: soleado
Actividades realizadas
- Se realiza retiro de monte y postes en zona de nuevo del cerramiento perimetral;
Se continua fundiendo nuevo tapas y contra de cajas de inspección; Se realiza en taller fabricación de portón

de ingreso al parque

Jueves 14 febrero 2024
Nota 40 Personal en obra: 1 inspector, 1 residente de obra, 1 residente de instrumentación, 1 oficial y 2 ayudantes
Clima: Soleado.
Actividades realizadas:
- Se continua realizando fundido de contra. de cajas de inspección
- Se realiza retiro de escombros.

Viernes 16 Febrero 2024
Nota 41 Personal en obra: 1 oficial y 2 ayudantes
Se realiza mantenimiento de cajas.
y se realiza enlodado de escombros retiro

Sabado 16 febrero. 2024
Se informa a interventoría que los trabajos realizados el día de hoy obedecen a metalmecanica se realiza fabricacion del portón porco:

NOTA 42 lunes 18 febrero 2024
personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente de interventoría, 1 inspector 1 oficial y 2 ayudantes
clima: Soleado
Actividades realizadas
- se realiza fundida de 2 cintas de cerca y mantenimiento interno de cajas de inspección

NOTA 43 miercoles 20 febrero 2024
personal en obra: 1 residente de obra, 1 residente interventoria, 1 inspector, 1 oficial y 2

ayudantes
clima: llovio en horas de la tarde
Se realiza mantenimiento de cajas interno (Retie) se finaliza la fundida de antes para instalar nuevas tapas

NOTA 44 Jueves 22 febrero 2024
Personal en obra: 1 Inspector de obra, 1 residente de obra, 1 residente de interventoria 1 oficial y 2 oiyudantes.
Clima llovio en horas de la tarde
Actividades realizadas
- Se hace el trasiego de material para la construcción del muro, se inicia el levantamiento de muro con ladrillo prensado liviano. en costado posterior del cerramiento perimetral.

NOTA 45 Se Solicita al Contratista dejar los tramos Diarios Terminados para Evitar Humedades.


1 Marzo 2024.

NOTA 46 Personal en obra: 1 oficial y 2 ayudantes de obra civil.

Clima Soleado

Actividades realizadas

- Se realize la construccion de muro. pensado liviano para el cerramiento posterior del parque.




NOTA 47 2 Marzo 2024 sabado.

Personal en obra: 1 oficial, 2 ayudantes de obra civil, 1 residente de obra, 1 residente interventoria

Clima Soleado

Actividades realizadas.

Se avanza con el muro de cerramiento en el costado posterior del parque.




lunes 04 marzo 2024

NOTA 48 Personal en obra: 1 inspector, 1 oficial y 1 ayudante de obra.

Clima Soleado

Actividades realizadas: Se avanza con el muro de cerramiento y se rabica el poste nuevo para instalacion.




Miercoles 06 Marzo de 2024

NOTA 49 Personal en obra: 1 inspector de obra, 1 Residente de obra, 1 residente interventoria, 1 oficial 1. 2 ayudantes de obra civil

Clima soleado

Actividades realizadas.

El dia de ayer 05 marzo y hoy 6 de marzo se realiza remates y finalizacion de muro de cerramiento.



Nota 50 Sabado 9 marzo 2024

Personal en obra: 1 residente obra, 1 soldador y 2 ayudantes., 1 residente Interventoria.

Clima: Soleado.

Actividades realizadas

Instalacion de porton de cerramiento. y se realiza la instalacion de las tapas de cajas con puntos de soldadura.

Nota 51 25 Marzo de 2024.

Se informa a la interventoria que los trabajos y actividades faltantes en el Parque se encuentran en diseño y fabricacion ya que corresponde a los unidos de señales las cuales se estiman esten para la instalacion durante la primera semana de abril al igual que la instalacion de mallas de cerramiento

4 abril 2024.

Nota 52 Se informa a la interventoria que el dia Domingo 7 de (marzo) abril. Se realizaran actividades de observaciones. el mantenimiento del porton principal.

Nota 53 Se le recuerda al / contratista Que dentro De los pendientes Estan:

1- Pasacon El SS porton Nuevo para poder dejar Asiento y para Asegurar el piso

2- Disco del cuarto posterior del cuarto de Contratista

3- Mantenimiento y pintura del Porton principal

4- Venta de las Señales Diagnosticadas

5- Observaciones de lo YA Ejecutado

ANEXO 10. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS

SOLIUN INGENIERÍA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CONTRATO DE OBRA No:	3029-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	3131-2023
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
PARQUE	Parques Bogotá

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
CTO-IDRD-3099-2023-258	5/3/2024	Control calidad	Se entregan controles de calidad
CTO-IDRD-3099-2023-260	5/3/2024	Rta 269	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-261	5/3/2024	Propuesta Parkour	Se envian distribución de los parkours
CTO-IDRD-3099-2023-262	5/3/2024	Listado materiales	Se atienden las observaciones realizadas
CTO-IDRD-3099-2023-263	5/3/2024	PIE	Se atienden las observaciones realizadas
CTO-IDRD-3099-2023-265	11/3/2024	Rta 290	Se atienden las observaciones realizadas
CTO-IDRD-3099-2023-266	12/3/2024	Inf Inspección Calidad	Se entrega informe de inspección de calidad
CTO-IDRD-3099-2023-267	12/3/2024	Certif calidad insumos	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-270	12/3/2024	Manual mto	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-271	12/3/2024	Soporte llegada	Se informa fecha de entrega
CTO-IDRD-3099-2023-273	14/3/2024	Rta 289 atraso activi	Se da respuesta a lo solicitado
CTO-IDRD-3099-2023-275	14/3/2024	Planos record	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-276	14/3/2024	Cambio coordinadores	Se informa el cambio de coordinador
CTO-IDRD-3099-2023-277	15/3/2024	Radicación conceptualización	Se adjunta informe de resultados

SOLIUN INGENIERÍA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA No:	3029-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	3131-2023
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
PARQUE	Parques Bogotá

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
CTO-IDRD-3099-2023-278	15/3/2024	Caracterización grava y arena	Se adjunta caracterización de materiales
CTO-IDRD-3099-2023-280	18/3/2024	Rta 299 Pozo séptico	Se atienden las observaciones realizadas
CTO-IDRD-3099-2023-281	18/3/2024	Infs No. 6	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-282	18/3/2024	Pruebas Higrométricas	Se remiten resultados de las pruebas
CTO-IDRD-3099-2023-283	18/3/2024	Manuales mto	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-285	18/3/2024	Plano propuesta	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-286	18/3/2024	Control Calidad	Se atiende la solicitud realizada
CTO-IDRD-3099-2023-284	19/3/2024	Aceptación adición No. 1	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-287	19/3/2024	Subsan plan adquisiciones	Se remiten para revisión y aprobación
IDRD No. 20246000077551	19/3/2024	Solicitud aceptación adición	Se solicita elaborar presupuesto
CTO-IDRD-3099-2023-289	21/3/2024	Rta 293 manuales mto	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-290	21/3/2024	Resultados ensayos	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-291	21/3/2024	Procedencia material	Se atienden las observaciones realizadas

1118

SOLIUN INGENIERÍA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CONTRATO DE OBRA No:	3029-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	3131-2023
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
PARQUE	Parques Bogotá

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
CTO-IDRD-3099-2023-293	26/3/2024	Intervención pista BMX Tunal	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-294	26/3/2024	Manuales mto	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-295	26/3/2024	Dotación	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-296	26/3/2024	Relación material eléctrico	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-297	26/3/2024	Doc personal	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-298	26/3/2024	APU pulida granito	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-299	26/3/2024	Ensayos laboratorio	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-300	27/3/2024	Entrega diseños	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-302	27/3/2024	Inf Técnico 7	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-252	27/3/2024	Remision actas de vecindad	Se remiten para revisión y aprobación

SOLIUN INGENIERÍA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CONTRATO DE OBRA No:	3029-2023
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES BOG
OBJETO:	"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	3131-2023
INTERVENTOR :	SOLIUN INGENIERIA SAS
OBJETO:	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"
PARQUE	Parques Bogotá

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA

No. CONSECUTIVO	FECHA	CONCEPTO	OBSERVACIONES
CTO-IDRD-3099-2023-253	27/3/2024	Remision actas de vecindad	Se remiten para revisión y aprobación
CTO-IDRD-3099-2023-268	27/3/2024	Rta 277 Remision actas de vecindad de los parques simon bolivar	Se remiten para revisión y aprobación

1120

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Control Calidad

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 5 de marzo de 2024, 9:36
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

Ensayos SBR Rev MRG.pdf
1834K

CTO.IDRD-3099-2023-258 Subbase Granular PRD.pdf
118K

117
1008

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 5 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-258

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Control Calidad

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato, nos permitimos hacer entrega de los controles de calidad de SBG - Material Gravo Arenoso De Color Café, realizados en el parque y/o escenario deportivo PRD idenficiado con código 12-091, debidamente revisado por la profesional de Calidad - Monica Rodríguez Gaona.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72° No.11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: veintidós (22) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

1122
1009

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta comunicado IDRD-3131-2024-269

1 mensaje

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 5 de marzo de 2024, 15:02
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

ra su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

NO PREVISTOS 7.xlsx

CTO.IDRD-3099-2023-260 Items No Previstos.pdf
272K

1123

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 5 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-260

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta comunicado IDRD-3131-2024-269

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado del asunto, nos permitimos realizar la entrega de los ítems no previstos listados a continuación para su revisión y concepto:

Código	Descripción	Unidad	Valor Unitario
NP 121	Luminaria Tipo Led Características De Iluminación Tipo Proyector 200w (sum+Ins)	UN	$ 1.391.352,00
NP 122	Suministro E Instalación De Fachada Vegetal Tipo 1 (Incluye Materias En Concreto = 0,60*0,40*0,30, Hidroretenedor Y Cuadrilla De Mantenimiento Por Garantía De 1 Mes)	M2	$ 610.161,00
NP 123	Suministro E Instalación De Fachada Vegetal Tipo 2 (Incluye Hidroretenedor Y Cuadrilla De Mantenimiento Por garantía De 1 Mes)	M2	$ 424.294,00
NP 124	Suministro E Instalación De Fachada Vegetal Tipo 3 (Incluye Hidroretenedor Y Cuadrilla De Mantenimiento Por Garantía De 1 Mes)	M2	$ 445.067,00
NP 125	Suministro E Instalación De Fachada Vegetal Tipo 4 (Incluye Materias En Concreto = 0,60*0,40*0,30, Hidroretenedor Y Cuadrilla De Mantenimiento Por Garantía De 1 Mes)	M2	$ 530.390,00
NP 126	Suministro E Instalación De Fachada Vegetal Tipo 5 (Incluye Hidroretenedor Y Cuadrilla De Mantenimiento Por Garantía De 1 Mes)	M2	$ 433.015,00
NP 127	Colchoneta Protectora Para Poste Ancho Arriba 2,77 Ancho Abajo 6,40 Largo 2 Metro (Sum+Ins)	UN	$ 4.864.970,00
NP 128	Colchoneta Protectora Para Poste Ancho Arriba 2,50 Ancho Abajo 5,53 Largo 1,90 (Sum+Ins)	UN	$ 4.469.051,00
NP 129	Colchoneta Protectora Para Poste Ancho Arriba 2,50 Ancho Abajo 5,50 Largo 1,87 (Sum+Ins)	UN	$ 4.469.051,00
NP 130	Colchoneta Protectora Para Poste Ancho Arriba 2,47 Ancho Abajo 5,85 Largo 2 Metros (Sum+Ins)	UN	$ 4.925.851,00
NP 131	Caja Metalic.De Paso (20x20x15cm) Lam.Cal.18+Pint-Electros (Sum+Int)	UN	$ 88.692,00
NP 132	Adhesivo Vidrios Vinilo Papel Micro Perforado (Sum+Int)	M2	$ 192.099,00
NP 133	Accesorios P.V.P. Ø1 1/4" (Sum + Instalación)	UN	$ 11.541,00

1126

NP 134	Simulacion Fotometrica Para Canchas De Futbol 5	UN	$ 1.563.884,00
NP 135	Válvula De Bola 1/2" (Sum+Inst)	UN	$ 84.683,00
NP 136	Válvula De Bola 1 1/4" (Sum+Inst)	UN	$ 179.619,00
NP 137	Adoquín Concreto 8 Cm + Base De Arena (Sum+Inst)	M2	$ 83.896,00
NP 138	Bordillo Zarpa E=0.15;A=0.40;H=0.35 M -3000 Psiobra (Sum+Inst)	ML	$ 103.017,00
NP 139	Buje 1 1/2" X 1 1/4" Sch80 PAVCO ** (Sum+Inst)	UN	$ 43.023,00
NP 140	Caja De Inspección .80x.80 H=1.0+Excav(ESPEC/IDRD)	UN	$ 740.218,00
NP 141	Concreto Ciclopeo 3000 Psi Cimentac+Formaleta **	M3	$ 545.885,00
NP 142	Impermeabili Espaldon Con Igol Impriman Y Denso **	M2	$ 33.865,00
NP 143	Instalación Cicloparquadero En Concreto + Señal	UN	$ 161.832,00
NP 144	Reparación De Goteras Existentes En Cubiertas (Sum+Int)	UN	$ 488.442,00
NP 145	Mortero De Rehabilitación + Sikatop 121 O Similar (Espesor De 1 A 2 Cm)	M2	$ 94.804,00
NP 146	Relleno En Rajón Sum+Inst	M3	$ 159.032,00
NP 147	Desmonte, Arreglo, Reposición De Piezas Para Modulos Biosaludables Grecoromanos, Pintura E Instalación	UN	$ 909.388,00
NP 148	Pintura Poliuretano Brocha+Rodillo (Sum+Instalac)	M2	$ 43.849,00
NP 149	Piso Caucho Reciel 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm (Sum+Inst)	M2	$ 756.937,00
NP 150	Puerta hoja entab.Lam.Coldrolledcal.16marcocal.18 (SUM+INS)	M2	$ 849.345,00
NP 151	Puertahojaentab.Lam.Coldrolledcal.16 (SUM+INS)	M2	$ 826.111,00
NP 152	Relleno En Tierra Negra (Suministro + Transporte)	M3	$ 65.430,00
NP 153	Tubo Estructural Galv. Ø 3"-2.5mmastm A-500 Grad-C (SUM+INS)	ML	$ 82.536,00
NP 154	Desmonte De Fluxometro Tipo Push	UN	$ 42.217,00
NP 155	Templada Y Fijación De Malla Eslabonada En Estructura Existente (SUM+INS)	M2	$ 38.536,00
NP 156	Filtro francés (Trinchera)B=0.40mhmax=1.20m Tub160mm (Sum+Ins)	ML	$ 262.214,00
NP 157	Modulo Complemento En Malla Eslabonada Para Baranda (Sum+Ins)	M2	$ 324.500,00
NP 158	Suministro E Instalación De Poste Tronconico De 14m + Canastilla Para 12 Reflectores	UND	$ 19.631.264,00

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

NP 159	Transformador Seco 75 Kva Con 380/220v (Sum+Ins)	UN	$ 20.284.076,00
NP 160	Acometida 3#250 Mcm +1#2/0 Awc Aluminio	ML	$ 120.603,00
NP 161	Acometida 3(3#250 Mcm)+1#2/0 Awc Aluminio	ML	$ 264.273,00
NP 162	Adecuación De Modulo Sanitario (Incluye Desmonte Y Reinstalación De Cubierta + Desmonte Y Reinstalación De Rampas De Ingreso + Corte Y Desconexión De Tuberías Hidráulicas, Sanitarias Y Eléctricas)	UN	$ 581.480,00
NP 163	Estructura Superior Canastilla De Protección Para Bajos 1,35m*0,67m + Incluye Pintura (Sum+Ins)	UN	$ 1.099.554,00
NP 164	Estructura Inferior Base Canastilla De Protección Para Bajos 2,65m*1,25m + Pintura (Sum+Ins)	UN	$ 3.440.043,00
NP 165	Estructura Inferior Base Canastilla De Protección Para Bajos 1,36m*0,96m + Pintura (Sum+Ins)	UN	$ 1.812.966,00
NP 166	Desmonte Traslado Y Reinstalación De Estructura Modulo De Lectura	UN	$ 469.557,00
NP 167	Desmonte Y Reinstalación De Maquina De Ruta De La Vida (Incluye Demolicion De Dados, Excavación Y Fundida De Dados De 0,35x0,35x0,80)	UN	$ 118.646,00
NP 168	Levantamiento De Información Eléctrica Para Escenarios Deportivos (Levantamiento De Cajas De Inspección, Red Existente, Luminarias, Toma De Medida De Cargas Y Voltajes, Digitalización De Información Y Entrega De Informe Eléctrico Del Levantamiento)	UN	$ 4.194.362,00
NP 169	Pintura Sintética + Anticorrosivo De Estructura Pérgola Y Columnas (Incluye Desmonte Y Reinstalación De Cubierta En Policarbonato Con Andamio) Sum+Ins	M2	$ 89.985,00
NP 170	Pedestal En Concreto De 0.30x0.30x0.50 Para Anclaje De Estructura. Incluye Excavación, Dado En Concreto, Refuerzo Interno, Elementos De Anclaje Y Platina"	UN	$ 134.752,00

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No, 11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Un (1) Archivo Excel
Elaboro: JKCG
Aprobo: JCMM

115
1019

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Justificación Distribución Parkour

1 mensaje

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 5 de marzo de 2024, 15:11
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

7 adjuntos

- **CTO.IDRD-3099-2023-261 Propuesta Parkour.pdf** 231K
- **081764M.pdf** 154K
- **220597.pdf** 233K
- **264841_1_446247.pdf** 1065K
- **11-368 FONTANAR -PARKOUR.pdf** 1587K
- **06-063_EL TUNAL _PARKOUR IMPLANTACION.pdf** 1674K
- **204482_1_362953.pdf** 2741K

1126
1013

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545 4

Bogotá D.C., 5 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-261

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Justificación Distribución Parkour

Cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos enviar la distribución de los Parkour para los parques y/o escenarios deportivos Fontanar del Rio identificado con código 11-368 y El Tunal identificado con código 06-063 de acuerdo al manual de instalación de la marca, ver los siguientes anexos:

1. Plano parque 11-368 Fontanar del Rio
2. Plano parque 06-063 El Tunal
3. Manual de Instalación de la marca para el parque Fontanar 11-368 (Archivos 204482_1_362953 y 220597)
4. Manual de Instalación de la marca para el parque Tunal 06-063 (Archivos 081764M y 264841_1_446247)

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No, 11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Setenta y Cinco (75) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobo: JCMM

172

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta Listado Materiales Consolidado

2 mensajes

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 5 de marzo de 2024, 21:20
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

rdial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-262 Listado Materiales Consolidado.pdf
579K

PARQUES BOG_Lista materilaes.pdf
687K

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 6 de marzo de 2024, 6:04
Para: vianney.leano@gmail.com

Para tu revisión
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-262 Listado Materiales Consolidado.pdf
579K

PARQUES BOG_Lista materilaes.pdf
687K

1128

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 5 de marzo 2024

CTO-IDRD-3099-2023-262

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Listado Materiales Consolidado

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado IDRD-3131-2024-273, nos permitimos hacer entrega del listado de materiales consolidado del pròyecto, avalado previamente por la profesional de Calidad Mónica Rodríguez.

Dando respuesta a cada una de las anotaciones así:

- SBG PEA proveniente de Reciclados industriales, no cuenta con los ensayos de laboratorio que presente evidencia de cumplimiento de especificaciones aplicables
  Respuesta: Los ensayos se enviaron mediante carta CTO-IDRD-3099-2023-258 del 5 de marzo de 2024.

- Arena de rio proveniente de Wilmar García, no cuenta con los ensayos de laboratorio que presente evidencia de cumplimiento de especificaciones aplicables, teniendo en cuenta la actividad para su uso
  Respuesta: La caracterización se presentó en informe del mes de diciembre y la muestra fue enviada al laboratorio aprobado, el pasado 28 de febrero de 2024, nos encontramos a la espera de los resultados

- SBG Tipo A proveniente de Reciclados Industriales, no cuenta con los ensayos de laboratorio que presente evidencia de cumplimiento de especificaciones aplicables
  Respuesta: La SBG Tipo A, viene de CONSTRITURAR, las muestras correspondientes se enviaron para ensayos al laboratorio aprobado, nos encontramos a la espera de los resultados

- Arena de peña proveniente de Wilmar García, no cuenta con los ensayos de laboratorio que presente evidencia de cumplimiento de especificaciones aplicables, teniendo en cuenta la actividad para su uso

119
1016

Respuesta: La caracterización se presentó en informe del mes de diciembre y la muestra fue enviada al laboratorio aprobado, el pasado 28 de febrero de 2024, nos encontramos a la espera de los resultados

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Cinco (05) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta Comunicado IDRD-3131-2023-275

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 5 de marzo de 2024, 21:32
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-263 Plan Inspección Medida Ensayo.pdf
562K

FC-09 Plan de inspeccion y ensayos NP 040324.pdf
704K

1130

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 5 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-263

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta Comunicado IDRD-3131-2023-275

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado del asunto, nos permitimos hacer entrega del plan de inspección, medida y ensayo atendiendo las observaciones realizadas.

Dando respuesta a cada una de las anotaciones así:

1. Grama sint monofil.60mm-fifa princ arena+caucho+ins: Describir las pruebas realizadas por el proveedor FIFA, esto dado a que no se describen los ensayos y criterios de aceptación de la arena y granulo de caucho requerido para la actividad, se reitera observación.
   Respuesta: Se incluyen controles

2. Simulación fotométrica de coliseos: Se debe realizar la entrega del estudio de simulación fotométrica por cada coliseo que se realice, se reitera observación.
   Respuesta: Esta actividad y la obligación de entregar el resultado del ensayo ya se encontraba en el plan de inspección, no aplica realizar correcciones.

3. Señales Fotoluminiscentes: Describir cuales son los parámetros establecidos por el cliente y los criterios de aceptación los cuales se soportan con los certificados correspondientes, se reitera observación.
   Respuesta: Se incluyen controles

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Nueve (9) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

1137
1018

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta Comunicado IDRD-3131-2023-290

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 11 de marzo de 2024, 11:49
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

gradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-265 Plan Inspección Medida Ensayo.pdf
222K

FC-09 Plan de inspeccion y ensayos NP 040324.pdf
1583K

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-265

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta Comunicado IDRD-3131-2023-290

Cordial saludo,

Dando respuesta al comunicado del asunto, nos permitimos hacer entrega del plan de inspección, medida y ensayo atendiendo las observaciones realizadas.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Nueve (9) Folios
Elaboro: JKCG
Aprobó: JCMM

1133
1020

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Informe De Inspección De Calidad De Soldaduras - Respuesta IDRD-3131-2024-291

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 12 de marzo de 2024, 12:30
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-266 Informe Prueba Tintas.pdf
253K

Tintas Nvo Muzu Rev MRG.pdf
497K

1134
1024

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-266

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Informe De Inspección De Calidad De Soldaduras

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los compromisos establecidos en comité de seguimiento del 19 de enero de 2023, nos permitimos hacer entrega del informe de inspección de calidad de soldaduras en el parque Nuevo Muzu identificado con código 06-017.

En consecuencia, *"Se encontró que un total de 2 cordones analizados (100%) en 1 tipo de producto cumplen (100%) con el criterio de la prueba menos el del 30% de porosidad"*.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Nueve (9) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1135

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Certificados calidad insumos eléctricos

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 12 de marzo de 2024, 14:48
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

5 adjuntos

- **CTO.IDRD-3099-2023-267 Certificados calidad.pdf** 222K
- **Certificado tableros 1.pdf** 2314K
- **Certificado tableros.pdf** 2208K
- **Certificado ISO 2022 transformador.pdf** 4859K
- **Certificado RETIE 2.023 transformador.pdf** 14298K

1136
013

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-267

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Certificados calidad insumos eléctricos

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los compromisos establecidos en comité de seguimiento del 28 de febrero de 2023, nos permitimos hacer entrega de los certificados de los transformadores y tableros, para su revisión y concepto.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Catorce (14) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

133

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta a comunicado IDRD-3131-2023-279 - Subsanación a observaciones de manuales

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 12 de marzo de 2024, 17:38
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

'ara su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

3 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-270 Manuales de Mantenimiento.pdf
223K

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARQUE PALESTINA CON ANEXO.pdf
4908K

MANUAL DE MANTENIMINETO PARQUE NARANJOS CON ANEXOS.pdf
6933K

1138
1026

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-270

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta a comunicado IDRD-3131-2023-279 - Subsanación a observaciones de manuales.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso adquirido en comité de seguimiento, nos permitimos hacer entrega de los manuales de mantenimiento y uso de los parques y/o escenarios deportivos mencionados a continuación, para su revisión y concepto:

1. Palestina Cod. 07-165
2. Laureles Naranjos Cod. 07-035

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Noventa y cuatro (94) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1739
1026

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Soporte de Llegada estructuras móviles

1 mensaje

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 12 de marzo de 2024, 17:54
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

CTO.IDRD-3099-2023-271 Soporte de Llegada de Estructuras Móviles.pdf
357K

1140
1022

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 12 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-271

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Soporte de Llegada de Estructuras Móviles

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso establecido en comité de seguimiento, nos permitimos informar la fecha de entrega a puerto de las estructuras móviles para el parque de los Niños identificado con código 12-141:

▶ LYD PROYECTOS SAS - BOGOTA

No. Pedido	No. de Instrucción de Embarque	No. de Documento de Transporte	Origen - Destino	Modalidad de Transporte
FUNTEC	1 - 318484	N/A	HAMBURGO-CARTAGENA	IMPORTACIONES MARITIMO

Último Estado
Coordinando Salida

Coordinando Salida → Salida Confirmada → En Transito → Llegada Confirmada

Observaciones: La fecha estimada de salida de su carga es el 14 de Marzo de 2024.

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 – Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

1141

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

HISTORICO DE OBSERVACIONES

Fecha	Estatus	Observaciones
01-Mar-24	Coordinando Recogida	Bienvenido al servicio TRANSBORDER, confirmamos la coordinación de su embarque. Estamos a la espera de recibir información de su carga, así como el itinerario de salida.
04-Mar-24		Para Transborder es un gusto saludarlo Informamos que en este momento nuestro agente en origen está contactándose con el proveedor de la carga en referencia, una vez recibamos noticias del estado de su carga, le estaremos notificando.
05-Mar-24		Buenos días Estimados Informamos que el Shipper dice que la carga estará lista para ser recogida a partir de mañana. Una vez recibamos detalles de la carga y los documentos comerciales podemos proceder a organizar la recogida, antes no.
06-Mar-24		Para Transborder es un gusto saludarlo Enviamos detalles de la carga:
06-Mar-24	Coordinando Recogida	La recogida de su carga está programada para el 8 de Marzo de 2024. La fecha estimada de salida de su carga es el 14 de Marzo de 2024. Informamos que con base en el itinerario inicial, la fecha estimada de arribo sera el dia 28 DE MARZO , una vez le confirmemos la fecha de salida, estaremos actualizando la fecha estimada de arribo, sujeta a cambios.
11-Mar-24	Recogida Confirmada	Confirmamos que su carga fue recogida el 8 de Marzo de 2024. La fecha estimada de salida de su carga es el 14 de Marzo de 2024. Informamos que su carga fue recogida e ingresó hoy a las bodegas del Agente en Origen
11-Mar-24	Coordinando Salida	La fecha estimada de salida de su carga es el 14 de Marzo de 2024.

INFORMACIÓN DEL EMBARQUE

Incoterms	EXW	Modalidad de Flete	Collect
Transportador	Sugerida De Venta Estandar	Tipo de Embarque	LCL
Piezas	N/A	Peso	0
Volumen	7.78	Carga Peligrosa	Non Hazardous
Motonave	Maersk Benguela	Viaje	N/A
Descripción de la Mercancía	Estructuras De Juegos		
Nombre de Proveedor(es)	Funtec Sports Gmbh		

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: 0 Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Atraso actividades eléctricas Parque de Los Niños

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 14 de marzo de 2024, 11:53
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-273 Actividades Eléctricas.pdf
317K

CERTIFICADO LYD PROYECTOS ENTREGAS.pdf
193K

1142
1029

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-273

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta a comunicado IDRD-3131-2024-289 – Atraso actividades eléctricas Parque de los Niños.

Cordial saludo,

Atendiendo a su solicitud, nos permitimos dar respuesta al comunicado a continuación:

1. Debido a un retraso en las actividades de obra se presenta un atraso en las actividades eléctricas debido a demoras en el despacho del Geotextil por parte del proveedor. Lo anterior implicó que las obras no pudieran estar culminadas y las áreas a intervenir no estuvieran libres para permitir el ingreso del personal eléctrico. Adjunto enviamos soporte por parte del proveedor que indica las demoras a las que hacemos referencia.

2. Con base a lo expuesto anteriormente, nos permitimos enviar los tiempos para su respectiva evaluación y de esta forma dar cumplimiento a la ejecución de las actividades citadas en el presente comunicado.

INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 17.151.322,00	10 días	jue 14/03/24	mié 27/03/24	
	Cable Encauchetado 3 x12 (Sum e Instalación).	ML	72,00	$ 1.411.056,00	5 días	jue 14/03/24	mié 20/03/24	1240FC+76 días
	Suministro e Instalacion de Fotocelda	UN	48,00	$ 1.821.312,00	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	1354
	CAJA PASO(.30x.30x.30) Control Tierras	UN	6,00	$ 1.688.574,00	5 días	jue 14/03/24	mié 20/03/24	1240FC+76 días
	Aterrizaje varilla cooper well 5/8"y2.4m(tierr	UN	6	$ 3.424.596,00	5 días	jue 14/03/24	mié 20/03/24	1240FC+76 días
	Empalme en Derivación (9181) Juego x 2 unid	JGO	24,00	$ 6.723.456,00	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	1355
	CUADRILLA MNTO. ELECTROMECANICO 1:1 + PREST.	JRN	8,00	$ 2.082.828,00	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	1355
NO PREVISTOS				$ 41.082.795,46	10 días	jue 14/03/24	mié 27/03/24	
	INSTALACION DE LUMINARIA ALUMB PUBLICO CON PLATAFORMA TRABAJO	UN	48,00	$ 29.401.145,96	5 días	jue 14/03/24	mié 20/03/24	1240FC+76 días
	Simulación fotometrica de Coliseos	UN.	1,00	$ 1.726.833,48	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	1359
	Desmonte de luminaria en altura con escalera tipo extensión altura superior a 4 mts	UND	12,00	$ 3.803.259,69	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	1359
	Cruceta de 2.40m con abrazadera para 4 reflectores (sum + Inst)	UN	12,00	$ 6.151.556,33	5 días	mié 20/03/24	mié 27/03/24	1359

1143
1030

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Un (1) Folio
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1144

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Radiación Planos Record para revisión

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 14 de marzo de 2024, 18:15
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

gradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

4 adjuntos

- **CTO.IDRD-3099-2023-275 Planos record.pdf** 223K
- **P_HIPPIES-PLANO RECORD (1).pdf** 986K
- **DIAGRAMA CONTROL ILUMINACION-TUNAL.pdf** 417K
- **DIAGRAMA CONTROL ILUMINACION-PRD (1).pdf** 553K

1145
1032

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-275

Señores:
JMV INGENIEROS S.A.S
Ant Sra. **LILIA MOSQUERA MOSQUERA**
Dpto. de Contabilidad
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra No. IDU 1791 DE 2021 que tiene por objeto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C.", GRUPO 2"

Asunto: Radicación de Planos Récord Obra Civil y Eléctricos

Cordial saludo,

Atendiendo a su solicitud, adjuntamos los planos récord modelo para su revisión y recomendaciones a los mismos.

1. Plano Récord Obra Civil Parque Hippies 02-019
2. Plano Eléctrico Récord Control Iluminación PRD El Salitre 12-091
3. Plano Eléctrico Récord Control Iluminación EL Tunal 06-063

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Tres (3) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1146
1033

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Notificación cambio de coordinador

1 mensaje

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 14 de marzo de 2024, 18:26
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

*tendiendo a la solicitud, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

CTO.IDRD-3099-2023-276 Cambio de Coordinador.pdf
223K

1147
1039

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-276

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Cambio de coordinador general del contrato 3099

Cordial saludo,

El CONSORCIO PARQUES BOG, se permite informar que a partir del 6 de marzo de 2024 el ingeniero Andrés Fernando Vacca Ramos realizará las funciones y/o gestiones como coordinador general del contrato 3099 que venía desarrollando la ingeniería Katherin Cobos Garzon.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: (0) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1148

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Conceptualización Geotécnica-Parque Canal Boyacá

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 15 de marzo de 2024, 16:37
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

gradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

6 adjuntos

- **CTO.IDRD-3099-2023-277 Conceptualización Geotécnica-Parque Canal Boyacá.pdf** 82K
- **INFORME.pdf** 3150K
- **OT-7110-2024 Apique 04.pdf** 835K
- **OT-7110-2024 Apique 02.pdf** 835K
- **OT-7110-2024 Apique 01.pdf** 836K
- **OT-7110-2024 Apique 03.pdf** 835K

1149
1036

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-277

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Radicación Conceptualización Geotécnica-Parque Canal Boyacá

Cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos adjuntar el informe y los resultados de geotecnia de las muestras tomadas en campo del parque Canal de Boyacá 09-050.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No.11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Sesenta y Seis (66) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1150
1032

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Caracterización de grava y arena-Parque de los Niños

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 15 de marzo de 2024, 16:58
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

gradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

3 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-278 Caracterización grava y arena-Parque de los Niños.pdf
82K

IDRD 14-03-24 .pdf
219K

IDRD 1 14-03-24 .pdf
518K

1751

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-278

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Caracterización de grava y arena-Parque de los Niños

Cordial saludo,

Atendiendo a su solicitud, se adjunta la caracterización de materiales tanto de arena como de grava a utilizar en el parque de los niños 12-141.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Diez (10) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1152
1039

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta comunicado IDRD-3131-2024-299

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 18 de marzo de 2024, 10:18
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

gradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

8 adjuntos

- **PRUEBA ESTANQUEIDAD TANQUE MANÀ S.B (1).pdf** 1822K
- **OT-7161-2024 DENSIDADES TANQUE4 Rev MRG.pdf** 314K
- **OT-7162-2024 DENSIDADES TANQUE5 Rev MRG.pdf** 313K
- **OT-7160-2024 DENSIDADES TANQUE3 Rev MRG.pdf** 313K
- **CARACTERIZACION MATERIAL 7129 Rev MRG (1).pdf** 566K
- **OT-7159-2024 DENSIDADES TANQUE2 Rev MRG.pdf** 313K
- **OT-7158-2024 DENSIDADES TANQUE Rev MRG.pdf** 313K
- **CTO.IDRD-3099-2023-280 Ensayos tanque séptico.pdf** 474K

1153

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-280

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta oficio IDRD-3131-2024-299-Pozo séptico Simón Bolívar

Cordial saludo,

En atención al comunicado descrito en el asunto, nos permitimos atender las observaciones realizadas por interventoría:

1. ... *"Teniendo en cuenta el avance de las actividades realizadas en el Pozo Séptico de Parque Simón Bolívar se ejecutaron sin realizar la entrega de la información correspondiente a esta interventoría para realizar la verificación y liberación de los procesos constructivos asi:*

- *Resultado de prueba estanqueidad.*
- *Resultado de caracterización de material usado para los llenos atendiendo recomendaciones de concepto estructural.*
- *Resultado de densidades tomadas en campo.* "...




Con base a lo mencionado anteriormente, nos permitimos aclarar de manera atenta que la prueba de estanqueidad, la caracterización del material de lleno y las densidades si fueron tomadas en los tiempos de la ejecución, pero no habían sido radicadas a interventoría. Esto fue manifestado durante el comité presencial de seguimiento llevado a cabo el día 13/03/2024 y cumpliendo con la solicitud realizada, a continuación, se relaciona lo que se adjunta al presente comunicado:

1. Resultado prueba de estanqueidad. (Ver anexo)

Dicho resultado concluye que después de finalizado el proceso, se evidenció que el tanque quedó perfectamente impermeabilizado, generando la hermeticidad requerida para su propósito final.

1154




A continuación, se evidencia el registro fotográfico:

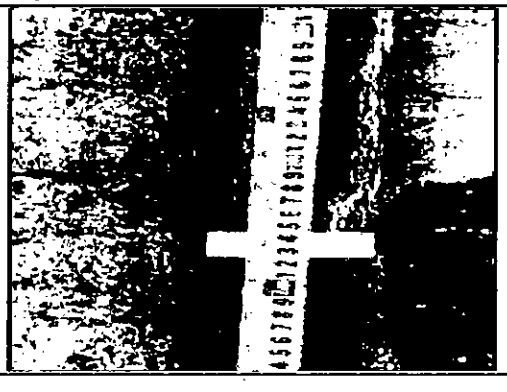Imagen N°1	Imagen N°2
	
Imagen N°3	Imagen N°4
	
Imagen N°5	Imagen N°6
	

2. Caracterización del material utilizado para los llenos atendiendo recomendaciones del concepto estructural. (Ver anexo).

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737645-4

Atendiendo el concepto estructural se adjuntan a la presente comunicación la caracterización del material de excavación utilizado para en llenado en capas de 0,15 m y realizando su debida compactación como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:

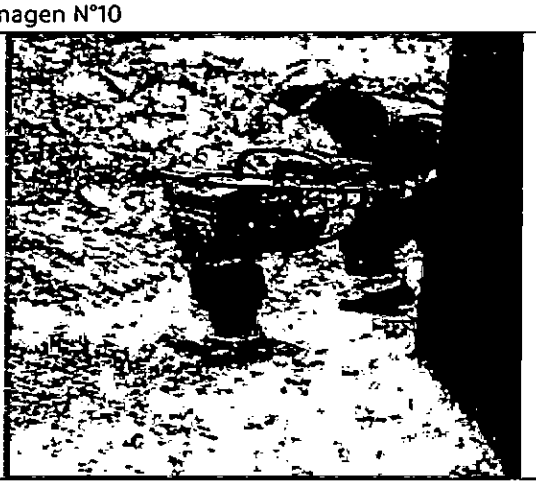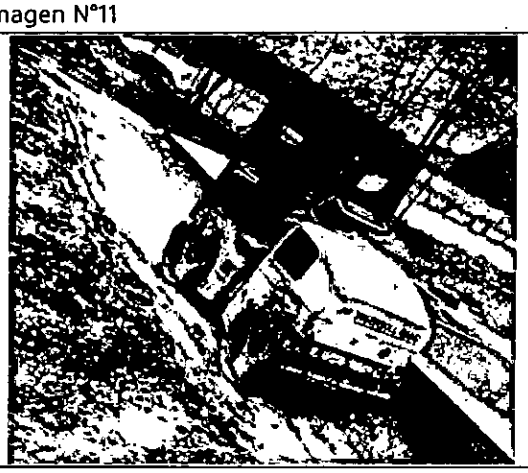
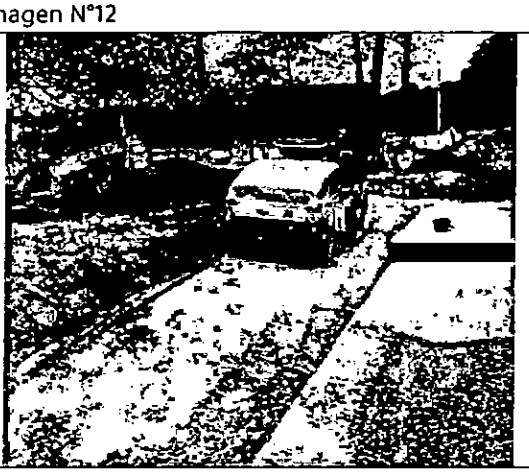
Imagen N°7	Imagen N°8
	
Imagen N°9	Imagen N°10
	
Imagen N°11	Imagen N°12
	

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 - Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

1195

3. Resultado de densidades tomadas en campo. (Ver anexo)

Se tomaron las densidades requeridas y se anexan los resultados de laboratorio. Se evidencia a continuación la toma de muestras en el registro fotográfico:

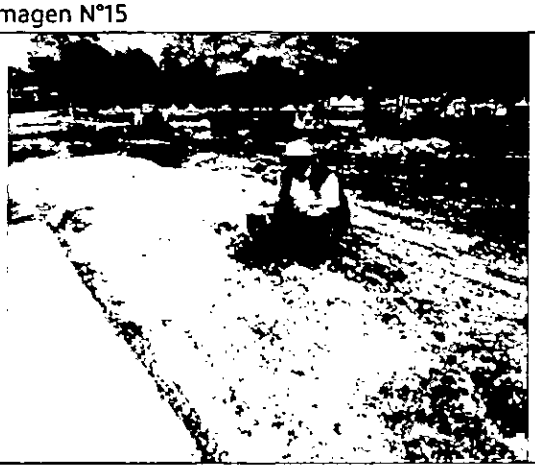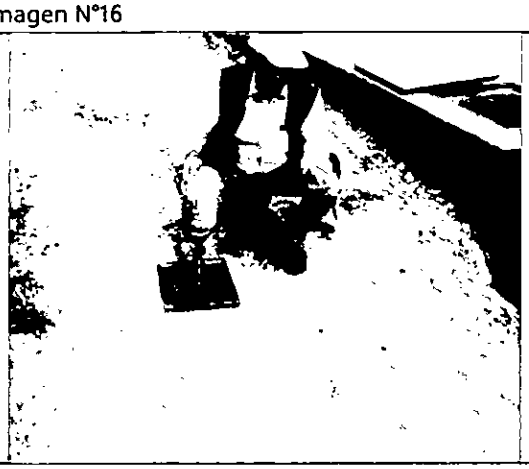Imagen N°13	Imagen N°14
	
Imagen N°15	Imagen N°16
	

Con base a lo manifestado anteriormente y con la documentación adjunta, se demuestra que se ha cumplido con los requerimientos de calidad en obra, las pruebas y las muestras solicitadas por ustedes.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Veinti cinco (25) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobo: JCMM

1156
1043

CONSORCIO PARQUES BOG
801737545-4

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-281

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Informe Mensual No. 6

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a la cláusula 10 - Obligaciones específicas del contratista *"Presentar informes mensuales de cada componente (técnico: (administrativo, contable/financiero y jurídico), calidad, social, ambiental-RCD, SST) a la interventoría del contrato con las novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias, los cuales son soportes del acta parcial mensual señala en el numeral anterior"*. Nos permitimos hacer entrega del informe mensual No. 6 correspondiente al periodo comprendido del 1 al 29 de febrero de 2024, aprobado previamente vía correo electrónico por los diferentes componentes.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No.11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

Fecha: 18-03-2024
Hora: 1:32 pm
Recibe:
Recibido para estudio
NO implica aceptación

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Dos mil Quinientos siete (2507) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1157
1044

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Pruebas Higrométricas

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 18 de marzo de 2024, 11:55
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

3 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-282 Pruebas Higrométricas.pdf
103K

INFO%20HIGROMETRICO%20Z%20baloncesto%2015%20mar_signed.pdf
1863K

INFO%20HIGROMETRICO%20Z%20Tenis%208%20mzo2024_signed.pdf
1807K

1153
104

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-282

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Resultado de Pruebas Higrométricas

Cordial saludo,

Nos permitimos radicar los resultados de las pruebas higrométricas tomadas en los siguientes lugares:

- Placa asfáltica Zona Cancha de baloncesto 1 - Parque PRD El Salitre código: 12-091, ciudad de Bogotá.
- Placa asfáltica Zona Cancha de Tenis 1 - Parque PRD El Salitre código: 12-091, ciudad de Bogotá.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No.11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Dieciocho (18) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1154
1046

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Propuesta parqueadero parque de los niños

1 mensaje

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 18 de marzo de 2024, 16:57
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

\tendiendo a la solicitud, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-285 Plano propuesta parqueadero.pdf
94K

P_D_NIÑOS V2 PARQUEADERO DEMARC-PLANO ARQ.pdf
1268K

1160

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-285

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Plano de propuesta parqueadero - Parque de los niños.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso adquirido en comité de seguimiento, nos permitimos hacer entrega de la propuesta del parqueadero en el parque de los niños 12-141, para su conocimiento:

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No.11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Uno (1) Folio
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1761

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Control de calidad de materiales

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 18 de marzo de 2024, 17:23
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

.gradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

4 adjuntos

- **CTO.IDRD-3099-2023-286 Control de calidad de materiales.pdf** 96K
- **OT-7181-2024 DENSIDADES BG Rev MRG.pdf** 301K
- **OT-7173-2024 CONTROL DE MD 12 Rev MRG.pdf** 511K
- **OT-7045-2024 CONTROL DE MD 3 Rev MRG.pdf** 509K

1762
1099

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-286

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Entrega control de calidad de materiales.

Cordial saludo,

Atendiendo a la solicitud por parte de interventoría, se anexa a la presente comunicación el control de calidad de materiales como se relacionan a continuación:

1. Parque la Fragua-Base granular. (Ver Anexo).
2. Parque Tunal-Mezcla Asfáltica MDC-3. (Ver anexo).
3. Parque Tunal-Mezcla Asfáltica MDC-12. (Ver anexo).

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No.11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Ocho (8) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1163
1050

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta oficio IDRD-3131-2024-293 - Avance en entrega de Manuales.

2 mensajes

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 19 de marzo de 2024, 17:08
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

3 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-283 Manuales de mantenimiento.pdf
138K

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARQUE ESTADIO TECHO CON ANEXOS.pdf
6616K

MANUAL_DE_MANTENIMIENTO_PARQUE_VIRREY Rev MRG.pdf
13335K

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com> 19 de marzo de 2024, 17:42
Para: vianney.leano@gmail.com, Luis Fernando Mondragón Camacho <fermonca65@gmail.com>

Para su revisión,
[El texto citado está oculto]
--
CORDIALMENTE:

SOLIUN

KAREN ADRIANA ALGECIRAS
INGENIERA CIVIL / DEP. PROYECTOS

Tel: (031) 765 3016. Cel: 301 3942384.
Cra. 70 C # 48-55, Bogotá D.C. / www.soliunsas.com

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

1164

1051

3 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-283 Manuales de mantenimiento.pdf
138K

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARQUE ESTADIO TECHO CON ANEXOS.pdf
6616K

MANUAL_DE_MANTENIMIENTO_PARQUE_VIRREY Rev MRG.pdf
13335K

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737645-4

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-283

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta a comunicado IDRD-3131-2023-293 – Radicación de manuales de mantenimiento.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso adquirido en comité de seguimiento, nos permitimos hacer entrega de dos manuales de mantenimiento y uso de los parques y/o escenarios deportivos mencionados a continuación, para su revisión y concepto:

1. Estadio de Techo – 08-554
2. Parque Virrey Norte – 02-014

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Noventa y cinco (95) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1165

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Aceptación de Adición N°1 Y Prorroga N°1

1 mensaje

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 19 de marzo de 2024, 21:51
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-284 Aceptación de Adición N°1.pdf
202K

ANEXOS-PRESUPUESTOSYCRONOGRAMA.pdf
7826K

1166

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-284

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Aceptación de Adición N°1 Y Prorroga N°1

Cordial saludo,

En virtud al cumplimiento en lo estipulado en la misión, objetivos y propósitos del IDRD, al cumplimiento de nuestras obligaciones como contratistas y en la identificación de necesidades de algunas actividades específicas solicitadas por parte de la entidad para dar cumplimiento en el contrato en referencia, en cuanto a la recuperación de la infraestructura física, mobiliario, estructuras deportivas y emergencias, confirmamos nuestra aceptación de adición, aportando como contratistas de la misma manera, a la misión de la entidad, específicamente en "*El Instituto Distrital de Recreación y Deporte promueve el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los habitantes de Bogotá con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de lo público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más participativa, activa e incluyente*".

Con base en lo anterior y según requerimiento de la interventoría, se relacionan lo siguientes aspectos, para tener en cuenta:

- **TÉCNICO**

A continuación, se relacionan los parques específicos y el valor a ejecutar, para tener en cuenta dentro de la presente aceptación de adición, con la intención y tal como lo manifiesta la entidad en su comunicado a fin de garantizar el disfrute de los habitantes de Bogotá D.C, así:

1162
1059

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737645-4

N°	ESCENARIO	LOCALIDAD	DIRECCIÓN	TIPO	CÓDIGO IDR	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	PARQUE INDEPENDENCIA - BICENTENARIO	SANTA FE	Calle 24 # 6A-01	Estructurante	03-039	Recuperación y mantenimiento de zonas de gimnasios al aire libre	$ 25.180.668
2	PARQUE NACIONAL	SANTA FE	Carrera 7 # 37-04	Estructurante	03-035	Reparaciones locativas (Zona de baños y administración).	$ 156.961.754
3	PARQUE JUAN AMARILLO	ENGATIVA	Avenida Calle 90 # 110-06	Estructurante	10-171	Mantenimiento y reparación en zonas de cancha y mobiliario.	$ 392.607.919
4	PARQUE ZONA FRANCA	FONTIBON	Diagonal 12C Carrera 109	Estructurante	09-125	Mantenimiento y reparación en zona de gimnasio al aire libre y juegos infantiles	$ 61.427.360
5	PARQUE EL CARMELO	ENGATIVA	Carrera 104 # 71 C-23	Estructurante	10-169	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de cancha y módulos.	$ 325.724.634
6	PARQUE CASA BLANCA	SUBA	Carrera 80 # 145-50	Estructurante	11-069	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de cancha de tenis y juegos	$ 64.727.388
7	PARQUE LA FRAGUA	ANTONIO NARIÑO	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur	Estructurante	15-040	Recuperación y mantenimientos de zona infantil	$ 460.498.472
8	PARQUE VALLES DE CAFAM	USME	Calle 92 Sur # 14D - 87	Estructurante	05-003	Mantenimientos en zona gimnasio al aire libre	$ 9.795.597
9	PARQUE EL RECREO	BOSA	Carrera 100 Calle 20	Estructurante	07-260	Recuperación y mantenimiento en zona de juegos infantiles	$ 420.043.800
10	PARQUE CASTILLA	KENNEDY	Carrera 75 # 8 A- 31	Estructurante	08-200	Mantenimiento y adecuación de zonas infantiles, cancha de futbol y	$ 477.228.299
11	PARQUE TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	BOSA	Carrera 68 D # 54 A - 03 Sur	Estructurante	07-036	Adecuación en senderos peatonales	$ 52.453.124
12	PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PLAZA DE LOS ARTESANOS)	BARRIOS UNIDOS	Av. Calle 63 # 59 A 06	Estructurante	12-110	Mantenimientos locativos	$ 200.000.000
13	PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 68 # 53-36	Estructurante	13-089	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de juegos infantiles	$ 673.340.428
14	PARQUE GILMA JIMENEZ (LAS MARGARITAS)	KENNEDY	Calle 51 A Sur # 82 A - 16	Estructurante	08-552	Adecuación de iluminación en pista de patinaje y senderos, recuperación y	$ 653.826.234
15	PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)	BARRIOS UNIDOS	Avenida carrera 63 # 60 - 80	Estructurante	12-141	Mantenimientos y adecuaciones locativas	$ 99.268.489
16	PARQUE GAITÁN CORTES	SAN CRISTOBAL	Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E	Estructurante	04-103	Recuperación y adecuación de iluminación en senderos y mantenimiento en zona de	$ 33.826.234
17	PARQUE VILLA DE LOS ALPES	SAN CRISTOBAL	Carrera 3 B # 35 -04 Sur	Estructurante	04-075	Mantenimiento en cancha múltiple.	$ 221.850.301
18	PARQUE SAUZALITO	FONTIBON	Transversal 66 Diagonal 22B Costado	Estructurante	09-111	Mantenimiento y adecuación de actividades eléctricas	$ 109.917.609

19	PARQUE SAN ANDRES	ENGATIVA	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No	Estructurante	10-234	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas	$ 113,464,592
20	PARQUE LA SERENA	ENGATIVA	Calle 90 A # 85- 70	Estructurante	10-223	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas	$ 113,464,592
21	PARQUE NUEVO MUZU	TUNJUELITO	Carrera 61 B # 52A - 20 Sur	Estructurante	06-017	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas	$ 113,464,592
22	PARQUE SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO	BARRIOS UNIDOS	Carrera 60 # 63 - 75	Estructurante	12-091	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas	$ 226,929,184
23	PARQUE UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA	PUENTE ARANDA	Calle 43 Sur # 52-20	Estructurante	16-024	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas	$ 113,464,592
24	PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	RAFAEL URIBE	Calle 22 Sur # 21-09	Estructurante	18-207	Mantenimiento juegos infantiles	$ 20,000,345
25	PARQUE CAYETANO CAÑIZARES	KENNEDY	Carrera 80 40 56 Sur	Estructurante	08-241	Adecuación y mantenimiento de iluminación en senderos	$ 60,028,800
26	PARQUE ATAHUALPA	FONTIBON	Avenida Calle 24 # 113-51	Estructurante	09-104	Mantenimiento y adecuación en zona infantil	$ 406,542,317
27	PARQUE EDUARDO SANTOS	LOS MARTIRES	CALLE 4A BIS N 18 B 30	Estructurante	14-030	Recuperación de senderos peatonales	$ 42,583,321
28	PARQUE EL TUNAL	TUNJUELITO	CALLE 48 C SUR N 22D 81	Estructurante	06-063	Recuperación y mantenimiento locativo	$ 187,999,655.00
29	PAQUE NIZA XII	SUBA	CARRERA 57 # 119B60	Estructurante	11-191	Mantenimiento Locativo	$ 29,956,200
30	EMERGENCIAS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	Atención de emergencias del sistema distrital de parques. Las cuales surgen de actividades y requerimientos urgentes.	$ 300,000,000
31	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	VARIOS	Atención de mantenimientos preventivos y correctivos.	$ 700,000,000
TOTAL ADICIÓN							$ 6,866,576,500

Cada presupuesto por parque relacionado de la tabla anterior, se adjunta al presente documento. (Ver Anexo N° 1).

Las actividades generadas, asunto de la presente adición cuentan con precio contractual y/o precio no previsto aprobado y legalizado.

De acuerdo con lo manifestado por el IDRD mediante memorando 20246000077551, se deben considerar la atención de emergencias del sistema general de parques y la atención de mantenimientos preventivos y correctivos que se puedan presentar. Por lo cual se reserva un valor de $1.000.000.000,00.

1169

- **JURÍDICAMENTE**

1. Actualmente el contrato de obra 3099 de 2023 se encuentra con las pólizas de garantía debidamente aprobadas y vigentes.

2. Al contrato en cuestión a la fecha no ha sido objeto de ninguna adición y prórroga y se encuentra actualmente vigente (en periodo de ejecución).

3. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que reza lo siguiente:

"ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL. *Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.*

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.

PARÁGRAFO. *En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.*

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales."

Por lo anterior, y en cumplimiento de un marco técnico y jurídico, aceptamos la adición solicitada, por valor de **$6.866.576.500** pesos m/cte de acuerdo con lo manifestado por el IDRD mediante memorando 20246000077551; para la ejecución de las actividades previstas, se requiere una prórroga de cuatro (04) meses, contados a partir del día de la terminación del contrato 3099 de 2023, es decir, desde el 12 de abril hasta el 11 de agosto de 2024, tiempo que consideramos suficiente para ejecutar las actividades específicas requeridas por la entidad y resumidas en el presente documento.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Treinta y tres (33) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1169

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta oficio IDRD-3131-2024-298-Subsanación plan de adquisiciones.

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 19 de marzo de 2024, 16:42
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

gradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-287 Subsanación Plan Adquisiciones.pdf
227K

Plan adquisiciones 180324.pdf
2438K

1790
1052

CONSORCIO PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 19 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-287

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta oficio IDRD-3131-2024-298-Subsanación plan de adquisiciones.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los compromisos establecidos en comités de seguimiento y en mesas de trabajo, nos permitimos hacer entrega del plan de adquisiciones para su revisión y concepto.

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Diez (10) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1171
1058

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

20246000077551 - Solicitud de Aceptación Adición al Contrato de Obra 3099 de 2023

1 mensaje

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD <idrdcorrespondencia@idrd.gov.co>
Para: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA <proyectos2@soliunsas.com>

19 de marzo de 2024, 9:38



Señor(a)

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA

Reciba un cordial saludo:

Usted ha recibido un correo electrónico seguro y certificado de parte de **INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD**, quien ha depositado su confianza en el servicio de correo electrónico certificado de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S para hacer efectiva y oportuna la entrega de la presente notificación electrónica.

Con la recepción del presente mensaje de datos se entiende que el destinatario ha sido notificado para todos los efectos según las normas aplicables vigentes, especialmente los artículos 12 y 20 la Ley 527 de 1999 y sus normas reglamentarias.

Nota: Para leer el **contenido del mensaje** recibido, usted debe **hacer click** en el enlace que se muestra a continuación:

«4+72»

Ver contenido del correo electrónico
Enviado por INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD

1172

1056

BOGOTÁ | IDRD

Al contestar cite este número

Radicado IDRD No. 20246000077551

Bogotá D.C. 15-03-2024

Doctor
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
SOLIUN INGENIERIA SAS
Carrera 70 C No 48-55
PBX: 7653016
Correo electrónico: proyectos2@soliunsas.com
Ciudad.

ASUNTO: **Solicitud de Aceptación Adición al Contrato de Obra 3099 de 2023**

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3131 DE 2023, cuyo objeto es "*Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".*

Respetado ingeniero Raúl Delgado,

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD tiene a su cargo el mantenimiento de los parques y escenarios que conforman el Sistema Distrital de Parques, respecto de los cuales se debe garantizar su sostenibilidad y uso adecuado, cumpliendo de manera directa con la misión institucional que corresponde a: *"El Instituto Distrital de Recreación y Deporte promueve el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los habitantes de Bogotá con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de lo público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más participativa, activa e incluyente"*, motivo por el cual se fundamenta la celebración del contrato de obra pública No. 3099 de 2023, que tiene por Objeto: *"Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y*

Fecha de firmado: 2024.03.15 16:37:28 COT
Firmado digitalmente desde SGD-Orfeo

1773
7060

recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD". Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la misión, objetivos y propósitos del IDRD la Subdirección Técnica de Parques en el ejercicio de su gestión ha evidenciado la necesidad de priorizar intervenciones en los distintos parques, considerando lo establecido en el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO que hace parte integral del COP No. 3099 de 2023 en los siguientes términos*: "realización del mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques para la recuperación y consolidación de espacios recreo deportivos, de contemplación y ocio, (...) del Sistema Distrital de Parques.*

Como consecuencia de la priorización realizada, se identificaron los parques administrados por el IDRD (pertenecientes al Sistema Distrital de Parques) que requieren intervención a fin de garantizar el disfrute de los habitantes de Bogotá D.C., se evidencian:

PARQUE: PARQUE INDEPENDENCIA - BICENTENARIO			
LOCALIDAD	SANTAFE	**DIRECCION**	Calle 24 # 6A -01
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	03-039
Actividad	Recuperación y mantenimiento de zonas de gimnasios al aire libre		

PARQUE: PARQUE NACIONAL			
LOCALIDAD	SANTAFE	**DIRECCION**	Carrera 7 # 37 -04
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	03-035
Actividad	Reparaciones locativas (zona de baños y administración)		

PARQUE: JUAN AMARILLO			
LOCALIDAD	ENGATIVÁ	**DIRECCION**	Avenida Calle 90 # 110- 06
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	10-171
Actividad	Mantenimiento y reparación en zonas de cancha y mobiliario		

PARQUE: ZONA FRANCA			
LOCALIDAD	FONTIBÓN	**DIRECCION**	Diagonal 12 C Carrera 109
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	09-125
Actividad	Mantenimiento y reparación en zona de gimnasio al aire libre y juegos infantiles		

PARQUE: EL CARMELO			
LOCALIDAD	ENGATIVÁ	**DIRECCION**	Carrera 104 # 71 C- 23
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	10-169
Actividad	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zonas de cancha y módulos		

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

PARQUE: CASA BLANCA			
LOCALIDAD	SUBA	**DIRECCION**	Carrera 80 # 145-50
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	11-069
Actividad	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de cancha tenis y juegos infantiles		

PARQUE: LA FRAGUA			
LOCALIDAD	ANTONIO NARIÑO	**DIRECCION**	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	15-040
Actividad	Recuperación y mantenimientos de zona infantil		

PARQUE: VALLES DE CAFAM			
LOCALIDAD	USME	**DIRECCION**	Calle 92 Sur # 14D -87
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	05-003
Actividad	Mantenimientos en zona gimnasio al aire libre		

PARQUE: EL RECREO			
LOCALIDAD	BOSA	**DIRECCION**	Carrera 100 Calle 20
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	07-260
Actividad	Recuperación y mantenimiento en zona de juegos infantiles		

PARQUE: CASTILLA			
LOCALIDAD	KENNEDY	**DIRECCION**	Carrera 75 # 8 A- 31
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	08-200
Actividad	Mantenimiento y adecuación de zonas infantiles, cancha de futbol y gimnasio al aire libre		

PARQUE: TIMIZA SECTOR VILLA DEL RÍO			
LOCALIDAD	BOSA	**DIRECCION**	Carrera 68 D # 54 A - 03 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	07-036
Actividad	Adecuación en senderos peatonales		

PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR PLAZA DE LOS ARTESANOS)			
LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS	**DIRECCION**	Av. Calle 63 # 59 A 06
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	12-110
Actividad	Mantenimientos locativos		

PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)			
LOCALIDAD	TEUSAQUILLO	**DIRECCION**	Avenida Carrera 68 # 53-36
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	13-089
Actividad	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de juegos infantiles		

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 05
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

45 años IDRD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1774
1061

PARQUE: GILMA JIMENEZ (LAS MARGARITAS)			
LOCALIDAD	KENNEDY	**DIRECCION**	Calle 51 A Sur # 82 A - 16
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	08-552
Actividad	Adecuación de iluminación en pista de patinaje y senderos, recuperación y mantenimiento de juegos en zona infantil		

PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)			
LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS	**DIRECCION**	Avenida carrera 63 # 60 - 80
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	12-141
Actividad	Mantenimientos y adecuaciones locativas		

PARQUE: GAITAN CORTES			
LOCALIDAD	SAN CRISTOBAL	**DIRECCION**	Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	04-103
Actividad	Recuperación y adecuación de iluminación en senderos y mantenimiento en zona de gimnasio al aire libre		

PARQUE: VILLA DE LOS ALPES			
LOCALIDAD	SAN CRISTOBAL	**DIRECCION**	Carrera 3 B # 35 -04 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	04-075
Actividad	Mantenimiento en cancha múltiple.		

PARQUE: SAUZALITO			
LOCALIDAD	FONTIBON	**DIRECCION**	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	09-111
Actividad	Mantenimiento y adecuación de actividades eléctricas		

PARQUE: SAN ANDRES			
LOCALIDAD	ENGATIVÁ	**DIRECCION**	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	10-234
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: LA SERENA			
LOCALIDAD	ENGATIVÁ	**DIRECCION**	Calle 90 A # 85- 70
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	10-223
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

45 años IDRD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

PARQUE: NUEVO MUZU			
LOCALIDAD	TUNJUELITO	**DIRECCION**	Carrera 61 B # 52A -20 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	06-017
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)			
LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS	**DIRECCION**	Carrera 60 # 63 - 75
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	12-091
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA			
LOCALIDAD	PUENTE ARANDA	**DIRECCION**	Calle 43 Sur # 52-20
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	16-024
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA			
LOCALIDAD	RAFAEL URIBE	**DIRECCION**	Calle 22 Sur # 21-09
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	18-207
Actividad	Mantenimiento juegos infantiles		

PARQUE: CAYETANO CAÑIZARES			
LOCALIDAD	KENNEDY	**DIRECCION**	Carrera 80 40 56 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	08-241
Actividad	Adecuación y mantenimiento de iluminación en senderos		

PARQUE: ATAHUALPA			
LOCALIDAD	FONTIBON	**DIRECCION**	Avenida Calle 24 # 113-51
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	09-104
Actividad	Mantenimiento y adecuación en zona infantil		

PARQUE: EDUARDO SANTOS			
LOCALIDAD	LOS MARTIRES	**DIRECCION**	CALLE 4A BIS N 18 B 30
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	14-030
Actividad	Recuperación de senderos peatonales		

PARQUE: EL TUNAL			
LOCALIDAD	TUNJUELITO	**DIRECCION**	CALLE 48 C SUR N 22D 81
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	06-063
Actividad	Recuperación y mantenimiento locativo		

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

45 años IDRD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

1175
1082

PARQUE: NIZA XII			
LOCALIDAD	SUBA	**DIRECCION**	CARRERA 57 # 119ª60
TIPO	ESTRUCTURANTE	**CÓD. IDRD**	11-191
Actividad	Mantenimiento locativo		

Adicional a lo expuesto de acuerdo con lo establecido en el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO del contrato de obra COP 3099 de 2023 en lo referente a la atención de emergencias:

> *(...)" El oferente debe contar con personal, equipo e insumos necesarios para atender en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas cualquier actividad imprevista y que pueda catalogarse como emergencia. Igualmente, deberá estar en disposición de atender casos puntuales de mantenimiento, adecuación, recuperación y reparación o arreglos locativos que se deriven de la emergencia y que estén al margen de la periodicidad antes anotada.*
> *Los oferentes deben informar el número de operarios disponibles para atender este tipo de servicio, la logística disponible y el tiempo mínimo de respuesta. Se aclara que las emergencias deben estar cubiertas los siete días de la semana las 24 horas del día" (...).*

Es oportuno considerar la atención de emergencias que se puedan presentar:

PARQUE: EMERGENCIAS			
LOCALIDAD	VARIAS	**DIRECCION**	VARIAS
TIPO	VARIOS	**CÓD. IDRD**	VARIOS
Actividad	Atención de emergencias del sistema distrital de parques. Las cuales surgen de actividades y requerimientos urgentes		

De la misma forma, el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO del contrato de obra 3099 de 2023 determina: (...) "*se deben tener en cuenta la atención a las necesidades que se presentan en el transcurso de la ejecución contractual que se ocasionan como consecuencia de los factores climáticos, deterioro por uso y daños por actos vandálicos, situaciones que podrán influir en la priorización inicial*", por lo tanto, es pertinente establecer la atención de mantenimientos preventivos y correctivos para los parques que conforman el Sistema Distrital de Parques:

PARQUE: VARIOS			
LOCALIDAD	VARIAS	**DIRECCION**	VARIAS
TIPO	VARIOS	**CÓD. IDRD**	VARIOS
Actividad	Atención de mantenimientos preventivos y correctivos		


Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

En tal sentido, y como bien se evidencia en la descripción de las necesidades identificadas en cada escenario por el IDRD, se estima conveniente que previo al diagnóstico de las necesidades de cada sitio, acordemos los términos de una adición al contrato de obra pública No. 3099 del 2023, teniendo claro que los recursos máximos disponibles corresponden al 50% del valor inicial del contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales equivalentes a $ 6.866.576.500.

Dicho eso solicitamos su amable colaboración para elaborar un presupuesto de acuerdo con las necesidades identificadas en cada sitio, sin superar el monto definido para la adición, conforme a los precios de la oferta.

Lo anterior teniendo en cuenta que en el anexo técnico del contrato 3099 de 2023 define dentro de su alcance y actividades por ejecutar el "*mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de los parques para la recuperación y consolidación de espacios recreo deportivos, de contemplación y ocio, (...)* ***La priorización de los parques y de las actividades de mantenimiento, adecuación, recuperación y reparación estará a cargo del IDRD,***", y como se evidenció, las necesidades plasmadas en el presente documento se deben atender pues se presentan en los parques y escenarios pertenecientes al Sistema Distrital de Parques.

Una vez el contratista CONSORCIO PARQUES BOG, acepte la solicitud planteada le agradecemos remitir su respuesta, junto con los documentos adicionales que considere como interventoría del contrato de obra pública No. 3099 de 2023.



RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector Técnico de Parques

Anexos: N/A
Copia: N/A
Elaboró: Angelica Romero - Contratista - Subdirección Técnico de Parques
Proyectó: Angelica Romero - Contratista - Subdirección Técnico de Parques
Revisó: Camilo Galindo - Contratista
Aprobó: Rodrigo Alberto Manrique Forero – Subdirector Técnico de Parques

Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info: Línea 195

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta oficio IDRD-3131-2024-293 - Avance en entrega de Manuales

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 21 de marzo de 2024, 11:17
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

gradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-289 Manuales de mantenimiento.pdf
138K

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARQUE VILLA DE LOS ALPES.pdf
12298K

177
100

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737645-4

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-289

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta a comunicado IDRD-3131-2023-293 – Radicación de manuales de mantenimiento.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento al compromiso adquirido en comité de seguimiento, nos permitimos hacer entrega del manual de mantenimiento y uso del parque y/o escenario deportivo mencionados a continuación, para su revisión y concepto:

1. Parque Villa de los Alpes – 04-075

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Cincuenta y seis (56) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1179
1065

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Resultado ensayos de laboratorio

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 21 de marzo de 2024, 12:42
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

10 adjuntos

- **CTO.IDRD-3099-2023-290 Resultado Ensayos de Laboratorio.pdf** 141K
- **CARACTERIZACION 7128 ARENA PEÑA Rev MRG.pdf** 448K
- **AFIRMADO OT-7136 B200 Rev MRG.pdf** 3515K
- **OT-7130-2024 - CARACTERIZACION RAJON Rev MRG.pdf** 733K
- **OT-7017-2024 Concreto Rev MRG.pdf** 1747K
- **OT-7156-2024 CONTROL DE MDC 19 Rev MRG.pdf** 507K
- **OT-7157-2024 CONTROL DE MDC 19 Rev MRG.pdf** 508K
- **1350 OT-7155-2024 1350 Rev MRG.pdf** 495K
- **1350 OT-7090-2024 1350 Rev MRG.pdf** 495K

179
1066

OT-7171-2024 ADOQUIN ARCILLA Rev MRG.pdf
374K

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-290

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Radicación resultados ensayos de laboratorio

Cordial saludo,

Por medio del presente nos permitimos adjuntar los siguientes resultados de los ensayos de laboratorio para su revisión:

1. Material Granular:
    a. OT-7128-Caracterizacion de Arena lavada para la capa de soporte de los adoquines.
    b. OT-7136-Caracterizacion de afirmado.
    c. OT-7130-Caracterizacion de Rajón.
2. Concretos
    a. OT-7017-Reeporte de compresión de cilindros
3. Asfaltos
    a. OT-7090-Control de calidad de mezcla asfáltica 1350 tipo IDRD.
    b. OT-7155- Control de calidad de mezcla asfáltica 1350 tipo IDRD.
    c. OT-7156-Control de calidad de mezcla asfáltica MDC-19.
    d. OT-7157- Control de calidad de mezcla asfáltica MDC-19.
4. Prefabricados
    a. OT-7171-Control de calidad de adoquín de arcilla.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

1180
1064

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Cincuenta y uno (51) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 – Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta oficio IDRD-3131-2024-305-Procedencia material presentado

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 21 de marzo de 2024, 13:35
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

gradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

3 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-291 Procedencia material presentado.pdf
139K

CARACTERIZACION 7091 ARENA PELDAR REV MRG.pdf
386K

OT-7120 GRAVA FILTROS Rev MRG.pdf
631K

1181
1068

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-291

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Respuesta oficio IDRD-3131-2024-305

Cordial saludo,

Atendiendo a su solicitud, nos permitimos dar respuesta al oficio **IDRD-3131-2024-305 en el cual** se requiere la descripción de la procedencia de cada material presentado en el oficio CTO-IDRD-3099-2023-278.

Adjunto al presente oficio se presentan los siguientes informes con atención a la observación solicitada, de la siguiente manera:

1. **OT-7120**-CARACTERIZACION GRAVA PARA FILTROS ESPECIFICACION IDRD-**PROCEDENCIA AGREGADOS NACIONALES. (Ver Anexo)**
2. OT-7091-CARACTERIZACION DE ARENA SILICEA ESPECIFICACION IDRD-**PROCEDENCIA COLOMBIA MINERALES INDUSTRIALES SAS. (Ver Anexo)**

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

Juan Camilo Mosquera

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: Diez (10) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

1182
1069

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Registro fotográfico pista BMX

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 26 de marzo de 2024, 12:05
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

Para su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

gradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

CTO.IDRD-3099-2023-293 Intervención Pista BMX.pdf
1616K

1183
1020

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Bogotá D.C., 26 de marzo de 2024

CTO-IDRD-3099-2023-293

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Obra IDRD 3099 DE 2023 que tiene por objeto: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

Asunto: Intervención pista BMX parque Tunal COD 06-063

Durante la ejecución del contrato se realizaron visitas a la pista de BMX junto con la interventoría y la entidad contratante en donde surgió la necesidad de realizar el mantenimiento preventivo que incluye el reparcheo en las zonas más deterioradas y aplicación de sluring en la pista en general. Es importante tener en cuenta que dicho mantenimiento estaba destinado a la conservación de la pista de BMX, la cual ya existía y sobre la cual fue indicado que no se podían realizar modificaciones que pudieran alterar el trazado, las curvaturas y las pendientes, dadas las características de competición expresadas por las ligas durante la reunión preliminar al inicio de actividades. (Ver anexo No 1. Acta de reunión preliminar)




En el presupuesto presentado se definieron las siguientes actividades.

Código APU/Insum		UND	VALOR UNITARIO	CANT	Vr Parcial Directo
13660	Demol pav asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro	M2	$ 14.737	507,32	$ 7.476.374,84
12148	Relleno Recebo Base granular (Compact-rana)+Trasle	M3	$ 185.989	53,90	$ 10.025.272,07
13069	SLURING EMULSION CRL-1,CRL-0 Y ARENA DE	M2	$ 25.319	2372,47	$ 60.068.567,93
14518	CAJA INSPECCION(.80x.80x.80) ESPEC-IDRD	UN	$ 840.992	2,00	$ 1.681.984,00
11931	Base asfaltica MDC-3 e=7cm compactado**	M2	$ 87.152	641,64	$ 55.920.209,28
10713	Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr	ML	$ 9.868	1091,01	$ 10.766.086,68
NP 33	Marco+tapa(äng+plat+acero+conc.3.000)caja 60x60cm (sum + inst)	UND	$ 279.495	4,00	$ 1.117.981,37
NP 99	Señaletica de normas generales para zonas infantiles y zona biosaludables 120x80 cmc*2 caras (suministro e instalacion)	UND	$ 2.004.941	1,00	$ 2.004.940,66
NP 112	Rodadura asfaltica mdc-12 e=0.08 compactado ** (sum+inst)	M2	$ 122.774	487,73	$ 59.880.515,81
					$ 208.941.932,64





1184
1021

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

Atendiendo a la solicitud de la interventoría realizada en comité de seguimiento, nos permitimos presentar a ustedes el registro fotográfico que permite observar el estado de la pista original y el resultado de después de haber realizado el mantenimiento preventivo indicado en el presente documento

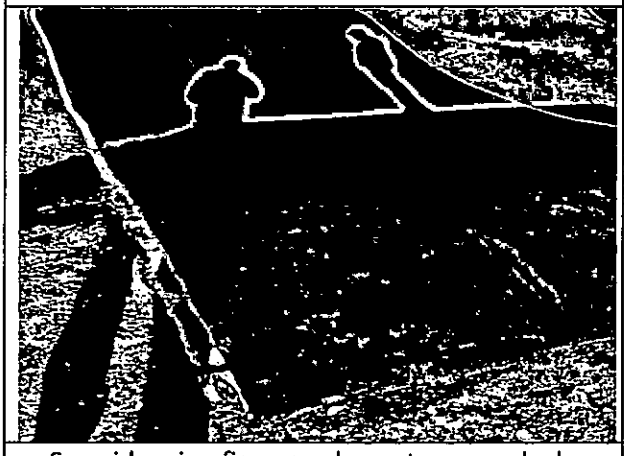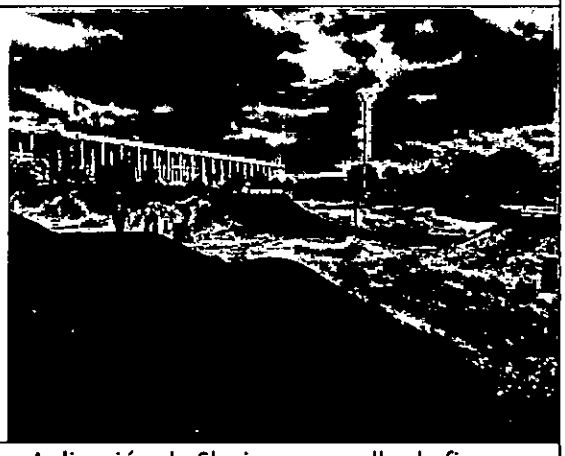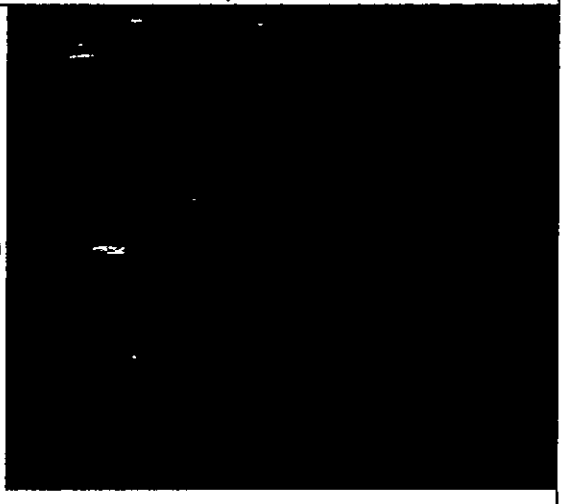REGISTRO FOTOGRAFICO	
ANTES	DESPUES
	
Se evidencian fisuras y desgaste general a lo largo de la pista de BMX.	Aplicación de Sluring para sello de fisuras superficiales.
	

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 - Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

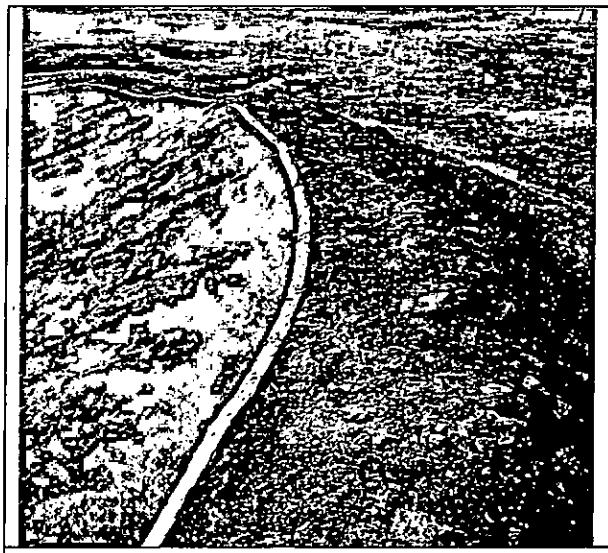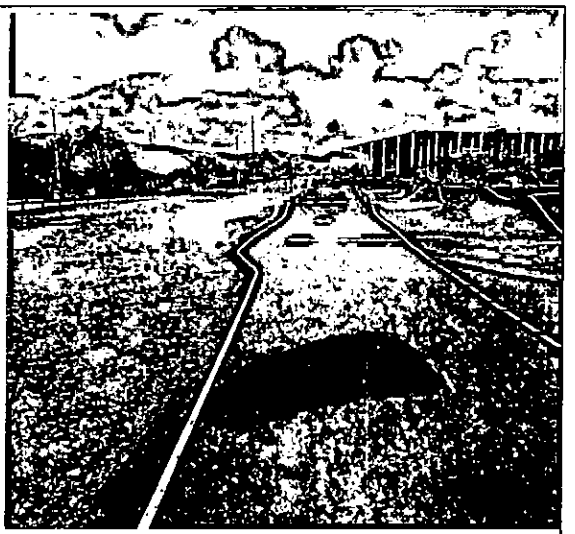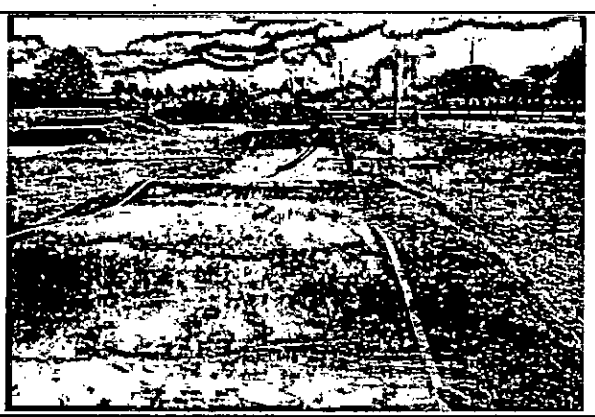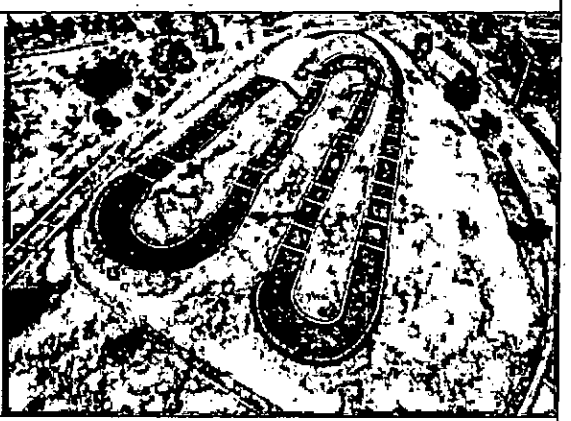
	
El sobre ancho se encontraba en mal estado, en el cual ya contenia carpeta vegetal en el area perimetral de todo la pista.	Mejoramiento de sobre ancho en la pista de BMX.
	
En la pista se evidencia que la demarcacion contiene perdida de material.	Demarcacion de pista de BMX según normativas de cartilla IDRD.

1185
1022

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737546-4


REGISTRO FOTOGRÁFICO ADICIONAL

ANTES

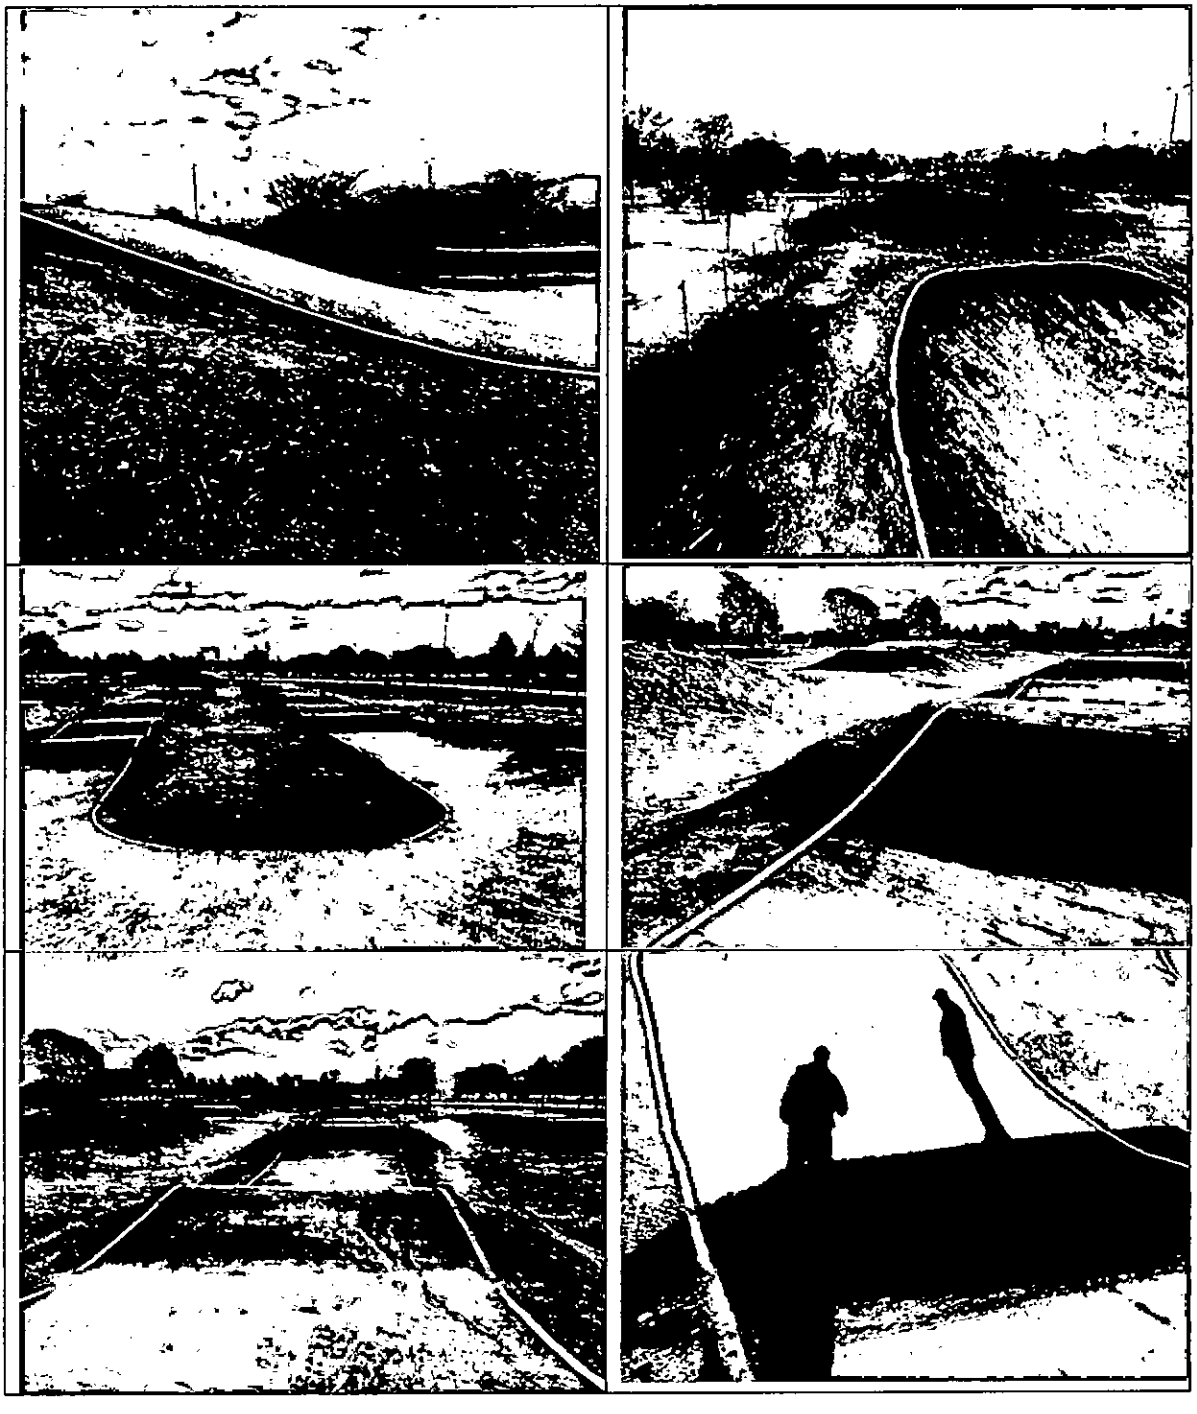

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 - Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

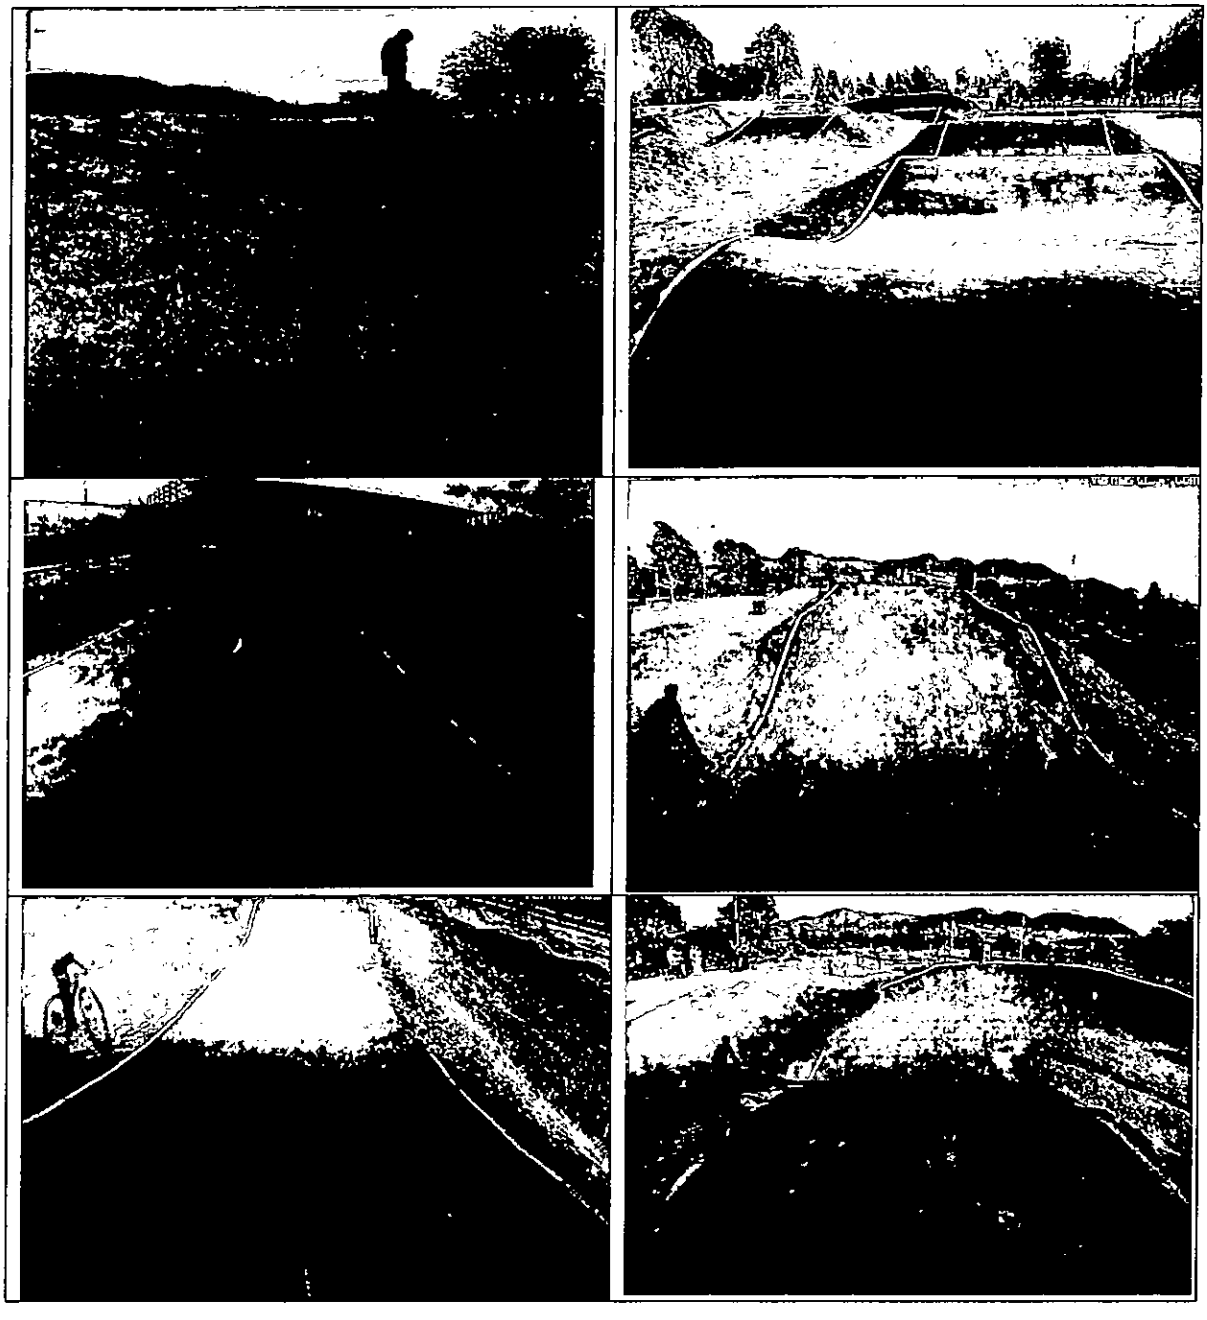


Carrera 15 No 90-64 ofc 402 - Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

1187
1223

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4

DESPUÉS

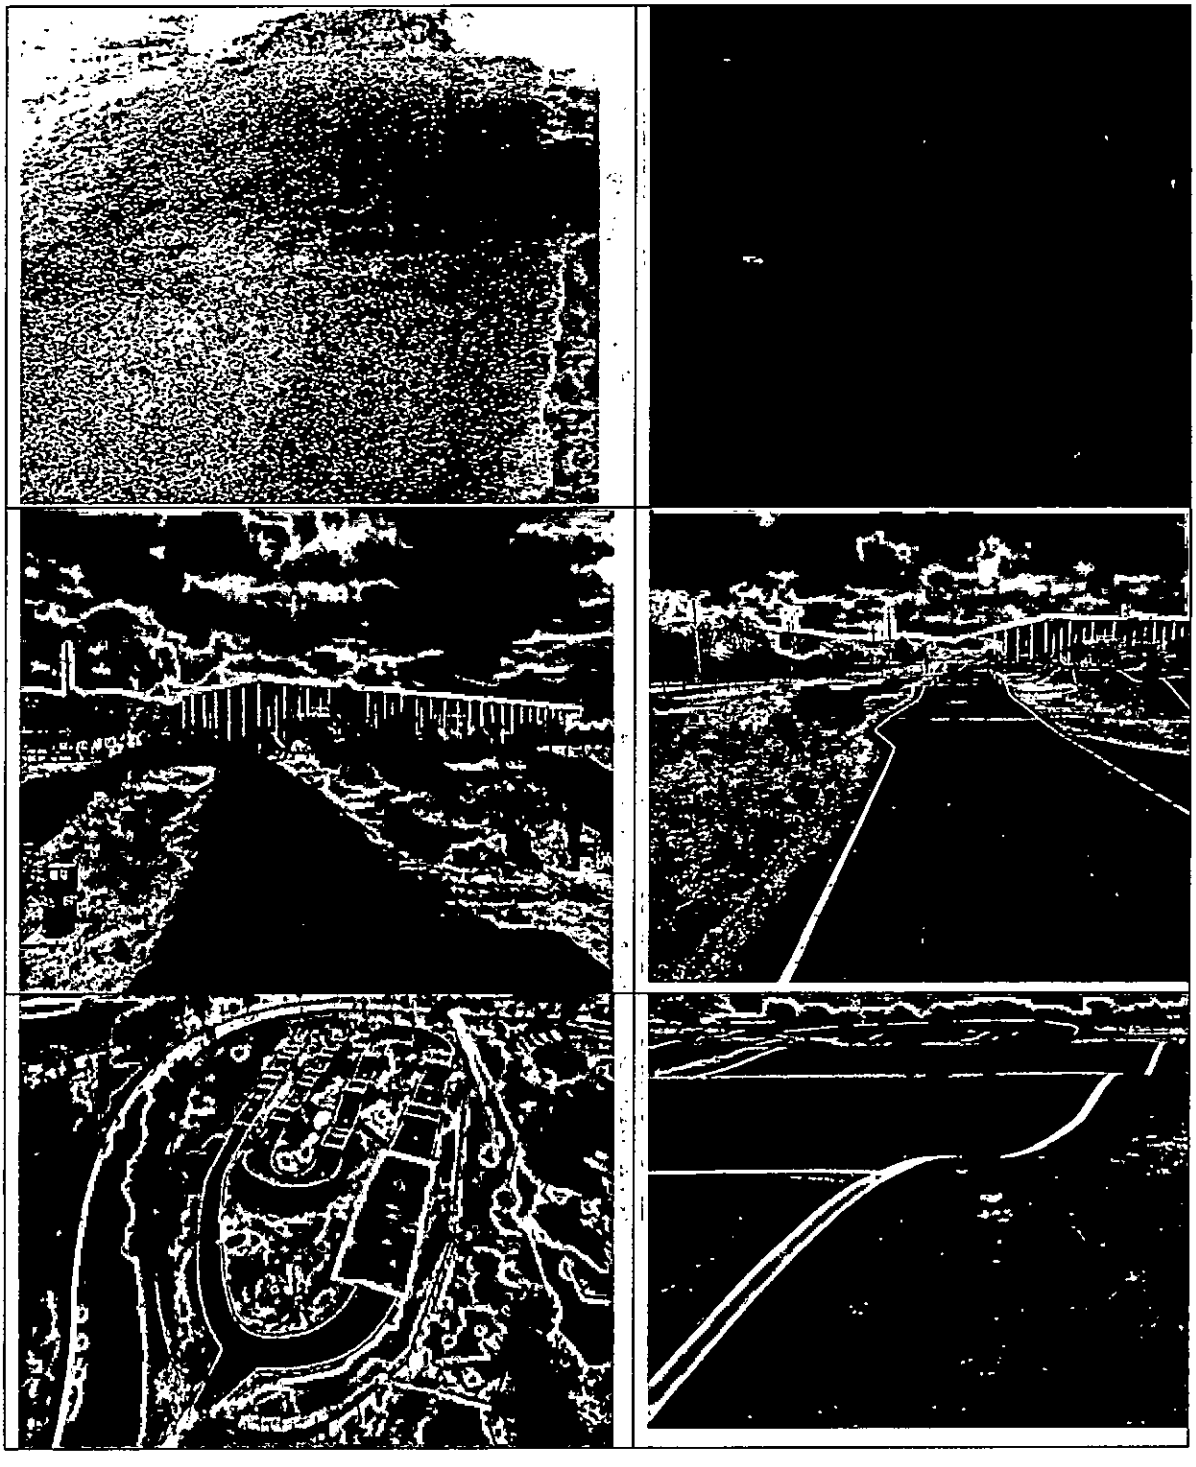

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 - Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

CONSORCIO
PARQUES BOG
901737545-4



Dentro de las actividades ejecutadas en la pista de BMX, se llevaron a cabo los controles de calidad establecidos en las fichas técnicas de los materiales entregada por los proveedores. También se realizaron los ensayos requeridos para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por la identidad contratante IDRD.

Atentamente,

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

1180
1074

CONSORCIO
PARQUES BOG
901.737545-4

JUAN CAMILO MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal

Anexo: (0) Folios
Elaboro: AFVR
Aprobó: JCMM

Carrera 15 No 90-64 ofc 402 - Bogotá
6017333-4113160
c.parquesbog@gmail.com

SOLIUN

Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Respuesta a comunicado IDRD-3131-2023-293 – Radicación de manuales de mantenimiento.

CONSORCIO PARQUES BOG <c.parquesbog@gmail.com> 26 de marzo de 2024, 13:14
Para: Proyectos 2 <proyectos2@soliunsas.com>

Señores
SOLIUN INGENIERÍA
RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante legal
Ciudad

Cordial saludo,

ara su revisión y concepto, nos permitimos hacer entrega de lo mencionado en el asunto.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios

CONSORCIO PARQUES BOG
NIT 901.737.545-4
Cr 72ª No,11 B 18 of.501
Tel.: 601 4113160
c.parquesbog@gmail.com

2 adjuntos

CTO.IDRD-3099-2023-294 Manuales de mantenimiento.pdf
96K

MANUAL DE MANTENIMIENTO PARQUE CAYETANO CAÑIZARES Rev MRG.pdf
9929K

1789
