SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS I.E. TECNICO DE COMERCIO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

VIGENCIA 2023

Codigo DANE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO + AIU	(VR U +AIU)*CANT	ACTA PARCIAL 1 23/02/2024		ACTA PARCIAL 1 23/02/2024		CANTIDADES POR EJECUTAR	
							CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
543	SERVICIO DE PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN											
	1	**PRELIMINARES**				$ 629.573,00		$ 453.044,00		$ 176.529,00		$ -
	1,1	Desmonte de puerta en malla eslabonada en subestación existente, incluye disposición final	UND	1	$ 40.492,00	$ 40.492,00	0,00	$ -	1,00	$ 40.492,00	0,00	$ -
	1,2	Desmonte de ventana en malla eslabonada en subestación existente, incluye disposición final	UND	2	$ 30.368,00	$ 60.736,00	1,00	$ 30.368,00	1,00	$ 30.368,00	0,00	$ -
	1,3	Desmonte de transformadores en subestación existente	UND	5	$ 105.669,00	$ 528.345,00	4,00	$ 422.676,00	1,00	$ 105.669,00	0,00	$ -
								$ -				$ -
5461	SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS											
	2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				222.100.403,00		$ 120.489.472,00		$ 81.680.541,00		$ 19.930.390,00
	2,1	Suministro e instalacion de punta captadora pararrayos tipo Franklin	UND	38,00	$ 447.678,00	$ 17.011.764,00	19,00	$ 8.505.882,00	19,00	$ 8.505.882,00	0,00	$ -
	2,2	Suministro e instalación de anillo superior equipotencial incluye alambrón en aluminio 8mm y accesorios	ML	680,00	$ 133.449,00	$ 90.745.320,00	450,00	$ 60.052.050,00	230,00	$ 30.693.270,00	0,00	$ -
	2,3	Suministro e instalacion de Cable Cu No.2 AWG aislado	ML	230,00	$ 58.359,00	$ 13.422.570,00	0,00	$ -	230,00	$ 13.422.570,00	0,00	$ -
	2,4	Suministro e instalacion de Cable Cu No.2 desnudo incluye excavación manual, rompimiento de concreto y compactación	ML	680,00	$ 59.975,00	$ 40.783.000,00	680,00	$ 40.783.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	2,5	Suministro e instalacion de sistema puesta a tierra, incluye varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts, caja prefabricada 30x30mm, soldadura exotermica, excavación manual y compactación	UND	15,00	$ 743.236,00	$ 11.148.540,00	15,00	$ 11.148.540,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	2,6	Suministro, transporte e instalacion de puerta contrafuego en lamina calibre 16 bajo normatividad RETIE	UND	1,00	$ 11.387.347,00	$ 11.387.347,00	0,00	$ -	1,00	$ 11.387.347,00	0,00	$ -
	2,7	Suministro, trasnporte e instalacion de Dampers cortafuego certificado	UND	2,00	$ 2.639.326,00	$ 5.278.652,00	0,00	$ -	2,00	$ 5.278.652,00	0,00	$ -
	2,8	Suministro e instalación de transformador de corriente 20-60/5	UND	3,00	$ 3.168.119,00	$ 9.504.357,00	0,00	$ -		$ -	3,00	$ 9.504.357,00
	2,9	Suministro e instalación de transformador de Potencial 13200/120 V CLASE 0,5	UND	1,00	$ 6.138.342,00	$ 6.138.342,00	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 6.138.342,00
	2,10	suministro e instalación de sistema de medida, incluye medidor multirango, bornera de prueba y púerto de comunicación.	UND	1,00	$ 3.860.383,00	$ 3.860.383,00	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 3.860.383,00
	2,11	suministro e instalación de bajante en tuberia IMC 1", incluye accesorios	UND	15,00	$ 826.188,00	$ 12.392.820,00	0,00	$ -	15,00	$ 12.392.820,00	0,00	$ -
	2,12	Reinstalación de transformador, incluye calibración, cableado y puesta en funcionamiento	UND	2,00	$ 213.654,00	$ 427.308,00	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 427.308,00
547	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS											
	3	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				$ 2.506.300,00		$ 626.575,00		$ 1.879.725,00		$ -
	3,1	Construccion de muro en ladrillo H: 10 a la vista	M2	20,00	$ 125.315,00	$ 2.506.300,00	5,00	$ 626.575,00	15,00	$ 1.879.725,00	0,00	$ -
5479	OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS											
	4	**ACTIVIDADES VARIAS**				$ 1.440.500,00		$ 1.440.500,00		$ -		$ -
	4,1	ASEO GENERAL	M2	500	$ 2.881,00	$ 1.440.500,00	500,00	$ 1.440.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL VALOR DIRECTO DEL PROYECTO + AIU				226.676.776,00		**123.009.591,00**		**83.736.795,00**		19.930.390,00
		AIU			**35%**	**$ 58.768.053,00**		**$ 31.891.375,00**		**$ 21.709.539,00**		**$ 5.167.138,00**
		COSTO DIRECTO				$ 167.908.723,00		**$ 91.118.216,00**		**$ 62.027.256,00**		$ 14.763.252,00
		Certificacion RETIE + tramite OR(planos aprobados, factibilidad, linea viva, matricula y puesta en funcionamiento) de subestación existente				$ 16.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ 16.500.000,00
		TOTAL VALOR DEL PROYECTO			243.176.776,00		**123.009.591,00**		**83.736.795,00**		**36.430.390,00**	

Carlos Andres Medina
Ingeniero Electricista
Interventoria

JHOANA FORERO SERRANO
ABOGADA

OSPAI LESUS ESPINA TOLOSA
Representante Legal Satelite Global SG sas
Contratista

SATELITE GLOBAL SG SAS

NIT: 901081204 - 0

Factura Electrónica de Venta

SG 382

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764053177647 que habilita desde SG 376 hasta SG 451. Vence 07/08/2024

Somos Responsables de IVA, Actividad Económica ICA 7120

Barrancabermeja Calle 75a No 30a38
Teléfono 3022822936 - 0
Correo Electrónico satelitegloballsas@gmail.com

Cliente: INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO **NIT:** 800043472 - 1

Dirección: Calle 64 No 25-105

Ciudad: Barrancabermeja **Teléfono:** 6222453

Fecha: 23/05/2024 **Vencimiento:** 28/05/2024 **Forma de Pago:** Contado

Vendedor: SATELITE GLOBAL SG SAS

Por Concepto de:

FACTURA DE VENTA

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	% Dscto	IVA %	IVA Valor	Total
1	41309501	Servicio de obra	und	1,00	62.027.256,00	0,00	0	0,00	62.027.256,00
2	41309502	Administración	und	1,00	14.266.268,88	0,00	0	0,00	14.266.268,88
3	41309503	Imprevistos	und	1,00	3.101.362,80	0,00	0	0,00	3.101.362,80
4	41309504	Utilidad	und	1,00	4.341.907,92	0,00	19	824.962,51	4.341.907,92

Valor en Letras

OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Cuenta de Ahorros No 850147497 Banco de Bogota

TOTAL LINEAS O ITEMS	4
SUBTOTAL	**$ 83.736.795,60**
DESCUENTO	$ 0,00
IVA	$ 824.962,50
TOTAL OPERACION	$ 84.561.758,10
RETEFUENTE	$ 1.674.735,91
RETEIVA	$ 123.744,38
RETEICA	$ 808.897,45
TOTAL DOCUMENTO	**$ 81.954.380,37**

Recibido Por _____

Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación:2024-05-23 10:52:53
Medios de Pago: Efectivo

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

cufe: 257e789bede2a98d976088ccf28ee9236aafab5775b18c9591aa32338a8019fd1ebe765a49af5297ba946cb93d4931dd

SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS I.E. TECNICO DE COMERCIO

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

VIGENCIA 2023

Codigo DANE	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO + AIU	(VR U +AIU)*CANT	ACTA PARCIAL 1 23/02/2024		ACTA PARCIAL 1 23/02/2024		CANTIDADES POR EJECUTAR	
							CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
543	SERVICIO DE PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN											
	1	**PRELIMINARES**				$ 629.573,00		$ 453.044,00		$ 176.529,00		$ -
	1,1	Desmonte de puerta en malla eslabonada en subestación existente, incluye disposición final	UND	1	$ 40.492,00	$ 40.492,00	0,00	$ -	1,00	$ 40.492,00	0,00	$ -
	1,2	Desmonte de ventana en malla eslabonada en subestación existente, incluye disposición final	UND	2	$ 30.368,00	$ 60.736,00	1,00	$ 30.368,00	1,00	$ 30.368,00	0,00	$ -
	1,3	Desmonte de transformadores en subestación existente	UND	5	$ 105.669,00	$ 528.345,00	4,00	$ 422.676,00	1,00	$ 105.669,00	0,00	$ -
								$ -				$ -
5461	SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS											
	2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				222.100.403,00		$ 120.489.472,00		$ 81.680.541,00		$ 19.930.390,00
	2,1	Suministro e instalacion de punta captadora pararrayos tipo Franklin	UND	38,00	$ 447.678,00	$ 17.011.764,00	19,00	$ 8.505.882,00	19,00	$ 8.505.882,00	0,00	$ -
	2,2	Suministro e instalación de anillo superior equipotencial incluye alambrón en aluminio 8mm y accesorios	ML	680,00	$ 133.449,00	$ 90.745.320,00	450,00	$ 60.052.050,00	230,00	$ 30.693.270,00	0,00	$ -
	2,3	Suministro e instalacion de Cable Cu No.2 AWG aislado	ML	230,00	$ 58.359,00	$ 13.422.570,00	0,00	$ -	230,00	$ 13.422.570,00	0,00	$ -
	2,4	Suministro e instalacion de Cable Cu No.2 desnudo incluye excavación manual, rompimiento de concreto y compactación	ML	680,00	$ 59.975,00	$ 40.783.000,00	680,00	$ 40.783.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	2,5	Suministro e instalacion de sistema puesta a tierra, incluye varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts, caja prefabricada 30x30mm, soldadura exotermica, excavación manual y compactación	UND	15,00	$ 743.236,00	$ 11.148.540,00	15,00	$ 11.148.540,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	2,6	Suministro, transporte e instalacion de puerta contrafuego en lamina calibre 16 bajo normatividad RETIE	UND	1,00	$ 11.387.347,00	$ 11.387.347,00	0,00	$ -	1,00	$ 11.387.347,00	0,00	$ -
	2,7	Suministro, trasnporte e instalacion de Dampers cortafuego certificado	UND	2,00	$ 2.639.326,00	$ 5.278.652,00	0,00	$ -	2,00	$ 5.278.652,00	0,00	$ -
	2,8	Suministro e instalación de transformador de corriente 20-60/5	UND	3,00	$ 3.168.119,00	$ 9.504.357,00	0,00	$ -		$ -	3,00	$ 9.504.357,00
	2,9	Suministro e instalación de transformador de Potencial 13200/120 V CLASE 0,5	UND	1,00	$ 6.138.342,00	$ 6.138.342,00	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 6.138.342,00
	2,10	suministro e instalación de sistema de medida, incluye medidor multirango, bornera de prueba y púerto de comunicación.	UND	1,00	$ 3.860.383,00	$ 3.860.383,00	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 3.860.383,00
	2,11	suministro e instalación de bajante en tuberia IMC 1", incluye accesorios	UND	15,00	$ 826.188,00	$ 12.392.820,00	0,00	$ -	15,00	$ 12.392.820,00	0,00	$ -
	2,12	Reinstalación de transformador, incluye calibración, cableado y puesta en funcionamiento	UND	2,00	$ 213.654,00	$ 427.308,00	0,00	$ -		$ -	2,00	$ 427.308,00
547	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS											
	3	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				$ 2.506.300,00		$ 626.575,00		$ 1.879.725,00		$ -
	3,1	Construccion de muro en ladrillo H: 10 a la vista	M2	20,00	$ 125.315,00	$ 2.506.300,00	5,00	$ 626.575,00	15,00	$ 1.879.725,00	0,00	$ -
5479	OTROS SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS											
	4	**ACTIVIDADES VARIAS**				$ 1.440.500,00		$ 1.440.500,00		$ -		$ -
	4,1	ASEO GENERAL	M2	500	$ 2.881,00	$ 1.440.500,00	500,00	$ 1.440.500,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		TOTAL VALOR DIRECTO DEL PROYECTO + AIU				226.676.776,00		**123.009.591,00**		**83.736.795,00**		19.930.390,00
		AIU			**35%**	**$ 58.768.053,00**		**$ 31.891.375,00**		**$ 21.709.539,00**		**$ 5.167.138,00**
		COSTO DIRECTO				$ 167.908.723,00		**$ 91.118.216,00**		**$ 62.027.256,00**		$ 14.763.252,00
		Certificacion RETIE + tramite OR(planos aprobados, factibilidad, linea viva, matricula y puesta en funcionamiento) de subestación existente				$ 16.500.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ 16.500.000,00
		TOTAL VALOR DEL PROYECTO			243.176.776,00		**123.009.591,00**		**83.736.795,00**		**36.430.390,00**	

Carlos Andres Medina
Ingeniero Electricista
Interventoria

JHOANA FORERO SERRANO
ABOGADA

OSPAI LESUS ESPINA TOLOSA
Representante Legal Satelite Global SG sas
Contratista

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad: Distrito especial de Barrancabermeja	**Período del informe desde el**	26/02/2024	**Hasta el**	

Objeto del Contrato

Instalación del Sistema de Apantallamiento y Protección contra Rayos en el colegio Instituto Técnico Superior de Comercio

Lugar de Ejecución de Actividades: Instituto Técnico Superior Industrial

ITEM	Actividades Desarrolladas
1	Instalación de puntas aisladoras en alturas
2	Arreglo de tapas electricas con cable cobre
3	Inventario de herramientas y materialesde subestación
4	Resanado de Zanjas
5	Colocación de cajas electricas
6	Orden y aseo
7	empalme columna

Ítem	Semanal	Acumulado Mes	
Horas/Hombre/Trabajadas *(Sin descontar los días perdidos por accidentes)*	416	1232	
Número de Trabajadores	6	0	
Días Trabajados	**7**	**23**	
Número de Incidentes	0	0	
Número de Incidentes incapacitantes o con perdida de tiempo	0	0	
Número Total de Accidentes	**0**	**0**	
Días de ausentismo por incidentes incapacitantes	0	0	
Días Ausentismo por Otros Motivos	0	0	
Número de permisos de Trabajos en frio	1	1	
Número de Permiso de Trabajos en Caliente	0	0	
Número de Permiso de Trabajos Eléctricos	0	0	
Numero de Charlas de Seguridad de 5 minutos	15	75	
Número de Capacitaciones	0	0	
Simulacros	0	0	
Número de Vehículos	0	0	
Kilometraje Recorrido	0	0	
	0	0	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA
Del 26/02/24 al 02/03/2024 Se realizo las instalaciones de las puntas aisladoras .Trabajos en altura instalación de alambrón.	  
Arreglo de las tapas de las cajas electricas de cable cobre, se repararon la tapas con concreto	  
Se realizo inventario de herramienta en la subestación electrica.	  
Se realizo resanación de zanjas y se piso para quequedara firme	  

Se instalaron las cajas electricas y se resano para que quedaran cubiertas con tierra.	  
Se realizo jornada de orden y aseo en diversas areas de ITSC	  
Se realizo empalme del alambron al cable cobre.	  

RESUMEN CAPACITACIONES

Charla Diaria


Fecha	Tema	Participantes	
26/02/2024	TOMA DE TENSION ARTERIAL	7	
27/02/2024	TRABAJO CON RESPONSABILIDAD Y ATENSIÓN	6	
28/02/2024	REVISIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	5	
29/02/2024	REVISIÓN LUGAR DE TRABAJO	6	
1/03/2024	COMO REPORTO UN ACCIDENTE LABORAL ,QUE ES UN ACCIDENTE	5	
2/03/2024	TENECIA , ESTILOS DE MANDOS, GERENCIA .TRABAJADORES	5	

26/02/2024	**Total Horas Hombres trabajadas en la semana**	**400 HORAS/HOMBRE TRABAJADAS**	**Total Minutos Semana**	

Capacitación y/o Entrenamiento

Fecha	Tema	Participantes	
		TOTAL DE HORAS LABORALES	

REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO			
Fecha	Humedad Relativa	Velocidad del viento	Pronóstico del tiempo
26/02/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 10 km/h	
27/02/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 5 km/h	
28/02/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 5 km/h	
29/02/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 5 km/h	
1/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 3 km/h	
2/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento km/h	

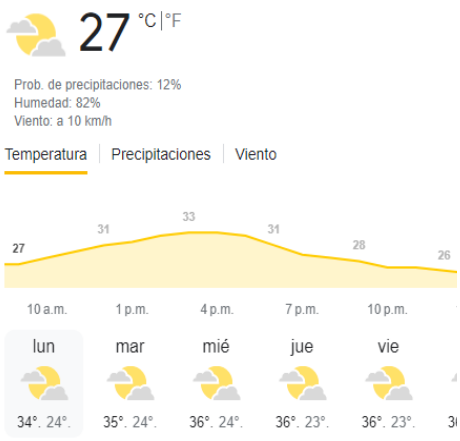

REPORTE DE INCIDENTES			
Fecha	Tipo	Incapacidad	Descripción
		Total Incidentes Semana	

REGISTRO FOTOGRAFICO



26/02/2024 TOMA DE TENSION ARTERIAL



27/02/2024 TRABAJO CON RESPONSABILIDAD Y ATENSIÓN



28/02/2024 COMO REPORTO UN ACCIDENTE LABORAL Y QUE ES UN CCIDENTE



01/03/2024 CHARLAS EN EL AREA DE TRABAJO



02/03/2024 CHARLA CON EL GERENTE DE SATELITE GLOBAL SAS

	Elaboró
Cargo	
Firma	

Código:	SST-FO-IS-CO
2/03/2024	

Acumulado Proyecto
1600
0
1384
0
0
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0















Duración (Minutos)

Duración (Minutos)

Clima

lunes, 9:00 a.m.

Mayormente nublado



1 a.m. 4 a.m. 7 a.m.

sáb	dom	lun
36°. 23°.	35°. 23°.	36°. 24°.

0

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad: Distrito especial de Barrancabermeja	**Período del informe desde el**	4/03/2024	**Hasta el**	

Objeto del Contrato

Instalación del Sistema de Apantallamiento y Protección contra Rayos en el colegio Instituto Técnico Superior de Comercio

Lugar de Ejecución de Actividades: Instituto Técnico Superior Industrial

ITEM	Actividades Desarrolladas
1	charlas con el gerente de Satelite Global
2	Furgon del PAE daños
3	Medición dl modulo 1
4	
5	
6	
7	

Ítem	Semanal	Acumulado Mes	
Horas/Hombre/Trabajadas *(Sin descontar los días perdidos por accidentes)*	416	1232	
Número de Trabajadores	6	0	
Días Trabajados	**7**	**23**	
Número de Incidentes	0	0	
Número de Incidentes incapacitantes o con perdida de tiempo	0	0	
Número Total de Accidentes	**0**	**0**	
Días de ausentismo por incidentes incapacitantes	0	0	
Días Ausentismo por Otros Motivos	0	0	
Número de permisos de Trabajos en frio	1	1	
Número de Permiso de Trabajos en Caliente	0	0	
Número de Permiso de Trabajos Eléctricos	0	0	
Numero de Charlas de Seguridad de 5 minutos	15	75	
Número de Capacitaciones	0	0	
Simulacros	0	0	
Número de Vehículos	0	0	
Kilometraje Recorrido	0	0	
	0	0	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA
El Gerente de la empresa Satelite Global Sas, Realizo charla a los trabajadores	  
El Gerente de la empresa Satelite Global Sas, Realizo charla a los trabajadores	 
Se evidencio que el furgon del PAE ocasiono daños a la tapa de la caja.	 
Se realizo mediciones en el modulo 1 al modulo 2 midiendo 204.8 metros	 

RESUMEN CAPACITACIONES

Charla Diaria


Fecha	Tema	Participantes	
4/03/2024	CHARLAS CON EL GERENTE DE SATELITE GLOBAL SAS	2	
5/03/2024	CHARLAS CON EL GERENTE DE SATELITE GLOBAL SAS	2	
6/03/2024	REVISIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO	2	

4/03/2024	**Total Horas Hombres trabajadas en la semana**	**400 HORAS/HOMBRE TRABAJADAS**	**Total Minutos Semana**	

Capacitación y/o Entrenamiento

Fecha	Tema	Participantes	
		TOTAL DE HORAS LABORALES	

REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO			
Fecha	Humedad Relativa	Velocidad del viento	Pronóstico del tiempo
04/03/024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 10 km/h	
5/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 5 km/h	
6/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 5 km/h	
7/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 5 km/h	
8/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 3 km/h	
9/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento km/h	

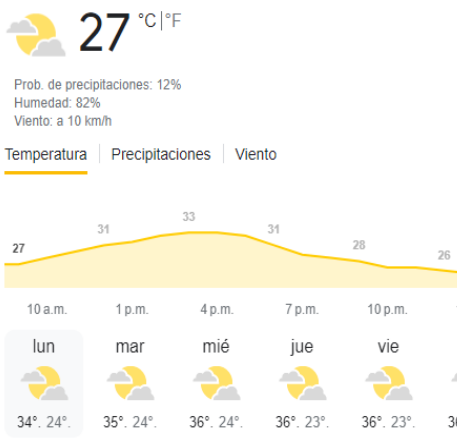

REPORTE DE INCIDENTES			
Fecha	Tipo	Incapacidad	Descripción

Total Incidentes Semana	

REGISTRO FOTOGRAFICO



04/03/2024 CHARLA DEL GERENTE DE SATELITE GLOBAL SAS



05/03/2024 CHARLAS DEL GERENTE SATELITE GLOBAL SAS

Elaboró	
Cargo	
Firma	

Código:	SST-FO-IS-CO
9/03/2024	

Acumulado Proyecto
1600
0
1384
0
0
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0









Duración (Minutos)

Duración (Minutos)

Clima

lunes, 9:00 a.m.

Mayormente nublado



1 a.m. 4 a.m. 7 a.m.

sáb	dom	lun
36°. 23°.	35°. 23°.	36°. 24°.

0

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad: Distrito especial de Barrancabermeja	**Período del informe desde el**	18/03/2024	**Hasta el**	

Objeto del Contrato

Instalación del Sistema de Apantallamiento y Protección contra Rayos en el colegio Instituto Técnico Superior de Comercio

Lugar de Ejecución de Actividades: Instituto Técnico Superior Industrial

ITEM	Actividades Desarrolladas
1	Las Obras civiles y electricas se encuentra detenidas por motivos administrativos
2	Se realizan solo trabajos administrativos
3	Ingreso del ingeniero electrico
4	Se realizo un recorrido
5	Reunión con el Rector Manuel Salvador Tapias
6	Entrega de camisa a la HSEQ
7	Retiro de herramientas por parte del electrico

Ítem	Semanal	Acumulado Mes	
Horas/Hombre/Trabajadas *(Sin descontar los dias perdidos por accidentes)*	416		
Número de Trabajadores	6	0	
Días Trabajados	**7**	**14**	
Número de Incidentes	0	0	
Número de Incidentes incapacitantes o con perdida de tiempo	0	0	
Número Total de Accidentes	**0**	**0**	
Días de ausentismo por incidentes incapacitantes	0	0	
Días Ausentismo por Otros Motivos	0	0	
Número de permisos de Trabajos en frio	1	1	
Número de Permiso de Trabajos en Caliente	0	0	
Número de Permiso de Trabajos Eléctricos	0	0	
Numero de Charlas de Seguridad de 5 minutos	15	75	
Número de Capacitaciones	0	0	
Simulacros	0	0	
Número de Vehículos	0	0	
Kilometraje Recorrido	0	0	
	0	0	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA
18/03/2024 hasta 23/03/2024 Se realizan trabajos administrativos	
18/03/2024 Ingreso del Ingeniero Electrico Jesus Llanes por parte de la secretaria de Educación.	
Se realizo un recorrido con el Ingeniero y se dio a conocer el avance de la obra, mostrando los puntos de empalme inferior y exterior de la obra.	  
Se entrego camisa de dotación para la HSEQ	
22/03/2024 El electrcio Dairo Cuadrado retiro 2 cuerdas, 2 arnes, 1 estalación electrica y 1 molde.	  

RESUMEN CAPACITACIONES

Charla Diaria

Fecha	Tema	Participantes	

23/03/2024	Total Horas Hombres trabajadas en la semana	400 HORAS/HOMBRE TRABAJADAS	Total Minutos Semana	

Capacitación y/o Entrenamiento

Fecha	Tema	Participantes	

TOTAL DE HORAS LABORALES	

REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO			
Fecha	Humedad Relativa	Velocidad del viento	Pronóstico del tiempo
18/03/024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 10 km/h	
19/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 5 km/h	
20/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 5 km/h	
21/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 5 km/h	
22/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 3 km/h	
23/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento km/h	

REPORTE DE INCIDENTES				
Fecha	Tipo	Incapacidad		Descripción
			Total Incidentes Semana	

REGISTRO FOTOGRAFICO	

Elaboró		Maria Camila Avila Suarez
Cargo	HSEQ	
Firma		

Código:	**SST-FO-IS-CO**
	23/03/2024

Acumulado Proyecto
0
0
0
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0





Duración (Minutos)

Duración (Minutos)

Clima

lunes, 9:00 a.m.

Mayormente nublado



1 a.m. 4 a.m. 7 a.m.

sáb	dom	lun
36°. 23°.	35°. 23°.	36°. 24°.

0

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad: Distrito especial de Barrancabermeja	**Período del informe desde el**	11/03/2024	**Hasta el**	

Objeto del Contrato

Instalación del Sistema de Apantallamiento y Protección contra Rayos en el colegio Instituto Técnico Superior de Comercio

Lugar de Ejecución de Actividades: Instituto Técnico Superior Industrial

ITEM	Actividades Desarrolladas
1	Las Obras civiles y electricas se encuentra detenidas por motivos administrativos
2	Se realizan solo trabajos administrativos
3	Entrega de dotación a la Hse
4	
5	
6	
7	

Ítem	Semanal	Acumulado Mes	
Horas/Hombre/Trabajadas *(Sin descontar los días perdidos por accidentes)*	416		
Número de Trabajadores	6	0	
Días Trabajados	**7**	**14**	
Número de Incidentes	0	0	
Número de Incidentes incapacitantes o con perdida de tiempo	0	0	
Número Total de Accidentes	**0**	**0**	
Días de ausentismo por incidentes incapacitantes	0	0	
Días Ausentismo por Otros Motivos	0	0	
Número de permisos de Trabajos en frio	1	1	
Número de Permiso de Trabajos en Caliente	0	0	
Número de Permiso de Trabajos Eléctricos	0	0	
Numero de Charlas de Seguridad de 5 minutos	15	75	
Número de Capacitaciones	0	0	
Simulacros	0	0	
Número de Vehículos	0	0	
Kilometraje Recorrido	0	0	
	0	0	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA
14/03/2024 Entrega de dotación a la Hse (guantes, gafas, casco de seguridad y pantalón)	  

RESUMEN CAPACITACIONES

Charla Diaria

Fecha	Tema	Participantes	

4/03/2024	Total Horas Hombres trabajadas en la semana	400 HORAS/HOMBRE TRABAJADAS	Total Minutos Semana	

Capacitación y/o Entrenamiento

Fecha	Tema	Participantes	

TOTAL DE HORAS LABORALES

REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO			
Fecha	Humedad Relativa	Velocidad del viento	Pronóstico del tiempo
11/03/024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 10 km/h	
12/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 5 km/h	
13/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 5 km/h	
14/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 5 km/h	
15/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 3 km/h	
16/03/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento km/h	

REPORTE DE INCIDENTES				
Fecha	Tipo	Incapacidad		Descripción
			Total Incidentes Semana	

REGISTRO FOTOGRAFICO	

Elaboró		Maria Camila Avila Suarez
Cargo	HSEQ	
Firma		

Código:	**SST-FO-IS-CO**
16/03/2024	

Acumulado Proyecto
0
0
0
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0



Duración (Minutos)

Duración (Minutos)

Clima

lunes, 9:00 a.m.

Mayormente nublado



1 a.m. 4 a.m. 7 a.m.

sáb	dom	lun
36°. 23°.	35°. 23°.	36°. 24°.

0

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad: Distrito especial de Barrancabermeja	**Período del informe desde el**	26/03/2024	**Hasta el**	

Objeto del Contrato

Instalación del Sistema de Apantallamiento y Protección contra Rayos en el colegio Instituto Técnico Superior de Comercio

Lugar de Ejecución de Actividades: Instituto Técnico Superior Industrial

ITEM	Actividades Desarrolladas
1	Las Obras civiles y electricas se encuentra detenidas por motivos administrativos
2	Se realizan solo trabajos administrativos
3	
4	
5	
6	
7	

Ítem	Semanal	Acumulado Mes	
Horas/Hombre/Trabajadas *(Sin descontar los dias perdidos por accidentes)*			
Número de Trabajadores	6	0	
Días Trabajados	**7**	**14**	
Número de Incidentes	0	0	
Número de Incidentes incapacitantes o con perdida de tiempo	0	0	
Número Total de Accidentes	**0**	**0**	
Días de ausentismo por incidentes incapacitantes	0	0	
Días Ausentismo por Otros Motivos	0	0	
Número de permisos de Trabajos en frio	1	1	
Número de Permiso de Trabajos en Caliente	0	0	
Número de Permiso de Trabajos Eléctricos	0	0	
Numero de Charlas de Seguridad de 5 minutos	15	75	
Número de Capacitaciones	0	0	
Simulacros	0	0	
Número de Vehículos	0	0	
Kilometraje Recorrido	0	0	
	0	0	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA
26/03/2024 hasta 30/03/2024 Se realizan trabajos administrativos	

RESUMEN CAPACITACIONES


Charla Diaria

Fecha	Tema	Participantes	

23/03/2024	Total Horas Hombres trabajadas en la semana	400 HORAS/HOMBRE TRABAJADAS	Total Minutos Semana	

Capacitación y/o Entrenamiento

Fecha	Tema	Participantes	
		TOTAL DE HORAS LABORALES	

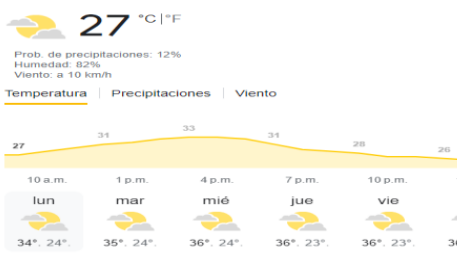REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO			
Fecha	Humedad Relativa	Velocidad del viento	Pronóstico del tiempo
26/03/024	**Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%**	**Velocidad del viento 10 km/h**	
27/03/2024	**Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%**	**Velocidad del viento 5 km/h**	
30/03/2024	**Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%**	**Velocidad del viento 5 km/h**	

REPORTE DE INCIDENTES				
Fecha	Tipo	Incapacidad		Descripción
			Total Incidentes Semana	

REGISTRO FOTOGRAFICO


Elaboró	Maria Camila Avila Suarez
Cargo	HSEQ
Firma	

Código:	SST-FO-IS-CO
30/03/2024	

Acumulado Proyecto
0
0
0
7
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Duración (Minutos)

Duración (Minutos)


Clima
lunes, 9:00 a.m.
Mayormente nublado
25
24
1 a.m.
4 a.m.
7 a.m.
sáb
dom
lun
i6°, 23°
35°, 23°
36°, 24°

0

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad: Distrito especial de Barrancabermeja	**Período del informe desde el**	1/04/2024	**Hasta el**	


Objeto del Contrato

Instalación del Sistema de Apantallamiento y Protección contra Rayos en el colegio Instituto Técnico Superior de Comercio

Lugar de Ejecución de Actividades: Instituto Técnico Superior Industrial

ITEM	Actividades Desarrolladas
1	Las Obras civiles y electricas se encuentra detenidas por motivos administrativos
2	Revisión de materiales faltantes, para trabajos en alturas
3	Ingreso de materiales
4	Retiro de escombros
5	Desarme de andamios
6	
7	

Ítem	Semanal	Acumulado Mes	
Horas/Hombre/Trabajadas *(Sin descontar los días perdidos por accidentes)*			
Número de Trabajadores	2	0	
Días Trabajados	**7**	**14**	
Número de Incidentes	0	0	
Número de Incidentes incapacitantes o con perdida de tiempo	0	0	
Número Total de Accidentes	**0**	**0**	
Días de ausentismo por incidentes incapacitantes	0	0	
Días Ausentismo por Otros Motivos	0	0	
Número de permisos de Trabajos en frio	1	1	
Número de Permiso de Trabajos en Caliente	0	0	
Número de Permiso de Trabajos Eléctricos	0	0	
Numero de Charlas de Seguridad de 5 minutos	15	75	
Número de Capacitaciones	0	0	
Simulacros	0	0	
Número de Vehículos	0	0	
Kilometraje Recorrido	0	0	
	0	0	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA
02/04/2024 Ingreso los señores Juan Tercero y Alexander, para realizar una revisión de los materailes faltantes en la parte de Alturas.	 
03/04/2024 Ingreso de volqueta, para retirar los escombros producidos por la obra civil.	 
04/04/2024 Ingreso de materiales a la obra civil, 900 ladrillos vitrificados y 10 vultos de cemento.	 
05/04/2024 Ingreso de materiales a la obra: **2 dampers** **8 varillas cobre** **16 empalmes modulares** **2 puertas portón** **1 marco portón** **1 rollo de cable N 4 electrico de 280 m lineales.**	  
06/04/2024 Ingreso de los señores Alexander y Jorge para el desmantelamiento del Andamio de la entrada del colegio ITSC, Cra 28.	  

Fecha	Tema	Participantes	

6/04/2024	Total Horas Hombres trabajadas en la semana	400 HORAS/HOMBRE TRABAJADAS	Total Minutos Semana	

Capacitación y/o Entrenamiento

Fecha	Tema	Participantes	

TOTAL DE HORAS LABORALES	

REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO			
Fecha	Humedad Relativa	Velocidad del viento	Pronóstico del tiempo
1/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 100%	Velocidad del viento 10 km/h	
2/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 80%	Velocidad del viento 5 km/h	
3/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 80%	Velocidad del viento 5 km/h	
4/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 82%	Velocidad del viento 5 km/h	
5/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 67%	Velocidad del viento 5 km/h	
6/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 80%	Velocidad del viento 5 km/h	



REPORTE DE INCIDENTES			
Fecha	Tipo	Incapacidad	Descripción

Total Incidentes Semana	

REGISTRO FOTOGRAFICO

Elaboró	HSEQ	Maria Camila Avila Suarez
Cargo		
Firma		

Código:	SST-FO-IS-CO
6/04/2024	

Acumulado Proyecto
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0











Duración (Minutos)

Duración (Minutos)


UTECAST
MENSU
DIARIO
J
V
S
4
5
6
6°
26°
29°
0°
19°
19°

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad: Distrito especial de Barrancabermeja	**Período del informe desde el**	8/04/2024	**Hasta el**	

Objeto del Contrato

Instalación del Sistema de Apantallamiento y Protección contra Rayos en el colegio Instituto Técnico Superior de Comercio

Lugar de Ejecución de Actividades: Instituto Técnico Superior Industrial

ITEM	Actividades Desarrolladas
1	Retiro de Andamios
2	Retoma de obra civil
3	Ingreso de herramientas
4	Ingreso de materiales
5	Retoma de obra electrica
6	Ingreso de materiales
7	Obras civiles (manposteria)
8	Obras electricas en Alturas
9	Ingreso de materiales
10	Visita del Rector
11	Entrega de Epps
12	Ingreso de materiales
13	Retiro de herramientas
14	Ingreso de herramientas

Ítem	Semanal	Acumulado Mes	
Horas/Hombre/Trabajadas *(Sin descontar los días perdidos por accidentes)*	7	15	
Número de Trabajadores	7	0	
Días Trabajados	**7**	**14**	
Número de Incidentes	0	0	
Número de Incidentes incapacitantes o con perdida de tiempo	0	0	
Número Total de Accidentes	**0**	**0**	
Días de ausentismo por incidentes incapacitantes	0	0	
Días Ausentismo por Otros Motivos	0	0	
Número de permisos de Trabajos en frío	1	1	
Número de Permiso de Trabajos en Caliente	0	0	
Número de Permiso de Trabajos Eléctricos	0	0	
Numero de Charlas de Seguridad de 5 minutos	15	75	
Número de Capacitaciones	0	0	
Simulacros	0	0	
Número de Vehículos	0	0	
Kilometraje Recorrido	0	0	
	0	0	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA
09/04/2024 Retiro de andamios	
09/04/2024 Retoma de obra civil, Adecuación para tumbar muro en la subestación	
10/04/2024 Instalación de dampers superior e inferior en la subestación electrica	
9/04/2024 Ingreso de materiales 3 brocas 1 laso de 150 metros 5 varillas de cobre	
9/04/2024 Ingreso de herramientas 1 escalera 1 pulidora 2 conos pequeños	

10/04/2024 Retoma de obras electricas en alturas, Instalación de pararayos





10/04/2024 Instalación del portón corta incendios en la subestación





10/04/2024 Ingreso de materiales a la obra
15 chazos metalicos
4 discos de corte para concreto
1 disco de corte para metal




11/04/2024 Visita porparte del Rector Manuel Tapias a la subestación




11/04/2024 Ingreso de materiales en la obra, 12 Und de Soldadura exoternica
50 Und de soportes anillo superior poliamida 36 mm 8-10 gris
400 Und chazos anclaje camisa 5/16" x1 ½ metálico expansivo.
50 ML cable cu aislado amarillo
50 ML cable cu aislado azul
50 ML cable cu aislado blanco
50 ML cable cu aislado rojo
50 ML cable cu aislado verde
260 ML alambron aluminio 8 MM AAC 1H
14 ML cable cu desnudo N•2 con marcación secuencial
1 ML platina cobre ¼" x 1/400 Amp
130 Und grapa metálica 3/8" doble ojo c16 zinc
32 Und grapa metálica ¾" doble ojo c24 galv
64 Und tornillos lamina 8x1 cabeza cilíndrica zincado
64 Und chazos plásticos ¾ x¼
1 Und masilla removible para llenado de sellos cortafuego
400 Und soporte anillo superior poliamida 36 MM 8-10 gris
18 Und conector bimetalico ranuras paralelas N •4 1 perno
1 Und caja concreto 30x30x30
8 Unidades tubo conduit galvanizado IMC ¾" x 3 mts





11/04/2024 hasta 13/04/2024 Se realiza trabajo de manposteria, realización de muro en la subestación





11/04/2024 Instalación de pararayos sector cafeteria




11/04/2024 Se realiza, soportes para el alambrón




12/04/2024 Ingreso de materiales a la obra,
450 chazos anclaje camisa 3/8" 1 1/8" metalicos expansivos
1 marcador industrial
16 listones de 2x2 x10
1 Eslinga de posicionamiento





12/04/2024 Ingreso de herramientas a la obra,
1 planta electrica
1 ponchadora





12/04/2024 Retiro de materiales por parte del representante legal de la obra Osbal Ospina,
400 UND tornillos anclaje camisa 5/16" x 1 1/2" metalicos expansivos.



12/04/2024 Se realiza la entrega de epps al ayudante de obra civil





12/04/2024 Colocación de soportes para el alambrón





13/04/2024 Ingreso de materiales
10 puntas aisladoras
2 hojas de segueta





13/04/2024 Instalación de cable cobre, con aislamiento bajante de pararayos







13/04/2024 Trabajo de manposteria







13/04/2024 Extendida de alambrón y anclaje en alturas			
13/04/2024 Instalación de puntas aisladoras.			

Fecha	Tema			Participantes	
13/04/2024	Total Horas Hombres trabajadas en la semana	400 HORAS/HOMBRE TRABAJADAS	Total Minutos Semana		
Capacitación y/o Entrenamiento					
Fecha	Tema			Participantes	
			TOTAL DE HORAS LABORALES		

REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO			
Fecha	Humedad Relativa	Velocidad del viento	Pronóstico del tiempo
8/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 90%	Velocidad del viento 3 km/h	
9/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 92%	Velocidad del viento 9 km/h	
10/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 59%	Velocidad del viento 11 km/h	
11/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 85%	Velocidad del viento 10 km/h	
12/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 28%	Velocidad del viento 10 km/h	
13/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 59%	Velocidad del viento 8 km/h	

REPORTE DE INCIDENTES			
Fecha	Tipo	Incapacidad	Descripción
		Total Incidentes Semana	

REGISTRO FOTOGRAFICO



09/04/2024 charla de tipos de riesgos expuestos.



10/04/2024 Charla con el representante legal de Satelite Global SG SAS




11/04/2024 Charla de habitos saludables y pausas activas



12/04/2024 Charla de seguridad





13/04/2024 Pausas activas

0

Cargo	Elaboró HSEQ	Maria Camila Avila Suarez
Firma		

Código:	SST-FO-IS-CO
13/04/2024	




















MOTOBORDA

















Duración (Minutos)

Duración (Minutos)


°C
JTECAST
MENSU
>
DIARIO →
J
V
S
11
12
13
9°
30°
30°
0°
21°
22°

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad: Distrito especial de Barrancabermeja	**Período del informe desde el**	15/04/2024	**Hasta el**	

Objeto del Contrato

Instalación del Sistema de Apantallamiento y Protección contra Rayos en el colegio Instituto Técnico Superior de Comercio

Lugar de Ejecución de Actividades: Instituto Técnico Superior Industrial

ITEM	Actividades Desarrolladas
1	Ingreso de materiales
2	Instalación de grapas
3	Estendida de alambrón
4	Adecuación de puerta
5	Trabajo de mamposteria
6	Arreglo de tapas
7	Soldadura exotérmica
8	Retiro de herramientas
9	Ingreso de materiales
10	Instalación de cajas
11	Visita de interventoria
12	Visita de ingeniero electrico
13	Arreglo de tubo de gres
14	Adecuación del gato hidraulico

Ítem	Semanal	Acumulado Mes	
Horas/Hombre/Trabajadas *(Sin descontar los días perdidos por accidentes)*	7	15	
Número de Trabajadores	7	0	
Días Trabajados	**7**	**14**	
Número de Incidentes	0	0	
Número de Incidentes incapacitantes o con perdida de tiempo	0	0	
Número Total de Accidentes	**0**	**0**	
Días de ausentismo por incidentes incapacitantes	0	0	
Días Ausentismo por Otros Motivos	0	0	
Número de permisos de Trabajos en frío	1	1	
Número de Permiso de Trabajos en Caliente	0	0	
Número de Permiso de Trabajos Eléctricos	0	0	
Numero de Charlas de Seguridad de 5 minutos	15	75	
Número de Capacitaciones	0	0	
Simulacros	0	0	
Número de Vehículos	0	0	
Kilometraje Recorrido	0	0	
	0	0	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA
15/04/2024 Ingreso de materiales 38 tornillos punta broca 6 tornillos rosca fina de 2" 14 aisladores 11 puntas aisladoras	 
15/04/2024 Instalación de grapas para las bajantes del cable cobre.	 
15/04/2024 Trabajo de manpostería	 
15/04/2024 Marcación de puntas aisladoras	 
16/04/2024 Ingreso de dos señores Edin Gomes y Belquis Dairo para la desmantelación del andamio.	 
16/04/2024 Ingreso de materiales 1 cable encauchetado para instalción 1alicate 1 par de conector 1 cinta aislante negra 1 Destornillador 1 cinta transparente 1 limpión 1 limpiador 1 limpia vidrios 1 lapicero	 

16/04/2024 Ingreso de turbo para retirar andamios




16/04/2024 Instalación de chazos, soportes y alambrón en alturas




17/04/2024 Instalación de bajantes por parte de los electricos




17/04/2024 Ingreso de materiales
3 brocas
1 pica
100 chazos plasticos de 1/4"
100 tornillos de 1/4"




17/04/2024 al 29/04/2024 Instalación de chazos, soportes y alambrón en alturas




17/04/2024 Trabajos de mamposteria




18/04/2024 Ingreso de materiales
12 cajas de luces de bengala
1encendedor
2 borderas de conección





18/04/2024 Realización de regatas para la adecuación del cable cobre.




18/04/2024al 20/04/2024 Realización de soldaduras exotermica en diferentes puntos de la obra.




18/04/2024 Visita de interventoria en la obra y subestación




18/04/2024 Visita de ingeniero electrico a la subestación.




18/04/2024 Utilización de planta electrica, para realizar trabajos de soldadura exotérmica.




19/04/2024 Ingreso dematerìales
2 Radios de comunicación
1 tubo de PVC
50 Grapas doble ojo de 3/4"
6 Curvas de PVC
4 Discos de corte para metal





19/04/2024 Salida de herramientas dela subestación, van dirijidas para la oficina de Satelite Global





0

19/04/2024 Adecuación de puerta para la subestación.





19/04/2024 Arreglo de tapas de las cajas electricas.





19/04/2024 Instalación de cajas electricas.








20/04/2024 Ingreso de materiales
1 pedazo de tubo de PVC
1 Masilla epóxica





20/04/2024 Reparación de tubo de gres





20/04/2024 Instalación de tubo IMC





20/04/2024 Instalación del gato hidraulico a la puerta.





Fecha	Tema		Participantes	
20/04/2024	Total Horas Hombres trabajadas en la semana	400 HORAS/HOMBRE TRABAJADAS	Total Minutos Semana	

Capacitación y/o Entrenamiento			
Fecha	Tema	Participantes	
		TOTAL DE HORAS LABORALES	

REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO			
Fecha	Humedad Relativa	Velocidad del viento	Pronóstico del tiempo
15/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 90%	Velocidad del viento 3 km/h	
16/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 92%	Velocidad del viento 9 km/h	
17/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 59%	Velocidad del viento 11 km/h	
18/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 85%	Velocidad del viento 10 km/h	
19/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 28%	Velocidad del viento 10 km/h	
20/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 59%	Velocidad del viento 8 km/h	

REPORTE DE INCIDENTES			
Fecha	Tipo	Incapacidad	Descripción
		Total Incidentes Semana	

REGISTRO FOTOGRAFICO



15/04/2024 charla de caidas de alto nivel



16/04/2024 Charla trabajo en equipo



17/04/2024 Riesgos ambientales



18/04/2024 Charla de tormentas electricas







19/04/2024 Pausas activas



20/04/2024 Charla seguridad.

0

	Elaboró	**Maria Camila Avila Suarez**
Cargo	**HSEQ**	
Firma		

Código:	SST-FO-IS-CO
20/04/2024	

Acumulado Proyecto
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0



























El vaquero
Sparklers
El vaquero
Sparklers












DEWALT
























Duración (Minutos)

Duración (Minutos)


°C
JTECAST
MENSU
>
DIARIO →
J
V
S
18
19
20
27°
21°
25°
21°
28°
20°

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad: Distrito especial de Barrancabermeja	**Período del informe desde el**	22/04/2024	**Hasta el**	

Objeto del Contrato

Instalación del Sistema de Apantallamiento y Protección contra Rayos en el colegio Instituto Técnico Superior de Comercio

Lugar de Ejecución de Actividades: Instituto Técnico Superior Industrial

ITEM	Actividades Desarrolladas
1	Cortes de madera
2	Instalación de grapas y chazos
3	Instalación de tubo IMC para bajantes
4	Ingreso de herramientas
5	Ingreso de materiales
6	Realización de soldadura exotérmica
7	Instalación de puntas aisladoras
8	Demarcación de puntas
9	Desmantelación de tubo IMC bajante
10	Remplantamiento de zanjas
11	Instalación de caja eléctrica
12	Instalación de línea de vida, soportes y chazos
13	Instalación de pata para la caja eléctrica
14	Salida de material

Ítem	Semanal	Acumulado Mes	
Horas/Hombre/Trabajadas *(Sin descontar los días perdidos por accidentes)*	7	15	
Número de Trabajadores	7	0	
Días Trabajados	**7**	**14**	
Número de Incidentes	0	0	
Número de Incidentes incapacitantes o con perdida de tiempo	0	0	
Número Total de Accidentes	**0**	**0**	
Días de ausentismo por incidentes incapacitantes	0	0	
Días Ausentismo por Otros Motivos	0		
Número de permisos de Trabajos en frío	1	1	
Número de Permiso de Trabajos en Caliente	0	0	
Número de Permiso de Trabajos Eléctricos	0	0	
Numero de Charlas de Seguridad de 5 minutos	15	75	
Número de Capacitaciones	0	0	
Simulacros	0	0	
Número de Vehículos	0	0	
Kilometraje Recorrido	0	0	
	0	0	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA
22/04/2024 Se registran fuertes lluvias en la aplicación del Clima con una duración hasta las 10:00 am,se espera a que escampe para retomar labores en alturas.	 
22/04/2024 Se realizan los cortes de la madera, para realizar la escalera colgante	  
22/04/2024 Instalación de chazos y grapas	  
22/04/2024 Retiro de herramientas por parte del representante legal Osbal Ospina 1 pulidora pequeña 1 disco de corte de concreto 1 llave de pulidora	  
22/04/2024 Se realizo soldadura exotérmica	  

22/04/2024 Desmantelamiento de línea de vida




23/04/2024 Ingreso de materiales
1 juego de brocas
10 puntas aisladoras




23/04/2024 Instalación de puntas aisladoras




23/04/2024 Instalación de tubería IMC para las bajantes




23/04/2024 Demarcación de puntas aisladoras instaladas en la obra.




23/04/2024 Remplantamiento de zanjas alrededor de la caja electrica.




24/04/2024 Ingreso de material
1 contador direccional



24/04/2024 Instalación de cable cobre para la bajante




24/04/2024 Se partió el cabo de la pala, cuando se estaba utilizando.



24/04/2024 Se realizo soldadura exotermica





25/04/2024 Obra detenida por falta de material, la parte administrativa se presenta para recibir el material en la obra.



26/04/2024 Ingreso de materiales
1 caja electrica
1 radio de comunicación





26/04/2024 Desmantelamiento de tubo IMC bajante





26/04/2024 Instalación de caja eléctrica





26/04/2024 Instalación de tubo IMC para la bajantes





0

26/04/2024 Instalación de línea de vida y instalación de chazos y soportes en el área del coliseo.





27/04/2024 Ingreso de materiales
1 cabo de pala
150 soportes plasticos
5 brocas
82 horri plasticos
1 pulidora pequeña
1 grata
10 tornillos pequeños
20 aisladores





27/04/2024 Instalación de soportes, chazos, puntas aisladoras y estendida de alambrón en el área del coliseo





27/04/2024 Instalación de pata para la caja électrica





27/04/2024 Relleno de zanja.






27/04/2024 Retiro de material por parte del representante legal Osbal Ospina
1 bulto y medio de cemento
ladrillos





Fecha	Tema		Participantes	
27/04/2024	Total Horas Hombres trabajadas en la semana	400 HORAS/HOMBRE TRABAJADAS	Total Minutos Semana	
Capacitación y/o Entrenamiento				
Fecha	Tema		Participantes	
			TOTAL DE HORAS LABORALES	

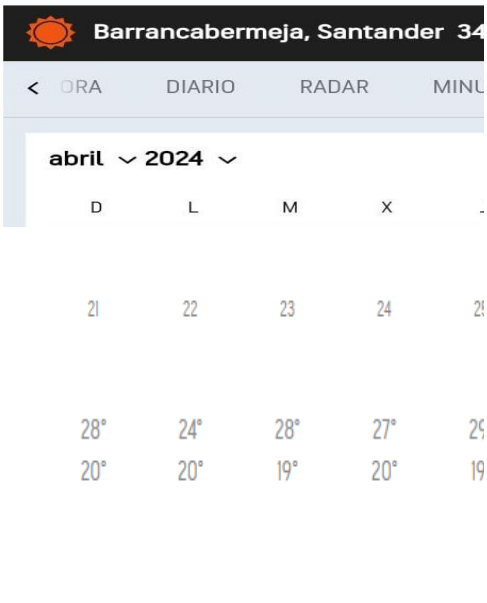REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO			
Fecha	Humedad Relativa	Velocidad del viento	Pronóstico del tiempo
22/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 97%	Velocidad del viento 5 km/h	
23/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 75%	Velocidad del viento 9 km/h	
24/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 59%	Velocidad del viento 10 km/h	
25/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 85%	Velocidad del viento 10 km/h	
26/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 80%	Velocidad del viento 4 km/h	
27/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 59%	Velocidad del viento 11 km/h	

REPORTE DE INCIDENTES			
Fecha	Tipo	Incapacidad	Descripción
		Total Incidentes Semana	

REGISTRO FOTOGRAFICO



22/04/2024 charla de deslizamientos por humedad



23/04/2024 Pausas activas



24/04/2024 Charla de seguridad sopre el buen anclaje.







26/04/2024 Charla de seguridad



27/04/2024 Ejercicios de prueba de alcoholemia.

0

Elaboró	HSEQ	Maria Camila Avila Suarez
Cargo		
Firma		

Código:	SST-FO-IS-CO
27/04/2024	

Acumulado Proyecto
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0






































Duración (Minutos)
Duración (Minutos)


°C
JTECAST
MENSU
>
DIARIO →
J
V
S
5
26
27
9°
28°
27°
9°
18°
19°

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Ciudad: Distrito especial de Barrancabermeja	**Período del informe desde el**	5/06/2024	**Hasta el**	

Objeto del Contrato

Instalación del Sistema de Apantallamiento y Protección contra Rayos en el colegio Instituto Técnico Superior de Comercio

Lugar de Ejecución de Actividades: Instituto Técnico Superior Industrial

ITEM	Actividades Desarrolladas
1	Ingreso de materiales
2	Salida de materiales
3	Excavación de zanjas
4	Soldadura exotermica
5	Conección alambrón
6	Ingreso material
7	Instalación de alambrón
8	Instalación linea de vida
9	Instalación puntas captadoras
10	Relleno de zanjas
11	Realización de escalera colgante
12	Lluvia
13	Realización de inventario

Ítem	Semanal	Acumulado Mes	
Horas/Hombre/Trabajadas *(Sin descontar los dias perdidos por accidentes)*	7	15	
Número de Trabajadores	7	0	
Días Trabajados	**7**	**14**	
Número de Incidentes	0	0	
Número de Incidentes incapacitantes o con perdida de tiempo	0	0	
Número Total de Accidentes	**0**	**0**	
Días de ausentismo por incidentes incapacitantes	0	0	
Días Ausentismo por Otros Motivos	0		
Número de permisos de Trabajos en frio	1	1	
Número de Permiso de Trabajos en Caliente	0	0	
Número de Permiso de Trabajos Eléctricos	0	0	
Numero de Charlas de Seguridad de 5 minutos	15	75	
Número de Capacitaciones	0	0	
Simulacros	0	0	
Número de Vehículos	0	0	
Kilometraje Recorrido	0	0	
	0	0	


DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA
06/05/2024 Ingreso de materiales 1 conector N°4 3 soladaduras exotérmicas 2 metros de cable encauchetado	  
06/05/2024 Salida de herramientas por parte del Representante Legal Osbal Ospina 1 hidrolavadora	
06/05/2024 Excavación detrás de la subestación, se hace la instalación de cable cobre.	  
06/05/2024 Se realiza soldadura exotermica para el pegue de cable cobre, detrás de la subestación.	  
06/05/2024 Conección de cable cobre a la subestación.	 
07/05/2024 Ingreso de materiales 1 jabon liquido 1 esponga 10 tornillos cabeza exagonal	 

07/05/2024 Instalación de alambrón en el área del coliseo.		
07/05/2024 Instalación de línea de vida , en el techo del coliseo		
07/05/2024 Instalación de puntas captadoras en el coliseo.		
07/05/2024 Relleno de zanjas, detrás de la subestación.		
08/05/2024 Instalación bajante faltante		
08/05/2024 Instalación del conector de alambrón		
08/05/2024 Realización de la escalera colgante.		
09/05/2024 Se registra fuertes lluvias en la obra, en la aplicación Clima, se registra lluvias hasta las 11:30am, las actividades se encuentran suspendidas.		

09/05/2024 Realización de inventario para realizar la entrega del puesto de HSEQ al Representante legal Osbal Ospina.	 
10/05/2024 Instalación de grapas en los bajantes, con utilización de la escalera colgante	 
11/05/2024 Registro fotográfico de las grapas en los bajantes.	 
11/05/2024 Se registra fuertes lluvias en la obra, en la aplicación Clima, se regustra lluvias hasta las 12:00pm, las actividades se encuentran suspendidas.	 

Fecha	Tema		Participantes	
5/11/2024	Total Horas Hombres trabajadas en la semana	400 HORAS/HOMBRE TRABAJADAS	Total Minutos Semana	

Capacitación y/o Entrenamiento			
Fecha	Tema	Participantes	
		TOTAL DE HORAS LABORALES	

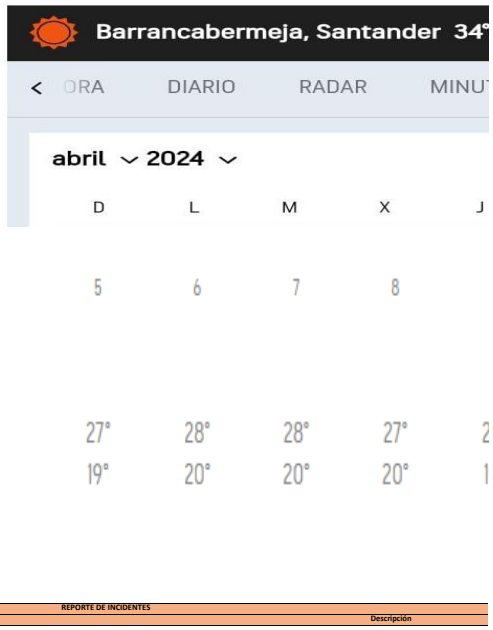REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO			
Fecha	Humedad Relativa	Velocidad del viento	Pronóstico del tiempo
5/06/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 57%	Velocidad del viento 5 km/h	
5/07/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 52%	Velocidad del viento 11 km/h	
5/08/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 54%	Velocidad del viento 10 km/h	
5/09/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 92%	Velocidad del viento 8 km/h	
5/10/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 94%	Velocidad del viento 3 km/h	
5/11/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 98%	Velocidad del viento 3 km/h	

REPORTE DE INCIDENTES			
Fecha	Tipo	Incapacidad	Descripción
		Total Incidentes Semana	

REGISTRO FOTOGRAFICO



06/05/2024 Charla trabajo seguro en alturas



07/05/2024 Charla precaución en trabajos en alturas y el buen amarre.



08/05/2024 Charla de seguridad sopre el buen anclaje.



10/05/2024 Medidas de prevención en caidas de alto nivel.

0

	Elaboró	Maria Camila Avila Suarez
Cargo	HSEQ	
Firma		


Código:	SST-FO-IS-CO
	5/10/2024

Acumulado Proyecto
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
























Duración (Minutos)

Duración (Minutos)


TECAST
MENSU
DIARIO
V
S
9
10
11
25°
19°
35°
25°
38°
25°

INFORME SEMANAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
Ciudad: Distrito especial de Barrancabermeja	**Período del informe desde el**	29/04/2024	**Hasta el**	

Objeto del Contrato

Instalación del Sistema de Apantallamiento y Protección contra Rayos en el colegio Instituto Técnico Superior de Comercio

Lugar de Ejecución de Actividades: Instituto Técnico Superior Industrial

ITEM	Actividades Desarrolladas
1	Ingreso de materiales
2	Excavación detrás de subestación
3	Instalación de soportes
4	Instalación de tubo IMC
5	Replanteamiento de zanjas
6	Ingreso de materiales
7	Extendida de alambrón
8	Demarcación con cinta peligro
9	Ingreso de materiales
10	Salida de herramientas
11	Registro de lluvias
12	Instalación de soportes
13	Ingreso de materiales
14	

Ítem	Semanal	Acumulado Mes	
Horas/Hombre/Trabajadas *(Sin descontar los días perdidos por accidentes)*	7	15	
Número de Trabajadores	7	0	
Días Trabajados	**7**	**14**	
Número de Incidentes	0	0	
Número de Incidentes incapacitantes o con perdida de tiempo	0	0	
Número Total de Accidentes	**0**	**0**	
Días de ausentismo por incidentes incapacitantes	0	0	
Días Ausentismo por Otros Motivos	0		
Número de permisos de Trabajos en frío	1	1	
Número de Permiso de Trabajos en Caliente	0	0	
Número de Permiso de Trabajos Eléctricos	0	0	
Numero de Charlas de Seguridad de 5 minutos	15	75	
Número de Capacitaciones	0	0	
Simulacros	0	0	
Número de Vehículos	0	0	
Kilometraje Recorrido	0	0	
	0	0	

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OBRA	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA
29/04/2024 Ingreso de materiales 100 chazos plasticos de 1/4	 
29/04/2024 Excavación para apantallamiento a tierra, en la parte atrasera de la subestación	  
29/04/2024 Instalación de soportes para las bajantes	  
29/04/2024 Instalación de tubo IMC y soportes para la bajantes	  
29/04/2024 Replanteamiento de zanja abierta en el coliceo	  

30/04/2024 Ingreso de material
1 bolsa con combustible (gasolina)



30/04/2024 Desmantelamiento o bajada de tablas de madera





30/04/2024 Demarcación con cinta peligro,en la excavación atrás de la subestación



30/04/2024 Instalación de alambrón y puntas captadoras en el área del coliseo





30/04/2024 Instalación de tubo IMC para bajante





30/04/2024 Retiro de herramientas por parte del Representante legal Osbal Ospina
1 pulidora pequeña
2 gratas



02/05/2024 Se registra en la aplicación Clima, fuertes lluvias con durabilidad hasta las 10:00 am, las actividades en alturas se encuentra detenidas



02/05/2024 Ingreso de herramienta
1 hidrolavadora



02/05/2024 Instalación de puntas captadoras, en el área del coliseo





3/04/2024 Desmantelación de cable cobre.





3/05/2024 Instalación de soportes en el área del coliseo.






04/05/2024 Se registra en la aplicación Clima, fuertes lluvias con durabilidad hasta las 11:00 am, las actividades en alturas se encuentra detenidas



04/05/2024 Ingreso de materiales
35 metros de alambrón aluminio 8mm
6 metros cable desnudo N2
15 metros cable cu aislado
4 soldadura exotermica
2 conectores universal aluminio





Fecha	Tema		Participantes	
4/05/2024	Total Horas Hombres trabajadas en la semana	400 HORAS/HOMBRE TRABAJADAS	Total Minutos Semana	
Capacitación y/o Entrenamiento				
Fecha	Tema		Participantes	
			TOTAL DE HORAS LABORALES	

REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO			
Fecha	Humedad Relativa	Velocidad del viento	Pronóstico del tiempo
29/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 87%	Velocidad del viento 10 km/h	
30/04/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 52%	Velocidad del viento 3 km/h	
2/05/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 98%	Velocidad del viento 5 km/h	
3/05/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 87%	Velocidad del viento 3 km/h	
4/05/2024	Hora de la toma: 7:00 am -5 pm /Humedad 97%	Velocidad del viento 3 km/h	

REPORTE DE INCIDENTES			
Fecha	Tipo	Incapacidad	Descripción
		Total Incidentes Semana	

REGISTRO FOTOGRAFICO



29/04/2024 Pausas activas



30/04/2024 Charla de como reprtar un incidente o accidente de trabajo



02/05/2024 Charla de seguridad sopre el buen anclaje.



03/05/2024 Trabajo seguros

0

Elaboró	Maria Camila Avila Suarez
Cargo	HSEQ
Firma	

Código:	SST-FO-IS-CO
4/05/2024	

Acumulado Proyecto
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0






















Duración (Minutos)

Duración (Minutos)


°C
UTECAST
MENSU
>
DIARIO →
J
V
S
2
3
4
26°
19°
28°
19°
34°
25°

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901081204
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SATELITE GLOBAL SG S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 75A # 30A 38	TELÉFONO:	6004132
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**5166036626**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			41				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/06/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			0546095269

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500	$ 0	$ 13.900	$ 500	$ 14.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700	$ 0	$ 20.800	$ 700	$ 21.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 167.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.600	$ 0	$ 167.600	$ 5.600	$ 173.200
230301	230301-PORVENIR	7	$ 431.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200	$ 0	$ 431.600	$ 14.200	$ 445.800
SUBTOTALES:										**$ 633.900**	**$ 21.000**	**$ 654.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.800	$ 0	$ 800	$ 0	$ 21.800	$ 800	$ 0	$ 22.600
EPS041	NUEVA EPS CM	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 157.700	$ 0	$ 5.200	$ 0	$ 157.700	$ 5.200	$ 0	$ 162.900
EPS017	EPS017-FAMISANAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.800	$ 0	$ 800	$ 0	$ 21.800	$ 800	$ 0	$ 22.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 294.400	$ 0	$ 9.700	$ 0	$ 294.400	$ 9.700	$ 0	$ 304.100
SUBTOTALES:													**$ 495.700**	**$ 16.500**	**$ 0**	**$ 512.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 33.700	$ 33.700	$ 1.200	$ 0	$ 34.900
SUBTOTALES:									**$ 33.700**	**$ 1.200**	**$ 0**	**$ 34.900**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	14	$ 158.700	$ 5.300	$ 164.000
SUBTOTALES:			**$ 158.700**	**$ 5.300**	**$ 164.000**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	14	$ 119.700	$ 4.000	$ 123.700
PASENA	PASENA - SENA	13	$ 78.000	$ 2.600	$ 80.600
SUBTOTALES:			**$ 197.700**	**$ 6.600**	**$ 204.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES										
																									PENSIÓN								SALUD						ARP																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																													SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901081204
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SATELITE GLOBAL SG S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 75A # 30A 38	TELÉFONO:	6004132
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5166036626**			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES abril AÑO 2024			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	41				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0546095269

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD					ARP												
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																				
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 13570163	CUADRADO ALVAREZ DAIRO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	29	30															25-14 COLPENSIONES	2	$ 86.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.900	EPS017-FAMISANAR	2	$ 86.667	$ 10.900	$ 0	$ 10.900	14-11 - ARL SURA	2	$ 86.667		$ 1.000	2	$ 86.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500	$ 1.800	$ 2.700	$ 0	$ 0
8	CC 13850623	SANCHEZ CABALLERO ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	29	30															25-14 COLPENSIONES	2	$ 86.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.900	NUEVA EPS CM	2	$ 86.667	$ 10.900	$ 0	$ 10.900	14-11 - ARL SURA	2	$ 86.667	1	$ 1.000	2	$ 86.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500	$ 1.800	$ 2.700	$ 0	$ 0
9	CC 13853553	RANGEL OSPINA MORGAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	16	30															230301-PORVENIR	15	$ 650.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 650.000	$ 81.300	$ 0	$ 81.300	14-11 - ARL SURA	15	$ 650.000	1	$ 3.400	15	$ 650.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 26.000	$ 13.000	$ 19.500	$ 0	$ 0
10	CC 37851524	ROMERO ARRIETA ANGELICA PAOLA	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			NO	16	30															230301-PORVENIR	15	$ 700.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 700.000	$ 87.500	$ 0	$ 87.500	14-11 - ARL SURA	15	$ 700.000	1	$ 7.400	15	$ 700.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 28.000	$ 14.000	$ 21.000	$ 0	$ 0
11	CC 8828121	CUADROS TORO ANGEL MARIA	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	29	30															230301-PORVENIR	2	$ 86.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.900	EPS017-FAMISANAR	2	$ 86.667	$ 10.900	$ 0	$ 10.900	14-11 - ARL SURA	2	$ 86.667	1	$ 1.000	2	$ 86.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500	$ 1.800	$ 2.700	$ 0	$ 0
12	CC 91270229	OSPINA TOLOSA OSBAL JESUS	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			NO	16	30															25-14 COLPENSIONES	15	$ 700.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 112.000	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 700.000	$ 87.500	$ 0	$ 87.500	14-11 - ARL SURA	15	$ 700.000	1	$ 3.700	15	$ 700.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 28.000	$ 14.000	$ 21.000	$ 0	$ 0
13	CC 91431721	PEREZ ANGULO JUAN TERCERO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	29	30															25-14 COLPENSIONES	2	$ 86.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.900	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 86.667	$ 10.900	$ 0	$ 10.900	14-11 - ARL SURA	2	$ 86.667	1	$ 500	2	$ 86.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500	$ 0	$ 2.700	$ 0	$ 0
14	CC 91437153	PEREZ ANGULO ADEL	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	24	25															25-14 COLPENSIONES	2	$ 86.667	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.900	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 86.667	$ 10.900	$ 0	$ 10.900	14-11 - ARL SURA	2	$ 86.667	1	$ 1.000	2	$ 86.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 3.500	$ 1.800	$ 2.700	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.570.300**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901081204
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SATELITE GLOBAL SG S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 75A # 30A 38	TELÉFONO:	6004132
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE LA LEY 1429
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**5166036804**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:	8						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	0491824024		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 224.000	$ 1.500	$ 225.500
230301	230301-PORVENIR	3	$ 281.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 281.100	$ 1.800	$ 282.900
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300	$ 0	$ 34.700	$ 300	$ 35.000
SUBTOTALES:										**$ 539.800**	**$ 3.600**	**$ 543.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 62.500	$ 0	$ 400	$ 0	$ 62.500	$ 400	$ 0	$ 62.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 359.200	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 359.200	$ 2.300	$ 0	$ 361.500
SUBTOTALES:													**$ 421.700**	**$ 2.700**	**$ 0**	**$ 424.400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 24.100	$ 24.100	$ 200	$ 0	$ 24.300
SUBTOTALES:									**$ 24.100**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 24.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	$ 135.000	$ 900	$ 135.900
SUBTOTALES:			**$ 135.000**	**$ 900**	**$ 135.900**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	5	$ 101.400	$ 700	$ 102.100
PASENA	PASENA - SENA	5	$ 67.600	$ 500	$ 68.100
SUBTOTALES:			**$ 169.000**	**$ 1.200**	**$ 170.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES													
																										PENSIÓN								SALUD						ARP														CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1005239784	AVILA SUAREZ MARIA CAMILA	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			NO	01	10															230301-PORVENIR	10	$ 500.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80.000	NUEVA EPS CM	10	$ 500.000	$ 62.500	$ 0	$ 62.500	14-11 - ARL SURA	10	$ 500.000	1	$ 5.300	10	$ 500.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 20.000	$ 10.000	$ 15.000	$ 0	$ 0
2	CC 1096182617	MONCADA LINDADO NELSON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	20	30															230301-PORVENIR	11	$ 476.667	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 76.300	EPS037-NUEVA EPS	11	$ 476.667	$ 59.600	$ 0	$ 59.600	14-11 - ARL SURA	11	$ 476.667	1	$ 5.000	11	$ 476.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 19.100	$ 9.600	$ 14.400	$ 0	$ 0
3	CC 1096192861	PLATA JORGE ARMANDO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	26	30															231001-COLFONDOS	5	$ 216.667	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 34.700	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 216.667	$ 27.100	$ 0	$ 27.100	14-11 - ARL SURA	5	$ 216.667	1	$ 2.300	5	$ 216.667	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 8.700	$ 4.400	$ 6.600	$ 0	$ 0
4	CC 13853553	RANGEL OSPINA MORGAN	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	01	18															230301-PORVENIR	18	$ 780.000	$ 124.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 124.800	EPS037-NUEVA EPS	18	$ 780.000	$ 97.500	$ 0	$ 97.500	14-11 - ARL SURA	18	$ 780.000	1	$ 4.100	18	$ 780.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 31.200	$ 15.600	$ 23.400	$ 0	$ 0
5	CC 91270229	OSPINA TOLOSA OSBAL JESUS	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			NO	01	30															25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.400.000	$ 175.000	$ 0	$ 175.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.400.000	1	$ 7.400	30	$ 1.400.000	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 56.000	$ 28.000	$ 42.000	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 1.298.200**

	INFORME INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA No 02	FECHA: Junio de 2024

PROYECTO / OBRA:	INTERVENTORIA SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO BARRANCABERMEJA	AREA: Electricidad
CONTRATISTA:	CM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S	
DISCIPLINA: ELÉCTRICA	SISTEMA: SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS	

OBJETIVO DE LA INSPECCIÓN	DOCUMENTOS APLICABLES
Dentro del marco de la aceptación del servicio a **INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO** se realiza la ejecución de las actividades descritas en su alcance: Los interventores se encargan de verificar que el diseño del sistema de protección contra rayos cumpla con los requisitos técnicos y de seguridad, así como también de garantizar que se sigan los procedimientos adecuados durante todas las etapas del proceso. Esto puede implicar revisar planos, especificaciones técnicas, normativas de seguridad, cronogramas, presupuestos y coordinar con los diferentes actores involucrados en el diseño del sistema para garantizar su eficacia y fiabilidad en la protección contra descargas atmosféricas.	• NTC 4552 PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (RAYOS)

	INFORME INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA No 02	FECHA: Junio de 2024

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SERVICIO DE INTERVENTORIA A SISTEMA DE PROTECCION CONTRA RAYOS

El CONTRATISTA prestará el servicio de interventoría con el objetivo de garantizar que dicho sistema cumpla con los estándares técnicos, normativas de seguridad y mejores prácticas establecidas para proteger las estructuras y las personas de los efectos nocivos de las descargas atmosféricas. El interventor supervisa el proceso de diseño para asegurar que se sigan los procedimientos adecuados, se utilicen los materiales apropiados y se implementen las tecnologías más efectivas para minimizar los riesgos asociados con los rayos. Además, el interventor se encarga de verificar que el sistema cumpla con los requisitos específicos de la instalación, considerando aspectos como la ubicación, la geometría y la función de la estructura a proteger.

PROCEDIMIENTO A EJECUTAR

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los estudios previos y demás Documentos del Contrato.
2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los estudios previos.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el estudio previo y demás Documentos del Contrato.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
5. Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
6. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuesta.
7. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo del estudio previo y demás documentos del contrato, en los plazos acordados con la Entidad.
8. Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.

11. Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
14. Ejecutar el contrato con el Personal Profesional e idóneo como se determinada en los estudios previos con la formación académica para el cumplimiento de las labores designadas.
15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, registro fotográfico, y demás documentos que apliquen) en medio físico y/o digital.
16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.
17. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
18. Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.
19. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en los documentos previos, en los plazos acordados con la Entidad.
20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
21. Elaborar las diferentes actas y documentos necesarios para la correcta ejecución del contrato de obra e interventoría.

	INFORME INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA No 02	FECHA: Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO








REGISTRO FOTOGRÁFICO










	INFORME INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA No 02	FECHA: Junio de 2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO




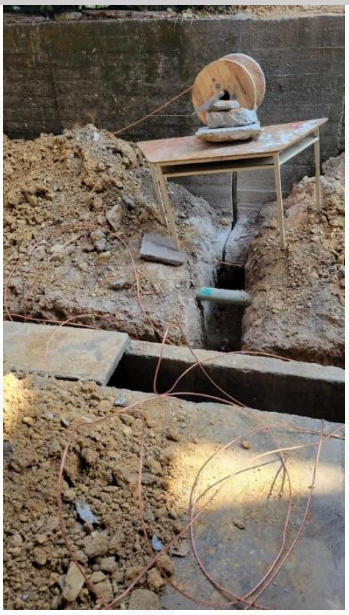



	INFORME INTERVENTORIA

INFORME DE INTERVENTORIA No 02	FECHA: Junio de 2024

OBSERVACIONES
• Sin observaciones.
ESTADO ACTUAL
• Se realiza una visita técnica mediante la cual se observa el avance total de la obra, a partir de esta se aprueba el corte de obra presentado para pago parcial del contrato.

Hallazgos corregidos:	SI	NO	Verificó: CAMG	FECHA DE CIERRE: 14/06/2024

COMPAÑÍA	CM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.	
FIRMA		
NOMBRE	Carlos Andrés Medina Gómez	Andrés Felipe Alvarez Gelvez
FECHA	14/06/2024	

ACTA DE REINICIO No. 01

CONTRATO OBRA No. 13-2023
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE COMERCIO Y SATELITE GLOBAL SG S.A.S. NIT. 901.081.204-0

FECHA ACTA	ABRIL 01 DE 2024
CONTRATO No.	**13-2023**
FECHA DE CELEBRACION	DICIEMBRE 21 de 2023
MODALIDAD	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE COMERCIO** **NIT. 901.081.204-0**
FUNCIONARIO FACULTADO PARA PARA CONTRATAR	**MANUEL SALVADOR TAPIAS WILCHES** CC. No. 13.890.415 DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	**SATELITE GLOBAL SG S.A.S. – NIT: 901.081.204-0** Rep. Legal OSBAL JESÚS OSPINA TOLOZA CC. 91.270.229 DE BUCARAMANGA (SANTANDER), con domicilio principal en la CALLE 37 # 36-151 en la Ciudad de Barrancabermeja (SANTANDER)
OBJETO	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS EN INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($243.176.776,00).**
VALOR ADICIONAL	**N/A**
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	UN (1) MES CALENDARIO
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES CALENDARIO
Interventor	**ING. CARLOS ANDRÉS MEDINA GOMEZ** C.C. 1.100.949.177 de San Gil
FECHA INICIO	DICIEMBRE 27 DE 2023
FECHA TERMINACION SEGÚN ADICIONAL	MARZO 27 DE 2024
ACTA SUSPENSIÓN No. 01	MARZO 01 DE 2024
ACTA REINICIO No. 01	ABRIL 01 DE 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	ABRIL 26 DE 2024

En Barrancabermeja, al primer (01) día del mes de Abril de 2024, se reunieron, el Señor **MANUEL SALVADOR TAPIAS WILCHES**, en calidad de Rector de la Institución Educativa TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO, el señor **CARLOS ANDRÉS MEDINA GÓMEZ** identificado con CC. 1.100.949.177 de San Gil, actuando como Interventor del Contrato Obra No. 13-2023 y el Señor **OSBAL JESÚS OSPINA TOLOZA,** identificado con la CC. No. 91.270.229 de Bucaramanga, representante legal de SATELITE GLOBAL SG S.A.S. – NIT: 901.081.204-0 en calidad de CONTRATISTA, con el fin de elaborar la presente ACTA DE REINICIO No. 01

CONSIDERANDO

- Que el día de 21 de Diciembre de 2023, se suscribió el contrato de Obra No. 13-2023 derivado de la SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. TSC-001-23 que tiene por objeto SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS EN INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO, con fecha el día 27 de Diciembre de 2023 y plazo ejecución según prórrogas suscritas hasta el día 27 marzo 2024.

- Que el día 20 de febrero de 2024 se suscribe prorroga No. 01 en un plazo adicional de treinta (30) días, debido al cierre financiero y contable en la finalización del año 2023 afectando la entrega oportuna de los elementos adquiridos, la escaza mano de obra por época decembrina y de algunos enjambres de abejas reportados en la institución educativa que ponen en riesgos la vida y salud de estudiantes y trabajadores.

- Que en el transcurso del mes de febrero de 2024 se han presentado fuertes lluvias que impiden proceder con el desarrollo normal de las actividades en especial con las excavaciones para la instalación del alambrón para el anillo superior equipotencial e igualmente con la instalación de punta captadora, afectando los rendimientos previstos en la programación de obra.

- Que después de analizada la situación descrita anteriormente por interventoría, contratista y entidad contratante, es procedente suspender la ejecución de la obra por un periodo de tiempo de un mes, con el fin de sortear este periodo de invierno y lograr retomar las obra, con un clima favorable, además que se aproxima en el presente mes la semana santa, días en los cuales se paralizan algunas actividades comerciales y de servicios.

- Que transcurrido los 30 días establecidos como periodo de suspensión de la obra, se realiza comité de obra y se establece que el tiempo es favorable para retomar las labores.

- Que las partes deciden que es necesario reiniciar las labores, para garantizar el cumplimiento del proceso contractual.

- Que están dadas las condiciones para realizar el reinicio del contrato de obra No. 13-2023.

- Que por lo anterior, las partes

ACUERDAN

ARTICULO PRIMERO. REINICIAR el contrato de obra No. 13-2023 con objeto: **SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS EN INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO** a partir del día primero (01) de abril de 2024.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar el día VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE 2024 como fecha de terminación actualizada del contrato de obra No 13-2023.

ARTICULO TERCERO: Actualizar las pólizas que respaldan la ejecución del presente contrato.

Se firma por quienes intervienen,

MANUEL SALVADOR TAPIAS WILCHES
Rector

OSBAL JESUS OSPINA TOLOZA
Representante Legal - Contratista

ING. CARLOS ANDRÉS MEDINA GÓMEZ
Interventor

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

CONTRATO OBRA No. 13-2023
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE COMERCIO Y SATELITE GLOBAL SG S.A.S. NIT. 901.081.204-0

FECHA ACTA	MARZO 01 DE 2024
CONTRATO No.	**13-2023**
FECHA DE CELEBRACION	DICIEMBRE 21 de 2023
MODALIDAD	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE COMERCIO** **NIT. 901.081.204-0**
FUNCIONARIO FACULTADO PARA PARA CONTRATAR	**MANUEL SALVADOR TAPIAS WILCHES** CC. No. 13.890.415 DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	**SATELITE GLOBAL SG S.A.S. – NIT: 901.081.204-0** Rep. Legal OSBAL JESÚS OSPINA TOLOZA CC. 91.270.229 DE BUCARAMANGA (SANTANDER), con domicilio principal en la CALLE 37 # 36-151 en la Ciudad de Barrancabermeja (SANTANDER)
OBJETO	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS EN INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO**
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($243.176.776,00).**
VALOR ADICIONAL	**N/A**
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL	UN (1) MES CALENDARIO
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES CALENDARIO
Interventor	**ING. CARLOS ANDRÉS MEDINA GOMEZ** C.C. 1.100.949.177 de San Gil
FECHA INICIO	DICIEMBRE 27 DE 2023
FECHA TERMINACION INICIAL	FEBRERO 26 DE 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	MARZO 27 DE 2024
ACTA SUSPENSIÓN	MARZO 01 DE 2024

En Barrancabermeja, el primer (01) día del mes de Marzo de 2024, se reunieron, el Señor **MANUEL SALVADOR TAPIAS WILCHES**, en calidad de Rector de la Institución Educativa TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO, el señor **CARLOS ANDRÉS MEDINA GÓMEZ** identificado con CC. 1.100.949.177 de San Gil, actuando como Interventor del Contrato Obra No. 13-2023 y el Señor **OSBAL JESÚS OSPINA TOLOZA,** identificado con la CC. No. 91.270.229 de Bucaramanga, representante legal de SATELITE GLOBAL SG S.A.S. – NIT: 901.081.204-0 en calidad de CONTRATISTA, con el fin de elaborar la presente ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

CONSIDERANDO

- Que el día de 21 de Diciembre de 2023, se suscribió el Contrato de Obra No. 13-2023 derivado de la SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA No. TSC-001-23 que tiene por objeto SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS EN INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO, con fecha de inicio el día 27 de Diciembre de 2023 y plazo ejecución según prórrogas suscritas hasta el día 27 marzo 2024.

- Que el día 20 de febrero de 2024 se suscribe prorroga No. 01 en un plazo adicional de treinta (30) días, debido al cierre financiero y contable en la finalización del año 2023 afectando la entrega oportuna de los elementos adquiridos, la escaza mano de obra por época decembrina y de algunos enjambres de abejas reportados en la institución educativa que ponen en riesgos la vida y salud de estudiantes y trabajadores.

- Que en el transcurso del mes de febrero de 2024 se han presentado fuertes lluvias que impiden proceder con el desarrollo normal de las actividades en especial con las excavaciones para la instalación del alambrón para el anillo superior equipotencial e igualmente con la instalación de punta captadora, afectando los rendimientos previstos en la programación de obra.

- Que después de analizada la situación descrita anteriormente por interventoría, contratista y entidad contratante, es procedente suspender la ejecución de la obra por un periodo de tiempo de un mes, con el fin de sortear este periodo de invierno y lograr retomar las obra, con un clima favorable, además que se aproxima en el presente mes la semana santa, días en los cuales se paralizan algunas actividades comerciales y de servicios.

- Que verificado lo expuesto y evaluados los pronostico del clima y los sobre costo de continuar la ejecución de las obras, las partes consideran procedente realizar la suspensión al contrato de obra No. 13-2023

- Que por lo anterior, las partes

ACUERDAN

ARTICULO PRIMERO. SUSPENDER el contrato de obra No. 13-2023 con objeto: **SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS EN INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO** por treinta (30) días o antes si se superen los hechos que motivaron la suspensión del mismo, a partir del PRIMERO (01) DE MARZO DE 2024.

ARTICULO SEGUNDO: Fijar el día primero (01) de abril de 2024 o antes si se superen los hechos que motivaron la suspensión del mismo, como fecha de reinicio del contrato de obra No. 13-2023.

ARTICULO TERCERO: Dar la orden de reinicio de los trabajos mediante acta fijando la nueva fecha de entrega final.

No siendo otro el objeto, en constancia se firma la presente acta una vez leída y aprobada como aparece; por quienes en ella intervinieron.

MANUEL SALVADOR TAPIAS WILCHES Rector	**OSBAL JESUS OSPINA TOLOZA** Representante Legal - Contratista

ING. CARLOS ANDRÉS MEDINA GÓMEZ
Interventor

ADICIONAL EN TIEMPO No. 02

CONTRATO OBRA No. 13-2023
SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE COMERCIO Y SATELITE GLOBAL SG S.A.S. NIT. 901.081.204-0

FECHA ADICIONAL	ABRIL 19 DE 2024
CONTRATO No.	**13-2023**
FECHA DE CELEBRACION	DICIEMBRE 21 de 2023
MODALIDAD	SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
CONTRATANTE	**INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE COMERCIO** **NIT. 901.081.204-0**
FUNCIONARIO FACULTADO PARA PARA CONTRATAR	**MANUEL SALVADOR TAPIAS WILCHES** CC. No. 13.890.415 DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA	**SATELITE GLOBAL SG S.A.S. – NIT: 901.081.204-0** Rep. Legal OSBAL JESÚS OSPINA TOLOZA CC. 91.270.229 DE BUCARAMANGA (SANTANDER), con domicilio principal en la CALLE 37 # 36-151 en la Ciudad de Barrancabermeja (SANTANDER)
VALOR DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($243.176.776,00).**
OBJETO	**SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS EN INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO**
FORMA DE PAGO	LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, cancelará al contratista el valor total del contrato mediante: a) Mediante actas parciales de obra previo visto bueno del interventor y supervisor designado, mediante las siguientes condiciones: i) un primer pago hasta acreditar la ejecución del cincuenta porciento (50%) del valor del contrato, ii) informe de actividades de seguridad y salud en el trabajo acordes con los ítems ejecutados, iii) pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales, conforme con la ley 100 de 1993, a la ley 789 de 2002, el decreto 510 de 2003 y demás documentos exigidos a que haya lugar, sin superar el noventa por ciento (90%) del valor del contrato. b) Un pago final por el diez por ciento (10%) del valor correspondiente que será pagado una vez se encuentra elaborada y suscrita el acta de liquidación del contrato.
FECHA INICIO	DICIEMBRE 27 DE 2023
FECHA TERMINACION ACTUALIZADA	ABRIL 26 DE 2024

PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES CALENDARIO		
PLAZO ADICIONAL 01	UN (01) MES CALENDARIO		
PLAZO ADICIONAL 02	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO		
ACTA SUSPENSIÓN 01	MARZO 01 DE 2024		
ACTA REINICIO 01	ABRIL 01 DE 2024		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	JULIO 05 DE 2024		
Interventor	**ING. CARLOS ANDRÉS MEDINA GOMEZ** C.C. 1.100.949.177 de San Gil		
Registro Presupuestal	**No de RP**	**FECHA**	**VALOR**
	071	21 DICIEMBRE 2023	$243.176.776,00

Entre los suscritos a saber: **MANUEL SALVADOR TAPIAS WILCHES**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.890.415 expedida en Barrancabermeja, Rector de la Institución Educativa TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO – NIT. 890.210.216-4, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE** de una parte y por la otra **OSBAL JESÚS OSPINA TOLOZA** identificado con CC. 91.270.229 expedida en Bucaramanga, Representante legal de **SATELITE GLOBAL SG S.A.S. – NIT: 901.081.204-0**, quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado suscribir el presente adicional No. 02 en tiempo al Contrato de Obra No. 13-2023, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por el manual interno de contratación y demás normas legales concordantes previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que la institución Educativa Técnico Superior de Comercio celebró el contrato de Obra No. 13-2023 de fecha 21 de diciembre del 2023, entre la Institución Educativa Técnico Superior de Comercio y **SATELITE GLOBAL SG S.A.S. – NIT: 901.081.204-0**, el cual tiene por objeto: **SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCIÓN CONTRA RAYOS EN INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO**.

2. Que las parte suscriben el acta de inicio el día veintisiete (27) de Diciembre del 2023, acta que autorizó al contratista la ejecución de la Consultoría.

3. Que el día 20 de febrero de 2024 se suscribe prorroga No. 01 en un plazo adicional de treinta (30) días, debido al cierre financiero y contable en la finalización del año 2023 afectando la entrega oportuna de los elementos adquiridos, la escaza mano de obra por época decembrina y de algunos enjambres de abejas reportados en la institución educativa que ponen en riesgos la vida y salud de estudiantes y trabajadores.

4. Que el día 01 de marzo 2024 se suspende las labores del Contrato de Obra No. 13-2023 por las fuertes lluvias que impiden proceder con el desarrollo normal de las actividades en especial con las excavaciones para la instalación del alambrón para el anillo superior equipotencial e igualmente con la instalación de punta captadora, afectando la programación de obra.

5. Que el día 01 abril de 2024 se da reinicio al contrato No. 13-2023 superando la temporada de lluvia que se presentó en la zona, encontrando que el tiempo es favorable para retomar las labores, igualmente ha culminado la semana mayor.

6. Que el día 10 de abril de 2024 el contratista de obra manifiesta mediante oficio que la adquisición del equipo de medida con algunos proveedores, como lo es el Transformador de Potencia requerido, el cual hace parte del capitulo Instalaciones Eléctricas, no existe disponibilidad en el mercado, elemento que debe importarse y su importación fluctúa en aproximadamente setenta (70) días, incluyendo el plazo para su instalación.

7. Que la interventoría, ha participado activamente de todos los comités, y reuniones convocadas por la entidad, dando orientaciones precisas a las partes, para superar las dificultades presentadas, se ha señalado que la obra cumple con un avance significativo, pero es pertinente, recuperar el tiempo que por situaciones que se desprenden de la voluntad de las partes han afectado la ejecución, encontrando conducente, útil y necesario el presente adicional.

8. Que la Institución Educativa evidencia la necesidad de suscribir el presente adicional; el cual se regirá por la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: Ampliar el plazo de ejecución señalado en la CLÁUSULA 4. PLAZO del CONTRATO No. 13-2023, en SETENTA (70) DIAS CALENDARIO MÁS, quedando así:

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo actualizado para la ejecución del presente contrato será de CINCO PUNTO TREINTA Y TRES (5,33) MESES, contados a partir de acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Parágrafo No 1: EL PLAZO ADICIONADO 02 ES DE SETENTA (70) DIAS CALENDARIO
Parágrafo No 2: Establecer el día CINCO (05) DE JULIO 2024, como fecha de terminación del CONTRATO DE OBRA No. 13-2023 y Recibo final de las actividades ejecutadas por el contratista.

CLAUSULA SEGUNDA: GARANTÍAS: El contratista deberá realizar la actualización de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual que respaldan la ejecución de este contrato, de acuerdo a lo establecido en la CLÁUSULA 17. GARANTÍAS.

CLAUSULA TERCERA: Los demás numerales descritos en el CONTRATO DE OBRA No. 13-2023, permanecen tal y como fueron consignadas en el documento original y por lo tanto no sufren modificación alguna.

En constancia, se firma en el municipio de Barrancabermeja Santander, a los diecinueve (19) días del mes de abril de Dos Mil veinticuatro (2024).

Por la Entidad,	Por el Contratista,
MANUEL ~~SALVADOR TAPIAS~~ WILCHES Rector	**OSBAL JESÚS OSPINA TOLOZA** Representante Legal - Contratista

RECIBO DE CAJA

000 14226

NSC
ASESORES DE SEGUROS

SATELITE GLOBAL SG SAS
901081204
CL 75 A 30 A 38 BRR LA FLORESTA
BARRANCABERMEJA

VALOR RECIBO $242,024.00

FECHA 17/6/2024

Ciudad BARRANCABERMEJA

CONCEPTO 99 ING VARIOS
EFECTIVO

DETALLE DE VALORES RECIBIDOS	DOCUMENTO	CTA BANCARIA	VALOR PAGADO
CONSIGNACIONES ASEGURADORAS			$242,024.00

Cuenta(s) 23551 Estado S.A. CUMPLIMIENTO ESTATAL Pól.101007072 Doc. 2, $49,359.00 - 23553 Estado S.A. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRATOS Pól.101003127 Doc. 2, $192,665.00 -

RECIBODECAJA
NSC Fecha: 17/06/2024

Firma y Sello Autorizado : _____

Calle 51 N° 8B - 96 Local 101 Edificio Bertha Sector Comercial Barrancabermeja, Santander.
Teléfonos: (7) 6222815 - 6203185 - Movil: 3107870629 - Correo electrónico: gerencia@nsc-seguros.com.co

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101007072	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	06	2024	21	12	2023	00:00	21	03	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	SATELITE GLOBAL SG S.A.S	NIT: 901.081.204-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 75 A 30 A 38 BRR LA FLORESTA	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	3022822936

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO	NIT: 800.043.472-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 64 NRO. 25 - 105 BARRIO EL PARNASO	BARRANCABERMEJA, SANTANDER	6224161

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARRROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 13-2023 CUYO OBJETO ES: SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCION CONTRA RAYOS EN INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO.

NOTA: LA GARANTIA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE OTORGA PARA EL COMPONENTE DE OBRA CIVIL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/12/2023	05/11/2024	$24,317,677.60	$24,317,677.60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	21/12/2023	05/07/2027	$24,317,677.60	$24,317,677.60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÍAS *		$72,953,032.80	$72,953,032.80

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE RADICAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

-ACTA DE SUSPENSION No. 01 DE FECHA 01/03/2024.
-ACTA DE REINICIO No. 01 DE FECHA 01/04/2024.
-ADICIONAL EN TIEMPO No. 02 DE FECHA 19/04/2024. CON EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN 70 DIAS CALENDARIO.

LAS DEMAS CONDICIONES DE LA POLIZA INICIAL NO MODIFICADAS EN ESTE DOCUMENTO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******33,478.00	$ *******8,000.00	$ *******7,880.00	$ **********49,359.00	$ ******121,588,388.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NSC ASESORES DE SEGUROS LTDA	103140	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

56-44-101007072
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PUNICA 01
RAMIREZ Impresores S.A.S PBX: 3110255 Nit. 860.350.626-1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-40-101003127	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	06	2024	21	12	2023	00:00	05	07	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SATELITE GLOBAL SG S.A.S		NIT: 901.081.204-0
DIRECCIÓN: CL 75 A 30 A 38 BRR LA FLORESTA	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO:	3022822936

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO		NIT: 800.043.472-1
DIRECCIÓN: CL 64 NRO. 25 - 105 BARRIO EL PARNASO	CIUDAD: BARRANCABERMEJA, SANTANDER	TELÉFONO	6224161
BENEFICIARIO: 800043472 - INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO	ADICIONAL:	ADICIONAL:	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA No. 13-2023 CUYO OBJETO ES: SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PROTECCION CONTRA RAYOS EN INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO.

SON ASEGURADOS: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO / SATELITE GLOBAL SG SAS.
SON BENEFICIARIOS: LOS TERCEROS AFETADOS / INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2023	05/07/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2023	05/07/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2023	05/07/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICADO SE RADICAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

-ACTA DE SUSPENSION No. 01 DE FECHA 01/03/2024.
-ACTA DE REINICIO No. 01 DE FECHA 01/04/2024.
-ADICIONAL EN TIEMPO No. 02 DE FECHA 19/04/2024. CON EL CUAL SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN 70 DIAS CALENDARIO.

LAS DEMAS CONDICIONES DE LA POLIZA INICIAL NO MODIFICADAS EN ESTE DOCUMENTO CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****158,904.00	$ *******3,000.00	$ ******30,761.00	$ **********192,665.00	$ ******232,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NSC ASESORES DE SEGUROS LTDA	103140	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

56-40-101003127
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-40-101003127	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	06	2024	21	12	2023	00:00	05	07	2024	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SATELITE GLOBAL SG S.A.S		NIT:	901.081.204-0
DIRECCIÓN: CL 75 A 30 A 38 BRR LA FLORESTA	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3022822936

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO		NIT:	800.043.472-1
DIRECCIÓN: CL 64 NRO. 25 - 105 BARRIO EL PARNASO	**CIUDAD:** BARRANCABERMEJA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6224161
BENEFICIARIO: 800043472 - INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO			

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2023	05/07/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2023	05/07/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
GASTOS MEDICOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2023	05/07/2024	$50,000,000.00	$50,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2023	05/07/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	21/12/2023	05/07/2024	$232,000,000.00	$232,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-40-101003127

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
