INFORME MENSUAL DE OBRA No. 2

PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. 041-2023



CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

CONTRATO DE OBRA No. 041 DE 2023		
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE		
INFORME N°2 PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024		
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN POR PARTE CONTRATISTA DE OBRA	FIRMA:	
	NOMBRE:	LUIS EDUARDO REAL HOYOS
	FECHA:	05 DE ABRIL DE 2024
RESPONSABLE DE REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORÍA	FIRMA:	
	NOMBRE:	Gabriel Andres Duran Moreno
	FECHA:	29 de abril de 2024
RESPONSABLE DE REVISIÓN POR PARTE DE SUPERVISIÓN	FIRMA:	
	NOMBRE:	
	FECHA:	
OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA		

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 7
OBJETIVOS 8
OBJETIVO GENERAL 8
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 8
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 9
1.1 FICHA TECNICA 9
1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA 10
1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL ACTA DE INICIO 10
1.4 RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES 11
1.5 RELACIÓN DE PAGO DE ESTAMPILLAS 11
2 ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA DE OBRA 12
2.1 ANEXOS 13
2.1.1 HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DE OBRA 13
3 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 14
3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 14
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 15
3.2.1 ALCANCE 16
3.3 TRAMOS A INTERVENIR 29
4 ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO 32
4.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 32
4.2 VALOR DEL PROYECTO 32
4.2.1 CÁLCULOS DE COSTOS INDIRECTOS A.I.U 32
4.2.2 ANÁLISIS DEL FACTOR PRESTACIONAL 33
4.3 FLUJO DE CAJA DEL CONTRATO DE OBRA 33
4.4 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO 33
4.5 AVANCE DEL ANTICIPO 34
4.6 ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL CONTRATO 34

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

4.7 CUADRO DEL AVANCE DE OBRA 35
5 AVANCE DEL PROYECTO 36
5.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA 36
5.1.1 INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMADA Vs INVERSIÓN MENSUAL EJECUTADA 58
5.1.2 GRAFICO %PROGRAMADO Vs %EJECUTADO 58
5.1.3 DESCRIPCIÓN INDIVIDUAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 59
5.1.3.1 CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR) 59
5.1.3.2 RED DE MEDIA TENSION 60
5.2 PROYECCIONES DE OBRA PARA EL SIGUIENTE PERIODO 61
5.3 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO 61
5.3.1 RELACIÓN PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 63
5.4 EQUIPOS UTILIZADOS 63
5.5 MATERIALES UTILIZADOS 64
5.5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 65
5.5.1.1 ARANDELAS 65
5.5.1.2 CABLE EN ACERO GALVANIZADO 69
5.5.1.3 COLLARINES O ABRAZADERAS 72
5.5.1.4 CRUCETA METÁLICA 74
5.5.1.5 POSTE EN CONCRETO 79
5.6 ESTADO DEL CLIMA 84
5.7 DIFICULTADES O INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO 85
5.7.1 RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ 86
5.8 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA 86
5.9 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA 87
5.10 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA 87
5.11 BITÁCORA 88
5.12 ANEXOS 88

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

5.12.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO 88
5.12.2 CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 88
5.12.3 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL 88
5.12.4 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 88
5.12.5 ACTAS DE COMITE 88
5.12.6 ACTAS DE REUNION DE OBRA 88
5.12.7 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 88
5.12.8 CORRESPONDENCIA ENVIADA 88
5.12.9 BITÁCORA DE OBRA 88
6 ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 97
6.1 ANEXOS: 97
6.1.1 INFORME MENSUAL No. 2 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA Y SALUD OCUPACIONAL 97
7 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 98
7.1 ANEXOS 98
7.1.1 INFORME MENSUAL No. 2 DEL INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 98
8 ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 99
9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 100

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Información general del proyecto 9
Tabla 2. Relación de pólizas contrato de obra 10
Tabla 3. Relación de pólizas acta de inicio 10
Tabla 4. Actas contractuales del contrato 11
Tabla 5. Estampillas del contrato 11
Tabla 6. Tramos a intervenir en PPAMM 29
Tabla 7. Disponibilidad presupuestal 32
Tabla 8. Relación de costos del proyecto 32
Tabla 9. Desglose del AIU 32
Tabla 10. Factor prestacional 33
Tabla 11. Flujo semanal de obra 33

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Tabla 12. Plan de inversión del anticipo 33
Tabla 13. Gastos de anticipo 34
Tabla 14. Estado financiero del contrato 34
Tabla 15. Inversión programada vs inversión ejecutada 58
Tabla 16. Relación de personal 61
Tabla 17. Relación de planillas de seguridad social 63
Tabla 18. Equipos utilizados a fecha del presente informe 63
Tabla 19. Relación de material utilizado 64
Tabla 20. Relación de actas de reunión de obra 86
Tabla 21. Relación de actas de reunión de obra 86
Tabla 22. Relación de correspondencia recibida 87
Tabla 23. Relación de correspondencia enviada 87

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Organigrama del contrato de obra 12
Ilustración 2. Localización general del proyecto 14
Ilustración 3 Localización específica del proyecto 15
Ilustración 4. Grafica valor gastado vs valor restante de anticipo 34
Ilustración 5. Porcentaje de avance del contrato 35
Ilustración 6. Valor ejecutado vs valor gastado contrato de obra 58
Ilustración 7. Descapote a maquina 59
Ilustración 8. Excavación mecánica EBAR 60
Ilustración 9. Red de media tensión 61
Ilustración 10. Reporte diario del clima 84
Ilustración 11. Interrupción de actividades por parte de la comunidad 85
Ilustración 12. Inundación zona de excavación EBAR 86

INTRODUCCIÓN

En desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023, se elabora el presente informe mensual de obra No. 02, de la etapa constructiva, el cual contiene el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y social de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024.

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare S.A. E.S.P. - ACUATODOS S.A. E.S.P., por ser una entidad del nivel descentralizado del Departamento de Casanare, tiene bajo su responsabilidad garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental que se encuentran articuladas con las acciones a desarrollar para alcanzar los objetivos de la política del sector de saneamiento básico en el Departamento de Casanare.

Con base en lo anterior, la necesidad a satisfacer por parte de ACUATODOS S.A. E.S.P, es la de atender las necesidades de la población y mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector a intervenir, así como ampliar las coberturas de la prestación de servicios de alcantarillado Sanitario en la Población de la ciudadela la Bendición y zona sur occidental del municipio de Yopal, ya que en la actualidad se presenta insuficiencia de cobertura en el sector de Saneamiento Básico, de esta manera, la ejecución del presente proyecto permitirá ampliar la cobertura de la infraestructura de prestación de los servicios públicos de alcantarillado sanitario.

Este informe se realiza en cumplimiento a lo estipulado en la CLAUSULA 8. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA en el numeral 26; Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener como mínimo para cada uno de los frentes de trabajo.

El presente informe contempla el avance del contrato de obra 041 de 2023 en el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2024 al 31 de marzo 2024.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Construir la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudadela la bendición y zona sur occidental del municipio de Yopal, departamento de Casanare.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construcción e instalación de campamento provisional.
- Iniciar actividades de descapote y excavación para la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) denominada el YOPO.
- Ejecución del capítulo de RED DE MEDIA TENSIÓN con el fin de suministrar energía eléctrica a la zona de la EBAR.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

1.1 FICHA TECNICA

Tabla 1. Información general del proyecto

CONTRATO DE OBRA No.	041 DE 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."
SUPERVISOR DESIGNADO PARA EL CONTRATO:	ING. JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ SUBGERENTE TÉCNICO Y OPERATIVO
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	ING. ROBERTO ANDRÉS RÍOS FIGUEROA
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23
DIRECTOR DE OBRA:	ING. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
RESIDENTE DE OBRA:	ING. LUIS EDUARDO REAL HOYOS
VALOR DEL CONTRATO:	$ 83.611.009.207,00
VALOR DEL ANTICIPO (50%):	$ 41.805.504.603,50
PLAZO:	VEINTICUATRO (24) MESES
FECHA DE INICIO:	TRECE (13) DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2026
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PR-HK R/L OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ
DATOS DEL CONSORCIO	
DIRECCIÓN	CONDOMINIO CASA VIEJA MANZANA A CASA 4
TELÉFONO	6334412
CORREO ELECTRÓNICO	consorciobendicion23@theos.com.co

1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 2. Relación de pólizas contrato de obra

No. DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN EL CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
400052748 Anexo 1	Cumplimiento	Nacional de seguros	20%	$ 16.722.201.841,40	15/11/2023	15/09/2026
400052748 Anexo 1	Buen manejo del anticipo	Nacional de seguros	50%	$ 41.805.504.603,50	15/11/2023	15/09/2026
400052748 Anexo 1	Prestaciones sociales	Nacional de seguros	5%	$ 4.180.550.460,35	15/11/2023	15/11/2028
400052748 Anexo 1	Estabilidad de la obra	Nacional de seguros	20%	$ 16.722.201.841,40	Cinco (05) años contados a partir del acta de recibo final	
400052747 Anexo 1	Responsabilidad civil extracontractual	Nacional de seguros	5%	$ 4.180.550.460,35	15/11/2023	15/11/2025

Estas pólizas fueron aprobadas el día 09 de febrero de 2024 por parte de la oficina Jurídica de ACUATODOS S.A. E.S.P.

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL ACTA DE INICIO

Tabla 3. Relación de pólizas acta de inicio

No. DE PÓLIZA	CONCEPTO	ASEGURADORA	% SEGÚN EL CONTRATO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
400052748 Anexo 2	Cumplimiento	Nacional de seguros	20%	$ 16.722.201.841,40	13/02/2024	12/12/2026
400052748 Anexo 2	Buen manejo del anticipo	Nacional de seguros	50%	$ 41.805.504.603,50	13/02/2024	12/12/2026
400052748 Anexo 2	Prestaciones sociales	Nacional de seguros	5%	$ 4.180.550.460,35	13/02/2024	12/02/2029
400052748 Anexo 2	Estabilidad de la obra	Nacional de seguros	20%	$ 16.722.201.841,40	Cinco (05) años contados a partir del acta de recibo final	
400052747 Anexo 1	Responsabilidad civil extracontractual	Nacional de seguros	5%	$ 4.180.550.460,35	13/02/2024	12/02/2026

Estas pólizas fueron aprobadas el día 28 de febrero de por parte de la oficina Jurídica de ACUATODOS S.A. E.S.P.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

1.4 RELACIÓN DE ACTAS CONTRACTUALES

Tabla 4. Actas contractuales del contrato

ACTA No.	NOMBRE DEL ACTA	FECHA	VALOR	OBSERVACIONES
1	Acta de inicio	13/02/2024	N/A	
2	Acta de Entrega de anticipo	13/02/2024	$ 41.805.504.603,50	

1.5 RELACIÓN DE PAGO DE ESTAMPILLAS


Tabla 5. Estampillas del contrato

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	No. CUENTA	VALOR
ESTAMPILLA PROCULTURA	02/02/2024	0013-0354-0200011918	$ 836.110.100,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	02/02/2024	0013-0981-0200564347	$ 2.508.330.300,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	02/02/2024	0013-0981-0200564339	$ 836.110.100,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE	02/02/2024	0013-0981-0200581333	$ 2.090.275.200,00
ESTAMPILLA PROUNITROPICO	02/02/2024	0013-0981-0200002174	$ 1.254.165.100,00

2 ORGANIGRAMA DEL CONTRATISTA DE OBRA

El esquema organizacional de Consorcio Bendición 23 es el siguiente:

Ilustración 1. Organigrama del contrato de obra

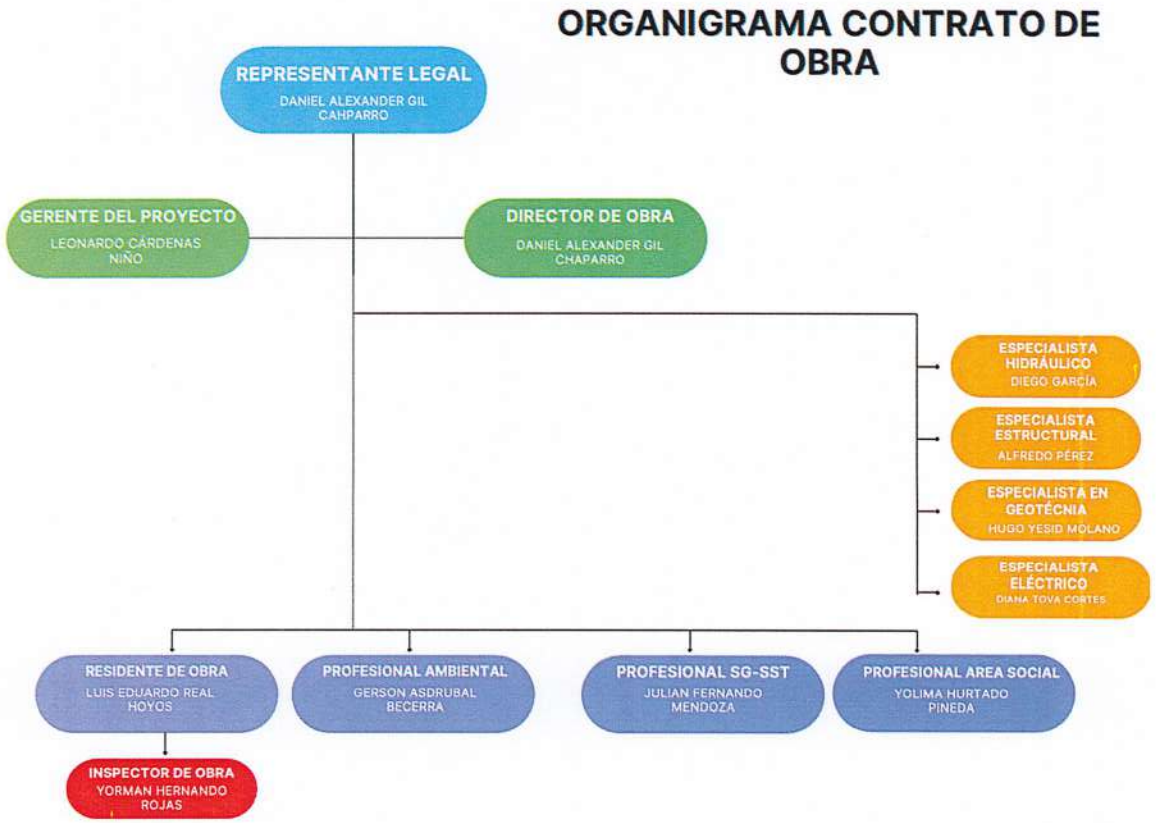

2.1 ANEXOS

2.1.1 HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DE OBRA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO



DATOS PERSONALES

Documento de identidad: C.C 1.118.548.824 de Yopal
Lugar y fecha de nacimiento: Yopal, 16 de septiembre de 1991
Teléfono: 311 847 27 76 - 633 44 12
E-mail: daniel.gil@theos.com.co

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **ESTUDIOS DE POSGRADO**

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Magister en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos
Enfoque Profundización: Desarrollo de Proyectos y Dirección de Portafolio
Fecha de Grado: septiembre de 2016

- **ESTUDIOS SUPERIORES**

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Ingeniería Civil
Fecha de Grado: Marzo de 2013

- **EXPERIENCIA GENERAL**

1. **Director general de Proyectos- GRUPO THEOS S.A.S**

   Periodo: 08 de abril de 2013 a 03 de diciembre de 2014.

2. **Profesional de apoyo- Consorcio El Poblado**

   CONTRATO 170 de 2014 "construcción plan maestro de alcantarillado en el centro poblado el cedral municipio de Tello".

   Periodo: 4 de diciembre de 2014 a 31 de julio de 2015.

3. **Director general de Proyectos- GRUPO THEOS S.A.S**

   Periodo: 01 de agosto de 2015 a 14 de octubre de 2015.

4. **Residente de obra- Héctor Julio Pedraza.**

   CONTRATO 575 DE 2015: "Ampliación red de alcantarillado pluvial construido en la etapa I, para el centro poblado de San José del Bubuy del municipio de Aguazul, departamento de Casanare".

   Periodo: 15 de octubre de 2015 a 14 de diciembre de 2015.

5. **Director general de Proyectos- GRUPO THEOS S.A.S**

   Periodo: 15 de diciembre de 2015 a 24 de julio de 2016.

6. **Profesional de apoyo - RAELJA INGENIERIA LTDA**

   CONTRATO 263-CENAC-2016: "Conexión, línea de conducción acueducto, tanque de almacenamiento y sistema de bombeo según diseño en el batallón de infantería No 21 Vargas, /Granada - Meta) - unidad centralizada por la CENAC - Villavicencio vigencia 2016 con recursos del convenio de colaboración No 005-14 entre el ministerio de Defensa Nacional - fuerzas militares de Colombia Ejército Nacional y la empresa ECOPETROL S.A

   Periodo: 25 de julio de 2016 a 31 de octubre de 2016.

7. **Director de obra - UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO SAN ANTONIO**

   CONTRATO 0305-2016: "Reposición de las redes de alcantarillado sanitario en la carrera 6b entre calle 2 y 3 del municipio de Maní, Casanare."

   Periodo: 01 de noviembre de 2016 a 21 de diciembre de 2016.

8. **Director general de Proyectos- GRUPO THEOS S.A.S**

   Periodo: 22 de diciembre de 2016 a 26 de junio de 2016.

9. **Profesional de apoyo – CONSORCIO ENVIGADO 2017**

CONTRATO 09-00-30-18-036-17: "Construcción del tanque de almacenamiento del acueducto cristal peña azul municipio de Envigado"

Periodo: 27 de junio de 2017 a 07 de diciembre de 2017.

10. **Profesional de apoyo – CONSORCIO PROYECTO PTAR 2017**

CONTRATO 705 DE 2017: "Construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales para el centro poblado San José de Bubuy del municipio de Aguazul departamento de Casanare".

Periodo: 19 de diciembre de 2017 a 11 de septiembre de 2019.

11. **Director general de Proyectos- GRUPO THEOS S.A.S**

Periodo: 22 de septiembre de 2019 a 24 de octubre de 2019

12. **Residente de obra – UNION TEMPORAL A&A PORE 2019**

CONTRATO 229 DE 2019: "Construcción de la primera etapa de la red de acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial para la urbanización los centauros, municipio de Pore, departamento de Casanare".

Periodo: 25 de octubre de 2019 hasta 16 de diciembre de 2019.

13. **Residente de obra – UNION TEMPORAL A&A PAZ DE ARIPORO 2019**

CONTRATO 301.17-5-016: "Ampliación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario, para la urbanización "Los Alcaravanes" en el barrio La Granja del municipio de Paz de Ariporo, departamento de Casanare

Periodo: 17 de diciembre de 2019 a 26 de diciembre de 2019.

14. **Residente de obra- UNION TEMPORAL PLUVIAL 2020**

CONTRATO 074 DE 2019: "Construcción alcantarillado pluvial y obras de complementarias en la zona sur del área urbana del municipio de maní, departamento de Casanare"

Periodo 29 de enero de 2020 a 7 de julio de 2020.

15. **Residente de obra- GRUPO THEOS S.A.S**

CONTRATO 0080 DE 2020: "Obras de reposición de tramos red de alcantarillado sanitario del área urbana comuna I de la ciudadela Yopal, departamento de Casanare."

Periodo: 08 de julio de 2020 a 19 de octubre de 2020.

16. Director general de Proyectos- GRUPO THEOS S.A.S

Periodo: 20 de octubre de 2020 a 28 de diciembre de 2020

17. Residente de obra - GRUPO THEOS S.A.S

CONTRATO 0300 DE 2020: "Ampliación red de alcantarillado sanitario, barrio bosques de sirivana y un sector del barrio la primavera y ampliación de red de acueducto del barrio Villas del Pedregal en el municipio de Yopal, departamento de Casanare".

Periodo 29 de diciembre de 2020 a 28 de abril de 2021

18. Director general de Proyectos- GRUPO THEOS S.A.S

Periodo: 29 de abril de 2021 a 02 de agosto de 2021.

19. Director de Proyecto - UNION TEMPORAL PLUVIAL PORE 2021

CONTRATO 030 de 2021 : "Construcción de la segunda etapa de la red de acueducto, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial y obras complementarias, para la urbanización Los centauros, municipio de Pore, departamento de Casanare".

Periodo 03 de agosto de 2021 a 16 de junio de 2022.

20. Director general de Proyectos- GRUPO THEOS S.A.S

Periodo: 17 de junio de 2022 a 27 de junio de 2023.


21. Residente de obra - VINAM INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A.S.

CONTRATO SEMPEM No. 026 DE 2023: "Realizar la optimización de la captación, aducción y tratamiento del sistema de acueducto del centro poblado Aguaclara del municipio de Sabanalarga, departamento de Casanare".

Periodo: 28 de junio de 2023 a 6 de marzo de 2024.

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

República de Colombia



La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito

con Personería jurídica reconocida por el Ministerio de Justicia
según resolución No 0198 del 19 de enero de 1973

otorgó a

Daniel Alexánder Gil Chaparro

c.c. 1.118.548.824 de Yopal
el día 5 del mes de marzo de 2013

El título de

Ingeniero Civil

En testimonio de ello se expide el presente Diploma

Presidente del Consejo Directivo

Rector

Secretario General

Folio de Grado No. 9874 Registro No. 6956 Libro de Diplomas No. [illegible]

Bogotá, D. C. 5 de marzo de 2013

276 270 8



REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.

25202-248574 CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 08/04/2013

DANIEL ALEXANDER

GIL CHAPARRO

C.C. 1118548824

ESCUELA COLOMBIANA DE

INGENIERIA JULIO GARAVITO

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Generated by CamScanner

311.044.31/3

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Ingeniero en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel. 3220102 Bogotá D.C.

Generated by CamScanner

271

274 9

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2024-2605734

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1118548824, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-248574 desde el 08 de Abril de 2013, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 607.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los uno (01) días del mes de Marzo del año dos mil veinticuatro (2024).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

3 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de Yopal es la capital del Departamento de Casanare, está situado al oriente del país, a una altura de 350 msnm. Se encuentra a una distancia de Bogotá D.C. de 355 km. La extensión del área urbana es de 10.47 km2.

Limita al norte con los municipios de Nunchía y Paya (Boyacá); al sur con los municipios de Orocué y Maní; al oriente con el Municipio de San Luis de Palenque y al occidente con los municipios de Aguazul y Labranza grande (Boyacá).

Ilustración 2. Localización general del proyecto



El área de estudio corresponde al asentamiento humano denominado Ciudadela La Bendición y la zona suroccidental, la cual se encuentra ubicada al sur del casco urbano del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a 3.8 km de distancia, partiendo de la Diagonal 47, sobre la vía que conduce al Centro Poblado de Santa Fe de Morichal, limita al Norte con la Comuna 6 y Oriente con el Caño Usivar, tiene una extensión aproximada de 745.794,30 m2.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Ilustración 3 Localización específica del proyecto



3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de construcción de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario es una iniciativa integral que comprende varias etapas y componentes esenciales para su implementación exitosa.

Se llevará a cabo la construcción de las siguientes instalaciones:

- ✓ **Redes Internas de Alcantarillado Sanitario**: Se instalarán redes de alcantarillado interno en la Ciudadela La Bendición y el plan parcial Alameda Martha Mojica (PPAMM) de Yopal para conectar las viviendas y edificios a la red principal de recolección de aguas residuales. A su vez, se implementa la construcción de cajas de inspección domiciliarias, pozos y cámaras de inspección que ayudarán a dar funcionalidad al sistema propuesto.

- ✓ **Construcción de Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR):** Se edificará una estación de bombeo de aguas residuales que comprende la construcción de dos cámaras de almacenamiento que conecta con un sistema de bombas que impulsan las aguas recogidas del sistema de alcantarillado sanitario y las conduces hasta la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

La estación de bombeo denominada "EL YOPO", está dotada de todo el equipo necesario para funcionar de manera autónoma, conectando dos 4 bombas que funcionan de 2 en 2 alternadas. A su vez, se construirá una subestación y caseta eléctrica, iluminación y cerramiento de seguridad.

- ✓ **Línea de impulsión**: Finalmente, se pretende la construcción de una línea de impulsión que permita la conducción de las aguas residuales almacenadas en la EBAR y finalizando su entrega en la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Yopal.

La implementación de este sistema de alcantarillado sanitario contribuirá significativamente a la mejora de las condiciones de salubridad y medio ambiente en la zona, al tiempo que promoverá el desarrollo sostenible y el bienestar de la comunidad.

3.2.1 ALCANCE

El proyecto inicial presenta la construcción de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudadela la bendición y zona sur occidental del municipio de Yopal y se pueden detallar en las siguientes cantidades:

Actividad	U.M.	Cantidad
SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO REDES INTERNAS		
COLECTORES RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m	33.942,23
Retiro de tubería existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	4.683,90
Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (área restringida)	m³	1.390,84
Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m³	104.058,99
Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida)	m³	101.096,30
Excavación mecánica en material común bajo agua de 6 - 8 m (área restringida)	m³	37.059,52
Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	8.410,36
Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	15.197,59
Tubería 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	30.021,62
Tubería 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (10"). Suministro e instal.	m	3.288,14

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Actividad	U.M.	Cantidad
Tubería 315 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (12"). Suministro e instal.	m	288,67
Tubería 350 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (14"). Suministro e instal.	m	343,80
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	212.505,25
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 km	m^3	31.100,40
Terraplén con material crudo de rio seleccionado T. Máx. 3" (zaranda)	m^3	1.673,03
Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	m^3-km	29.880,23
Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	Und	82.626,00
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO		
Demolición de pozos de Inspección Di=1.20m H= 1.0 a 2.0 m	Und	49,00
Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (área restringida)	m^3	1.686,61
Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m^3	2.875,10
Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida)	m^3	724,22
Excavación mecánica en material común hasta 8 m (oruga)	m^3	176,85
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.50 m	Und	131,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	Und	73,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	Und	50,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	Und	31,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	Und	31,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	Und	9,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=4.0 - 4.5 m Ø 1.50 m - Tizón	Und	7,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 4.5 - 5.0 m Ø 1.50 m - Tizón	Und	7,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizón	Und	5,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizón	Und	3,00
Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para tráfico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	Und	347,00
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	4.077,48
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 km	m^3	1.385,30
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO		
Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m^3	80.943,20
Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de rio)	m^3	7.623,72

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Actividad	U.M.	Cantidad
Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m³	13.873,56
Tubería 150 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (6"). Suministro e instal.	m	56.472,00
Kit acometida domiciliaria alcantarillado tubería corrugada PEAD 150 mm (Ø=6"). Suministro e Instal.	Und	4.706,00
Caja de inspección 80 x 80 cm	Und	4.706,00
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	55.060,20
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 km	m³	25.883,00
CAMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO		
Excavación mecánica en material común hasta 8 m (oruga)	m³	30.33,58
Relleno con material sub base triturado tamaño máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	33,77
Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	7,92
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	26.441,80
Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas	m³	284,93
Dilatación en Cinta PVC-022	m	930,40
Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para tráfico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	Und	11,00
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	2.365,29
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Km	m³	668,29
EMISARIOS ENTREGA EBAR		
COLECTORES RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		
Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m	6.093,75
Retiro de tubería existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	193,50
Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m³	17.401,47
Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida)	m³	144.245,85
Excavación mecánica en material común bajo agua de 6 - 8 m (área restringida)	m³	5.489,75
Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	2.767,52
Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	8.653,63
Tubería 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	558,67
Tubería 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (10"). Suministro e instal.	m	336,15

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Actividad	U.M.	Cantidad
Tubería 400 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (16"). Suministro e instal.	m	1.380,46
Tubería 350 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (20"). Suministro e instal.	m	301,56
Tubería 600 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	1.410,38
Tubería 800 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (32"). Suministro e instal.	m	148,96
Tubería 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). Suministro e instal.	m	1.185,13
Tubería 1200 mm PEAD SN8 estructurada (48"). Suministro e instal.	m	772,44
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	149.141,48
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 km	m^3	17.995,59
Terraplén con material crudo de rio seleccionado T. Máx. 3" (zaranda)	m^3	180,00
Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	m^3-km	3.214,80
Perforación horizontal dirigida (PHD) Ø24", para instalación de red de tubería PE100, PN16, 400 mm (16") en terreno limo arcilloso	m	434,62
Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	Und	45.687,00
POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO		
Demolición de pozos de Inspección Di=1.20m H= 1.0 a 2.0 m	Und	10,00
Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m^3	875,15
Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida)	m^3	709,11
Excavación mecánica en material común hasta 8 m (oruga)	m^3	1.788,14
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	Und	5,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	Und	4,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	Und	2,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	Und	1,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	Und	2,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=2.0 - 3.0 m Ø 2.0 m	Und	14,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=3.0 - 4.0 m Ø 2.0 m	Und	3,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=4.0 - 5.0 m Ø 2.0 m	Und	7,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizón	Und	8,00
Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizón	Und	17,00
Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para tráfico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	Und	63,00

Actividad	U.M.	Cantidad
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	2.581,52
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 km	m³	790,88
CAMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO		
Excavación mecánica en material común hasta 8 m (oruga)	m³	5.248,86
Relleno con material sub base triturado tamaño máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	61,40
Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	14,40
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	46.609,12
Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas	m³	514,04
Dilatación en Cinta PVC-022	m	1.680,00
Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para tráfico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	Und	20,00
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	4.043,62
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 km	m³	1.205,24
LÍNEA DE IMPULSION		
Replanteo y localización de tuberías de acueducto	m	3.753,26
Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m³	28.607,38
Excavación a mano en material común	m³	12,24
Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	1.546,32
Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	6.138,41
Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=560 mm = 22"	m	3.753,26
Codo TE 45° PE 100 - RDE 17 PN 10 560 mm tope Ø=22"	Und	8,00
Codo TE 90° PE 100 - RDE 17 PN 10 560 mm tope Ø=22"	Und	4,00
Relleno con material sub base triturado tamaño máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	1,18
Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m³	0,28
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 Psi	m³	1,56
Pedestal en concreto de 3000 psi	m³	2,31
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	404,74
Estructura metálica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg	3.524,97

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Actividad	U.M.	Cantidad
Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg	268,88
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	19.647,72
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 km	m³	8.971,90
CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)		
ESTACION DE BOMBEO		
Descapote a maquina	m²	1.653,51
Excavación mecánica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m³	4.435,46
Excavación mecánica en material común bajo agua de 6 - 8 m (área restringida)	m³	2.132,04
Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	14,65
Excavación mecánica en material conglomerado bajo agua de 6 - 14 m	m³	1.162,85
Relleno con material sub base triturado tamaño máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	146,46
Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas e= 2. mm	m²	824,24
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	4.741,08
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 km	m³	1.826,42
Concreto 4500 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas	m³	691,34
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	56.957,81
Muro en bloque No. 5 arcilla estándar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m²	93,10
Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	m²	1,40
Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m²	186,19
Estructura metálica en Acero ASTM - A1011 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg	388,75
Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal.	m²	73,98
Canastilla metálica para retención de solidos A=1.44 m, L=2.0 m, H=0.81 m	Und	1,00
Rejilla para retención de solidos finos en platina de 2 x 1/4" de 1.17 x 0.90 m. Incluye. marco, contramarco e instalación.	Und	2,00
Codo 90° Ø=8" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	Und	4,00
Codo 90° Ø=12" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	Und	4,00
Codo 90° Ø=14" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	Und	1,00

Actividad	U.M.	Cantidad
Codo 90° Ø=16" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	Und	1,00
Pasamuro en A.C. Ø=12" L=1.10 m E.B x E.B. Suministro e Instal.	Und	4,00
Pasamuro en A.C. Ø=16" L=1.00 m E. B x E.B. Suministro e Instal.	Und	1,00
Niple Ø= 14" en A.C. con E.B x E.B. L=0.50 m. Suministro e instal	Und	4,00
Niple Ø= 12" en A.C. con E.B x E.B. L=0.70 m. Suministro e instal	Und	1,00
Reducción H.D 12" X 8" E.B. Suministro e Instal	Und	4,00
Reducción H.D 14" X 12" E.B Suministro e Instal	Und	1,00
Reducción H.D 16" X 14" E.B Suministro e Instal	Und	2,00
Tee en H.D. 14" x 14" E.B.x E. B Suministro e Instal.	Und	1,00
Tee en H.D. 14" x 12" E.B.x E. B Suministro e Instal.	Und	3,00
Válvula de ventosa 6". Cámara doble acción múltiple E.B. Suministro e instal.	Und	4,00
Tubería en acero negro (acero al carbón) SCH 40 3". Suministro e instal.	m	7,49
Tapón en H.D. Ø=14" J.H. Suministro e Instal.	Und	1,00
Diferencial 3 tn con cadena Crosby 3.0 m. Suministro e Instal.	Und	2,00
Válvula de mariposa en HD Ø 12" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo volante. Suministro e Instal.	Und	4,00
Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 400 mm Ø=16".	Und	1,00
Brida metálica DN 16 PLG (400mm) ANSI CL 150. Suministro e Instal.	Und	1,00
Codo 45° Ø=16" PEAD PN10. Suministro e instal.	Und	2,00
Tapa en lamina alfajor 1/4" con contramarco en Angulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.	m^2	1,62
Baranda en tubo galvanizado de 2", cal 1.5 mm (inc. anticorrosivo, pintura) h=0.90 m REVISAR y AJUSTAR	m	18,52
Viga aérea en concreto de resistencia 4500 psi	m^3	2,64
Columna en concreto de resistencia 4500 psi	m^3	5,56
Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m^2	14,04
Columneta de 0.12 x 0.10 en concreto resistencia 4500 Psi sin refuerzo	m	5,40
Estructura metálica en Acero ASTM - A572 G-50 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje).	kg	1.148,91
Cerramiento, en ciclópeo, viga, muro en concreto reforzado a la vista (0.20 x 1.0 m), tubo con brazo, platina, Angulo, malla eslabonada y 3 hilos alambre de púas.	m	143,82

Actividad	U.M.	Cantidad
Portón en lamina cold rolled cal 18 de doble hoja con puerta de acceso, cerradura y con marco en tubo estructural 2" x 2.5 mm, anticorrosivo y pintura. Suministro e instal.	m²	49,92
Tubería A.C S/C SCH 40 Ø 12" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	11,53
Tubería A.C S/C SCH 40 Ø 14" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	4,00
Tubería A.C S/C SCH 40 Ø 16" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	2,04
Codo 90° Ø=3" acero negro 150 PSI A197 Rosca. Suministro e Instal.	Und	1,00
Reducción Ø= 3" x 1 1/2" acero al carbón SCH 40. Suministro e Instal.	Und	1,00
Bomba sumergible con impulsor cerrado de 1.9hp con motor sumergible eléctrico estándar conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz, incluye tablero de fuerza y control para 1 bomba de 1.4 Kw/ 1.9Hp / 460 VAC. Suministro, Instal. y puesta en marcha.	Und	1,00
Bomba sumergible en pozo seco de 185hp con motor sumergible eléctrico estándar conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz. Suministro, Instal. y puesta en marcha.	Und	4,00
Tablero de fuerza y control para 2 bombas de 138 Kw/ 185Hp / 460 VAC. Suministro e Instal.	Und	2,00
Reducción Ø=22"x 20" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	Und	1,00
Reducción Ø=20"x 16" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	Und	1,00
Cheque cortina Ø=12" E.B. A.C 150 PSI. Suministro e instal.	Und	4,00
Cheque cortina Ø=16" E.B. A.C 150 PSI. Suministro e instal.	Und	1,00
Compuerta mural deslizante tipo guillotina DN 48"(1200 mm) x 48"(1200mm), S/AWWA C561; estructura y guías asiento en acero inoxidable AISI 304, incluye accesorios, soportes, anclajes y vástago de 7 m	Und	3,00
CASETA ELECTRICA		
Losa maciza elevada en concreto de 4000 psi, e= 0.1 m tipo metaldeck - terrazas.	m²	78,22
Viga aérea en concreto de resistencia 4000 psi	m³	5,57
Columna en concreto de resistencia 4000 psi	m³	3,78
Zapata en concreto para cimentación de resistencia 4000 Psi	m³	6,18
Viga de amarre para cimentación en concreto de 4000 Psi	m³	4,22
Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m reforzado con malla electrosoldada Q-5	m²	78,22
Acero de Refuerzo Grado 60	kg	2.898,78
Muro en bloque No. 5 arcilla estándar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m²	94,14

Actividad	U.M.	Cantidad
Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	m²	3,00
Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m²	188,26
Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m²	19,50
Excavación manual en conglomerado	m³	71,66
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	60,46
Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 km	m³	11,20
Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m³	11,57
Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m²	27,46
RED DE MEDIA TENSION		
Replanteo en media tensión	km	0,44
Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	Und	10,00
Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	Und	3,00
Poste de concreto 12 m x 510 Kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.	Und	7,00
Cimentación poste de 10/12 m.	Und	3,00
Estructura 730 derivación trifásica con cortacircuito, con cruceta metálica doble de 2 m, aislador de suspensión sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	Und	1,00
Descargadores de sobre tensión (juego/3) 15 kV cambio red compacta abierta. Suministro e instalación.	Und	2,00
Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida	Und	7,00
Espaciador angular 15 KV. Suministro e instalación.	Und	39,00
Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 KV final de circuito, suministro y vestida	Und	5,00
Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 1/4" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado	m	438,00
Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e instalación.	Und	5,00
Red compacta en media tensión en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x N.º 1/0), suministro, tendido y tensionado	m	438,00
Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 4", uniones galvanizadas, boquilla, curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalación.	Und	1,00
Caja de inspección CS-275	Und	2,00

Actividad	U.M.	Cantidad
Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m^3	13,21
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	8,37
Canalización ducto Conduit PVC DB tipo pesado 4 x4", zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavada de rio.	m	20,55
Suministro e instalación acometida subterránea media tensión en conductor 3 x Nº 1/0 AWG XLPE-15 KV, 133%	m	40,38
Terminales premoldeados y cono de alivio tipo exterior para red de media tensión 15 KV calibre N° 1/0 XLPE (jgo/3). Suministro e instalación.	Und	1,00
SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN		
Suministro, transporte e instalación de celda de medida en media tensión, Medidor trifásico multifuncional, con registro de demanda y telemedida. Incluye TC's TP's, calibración	Und	1,00
Suministro e instalación Celda de protección con seccionador en aire 17,5 kV / 16 kA NORMA CTS 506-2	Und	1,00
Suministro e instalación Celda para transformador seco de hasta 500 KVA 15 KV	Und	1,00
Transformador de potencia trifásico de 400 KVA tipo seco clase H para nivel de tensión 13200/440V-254 frecuencia de operación 60 Hz. Suministro e instalación.	Und	1,00
Construcción malla de puesta a tierra para cuarto eléctrico. Incluye: Cable de cobre desnudo N° 4/0, excavación y relleno, soldaduras exotérmicas	Und	1,00
Terminales premoldeados y cono de alivio tipo interior para red de media tensión 15 kV calibre N.º 1/0 XLPE (jgo/3) suministro e instalación	Und	5,00
DPS 12 kV 10 kA protección transformador tipo seco (jgo/3). Suministro e instalación.	Und	1,00
Suministro e instalación acometida subterránea media tensión en conductor 3 x N.º 2 AWG XLPE-15 KV, 133%	m	8,00
Caja de inspección AP-280	Und	6,00
CUARTO ELECTRICO		
Transferencia automática para planta de emergencia de 500 KVA.	Und	1,00
Suministro e instalación de Gabinete metálico de 150x2.00x060 m incluye totalizador principal breakers borneras barraje de distribución barraje electro plateado marquillado elementos de sujeción y pruebas.	Und	1,00
Suministro e instalación de banco de condensadores, incluye: Gabinete metálico de 1x0,80x0,70 m, controlador automático de factor de potencia, transformador de corriente, contactor para condensador, reactancia de rechazo y accesorios	Und	1,00

Actividad	U.M.	Cantidad
Autotransformador 20 KVA baja - baja 440 V./ 208 - 120 V. tipo seco trifásico conexión estrella grupo de conexión Dy5 protección IP. Suministro e instalación.	Und	1,00
Cárcamo en concreto 3000 psi 0.60 x 0.60 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	m	2,81
Cárcamo en concreto 3000 psi 0.30 x 0.30 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	m	18,24
Tapa en lamina alfajor 1/8" con marco en Angulo de 1 1/22X3/16" pintada. Suministro e instalación	m²	4,30
Tablero protección trifásico de 12 puestos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación	Und	1,00
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (2 N° 500MCM) + 1N° 4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	23,90
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 3(1 N° 500 MCM) + 1N°4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	35,74
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	18,68
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (N° 6) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	5,51
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 3 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	11,67
Interruptor termomagnético regulable 32A a 40A 25kA. Suministro e instalación.	Und	1,00
Cortacircuito termomagnético de 1 x (10A-60A) 120/240 V 10 KA enchufable. Suministro e instalación.	Und	2,00
Cortacircuito termomagnético bipolar de 15-30A 10kA 120/240V. Suministro e instalación	Und	1,00
Cortacircuito termomagnético tripolar de 15 - 60A 120/340 V. enchufable. Suministro e instalación.	Und	2,00
Canalización ducto Conduit PVC 1" zona dura.	m	7,86
ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN		
Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	13,58
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	9,98
Canalización ducto Conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	17,64
Suministro e instalación de tubería IMC de 3"	m	63,40
Suministro e instalación de tubería IMC de 1"	m	85,94

Actividad	U.M.	Cantidad
Canalización Conduit PVC DB tipo pesado 2 x 1", zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavada de rio.	m	29,57
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 3(1 N° 500 MCM) + 1N°4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C.	m	147,06
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	6,00
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 3 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	42,00
PLANTA DE EMERGENCIA		
Suministro e instalación de planta eléctrica de 438 KVA, tipo Diesel, velocidad de 1800RPM, trifásica. Incluye tablero de control de motor y generador, breaker tipo industrial, cabina insonora tipo interior y sistema de escape de gases.	Und	1,00
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (2 N° 500MCM) + 1N° 4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	10,23
INSTALACIÓNES INTERNAS		
Tablero de protección trifásico 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	Und	1,00
Cortacircuito termomagnético de 1 x (10A-60A), 120/240 V, 10 KA, enchufable. Suministro e instalación.	Und	4,00
Cortacircuito termomagnético bipolar de 15 - 30A, 10 KA, 120/240 V. Suministro e instalación.	Und	1,00
Cortacircuito termomagnético tripolar de 15 - 60A, 120/340 V. enchufable. Suministro e instalación.	Und	4,00
Canalización ducto Conduit PVC 1", zona dura.	m	1,50
Salida para iluminación, en tubería metálica tipo Conduit EMT 1/2". Incluye: caja metálica semipesado 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa.	Und	19,00
Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plástica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	Und	9,00
Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalación	Und	9,00
Salida para toma corriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: Tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xN° 12 + 1x12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	Und	8,00
Salida para tomacorriente doble bifásico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2xn°10 + 1xN°12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	Und	2,00

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Actividad	U.M.	Cantidad
Salida para tomacorriente trifásico con polo a tierra incluye: tubo EMT tipo pesado 1" cable de cobre aislado THWN 3x10 +1x12T AWG caja metálica 2400 tipo honda terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	Und	2,00
Luminaria tipo led hermética IP65, 36W, 3500 lm, 120x8 cm. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación.	Und	19,00
Luminaria de emergencia tipo led 110V, 2.4W, autonomía mínima 90 minutos. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	3,00
Letrero luminoso de emergencia SALIDA. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación	Und	3,00
Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	Und	5,00
Salida para interruptor conmutable sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	Und	1,00
Salida para interruptor doble conmutable, línea decorativa incluye: Tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro	Und	1,00
ALUMBRADO PÚBLICO		
Caja de inspección AP-280	Und	7,00
Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m^3	26,30
Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	19,72
Canalización Conduit PVC tipo pesado 2x3/4" zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavado de rio.	m	111,09
Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x10 + 1x8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C.Suministro e instalación.	m	118,59
Luminaria led 30-60W, 7P, 4230-8460 lm, 4000K, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda, cableado y empalmes de derivación. Suministro e instalación.	Und	7,00
Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo con altura de montaje de 6 m. incluye: pernos de anclaje puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalación	Und	7,00

3.3 TRAMOS A INTERVENIR

✓ PLAN PARCIAL ALAMEDA MARTHA MOJICA

Tabla 6. Tramos a intervenir en PPAMM

No	Calle / Carrera	Desde	Hasta
1	Calle 90	Carrera 7 Oeste	Carrera 1
2	Calle 90A	Carrera 2A Oeste	Carrera 1
3	Calle 90B	Carrera 2A Oeste	Carrera 1C Oeste
4	Calle 90C	Carrera 2A Oeste	Carrera 1C Oeste
5	Calle 91	Transversal 1	Carrera 1C Oeste
6	Calle 90A	Carrera 1B Oeste	Carrera 1
7	Calle 90B	Carrera 1B Oeste	Carrera 1
8	Transversal 1	Carrera 4 Oeste	Carrera 1
9	Calle 90C	Carrera 7B Oeste	Carrera 7 Oeste
10	Calle 92	Carrera 7B Oeste	Carrera 4 Oeste
11	Calle 92B	Carrera 7B Oeste	Carrera 4 Oeste
12	Calle 92B BIS	Carrera 8 Oeste	Carrera 3 Oeste
13	Calle 92C	Carrera 7A Oeste	Carrera 3 Oeste
14	Calle 93	Carrera 7A Oeste	Carrera 3 Oeste
15	Calle 93A	Carrera 7A Oeste	Carrera 7 Oeste
16	Calle 93B	Carrera 7 Oeste	Carrera 3 Oeste
17	Calle 94	Carrera 7A Oeste	Carrera 3 Oeste
18	Calle 94A	Carrera 7 Oeste	Carrera 3 Oeste
19	Calle 94B	Carrera 7 Oeste	Carrera 3 Oeste
20	Calle 95	Carrera 8 Oeste	Carrera 1
21	Calle 95A	Carrera 7 BIS Oeste	Carrera 4 Oeste
22	Calle 95B	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
23	Calle 95C	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
24	Calle 95D	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
25	Calle 96	Carrera 7 BIS Oeste	Carrera 4 Oeste
26	Calle 96A	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
27	Calle 97	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
28	Calle 97A	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
29	Calle 97B	Carrera 7 Oeste	Carrera 4 Oeste
30	Transversal 3 Oeste	Calle 92	Calle 92B BIS
31	Transversal 3A Oeste	Carrera 4 Oeste	Calle 92B BIS

No	Calle / Carrera	Desde	Hasta
32	Carrera 8	Calle 90	Calle 95
33	Carrera 7B Oeste	Calle 90C	Calle 92B
34	Carrera 7A Oeste	Calle 90C	Calle 95
35	Carrera 7 BIS Oeste	Calle 90C	Calle 92B
36	Carrera 7 BIS Oeste	Calle 93A	Calle 95
37	Carrera 7 BIS Oeste	Calle 95A	Calle 96
38	Carrera 7 Oeste	Calle 90	Calle 97B
39	Carrera 6 Oeste	Calle 92	Calle 92B
40	Carrera 5 Oeste	Calle 92	Calle 92B
41	Carrera 4 Oeste	Calle 92	Calle 93
42	Carrera 4 Oeste	Calle 92B BIS	Calle 95
43	Carrera 6 Oeste	Calle 93	Calle 93B
44	Carrera 5 Oeste	Calle 93	Calle 93B
45	Carrera 4 Oeste	Calle 93	Calle 97B
46	Carrera 3B Oeste	Calle 93	Calle 93B
47	Carrera 3A Oeste	Calle 93	Calle 93B
48	Carrera 4 Oeste	Calle 90	Transversal 1
49	Carrera 3 Oeste	Calle 90	Transversal 1
50	Carrera 2A Oeste	Calle 90	Transversal 1
51	Carrera 2 Oeste	Calle 90	Calle 90C
52	Carrera 1C Oeste	Calle 90	Transversal 1
53	Carrera 1B BIS Oeste	Calle 90A	Transversal 1
54	Carrera 1B Oeste	Calle 90	Transversal 1
55	Carrera 1B Oeste	Calle 90	Transversal 1
56	Carrera 1A BIS Oeste	Calle 90A	Transversal 1
57	Carrera 1A Oeste	Calle 90A	Transversal 1
58	Carrera 1 BIS Oeste	Calle 90A	Transversal 1
59	Carrera 1	Calle 90	Calle 95
57	Carrera 1A Oeste	Calle 90A	Transversal 1
58	Carrera 1 BIS Oeste	Calle 90A	Transversal 1
59	Carrera 1	Calle 90	Calle 95

- ✓ **CIUDADELA LA BENDICIÓN**

En la ciudadela la bendición, se proyecta intervenir el 100% de las vías de esta zona. No se tiene listado de vías a intervenir debido a que a la fecha no se tienen nomenclaturas oficiales para este sector, por tanto, la ubicación de referencia utilizada esta plasmada en los planos de la etapa de formulación.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

4 ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

4.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Tabla 7. Disponibilidad presupuestal

DESCRIPCIÓN	NUMERO	FECHA	VALOR
CDP: CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4423	25/09/2023	$ 88.842.008.646,00
	CDR092500001	25/09/2023	
RP: REGISTRO PRESUPUESTAL	5023	18/12/2023	$ 83.611.009.207,00
	RPR121800001	18/12/2023	

4.2 VALOR DEL PROYECTO

Tabla 8. Relación de costos del proyecto

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL	**$ 62.126.737.865,00**
% ADMINISTRACIÓN (27%)	$ 16.774.219.224,00
% IMPREVISTOS (2%)	$ 1.242.534.757,00
% UTILIDADES (5%)	$ 3.106.336.893,00
VALOR TOTAL DE OBRA CIVIL CON AIU	**$ 83.249.828.739,00**
VALOR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$50.629.860,00
VALOR PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$263.188.608,00
RETIE	$36.652.000,00
RETILAP	$10.710.000,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA	**$83.611.009.207,00**

4.2.1 CÁLCULOS DE COSTOS INDIRECTOS A.I.U

Tabla 9. Desglose del AIU

1	ADMINISTRACIÓN	% INCIDENCIA	VALOR
		27%	$ 16.774.219.224,00
2	IMPREVISTOS	% INCIDENCIA	VALOR
		2%	$ 1.242.534.757,00
3	UTILIDAD	% INCIDENCIA	VALOR
		5%	$ 3.106.336.893,00
	TOTAL	34%	**$ 21.123.090.874,00**

4.2.2 ANÁLISIS DEL FACTOR PRESTACIONAL

Tabla 10. Factor prestacional

DESCRIPCIÓN	%
A. SUELDOS	
SALARIO BÁSICO	100,00%
B. PRESTACIONES SOCIALES	
PRESTACIONES LEGALES	21,82%
APORTES PARAFISCALES	4,00%
SEGURIDAD SOCIAL	18,96%
OTROS COSTOS PRESTACIONALES	25,27%
FACTOR PRESTACIONAL (A+B) /100	**170,00%**

4.3 FLUJO DE CAJA DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 11. Flujo semanal de obra

SEMANA	FECHA	INVERSIÓN	INVERSIÓN ACUMULADA
1	Del 13 de febrero 2024 al 19 de febrero de 2024	$ -	$ -
2	Del 20 de febrero 2024 al 29 de febrero de 2024	$ -	$ -
3	Del 01 de marzo 2024 al 07 de marzo de 2024	$ 110.972.674,00	$ 110.972.674,00
4	Del 11 de marzo 2024 al 14 de marzo de 2024	$ 14.840.403,00	$ 120.405.625,00
5	Del 18 de marzo 2024 al 21 de marzo de 2024	$ 14.840.403,00	$ 135.246.028,00
6	Del 22 de marzo 2024 al 31 de marzo de 2024	$ 14.840.403,00	$ 155.493.871,00

4.4 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Tabla 12. Plan de inversión del anticipo

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES	60%	$ 25.083.302.762,10
PAGOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL	20%	$ 8.361.100.920,70
ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	20%	$ 8.361.100.920,70
TOTAL	**100%**	**$ 41.805.504.603,50**

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

4.5 AVANCE DEL ANTICIPO

A corte del presente informe mensual no se presenta inversión o soportes de gastos del anticipo del contrato

Tabla 13. Gastos de anticipo


ÍTEM	No. FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
---	---	---	---	---	---

4.6 ESTADO FINANCIERO ACTUAL DEL CONTRATO

Tabla 14. Estado financiero del contrato

DESCRIPCIÓN	DEBITO	HABER	SALDO
ANTICIPO	$ 41.805.504.603,50		
GASTO MES No. 1		$ 0.00	$ 41.805.504.603,50
GASTO MES No. 2		$ 0.00	$ 41.805.504.603,50

Ilustración 4. Grafica valor gastado vs valor restante de anticipo

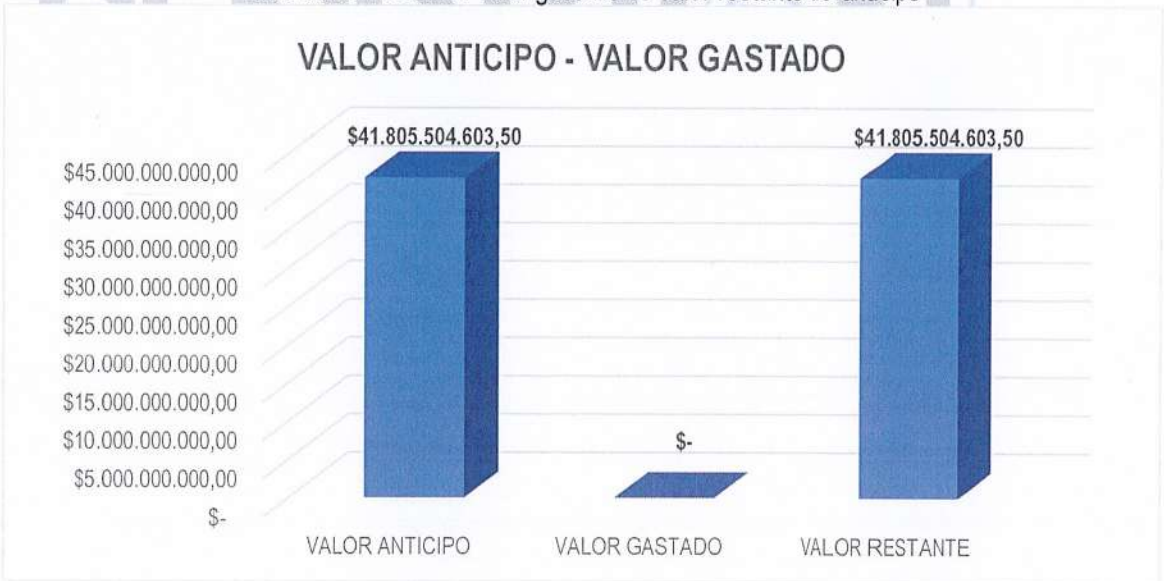

4.7 CUADRO DEL AVANCE DE OBRA

Ilustración 5. Porcentaje de avance del contrato

DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE RESPECTO DEL VALOR Y TIEMPO DEL CONTRATO
PROGRAMADO	$ 53.045.704,50	0,06%
EJECUTADO	$ 155.493.871,00	0,19%
DIFERENCIA	$ 102.448.166,50	0,12%
TIEMPO TRANSCURRIDO EN DÍAS	48 DÍAS	6,57%

CONSORCIO BENDICIÓN 23

5 AVANCE DEL PROYECTO

5.1 ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
	PRELIMINARES										
1	**SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO REDES INTERNAS**										
1,1	**COLECTORES RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO**										
1.1.01	Replanteo y localización de tuberias de alcantarillado	m	33.942,23	$ 7.697,00	$ 261.253.344,31		$ -		$ -	33.942,23	$ 261.253.344,31
1.1.02	Retiro de tubería existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	4.683,90	$ 13.837,00	$ 64.811.124,30		$ -		$ -	4.683,90	$ 64.811.124,30
1.1.03	Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (área restringida)	m³	1.390,84	$ 12.650,00	$ 17.594.126,00		$ -		$ -	1.390,84	$ 17.594.126,00
1.1.04	Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m³	104.058,99	$ 14.787,00	$ 1.538.720.285,13		$ -		$ -	104.058,99	$ 1.538.720.285,13
1.1.05	Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida)	m³	101.096,30	$ 17.096,00	$ 1.728.342.344,80		$ -		$ -	101.096,30	$ 1.728.342.344,80
1.1.06	Excavación mecánica en material común bajo agua de 6 - 8 m (área restringida)	m³	37.059,52	$ 32.695,00	$ 1.211.661.006,40		$ -		$ -	37.059,52	$ 1.211.661.006,40
1.1.07	Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	8.410,36	$ 104.382,00	$ 877.890.197,52		$ -		$ -	8.410,36	$ 877.890.197,52
1.1.08	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	15.197,59	$ 158.775,00	$ 2.412.997.352,25		$ -		$ -	15.197,59	$ 2.412.997.352,25
1.1.09	Tubería 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	30.021,62	$ 94.811,00	$ 2.846.379.813,82		$ -		$ -	30.021,62	$ 2.846.379.813,82
1.1.10	Tubería 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (10"). Suministro e instal.	m	3.288,14	$ 135.981,00	$ 447.124.565,34		$ -		$ -	3.288,14	$ 447.124.565,34
1.1.11	Tubería 315 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (12"). Suministro e instal.	m	288,67	$ 176.191,00	$ 50.861.055,97		$ -		$ -	288,67	$ 50.861.055,97

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1.1.12	Tuberia 350 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (14"). Suministro e instal.	m	343,80	$ 239.860,00	$ 82.463.868,00		$ -		$ -	343,80	$ 82.463.868,00
1.1.13	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	212.505,25	$ 42.117,00	$ 8.950.083.614,25		$ -		$ -	212.505,25	$ 8.950.083.614,25
1.1.14	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Km	m³	31.100,40	$ 18.999,00	$ 590.876.499,60		$ -		$ -	31.100,40	$ 590.876.499,60
1.1.15	Terraplén con material crudo de rio seleccionado T. Máx. 3" (zaranda)	m³	1.673,03	$ 82.667,00	$ 138.304.371,01		$ -		$ -	1.673,03	$ 138.304.371,01
1.1.16	Transporte de material Pétreo (via pavimentada)	m³-km	29.880,23	$ 2.143,00	$ 64.033.332,89		$ -		$ -	29.880,23	$ 64.033.332,89
1.1.17	Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	Und	82.626,00	$ 15.682,00	$ 1.295.740.932,00		$ -		$ -	82.626,00	$ 1.295.740.932,00
1,2	POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO										
1.2.01	Demolición de pozos de Inspección Di=1.20m H= 1.0 a 2.0 m	Und	49,00	$ 189.711,00	$ 9.295.839,00		$ -		$ -	49,00	$ 9.295.839,00
1.2.02	Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (área restringida)	m³	1.686,61	$ 12.650,00	$ 21.335.616,50		$ -		$ -	1.686,61	$ 21.335.616,50
1.2.03	Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m³	2.875,10	$ 14.787,00	$ 42.514.103,70		$ -		$ -	2.875,10	$ 42.514.103,70
1.2.04	Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida)	m³	724,22	$ 17.096,00	$ 12.381.265,12		$ -		$ -	724,22	$ 12.381.265,12
1.2.05	Excavación mecánica en material común hasta 8 m (oruga)	m³	176,85	$ 12.711,00	$ 2.247.940,35		$ -		$ -	176,85	$ 2.247.940,35
1.2.06	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.50 m	Und	131,00	$ 3.919.429,00	$ 513.445.199,00		$ -		$ -	131,00	$ 513.445.199,00
1.2.07	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	Und	73,00	$ 4.710.178,00	$ 343.842.994,00		$ -		$ -	73,00	$ 343.842.994,00
1.2.08	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	Und	50,00	$ 5.513.216,00	$ 275.660.800,00		$ -		$ -	50,00	$ 275.660.800,00
1.2.09	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	Und	31,00	$ 6.358.014,00	$ 197.098.434,00		$ -		$ -	31,00	$ 197.098.434,00
1.2.10	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	Und	31,00	$ 7.237.066,00	$ 224.349.046,00		$ -		$ -	31,00	$ 224.349.046,00
1.2.11	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	Und	9,00	$ 7.974.510,00	$ 71.770.590,00		$ -		$ -	9,00	$ 71.770.590,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1.2.12	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=4.0 - 4.5 m Ø 1.50 m - Tizón	Und	7,00	$ 9.206.009,00	$ 64.442.063,00		$ -		$ -	7,00	$ 64.442.063,00
1.2.13	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 4.5 - 5.0 m Ø 1.50 m - Tizón	Und	7,00	$ 9.995.714,00	$ 69.969.998,00		$ -		$ -	7,00	$ 69.969.998,00
1.2.14	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizón	Und	5,00	$ 17.927.796,00	$ 89.638.980,00		$ -		$ -	5,00	$ 89.638.980,00
1.2.15	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizón	Und	3,00	$ 19.325.067,00	$ 57.975.201,00		$ -		$ -	3,00	$ 57.975.201,00
1.2.16	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para tráfico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	Und	347,00	$ 1.957.007,00	$ 679.081.429,00		$ -		$ -	347,00	$ 679.081.429,00
1.2.17	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	4.077,48	$ 42.117,00	$ 171.731.225,16		$ -		$ -	4.077,48	$ 171.731.225,16
1.2.18	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Km	m³	1.385,30	$ 18.999,00	$ 26.319.314,70		$ -		$ -	1.385,30	$ 26.319.314,70
1,3	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO										
1.3.01	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m³	80.943,20	$ 62.525,00	$ 5.060.973.580,00		$ -		$ -	80.943,20	$ 5.060.973.580,00
1.3.02	Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	7.623,72	$ 104.382,00	$ 795.779.141,04		$ -		$ -	7.623,72	$ 795.779.141,04
1.3.03	Relleno en arena lavada apisonada para atraque de la tubería con transporte	m³	13.873,56	$ 113.688,00	$ 1.577.257.289,28		$ -		$ -	13.873,56	$ 1.577.257.289,28
1.3.04	Tubería 150 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (6"). Suministro e instal.	m	56.472,00	$ 62.991,00	$ 3.557.227.752,00		$ -		$ -	56.472,00	$ 3.557.227.752,00
1.3.05	Kit acometida domiciliaria alcantarillado tubería corrugada PEAD 150 mm (Ø=6") . Suministro e Instal.	Und	4.706,00	$ 183.924,00	$ 865.546.344,00		$ -		$ -	4.706,00	$ 865.546.344,00
1.3.06	Caja de inspección 80 x 80 cm	Und	4.706,00	$ 707.207,00	$ 3.328.116.142,00		$ -		$ -	4.706,00	$ 3.328.116.142,00
1.3.07	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	55.060,20	$ 42.117,00	$ 2.318.970.443,40		$ -		$ -	55.060,20	$ 2.318.970.443,40
1.3.08	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Km	m³	25.883,00	$ 18.999,00	$ 491.751.117,00		$ -		$ -	25.883,00	$ 491.751.117,00
1,4	CAMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO										

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1.4.01	Excavación mecánica en material común hasta 8 m (oruga)	m³	3.033,58	$ 12.711,00	$ 38.559.835,38		$ -		$ -	3.033,58	$ 38.559.835,38
1.4.02	Relleno con material sub base triturada tamaño Máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	33,77	$ 143.862,00	$ 4.858.219,74		$ -		$ -	33,77	$ 4.858.219,74
1.4.03	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	7,92	$ 734.316,00	$ 5.815.782,72		$ -		$ -	7,92	$ 5.815.782,72
1.4.04	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	26.441,80	$ 9.450,00	$ 249.875.010,00		$ -		$ -	26.441,80	$ 249.875.010,00
1.4.05	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas	m³	284,93	$ 1.647.519,00	$ 469.427.588,67		$ -		$ -	284,93	$ 469.427.588,67
1.4.06	Dilatación en Cinta PVC-022	m	930,40	$ 135.858,00	$ 126.402.283,20		$ -		$ -	930,40	$ 126.402.283,20
1.4.07	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para tráfico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	Und	11,00	$ 1.957.007,00	$ 21.527.077,00		$ -		$ -	11,00	$ 21.527.077,00
1.4.08	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	2.365,29	$ 42.117,00	$ 99.618.918,93		$ -		$ -	2.365,29	$ 99.618.918,93
1.4.09	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Km	m³	668,29	$ 18.999,00	$ 12.696.841,71		$ -		$ -	668,29	$ 12.696.841,71
2	**EMISARIOS ENTREGA EBAR**										
2,1	**COLECTORES RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO**										
2.1.01	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m	6.093,75	$ 7.697,00	$ 46.903.593,75		$ -		$ -	6.093,75	$ 46.903.593,75
2.1.02	Retiro de tubería existente con manejo de aguas residuales de 0" a 12"	m	193,50	$ 13.837,00	$ 2.677.459,50		$ -		$ -	193,50	$ 2.677.459,50
2.1.03	Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m³	17.401,47	$ 14.787,00	$ 257.315.536,89		$ -		$ -	17.401,47	$ 257.315.536,89
2.1.04	Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida)	m³	144.245,85	$ 17.096,00	$ 2.466.027.051,60		$ -		$ -	144.245,85	$ 2.466.027.051,60
2.1.05	Excavación mecánica en material común bajo agua de 6 - 8 m (área restringida)	m³	5.489,75	$ 32.695,00	$ 179.487.376,25		$ -		$ -	5.489,75	$ 179.487.376,25
2.1.06	Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	2.767,52	$ 104.382,00	$ 288.879.272,64		$ -		$ -	2.767,52	$ 288.879.272,64

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.1.07	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	8.653,63	$ 158.775,00	$ 1.373.980.103,25		$ -		$ -	8.653,63	$ 1.373.980.103,25
2.1.08	Tuberia 200 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (8"). Suministro e instal.	m	558,67	$ 94.811,00	$ 52.968.061,37		$ -		$ -	558,67	$ 52.968.061,37
2.1.09	Tuberia 250 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (10"). Suministro e instal.	m	336,15	$ 135.981,00	$ 45.710.013,15		$ -		$ -	336,15	$ 45.710.013,15
2.1.10	Tuberia 400 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (16"). Suministro e instal.	m	1.380,46	$ 361.924,00	$ 499.621.605,04		$ -		$ -	1.380,46	$ 499.621.605,04
2.1.11	Tuberia 350 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (20"). Suministro e instal.	m	301,56	$ 468.560,00	$ 141.298.953,60		$ -		$ -	301,56	$ 141.298.953,60
2.1.12	Tuberia 600 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (24"). Suministro e instal.	m	1.410,38	$ 625.130,00	$ 881.670.849,40		$ -		$ -	1.410,38	$ 881.670.849,40
2.1.13	Tuberia 800 mm PEAD SN8 alcantarillado corrugada (32"). Suministro e instal.	m	148,96	$ 1.200.850,00	$ 178.878.616,00		$ -		$ -	148,96	$ 178.878.616,00
2.1.14	Tuberia 900 mm PEAD SN8 estructurada (36"). Suministro e instal.	m	1.185,13	$ 2.260.408,00	$ 2.678.877.333,04		$ -		$ -	1.185,13	$ 2.678.877.333,04
2.1.15	Tuberia 1200 mm PEAD SN8 estructurada (48"). Suministro e instal.	m	772,44	$ 3.812.726,00	$ 2.945.102.071,44		$ -		$ -	772,44	$ 2.945.102.071,44
2.1.16	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	149.141,48	$ 42.117,00	$ 6.281.391.713,16		$ -		$ -	149.141,48	$ 6.281.391.713,16
2.1.17	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Km	m³	17.995,59	$ 18.999,00	$ 341.898.214,41		$ -		$ -	17.995,59	$ 341.898.214,41
2.1.18	Terraplén con material crudo de rio seleccionado T. Máx. 3" (zaranda)	m³	180,00	$ 82.667,00	$ 14.880.060,00		$ -		$ -	180,00	$ 14.880.060,00
2.1.19	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	m³-km	3.214,80	$ 2.143,00	$ 6.889.316,40		$ -		$ -	3.214,80	$ 6.889.316,40
2.1.20	Perforación horizontal dirigida (PHD) Ø24", para instalación de red de tuberia PE100, PN16, 400 mm (16") en terreno limo arcilloso	m	434,62	$ 2.673.524,00	$ 1.161.967.000,88		$ -		$ -	434,62	$ 1.161.967.000,88
2.1.21	Bolsa o saco con base granular de 0.60 x 0.80	Und	45.687,00	$ 15.682,00	$ 716.463.534,00		$ -		$ -	45.687,00	$ 716.463.534,00
2,2	POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO										
2.2.01	Demolición de pozos de Inspección Di=1.20m H= 1.0 a 2.0 m	Und	10,00	$ 189.711,00	$ 1.897.110,00		$ -		$ -	10,00	$ 1.897.110,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.2.02	Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m³	875,15	$ 14.787,00	$ 12.940.843,05		$ -		$ -	875,15	$ 12.940.843,05
2.2.03	Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida)	m³	709,11	$ 17.096,00	$ 12.122.944,56		$ -		$ -	709,11	$ 12.122.944,56
2.2.04	Excavación mecánica en material común hasta 8 m (oruga)	m³	1.788,14	$ 12.711,00	$ 22.729.047,54		$ -		$ -	1.788,14	$ 22.729.047,54
2.2.05	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	Und	5,00	$ 4.710.178,00	$ 23.550.890,00		$ -		$ -	5,00	$ 23.550.890,00
2.2.06	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	Und	4,00	$ 5.513.216,00	$ 22.052.864,00		$ -		$ -	4,00	$ 22.052.864,00
2.2.07	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.50 m	Und	2,00	$ 6.358.014,00	$ 12.716.028,00		$ -		$ -	2,00	$ 12.716.028,00
2.2.08	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=3.0 - 3.5 m Ø 1.50 m	Und	1,00	$ 7.237.066,00	$ 7.237.066,00		$ -		$ -	1,00	$ 7.237.066,00
2.2.09	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 3.5 - 4.0 m Ø 1.50 m	Und	2,00	$ 7.974.510,00	$ 15.949.020,00		$ -		$ -	2,00	$ 15.949.020,00
2.2.10	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=2.0 - 3.0 m Ø 2.0 m	Und	14,00	$ 8.717.379,00	$ 122.043.306,00		$ -		$ -	14,00	$ 122.043.306,00
2.2.11	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=3.0 - 4.0 m Ø 2.0 m	Und	3,00	$ 10.818.206,00	$ 32.454.618,00		$ -		$ -	3,00	$ 32.454.618,00
2.2.12	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=4.0 - 5.0 m Ø 2.0 m	Und	7,00	$ 16.589.573,00	$ 116.127.011,00		$ -		$ -	7,00	$ 116.127.011,00
2.2.13	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H=5.0 - 6.0 m Ø 2.0 m - Tizón	Und	8,00	$ 17.927.796,00	$ 143.422.368,00		$ -		$ -	8,00	$ 143.422.368,00
2.2.14	Pozo de Inspección recto (sin cono truncado) H= 6.0 - 7.0 m Ø 2.0 m - Tizón	Und	17,00	$ 19.325.067,00	$ 328.526.139,00		$ -		$ -	17,00	$ 328.526.139,00
2.2.15	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para tráfico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	Und	63,00	$ 1.957.007,00	$ 123.291.441,00		$ -		$ -	63,00	$ 123.291.441,00
2.2.16	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	2.581,52	$ 42.117,00	$ 108.725.877,84		$ -		$ -	2.581,52	$ 108.725.877,84
2.2.17	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Km	m³	790,88	$ 18.999,00	$ 15.025.929,12		$ -		$ -	790,88	$ 15.025.929,12
2,3	CAMARAS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO										
2.3.01	Excavación mecánica en material común hasta 8 m (oruga)	m³	5.248,86	$ 12.711,00	$ 66.718.259,46		$ -		$ -	5.248,86	$ 66.718.259,46

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.3.02	Relleno con material sub base triturada tamaño Máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	61,40	$ 143.862,00	$ 8.833.126,80		$ -		$ -	61,40	$ 8.833.126,80
2.3.03	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	14,40	$ 734.316,00	$ 10.574.150,40		$ -		$ -	14,40	$ 10.574.150,40
2.3.04	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	46.609,12	$ 9.450,00	$ 440.456.184,00		$ -		$ -	46.609,12	$ 440.456.184,00
2.3.05	Concreto 4000 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas	m³	514,04	$ 1.647.519,00	$ 846.890.666,76		$ -		$ -	514,04	$ 846.890.666,76
2.3.06	Dilatación en Cinta PVC-022	m	1.680,00	$ 135.858,00	$ 228.241.440,00		$ -		$ -	1.680,00	$ 228.241.440,00
2.3.07	Tapa manhole en H.D. Ø 60 cm para tráfico pesado con sistema de seguridad. Suministro e Instal.	Und	20,00	$ 1.957.007,00	$ 39.140.140,00		$ -		$ -	20,00	$ 39.140.140,00
2.3.08	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	4.043,62	$ 42.117,00	$ 170.305.143,54		$ -		$ -	4.043,62	$ 170.305.143,54
2.3.09	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Km	m³	1.205,24	$ 18.999,00	$ 22.898.354,76		$ -		$ -	1.205,24	$ 22.898.354,76
2,4	LÍNEA DE IMPULSION										
2.4.01	Replanteo y localización de tuberias de acueducto	m	3.753,26	$ 5.344,00	$ 20.057.421,44		$ -		$ -	3.753,26	$ 20.057.421,44
2.4.02	Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m³	28.607,38	$ 14.787,00	$ 423.017.328,06		$ -		$ -	28.607,38	$ 423.017.328,06
2.4.03	Excavación a mano en material común	m³	12,24	$ 53.603,00	$ 656.100,72		$ -		$ -	12,24	$ 656.100,72
2.4.04	Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de rio)	m³	1.546,32	$ 104.382,00	$ 161.407.974,24		$ -		$ -	1.546,32	$ 161.407.974,24
2.4.05	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	6.138,41	$ 158.775,00	$ 974.626.047,75		$ -		$ -	6.138,41	$ 974.626.047,75
2.4.06	Tubería de Polietileno PE 100 PN-10 de Ø=560 mm = 22"	m	3.753,26	$ 1.453.298,00	$ 5.454.605.251,48		$ -		$ -	3.753,26	$ 5.454.605.251,48
2.4.07	Codo TE 45° PE 100 - RDE 17 PN 10 560 mm tope Ø=22"	Und	8,00	$ 6.797.312,00	$ 54.378.496,00		$ -		$ -	8,00	$ 54.378.496,00
2.4.08	Codo TE 90° PE 100 - RDE 17 PN 10 560 mm tope Ø=22"	Und	4,00	$ 8.090.494,00	$ 32.361.976,00		$ -		$ -	4,00	$ 32.361.976,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.4.09	Relleno con material sub base triturada tamaño Máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	1,18	$ 143.862,00	$ 169.757,16		$ -		$ -	1,18	$ 169.757,16
2.4.10	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 psi	m³	0,28	$ 723.004,00	$ 202.441,12		$ -		$ -	0,28	$ 202.441,12
2.4.11	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 Psi	m³	1,56	$ 1.084.415,00	$ 1.691.687,40		$ -		$ -	1,56	$ 1.691.687,40
2.4.12	Pedestal en concreto de 3000 psi	m³	2,31	$ 889.438,00	$ 2.054.601,78		$ -		$ -	2,31	$ 2.054.601,78
2.4.13	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	404,74	$ 9.450,00	$ 3.824.793,00		$ -		$ -	404,74	$ 3.824.793,00
2.4.14	Estructura metálica en Acero ASTM - A500 C (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg	3.524,97	$ 25.262,00	$ 89.047.792,14		$ -		$ -	3.524,97	$ 89.047.792,14
2.4.15	Estructura metálica en Acero ASTM - A36 (Incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg	268,88	$ 22.623,00	$ 6.082.872,24		$ -		$ -	268,88	$ 6.082.872,24
2.4.16	Relleno en material seleccionado de la Excavación compactado	m³	19.647,72	$ 42.117,00	$ 827.503.023,24		$ -		$ -	19.647,72	$ 827.503.023,24
2.4.17	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Km	m³	8.971,90	$ 18.999,00	$ 170.457.128,10		$ -		$ -	8.971,90	$ 170.457.128,10
3	**CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)**										
3,1	**ESTACION DE BOMBEO**										
3.1.01	Descapote a maquina	m²	1.653,51	$ 1.107,00	$ 1.830.435,57	1653.51	$ 1.830.432,57	1653.51	$ 1.830.432,57	0,00	$ 0,00
3.1.02	Excavación mecánica en material conglomerado hasta 6 m (oruga)	m³	4.435,46	$ 13.117,00	$ 58.179.928,82	4386.00	$ 57.531.162,00	4386.00	$ 57.531.162,00	49.46	$ 648.766,82
3.1.03	Excavación mecánica en material común bajo agua de 6 - 8 m (área restringida)	m³	2.132,04	$ 32.695,00	$ 69.707.047,80		$ -		$ -	2.132,04	$ 69.707.047,80
3.1.04	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m³	14,65	$ 734.316,00	$ 10.757.729,40		$ -		$ -	14,65	$ 10.757.729,40
3.1.05	Excavación mecánica en material conglomerado bajo agua de 6 - 14 m	m³	1.162,85	$ 50.661,00	$ 58.911.143,85		$ -		$ -	1.162,85	$ 58.911.143,85

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.1.06	Relleno con material sub base triturada tamaño Máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	m³	146,46	$ 143.862,00	$ 21.070.028,52		$ -		$ -	146,46	$ 21.070.028,52
3.1.07	Impermeabilización con mortero acrílico reforzado con fibras para tanques y piscinas e= 2. mm	m²	824,24	$ 120.223,00	$ 99.092.605,52		$ -		$ -	824,24	$ 99.092.605,52
3.1.08	Relleno en material seleccionado de la Excavación compactado	m³	4.741,08	$ 42.117,00	$ 199.680.066,36		$ -		$ -	4.741,08	$ 199.680.066,36
3.1.09	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Km	m³	1.826,42	$ 18.999,00	$ 34.700.153,58		$ -		$ -	1.826,42	$ 34.700.153,58
3.1.10	Concreto 4500 Psi, impermeabilizado para estructuras hidráulicas	m³	691,34	$ 1.685.735,00	$ 1.165.416.034,90		$ -		$ -	691,34	$ 1.165.416.034,90
3.1.11	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	56.957,81	$ 9.450,00	$ 538.251.304,50		$ -		$ -	56.957,81	$ 538.251.304,50
3.1.12	Muro en bloque No. 5 arcilla estándar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m²	93,10	$ 89.389,00	$ 8.322.115,90		$ -		$ -	93,10	$ 8.322.115,90
3.1.13	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	m²	1,40	$ 299.057,00	$ 418.679,80		$ -		$ -	1,40	$ 418.679,80
3.1.14	Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m²	186,19	$ 55.158,00	$ 10.269.868,02		$ -		$ -	186,19	$ 10.269.868,02
3.1.15	Estructura metálica en Acero ASTM - A1011 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje)	kg	388,75	$ 23.164,00	$ 9.005.005,00		$ -		$ -	388,75	$ 9.005.005,00
3.1.16	Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal.	m²	73,98	$ 55.144,00	$ 4.079.553,12		$ -		$ -	73,98	$ 4.079.553,12
3.1.17	Canastilla metálica para retención de solidos A=1.44 m, L=2.0 m, H=0.81 m	Und	1,00	$ 18.895.834,00	$ 18.895.834,00		$ -		$ -	1,00	$ 18.895.834,00
3.1.18	Rejilla para retención de solidos finos en platina de 2 x 1/4" de 1.17 x 0.90 m. Incluye. marco, contramarco e instalación.	Und	2,00	$ 1.137.740,00	$ 2.275.480,00		$ -		$ -	2,00	$ 2.275.480,00
3.1.19	Codo 90° Ø=8" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	Und	4,00	$ 1.750.019,00	$ 7.000.076,00		$ -		$ -	4,00	$ 7.000.076,00
3.1.20	Codo 90° Ø=12" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	Und	4,00	$ 3.706.862,00	$ 14.827.448,00		$ -		$ -	4,00	$ 14.827.448,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.1.21	Codo 90° Ø=14" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	Und	1,00	$ 5.359.250,00	$ 5.359.250,00		$ -		$ -	1,00	$ 5.359.250,00
3.1.22	Codo 90° Ø=16" en A.C. con E.B x E.B. Suministro e Instal.	Und	1,00	$ 6.317.697,00	$ 6.317.697,00		$ -		$ -	1,00	$ 6.317.697,00
3.1.23	Pasamuro en A.C. Ø=12" L=1.10 m E.B x E.B. Suministro e Instal.	Und	4,00	$ 4.052.408,00	$ 16.209.632,00		$ -		$ -	4,00	$ 16.209.632,00
3.1.24	Pasamuro en A.C. Ø=16" L=1.00 m E.B x E.B. Suministro e Instal.	Und	1,00	$ 5.989.854,00	$ 5.989.854,00		$ -		$ -	1,00	$ 5.989.854,00
3.1.25	Niple Ø= 14" en A.C. con E.B x E.B. L=0.50 m. Suministro e instal	Und	4,00	$ 2.253.943,00	$ 9.015.772,00		$ -		$ -	4,00	$ 9.015.772,00
3.1.26	Niple Ø= 12" en A.C. con E.B x E.B. L=0.70 m. Suministro e instal	Und	1,00	$ 2.403.628,00	$ 2.403.628,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.403.628,00
3.1.27	Reducción H.D 12" X 8" E.B. Suministro e Instal	Und	4,00	$ 2.863.268,00	$ 11.453.072,00		$ -		$ -	4,00	$ 11.453.072,00
3.1.28	Reducción H.D 14" X 12" E.B Suministro e Instal	Und	1,00	$ 4.047.959,00	$ 4.047.959,00		$ -		$ -	1,00	$ 4.047.959,00
3.1.29	Reducción H.D 16" X 14" E.B Suministro e Instal	Und	2,00	$ 5.728.181,00	$ 11.456.362,00		$ -		$ -	2,00	$ 11.456.362,00
3.1.30	Tee en H.D. 14" x 14" E.B.x E. B Suministro e Instal.	Und	1,00	$ 8.126.886,00	$ 8.126.886,00		$ -		$ -	1,00	$ 8.126.886,00
3.1.31	Tee en H.D. 14" x 12" E.B.x E. B Suministro e Instal.	Und	3,00	$ 7.967.426,00	$ 23.902.278,00		$ -		$ -	3,00	$ 23.902.278,00
3.1.32	Válvula de ventosa 6". Cámara doble acción múltiple E.B. Suministro e instal.	Und	4,00	$ 6.032.126,00	$ 24.128.504,00		$ -		$ -	4,00	$ 24.128.504,00
3.1.33	Tubería en acero negro (acero al carbón) SCH 40 3". Suministro e instal.	m	7,49	$ 244.049,00	$ 1.827.927,01		$ -		$ -	7,49	$ 1.827.927,01
3.1.34	Tapón en H.D. Ø=14" J.H. Suministro e Instal.	Und	1,00	$ 1.346.165,00	$ 1.346.165,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.346.165,00
3.1.35	Diferencial 3 tn con cadena crosby 3.0 m. Suministro e Instal.	Und	2,00	$ 531.330,00	$ 1.062.660,00		$ -		$ -	2,00	$ 1.062.660,00
3.1.36	Válvula de mariposa en HD Ø 12" wafer con disco en acero inoxidable con actuador tipo volante. Suministro e Instal.	Und	4,00	$ 5.457.707,00	$ 21.830.828,00		$ -		$ -	4,00	$ 21.830.828,00
3.1.37	Portaflanche de polietileno PE 100 - RDE 17 PN 10 400 mm Ø=16".	Und	1,00	$ 1.990.573,00	$ 1.990.573,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.990.573,00
3.1.38	Brida metálica DN 16 PLG (400mm) ANSI CL 150. Suministro e Instal.	Und	1,00	$ 983.243,00	$ 983.243,00		$ -		$ -	1,00	$ 983.243,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.1.39	Codo 45° Ø=16" PEAD PN10. Suministro e instal.	Und	2,00	$ 5.790.899,00	$ 11.581.798,00		$ -		$ -	2,00	$ 11.581.798,00
3.1.40	Tapa en lamina alfajor 1/4" con contramarco en ángulo de 1 1/2"x3/16" con agarradera, anticorrosivo y pintura e instalada.	m²	1,62	$ 1.357.183,00	$ 2.198.636,46		$ -		$ -	1,62	$ 2.198.636,46
3.1.41	Baranda en tubo galvanizado de 2", cal 1.5 mm (inc. anticorrosivo, pintura) h=0.90 m REVISAR y AJUSTAR	m	18,52	$ 289.464,00	$ 5.360.873,28		$ -		$ -	18,52	$ 5.360.873,28
3.1.42	Viga aérea en concreto de resistencia 4500 psi	m³	2,64	$ 1.658.846,00	$ 4.379.353,44		$ -		$ -	2,64	$ 4.379.353,44
3.1.43	Columna en concreto de resistencia 4500 psi	m³	5,56	$ 1.470.030,00	$ 8.173.366,80		$ -		$ -	5,56	$ 8.173.366,80
3.1.44	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m²	14,04	$ 657.071,00	$ 9.225.276,84		$ -		$ -	14,04	$ 9.225.276,84
3.1.45	Columneta de 0.12 x 0.10 en concreto resistencia 4500 Psi sin refuerzo	m	5,40	$ 40.780,00	$ 220.212,00		$ -		$ -	5,40	$ 220.212,00
3.1.46	Estructura metálica en Acero ASTM - A572 G-50 (incluye: suministro - fabricación - pintura - montaje).	kg	1.148,91	$ 24.717,00	$ 28.397.608,47		$ -		$ -	1.148,91	$ 28.397.608,47
3.1.47	Cerramiento, en ciclópeo, viga, muro en concreto reforzado a la vista (0.20 x 1.0 m), tubo con brazo, platina, ángulo, malla eslabonada y 3 hilos alambre de púas.	m	143,82	$ 994.707,00	$ 143.058.760,74		$ -		$ -	143,82	$ 143.058.760,74
3.1.48	Portón en lamina cold rolled cal 18 de doble hoja con puerta de acceso, cerradura y con marco en tubo estructural 2" x 2.5 mm, anticorrosivo y pintura. Suministro e instal.	m²	49,92	$ 609.064,00	$ 30.404.474,88		$ -		$ -	49,92	$ 30.404.474,88
3.1.49	Tubería A.C S/C SCH 40 Ø 12" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	11,53	$ 2.568.165,00	$ 29.610.942,45		$ -		$ -	11,53	$ 29.610.942,45
3.1.50	Tubería A.C S/C SCH 40 Ø 14" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	4,00	$ 3.060.644,00	$ 12.242.576,00		$ -		$ -	4,00	$ 12.242.576,00
3.1.51	Tubería A.C S/C SCH 40 Ø 16" E.B X E.B. Suministro e instal.	m	2,04	$ 4.464.270,00	$ 9.107.110,80		$ -		$ -	2,04	$ 9.107.110,80
3.1.52	Codo 90° Ø=3" acero negro 150 PSI A197 Rosca. Suministro e Instal.	Und	1,00	$ 84.563,00	$ 84.563,00		$ -		$ -	1,00	$ 84.563,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.1.53	Reducción Ø= 3" x 1 1/2" acero al carbón SCH 40. Suministro e Instal.	Und	1,00	$ 69.832,00	$ 69.832,00		$ -		$ -	1,00	$ 69.832,00
3.1.54	Bomba sumergible con impulsor cerrado de 1.9hp con motor sumergible eléctrico estándar conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz, incluye tablero de fuerza y control para 1 bomba de 1.4 Kw/ 1.9Hp / 460 VAC. Suministro, Instal. y puesta en marcha.	Und	1,00	$ 28.517.835,00	$ 28.517.835,00		$ -		$ -	1,00	$ 28.517.835,00
3.1.55	Bomba sumergible en pozo seco de 185hp con motor sumergible eléctrico estándar conectado a 460 V, 3 fases, 60 Hz. Suministro, Instal. y puesta en marcha.	Und	4,00	$ 474.317.715,00	$ 1.897.270.860,00		$ -		$ -	4,00	$ 1.897.270.860,00
3.1.56	Tablero de fuerza y control para 2 bombas de 138 Kw/ 185Hp / 460 VAC. Suministro e Instal.	Und	2,00	$ 184.966.355,00	$ 369.932.710,00		$ -		$ -	2,00	$ 369.932.710,00
3.1.57	Reducción Ø=22"x 20" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	Und	1,00	$ 3.030.883,00	$ 3.030.883,00		$ -		$ -	1,00	$ 3.030.883,00
3.1.58	Reducción Ø=20"x 16" PE 100 RDE 17 PN 10 Tope	Und	1,00	$ 2.367.819,00	$ 2.367.819,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.367.819,00
3.1.59	Cheque cortina Ø=12" E.B. A.C 150 PSI. Suministro e instal.	Und	4,00	$ 9.280.266,00	$ 37.121.064,00		$ -		$ -	4,00	$ 37.121.064,00
3.1.60	Cheque cortina Ø=16" E.B. A.C 150 PSI. Suministro e instal.	Und	1,00	$ 10.898.928,00	$ 10.898.928,00		$ -		$ -	1,00	$ 10.898.928,00
3.1.61	Compuerta mural deslizante tipo guillotina DN 48"(1200 mm) x 48"(1200mm), S/AWWA C561; estructura y guías asiento en acero inoxidable AISI 304, incluye accesorios, soportes, anclajes y vástago de 7 m	Und	3,00	$ 137.846.632,00	$ 413.539.896,00		$ -		$ -	3,00	$ 413.539.896,00
3,2	**CASETA ELECTRICA**										
3.2.01	Losa maciza elevada en concreto de 4000 psi, e= 0.1 m tipo metaldeck - terrazas.	m²	78,22	$ 228.440,00	$ 17.868.576,80		$ -		$ -	78,22	$ 17.868.576,80
3.2.02	Viga aérea en concreto de resistencia 4000 psi	m³	5,57	$ 1.620.610,00	$ 9.026.797,70		$ -		$ -	5,57	$ 9.026.797,70
3.2.03	Columna en concreto de resistencia 4000 psi	m³	3,78	$ 1.431.793,00	$ 5.412.177,54		$ -		$ -	3,78	$ 5.412.177,54

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.2.04	Zapata en concreto para cimentación de resistencia 4000 Psi	m³	6,18	$ 1.177.796,00	$ 7.278.779,28		$ -		$ -	6,18	$ 7.278.779,28
3.2.05	Viga de amarre para cimentación en concreto de 4000 Psi	m³	4,22	$ 1.163.416,00	$ 4.909.615,52		$ -		$ -	4,22	$ 4.909.615,52
3.2.06	Placa base en concreto 3000 psi e=0.15 m reforzado con malla electrosoldada Q-5	m²	78,22	$ 163.981,00	$ 12.826.593,82		$ -		$ -	78,22	$ 12.826.593,82
3.2.07	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	2.898,78	$ 9.450,00	$ 27.393.471,00		$ -		$ -	2.898,78	$ 27.393.471,00
3.2.08	Muro en bloque No. 5 arcilla estándar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	m²	94,14	$ 89.389,00	$ 8.415.080,46		$ -		$ -	94,14	$ 8.415.080,46
3.2.09	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	m²	3,00	$ 299.057,00	$ 897.171,00		$ -		$ -	3,00	$ 897.171,00
3.2.10	Estuco plástico, vinilo 1 mano y acabado en 2 manos pintura tipo koraza para exteriores o similar.	m²	188,26	$ 55.158,00	$ 10.384.045,08		$ -		$ -	188,26	$ 10.384.045,08
3.2.11	Puerta en persiana y marco en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	m²	19,50	$ 657.071,00	$ 12.812.884,50		$ -		$ -	19,50	$ 12.812.884,50
3.2.12	Excavación manual en conglomerado	m³	71,66	$ 82.335,00	$ 5.900.126,10		$ -		$ -	71,66	$ 5.900.126,10
3.2.13	Relleno en material seleccionado de la Excavación compactado	m³	60,46	$ 42.117,00	$ 2.546.393,82		$ -		$ -	60,46	$ 2.546.393,82
3.2.14	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Km	m³	11,20	$ 18.999,00	$ 212.788,80		$ -		$ -	11,20	$ 212.788,80
3.2.15	Relleno con base granular seleccionada o clasificada, compactada y transportada	m³	11,57	$ 143.807,00	$ 1.663.846,99		$ -		$ -	11,57	$ 1.663.846,99
3.2.16	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi	m²	27,46	$ 36.712,00	$ 1.008.111,52		$ -		$ -	27,46	$ 1.008.111,52
3,3	RED DE MEDIA TENSION										
3.3.01	Replanteo en media tensión	km	0,44	$ 682.846,00	$ 300.452,24	0,39	$ 266.309,94	0,39	$ 266.309,94	0,05	$ 34.142,30
3.3.02	Apertura de hueco para poste o templete en M.T.	Und	10,00	$ 116.014,00	$ 1.160.140,00	9,00	$ 1.044.126,00	9,00	$ 1.044.126,00	1,00	$ 116.014,00
3.3.03	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	Und	3,00	$ 3.607.489,00	$ 10.822.467,00	2,00	$ 7.214.978,00	2,00	$ 7.214.978,00	1,00	$ 3.607.489,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.3.04	Poste de concreto 12 m x 510 Kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada.	Und	7,00	$ 2.396.003,00	$ 16.772.021,00	7,00	$ 16.772.021,00	7,00	$ 16.772.021,00	0,00	$ -
3.3.05	Cimentación poste de 10/12 m.	Und	3,00	$ 189.789,00	$ 569.367,00	2,00	$ 379.578,00	2,00	$ 379.578,00	1,00	$ 189.789,00
3.3.06	Estructura 730 derivación trifásica con cortacircuito, con cruceta metálica doble de 2 m, aislador de suspensión sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	Und	1,00	$ 2.111.573,00	$ 2.111.573,00	1,00	$ 2.111.573,00	1,00	$ 2.111.573,00	0,00	$ -
3.3.07	Descargadores de sobre tensión (juego/3) 15 kV cambio red compacta abierta. Suministro e instalación.	Und	2,00	$ 755.983,00	$ 1.511.966,00	1,00	$ 755.983,00	1,00	$ 755.983,00	1,00	$ 755.983,00
3.3.08	Estructura LA-461/H-1000 para red compacta 13.2 KV, suministro y vestida	Und	7,00	$ 544.979,00	$ 3.814.853,00	7,00	$ 3.814.853,00	7,00	$ 3.814.853,00	0,00	$ -
3.3.09	Espaciador angular 15 KV. Suministro e instalación.	Und	39,00	$ 110.698,00	$ 4.317.222,00	35,00	$ 3.874.430,00	35,00	$ 3.874.430,00	4,00	$ 442.792,00
3.3.10	Estructura LA-464/H-1001 para red compacta 13.2 KV final de circuito, suministro y vestida	Und	5,00	$ 1.229.950,00	$ 6.149.750,00	4,00	$ 4.919.800,00	4,00	$ 4.919.800,00	1,00	$ 1.229.950,00
3.3.11	Cable mensajero en acero extrareforzado Ø 1/4" para red compacta. Suministro, tendido y tensionado	m	438,00	$ 13.311,00	$ 5.830.218,00	390,50	$ 5.197.945,50	390,50	$ 5.197.945,50	47,50	$ 632.272,50
3.3.12	Puesta a tierra para cable mensajero. Suministro e instalación.	Und	5,00	$ 730.102,00	$ 3.650.510,00	4,00	$ 2.920.408,00	4,00	$ 2.920.408,00	1,00	$ 730.102,00
3.3.13	Red compacta en media tensión en cable ACSR semiaislado XLPE 15KV (3 x Nº 1/0), suministro, tendido y tensionado	m	438,00	$ 101.554,00	$ 44.480.652,00	390,50	$ 39.656.837,00	390,50	$ 39.656.837,00	47,50	$ 4.823.815,00
3.3.14	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 4", uniones galvanizadas, boquilla, curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalación.	Und	1,00	$ 2.170.045,00	$ 2.170.045,00		$ -		$ -	1,00	$ 2.170.045,00
3.3.15	Caja de inspección CS-275	Und	2,00	$ 1.962.129,00	$ 3.924.258,00		$ -		$ -	2,00	$ 3.924.258,00
3.3.16	Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	13,21	$ 50.016,00	$ 660.711,36		$ -		$ -	13,21	$ 660.711,36

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.3.17	Relleno en material seleccionado de la Excavación compactado	m³	8,37	$ 42.117,00	$ 352.519,29		$ -		$ -	8,37	$ 352.519,29
3.3.18	Canalización ducto Conduit PVC DB tipo pesado 4 x4", zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavada de rio.	m	20,55	$ 207.533,00	$ 4.264.803,15		$ -		$ -	20,55	$ 4.264.803,15
3.3.19	Suministro e instalación acometida subterránea media tensión en conductor 3 x N° 1/0 AWG XLPE-15 KV, 133%	m	40,38	$ 402.565,00	$ 16.255.574,70		$ -		$ -	40,38	$ 16.255.574,70
3.3.20	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo exterior para red de media tensión 15 KV calibre N° 1/0 XLPE (jgo/3). Suministro e instalación.	Und	1,00	$ 1.281.497,00	$ 1.281.497,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.281.497,00
3,4	SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN										
3.4.01	Suministro, transporte e instalación de celda de medida en media tensión, Medidor trifásico multifuncional, con registro de demanda y telemedida. Incluye TC's TP's, calibración	Und	1,00	$ 29.954.638,00	$ 29.954.638,00		$ -		$ -	1,00	$ 29.954.638,00
3.4.02	Suministro e instalación Celda de protección con seccionador en aire 17,5 kV / 16 kA NORMA CTS 506-2	Und	1,00	$ 27.028.496,00	$ 27.028.496,00		$ -		$ -	1,00	$ 27.028.496,00
3.4.03	Suministro e instalación Celda para transformador seco de hasta 500 KVA 15 KV	Und	1,00	$ 10.789.843,00	$ 10.789.843,00		$ -		$ -	1,00	$ 10.789.843,00
3.4.04	Transformador de potencia trifásico de 400 KVA tipo seco clase H para nivel de tensión 13200/440V-254 frecuencia de operación 60 Hz. Suministro e instalación.	Und	1,00	$ 143.431.706,00	$ 143.431.706,00		$ -		$ -	1,00	$ 143.431.706,00
3.4.05	Construcción malla de puesta a tierra para cuarto eléctrico. Incluye: Cable de cobre desnudo N° 4/0, excavación y relleno, soldaduras exotérmicas	Und	1,00	$ 15.957.731,00	$ 15.957.731,00		$ -		$ -	1,00	$ 15.957.731,00
3.4.06	Terminales premoldeados y cono de alivio tipo interior para red de media tensión 15 kV calibre N° 1/0 XLPE (jgo/3) suministro e instalación	Und	5,00	$ 792.272,00	$ 3.961.360,00		$ -		$ -	5,00	$ 3.961.360,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.4.07	DPS 12 kV 10 kA protección transformador tipo seco (jgo/3). Suministro e instalación.	Und	1,00	$ 837.202,00	$ 837.202,00		$ -		$ -	1,00	$ 837.202,00
3.4.08	Suministro e instalación acometida subterránea media tensión en conductor 3 x Nº 2 AWG XLPE-15 KV, 133%	m	8,00	$ 333.507,00	$ 2.668.056,00		$ -		$ -	8,00	$ 2.668.056,00
3.4.09	Caja de inspección AP-280	Und	6,00	$ 494.883,00	$ 2.969.298,00		$ -		$ -	6,00	$ 2.969.298,00
3,5	CUARTO ELECTRICO										
3.5.01	Transferencia automática para planta de emergencia de 500 KVA.	Und	1,00	$ 56.818.284,00	$ 56.818.284,00		$ -		$ -	1,00	$ 56.818.284,00
3.5.02	Suministro e instalación de Gabinete metálico de 150x2.00x060 m incluye totalizador principal breakers borneras barraje de distribución barraje electro plateado marquillado elementos de sujeción y pruebas.	Und	1,00	$ 56.432.489,00	$ 56.432.489,00		$ -		$ -	1,00	$ 56.432.489,00
3.5.03	Suministro e instalación de banco de condensadores, incluye: Gabinete metálico de 1x0,80x0,70 m, controlador automático de factor de potencia, transformador de corriente, contactor para condesador, reactancia de rechazo y accesorios	Und	1,00	$ 30.101.311,00	$ 30.101.311,00		$ -		$ -	1,00	$ 30.101.311,00
3.5.04	Autotransformador 20 KVA baja - baja 440 V./ 208 - 120 V. tipo seco trifásico conexión estrella grupo de conexión Dy5 protección IP. Suministro e instalación.	Und	1,00	$ 16.988.971,00	$ 16.988.971,00		$ -		$ -	1,00	$ 16.988.971,00
3.5.05	Cárcamo en concreto 3000 psi 0.60 x 0.60 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	m	2,81	$ 393.414,00	$ 1.105.493,34		$ -		$ -	2,81	$ 1.105.493,34
3.5.06	Cárcamo en concreto 3000 psi 0.30 x 0.30 m e=0.07 m, base 0.10 m, reforzado malla electrosoldada Q-3, con solado 2000 psi.	m	18,24	$ 271.155,00	$ 4.945.867,20		$ -		$ -	18,24	$ 4.945.867,20
3.5.07	Tapa en lamina alfajor 1/8" con marco en ángulo de 1 1/22X3/16" pintada. Suministro e instalación	m²	4,30	$ 1.005.630,00	$ 4.324.209,00		$ -		$ -	4,30	$ 4.324.209,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.5.08	Tablero protección trifásico de 12 puestos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación	Und	1,00	$ 839.514,00	$ 839.514,00		$ -		$ -	1,00	$ 839.514,00
3.5.09	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (2 N° 500MCM) + 1N° 4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	23,90	$ 2.791.784,00	$ 66.723.637,60		$ -		$ -	23,90	$ 66.723.637,60
3.5.10	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 3(1 N° 500 MCM) + 1N°4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	35,74	$ 1.145.104,00	$ 40.926.016,96		$ -		$ -	35,74	$ 40.926.016,96
3.5.11	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	18,68	$ 64.906,00	$ 1.212.444,08		$ -		$ -	18,68	$ 1.212.444,08
3.5.12	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (N° 6) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	5,51	$ 91.265,00	$ 502.870,15		$ -		$ -	5,51	$ 502.870,15
3.5.13	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 3 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	11,67	$ 53.698,00	$ 626.655,66		$ -		$ -	11,67	$ 626.655,66
3.5.14	Interruptor termomagnético regulable 32A a 40A 25kA. Suministro e instalación.	Und	1,00	$ 763.066,00	$ 763.066,00		$ -		$ -	1,00	$ 763.066,00
3.5.15	Cortacircuito termomagnético de 1 x (10A-60A) 120/240 V 10 KA enchufable. Suministro e instalación.	Und	2,00	$ 35.581,00	$ 71.162,00		$ -		$ -	2,00	$ 71.162,00
3.5.16	Cortacircuito termomagnético bipolar de 15-30A 10kA 120/240V. Suministro e instalación	Und	1,00	$ 91.980,00	$ 91.980,00		$ -		$ -	1,00	$ 91.980,00
3.5.17	Cortacircuito termomagnético tripolar de 15 - 60A 120/340 V. enchufable. Suministro e instalación.	Und	2,00	$ 211.220,00	$ 422.440,00		$ -		$ -	2,00	$ 422.440,00
3.5.18	Canalización ducto Conduit PVC 1" zona dura.	m	7,86	$ 16.155,00	$ 126.978,30		$ -		$ -	7,86	$ 126.978,30

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3,6	ACOMETIDAS BAJA TENSIÓN										
3.6.01	Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	13,58	$ 50.016,00	$ 679.217,28		$ -		$ -	13,58	$ 679.217,28
3.6.02	Relleno en material seleccionado de la Excavación compactado	m³	9,98	$ 42.117,00	$ 420.327,66		$ -		$ -	9,98	$ 420.327,66
3.6.03	Canalización ducto Conduit PVC DB tipo pesado 2 x 3", zona blanda. Incluye cinta de prevención y arena lavada de río.	m	17,64	$ 73.354,00	$ 1.293.964,56		$ -		$ -	17,64	$ 1.293.964,56
3.6.04	Suministro e instalación de tubería IMC de 3"	m	63,40	$ 259.086,00	$ 16.426.052,40		$ -		$ -	63,40	$ 16.426.052,40
3.6.05	Suministro e instalación de tubería IMC de 1"	m	85,94	$ 68.302,00	$ 5.869.873,88		$ -		$ -	85,94	$ 5.869.873,88
3.6.06	Canalización Conduit PVC DB tipo pesado 2 x 1", zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavada de río.	m	29,57	$ 33.312,00	$ 985.035,84		$ -		$ -	29,57	$ 985.035,84
3.6.07	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 3(1 N° 500 MCM) + 1N°4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C.	m	147,06	$ 1.145.104,00	$ 168.398.994,24		$ -		$ -	147,06	$ 168.398.994,24
3.6.08	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	6,00	$ 64.906,00	$ 389.436,00		$ -		$ -	6,00	$ 389.436,00
3.6.09	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 3 (N° 8) + 1N° 8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	42,00	$ 53.698,00	$ 2.255.316,00		$ -		$ -	42,00	$ 2.255.316,00
3,7	PLANTA DE EMERGENCIA										
3.7.01	Suministro e instalación de planta eléctrica de 438 KVA, tipo Diesel, velocidad de 1800RPM, trifásica. Incluye tablero de control de motor y generador, breaker tipo industrial, cabina insonora tipo interior y sistema de escape de gases.	Und	1,00	$ 418.714.998,00	$ 418.714.998,00		$ -		$ -	1,00	$ 418.714.998,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.7.02	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4 (2 N° 500MCM) + 1N° 4/0T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C. Suministro e instalación.	m	10,23	$ 2.792.476,00	$ 28.567.029,48		$ -		$ -	10,23	$ 28.567.029,48
3,8	INSTALACIÓNES INTERNAS										
3.8.01	Tablero de protección trifásico 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador. Suministro e instalación.	Und	1,00	$ 1.171.905,00	$ 1.171.905,00		$ -		$ -	1,00	$ 1.171.905,00
3.8.02	Cortacircuito termomagnético de 1 x (10A-60A), 120/240 V, 10 KA, enchufable. Suministro e instalación.	Und	4,00	$ 35.581,00	$ 142.324,00		$ -		$ -	4,00	$ 142.324,00
3.8.03	Cortacircuito termomagnético bipolar de 15 - 30A, 10 KA, 120/240 V. Suministro e instalación.	Und	1,00	$ 91.980,00	$ 91.980,00		$ -		$ -	1,00	$ 91.980,00
3.8.04	Cortacircuito termomagnético tripolar de 15 - 60A, 120/340 V. enchufable. Suministro e instalación.	Und	4,00	$ 211.220,00	$ 844.880,00		$ -		$ -	4,00	$ 844.880,00
3.8.05	Canalización ducto Conduit PVC 1", zona dura.	m	1,50	$ 16.155,00	$ 24.232,50		$ -		$ -	1,50	$ 24.232,50
3.8.06	Salida para iluminación, en tubería metálica tipo Conduit EMT 1/2". Incluye: caja metálica semipesado 5800, accesorios de montaje, cable de cobre 3x12 AWG-THHN, Toma monofásica doble con polo a tierra 15A con tapa.	Und	19,00	$ 303.132,00	$ 5.759.508,00		$ -		$ -	19,00	$ 5.759.508,00
3.8.07	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plástica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	Und	9,00	$ 143.717,00	$ 1.293.453,00		$ -		$ -	9,00	$ 1.293.453,00
3.8.08	Tomacorriente doble, polo a tierra, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R grado comercial. Suministro e instalación	Und	9,00	$ 38.165,00	$ 343.485,00		$ -		$ -	9,00	$ 343.485,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.8.09	Salida para toma corriente doble con polo a tierra, NEMA 5 15R, incluye: Tubo EMT tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado THWN 2xN° |2 + 1x12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	Und	8,00	$ 305.026,00	$ 2.440.208,00		$ -		$ -	8,00	$ 2.440.208,00
3.8.10	Salida para tomacorriente doble bifásico con polo a tierra, incluye: tubo EMT tipo pesado 3/4", cable de cobre aislado THWN 2xn°10 + 1xN°12T AWG, caja metálica 5800 o 2400, terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	Und	2,00	$ 526.189,00	$ 1.052.378,00		$ -		$ -	2,00	$ 1.052.378,00
3.8.11	Salida para tomacorriente trifásico con polo a tierra incluye: tubo EMT tipo pesado 1" cable de cobre aislado THWN 3x10 +1x12T AWG caja metálica 2400 tipo honda terminales tipo rosca. Suministro e instalación.	Und	2,00	$ 718.957,00	$ 1.437.914,00		$ -		$ -	2,00	$ 1.437.914,00
3.8.12	Luminaria tipo led hermética IP65, 36W, 3500 lm, 120x8 cm. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación.	Und	19,00	$ 225.350,00	$ 4.281.650,00		$ -		$ -	19,00	$ 4.281.650,00
3.8.13	Luminaria de emergencia tipo led 110V, 2.4W, autonomia minima 90 minutos. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalación	Und	3,00	$ 169.943,00	$ 509.829,00		$ -		$ -	3,00	$ 509.829,00
3.8.14	Letrero luminoso de emergencia SALIDA. Incluye: cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de caucho y elementos de fijación	Und	3,00	$ 175.211,00	$ 525.633,00		$ -		$ -	3,00	$ 525.633,00
3.8.15	Salida para interruptor sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	Und	5,00	$ 125.086,00	$ 625.430,00		$ -		$ -	5,00	$ 625.430,00

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
3.8.16	Salida para interruptor conmutable sencillo, línea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	Und	1,00	$ 158.049,00	$ 158.049,00		$ -		$ -	1,00	$ 158.049,00
3.8.17	Salida para interruptor doble conmutable, línea decorativa incluye: Tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plástica 5800, terminales PVC y readecuación de muro	Und	1,00	$ 193.556,00	$ 193.556,00		$ -		$ -	1,00	$ 193.556,00
3,9	ALUMBRADO PÚBLICO										
3.9.01	Caja de inspección AP-280	Und	7,00	$ 494.883,00	$ 3.464.181,00		$ -		$ -	7,00	$ 3.464.181,00
3.9.02	Excavación manual en material común < 1 m. (zanjas .30 >.60)	m³	26,30	$ 50.016,00	$ 1.315.420,80		$ -		$ -	26,30	$ 1.315.420,80
3.9.03	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	19,72	$ 42.117,00	$ 830.547,24		$ -		$ -	19,72	$ 830.547,24
3.9.04	Canalización Conduit PVC tipo pesado 2x3/4" zona blanda. Incluye cinta de previsión y arena lavado de rio.	m	111,09	$ 24.578,00	$ 2.730.370,02		$ -		$ -	111,09	$ 2.730.370,02
3.9.05	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 2x10 + 1x8T AWG THHN/THWN-2 600V. 90°C.Suministro e instalación.	m	118,59	$ 33.841,00	$ 4.013.204,19		$ -		$ -	118,59	$ 4.013.204,19
3.9.06	Luminaria led 30-60W, 7P, 4230-8460 lm, 4000K, incluye fusible y DPS, base para fotocelda y fotocelda, cableado y empalmes de derivación. Suministro e instalación.	Und	7,00	$ 1.330.964,00	$ 9.316.748,00		$ -		$ -	7,00	$ 9.316.748,00
3.9.07	Poste metálico galvanizado perfil redondo y brazo sencillo con altura de montaje de 6 m. incluye: pernos de anclaje puesta a tierra y base en concreto reforzado. Suministro e instalación	Und	7,00	$ 2.885.855,00	$ 20.200.985,00		$ -		$ -	7,00	$ 20.200.985,00
				IMPLEMENTACIÓN PMA		$ 7.203.428,00		$ 7.203.428,00			$ 43.426.432,00
				PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PTM)		$ -		$ -			$ 263.188.608,00

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONTRATO DE OBRA No. 041-2023
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
	INFORME MENSUAL DE OBRA No. 2
NIT. 901.767.095-1	PERIODO DEL 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

PRESUPUESTO CONTRACTUAL						CANTIDADES EJECUTADAS MES 2		CANTIDADES EJECUTADA ACUMULADA		CANTIDADES POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
					CERTIFICADO RETIE		$ -		$ -		$ 36.652.000,00
					CERTIFICADO RETILAP		$ -		$ -		$ 10.710.000,00
					TOTAL		$ 155.493.871,00		$ 155.493.871,00		**$ 83.455.515.336,00**

A corte Mensual No. 2 del 31 de marzo de 2024 se ha ejecutado un valor de $ 155.493.871,00 el cual corresponde a un porcentaje de avance del 0.19% en cuanto al manejo de recursos y un avance del 6.57% en cuanto al tiempo contractual del contrato.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

5.1.1 INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMADA Vs INVERSIÓN MENSUAL EJECUTADA

Tabla 15. Inversión programada vs inversión ejecutada

MES	PERIODO	INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA	INVERSIÓN EJECUTADA
1	13/02/2024 - 29/02/2024	$ -	$ -
2	01/03/2024 - 31/03/2024	$ 53.045.704,50	$ 155.493.871,00

5.1.2 GRAFICO %PROGRAMADO Vs %EJECUTADO

Ilustración 6. Valor ejecutado vs valor gastado contrato de obra



5.1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.1.3.1 CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)

- **SUBCAPITULO 3.1 ESTACION DE BOMBEO**

ÍTEM 3.1.01 DESCAPOTE A MAQUINA (M2)

UNIDAD	m²
CANTIDAD TOTAL	1653,51
CANTIDAD EJECUTADA	1653,51
CANTIDAD POR EJECUTAR	0,00

Se refiere al proceso de limpieza y preparación del terreno para la construcción de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR), donde se retiró la capa superficial generalmente compuesta por material orgánico.

Ilustración 7. Descapote a maquina





ÍTEM 3.1.02 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL CONGLOMERADO HASTA 6 M (ORUGA)

UNIDAD	m²
CANTIDAD TOTAL	4435,46
CANTIDAD EJECUTADA	4386,00
CANTIDAD POR EJECUTAR	49,46

Esta actividad contempla la remoción de tierra del sitio donde se va a cimentar la EBAR.

del sistema de bombas en la EBAR, además, cuenta con la capacidad de proporcionar energía eléctrica con uso de alumbrado público en la misma zona.

Ilustración 9. Red de media tensión

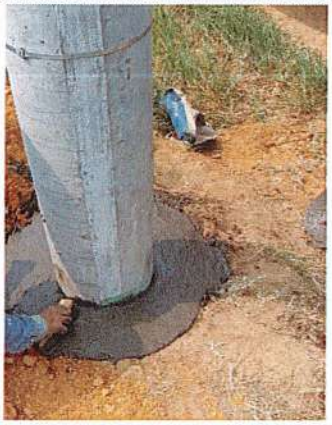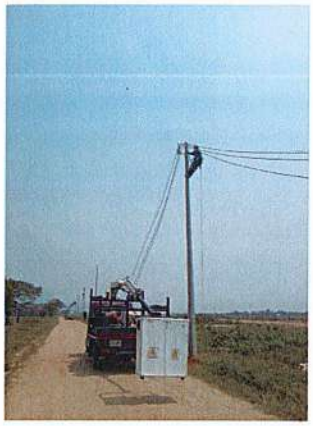5.2 PROYECCIONES DE OBRA PARA EL SIGUIENTE PERIODO

Para el siguiente mes se proyectan las siguientes actividades:

- ✓ Construcción de pozos de inspección y cámaras.
- ✓ Instalación de tubería para colectores
- ✓ Excavación para estación de bombeo (EBAR)

5.3 PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Tabla 16. Relación de personal

No	CEDULA	NOMBRE	CARGO	% DEDIC	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	OBSERVACIONES
1	86.039.937	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	OFICIAL DE OBRA	100%	15/01/2024	-	-
2	6.775.413	AVILA FONSECA VICTOR MANUEL	DIRECTOR DE OBRA	50%	13/02/2024	18/03/2024	-
3	88.215.115	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	MAESTRO DE OBRA	100%	01/02/2024	-	-
4	1.116.544.049	BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL	PROFESIONAL AMBIENTAL	30%	13/02/2024	-	-

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

No	CEDULA	NOMBRE	CARGO	% DEDIC	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	OBSERVACIONES
5	74.181.863	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	GERENTE DE PROYECTO	50%	22/12/2023	-	-
6	1.118.564.818	CERON SOTABAN DALAVIER	OFICIAL DE OBRA	100%	19/02/2024	-	-
7	1.116.551.841	CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED	AYUDANTE DE OBRA	100%	21/03/2024	-	-
8	9.530.553	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	100%	21/03/2024	-	-
9	9.532.276	HURTADO PINEDA ALVARO	OFICIAL DE OBRA	100%	05/03/2024	-	-
10	46.364.728	HURTADO PINEDA YOLIMA	PROFESIONAL AREA SOCIAL	20%	13/02/2024	-	-
11	30.206.557	JIMENEZ LOPEZ LINA MARIA	AYUDANTE DE OBRA	100%	21/03/2024	-	-
12	1.006.553.132	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	AYUDANTE DE OBRA	100%	21/03/2024	-	-
13	7.227.214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20%	13/02/2024	-	-
14	91.240.944	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	20%	13/02/2024	-	-
15	79.483.830	REAL HOYOS LUIS EDUARDO	INGENIERO RESIDENTE	100%	15/01/2024	-	-
16	47.435.477	TARACHE CECILIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	100%	14/03/2024	-	-
17	1.193.100.410	TEATIN CACHAY JUAN CAMILO	AYUDANTE DE OBRA	100%	21/03/2024	-	-
18	1.118.572.201	VARGAS CERON MANUEL ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	100%	26/03/2024	-	-
19	1.116.543.333	YORMAN HERNANDO ROJAS PUCHIGAY	INSPECTOR DE OBRA	100%	13/02/2024	-	-
20	1.118.548.824	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	DIRECTOR DE OBRA	50%	19/03/2024	-	-
21	1.136.883.799	DIANA CAROLINA TOVAR CORTES	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	50%	13/02/2024	-	-

No	CEDULA	NOMBRE	CARGO	% DEDIC	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	OBSERVACIONES
22	9.430.088	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	PROFESIONAL HSE	20%	13/02/2024	-	-
23	1.049.621.180	DIEGO ANDRES GARCIA MENDIVELSO	ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA	20%	13/02/2024	-	-

5.3.1 RELACIÓN PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Tabla 17. Relación de planillas de seguridad social

MES DE MARZO DE 2024			
CLAVE PLANILLA	CLAVE PAGO	PENSIÓN	SALUD
9465362689	554598770	2024-03	2024-04
9466196589	597061435	2024-03	2024-04

5.4 EQUIPOS UTILIZADOS

Tabla 18. Equipos utilizados a fecha del presente informe

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Estación total (topografía)	1
Nivel automático (topografía)	1
Excavadora de oruga	4
Retroexcavadora	1
Mini cargador	1
Vibrocompactador	1
Volqueta sencilla	11
Volquea Doble	1

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

5.5 MATERIALES UTILIZADOS

Los materiales utilizados durante el presente periodo son los siguientes:

Tabla 19. Relación de material utilizado

No	MATERIAL
1	Agua para obra
2	Aislador suspensión sintetico-polimerico para 15 KV
3	Arandela de presión de 1/2"
4	Arandela de presión de 5/8"
5	Arandela redonda plana de 1/2"
6	Arandela redonda plana de 5/8"
7	Arena lavada de rio
8	Brazo anti balanceo 32 cm en acero para red compacta 13.2KV
9	Cable de acero galvanizado Ø 1/4" extra resistente
10	Cable N.º 1/0 AWG ACSR semiaislado XLPE-TK 15KV
11	Cemento gris
12	Cinta de Señalización - peligro no pase -
13	Collarín de 6" a 8" por 1 salida en platina galvanizada de 1/4"
14	Collarín de 8" a 10" por 2 salida en platina galvanizada de 1/4"
15	Cortacircuitos de cañuela para 15 KV 100 A
16	Cruceta metálica de 2 1/2" x 2 1/2 x 3/16" x 1.5 m
17	Cruceta metálica de 2 1/2" x 2 1/2 x 3/16" x 2 m
18	Diagonal en V de 1.10 m entre huecos (CR. metálica)
19	Diagonal en varilla de 0.68 m x 5/8"
20	Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar
21	Espaciador polimérico 13.2KV, incluye anillos, red compacta
22	Esparrago galvanizado de 5/8" x 10" con 4 tuercas y 4 arandelas
23	Estaca de madera h=0.50-0.60m * A= 4-5 cm
24	Fusible de 15 KV, 1 - 5 A, tipo H
25	Grapa de retención pistola para cable guarda
26	Grapa de retención recta para cable No. 4 - 2/0 ACSR
27	Grapa de retención recta para cable No. 4 - 2/0 ACSR
28	kit puesta a tierra, incluye conductor bajante en (cable de acero austenítico 10 mm, forrado), conector para electrodo tipo varilla de 5/8 y varilla en acero inoxidable de 5/8"*2,4 m
29	Pararrayos polimérico de 12 KV, 10 KA
30	Perno de carriaje de 5/8" x 1 1/2"
31	Perno de máquina de 1/2" x 2"

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

No	MATERIAL
32	Perno de máquina de 5/8" x 10"
33	Perno de máquina de 5/8" x 12"
34	Perno de máquina de 5/8" x 8"
35	Poste de ferro concreto 12 m x 1050 kgf, tipo extrareforzado
36	Soporte tangencial o ménsula para red compacta 13.2KV
37	Triturado de 1/2" - 3/4"
38	Tuerca de ojo alargado de 5/8"

5.5.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

5.5.1.1 ARANDELAS

Las arandelas se clasifican en dos tipos; arandelas de presión y arandelas planas las cuales pueden ser redondas o cuadradas.

Las arandelas deben ser de una sola pieza, libres de soldadura, deformaciones y aristas cortantes.

- **Características Químicas**

Los materiales deben cumplir con los requisitos químicos indicados en numeral 4.2 de la norma NTC 2806, los cuales se indican en la siguiente tabla:

Tipo de Material	Lamina/Platina
% Carbono	0.15 a 0.36
% Fósforo	0.04
% Azufre	0.05

Para arandelas de presión, la composición química debe cumplir con la NTC 243.

- **Características Mecánicas**

La dureza del material de las arandelas debe estar entre 26 y 45 HRC para arandelas planas y entre 45 y 51 para las de presión.

- **Características del Recubrimiento**

Las arandelas serán totalmente galvanizadas por inmersión en caliente de acuerdo a lo establecido en la norma NTC. Las arandelas deben estar libres de burbujas, áreas sin revestimientos, depósitos

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

de escoria, manchas negras y otro tipo de inclusiones que puedan causar interferencia en el uso del producto.

Para zonas contaminadas se utilizarán galvanizados superiores como se indica en la tabla 4 a continuación.

- **Características Geométricas y Dimensionales**

Las características geométricas y dimensionales deberán estar de acuerdo con las figuras 1, 2 y 3 y las tablas 5, 6 y 7 de la presente especificación.

Figura 1 Arandelas Redondas Planas


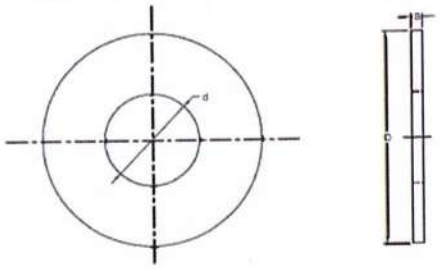


Tabla 5. Dimensiones Arandelas Redondas Planas.

Perno		d				D				B			
mm	pulgada	mm	pulgada	+	-	mm	pulgada	+	-	mm	pulgada	+	-
9.5	3/8	11	7/16	0.38	0.13	25.4	1	0.4	0	2.1	0.083	2.6	1.6
13	½	14.3	9/16	0.38	0.13	35	1 3/8	0.4	0	2.8	0.109	3.6	2.2
16	5/8	17.5	11/16	0.76	0.18	44	1 3/4	0.4	0	3.2	0.134	3.8	2.7
19	3/4	20.6	13/16	0.76	0.18	51	2	0.4	0	4	0.148	4.6	3.5

Figura 2 Arandelas Cuadradas Planas

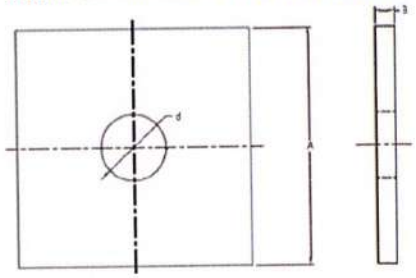

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Tabla 6. Dimensiones Arandelas Cuadradas Planas.

Perno		d				A				B			
mm	pulgada	mm	pulgada	+	-	mm	pulgada	+	-	mm	pulgada	+	-
16	5/8	17.5	11/16	0.76	0.18	76	3	0.8	0.18	6.4	1/4	6.8	6.0
19	3/4	20.6	13/16	0.76	0.18	76	3	0.8	0.18	6.4	1/4	6.8	6.0
16	5/8	17.5	11/16	0.76	0.18	102	4	0.8	0.18	6.4	1/4	6.8	6.0
19	3/4	20.6	13/16	0.76	0.18	102	4	0.8	0.18	6.4	1/4	6.8	6.0

Figura 3. Arandelas de Presión

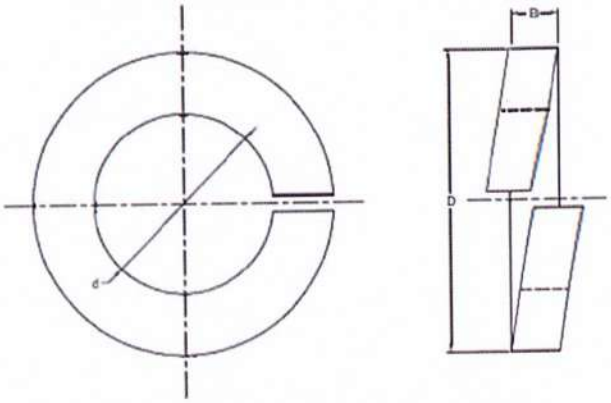


Tabla 7. Dimensiones Arandelas de Presión.

Perno		d		D		B	
mm	pulgada	máx	mín	máx	mín	máx	mín
13	1/2	13.5	13.1	22.2	21.6	3.8	3.2
16	5/8	16.5	16.1	27.4	26.6	4.8	4.0
19	3/4	19.7	19.3	32.3	31.3	5.7	4.8

- **Ensayos**

La conformidad de producto se verificará mediante protocolos de pruebas tipo, certificados de producto con norma y RETIE, si aplica, y pruebas de rutina e inspección en laboratorios. Los protocolos de los ensayos tipo serán solicitados en caso de ser necesario. El interventor, administrador o gestor técnico del contrato solicitará al fabricante todos los ensayos que considere necesarios para validar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo a las normas fabricación y ensayo.

Las pruebas destinadas a garantizar la conformidad del producto con la norma técnica, serán efectuadas en laboratorios propios del fabricante o de terceros, seleccionados de común acuerdo entre las partes.

Todos los instrumentos, equipos o sistemas de medición deben ser calibrados de tal manera que se garantice la trazabilidad a patrones nacionales o internacionales, respaldándose en certificados o informes de calibración que incluya la fecha, incertidumbre de medida y las condiciones bajo las cuales se obtuvieron los resultados. Todos los ensayos de recepción se harán antes de la entrega, en el lugar de fabricación o en laboratorio acordado. El costo de los ensayos será a cargo del fabricante.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

- **Criterios de aceptación y rechazo**

Los criterios de aceptación y el tipo de muestreo para todos los diferentes ensayos serán de acuerdo con lo indicado en la norma NTC-ISO 2859-1, y será potestad del interventor o administrador técnico aplicar el plan de muestreo señalado en este numeral.

Se procederá a la extracción de la muestra aleatoriamente, de tal manera que se asegure la representatividad del lote de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

TAMAÑO DEL LOTE	TAMAÑO DE LA MUESTRA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
2 a 15	2	0
16 a 25	3	0
26 a 90	5	0
91 a 150	8	1
151 a 280	13	1
281 a 500	20	2
501 a 1200	32	3
1201 a 3200	50	5
3201 a 10000	80	7
10001 y mas	125	10

Se considera que un (1) lote cumple con los requisitos dimensionales, mecánicos y eléctricos, cuando al probar todos los elementos de la muestra se encuentra el número de elementos defectuosos permitidos o menos.

En el lote rechazado el fabricante deberá ensayar cada uno de los elementos que lo componen, remitir los resultados de las pruebas a la empresa y solicitar nuevamente la inspección de los mismos.

Los elementos rechazados de los lotes aprobados y las unidades componentes de los lotes definitivamente rechazados no podrán formar parte del suministro en cumplimiento del pedido de la empresa.

En caso de ser requerido y de común acuerdo entre las partes, por razones de orden económico, por la naturaleza de los ensayos o por las exigencias del proceso, podrán realizarse cambios sobre el plan de muestreo establecido.

- <u>NOTA:</u>

Las arandelas utilizadas en este proyecto cumplen con la especificación anteriormente mencionada.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

5.5.1.2 CABLE EN ACERO GALVANIZADO

- **Condiciones de servicio**

Los cables de acero deberán suministrarse para operar satisfactoriamente a la intemperie, bajo las siguientes condiciones de servicio:

Característica	AMPLA	CODENSA	COELCE	CHILECTRA	EDELNOR	EDESUR
Altitud máxima (m)	< 1.000	2.700	< 1.000	< 1.000	< 1.000	< 1.000
Temperatura Min/Máx (°C)	-5 / +40					
Humedad relativa (IEC – 60721-2-1)	100%	90%	95%	100%	100%	100%
Nivel contaminación (IEC-60815)	Alto (III)	Medio (II)	Muy Alto (IV)	Medio (II)	Muy Alto (IV)	Medio (II)
Radiación Solar máx (w/m²)	< 1000					

- **Material**

Acero al carbono con alambre o hilos zincados de acuerdo a Normas NBR 6323 y ASTM-475.

- **Uniones**

Las uniones de los hilos o alambres del cable deben hacerse con soldaduras fuertes con traslapo o con soldadura eléctrica al tope y deben recubrirse con Zinc. Se acepta hasta una unión cada 45m en alguno de los alambres componentes. En este tramo no se admite unión en otro alambre.

No deben existir uniones o empalmes realizados por torsión en ningún de los hilos que conforma el cable terminado.

- **Parámetros físicos**

Para los cables de 7 hilos descritos en la presente especificación son válidos los parámetros siguientes:

- Coeficiente de elasticidad (E): 11000 kg/mm2
- Coeficiente de dilatación lineal: 12.5 x10 exp(-6) por °C y por metro.
- Carga de rotura: está indicada en la Tabla 3 para cada tipo o grado de cable.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Grado	Descripción
EAR o EHS	Extra High-Strength. (Extra Alta Resistencia)
AR o HS	High-Strength. (Alta Resistencia)
MR o SM	Siemens-Martin

- **Características constructivas:**

Alambres o hilos de acero:

- Galvanizados a través de una camada de zinc continua y uniforme.
- Los alambres de acero deberán tener el recubrimiento de zinc de acuerdo a la clase indicada en la Tabla 3, de acuerdo con la norma ASTM A-475. En alambres terminados no se aceptan empalmes.
- Regularmente cilíndrico.
- Sin enmiendas, torceduras, rayas (arañazos) profundas y de otras imperfecciones que puedan afectar su resistencia mecánica

Cable de acero:

El cable debe estar construido de 7 alambres o hilos de acero, descritos en el párrafo 6.4.1, conformado por un hilo central con una capa de 6 hilos encordados juntos concéntricamente sobre él.

La torsión será izquierda, lo cual está definido como un trenzado en forma helicoidal opuesto a las manecillas del reloj (sentido antihorario) con paso uniforme máximo igual a 16 veces el diámetro nominal para el cable.

N° hilos	Grado	Masa mínima de camada de zinc Clase (gr/m²)	Diámetro Nominal del cable de acero en mm(pulg)	Diámetro Nominal de hilo de acero (mm)	Masa aprox. cable (kg/km)	Carga Ruptura mínima (daN)
7	MR o SM	B(370)	6.4(1/4)	2.03	160	1430
7	AR o HS	B(490)	7.9 (5/16)	2.64	305±15	3630
7	EAR o EHS	B(520)	9.5(3/8)	3.05	407±20	6990

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

- **Ensayos**

Ensayos de Tipo

Inspección Visual

- Considerar lo señalado en la Norma NBR 5909 y lo aquí señalado:
- Se observará a ojo descubierto que las superficies no presenten agrietaduras visibles. Ralladuras profundas, torcimientos y otros defectos.
- Se verificará la ubicación y existencia de soldaduras en los hilos o alambres del cable.
- Se verificará el número de hilos del cable.
- El acabado de las superficies internas y externas del cable será uniforme y sin exposición de fibras, ni poros.
- Se verificará el sentido de torcimiento.

Verificación dimensional

Se verificarán todas las dimensiones del cable de acero, tales como diámetro externo y diámetro de cada hebra y peso por metro. Para ello se utilizarán instrumentos que tengan un alcance y precisión adecuados. Recordar que los instrumentos de medida utilizados deben estar calibrados previamente.

Prueba de resistencia mecánica

Ensayo realizado a las muestras de cable según la Norma NBR y ASTM.

Verificación de Galvanizado

Mediante medidas se determinará la cantidad de zinc para el cable considerado

- **NOTA:**

El cable utilizado en este proyecto cumple con la especificación anteriormente mencionada.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

5.5.1.3 COLLARINES O ABRAZADERAS

- **Requisitos técnicos**


Son elementos de características geométricas y mecánicas tales que les permiten adaptarse a las limitaciones impuestas por otros elementos y por los postes.

Las abrazaderas de 1 ½" X ¼" de una salida deberán estar formadas por dos elementos en forma circunferencial con pestañas, las platinas deben ser de alta calidad y cumplir la norma NTC – 422; si la abrazadera es estampada en frío, el acero debe ser de bajo silicio o sea menor de 0,05% (A34 - SAE1010 o SAE1020) o en su defecto, deberá ser estampada en caliente.

Los tornillos o pernos, tuercas y arandelas deberán estar de acuerdo con las normas que disponga CODENSA para tal fin o en su defecto con las normas NTC – 858 y ANSI/ASME B1.1-1982; deberán tener un recubrimiento para evitar la corrosión.

- **Platina**

La platina utilizada será de 1 ½" X ¼" (38,1 X 6,35mm)

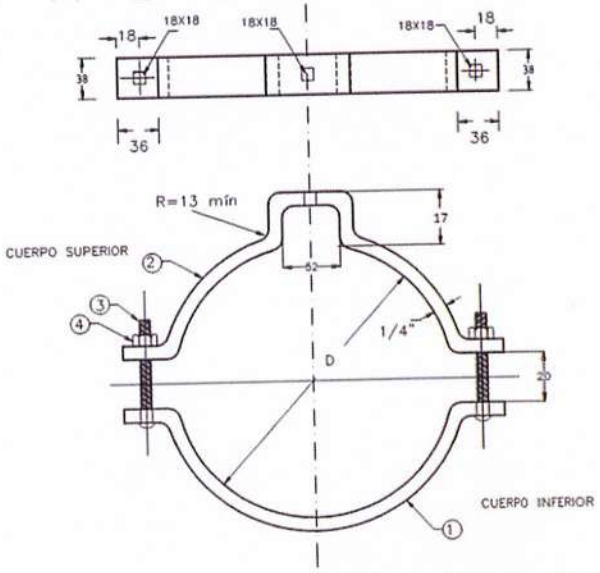

NOTAS :

1 - Recubrimiento con galvanizado por inmersión en caliente o recubrimiento órgano metálico
2 - Material platina acero SAE 1010 o 1020
3 - Dimensiones en milímetros y pulgadas.
4 - Tolerancias de medidas +/- 5%

APLICACIÓN

Soporte de diagonales para estructuras de M.T.

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
		ELEMENTOS QUE SE SUMINISTRAN
④	2	Tuerca Hexagonal m_5
③	2	Tornillo Carruaje Tipo 1-t_4
②	1	Cuerpo Superior
①	1	Cuerpo Inferior

SIMBOLO	COD. SAP	ABRAZADERA	D (mm)
Z_7	6762235	TIPO Nº2	140
Z_8	6762236	TIPO Nº3	180
Z_9	6762237	TIPO Nº4	200
Z_{10}		TIPO Nº5	250
		TIPO Nº6	300
		TIPO Nº7	350

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

- **Químicos**

Las platinas deben cumplir con los siguientes requisitos de la tabla 1:

REQUISITOS QUÍMICOS DE LAS PLATINAS		
ELEMENTO	**SAE 1010**	**SAE 1020**
% Carbono	0,08 a 0,13	0,18 a 0,22
% Fósforo, máx.	0,05	0,05
% Azufre, máx.	0,05	0,05
% Manganeso	0,3 a 0,6	0,3 a 0,6
% Silicio, máx.	0,05	0,05

- **Mecánicos**

Las platinas utilizadas para la fabricación de las abrazaderas de una salida deben tener los siguientes requisitos mínimos:

- Resistencia a la tracción 34,7 Kg/mm2 (340 MN/m2).
- Límite mínimo de fluencia 18,4 Kg/mm2 (180 MN/m2).
- Elongación 30% en 50 mm (2pulg.).

Doblado en caliente

La temperatura máxima permitida es de 650 grados centígrados. El fabricante debe garantizar esta temperatura sobre la platina; se recomienda el uso de tiza térmica de 620 grados y de 650 grados centígrados.

- **Requisitos del recubrimiento**

Para el recubrimiento se acepta el galvanizado por inmersión en caliente y como alternativa el recubrimiento órgano metálico por micro capas.

- **Requisitos del acabado**

Los perfiles deben ser de una sola pieza, libres de soldaduras, libres de deformaciones, fisura, aristas cortantes, y defectos de laminación. No se permiten dobleces ni rebabas en las zonas de corte, perforadas o punzadas. El recubrimiento debe estar libre de burbujas, depósitos de escorias, manchas negras, excoriaciones y/u otro tipo de inclusiones.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

- **Criterios de aceptacion o rechazo**

Para este caso se considerará que existe un lote cuando, los materiales de la platina y los demás elementos pertenecen a un mismo lote de materia prima y un mismo lote de producción, de no ser así deberá tomarse como lotes, por los diferentes aspectos de materia prima y de producción.

- **NOTA:**

Los collarines utilizados en este proyecto cumplen con la especificación anteriormente mencionada.

5.5.1.4 CRUCETA METÁLICA

- **Requisitos**


Son elementos de características geométricas y mecánicas tales que les permiten adaptarse a las limitaciones impuestas por otros elementos y por los postes. Las crucetas metálicas en ángulo deberán estar formadas por un (1) solo elemento.

Las crucetas metálicas en ángulo deben ser construidas con el material acero estructural A36, que cumpla los requisitos de la NTC 1920. Las crucetas metálicas en ángulo deben ser construidas con ángulo 3 "x 3 "x ¼ ".


- **Geometría**


Las crucetas metálicas en ángulo son de tres tipos: 2.5, 4 y 6 metros.

Las perforaciones para la cruceta de 2.5 serán las indicadas en la figura No.1 y para las crucetas de 4 y 6 serán de diámetro de 13/16 ". Deben cumplir las dimensiones y perforaciones dadas en las siguientes figuras.




Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

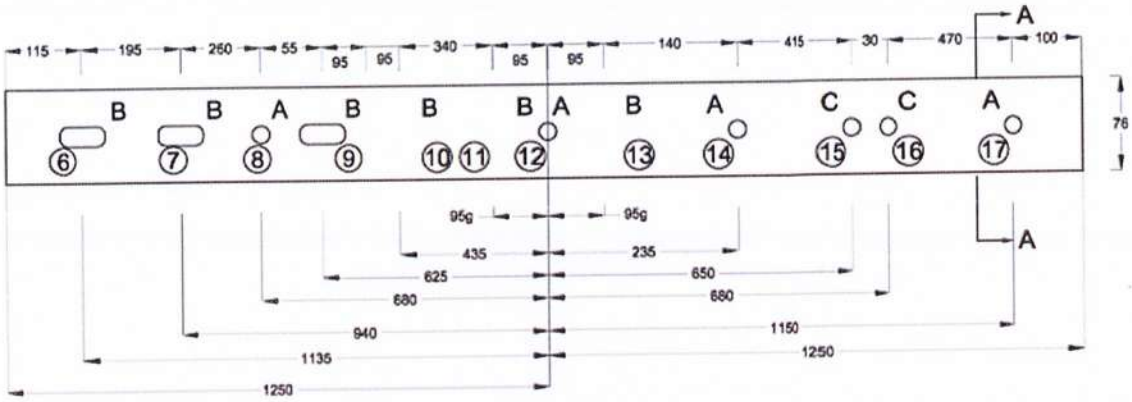



Vista lateral



DETALLE "B"

① ③ y ⑤	Para porta aislador tipo pin. En construcción semi-bandera
⑥ ⑫ y ⑰	Para colocación de perro de ojo en retención simétrica sencilla o doble
⑨ y ⑩	Sujeción de la cruceta al poste en construcción semi-bandera
⑮	Fijación de la cruceta en construcción semi-bandera
⑧ y ⑯	Fijación de las diagonal en construcción simétrica
⑪ y ⑬	Fijación de la cruceta al poste en construcción simétrica
⑥ y ⑦	Fijación de la cruceta al poste en construcción bandera
② ④ y ⑤	Fijación porta aislador tipo pin en construcción bandera
⑯	Fijación de diagonal en construcción bandera
⑧ ⑭ y ⑰	Colocación de perno de ojo en retención tipo bandera
③ ⑤ y ⑱	Para porta aislador tipo pin. En construcción bandera para circuito primario

Dimensiones en mm



DETALLE "C"

USO DE LOS ORIFICIOS


DIÁMETRO DE LOS HUECOS
A=23 mm Ø
B=ver detalle B
C=19mm Ø

TOLERANCIAS
Diámetros huecos: 3 mm
Longitud de la cruceta =+5 mm
Entre perforaciones=+4 mm


SÍMBOLO	COD. SAP
C19	

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare


Planta

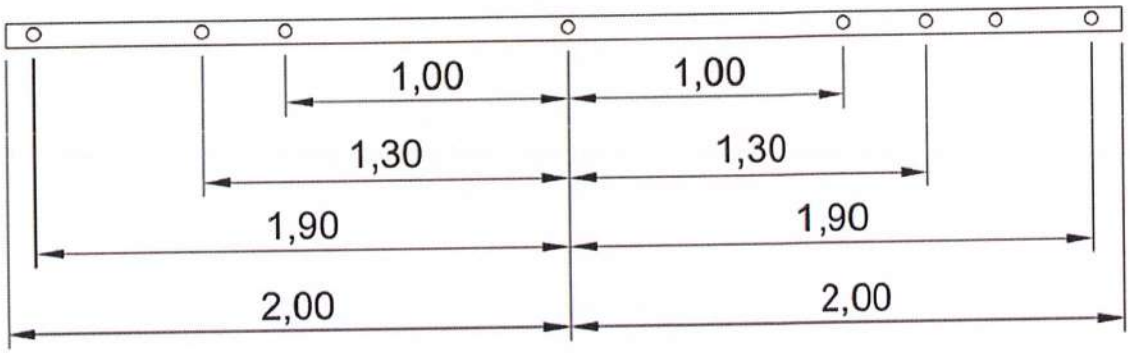

Perfil

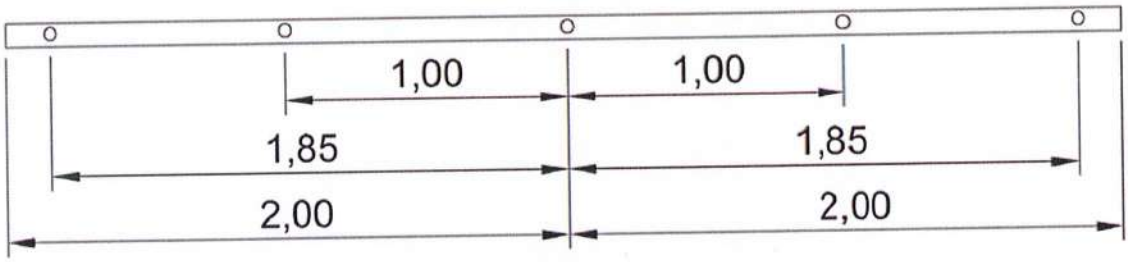


Detalle platina

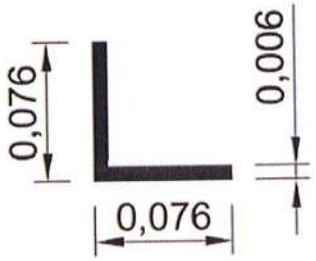


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare


Planta



Perfil

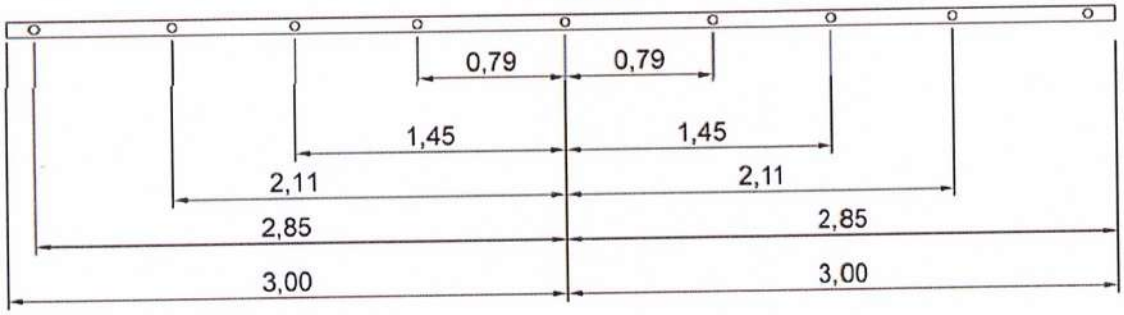

Detalle platina



Notas figuras 1, 2 y 3

1. Las dimensiones se indican en metros.
2. Las perforaciones tienen diámetro de 3/16".
3. Los ángulos utilizados son de 3" x 3" x 1/4" como se indica en la vista lateral.

- **Mecánicos**

Los ángulos utilizados para la fabricación de las crucetas metálicas en ángulo deben tener los siguientes requisitos mínimos:

- Resistencia a la tracción 34,7 Kg/mm2 (340 MN/m2).
- Límite mínimo de fluencia 18,4 Kg/mm2 (180 MN/m2).
- Elongación 30% en 50 mm.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

- **Criterios de aceptación o rechazo**

Para este caso se considerará que existe un lote cuando, los materiales de los ángulos y platina y los demás elementos pertenecen a un mismo lote de materia prima y un mismo lote de producción, de no ser así deberá tomarse como lotes diferentes, por los aspectos de materia prima y de producción.

TAMAÑO DEL LOTE	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO PERMITIDO DE DEFECTUOSOS	NUMERO DEFECTUOSOS PARA RECHAZO
2 a 8	A = 2	0	1
9 a 15	B = 3	0	1
16 a 25	C = 5	0	1
26 a 50	D = 8	1	2
51 a 90	E = 13	1	2
91 a 150	F = 20	1	2
151 a 280	G = 32	2	3
281 a 500	H = 50	3	4
501 a 1200	J = 80	5	6
1201 a 3200	K = 125	7	8
3201 a 10000	L = 200	10	11

TAMAÑO DEL LOTE	TAMAÑO DE LA MUESTRA	NUMERO PERMITIDO DE DEFECTUOSOS	NUMERO DEFECTUOSOS PARA RECHAZO
2 a 8	A = 2	0	1
9 a 15	A = 2	0	1
16 a 25	B = 3	0	1
26 a 50	B = 3	0	1
51 a 90	C = 5	1	2
91 a 150	C = 5	1	2
151 a 280	D = 8	1	2
281 a 500	D = 8	1	2
501 a 1200	E = 13	1	2
1201 a 3200	E = 13	1	2
3201 a 10000	F = 20	1	2

- NOTA:

Las crucetas metálicas utilizadas en este proyecto cumplen con la especificación anteriormente mencionada.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

5.5.1.5 POSTE EN CONCRETO

- **Características**

Todos los postes de concreto, sean armados o pretensados, deben cumplir con las normas y con los requisitos específicos indicados en este documento y deben contar con certificación de producto bajo RETIE y la norma NTC 1329.

- **Fabricación**

Los postes se deben fabricar con el uso exclusivo de formaletas metálicas, que aseguren uniformidad geométrica y exactitud en sus dimensiones.

La fabricación de los postes debe cumplir con la norma NTC 1329. En ningún caso se aceptan los postes amasados y compactados a mano

- **Perforaciones para postes de redes de distribución**


Ninguna perforación puede tener una desviación mayor a 5 mm, con respecto al plano diametral del poste que contiene su eje longitudinal. Ninguna de las partes de la armadura de refuerzo del poste, debe ser visible por estas perforaciones.

Todas las perforaciones a excepción de las perforaciones que se utilizan para los conductores bajantes de puesta a tierra, deben contar con tapones plásticos de fácil remoción y reinstalación, estos tapones deben ajustarse perfectamente a las perforaciones.

- **Perforaciones para la sujeción de estructuras**

Todos los postes que se van a utilizar en redes de distribución de baja y media tensión, deben llevar de la cima hacia abajo un número de perforaciones destinadas para la sujeción de herrajes o estructuras mediante tornillos. Un primer conjunto de perforaciones se realizará normales al eje del poste, traspasándolo, y su diámetro deberá estar entre 20 mm y 23 mm, la primera perforación se debe realizar a 100 mm de la cima y las siguientes a una distancia entre centros de 200 mm de la perforación anterior. Un segundo conjunto de perforaciones se realizará a 90° y desplazadas 100 mm centro a centro del primer conjunto.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

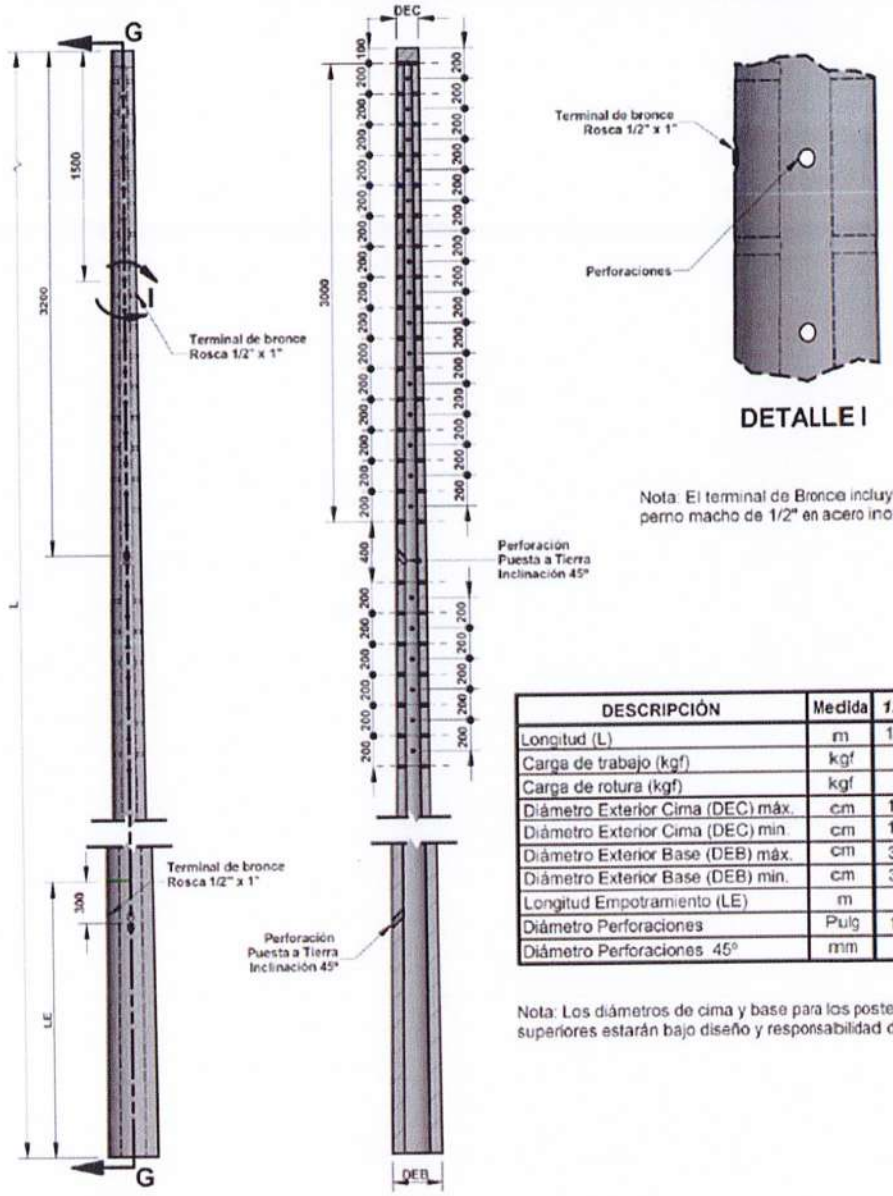

DETALLE I

Nota: El terminal de Bronce incluye perno macho de 1/2" en acero inoxidable

DESCRIPCIÓN	Medida	12-510	12-750	12-1050	12-1350
Longitud (L)	m	12.00	12.00	12.00	12.00
Carga de trabajo (kgf)	kgf	204	300	420	540
Carga de rotura (kgf)	kgf	510	750	1050	1350
Diámetro Exterior Cima (DEC) máx.	cm	16.00	18.00	21.00	22.00
Diámetro Exterior Cima (DEC) min.	cm	13.50	15.50	18.50	19.50
Diámetro Exterior Base (DEB) máx.	cm	34.00	36.00	39.00	40.00
Diámetro Exterior Base (DEB) min.	cm	31.50	33.50	36.50	37.50
Longitud Empotramiento (LE)	m	1.80	1.80	1.80	1.80
Diámetro Perforaciones	Pulg	13/16	13/16	13/16	13/16
Diámetro Perforaciones 45°	mm	40	40	40	40

Nota: Los diámetros de cima y base para los postes con cargas de rotura superiores estarán bajo diseño y responsabilidad del fabricante

Figura 5-6 Poste de 12 m.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

- **Perforaciones para la instalación de la puesta a tierra**

Los postes deben tener dos perforaciones de diámetro no menor a 40 mm, una localizada a una distancia de 300 mm por debajo de la marcación de empotramiento y la otra en la parte superior del poste, a 200 mm por debajo de la última perforación en los postes de 8 m y 10 m, a 3300 mm de la cima hacia abajo en los postes de 12 m, a 4900 mm de la cima hacia abajo en los postes de 14 m y a 6700 mm de la cima hacia abajo en los postes de 16 m, (ver perforación C en figura 5-1 a figura 5-11). Además, el diseño de estas perforaciones debe ser de tal forma que permita la fácil instalación del conductor bajante de la puesta a tierra y su paso por el interior del poste, igualmente deben construirse con una inclinación de 45° descendente en la perforación superior y ascendente en la perforación inferior.

- **Conicidad**

Los postes deben tener una conicidad entre 1,5 y 2 cm/m de longitud, conforme al RETIE, la conicidad del poste se determina con base en los parámetros geométricos de éste y obedece a la siguiente ecuación:

$$C = \frac{D_1 - D_2}{h}$$

Donde C es la conicidad, D1 y D2 son los diámetros de la cima y de la base respectivamente y h es la altura total. Los diámetros de cima y de base, deberán estar de acuerdo a lo establecido en la norma NTC 1329.

- **Cargas mínimas de rotura**

En la siguiente tabla, se establecen las cargas mínimas de rotura para todos los postes de concreto armado y pretensado y sus equivalentes en daN. Para efectos de esta especificación aplican las cargas de rotura establecidas en el RETIE. Los postes con cargas de rotura superiores se considerarán postes especiales.

Tabla 3 Cargas mínimas de rotura

CARGA MÍNIMA DE ROTURA SEGÚN RETIE EN kgf	CARGA EN N	CARGA MÍNIMA DE ROTURA EN daN	TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN
510	5001	500	Armado o Pretensado
750	7355	736	Armado o Pretensado
1050	10300	1030	Armado o Pretensado
1350	13240	1324	Pretensado
1500	14700	1470	Pretensado
1800	17640	1764	Pretensado
2000	19600	1960	Pretensado

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Tabla 4 Cargas de trabajo

CARGA DE ROTURA EN kgf	CARGA DE TRABAJO EN kgf	CARGA DE TRABAJO EN daN
510	204	200
750	300	294
1050	420	412
1350	540	530
1500	600	588
1800	720	706
2000	800	786

- **Deformaciones o flechas bajo carga**

El poste, bajo la acción de una carga aplicada a 20 cm de la cima, con una intensidad igual a la carga de trabajo especificada en la tabla 4, no debe producir una deformación (flecha) superior al 3% de la longitud libre del poste (la deformación debe ser aproximada al cm, de acuerdo con la tabla 5), y al finalizar la acción de esa carga, la deformación permanente no debe ser superior al 0.15% de la longitud libre del poste (la deformación debe ser aproximada al mm, de acuerdo con la tabla 5). En la Tabla 5 se establecen los límites para la flexión bajo carga y deformación permanente. Las deformaciones se determinan de acuerdo con el ensayo de flexión especificado en la norma NTC 1329.

Tabla 5 Deformaciones o flechas bajo carga

LONGITUD TOTAL (m)	DEFORMACIÓN BAJO CARGA DE TRABAJO (cm)	DEFORMACIÓN PERMANENTE (mm)
8	20	10
10	25	13
12	31	15
14	36	18
16	41	21

- **Resistencia a la compresión del concreto**

Se debe tener en cuenta las condiciones establecidas en el numeral 6.2 de la Norma NTC-1329.

- **Acero de refuerzo principal**

Se debe tener en cuenta las condiciones establecidas en el numeral 5.1 de la Norma NTC1329.

- **Recubrimiento**

El recubrimiento mínimo de la armadura debe ser de 25 mm, medidos desde la superficie de la armadura hasta la cara o superficie interior y exterior del poste, incluidas la cima y la base.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

5.6 ESTADO DEL CLIMA

Ilustración 10. Reporte diario del clima

INFORME DIARIO ESTADO DEL CLIMA

CONTRATO DE OBRA No:	041-2023	CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23
CONTRATO DE INTEVENTORIA No:	042-2023	CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PR-HK

		MARZO																															
	MES																																
	DÍA	VI	SA	DO	LU	MAR	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	TOTAL DIAS
HORA	FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
HORAS/AM	7:00-8:00														Obra suspendida por la comunidad														Semana Santa				31
	8:00-9:00																																31
	9:00-10:00																																31
	10:00-11:00																																31
	11:00-12:00																																31
HORAS/PM	12:00-1:00																																31
	1:00-2:00																																31
	2:00-3:00																																31
	3:00-4:00																																31
	4:00-5:00																																31
	5:00-6:00																																31

S	SOL	NB	NUBLADO
LL	LLUVIA	LZ	LLOVIZNA
NT	NO SE TRABAJO	T	TORMENTA

Ilustración 12. Inundación zona de excavación EBAR





5.7.1 RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ

Tabla 20. Relación de actas de reunión de obra

ACTA No.	FECHA	OBJETO	CONCLUSIONES	COMPROMISOS
1	04/03/2024	Plan de trabajo para el mes de marzo	El contratista de obra informa a la interventoría el plan de trabajo y la ruta a seguir para el mes de febrero.	Se programa nuevo comité para el día 11 de marzo de 2024
2	13/03/2024	Plan de acción ante inconformidades por parde la comunidad local	Se propone realizar canales de diálogo directo con la comunidad con el fin de dar pronta solución a la problemática presentada.	Se programa nuevo comité para el día 20 de marzo de 2024
3	20/03/2024	Dar a conocer el avance del contrato de obra	El residente pone al tanto a la interventoría sobre el avance que ha tenido la obra y la ruta a seguir en adelante	Se programa nuevo comité para el día 01 de abril de 2024

5.8 RELACIÓN DE ACTAS DE REUNIÓN DE OBRA

Tabla 21. Relación de actas de reunión de obra

ACTA No.	FECHA	OBJETO	CONCLUSIONES	COMPROMISOS
1	07/03/2024	Evaluación de hojas de vida para cambio de profesionales de propuesta Consorcio PR-HK	La supervisión avala el cambio de los profesionales	N/A
2	11/03/2024	Informar a los contratistas las disposiciones de la	La interventoría manifiesta que hará acompañamiento técnico durante el proceso de evaluación	Revisar la posibilidad de darle prioridad a la construcción de las redes

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

ACTA No.	FECHA	OBJETO	CONCLUSIONES	COMPROMISOS
		secretaria de planeación municipal	de la alternativa con el fin verificar que las condiciones planteadas se ajusten a los requerimientos del proyecto	de alcantarillado de la Ciudadela La Bendición
3	13/03/2024	Suspensión de actividades	Las partes son puestas al tanto acerca de la problemática que se aqueja, se proponen canales de diálogos para lograr reactivar lo más pronto las actividades de obra.	El personal de obra e interventoría se comprometen a establecer un canal de comunicación efectivo con los líderes y representantes de la comunidad afectada.
4	20/03/2024	Entrega de plan de trabajo según requerimientos secretaria de planeación municipal	Supervisión e interventoría avalan el plan de trabajo presentado por el contratista de obra.	Por parte del contratista, enviar el plan de trabajo actualizado que incluya diámetros y longitudes de tubería, cómo Plazo máximo para el cumplimiento de este compromiso: miércoles 20 de marzo de 2024 en horas de la tarde

5.9 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Tabla 22. Relación de correspondencia recibida

FECHA RECIBIDO	REMITENTE	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
19/03/2024	Consorcio PR-HK	Consorcio BENDICIÓN 23	Traslado de aprobación del cambio de residente de obra.

5.10 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

Tabla 23. Relación de correspondencia enviada

FECHA RECIBIDO	REMITENTE	DIRIGIDO A:	REFERENCIA / ASUNTO
11/03/2024	R/L CONSORCIO BENDICIÓN 23	Consorcio PR-HK	Solicitud cambio de director de obra
21/03/2024	R/L CONSORCIO BENDICIÓN 23	Consorcio PR-HK	Entrega informe mensual de obra No. 1

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

5.11 BITÁCORA

Se anexa bitácora de obra debidamente firmada.

5.12 ANEXOS

5.12.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO

5.12.2 CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

5.12.3 PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL

5.12.4 CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS

5.12.5 ACTAS DE COMITE

5.12.6 ACTAS DE REUNION DE OBRA

5.12.7 CORRESPONDENCIA RECIBIDA

5.12.8 CORRESPONDENCIA ENVIADA

5.12.9 BITÁCORA DE OBRA

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

Red de media tensión



Apertura de huecos para postes



Apertura de huecos para postes




Hincado de postes



Cimentación de postes



Instalacion de cableado red de media tensión

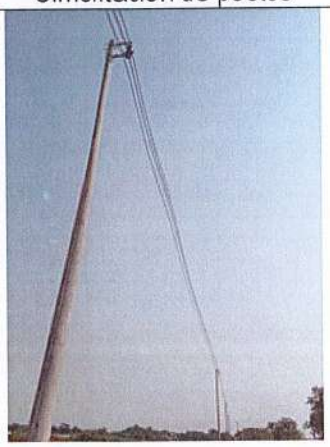

Instalacion de cableado red de media tensión

Obras zona de ebar



Construccion de canales para evacuacion de aguas lluvia



Construccion de canales para evacuacion de aguas lluvia



Descapote en zona de EBAR.



Descapote en zona de EBAR.



Replanteo en zona de EBAR



Replanteo en zona de EBAR

	
Excavación para cimentación de la EBAR	Excavación para cimentación de la EBAR
	
Excavación para cimentación de la EBAR	Excavación para cimentación de la EBAR
	
Excavación para cimentación de la EBAR	Excavación para cimentación de la EBAR



Excavación para cimentación de la EBAR



Excavación para cimentación de la EBAR



Excavación para cimentación de la EBAR



Excavación para cimentación de la EBAR

Cerramiento EBAR



Cerramiento perimetral EBAR



Cerramiento perimetral EBAR

	
Cerramiento perimetral EBAR	Cerramiento perimetral EBAR
	
Cerramiento perimetral EBAR	Cerramiento perimetral EBAR
	
Cerramiento perimetral EBAR	Cerramiento perimetral EBAR

Actividades en campamento de obra



Armado de acero para tanque de combustible



Armado de acero para tanque de combustible



Fundicion de placa tanque de cumbistible



Fundicion de placa tanque de cumbistible



Formaleteado para muros de tanque de combustible



Formaleteado para muros de tanque de combustible



Fundicion de muros para tanque de cumbistible



Fundicion de muros para tanque de cumbistible



Estructura para bodega de materiales



Estructura para bodega de materiales



Estructura para bodega de materiales



Planta potalizadora de agua

Inconvenientes presentados



Invasion de la comunidad a la zona de excavacion EBAR



Invasion de la comunidad a la zona de excavacion EBAR



Reunion con la comunidad en busca de solucion a la problematica



Reunion con la comunidad en busca de solucion a la problematica



Inundacion zona de excavacion EBAR



Inundacion zona de excavacion EBAR

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 25 de abril de 2024

Ingeniero:
OVED QUIROGA FLOREZ
Gerente General
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P"
Carrera 19 No. 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco Piso 3. El Yopal

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **CERTIFICA PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES.**

En nuestra condición de Representante legal, yo DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO identificado con C.C. 1.118.548.824 de Yopal y CESAR ANDRÉS HERMIDA SERRANO en calidad de Contador del CONSORCIO BENDICIÓN 23 con NIT: 901.767.095-1. Nos permitimos CERTIFICAR que de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia se ha realizado el pago efectuado por el concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Por lo anterior certificamos el pago de los siguientes aportes, los cuales forman parte de dichos estados financieros y corresponden a los montos contabilizados y pagados por el CONSORCIO BENDICIÓN 23 (NIT: 901.767.095-1) durante el periodo comprendido del 01/03/2024 – 31/03/2024 en desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE". Contemplado en el contrato No. 041 de fecha 15 DE NOVIEMBRE DE 2023 firmado entre el CONSORCIO BENDICION 23 y la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P"

358

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Télefono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Nota. Se anexa la relación del pago de seguridad social y aportes a parafiscales de cada trabajador durante el periodo relacionado.

Lo anterior acorde con los costos de personas previsto en la propuesta económica la cual hacer parte integral del contrato en mención y en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y de la ley 828 de 2003.

En constancia se firma en la Ciudad de Yopal Casanare, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año 2024.

En constancia firmo,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
1.118.548.824 DE YOPAL
R/L CONSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

CESAR ANDRÉS HERMIDA SERRANO
Tarjeta Profesional No. 134610-T
Contador

359

PAGO DE NÓMINA DEL PERSONAL



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

RELACION DE NOMINA GENERAL MES DE MARZO 2024

N°	DIRECCIÓN	TELEFONO	% ARL AFILIACION	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE INGRESO / CTO	FECHA DE RETIRO/CTO	SALARIO BASE MENSUAL	DIAS INCAPACIDAD GENERAL 66,67%	VALOR DIAS INCAPACIDAD GENERAL 66,67%	DIAS LABORADOS	VALOR DIA	TOTAL SALARIO DÍAS LABORADOS	VALOR IBC SALARIAL	SUBTOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR	TOTAL APORTES A PAGAR	FIRMA
1	CARRERA 8 N° 15-53	3024129218	6,96%	86.039.937	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL	OFICIAL DE OBRA	15/01/2024		$ 2.600.000	10	$ 577.778	20	$ 86.666,67	$ 1.733.334,00	$ 2.311.112	$ 2.419.112,00	$ 92.500	$ 92.500	$ 185.000,00	$ 2.234.112,00	$ 652.500	
2	CALLE 22 N° 16 - 25	3103650255	6,96%	6.775.413	AVILA FONSECA VICTOR MANUEL	DIRECTOR DE OBRA	13/02/2024	18/03/2024	$ 2.600.000	-	$ -	18	$ 86.666,67	$ 1.560.000,00	$ 1.560.000	$ 1.657.200,00	$ 62.400	$ 62.400	$ 124.800,00	$ 1.532.400,00	$ 483.000	
3	CALLE 32 A N° 15 A - 23	3102712725	6,96%	88.215.115	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE	MAESTRO DE OBRA	01/02/2024		$ 2.576.000	-	$ -	30	$ 85.866,67	$ 2.576.000,00	$ 2.576.000	$ 2.738.000,00	$ 103.100	$ 103.100	$ 206.200,00	$ 2.531.800,00	$ 797.800	
4	CALLE 139 N° 94-46	3214111614	6,96%	1.116.544.049	BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL	PROFESIONAL AMBIENTAL	13/02/2024		$ 1.300.000	-	$ -	30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
5	CARRERA 23 N° 19-15	3204074458	6,96%	74.181.863	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL	GERENTE DE PROYECTO	22/12/2023		$ 5.000.000	-	$ -	30	$ 166.666,67	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000	$ 5.000.000,00	$ 200.000	$ 200.000	$ 400.000,00	$ 4.600.000,00	$ 1.540.000	
6	CARRERA 23A # 21-76	3222673545	6,96%	1.118.564.818	CERON SOTABAN DALAVIER	OFICIAL DE OBRA	19/02/2024		$ 2.600.000	-	$ -	30	$ 86.666,67	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000	$ 2.762.000,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.554.000,00	$ 805.000	
7	CALLE 10 N° 10-79	3203310331	6,96%	1.116.551.841	CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED	AYUDANTE DE OBRA	21/03/2024		$ 1.300.000	-	$ -	10	$ 43.333,33	$ 433.334,00	$ 433.334	$ 487.334,00	$ 17.400	$ 17.400	$ 34.800,00	$ 452.534,00	$ 134.500	
8	CARRERA 28b #29-41	3108583168	6,96%	9.530.553	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE	AYUDANTE DE OBRA	21/03/2024		$ 1.300.000	-	$ -	10	$ 43.333,33	$ 433.334,00	$ 433.334	$ 487.334,00	$ 17.400	$ 17.400	$ 34.800,00	$ 452.534,00	$ 134.500	
9	CARRERA 30A N° 29-03	3108608846	6,96%	9.532.276	HURTADO PINEDA ALVARO	OFICIAL DE OBRA	05/03/2024		$ 2.600.000	-	$ -	26	$ 86.666,67	$ 2.253.334,00	$ 2.253.334	$ 2.393.734,00	$ 90.200	$ 90.200	$ 180.400,00	$ 2.213.334,00	$ 698.000	
10	CARRERA 72 N° 23-24	3115955649	6,96%	46.364.728	HURTADO PINEDA YOLIMA	PROFESIONAL AREA SOCIAL	13/02/2024		$ 1.300.000	-	$ -	30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
11	CARRERA 34 N° 16-16	3142652662	6,96%	30.266.557	JIMENEZ LOPEZ LINA MARIA	AYUDANTE DE OBRA	21/03/2024		$ 1.300.000	-	$ -	10	$ 43.333,33	$ 433.334,00	$ 433.334	$ 487.334,00	$ 17.400	$ 17.400	$ 34.800,00	$ 452.534,00	$ 134.500	
12	CARRERA 7B N° 42-40	3106183434	6,96%	1.006.553.132	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	AYUDANTE DE OBRA	21/03/2024		$ 1.300.000	-	$ -	10	$ 43.333,33	$ 433.334,00	$ 433.334	$ 487.334,00	$ 17.400	$ 17.400	$ 34.800,00	$ 452.534,00	$ 134.500	
13	CALLE 30 N° 11-71	3112083593	6,96%	7.227.214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	13/02/2024		$ 1.300.000	-	$ -	30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
14	CALLE 18A N° 21A - 54	3106691787	6,96%	91.240.944	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	13/02/2024		$ 1.300.000	-	$ -	30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
15	CARRERA 58C N° 152B 22	3114754429	6,96%	79.483.839	REAL HOYOS LUIS EDUARDO	INGENIERO RESIDENTE	15/01/2024		$ 3.900.000	-	$ -	30	$ 130.000,00	$ 3.900.000,00	$ 3.900.000	$ 3.900.000,00	$ 156.000	$ 156.000	$ 312.000,00	$ 3.588.000,00	$ 1.207.500	
16	CARRERA 10N° 46B - 46	3125577937	0,52%	47.435.477	TARACHE CECILIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	14/03/2024		$ 1.300.000	-	$ -	17	$ 43.333,33	$ 736.667,00	$ 736.667	$ 828.467,00	$ 29.500	$ 29.500	$ 59.000,00	$ 769.467,00	$ 180.900	
17	CORREGIMIENTO LA CHAPARRERA	3143736953	6,96%	1.193.100.410	TEATIN CACHAY JUAN CAMILO	AYUDANTE DE OBRA	21/03/2024		$ 1.300.000	-	$ -	10	$ 43.333,33	$ 433.334,00	$ 433.334	$ 487.334,00	$ 17.400	$ 17.400	$ 34.800,00	$ 452.534,00	$ 134.500	
18	CIUDADELA COMFACASANARE TORRE 4 APTO 318	3103587099	6,96%	1.118.572.201	VARGAS CERON MANUEL ALBERTO	MAESTRO DE OBRA	26/03/2024		$ 3.250.000	-	$ -	5	$ 108.333,33	$ 541.667,00	$ 541.667	$ 541.667,00	$ 21.700	$ 21.700	$ 43.400,00	$ 498.267,00	$ 168.000	
19	CALLE 168 N° 69-07	3024129218	6,96%	1.049.621.180	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	13/02/2024		$ 1.300.000	-	$ -	30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	
20	CARRERA 30 A N° 17 - 109	3116472776	6,96%	1.118.548.824	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	DIRECTOR DE OBRA	19/03/2024		$ 3.000.000	-	$ -	12	$ 100.000,00	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000	$ 1.200.000,00	$ 48.000	$ 48.000	$ 96.000,00	$ 1.104.000,00	$ 371.000	
21	CALLE 49 TRANS 23-67	3115912678	6,96%	9.430.088	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	13/02/2024		$ 1.300.000	-	$ -	30	$ 43.333,33	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000	$ 1.462.000,00	$ 52.000	$ 52.000	$ 104.000,00	$ 1.358.000,00	$ 402.500	

RELACION DE NOMINA GENERAL MES DE MARZO 2024

N°	DIRECCIÓN	TELEFONO	% ARL AFILIACION	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE TRABAJADOR	CARGO	FECHA DE INGRESO / CTO	FECHA DE RETIRO/CTO	SALARIO BASE MENSUAL	DIAS INCAPACIDAD GENERAL 66,67%	VALOR DIAS INCAPACIDAD GENERAL 66,67%	DIAS LABORADOS	VALOR DIA	TOTAL SALARIO DÍAS LABORADOS	VALOR IBC SALARIAL	SUBTOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DEDUCCIONES	VALOR NETO A PAGAR	TOTAL APORTES A PAGAR	FIRMA
22	URBANIZADOR CAMINO REAL	3102569670	6,96%	1.116.545.333	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	INSPECTOR DE OBRA	13/02/2024		$ 1.500.000	-	$ -	30	$ 50.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000	$ 1.662.000,00	$ 60.000	$ 60.000	$ 120.000,00	$ 1.542.000,00	$ 484.000	
23	CALLE 31 N° 5 - 79	3144910134	6,96%	1.136.883.799	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	ESPECIALISTA AREA ELECTRICA	13/02/2024		$ 2.600.000	-	$ -	30	$ 86.666,67	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000	$ 2.762.000,00	$ 104.000	$ 104.000	$ 208.000,00	$ 2.554.000,00	$ 885.000	
								SUMA	$ 47.826.000	$ 10	$ 577.778	$ 908	$ 1.594.200	$ 32.167.672	$ 36.745.450	$ 39.072.850	$ 1.470.400	$ 1.470.400	$ 2.940.800	$ 36.132.050	$ 11.269.200	

	FECHA DE ELABORACIÓN	PERIODO DE NOMINA	ELABORADO POR DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	APROBADO POR REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO BENDICION 23 NIT. 901.767.095-1	30 de marzo de 2024	01/03/2024 AL 30/03/2024	DUMAR FABIAN CAÑIZALES BALCARCEL	DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

362

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

CERTIFICADO DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN

NIT. 900.407.723-1
No. 2024-3533

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE: EDGAR GONZALEZ
TELEFONO: 3202590924
CIUDAD: YOPAL

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

EQUIPO: NIVEL AUTOMATICO
MARCA: RUIDE
MODELO: RL-C32
SERIAL: X114713

PRECISIÓN: 1,5mm X Km DOBLE DE NIVELACIÓN
¿NUEVO?: NO
FECHA DE EXPEDICIÓN: 27 de febrero de 2024
RECOMENDAMOS AJUSTAR: 27 de agosto de 2024

2024-3533

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

DESVIACIÓN ESTANDAR	2.0MM	MINIMA DISTANCIA FOCAL	0.5M
TIPO DE IMAGEN	DIRECTA	RELACIÓN ESTANDAR	100
MAGNIFICACIÓN	32X	RANGO DE COMPENSADOR	± 15"
APERTURA DEL OBJETIVO	38MM	EXACTITUD DEL COMPENSADOR	0.6"

TRABAJO REALIZADO

CODIGOS: CORRECTO (1) FALLA CORREGIDA (2) NO CORREGIDA (3) NO APLICA (4)

1	LIMPIEZA EXTERIOR	2	AJUSTE DEL NIVEL CIRCULAR
2	ERROR DETECTADO	1	AJUSTE DEL SISTEMA DE ENFOQUE
1	MANTENIMIENTO INTERNO	2	AJUSTE DEL RÉTICULO
1	MANTENIMIENTO DE BASE NIVELANTE	1	AJUSTE DE COLIMACION
1	TORNILLO DE MOVIMIENTO FINO V Y/O H	1	OPTICA GENERAL (LENTES Y OCULARES)
1	AJUSTE DEL COMPENSADOR	1	PERILLA DE ENFOQUE

TECNIRAC

TECNIRAC S.A.S ESTABLECE:

1. TECNIRAS S.AS NO SE RESPONSABILIZA DE LOS PREJUICIOS QUE PUEDE OCACIONAR EL USO INADECUADO DEL INSTRUMENTO VERIFICADO.
2. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DEL TRANSPORTE DEL INSTRUMENTO Y USO DE ESTE CERTIFICADO.
3. LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO SE REFIEREN AL MOMENTO Y CONDICIONES EN QUE SE REALIZARON LAS MEDICIONES
4. LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN TECNIRAC CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, DE MODO QUE, TECNIRAC CERTIFICA QUE EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y SE RECOMINEDA QUE EL OPERADOR REALICE LOS CHEQUEOS DE CAMPO RUTINARIOS.

REALIZADO POR:
FABIÁN RODRÍGUEZ

2024-3533

NIT:90 **REVISADO POR:**
ANGEL RODRÍGUEZ

ARODRIGUEZ.TECNIRAC@GMAIL.COM
SECRETARIATECNIRAC@GMAIL.COM
CRA. 38 # 10-60 OFC.716, BOGOTÁ D.C
3125152722 - 3157483174
3188037560 - 3107984455

VERIFICA LA AUTENTICIDAD DEL CERTIFICADO VISITANDO NUESTRA PÁGINA WEB DE WWW.TECNIRAC.COM O CONTÁCTENOS DIRECTAMENTE A LOS NÚMEROS DE TELÉFONO.

(610) 366

INCOLTOP SAS
www.equiposdetopografia.com ®
Nit 900.710.142-9
CRA 71B No 68B 15 TEL 7164430 www.incoltop.com

APLICAMOS PROCEDIMIENTOS
Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017
Formato No: FT - L - 002 V3

CERTIFICADO DE CALIBRACION No 5K2B330 14

PROPIETARIO	HENRY CONTRERAS OLIVEROS		
INSTRUMENTO	ESTACIÓN TOTAL	**MARCA:**	TOPCON
MODELO	GTS 300	**NUMERO DE SERIE**	NY1118
IDENTIFICACION CLIENTE	1099 474 036		
FECHA DE VERIFICACION Y EXPEDICION	15 /ENE/2024		
NORMA ISO / IEC 17025 : 2017	**VENCE**	15 /JUL/2024	
Instrumento Nuevo?	SI	NO	X

/

cualquier reclamacion del ajuste se debe hacer maximo 5 dias de fecha de expedicion

PATRONES UTILIZADOS

Estacion total South NTS 332 R10 SN 297863 , Nivel Automatico TOPCON ATB2 JZ29924 Certificado Trazable al NIST

ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FABRICANTE

Precision Angular (DIN 18723)		5 "		**Minima distancia Focal**	0.5	m
Precision en Distancia		2 mm+ 2ppm xD		**Medicion con un Prisma**	2500	m
Aumento del Telescopio			30X	**Compensador**		X Y
Apertura de Objetivo			30mm	**Exactitud del Compensador**		0.3"
Lectura en Pantalla			1"	**Medicion sin Prisma**	N/A	m
AJUSTES EFECTUADOS						
CODIGOs:	1: correcto	2: falla corregida		3: no corregida	4: no aplica	
Limpieza exterior		1		Ajuste del nivel Circular		2
Mantenimiento Interno		1		Ajuste del sistema de enfoque		1
Tornillo de movimiento Fino H		1		Ajuste del reticulo		1
Chequeo del Teclado		1		Ajuste de mirillas de punteria		2
Ajuste Compensador X Y		1				

15 ENE 2024
5K2B330 14

CALIBRADO Q.C 2024 INCOLTOPSAS

Reviso	Aprobo	Especialista Tecnologica
Alexander Piza	**Maria Claudia Fernandez**	Gestion En Laboratorios De Ensayo Y Calibracion
Ingeniero Topografico	**Ingeniera Industrial**	**NORMA ISO / IEC 17025**

este documento puede ser verificado citando el numero del certificado

TEL 7164430 - 3005611444 - 3124126637
Email: gerencia@equiposdetopografia.com

(6-1)
367

ACTAS DE COMITÉ



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. DATOS GENERALES

No. ACTA:

FECHA DE LA REUNIÓN:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:
04 (DÍA) 03 (MES) 2024 (AÑO)	09 : 00 AM [X] PM [ ]	09 : 50 AM [X] PM [ ]

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Campamento de Obra

TEMAS DE LA REUNIÓN:

Actividades de Obra en el desarrollo del Contrato 041-2023. para el mes de marzo.

ASISTENTES:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / INSTITUCIÓN
1	Luis Eduardo Real Hoyos	Residente de Obra	Consorcio Bendición 23
2	Leonardo Cárdenas Niño	Gerente Proyecto	Consorcio Bendición 23
3	Boris Andrés Roa Pineda	Director de Interventoría	Consorcio PR-HK
4	Jorge Alexander Bernal	Residente 1	Consorcio PR-HK
5	Sandra Carolina Barrera	Residente Ambiental	Consorcio PR-HK
6			
7			
8			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Dar a conocer las actividades de obra programadas por el Consorcio Bendición 23 para el mes de marzo y otras aspectos a considerar dentro de la ejecución del Contrato de Obra pública No 041- 2023.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo
2. Presentación de los asistentes
3. Descripción de las actividades a realizar durante el mes de marzo
4. Programación del próximo comité.
5. Cierre de la Reunión.

2) DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio al comité siendo las 09:00 AM con el saludo y respectiva presentación de los asistentes.
El director de Interventoría manifiesta que el objetivo de la reunión es informar las actividades de obra programadas para el mes de marzo y así dar seguimiento a su cumplimiento.
El gerente de proyecto informa que se iniciarán las actividades de descapote y excavación para la zona donde se ubicará la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR).
También se dará inicio a la ejecución de las actividades de obra plasmadas en el subcapítulo 3.3 del presupuesto de obra con el fin de poner en funcionamiento la red de media tensión que suministrará energía eléctrica a la zona de la EBAR.
Por último, se informa a las asistentes que la construcción del Campamento de obra se ha llevado a cabo sin inconvenientes y que esta etapa está próxima a culminarse.
Se acuerda una fecha estimada para el próximo comité (lunes 11 de marzo 2024), la cual puede ser modificada debido al desarrollo de las actividades contractuales del proyecto.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

3) ACUERDOS Y COMPROMISOS

Acuerdos y compromisos	Responsable	Fecha de cumplimiento

4) FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Eduardo Real H
CARGO: Ingeniero Residente

NOMBRE: Boris Roa Pineda
CARGO: Director de Interventoría

NOMBRE: Leonardo Cardenas Ruiz
CARGO: Director Proyecto

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Jorge Alexander B.
CARGO: Residente Interventoría

NOMBRE: Sandra Carolina Barrera
CARGO: Residente Ambiental

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. DATOS GENERALES

No. ACTA:

FECHA DE LA REUNIÓN:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:
13 (DÍA) 03 (MES) 2024 (AÑO)	03 : 00 AM ☐ PM ☒	04 : 05 AM ☐ PM ☒

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Campamento de Obra

TEMAS DE LA REUNIÓN:

Discutir estrategias para abrir espacios de diálogo con la comunidad local y llegar a acuerdos oportunos que permitan retomar las actividades programadas en el menor tiempo posible luego de la suspensión de actividades por intervención de la comunidad

ASISTENTES:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / INSTITUCIÓN
1	Boris Andrés Roa Pineda	Director Interventoría	Consorcio PR-HK
2	Sandra Carolina Barrera	Residente Ambiental	Consorcio PR-HK
3	Jorge Alexander Bernal	Residente 1	Consorcio PR-HK
4	Leonardo Cárdenas Niño	Gerente Proyecto	Consorcio Bendición 23
5	Luis Eduardo Real Hoyos	Residente Obra	Consorcio Bendición 23
6			
7			
8			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

① Establecer un plan de acción para identificar y abordar las preocupaciones de la comunidad local.

② Desarrollar estrategias concretas y plazos definidos para alcanzar acuerdos colaborativos con la comunidad local, priorizando la resolución de conflictos y la reanudación eficiente de las actividades programadas.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ORDEN DEL DÍA:

① Saludo
② Presentación de los asistentes
③ Revisión de los Objetivos de la Reunión.
④ Discusión y desarrollo de estrategias concretas para alcanzar acuerdos colaborativos con la comunidad local.
⑤ Conclusiones y compromisos
⑥ Programación del próximo Comité
⑦ Cierre de la Reunión.

2) DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 3:00 PM se da inicio a la reunión, el moderador da la bienvenida a todos los participantes y se explica el propósito de la reunión.
Se abre la discusión para identificar cómo se pueden abordar las preocupaciones y necesidades de la comunidad local, se propone la programación de reuniones con los representantes de la comunidad para generar espacios donde exista un diálogo abierto y constructivo, y de esta forma proponer soluciones para las necesidades planteadas y despejar las dudas existentes respecto al desarrollo del proyecto.
A su vez, se exploran diversas formas de involucrar activamente a los miembros de la comunidad, se sugiere realizar reuniones informativas y la posibilidad de establecer canales de comunicación directa.
Todo lo anterior con el fin de resolver con prontitud los conflictos existentes y de esta forma retomar las actividades de obra programadas en el menor tiempo posible.
Por último, se programa el próximo comité para el miércoles 20 de marzo de 2024.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

3) ACUERDOS Y COMPROMISOS

Acuerdos y compromisos	Responsable	Fecha de cumplimiento

4) FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Eduardo Raad H
CARGO: Ingeniero Residente

NOMBRE: Boris Rosa Pineda
CARGO: Director de Interventoría

NOMBRE: Leonardo Cardenas
CARGO: Dir Proyecto

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE: Jorge Alexander B.
CARGO: Resident Interventora

NOMBRE: Sandra Cardina Barrera T.
CARGO: Residente ambiental

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

1. DATOS GENERALES

No. ACTA:

FECHA DE LA REUNIÓN:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACIÓN:
20 (DÍA) 03 (MES) 2024 (AÑO)	02 : 00 AM ☐ PM ☒	03 : 05 AM ☐ PM ☒

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Campamento de Obra

TEMAS DE LA REUNIÓN:

Avance de Actividades de Obra en el desarrollo del Contrato 041 de 2023. (Contrato de Obra pública).
Reanudación de actividades luego de la suspensión temporal (del 13 Marzo al 19 de Marzo) como consecuencia de la intervención de la comunidad.

ASISTENTES:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / INSTITUCIÓN
1	Leonardo Cárdenas Niño	Gerente Proyecto	Consorcio Bendición 23
2	Luis Eduardo Real Hoyos	Residente de Obra	Consorcio Bendición 23
3	Jorge Alexander Beiral	Residente 1 (Interv).	Consorcio PR-HK
4	Boris Andrés Roa Pineda	Director de Interventoría	Consorcio PR-HK
5	Sandra Carolina Barrera	Residente Ambiental	Consorcio PR-HK.
6			
7			
8			

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN:

Dar a conocer las actividades desarrolladas por el Consorcio Bendición 23 hasta el momento y aspectos a tener en cuenta en la ejecución del contrato de Obra pública 041-2023.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

ACTA DE REUNIÓN

PR-HK CONSORCIO

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo
2. Presentación de los asistentes
3. Descripción de actividades desarrolladas dentro de la ejecución del proyecto.
4. Informar el levantamiento de la suspensión temporal y la reanudación de la ejecución de actividades programadas.
5. Programación del próximo comité.
6. Cierre de la Reunión.

2) DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 2:00 PM se da inicio a la reunión con el saludo y presentación de los participantes.

El residente de obra realiza un resumen de las actividades ejecutadas hasta el momento como:

- Descapote a máquina del área proyectada para la construcción de la EBAR.
- Se inició la excavación mecánica de material para la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR).
- Actividades de Replanteo para la red de media tensión
- Apertura de huecas para postes
- Hincado de postes de 12m * 510kgf y Cimentación de postes de 12m * 1050 kfg
- Construcción de Canales de drenaje perimetrales al área de excavación de la EBAR.
- Se realizó la instalación de 35 espaciadores angulares de 15 kV.
- Instalación de Red compacta de media tensión.
- Construcción y adecuación campamento de obra.

Se informa a los asistentes que el porcentaje de obra física ejecutada es mayor al porcentaje programado.

A su vez, se da a conocer que las actividades en obra se reanudaran el dia de hoy (20-03-2024) luego de que se levantara la suspensión como consecuencia de los compromisos adquiridos con la comunidad local durante las dialogos sostenidas.

Por último, se programa el próximo comité para el lunes 01 de Abril de 2024.

3) ACUERDOS Y COMPROMISOS

Acuerdos y compromisos	Responsable	Fecha de cumplimiento

4) FIRMA DE LOS ASISTENTES

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE: Eduardo Real

CARGO: Ingeniero Residente

NOMBRE: Reinaldo Reyes

CARGO: Dir. Proyect

NOMBRE: Boris Rau Pineda

CARGO: Director de Interventoría

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE: Jorge Alexander B.

CARGO: Residente Interventoría

NOMBRE: SANDRA CAROLINA BARRERA

CARGO: Residente Ambiental

NOMBRE:

CARGO:

NOMBRE:

CARGO:

ACTAS DE REUNION DE OBRA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN: REALIZAR LA EVALUACIÓN DE HOJAS DE VIDA PARA EL CAMBIO DE RESIDENTE ELÉCTRICO Y RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2 DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No. 042 de 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Fecha de la Reunión:			Hora de inicio	Hora de finalización
2024	03	07	04:00 pm	05:00 pm

LUGAR DE LA REUNIÓN: OFICINA ACUATODOS S.A E.S.P

ASISTENTES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Julio Cesar Cuevas Jiménez	Subgerente Técnico y Operativo	ACUATODOS S.A. E.S.P
2	Boris Andrés Roa Pineda	Director de interventoría	Interventoría Consorcio PR-HK
3	Omar Andrés Corredor Pérez	R/L Consorcio PR-HK	Consorcio PR-HK
5	Roberto Ríos Figueroa	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A E.S.P

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Revisión de documentos anexos que acreditan los perfiles, experiencia profesional y experiencia especifica de acuerdo a los pliegos de condiciones definitivos para la evaluación del cambio de residente eléctrico y residente de interventoría del consorcioPR-HK.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Presentación de Asistentes
3. Revisión de documentación de los proponentes
4. Resultado de evaluación del cambio de residente eléctrico
5. Resultado de evaluación del cambio de residente de interventoría 2

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El director de la interventoría inicia manifestándole a los asistentes que se requiere realizar el cambio de los profesionales *Heyder Ivan González Castellanos* Residente eléctrico propuesto y *Ronald Alexis Sanabria Quintero* residente de interventoría 2 propuesto, esto debido a que por motivos personales no pueden desempeñar dichos cargos en la ejecución del contrato de consultoría 042 de 2023.

Manifiesta además que se remite las dos hojas de vida de los proponentes a ocupar el cargo para la debida evaluación por parte de la supervisión del contrato teniendo en cuenta que estos cumplen a cabalidad los requerimientos descritos en los pliegos de condiciones definitivos numeral 4.3.2.3. para el residente de interventoría 2 y numeral 4.3.2.5 residente de interventoría 4 – residente eléctrico.

El apoyo a la supervisión indica que revisados los documentos anexos que acreditan los perfiles, experiencia

profesional y experiencia especifica de acuerdo a los pliegos de condiciones y de acuerdo a la evaluación técnica realizada se aceptan los cambios de residente.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Nombre Omar Andrés Sogueda
Cargo R/L Consorcio PE-HK.

Nombre Andrés Roa Pineda.
Cargo Director Interventoría

Nombre Roberto Ríos F
Cargo Apoyo a la Supv. Acuatodos

Nombre Julio César Cuevas Jiménez
Cargo Subgerente Acuatodos.

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

Nombre
Cargo

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "AGUAFODOS S.A. E.S.P."

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 041 DE 2022 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ANEXO EVALUACIÓN TÉCNICA: ACEPTACIÓN

1.2.2. RECURSO HUMANO

RESIDENTE ELÉCTRICO

PROPONENTE: CONSORCIO PRAHC
NOMBRE DEL PROFESIONAL: CARLOS ANDRÉS PEREZ ACEVEDO
PROFESION: INGENIERO ELECTROMECANICO
FECHA DE GRADO: 10/12/2014
FECHA EXP. MATRICULA: 19 de diciembre de 2014
MATRICULA PROFESIONAL NO.: 8Y250-107172

CARGO: RESIDENTE ELÉCTRICO
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

CONTRATO No.	OBJETO CONTRATO	EMPRESA CONTRATANTE	ENTIDAD CON LA QUE TUVO RELACION LABORAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	FECHA DE INICIO DEL CARGO	FECHA FINAL DEL CARGO	DURACION EN AÑOS	EXPERIENCIA PROFESIONAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FOLIO	OBSERVACIONES
-	PROFESIONAL DE APOYO A LA EMPRESA: SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES LTDA, EJERCIENDO LABORES DE INTERVENTORIA Y APOYO A LA SUPERVISION DE LOS CONTRATOS 019 DE 2014, 021 DE 2014, 0216 DE 2014, 448 DE 2015, 536 DE 2015, 1267 DE 2015, OPS 490 DE 2015, SUSCRITOS POR LA EMPRESA SECOB LTDA	SECOB LTDA		PROFESIONAL DE APOYO	12/01/2015	30/12/2016	1,99	1,99			
-	PRESTO SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA EN EL DESARROLLO DE LOS CONTRATOS: 1086 DE 2019, 493 DE 2018, 190 DE 2019, 535 DE 2018, 157 DE 2018, 389 DE 2017, 2598 DE 2017, 193 DE 2017, EJECUTADOS POR LA EMPRESA Y SUSCRITOS CON DIFERENTES ENTIDADES PUBLICAS	SECOB LTDA		PROFESIONAL DE INGENIERIA	05/06/2017	25/01/2018	0,48	0,48			
					26/07/2018	31/12/2018	1,45	1,45			
301.17-4-001	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED ETAPA 1, EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOCI	UNIÓN TEMPORAL INTERLUCES DE PAZ 2018	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	PROFESIONAL ELECTRICO	26/01/2018	25/07/2018	0,50	0,50	0,50		
355 DE 2021	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ALGUNOS SECTORES DE LAS COMUNAS 1, 2, 3, 4, 5 Y 8 DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	UNIÓN TEMPORAL INTERALUMBRADO YOPAL 2021	ENERCA S.A. E.S.P.	PROFESIONAL ELECTRICO	21/09/2021	14/12/2021	0,23	0,23	0,38		
					28/01/2022	22/03/2022	0,15	0,15			
214 DE 2022	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, CONTABLE, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSIÓN A NIVEL DE 34,5 KV Y 13,2 KV, DESDE LA SUBESTACION AGUAZUL HASTA LA SUBESTACIÓN TAURAMENA, MUNICIPIOS DE AGUAZUL Y TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	CONSORCIO INTERREDES 2022	ENERCA S.A. E.S.P.	RESIDENTE ELECTRICO DE INTERVENTORIA	23/03/2022	15/12/2022	0,74	0,74	1,59		
					16/04/2023	15/02/2024	0,85	0,85			
				TOTAL			5,09	4,46	2,47		
								GENERAL	ESPECIFICA		

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Subgerente Tecnico / Operativo - Evaluador Tecnico

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "AGUATODOS S.A. E.S.P."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 041 DE 2021 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ANEXO EVALUACIÓN TÉCNICA: ACEPTACIÓN

4122 RECURSO HUMANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

PROPONENTE
NOMBRE DEL PROFESIONAL: GABRIEL ANDRES DURAN MORENO
PROFESION: INGENIERO CIVIL
FECHA DE GRADO: 23/04/2009
FECHA EXP. MATRICULA: 22 de diciembre de 2009
MATRICULA PROFESIONAL No. 68202-179442 STD

CARGO: RESIDENTE DE INTERVENTORIA
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

CONTRATO No.	OBJETO CONTRATO	EMPRESA CONTRATANTE	ENTIDAD CON LA QUE TUVO RELACION LABORAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	FECHA DE INICIO DEL CARGO	FECHA FINAL DEL CARGO	DURACION EN AÑOS	EXPERIENCIA PROFESIONAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FOLIO	OBSERVACIONES
01 DE 2010	CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SACAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	MUNICIPIO DE SACAMA	CONSORCIO PLUVIAL DE SACAMA	PROFESIONAL DE APOYO	12/03/2010	30/11/2010	0,73	0,73	1,26		
					15/01/2011	28/02/2011	0,12	0,12			
					30/04/2011	23/09/2011	0,41	0,41			
2144-2012	RENOVACION Y AMPLIACION DE COBERTURA EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD - DEPARTAMENTO DE CASANARE	GOBERNACION DE CASANARE	ICICO SAS	PROFESIONAL DE APOYO	12/09/2012	19/05/2013	0,69	0,69	0,69		
APCOB 12 03	CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES POR AGUAS LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR COMPRENDIDO EN LA CARRERA 10 ENTRE LA SERVIDUMBRE DE LA CALLE 42A Y LA CALLE 45, EN LA CALLE 45 ENTRE LAS CARRERAS 9 Y 10 Y EN LA CARRERA 9 ENTRE LAS CALLES 45 Y 62, CON UN DESCOLE UBICADO SOBRE EL CAÑO DEL BARRIO LA FORTUNA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA	AGUAS DEL PUERTO S.A. ESP	SANEAR S.A.	INGENIERO RESIDENTE	05/06/2013	10/07/2014	0,94	0,94			
					26/09/2014	10/10/2014	0,04	0,04			
496 DE 2015	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL SISTEMA DE DESCARGUE DEL CAÑO AGUAZULERO AL BRAZO DEL RIO UNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE	MUNICIPIO DE AGUAZUL	UNION TEMPORAL CANAL	RESIDENTE DE OBRA	09/10/2015	23/12/2015	0,21	0,21			
111 DE 2015	REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DEL GUAVY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUAZUL - ESPA S.A. E.S.P.	UNIÓN TEMPORAL INTERPLUVIAL SAN JOSE	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	01/03/2016	30/12/2016	0,84	0,84	0,84		
007 DE 2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 12 FASE 2 MUNICIPIO DE AQUITANIA	MUNICIPIO DE AQUITANIA	PIA MHL S.A.S	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	09/01/2018	05/02/2018	0,08	0,08	0,08		
033-2018	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	MUNICIPIO DE PORE	UT VIAS HISTORICAS PORE 2018	RESIDENTE DE OBRA	06/02/2018	05/06/2018	0,33	0,33			
0034-2018	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE MANI, DEPARTAMENTO DE CASANARE	MUNICIPIO DE MANI	UT PAVISUR 2018	RESIDENTE DE OBRA	19/11/2018	22/04/2019	0,43	0,43			
					TOTAL		4,84	4,84	2,97		
								CUMPLE	CUMPLE		

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Subgerente Técnico y Operativo - Evaluador Técnico

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN: INFORMAR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA DEBIDO A INTERVENCIONES POR PARTE DE LA COMUNIDAD LOCAL.

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio	Hora de finalización
2024 | MES | DÍA	11:00 am	12:30 pm

LUGAR DE LA REUNIÓN: Ciudadela la Bendición – Campamento de Obra

ASISTENTES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Roberto Ríos Figueroa	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A E.S.P.
2	Leonardo Cárdenas Niño	Gerente de proyecto	Obra- Consorcio Bendición 23
3	Luis Eduardo Real Hoyos	Residente de Obra	Obra- Consorcio Bendición 23
4	Gabriel Andrés Durán Moreno	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio PR-HK
5	Hoyne Halvane Ávila	Especialista en Geotecnia	Interventoría Consorcio PR-HK

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Informar a la entidad contratante sobre la suspensión de actividades de obra debido a intervenciones por parte de la comunidad local.

ORDEN DEL DÍA

1. Informar sobre la suspensión de las actividades de obra programadas y sus respectivas causas.
2. Acuerdos y compromisos

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El día de hoy, 13 de marzo de 2024, el equipo de interventoría y el personal de obra, debidamente identificados, dejan constancia ante la entidad contratante, Acuatodos S.A. E.S.P., de un incidente que afectó el desarrollo de las actividades programadas en el proyecto. Durante el transcurso de la jornada laboral, la comunidad local detuvo las labores de construcción, impidiendo así la continuidad de los trabajos y las actividades programadas. A pesar de los esfuerzos realizados por dialogar y encontrar una solución, la situación no pudo resolverse satisfactoriamente, lo que resultó en la interrupción temporal del proyecto.

Se lamentan los inconvenientes ocasionados y es necesario dejar claro que la entidad contratista está comprometida con el cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra. No obstante, eventos como este escapan al control directo. El contratista está en disposición de colaborar para buscar alternativas que permitan retomar las actividades en el menor tiempo posible, siempre en apego a la normativa y respetando los intereses de la comunidad afectada.

Se espera que esta situación sea abordada con la celeridad y la diligencia necesarias, y se reitera el compromiso de mantener una comunicación fluida y transparente con todas las partes involucradas para garantizar el éxito del proyecto.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES
1. El personal de obra e interventoría se comprometen a establecer un canal de comunicación efectivo con los líderes y representantes de la comunidad afectada. Esto implicará la organización de reuniones periódicas para discutir sus preocupaciones, escuchar sus sugerencias y trabajar en conjunto para encontrar soluciones que satisfagan tanto las necesidades de la comunidad como los objetivos del proyecto. 2. La entidad contratante (Acuatodos S.A. E.S.P.) se compromete a buscar espacios de diálogo con los representantes de la comunidad afectada en pro de gestionar una pronta solución a la situación que impide el avance de las actividades programadas y de esta forma permitir el libre desarrollo del proyecto por parte del contratista.

FIRMA DE LOS ASISTENTES	
Nombre Jaime Mauricio Ayala Cargo Esp Gerencia Interventoría	Nombre Cargo
Nombre Federico Gregorio Muño Cargo Gerente de Proyecto Consorcio Bendición 27	Nombre Eduardo Real H Cargo Ingeniero Residente
Nombre Gabriel Andres Ruiz Moreno Cargo Residente Interventoría	Nombre Cargo

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN: REMITIR DISPOSICIONES DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA 041 DE 2023 SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL.

Fecha de la Reunión:			Hora de inicio	Hora de finalización
2024	MES 03	DÍA 11	11:00 am	12:00 m

LUGAR DE LA REUNIÓN: Oficina Consorcio Bendición 23

ASISTENTES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Julio Cesar Cuevas Jiménez	Subgerente Técnico y Operativo	ACUATODOS S.A. E.S.P
2	Leonardo Cárdenas Niño	Gerente de proyecto	Obra- Consorcio Bendición 23
3	Fabian Leonardo Carreño	Profesional de apoyo	Obra- Consorcio Bendición 23
4	Gabriel Andrés Durán Moreno	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio PR-HK
5	Roberto Ríos Figueroa	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A E.S.P
6	Cristian Camilo Hurtado Ojeda	Representante legal suplente	Consorcio Bendición 23

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Informar a los contratistas de Obra e Interventoría acerca de algunas disposiciones que la secretaria de planeación Municipal de Yopal sugiere para la ejecución del proyecto y sus fases para la respectiva evaluación por parte del contratista.

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo
2. Presentación de Asistentes
3. Contextualización del comité por parte de la supervisión del contrato.
4. Acuerdos y compromisos.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La supervisión del contrato inicia socializando algunas disposiciones que recomiendan que se lleve a cabo en la ejecución del proyecto sugeridas por parte de la secretaria de planeación del municipio de Yopal.

La supervisión del contrato manifiesta que en reunión previa que se sostuvo con la secretaria de Planeación de Yopal y algunas otras autoridades respecto a algunas inquietudes respecto al proyecto, se logró resolver algunas inquietudes acerca de la EBAR que se plantea construir y se consiguió que las personas asistentes a dicha reunión estuvieran de acuerdo con la construcción de la EBAR.

Sin embargo, supervisión comenta que en la reunión también se quedó con el compromiso de revisar la posibilidad de darle prioridad a la construcción de las redes de alcantarillado de la Ciudadela La Bendición, por lo anterior solicitan al contratista que se evalué la alternativa de iniciar con los colectores principales en el sector de Alameda Martha Mojica e inmediatamente comenzar trabajos de instalación de redes del

alcantarillado sanitario en el sector de la ciudadela La Bendición.

El contratista de obra manifiesta que analizará estas disposiciones y entregará medidas definitivas en una próxima reunión teniendo en cuenta evaluaciones técnicas y logísticas que se requieran para el desarrollo del proyecto.

La interventoría manifiesta que hará acompañamiento técnico durante el proceso de evaluación de la alternativa con el fin verificar que las condiciones planteadas se ajusten a los requerimientos del proyecto.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Por parte del contratista, definir si es posible construir modificando las fases del proyecto de acuerdo a los requerimientos planteados por la secretaría de Planeación y de ser así, entregar un plan de trabajo ajustado a este requerimiento.

Por parte de la interventoría, hacer acompañamiento técnico durante el proceso de evaluación de la alternativa y verificar que las condiciones planteadas se ajusten a los requerimientos del proyecto.

Plazo máximo para el cumplimiento de este compromiso: miércoles 20 de marzo de 2024.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Nombre: Roberto Rios F
Cargo: Apoyo Supervision Acuatodos

Nombre: Julio Cesar Cuevas
Cargo: Subgerente Acuatodos

Nombre: Fabian Leonardo Carrero
Cargo: Profesional de Apoyo Consorcio Bendición 23

Nombre: Gabriel Andres Rojas
Cargo: Residente Interventoria.

Nombre: Cristian Horlado
Cargo: Ft. suplente Consorcio Bendición

Nombre:
Cargo: Fernando Cardenas D

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN: ENTREGA DE PLAN DE TRABAJO DE ACUERDO A DISPOSICIONES DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL

Fecha de la Reunión:			Hora de inicio	Hora de finalización
2024	03	20	10:00 am	12:00 m

LUGAR DE LA REUNIÓN: Oficina Consorcio Bendición 23

ASISTENTES

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	Julio Cesar Cuevas Jiménez	Subgerente Técnico y Operativo	ACUATODOS S.A. E.S.P
2	Roberto Ríos Figueroa	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A E.S.P
3	Leonardo Cárdenas Niño	Gerente de proyecto	Obra- Consorcio Bendición 23
4	Fabian Leonardo Carreño	Profesional de apoyo	Obra- Consorcio Bendición 23
5	Gabriel Andrés Durán Moreno	Residente de interventoría	Interventoría Consorcio PR-HK
6	Hoyne Halvane Avila	Especialista en Geotecnia	Interventoría Consorcio PR-HK

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Entrega por parte del contratista de obra del plan de trabajo ajustado de acuerdo a las disposiciones de la secretaría de Planeación de Yopal y reanudación de las obras.

ORDEN DEL DÍA

1. Socialización de principales aspectos de reunión previa sobre el proyecto por parte de la supervisión
2. Entrega de plan de trabajo por parte del contratista de obra
3. Acuerdos y compromisos.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

La supervisión informa que el día 19 de marzo de 2024 se sostuvo una reunión con los diferentes representantes de las comunidades que se ven impactadas directa o indirectamente con el proyecto, además de algunas autoridades municipales, departamentales y entidades interesadas.

De acuerdo a esto, la Supervisión manifiesta que en la reunión se logró que las comunidades que no estaban permitiendo el desarrollo de la obra accedieran a permitir la continuación de las mismas sin ninguna oposición hasta el día 14 de abril de 2024, toda vez que solicitan la realización de mesas de trabajo periódicas, con el fin de aclarar dudas e inquietudes y concertar que no exista ningún impedimento de su parte para permitir la continuidad normal de las obras.

En vista de lo anterior, se reanudan inmediatamente las actividades en la obra, con excavaciones mecánicas en la EBAR.

Por otra parte, se aborda el tema del ajuste al plan de trabajo de las obras, de acuerdo a las disposiciones de la secretaría de Planeación del municipio de Yopal. El contratista de obra entrega un plano en medio físico con

la disposición del plan de trabajo inicial de la obra, en este plano se detalla la proyección de avance para los primeros tres (03) meses, en donde se proyecta la realización actividades en paralelo en 3 frentes de trabajo, distribuidos en EBAR, Emisarios principales de Alameda Martha Mojica y Red de Colectores en algunos sectores de La Bendición.

La interventoría manifiesta que ellos avalan el plan de trabajo y de ser aprobado harán el acompañamiento durante la construcción de las obras para garantizar las condiciones técnicas del proyecto.

La supervisión del proyecto revisa el plan de trabajo y manifiesta estar de acuerdo con este, ya que se ajusta a las disposiciones requeridas por la secretaría de planeación y solicita al contratista incluir los datos de diámetros y longitudes de tubería a intervenir en cada uno de los meses de trabajo.

El contratista se compromete a enviar la información ajustada en horas de la tarde y se da fin a la reunión.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

Por parte del contratista, enviar el plan de trabajo actualizado que incluya diámetros y longitudes de tubería, cómo
Plazo máximo para el cumplimiento de este compromiso: miércoles 20 de marzo de 2024 en horas de la tarde.

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Nombre: Roberto Rios F
Cargo: Apoyo Supervision Acuatodos SA

Nombre: SUBGERENTE ACUATODOS.
Cargo:

Nombre: Fabian Leonardo Cortes
Cargo: Profesional de Apoyo Comunidad Bendición 23

Nombre: HOYNER AVICA
Cargo: CONSULTORIA INTERVENTORIA

Nombre: Gabriel Andres Avon
Cargo: Residente Interventoria

Nombre: Leonardo Cardenas N.
Cargo:

CORRESPONDENCIA RECIBIDA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

PR-HK
CONSORCIO

Yopal, marzo 19 de 2024

Ingeniero:
DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L CONSORCIO BENDICIÓN 23
Cuidad.

Referencia: Contrato de obra pública No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE."

Asunto: TRASLADO DE APROBACIÓN DEL CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA.

Cordial Saludo,

De manera atenta y respondiendo a las obligaciones contractuales del contrato de Consultoría No. 042 de 2023, suscrito entre el CONSORCIO PR-HK y la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare - ACUATODOS S.A. E.S.P. nos permitimos informar la respuesta a la solicitud referente al cambio de profesional residente de obra del proyecto de referencia de acuerdo con información suministrada por ACUATODOS S.A. E.S.P. Se informa que, revisados los documentos anexos que acredita el perfil, experiencia profesional y experiencia específica, después de haber constatado con los requisitos en los pliegos de condiciones definitivos del proceso No. ACUA-SPO-003-2023 en relación con el Numeral 4.3.2.1 DIRECTOR DE OBRA, y una vez verificado su cumplimiento y bajo estas condiciones **SE ACEPTA** el cambio de director, de esta forma el director entrante y aprobado es el señor Daniel Alexander Gil Chaparro identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.548.824.

ANEXO: 03 FOLIOS

Sin otro particular.

Atentamente,

Recibido
19/03/2024 ; 10:35Am

OMAR ANDRÉS CORREDOR PÉREZ
NIT:901.770.052-4
R/L: CONSORCIO PR-HK
C.C: 74.182.984 De Sogamoso

391

acuatodos s.a. E.S.P.

130.20.10 0179

Yopal, 18 MAR 2024

Ingeniero:
OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
R.L CONSORCIO PR-HK
Dirección: Cll 10 No. 19-39
Tel: 3125229632
E-MAIL: consorcioprhk@proycon.com.co

ASUNTO: **ACEPTACION CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA CONTRATO 041-2023 – OFICIO CON RADICADO INTERNO 0313 DEL 14 DE MARZO DE 2024.**

Cordial saludo;

En atención a la solicitud realizada el dia 14 de marzo de 2024 referente al cambio de profesional director de obra del contrato 041-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, que una vez revisados los documentos anexos que acredita su perfil, experiencia profesional y experiencia especifica, y después de haber constatado con los requisitos en los pliegos de condiciones definitivos, del proceso No. ACUA-SPO-003-2023 en relación al Numeral 4.3.2.1 DIRECTOR DE OBRA, y una vez verificado su cumplimiento y bajo estas condiciones esta supervisión acepta el cambio de residente así:

DIRECTOR SALIENTE	VICTOR AVILA FONSECA	CC 6.775.413
DIRECTOR ENTRANTE Y APROBADO	DANIEL ALEXANDER GIL	CC 1.118.548.824

Sin otro particular,

Atentamente,

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Subgerente Técnico y Operativo

Proyectó: **ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA**
Profesional de Apoyo a la Supervisión

GESTION DOCUMENTAL:
Original: *Destinatario*
Copia: *Archivo*

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 041 DE 2013 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ANEXO EVALUACION TECNICA- ACEPTACION

4.2.2 RECURSO HUMANO

DIRECTOR DE OBRA

PROPONENTE	CONSORCIO BENDICION 23	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
NOMBRE DEL PROFESIONAL:	DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	UNIVERSIDAD	ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
PROFESION:	INGENIERO CIVIL		
FECHA DE GRADO:	05 DE MARZO DE 2013		
FECHA EXP. MATRICULA :	08 DE ABRIL DE 2013		
MATRICULA PROFESIONAL NO.	25202-246574 CND		
TITULO POSGRADO:	MAGISTER EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS		

CONTRATO No.	OBJETO CONTRATO	EMPRESA CONTRATANTE	ENTIDAD CON LA QUE TUVO RELACION LABORAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	FECHA DE INICIO DEL CARGO	FECHA FINAL DEL CARGO	DURACION EN AÑOS	EXPERIENCIA PROFESIONAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FOLIO	OBSERVACIONES
--	DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS EN LOS DIFERENTES CONTARTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA	--	GRUPO THEOS	DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS	8/04/2013	3/12/2014	1.66	1.66			
170 DE 2014	CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO EL CEDRAL MUNICIPIO DE TELLO DEPARTAMENTO DE HUILA	SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS, ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.	CONSORCIO EL POBLADO	PROFESIONAL DE APOYO	4/12/2014	31/07/2015	0.67	0.67	0.67		
--	DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS EN LOS DIFERENTES CONTARTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA	--	GRUPO THEOS	DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS	1/08/2015	14/10/2015	0.21	0.21			
573 de 2015	AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CONSTRUIDO EN LA ETAPA I, PARA EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DEL BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	MUNICIPIO DE AGUAZUL	HECTOR JULIO PEDRAZA	RESIDENTE DE OBRA	15/10/2015	14/12/2015	0.17	0.17	0.17		
--	DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS EN LOS DIFERENTES CONTARTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA	--	GRUPO THEOS	DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS	15/12/2015	24/07/2016	0.62	0.62			
203-CENAC-2016	CONEXIÓN, LINEA DE CONDUCCION ACUEDUCTO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA DE BOMBEO SEGUN DISEÑO EN EL BATALLON DE INFANTERIA No 21 VARGAS, (GRANADA - META) - UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC - VILLAVICENCIO VIGENCIA 2016 CON RECURSOS DEL CONVENIO DE COLABORACION No 005-11 ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL Y LA EMPRESA ECOPETROL S.A.	CENAC VILLAVICENCIO	HAELIA INGENIERIA LTDA	PROFESIONAL DE APOYO	25/07/2016	31/10/2016	0.28	0.28	0.28		
0305-2016	REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 6B ENTRE CALLE 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE MANI, CASANARE	MUNICIPIO DE MANI	UNIÓN TEMPORAL ALCANTARILLADO SAN ANTONIO	DIRECTOR DE OBRA	1/11/2016	21/12/2016	0.14	0.14	0.14		
--	DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS EN LOS DIFERENTES CONTARTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA	--	GRUPO THEOS	DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS	22/12/2016	26/06/2017	0.52	0.52			
09-00-30-18-036-17	"CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO CRISTAL PEÑA AZUL MUNICIPIO DE ENVIGADO"	ALCALDIA DE ENVIGADO	CONSORCIO ENVIGADO 2017	PROFESIONAL DE APOYO	27/06/2017	7/12/2017	0.46	0.46	0.46		
705 DE 2017	CONSTRUCCION DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE BUBUY DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	MUNICIPIO DE AGUAZUL	CONSORCIO PROYECTO PTAR 2017	PROFESIONAL DE APOYO	16/12/2017 21/01/2019 8/05/2019	5/11/2018 25/02/2019 11/09/2019	0.65 0.10 0.35	0.89 0.10 0.35	1.35		
--	DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS EN LOS DIFERENTES CONTARTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA	--	GRUPO THEOS	DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS	12/09/2019	24/10/2019	0.12	0.12			
229 DE 2019	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA RED DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA URBANIZACION LOS CENTAUROS, MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	MUNICIPIO DE PORE	UNION TEMPORAL AS&PORE 2019	RESIDENTE DE OBRA	25/10/2019	16/12/2019	0.15	0.15	0.15		

393

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 041 DE 2023 "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ANEXO EVALUACIÓN TÉCNICA- ACEPTACIÓN

4.2.2.2. RECURSO HUMANO

DIRECTOR DE OBRA

PROPONENTE	CONSORCIO BENDICION 23	CARGO:	DIRECTOR DE OBRA
NOMBRE DEL PROFESIONAL:	DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO	UNIVERSIDAD	ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO
PROFESION:	INGENIERO CIVIL		
FECHA DE GRADO:	05 DE MARZO DE 2013		
FECHA EXP. MATRICULA:	08 DE ABRIL DE 2013		
MATRICULA PROFESIONAL NO.	25202-214574 CND		
TITULO POSGRADO:	MAGISTER EN DESARROLLO Y GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS		

CONTRATO No.	OBJETO CONTRATO	EMPRESA CONTRATANTE	ENTIDAD CON LA QUE TUVO RELACION LABORAL	ACTIVIDAD DESARROLLADA	FECHA DE INICIO DEL CARGO	FECHA FINAL DEL CARGO	DURACION EN AÑOS	EXPERIENCIA PROFESIONAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FOLIO	OBSERVACIONES
301 17-5-016	AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA LA URBANIZACIÓN "LOS ALCARAVANES" EN EL BARRIO LA GRANJA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE	MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO	UNION TEMPORAL A&A PAZ DE ARIPORO 2019	RESIDENTE DE OBRA	17/12/2019	26/12/2019	0.03	0.03	0.03		
074 DE 2019	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS DE COMPLEMENTARIAS EN LA ZONA SUR DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE	ACUATODOS S.A. E.S.P.	UNION TEMPORAL PLUVIAL 2020	PROFESIONAL DE APOYO	29/01/2020	24/03/2020	0,16	0,16	0,36		
					24/04/2020	7/07/2020	0,21	0,21			
0080 DE 2020	OBRAS DE REPOSICION DE TRAMOS RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA COMUNA I DE LA CIUDADELA YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL - E.I.C.E-ESP	GRUPO THEOS	RESIDENTE DE OBRA	8/07/2020	19/10/2020	0.29	0.29	0,29		
--	DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS EN LOS DIFERENTES CONTARTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA	--	GRUPO THEOS	DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS	20/10/2020	28/12/2020	0.19	0,19			
0300 DE 2020	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO BOSQUES DE SIRVANA Y UN SECTOR DEL BARRIO LA PRIMAVERA Y AMPLIACIÓN DE RED DE ACUEDUCTO DEL BARRIO VILLAS DEL PEDREGAL EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL - E.I.C.E-ESP	GRUPO THEOS	RESIDENTE DE OBRA	29/12/2020	26/04/2021	0.34	0,34	0,34		
--	DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS EN LOS DIFERENTES CONTARTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA	--	GRUPO THEOS	DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS	29/04/2021	2/08/2021	0.27	0.27			
030 DE 2021	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA LA URBANIZACION LOS CENTAUROS, MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE	ACUATODOS S.A. E.S.P.	UNION TEMPORAL PLUVIAL PORE 2021	DIRECTOR DE PROYECTO	3/08/2021	16/06/2022	0.88	0.88	0,88		
--	DESEMPEÑO EL CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS EN LOS DIFERENTES CONTARTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA	--	GRUPO THEOS	DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS	17/06/2022	27/06/2023	1.04	1,04			
SEMPEM No. 036 DE 2023	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA CAPTACIÓN, ADUCCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO AGUACLARA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DE CASANARE	SABANALARGA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. S.A	VIVAN INGENIERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL S.A.S	RESIDENTE DE OBRA	28/06/2023	12/02/2024	0.64	0.64	0,66		
					28/02/2024	6/03/2024	0.02	0,02			
				TOTAL			3.62	3.62	3,76		
								GENERAL	ESPECIFICA		

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Subgerente Técnico y Operativo - Evaluador Técnico

304

2

CORRESPONDENCIA ENVIADA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 11 de marzo de 2024

Señor:
OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
R/L CONSORCIO PR-HK
Calle 10 No. 17 – 39
YOPAL – CASANARE

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **SOLICITUD CAMBIO DE DIRECTOR DE OBRA**

Por medio de la presente y en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO BENDICIÓN 23** identificado con NIT. 901.767.095-1, me permito hacerle entrega de la hoja de vida de DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO en calidad de ingeniero civil postulado al cargo de DIRECTOR DE OBRA del contrato de obra pública 041 de 2023, se presenta en consecuencia a que el profesional presentado en la oferta no puede ocupar la vacante por razones personales, el aspirante al cargo cumple con los requisitos estipulados en el numeral 4.3.2.1 del pliego de condiciones definitivo para el contrato 041 de 2023.

Adjunto hoja de vida y sus respectivos soportes para evaluación y aprobación.

Dado en Yopal, a los once (11) días del mes de marzo de 2024.

Atentamente,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. CONSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

Rcdo.
11/03/2024

396

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Télefono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Yopal, 21 de marzo de 2024

Señor:
OMAR ANDRES CORREDOR PEREZ
R/L CONSORCIO PR-HK
Calle 10 No. 17 – 39
YOPAL – CASANARE

REFERENCIA: **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No: 041 DE 2023**

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".**

ASUNTO: **ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1**

Por medio de la presente y en mi calidad de representante legal del **CONSORCIO BENDICIÓN 23** identificado con NIT. 901.767.095-1, me permito hacerle entrega del **INFORME MENSUAL DE OBRA No. 1** correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de Febrero de 2024 al 29 de Febrero de 2024 del contrato de obra No. 041 de 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Para lo anterior se hace entrega del informe original y sus respectivos anexos.

No. de folios: 596 + 1 cd

Atentamente,

DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO
R/L. COSORCIO BENDICIÓN 23
NIT. 901.767.095-1

Rcdo.
21/03/2024

397

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Télefono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

BITÁCORA DE OBRA



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23
R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

de replanteo y localización de colectores, pozos, y cámaras de inspección del Proyecto. se continua labores de adecuación de espacios (sala de reuniones y oficinas) en campamento de obra. se finaliza con el montaje del cartel para la valla informativa del Proyecto.

Residente obra. Residente Interventor

29/02/24 Jueves, Soleado.
Se continua con actividades de revisión de diseños, especificaciones del Proyecto y cantidades de obra descritas en el Presupuesto oficial. la comisión topografica continua labores de replanteo y localización de colectores, pozos y cámaras de inspección del Proyecto. se continua labores de adecuación de espacios (sala de reuniones y oficinas) en campamento de obra.

Residente obra. Residente Interventor

01/03/24 Viernes Soleado.
Se continuan actividades de revisión de diseños, Planos, especificaciones del Proyecto y cantidades de obra descritas en el Presupuesto oficial. la comisión topografica continua labores de replanteo y localización de

colectores, pozos y cámaras de inspeca del Proyecto. se continua labores de adecuación de espacios (Sala de reuniones y oficinas) en campamento de obra.

Residente obra

Residente Interventor

02/03/24 sábado, soleado

se finalizan actividades de revisión de diseños, planos, especificaciones del Proyecto y cantidades de obra descrita en el presupuesto oficial. La comisión topográfica finaliza labores de replanteo y localización de colectores, pozos y cámaras de inspección del Proyecto. se finaliza labores de adecuación de espacios (Sala de reuniones y oficinas en campamento de obra.

Residente obra

Residente Interventor

03/03/24 Domingo, Pla no laboral.

Residente obra

Residente Interventora

04/03/24 Lunes, soleado.

se inician actividades de replanteo y localización de red de media tensión, adicionalmente, se inicia la apertura de huecos para hincado de postes

Residente obra Residente Interventoría.

05/03/24 Martes, Soleado.
Se realizó el hincado de Postes de 12M * 1050 kg y Postes de 12M * 510 kg.

Residente obra Residente Interventoría.

06/03/24 Miércoles, Soleado.
Se inician actividades de desarote mecánico en la zona de la EBAR, esta actividad se finaliza el mismo día. Adicionalmente, se inician actividades de excavación para la implementación de canales laterales que puedan drenar la escorrentía superficial de aguas lluvias, paralelamente, se inician actividades de cerramiento de la zona de la EBAR. Se continua con hincado de postes de 12M * 510 kg y se inicia instalación de cableado de media tensión.

Residente obra. Residente Interventoría

07/03/24 Jueves, Soleado.
Se continuan actividades de cerramiento perimetral en la zona de la EBAR, adicionalmente, se inician actividades de excavación para la cimentación de la EBAR. Adicionalmente, se

Finaliza la instalación del cableado de red compacta de media tensión e instalación de esfera cadoras

Residente obra — Residente Interventor

08/03/24 Viernes, Nuboso
Se continuan actividades de cerramiento Perimetral en la zona de la EBAR, adicionalmente, se continuan actividades de excavación mecánica en la zona de la EBAR. A su vez, se funden Placas Para bodega en el campamento de obra.

Residente obra — Residente Interventor

09/03/24 Sábado, Nuboso
Se continuan actividades de cerramiento Perimetral en la zona de la EBAR, adicionalmente, se continuan actividades de excavación mecánica en la zona de la EBAR. A su vez, se funden Placas Para bodega en el campamento de obra

Residente obra — Residente Interventor

10/03/24 Domingo, Día no laboral.

Residente obra — Residente Interventor

11/03/24 Lunes, soleado.
Se continuan actividades de cerramiento perimetral en la zona de la EBAR, adicionalmente, se continuan actividades de excavación mecánica en la zona de la EBAR. A su vez, se inicia actividades de amarre de accesos para pedestales y placas para tanques de combustible.

Residente obra — Residente Interventoria

12/03/24 Martes, soleado.
Se continuan actividades de excavación mecánica en la zona de la EBAR. Adicionalmente, se funde placa en concreto de 3000 PSI para tanques de combustible.

Residente obra — Residente Interventoria

13/03/24 Miercoles, soleado.
Se continua con la actividad de excavación mecánica y trasiego de material de excavación en volqueta sencilla hasta las 9 Am, debido a presencia de la comunidad en el sitio de trabajo, realizando la labor, exigiendo dialogos en relación al proyecto. las actividades de obra quedaron pausadas hasta nueva orden y la maquinaria fue retirada de la zona.

Residente obra — Residente Interventoría

14/03/24 Jueves, soleado.
Se fenden Pedestales en Concreto en Zona de tanque de Combustible en Campamento de obra. Las actividades en la EBAR Continuan sus Pendientes.

Residente obra — Residente Interventoría

15/03/24 Viernes soleado.
Se Fende Placa en concreto en Zona de tanque de combustible en Campamento de obra. Las actividades en la EBAR Continuan sus Pendientes.

Residente obra. — Residente Interventoría

16/03/24 Sabado, soleado
Se realizan Conexiones y ensamble de la Planta Potabilizadora de agua Para el Campamento de obra. Adicionalmente se asiste en Calidad de Contratista a la reunión Comunitaria en la Zona de la EBAR con la Comunidad de Alameda, Bendición y San Rafael. Durante este encuentro, se ofrecen aclaraciones y se Proporciona Información relevante acerca del Proyecto, con el

Fin de abordar cualquier inquietud surgida en la comunidad

Residente obra — Residente Interventoría

17/03/24 Domingo, Día No laboral.

Residente obra — Residente Interventoría.

18/03/24 Lunes Se inician actividades de mejoramiento Soleado de suelo con material Sub base Retolera en la zona de campamento de obra. Continuan suspendidas las labores en la zona de la EBAR.

Residente obra. — Residente Interventoría

19/03/24 Martes, Soleado.
Se continuan actividades de mejoramiento de suelo con material Sub base Retolera en la zona de campamento de obra. Se inician actividades de encofrado y fundida de dique para tanques de combustible en campamento de obra. Continuan suspendidas las labores en la zona de la EBAR.

Residente obra. — Residente Interventoría

20/03/24 Miércoles, soleado.
Se continuan actividades de mejoramiento de suelo con material sub base Petrolera en la zona de campamento de obra. Se reinician actividades de excavación mecánica y trasiego de material de la zona de la OBAR, A su vez, se retoman las actividades de cerramiento Perimetral en la zona de la OBAR.

Residente obra — Residente Interventoría

21/03/24 Jueves, soleado.
Se inician actividades de construcción de bodega en concreto en el campamento de obra, a su vez, se continua actividades de excavación mecánica y trasiego de material de la zona de la OBAR y actividades de cerramiento Perimetral en esta misma zona

Residente obra — Residente Interventoría

22/03/24 Viernes, soleado.
Continuan actividades de construcción de bodega en concreto en zona de campamento de obra, a su vez, se continuan actividades de excavación mecánica y trasiego de material de la zona de la OBAR y actividades de cerramiento Perimetral

misma zona.

Residente obra Residente Interventoría

23/03/24 Sábado, soleado.
Continuan actividades de construcción de bodega en concreto en zona de campamento de obra, A su vez, se Continuan actividades de excavación mecanica y trasiego de material de la zona de la EBAR y actividades de cerramiento perimetral en esta misma zona.

Residente obra Residente Interventoría

24/03/24 Domingo, dia no laboral.

Residente obra Residente Interventoría.

25/03/24 Lunes, nublado.
Continuan actividades de construcción de bodega en concreto en zona de campamento de obra, a su vez, se Continuan actividades de excavación mecánica y trasiego de material de la zona de la EBAR y actividades de cerramiento perimetral en esta misma zona.

Residente obra Residente Interventoría.

26/03/24 Martes, lluvioso.
Se presentaron fuertes lluvias en hora de la madrugada producto de esto la zona de excavación de la EBAR qu parcialmente inundada, en respuesta se llevo a cabo labores de bombeo. Pa Controlar el nivel freatico de la zon Continuan labores de construcción de bodega en concreto en campamento de obra.

Residente obra Residente Interventoría

27/03/24. Miercoles, nublados.
Continuan labores de bombeo en la zona de la excavación de la EBAR a su vez, Continuan labores de Construcción de bodega en concreto en Campamento de obra.

Residente obra Residente Interventoría

28/03/24. Jueves Santo, Dia no laboral.

Residente obra. Residente Interventoría

29/03/24. Viernes Santo, Dia no laboral.

Residente obra. Residente Interventoría

30/03/24 Sábado Santo, Día no laboral.

Residente obra. Residente Interventora

31/03/24. Domingo, Día no laboral.

Residente obra. Residente Interventora.

6 ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL, AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Las actividades ejecutadas pertenecientes al Plan integral de salud ocupacional, ambiental y seguridad industrial, se encuentran especificadas y detalladas en el informe anexo referente a este componente.

6.1 ANEXOS:

6.1.1 INFORME MENSUAL No. 2 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA Y SALUD OCUPACIONAL

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4

OBJETIVOS 5

OBJETIVO GENERAL 5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5

1 DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA 6

1.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL A SOLUCIONAR CON EL PROYECTO 7

2 EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 9

2.1 FICHA MA-G1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES 9

2.2 FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE. 10

2.3 FICHA MA-G3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 10

2.4 FICHA MA-G4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). 12

2.5 FICHA MA-PM-G6 MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA 13

2.6 FICHA MA-S1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO 13

2.7 MA-S2 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO 14

2.8 FICHA MA-PM-S3 GESTIÓN SOCIAL 18

2.9 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/SALUD EN EL TRABAJO 18

2.10 FICHA MA-PM-S5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 20

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Relación de personal de obra 15
Tabla 2. Relación de planillas de seguridad social personal de obra 19
Tabla 3. Relación de equipos utilizados 21

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Estado actual de pozos de inspección sistema de alcantarillado sanitario Bendición 7
Ilustración 2. Estado actual de vertimiento de aguas negras en ciudadela Bendición 8
Ilustración 3. Punto ecológico instalado en campamento de la obra 9
Ilustración 4. Cerramiento zona de excavación EBAR 10
Ilustración 5. Acondicionamiento de áreas de almacenamiento 12
Ilustración 6. Capacitación de personal y pausas activas 14
Ilustración 7. Instalaciones de campamento de obra 18
Ilustración 8. Charlas preoperacionales 19
Ilustración 10. Charlas diarias 20

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato de obra pública 041 de 2023, presentamos el informe ambiental y SST correspondiente al período comprendido entre el 01 de marzo de 2024 y el 31 de marzo de 2024. En este informe se detallan los avances y logros alcanzados en la implementación del Plan de Manejo Ambiental y las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSG-SST).

El enfoque principal de este informe se centra en la ejecución del proyecto denominado **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**. Durante este período, hemos trabajado diligentemente para garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales y las normativas aplicables en estas áreas críticas.

En cuanto al Plan de Manejo Ambiental, hemos implementado medidas para mitigar los posibles impactos negativos en el entorno natural durante la ejecución de las actividades de obra. Estas medidas incluyen el control adecuado de residuos, la preservación de áreas verdes y la promoción de prácticas sostenibles. Nuestro compromiso es preservar la biodiversidad y los recursos naturales, minimizando al máximo los efectos negativos en el entorno en el que trabajamos.

La seguridad y la salud ocupacional de nuestro equipo de trabajo son aspectos fundamentales. Por lo tanto, hemos implementado medidas de seguridad, capacitaciones, inspecciones periódicas y promovido una cultura de prevención y cuidado. Nuestro objetivo es asegurar un entorno laboral seguro y saludable para todos los involucrados en el proyecto, fomentando así el bienestar y la protección de nuestro equipo.

En este informe, compartiremos los avances y resultados obtenidos durante el periodo mencionado. Destacaremos los logros alcanzados y los desafíos encontrados. Además, presentaremos las medidas implementadas para asegurar la efectividad de nuestros planes de gestión.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar de manera efectiva las actividades correspondientes al contrato de **"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"**. Esto implica garantizar la seguridad del personal de obra mediante acciones de seguridad y capacitación adecuada. Además, se aplicará el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para prevenir, evitar y controlar los impactos negativos en el medio físico, biótico y socioeconómico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Implementar medidas efectivas de protección ambiental, como la adecuada gestión de residuos, la prevención de la contaminación del suelo, agua, y la conservación de la biodiversidad local.
- ✓ Fomentar la sostenibilidad en cada uno de los procesos de obra optimizando el uso de los recursos naturales empleando fuentes y estrategias renovables con el fin de reducir todos los aspectos contaminantes.
- ✓ Implementar el programa de seguridad y salud ocupacional cumpliendo estándares de regulación vigente para crear un ambiente laboral seguro y saludable.
- ✓ Capacitar al personal técnico en procedimientos de seguridad y uso adecuado de equipos de protección personal, minimizando los riesgos de accidentes y lesiones.
- ✓ Crear estrategias para garantizar el control del estado de los equipos y maquinaria utilizada en las labores de obra.

1 DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

La Ciudadela "La Bendición" actualmente cuenta con un sistema de alcantarillado sanitario parcialmente terminado, el sistema que se caracteriza por funcionar a gravedad, drena desde el norte (en límite con el núcleo urbano 2) hacía el sur, además en sentido occidente- oriente. El punto más bajo de la red se ubica entre las manzanas 107 y 113, a la altura de las coordenadas Norte 1.076.811,970 y Este 851.417,776 origen Magna Sirgas 3° Este, da cobertura a algunas de las manzanas que conforman la ciudadela, sin embargo, el sistema construido no presta servicio debido a que las redes no cuentan con descole o descarga final que permita el flujo continuo de agua residual en las tuberías, por tal motivo, cualquier flujo que ingresa al sistema queda estancado y se acumula dentro de las redes.

No se cuenta con un sistema de alcantarillado en funcionamiento y dando cobertura a la totalidad de las viviendas existentes en la Ciudadela la Bendición. Por el contrario, el sistema actual está compuesto por solo 94 tramos de tuberías en diámetros de 8, 10, y 12 pulgadas respectivamente. Que en conjunto suman 5.907,3 metros lineales; los cuales, al hacer comparación con el número de vías existentes, permiten determinar de manera indirecta el porcentaje de cobertura el cual solo asciende al 27.60% dado que la totalidad de vías en afirmado asciende a 21.400 aproximadamente.

No se cuenta con estructuras de descarga a donde se puedan entregar las aguas residuales generadas; su última estructura en sentido de flujo del agua, corresponde a un pozo de inspección con profundidad media de 5.74 metros, razón por la cual parte del sistema se encuentra colmatado y sobrecargado.

Durante los recorridos se identificó la presencia de agua residual dentro del sistema construido, encontrando tramos completamente inundados y pozos colmatados, lo que demuestra que efectivamente existen usuarios conectados a las redes entregando agua residual al sistema. La consultoría realizó encuestas a la población de la ciudadela entre otros, con el objetivo de determinar la cantidad de conexiones existentes al alcantarillado, sin embargo, la comunidad encuestada negó la existencia de conexiones, manifestado en el total de encuestas que no poseen conexión al alcantarillado. Se concluye, que la comunidad se niega a confirmar la existencia de conexiones a la red de alcantarillado, debido a que: i) son conocedores de que el sistema existente actualmente no tiene funcionalidad, y a pesar de ello realizaron conexiones, y ii) debido a que las conexiones realizadas corresponden a conexiones artesanales no autorizadas, lo que genera temor en la comunidad, asociando esta conexión no autorizada con posibles sanciones.

Ilustración 1. Estado actual de pozos de inspección sistema de alcantarillado sanitario Bendición



1.1 PROBLEMÁTICA AMBIENTAL A SOLUCIONAR CON EL PROYECTO

La problemática ambiental que se presenta actualmente en la Ciudadela La Bendición del Municipio de Yopal, se debe a la carencia de un sistema de tratamiento de agua residual doméstica, en este momento las aguas residuales domésticas generadas son parcialmente recolectadas en pozos sépticos (aproximadamente 2.600) propios de las viviendas, el restante de las aguas residuales domésticas generadas son direccionadas hacia una laguna natural que limita con la urbanización mencionada. Su conducción se realiza mediante cunetas a lo largo de las vías de la ciudadela, lo cual constituye un factor ambiental que demanda su atención con prontitud al representar un foco de contaminación, olores ofensivos y proliferación de vectores.

Ilustración 2. Estado actual de vertimiento de aguas negras en ciudadela Bendición



2 EJECUCION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

A partir de los impactos ambientales identificados se definieron las medidas de manejo a implementar durante la ejecución del proyecto, las cuales están enfocadas hacia la prevención, corrección, mitigación, control y compensación, de los posibles impactos que se puedan generar, estas medidas de manejo se presentan en fichas las cuales se relacionan a continuación:

2.1 FICHA MA-G1 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.

Para el periodo de reporte de acuerdo a lo evidenciando en las acciones de esta ficha, se instaló un punto ecológico en el área del campamento, adicional se manejarán estrategias de almacenamiento temporal en bolsas de color negro y rojo con el fin de establecer en cada frente durante el día tenga donde disponer los residuos contaminados como (bolsas de cemento, estopas, guantes, entre otros residuos contaminados), y en la bolsa negra los residuos reciclables (botellas, bolsas entre otros).

En cuanto a los residuos ordinarios, la obra solo genera residuos como bolsas producto de la hidratación, la recolección y transporte final de estos desechos estará a cargo de la empresa prestadora de servicios de recolección de aseo.

En cuanto a los puntos ecológicos y por la naturaleza del proyecto se encuentra en el establecimiento de punto ecológico cuando se tenga en pleno la ejecución de la obra (a corte de este periodo no se ha requerido); además se estudia la opción de construir un punto de acopio temporal de residuos con la finalidad que sea un solo sitio donde se entregan dichos residuos.

Ilustración 3. Punto ecológico instalado en campamento de la obra



2.2 FICHA MA-G2 MANEJO DE LA CALIDAD DEL AIRE.

En cuanto a la ficha en mención el contratista para el periodo relacionado ha realizado el cerramiento perimetral teniendo en cuenta el movimiento de equipos para el cargue y descargue de material en el campamento, se realizó esta actividad mediante malla electrosoldada y lona verde, esto con el fin de garantizar la disminución de material particulado y la reducción parcial del ruido, contribuyendo a las comunidades aledañas al proyecto.

Se realizarán inspecciones preoperacionales de maquinaria, vehículos y equipos utilizados por el constructor para el desarrollo de las actividades de obra, para este periodo aún no se han realizado. toda vez que no se ha hecho ejecución de obra: se anexan los documentos de la maquinaria y demás en la ficha respectiva.

Ilustración 4. Cerramiento zona de excavación EBAR



2.3 FICHA MA-G3 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Para este periodo se encuentran en acondicionamiento de áreas provisionales dentro del campamento dentro de las cuales se tiene una bodega dentro del campamento de obra con el fin de almacenar de manera organizada y programada los materiales e insumos requeridos para la ejecución de la obra. El contratista se encuentra en acondicionamiento y señalización de las áreas del campamento con la finalidad de mantener la información del manejo integral de los materiales a usar junto con su preservación según sea el material a almacenar. Para ello se estipulan algunas recomendaciones a tener en cuenta:

- ✓ No se deberá realizar el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos para construcción, en zonas de espacio público, zonas verdes, áreas arborizadas, reservas naturales o forestales, áreas de recreación y parques ríos o en cualquier tipo de cuerpo de agua.
- ✓ Se debe verificar que los sitios disponibles para la obtención de material pétreo cuenten con la respectiva autorización de la autoridad ambiental. En lo posible se utilizarán plantas concreteras ubicadas en la zona y que cuenten con los permisos ambientales correspondientes. En caso de no tener concreteras en el sector, la preparación de los morteros y concretos se realizará sobre formaletas que impidan la desagregación del material, el contacto directo con el suelo y la dispersión de agua contaminada.

Para el manejo de la arena se recomienda tomar en cuenta lo siguiente:

- ✓ Se deben construir contenedores en material resistente, preferiblemente metálicos cuando se requiera almacenar temporalmente la arena, los cuales deben impedir su disgregación. Se recomienda la cobertura con productos sintéticos como lona, plásticos o geotextiles para evitar el arrastre por el viento y el agua lluvia.
- ✓ Los contenedores deben estar ubicados en un sitio estratégico de tal forma que sean de fácil acceso y al mismo tiempo no interfieran con el tráfico.

Para los procesos de fundición de estructuras se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:

- ✓ Los agregados serán ubicados en sitios de fácil acceso, evitando su dispersión.
- ✓ Durante el vaciado del concreto se controlará lo más pronto posible cualquier desperdicio o residuo Los residuos de concreto que resulten al final de las fundidas se recolectarán para ser mezclados con tierra y posteriormente se llevaran al sitio de disposición final.
- ✓ Para la fundición de concretos se recomienda utilizar formaletas metálicas. Solo para fundición de elementos pequeños se podrán realizar mezclas en obra.

Ilustración 5. Acondicionamiento de áreas de almacenamiento



2.4 FICHA MA-G4 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD).

Durante el periodo consolidado en relación a esta ficha el contratista de obra maneja la alternativa de reincorporación del material de excavación en actividades que se ameriten como accesos, paisajismo entre otras actividades que no requieran contar con los parámetros exigidos por la norma, de acuerdo a ello no se dispondrá dicho material de excavación para este periodo; no obstante el contratista de obra estudia la posibilidad de iniciar el trámite de gestor de RCD, con la finalidad de tener una opción amigable con el ambiente en dado caso que se llegase a requerir por lo volúmenes que saldrán del proyecto.

2.5 FICHA MA-PM-G6 MANEJO Y PROTECCIÓN DE FAUNA

Para el cumplimiento de estas acciones enmarcadas en la ficha para este periodo consolidado se realizó algunas charlas donde relaciono algunos temas de importancia para la protección de la fauna de la zona, con la finalidad de concientizar y educar al personal acerca de la importancia de preservar y cuidar a nuestras especies faunísticas. Para este periodo se realizó el siguiente tema:

- ✓ Protección de la flora y la fauna

Esta charla se encuentra consolidada en las capacitaciones y charlas al personal del proyecto ver ficha *Ma-S1 capacitación al personal del proyecto.*

2.6 FICHA MA-S1 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PROYECTO

En relación al periodo consolidado correspondiente del 01 al 31 de marzo de 2024, se realizó la divulgación de charlas de seguridad, salud en el trabajo y ambiental al personal vinculado a la obra, donde se ha brindado información clara sobre cada uno de los temas abordados en las capacitaciones con el propósito de continuar creando concientización sobre la importancia del autocuidado y la conservación de los recursos naturales. Dentro de los temas relacionados por el contratista de obra y verificados en sitio por la interventoría se tiene:

Periodo de Marzo

- ✓ Peligro en excavaciones
- ✓ Consciencia ambiental
- ✓ Agotamiento por calor
- ✓ Actos y condiciones inseguras
- ✓ Ahorro y uso eficiente del recurso hídrico
- ✓ Protección de la flora y la fauna
- ✓ Clasificación de residuos solidos
- ✓ Comunicación asertiva
- ✓ Atención a la comunidad

Ver **anexo 1**. Charlas y/o capacitaciones

Ilustración 6. Capacitación de personal y pausas activas





2.7 MA-S2 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA EL PROYECTO

A continuación, se relaciona personal con el que se cuenta para el periodo en mención.

Tabla 1. Relación de personal de obra

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SEGURIDAD SOCIAL			ESTADO
					SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
1	JERSON RAFAEL ALONSO HERRERA	INSPECTOR DE OBRA	15/01/2024	-	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	ACTIVO
2	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	DIRECTOR DE OBRA	13/02/2024	18/03/2024	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	ACTIVO
3	JAVIER ENRIQUE BECERRA CONTRERAS	SUPERVISOR DE OBRA	01/02/2024	-	SANITAS	SKANDIA	SURA	ACTIVO
4	GERSON ASDRUBAL BECERRA CONTRERAS	PROFESIONAL AMBIENTAL	13/02/2024	-	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	ACTIVO
5	LEONARDO ARIEL CARDENAS NIÑO	GERENTE DE PROYECTO	22/12/2023	-	SANITAS	COLFONDOS	SURA	ACTIVO
6	DALAVIER CERON SOTABAN	INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRATIVO	19/02/2024	-	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
7	CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED	OPERADOR ORUGADA	21/03/2024	-	SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
8	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE	OPERADOR CARROTANQUE	21/03/2024	-	SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
9	HURTADO PINEDA ALVARO	ALMACENISTA	05/03/2024	-	CAPRESOCA	PORVENIR	SURA	ACTIVO
10	YOLIMA HURTADO PINEDA	PROFESIONAL AREA SOCIAL	13/02/2024	-	COMPENSAR	PORVENIR	SURA	ACTIVO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SEGURIDAD SOCIAL			ESTADO
					SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
11	JIMENEZ LOPEZ LINA MARIA	OPERADORA MINICARGADOR	21/03/2024	-	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	ACTIVO
12	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	OPERADOR MONTACARGA	21/03/2024	-	NUEVA EPS	SANITAS	SURA	ACTIVO
13	HUGO YEZID MOLANO SANABRIA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	13/02/2024	-	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	ACTIVO
14	ALFREDO MARTIN PEREZ JAIMES	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	13/02/2024	-	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	ACTIVO
15	LUIS EDUARDO REAL HOYOS	INGENIERO RESIDENTE	15/01/2024	-	FAMISANAR	COLPENSIONES	SURA	ACTIVO
16	TARACHE CECILIA	AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	14/03/2024	-	SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
17	TEATIN CACHAY JUAN CAMILO	OPERADOR ORUGADA	21/03/2024	-	SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
18	VARGAS CERON MANUEL ALBERTO	SUPERVISOR DE OBRA	26/03/2024	-	SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
19	GARCIA MELDIVELSO DIEGO ANDRES	ESPECIALISTA HIDRAULICA O HIDROLOGIA	13/02/2024	-	COLMEDICA	PORVENIR	SURA	ACTIVO
20	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	DIRECTOR DE OBRA	19/03/2024	-	SANITAS	SKANDIA	SURA	ACTIVO

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	SEGURIDAD SOCIAL			ESTADO
					SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	
21	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO	PROFESIONAL SG-SST DE OBRA	13/02/2024	-	SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
22	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	INSPECTOR DE OBRA	13/02/2024	-	SANITAS	PORVENIR	SURA	ACTIVO
23	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	ESPECIALISTA AREA ELÉCTRICA	13/02/2024	-	SANITAS	COLFONDOS	SURA	ACTIVO

CONSORCIO BENDICIÓN 23

2.8 FICHA MA-PM-S3 GESTIÓN SOCIAL

De acuerdo a las acciones inmersas en la ficha, se relaciona que se tiene informada a las comunidades y autoridades locales sobre el proyecto a desarrollar, se tiene un sitio de atención e información el cual se encuentra anexo al informe mensual de obra denominado **PLAN DE GESTIÓN EN OBRA.**

En este sitio se recibirá y se atenderán las inquietudes, quejas, reclamos y solicitudes de la comunidad.

De acuerdo a ello se realizó la socialización a la comunidad el día 15 de febrero de 2024 donde hubo representantes de la gobernación de Casanare, ACUATODOS S.A, Alcaldía municipal, Diputados, concejo municipal y la comunidad en general. Allí se expuso el alcance del proyecto, actividades a desarrollar, programación y demás componentes del proyecto, además, se atendieron dudas y se recogieron sugerencias.

Adicional a esto, se anexa al presente documento el informe social donde se plasma el trabajo social requerido que enmarca la ruta a seguir durante la ejecución de la obra.

Ilustración 7. Instalaciones de campamento de obra





VER INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

2.9 MA-PM-S4 SEGURIDAD INDUSTRIAL/SALUD EN EL TRABAJO

Con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores, prevenir accidentes laborales y establecer la seguridad del personal, se realiza actividades que promueven el autocuidado y que indican un ambiente seguro para laboral.

Inducción al personal: Esto permite mejorar el rendimiento de los trabajadores, disminuye las dudas de los nuevos colaboradores, facilitan el aprendizaje de las funciones a desempeñar y el proceso de adaptación, reduce o evitar errores porque se proporciona toda la información necesaria al nuevo miembro del equipo, entre otros.

Ilustración 8. Charlas preoperacionales





- ✓ **Afiliación a seguridad social**: se garantiza la protección a los trabajadores y a su familia en el cubrimiento económico, en caso de que sufra una eventualidad en términos de salud, entre otros.

Tabla 2. Relación de planillas de seguridad social personal de obra

MES DE FEBRERO DE 2024			
CLAVE PLANILLA	CLAVE PAGO	PENSIÓN	SALUD
9465362689	554598770	2024-03	2024-04
9466196589	597061435	2024-03	2024-04

Ver Anexo 2. Afiliaciones a seguridad social
Ver Anexo 3. Planilla de aportes personal de obra

- ✓ **Charlas diarias**

De acuerdo a lo denotado en la ficha en mención, el contratista de obra realiza inducción al personal del proyecto con el fin de dar pautas en cuanto a reglamento interno del de trabajo, temas importantes para la realización de sus actividades y otros temas que hacen parte de la información necesaria que se debe dar al personal para que realicen sus tareas conforme lo estipulado. Como se relaciona en la

FICHA MA-S1 capacitación al personal del proyecto; Capacitación ambiental al personal de obra; Como se pueden observar en la ficha en mención en el anexo 1. Charlas y/o capacitación.

Ilustración 9. Charlas diarias





2.10 FICHA MA-PM-S5 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

A la fecha de este informe ya se ha requerido el uso de maquinaria la cual se relaciona en la tabla 3, dentro de las acciones que se deben tener en cuenta para el momento en que usemos las mismas se encuentra:

- ✓ Realizar inspecciones pre operacional de toda la maquinaria anexa al proyecto. Cuya evidencia se puede ver reflejada en los anexos que componen el presente informe.
- ✓ Se verificará e inspeccionará la zona de trabajo antes del inicio de las tareas.
  Cuando se trabaje cerca de líneas eléctricas se guardarán las distancias mínimas.
- ✓ Se tendrá especial cuidado cuando se trabaje en zonas con altas pendientes y en zonas de alta pluviosidad, donde hay mayor presencia de riesgos.
- ✓ Los vehículos de obra tendrán certificados de emisiones de gases y SOAT vigentes.

Tabla 3. Relación de equipos utilizados

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Estación total (topografía)	1
Nivel automático (topografía)	1
Excavadora de oruga	4
Retroexcavadora	1
Mini cargador	1
Vibrocompactador	1
Volqueta sencilla	11
Volquea Doble	1

Ver anexo 4. Inspecciones preoperacionales

GERSON ASDRUBAL BECERRA CONTRERAS
PROFESIONAL AMBIENTAL

JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ
PROFESIONAL SG-SST

ANEXO 1. CHARLAS Y/O CAPACITACIONES

CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINA

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	04 03 24	HORA DE INICIO:	7:00 Am	HORA DE FINALIZACIÓN:	7:15 Am
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional		Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento	X	Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Uso y Cuidado de los EPP's

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JERSON RAFAEL ALONSO HERRERA	86.039.937	INSPECTOR DE OBRA	
2	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	6.775.413	DIRECTOR DE OBRA	
3	JAVIER ENRIQUE BECERRA CONTRERAS	88.215.115	SUPERVISOR DE OBRA	
4	GERSON ASDRUBAL BECERRA CONTRERAS	1.116.544.049	PROFESIONAL AMBIENTAL	
5	LEONARDO ARIEL CARDENAS	74.181.863	GERENTE DE PROYECTOS	
6	DALAVIER CERON SOTABAN	1.118.564.818	INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
7	YOLIMA HURTADO PINEDA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	Yolima M.
8	HUGO YEZID MOLANO SANABRIA	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA	
9	ALFREDO MARTIN PEREZ JAIMES	91.240.944	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	
10	LUIS EDUARDO REAL HOYOS	79.483.830	RESEDENTE DE OBRA 1	
11	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
12	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	
13	DIEGO ANDRES GARCIA MENDIVELSO	1.049.621.180	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Diego A garcia
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	11	03	24	HORA DE INICIO:	7:00 Am	HORA DE FINALIZACIÓN:	7:15 Am

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional		Reunion		Cual:	
Capacitacion / Entrenamiento	X	Divulgación		Otra		Cual:	

TEMA: Trabajo en espacios Confinados

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JERSON RAFAEL ALONSO HERRERA	86.039.937	INSPECTOR DE OBRA	
2	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	6.775.413	DIRECTOR DE OBRA	
3	JAVIER ENRIQUE BECERRA CONTRERAS	88.215.115	SUPERVISOR DE OBRA	
4	GERSON ASDRUBAL BECERRA CONTRERAS	1.116.544.049	PROFESIONAL AMBIENTAL	
5	LEONARDO ARIEL CARDENAS	74.181.863	GERENTE DE PROYECTOS	
6	DALAVIER CERON SOTABAN	1.118.564.818	INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
7	HURTADO PINEDA ALVARO	46.364.728	ALMACENISTA	
8	YOLIMA HURTADO PINEDA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
9	HUGO YEZID MOLANO SANABRIA	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA	
10	ALFREDO MARTIN PEREZ JAIMES	91.240.944	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	
11	LUIS EDUARDO REAL HOYOS	79.483.830	RESEDENTE DE OBRA 1	
12	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
13	ITOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	
14	DIEGO ANDRES GARCIA MENDIVELSO	1.049.621.180	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	18 / 03 / 24	HORA DE INICIO:	7:00 Am	HORA DE FINALIZACIÓN:	7:15 Am

Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional		Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Comunicacion Asertiva.

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JERSON RAFAEL ALONSO HERRERA	86.039.937	INSPECTOR DE OBRA	
2	VICTOR MANUEL AVILA FONSECA	6.775.413	DIRECTOR DE OBRA	
3	JAVIER ENRIQUE BECERRA CONTRERAS	88.215.115	SUPERVISOR DE OBRA	
4	GERSON ASDRUBAL BECERRA CONTRERAS	1.116.544.049	PROFESIONAL AMBIENTAL	
5	LEONARDO ARIEL CARDENAS	74.181.863	GERENTE DE PROYECTOS	
6	DALAVIER CERON SOTABAN	1.118.564.818	INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
7	HURTADO PINEDA ALVARO	46.364.728	ALMACENISTA	
8	YOLIMA HURTADO PINEDA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	
9	HUGO YEZID MOLANO SANABRIA	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA	
10	ALFREDO MARTIN PEREZ JAIMES	91.240.944	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	
11	LUIS EDUARDO REAL HOYOS	79.483.830	RESEDENTE DE OBRA 1	
12	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
13	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	
14	DIEGO ANDRES GARCIA MENDIVELSO	1.049.621.180	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

RESPONSABLE ACTIVIDAD			
	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST	
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23	

CONSORCIO BENDICIÓN 23	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Versión: 0
	REGISTRO DE ASISTENCIA	Fecha 08/11/2022

FECHA	26 / 03 / 24	HORA DE INICIO:	7:00 Am	HORA DE FINALIZACIÓN:	7:25 Am
Inducción / Reinduccion		Charla preoperacional		Reunion	Cual:
Capacitacion / Entrenamiento		Divulgación		Otra	Cual:

TEMA: Protección de fauna Silvestre.

ASISTENTES

No	NOMBRE	No. CEDULA	CARGO	FIRMA
1	JERSON RAFAEL ALONSO HERRERA	86.039.937	INSPECTOR DE OBRA	
2	JAVIER ENRIQUE BECERRA CONTRERAS	88.215.115	SUPERVISOR DE OBRA	
3	GERSON ASDRUBAL BECERRA CONTRERAS	1.116.544.049	PROFESIONAL AMBIENTAL	
4	LEONARDO ARIEL CARDENAS	74.181.863	GERENTE DE PROYECTOS	
5	DALAVIER CERON SOTABAN	1.118.564.818	INGENIERO RESIDENTE ADMINISTRATIVO	
6	CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED	1.116.551.841	OPERADOR ORUGADA	
7	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE	9.530.553	OPERADOR CARROTANQUE	
8	HURTADO PINEDA ALVARO	46.364.728	ALMACENISTA	
9	YOLIMA HURTADO PINEDA	46.364.728	PROFESIONAL AREA SOCIAL	Yolima M.
10	JIMENEZ LOPEZ LINA MARIA	30.206.557	OPERADORA MINICARGADOR	
11	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	1.006.553.132	OPERADOR MONTACARGA	
12	HUGO YEZID MOLANO SANABRIA	7.227.214	ESPECIALISTA EN GEOTÉCNIA	
13	ALFREDO MARTIN PEREZ JAIMES	91.240.944	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	
14	LUIS EDUARDO REAL HOYOS	79.483.830	RESEDENTE DE OBRA 1	
15	TEATIN CACHAY JUAN CAMILO	1.193.100.410	OPERADOR ORUGADA	Camilo Teatin.
16	VARGAS CERON MANUEL ALBERTO	1.118.572.201	SUPERVISOR DE OBRA	Manuel Vargas
17	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO	1.116.545.333	INSPECTOR DE OBRA	
18	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	1.118.548.824	DIRECTOR DE OBRA	
19	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA	1.136.883.799	ESPECIALISTA ELÉCTRICO	
20	DIEGO ANDRES GARCIA MENDIVELSO	1.049.621.180	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	Diego A garcia
21				

RESPONSABLE ACTIVIDAD	NOMBRE	JULIAN FERNANDO MENDOZA DIAZ	FIRMA	
	CARGO	PROFESIONAL SG-SST		
	EMPRESA	CONSORCIO BENDICIÓN 23		

ANEXO 2. AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINA

ARL | sura

Medellín, 25 de April de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BENDICION 23.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL CASANARE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1118548824	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	19/03/2024		2MV306J2	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 25/04/2024 15:54:45 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.148.180.219, 192.230.104.4, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación
☐ Traslado
☐ Reintegro en el mismo mes Si☐ NO☐
Indique última fecha de retiro: AAAA MM DD

CO09/2884

Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación: CEDULA: 1118548824	Fecha de expedicion: 2009-10-23	Sexo: MASCULINO	
Primer Apellido: GIL	Segundo Apellido: CHAPARRO	Primer Nombre: DANIEL	Segundo Nombre: ALEXANDER
Fecha de nacimiento: 1991-09-16	Telefono: 3118472776	Dirección de residencia: CARRERA 30 A N° 17 - 10	Barrio:
Correo Electronico: TALENTOHUMANO@THEOS.COM.CO			
Estado civil: CASADO			
Ciudad: YOPAL	Fecha de ingreso a la empresa: 2024-03-19	Horas labor mes: 235	Cargo: DIRECTOR DE OBRA
Sueldo Básico: 3000000			
Tipo de contrato: OBRA LABOR	Administra recursos públicos:	Servidor público:	Nivel de escolaridad: POSGRADO /MAE
Profesión: INGENIERO CIVIL	Ocupacion: INGENIEROS CIVILES		
Orientacion sexual: HETEROSEXUAL	Vivienda: PROPIA		
Factor de vulnerabilidad: NO APLICA	Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE		

2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO BENDICION 23		Telefono: 6335023
NIT, CC O CE: 901767095	DEPENDENCIA:	

3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación	Fecha de expedicion	Sexo	
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Fecha de nacimiento	EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA		
Caja de compensación a las cual está afiliado(a)	Sueldo básico		

Solicitud de Datos Personales

Yo, DANIEL ALEXANDER GIL ALEXANDER, Identificado con cédula de ciudadanía No. 1118548824,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mí suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 1118548824

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare

Radicado: 2024-03-19-gTfUHnMeb-afi
Fecha: 2024-03-19
Hora: 17:18:21
Destino: Afiliaciones
Empresa: CONSORCIO BENDICION 23

La información de este formato está sujeta a verificacion

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

200121567

Fecha de Radicación: D D M M A A A A

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual { - Cotizante o Cabeza de Familia [ ] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ] } B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS) [ ]

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Gil	Chaparro	Daniel	Alexander
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
7. Tipo de documento de identidad: C.C.	8. Número del documento de identidad: 1118548824	9. Sexo: Femenino [ ] Masculino [X]	10. Fecha de nacimiento: 16 09 1991

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo F N M; Condición T P	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
SURA	Skandia	3.000.000

18. Residencia	Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
Carrera	30A # 17-109		3118472776	daniel.gil@theos.com.co

Municipio / Distrito	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	Localidad / Comuna	Departamento
Yopal			Casanare

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo: Femenino	27. Sexo: Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1					D D M M A A A A
B2					D D M M A A A A
B3					D D M M A A A A
B4					D D M M A A A A
B5					D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo: F	Tipo: N	Tipo: M	Condición: T	Condición: P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

32. Datos de residencia	Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Zona: Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C IPS Yopal	
B	
B	
B	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
Consorcio Bendición 23	N I T	901767095	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
			Yopal	Casanare

440

200121567

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo — [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen — [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino	Sexo: Masculino	Fecha de Radicación	42. Fecha
		[ ]	[ ]		19 03 20 24

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado — Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	[ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [x] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [x] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [x] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Daniel Gil	Laudis Duarte.

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad — Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] — Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial — Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN — Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
					D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos funcionario que realiza la validación — Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

SOLICITUD RECIBIDA PARA ESTUDIO
HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA
1.118.544.609

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Nombre / Clave Asesor Comercial	Sticker procesamiento
HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA C.C. No. 1118544609		EPS SANITAS	1118544609

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

441

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso
☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación
☐ Traslado
☐ Reintegro en el mismo mes Si ☐ NO ☐
Indique última fecha de retiro: AAAA MM DD

SGS CO09/2884

Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación: CEDULA: 30206557	Fecha de expedicion: 1995-05-31	Sexo: FEMENINO	
Primer Apellido: JIMENEZ	Segundo Apellido: LOPEZ	Primer Nombre: LINA	Segundo Nombre: MARIA
Fecha de nacimiento: 1976-12-11	Telefono: 3142652862	Dirección de residencia: CARRERA 34 N° 16-16	Barrio:
Correo Electronico: talentohumano@theos.com.co			
Estado civil: SOLTERO			
Ciudad: YOPAL	Fecha de ingreso a la empresa: 2024-03-21	Horas labor mes: 235	Cargo: OPERADORA MINIC
Sueldo Básico: 1300000			
Tipo de contrato: FIJO	Administra recursos públicos:	Servidor público:	Nivel de escolaridad: BASICA
Profesión: CONDUCTOR	Ocupacion: CONDUCTORES DE CAMIONES Y VEHICULOS PESADO		
Orientacion sexual: HETEROSEXUAL	Vivienda: NO TIENE		
Factor de vulnerabilidad: NO APLICA	Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE		

2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO BENDICION 23		Telefono: 6335023
NIT, CC O CE: 901767095	DEPENDENCIA:	

3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación:	Fecha de expedicion:	Sexo:	
Primer Apellido:	Segundo Apellido:	Primer Nombre:	Segundo Nombre:
Fecha de nacimiento:	EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA:		
Caja de compensación a las cual está afiliado(a):	Sueldo básico:		

Datos Personales de Solicitud

Yo, LINA MARIA JIMENEZ MARIA, Identificado con cédula de ciudadanía No. 30206557,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 30206557

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare

Radicado: 2024-04-05-yQV2yYGmy-afi
Fecha: 2024-04-05
Hora: 10:53:00
Destino: Afiliaciones
Empresa: [illegible]

La información de este formato está sujeta a verificacion

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios

ARL | sura

Medellín, 06 de Abril de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO BENDICION 23, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CASANARE, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C30206557	JIMENEZ LOPEZ LINA MARIA	21/03/2024		234'6120	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11185488242409735449

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/04/2024 09:50:49 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.148.180.219, 198.143.41.40, 172.16.42.57

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S.Sanitas
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

200106507

Fecha de Radicación: 05 04 2024

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ]; B. Colectiva [ ]; C. Institucional [ ]; D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): [ ]

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: Jimenez	Segundo apellido: Lopez	Primer nombre: Lina	Segundo nombre: Maria
7. Tipo de documento de identidad: C.C.	8. Número del documento de identidad: 30206557	9. Sexo: Femenino [X] Masculino [ ]	10. Fecha de nacimiento: 11 11 1976

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad: Tipo [F][N][M] Condición [T][P]	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ][ ]		[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
SURA	Colpensiones	1.300.000

18. Residencia	Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
Sabana	Cra 34 # 16-16		3142652862	lina15@gmail.com

Municipio / Distrito	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	Localidad / Comuna	Departamento
Yopal			Casanare

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo: Femenino [ ] Masculino [ ]	23. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A
[ ][ ][ ][ ][ ][ ]			

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo: Femenino	Masculino	28. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A
B1	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				
B2	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				
B3	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				
B4	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				
B5	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo: F	N	M	Condición: T	P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona: Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
Consorcio Bendición 23	[ ][ ][ ][ ][ ][ ]	901767095	

39. Ubicación Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
			Yopal	Casanare

200106507

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS
  Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de Radicación	42. Fecha
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]		21 03 2024

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	[ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [x] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [x] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [x] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Jimenez lopez Lind	Laudis Duarte

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad
  Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial (Código del Municipio / Código del Departamento)	67. Datos del SISBÉN (Número de Ficha / Puntaje / Nivel)	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
[ ][ ] / [ ][ ]	[ ] / [ ] / [ ]	DD MM AAAA	DD MM AAAA

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ][ ][ ][ ][ ]		

Observaciones:

SOLICITUD RECIBIDA
PARA ESTUDIO
HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA
1.118.544.609
Nombre / Clave Asesor Comercial
EPS SANITAS

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Sticker procesamiento
HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA C.C. No. 1118544609		1118544609

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

EPS Sanitas

Nuestro compromiso es contigo

NIT. 800.251.440-6

FORMATO DE ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO Y CARTA DE DESEMPEÑO DE EPS SANITAS S.A.

Nombre del Afiliado Lina Maria Jimenez Lopez

Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?	SI NO
Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	SI NO
¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?	SI NO
¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?	SI NO
Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, ¿fue asesorado adecuadamente por la EPS?	SI NO
¿Autoriza a EPS Sanitas el envío de este documento e información relacionada con la afiliación y la prestación en servicios de salud a su correo electrónico o celular?	SI NO

Lina Maria Jimenez Lopez

Firma del Afiliado

Documento de Identidad 30206557

FIRMA A RUEGO

A ruego del señor(a) _____, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. _____ quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el señor(a) _____, quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al señor(a) _____

El firmante a ruego

Huella índice

Nombres y Apellidos: _____

Documento de identidad: _____

Edad: _____

Dirección de domicilio: _____

Nombre de la persona que no sabe firmar

● Lina María Jiménez, declaro que he sido informado sobre que la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. en adelante EPS Sanitas, actuará como el Responsable del Tratamiento de mis datos personales y ha puesto a mi disposición la línea de atención en Bogotá en el número de teléfono 3759000 o fuera de Bogotá en el 018000919100, para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de mis derechos constitucionales y legales, observando la Política de Tratamiento de Información de EPS Sanitas disponible en www.epssanitas.com.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 5621 de 1994 del Ministerio de Salud, en el artículo 2.1.3.8 del Decreto 780 de 2016, y en los artículos 7 y 20 del Decreto 1377 de 2013, estos últimos, referidos a la estipulación a favor de otro o para otro, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a EPS Sanitas y/o a quien le sean cedidos sus derechos, para tratar mis datos personales y los de mis beneficiarios, afiliados, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, con las siguientes finalidades, adicionales a las autorizadas por la Constitución y la ley de prestación de servicios de salud, actividades propias del Sistema de Seguridad Social en Salud y del cumplimiento de las normas que lo regulan, así como de las actividades derivadas del objeto social de EPS Sanitas, incluidas pero sin limitarse a las actividades corporativas, administrativas, de información, comercialización, petición, recaudo, cobranza entre otros; contacto y envío de información relacionada con la prestación de los servicios de salud y relacionados a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales; crear y gestionar bases de datos (incluyendo bases de datos respecto de datos sensibles) para fines de investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios; dar a conocer, transferir y/o transmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier empresa miembro de la Organización Sanitas Internacional, de la cual hace parte EPS Sanitas, así como a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, o para implementar servicios de computación en la nube; acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública; consultar a cualquier médico, hospital, compañía de seguros, compañía de medicina prepagada o entidad promotora de salud (EPS) para que en cualquier momento, ya sea en vida mía o ya habiendo sucedido mi muerte, EPS Sanitas pueda acceder a la información sobre mi esto de salud; en consecuencia autorizo a dichas entidades para que entreguen a EPS Sanitas copia de toda la información que sea requerida. Por lo tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en: www.epssanitas.com. Así mismo, autorizo a EPS Sanitas a modificar o actualizar el contenido de la política, con el fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de los servicios, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía y/o correo electrónico.

La presente autorización la he suministrado de forma voluntaria.

Firma: ● Lina María Jiménez

Nombre: ● Lina María Jiménez López

Identificación: ● 30206557

Fecha: ● 05/04/2024

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 06/04/2024, el empleador CONSORCIO BENDICION 23 identificado con NIT número 901767095 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
7010045	06/04/2024	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1006553132	ANDERSONYESID MACIAS NARANJO	1300000	OPERADOR DE CARGA	2024-03-21

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 6 días del mes de Abril del año 2024.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

448

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación

☐ Traslado

☐ Reintegro en el mismo mes Si☐ NO☐

Indique última fecha de retiro: AÑO MES DIA

SGS CO09/2884

Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación: CEDULA: 1006553132	Fecha de expedicion: 2020-02-25	Sexo: MASCULINO	
Primer Apellido: MACIAS	Segundo Apellido: NARANJO	Primer Nombre: ANDERSON	Segundo Nombre: YESID
Fecha de nacimiento: 2002-01-21	Telefono: 3106183434	Dirección de residencia: CARRERA 7B N° 42-40	Barrio:
Correo Electronico: talentohumano@theos.com.co			
Estado civil: SOLTERO			

Ciudad: YOPAL	Fecha de ingreso a la empresa: 2024-03-21	Horas labor mes: 235	Cargo: OPERADOR MONTA	Sueldo Básico: 1300000
Tipo de contrato: FIJO	Administra recursos públicos:	Servidor público:	Nivel de escolaridad: SECUNDARIA	
Profesión: CONDUCTOR	Ocupacion: CONDUCTORES DE CAMIONES Y VEHICULOS PESADO			
Orientacion sexual: HETEROSEXUAL	Vivienda: NO TIENE			
Factor de vulnerabilidad: NO APLICA	Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE			

2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO BENDICION 23		Telefono: 6335023
NIT, CC O CE: 901767095	DEPENDENCIA:	

3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación:	Fecha de expedicion:	Sexo:	
Primer Apellido:	Segundo Apellido:	Primer Nombre:	Segundo Nombre:
Fecha de nacimiento:	EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA:		
Caja de compensación a las cual está afiliado(a):	Sueldo básico:		

Datos Personales de Solicitud

Yo, ANDERSON YESID MACIAS YESID, Identificado con cédula de ciudadanía No. 1006553132,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envio de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 1006553132

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare

Radicado: 2024-04-05-7gGZxujHy-afi
Fecha: 2024-04-05
Hora: 11:31:14
Destino: Afiliaciones
Empresa: CONSORCIO BENDICION 23

La información de este formato está sujeta a verificacion

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios

ARL | sura

Medellín, 06 de Abril de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO BENDICION 23, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CASANARE, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1006553132	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	21/03/2024		B1621722	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11185488242409735588

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/04/2024 09:53:08 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.148.180.219, 198.143.41.40, 172.16.42.57

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

200106510

Fecha de Radicación: 05 04 2024

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual - Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ]; B. Colectiva [ ]; C. Institucional [ ]; D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): [ ][ ]

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: Tentin	Segundo apellido: Cachay	Primer nombre: Juan	Segundo nombre: Camilo

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
C.C.	1193100410	Femenino [ ] Masculino [X]	01 04 1993

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ][ ]	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
SURA	Porvenir	1.300.000

18. Residencia	Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
Conegimiento	la Chaparrera		3143736953	tentinj@gmail.com

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
Yopal	Urbana [ ] Rural [ ]		Casanare

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				D D M M A A A A
B2	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				D D M M A A A A
B3	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				D D M M A A A A
B4	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				D D M M A A A A
B5	[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]				D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

32. Datos de residencia	Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C		
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
Consorcio Bendición 23	[ ][ ][ ][ ][ ][ ]	901767095	

39. Ubicación Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
			Yopal	Casanare

200106510

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo: Femenino	Sexo: Masculino	Fecha de Radicación	42. Fecha
[ ][x][ ][ ][ ][ ][ ][ ]		[ ]	[ ]		21 03 2014

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado — Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	[ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [x] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [x] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [x] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Teatin Juan Camilo	Laudo Duarte

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad — Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] — Total [ ]

- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial: Código del Municipio	Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de Ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de Radicación	69. Fecha de Validación
[ ][ ]	[ ][ ]				D D M M A A A A	D D M M A A A A

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario
[ ][ ][ ][ ][ ]		

Observaciones:

SOLICITUD RECIBIDA PARA ESTUDIO
HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA
1.118.544.609

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Nombre / Clave Asesor Comercial	Sticker procesamiento
HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA C.C. No. 1118544609		EPS SANITAS	1118544609

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación
☐ Traslado
☐ Reintegro en el mismo mes Si☐ NO☐
Indique última fecha de retiro: AAAA MM DD

SGS CO09/2884

Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación: CEDULA: 1193100410	Fecha de expedicion: 2011-04-07	Sexo: MASCULINO	
Primer Apellido: TEATIN	Segundo Apellido: CACHAY	Primer Nombre: JUAN	Segundo Nombre: CAMILO
Fecha de nacimiento: 1993-04-01	Telefono: 3143736953	Dirección de residencia: CORREGIMIENTO LA CI	Barrio:
Correo Electronico: talentohumano@theos.com.co			
Estado civil: SOLTERO			

Ciudad	Fecha de ingreso a la empresa	Horas labor mes	Cargo	Sueldo Básico
YOPAL	2024-03-21	235	OPERADOR ORUGA	1300000

Tipo de contrato: FIJO	Administra recursos públicos:	Servidor público:	Nivel de escolaridad: SECUNDARIA		
Profesión: CONDUCTOR	Ocupacion: CONDUCTORES DE CAMIONES Y VEHICULOS PESADO				
Orientacion sexual: HETEROSEXUAL	Vivienda: NO TIENE				
Factor de vulnerabilidad: NO APLICA	Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE				

2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO BENDICION 23	Telefono: 6335023
NIT, CC O CE: 901767095	DEPENDENCIA:

3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación	Fecha de expedicion	Sexo	
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Fecha de nacimiento	EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA		
Caja de compensación a las cual está afiliado(a)	Sueldo básico		

Solicitud de Datos Personales

Yo, JUAN CAMILO TEATIN CAMILO, Identificado con cédula de ciudadanía No. 1193100410,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 1193100410

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare Construimos Sueños !!!

Radicado: 2024-04-05-vb4jfjrvu-afi
Fecha: 2024-04-05
Hora: 10:40:17
Destino: Afiliaciones
Empresa: CONSORCIO BENDICION 23

La información de este formato está sujeta a verificacion

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios.

ARL | sura

Medellín, 06 de Abril de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de CONSORCIO BENDICION 23, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL CASANARE, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
C1193100410	TEATIN CACHAY JUAN CAMILO	21/03/2024		25223062	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11185488242409736134

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 06/04/2024 10:02:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.148.180.219, 198.143.41.40, 172.16.42.57

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

E.P.S. Sanitas
Organización Sanitas Internacional
NIT. 800.251.440-6
CÓDIGO 005, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

200106506

Fecha de Radicación: 05 04 2024

I - DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite: A. Afiliación [ ] B. Reporte de Novedades [X]
2. Tipo de Afiliación: A. Individual [- Cotizante o Cabeza de Familia [X] - Beneficiario o Afiliado adicional [ ]] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]
3. Régimen: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. Tipo de afiliado: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]
5. Tipo de cotizante: A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]
Código (a registrar por la EPS): [ ]

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
Primer apellido: Vaigas	Segundo apellido: Ceron	Primer nombre: Manuel	Segundo nombre: Alberto

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
C.C.	1118572201	Femenino [ ] Masculino [X]	20 08 1998

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial
[ ]	Tipo [F][N][M] Condición [T][P]	[ ]	[ ]

15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
SURA	Porvenir	3.250.000

18. Residencia	Dirección	Teléfono Fijo	Teléfono Celular	Correo Electrónico
	Ciudadela Comfa Torre 4 apto 310		3105587699	manu_vaiga3108@hotmail.

Municipio / Distrito	Zona	Localidad / Comuna	Departamento
Yopal	Urbana [X] Rural [ ]		Casanare

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo Femenino	27. Sexo Masculino	28. Fecha de nacimiento
B1	[ ]				D D M M A A A A
B2	[ ]				D D M M A A A A
B3	[ ]				D D M M A A A A
B4	[ ]				D D M M A A A A
B5	[ ]				D D M M A A A A

Datos complementarios

	29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1								
B2								
B3								
B4								
B5								

	32. Datos de residencia Municipio / Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la E.P.S.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la I.P.S. Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la E.P.S.)
C	IPS Yopal	
B		
B		
B		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la E.P.S.)
Consorcio Bendición 23	[ ]	901767045	

39. Ubicación Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
			Yopal	Casanare

200106506

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS — Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [x] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad — [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado — [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo		Fecha de Radicación	42. Fecha
		Femenino	Masculino		26/03/2014

43. EPS Anterior	44. Motivo de Traslado	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
	Código [ ]	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
- [ ] 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
- [ ] 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
- [x] 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
- [x] 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- [x] 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
Manuel Vargas	Idodis Duarte

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad — Cantidad: CN [ ] RC [ ] TI [ ] CC [ ] CE [ ] PA [ ] CD [ ] SC [ ] Total [ ]
- [ ] 57. Copia del diclamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- [ ] 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital
- [ ] 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital
- [ ] 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor
- [ ] 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia
- [ ] 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial — Código del Municipio / Código del Departamento	67. Datos del SISBÉN — Número de Ficha / Puntaje / Nivel	68. Fecha de Radicación (DD MM AAAA)	69. Fecha de Validación (DD MM AAAA)

70. Datos funcionario que realiza la validación			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

Observaciones:

SOLICITUD RECIBIDA PARA ESTUDIO
HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA
1.118.544.609

Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial	Sello de radicación	Nombre / Clave Asesor Comercial	Sticker procesamiento
HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA C.C. No. 1118544609		EPS SANITAS	1118544609

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

ComfaCasanare
Construimos Sueños !!!

Marque con una equis (x) y verifique instrucciones de diligenciamiento y causales de no aceptación al reverso

☐ Inscripción del trabajador ☐ Modificación
☐ Traslado
☐ Reintegro en el mismo mes Si☐ NO☐
Indique última fecha de retiro: AÑO MES DIA

SGS CO09/2884

Formato de Inscripción, de Trabajadores

FAPP006

1. DATOS DEL TRABAJADOR

Tipo y número de identificación	Fecha de expedicion	Sexo	
CEDULA: 1118572201	2016-09-20	MASCULINO	
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
VARGAS	CERON	MANUEL	ALBERTO
Fecha de nacimiento	Telefono	Dirección de residencia	Barrio
1998-08-20	3103587699	CIUDADELA COMFACAS	

Correo Electronico: talentohumano@theos.com.co

Estado civil: SOLTERO

Ciudad	Fecha de ingreso a la empresa	Horas labor mes	Cargo	Sueldo Básico
YOPAL	2024-03-26	235	RESIDENTE DE OBR	3250000

Tipo de contrato: FIJO — Administra recursos públicos ☐ — Servidor público ☐ — Nivel de escolaridad: PROFESIONAL UN

Profesión: CONDUCTOR — Ocupacion: CONDUCTORES DE CAMIONES Y VEHICULOS PESADO

Orientacion sexual: HETEROSEXUAL — Vivienda: NO TIENE

Factor de vulnerabilidad: NO APLICA — Pertenencia etnica: NO DISPONIBLE

2. DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		Telefono
CONSORCIO BENDICION 23		6335023
NIT, CC O CE	DEPENDENCIA	
901767095		

3. DATOS DEL CÓNYUGE O COMPAÑERO(A) PERMANENTE

Tipo y número de identificación	Fecha de expedicion	Sexo	
Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
Fecha de nacimiento	EMPRESA DONDE TRABAJA O ACTIVIDAD ECONOMICA		
Caja de compensación a las cual está afiliado(a)	Sueldo básico		

Datos Personales de Solicitud

Yo, MANUEL ALBERTO VARGAS ALBERTO, Identificado con cédula de ciudadanía No. 1118572201,manifiesto así de manera expresa, que AUTORIZO para el uso y tratamiento de mis datos personales en virtud de la función que le compete el tratamiento de los que fueron recolectados para las finalidades, así como para el envío de mensajes de correos de texto (SMS); de igual forma autorizó de manera irrevocable a la Caja a corroborar con cualquier persona, institución y autoridad, la información relativa a mis referencias personales, comerciales, fiscales, judiciales, financieras y cualquier otro dato que a juicio de la organización sea pertinentes para verificar y ampliar información por mi suministrada de acuerdo al manual de políticas y protección de datos establecido por la Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE de acuerdo a lo establecido en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013

FIRMA

Declaro bajo la gravedad de juramento que todos los datos son exactos y examinados por quien firma.

Firma del trabajador(a)
C.C. T.I. R.C o C.E. No 1118572201

Firma y sello del empleador

OBSERVACIONES: FORMULARIO SIN BENEFICIARIOS

ComfaCasanare

Radicado: 2024-04-05-HvKjtHy7X-afi
Fecha: 2024-04-05
Hora: 11:17:28
Destino: Afiliaciones
Empresa: [illegible]

La información de este formato está sujeta a verificacion

Utilice este formato exclusivamente para afiliación de trabajadores solteros, casados o en unión libre sin beneficiarios.

ARL | sura

Medellín, 23 de March de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de CONSORCIO BENDICION 23.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL CASANARE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1118572201	VARGAS CERON MANUEL ALBERTO	26/03/2024		I2I58218	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/03/2024 12:48:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 186.148.180.219, 198.143.41.39, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 3. PLANILLA DE APORTES PERSONAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901767095	1	CONSORCIO BENDICION 23	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO BENDICION 23	CONDOMINIO CASA VIEJA MZ A CA 12	YOPAL-CASANARE	6334412	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	554598770	9465362689	E	2024/04/22	2024/04/04	BANCOLOMBIA	0	$8,827,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO BENDICION 23 (18 Afiliados)																						$28,845,450	$4,615,900			$28,845,450	$1,154,500			$28,397,672	$1,136,500			$28,845,450		$1,920,700		$0	$0		$8,827,600
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$736,667	$117,900			$736,667	$29,500			$736,667	$29,500			$736,667		$3,900		$0	$0		$180,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$736,667	$117,900			$736,667	$29,500			$736,667	$29,500			$736,667		$3,900		$0	$0		$180,800
1	CC	47435477	TARACHE CECILIA	X																23030 1	17	$736,667	$117,900	EPS005	17	$736,667	$29,500	CCF69	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	0.522%	$3,900	17	$0	$0	SI	$180,800
Centro de Trabajo: CONSORCIO BENDICION 23 (17 Afiliados)																						$28,108,783	$4,498,000			$28,108,783	$1,125,000			$27,661,005	$1,107,000			$28,108,783		$1,916,800		$0	$0		$8,646,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (17 Afiliados)																						$28,108,783	$4,498,000			$28,108,783	$1,125,000			$27,661,005	$1,107,000			$28,108,783		$1,916,800		$0	$0		$8,646,800
2	CC	86039937	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL															X		25-14	10	$577,778	$92,500	EPS005	10	$577,778	$23,200	CCF69	0	$0	$0	14-11	10	$577,778	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$115,700
3	CC	86039937	ALONSO HERRERA JERSON RAFAEL																	25-14	20	$1,733,334	$277,400	EPS005	20	$1,733,334	$69,400	CCF69	20	$1,733,334	$69,400	14-11	20	$1,733,334	6.960%	$120,700	20	$0	$0	SI	$536,900
4	CC	6775413	AVILA FONSECA VICTOR MANUEL		X														X	25-14	18	$1,560,000	$249,600	EPS005	18	$1,560,000	$62,400	CCF69	18	$1,690,000	$67,600	14-11	18	$1,560,000	6.960%	$108,600	18	$0	$0	SI	$488,200
5	CC	1116544049	BECERRA CONTRERAS GERSON ASDRUBAL																	23090 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
6	CC	88215115	BECERRA CONTRERAS JAVIER ENRIQUE																	25-14	30	$2,576,000	$412,200	EPS005	30	$2,576,000	$103,100	CCF69	30	$2,576,000	$103,100	14-11	30	$2,576,000	6.960%	$179,300	30	$0	$0	SI	$797,700
7	CC	74181863	CARDENAS NIÑO LEONARDO ARIEL																	23100 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF69	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
8	CC	1118564818	CERON SOTABAN DALAVIER																	23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS041	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	SI	$805,000
9	CC	1116551841	CUBIDES ALARCON MAICK MOHAMMED	X																23030 1	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	SI	$134,400
10	CC	9530553	GONZALEZ ZAMBRANO JOSE REINALDO	X																23020 1	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	SI	$134,400
11	CC	9532276	HURTADO PINEDA ALVARO	X																23030 1	26	$2,253,334	$360,600	EPSC25	26	$2,253,334	$90,200	CCF69	26	$2,253,334	$90,200	14-11	26	$2,253,334	6.960%	$156,900	26	$0	$0	SI	$697,900
12	CC	46364728	HURTADO PINEDA YOLIMA																	23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
13	CC	30206557	JIMENEZ LOPEZ LINA MARIA	X																25-14	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	SI	$134,400
14	CC	1006553132	MACIAS NARANJO ANDERSON YESID	X																23030 1	10	$433,334	$69,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	SI	$134,400
15	CC	7227214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
16	CC	91240944	PEREZ JAIMES ALFREDO MARTIN																	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
17	CC	79483830	REAL HOYOS LUIS EDUARDO																	25-14	30	$3,900,000	$624,000	EPS017	30	$3,900,000	$156,000	CCF69	30	$3,900,000	$156,000	14-11	30	$3,900,000	6.960%	$271,500	30	$0	$0	SI	$1,207,500
18	CC	1193100410	TEATIN CACHAY JUAN CAMILO	X																23030 1	10	$433,334	$69,400	EPS005	10	$433,334	$17,400	CCF69	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	6.960%	$30,200	10	$0	$0	SI	$134,400
19	CC	1118572201	VARGAS CERON MANUEL ALBERTO	X																23030 1	5	$541,667	$86,700	EPS005	5	$541,667	$21,700	CCF69	5	$541,667	$21,700	14-11	5	$541,667	6.960%	$37,800	5	$0	$0	SI	$167,900
Total			**Afiliados(18)**																			$28,845,450	$4,615,900			$28,845,450	$1,154,500			$28,397,672	$1,136,500			$28,845,450		$1,920,700		$0	$0		$8,827,600

2024/04/06 09:10 AM

460

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901767095	1	CONSORCIO BENDICION 23	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO BENDICION ESPECIAL	CONDOMINIO CASA VIEJA MZ A CA 12	YOPAL-CASANARE	6334412	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	597061435	9466196589	E	2024/04/22	2024/04/25	BANCO DE OCCIDENTE	3	$2,452,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1049621180	GARCIA MENDIVELSO DIEGO ANDRES																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1118548824	GIL CHAPARRO DANIEL ALEXANDER	X																	230901	12	$1,200,000	$192,000	EPS005	12	$1,200,000	$48,000	CCF69	12	$1,200,000	$48,000	14-11	12	$1,200,000	$83,600	12	$0	$0	SI	$371,600
3	CC	9430088	MENDOZA DIAZ JULIAN FERNANDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
4	CC	1116545333	ROJAS PUCHIGAY YORMAN HERNANDO																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF69	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
5	CC	1136883799	TOVAR CORTES DIANA CAROLINA																		231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF69	30	$2,600,000	$104,000	14-11	30	$2,600,000	$181,000	30	$0	$0	SI	$805,000
Total	Afiliados(5)																					$7,900,000	$1,264,000			$7,900,000	$316,000			$7,900,000	$316,000			$7,900,000	$550,000		$0	$0		$2,446,000

2024/04/25 02:46 PM

ANEXO 4. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINA

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

SEMANA DEL 04/03 AL 09/03 AÑO: 2024 MODELO _____ SERIE _____

OPERADOR Lina Jimenez UBICACIÓN Bendición MARCA: _____

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X			
CABINA	*Cabina anti vuelo (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	X		X		X		X		X		X			
	Asiento	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horometro, corriente, aceite motor, combustible)	X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
	* Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Pito	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Espejo retrovisor central (convexo)	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales	X		X		X		X		X		X			
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X			
	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Puntos de lubricación	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	X		X		X		X		X		X			
	* Motor	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos	X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X			
	Guardas	X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR	Jf		Jf		Jf		Jf		Jf		Jf			

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

SEMANA DEL 11/03 AL 16/03 AÑO: 2024 MODELO _____ SERIE _____

OPERADOR Linda Jimenez UBICACIÓN Bendición MARCA: _____

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X			
CABINA	*Cabina anti vuelo (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	X		X		X		X		X		X			
	Asiento	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible)	X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
	* Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Pito	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Espejo retrovisor central (convexo)	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales	X		X		X		X		X		X			
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X			
	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Puntos de lubricación	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	X		X		X		X		X		X			
	* Motor	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos	X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X			
	Guardas	X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

SEMANA DEL 18/03 AL 23/03 AÑO: 2024 MODELO _____ SERIE _____

OPERADOR Lina Jimenez UBICACIÓN Bendición MARCA: _____

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X			
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)	X		X		X		X		X		X			
CABINA	*Cabina anti vuelo (R.O.P.S)	X		X		X		X		X		X			
	* Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios 10 lbs PQS	X		X		X		X		X		X			
	Asiento	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible)	X		X		X		X		X		X			
	Control ingreso humo (tubo de escape)	X		X		X		X		X		X			
	* Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
	Pito	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Espejo retrovisor central (convexo)	X		X		X		X		X		X			
	Estado de pedales	X		X		X		X		X		X			
	Estado de mandos manuales	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de cilindro (amortiguadores)	X		X		X		X		X		X			
	Llantas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Puntos de lubricación	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de viraje	X		X		X		X		X		X			
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)	X		X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento (emergencia)	X		X		X		X		X		X			
	* Motor	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores y tornillos en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Batería y cables	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio	X		X		X		X		X		X			
	* Resguardos	X		X		X		X		X		X			
	Anclajes de contrapeso	X		X		X		X		X		X			
	Guardas	X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor	X		X		X		X		X		X			
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR	[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]			

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VIBROCOMPACTADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

SEMANA DEL 25/03 AL 30/03 AÑO: 2024 MODELO _____ SERIE _____

OPERADOR Lina Jimenez UBICACIÓN Bendición MARCA: _____

ÍTEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* De trabajo delanteras (Trabajo nocturno)			X		X									
	* De trabajo traseras (Trabajo nocturno)			X		X									
CABINA	*Cabina anti vuelo (R.O.P.S)			X		X									
	* Cinturón de seguridad			X		X									
	Extintor de incendios 10 lbs PQS			X		X									
	Asiento			X		X									
	Mandos de avance			X		X									
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerantes, horómetro, corriente, aceite motor, combustible)			X		X									
	Control ingreso humo (tubo de escape)			X		X									
	* Alarma de retroceso			X		X									
	Pito			X		X									
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X									
	Espejo retrovisor central (convexo)			X		X									
	Estado de pedales			X		X									
	Estado de mandos manuales			X		X									
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			X		X									
	* Estado de cilindro (amortiguadores)			X		X									
	Llantas en buen estado			X		X									
	Puntos de lubricación			X		X									
	Mecanismo de viraje			X		X									
	* Dirección (terminales, bomba hidráulica)			X		X									
	* Mando de estacionamiento (emergencia)			X		X									
	* Motor			X		X									
	Pasadores y tornillos en buen estado			X		X									
	Batería y cables			X		X									
	* Freno de servicio			X		X									
	* Resguardos			X		X									
	Anclajes de contrapeso			X		X									
	Guardas			X		X									
	Estado del bastidor			X		X									
FIRMA	FIRMA OPERADOR														
	FIRMA SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

B: BUENO M: MALO *PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Fernando Mendoza MARCA: Caterpilar 420E

CARGO: Profesional HSE SERIE N°:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 04-09/Marzo/2024 MODELO:

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X			
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X			
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X			
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X			
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X			
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X			
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X			
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.	X		X		X		X		X		X			
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X		X		X		X		X		X			
Vo.Bo. SUPERVISOR		JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Juan Fernando Mendoza MARCA: Caterpillar 420E

CARGO: Profesional HSE SERIE N°:

MODELO:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 11-16/Marzo/2024

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X			
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X			
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X			
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X			
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X			
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X			
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X			
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.	X		X		X		X		X		X			
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X		X		X		X		X		X			
Vo.Bo. SUPERVISOR		JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Fernando Mendoza. MARCA: Caterpilar 420 E

CARGO: Profesional HSE SERIE N°:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 18-23/Marzo/2024 MODELO:

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X			
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X			
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X			
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X			
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X			
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X			
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.	X		X		X		X		X		X			
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.	X		X		X		X		X		X			
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X		X		X		X		X		X			
Vo.Bo. SUPERVISOR		JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Juan Fernando Mendoza MARCA: Caterpillar 420E

CARGO: Profesional HSE SERIE Nº:

MODELO:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 25-30/Marzo/2024

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.			X		X									
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.			X		X									
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.			X		X									
	Las luces de STOP y señal trasera funcionan correctamente.			X		X									
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.			X		X									
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.			X		X									
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.			X		X									
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.			X		X									
	La alarma de retroceso funciona correctamente.			X		X									
	El pito no presenta alguna falla.			X		X									
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.			X		X									
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.			X		X									
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.			X		X									
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.			X		X									
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.			X		X									
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.			X		X									
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.			X		X									
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.			X		X									
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.			X		X									
	La huella está en buen estado.			X		X									
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.			X		X									
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.			X		X									
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.			X		X									
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.			X		X									
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.			X		X									
	El freno de servicio está en condiciones seguras.			X		X									
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.			X		X									
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.			X		X									
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.			X		X									
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.			X		X									
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.			X		X									
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.			X		X									
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.			X		X									
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.			X		X									
Vo. Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

470

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Fernando Mendoza MARCA: Caterpillar 416E

CARGO: Profesional HSE SERIE N°:

MODELO:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 18-23/marto/2024

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falta.	X		X		X		X		X		X			
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	P	X		X		X		X		X		X			
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.	X		X		X		X		X		X			
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
	La alarma de retroceso funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
	El pito no presenta alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.	X		X		X		X		X		X			
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.	X		X		X		X		X		X			
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.	X		X		X		X		X		X			
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.	X		X		X		X		X		X			
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.	X		X		X		X		X		X			
	La huella está en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.	X		X		X		X		X		X			
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.	X		X		X		X		X		X			
	El freno de servicio está en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado	X		X		X		X		X		X			
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.	X		X		X		X		X		X			
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.	X		X		X		X		X		X			
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.	X		X		X		X		X		X			
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.	X		X		X		X		X		X			
Vo.Bo. SUPERVISOR		JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE RETROCARGADOR	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Fernando Mendoza. MARCA: Caterpillar 416E

CARGO: Profesional HSE SERIE Nº:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 25-30/marzo/2024 MODELO:

C: Cumple NC: No cumple

ÍTEM	ASPECTO A VERIFICAR	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
LUCES	Las luces de trabajo delanteras (Altas y bajas) se encuentran en buen estado.			X		X									
	Las luces direccionales delanteras de parqueo y giro no presentan alguna falla.			X		X									
	Las luces direccionales traseras de parqueo y giro se encuentran en buen estado.			X		X									
	p			X		X									
	Las luces de trabajo traseras no presentan alguna falla.			X		X									
CABINA	La cabina anti volcó (ROPS) se encuentra certificada.			X		X									
	Los indicadores de horómetro, corriente, aceite y motor están en buenas condiciones.			X		X									
	El tubo de control de ingreso de humo (Tubo de escape) está en condiciones seguras.			X		X									
	La alarma de retroceso funciona correctamente.			X		X									
	El pito no presenta alguna falla.			X		X									
	Las palancas de mando se encuentran en buen estado.			X		X									
	El cinturón de seguridad funciona correctamente.			X		X									
	Los espejos laterales no presentan algún defecto.			X		X									
	El espejo central convexo se encuentra en buen estado.			X		X									
	El dispositivo de giro no presenta alguna falla en su funcionamiento.			X		X									
	Las escaleras y apoyos de acceso están en buenas condiciones.			X		X									
	Los indicadores (hidráulicos, refrigerantes) funcionan adecuadamente.			X		X									
	Los pedales se encuentran en condiciones inseguras.			X		X									
LLANTAS	Las llantas no presentan abolladuras, abultamientos o cortaduras.			X		X									
	La huella está en buen estado.			X		X									
ESTADO MECÁNICO	Los pasadores (Brazo y balde) se encuentran en condiciones seguras.			X		X									
	Los pasadores (Bastidor / Desgarrador) están en buenas condiciones.			X		X									
	Los gatos estabilizadores no presentan alguna falla.			X		X									
	El mecanismo de giro (brazo / Excavador) está en buenas condiciones.			X		X									
	La función hidráulica está funcionando adecuadamente.			X		X									
	El freno de servicio está en condiciones seguras.			X		X									
	El freno de emergencia se encuentra en buen estado.			X		X									
	El control de fugas hidráulicas se encuentra en buenas condiciones.			X		X									
	El estado general del desgarrador / balde es el adecuado.			X		X									
	Los mandos de elevación del brazo se encuentran en buen estado.			X		X									
	Los gatos hidráulicos se encuentran en condiciones seguras.			X		X									
ELEMENTOS DE EMERGENCIA	El kit ambiental está completo.			X		X									
	El extintor se encuentra cargado y en buenas condiciones.			X		X									
	Cuenta con botiquín de primeros auxilios.			X		X									
Vo.Bo. SUPERVISOR															

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Juan Fernando M. SERIE No.:

CARGO: Profesional HSE MODELO:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 18-23/marzo/2024 MARCA: Hyundai

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X			
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X			
Bocina	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X			
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X			
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X			
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X			
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X			
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X			
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X			
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X			
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X			
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X			
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X			
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X			
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X			
Orugas	X		X		X		X		X		X		X			
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X			
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X			
Exosto	X		X		X		X		X		X		X			
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X			
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X			
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X			
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X			
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X			
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X			
Vo. Bo. Supervisor			JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Juan Fernando M. SERIE No.:

CARGO: Profesional HSE MODELO:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 25-30/marzo/2024 MARCA: HYUNDAI

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X				X		X									
Sistema eléctrico	X				X		X									
B. CABINA																
Asiento	X				X		X									
Cinturón de seguridad	X				X		X									
Radio transmisión	X				X		X									
Bocina	X				X		X									
Vidrio lateral derecho	X				X		X									
Vidrio lateral izquierdo	X				X		X									
Vidrio lateral frontal	X				X		X									
Vidrio lateral trasero	X				X		X									
Alarma de retroceso	X				X		X									
Limpieza exterior	X				X		X									
Relojes indicadores	X				X		X									
Limpia parabrisas	X				X		X									
Niveles aceite hidráulico	X				X		X									
Mandos operacionales	X				X		X									
Panel de control	X				X		X									
Niveles agua radiador	X				X		X									
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X				X		X									
Filtraciones aceite	X				X		X									
Filtraciones de agua	X				X		X									
Radiador de filtro hidráulico	X				X		X									
Filtro de combustible	X				X		X									
Filtro de aceite	X				X		X									
Orugas	X				X		X									
Dientes de las orugas	X				X		X									
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X				X		X									
Exosto	X				X		X									
Rodamientos de oruga fijos	X				X		X									
Ajusladores de oruga hidráulicos	X				X		X									
Tanque de reserva del radiador	X				X		X									
Ventitador de refrigeración	X				X		X									
Motor de arranque	X				X		X									
Cubiertas laterales del motor	X				X		X									
Vo. Bo. Supervisor					JF		JF									

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Juan Fernando M. SERIE No.:

CARGO: Profesional HSE MODELO: 2007

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 25-30/MARZO/2024 MARCA: ITACHI

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X				X		X									
Sistema eléctrico	X				X		X									
B. CABINA																
Asiento	X				X		X									
Cinturón de seguridad	X				X		X									
Radio transmisión	X				X		X									
Bocina	X				X		X									
Vidrio lateral derecho	X				X		X									
Vidrio lateral izquierdo	X				X		X									
Vidrio lateral frontal	X				X		X									
Vidrio lateral trasero	X				X		X									
Alarma de retroceso	X				X		X									
Limpieza exterior	X				X		X									
Relojes indicadores	X				X		X									
Limpia parabrisas	X				X		X									
Niveles aceite hidráulico	X				X		X									
Mandos operacionales	X				X		X									
Panel de control	X				X		X									
Niveles agua radiador	X				X		X									
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X				X		X									
Filtraciones aceite	X				X		X									
Filtraciones de agua	X				X		X									
Radiador de filtro hidráulico	X				X		X									
Filtro de combustible	X				X		X									
Filtro de aceite	X				X		X									
Orugas	X				X		X									
Dientes de las orugas	X				X		X									
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X				X		X									
Exosto	X				X		X									
Rodamientos de oruga fijos	X				X		X									
Ajusladores de oruga hidráulicos	X				X		X									
Tanque de reserva del radiador	X				X		X									
Ventilador de refrigeración	X				X		X									
Motor de arranque	X				X		X									
Cubiertas laterales del motor	X				X		X									
Vo. Bo. Supervisor					JF		JF									

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Johan Fernando M. SERIE No.:

CARGO: Profesional HSE MODELO: 2007

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 18-23/Marzo/2024 MARCA: ITACHI

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X			
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X			
Bocina	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X			
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X			
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X			
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X			
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X			
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X			
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X			
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X			
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X			
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X			
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X			
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X			
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X			
Orugas	X		X		X		X		X		X		X			
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X			
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X			
Exosto	X		X		X		X		X		X		X			
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X			
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X			
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X			
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X			
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X			
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X			
Vo. Bo. Supervisor			JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Juan Fernando M. SERIE No.:

CARGO: Profesional HSE MODELO:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 18-23/marzo/2024 MARCA: ITACHI 200LT

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X		X		X		X		X		X		X			
Sistema eléctrico	X		X		X		X		X		X		X			
B. CABINA																
Asiento	X		X		X		X		X		X		X			
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X			
Radio transmisión	X		X		X		X		X		X		X			
Bocina	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio lateral derecho	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio lateral izquierdo	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio lateral frontal	X		X		X		X		X		X		X			
Vidrio lateral trasero	X		X		X		X		X		X		X			
Alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X		X			
Limpieza exterior	X		X		X		X		X		X		X			
Relojes indicadores	X		X		X		X		X		X		X			
Limpia parabrisas	X		X		X		X		X		X		X			
Niveles aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X			
Mandos operacionales	X		X		X		X		X		X		X			
Panel de control	X		X		X		X		X		X		X			
Niveles agua radiador	X		X		X		X		X		X		X			
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X			
Filtraciones aceite	X		X		X		X		X		X		X			
Filtraciones de agua	X		X		X		X		X		X		X			
Radiador de filtro hidráulico	X		X		X		X		X		X		X			
Filtro de combustible	X		X		X		X		X		X		X			
Filtro de aceite	X		X		X		X		X		X		X			
Orugas	X		X		X		X		X		X		X			
Dientes de las orugas	X		X		X		X		X		X		X			
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X		X		X		X		X		X		X			
Exosto	X		X		X		X		X		X		X			
Rodamientos de oruga fijos	X		X		X		X		X		X		X			
Ajustadores de oruga hidráulicos	X		X		X		X		X		X		X			
Tanque de reserva del radiador	X		X		X		X		X		X		X			
Ventilador de refrigeración	X		X		X		X		X		X		X			
Motor de arranque	X		X		X		X		X		X		X			
Cubiertas laterales del motor	X		X		X		X		X		X		X			
Vo. Bo. Supervisor			JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Juan Fernando M. SERIE No.:

CARGO: Profesional HSE MODELO:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 25-30/Marzo/2024 MARCA: ITACHI ZX470

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X				X		X									
Sistema eléctrico	X				X		X									
B. CABINA																
Asiento	X				X		X									
Cinturón de seguridad	X				X		X									
Radio transmisión	X				X		X									
Bocina	X				X		X									
Vidrio lateral derecho	X				X		X									
Vidrio lateral izquierdo	X				X		X									
Vidrio lateral frontal	X				X		X									
Vidrio lateral trasero	X				X		X									
Alarma de retroceso	X				X		X									
Limpieza exterior	X				X		X									
Relojes indicadores	X				X		X									
Limpia parabrisas	X				X		X									
Niveles aceite hidráulico	X				X		X									
Mandos operacionales	X				X		X									
Panel de control	X				X		X									
Niveles agua radiador	X				X		X									
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X				X		X									
Filtraciones aceite	X				X		X									
Filtraciones de agua	X				X		X									
Radiador de filtro hidráulico	X				X		X									
Filtro de combustible	X				X		X									
Filtro de aceite	X				X		X									
Orugas	X				X		X									
Dientes de las orugas	X				X		X									
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X				X		X									
Exosto'	X				X		X									
Rodamientos de oruga fijos	X				X		X									
Ajustadores de oruga hidráulicos	X				X		X									
Tanque de reserva del radiador	X				X		X									
Ventilador de refrigeración	X				X		X									
Motor de arranque	X				X		X									
Cubiertas laterales del motor	X				X		X									
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE EXCAVADORA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

INSPECCIONADO POR: Julian Fernando M. SERIE No.:

CARGO: Profesional HSE MODELO:

FECHA O SEMANA DE INSPECCIÓN: 25-30/marzo/2024 MARCA: HYUNDAI 115

C: Cumple / NC: No cumple

ÍTEM	APLICA		LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SABA		DOM	
A. LUCES	SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
Luces de viraje delanteras	X				X		X									
Sistema eléctrico	X				X		X									
B. CABINA																
Asiento	X				X		X									
Cinturón de seguridad	X				X		X									
Radio transmisión	X				X		X									
Bocina	X				X		X									
Vidrio lateral derecho	X				X		X									
Vidrio lateral izquierdo	X				X		X									
Vidrio lateral frontal	X				X		X									
Vidrio lateral trasero	X				X		X									
Alarma de retroceso	X				X		X									
Limpieza exterior	X				X		X									
Relojes indicadores	X				X		X									
Limpia parabrisas	X				X		X									
Niveles aceite hidráulico	X				X		X									
Mandos operacionales	X				X		X									
Panel de control	X				X		X									
Niveles agua radiador	X				X		X									
C. ESTADO MECÁNICO																
Conexiones hidráulicas	X				X		X									
Filtraciones aceite	X				X		X									
Filtraciones de agua	X				X		X									
Radiador de filtro hidráulico	X				X		X									
Filtro de combustible	X				X		X									
Filtro de aceite	X				X		X									
Orugas	X				X		X									
Dientes de las orugas	X				X		X									
Marco de protección de los rodamientos de las orugas	X				X		X									
Exosto	X				X		X									
Rodamientos de oruga fijos	X				X		X									
Ajustadores de oruga hidráulicos	X				X		X									
Tanque de reserva del radiador	X				X		X									
Ventilador de refrigeración	X				X		X									
Motor de arranque	X				X		X									
Cubiertas laterales del motor	X				X		X									
Vo. Bo. Supervisor																

OBSERVACIONES:

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Noe Gamboa Tzi	**Supervisor:**	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 4-9/Marzo	**Firma del Conductor:**	
Placas:	URA 165	**Marca/Modelo:**	Sencilla 6m³
Kilometraje Inicial:		**Kilometraje Final:**	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pata, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la capa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS.** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

420

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	1/mar/2024

Conductor:	Jose Contreras	Supervisor:	Jdan Fernando M.
Periodo de inspección: 2024	11-16 / Marzo	Firma del Conductor:	
Placas:	ORA 165	Marca/Modelo:	Sencilla 6 m³
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras. profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funciona correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, linpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Galos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión están operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases. manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

Versión: 0

Fecha

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Cuatrenal

Conductor:	Noe Contreras	Supervisor:	Johan Fernando Ng.
Periodo de Inspección: 2024	18-23/Marzo	Firma del Conductor:	
Placas:	URA 165	Marca/Modelo:	Sencilla 6m3
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje. Pasador. Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolsquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante, Espigos de la compuerta, Anclajes, Ganchos de amarre de la carpa, Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO X

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Noe Combariza	Supervisor:	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección: 2024	25-30 Marzo	Firma del Conductor:	
Placas:	URA 165	Marca/Modelo:	Sencilla 6 m3
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO.** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.			X		X									
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso			X		X									
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.			X		X									
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.			X		X									
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.			X		X									
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido			X		X									
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado			X		X									
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades			X		X									
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras			X		X									
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.			X		X									
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible			X		X									
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.			X		X									
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre			X		X									
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funciona correctamente			X		X									
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención			X		X									
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)			X		X									
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)			X		X									
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta			X		X									
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños			X		X									
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos			X		X									
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad. Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.			X		X									
	Vo.Bo. SUPERVISOR			JC		JC									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha

Vigencia

Conductor:	Hernando G.	Supervisor:	Julian Fernando Ra.
Periodo de Inspección: 2024	4-9/Marzo	Firma del Conductor:	
Placas:	URJ 493	Marca/Modelo:	Sencilla 6m³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Aceites de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, Equido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	Marzo 2024

Conductor:	Hernando G.	Supervisor:	Wilson Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 11-16/Marzo	Firma del Conductor:	
Placas:	URJ 473	Marca/Modelo:	Escilla 6M3
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, Equido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Galos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/Mar/2024

Conductor:	Hernando G.	Supervisor:	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección: 2024	18-23/Marzo	Firma del Conductor:	
Placas:	URJ 493	Marca/Modelo:	Sencilla 6m³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI (X) NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	1/02/2024

Conductor:	Hernando G.	Supervisor:	Juan Fernando M.
Periodo de Inspección: 2024	25-30/Marzo	Firma del Conductor:	
Placas:	URJ 473	Marca/Modelo:	Sencilla 6M³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.			X		X									
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso			X		X									
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.			X		X									
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.			X		X									
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.			X		X									
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido			X		X									
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado			X		X									
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades			X		X									
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras			X		X									
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.			X		X									
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible			X		X									
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.			X		X									
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre			X		X									
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente			X		X									
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , boliqui, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención			X		X									
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).			X		X									
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)			X		X									
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón Galos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta			X		X									
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.			X		X									
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos			X		X									
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precoperacional			X		X									
	Vo.Bo. SUPERVISOR			JF		JF									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Jorge Vargas	Supervisor:	Jhon Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 4-9 / Marzo	Firma del Conductor:	
Placas:	JRC 132	Marca/Modelo:	Escalla 6m³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO.** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSNISIÓN.** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA :** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos o olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fijelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	MAR/2024

Conductor:	Jorge Vargas	Supervisor:	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección: 2024	11-16/Marzo	Firma del Conductor:	
Placas:	JRE132	Marca/Modelo:	Sencilla 6m³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	JUNIO 2024

Conductor:	Jorge Vargas	Supervisor:	Johan Fernando M.
Periodo de Inspección: 2024	18-23/MAYO	Firma del Conductor:	
Placas:	JRE 132	Marca/Modelo:	Sencilla 6m3
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Galos de levante. Espigos de la compuesta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha

Edición 2024

Conductor:	Jorge Vargas	Supervisor:	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección: 2024	25-30/Mar-24	Firma del Conductor:	
Placas:	JRE 132	Marca/Modelo:	Sencilla 6m³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón, Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Fabian Diaz	Supervisor:	Julian Fernando Na.
Periodo de Inspección: 2024	4-9/Mar-20	Firma del Conductor:	FABIAN DIAZ
Placas:	FTN 161	Marca/Modelo:	Sencilla 6m³
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallas(s) en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bobiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Galos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	1/01/2024

Conductor:	Fabian Diaz	Supervisor:	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 11-16/ marzo	Firma del Conductor:	FABIAN DIAZ
Placas:	FTD 161	Marca/Modelo:	Sencilla 6m3
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las Novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estén en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE . Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia. Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador. limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo, SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Fabian Paz	Supervisor:	Julian Fernandez Ma.
Periodo de Inspección: 2024	18-23/Marzo	Firma del Conductor:	FABIAN PAZ
Placas:	FTD161	Marca/Modelo:	Sencilla 6m³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X a casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los Hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, crucela, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Fabian Diaz	Supervisor:	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección: 2024	25-30/marzo	Firma del Conductor:	FABIAN MAS
Placas:	FTD161	Marca/Modelo:	Sencilla 6m³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, anotar B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.			X		X									
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso			X		X									
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.			X		X									
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.			X		X									
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.			X		X									
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido			X		X									
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado			X		X									
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades			X		X									
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras			X		X									
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.			X		X									
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible			X		X									
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no están sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.			X		X									
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre			X		X									
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funciona correctamente			X		X									
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto: Avisos de señales de prevención			X		X									
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).			X		X									
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)			X		X									
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta			X		X									
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.			X		X									
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos			X		X									
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato precoperacional.			X		X									
	Vo.Bo. SUPERVISOR			JF		JF									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/02/2024

Conductor:	Ramiro Salazar	Supervisor:	Jhon Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 11-16/Marzo	Firma del Conductor:	Ramiro Salazar.
Placas:	AUK 707	Marca/Modelo:	Sencilla 6 m³
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, arosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjalos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/03/2024

Conductor:	Ramiro Salazar	Supervisor:	Julian Fernando M
Periodo de inspección: 2024	18-23 / Marzo	Firma del Conductor:	Ramiro Salazar
Placas:	AUK202	Marca/Modelo:	Sencilla 6m3
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS. Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Ramiro Salazar	Supervisor:	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección: 2024	25-30/Marzo	Firma del Conductor:	Ramiro Salazar
Placas:	AUF202	Marca/Modelo:	Sencilla 6m³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.			X		X									
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso			X		X									
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.			X		X									
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.			X		X									
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que estan en buen estado.			X		X									
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido			X		X									
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado			X		X									
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN. Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades			X		X									
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras			X		X									
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.			X		X									
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible			X		X									
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.			X		X									
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre			X		X									
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente			X		X									
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, cajá de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto, Avisos de señales de prevención			X		X									
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos)			X		X									
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)			X		X									
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platon. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta			X		X									
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.			X		X									
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúralos			X		X									
21	DOCUMENTOS: Tagela de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.			X		X									
	Vo.Bo. SUPERVISOR			JF		JF									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/03/2024

Conductor:	Alberto Zanabria	Supervisor:	Jairon Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 11-16/Marzo	Firma del Conductor:	Alberto Zanabria
Placas:	SPD603	Marca/Modelo:	Doble 12m³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO. Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO. Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, Equido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , bolíquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (perosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Alberto Sanabria	Supervisor:	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 (18-23/MARZO	Firma del Conductor:	Alberto Sanabria
Placas:	XPO603	Marca/Modelo:	doble 12m³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las Novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de las frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , boliqui, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

500

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha

12/02/2024

Conductor:	Alberto Sanabria	Supervisor:	Adrian Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 25-30/Marzo	Firma del Conductor:	Alberto Sanabria
Placas:	SDD603	Marca/Modelo:	doble 12 m³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo. de freno, de retroceso.			X		X									
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso			X		X									
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.			X		X									
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.			X		X									
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.			X		X									
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido			X		X									
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Arcples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado			X		X									
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades			X		X									
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos Rin sin rajaduras			X		X									
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.			X		X									
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible			X		X									
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.			X		X									
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre			X		X									
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente			X		X									
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención			X		X									
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).			X		X									
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)			X		X									
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Galos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta			X		X									
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.			X		X									
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos			X		X									
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.			X		X									
	Vo.Bo. SUPERVISOR			AA		AA									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

501

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	1/10/2024

Conductor:	Marco Martinez	Supervisor:	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 11-16/Mayo	Firma del Conductor:	Marco Martinez
Placas:	WRJ482	Marca/Modelo:	Sencilla 6m3
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si está Bueno o M si está Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocimetro, hidráulico, neumático, bateria, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	1/ago/2024

Conductor:	Marco Martinez	**Supervisor:**	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 18-23/Marzo	**Firma del Conductor:**	marco martinez
Placas:	WYJ482	**Marca/Modelo:**	Sencilla 6m3
Kilometraje Inicial:		**Kilometraje Final:**	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que estan en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de ajuste	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , boliquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión. 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Marco Martinez	Supervisor:	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 25-30/marzo	Firma del Conductor:	Marco Martinez
Placas:	WYJ482	Marca/Modelo:	Sencilla 6m3
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.			X		X									
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso			X		X									
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.			X		X									
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.			X		X									
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.			X		X									
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido			X		X									
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado			X		X									
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades			X		X									
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras			X		X									
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.			X		X									
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible			X		X									
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.			X		X									
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre			X		X									
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente			X		X									
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , bobiquin, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención			X		X									
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).			X		X									
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)			X		X									
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta			X		X									
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento. Detectar ruidos u olores extraños.			X		X									
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos			X		X									
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.			X		X									
	Vo.Bo. SUPERVISOR			JF		JF									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Hector Ochoa	Supervisor:	Jayson Fernando M.
Periodo de Inspección: 2024	11-16/ Marzo	Firma del Conductor:	Hector Ochoa.
Placas:	AEC 294	Marca/Modelo:	Sencilla 6m3
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallas en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento; Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO: SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/Marzo/24

Conductor:	Hector Ochoa	Supervisor:	Jolan Fernando M.
Periodo de Inspección: 2024	18-23/Marzo	Firma del Conductor:	Hector Ochoa
Placas:	AEC294	Marca/Modelo:	Sencilla 6m³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA

CONSORCIO BENDICIÓN 23

Versión: 0

Fecha: 12/01/2024

Conductor:	Hector Ochoa	Supervisor:	Julian Fernandez M.
Periodo de Inspección: 2024	25-30/Marzo	Firma del Conductor:	Hector Ochoa
Placas:	AEC 294	Marca/Modelo:	Sencilla 6m³
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, en que B: esta Bueno o M: si esta Malo, registre las novedades en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.			X		X									
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso			X		X									
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.			X		X									
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.			X		X									
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.			X		X									
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido			X		X									
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado			X		X									
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades			X		X									
9	**LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado.** Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras			X		X									
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.			X		X									
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible			X		X									
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.			X		X									
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre			X		X									
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente			X		X									
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lampara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención			X		X									
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).			X		X									
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)			X		X									
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta			X		X									
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo está en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.			X		X									
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido Fíjelos y asegúrelos			X		X									
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional			X		X									
	Vo.Bo. SUPERVISOR			JF		JF									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [NO]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/03/2024

Conductor:	Carlos Berrios	**Supervisor:**	Julian Fernando Ng.
Periodo de inspección:	2024 18-23/MARZO	**Firma del Conductor:**	Carlos Berrios
Placas:	JIO670	**Marca/Modelo:**	Escalla 6m3
Kilometraje Inicial:		**Kilometraje Final:**	

Marque con X la casilla correspondiente, Marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO [SI] [NO X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Carlos Barajas	Supervisor:	Juan Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 25-30/Mar 70	Firma del Conductor:	Carlos Barajas
Placas:	JID670	Marca/Modelo:	Sencilla Gm 3
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.			X		X									
2	**SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso			X		X									
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.			X		X									
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.			X		X									
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.			X		X									
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido			X		X									
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal. Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado			X		X									
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora. caja de velocidades			X		X									
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras			X		X									
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.			X		X									
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible			X		X									
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.			X		X									
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre			X		X									
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente			X		X									
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , boliquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención			X		X									
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).			X		X									
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)			X		X									
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta			X		X									
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños			X		X									
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos			X		X									
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.			X		X									
	Vo.Bo. SUPERVISOR			Af		Af									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/8/2024

Conductor:	Faban Zuluaga	Supervisor:	Dylan Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 18 al 23/Marzo	Firma del Conductor:	
Placas:	UVK 830	Marca/Modelo:	Sencilla 6m³
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, indique B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	**SISTEMA ACÚSTICO.** Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio lastero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Anclas de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni contaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre	X		X		X		X		X		X			
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (perosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la tarpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo. Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR														

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	14/02/2024

Conductor:	Fabian Salazar	Supervisor:	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección:	7:30/Mañana	Firma del Conductor:	
Placas:	UVF830	Marca/Modelo:	Sencilla 6 m³
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	**SISTEMA DE ALUMBRADO:** Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.			X		X									
2	**SISTEMA ACÚSTICO:** Bocina o Pito, alarma de retroceso			X		X									
3	**INDICADORES:** Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.			X		X									
4	**PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS:** Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.			X		X									
5	**ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA:** Verificar que están en buen estado.			X		X									
6	**SISTEMA DE ENCENDIDO:** Switch y motor de encendido			X		X									
7	**SISTEMA DE FRENOS DE AIRE :** Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acoples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado			X		X									
8	**SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN:** Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades			X		X									
9	**LLANTAS Y RUEDAS:** Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras			X		X									
10	**NIVELES DE FLUIDOS:** Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.			X		X									
11	**INSPECCIÓN DE FUGAS:** De aceite, agua, líquido de frenos y combustible			X		X									
12	**CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS** Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.			X		X									
13	**CINTURONES DE SEGURIDAD:** Correas y dispositivos de cierre			X		X									
14	**DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD:** Que funcione correctamente			X		X									
15	**EQUIPO DE CARRETERA:** Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención			X		X									
16	**KIT AMBIENTAL:** Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).			X		X									
17	**SISTEMA DE ESCAPE:** Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)			X		X									
18	**VOLCÓ O PLATÓN:** Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta			X		X									
19	**Antes de arrancar el motor** se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.			X		X									
20	**OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA:** Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos			X		X									
21	**DOCUMENTOS:** Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia. Formato preoperacional.			X		X									
	Vo.Bo. SUPERVISOR			JF		JF									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	12/02/2024

Conductor:	Mario Vargas	Supervisor:	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección:	2024 18-23/Marzo	Firma del Conductor:	
Placas:	X6C292	Marca/Modelo:	Encilla 6m3
Kilometraje Inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre los hallazgos en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.	X		X		X		X		X		X			
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso	X		X		X		X		X		X			
3	INDICADORES: Velocimetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.	X		X		X		X		X		X			
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.	X		X		X		X		X		X			
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido	X		X		X		X		X		X			
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo). Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire. Cauchos de pedales en buen estado	X		X		X		X		X		X			
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades	X		X		X		X		X		X			
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Run sin rajaduras	X		X		X		X		X		X			
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.	X		X		X		X		X		X			
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible	X		X		X		X		X		X			
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.	X		X		X		X		X		X			
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de derre	X		X		X		X		X		X			
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funcione correctamente	X		X		X		X		X		X			
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención	X		X		X		X		X		X			
16	KIT AMBIENTAL: Equipo mínimo: Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).	X		X		X		X		X		X			
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, escape (porosidad o rajaduras)	X		X		X		X		X		X			
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta	X		X		X		X		X		X			
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.	X		X		X		X		X		X			
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjalos y asegúrelos	X		X		X		X		X		X			
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional	X		X		X		X		X		X			
	Vo.Bo. SUPERVISOR	JF		JF		JF		JF		JF		JF			

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [X] NO

512

CONSORCIO BENDICIÓN 23	INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE VOLQUETA	Versión: 0
		Fecha
	CONSORCIO BENDICIÓN 23	10/01/2024

Conductor:	Mario Vargas	Supervisor:	Julian Fernando M.
Periodo de Inspección: 2024	25-30/Marzo	Firma del Conductor:	
Placas:	X6C292	Marca/Modelo:	Sencilla 6m³
Kilometraje inicial:		Kilometraje Final:	

Marque con X la casilla correspondiente, marque B si esta Bueno o M si esta Malo, registre las fallas en observaciones

No.	ÍTEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	SISTEMA DE ALUMBRADO: Luces altas, bajas, direccionales, de parqueo, de freno, de retroceso.			X		X									
2	SISTEMA ACÚSTICO: Bocina o Pito, alarma de retroceso			X		X									
3	INDICADORES: Velocímetro, hidráulico, neumático, batería, combustible, RPM.			X		X									
4	PUERTAS, ASIENTOS, VIDRIOS Y ESPEJOS: Parabrisas y plumillas, vidrio trasero y de puertas. Espejos retrovisores y el central.			X		X									
5	ESCALERAS Y PASAMANOS DE ACCESO A LA CABINA: Verificar que están en buen estado.			X		X									
6	SISTEMA DE ENCENDIDO: Switch y motor de encendido			X		X									
7	SISTEMA DE FRENOS DE AIRE : Revisión del sistema general (Servicio, Emergencia, Parqueo), Montaje, Pasador, Recorrido del pedal, Acples de los frenos, tanques de almacenamiento de aire Cauchos de pedales en buen estado			X		X									
8	SISTEMA DE DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN: Barra de acoplamiento y estabilizadora, caja de velocidades			X		X									
9	LLANTAS Y RUEDAS: Presión inflado. Sin abultamientos ni cortaduras o rajaduras, profundidad de labrado mínimo 3 mm. Pernos y espárragos completos. Rin sin rajaduras			X		X									
10	NIVELES DE FLUIDOS: Refrigerante del radiador, limpiaparabrisas, agua de la batería, aceite del motor y dirección.			X		X									
11	INSPECCIÓN DE FUGAS: De aceite, agua, líquido de frenos y combustible			X		X									
12	CORREAS, CABLES Y CONEXIONES ELÉCTRICAS Verificar que no estén sueltas, deterioradas o en mal estado para prevenir eventuales contactos con partes metálicas.			X		X									
13	CINTURONES DE SEGURIDAD: Correas y dispositivos de cierre			X		X									
14	DISPOSITIVO DE CONTROL DE VELOCIDAD: Que funciona correctamente			X		X									
15	EQUIPO DE CARRETERA: Extintor , botiquín, gato, cruceta, tacos, señales de advertencia de peligro, caja de herramientas, lámpara de pilas, llanta de repuesto; Avisos de señales de prevención			X		X									
16	KIT AMBIENTAL. Equipo mínimo. Pica, pala, rollo de cinta para señalización, almohadillas para absorber crudo, tacos de madera. (Aplica si el vehículo transporta materiales peligrosos).			X		X									
17	SISTEMA DE ESCAPE: Silenciador, exosto (porosidad o rajaduras)			X		X									
18	VOLCÓ O PLATÓN: Verificar el estado general del platón. Gatos de levante. Espigos de la compuerta. Anclajes. Ganchos de amarre de la carpa. Estado de la carpa que se utiliza para cubrir el material que se transporta			X		X									
19	Antes de arrancar el motor se debe verificar que los mecanismos de baja presión estén operables, dirección que no tenga juego, prueba del sistema de frenos para detectar fugas. Cuando el vehículo esté en movimiento: Detectar ruidos u olores extraños.			X		X									
20	OBJETOS SUELTOS EN LA CABINA: Totalmente Prohibido. Fíjelos y asegúrelos			X		X									
21	DOCUMENTOS: Tarjeta de Propiedad, Seguro Obligatorio, Licencia de Conducción, Certificado de gases, manejo defensivo, Lista de teléfonos de Emergencia, Formato preoperacional.			X		X									
	Vo.Bo. SUPERVISOR			JF		JF									

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI [ ] NO [X]

7 INFORME DE GESTIÓN SOCIAL

Las actividades ejecutadas pertenecientes al Plan de gestión social, se encuentran especificadas y detalladas en el informe anexo referente a este componente.

7.1 ANEXOS

7.1.1 INFORME MENSUAL No. 2 DEL INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.

CONSORCIO BENDICIÓN 23

INFORME MENSUAL No. 2 DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

CONTRATO DE OBRA No. 041-2023

CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE



CONTRATISTA: CONSORCIO BENDICION 23

R/L. DANIEL ALEXANDER GIL CHAPARRO

YOPAL, CASANARE
ABRIL 2024
ORIGINAL

515

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVOS 4
OBJETIVO GENERAL 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
1 PRELIMINARES DE OBRA 5
1.1 DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 5
1.2 DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL 8
1.2.1 ACTORES INVOLUCRADOS 8
2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN 9
2.1 SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO 9
2.2 ACONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL 13
2.3 INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA 14
2.4 PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 15
2.5 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 16
2.5.1 QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD 17
2.5.2 RELACIÓN DE QUEJAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y TRAMITE 17
2.6 DIALOGOS CON LA COMUNIDAD 17

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

INTRODUCCIÓN

En desarrollo del contrato de obra pública No. 041 de 2023, se elabora el presente informe de actividades realizadas del plan de gestión social durante la etapa constructiva, el cual contiene el acompañamiento y seguimiento a las actividades de comunicación y participación a la comunidad durante la ejecución de la CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

El plan busca mitigar los impactos generados en el momento de ejecución de las obras, cambios abruptos tanto en el trabajador como en las rutinas diarias de los habitantes del sector, así como también atender a los intereses y expectativas de la comunidad frente a la ejecución de las obras. De igual manera, el plan de gestión social busca impactar positivamente en la comunidad permitiendo vincularla mediante su participación ciudadana en la ejecución de la obra de una manera voluntaria, comprometida y desinteresada, haciendo que se sientan beneficiarios de la misma.

El presente documento, será un compendio de las actividades del plan de gestión social realizadas por el contratista a través de todo el desarrollo de la obra, por lo cual, contiene cada una de las actividades ejecutadas e implementadas relacionadas con el plan desde el inicio de la obra.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer procedimientos y estrategias que permitan prevenir, reducir, controlar y/o mitigar de manera oportuna los impactos negativos, así como potenciar los impactos positivos que se generen derivados de las obras civiles relacionadas con la **CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE**, así como garantizar la participación activa de la comunidad y promover el reconocimiento, apropiación, cuidado y sostenibilidad de las obras dirigidas a mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el sector.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Dar a conocer el proyecto a ejecutar a la comunidad de La Ciudadela La Bendición y Alameda Martha Mojica, así como las actividades que se desarrollaran antes, durante y después de la obra.
- ✓ Socializar a la comunidad sobre el inicio de la ejecución del proyecto, así como informar todos los aspectos técnicos y generalidades del mismo junto con los actores y entidades públicas involucradas.
- ✓ Dar respuesta de manera oportuna a las inquietudes de la comunidad frente al proyecto.
- ✓ Dar claridad frente a la vinculación de mano de obra local y los aspectos a tener en cuenta sobre la misma para así evitar la creación de las falsas expectativas por la demanda laboral con ocasión a la ejecución del proyecto.
- ✓ Ser responsable con las actividades a ejecutar sobre el espacio público, socializando las políticas y medidas diseñadas para la adecuada intervención de éste y respetando su uso.
- ✓ Disminuir al máximo el impacto generado en el tráfico y en los distintos actores viales por las labores constructivas que se desarrollan en el sector.
- ✓ Establecer estrategias que permitan minimizar la afectación de viviendas por el tránsito de maquinaria pesada.
- ✓ Mantener informadas a las comunidades y demás actores que intervengan en el desarrollo del proyecto en cuanto a las medidas de manejo ambiental.
- ✓ Evitar especulaciones y desinformación de la comunidad frente al proyecto y sus impactos a nivel socioeconómico y ambiental.


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

1 PRELIMINARES DE OBRA

1.1 DIAGNOSTICO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO

El área de estudio corresponde al asentamiento humano denominado Ciudadela La Bendición y la zona suroccidental, la cual se encuentra ubicada al sur del casco urbano del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a 3.8 km de distancia, partiendo de la Diagonal 47, sobre la vía que conduce al Centro Poblado de Santa Fe de Morichal, limita al Norte con la Comuna VI y Oriente con el Caño Usivar, tiene una extensión de 745.794,30 m².

Ilustración 1 Localización del proyecto

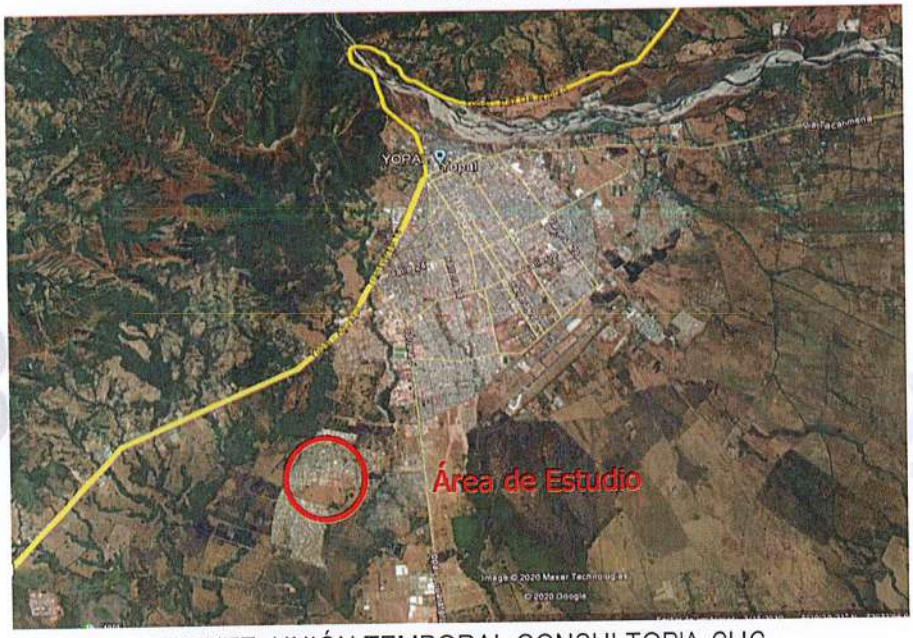

FUENTE: UNIÓN TEMPORAL CONSULTORIA GHC.

Para la realización del diagnóstico de la zona de influencia directa del proyecto se inició con una inspección ocular en el sector de ciudadela la bendición en donde se identificó que no existen industrias o fábricas de ninguna clase, en consecuencia, no hay generación de aguas residuales industriales.

Se observó y cuantificó que el sector comercial de la Ciudadela La Bendición lo conforman establecimientos de comercio tales como: supermercados, tiendas, expendio de carnes, restaurantes, peluquerías, bares, talleres y panaderías; donde el establecimiento que más prevalece su economía son las tiendas, ya que ocupa el 32.53% de la totalidad de la zona comercial.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

En total se cuantificaron ochenta y tres (83) establecimientos comerciales, A continuación, se ilustra en la Tabla *1.* Inventario de establecimientos, el conteo de establecimientos comerciales realizados en la Ciudadela La Bendición.

Tabla 1. Inventario de establecimientos

ESTABLECIMIENTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
Tiendas	27	32,53%
Supermercados	15	18,07%
Talleres	11	13,25%
Expendio de carnes	10	12,05%
Restaurantes	6	7,23%
Bares	6	7,23%
Panaderías	5	6,02%
Peluquerías	3	3,61%
TOTAL	**83**	**100,00%**

FUENTE: UNIÓN TEMPORAL CONSULTORIA GHC.

Además, en el diagnóstico de la zona de influencia directa del proyecto se identificaron áreas públicas existentes tales como parques, vías, andenes, antejardines senderos peatonales, mobiliario urbano (bancas, señalización luminarias) y se determinó el estado actual zonas recreativas o zonas verdes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO- INSPECCIÓN DE DIAGNOSTICO EN LA ZONA DIRECTA DEL PROYECTO



Identificación de vías en la zona directa del proyecto



Identificación de senderos en la zona directa del proyecto

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

REGISTRO FOTOGRÁFICO- INSPECCIÓN DE DIAGNOSTICO EN LA ZONA DIRECTA DEL PROYECTO



Identificación de vías en la zona directa del proyecto




Identificación de andenes en la zona directa del proyecto




Identificación de mobiliario urbano en la zona directa del proyecto



Identificación de establecimientos comerciales en la zona directa del proyecto

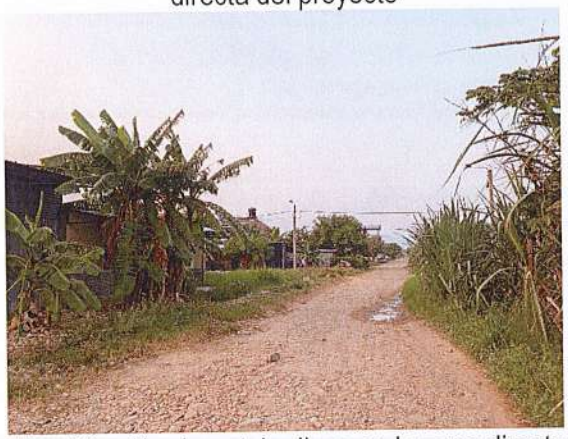

Identificación de antejardines en la zona directa del proyecto

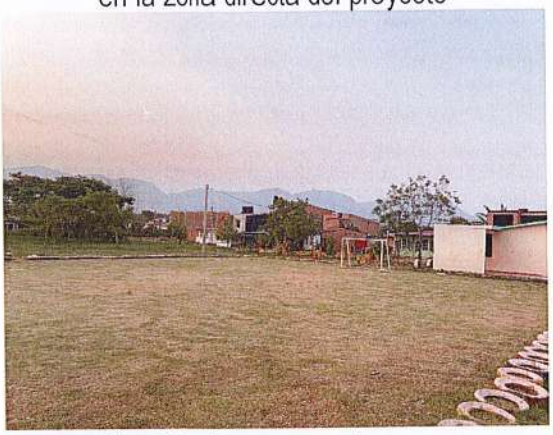

Identificación de zonas verdes y parques recreativos en la zona directa del proyecto

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Cabe resaltar que los trabajos de obra contemplan la intervención de calzadas, igualmente se pueden presentar alteraciones en la prestación de los servicios públicos, el acceso a las viviendas, garajes, además se pueden presentar riesgos de accidentes, razón por la que se hace necesario formular acciones que permitan mitigar los impactos de carácter negativo, a fin de evitar en la etapa constructiva del proyecto genere molestias en la comunidad.

1.2 DIAGNOSTICO SOCIOCULTURAL

1.2.1 ACTORES INVOLUCRADOS

Veeduría ciudadana: Mediante correo electrónico emitido el lunes 15 de enero de 2024 la veeduría ciudadana La Bendición envió carta de presentación al consorcio, realizando la presentación de su objeto el cual corresponde a "CONTROL SOCIAL A LOS PROCEDIMIENTOS, ACTUACIONES Y ADMINISTRACIONES DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE YOPAL, LA GOBERNACION DE CASANARE, LA SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES (SAE) Y LOS DEMAS ENTES GUBERNAMENTALES EN LO RELACIONADO CON LA ESCRITURACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, AL PROCESO DE CIUDADELA LA BENDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE". De acuerdo a la Resolución No. 067 de 2020 emitida por la personería de Yopal. Manifestaron en la carta de presentación el deber que los asiste a realizar control social a la ejecución e inversión de los recursos públicos en beneficio de la comunidad de la Ciudadela La Bendición.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN

2.1 SOCIALIZACIÓN INICIAL DEL PROYECTO

FECHA DE LA SOCIALIZACIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2024

LUGAR: CIUDADELA LA BENDICIÓN

HORA: 6:30 PM A 9:00 PM

ASISTENTES MESA PROTOCOLARIA:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
Julio Cesar Cuevas Jiménez	Subgerente Técnico y Operativo	ACUATODOS S.A. E.S. P
Leonardo Cárdenas Niño	Director del proyecto	Obra- Consorcio Bendición 23
Fabian Leonardo Carreño	Profesional de apoyo	Obra- Consorcio Bendición 23
Gabriel Andrés Durán Moreno	Coordinador de interventoría	Interventoría Consorcio PR-HK
Boris Andrés Roa Pineda	Director de interventoría	Interventoría Consorcio PR-HK
Roberto Ríos Figueroa	Apoyo a la supervisión	ACUATODOS S.A E.S. P
Ociel Ortiz Zuluaga	Concejal-representante de la comunidad	Concejo Municipal de Yopal
Pedro Felipe Becerra Vargas	Concejal	Concejo Municipal de Yopal
Elmer Dumar Montaña Torres	Concejal	Concejo Municipal de Yopal
Wilder Andrés Ávila	Diputado	Asamblea Departamental de Casanare

OBJETIVOS DE LA SOCIALIZACIÓN: Realizar la socialización del proyecto que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo y presentación de los asistentes de la mesa protocolaria.
2. Himnos de Colombia, Casanare y Yopal.
3. Palabras de bienvenida, descripción general del proyecto por parte del subgerente Técnico y Operativo de ACUATODOS S.A. E.S.P, Julio Cesar Cuevas Jiménez
4. Presentación del proyecto, fases, alcance total del mismo y aspectos a tener en cuenta para la vinculación de la mano de obra local por parte del Contratista, representado por el arquitecto Leonardo Cárdenas Niño.
5. Intervención por parte del coordinador de interventoría, el ingeniero Gabriel Andrés Durán Moreno.
6. Intervención por parte del concejal y representante de la comunidad de la Bendición Ociel Ortiz Zuluaga.
7. Intervención por parte del concejal Pedro Felipe Becerra Vargas, Elmer Dumar Montaña Torres y el diputado Wilder Andrés Ávila.
8. Intervención por parte de veeduría, ediles, presidentes de juntas de acción comunal, lideres sociales y representantes de la comunidad de La ciudadela La Bendición, Alameda Martha Mojica y San Rafael de Morichal.
9. Despedida.

DESARROLLO DE LA SOCIALIZACIÓN

Se da inicio a la socialización siendo las 6:30 pm con la presentación de todos los asistentes en la mesa protocolaria mismos que se relacionan en el cuadro de asistentes.

El ingeniero Julio Cesar Cuevas Jiménez subgerente técnico y operativo de la empresa contratante ACUATODOS S.A. E.S.P manifiesta a la comunidad y los asistentes a la socialización el valor total de los recursos invertidos que corresponden al contrato de obra pública, al contrato de consultoría para la interventoría y al contrato de apoyo a la supervisión, manifiesta que ACUATODOS S.A E.S.P empresa contratante será exigente para que así se garantice que las obras se cumplan en su totalidad y se cumplan la normatividad y los aspectos técnicos propuestos.

Realiza su intervención el contratista de obra, representado por el arquitecto Leonardo Cárdenas Niño en calidad de director del proyecto, inicia describiendo la información general del proyecto correspondiente al objeto del contrato, valor total del proyecto y de sus contratos derivados, plazos de ejecución y fuente de financiación, realizó la descripción de los capítulos principales y el alcance de la obra, constituidas en la construcción de la EBAR, construcción de pozos y cámaras de inspección, instalación de tubería sanitaria y la instalación de la tubería de impulsión, indicó los aspectos a tener en cuenta en las situaciones asociadas a la ejecución del contrato como la vinculación de la mano de

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

obra local, dio a conocer los canales oficiales para la atención al público en general y finalmente dio a conocer el diseño de la valla informativa del proyecto, además de realizar una explicación de las fases de intervención del proyecto que se tienen proyectadas.

A continuación, se relacionan algunos de los aspectos más relevantes de la presentación del contratista:

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

PROYECTO BPIN	2023005850036
NOMBRE:	"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
APROBACION:	DECRETO DEPARTAMENTAL 0358 DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR:	$ 88.842.008.646,00
FUENTES DE FINANCIACION:	$ 88.842.008.646,00 (100%) – REGALIAS ASIGNACIONES DIRECTAS GOBERNACION
ENTIDAD EJECUTORA:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."
PLAZO DE EJECUCION	26 MESES

CONTRATOS DEL PROYECTO

OBRA	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 041 DE 2023
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
CONTRATISTA:	CONSORCIO BENDICIÓN 23
VALOR:	$ 83.611.009.207,00
PLAZO DE EJECUCION:	24 MESES
FECHA DE INICIO:	13 DE FEBRERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	12 DE FEBRERO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CONTRATOS DEL PROYECTO

INTERVENTORÍA	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 042 DE 2023
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
CONTRATISTA:	CONSORCIO PR-HK
VALOR:	$ 5.097.882.690,00
PLAZO DE EJECUCION:	25 MESES
FECHA DE INICIO:	18 DE ENERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	17 DE FEBRERO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

CONTRATOS DEL PROYECTO

SUPERVISIÓN	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 040 DE 2023
OBJETO:	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN A LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE"
CONTRATISTA:	ROBERTO ANDRÉS RIOS FIGUEROA
VALOR:	$ 130.690.560,00
PLAZO DE EJECUCION:	26 MESES
FECHA DE INICIO:	11 DE ENERO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN:	10 DE MARZO DE 2026
ENTIDAD CONTRATANTE:	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P."

DESCRIPCIÓN DE CAPITULOS PRINCIPALES

ITEM	DESCRIPCIÓN
CAP-1	SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO REDES INTERNAS
CAP-2	EMISARIOS ENTREGA EBAR
CAP-3	CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (EBAR)

UBICACIÓN DEL PROYECTO



Ejemplos de trabajos a realizar:



Atención a la comunidad

CONTRATISTA DE OBRA

Consorcio BENDICIÓN 23
Director de proyecto: Leonardo Ariel Cárdenas Niño
Contacto: 3248217830
Atención al público: Vía San Rafael de Morichal con calle 79
Correo: consorciobendicion23@theos.com.co

INTERVENTORÍA

Consorcio PR-HK
Coordinador de interventoría: Gabriel Andrés Duran Moreno
Contacto: 3219726100
Atención al público: Carrera 7 Oeste con Calle 67 Ciudadela la Bendición
Correo: consorcioprhk@proycon.com.co

ENTIDAD CONTRATANTE

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE
ACUATODOS S.A. E.S.P.
Profesional apoyo a la supervisión: Roberto Andrés Ríos
Correo: contactenos@espacuatodos.gov.co

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

El coordinador de interventoría realiza su intervención, socializa a los asistentes los canales de comunicación y manifiesta que estará en disposición de atender cualquier asunto relacionado con el control y seguimiento de la ejecución del contrato de obra.

El concejal Ociel Ortiz realiza su intervención, manifiesta a la comunidad la importancia y magnitud del proyecto, manifiesta servir a la comunidad como veedor del cumplimiento del contrato estipulado, así como de velar por el cumplimiento de la vinculación de la mano de obra local, del mismo modo los demás concejales y el honorable Diputado manifestaron el compromiso de velar por el desarrollo oportuno y legal de este proyecto.

La comunidad representada por los respectivos ediles, presidentes de juntas, veeduría entre otros manifestaron la importancia de la vinculación de la mano de obra local e indicaron que estarán atentos al cumplimiento general del contrato en todas sus fases.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Ilustración 2 Socialización del proyecto



Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

2.2 ACONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL

El día 20 de febrero de 2024 luego de la socialización inicial del proyecto se programó una reunión con la comunidad de ciudadela La Bendición y beneficiarios del proyecto Alameda Martha Mojica en donde se les informó el proceso de vinculación de mano de obra local calificada y no calificada, se les menciono que para mayor organización en el proceso de recepción de hojas de vida se debe hacer la entrega en el punto de atención a la comunidad, ubicado en el campamento de obra, además se le menciono a la comunidad de AMM que si es posible eligieran a una persona como vocero(a) de los beneficiaros de este sector para mantener información constante con la persona designada y fuera está la encargada de transmitir la información a los demás en aras de brindar organización y claridad en el proceso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO REUNIÓN CON LA COMUNIDAD SOBRE CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL









Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare









2.3 INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA

El día 28 de febrero de 2024 se realizó la instalación de la valla informativa del proyecto en la vía que conduce a San Rafael de Morichal entrada principal de Alameda Martha Mojica con las especificaciones técnicas y diseño suministrado por ACUATODOS S.A E.S.P.


Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare



FUENTE: AUTOR, 2024

2.4 PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

La oficina destinada para la atención a la comunidad se encuentra ubicada en la vía San Rafael de Morichal con calle 79 en la cual el profesional del área social atenderá, recibirá y tramitará todos los PQRS que sean radicados con ocasión de la ejecución del proyecto.

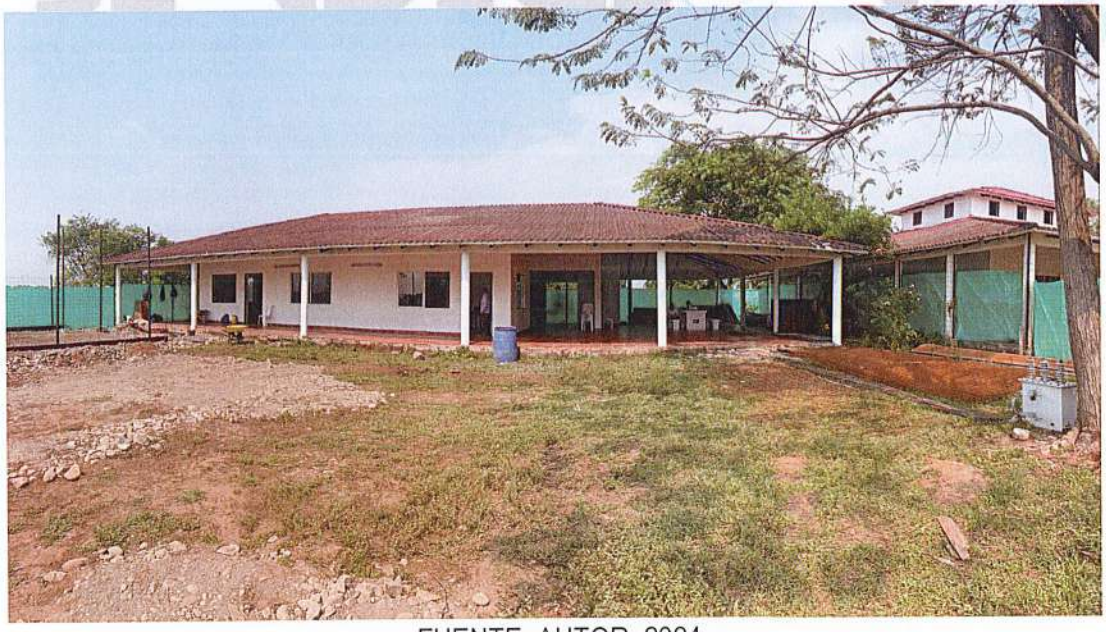


FUENTE: AUTOR, 2024

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

2.5 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Con la finalidad de tramitar y gestionar las solicitudes de información, quejas y reclamos presentados por la comunidad o las autoridades competentes relacionadas con la actividad del proyecto, se realiza la instalación de un buzón de sugerencias el cual está dotado de un formato de sugerencias, quejas, reclamos y solicitudes que podrá diligenciar cualquier persona natural o jurídica con el fin de exponer sus opiniones, inquietudes o solicitudes con respecto al desarrollo de la obra

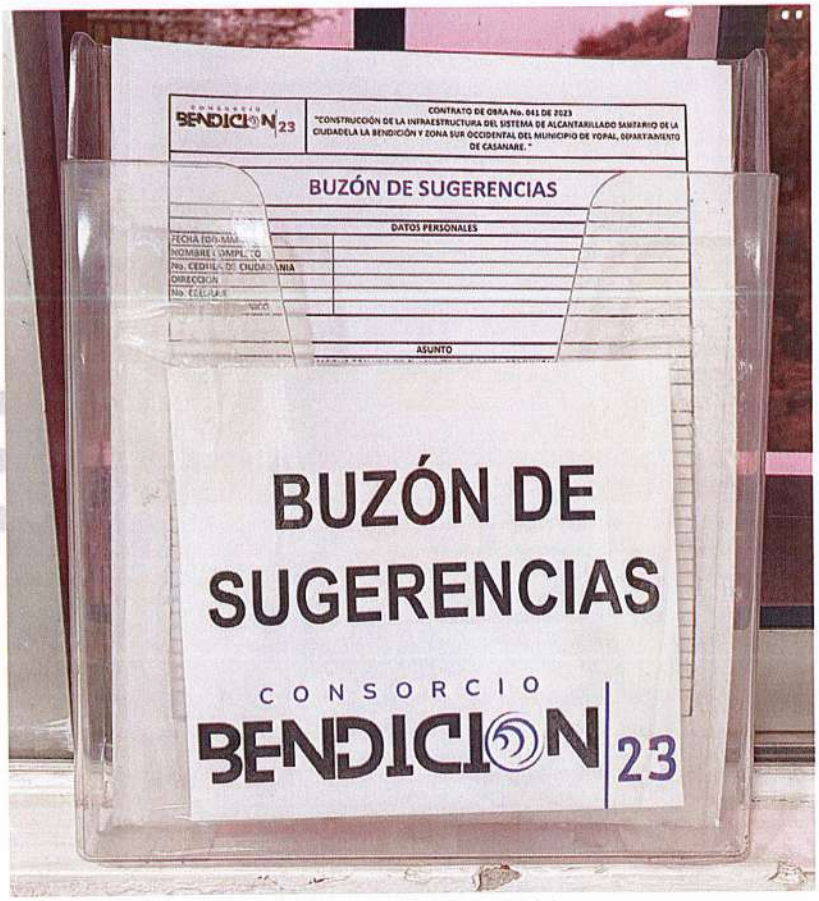

FUENTE: AUTOR, 2024

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

2.5.1 QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD

QUEJAS GENERADAS POR LA COMUNIDAD	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA	OBSERVACIONES
RECIBIDAS	-	-	-	
ENVIADAS	-	-	-	
SEGUIMIENTO	-	-	-	

2.5.2 RELACIÓN DE QUEJAS RECIBIDAS POR LA COMUNIDAD Y TRAMITE

FECHA DE RECIBIDO	QUIEN ENVÍA	ASUNTO	SE LE DIO TRAMITE (SI, NO)	¿CUAL?
-	-	-	-	-

2.6 DIALOGOS CON LA COMUNIDAD

El proyecto estaba progresando sin inconvenientes hasta el miércoles 13 de marzo de 2024, cuando, lamentablemente, se presentó un incidente. Un grupo de personas ingresó sin autorización al área designada para las excavaciones de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) aproximadamente a las 8:00 a.m. Este evento inesperado provocó una interrupción en el flujo normal de las operaciones y las actividades de construcción se vieron afectadas temporalmente.

La oposición de este grupo de personas al proyecto llevó al CONSORCIO BENDICION 23 a tomar medidas preventivas para salvaguardar sus recursos. En respuesta a la invasión del sitio de construcción, el consorcio actuó con prontitud y retiró la maquinaria que estaba en uso para evitar daños o complicaciones adicionales. Esta acción refleja un compromiso con la seguridad y la gestión de riesgos, así como con la resolución de conflictos de manera pacífica y eficiente. Pasados los días, con diálogos entre la comunidad y las entidades gubernamentales se llegó a un común acuerdo que permitió la reanudación de las actividades el día 20 de marzo de 2024.

Dirección: Condominio Casa Vieja Mz A Casa 4
Teléfono: 633 4412 / E-mail: consorciobendicion23@theos.com.co
Yopal - Casanare

Ilustración 3. Interrupción de actividades por parte de la comunidad y reunión





2.7 SOCIALIZACIÓN INICIO DE ACTAS DE VECINDAD

El día 26 de marzo de 2024 se realizó una socialización con la comunidad para informar el inicio del llenado de los formatos de actas de vecindad con el fin de verificar el estado actual de las viviendas antes de iniciar actividades de obra, con esto, se pretende establecer posibles responsabilidades por afectaciones a las viviendas después de la intervención de cada tramo.

Ilustración 4. Socialización inicio de actas de vecindad





Firma:

Yolima Hurtado

PROFESIONAL ÁREA SOCIAL
YOLIMA HURTADO PINEDA
C.C. 46.364.728 DE SOGAMOSO

532

8 ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Hasta el momento, correspondiente a la fecha límite para la presentación de este informe, no se ha llevado a cabo ninguna intervención en las vías urbanas. Por consiguiente, no se ha requerido implementar el plan de manejo de tránsito diseñado para dichas circunstancias. Este plan, que se encuentra preparado para ser activado en caso de necesidad, tiene como objetivo principal garantizar la fluidez y la seguridad vial durante las intervenciones en la infraestructura urbana, minimizando así el impacto en el tráfico y en la vida cotidiana de los ciudadanos.

El plan de manejo de tránsito (PMT) del proyecto se dedicó y aprobó según resolución No. 01504 DEL 26 DE ENERO DE 2024 "Por la cual se concede permiso para cierre total y parcial de vías urbanas del municipio de Yopal para la realización de la "CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCODENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

CONSORCIO BENDICIÓN 23

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- En el informe mensual No.2, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

  - **Red de media tensión:** Hincado de postes en ferroconcreto e instalación de red de media tensión para suministrar energía eléctrica a la zona de la EBAR.

  - **Campamento de obra:** Se adelantan labores de adecuación de todos los espacios del campamento de obra con el fin de garantizar un correcto almacenamiento de la materia prima necesaria para la ejecución del proyecto.

  - **Estación de bombeo de aguas residuales (EBAR):** Se adelantan labores de excavación para la cimentación de la estación de bombeo (EBAR EL YOPO), a su vez, se realizó el cerramiento perimetral de la misma con el fin de garantizar la seguridad de la excavación y las actividades futuras.

- Durante el período hasta la fecha del informe mensual No.2, se ha logrado un avance del 0.19%, en comparación con el porcentaje programado del 0.06%. Eso muestra un porcentaje de avance del 0.12% con respecto al contractual. Es importante señalar que, según el cuadro de avance de obra, han transcurrido 48 días, lo que corresponde al 6.57% del tiempo desde la fecha de inicio del contrato.

- Hasta la fecha del presente informe, no se han registrado actividades específicas relacionadas con el plan de manejo de tránsito, no obstante, se definió el plan de manejo de tránsito del proyecto y se tramitó la resolución de permiso para cierres totales y parciales de vías ante la secretaría de movilidad.

- En cuanto al plan de manejo integral de salud ocupacional, ambiental y seguridad industrial, a la fecha se cuenta con personal de mano de obra calificada y no calificada, al personal contratado se le han realizado las respectivas afiliaciones a ARL y EPS, se les realizó su respectivo pago de seguridad social, se les realizo entrega de dotación y EPP's y se realizaron charlas preoperacionales periódicas.

Firma:

DIRECTOR DE OBRA
DANIEL ALEXANDER GIL
C.C. 1.118.548.824 DE YOPAL

Firma:

RESIDENTE DE OBRA
LUIS EDUARDO REAL HOYOS
C.C. 79.483.830 DE BOGOTA
