EL SUSCRITO COORDINADOR DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR

CERTIFICA:

Que en mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR-1220822 del 13 de Diciembre de 2019 y en cumplimiento de las funciones asignadas, me permito manifestar que se verificó el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual y las obligaciones del contratista.

Se expide la presente en la ciudad de Valledupar, Cesar, a los Veinte (20) días del mes de Enero de 2020.

EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES
Supervisor del Contrato

118

EL SUSCRITO COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 1220822 DE 2019

CERTIFICA:

N° Contrato	CO1.PCCNTR. 1220822 del 13 de diciembre de 2019
Contratista	OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
Objeto	"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL DE VALLEDUPAR, ALGUNAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL ANTIGUO EDIFICIO TELECOM SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR, EN LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE CALIDAD Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD Y BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.
Plazo Inicial	Diecisiete (17) días comprendidos entre el (13 al 30 de diciembre de 2019).
Valor Inicial	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($54.261.935) Incluido IVA y demás contribuciones.
N° de Factura	Factura de venta No 206, del 31 de diciembre de 2019
Valor Final Ejecutado	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($54.261.935) Incluido IVA y demás contribuciones.

Que en mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR. 1220822 del 13 de diciembre de 2019 y en cumplimiento de las funciones asignadas, me permito manifestar que se verificó el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual y las obligaciones del contratista; así como el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Se expide la presente en la ciudad de Valledupar – Cesar, el veinte (20) de enero de 2020.

EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES
Coordinador Administrativo y Financiero
Supervisor

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Infraestructura Fisica	

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No: 1 PERIODO: Del 13 de diciembre al 30 de diciembre

OBJETO

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR, ALGUNAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL ANTIGUO EDIFICIO TELECOM SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR Y LOS JUZGADOS LABORALES DE VALLEDUPAR, EN LAS CONDICONES TECNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD Y BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		0,00%	CONTRATO DE OBRA		
INTERVENTOR:	0		CONTRATISTA:	OSCAR GUERRA OÑATE	
CONTRATO No.:	0		CONTRATO No:	CO1PCCNTR.1220822	
VALOR INICIAL:		$0,00	VALOR INICIAL:	$	54.261.935,00
VALOR ADICIÓN 1:		$0,00	VALOR ADICIÓN 1		$0,00
VALOR ADICIÓN 2:		$0,00	VALOR ADICIÓN 2		$0,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ -		VALOR ACTUALIZADO:	$	54.261.935,00
PLAZO INICIAL:			PLAZO INICIAL:	DIECISITE (17) DIAS	
PLAZO ACTUALIZADO:	0		PLAZO ACTUALIZADO:	DIECISITE (17) DIAS	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	0		FECHA DE SUSPENSIÓN:	0	
FECHA DE REINICIACIÓN:	0		FECHA DE REINICIACIÓN:	0	
FECHA DE INICIACIÓN:	0		FECHA DE INICIACIÓN:	13/12/2019	
FECHA DE TERMINACIÓN:	0/01/1900		FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2019	
VALOR EJECUTADO:	$ -	#¡DIV/0!	VALOR EJECUTADO:	$ 54.261.935,00	100,00%
VALOR POR EJECUTAR:	$ -	#¡DIV/0!	VALOR POR EJECUTAR:	$ -	0,00%

3. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

3.1 ESTADO DE LICENCIAS, PERMISOS Y /O SERVICIOS PÚBLICOS

LICENCIAS, PERMISOS Y/O SERVICIOS	DESCRIPCIÓN DEL ESTADO	FECHA DE APROBACIÓN Y/O CONEXIÓN
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

3.2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN


AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO HASTA LA FECHA	% EJECUTADO DEL CONTRATO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	100,00%	100,00%	0,00%
Acumulado Actual	100,00%	100,00%	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

Total Contractual	Transcurrido	Faltante	Atraso o adelanto en tiempo
17	17	0	0

GRAFICA DE AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

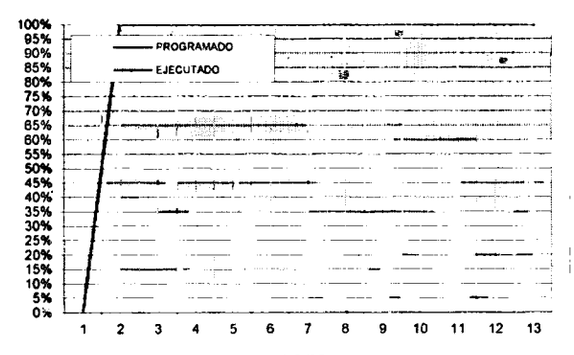

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Suministro e instalacion de sanitario, suministro e instalacion de cielo razo en icopor, desmonte de puertas en madera seccion 1x2.3m, puerta en madera y vidrio 5mm, mantenimiento de puerta existente en madera y vidrio, mantenimiento de ventana existente en madera y vidrio, cerradura en puerta de aluminio, suministro e instalacion de cerradura similar existente despacho judicial quinto piso, suministro e inst de cubierta en teja tipo colonial, pintura exterior tipo coraza o similar, resane de muros, mantenimeinto sensores en batena sanitaria, extractor para eliminar olores en area sanitaria, mantenimiento de columnas circulares en la laca, limpieza y retiro de escombros. (ver anexo:Acta de recibo final de obra).

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Infraestructura Fisica	

1. INFORMACIÓN GENERAL

INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: **Del 13 de diciembre al 30 de diciembre**

OBJETO


CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR, ALGUNAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL ANTIGUO EDIFICIO TELECOM SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR Y LOS JUZGADOS LABORALES DE VALLEDUPAR, EN LAS CONDICONES TECNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD Y BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.

4.CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO (Cumplimiento de flujo de inversión vs cortes de recibo parcial de obra)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (COSTO DIRECTO + AIU + IVA)

MES	ACUMULADO PROGRAMADO FLUJO DE INVERSIÓN ($)	ACUMULADO EJECUTADO RECIBO PARCIAL OBRA ($)	INDICADOR (%) EJECUCION
1	$ 54.261.935	$ 54.261.935	100,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -		0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
	$ -	$ -	0,00%
VALOR TOTAL	$ 54.261.935	$ 54.261.935	100,00%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

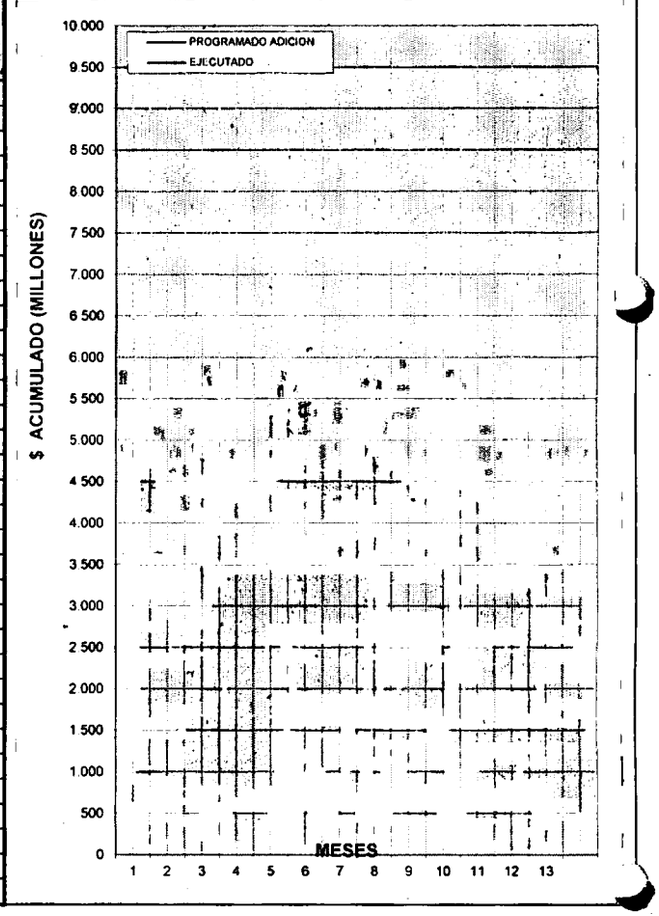

5. CONTROL LEGAL DEL CONTRATO

ASPECTOS	SI	NO	OBSERVACIONES
VIGENTES LAS PÓLIZAS	X		
TIENE RECLAMACIONES		X	
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES	X		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

N/A

Interventoria N/A

Obra

Informe Ejecutivo Mensual	Consejo Superior de la Judicatura Direccion Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Infraestructura Física	

1. INFORMACION GENERAL

INFORME MENSUAL No. 1 PERIODO: **Del 13 de diciembre al 30 de diciembre**

OBJETO

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR, ALGUNAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL ANTIGUO EDIFICIO TELECOM SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE VALLEDUPAR Y LOS JUZGADOS LABORALES DE VALLEDUPAR, EN LAS CONDICONES TECNICAS, DE CALIDAD Y CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD Y BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA MATERIA.

REGISTRO FOTOGRAFICO: Ver anexo Informe de Obra Folio ( )

EDWIN ANTONIO FIGUEROA COLMENARES
Supervisor del Contrato
