COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	*PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA*	CORPORACIÓN NASA KIWE	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 03 FECHA ACTUALIZACION 07 DE FEBRERO DE 2023
	FORMATO PARA CARATULA BITACORA DE OBRA		

BITACORA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO	197-2023	
OBJETO CONTRACTUAL	REALIZAR A TODO COSTO EL CERRAMIENTO DE INMUEBLES EN RIESGO VINCULADOS AL PROCESO DE REUBICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA VIGENCIA 2023	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO PRORROGA		
	NOMBRE	**FIRMA**
CONTRATANTE	CORPORACION NASA KIWE	
CONTRATISTA	LEGOCONSTRUCCIONES SAS	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING DORA ISABEL AGUILAR	
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERVISION	ING MARIA DEL MAR CERON	
NOMBRE DEL INTERVENTOR (SI APLICA)		
NOMBRE DEL RESIDENTE O SUPERVISOR DE OBRA DEL CONTRATISTA (SI APLICA)		
NOMBRE AUXILIAR DE RESIDENTE O DE SUPERVISOR DE OBRA DEL CONTRATISTA (SI APLICA)		
NOMBRE DEL INSPECTOR DE OBRA		
NOMBRE MAESTRO DE OBRA	EDGAR AUGUSTO SARRIA	Edgar A Sarria

Cerramientos → Municipio de Belalcazar

9
11-23 - Visitas a entregas de sitio a intervenir
- se realizo el recorrido de verificacion en el Municipio de Belalcazar.

Semana 1 (10 de Noviembre al 11 de Noviembre)

-Se realiza replanteo de los lotes de Luz casamachin – Giovani Tejada y Jose casamachin, verificacion de medidas y excavaciones.


semana 2 (13 Noviembre al 18 de Noviembre)

-continua con las excavaciones de los lotes, se recibe material para realizar el cerramiento con sus rellenos, y se inicia con replanteo y localizacion de luis Pantoja, cecilio pique y Santiago pantoja,
-se realiza excavaciones y se llega material para cerramiento al sitio.
- se termina el cerramiento de los lotes mencionados con las indicaciones dadas

Libro Medio Oficio 80 H.

Marden

dentro de lo contratado

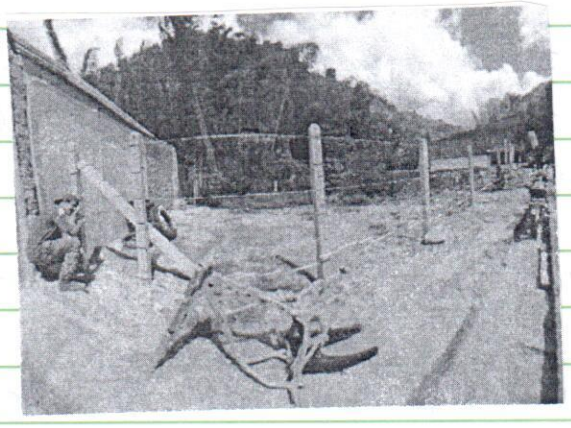



Semana 3 (20 noviembre - al 25 noviembre)

- se lleva material a los lotes de ceneida, Hercilia valencia y Gilberto Para continuar con localizacion y

Marden

replanteo,
se continua con los rellenos y puesto en sitio de los postes, terminando con el cerramiento de estos lotes.
- se inicia excavaciones donde Juan Goicoechea y ana lemos,
- se realiza cada 2,5 metros la instalacion de los postes con alambre de puas de 4 lineas.

semana 4 (27- noviembre al 2 de diciembre)


- Terminacion de cerramiento de los lotes de la semana anterior.
- se inicia excavaciones donde Adan collo, Yudier udasco - Roman Balcoe y marisol Vanegas.

Se realizo recorrido el dia 28 nov por los distintos lotes, Verificando q' esten cumpliendo con las especificaciones técnicas, medidas entre cada poste de 2,50 mts con 4 hilos de alambre de púas; Se corrigen amarres y se recuerda: mantener los EPP.

Libro Medio Oficio 80 H.
Marden

- se corrigen las observaciones dadas en visita por los ingenieros. y se terminan los cerramientos



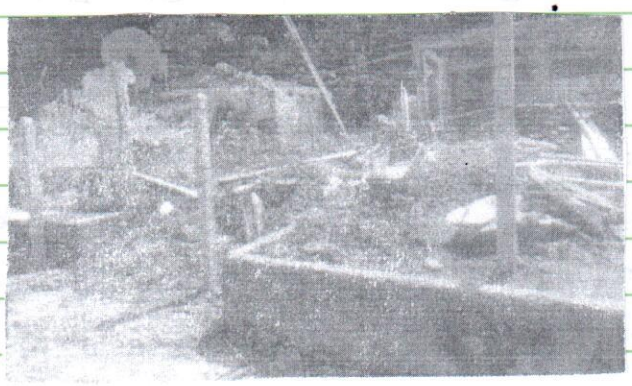

semana 5 (4 diciembre al 9 de diciembre)

- se terminan cerramientos pendientes con observaciones, y se inicia con excavaciones rellenos y replanteo de lotes sin comenzar con los cerramientos.

se lleva el material para culminacion donde Hernando solazar, carmen Rocha Bernarda Vargas.


- se terminan los cerramientos con todos los instalaciones y recomendaciones dadas


semana 6 (11 de diciembre al 14 de diciembre)

- se terminan los cerramientos con los 4 lineas de alambre y se deja amarrado con alambre galvanizado,
- se termina el cerramiento donde el señor Jose armando garcia, dando asi el cerramiento a todos los lotes entregados.

Se realiza el recorrido el dia 14 de Diciembre para Verificar la ejecución del Contrato q' involucra realizar el cerramiento de los Lotes en el municipio de Bolivar (cabecera), Se toma medidas de los respectivos Cerramientos en postes de Concreto con especificaciones técnicas.

Marden

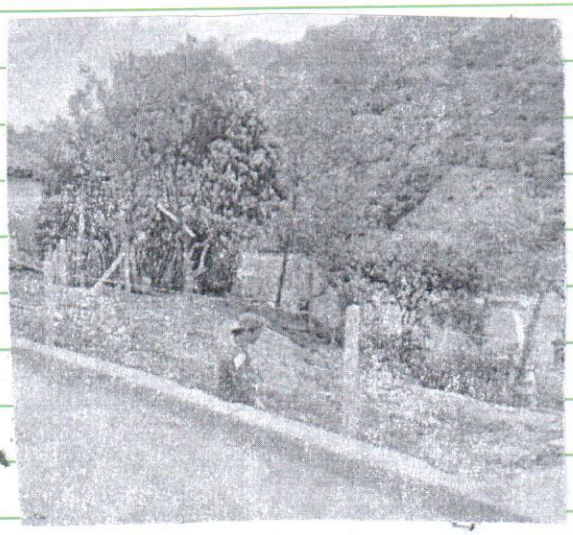

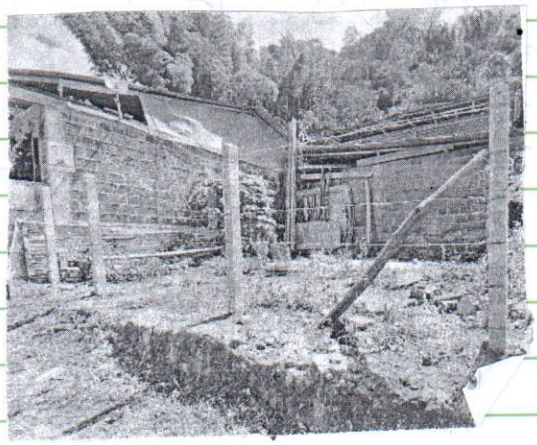

con el recorrido de los ingenieros por todos los lotes de cerramiento se termina el dic 14 de diciembre, dejando los postes con 4 lineas de alambre de pacas y amarre con alambre galvanizado.

Marden
