DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	ALVAREZ OSCAR ORLANDO
UBICACIÓN:			
Municipio	PORE	Cedula	74.862.382
Direccion	CARRERA 7A N. 8-52 MZ L LOTE 24	Telefono	
		Conyuge o Hijo (a)	
Barrio	CIUDADELA SAN JOSE		
		Cedula o TI	

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0224 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	150.38.02-002 del 27-06-2023	Expedida por:	Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Pore

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001935 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	26 de Mayo de 2024
Valor ejecutado:	$ 98.267.350,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	
OBSERVACIONES	
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024	

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	CELIS CESAR ORLANDO
UBICACIÓN:			
Municipio	PORE	Cedula	4.235.867
Direccion	CARRERA 13A N. 11-51 MZ A LOTE 5	Telefono	
		Conyuge o Hijo (a)	
Barrio	URBANIZACION VILLA DAVID		
		Cedula o TI	

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0224 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	150.38.02-003 del 27-06-2023	Expedida por:	Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Pore


DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001938 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	26 de Mayo de 2024
Valor ejecutado:	$ 98.267.350,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA







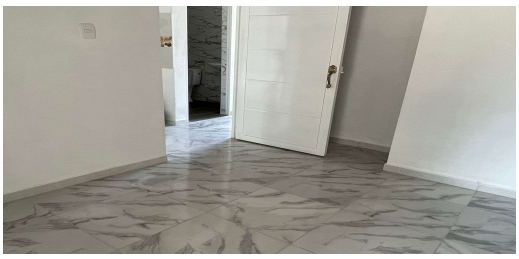

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA
 
OBSERVACIONES
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024


DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	CORREDOR OROS KAROLL YURITHZA
UBICACIÓN:			
Municipio	PORE	Cedula	1.116.042.807
Direccion	CARRERA 13 N. 11-27 MZ B LOTE 8	Telefono	
		Conyuge o Hijo (a)	CORREDOR OROS ADRIAN LEONARDO
Barrio	URBANIZACION VILLA DAVID	Cedula o TI	1.116.044.065

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0224 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	150.38.02-005 del 27-06-2023	Expedida por:	Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Pore

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001940 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	26 de Mayo de 2024
Valor ejecutado:	$ 98.267.350,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA



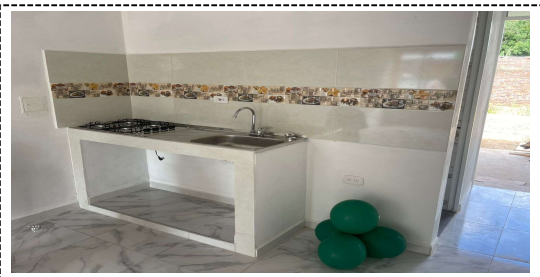





DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA
 
OBSERVACIONES
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	CRUZ MECHE JACINTO
UBICACIÓN:			
Municipio	PORE	Cedula	4.214.117
Direccion	CARRERA 13A N. 10-34 MZ B LOTE 27	Telefono	
		Conyuge o Hijo (a)	
Barrio	URBANIZACION MANZANA 83		
		Cedula o TI	

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0224 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	150.38.02-006 del 27-06-2023	Expedida por:	Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Pore

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001941 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	26 de Mayo de 2024
Valor ejecutado:	$ 98.267.350,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	FIGUEREDO GUANAY NELFA YEDITH
UBICACIÓN:			
Municipio	PORE	Cedula	1.118.560.397
Direccion	CARRERA 12A N. 11-52 MZ D LOTE 18	Telefono	
		Conyuge o Hijo (a)	RIAÑO FIGUEREDO LARRY GAEL
Barrio	URBANIZACION VILLA DAVID	Cedula o TI	1.116.043.347

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0224 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	150.38.02-007 del 27-06-2023	Expedida por:	Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Pore

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001943 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	26 de Mayo de 2024
Valor ejecutado:	$ 98.267.350,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	
OBSERVACIONES	
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024	

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	FONSECA TORRES FLOR ALBA
UBICACIÓN:			
Municipio	PORE	Cedula	23.937.331
Direccion	CARRERA 12 N. 11-27 MZ D LOTE 8	Telefono	
		Conyuge o Hijo (a)	ROMERO FONSECA LINA MARCELA
Barrio	URBANIZACION VILLA DAVID	Cedula o TI	1.116.040.264

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0224 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	150.38.02-008 del 27-06-2023	Expedida por:	Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Pore

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001946 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	26 de Mayo de 2024
Valor ejecutado:	$ 98.267.350,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA
 
OBSERVACIONES
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	FUENTES PATIÑO PEDRO LUIS
UBICACIÓN:			
Municipio	PORE	Cedula	1.125.548.823
Direccion	CARRERA 12A N. 11-12 MZ D LOTE 13	Telefono	
		Conyuge o Hijo (a)	PINZON TUMAY LUDIZ YURLEIDY
Barrio	URBANIZACION VILLA DAVID	Cedula o TI	1.006.966.362

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0224 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	150.38.02-009 del 27-06-2023	Expedida por:	Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Pore

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001948 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	26 de Mayo de 2024
Valor ejecutado:	$ 98.267.350,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	SIGUA COBA AYDA YAMILE
UBICACIÓN:			
Municipio	PORE	Cedula	23.937.879
Direccion	CARRERA 13 N. 11-35 MZ B LOTE 7	Telefono	
		Conyuge o Hijo (a)	ANZUETA SIGUA LINDA JOHALIS
Barrio	URBANIZACION VILLA DAVID	Cedula o TI	1.222.118.628

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0224 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	150.38.02-012 del 27-06-2023	Expedida por:	Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Pore

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001950 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	26 de Mayo de 2024
Valor ejecutado:	$ 98.267.350,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	
OBSERVACIONES	
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024	

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	SILVA PATIÑO YINA KATERINE
UBICACIÓN:			
Municipio	PORE	Cedula	1.116.042.540
Direccion	CALLE 2 N. 13-73	Telefono	3215687411
		Conyuge o Hijo (a)	CHAPARRO SILVA EVELIN SOFIA
Barrio	PANORAMA	Cedula o TI	122.213.987

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0224 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	150.38.02-013 del 27-06-2023	Expedida por:	Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Pore

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001952 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	26 de Mayo de 2024
Valor ejecutado:	$ 98.267.350,19
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA
 
OBSERVACIONES
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	TARACHE PINTO JOSE FERNANDO
UBICACIÓN:			
Municipio	PORE	Cedula	1.116.041.054
Direccion	CARRERA 7 N. 9-43 MZ F LOTE 114	Telefono	3215687411
		Conyuge o Hijo (a)	PRADA PARRA LAUDY LORENA
Barrio	CIUDADELA SAN JOSE	Cedula o TI	1.118.649.219

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0224 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	150.38.02-014 del 27-06-2023	Expedida por:	Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Pore

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001954 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	26 de Mayo de 2024
Valor ejecutado:	$ 98.267.350,19
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	CHAPARRO TARACHE KAREN LILIANA
UBICACIÓN:			
Municipio	PORE	Cedula	1.118.534.918
Direccion	CALLE 10 N. 14A-11 MZ A LOTE 14	Telefono	
		Conyuge o Hijo (a)	ALBARRACIN CHAPARRO ZEHURY ZHARICK
Barrio	URBANIZACION SAN JORGE	Cedula o TI	1.118.542.235

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0224 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	150.38.02-004 del 27-06-2023	Expedida por:	Oficina Asesora de Planeacion del Municipio de Pore

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001939 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	06 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	26 de Mayo de 2024
Valor ejecutado:	$ 106.353.500,00
% de ejecuccion:	100,00%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024
