DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	HILDA ANDREA RODRIGUEZ
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	33.646.652
Direccion	CARRERA 25 NO. 8-39 MZ E LOTE 11	Telefono	3203392935
		Conyuge o Hijo (a)	JUAN DAVID SILVA RODRIGUEZ
Barrio	URB. ALTOS DE GUARATARO	Cedula o TI	1.116.545.980

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.183 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001938 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 47.969.968,05
% de ejecuccion:	49,71%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES


Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	MARCO ALEJANDRO MARTINEZ CALDERON
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	19.409.646
Direccion	CRA 4 A#9 - 12 MZ C LT 11	Telefono	3214815579
		Conyuge o Hijo (a)	ANDRES ESTEBAN MARTINEZ ROZO
Barrio	CARLOS PIZARRO		
		Cedula o TI	1.116.546.007

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.188 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001929 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 47.969.968,05
% de ejecuccion:	49,71%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA

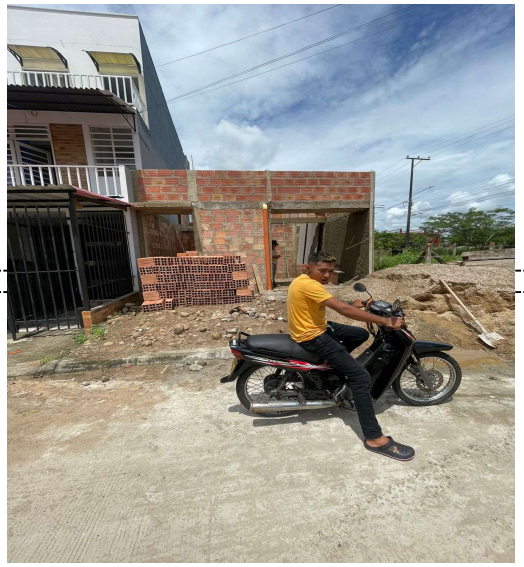



DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	INGRID YUSLEIBY SANABRIA CAMARGO
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.116.551.786
Direccion	CARRERA 1 NO. 23A-53 MZ C LOTE 18	Telefono	3142862875
		Conyuge o Hijo (a)	JHON ARLEY MOSQUERA ROJAS
Barrio	URB. RINCON DEL LLANO	Cedula o TI	1.116.548.266

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.192 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100002037 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA







DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	SOLMA VALLEJO LEGUIZAMON
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.116.543.888
Direccion	CALLE 16 A NO. 1-18 MZ Ñ LOTE 1	Telefono	3104839199
		Conyuge o Hijo (a)	STEFANY VIDES HERNANDEZ
Barrio	URB. SENDEROS DEL ORIENTE	Cedula o TI	1.116.551.673

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.206 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001925 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	GERMAN BARRERA PINTO
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	9.521.545
Direccion	CARRERA 2 NO. 23-79 MZ A LOTE 22	Telefono	3219674657
		Conyuge o Hijo (a)	MERCY ALIDA ARANGUREN CARDOZO
Barrio	URB. RINCON DEL LLANO	Cedula o TI	46.350.315

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.194 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001958 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	FLOR ANGELA ABELLA RONDON
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.116.548.386
Direccion	CARRERA 2 A NO. 24-12 MZ B LOTE 2	Telefono	3213579488
		Conyuge o Hijo (a)	DENNIS ALEJANDRO QUITIAN ABELLA
Barrio	URB RINCON DEL LLANO	Cedula o TI	1.116.547.288

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.200 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001930 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	AURA MARIA ROSAS LIZCANO
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	46.369.244
Direccion	MZ D LOTE D1	Telefono	3168687547
		Conyuge o Hijo (a)	ALISSON SOFIA GUTIERREZ ROSAS
Barrio	URB. RINCON DEL LLANO	Cedula o TI	1.145.424.257

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.204 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001928 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA







DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

La beneficiaria principal fallecio y bajo su nucleo familiar se encuentra una menor de edad, la cual se encuentra tramitando ante el bienestar familiar el tutor asignado; proceso el cual debe surtirse para dar traslado al titular principal del subsidio.

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	SANDRA PATRICIA MONROY MONZO
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.116.545.747
Direccion	CARRERA 1 NO. 23A-25 MZ C LOTE 14	Telefono	3114659781
		Conyuge o Hijo (a)	OMAR ANDRES SALAS LOPEZ
Barrio	URB. RINCON DEL LLANO	Cedula o TI	1.116.546.522

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.189 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001927 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	
OBSERVACIONES	
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024	

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	FLOR DELIA COMAYAN BARRERA
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	33.645.918
Direccion	CARRERA 1 NO. 23A-11 MZ C LOTE 12	Telefono	3208425246
		Conyuge o Hijo (a)	KIMBERLY SOFIA PAEZ COMAYAN
Barrio	URB. RINCON DEL LLANO	Cedula o TI	1.116.549.791

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.198 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001931 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	
OBSERVACIONES	
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024	

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	LEIDY JOHANA PEREZ LEON
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.116.547.549
Direccion	CALLE 17 NO. 1-25 MZ Ñ LOTE 10	Telefono	3017867301
		Conyuge o Hijo (a)	CRISTIAN FELIPE PATIÑO PEREZ
Barrio	URB. SENDEROS DEL ORIENTE	Cedula o TI	1.029.652.697

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.184 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001926 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	
OBSERVACIONES	
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024	

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	JAKLIN MAYGLINE PEÑA GUTIERREZ
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.119.886.842
Direccion	CARRERA 2 NO. 23A-12 MZ C LOTE 12	Telefono	3104848940
		Conyuge o Hijo (a)	CARLOS ANDRES BUITRAGO NIÑO
Barrio	URB. RINCON DEL LLANO	Cedula o TI	74.755.510

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.205 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001934 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	
OBSERVACIONES	
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024	

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	LEIDY JAZMIN REYES PATARROYO
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.116.543.612
Direccion	CALLE 17 NO. 1-60 ESTE	Telefono	3222123909
		Conyuge o Hijo (a)	KEVIN SNEIDER NAVARRO REYES
Barrio	MZ O LOTE 5 URB. SENDEROS DEL ORIENTE	Cedula o TI	1.029.657.166

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.193 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001932 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES


Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	HENRY ESNEIDER MALAVER ROMERO
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.116.542.318
Direccion	CARRERA 1A ESTE NO. 23-75	Telefono	3224118932
		Conyuge o Hijo (a)	LAURA LUCIA MARTINEZ SANCHEZ
Barrio	MZ E LOTE 20 URB. RINCON DEL LLANO	Cedula o TI	1.116.547.615

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.185 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001947 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA

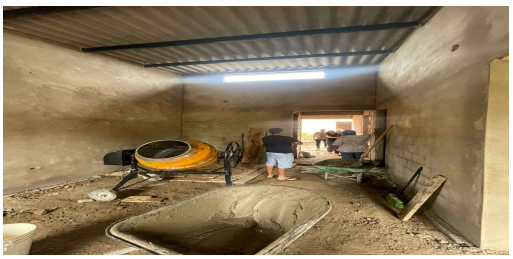







DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	MARIA SORAIDA GIRALDO VELASQUEZ
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	32.118.843
Direccion	CARRERA 2A NO. 23-22	Telefono	3118694172
		Conyuge o Hijo (a)	JOSE MANUEL RIVERA RIVERA
Barrio	MZ A LOTE 1 URB. RINCON DEL LLANO	Cedula o TI	1.116.543.242

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.196 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001936 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	VICENTE PUERTO HERNANDEZ
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	74.750.195
Direccion	CARRERA 1 NO. 24-25	Telefono	3213270943
		Conyuge o Hijo (a)	
Barrio	MZ D LOTE 11 URB. RINCON DEL LLANO		
		Cedula o TI	

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.197 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001951 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	ILIANA STEPHANIE SANCHEZ GRANADOS
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.116.548.309
Direccion	MZ Ñ LOTE 12	Telefono	3228459185
		Conyuge o Hijo (a)	ANNETTE SOPHIA BARRERA SANCHEZ
Barrio	SENDEROS DEL ORIENTE	Cedula o TI	1.116.552.538

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.203 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001937 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA
 
OBSERVACIONES
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	YEISON FABIAN GOMEZ PAEZ
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.116.548.011
Direccion	CARRERA 2 A NO. 23-56	Telefono	3123320451
		Conyuge o Hijo (a)	DIANA MARCELA NAZARIT ACEVEDO
Barrio	MZ A LOTE 6 URB. RINCON DEL LLANO	Cedula o TI	1.116.552.054

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.201 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001953 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	
OBSERVACIONES	
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024	

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	VICTOR ALFONSO ORTEGA FRANKY
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.049.602.215
Direccion	CARRERA 2 A NO. 24-26 MZ B LOTE 4	Telefono	3143589072
		Conyuge o Hijo (a)	PAULA YINETH SANABRIA VEGA
Barrio	URB. RINCON DEL LLANO	Cedula o TI	1.116.550.121

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.195 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001952 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA







DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	ELSA LILIANA GUTIERREZ BARRERA
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.122.117.253
Direccion	MZ B LOTE 12	Telefono	3105535592
		Conyuge o Hijo (a)	JOHAN DAVID TAMAYO GUTIERREZ
Barrio	URB. RINCON DEL LLANO	Cedula o TI	1.122.118.949

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.199 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001924 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	CIELO GARCIA
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.116.546.403
Direccion	CARRERA 1 NO. 23-80	Telefono	3103039903
		Conyuge o Hijo (a)	FABIAN RODRIGO CHAPARRO PRECIADO
Barrio	MZ E LOTE 10 URB. RINCON DEL LLANO	Cedula o TI	80.759.597

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.187 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001956 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.395.420,96
% de ejecuccion:	41,51%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	SONIA CONSUELO RODRIGUEZ MANCHEGO
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	33.645.179
Direccion	MZ A LOTE 24	Telefono	3144280684
		Conyuge o Hijo (a)	MARIA JOSE CARDENAS RODRIGUEZ
Barrio	URB. LA COROCORA	Cedula o TI	1.116.547.925

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.191 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001933 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 47.038.391,81
% de ejecuccion:	46,76%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA







DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA
 
OBSERVACIONES
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	LUIS ARMANDO BUITRAGO CORREDOR
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	7.212.087
Direccion	MZ A LOTE 26	Telefono	3178850210
		Conyuge o Hijo (a)	
Barrio	URB LA COROCORA		
		Cedula o TI	

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.186 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001949 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 47.038.391,81
% de ejecuccion:	46,76%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	

OBSERVACIONES

Elaboro:
Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	CRISETH VELASQUEZ
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.116.543.290
Direccion	MZ A LOTE 22	Telefono	3143013955
		Conyuge o Hijo (a)	ERIK SANTIAGO HERNANDEZ VELASQUEZ
Barrio	URB LA COROCORA	Cedula o TI	1.116.545.245

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.190 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001944 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 47.038.391,81
% de ejecuccion:	46,76%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA	
	
OBSERVACIONES	
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024	

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	EDGAR IGNACIO MARTINEZ ESCOBAR
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	74.751.971
Direccion	MZ A LOTE 27	Telefono	3115009011
		Conyuge o Hijo (a)	
Barrio	URB. LA COROCORA		
		Cedula o TI	

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.207 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001955 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 47.038.391,81
% de ejecuccion:	46,76%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA
 
OBSERVACIONES
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	MARIA INES MONROY AGUILAR
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.116.546.959
Direccion	MZ B LOTE 12	Telefono	3132875266
		Conyuge o Hijo (a)	
Barrio	URB. LA COROCORA		
		Cedula o TI	

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.202 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001956 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 47.038.391,81
% de ejecuccion:	46,76%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA
 
OBSERVACIONES
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA			
FICHA DE SEGUIMIENTO TECNICO			
FECHA DE SEGUIMIENTO : 06 Mayo 2024 - 05 Junio 2024		**INFORMACION NUCLEO FAMILIAR**	
Tipo de Subsidio	VIVIENDA NUEVA SITIO PROPIO	Beneficiario Cabeza de Hogar	BLANCA ISABEL CHACON MORALES
UBICACIÓN:			
Municipio	AGUAZUL	Cedula	1.116.544.544
Direccion	CARRERA 10 A NO. 21-03	Telefono	3143407057
		Conyuge o Hijo (a)	JULIAN DAVID RODRIGUEZ CHACON
Barrio	MZ A LOTE 12 JUAN HERNANDO URREGO	Cedula o TI	1.116.553.523

ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACION			
Resolucion Nro : 0223 del 22 de diciembre de 2023 - Expedida por la Direccion Tecnica de Vivienda de la Gobernacion de Casanar			
LICENCIA DE CONSTRUSCCION			
No. de licencia:	101.24.01.182 del 25-10-2023	Expedida por:	Oficina asesora de Planeacion del Municipio de Aguazul

DATOS DE CONTRATISTAS Y SUPERVISOR	
Contratista O Constructor elegido:	SERPROCAS S.A.S - NIT 900.539.355-9
Interventor:	NA
Supervisor:	LILIANA VALBUENA MONROY - DIRECTORA TECNICA DE VIVIENDA
Apoyo a la supervisor:	FRANCISCO ALBERTO SANDOVAL OLAYA - CPSP 1015 / 2024
DATOS DE LA EJECUCCION:	
Poliza del contrato de Obra:	COQ-100001945 expedida por Seguros Mundial NIT 860.037.013-6
Duracion Inicial del Contrato:	Tres (3) Meses
Fecha de Inicio:	26 de Diciembre de 2023
Fecha estimada de finalizacion:	25 de Julio de 2024
Valor ejecutado:	$ 43.099.165,44
% de ejecuccion:	44,69%

REGISTRO FOTOGRAFICO A LA FECHA









DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA
 
OBSERVACIONES
Elaboro: Francisco Alberto Sandoval Olaya CPSP 1015 / 2024
