

MANTENIMIENTO
Rocería y Limpieza
Alcantarillas



MEJORAMIENTO
Construcción Placa
Huella o pavimento

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Construcción – Consultoría - Interventoría

INFORME DE INTERVENTORÍA NO. 3
CONTRATO 4520 – 2023
CONVENIOS PAICOL-NATAGA, HUILA

PERIODO: 1 AL 31 DE MARZO DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL – NATAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA:
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE PAICOL - NATAGA, HUILA

INTERVENTOR:
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

SUPERVISOR:
JOSÉ MIGUEL ORTEGA ORTIZ

MARZO DE 2024

Contenido

RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – LA ESMERALDA 5
RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – CALOTO 8
RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – LA REFORMA 11
RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – SAN MARCOS 14
INTRODUCCIÓN 17
1. CONVENIO SOLIDARIO No. 4110 DE 2023, JAC VEREDA LA ESMERALDA 17
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 17
1.1.1. Localización 17
1.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 18
1.1.3. Inventario y estado inicial de la vía 18
1.1.4. Características técnicas del proyecto 19
1.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 19
1.2.1. Información general del contrato 19
1.2.2. Descripción de las actividades 20
1.2.3. Seguimiento Ítems no previstos 21
1.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 21
1.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 22
1.3.1. Informe semanal 22
1.3.2. Maquinaria y equipo contrato de obra 22
1.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 23
1.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra 23
1.3.5. Estado general del tiempo 24
1.3.6. Resumen ensayos de laboratorio 24
1.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 24
1.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 25
1.3.9. Otros documentos seguimiento mensual 25
2. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3385 DE 2023, JAC VEREDA CALOTO 26
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 26
2.1.1. Localización 26

2.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 27
2.1.3. Inventario y estado inicial de la vía 27
2.1.4. Características técnicas del proyecto 28
2.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 28
2.2.1. Información general del contrato 28
2.2.2. Descripción de las actividades 29
2.2.3. Seguimiento Ítems no previstos 30
2.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 30
2.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 31
2.3.1. Informe semanal 31
2.3.2. Maquinaria y equipo contrato de obra 31
2.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 31
2.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra 32
2.3.5. Estado general del tiempo 32
2.3.6. Resumen ensayos de laboratorio 33
2.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 33
2.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 33
2.3.9. Otros documentos seguimiento mensual 33
3. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3750 DE 2023, JAC VEREDA LA REFORMA 35
3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 35
3.1.1. Localización 35
3.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 36
3.1.3. Inventario y estado inicial de la vía 36
3.1.4. Características técnicas del proyecto 36
3.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 37
3.2.1. Información general del contrato 37
3.2.2. Descripción de las actividades 37
3.2.3. Seguimiento Ítems no previstos 38
3.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 38
3.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 39

3.3.1. Informe semanal 39
3.3.2. Maquinaria y equipo contrato de obra 39
3.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 39
3.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra 40
3.3.5. Estado general del tiempo 40
3.3.6. Resumen ensayos de laboratorio 41
3.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 41
3.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 41
3.3.9. Otros documentos seguimiento mensual 41
4. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3518 DE 2023, JAC VEREDA SAN MARCOS 43
4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 43
4.1.1. Localización 43
4.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 43
4.1.3. Inventario y estado inicial de la vía 44
4.1.4. Características técnicas del proyecto 44
4.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 44
4.2.1. Información general del contrato 44
4.2.2. Descripción de las actividades 45
4.2.3. Seguimiento Ítems no previstos 46
4.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 47
4.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 47
4.3.1. Informe semanal 47
4.3.2. Maquinaria y equipo contrato de obra 48
4.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 48
4.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra 48
4.3.5. Estado general del tiempo 49
4.3.6. Resumen ensayos de laboratorio 49
4.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 49
4.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 50
4.3.9. Otros documentos seguimiento mensual 50
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 51

5.1. Información general del contrato 51
5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor 52
5.3. Informes especialistas y profesionales 53
5.4. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 53
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 53
6.1. Equipo y vehículos contrato de interventoría 53
6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 54
6.3. Información financiero y presupuestal contrato de interventoría 54
6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría 54
6.5. Otros documentos seguimiento mensual 55
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 55
8. ANEXOS 56
8.1. Relación de la correspondencia 56
8.2. Registro fotográfico 57
8.3. Formatos y Anexos por convenio 60
8.4. Formatos Interventorías Convenios Solidarios 60

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** mar-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4110 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 4/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE PRÓRROGA: 26/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.622.861,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.622.861,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE MIGUEL ORTEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	12,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,20
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,98
	Subbase Granular Clase C	M3	101,82
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in s	M3	71,31
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	31,40
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3298,91
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	43,40
	Excavaciones en roca en seco	M3	7,70
	Rellenos para estructuras con material de la excavación	M3	23,00
	Concreto resistencia 21MPA (D)	M3	19,02
	Concreto resistencia 14MPA (F)	M3	0,80
	Tubería concreto reforzado 21 MPA de 900 mm diámet	KG	5,00
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	1036,34
	Demolición de Estructuras	M	3,58
	Suministro e instalación de saco suelo	M2	45,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	2,1	2,1
Subbase Granular Clase C	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	16	16
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	8,91	8,91
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	793,7	793,7
Excavaciones varias sin Clasificar	0	43,4
Excavaciones en roca en seco	0	7,7
Rellenos para estructuras con material de la excavación	0	23
Concreto resistencia 21MPA (D)	0	19,02
Concreto resistencia 14MPA (F)	0	0,8
Tubería concreto reforzado 21 MPA de 900 mm diámetro interior	0	5
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	1036,34	1036,34
Demolición de Estructuras	0	0
Suministro e instalación de saco suelo	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	141.559.788,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.246.794,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.816.279,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.622.861,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	29.594.690,66	51.953.667,66
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	11.600.000,00	24.802.640,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	41.194.690,66	76.756.307,66

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 124.572.613,44
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 51.953.667,66
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 36,70%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Instalación de acero para el muro de descole. Alcantarilla No.1	**Construcción de placa huella, instalación de concreto de 2000psi**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** mar-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3385 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 30/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE PRÓRROGA: 7/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.398.498,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.398.498,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE MIGUEL ORTEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	24,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	2,40
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,98
	Subbase Granular Clase C	M3	100,98
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in s	M3	71,27
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	31,40
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3286,80
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	Excavaciones varias sin clasificar	M3	87,00
	Excavaciones Varias en rocas en seco	M3	15,30
	Rellenos para estructuras con material de la excavación	M3	45,90
	Concreto resistencia 21MPA (D)	M3	19,10
	Concreto resistencia 14MPA (F)	M3	1,50
	Tubería concreto reforzado 21 MPA de 900 mm diámet	M	10,00
	Acero de refuerzo fy = 4200 MPA.	KG	578,90
	Demolición de Estructuras	M3	7,16
	Saco suelo	M2	45,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	24
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	2
Excavaciones varias sin Clasificar	1	1
Subbase Granular Clase C	16	101
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	7	7
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	5	5
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	526	526
Excavaciones varias sin clasificar	76	87
Excavaciones Varias en rocas en seco	11	15
Rellenos para estructuras con material de la excavación	36	46
Concreto resistencia 21MPA (D)	19	19
Concreto resistencia 14MPA (F)	1	2
Tubería concreto reforzado 21 MPA de 900 mm diámetro interior	5	10
Acero de refuerzo fy = 4200 MPA.	476	476
Demolición de Estructuras	0	0
Saco suelo	31	31

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	142.309.920,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.269.298,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.819.280,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.398.498,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	40.772.822,16	58.397.174,72
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9.251.525,00	26.991.727,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	50.024.347,16	85.388.901,72

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 142.309.920,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 58.397.174,72
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 41,04%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción muro de descoles. Alcantarilla No.1 (formaleta)



Construcción de placa huella (instalación de concreto de 3000psi)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** mar-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3750 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE PRÓRROGA: 7/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.579.984,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.579.984,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE MIGUEL ORTEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	36,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,20
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	5,51
	Subbase Granular Clase C	M3	143,90
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in s	M3	99,47
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	43,79
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4620,67

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Subbase Granular Clase C	143,9	143,9
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	5,67	5,67
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	236	236

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	142.485.439,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.274.563,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.819.982,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.579.984,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	17.681.062,13	17.681.062,13
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	8.273.889,03	14.558.935,03
VALOR TOTAL EJECUTADO	25.954.951,16	32.239.997,16

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 96.890.098,52
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 17.681.062,13
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 12,41%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de acero para el muro de descole. Alcantarilla No.2



Construcción de placa huella (instalación de acero para riostra)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** mar-24

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3518 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 30/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
FECHA DE PRÓRROGA: 7/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.457.015,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.457.015,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE MIGUEL ORTEGA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	36,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	2,40
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,18
	Subbase Granular Clase C	M3	107,71
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in s	M3	75,08
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	33,05
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3479,18
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	87,00
	Excavaciones en roca en seco	M3	15,30
	Rellenos para estructuras con material de la excavació	M3	45,90
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in s	M3	19,10
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in	M3	1,50
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	10,00
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	578,90
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm	M	3,58
	Suministro e instalación de saco suelo	M2	45,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	1,50	1,50
Subbase Granular Clase C	84,50	84,50
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	4,05	4,05
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	4,05	4,05
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	417,50	417,50
Excavaciones varias sin Clasificar	87,00	87,00
Excavaciones en roca en seco	15,30	15,30
Rellenos para estructuras con material de la excavación	45,90	45,90
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	19,10	19,10
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	1,50	1,50
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	10,00	10,00
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	578,90	578,90
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	3,58	3,58
Suministro e instalación de saco suelo	40,00	40,00

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	142.366.514,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.270.995,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.819.506,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	189.457.015,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	49.439.771,01	49.439.771,01
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.290.000,00	9.637.264,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	50.729.771,01	59.077.035,01

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 65.852.426,47
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 49.439.771,01
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 34,73%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción muro de descole. Alcantarilla No.1 (acero y formaleta)



Construcción de placa huella (acero, concreto de 2000psi y 3000psi)

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTRODUCCIÓN

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS suscribió convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal del departamento, bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Para lo cual, en el municipio de Paicol y Nátaga las JAC La Esmeralda, Caloto, La Reforma y San Marcos, suscribieron los convenios solidarios No. 4110, 3385, 3750 y 3518 de 2023, respectivamente.

Dado lo anterior, el INVIAS mediante proceso IP-DT-HUI-009-2023 efectuó el contrato No. 4520 de 2023 con orden de inicio 2023S-VHUI-025344 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - NATAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Para lo anterior, el INVIAS designó como Supervisor del contrato de interventoría al ing. José Miguel Ortega Ortiz mediante comunicado 0130 de fecha 01 de diciembre de 2023.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente informe parcial contempla las actividades realizadas en cada uno de los convenios en el periodo entre el 01 de marzo de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024.

1. CONVENIO SOLIDARIO No. 4110 DE 2023, JAC VEREDA LA ESMERALDA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1. Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera: El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Nátaga del departamento del Huila, en la vereda La Esmeralda, teniendo como punto inicial de intervención el K17+380 de la vía NÁTAGA – LA ESMERALDA – CRUCE LA MESA código 41483-7, partiendo desde su intersección con la Cra 6 del casco urbano del municipio de Nátaga, vía de

acceso a la Vereda La Esmeralda, con coordenadas iniciales 2°37'13.38"N; 75°46'1.52"W, y punto final de coordenadas 2°37'12.23"N; 75°46'5.07"W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 1. Localización de la obra del convenio 4110 de 2023 - JAC La Cabaña

1.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto se verán beneficiados principalmente, la población de La Esmeralda junto con las veredas aledañas, en las cuales su principal fuente de ingreso es la producción y comercialización de café, también se verá beneficiada la población en general del municipio de Nátaga ya que se mejorará las condiciones de conectividad en materia de transporte conectando los sectores de consumo con los de producción para la comercialización de sus cultivos.

1.1.3. Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 121 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que

permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.

	
Foto inicial	Foto recorrido

1.1.4. Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
12,00	1,20	121,00	1

1.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

1.2.1. Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	4110 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	25/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA
RUT	8130057056
VALOR INICIAL	$ 189.622.861,00

VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.622.861,00
ORDEN DE INICIO	4/12/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2023
SUPERVISOR	JOSE MIGUEL ORTEGA

1.2.2. Descripción de las actividades

El día 06/03/2024 se realiza comité No.9 se realizó balance financiero del proyecto en cuanto a maquinaria, materiales y personal, se realiza solicitud de requerimientos de gestión social y ambiental en cuanto al avance del físico ya se realizó le reposición de alcantarillas No. 2, y está en ejecución alcantarilla No. 1. Se aprobaron transferencia No. 10

El 13/03/2024 ser realizo visita por parte delegados de la supervisión para revisar avance físico de la obra, durante la semana se realizan actividades de figurado de acero (vigas riostra y bordillos) y el día 14/03/2024 se inició labores de nivelación del terreno con ayuda de maquinaria (motoniveladora); el 11/03/2024 en comité operativo No. 10 se revisó valor del transporte convenido inicialmente por $720,000 el cual se ajustó con el proveedor los siguiente: los 10 viajes realizados por un valor de $650,000 y los faltantes a $600,000. con esto se ajustó y autorizó el desembolso No. 13: caja menor a BRAYAN ARMED YUCUMA CHAMBO ($ 250.000), retención en la fuente del mes de febrero a BRAYAN ARMED YUCUMA CHAMBO ($ 41.000), avance al maestro ABEL CASTAÑEDA SANCAHEZ ($ 2.000.000), transporte de agregados, cemento y alquiler de retroexcavadora ($ 12.008.500), valla informativa EDWIN EDUARDO SILVA ($ 450.000), anticipo del alquiler de la motoniveladora JOSE MARCOS SUNS PENCUE ($ 3.960.000) y nómina del oficial de obra LUIS ALFREDO AMAYA ($ 225.461), para un total de $ 18.934.961; igualmente se autorizó desembolso No. 14 para el pago final del alquiler de la motoniveladora JOSE MARCOS SUNS PENCUE $2,400,000; Transferencia No. 13.

El día 19/03/2024 se realizó la toma de densidades en campo, el material estaba saturado por lluvias constantes por lo tanto se solicitó debida compactación con el uso de vibro compactador para iniciar la construcción de la placa huella y reprogramar toma de densidades; es de anotar que en el transcurso de la semana se presentaron lluvias que han impidió la normal ejecución de las obras. El día 20/03/2024 se iniciaron actividades de compactación del terreno con vibro compactador.
NOTA: Debido a que la vereda se encuentra lejos del caso urbano ha sido difícil consecución de Vibro compactador; se tenía previsto el préstamo del vibro por parte de alcaldía de Tesalia, pero por trámites administrativos no fue posible. además, por la lejanía de la vereda las cotizaciones presentadas son de costo elevado.

Durante el periodo reportado se realizó construcción de placa huella realizando actividades de excavaciones varias sin clasificar, instalación de formaleta, fundición de concreto reforzada resistencia 21 MPA, concreto ciclópea resistencia 14 MPA y acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2; es de resaltar que, debido a las festividades de la semana santa, solo se trabajó el lunes, martes y miércoles,

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de marzo de 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO PERIODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 141.559.788,00	N/A	$ 29.594.690,66	$ 51.953.667,66	$ 89.606.120,34
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.246.794,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.246.794,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.816.279,00	N/A	$ 11.600.000,00	$ 24.802.640,00	$ 18.013.639,00
TOTAL	**$ 188.622.861,00**	**N/A**	**$ 41.194.690,66**	**$ 76.756.307,66**	**$ 111.866.553,34**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 40,69 %.

1.2.3. Seguimiento Ítems no previstos

Hasta la fecha de la elaboración del presente informe no se ha requerido la creación de ítems no previstos inicialmente para lograr la consecución del objeto del convenio.

1.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
- Control de permanencia del personal calificado y no calificado.
- Revisión de los diferentes documentos presentados por el contratista.
- Control del pago de parafiscales del personal que labora para el contrato.
- Archivo actualizado de la Interventoría.
- Comunicados dirigidos al contratista.
- Comunicados dirigidos al INVIAS.
- Reuniones con el contratista.
- Asistir a las reuniones citadas por el INVIAS.
- Seguimiento y acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas por el Contratista en los sectores donde se desarrollan las obras.
- Elaboración de informes semanales.

- Elaboración de informe mensual.
- Medición y cuantificación de cantidades de obra.
- Supervisión de ejecución de obras.
- Revisión y ajuste de estudios y diseños.

La interventoría realiza la revisión para la aprobación definitiva de estudios y diseños de entregados por JAC de acuerdo con la instrucción del INVIAS, teniendo en cuenta los parámetros técnicos de topografía y estudios de laboratorio e in situ; así como los diseños geométrico y estructural para la construcción de las estructuras de placa huella y alcantarilla.

Se anexan los formatos "ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS".

1.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

1.3.1. Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 14: Del 01 de marzo de 2024 al 07 de marzo de 2024.
- Semana 15: Del 08 de marzo de 2024 al 14 de marzo de 2024.
- Semana 16: Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024.
- Semana 17: Del 22 de marzo de 2024 al 28 de marzo de 2024.

Se anexan los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

1.3.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

Se utilizo la siguiente maquinaria:

- 1 retroexcavadora CAT 416E
- motoniveladora 120 E
- vibro compactador CA-15

Se utilizo el siguiente equipo:

- 1 compactador (tipo canguro 1 ton)
- 1 vibrador de concreto (0.50 Mpa)
- 1 mezcladora (1.5 bultos)

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

1.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para el presente periodo, ingresó el siguiente personal a partir del día 15 de enero de 2024; por lo cual el contratista presentara la planilla de pago con el informe mensual.

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	MARLENY RAMON OSPITIA	Contadora	15/01/2024	Prestación de servicios
2	WILMER RAMIREZ GONZALES	Residente	15/01/2024	Prestación de servicios
3	ABEL CASTAÑEDA SANCHEZ	Maestro	12/02/2024	Contraprestación
4	LUIS ALFREDO AMAYA	Oficial	29/02/2024	Obra o labor
5	LUIS URIEL SICACHA PAEZ	Ayudante	12/02/2024	Obra o labor
6	ALEXANDER OTECA YUCUMA	Ayudante	12/02/2024	Obra o labor
7	FABIO NELSON YUCUMA	Ayudante	19/02/2024	Obra o labor
8	LUIYI YULIETH PIÑACUE RUIZ	Ayudante	12/02/2024	Obra o labor
9	WILLIAM ANDRES OLIVERA	Ayudante	19/02/2024	Obra o labor
10	YAZMIN MAÑOZCA YUCUMA	Ayudante	12/02/2024	Obra o labor

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL". La OAC cancela la seguridad social completa de la mano de obra no calificada, del Ingeniero Residente y Maestro de Obra la OAC cancela exclusivamente ARL.

1.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 4110 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1275923 de fecha 2023-11-20 por valor $ 188.622.861,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-14-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL NACIONAL.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos que se anexan en el presente informe:

Se anexa formato de INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".
Se anexa formato de "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

1.3.5. Estado general del tiempo

Durante el presente periodo predomino el tiempo seco, se presentaron lluvias moderadas los días 06, 08, 21, 23, 25, y 30 de marzo de 2024.

Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

1.3.6. Resumen ensayos de laboratorio

Se programó toma de densidades para la rasante pero el suelo se encontraba saturado por las lluvias presentes en la zona, por lo cual se tomarán nuevamente en las condiciones apropiadas.

1.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Póliza de cumplimiento No. 3002981 de fecha 1/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 de fecha 18/10/2023, actualizadas según la prórroga efectuada.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.924.57,00	31/10/2024	01/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.886.859,00	30/04/2024	30/04/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.481.144,00	31/12/2026	01/05/2027
TOTAL		$104.292.576,00		

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	17/01/2024	31/12/2023

No se realizan cambios con respecto a las garantías reportadas en el periodo anterior.

1.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra


En el momento se adelantan las obras siguiendo las Normas estipuladas por nuestro contratante; Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022.

1.3.9. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

Se realiza el respectivo seguimiento en los informes semanales. Para el periodo reportado se tiene un avance ejecutado de 37% con respecto a un avance programado del 88%del valor total del convenio.

Lo anterior, se debe a que las actividades realizadas en marzo fueron afectadas por la dificultad de conseguir proveedores de maquinaria amarilla en la región para las actividades extensión de material y compactación; sin embargo, el avance se vio representado en la construcción la alcantarilla.

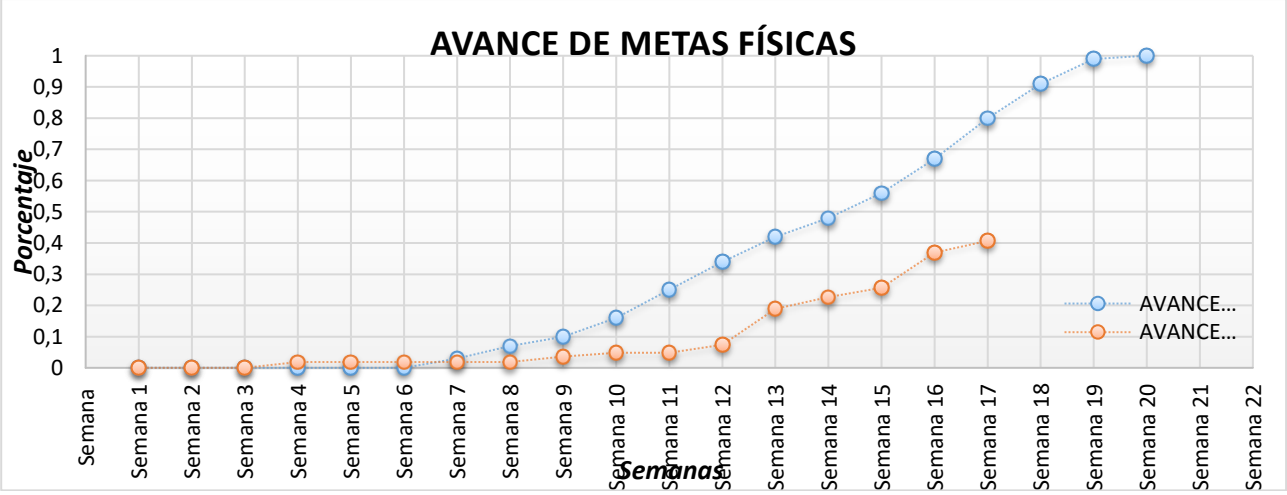

Durante el periodo reportador se realizaron actividades de obra tales como construcción de placa huella. Se presentaría un acta final de obra, por esta razón no se anexa el "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:
- Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
6/03/2024	Comité operativo 9	Se realizó balance financiero del proyecto en cuanto a maquinaria, materiales y personal, se realiza solicitud de requerimientos de gestión social y ambiental en cuanto al avance del físico
11/03/2024	Comité operativo 10	Se revisó valor del transporte convenido inicialmente por $720,000 el cual se ajustó con el proveedor los siguiente: los 10 viajes realizados por un valor de $650,000 y los faltantes a $600,000. con esto se ajustó y autorizó el desembolso No. 13
16/03/2024	Comité operativo 11	Aprobación de proveedor de mezcladora, vibrocompactador, transporte del vibrocompactador, antisol y su respectivo valor.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

2. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3385 DE 2023, JAC VEREDA CALOTO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1. Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paicol del departamento del Huila, en la vereda de Caloto, teniendo como punto inicial el K17+830 de la vía PAICOL - ALTO SAN MIGUEL - CALOTO - SAN ANDRES código 24HL04, partiendo desde su intersección con la Cra 6 del casco urbano del municipio de Paicol,

vía de acceso a la Vereda de Caloto, con coordenadas iniciales 2.378176N; 75.81846W, y punto final de coordenadas 2.37669N; 75.81933W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 2. Localización de la obra del convenio 4110 de 2023 - JAC Caloto

2.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto se verán beneficiados principalmente, la población de Caloto junto con las veredas aledañas, en las cuales su principal fuente de ingreso es la producción y comercialización de café, también se verá beneficiada la población en general del municipio de Paicol ya que se mejorará las condiciones de conectividad en materia de transporte conectando los sectores de consumo con los de producción para la comercialización de sus cultivos.

2.1.3. Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 120 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.

	
Foto inicial	Foto avance

2.1.4. Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
24,00	2,40	120,00	2

2.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.2.1. Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	3385 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	18/09/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL
RUT	813004190-9
VALOR INICIAL	$ 189.398.498
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.398.498

ORDEN DE INICIO	30/11/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2023
SUPERVISOR	JOSE MIGUEL ORTEGA

2.2.2. Descripción de las actividades

El día 07/03/2024 se realizó comité operativo No. 10 en el cual se presentaron y aprobaron los pagos para la transferencia No. 5 de la nómina de febrero de ayudantes $497.933 cada uno, maestro de obra $ 1.560.000 y del Ingeniero residente $ 3.500.000, de la maquinaria (volqueta y retroexcavadora) $ 13.858.690 y ferretería $ 1.488.795. En obra se realizaron de actividades reposición de alcantarillas tales como: Excavaciones varias sin clasificar, Excavaciones Varias en rocas en seco, Rellenos para estructuras con material de la excavación, Concreto resistencia 21MPA (D), Concreto resistencia 14MPA. (F), Tubería concreto reforzado y Acero de refuerzo fy = 4200 MPA.

El 13/03/2024 ser realizo visita por parte delegados de la supervisión para revisar avance físico de la obra, durante la semana se realizaron actividades de obra tales como: instalación de concreto de 3000 psi para encole y descole de las alcantarillas; el día 12/03/2024 se realizó comité operativo No. 11 en el cual se presentaron y aprobaron los siguientes desembolsos: la nómina de los ayudantes del periodo del 01/03/2024 al 15/03/2024 por un total de $3.395.000, cuenta de cobro del contador YORYANI GARZON por un valor de $ 1.400.000, elementos de seguridad por un valor de $96.000, retención en la fuente por $1.507.000, excedente de la valla informativa por un valor de $98.825, nuevo pedido de formaleta (madera) por un valor de $780.000 y un desembolso de caja menor por un valor de $300.000; se aprobaron todas las transferencias presentadas anteriormente; transferencia No. 6.

El 19/03/2024 se realizó en campo la toma de densidades de la subbase instalada en la obra; la compactación dio un resultado aceptable por lo cual se empezó con la construcción de la placa huella (excavaciones varias sin clasificar, instalación de concreto ciclópea (resistencia 14MPa).

Durante el periodo reportado se realizó construcción de placa huella adelantando actividades de excavaciones varias sin clasificar, instalación de formaleta, fundición de concreto reforzada resistencia 21 MPA, concreto ciclópeo resistencia 14 MPA y acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2; debido a las festividades de semana santa, solo se laboró los días martes y miércoles; así mismo se reportan algunos deslizamientos sobre la vía que han retrasado la construcción de la placa huella.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 28 de marzo de 2024 así:

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 142.309.920,00	N/A	$ 40.772.822,16	$ 58.397.174,72	$ 83.912.745,28
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.269.298,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.269.298,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.819.280,00	N/A	$ 9.251.525,00	$ 26.991.727,00	$ 14.827.553,00
TOTAL	**$ 188.398.498,00**	**N/A**	**$ 50.024.347,16**	**$ 85.388.901,72**	**$ 103.009.596,28**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 45,32% con avance en rubro de obra y administrativo.

2.2.3. Seguimiento Ítems no previstos

Hasta la fecha de la elaboración del presente informe no se ha requerido la creación de ítems no previstos inicialmente para lograr la consecución del objeto del convenio.

2.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
- Control de permanencia del personal calificado y no calificado.
- Revisión de los diferentes documentos presentados por el contratista.
- Control del pago de parafiscales del personal que labora para el contrato.
- Archivo actualizado de la Interventoría.
- Comunicados dirigidos al contratista.
- Comunicados dirigidos al INVIAS.
- Reuniones con el contratista.
- Asistir a las reuniones citadas por el INVIAS.
- Seguimiento y acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas por el Contratista en los sectores donde se desarrollan las obras.
- Elaboración de informes semanales.
- Elaboración de informe mensual.
- Medición y cuantificación de cantidades de obra.
- Supervisión de ejecución de obras.
- Revisión y ajuste de estudios y diseños.

La interventoría realiza la revisión para la aprobación definitiva de estudios y diseños de entregados por JAC de acuerdo con la instrucción del INVIAS, teniendo en cuenta los parámetros técnicos de topografía y estudios de laboratorio e in situ; así como los

diseños geométrico y estructural para la construcción de las estructuras de placa huella y alcantarilla.

Se anexan los formatos "ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS".

2.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

2.3.1. Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 14: Del 01 de marzo de 2024 al 07 de marzo de 2024.
- Semana 15: Del 08 de marzo de 2024 al 14 de marzo de 2024.
- Semana 16: Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024.
- Semana 17: Del 22 de marzo de 2024 al 28 de marzo de 2024.

Se anexan los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

2.3.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

Se utilizo la siguiente maquinaria:
- 1 volqueta (6 m3)
- Minicargador 68 HP

Se utilizo el siguiente equipo:
- 1 mezcladora (1.5 bultos)

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

2.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para el presente periodo, ingresó el siguiente personal a partir del día 12 de enero de 2024; por lo cual el contratista presentara la planilla de pago con el informe mensual.

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	YORYANI GARZON QUIMBAYA	Contador	12/01/2024	Prestación de servicios
2	NICOLAS GARZON BARRETO	Residente	05/02/2024	Prestación de servicios

3	JEISON JOHAN NOGUERA LOSADA	Maestro	19/02/2024	Contraprestación
4	EDWIN HERRERA MONSALVE	Ayudante	19/02/2024	Obra o labor
5	GUILLERMO TOLEDO SANCHEZ	Ayudante	19/02/2024	Obra o labor
6	LEANDRO SÁNCHEZ LOSADA	Ayudante	19/02/2024	Obra o labor
7	REINEL VITOVIS ROA	Ayudante	19/02/2024	Obra o labor
8	YILVER SÁNCHEZ LOSADA	Ayudante	19/02/2024	Obra o labor

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

La OAC cancela la seguridad social de la mano de obra no calificada, del Ingeniero Residente y Maestro de Obra la OAC cancela exclusivamente ARL.

2.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 3385 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1121423 de fecha 2023-10-10 por valor $ 188.398.498,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos que se anexan en el presente informe:

Se anexa formato de "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".
Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

2.3.5. Estado general del tiempo

Durante el presente periodo predomino el tiempo seco, sin embargo, se presentaron lluvias moderadas de lapsos cortos, se anexa formato del mes de marzo de 2024.

Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

2.3.6. Resumen ensayos de laboratorio

Debido al avance de las obras, en el presente periodo no se realizaron toma de muestras de laboratorio, las mismas se realizarán durante el próximo periodo.

2.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Prorroga No.1: Póliza de cumplimiento No. 3002981 anexo No.1 de fecha 1/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 anexo No.1 de fecha 18/10/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.879.699,60	31/12/2023	01/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.819.549,40	30/04/2024	30/04/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.469.924,90	31/12/2023	30/04/2027
TOTAL		$104.292.576,00	**18/09/2023**	**30/04/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	18/09/2023	30/04/2023

No se realizan cambios con respecto a las garantías reportadas en el periodo anterior.


2.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

En el momento se adelantan las obras siguiendo las Normas estipuladas por nuestro contratante; Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022.

2.3.9. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

se realiza el respectivo seguimiento en los informes semanales. Para el periodo reportado se tiene un avance ejecutado de 41% con respecto a un avance programado del 100% del valor total del convenio.

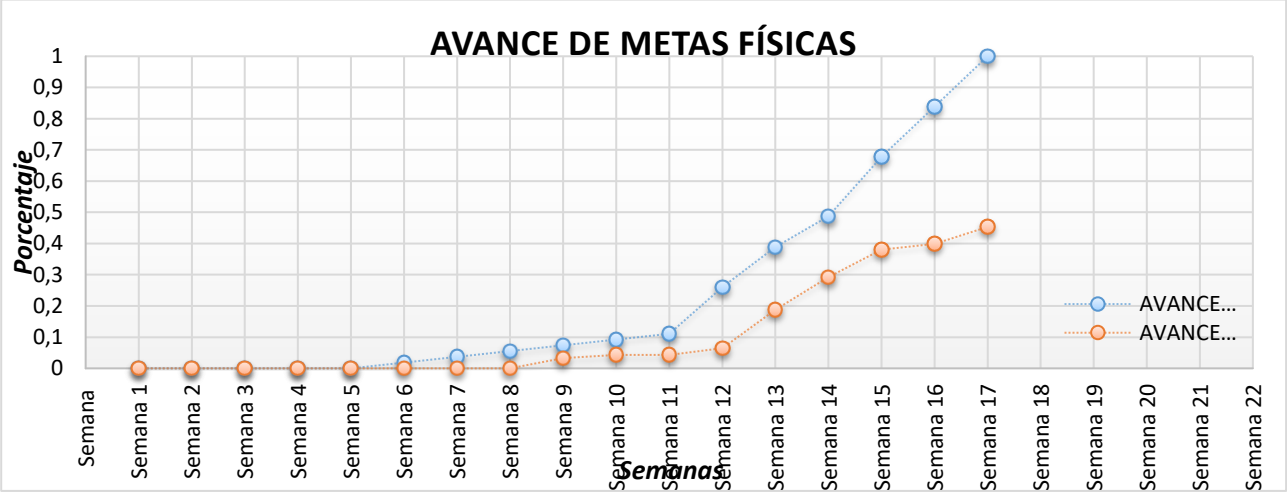

Durante el periodo reportador se realizaron actividades de obra tales como construcción de alcantarillas y placa huella. Se presentaría un acta final de obra, por esta razón no se anexa el "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:

Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
7/03/2024	comité operativo 10	se presentaron y aprobaron los pagos para la transferencia No. 5 de la nómina de febrero de ayudantes $497.933 cada uno, maestro de obra $ 1.560.000 y del Ingeniero residente $ 3.500.000, de la maquinaria (volqueta y retroexcavadora) $ 13.858.690 y ferretería $ 1.488.795
12/03/2024	comité operativo 11	se presentaron y aprobaron los siguientes desembolsos: la nómina de los ayudantes del periodo del 01/03/2024 al 15/03/2024 por un total de $3.395.000, cuenta de cobro del contador YORYANI GARZON por un valor de $ 1.400.000, elementos de seguridad por un valor de $96.000, retención en la fuente por $1.507.000, excedente de la valla informativa por un valor de $98.825, nuevo pedido de formaleta (madera) por un valor

		de $780.000 y un desembolso de caja menor por un valor de $300.000; se aprobaron todas las transferencias presentadas anteriormente.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

3. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3750 DE 2023, JAC VEREDA LA REFORMA

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1.1. Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paicol del departamento del Huila, en la vereda La Reforma, teniendo como punto de referencia inicial el PR71+530 de la vía Transversal Huila – Cauca código 2402, en el acceso a la Vereda La Reforma Cruce en Km 8 +250 de la vía La Lajita - La Reforma (Junto al Río Páez), con coordenadas iniciales 2.44687382N; -75.702305W, y punto final de coordenadas 2.4477131N; 75.70120698W, ubicado sobre el mismo corredor vial, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 3. Localización de la obra del convenio 4110 de 2023 - JAC La Reforma

3.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto se verán beneficiados principalmente, la población de La Reforma junto con las veredas aledañas, en las cuales su principal fuente de ingreso es la producción y comercialización de ganado vacuno y arroz, también se verá beneficiada la población en general del municipio de Paicol ya que se mejorará las condiciones de conectividad en materia de transporte conectando los sectores de consumo con los de producción para la comercialización de sus cultivos.

3.1.3. Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 171 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.



Socialización inicial



Recorrido por el sitio de la obra

3.1.4. Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
36,00	1,20	171,00	0

3.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.2.1. Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	3750 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	5/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA REFORMA MUNICIPIO DE PAICOL.
RUT	900359930-1
VALOR INICIAL	$ 189.398.498
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.398.498
ORDEN DE INICIO	30/11/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	17/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	JOSE MIGUEL ORTEGA

3.2.2. Descripción de las actividades

Durante el periodo reportado se tiene programado el arribo de material a la obra, además se espera que el municipio envíe maquinaria a la obra para desarrollar actividades de conformación.

Durante el periodo reportado se programó realizar actividades de concretos encole y descoles de las alcantarillas, se está a espera que la alcaldía de Paicol disponga en la obra del vibro compactador para el lunes 18/03/2024 y poder finalizar la actividad con toma de densidades.

El dia18/03/2024 se empezaron actividades de compactación de la subbase con la ayuda del vibro compactador que suministro la alcaldía de Paicol, debido a que ese día se había cortado el suministro de agua no se pudo realizar una buena compactación por lo cual se acordó que el día 21/03/2024 nuevamente la alcaldía enviaría la maquinaria (vibro compactador y motoniveladora).

Durante el periodo reportado se realizó construcción de placa huella realizando actividades de excavaciones varias sin clasificar, instalación de formaleta, concreto

ciclópea resistencia 14 MPA y acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2; debido a las festividades de semana santa, solo se laboró los días martes y miércoles.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 28 de marzo de 2024 así:

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 142.485.439,00	N/A	$ 17.681.062,13	$ 17.681.062,13	$ 124.804.376,87
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.274.563,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.274.563,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.819.982,00	N/A	$ 8.273.889,03	$ 14.558.935,03	$ 27.261.046,97
TOTAL	**$ 188.579.984,00**	**N/A**	**$ 25.954.951,16**	**$ 32.239.997,16**	**$ 156.339.986,84**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 17,10% Las memorias de los gastos se encuentran consolidados en las actas de recibo parcial de obra de convenio.

3.2.3. Seguimiento Ítems no previstos

Hasta la fecha de la elaboración del presente informe no se ha requerido la creación de ítems no previstos inicialmente para lograr la consecución del objeto del convenio.

3.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
- Control de permanencia del personal calificado y no calificado.
- Revisión de los diferentes documentos presentados por el contratista.
- Control del pago de parafiscales del personal que labora para el contrato.
- Archivo actualizado de la Interventoría.
- Comunicados dirigidos al contratista.
- Comunicados dirigidos al INVIAS.
- Reuniones con el contratista.
- Asistir a las reuniones citadas por el INVIAS.
- Seguimiento y acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas por el Contratista en los sectores donde se desarrollan las obras.
- Elaboración de informes semanales.
- Elaboración de informe mensual.
- Medición y cuantificación de cantidades de obra.

- Supervisión de ejecución de obras.
- Revisión de estudios y diseños.

La interventoría realiza la revisión para la aprobación definitiva de estudios y diseños de entregados por JAC de acuerdo con la instrucción del INVIAS, teniendo en cuenta los parámetros técnicos de topografía y estudios de laboratorio e in situ; así como los diseños geométrico y estructural para la construcción de las estructuras de placa huella y alcantarilla.

Se anexan los formatos "ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS".

3.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

3.3.1. Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 14: Del 01 de marzo de 2024 al 07 de marzo de 2024.
- Semana 15: Del 08 de marzo de 2024 al 14 de marzo de 2024.
- Semana 16: Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024.
- Semana 17: Del 22 de marzo de 2024 al 28 de marzo de 2024.

Se anexan los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

3.3.2. Maquinaria y equipo contrato de obra

Se utilizo la siguiente maquinaria:

- RETRO CARGADOR CAT 416E 18 TON
- MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 140 hp
- VIBRO COMPACTADOR CASE 41 KN

Se utilizo el siguiente equipo:

- MEZCLADORA TIPO TROMPO 1 BULTO
- VIBRADOR CONCRETO TIPO AGUJA 0.50 Mpa

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

3.3.3. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	DIANA MILEIDY FIESCO	Contadora	07/02/2024	Prestación de servicios

2	CAMILO ANDRÉS QUINTERO	Residente	07/02/2024	Prestación de servicios
3	JUAN PABLO CHAVARRO ROJAS	Maestro de obra	04/03/2024	Obra a todo costo
4	ELIECER ALVARADO CADENA	Obrero	04/03/2024	Obra labor
5	JUAN SEBASTIAN ILLERA MENZA	Obrero	04/03/2024	Obra labor
6	RODMI MARCELO ILLERA MENZA	Obrero	04/03/2024	Obra labor
7	SANTIAGO ALVARADO PERDOMO	Obrero	04/03/2024	Obra labor
8	HAMILTON SARRIAS ROJAS	Oficial de obra	04/03/2024	Obra labor

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

La OAC cancela la seguridad social de la mano de obra no calificada, del Ingeniero Residente y Maestro de Obra la OAC cancela exclusivamente ARL.

3.3.4. Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 3750 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1141923 de fecha 2023-10-17 por valor $ 188.579.984,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS – VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – COLOMBIA RURAL. NACIONAL

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa formato de INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".
Se anexa formato de "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

3.3.5. Estado general del tiempo

Durante el presente periodo predomino el tiempo seco, sin embargo, se presentaron lluvias moderadas de lapsos cortos, se anexa formato del mes de marzo de 2024.

Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

3.3.6. Resumen ensayos de laboratorio

En el presente periodo no s realizaron ensayos de laboratorio debido al avance de las obras ejecutadas, los mismo se realizarán durante el próximo periodo.

3.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

Póliza de cumplimiento No. NB-100287483 de fecha 23/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 de fecha 18/10/2023, actualizadas según la prórroga efectuada.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.915.996,80	31/12/2023	01/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.873.995,20	30/04/2024	30/04/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.478.999,20	31/12/2026	30/04/2027
TOTAL		$104.268.991,20		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	05/10/2023	30/04/2024

No se realizan cambios con respecto a las garantías reportadas en el periodo anterior.


3.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

En el momento se adelantan las obras siguiendo las Normas estipuladas por nuestro contratante; Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022.

3.3.9. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

Se realiza el respectivo seguimiento en los informes semanales. Para el periodo reportado se tiene un avance ejecutado de 17,1% con respecto a un avance programado del 60,0% del valor total del convenio.

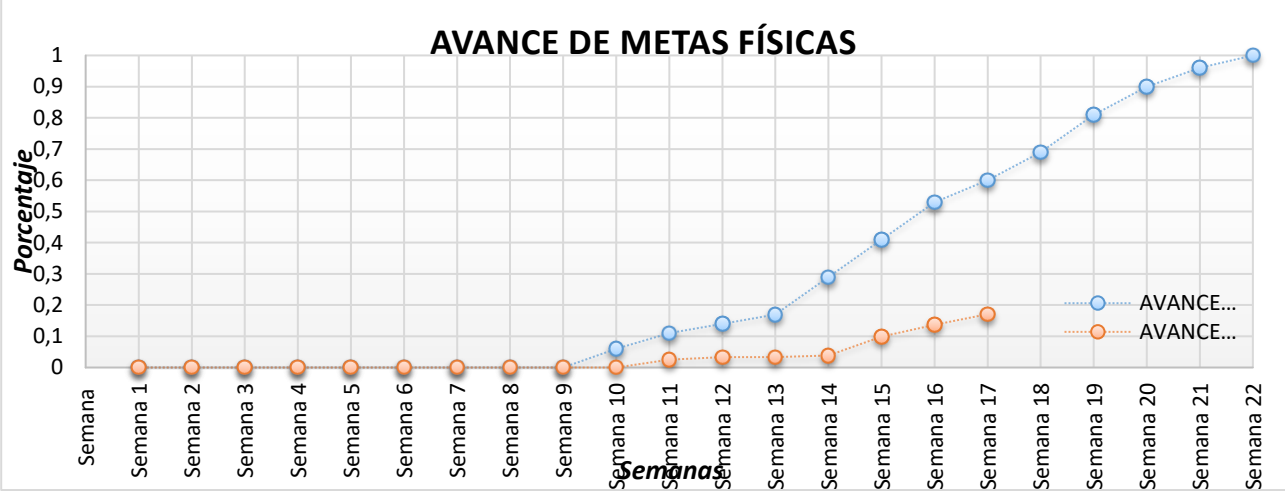

Durante el periodo reportador se realizaron actividades de obra tales como construcción de placa huella. Se presentaría un acta final de obra, por esta razón no se anexa el "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:
  Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
12/03/2024	comité operativo 8	se aprobó el pago del transporte, maquinaria, compra de tubería de 36", se presentó resumen de la obra, resumen financiero, pago de la valla.

  Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

- Estudios y diseños

  La junta OAC realizo estudios y diseños del tramo de vía los cuales contemplan diseño geométrico, topografía, estudio de suelos y caracterización de materiales, condiciones climáticas, concepto de tránsito, concepto estructural.

4. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3518 DE 2023, JAC VEREDA SAN MARCOS

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1.1. Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Paicol del departamento del Huila, en la vereda San Marcos, teniendo como punto inicial el K7+615 de la vía PAICOL - ALTO SAN MIGUEL - CALOTO - SAN ANDRES código 24HL04, partiendo desde su intersección con la Cra 6 del casco urbano del municipio de Paicol, vía de acceso a la Vereda San Marcos, con coordenadas iniciales 2.413308N; 75.777629W, y punto final de coordenadas 2.41237N; -75.7787W, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 4. Localización de la obra del convenio 4110 de 2023 - JAC San Marcos

4.1.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto se verán beneficiados principalmente, la población de San Marcos junto con las veredas aledañas, en las cuales su principal fuente de ingreso es la producción y comercialización de café y ganado vacuno, también se verá

beneficiada la población en general del municipio de Paicol ya que se mejorará las condiciones de conectividad en materia de transporte conectando los sectores de consumo con los de producción para la comercialización de sus cultivos.

4.1.3. Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 128 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.





Estado inicial de la vía

4.1.4. Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
24,00	2,40	128,00	2

4.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

4.2.1. Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	3518
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	26/09/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS MUNICIPIO DE PAICOL
RUT	813010422-7
VALOR INICIAL	$189.457.015
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$189.457.015
ORDEN DE INICIO	23/11/2023
PLAZO INICIAL	31/12/2023
PRÓRROGA No. 1	30/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	30/04/2024
SUPERVISOR	JOSE MIGUEL ORTEGA

4.2.2. Descripción de las actividades

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades para la reposición alcantarillas: Excavaciones varias sin clasificar, Rellenos para estructuras con material de la excavación, Concreto resistencia 21MPA, Concreto resistencia 14MPA, Tubería concreto reforzado, Saco suelo.; no se realizaron comités operativos, sin embargo, se tuvo contacto con la OAC para resolver inquietudes de compra de materiales, alquiler de maquinaria entre otros administrativas.

El 13/03/2024 ser realizo visita por parte delegados de la supervisión para revisar avance físico de la obra. durante esta semana se realizaron las siguientes actividades para la reposición alcantarillas: Excavaciones varias sin clasificar, Rellenos para estructuras con material de la excavación, Concreto resistencia 21MPA, Concreto resistencia 14MPA, Tubería concreto reforzado, Saco suelo; además de esto se inició obra de placa huella con la actividad de extensión de subbase ; el día 08/03/2024 se realiza transferencia No.3 en la cual se paga: VIVIANA GARAVITO AVENDAÑO, formaleta ($ 720.000), CORNELIA GALINDO ANDRADRE, uniformes ($ 910.000), GILLERMO SALAZAR, valla informativa ($ 380.000) y JAC, pago de retenciones ($ 1.142.000); el día 12/03/2024 se realizó comité operativo No. 9 en el cual se presentó cotización del vibro compactador por un valor de $ 2.400.000 (transporte incluido),se presentó un cuadro resumen de transporte y horas de maquinaria requeridos hasta la fecha y se autorizaron los siguientes desembolsos: nómina de los ayudantes de obra del periodo del 04/03/2024 al 15/03/2024 por $3.369.600, anticipo del vibro compactador por $900,000, rendimientos financieros por un valor de $ 4.363,33 del mes diciembre, enero y febrero.

El día 18/03/2024 se realizaron labores de compactación de la subbase con la ayuda de un vibro compactador, El 19/03/2024 se realizó en campo la toma de densidades de la subbase instalada en la obra; la compactación dio un resultado aceptable por lo cual se empezó con la construcción de la placa huella (excavaciones varias sin clasificar, instalación de concreto ciclópeo (resistencia 14MPa).

Durante el periodo reportado se realizó construcción de placa huella realizando actividades de excavaciones varias sin clasificar, instalación de formaleta, concreto reforzado resistencia 21 MPA, concreto ciclópeo resistencia 14 MPA y acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2; debido a las festividades de semana santa, solo se laboró los días martes y miércoles; así mismo el día 26/03/2024 se realizó comité operativo No.10 en el cual se presentaron facturas y se autorizaron las transferencias de lo siguiente: nómina de 5 ayudantes y 1 oficial por el valor de $ 4.655.949, alquiler de retroexcavadora $ 7.740.000, alquiler de vibro compactador $ 2.250.000, material de ferretería CONSTRUCIVIL $ 11.428.000, pago de agregados MASSEQ $ 24.104.096, nómina del maestro 5.111.000, nómina del ing. residente $ 5.250.000 (15/01/2024 al 29/02/2024), nómina del contador 2.100.000 (15/01/2024 al 29/02/2024) para un total de $62.639.045; transferencia No. 6.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de marzo de 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 141.608.762,00	N/A	$ 49.439.771,01	$ 49.439.771,01	$ 92.926.742,99
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.248.263,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.270.995,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.816.475,00	N/A	$ 1.290.000,00	$ 9.637.264,00	$ 33.182.242,00
TOTAL	**$ 188.673.500,00**	**N/A**	**$ 50.729.771,01**	**$ 59.077.035,01**	**$ 130.379.979,99**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 31,18% Las memorias de los gastos se encuentran consolidados en las actas de recibo parcial de obra de convenio.

4.2.3. Seguimiento Ítems no previstos

Hasta la fecha de la elaboración del presente informe no se ha requerido la creación de ítems no previstos inicialmente para lograr la consecución del objeto del convenio.

4.2.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
- Control de permanencia del personal calificado y no calificado.
- Revisión de los diferentes documentos presentados por el contratista.
- Control del pago de parafiscales del personal que labora para el contrato.
- Archivo actualizado de la Interventoría.
- Comunicados dirigidos al contratista.
- Comunicados dirigidos al INVIAS.
- Reuniones con el contratista.
- Asistir a las reuniones citadas por el INVIAS.
- Seguimiento y acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas por el Contratista en los sectores donde se desarrollan las obras.
- Elaboración de informes semanales.
- Elaboración de informe mensual.
- Medición y cuantificación de cantidades de obra.
- Supervisión de ejecución de obras.
- Revisión y/o ajuste de estudios y diseños.

La interventoría realiza la revisión del acta de aprobación definitiva de estudios y diseños empleada para los convenios solidarios de acuerdo con la instrucción del INVIAS, teniendo en cuenta los parámetros técnicos de topografía y estudios de laboratorio e in situ; así como los diseños geométrico y estructural para la construcción de las estructuras de placa huella y alcantarilla.

4.3. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.3.1. Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

Semana 14: Del 01 de marzo de 2024 al 07 de marzo de 2024.
Semana 15: Del 08 de marzo de 2024 al 14 de marzo de 2024.
Semana 16: Del 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024.
Semana 17: Del 22 de marzo de 2024 al 28 de marzo de 2024.

Se anexan los formatos MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

4.3.2. *Maquinaria y equipo contrato de obra*

Se utilizo la siguiente maquinaria:

- 1 retroexcavadora CAT 426C
- vibro compactador DYNAPAC

Se utilizo el siguiente equipo:

- 1 vibrador de concreto (0.50 Mpa)
- 1 mezcladora (1.5 bultos)

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

4.3.3. *Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra*

Durante el presente periodo se cuenta con el siguiente personal para este convenio:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	DIANA MILEIDY FIESCO	Contadora	15/01/2024	Prestación de servicios
2	RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA	Residente	15/01/2024	Prestación de servicios
3	MIGUEL ANGEL PUYO VITECHE	obrero	04/03/2024	Obra labor
4	HENRY TRUJILLO SANTOFIMIO	obrero	04/03/2024	Obra labor
5	YEFERSON ANDRES PUYO VITECHE	obrero	04/03/2024	Obra labor
6	LUIS FERNANDO BAUTISTA PUYO	obrero	04/03/2024	Obra labor
7	URBANO ILLERA ARTEAGA	obrero	04/03/2024	Obra labor
8	CARLOS FERNEY DOMINGUEZ CASAMACHIN	oficial de obra	04/03/2024	Obra labor

La OAC cancela la ARL del Ingeniero Residente, el resto de la seguridad social es cancelada por cada uno de ellos.

4.3.4. *Informe financiero y presupuestal contrato de obra*

De acuerdo con el convenio solidario No. 3518 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1117123 de fecha 2023-10-09 por valor $ 188.457.015,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS – COLOMBIA RURAL. NACIONAL

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

Se anexa formato de INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".
Se anexa formato de "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

4.3.5. Estado general del tiempo

Durante el presente periodo predomino el tiempo seco, se presentaron lluvias moderadas los días 21, 26 y 27 de marzo de 2024.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

4.3.6. Resumen ensayos de laboratorio

Debido al avance de las obras durante el presente periodo, no se realizó toma de muestras para laboratorio, las mismas se realizarán durante el próximo periodo.

4.3.7. Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Póliza de cumplimiento No. 3002981 de fecha 1/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 de fecha 18/10/2023, actualizadas según la prórroga efectuada.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.891.403,00	31/12/2023	01/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.837.104,50	30/04/2024	30/04/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.472.850,75	31/12/2023	30/04/2027
TOTAL		$104.201.358,25		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	26/09/2023	30/04/2024

No se realizan cambios con respecto a las garantías reportadas en el periodo anterior.


4.3.8. Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

En el momento se adelantan las obras siguiendo las Normas estipuladas por nuestro contratante; Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022.

4.3.9. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

Se realiza el respectivo seguimiento en los informes semanales. Para el periodo reportado se tiene un avance ejecutado de 35% con respecto a un avance programado del 46% del valor total del convenio; este atraso es justificado por el contratista aludiendo que es bajo el rendimiento de la mano de obra de personal de la zona de influencia durante la construcción de las alcantarillas. La interventoría solicito al contratista mejorar los rendimientos para ponerse al día con la programación.

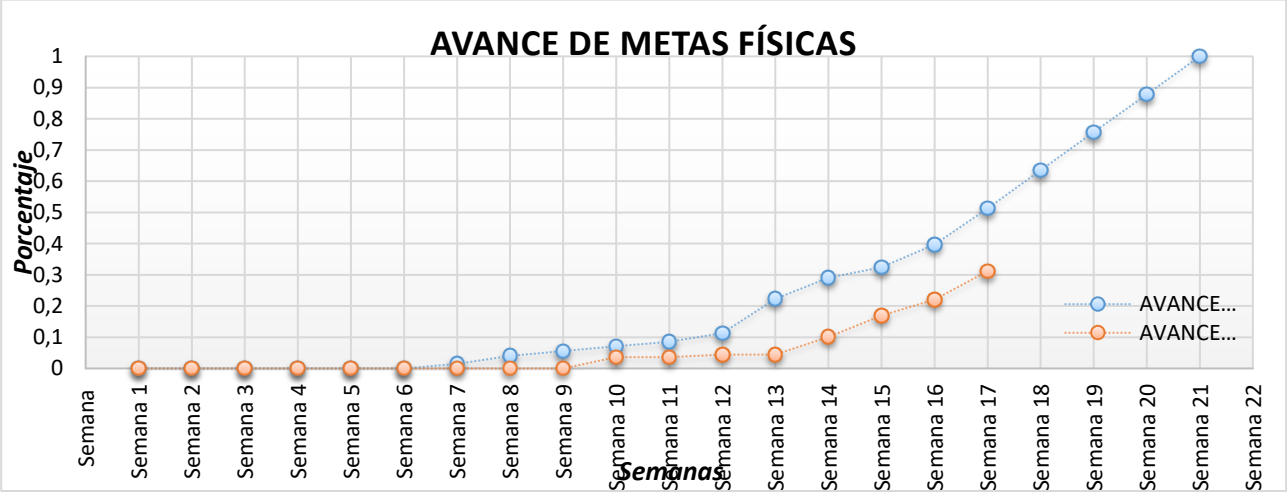

Durante el periodo reportador se realizaron actividades de obra tales como construcción de alcantarillas. Se presentaría un acta final de obra, por esta razón no se anexa el "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:
-

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
12/03/2024	comité operativo 9	se presentó cotización del vibro compactador por un valor de $ 2.400.000 (transporte incluido),se presentó un cuadro resumen de transporte y horas de maquinaria requeridos hasta la fecha y se autorizaron desembolsos
26/03/2024	comité operativo 10	se presentaron facturas y se autorizaron las transferencias de lo siguiente: nómina de 5 ayudantes y 1 oficial por el valor de $ 4.655.949, alquiler de retroexcavadora $ 7.740.000, alquiler de vibro compactador $ 2.250.000, material de ferretería CONSTRUCIVIL $ 11.428.000, pago de agregados MASSEQ $ 24.104.096, nómina del maestro 5.111.000, nómina del ing. residente $ 5.250.000 (15/01/2024 al 29/02/2024), nómina del contador 2.100.000 (15/01/2024 al 29/02/2024) para un total de $62.639.045.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información general del contrato

PROCESO DE SELECCIÓN	IP-DT-HUI-009-2023
FECHA DE PUBLICACIÓN	8/11/2023
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.PCCNTR.5570275
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4520 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/11/2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
CC	55.181.920
VALOR INICIAL	$ 75.820.315,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 75.820.315,00

ORDEN DE INICIO	2023S-VHUI-025344 de fecha 2023-12-01
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	NO APLICA
REANUDACIÓN No. 1	NO APLICA
PRÓRROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 31/03/2024
PRÓRROGA No. 2	1 MES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2024
DIRECCIÓN	Calle 18 # 42-72, Neiva – Huila
NÚMERO DE TELÉFONO	3235785141
SUPERVISOR	JOSÉ MIGUEL ORTEGA

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
- Control de permanencia del personal calificado y no calificado.
- Control del pago de parafiscales del personal que labora para el contrato.
- Archivo actualizado de la Interventoría.
- Comunicados dirigidos al contratista.
- Comunicados dirigidos al INVIAS.
- Reuniones con el contratista.
- Asistir a las reuniones citadas por el INVIAS.
- Seguimiento y acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas por el Contratista en los sectores donde se desarrollan las obras.
- Elaboración de informes semanales.
- Elaboración de informe mensual.
- Medición y cuantificación de cantidades de obra conjuntamente con el contratista de obra.
- Supervisión de ejecución de obras.
- Revisión para la aprobación definitiva de estudios y diseños de entregados por JAC de acuerdo con la instrucción del INVIAS, teniendo en cuenta los parámetros técnicos de topografía y estudios de laboratorio e in situ; así como

los diseños geométrico y estructural para la construcción de las estructuras de placa huella y alcantarilla.

5.3. Informes especialistas y profesionales

Durante el presente periodo, las labores del director y residente de interventoría consistieron en verificar que los diseños cumplan con lo dictado en la Guía de Diseño de Pavimentos con Placa-huella.

Igualmente se acompañaron las labores administrativas que permitieron vincular al personal de obra en el proyecto, así como la revisión y aprobación de proveedores de suministros y servicios requeridos tales como topografía y ensayos de laboratorio, control de pagos con transferencias bancarias, entre oros.

5.4. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

En el presente periodo se realizó la revisión para la aprobación definitiva de Estudios y Diseños requeridos para la ejecución del proyecto entregados por la JAC. Se realiza seguimiento a las obras teniendo en cuenta la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales y las Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022. Lo anterior, con el fin de obtener el diseño geométrico y estructural, soportados en un informe de aforo del tránsito que se encuentra en la vía a intervenir.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1. Equipo y vehículos contrato de interventoría

Durante el periodo reportado se contó con dos (2) motos para el residente e inspector de obra, permitiendo realizar las visitas de obra; también, con equipos de cómputo y dotación de oficina, que son requeridos para la efectuar las actividades de interventoría.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2. Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

Durante el mes de marzo de 2024 se generó pago de aportes de seguridad social del personal que se relaciona a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	No. PLANILLA
1	JOSE VALDERRAMA	Director	01/01/2024	9463702227
2	MIGUEL ÁNGEL SOTO SUÁREZ	Residente	01/01/2024	7920418958
3	DIANA CAROLINA MONTES COLLAZOS	Inspectora	01/01/2024	7920418958
4	JESÚS ALFONSO FAJARDO ARTEAGA	Inspector	01/02/2024	7920418958

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3. Información financiero y presupuestal contrato de interventoría

Con base en el CDP No. 183223 de fecha 2023-11-01. Se hizo el registro presupuestal No. 1295823 de fecha 2023-11-25 por valor $75.820.315,00 para el contrato principal. Lo anterior, sin adiciones a la fecha.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4. Seguimiento garantías contrato de interventoría

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. CHU-100010938 anexo No. 0 de fecha 21/11/2023.

AMPARO	**% AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	10%	$ 7.582.040,00	20/11/2023	31/12/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 15.164.080,00	20/11/2023	31/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 22.746.120,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 45.762.240,00**	**20/11/2023**	**31/12/2028**

- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. CHU-100010938 anexo No. 1 de fecha 29/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 7.582.040,00	28/12/2023	31/03/2025
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 15.164.080,00	28/12/2023	31/03/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 22.746.120,00	31/03/2024	31/03/2029
TOTAL		**$ 45.762.240,00**	**20/11/2023**	**30/04/2029**

- Prórroga No. 2: Póliza de cumplimiento No. CHU-100010938 anexo No. 2 de fecha 18/03/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 7.582.040,00	18/03/2024	30/04/2025
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 15.164.080,00	18/03/2024	30/04/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 22.746.120,00	30/04/2024	30/04/2029
TOTAL		**$ 45.762.240,00**		

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS", ya que no se modifica.

6.5. Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento al Plan de cargas o Reprogramación al plan de cargas aprobado:

  Se ajusta plan de cargas con fecha de terminación el 30 de abril de 2024, atendiendo la prórroga No. 2, el cual es socializado y aprobado por el supervisor del contrato de Interventoría.

  Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el convenio 4110 de 2023 de la JAC La Esmeralda, se culminaron las actividades correspondientes a la reconstrucción de las alcantarillas de 36", con la construcción de la poceta y descole en concreto reforzado. Con relación a la placa huella, cabe resaltar

la dificultad de conseguir vibro compactador para el proyecto, lo cual dificultó la compactación oportuna de la subbase granular, razón por la cual se atrasó la ejecución con relación a la programación; sin embargo, se realizó dicha labor para dar cumplimiento a la especificación técnica. Luego, se fundieron las huellas y berma-cunetas en concreto reforzado de acuerdo con el diseño.

En el convenio 3585 de 2023 de la JAC Caloto, se culminaron las actividades correspondientes a la reconstrucción de las alcantarillas de 36", con la construcción de la poceta y descole en concreto reforzado. Con relación a la placa huella, se fundieron las huellas y berma-cunetas en concreto reforzado de acuerdo con el diseño.

En el convenio 3775 de 2023 de la JAC La Reforma, se culminaron las actividades correspondientes a la reconstrucción de las alcantarillas de 36", con la construcción de la poceta y descole en concreto reforzado. Con relación a la placa huella, se fundieron las huellas y berma-cunetas en concreto reforzado de acuerdo con el diseño.

En el convenio 3518 de 2023 de la JAC San Marcos, se culminaron las actividades correspondientes a la reconstrucción de las alcantarillas de 36", con la construcción de la poceta y descole en concreto reforzado. Con relación a la placa huella, se fundieron las huellas y berma-cunetas en concreto reforzado de acuerdo con el diseño.

Se trabaja en conjunto con los representantes de las OAC para la toma de decisiones con respecto al desarrollo del convenio mediante comités operativo y reuniones en los sitios de las obras, con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de revisión y aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipo requerido en el proyecto.

Se presentaron lluvias en las zonas de construcción de las obras, que afectaron el normal desarrollo y rendimiento en la ejecución de las mismas.

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia

Durante el mes de marzo de 2024 se tuvo la siguiente trazabilidad de correspondencia de las Juntas de Acción Comunal, Interventoría y Supervisión:

- Interventoría

FECHA	COMUNICADO	DESCRIPCIÓN
13/03/2024	INVIAS 4597-2023/03	Requerimientos técnicos para control y seguimiento de las obras. JAC La Esmeralda.
13/03/2024	INVIAS 4597-2023/04	Requerimientos técnicos para control y seguimiento de las obras. JAC Caloto.
13/03/2024	INVIAS 4597-2023/05	Requerimientos técnicos para control y seguimiento de las obras. JAC La Reforma.
13/03/2024	INVIAS 4597-2023/06	Requerimientos técnicos para control y seguimiento de las obras. JAC San Marcos.

Se anexa copia de los comunicados relacionados.

8.2. Registro fotográfico

La Esmeralda.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Instalación de acero para el muro de descole. Alcantarilla No.1</td><td>Adecuación de la subrasante para iniciar la construcción de la placa huella</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Compactación de la subrasante</td><td>Construcción de placa huella, instalación de concreto de ciclópeo</td></tr>
</table>

Caloto



Construcción muro de descoles. Alcantarilla No.1 (formaleta)



Cosntrución de descole. Alcantarilla No.2 (instalación de concreto)



Construcción de placa huella (instalación de concreto ciclópeo)



Construcción de placa huella (instalación de concreto reforzado)

La Reforma



Instalación de acero para el muro de descole. Alcantarilla No.2



Compactación de la subbase

	
Construcción de placa huella (instalación de acero para riostra)	Construcción de placa huella (instalación de concreto de 3000psi)

San Marcos

	
Excavación de la poceta de la alcantarilla No. 2	Construcción muro de descole. Alcantarilla No.1 (acero y formaleta)
	
Instalación y compactación de subbase	Construcción de placa huella (acero, concreto de 2000psi y 3000psi)

8.3. Formatos y Anexos por convenio

Teniendo en cuenta que la interventoría se ejecuta en simultaneo para los proyectos activos, presentan los siguientes documentos: Informes semanales, maquinaria y equipo, personal control aportes legales y seguridad social, informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios acta parcial de pagos de convenios, estado general del tiempo, resumen ensayos de laboratorio, bitácora, comités operativos.

8.4. Formatos Interventorías Convenios Solidarios

Equipo y vehículos, personal control aportes legales y seguridad social, información financiera y presupuestal.

9.3.1 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA ESMERALDA

Acta de aprobación de Estudios y Diseños, informes semanales, maquinaria y equipo, personal control aportes legales y seguridad social, informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios acta parcial de pagos de convenios, estado general del tiempo, bitácora, comités operativos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/02/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. HUILA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Mediante la suscripción de la presente acta de aprobación de estudios y diseños, se aprueba por el Contratista y el Interventor los estudios y diseños contratados para la ejecución del Convenio 4110 de 2023 suscrito entre el Invias y la Junta de Acción Comunal de La Esmeralda del municipio de Nátaga.

CONVENIO No: 4110 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 189.622.861,00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 4 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4520 DE 2023 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
001 DE 2023	25/10/2023	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 189.622.861	$ 189.622.861

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA NÁTAGA – LA ESMERALDA – CRUCE LA MESA A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 120 ML DE PLACA HUELLA Y 2 ALCANTARILLAS.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
	Condiciones locales	1	1 A 11	NO APLICA	**NOMBRE:** INFORME LA ESMERALDA **ELAVORADO POR:** WILMER RAMÍREZ GONZÁLEZ **M.P:** 70202216243 TLM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 26/02/2024
(Día / Mes / Año)

VOL I	**Diseño geométrico**	**1**	**12 A 23**	**3**	**NOMBRE:** INFORME LA ESMERALDA **ELAVORADO POR:** WILMER RAMÍREZ GONZÁLEZ **M.P:** 70202216243 TLM **PLANOS:** PH-MODULACIO- PERFIL-ELEVACION, PH-MODULACIO-PLACAS- ACEROS, PH-SECCIONES CORTE, PH-SECCIONES RELLENO
	Condiciones climáticas e hidrológicas	**1**	**32 A 61**	**NO APLICA**	**NOMBRE:** INFORME LA ESMERALDA **ELAVORADO POR:** WILMER RAMÍREZ GONZÁLEZ **M.P:** 70202216243 TLM
	Caracteriazción de materiales	**1**	**8**	**NO APLICA**	**NOMBRE:** INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS **ELAVORADO POR:** SANDRA MILENA ORTIZ PERDOMO **M.P:** 70202152275 TLM
	Concepto de tránsito	**1**	**62 A 79**	**NO APLICA**	**NOMBRE:** INFORME LA ESMERALDA **ELAVORADO POR:** WILMER RAMÍREZ GONZÁLEZ **M.P:** 70202216243 TLM
	Concepto estructural	**1**	**24 A 30**	**5**	**NOMBRE:** INFORME LA ESMERALDA **ELAVORADO POR:** WILMER RAMÍREZ GONZÁLEZ **M.P:** 70202216243 TLM **PLANOS:** AL1-DIAGRAMA- CORTE-LONG Y PLANTA, AL1-DIAGRAMA-ACEROS MURO PANTALLA, AL1-DIAGRAMAS- ACEROS, AL2-DIAGRAMA- CORTE- LONG Y PLANTA, AL2-DIAGRAMAS-ACEROS
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio	**1**	**8**	**NO APLICA**	**NOMBRE:** INFORME DE ESTUDIO DE SUELOS **ELAVORADO POR:** SANDRA MILENA ORTIZ PERDOMO **M.P:** 70202152275 TLM
ANEXO 2	Diseño de mezclas	**2**	**2** **2**	**NO APLICA**	**NOMBRE:** "DISEÑO DE MEZCLA 3000 PSI" y "DISEÑO DE MEZCLA 2000 PSI" **ELAVORADO POR:** CARLOS ANDRES CUSCUE
ANEXO 3	Topográfia	**1**	**7**	**2**	**NOMBRE:** INFORME TOPOGRAFICO LEVANTAMIENTO DE VIA TERCIARIA PARA PROYECTO DE PLACA HUELLA **ELAVORADO POR:** NELSON EDUARDO OSSO HERRERA **L.P**: 0121701
ANEXO 4	Memorias de cálculo	**1**	**4**	**NO APLICA**	**NOMBRE:** "MEMORIAS DE CALCULO" **ELAVORADO POR:** WILMER RAMÍREZ GONZÁLEZ **M.P:** 70202216243 TLM

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

OUIEN ENTREGA

Firma: RAFAEL RUIZ YARA

RAFAEL RUIZ YARA
Representante legal de la Junta de Acción Comunal de La Esmeralda del municipio de Nataga
Contratista

Firma:

WILMER RAMIREZ GONZALES
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No: 70202216243 TLM

OUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Representante legal

Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Unidad Ejecutora
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4110 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 14 del 1/03/2024 al 7/03/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 12 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,2 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 121 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	4110 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.622.861,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.622.861,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.622.861			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.622.861			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.559.788,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75.026.687,64	53,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 29.648.592,56	20,94%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 45.378.095,08	32,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.740.380,92	9,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.289.615,56	5,15%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 5.450.765,36	3,85%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.246.794,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.279,00**	**22,70%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 26.117.930,19	61,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 13.202.640,00	30,84%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.622.861,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 101.144.617,83	53,62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 42.851.232,56	22,72%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 53.887.393,50	71,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 188.622.861,00**	**100,00%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ 8.515.300,00	4,51%
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 101.142.722,00	53,62%

Observaciones:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 53%
Meta Física Ejecutada % 21%
Avance o Atraso Físico % 32%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	12
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	121
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	12				100,0%
Ejec					
Prog	1,2				100,0%
Ejec					
Prog	121				100,0%
Ejec					
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Esmeralda

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	Km. 5 Vía Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
se recibio la infromacion por parte de la JAC y sera revisada por el profesional ambiental de interventoria

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 9
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda. La Esmeralda - Nataga

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 20/12/2023
comite operativo #2: 21/12/2023
comite operativo #3: 19/01/2024
comite operativo #4: 01/02/2024
comite operativo #5: 05/02/2024
comite operativo #6: 13/02/2024
comite operativo #7: 17/02/2024
comite operativo #8: 22/02/2024
comite operativo #9: 06/03/2024


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

el dia 06/03/2024 se realiza comité No.9 se realizó balance fianaciero del proyecto en cuanto a maquinaria, materiales y personal, se realiza solicitud de requerimientos de gestion social y ambiental en cuan to al avance del fisico ya se realizo le reposicón de alcantarillas No. 2, y esta en ejecucion alcantarilla No. 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

a) se tiene programado que la maquina motoniveladora llegue al sitio de obra el lunes 11 de marzo de 2024 y se realicen actividades de nivelacion del tereno.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

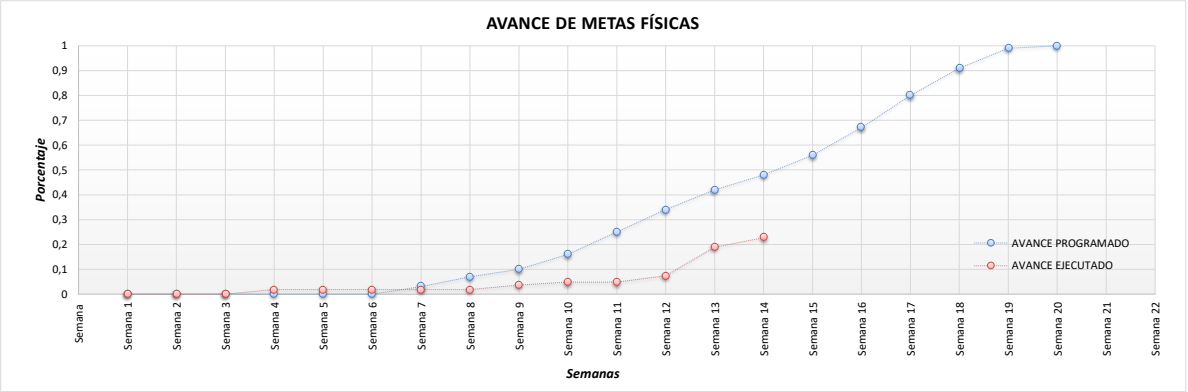

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



alcantarilla No.1



acero muro de contención y descole alcantarilla No.1



descole alcantarilla No.2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTROL PERMANANTE DE AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFIACAIONES TECINCAS DE LAS ACTIVIADES DESARROLLADAS EN OBRA, REALIZAR COMITES PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE OBRA (SUMINISTROS, EQUIPOS Y PRESONAL)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4110 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 15 del 8/03/2024 al 14/03/2024. Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 12 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,2 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 121 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	4110 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.622.861,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.622.861,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.622.861			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.622.861			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.559.788,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 86.351.470,68	61,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 29.648.592,56	20,94%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 56.702.878,12	40,06%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.324.783,04	8,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 11.324.783,04	8,00%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.246.794,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.279,00**	**22,70%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 29.115.069,72	68,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 18.802.640,00	43,91%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 879,59	
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.622.861,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 115.466.540,40	61,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 48.451.232,56	25,69%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 63.785.550,90	84,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 188.622.861,00**	**100,00%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ 21.334.961,00	11,31%
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 122.477.683,00	64,93%

Observaciones:

PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.515.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 61%
Meta Física Ejecutada % 21%
Avance o Atraso Físico % 40%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	12
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	121
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	12				100,0%
Ejec					
Prog	1,2				100,0%
Ejec					
Prog	121				100,0%
Ejec					
Prog	1				100,0%
Ejec	2				200,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Esmeralda

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	
Total	1	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	Km. 5 Vía Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
se recibio la infromacion por parte de la JAC y sera revisada por el profesional ambiental de interventoria

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 9
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda. La Esmeralda - Nataga

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 20/12/2023
comite operativo #2: 21/12/2023
comite operativo #3: 19/01/2024
comite operativo #4: 01/02/2024
comite operativo #5: 05/02/2024
comite operativo #6: 13/02/2024
comite operativo #7: 17/02/2024
comite operativo #8: 22/02/2024
comite operativo #9: 06/03/2024
ACTA DE VEEDURIA: Pendiente radicar en personeria.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 13/03/2024 ser realizo visita por parte delagados de la supervision para revisar avance fisico de la obra, durante la semana se realizacon actividades de figurado de acero (vigas riostra y bordillos) y el dia 14/03/2024 se inicio labores de nivelacion del terreno con ayuda de maquinaria (motoniveladora); el 11/03/2024 en comite operativo No. 10 se revisó valor del transporte convenido inicialmente por $720,000 el cual se ajusto con el proveedor los siguiente: los 10 viajes realizados por un valor de $650,000 y los faltantes a $600,000. con esto se ajusto y autorizó el desembolso No. 13: caja menor a BRAYAN ARMED YUCUMA CHAMBO ($ 250.000), retencion en la fuente del mes de febrero a BRAYAN ARMED YUCUMA CHAMBO ($ 41.000), avance al maestro ABEL CASTAÑEDA SANCAHEZ ($ 2.000.000), transporte de agregados, cemento y alquiler de retroexvadora ($ 12.008.500), valla informativa EDWIN EDUARDO SILVA ($ 450.000), anticipo del alquiler de la motoniveladora JOSE MARCOS SUNS PENCUE ($ 3.960.000) y nomina del oficial de obra LUIS ALFREDO AMAYA ($ 225.461), para un total de $ 18.934.961; igualmente de se autorizo desembolso No. 14 para el pago final del alquiler de la motoniveladora JOSE MARCOS SUNS PENCUE $2,400,000

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

a) toma de densidades e inicio la construccion de la placa huella el dia 18/03/2024

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

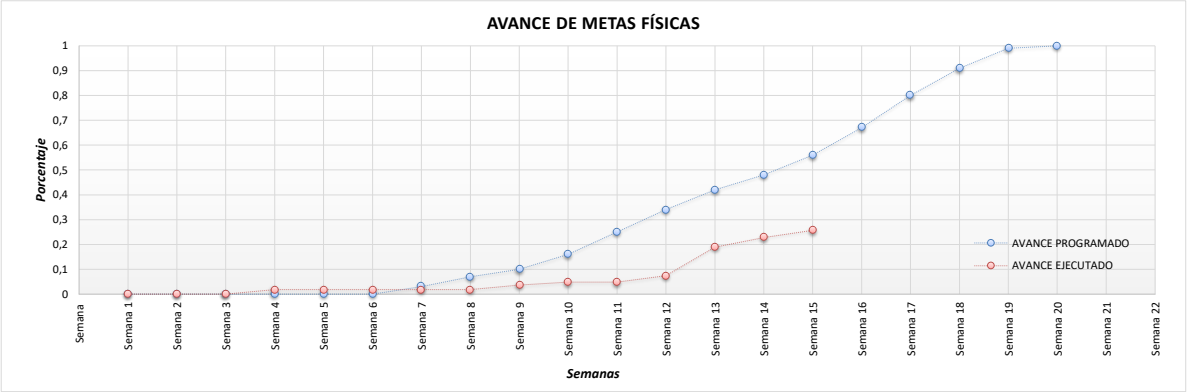

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISITA INVIAS



FIGURADO DE ACERO



NIVELACION DE TERRENO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONTROL PERMANANTE DE AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFIACAIONES TECINCAS DE LAS ACTIVIADES DESARROLLADAS EN OBRA, REALIZAR COMITES PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE OBRA (SUMINISTROS, EQUIPOS Y PRESONAL)	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4110 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 16 del 15/03/2024 al 21/03/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 12 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,2 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 121 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	4110 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.622.861,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.622.861,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.622.861			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.622.861			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.559.788,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 100.507.449,48	71,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 44.850.978,66	31,68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 55.656.470,82	39,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.155.978,80	10,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 15.202.386,10	10,74%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 1.046.407,30	0,74%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.246.794,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 1.231.570,26	29,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.279,00**	**22,70%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 32.540.372,04	76,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 24.802.640,00	57,93%

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 68.734.629,60	90,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%

SI **NO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 879,59	
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.622.861,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 134.279.391,78	71,19%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 69.653.618,66	36,93%
SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 188.622.861,00**	**100,00%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ 11.607.039,00	6,15%
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 139.315.202,00	73,86%

Observaciones:

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ENERO

VALOR FACTURA: $ 16.515.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 71%

Meta Física Ejecutada % 32%

Avance o Atraso Físico % 39%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	12
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	121
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	12				100,0%
Ejec					
Prog	1,2				100,0%
Ejec					
Prog	121				100,0%
Ejec	16,9				14,0%
Prog	1				100,0%
Ejec	2				200,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	
Total	1	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Esmeralda

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	Km. 5 Via Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
se recibio la infromacion por parte de la JAC y sera revisada por el profesional ambiental de interventoria

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 9

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda. La Esmeralda - Nataga

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 20/12/2023
comite operativo #2: 21/12/2023
comite operativo #3: 19/01/2024
comite operativo #4: 01/02/2024
comite operativo #5: 05/02/2024
comite operativo #6: 13/02/2024
comite operativo #7: 17/02/2024
comite operativo #8: 22/02/2024
comite operativo #9: 06/03/2024
ACTA DE VEEDURIA: Pendiente radicar en personeria.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El día 19/03/2024 se realizó la toma de densidades en campo, el material estaba saturado por lluvias constantes por lo tanto se solicito debida compactación con el uso de vibro compactador para dar inicio a la construcción de la placa huella y reprogramar toma de densidades; es de anotar que en el transcurso de la semana se presentaron lluvias que han impidido la normal ejecución de las obras. El día 20/03/2024 se iniciaron actividades de compactación del terreno con vibro compactador.
NOTA: Debido a que la vereda se encuentra lejos del caso urbano ha sido difícil conseguir Vibrocompactador; se tenía previsto el prestamo del vibro por parte de alcaldía de Tesalia, pero por tramites administrativos no fue posible. ademas por la lejania de la vereda las cotizaciones presentadas son de elevado costo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar con las actividades de construccion de placa huella mediante la instalacion de acero, instalacion de formaleta, fundicion de concreto.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

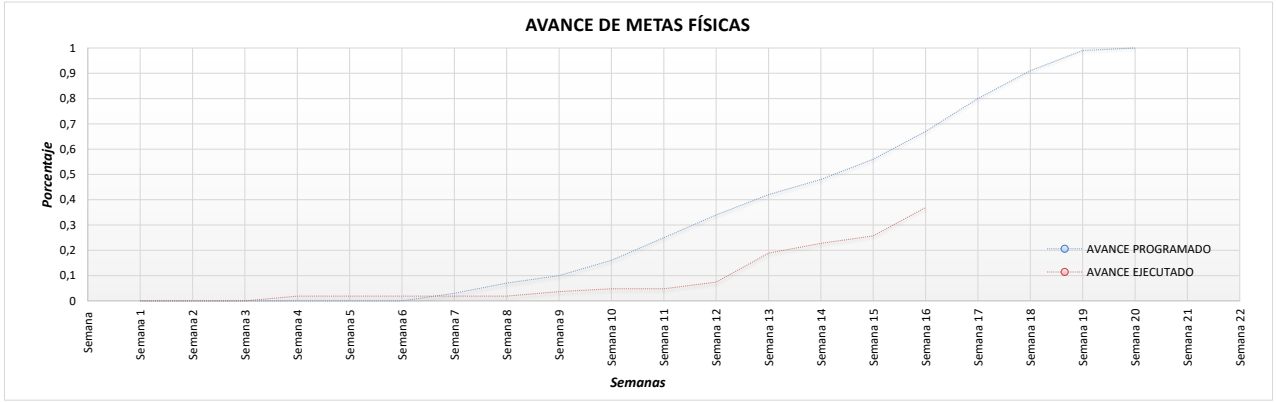

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMPACTACION DEL TERRENO



FORMALETA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA



CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTROL PERMANANTE DE AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFIACAIONES TECINCAS DE LAS ACTIVIADES DESARROLLADAS EN OBRA, REALIZAR COMITES PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE OBRA (SUMINISTROS, EQUIPOS Y PRESONAL)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4110 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 17 del 22/03/2024 al 28/03/2024 — Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 12 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,2 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 121 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NATAGA - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	4110 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.622.861,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.622.861,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA No. 2:	18/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.622.861			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.622.861			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.559.788,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 124.572.613,44	88,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 51.953.667,66	36,70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 72.618.945,78	51,30%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.065.163,96	17,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.102.689,00	5,02%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (16.962.474,96)	-11,98%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.246.794,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 2.165.864,94	51,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.279,00**	**22,70%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 35.965.674,36	84,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 24.802.640,00	57,93%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 879,59	

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.683.708,30	97,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.622.861,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 162.704.152,74	86,26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 76.756.307,66	40,69%

SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 188.622.861,00**	**100,00%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ -	
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 139.315.202,00	73,86%

Observaciones:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ENERO

VALOR FACTURA: $ 16.515.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 88%

Meta Física Ejecutada % 37%

Avance o Atraso Físico % 51%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	12
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	121
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	12				100,0%
Ejec					
Prog	1,2				100,0%
Ejec					
Prog	121				100,0%
Ejec	24,79				20,5%
Prog	1				100,0%
Ejec	2				200,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Esmeralda

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	Km. 5 Vía Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
se recibió la información por parte de la JAC y será revisada por el profesional ambiental de interventoría

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vda. La Esmeralda - Nátaga

OBSERVACIONES:

comité operativo #1: 20/12/2023
comité operativo #2: 21/12/2023
comité operativo #3: 19/01/2024
comité operativo #4: 01/02/2024
comité operativo #5: 05/02/2024
comité operativo #6: 13/02/2024
comité operativo #8: 22/02/2024
comité operativo #9: 06/03/2024
comité operativo #10: 11/03/2024
ACTA DE VEEDURIA: Pendiente radicar en personería.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo reportado se realizó construcción de placa huella realizando actividades de excavaciones varias sin clasificar, instalación de formaleta, fundición de concreto reforzado resistencia 21 MPA, concreto ciclópeo resistencia 14 MPA y acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2; es de resaltar que debido a las festividades de la semana santa, solo se trabajo los días lunes, martes y miércoles,

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la próxima semana se continuará con las actividades de construcción de placa huella mediante la instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta, fundición de concreto rígido y ciclópeo. Se realizará reunión en el sitio de las obras con el personal del contratista revisando programación y acciones a llevar a cabo para terminar dentro del plazo establecido.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

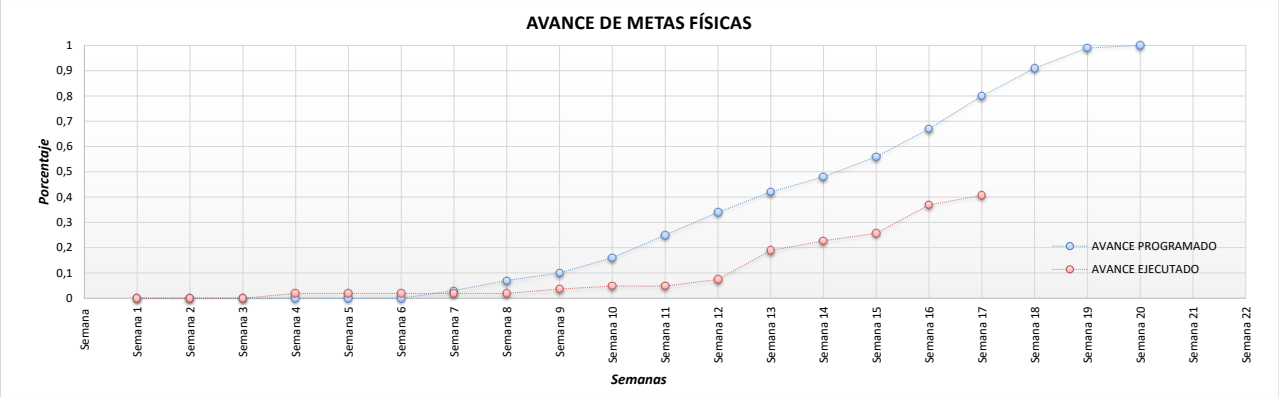

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE FORMALETA



FUNDICION DE CICLOPEO



INSTALACION DE ACERO PARA LA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONTROL PERMANANTE DE AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFIACAIONES TECINCAS DE LAS ACTIVIADES DESARROLLADAS EN OBRA, REALIZAR COMITES PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE RECURSOS PARA LOS REQUERIMIENTOS DE OBRA (SUMINISTROS, EQUIPOS Y PRESONAL)	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Sub Dirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Huila

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** Mantenimineto y mejoramiento vial en el marco del programa " Caminos para la paza total"

CONVENIO No. 4110 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JAC Vereda la Esmeralda Municipio de Nátaga Huila.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4520 de 2023 **INTERVENTORÍA:** Silvia Lorena Ordoñez Obrando

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA	CAT 416E	18 TON	V LA ESMERADA																															
MEZCLADORA	TIPO TROMPO	1½ DE BULTO	V LA ESMERADA	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X	
COMPACTADOR	TIPO CANGURO	1 TON	V LA ESMERADA	X	X																													
VIBRADOR CONCRETO	TIPO AGUJA	0.50 Mpa	V LA ESMERADA	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X			X	
MOTONIVELADORA	CAT 120 E	120 e	V LA ESMERADA														X	X	X															
VIBRO COMPACTADOR	DYNAPAC	CA-15	V LA ESMERADA																				X											
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A			A	
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): la Motoniveladora tubo problemas mecanicos con las llantar (pinchazo) se demoro medio dia la reparación. El vibro compactador se presento desgarte de liquidos hidraulicos pero se reparo en la mañana.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligaci
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: WILMER RAMIREZ G
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 702022-16243TLM

Firma
Nombre: Miguel Angel Soto Suarez
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0649262 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No: 4110 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-24 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4620 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
1	alexander oteca yucuma	1084578457	Obrero	$ 1.300.000												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC LA ESMERALDA	$ 823.334	$ 57.400	V	Sanitas	9464009428	$ 33.000	Porvenir	9464009428	$ 131.800	$ 33.000	N/A	N/A	N/A	N/A
2	luiyi yulieth piñacue ruiz	1079408627	Obrero	$ 1.300.000												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC LA ESMERALDA	$ 823.334	$ 57.400	V	Nueva EPS movilidad	9464009428	$ 33.000	Porvenir	9464009428	$ 131.800	$ 33.000	N/A	N/A	N/A	N/A
3	luis uriel sicacha paez	7276034	Obrero	$ 1.300.000												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC LA ESMERALDA	$ 823.334	$ 57.400	V	Sanitas	9464009428	$ 33.000	Porvenir	9464009428	$ 131.800	$ 33.000	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Yazmin Mañosca Yucuma	55197602	Obrero	$ 1.300.000												X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC LA ESMERALDA	$ 823.334	$ 57.400	V	Nueva EPS movilidad	9464009428	$ 33.000	Porvenir	9464009428	$ 131.800	$ 33.000	N/A	N/A	N/A	N/A
5	fabio nelson yucuma andapiña	1084578872	Obrero	$ 1.300.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC LA ESMERALDA	$ 520.000	$ 36.200	V	Sanitas	9464009428	$ 20.800	Porvenir	9464009428	$ 83.200	$ 20.800	N/A	N/A	N/A	N/A
6	willian andres olivera saenz	1075299824	Obrero	$ 1.300.000																			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC LA ESMERALDA	$ 520.000	$ 36.200	V	Nueva EPS movilidad	9464009428	$ 20.800	Colfondos	9464009428	$ 83.200	$ 20.800	N/A	N/A	N/A	N/A
7	luis alfredo amaya	12271811	Oficial	$ 1.838.000																									X	X	X	X	X	X	JAC LA ESMERALDA	$ 306.334	$ 21.400	V	Sanitas	9464009428	$ 12.300	Colpensiones	9464009428	$ 49.100	$ 12.300	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

WILMER RAMIREZ GONZALEZ
C.C. 7.715.590 de Neiva (H)

Firma
Nombre: WILMER RAMIREZ GONZALEZ
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 70202216243TLM

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 4 **MES:** mar-24 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4110/2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 188.622.861,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO: OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4225-2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA	9464009428	4/03/2024	APORTES EN LINEA	$ 1.437.900	1	SEGURIDAD SOCIAL
CUENTA DE COBRO	1	4/03/2024	MARLENY RAMON OSPINA	$ 2.100.000	1	HONRARIOS FEBREO MARZO
CUENTA DE COBRO	2	4/03/2024	WILMER RAMIREZ GONZALEZ	$ 3.500.000	1	HONORARIOS FEBRERO
FACTURA	FEN 241	1/03/2024	JESUS ODERAY LOSADA RAMIREZ	$ 210.000	3	CUARTONES Y POLINES
FACTURA	JL 1096	22/02/2024	FERRETERIA LA TERCERERA- JOSE LUIS ESTEBAN	$ 363.000	2	HERRAMIENTA MENOR Y MATERIALES
FACTURA	FEV 128	4/03/2024	FORMALEQUIPOS WM SAS	$ 904.400	2	ALQUILER DE CANGURO
CUENTA DE COBRO	3	11/03/2024	BRAYAN ARMET CHAMBO YUCUMA	$ 291.000	1	RETENCIONES FEBRERO-CAJA MENOR
CUENTA DE COBRO	2	11/03/2024	ABEL CASTAÑEDA SANCHEZ	$ 2.000.000	1	MAESTRO DE OBRA
CUENTA DE COBRO	1	8/03/2024	DIEGO MAURICIO CASTILLO VARILA	$ 6.435.000	4	TRASPORTES AGREGADOS - CEMENTO
CUENTA DE COBRO	2	8/03/2024	DIEGO MAURICIO CASTILLO VARILA	$ 5.573.500	2	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA
FACTURA	FE 36	11/03/2024	EDWIN EDUARDO SILVA	$ 450.000	1	VALLA PUBLICITARIA
CUENTA DE COBRO	1	11/03/2024	JOSE MARCOS SUNS PENCUE	$ 3.960.000	2	ALQUILER DE MOTONIVELADORA-ANTICPO
NOMINA	1	11/03/2024	LUIS ALFREDO AMAYA	$ 225.461	5	NOMINA OFICIAL FEBRERO
CUENTA DE COBRO	2	11/03/2024	JOSE MARCOS SUNS PENCUE	$ 2.400.000	2	ALQUILER DE MOTONIVELADORA-PAGO FINAL
CUENTA DE COBRO	1	11/03/2024	DUBER NEY ORTIZ	$ 2.092.800	2	ALQUILER MEZCLADORA-VIBRADOR DE CONCRETO
FACTURA	JL 1122	11/03/2024	FERRETERIA LA TERCERERA- JOSE LUIS ESTEBAN	$ 13.593.580	3	CAL AGRICOLA- VALDES DE CONSTRUCCION
NOMINA	2	14/03/2024	ALEXANDER OTECA YUCUMA	$ 679.000	5	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO
NOMINA	2	14/03/2024	LUIYI YULIETH PIÑACUE RUIZ	$ 679.000	5	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO
NOMINA	2	14/03/2024	LUIS URIEL SICACHA PAEZ	$ 679.000	5	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO
NOMINA	2	14/03/2024	YAZMIN MAÑOSCA YUCUMA	$ 679.000	5	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO
NOMINA	2	14/03/2024	FABIO NELSON YUCUMA ANDAPIÑA	$ 679.000	5	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO
NOMINA	2	14/03/2024	WILIAM ANDRES OLIVERA SAENZ	$ 679.000	5	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO
NOMINA	2	14/03/2024	LUIS ALFREDO AMAYA	$ 1.156.480	5	NOMINA 1 AL 15 DE MARZO
CUENTA DE COBRO	1	18/03/2024	WILLIAN ANDRES OLIVERA SAENZ	$ 300.000	1	ARRENDO BODEGA
CUENTA DE COBRO	4	18/03/2024	BRAYAN ARMET CHAMBO YUCUMA	$ 240.000	4	TRANSPORTE DE CAL
FACTURA	T124	14/03/2024	G Y J FERRETERIA	$ 571.200	3	ALAMBRE RECOCIDO
FACTURA	JL 1125	14/03/2024	FERRETERIA LA TERCERERA- JOSE LUIS ESTEBAN	$ 189.000	3	DISCOS DE CORTE
CUENTA DE COBRO	1	20/03/2024	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA MEDINA	$ 1.782.000	4	SERVICIO DE GRUA VIBRO
FACTURA	FEV 367	20/03/2024	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	$ 800.000	2	ALQUILER DE GRUA
FACTURA	JL 1136	20/03/2024	FERRETERIA LA TERCERERA- JOSE LUIS ESTEBAN	$ 1.272.689	3	ANTISOL X 20 KL
CUENTA DE COBRO	3	21/03/2024	ABEL CASTAÑEDA SANCHEZ	$ 3.000.000	1	MAESTRO DE OBRA

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
						2 de 2
1	ADMINISTRATIVO	$ 42.816.279,00	$ 13.267.517,00	$ 13.078.900,00	$ 26.346.417,00	$ 16.469.862,00
2	HERRAMIENTA Y EQUIPO	$ 19.080.727,00	$ 1.286.000,00	$ 16.093.700,00	$ 17.379.700,00	$ 1.701.027,00
3	MATERIAL	$ 88.560.821,00	$ 70.388.996,04	$ 15.836.469,00	$ 86.225.465,04	$ 2.335.355,96
4	TRANSPORTE	$ 16.987.325,00	$ 3.412.000,00	$ 8.457.000,00	$ 11.869.000,00	$ 5.118.325,00
5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	$ 16.930.915,00	$ 4.255.066,00	$ 5.230.480,00	$ 9.485.546,00	$ 7.445.369,00
6	PAGA	$ 4.246.794,00				$ 4.246.794,00
	TOTALES	$ 188.622.861,00	$ 92.609.579,04	$ 58.696.549,00	$ 151.306.128,04	$ 37.316.732,96

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (FEBRERO) : $ 879,59

(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 3.535,88

(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
	$ 879,59		FEBRERO		$ 3.535,88

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

RAFAEL RUIZ YARA

Firma:
Nombre: **RAFAEL RUIZ YARA**
Representante Legal o Delegado
Contratista

WILMER RAMIREZ GONZALEZ
C.C. 7.715.590 de Neiva (H)

Firma:
Nombre: **WILMER RAMIREZ GONZALEZ**
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: **SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO**
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 4

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 4110-2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO: OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA: K17+380 de la vía NÁTAGA – LA ESMERALDA – CRUCE LA MESA código 41483-7

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4225-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 4 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 188.622.861,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 188.622.861,00

PLAZO (MESES): 3

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	APORTES EN LINEA	900147238	9464009428	04/03/2024	$ 1.437.900,00	$ -	$ 1.437.900,00
2	MARLENY RAMON OSPINA	36383428	1	04/03/2024	$ 2.100.000	$ -	$ 2.100.000
3	WILMER RAMIREZ GONZALEZ	7715590	2	04/03/2024	$ 3.500.000	$ -	$ 3.500.000
4	JESUS ODERAY LOSADA RAMIREZ	12274034	FEN 241	01/03/2024	$ 200.000,00	$ 10.000,00	$ 210.000,00
5	FERRETERIA LA TERCERERA- JOSE LUIS ESTEBAN	1079412646	JL-196	22/02/2024	$ 305.042,00	$ 57.958,00	$ 363.000,00
6	FORMALEQUIPOS WM SAS	901368830	FEV 128	04/03/2024	$ 760.000,00	$ 144.400,00	$ 904.400,00
7	BRAYAN ARMET CHAMBO YUCUMA	1084579226	3	11/03/2024	$ 250.000,00		$ 250.000,00
8	DIAN	800197268-4	4910782342324	13/02/2024	$ 41.000,00		$ 41.000,00
9	ABEL CASTAÑEDA SANCHEZ	12276221	2	11/03/2024	$ 2.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00
10	DIEGO MAURICIO CASTILLO VARILA	1084578394	1	08/03/2024	$ 6.435.000,00	$ -	$ 6.435.000,00
11	DIEGO MAURICIO CASTILLO VARILA	1084578394	2	08/03/2024	$ 5.573.500,00	$ -	$ 5.573.500,00
12	EDWIN EDUARDO SILVA	12281864	FE 36	11/03/2024	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
13	JOSE MARCOS SUNS PENCUE	12276230	1	11/03/2024	$ 3.960.000,00		$ 3.960.000,00
14	LUIS ALFREDO AMAYA	12271811	1	11/03/2024	$ 225.461,00	$ -	$ 225.461,00
15	JOSE MARCOS SUNS PENCUE	12276230	2	11/03/2024	$ 2.400.000,00	$ -	$ 2.400.000,00
16	DUBER NEY ORTIZ	55197602	1	11/03/2024	$ 2.092.800,00	$ -	$ 2.092.800,00
17	FERRETERIA LA TERCERERA- JOSE LUIS ESTEBAN	1075302647	JL 1122	11/03/2024	$ 1.359.350,00	$ -	$ 1.359.350,00
18	ALEXANDER OTECA YUCUMA	1084578457	2	14/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
19	LUIYI YULIETH PIÑACUE RUIZ	1079408627	2	14/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
20	LUIS URIEL SICACHA PAEZ	7276034	2	14/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
21	YAZMIN MAÑOSCA YUCUMA	55197602	2	14/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
22	FABIO NELSON YUCUMA ANDAPIÑA	1084578872	2	14/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
23	WILIAM ANDRES OLIVERA SAENZ	1075299824	2	14/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
24	LUIS ALFREDO AMAYA	12271811	2	14/03/2024	$ 1.156.480,00	$ -	$ 1.156.480,00
25	WILLIAN ANDRES OLIVERA SAENZ	1075299824	1	18/03/2024	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
26	BRAYAN ARMET CHAMBO YUCUMA	1084579226	4	18/03/2024	$ 240.000,00	$ -	$ 240.000,00
27	G Y J FERRETERIA	800130426	T124	14/03/2024	$ 480.000,00	$ 91.200,00	$ 571.200,00
28	FERRETERIA LA TERCERERA- JOSE LUIS ESTEBAN	1079412646	JL 1125	14/03/2024	$ 158.824,00	$ 30.176,00	$ 189.000,00
29	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA MEDINA	12281944	1	20/03/2024	$ 1.782.000,00	$ -	$ 1.782.000,00
30	ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA	1081404091	1	20/03/2024	$ 800.000,00	$ -	$ 800.000,00
31	FERRETERIA LA TERCERERA- JOSE LUIS ESTEBAN	1075302647	JL 1136	20/03/2024	$ 1.065.126,00	$ 207.563,00	$ 1.272.689,00
32	ABEL CASTAÑEDA SANCHEZ	12276221	3	21/03/2024	$ 3.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 46.146.483,00	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 127.994.085
VALOR IVA	$ 541.297,00	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 12.087.217
TOTAL PAGOS	$ 46.687.780,00	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 140.081.302

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: RAFAEL RUIZ YARA

Nombre: **RAFAEL RUIZ YARA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma: WILMER RAMIREZ GONZALEZ C.C. 7.715.590 de Neiva (H)

Nombre: **WILMER RAMIREZ GONZALEZ**
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Firma:

Nombre: **SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202093187 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Sub Dirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Huila

CONVENIO DE OBRA No: 4110 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JAC Vereda la Esmeralda Municipio de Nátaga Huila.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Marzo **PROYECTO:** Mantenimineto y mejoramiento vial en el marco del programa " Caminos para la paza total"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4520 de 2023 **INTERVENTOR:** Silvia Lorena Ordoñez Obrando

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	X	X		X	X		X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X		X				X	X					240
Lluvias moderadas						X		X													X		X		X					X		36
Lluvias intensas																																
Total horas	12	12		12	12	6	12	6	12		12	12	12	12	12	12		12	12	12	6	12	6		6	12	12	12	12	6		**276**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

En el mes se presento solo seis días con lluvias moderadas y fuertes en la mañana, el cual retraso las labores en medio día, sin embargo la programación de obra no se retrazo lo suficiente para descompensar las actividades programadas según el cronograma de ejecución de obra, para le vereda la esmeralda Nátaga Huila

Firma
Nombre: WILMER RAMIREZ G
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 702022-16243TLM

Firma
Nombre: Miguel Angel Soto Suarez
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0649362 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

1 Marzo 2024

Personal de Obra

1 Maestro de Obra: Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra: Luis Alberto Anaya Narvaez.
3 Obrero : Alexander Otero Jacome.
4 Obrero : Leiyi Yoliet Pinzon Ruiz
5 Obrero : Luis Uriel Sicacha Paez
6 Obrero : Yasmin Mañosca Jacome
7 Obrero : Fabio Nelson Jacome Andapiña
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz

Condiciones Climaticas: Dia Soleado Temperatura 21°
Indice UV Alto Humedad 69.%
Velocidad 5 km/h

Actividades Programadas.

Se trabaja en la Alcantarilla 2. despues de conformar el terreno y acopiar el material de excavacion se trabaja en el descole destormaleteando y conformando el terreno a los lados de las aletas de la misma forma se extrae el materia de excavacion acopiado.

Se trabaja en la Alcantarilla 1 despues de formaletear la poceta se progama a fundir el concreto con el personal al finalizar el dia esta fundida la caja poceta del descole por otra parte se inicia la excavacion manual del muro de contencion de 6 m como descole de la Alcantarilla: De igual forma se continua flejando y cortando acero para las portilla de la placa huella y riostras. y bordillos.

Elementos de Proteccion Personal EPP
Uniforme, Guantes, Gafas, Botas

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

2 Marzo 2024

Personal de Obra

1	Maestro de Obra	Abel Castañeda Sanchez
2	Oficial de Obra	Luis Alberto Amaya Narvaez
3	Obrero	Alexander Ofeca Guarnea
4	Obrero	Jorge Yeliet Pinzon Ruiz.
5	Obrero	Luis Oriel Sicacha Paez
6	Obrero	Yasmin Manosco Guarnea
7	Obrero	Fabio Nelson Guarnea Andapino
8	Obrero	William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climatica: Dia Soleado Temperatura 24°Amb
Indice UV Humedad 65%
Moderado Viento 6 km/h

Actividades Programadas.
Se trabaja en la Alcantarilla 2, despues de conformar el material del descole se empieza con el relleno de la tubería lado del descole.
Se trabaja en la Alcantarilla 1. despues de fundir la pacta se continua trabajando en la excavacion para el muro de contencion, tomando niveles, para localizar la zapata del muro.

Elementos de Protección Personal EPP
Uniforme, Guantes, Gafas, Botas

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

4 Marzo 2024

Personal de Obra
1 Maestro de Obra : Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Amaya Narvaez
3 Obrero : Alexander Oteca Jovanca
4 Obrero : Loiyi Yulieth Piñawe Ruiz
5 Obrero : Luis Uriel Sicacha Paez
6 Obrero : Yarmin Mañosca Jovanca
7 Obrero : Fabio Nelson Jovanca Andapiño
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climaticas: Día Nublado Temperatura 18 Amb
Indice UV Medio
Humedad 54%
Velocidad Viento 5. Km

Actividades Programadas
Se trabaja en la Alcantarilla 2. en el descole se inicia la limpieza del material acopiado de excavación. esto con el fin de que el agua de escorrentia Fluya normalmente y no genere erosión. de la misma forma se realizaron los retoques con el embaquillado de la tuberia y un alistado del piso de la poseta para que tenga desnivel y evacue rapidamente.
Se trabaja en la Alcantarilla 1. Continuamos con la excavación manual del muro, despues se limpia para aplicar el solado de limpieza, e iniciar la instalación del acero de la zapata y el dentellon al muro, se toma los niveles y se ajusta el nivel con la tubería a empotrar,

Elementos de Protección Personal. EPP.
Uniformes, Guantes, Gafas, Botas.

Ingeniero Residente
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

5 Marzo 2024

Personal de Obra

1 Maestro de Obra	:	Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra	:	Luis Alberto Anaya Narvaez
3 Obrero	:	Alexander Otero Guerra
4 Obrero	:	Luigi Yuliett Piñeres Ruiz
6 Obrero	:	Luis Oriel Zicacha Paez
6 Obrero	:	Yasmin Mañosca Guerra.
7 Obrero	:	Fabio Nelson Guerra Andrapina.
8 Obrero	:	William Andres Olivera Baez.

Condiciones Climaticas: Dia Nublado Temperatura 18° Aub
Indice UV Humedad 56 %
Medio Velocidad Viento 6. Km/H.

Actividades Programadas.
Se trabaja en la Alcantarilla 2. en el descole se inicia el relleno a la tuberia y parte de la via, tambien el material de excavacion se acopia alrededor de la via con el fin de habilitar el corredor.
Se trabaja en la Alcantarilla 1. Se continua con la instalacion del acero de la tapa y dentellon de la misma forma se prepara la formaleta para colocar el concreto despues de termina la instalacion de acero y formaleta, Se solicita al personal acopiar la arena sobrante de la otra alcantarilla 2 para la Alcantarilla 1 de la misma forma se solicita traer Material de Mosseq con un viaje en Volqueta Sencilla 6 M^3 de arena que falta para fundir el muro de descole a la Alcantarilla 1

Elemento Protección Personal
Uniforme, Guantes, Gafas, Botas.

Residente de Obra
Ingo Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

6 Marzo 2024.

Personal de Obra

1 Maestro de Obra : Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Amaya Narvaez
3 Obrero : Alexander Ortega Yacuma
4 Obrero : Luiy Yulieth Piñawe Ruiz.
5 Obrero : Luis Oriel Sicacha Paez.
6 Obrero : Yasmin Mañasca Yacuma
7 Obrero : Fabio Nelson Yacuma Anabapiña.
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climaticas: Dia lluvioso. Temperatura 9°Aut
Indice UV Alto Humedad, 85%
Velocidad Viento 8. km/H

La lluvia continua hasta el medio dia, trabajos despues del medio dia.

Actividades Programadas

Se trabaja en las Alcantarillas 2. Se termina de recoger el material de escombra y excavación.

Se trabaja en la Alcantarilla 1. Se funde la zarpa y el dentellon en la tarde despues de acopiar la arena.

Llega el material de masseg. un viaje de Volqueta Sencilla con 6 m³ de arena. Material Petreo.

Elementos de Protección Personal EPP

Uniformes, Guantes, Gafas, Botas.

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

7 Marzo 2024

Personal de Obra
1 Maestros de Obra : Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Amaya Narvaez
3 Obrero : Alexander Oteca Jouma
4 Obrero : Luis Uriel Sicacha Paez
5 Obrero : Luigi Gabriella Pinaque Feitz.
6 Obrero : Yasmis Mariana Jouma.
7 Obrero : Fabio Nelson Jouma Andapiña.
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climaticas: Dia Nublado Temperatura 17°C
Indice UV Alto Humedad 67%
Velocidad Viento 6 Km/H

Actividades Programadas:
Se trabaja en la Alcantarilla 1. Despues de fundir la losa y el dentellon se continua con el armado del acero para el muro de contencion, por otra parte se le aplica el alistado del piso para que tenga desnivel y evacue el agua. de igual forma se limpia el area de la poceta del material de excavación.
Asimismo se realiza limpieza de la bodega, se acopia material, lamadera, el cemento y el Acero que esta partido y cortado.

Elemento de Protección Personal EPP
Uniformes, Botas, Gafas, Botas.

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

8 Marzo 2024

Personal de Obra

1 Maestro de Obra : Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Amaya Narvaez
3 Obrero : Alexander Oteca Guanuna
4 Obrero : Luigy Yulieth Pinduse Ruiz.
5 Obrero : Luis Uriel Sicacha Paez
6 Obrero : Yasmin Mañosca Guanuna
7 Obrero : Fabio Nelson Guerra Andapinia.
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climaticas. : Dias Nuvios Temperatura 10°A
Indice UV Medio Humedad 82%
Velocidad Viento 5 Km/H

La lluvia continua hasta el medio dia, se realizan trabajos despues del medio dia.
Se trabaja en la Alcantarilla 1. despues del armado del acero en el cuerpo del muro. se inicia con la instalacion de la formaleta esta se trabaja en dos fundida para llegar a la altura programada.
por otra parte se prepara el material para el concreto a instalar, se trae arena y grava y la mezcladora con el fin de fundir la primera fase del muro.
Asi mismo se organiza el cemento que esta en la bodega de la finca con el fin de protegerlo y que no se dañe.

Elemento de Protexcion Personal EPP.
Uniforme, Guantes, Gafas, Botas.

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez.

Interventoria
Ing. Marc Angel Soto

Powered by CamScanner

9 Marzo 2024.

Personal de Obra

1) Maestro de Obra : Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra. : Luis Alberto Amaya Navarez
3 Obrero : Alexander Otero Jaimes.
4 Obrero : Leidy Yolieth Pinzon Ruiz
5 Obrero : Luis Uriel Sicacha Paez
6 Obrero : Yasmin Manosca Jaimes
7 Obrero : Fabio Nelson Yaima Andapia.
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climaticas: Dia Soleado Temperatura 21° Aprox
Indice UV Alto Humedad 80%
Velocidad Viento 7 km/H.

Trabajos Programados.
Se trabaja en la Alcantarilla 1: Despues de fundir la primera parte del muro se continua con la segunda con la instalación de la formaleta y nivelación de la misma, asi mismo se prepara el cemento para ser aplicado a la estructura y poder terminar la Alcantarilla.
Para el momento ya estan terminada las dos Alcantarillas. Se espera coordinar la maquinaria con la interventoria, la JAC la esmeralda y el supervisor por parte del Invias. en la contratación de una motoniveladora con trabajar la nivelación de la plaza Huella. de la misma forma se espera contratar el vibro compactador.

Elementos de Protección Personal EPP
Uniforme, Guantes, Gafas, Botas,

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

11 Marzo 2024

Personal de Obra

1 Maestro de Obra : Abel Castaneda Sanchez
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Anaya Narvaez
3 Obrero : Alexander Ortiz Guzman
4 Obrero : Luigi Gabriel Piñango Ruiz
5 Obrero : Luis Oriel Sicacha Paez
6 Obrero : Yasmin Manosca Guzman
7 Obrero : Fabio Nelson Guzman Andrapino
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz

Condiciones Climaticas: Dia Soleado Temperatura 22° Amb
Indice UV Medio Humedad 50%
Velocidad Viento 5 Km/H

Actividades Programadas:
Se trabaja en el fleyado y amare del acero para la placa huella, tanto para las Riostras como para los bordillos.
de la misma forma se espera el arribo de la moto-niveladora para comenzar trabajos de conformación de la rasante para la Placa huella.
De la misma forma se solicita el material petro como arena, grava y piedra con el fin de tener los materiales a la mano de la placa huella

Elementos de Protección Personal EPP
Uniforme, guantes, Gafas, Botas.

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

12 Marzo 2024

Personal de Obra

1) Maestro de Obra : Abel Castanedas Sanchez
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Amaya Navarro
3 Obrero : Alexander Oteca Guerra.
4 Obrero : Luigi Yulieth Pitalua Ruiz.
5 Obrero : Luis Abel Sicacha Paez.
6 Obrero : Yasmin Monroy Guerra
7 Obrero : Fabio Nelson Guerra.
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climaticas: Dia Soleado Temperatura 23°C
Indice UV Humedad 45%
Medio Velocidad Viento 6 km/h

Actividades Programadas:
Se trabaja en la placa Huella, se continua con el fleyado y amarre del acero para las riostras como para los bordillos.
Se espera que llegue la motoniveladora para iniciar la conformación de la subrasante, sin embargo presento fallas mecanicas en el camino que impide el ingreso a la zona de trabajo.
de la misma forma se espera el prestamo de vibro por la alcaldia de tesalia para actividades en la placa Huella pero a la fecha se esta a la espera del permiso.

Elemento de Protección Personal EPP
Uniformes, Guantes, Gafas, Botas.

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

14 Marzo 2024

Personal de Obra.

1 Maestro de Obra : Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Analya Navaez
3 Obrero : Alexander Oteca Jacuma
4 Obrero : Luigi Julieth Pinaca Ruiz.
5 Obrero : Luis Uriel Sicaloa Paez
6 Obrero : Jasmin Mañosca Guaca.
7 Obrero : Fabio Nelson Jacuma Andapica.
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climaticas: Dia Nublado Temperatura 18° Aa
Indice UV Humedad 80%
Alto Velocidad Viento 4 km/H

Actividades Programadas

Se trabaja en la placa huella, se continua con el armado de la formaleta para la huella y el ciclopeo, tambien los tableros para los bordillos.

Llega la motoniveladora al terreno se trabaja inicialmente con la instalacion de la capa de cal en la sobrasante con el fin de mezclar el suelo y estabilizarlo despues la lanquina inicia labores de la conformacion del terreno para la placa huella. Se tomaron los ejes y se marco el ancho de la placa huella.

con el personal se organizo para sacar las piedras que salia de la conformacion de la via.

La gestion que se realizo para conseguir el vibro compactador por la Alcaldia de Tesalia fue denegada. Pendiente por localizar otro Equipo.

Elementos de Proteccion Personal EPP

Uniformes, Guantes, Gafas, Botas

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

13 Marzo 2024

Personal de Obra

1 Maestro de Obra : Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Anaya Narvaez
3 Obrero : Alexander Oteca Guarna
4 Obrero : Leiyi Yolieth Piñacue Ruiz
5 Obrero : Luis Oriel Sicacha Pasos
6 Obrero : Yasmin Mañosca Guarna
7 Obrero : Fabio Nelson Guarna Andapiño.
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz

Condiciones Climatologicas: Dia Soleado Temperatura 20° Aprox
Indice UV Medio Humedad Relativa 50%
Velocidad Viento 6 Km/H

Actividades Programadas

Se trabaja en la Placa Huella, se continua armando la formaleta para la huella y el ciclopeo, tambien los tableros para los bordillos de la PH.
Se deja listo todo el Area para la placa huella
Se espera la llegada de la motoniveladora para iniciar trabajos en la Placa Huella. Que se desbare de los problemas mecanicos.
Se tiene visita de la Interventoria y la oficina del Invias regional para evaluar las obras y el avance que se lleva al momento.
Se espera que llegue materia petreo como Arena, Grava, y Piedra para acopiar. y tener listo para iniciar la Placa Huella

Elementos de Proteccion Personal EPP
Uniformes, Guantes, Gafas, Botas

Ing Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria.
Ing. Miguel Angel Soto

15 Marzo 2024

Personal de Obra

1) Maestro de Obra : Abel Castaneda Sanchez
2) Oficial de Obra : Luis Alberto Anaya Narvaez.
3) Obrero : Alexander Otero Guerra
4) Obrero : Leidy Julieth Piñares Ruiz
5) Obrero : Luis Uriel Sicacha Paez.
6) Obrero : Yasmin Manosca Guerra
7) Obrero : Fabio Nelson Guerra Ar
8) Obrero : William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climaticas Dia Nublado Temperatura 17 °Aum
Indice UV Humedad 70%
Alto Velocidad Viento 8 Km/H

Actividades Programadas

Se trabaja en la Placa Huella, con la conformación y nivelación de la rasante y estabilidad al suelo la moto niveladora escarifica el terreno para luego perfilar el nivel de la placa huella, asi mismo el personal continua con la retirada de piedra salida por la máquina.

En la tarde tipo 3:30 PM la maquina sufre un daño se le pincho una llanta trasera del frente el cual para la actividad el operado retira la llanta y la lleva a despinchar.

- Se esta en la Espera para Conseguir un Vibro Compactador

Elementos de Protección Personal EPP

Uniformes, Guantes, Gafas, Botas.

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

16 Marzo 2024

Personal de Obra

1) Maestro de Obra : Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Amaya Narvaez
3 Obrero : Alexander Oteca Guerra
4 Obrero : Luigi Yulieth Pulgar Ruiz.
5 Obrero : Luis Uriel Sicacha Pabon
6 Obrero : Yasmin Mañoca Guerra.
7 Obrero : Fabio Nelson Guerra A.
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climaticas: Dia Nublado Temperatura 18°Aub
Indice UV Humedad 60%
Moderado Viento 8 km/H

Actividades Programadas.

Se trabaja en la Placa huella, con la conformacion y nivelacion del terreno, sin embargo se espera el repuesto de la maquinaria para continuar labores. retoma la activida a las 8:30 Am.

El personal continua con el retiro de las piedra que sale del movimiento de la motoniveladora, concreta ya el aplique del bombeo y la cuneta para la PH. termina la actividad a la 1:30 PM y la moto sale de la Obra.

Se esta pendiente de la maquina vibro para compactar El terreno.

llega a la Obra material pedrea - Arena, Grava, pendiente la Piedra.

Elementos de Proteccion Personal EPP
Uniformes, Guantes, Gafas, Botas

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

15 Marzo 2024

Personal de Obra
1 Maestro de Obra : Abel Cayetano Jerónimo
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Aragón Romero
3 Obrero : Alexander Oseil Guzmán
4 Obrero : Sergio Julieta Pineda Ruiz
5 Obrero : Luis Uriel Escocha Perez
6 Obrero : Jasmin Mariana Granados
7 Obrero : Fabio Nelson Jerónimo Andrés
8 Obrero : William Andres Olivera Torres

Condiciones Climaticas: Dia Soleado Temperatura 27°
Indice UV Regular 55%
Alto Viento V 7 km/h

Actividades Programadas:
Se trabaja en la placa huella. Se esta a la espera de conseguir el vibrocompactador sin embargo mientras llegan el equipo con las etiquetas se les da varios pasones estar cargado con material. Asi mismo se continua con el personal a acopiar los materiales y lo armado de la pantilla o rampa de acceso a la placa huella, esta se arma y se acopia al lado de la via donde se fundira o instalara, por orden del residente de la JAC, de la Mesa de la Esperanza iniciar la construcción de la placa huella, ya que la comunidad esta presionando para que la Obra se ejecute lo más Rapido posible, y habilite el corredor Vial.
Llega a la Obra material de Arena, y grava.

Elementos de Protección Personal EPP
Botas, Guantes, Gafas, Botas.

Residente de Obra
Ing. Wilmer Ramirez

Instrumentista
Ing. Miguel Angel Soto

19 Marzo 2024

Personal de Obra

1	Maestro de Obra	: Abel Castañeda Sanchez
2	Oficial de Obra	: Luis Alberto Anaya Narvaez
3	Obrero	: Alexander Oteca Guevara.
4	Obrero	: Leidy Yulieth Pinaeva Ruiz
5	Obrero	: Luis Oriel Sicacha Paez
6	Obrero	: Yasmin Mariaca Guevara
7	Obrero	: Fabio Nelson Guevara A.
8	Obrero	: William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climaticas: Dia Soleado Temperatura 28°
Indice UV Alto Humedad 65%
Velocidad Viento 6 Km/H.

Actividades Programadas:
Se trabaja en la placa Huella, se espera con el Vibro con el fin de compactar la rasante de la placa Huella sin embargo por ordenes del presidente de la vereda la Esmeralda se trabajo con la instalación de la formaleta para las losa del concreto ciclopeo y la rampa de acceso con la vivienda localizada en la alcantarilla 2.
Por otra parte llega la Interventoría con el laboratorio de suelos para tomar muestra de Densidad al suelo y Humedad, Informando que la madrugada en la zona llovio y el terreno se encontraba saturado de agua lluvia, sin embargo se tomaron 3 muestras de densidades, Pendiente que el vibro llegara a la zona para trabajar en la compactación del suelo,
Gestion que se desarrollo en la noche con el presidente y el apoyo de Invias. Para que la maquina llegara.
Elementos de Protección Personal EPP
Uniformes, Guantes, Gafas, Botas.

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoría
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

20 Marzo 2024

Personal de Obra
1) Maestro de Obra : Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Anaya Narvaez.
3 Obrero : Alexander Oteca Yonima
4 Obrero : Leigi Yolieth Ramirez Ruiz
5 Obrero : Luis Uriel Sicacha Paez
6 Obrero : Yasmin Manosca Yonima
7 Obrero : Fabio Nelson Yonima An.
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz

Condiciones Climaticas: Temperatura 28° mb Dia Soleado
Indice UV Humedad 75%
Alto Velocidad del Viento 7 km/H.

Actividades Programadas:
Se trabaja en la placa Huella: Se instala la formaleta para las losas de concreto ciclopeo tanto para la margen derecho como para la margen izquierdo en un total de 25 metros de la misma forma se formaletea la rampa de Acceso y la viga de amarre para la placa se instala tambien el Acero y se funde la losa.
Por otra parte llega el vibro compactador el cual inicia labores de vibrar la rasante donde se tiene programada la construccion de la placa Huella. este se trabaja todo el dia y se humedecen los tramos que esta compactando con el fin de obtener la densidad adecuada para la instalacion de la placa-huella se envian registros fotograficos.
tambien llega material de piedra y Arena, grabilla a la obra.

Elementos de Proteccion Personal EPP
Uniformes, Guantes, Gafas, Botas.

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

21 Marzo 2024.

Personal de Obra

1 Maestro de Obra	:	Abel Castaneda Sanchez
2. Oficial de Obra	:	Luis Alberto Anaya Navarro
3 Obrero	:	Alexander Oteca Guerra
4 Obrero	:	Luigi Yulieth Pinzon Ruiz.
5 Obrero	:	Luis Oriel Sicacha Paez
6 Obrero	:	Yasmin Manosca Guerra.
7 Obrero	:	Fabio Nelson Guerra A.
8 Obrero	:	William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climaticas: Dia Nublado/Lluvias Temperatura 20°
Indice UV Medio Humedad 85%
Viento 8 KM/H

Actividades Programadas:
Se trabaja en la Placa Huella: Despues de que el vibro compactador realizara su actividad en el tramo localizado para la PH, se replantea la formaleta para el concreto ciclopeo y se procede a instalar el concreto y la piedra. teniendo en cuenta que en la mañana se presentaron lluvias moderadas, que retraso un poco la instalación de la formaleta, apesar del impace Climatico se logro fundir las losa del concreto ciclopeo en total de 25 mts.
Por otra parte se presenta inpases con la comunidad al no contar con una via alterna para las motos tuna que tratamos de solucionar instalando una estructura en madera para que no pisara la losa y el concreto ciclopeo. sin embargo la comunidad se para y se mete dañando las actividades realizadas.
Llego a la Obra Piedra para el concreto ciclopeo.
Elementos de Proteccion Personal EPP
Uniforme, Gafas, Guantes, Bota,

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

22 Marzo 2024

Personal de Obra.

1 Maestro de Obra : Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Anaya Narvaez
3 Obrero : Alexander Oteca Guarnizo
4 Obrero : Luigi Julieth Piñacue Ruiz.
5 Obrero : Luis Uriel Sicacha Paez
6 Obrero : Jasmin Mañosca Guarnizo
7 Obrero : Fabian Nelson Guevara A.
8 Obrero : William Andres Olaya Saenz.

Condiciones Climaticas: Dia Nublado Temperatura 15°C
Indice UV Medio Humedad 80%
Velocidad Viento 9 Km/H

Actividades Programadas.
Se trabaja en la placa Huella: Despues de fundir los 25 metros del concreto ciclopeo se trabaja con las demas losa la huellas y las contras, en la instalación del concreto y el Acero de Refuerzo, así mismo el armado de la formaleta para los bordillos, se fundieron en tramos de modulos y acomodando las parrillas de acero, se trabaja con la mezcladora y vibro, y herramienta menor.
Llega la Obra material petreo. Triturado y Arenea material para la placa Huella.

Elementos de Protección Personal EPP
Uniformes, Guantes, Gafas, Botas.

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Marcel Angel Soto

Powered by CamScanner

23 Marzo 2024.

Personal de Obra.

1 Maestro de Obra : Abel Castañeda Sanchez.
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Anaya Narvaez.
3 Obrero : Alexander Oteca Jacuma
4 Obrero : Luigi Julieth Pinacue Ruiz.
5 Obrero : Luis Uriel Sicachá Paez.
6 Obrero : Jasmin Mañosca Jacuma
7 Obrero : Fabio Nelson Jacuma A.
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climaticas: Dia Soleado Temperatura 22 Aprox
Indice UV Humedad 70%
Medio Velocidad Viento 7 Km/H.

Actividades programadas:
Se trabaja en la Placa Huella: Despues de fundir las losas de la huellas y las cuneta, demuevo se forma formaleta para la losa del concreto ciclopeo en una longitud de 2.2 metros esto con el fin de avanzar, se nivela la formaleta, se ajusta la pendiente y se aneda para luego en la tarde fundir el concreto ciclopeo, se deja listo los materiales, la piedra, la arena, y de triturado, la mezcladora, Herramienta menor.
Por otra parte se funde los bordillos de primer tramo trabajo realizado en el resto de la tarde.

Elementos de Protección Personal EPP.
Uniformes, Guantes, Gafas, Botas

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria.
Ing. Miguel Angel Soto

26 Marzo 2024.

Personal de Obra.

1 Maestro de Obra : Abel Castañeda Sanchez.
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Anaya Narvaez.
3 Obrero : Alexander Oteca Yurima
4 Obrero : Lorgi Juliet Piñeres Ruiz
5 Obrero : Luis Oriel Sicacha Paez.
6 Obrero : Yasmin Mañosca Yurima.
7 Obrero : Fabio Nelson Yurima A.
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz

Condiciones Climaticas: Dia Nublados / Manana. Temperatura 14°C
Indice UV Humedad 80%
Medio Viento 7 Km/H.

Actividades Programadas:
Se trabaja en la placa Huella: Se continua con la instalacion de la formaleta para las losas del concreto ciclopeo. Pero primero se hace limpieza del area por los elemento que la lluvia dejo en el tramo, despues que se limpia la zona se continua a instalar el resto de la formaleta.
Se presenta de nuevo lluviar en la zona que hacen suspender las labores de trabajo, hasta por la tarde.
Despues de las 3:00 pm se intenta fundir el concreto ciclopeo pero es imposible debido a las lluvias presente en la area.
- Se desformaleteo lo que se fundio el dia anterior. y se instala la formaleta para el bordillo cuneta.
Por otra parte se acopia el material petreo en un punto para que este no se riegue por el agua de escorrentia de las lluvias.

Elementos de proteccion Personal EPP
Uniformes, Guantes, Gafas, Botas

Residente de Obra
Jorge Wilmer Ramirez

Interventoria.
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

25 Marzo 2024

Personal de Obra

1 Maestro de Obra : Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Anaya Narvaez
3 Obrero : Alexander Ortiz Jaramillo
4 Obrero : Luryi Yulieth Pinzon Ruiz
5 Obrero : Luis Oriel Sicacha Paez.
6 Obrero : Jasmin Mayerlis Jaramillo
7 Obrero : Fabio Nelson Jaramillo A.
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz

Condiciones Climaticas: Dia Nublado/Lluvioso Temperatura / Indice UV Humedad 80%
Medio Viento 7. km/H.

Actividades Programadas:
Se trabaja en la placa Huella: Despues formaleteas las loza para el concreto ciclopeo, se continua para aplicar el concreto y arme de las materiales.
Se comienza con la preparación de ciclopeo para fundir en la tarde.
Por otra parte se continua con la formaleteado del otro tramo de 27 metros para las loza del Concreto ciclopeo.
Nota: En la noche del sábado amanecer el Domingo se presentaron lluvias fuertes en la zona.
En la noche del Domingo amanecer el lunes se Presentaron lluvias fuertes en la zona
Estas condiciones climatica genero inconvenientes con el materiar acopiado (Arena) que la rego por parte del Corredor.

Elementos Protecion Personal EPP
Uniformes, Guantes, Gafas, Botas

Residente de Obra
Ing Wilmer Ramirez

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

Powered by CamScanner

27 Marzo del 2024

Personal de Obra

1 Maestro de Obra	:	Abel Castañeda Sanchez
2 Oficial de Obra	:	Luis Alberto Anaya Narvaez
3 Obrero	:	Alexander Oteca Yarma
4 Obrero	:	Luigi Yahel Hinaine Ruiz
5 Obrero	:	Luis Vidal Saacha Páez
6 Obrero	:	Yasmin Mañoca Yacumo
7 Obrero	:	Fabio Nelson Yarma A.
8 Obrero	:	William Andres Olivera Saenz.

Condiciones Climaticas: Dia Nublado/Lluvioso Temperatura 16
Indice UV Humedad 82%
Medio Viento 6.5 km/H

Actividades Programadas
Se trabaja en la Placa Huella: Despues de instalar la formaleta del bordillo y el concreto ciclopeo se prepara para fundir el concreto ciclópeo.
Se limpia el área y se aplica el concreto, en las losa, de la misma forma se funde los bordillos anteriores se termina el tramo. y se prepara para instalar las Parrillas para las Huellas y contra y del tramo ya fundido sin embargo solo se instalo parte de las estructura porque se presento lluvias en el area que hacen detener las actividades, sin embargo al final del dia se termina de instalar la formaleta! Porque se sale para los dias de Semana Santa.

Elementos de Protección Personal EPP
Uniformes, guantes, gafas, botas.

Residente de Obra
Ing Wilmer R.

Interventoria
Ing. Marel Angel Soto

Powered by CamScanner

28 Marzo del 2024

Personal de Obra

1 Maestro de Obra : Abel Castaneda Sanchez
2 Oficial de Obra : Luis Alberto Analla Narvaez
3 Obrero : Alexander Otero Yurma
4 Obrero : Luigi Julieth Piñacue Yurma
5 Obrero : Leis Oriel Sicacha Pérez
6 Obrero : Jasmin Mañaca Yurma
7 Obrero : Fabio Nelson Yurma A.
8 Obrero : William Andres Olivera Saenz.

Dia festivo

Semana Santa.

29 Marzo del 2024

Dia festivo

Semana Santa

Powered by CamScanner

30 Marzo 2024

Dia feriado.

Semana Santa

Powered by CamScanner

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 9	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 06/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: LA ESMERALDA – NATAGA - HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 4110 DE 2023
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
RAFAEL RUIZ YARA	PRESIDENTE	PRESIDENTE 3209889718
BRAYAN ARMED	TESORERO	TESORERO
MARLENY RAMON OSPINA	JAC	CONTADOR
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
CRISTHIAN CAMILO CHALA	INVIAS	APOYO FINANCIERO
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	INTERVENTORA
WILMER RAMIREZ	JAC	ING. RESIDENTE DE OBRA
MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Informe de actividades ejecutadas obra
2- Informe de contaduría
3- Cierre de obra- materiales
4- Transferencias
5-

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

<table>
<tr><th>Tema</th><th>Resumen</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>
Informe de actividades ejecutadas obra:
Informe No.1 al 29/02/2024
Memorias: muro de contención pendiente
Concreto:
• 10.13 3000psi
• 4.52 2000psi
• 1.349,25 kg (acero)

No2 alcantarilla
• 1854 kg (acero)
• 203 bultos de cemento

PH
• 720 bultos de cemento
• 4887,3 kg (acero)
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>
Informe de contaduría:
<table>
<tr><td>BODEGA</td><td>$</td><td></td><td></td><td>300.000</td></tr>
<tr><td>VALLA</td><td>$</td><td></td><td></td><td>450.000</td></tr>
<tr><td>ACPM</td><td>$</td><td></td><td></td><td>500.000</td></tr>
<tr><td>MAESTRO</td><td>$</td><td></td><td></td><td>8.000.000</td></tr>
<tr><td>OFICIAL</td><td>$</td><td></td><td></td><td>19.079.000</td></tr>
<tr><td>CELADOR</td><td>$</td><td></td><td></td><td>800.000</td></tr>
<tr><td>CEMENTO</td><td>$</td><td></td><td></td><td>9.728.000</td></tr>
<tr><td>AGREGADOS</td><td>$</td><td></td><td></td><td>29.422.425</td></tr>
<tr><td>RETROEXCAVADORA</td><td>$</td><td></td><td></td><td>5.805.000</td></tr>
<tr><td>CANGURO</td><td>$</td><td></td><td></td><td>900.000</td></tr>
<tr><td>MAEZCLADORA</td><td>$</td><td></td><td></td><td>2.360.000</td></tr>
<tr><td>VIBROCOMPACTADOR</td><td>$</td><td></td><td></td><td>2.000.000</td></tr>
<tr><td>RESIDENTE</td><td>$</td><td>3.500.000</td><td>2,5</td><td>$ 8.750.000</td></tr>
<tr><td>CONTADOR</td><td>$</td><td>1.400.000</td><td>3,0</td><td>$ 4.200.000</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>TOTAL</td><td>$ 92.294.425</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>
Cierre de obra- materiales:
<table>
<tr><td colspan="5">COMPRAS FALTANTES</td></tr>
<tr><td>AGREGADOS</td><td>$</td><td></td><td></td><td>7.822.425,00</td></tr>
<tr><td>TRANS. AGREGADOS</td><td>$</td><td>720.000</td><td>30</td><td>$ 21.600.000</td></tr>
<tr><td>CEMENTO</td><td>$</td><td>32.000</td><td>214</td><td>$ 6.848.000</td></tr>
<tr><td>TRANS. CEMENTO</td><td>$</td><td>720.000</td><td>3</td><td>$ 2.160.000</td></tr>
<tr><td>MAQUINARIA</td><td>$</td><td>135.000</td><td>43</td><td>$ 5.805.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	TOTAL	$ 44.235.425,00
4.	Transferencias: TRANSFERENCIA No. 10 CONTADOR $ 2.100.000 RETROEXCAVADORA $ 5.805.000 TRANSPORTE $ 7.200.000 CANGURO $ 900.000 MAESTRO $ 2.000.000 VALLA $ 450.000 TOTAL $ 18.455.000	
5.		

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requiere toma de decisión.
2.	No se requiere toma de decisión.
3.	No se requiere toma de decisión.
4.	Se aprueba transferencia No. 10
5.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI_____ NO_____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI_____ NO_____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI_____ NO_____ No. Folios:_____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI_____ NO_____ No. Folios: _____


COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Si la maquinaria (motoniveladora) no se encuentra presente para el día lunes 12/03/2024 se suspenderá obra		

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: RAFAEL RUIZ YARA
Cargo: PRESIDENTE




Nombre: BRAYAN ARMED



Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTORA




Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR



Nombre: CRISTHIAN CAMILO CHALA
Cargo: APOYO FINANCIERO



Nombre: MARLENY RAMON OSPINA
Cargo: CONTADORA



Nombre: WILMER RAMIREZ
Cargo: RESIDENTE DE OBRA

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 10	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 11/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: LA ESMERALDA – NATAGA - HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 4110 DE 2023
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
RAFAEL RUIZ YARA	PRESIDENTE	PRESIDENTE 3209889718
BRAYAN ARMED	TESORERO	TESORERO
MARLENY RAMON OSPINA	JAC	CONTADOR
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
CRISTHIAN CAMILO CHALA	INVIAS	APOYO FINANCIERO
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	INTERVENTORA
WILMER RAMIREZ	JAC	ING. RESIDENTE DE OBRA
MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Aprobación de maquinaria e insumos de obra
2-
3-
4-

5-

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Viajes: $ 600.000 – Pacarni (Jonathan Zúñiga) Motoniveladora: $ 3.000.000 transporte ida y vuelta $ 3.500.000 realizar la obra CAL: 48 bultos Cal agrícola 40Kg - $ 28.000 X 48 = $ 1.344.000 Vibro compactador: 250.000 arreglo de la máquina de la alcaldía Volqueta: Diego Mauricio Viajes 10 X $ 650.000 = $ 6.500.000 - $ 7.200.000 = $700.000 (los viajes faltantes) = $ 600.000
2.	
3.	
4.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	• Se aprueba la motoniveladora por un valor de $ 6.500.000. • Se aprueba la compra de 48 bulto de cal por un valor de $ 1.344.000 a la ferretería la tercera. • Se aprueba el desembolso de 250.000 para el arreglo de la maquinaria de la alcaldía de Tesalia- el valor aprobado se deja para manejo de caja menor ya que la alcaldía de tesalia a ultima hora no presto el vibro-compactador por decisiones administrativas.
2.	

3.	
4.	
5.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI _____ NO _____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI _____ NO _____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI _____ NO _____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI _____ NO _____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: RAFAEL RUIZ YARA
Cargo: PRESIDENTE




Nombre: BRAYAN ARMED CHAMBO



Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTORA




Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR



Nombre: CRISTHIAN CAMILO CHALA
Cargo: APOYO FINANCIERO



Nombre: MARLENY RAMON OSPINA
Cargo: CONTADORA



Nombre: WILMER RAMIREZ
Cargo: RESIDENTE DE OBRA

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 11	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 16/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: LA ESMERALDA – NATAGA - HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 4110 DE 2023
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
RAFAEL RUIZ YARA	PRESIDENTE	PRESIDENTE 3209889718
BRAYAN ARMED	TESORERO	TESORERO
MARLENY RAMON OSPITIA	JAC	CONTADOR
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
CRISTIAN CAMILO CHALA	JAC	APOYO FINANCIERO
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTEERVENTORIA	INTERVENTORA
WILMER RAMIREZ GONZALEZ	OAC	ING. RESIDENTE
MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Relación de pagos pendientes por realizar.
2-
3-
4-

5-

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Alquiler vibrador de concreto y mezcladora (19/02/2024 al 19/03/2024) Se aprueba pago al señor Duber Ney Ortiz por un valor de 2.092.000
2.	Alquiler de vibro compactador Andrés Camilo Cabrera $ 800.000
3.	Transporte de vibro compactador (grúa) Luis Fernando Castañeda $ 1.782.000
4.	Anti-sol Ferretería la tercera $ 1.300.000
5.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se aprueba pago al señor Duber Ney Ortiz por un valor de 2.092.000
2.	Se aprueba pago al señor Andrés Camilo Cabrera $ 800.000
3.	Se aprueba pago al señor Luis Fernando Castañeda $ 1.782.000
4.	Se aprueba el pago del Anti-sol por un valor de $ 1.300.000
5.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

RAFAEL RUIZ YARA

Nombre: RAFAEL RUIZ YARA
Cargo: PRESIDENTE

BRAYAN ARMED CHAMBO YUCUMA

Nombre: BRAYAN ARMED
Cargo: TESORERO

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTORA

Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: CRISTIAN CAMILO CHALA
Cargo: APOYO FINANCIERO

Nombre: MARLENY RAMON OSPITIA
Cargo: CONTADORA

WILMER RAMIREZ GONZALEZ
C.C. 7.715.590 de Neiva (H)

Nombre: WILMER RAMIREZ
Cargo: RESIDENTE DE OBRA

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

9.3.2 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CALOTO

Acta de aprobación de Estudios y Diseños, informes semanales, maquinaria y equipo, personal control aportes legales y seguridad social, informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios acta parcial de pagos de convenios, estado general del tiempo, bitácora, comités operativos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 09/02/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. HUILA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Mediante la suscripción de la presente acta de aprobación de estudios y diseños, se aprueba por el Contratista y el Interventor los estudios y diseños contratados para la ejecución del Convenio 3385 de 2023 suscrito entre el Invias y la Junta de Acción Comunal de Caloto del municipio de Paicol.

CONVENIO No: 3385 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 189.398.498,00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 30 (Dia) DE 11 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 30 (Dia) DE 4 (Mes) DE 2023 (Año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4520 DE 2023 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
001 DE 2023	18/09/2023	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 189.398.498	$ 189.398.498

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DENOMINADA "PAICOL - ALTO SAN MIGUEL - CALOTO - SAN ANDRES" A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 120 ML DE PLACA HUELLA Y 2 ALCANTARILLAS.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
	Condiciones locales	**1**	**4**	**N/A**	**NOMBRE:** "CONDICIONES LOCALES" **ELAVORADO POR:** NICOLÁS ALEXÁNDER GARZÓN BARRETO **M.P:** 091037-0602475 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 09/02/2024
(Día / Mes / Año)

VOL I	**Diseño geométrico**	**1**	**35**	**5**	**NOMBRE:** "Diseño Geometrico de la Placa Huella" **ELAVORADO POR:** PAULO CESAR ARRIETA RAMIREZ **M.P:** 25202097560CND **PLANOS:** "ANEXO 2 Planos Topografico y diseño geometrico"
	Condiciones climáticas e hidrológicas	**1**	**32**	**N/A**	**NOMBRE:** "Estudio hidrologico Caloto" **ELAVORADO POR:** PAULO CESAR ARRIETA RAMIREZ **M.P:** 25202097560CND
	Caracteriazción de materiales	**1**	**74**	**N/A**	**NOMBRE:** "Estudio de suelos" **ELAVORADO POR:** JOSE LUIS VARGAS QUIMABAYA **M.P:** 70202 – 170212 TLM
	Concepto de tránsito	**1**	**21**	**N/A**	**NOMBRE:** "Estudio de transito" **ELAVORADO POR:** PAULO CESAR ARRIETA RAMIREZ **M.P:** 25202097560CND
	Concepto estructural	**1**	**23**	**3**	**NOMBRE:** "Diseño Estructura Placa Huella" **ELAVORADO POR:** PAULO CESAR ARRIETA RAMIREZ **M.P:** 25202097560CND **PLANOS:** "ANEXO 2 Plano Detalle alcantarilla 1", "ANEXO 2 Plano Detalle alcantarilla 2", "ANEXO 2 Plano detalle estructural de la placa huella"
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio	**1**	**74**	**N/A**	**NOMBRE:** "Estudio de suelos" **ELAVORADO POR:** JOSE LUIS VARGAS QUIMABAYA **M.P:** 70202 – 170212 TLM
ANEXO 2	Diseño de mezclas	**2**	**2** **2**	**N/A**	**NOMBRE:** "Diseño de mezcla 3000 PSI" y "Diseño de mezcla 2000 PSI" **ELAVORADO POR:** CARLOS ANDRES CUSCUE
ANEXO 3	Topográfia	**1**	**17**	**5**	**NOMBRE:** "Informe Topografico" **ELAVORADO POR:** NELSON EDUARDO OSSO HERRERA **M.P:** 01-21701 **PLANOS:** "ANEXO 2 Planos Topografico y diseño geometrico"
ANEXO 4	Memorias de cálculo	**1**	**16**	**N/A**	**NOMBRE:** "MEMORIAS DE CANTIDADES" **ELAVORADO POR: ING. NICOLÁS GARZÓN BARRETO** **M.P:** 091037-0602475CND

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

OUIEN ENTREGA

Firma: Yulieth Fernanda Tello P

YULIET FERNANDA TELLO PERDOMO
Representante legal de la Junta de Acción Comunal de Caloto del municipio de Paicol
Contratista

Firma:

NICOLÁS ALEXANDER GARZÓN BARRETO
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 091037-0602475 CND

OUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Representante legal

Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Unidad Ejecutora

Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3385

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 14 del 1/03/2024 al 7/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 120 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	3385 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.398.498,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.398.498,00
PRÓRROGA No. 1:	6/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.398.498			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.398.498			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.309.920,00**	**75,54%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 59.388.124,61	41,73%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 37.257.599,25	26,18%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (22.130.525,36)	-15,55%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.989.142,48	9,83%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.633.246,69	13,80%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 5.644.104,21	3,97%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.269.298,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.280,00**	**22,20%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.364.460,00	75,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 17.740.202,00	42,42%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.398.498,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 90.752.584,61	48,17%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 54.997.801,25	29,19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.633.246,69	10,42%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 53.887.393,50	71,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 188.398.498,00**	**100,00%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ -	
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 96.511.643,00	51,23%

Observaciones:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 42%
Meta Física Ejecutada % 26%
Avance o Atraso Físico % -16%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	120
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	**Tramo 1**					**%**
Prog	24					100,0%
Ejec						
Prog	2,4					100,0%
Ejec						
Prog	120					100,0%
Ejec						
Prog	2					100,0%
Ejec	1					50,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caloto - Paicol

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadro	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	Km. 5 Via Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Caloto - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 12/12/2023
comite operativo #2: 12/01/2024
comite operativo #3: 17/01/2024
comite operativo #4: 30/01/2024
comite operativo #5: 01/02/2024
comite operativo #6: 05/02/2024
comite operativo #8: 13/02/2024
comite operativo #9: 22/02/2024
comite operativo #10: 07/03/2024


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

el dia 07/03/2024 se realizo comité operativo No. 10 en el cual se presentaron y aprobaron los pagos para la transferencia No. 5 de la nomina de febrero de ayudantes $497.933 cada uno, maestro de obra $ 1.560.000 y del Ingeniero residente $ 3.500.000, de la maquinaria (volqueta y retroexcavadora) $ 13.858.690 y ferreteria $ 1.488.795. En obra se realizaron de actividades reposicion de alcantarillas tales como: Excavaciones varias sin clasificar, Excavaciones Varias en rocas en seco, Rellenos para estructuras con material de la excavación, Concreto resistencia 21MPA (D), Concreto resistencia 14MPA. (F), Tubería concreto reforzado y Acero de refuerzo fy = 4200 MPA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

a) Permiso y/o autorizacon por parte del dueño del predio para el disposición de material proveniente de la obra
b)Próxima reunión el martes 12/03/2024

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

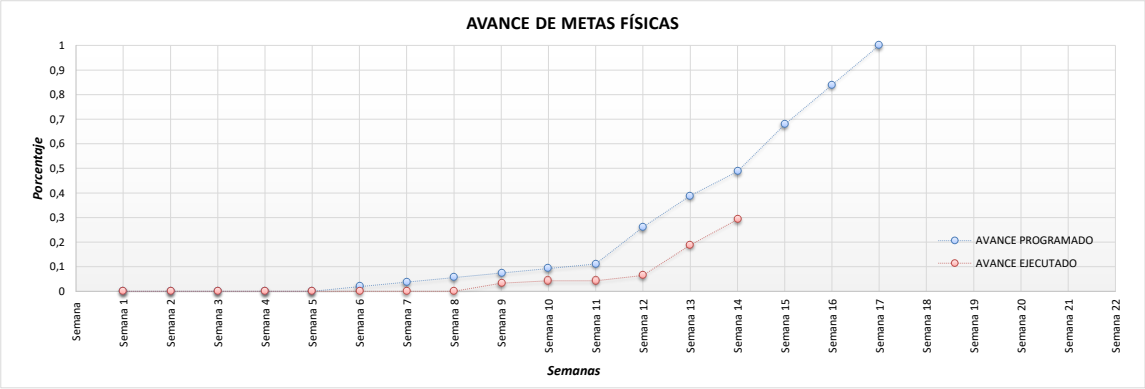

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Alcantarilla No.2



Alcantarilla No.1



formaleta descole alcantarilla No.1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTROL PERMANANTE DE AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFIACACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA, REALIZAR COMITES OPERATIVOS PARA APROBACION DE RECURSOS Y SUPLIR CON LA NECESIDAS DE LA OBRA (SUMISITROS, EQUIPOS Y PRESONAL)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3385

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 15 del 8/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 120 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	3385 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.398.498,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.398.498,00
PRÓRROGA No. 1:	6/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.398.498			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.398.498			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.309.920,00**	**75,54%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 90.730.353,93	63,76%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 49.722.575,00	34,94%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 41.007.778,93	28,82%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 31.342.229,33	22,02%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.134.991,75	9,23%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 18.207.237,58	12,79%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.269.298,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.280,00**	**22,20%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 34.849.400,00	83,33%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 24.492.902,00	58,57%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.752.700,00	16,15%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 1.228,36	
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.398.498,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 125.579.753,93	66,66%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 74.215.477,00	39,39%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.887.691,75	10,56%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 58.836.472,20	77,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 188.398.498,00**	**100,00%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ 24.308.024,00	12,90%
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 120.819.667,00	64,13%

Observaciones:

PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.515.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 64%
Meta Física Ejecutada % 35%
Avance o Atraso Físico % -29%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	120
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	**Tramo 1**					**%**
Prog	24					100,0%
Ejec						
Prog	2,4					100,0%
Ejec						
Prog	120					100,0%
Ejec						
Prog	2					100,0%
Ejec	2					100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caloto - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Km. 5 Via Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 11
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Caloto - Paicol

OBSERVACIONES:

comite operativo #1: 12/12/2023
comite operativo #2: 12/01/2024
comite operativo #3: 17/01/2024
comite operativo #4: 30/01/2024
comite operativo #5: 01/02/2024
comite operativo #6: 05/02/2024
comite operativo #8: 13/02/2024
comite operativo #9: 22/02/2024
comite operativo #10: 07/03/2024
comite operativo #11: 12/03/2024
ACTA DE VEEDUIRIA: 06/12/2023


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 13/03/2024 ser realizo visita por parte delagados de la supervision para revisar avance fisico de la obra, durante la semana se realizaron actividades de obra tales como: instalación de concreto de 3000 psi para encole y descole de las alcantarillas; el dia 12/03/2024 se realizo comité operativo No. 11 en el cual se presentaron y aprobaron los siguentes desembolsos: la nomina de los ayudantes del periodo del 01/03/2024 al 15/03/2024 por un total de $3.395.000, cuenta de cobro del contador YORYANI GARZON por un valor de $ 1.400.000, elementos de seguridad por un valor de $96.000, retencion en la fuente por $1.507.000, excedente de la valla infromativa por un valor de $98.825, nuevo pedido de formaleta (madera) por un valor de $780.000 y un desembolso de caja menor por un valor de $300.000; se aprobaron todas las tranferencias presentadas anteriormente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar toma de densidades de la sub-base para empezar actividades de construccion de placa huella,

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

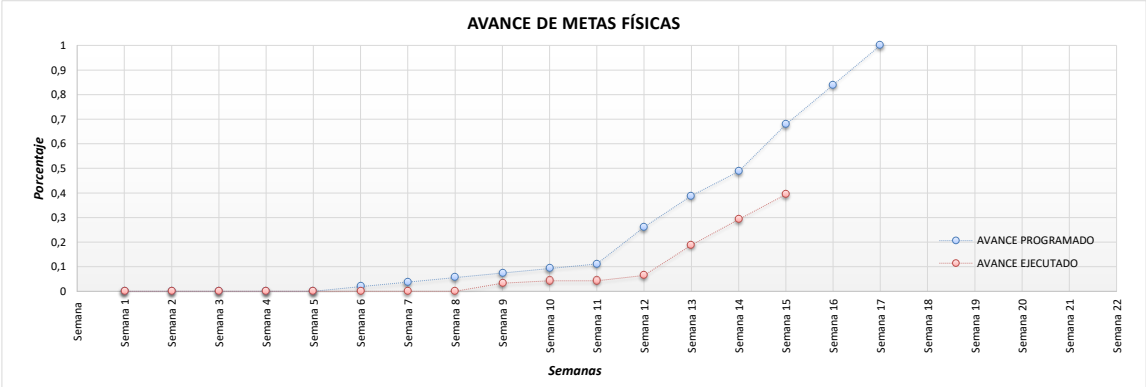

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA No. 1



CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA No. 2



VISITA INVIAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTROL PERMANANTE DE AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFIACACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA, REALIZAR COMITES OPERATIVOS PARA APROBACION DE RECURSOS Y SUPLIR CON LA NECESIDAS DE LA OBRA (SUMISITROS, EQUIPOS Y PRESONAL)

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3385

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 16 del 15/03/2024 al 21/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 120 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	3385 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.398.498,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.398.498,00
PRÓRROGA No. 1:	6/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.398.498			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.398.498			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.309.920,00**	**75,54%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 116.520.136,97	81,88%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 48.110.699,07	33,81%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 68.409.437,90	48,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.789.783,03	18,12%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 866.636,07	0,61%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 24.923.146,96	17,51%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.269.298,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 3.201.973,50	75,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.280,00**	**22,20%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 38.334.340,00	91,67%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 26.991.727,00	64,54%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.798.825,00	4,30%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 68.734.629,60	90,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$	1.228,36	
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$**	**188.398.498,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	158.056.450,47	83,89%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$	75.102.426,07	39,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	2.665.461,07	1,41%
SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$**	**188.398.498,00**	**100,00%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$	8.455.484,00	4,49%
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$	117.574.896,00	62,41%

Observaciones:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ENERO

VALOR FACTURA: $ 16.515.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 82%

Meta Física Ejecutada % 34%

Avance o Atraso Físico % -48%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	120
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	24				100,0%
Ejec					
Prog	2,4				100,0%
Ejec					
Prog	120				100,0%
Ejec	14,35				12,0%
Prog	2				100,0%
Ejec	2				100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	
Total	1	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caloto - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Km. 5 Vía Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 11

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Caloto - Paicol

OBSERVACIONES:

comité operativo #1: 12/12/2023
comite operativo #2: 12/01/2024
comite operativo #3: 17/01/2024
comite operativo #4: 30/01/2024
comite operativo #5: 01/02/2024
comite operativo #6: 05/02/2024
comite operativo #8: 13/02/2024
comite operativo #9: 22/02/2024
comite operativo #10: 07/03/2024
comite operativo #11: 12/03/2024
ACTA DE VEEDUIRIA: 06/12/2023


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 19/03/2024 se realizó en campo la toma de densidades de la subbase instalada en la obra; la compactación dio un resultado aceptable por lo cual se empezó con la construcción de la placa huella (excavaciones varias sin clasificar, instalacion de concreto ciclópeo resistencia 14MPa).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construcción de placa huella en las actividades mediente la instalación de formaleta, acero de refuerzo y fundición de concreto

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

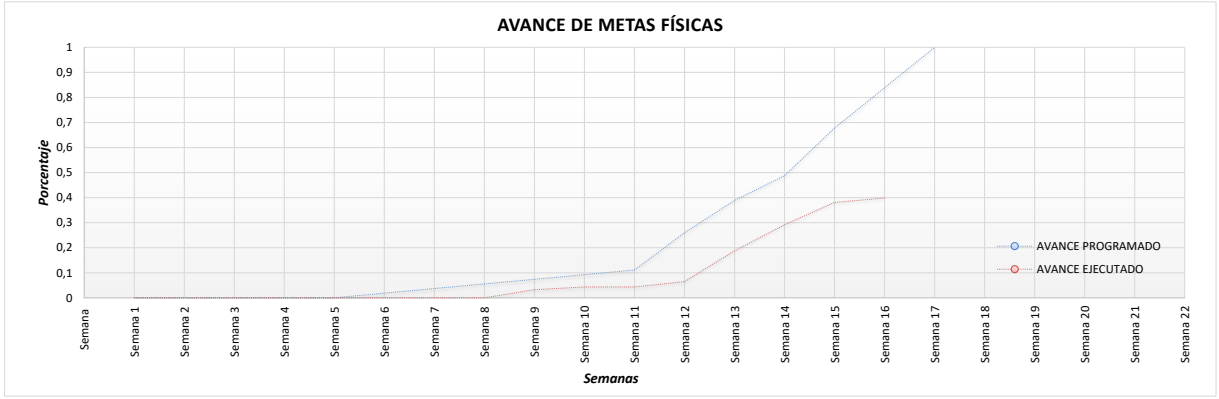

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO



INSTALACION DE FORMALETA DE PLACA HUELLA



INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONTROL PERMANANTE DE AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFIACACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA, REALIZAR COMITES OPERATIVOS PARA APROBACION DE RECURSOS Y SUPLIR CON LA NECESIDAS DE LA OBRA (SUMISITROS, EQUIPOS Y PRESONAL)	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3385

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 17 del 22/03/2024 al 28/03/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 120 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	3385 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.398.498,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.398.498,00
PRÓRROGA No. 1:	6/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA No. 2:	18/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.398.498			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.398.498			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.309.920,00**	**75,54%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 142.309.920,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 58.397.174,72	41,04%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 83.912.745,28	58,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 25.789.783,03	18,12%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.282.853,30	7,23%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 15.506.929,73	10,90%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.269.298,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 4.269.298,00	100,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.280,00**	**22,20%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41.819.280,00	100,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 26.991.727,00	64,54%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.683.708,30	97,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$	1.228,36	
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$**	**188.398.498,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	188.398.498,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$	85.388.901,72	45,32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	10.282.853,30	5,46%
SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$**	**188.398.498,00**	**100,00%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$	-	
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$	117.574.896,00	62,41%

Observaciones: A al fecha se han realizado 7 desembolsos de recursos.

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.515.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100%
Meta Física Ejecutada % 41%

Avance o Atraso Físico % -59%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	120
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	**Tramo 1**					**%**
Prog	24					100,0%
Ejec						
Prog	2,4					100,0%
Ejec						
Prog	120					100,0%
Ejec	27,05					22,5%
Prog	2					100,0%
Ejec	2					100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	
Total	1	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Caloto - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Km. 5 Vía Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Caloto - Paicol

OBSERVACIONES:

comité operativo #1: 12/12/2023
comité operativo #2: 12/01/2024
comité operativo #3: 17/01/2024
comité operativo #4: 30/01/2024
comité operativo #5: 01/02/2024
comité operativo #6: 05/02/2024
comité operativo #8: 13/02/2024
comité operativo #9: 22/02/2024
comité operativo #10: 07/03/2024
comité operativo #11: 12/03/2024
ACTA DE VEEDUIRIA: 06/12/2023


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo reportado se realizó construcción de placa huella adelantando actividades de excavaciones varias sin clasificar, instalación de formaleta, fundición de concreto reforzado resistencia 21 MPA, concreto ciclópeo resistencia 14 MPA y acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2; debido a las festividades de semana santa, solo se laboró los días martes y miercoles; así mismo se reportan algunos deslizamientos sobre la vía que han retrasado la construcción de la placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la próxima semana se continuará con las actividades de construcción de placa huella mediante la instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta, fundición de concreto rígido y ciclópeo. Se realizará reunión en el sitio de las obras con el personal del contratista revisando programación y acciones a llevar a cabo para terminar dentro del plazo establecido. Se solicitará reprogramación actuatlizada.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

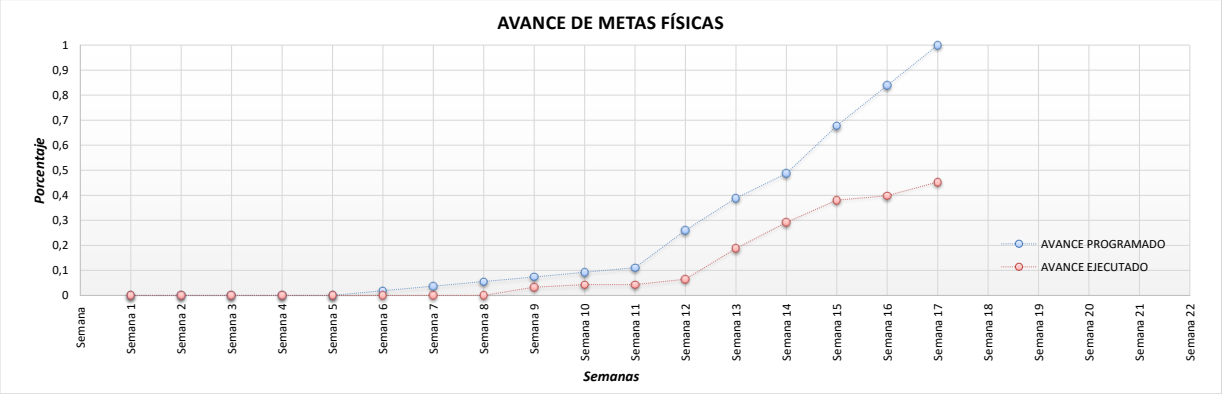

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE CONCRETO CUNETA



INSTALACION DE CONCRETO HUELLA



INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
CONTROL PERMANANTE DE AVANCE DE OBRA Y SOLICITUD DE AJUSTE A PROGRAMACION, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFIACACIONES TECNICAS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN OBRA, REALIZAR COMITES OPERATIVOS PARA APROBACION DE RECURSOS Y SUPLIR CON LA NECESIDAS DE LA OBRA (SUMISITROS, EQUIPOS Y PRESONAL)	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO SOLIDARIO No. 3385-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
VOLQUETA	-	6 M3	CALOTO						A							A		A				A	A	A										
MINICARGADOR	NEW HOLLAND	68 HP	CALOTO															A																
MEZCLADORA	TIPO TROMPO	1 BULTO	CALOTO	A	A		A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A				
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1	1		1	1	2	1	1			1	1	2	1	3			1	2	2	2	1			1	1	1				
TOTAL ACTIVO				1	1		1	1	2	1	1			1	1	2	1	3			1	2	2	2	1			1	1	1				
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0				
TOTAL INACTIVO				0	0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0	0	0				

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 1/04/2024
(Día / Mes / Año)

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Nicolás Garzón Barreto
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0602475CND

Firma
Nombre: Miguel Ángel Soto Suarez
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0649362 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	
		FECHA	31/03/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE OBRA No: 3385 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CALOTO MUNICIPIO DE PAICOL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4520 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	NICOLÁS ALEXÁNDER GARZÓN BARRETO	1,075,315,282	INGENIERO	$ 3.500.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 3.500.000	$ 97.940	V										
2	JEISON JOHAN NOGUERA LOSADA	1.078.508.082	MAESTRO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 90.500	V										
3	EDWIN HERRERA MONSALVE	79.221.272	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	7917343440	$ 162.500	COLFONDOS	7917343440	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	GUILLERMO TOLEDO SANCHEZ	1.079.508.562	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	7917343440	$ 162.500	PROTECCION	7917343440	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	REINEL VITOVIS ROA	4.925.994	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	7917343440	$ 162.500	PORVENIR	7917343440	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	YILVER SÁNCHEZ LOSADA	1.079.509.605	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS	7917343440	$ 162.500	PORVENIR	7917343440	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
7	LEANDRO SÁNCHEZ LOSADA	83.256.043	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	SANITAS	7917343440	$ 162.500	PORVENIR	7917343440	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

Firma

Nombre: NICOLÁS GARZÓN BARRETO

Ingeniero Residente del Proyecto

Matrícula Profesional No.:091037-0602475CND

Firma

Nombre:SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.:25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** mar-24 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3385 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 188.622.861,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA	FE4	25/02/2024	ESTRUCTURAS, SUELOS E INGENIERIA G&Q SAS	$ 927.920	1	ADMINISTRATIVO
FACTURA	FE35	04/03/2024	EDWIN EDUARDO SILVA	$ 480.000	1	ADMINISTRATIVO
FACTURA	PL-150	06/03/2024	POLO LLANOS ASOCIADOS SAS	$ 1.257.750	3	MATERIAL
CUENTA DE COBRO	2	06/03/2024	YULIETH FERNANDA TELLO PERDOMO	$ 1.692.700	1	ADMINISTRATIVO
CUENTA DE COBRO	1	08/03/2024	REINEL ROA VITOVIS	$ 497.933	5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CUENTA DE COBRO	1	08/03/2024	LEANDRO SANCHEZ LOSADA	$ 497.933	5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CUENTA DE COBRO	1	08/03/2024	YILVER SANCHEZ LOSADA	$ 497.933	5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CUENTA DE COBRO	1	08/03/2024	GUILLEROMO TOLEDO SANCHEZ	$ 497.933	5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CUENTA DE COBRO	1	08/03/2024	EDWIN HERRERA MONSALVE	$ 497.933	5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CUENTA DE COBRO	1	08/03/2024	JEISON JOHAN NOGUERA	$ 1.560.000	1	ADMINISTRATIVO
CUENTA DE COBRO	1	08/03/2024	NICOLAS ALEXANDER GARZON	$ 3.500.000	1	ADMINISTRATIVO
FACTURA	EJCM-224	06/03/202	EDWAR JAIR CABRERA	$ 13.576.864	4	TRANSPORTE
FACTURA	PL-151	06/03/202	POLO LLANOS ASOCIADOS SAS	$ 1.488.795	3	MATERIAL
CUENTA DE COBRO	3	15/03/2024	YULIETH FERNANDA TELLO PERDOMO	$ 1.761.000	1	ADMINISTRATIVO
CUENTA DE COBRO	2	15/03/2024	REINEL ROA VITOVIS	$ 679.000	5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CUENTA DE COBRO	2	15/03/2024	LEANDRO SANCHEZ LOSADA	$ 679.000	5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CUENTA DE COBRO	2	15/03/2024	YILVER SANCHEZ LOSADA	$ 679.000	5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CUENTA DE COBRO	2	15/03/2024	GUILLEROMO TOLEDO SANCHEZ	$ 679.000	5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CUENTA DE COBRO	2	15/03/2024	EDWIN HERRERA MONSALVE	$ 679.000	5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA
CUENTA DE COBRO	2	13/03/2024	ROBINSON SANCHEZ	$ 780.000	3	MATERIAL
CUENTA DE COBRO	3	15/03/2024	JEISON JOHAN NOGUERA	$ 855.400	3	MATERIAL
FACTURA	FE-400	11/03/2024	LOSADA PACHONGO AMANDA	$ 96.000	1	ADMINISTRATIVO
CUENTA DE COBRO	2	13/03/2024	YORYANIGARZON Q	$ 1.400.000	1	ADMINISTRATIVO
FACTURA	EJCM-228	19/03/2024	EDWAR JAIR CABRERA	$ 2.659.984	4	TRANSPORTE
CUENTA DE COBRO	1	21/03/2024	MANOLO TELLO LEDESMA	$ 4.999.500	2	HERRAMIENTA Y EQUIPO
CUENTA DE COBRO	4	19/03/2024	JEISON JOHAN NOGUERA	$ 700.000	1	ADMINISTRATIVO

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	ADMINISTRATIVO	$ 42.816.279,00	$ 11.894.389,00	$ 12.117.620,00	$ 24.012.009,00	$ 18.804.270,00
2	HERRAMIENTA Y EQUIPO	$ 19.080.727,00	$ -	$ 4.999.500,00	$ 4.999.500,00	$ 14.081.227,00
3	MATERIAL	$ 88.560.821,00	$ 62.059.929,00	$ 4.381.945,00	$ 66.441.874,00	$ 22.118.947,00
4	TRANSPORTE	$ 16.987.325,00	$ -	$ 16.236.848,00	$ 16.236.848,00	$ 750.477,00
5	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	$ 16.930.915,00	$ -	$ 5.884.665,00	$ 5.884.665,00	$ 11.046.250,00
6	PAGA	$ 4.246.794,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.246.794,00
	TOTALES	$ 188.622.861,00	$ 73.954.318,00	$ 43.620.578,00	$ 117.574.896,00	$ 71.047.965,00

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (MARZO) : (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Yulieth Fernanda Tello P
Nombre: YULIETH FERNANDA PERDOMO
PRESIDENTE JAC
JUNTA DE ACCION COMUNAL CALOTO

Firma:
Nombre: NICOLAS ALEXANDER GARZON
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 091037-0602475CND

Firma:
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

Acta No. 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. HUILA

CONVENIO No. 3385 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA: K17+830 DE LA VIA PAICOL - ALTO SAN MIGUEL - CALOTO -SAN ANDRES CODIGO 24HL04

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO 4520-2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	30 (Día)	DE	11 (Mes)	DE	2023 (Año)	$ 188.398.498,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	- (Día)	DE	- (Mes)	DE	- (Año)	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	- (Día)	DE	- (Mes)	DE	- (Año)	$ 188.398.498,00

PLAZO (MESES): HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO	30 (Día)	DE	4 (Mes)	DE	2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

No.	PROVEEDOR (RAZON SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	ESTRUCTURAS, SUELOS E INGENIERIA G&Q SAS	901797104-6	FE4	25/02/2024	$ 901.000,00	$ 76.190,00	$ 977.190,00
2	EDWIN EDUARDO SILVA	12.281.864-5	FE35	04/03/2024	$ 480.000	$ -	$ 480.000
3	POLO LLANOS ASOCIADOS SAS	901729266	PL-150	06/03/2024	$ 1.084.034	$ 205.966	$ 1.290.000
4	YULIETH FERNANDA TELLO PERDOMO	1.107.056.314	2	06/03/2024	$ 1.761.000,00	$ -	$ 1.761.000,00
5	REINEL ROA VITOVIS	4,925,994	1	08/03/2024	$ 497.933,00	$ -	$ 497.933,00
6	LEANDRO SANCHEZ LOSADA	83,256,043	1	08/03/2024	$ 497.933,00	$ -	$ 497.933,00
7	YILVER SANCHEZ LOSADA	1,079,509,605	1	08/03/2024	$ 497.933,00	$ -	$ 497.933,00
8	GULLEROMO TOLEDO SANCHEZ	1,079,508,562	1	08/03/2024	$ 497.933,00	$ -	$ 497.933,00
9	EDWIN HERRERA MONSALVE	79,221,272	1	08/03/2024	$ 497.933,00	$ -	$ 497.933,00
10	JEISON JOHAN NOGUERA	1,078,508,082	1	08/03/2024	$ 1.560.000,00	$ -	$ 1.560.000,00
11	NICOLAS ALEXANDER GARZON	1,075,315,282	1	08/03/2024	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00
12	EDWAR JAIR CABRERA	83,253,829	EJCM-224	06/03/202	$ 13.877.568,00	$ -	$ 13.877.568,00
13	POLO LLANOS ASOCIADOS SAS	901729266	PL-151	06/03/202	$ 1.277.936,00	$ 242.807,84	$ 1.520.743,84
14	YULIETH FERNANDA TELLO PERDOMO	1.107.056.314	3	15/03/2024	$ 1.761.000,00	$ -	$ 1.761.000,00
15	REINEL ROA VITOVIS	4,925,994	2	15/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
16	LEANDRO SANCHEZ LOSADA	83,256,043	2	15/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
17	YILVER SANCHEZ LOSADA	1,079,509,605	2	15/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
18	GULLEROMO TOLEDO SANCHEZ	1,079,508,562	2	15/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
19	EDWIN HERRERA MONSALVE	79,221,272	2	15/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
20	ROBINSON SANCHEZ	12,278,271	2	13/03/2024	$ 780.000,00		$ 780.000,00
21	JEISON JOHAN NOGUERA	1,078,508,082	3	15/03/2024	$ 910.000,00	$ -	$ 910.000,00
22	LOSADA PACHONGO AMANDA	4.544.559	FE-400	11/03/2024	$ 96.000,00	$ -	$ 96.000,00
23	YORYANIGARZON Q.	1,081,158,211	2	13/03/2024	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00
24	EDWAR JAIR CABRERA	83,253,829	EJCM-228	19/03/2024	$ 2.695.192,00	$ -	$ 2.695.192,00
25	MANOLO TELLO LEDESMA	4,920,006	1	21/03/2024	$ 5.050.000,00	$ -	$ 5.050.000,00
26	JEISON JOHAN NOGUERA	1,078,508,082	4	19/03/2024	$ 700.000,00	$ -	$ 700.000,00

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 43.718.394,62	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 119.306.461
VALOR IVA	$ 524.964,22	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 8.012.382
TOTAL PAGOS	$ 44.243.358,84	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 124.318.843

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: Yulieth Fernanda Tello P

Nombre:YULIET FERNANDA PERDOMO
PRESIDENTA
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO

Firma:

Nombre:NICOLÁS ALEXANDER GARZÓN
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:M.P.091037-0602475CND

Firma:

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202093187 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 1/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. HUILA

CONVENIO No: 3385-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	21	23	24	24	23	24	24	22	24	23	21	23	22	23	23	19	20	22	21	21	17	20	17	19	15	14	15	15	14	12	222
Lluvias moderadas		3	1			1			2		1	3	1	2	1	1	4	2	2	3	2	5	1	2	4	3	4	2	1	3	2	34
Lluvias intensas																	1	2			1	2	3	5	1	6	6	7	8	7	10	56
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Nicolás Garzón Barreto
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 091037-0602475CND

Firma
Nombre: Miguel Angel Soto Suarez
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0649362 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

MES DE MARZO

- 01 de marzo de 2024

Se continuó nivelando y extendiendo la subbase granular a lo largo de la vía, para darle los desniveles necesarios (pendiente y bombeo) con ayuda de la retroexcavadora. También se terminó de abrir las excavaciones para los descoles de las alcantarillas con ayuda de la maquina. El mismo día, se empezó a cortar las tablas de madera para armar las formaletas del descole para la alcantarilla 1. Seguidamente, se armó y ubicó la parrilla de acero de refuerzo para la placa inferior, o base del descole (muro y aletas) de la alcantarilla 1.

Firma:

Nicolás Garzón Barreto - Ing Residente

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

- 02 de marzo de 2024

No hubo presencia de maquinaria, pues ya se había culminado el día anterior con todas las actividades de la retroexcavadora. Se fundió la placa base de muro y aletas, y se dejó el acero transversal de estos elementos, anclados al acero de la placa base.

Firma:

Nicolás Garzón Barreto - Ing Residente

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

- 04 de marzo de 2024

Se amarró el acero para muro y aletas. También se cortó la tabla para el armado de formaletas para el muro y aletas de la alcantarilla 1. No se registraron más novedades en obra.

Firma: Nicolas Garzon Barreto - Ing Residente

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

Powered by CamScanner

• 05 de marzo de 2024

Se formaleteó con tabla el muro y aletas de la alcantarilla 1, apuntalando y fijando bien las formaletas para evitar que se abrieran al momento de vaciar el concreto. Se descargaron materiales de ferretería que llegaron al sitio de bodega, como alambre (30 kg), cemento (150 bultos) y varilla 3/8" (38 unidades).

Firma:

Nicolás Garzón Barreto - Ing. Residente

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

• 06 de marzo de 2024

Se fundió el muro y aletas de la alcantarilla 1. Al mismo tiempo, dos de los obreros fueron armando la parrilla de acero de refuerzo de la placa inferior de la alcantarilla 2. Una vez armada, se instaló la parrilla y se fundió la placa base del desde de la alcantarilla 2. Llego 1 viaje de arena y 1 de gravilla.

Firma:

Nicolas Garzón Barreto - Ing Residente

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

• 07 de marzo de 2024

Se cortó y se instaló el acero de refuerzo para el muro y ~~aletas~~ de la alcantarilla 2. También se cortó la tabla y se fueron armando las formaletas para fundir muro y aletas. Al mismo tiempo, se fue cortando el acero para la poseta de la alcantarilla 1 y 2.

Firma:

Nicolás Garzón Barreto - Ing Residente.

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

Powered by CamScanner

- 08 de marzo de 2024

Se fundió muro y aletas de descole de la alcantarilla 2. También, se retiró la formaleta de la alcantarilla 1 (muro y aletas) y se procedió a aplicar antisol a estos elementos para evitar fisuras por retracción térmica. Este día también se radicó el pago de la nomina de febrero, pago del maestro, Ing. residente, maquinaria (transporte y retroexcavadora), antisol, y otros materiales adicionales.

Firma:

Nicolás Garzón Barreto - Ing. Residente

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

- 11 de marzo de 2024

Se instaló y amarró el acero para la poceta de la alcantarilla 1 y 2. También se fundieron las placas base de estas dos pocetas, dejando instalado el acero de los muros. Se retiró la formaleta del descole de la alcantarilla 2.

Firma:

Nicolás Garzón Barreto - Ing Residente

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

- 12 de marzo de 2024

Se fundió el restante de la poceta de la alcantarilla 1 (muros y cabezal). Se dejó la poceta de la alcantarilla 2 formaleteada para fundir el día siguiente. También se aplicó antisol para (la) el descole de la alcantarilla 2.

Firma:

Nicolás Garzón Barreto - Ing Residente

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

Powered by CamScanner

• 13 de marzo de 2024

Se retiró la formaleta de la poceta de la alcantarilla 1. Se le aplicó antisol a la poceta anterior. También se fundió muros y cabezal de la poceta de la alcantarilla 2. Llegó 1 viaje de subbase granular y 1 viaje de arena. Llegó la valla informativa del proyecto.

Firma:

Nicolás Garzón Barreto - Ing Residente.

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

• 14 de marzo de 2024

Se retiró la formaleta de la alcantarilla 1 (poceta) y se aplicó antisol a este elemento. Se instaló la valla informativa alusiva al proyecto, cerca a la alcantarilla 1 por petición de la comunidad, ya que tenía más visibilidad en este sector. Se regó el viaje de subbase que había llegado el día anterior. se realizó manualmente tomando niveles y asegurando el bombeo del 2% de la vía. El nivel se tomó con el maestro y oficial (obrero) con ayuda de manguera.

Firma:

Nicolás Garzón Barreto - Ing Residente.

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

• 15 de marzo de 2024

Se realizaron trabajos de nivelación y compactación con ayuda del minicargador, adaptado con rodillo, para terminar de darle el nivel necesario a la vía, con el fin de empezar construcción de placahuella. Sólo se trabajó medio día con este minicargador debido a la disponibilidad de tiempo del proveedor (y falta de combustible). Con ayuda de la volqueta que transportó el minicargador hasta

Powered by CamScanner

el sitio de la obra, se retiró material de relleno en un viaje hasta el sitio de botadero, este material fue resultante de las excavaciones anteriores, que se cargó con el mismo cargador. Finalmente, se radicó el pago 6 en el banco, correspondiente a pago de nómina marzo 1 - 15, pago de retenciones y caja menor, pago del contador, Valla informativa (restante), Equipo de bioseguridad (restante), tablas de madera adicionales para formaletas y alquiler de mezcladora.

Firma:

Nicolás Garzón Barreto - Ing Residente.

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

- 18 de marzo de 2024

Se realizaron excavaciones para cunetas (manuales) de la placahuella, en las cuales también se niveló para darle su respectivo bombeo, tomando niveles con manguera a lo largo de todo el tramo para verificar. Se presentaron lluvias moderadas en la zona, se transportó la formaleta, el cemento y mezcladora hasta el sitio de la obra de placahuella para iniciar. Se cambió el proveedor de transporte de agregados, el cual será Manolo Tello, con aprobación de la JAC e Interventoría.

Firma:

Nicolás Garzón	Ing. Silvia Ordoñez	Yulieth Tello
Residente	Interventora	Presidente JAC

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

- 19 de marzo de 2024

Se realizaron los ensayos de densidades de campo por parte del laboratorio seleccionado, se hicieron 3 muestras en los 120 metros del tramo. Se continuó alistando el terreno y excavando cunetas, puesto que no se podía iniciar placahuella hasta tener los resultados de densidad del suelo, que debían

Powered by CamScanner

tesa de que el suelo estuba bien compactuado. Se programó entonces iniciar con la placahuella al dra siguiente si los resultados eran óptimos. Llegaron a la obra 3 viajes de gravilla, 2 de arena y 1 de piedra zonga.

Firma:

Nicolás Garzón B. - Ing Residente

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

• 20 de marzo de 2024

Se comenzó a formaletear la placahuella, empezando desde la abscisa K0+000 (parte más alta), fundiendo primero el centro y sobreanchos (concreto ciclópeo), en total se fundieron 9 m. Llegó 1 viaje de arena y otro de gravilla. También llegaron 150 bultos de cemento, por lo que los obreros y maestro tuvieron que descargar.

Firma:

Nicolás Garzón Bareto - Ing Residente

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

• 21 de marzo de 2024

Se continuó fundiendo concreto ciclópeo de la placahuella (centro y sobreanchos), dejando el espacio para la excavación de las rastras y para el armado de acero de huellas y cunetas. Llegó un viaje de gravilla y otro de arena, también llegaron 166 bultos de cemento y 20 m de plastico negro para cubrir el cemento. En total se fundieron 15 m de concreto ciclópeo (huellas y cunetas). También se revisó el diseño de la placahuella en las curvas, por petición de la comunidad (JAC y veeduría) pues no estuvieron de acuerdo con cambiar el diseño estándar (huellas y centro de 90 cm) en las zonas de curva, y solicitaron que se hiciera con el diseño estándar a lo largo de toda la placahuella. Teniendo en cuenta que las curvas existentes tienen una deflexión muy pequeña comparada con las curvas que hay en la Cartilla

Powered by CamScanner

del Invias, se acordó construir la placahuella con el mism diseño estandar y no como estaba diseñada en los pla nos iniciales.

Firmar:

Nicolás Garzón B. — Ing. Residente
Ing. Silvia Ordoñez — Interventoría
Yulieth Tel — Presidente JA

Jair Tello — Veeduría
Luis E. Chavarro — Tesorero JAC

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

- 22 de marzo de 2024

Se empezó a amarrar acero para huellas y cunetas, y a excavar y vibrar el acero previamente figura do para las rostras y bordillos. Se fundió 15 m de huellas y cunetas. También se realizaron cilindros para ensayos de resistencia del concreto. Se radicó en el banco Pago 7, correspondiente a Maquinaria, equi por de bioseguridad (hubo un error en la carta anterior), maestro de obra y transporte de agregados (Manolo Tello Se registraron lluvias en horas de la mañana.

Firma:

Nicolás Garzón B.
Ing. Residente

Miguel Angel Soto Suarez
Ing. residente de interventoria

- 25 de marzo de 2024

Los obreros y maestro decidieron trabajar el lunes fe tivo para adelantar obra, ya que debido a la sema na santa se perdían 2 días de trabajo. Se continuó fundiendo huellas y cunetas faltantes para com pletar lo fundido en ciclópeo. Se registraron lluvias el fin de semana y hoy (moderadas).

Powered by CamScanner

Firma:

Nicolás Garzón B. - Ing Residente

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

- 26 de marzo de 2024

Se continuó fundiendo placahuella, bordillos y huellas. También se fundieron cunetas y ~~la~~ parte de los muros. (concreto reforzado). Se registraron lluvias fuertes. Se tuvo que remover relleno que cayó del deslizamiento presente en la parte inicial del tramo, producto de las lluvias.

Firma:

Nicolás Garzón B. - Ing Residente

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

- 27 de marzo de 2024

Se fundió concreto ciclópeo, aproximadamente 12 metros. Se han presentado daños en la manguera del acueducto, lo que ha dificultado llevar el agua hasta la obra, todo esto producto de las lluvias.

Firma:

Nicolás Garzón - Ing Residente

Miguel Angel Soto Suarez - Ing. residente de interventoria

Powered by CamScanner

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 10	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 07/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: CALOTO – PAICOL – HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3385 – 2023
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
YULIET FERNANDA PERDOMO	OAC	PRESIDENTE
LUIS ENRIQUE CHAVARRO	OAC	TESORERO
NICOLAS GARZON	OAC	RESIDENTE OBRA
YORYANI GARZON	OAC	CONTADOR
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTEREVENTORIA	INTERVENTORA
MIGUEL ANGEL SOTO	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE DEL PROYECTO

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Pagos de nómina, reembolso para gastos varios de la presidenta
2- Pago de maquinaria
3- Pago de ferretería (alambre y acero)
4- Pago de madera (20 tablas adicionales)
5- Revisión de informe
6-

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen

1.	Gastos caja menor: $ 1.692.700 Reembolso a la presidenta de la junta por gatos de (pólizas, papelería, gastos de viajes) Pago de nómina: 

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL
NIT 813004190-9
NOMINA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

NOMBRE	CARGO	SUELDO	D.L.	DEVENGADO	SUB. Trasporte	TOTAL DV.	PENSION	SALUD	TOTAL DE.	LIQUIDO
REINEL ROA VITOVIS	Obrero	1.300.000	11	476.667	59.400	536.067	19.067	19.067	38.133	497.933
LEANDRO SANCHEZ LOSADA	Obrero	1.300.000	11	476.667	59.400	536.067	19.067	19.067	38.133	497.933
YILVER SANCHEZ LOSADA	Obrero	1.300.000	11	476.667	59.400	536.067	19.067	19.067	38.133	497.933
GULLEROMO TOLEDO SANCHEZ	Obrero	1.300.000	11	476.667	59.400	536.067	19.067	19.067	38.133	497.933
EDWIN HERRERA MONSALVE	Obrero	1.300.000	11	476.667	59.400	536.067	19.067	19.067	38.133	497.933
TOTALES		**6.500.000**		**2.383.333**	**297.000**	**2.680.333**	**95.333**	**95.333**	**190.667**	**2.489.667**

Pago de maestro:
$ 1.560.000
Por el avance que se ha registrado en obra.
Pago de ing. Residente:
$ 3.500.000
Nómina de un (1) mes de trabajo

Pago de maquinaria:

VOLQUETA	VJ 6 M3	$ 529.998,00	17	$ 9.009.966,00
RETROEXCAVADORA	HR	$ 120.000,00	38,13	$ 4.575.600,00
SUBTOTAL SIN RETENCIONES				$ 13.585.566,00
RETENCIÓN VOLQUETA			1%	$ 90.100,00
RETENCIÓN RETROEXCAVADORA			4%	$ 183.024,00
SUBTOTAL SOLO RETENCIONES				$ 273.124,00
HORAS ADICIONAL RETRO X RET			2,30	$ 276.000,00
TOTAL FACTURA				**$ 13.858.690,00**
HORAS TOTALES RETROEXCAVADORA				**40,43**
			$ 138.586,90	$ 554.347,60
5,03				

PAGO 1

Material	Unidad	Precio unitario	Cantidad	Precio total
VOLQUETA	VJ 6 M3	$ 529.998,00	17	$ 9.100.065,66
RETROEXCAVADORA	HR	$ 120.000,00	38,13	$ 4.758.624,00
SUBTOTAL SIN RETENCIONES				$ 13.858.690,00

Ferretería:

	 SUBTOTAL 1,277,936.00 IVA: 242,807.84 EXCLUIDO: $ 0.00 EXENTO: $ 0.00 RETEIVA: $ 0.00 RETEFUENTE: $ 0.00 RETEICA: $ 0.00 Son: Un Millón Quinientos Veinte Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Pesos Moneda Corriente TOTAL A PAGAR $ 1,520,743.84 Cufe:86308310a30c3932ba8bc823aeccb439bc3208b8f14e064366f3cd1b892064728af216e615d11c8806ae1e234cd86d3 TIPO DE NEGOCIACION: Credito Directo MEDIO DE PAGO CONSIGNACIONES DÍAS DE CREDITO: 7 Para todos los efectos legales,esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art 774 segun el codigo de comercio . Se hace constar que la firma del propetario y/o representante legal y/o dependiente laboral de la empresa compradora implica que dicha persona esta autorizada espresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador, segun el articulo 640 de codigo de comercio. Certifico que he recibido real y materialmente las mercancias objeto de esta factura, la mercancia amparada por este documento es transportadora por cuenta y riesgo del comprador, reservandonos el derecho de propiedad hasta su total cancelacion. No aceptamos devolucion despues de recibida la mercancia . A partir del vencimiento de la presente factura se causara interes moratorio en el maximo legal que autorice la superintendencia bancaria. autoriz(amos), de manera irrevocable para que con fines estadisticos de control, supervision y de informacion comercial. POLO LLANOS ASOCIADOS SAS., o quien represente sus derechos, sea cesionario de ellos o endosatario, consulte y reporte a cualquier entidad que maneje bancos de datos el nacimiento, modificacion, extincion de obligaciones contraidas con anterioridad y que les llegare a contraer en sombre propio y de la empresa o sociedad que represento. NOTAS: 003 OSCAR IVAN POLO Original Pagos totales: producto | N° de producto | Banco | Tercero asociados | Valor Ahorro | 03203107649 | Bancolombia | YULIETH FERNANDA TELLO PERDOMO (PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, CAJA MENOR, TRASPORTE Y COMPRAS IMPREVISTA DE OBRA) | $ 1.692.700 Ahorro | 3134906759 | Nequi | REINEL ROA VITOVIS (NOMINA OBRERO) | $ 497.933 Ahorro | 3134793167 | Nequi | LEANDRO SANCHEZ LOSADA (NOMINA OBRERO) | $ 497.933 Ahorro | 3227069507 | Nequi | YILVER SANCHEZ LOSADA (NOMINA OBRERO) | $ 497.933 Ahorro | 3232249882 | Nequi | GULLEROMO TOLEDO SANCHEZ (NOMINA OBRERO) | $ 497.933 Ahorro | 03107960776 | Bancolombia | EDWIN HERRERA MONSALVE (NOMINA OBRERO) | $ 497.933 Ahorro | 3204482914 | DaviPlata | JEISON JOHAN NOGUERA (MAESTRO DE OBRA) | $1.560.000 Ahorro | 3007946391 | Nequi | NICOLÁS ALEXÁNDER GARZÓN BARRETO (INGENIERO DE RESIDENTE) | $3.500.000 Ahorro | 45700028406 | Bancolombia | EDWAR JAIR CABRERA MAÑOZCA (SERVICIO DE MAQUINARIA) | $13.576.864 Ahorro | 941-000037-29 | Bancolombia | POLO LLANOS ASOCIADOS SAS (SUMINISTRO DE MATERIALES) | $1.488.795 TOTAL | $ 24.308.024 Sin otro en particular agradezco el trámite mencionado
2.	
3.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se aprueban traslados para pagos de: gastos de representación, nómina de ayudantes, nómina del maestro, nómina del ing. Residente, maquinaria y ferretería|
2.	
3.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Permiso por parte del dueño del predio para el bote de material de obra		
Próxima reunión el martes 12/03/2024		

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: YULIET PERDOMO FALLA
Cargo: PRESIDENTE

Nombre: NICOLÁS ALEXANDER GARZÓN
Cargo: RESIDENTE DE OBRA

Nombre: YOYANI GARZON
Cargo: CONTADOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTORA

Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: LUIS ENRIQUE CHAVARRO
Cargo: TESORERO

Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

Nombre:
Cargo:

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 11	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 12/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: CALOTO – PAICOL – HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3385 – 2023
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
YULIET FERNANDA PERDOMO	OAC	PRESIDENTE
LUIS ENRIQUE CHAVARRO	OAC	TESORERO
NICOLAS GARZON	OAC	RESIDENTE OBRA
YORYANI GARZON	OAC	CONTADOR
JOSE MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTEREVENTORIA	INTERVENTORA
MIGUEL ANGEL SOTO	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL AVANCE DEL PROYECTO

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Pago de nómina de ayudantes
2- Pago de nómina contador
3- Pago de elementos de seguridad
4- Pago de las retenciones
5- Pago de la valla
6- Nuevo pedido de madera para formaleta
7- Desembolso caja menor
8-

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

<table>
<tr><th>Tema</th><th>Resumen</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pago de nómina de ayudantes:
01/03/2024 al 15/03/2024

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL
NIT 813004190-9
NOMINA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024

<table>
<tr><th>NOMBRE</th><th>CARGO</th><th>SUELDO</th><th>D.L.</th><th>DEVENGADO</th><th>SUB. Trasporte</th><th>TOTAL DV.</th><th>PENSION</th><th>SALUD</th><th>TOTAL DE.</th><th>LIQUIDO</th></tr>
<tr><td>REINEL ROA VITOVIS</td><td>Obrero</td><td>1.300.000</td><td>15</td><td>650.000</td><td>81.000</td><td>731.000</td><td>26.000</td><td>26.000</td><td>52.000</td><td>679.000</td></tr>
<tr><td>LEANDRO SANCHEZ LOSADA</td><td>Obrero</td><td>1.300.000</td><td>15</td><td>650.000</td><td>81.000</td><td>731.000</td><td>26.000</td><td>26.000</td><td>52.000</td><td>679.000</td></tr>
<tr><td>YILVER SANCHEZ LOSADA</td><td>Obrero</td><td>1.300.000</td><td>15</td><td>650.000</td><td>81.000</td><td>731.000</td><td>26.000</td><td>26.000</td><td>52.000</td><td>679.000</td></tr>
<tr><td>GULLEROMO TOLEDO SANCHEZ</td><td>Obrero</td><td>1.300.000</td><td>15</td><td>650.000</td><td>81.000</td><td>731.000</td><td>26.000</td><td>26.000</td><td>52.000</td><td>679.000</td></tr>
<tr><td>EDWIN HERRERA MONSALVE</td><td>Obrero</td><td>1.300.000</td><td>15</td><td>650.000</td><td>81.000</td><td>731.000</td><td>26.000</td><td>26.000</td><td>52.000</td><td>679.000</td></tr>
<tr><td>TOTALES</td><td></td><td>6.500.000</td><td></td><td>3.250.000</td><td>405.000</td><td>3.655.000</td><td>130.000</td><td>130.000</td><td>260.000</td><td>3.395.000</td></tr>
</table>

YULIETH FERNANDA TELLO PERDOMO
Representante Legal J.A.C. DE LA VEREDA CALOTO

YORYANI GARZON QUIMBAYA
Contador Publico

LUIS ENRIQUE CHAVARRO FALLA
Tesorero J.A.C de Caloto Municipio de Paicol H</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Pago de nómina contador:

CUENTA DE COBRO No. 02

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA NIT: 813.004.190-9

DEBE A:

YORYANI GARZON QUIMBAYA
CC. 1.081.158.211 DE Rivera (H)

LA SUMA DE:
UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.400.000)

POR CONCEPTO DE:

Pago del Contrato de Prestación de Servicios del 12 de febrero al 11 de marzo del 2024, suscrito entre JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAICOL y YORYANI GARZON QUIMBAYA como contador público del proyecto: “AUNAR</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Pago de elementos de seguridad:</td></tr>
</table>

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1		Guantes tipo vaqueta reforzado largo	NIU	6,00	$ 14.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00
2	58	Tapaboca industrial negro	NIU	12,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		96.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		96.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		96.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 96.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

4. Pago de las retenciones:

Total retenciones renta y complementario		78	1,507,000
Retenciones practicadas por otros impuestos			
A título de IVA	A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
	Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
	Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
	Total retenciones IVA	82	0
Retenciones impuesto timbre nacional		83	0
Retenciones contribución laudos arbitrales		84	0
Total	**Total retenciones**	85	1,507,000
	Sanciones	86	0
	Total retenciones más sanciones	87	1,507,000

5. Pago de la valla:
Pago de excedente de la valla informativa $ 98.825 ya se había pagado $ 381.175 en el cuarto desembolso.

6. Nuevo pedido de madera para formaleta:
Proveedor Robinson Sánchez Lozada
60X13.000= 780.000
Gastos de madera
60 para alcantarillas
40 para placa huella

7.	Desembolso caja menor: Se autoriza un desembolso de caja menor por un valor de $300.000
8.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se aprueban las siguientes trasferencias: resumen transferencia No. 6 nomina $ 3.395.000,00 honorario contador $ 1.400.000,00 elementos de protección $ 96.000,00 retención en la fuente $ 1.507.000,00 tablas formaleta $ 780.000,00 valla - final $ 98.825,00 caja menor $ 300.000,00 TOTAL $ 7.576.825,00
2.	
3.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: YULIET PERDOMO FALLA
Cargo: PRESIDENTE

Nombre: NICOLÁS ALEXANDER GARZÓN
Cargo: RESIDENTE DE OBRA

Nombre: YOYANI GARZON
Cargo: CONTADOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTORA

Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: LUIS ENRIQUE CHAVARRO
Cargo: TESORERO

Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

Nombre:
Cargo:

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

9.3.3 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA REFORMA

Acta de aprobación de Estudios y Diseños, informes semanales, maquinaria y equipo, personal control aportes legales y seguridad social, informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios acta parcial de pagos de convenios, estado general del tiempo, bitácora, comités operativos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 09/02/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ ACTUALIZACIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ COMPLEMENTACIÓN ☐ AJUSTE ☐ REVISIÓN ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. HUILA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Mediante la suscripción de la presente acta de aprobación de estudios y diseños, se aprueba por el Contratista y el Interventor los estudios y diseños contratados para la ejecución del Convenio 3750 de 2023 suscrito entre el Invias y la Junta de Acción Comunal de La Reforma del municipio de Paicol.

CONVENIO No: 3750 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 189.579.984,00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 14 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4520 DE 2023 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
001 DE 2024	5/10/2023	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 189.579.984	$ 189.579.984

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRANSVERSAL HUILA – CAUCA CÓDIGO 2402, EN EL ACCESO A LA VEREDA LA REFORMA CRUCE EN KM 8 +250 DE LA VÍA LA LAJITA - LA REFORMA (JUNTO AL RÍO PÁEZ) A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 171 ML DE PLACA HUELLA Y 2 ALCANTARILLAS.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	Condiciones locales	1	12	N/A	NOMBRE: "DISEÑO DE PLAN VIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA" ELAVORADO POR: YERLY MAIRETH LEIVA CUMBE M.P: 161037-0560328 TLM
	Diseños geométrico	1	2	2	NOMBRE: "DISEÑO DE PLAN VIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA" ELAVORADO POR: YERLY MAIRETH LEIVA CUMBE M.P: 161037-0560328 TLM PLANOS: "ACAD-DISEÑO GEOMETRICO"
	Condiciones climáticas e hidrológicas	1	35-39	N/A	NOMBRE: "DISEÑO DE PLAN VIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA" ELAVORADO POR: YERLY MAIRETH LEIVA CUMBE M.P: 161037-0560328 TLM
	Caracteriazción de materiales	1	10	N/A	NOMBRE: "INFORME DENSIDADES DEL TERRENO" ELAVORADO POR: SANDRA MILENA ORTIZ PERDOMO
	Concepto de tránsito	1	18-28	N/A	NOMBRE: "DISEÑO DE PLAN VIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA" ELAVORADO POR: YERLY MAIRETH LEIVA CUMBE M.P: 161037-0560328 TLM
					NOMBRE: "DISEÑO DE PLAN VIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	2 de 3

FECHA 09/02/2024
(Día / Mes / Año)

ANEXO 1	Pruebas de laboratorio	**1**	**10**	**N/A**	**NOMBRE:** "INFORME DENSIDADES DEL TERRENO" **ELAVORADO POR:** SANDRA MILENA ORTIZ PERDOMO
ANEXO 2	Diseño de mezclas	**2**	**4**	**N/A**	**NOMBRE:** "Diseño de mezcla 3000 PSI" y "Diseño de mezcla 2000 PSI" **ELAVORADO POR:** MASSEQ
ANEXO 3	Topográfia	**1**	**18**	**2**	**NOMBRE:** "INFORME TOPOGRAFICO LA REFORMA" **ELAVORADO POR:** NELSON EDUARDO OSSO PLANOS: "PLANTA-PERFIL" y "SECCIONES TRANSVERSALES"
ANEXO 4	Memorias de cálculo	**1**	**6**	**N/A**	**NOMBRE:** "MEMORIAS DE CANTIDADES" **ELAVORADO POR:** YERLY MAIRETH LEIVA CUMBE **M.P:** 161037-0560328 TLM

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma:
MARIA CRISTINA SARRIAS ROJAS
Representante legal de la Junta de Acción Comunal de La Reforma del municipio de Paicol
Contratista

Firma:
CAMILO ANDRES QUINTERO LEIVA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 19202-312463 CAU

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante legal
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Unidad Ejecutora
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3750

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 14 del 1/03/2024 al 7/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 36 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,20 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 171 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 0 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	3750 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.579.984,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.579.984,00
PRÓRROGA No. 1:			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.579.984			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.579.984			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.485.439,00**	**75,56%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.274.563,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.982,00**	**22,18%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 7.786.378,07	18,62%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ -	
SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO		
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ 93.210.488,27	
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 101.051.231,31	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 53.887.393,50	71,07%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

Observaciones:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % .....
Meta Física Ejecutada % .....

Avance o Atraso Físico % .....

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	36
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	171
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	36				100,0%
Ejec					
Prog	1,2				100,0%
Ejec					
Prog	171				100,0%
Ejec					
Prog					#DIV/0!
Ejec					#DIV/0!

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... Vereda La Reforma - Paicol .....

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ Km. 5 Via Tesalia-Neiva	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	.....	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: ..... 6 .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: ..... 3 .....
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS: .....
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: ..... Vereda La Reforma - Paicol .....

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 24/01/2024
comite operativo #2: 29/01/2024
comite operativo #3: 07/02/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo reportado no se realizaon comites operativos sin embargo se tuvo contacto directo con los representates de la junta de accion comunal y del personal profesional en cuanto a temas de desombolso de recursos para suminsitros para la construccion de la obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado el arribo de material a la obra, ademas se espera que el municipio envie maquinaria a la obra para desarrollar activiades de confomación.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
HACER ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISION DE CANTIDADES, SEGUIMIENTO A LAS COTIZACIONES DE SUMINISTROS DE MATERILAES, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS PARA SU APROBACION Y TRAMITE DE DESEMBOLSOS.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3750

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 15 del 8/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 36 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,20 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 171 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 0 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	3750 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.579.984,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.579.984,00
PRÓRROGA No. 1:			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.579.984			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.579.984			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.485.439,00**	**75,56%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 47.020.194,87	33,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 11.329.649,92	7,95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (35.690.544,95)	-25,05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.398.835,12	8,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.329.649,92	7,95%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (69.185,20)	-0,05%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.274.563,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.982,00**	**22,18%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.491.791,18	49,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 7.786.378,07	18,62%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 1.478,77	
SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO		
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ -	
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 101.051.231,31	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 58.836.472,20	77,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.515.000,00

Observaciones: Se reporta rendimientos financieros del mes de febrero de 2024, se presenta atraso en avance físico a causa de que su desembolso se realizo a mediados de enero, no fue facil la consecución de ingeniero residente en la región que cumpliera con el perfil requerido, ademas de la falta de disponibilidad de maquinaria y equipo en la región.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 33%
Meta Física Ejecutada % 8%
Avance o Atraso Físico % -25%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	36
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	171
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	36				100,0%
Ejec					
Prog	1,2				100,0%
Ejec					
Prog	171				100,0%
Ejec					
Prog					#DIV/0!
Ejec					#DIV/0!

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Reforma - Paicol

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI	x	NO
	Km. 5 Via Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	x	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 3
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Reforma - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 24/01/2024
comite operativo #2: 29/01/2024
comite operativo #3: 07/02/2024
comite operativo #4: 13/02/2024
comite operativo #5: 16/02/2024
comite operativo #6: 22/02/2024
comite operativo #7: 26/02/2024
comite operativo #8: 12/03/2024
ACTA DE VEEDURIA: 25/01/2024

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 13/03/2024 ser realizo visita por parte delagados de la supervisión para revisar avance fisico de la obra, durante la semana se realizaron actividades de reposición de de alcantarillas existentes e instalacion de subbase; el dia 12/03/2024 se realizo comité operativo No. 8 en el cual aprobaron los siguiente desembolsos: cuenta de cobro del señor JUAN CARLOS CHIMBACO NASAYO (transporte de agregados) por un valor de $ 3.770.000, alquiler de maquinaria retreoexcavadora $3.660.000, factura de la compra de 6 tubos de 36" $ 1.630.00 (transporte incluido); valla informativa $ 380.000, estudios y diseños: $ 2.000.000, Ing. Residente (24 días): $ 2.800.000, contadora (24 días): $ 1.120.000, se aprueba desembolso de caja menor por un valor de $300.000, subsidio al dignatario por un valor de $400.000 (segundo desembolso).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

realizar actividades de concretos encole y descoles de las alcantarillas, se esta a espera de que la alcaldia de Paicol disponga en la obra del vibrocompactador para el dias Lunes 18/03/2024 y poder finalizar la actividad con toma de densidades.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE SUBBASE



CONTRUCCION DE ALCANTARILLA No.1



VISITA INVIAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
HACER ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OBRA EL CUMPLIMIENTO DE ESPEFICACIONES, DISEÑO Y CALIDAD DE OBRA ADEMAS DE REVISIÓN DE CANTIDADES, Y AUTORIZACION PARA TRAMITE DE DESEMBOLSOS.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3750

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 16 del 15/03/2024 al 21/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 36 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,20 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 171 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 0 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA
R. LEGAL:
CONVENIO No. 3750 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 189.579.984,00
FECHA DE INICIO: 30/11/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 189.579.984,00
PRÓRROGA No. 1:
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
INTEGRANTES: DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ
CONTRATO No. 4520 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1: 28/12/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2024 — VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.579.984			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.579.984			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.485.439,00**	**75,56%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 84.066.409,01	59,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 11.329.649,92	7,95%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (72.736.759,09)	-51,05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21.372.815,85	15,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (21.372.815,85)	-15,00%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.274.563,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.982,00**	**22,18%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.837.389,74	57,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 7.231.640,00	17,29%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 1.478,77	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 68.734.629,60	90,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.579.984,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 107.903.798,75	57,22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 18.561.289,92	9,84%

SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO

VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ 17.027.790,00
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 117.319.021,31

Observaciones: Se reporta rendimientos financieros del mes de febrero de 2024, se presenta atraso en avance físico a causa de que su desembolso se realizo a mediados de enero, no fue facil la consecución de ingeniero residente en la región que cumpliera con el perfil requerido, ademas de la falta de disponibilidad de maquinaria y equipo en la región.

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: ENERO

VALOR FACTURA: $ 16.515.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 59%

Meta Física Ejecutada % 8%

Avance o Atraso Físico % -51%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	36
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	171
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	36				100,0%
Ejec					
Prog	1,2				100,0%
Ejec					
Prog	171				100,0%
Ejec					
Prog					#¡DIV/0!
Ejec					#¡DIV/0!

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Reforma - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEO	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	Km. 5 Via Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A X
EMISIONES:	SI		NO		N/A X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 7

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 8

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1

ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Reforma - Paicol

OBSERVACIONES:

comite operativo #1: 24/01/2024
comite operativo #2: 29/01/2024
comite operativo #3: 07/02/2024
comite operativo #4: 13/02/2024
comite operativo #5: 16/02/2024
comite operativo #6: 22/02/2024
comite operativo #7: 26/02/2024
comite operativo #8: 12/03/2024
ACTA DE VEEDURIA: 25/01/2024


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia18/03/2024 se empezaron actividades de compactación de la subbase con la ayuda del vibro compactador que suministro la alcaldía de Paicol, debido a que ese día se había cortado el suministro de agua no se pudo realizar una buena compactación por lo cual se acordó que el día 21/03/2024 nuevamente la alcaldía enviaría la maquinaria (vibro compactador y motoniveladora).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar con las actividades de construccion de placa huella mediante instalacion de acero, instalacion de formaleta, fundicion de concreto.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

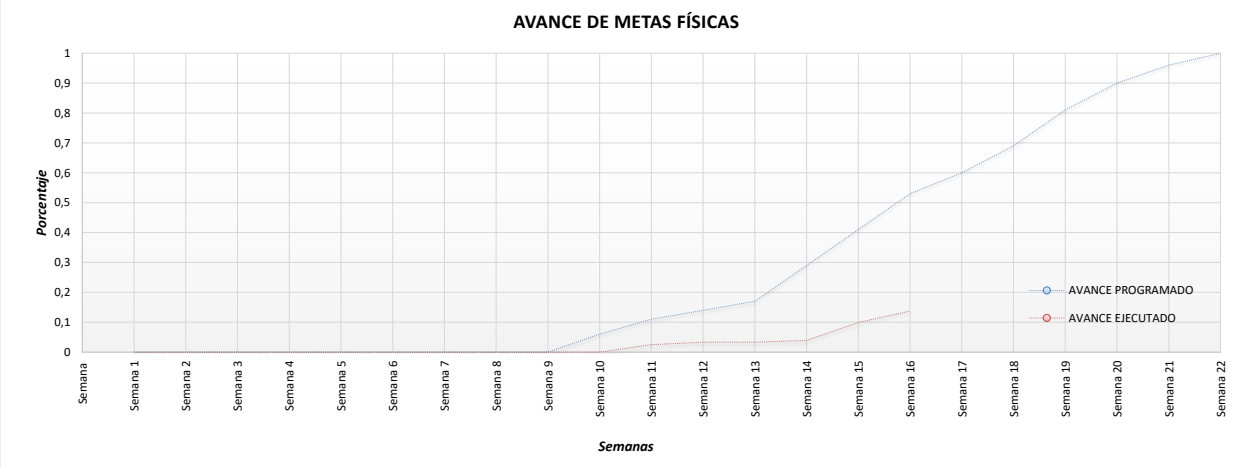

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA



CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA



COMPACTACION DE LA SUB BASE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
HACER ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OBRA EL CUMPLIMIENTO DE ESPEFICACIONES, DISEÑO Y CALIDAD DE OBRA ADEMAS DE REVISIÓN DE CANTIDADES, Y AUTORIZACION PARA TRAMITE DE DESEMBOLSOS.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3750

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 17 del 22/03/2024 al 28/03/2024 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 36 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 1,20 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 171 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 0 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	3750 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.579.984,00
FECHA DE INICIO:	30/11/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.579.984,00
PRÓRROGA No. 1:			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA No. 2:	18/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.579.984			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.579.984			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.485.439,00**	**75,56%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 96.890.098,52	68,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 17.681.062,13	12,41%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (79.209.036,39)	-55,59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.823.689,51	9,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.351.412,21	4,46%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (6.472.277,30)	-4,54%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.274.563,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.819.982,00**	**22,18%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 25.928.388,84	62,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 14.558.935,03	34,81%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.683.708,30	97,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$	1.478,77	
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$**	**188.579.984,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	122.818.487,36	65,13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$	32.239.997,16	17,10%
SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	$	188.579.984,00	**100,00%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$	-	
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$	117.319.021,31	62,21%

Observaciones: Se reporta rendimientos financieros del mes de febrero de 2024, se presenta atraso en avance físico a causa de que su desembolso se realizo a mediados de enero, no fue fácil la consecución de ingeniero residente en la región que cumpliera con el perfil requerido, además de la falta de disponibilidad de maquinaria y equipo en la región. A la fecha se han realizados 4 desembolsos.

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.515.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 68%
Meta Física Ejecutada % 12%
Avance o Atraso Físico % -56%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	36
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	171
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	36				100,0%
Ejec					
Prog	1,2				100,0%
Ejec					
Prog	171				100,0%
Ejec	0,21				0,1%
Prog					#¡DIV/0!
Ejec	2				#¡DIV/0!

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Reforma - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
	Km. 5 Vía Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	5
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 8
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Reforma - Paicol

OBSERVACIONES:
comité operativo #1: 24/01/2024
comité operativo #2: 29/01/2024
comité operativo #3: 07/02/2024
comité operativo #4: 13/02/2024
comité operativo #5: 16/02/2024
comité operativo #6: 22/02/2024
comité operativo #7: 26/02/2024
comité operativo #8: 12/03/2024
ACTA DE VEEDURIA: 25/01/2024


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo reportado se realizo construcción de placa huella realizando actividades de excavaciones varias sin clasificar, instalación de formaleta, concreto ciclópeo resistencia 14 MPA y acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2; debido a las festividades de semana santa, solo se laboró los días martes y miércoles.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la próxima semana se continuará con las actividades de construcción de placa huella mediante la instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta, fundición de concreto rígido y ciclópeo. Se realizará reunión en el sitio de las obras con el personal del contratista revisando programación y acciones a llevar a cabo para terminar dentro del plazo establecido.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

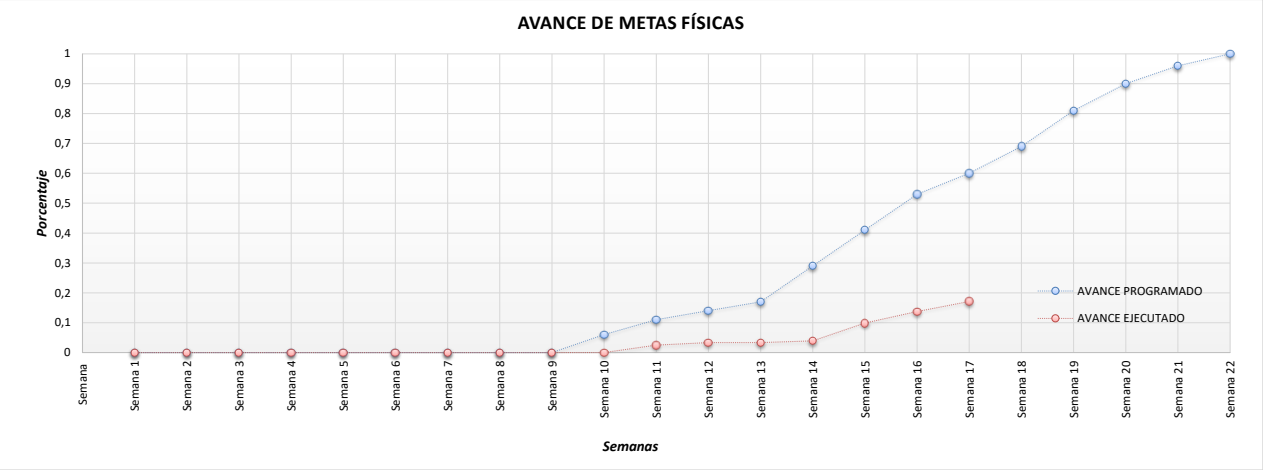

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE FORMALETA



INSTALACION DE ACERO



FUNDICION DE HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

HACER ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OBRA EL CUMPLIMIENTO DE ESPEFICACIONES , PROGRAMACION DE OBRA, DISEÑO Y CALIDAD DE OBRA ADEMAS DE REVISIÓN DE CANTIDADES, Y AUTORIZACION PARA TRAMITE DE DESEMBOLSOS DE PERSONAL, MATERIALES Y EQUIPO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Sub Dirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Huila

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** Mantenimineto y mejoramiento vial en el marco del programa " Caminos para la paza total"

CONVENIO No. 3750 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JAC Vereda La Reforma Municipio de Tesalia Huila.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4520 de 2023 **INTERVENTORÍA:** Silvia Lorena Ordoñez Obrando

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETRO CARGADOR	CAT 416E	18 TON	VDA. LA REFORMA				X	X	X	X																								
MEZCLADORA	TIPO TROMPO	1 BULTO	VDA. LA REFORMA																		X	X	X	X	X	X		X	X	X				
VIBRADOR CONCRETO	TIPO AGUJA	0.50 Mpa	VDA. LA REFORMA																		X	X	X	X	X	X		X	X	X				
MOTONIVELADORA	NEW HOLLAND	140 hp	VDA. LA REFORMA																							X								
VIBRO COMPACTADOR	CASE	41 KN	VDA. LA REFORMA																		X					X								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				A	A		A	A	A	A							A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A				
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	5	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: CAMILO ANDRÉS QUINTERO L.
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-312463 CAU

Firma
Nombre: Miguel Angel Soto Suarez
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0649362 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No: 3750 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-24 **PROYECTO:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ELIECER ALVARADO CADENA	4.919.813	OBRERO	$ 1.300.000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 563.334	$ 39.300	v	NUEVA EPS	9465882566	$ 70.500	PROTECCIÓN	9465882566	$ 90.200	$ 22.600	$ -	$ -	
2	JUAN SEBASTIAN ILLERA MENZA	1.079.509.579	OBRERO	$ 1.300.000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 563.334	$ 39.300	v	NUEVA EPS	9465882566	$ 70.500	PORVENIR	9465882566	$ 90.200	$ 22.600	$ -	$ -	
3	RODMI MARCELO ILLERA MENZA	1.079.508.179	OBRERO	$ 1.300.000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 563.334	$ 39.300	v	NUEVA EPS	9465882566	$ 70.500	PORVENIR	9465882566	$ 90.200	$ 22.600	$ -	$ -	
4	SANTIAGO ALVARADO PERDOMO	1.079.412.593	OBRERO	$ 1.300.000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 563.334	$ 39.300	v	NUEVA EPS	9465882566	$ 70.500	PROTECCIÓN	9465882566	$ 90.200	$ 22.600	$ -	$ -	
5	HAMILTON SARRIAS ROJAS	4.920.478	OFICIAL DE OBRA	$ 1.600.000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$ 563.334	$ 39.300	v	SANITAS	9465882566	$ 70.500	PORVENIR	9465882566	$ 90.200	$ 22.600	$ -	$ -	
6																																												

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:CAMILO ANDRES QUINTERO LEIVA
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520293187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2 **MES:** MARZO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3750 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 188.579.984,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Factura Electronica	FE-16	12-mar-24	GUILLERMO SALAZAR CUCHIMBA	$ 380.000,00	6	VALLA
Factura Electronica	FE EJCM-227	12-mar-24	EDWAR JAIR CABRERA MAÑOZCA	$ 3.801.600,00	1	HORAS DE MAQUINARIA
Cuenta de Cobro		13-mar-24	MARIA CARMEN NASAYO ANDAPIÑA	$ 3.732.300,00	3	TRANSPORTE MATERIAL
Factura Electronica	FE PSCT-55	13-mar-24	ARLENIS TOVAR CAQUIMBO	$ 1.589.250,00	2	TUBOS PARA ALCANTARILLA
Cuenta de Cobro		13-mar-24	YERLY MAIRETH LEIVA CUMBE	$ 1.920.000,00	6	DISEÑOS
Informe		14-mar-24	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA	$ 400.000,00	3	SUBSIDIO DE TRANSPORTE
		14-mar-24	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA	$ 300.000,00	6	CAJA MENOR
Factura Electronica	FE-10859	14-mar-24	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	$ 311.640,00	6	EXAMENES
Factura Electronica	FE-QLFE-34	15-mar-24	CAMILO ANDRES QUINTERO LEIVA	$ 2.800.000,00	6	INGENIERO
Cuenta de Cobro	N° 001	15-mar-24	DIANA MILEIDY FIESCO RAMIREZ	$ 1.120.000,00	6	CONTADORA
Recibo Oficial DIAN		15-mar-24	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA	$ 673.000,00	6	RETENCIÓN

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 19.721.547,00		$ 3.801.600,00	$ 3.801.600,00	$ 15.919.947,00
2	MATERIALES	$ 95.030.973,00	$ 94.224.477,54	$ 1.589.250,00	$ 95.813.727,54	$ (782.754,54)
3	TRANSPORTE	$ 8.367.950,00	$ 445.500,00	$ 4.132.300,00	$ 4.577.800,00	$ 3.790.150,00
4	MANO DE OBRA	$ 19.364.969,00	$ -		$ -	$ 19.364.969,00
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.274.563,00	$ -		$ -	$ 4.274.563,00
6	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 41.819.982,00	$ 7.406.378,07	$ 7.504.640,00	$ 14.911.018,07	$ 26.908.963,93
	TOTALES	$ 188.579.984,00	$ 102.076.355,61	$ 17.027.790,00	$ 119.104.145,61	$ 69.475.838,39

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (FEBRERO) : $ 1.478,77
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 3.799,08
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
De acuerdo con la fecha de inicio de la profesional contable en el proyecto y del radicado de la transferencia No. 1, donde se solicitó el traslado de los rendimientos financieros generados a la fecha de corte, no se ha entregado el comprobante de consignación por parte de la entidad bancaria para tramitar a la Subdirección Financiera del INVIAS.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: MARIA CRISTINA SARRIA ROJAS
Presidente
Junta de Acción Comunal de la Vereda LA REFORMA

Firma:
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 19202-65492 CAU

Firma:
Nombre: CAMILO ANDRES QUINTERO LEIVA
Ingeniero
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 19202-312463 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

Acta **No.** 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 3750 DE 2023
(Indique numero y año)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

VÍA INTERVENIDA: K17+380 de la vía NÁTAGA – LA ESMERALDA – CRUCE LA MESA código 41483-7

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE LA REFORMA

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4520-2023
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	30 (Día)	DE	11 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$	188.579.984,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ADICIONES:**	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$	188.579.984,00
PLAZO (MESES):	3							
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)			
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO:	30 (Día)	DE	4 (Mes)	DE	2024 (Año)			

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; asi mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	GUILLERMO SALAZAR CUCHIMBA	12.280.346	16	23/02/2024	$ 380.000,00		$ 380.000,00
2	EDWAR JAIR CABRERA MAÑOZCA	83.253.829	227	12/03/2024	$ 3.960.000,00		$ 3.960.000,00
3	MARIA CARMEN NASAYO ANDAPIÑA	26.473.557	1	13/03/2024	$ 3.770.000,00		$ 3.770.000,00
4	ARLENIS TOVAR CAQUIMBO	26.425.052	55	05/03/2024	$ 1.630.000,00		$ 1.630.000,00
5	YERLY MAIRETH LEIVA CUMBE	1.079.412.617	1	13/03/2024	$ 2.000.000,00		$ 2.000.000,00
6	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA	900.359.930	1	14/03/2024	$ 400.000,00		$ 400.000,00
7	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA	900.359.930	1		$ 300.000,00		$ 300.000,00
8	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD	900.604.369	10859	14/03/2024	$ 318.000,00		$ 318.000,00
9	CAMILO ANDRES QUINTERO LEIVA	1.061.753.182	34	15/03/2024	$ 2.800.000,00		$ 2.800.000,00
10	DIANA MILEIDY FIESCO RAMIREZ	55.130.728	1	15/03/2024	$ 1.120.000,00		$ 1.120.000,00
11	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFOR	900.359.930	1	16/03/2024	$ 673.000,00		$ 673.000,00
							$ -

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 17.351.000,00	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 105.184.947,58
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 14.966.140,03
TOTAL PAGOS	$ 17.351.000,00	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 120.151.087,61

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: **MARIA CRISTINA SARRIAS ROJAS**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: **SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:25202093187 CND

Firma:
Nombre: **CAMILO ANDRES QUINTERO LEIVA**
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Sub Dirección de Vías Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Huila

CONVENIO DE OBRA No: 3750 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JAC Vereda La Reforma Municipio de Paicol Huila.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Marzo **PROYECTO:** Mantenimineto y mejoramiento vial en el marco del programa " Caminos para la paza total"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4520 de 2023 **INTERVENTOR:** Silvia Lorena Ordoñez Obrando

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco					X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X									360
Lluvias moderadas				X																					X	X	X					26
Lluvias intensas																																
Total horas				2	24	24	24	24			24	24	24	24	24			24	24	24	24	24	24		8	8	8					**386**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

En el mes se presento solo dos días con lluvias moderadas en la mañana, el cual retraso las labores en un día entero, sin embargo la programación de obra no se retrazo lo suficiente para descompensar las actividades programadas según el cronograma de ejecución de obra, para le vereda la esmeralda Nátaga Huila

Firma
Nombre: CAMILO ANDRÉS QUINTERO L.
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-312463 CAU

Firma
Nombre: Miguel Angel Soto Suarez
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0649362 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

"Caminos comunitarios de la Paz total"

Convenio solidario 3750 de 2023

Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vias y la junta de acción comunal de la Vereda la Reforma del municipio de Paicol en el departamento del Huila para el mantenimiento y mejoramiento vial en el marco del programa "Caminos comunitarios de la Paz Total"

Junta de Acción Comunal de la Vereda
La Reforma del municipio de Paicol - Huila
Nit. 900359930-1

	04 / marzo / 2024
Personal	· 1 maestro de obra · 1 Residente de obra · 5 personas de la comunidad
Clima	· Óptimas condiciones climaticas, dia nublado con una temperatura de 22°C.
Actividades	· Se inician actividades a partir de las 09:00 am (Llega retrocargador) · Adecuación ruta de desvío para el tránsito · 10:00 am : Se inician actividades de excavación para la alcantarilla N°1 principalmente para la instalación de tubería en concreto de 36", aletas y poceta. · 10:30 am : Se presenta daño en tubería de gas de 2", solicitando atención · 11:30 am : Llegan los tubos de concreto de 36" para la alcantarilla N°1. · 11:40 am : Se suspende el descargue de la tubería y excavación por lluvia · 12:00 pm : Se reanudan las actividades y se procede a descargar la tubería de concreto de 36" con la pajarita. · 01:30 pm : Se reanudan actividades luego de la hora de descanso, continuando con la excavación para la alcantarilla N°1. · 05:00 pm : Se finaliza jornada laboral
Elementos Protección Personal	· Personal con el uniforme: camisa manga larga - jean · Guantes · Botas
Observaciones	
	Camilo Andres Quintero Leiva Residente de obra Ing. Marel Angel Soto Interventoria.

	05/marzo/2024
Personal	· 1 maestro de obra: · 1 Residente de obra: · 5 Personas de la comunidad
Clima	Óptimas condiciones climaticas, dia soleado con una temperatura de 25°C.
Actividad	08:00 am: Inicio de actividades, con la pajarita se continua con la excavación 11:00 am: Se elabora y vacia concreto pobre para solado de la tubería 11:30 am: Se inicia con la tubería de concreto de 36" instalandola 12:30: Finaliza instalación de tubería de 36" 01:30: Se reanudan las actividades luego de hora de descanso con el relleno de sacos suelos y se instalan donde inicia y finaliza la tubería en concreto. 02:00: se vacia el material procedente de la excavación una vez instalados los tubos y los sacos suelo 05:00 pm: Finaliza jornada laboral
Elem. Protección Personal	· Personal con vestidura de trabajo · Guantes · Botas
Observ.	

Camilo Andres Quintero Leiva
Ing. Residente de obra

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

	06/ marzo /2024
Personal	· 1 maestro de obra · 1 Residente de obra · 5 personal de la comunidad
Clima	Optimas condiciones climaticas, dia soleado con una temperatura de 25 °C.
Actividades	08:00 am: Inicio de actividades, se procede a realizar la excavación de la alcantarilla Nº2. 10:30 am: Se retira tubería de asbesto cemento para instalar en el desvio 11:00 am: Llegan a la obra 6 tubos de 36" en concreto para la alcantarilla Nº2 y se procede a realizar el descargue con ayuda de la comunidad. 01:00 pm: Se reanudan actividades luego de la hora de descanso y se continua con la excavación para la alcantarilla Nº2. 03:00 pm: Se verifican las medidas y se toman niveles 03:15 pm: se elabora y vacia concreto pobre para solado de la tubería. 03:30 pm: Se inicia la instalación de la tubería en concreto de 36" para la alcantarilla Nº2. en conjunto con la preparación de los sacos suelo. 04:00 pm: Llega a la obra el suministro de madera, se procede a realizar el descargue en el área de acopio en propiedad del señor Alvaro (veedor y residente de la vereda). 04:30 pm: Se inicia relleno con material proveniente de la excavación e instalación de sacos suelos de la alcantarilla Nº2. 05:00 pm: Finaliza jornada laboral.
Elementos Protección Personal	· Personal con vestidura de trabajo · Guantes · Botas
Observaciones	
	Camilo Andres Quintero Leiva — Interventoria Ing. Residente de Obra. — Ing. Miguel Angel Soto

07/marzo/2024

Personal	1 maestro de obra 1 Residente de obra 5 personal de la comunidad
Clima	Óptimas condiciones climaticas, dia soleado con una temperatura de 25°C.
Activid.	08:00 am: Inicio de actividades, se descargan los viajes de subbase que van llegando en las volquetas 08:15 am: Se realiza explanación para ampliar la vía 10:00 am: Extendido de material de subbase granular mediante retrocargador 01:00 pm: Se reanudan actividades luego de la hora de descanso y se continua con el extendido de subbase granular 04:00 pm: Se realiza excavación (cajeo) para la transición de placa huella nueva con la existente. 05:00 pm: Finaliza jornada laboral.
Elemt. Protece Personal	. Personal con vestidura de trabajo . Guantes . Botas
Observ.	

Camilo Andres Quintero Leiva
Ing. Residente de Obra

Interventoria.
Ing. Miguel Angel Soto

	08/mar20/2024
Personal	- 1 maestro de obra
	- 1 Residente de obra
	- 5 personas de la comunidad
Clima	Óptimas condiciones climáticas, día soleado con una temperatura de 25°C.
Actividades	08:00 am: Inicio de actividades, se continuan actividades de suministro, instalación y extendido de subbase granular
	01:00 pm: Se reanudan actividades luego de la hora de descanso, se continua con el extendido de subbase granular.
	05:00 pm: Finaliza jornada laboral
Elementos Protección Personal	· Personal con vestidura de trabajo · Guantes · Botas
Observaciones	
	Camilo Andres Quintero leiva — Interventoria
	Ing. Residente de obra — Ing. Miguel Angel Soto

	09/marzo/2024
Personal	N/A
Clima	N/A
Activid	Día no laborado, se solicita motoniveladora y vibrocompactador
	10/marzo/2024
Personal	N/A
Clima	N/A
Activid	Día no laborado, día festivo.
	11/marzo/2024
Personal	N/A
Clima	N/A
Activid	Día no laborado, en espera de motoniveladora y vibrocompactador.
	12/marzo/2024
Personal	N/A
Clima	N/A
Activid	Día no laborado, en espera de motoniveladora y vibrocompactador.

Camilo Andres Quintero Leiva — Interventoria.
Ing. Residente de Obra

	13/marzo/2024
Personal	· 1 maestro de obra · 1 Residente de obra · 5 personas de la comunidad
Clima	Óptimas condiciones climaticas, día soleado con una temperatura de 25°C
Actividades	08:00 am: Inicio de actividades, se programa para este dia el descargue del suministro de materiales de construcción según orden de llegada 09:00 am: Suministro de mixto 3/4" para concreto de alcantarillas 10:00 am: Suministro y descargue en acopio asignado de 236 bultos de cemento estructural cemex 11:00 am: suministro y descargue de acero de refuerzo y materiales para la construcción de ferreteria 01:00 pm: se reanudan actividades de descargue luego de la hora de descanso de suministro de señalización y dotacion Industrial. 03:30 pm: Suministro y descargue en acopio asignado de 236 bultos de cemento estructural cemex 04:30 pm: Se protege el área de acopio del cemento con plastico 05:00 pm: Finaliza jornada laboral
Elementos Proteccion Personal	· Personal con vestidura de trabajo · Guantes · Botas
Observaciones	

Camilo Andres Quintero Leiva
Ing. Residente de Obra

Interventoria.
Ing. Miguel Angel Soto

	14/mar20/2024
Personal	Personal
	· maestro de obra
	· Residente de obra
	· 5 personas de la comunidad
Clima	Óptimas condiciones climaticas, día nublado con una temperatura de 24°C
Activ.	08:00 am: Inicio de actividades
	08:30 am: Se retira agua de la alcantarilla N°2 debido a daño de la tuberia del acueducto de la vereda.
	10:30 am: Se realiza perfilado de la excavación en la alcantarilla N°1.
	01:00 pm: Se reanudan actividades luego de la hora de descanso, continuando con el perfilado de la excavación en la alcantarilla N°1.
	03:30 pm: Inicia armado y amarre de acero de refuerzo de alcantarilla N°1, empezando a llevar el material desde acopio hasta alcantarilla N°1.
	03:30 pm: Se elabora y vacia solado para placa de poceta y descole
	05:00 pm: Finaliza jornada laboral
Elem.	.Personal con vestidura de trabajo
Protecc.	· Guantes
Personal	· Botas
Obsev	

Camilo Andres Quintero Leiva
Ing. Residente de Obra

Interventoria.
Ing. Miguel Angel Soto

	15/marzo/2024
Personal	1 maestro de obra
	1 Residente de obra
	6 personas de la comunidad
Clima	Óptimas condiciones climaticas, día soleado con una temperatura de 25°C
Actividades	07:00 am : Inicio de actividades, se continua con el armado y amarre de acero de refuerzo de la poceta, aletas y muro de la alcantarilla N°1 (PR 0+041.184)
	11:20 am : Se realiza la elaboración y vaciado de concreto para las placas de descole y poceta, mediante mezcladora.
	01:00 pm : Se reanudan actividades luego de la hora de descanso y se continua con el vaciado de concreto de las placas
	03:00 pm : Se realiza la perfilación de las paredes y piso de la excavación de la alcantarilla N°2 (PR 0+141.084)
	05:00 pm : Finaliza la jornada laboral.
Elementos Protección Personal	· Personal con vestidura de trabajo . Guantes . Botas
Observaciones	

Camilo Andres Quintero Leiva
Ing Residente de obra

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

	16/marzo/2024
Personal	N/A
Clima	N/A
Actividad	Día no laborado, según lo previsto se inician actividades el día 18 de marzo de 2023 con personal contratado por la comunidad.
Observ.	

Camilo Andres Quintero Leiva — Interventoria
Ing. Residente de Obra — Ing. Miguel Angel Soto

	17/marzo/2024
Personal	N/A
Clima	N/A
Activid.	Día no laborado, según lo previsto se inician actividades el día 18 de marzo de 2023 con personal contratado por la comunidad.
Observ.	

Camilo Andres Quintero Leiva — Interventoria
Ing. Residente de Obra — Ing. Miguel Angel Soto

	18/marzo/2024
Personal	· 1 maestro de obra · 1 Residente de obra · 1 Oficial · 4 auxiliares de obra
clima	Óptimas condiciones climáticas, día soleado con una temperatura de 25°C
Actividades	07:00 am : Inicio de actividades · Se realiza la compactación de la subbase granular mediante vibrocompactador de la alcaldia municipal de Paicol - Huila. · El vibrocompactador realiza 2 pasones a la vía, pero debido a falta de humedad se retira; la administración municipal se compromete a prestarlo nuevamente. · Se continúa con el armado y amarre del acero de refuerzo de la poceta, aletas, muro de la alcantarilla N°1 (PR0+041.184) · Se inicia con la instalación y amarre de la formaleta en madera para poceta, aletas y muro de la alcantarilla N°1 · Se realiza la elaboración y vaciado de solado de limpieza de la poceta, aletas y muro en alcantarilla N° 2. (PR0+141.084) · Se inicia con el armado y amarre del acero de refuerzo de los muros de la poceta de la alcantarilla N°2. · Se finaliza el arme y amarre de formaleta en madera en la poceta de la alcantarilla N°1 · Se programa fundición de los muros de la poceta de la alcantarilla N°1 para el proximo día 05:00 pm: Finaliza jornada laboral
Observaciones	
	Camilo Andres Quintero Leiva — Interventoria Ing. Residente de Obra — Ing. Miguel Angel Soto

	19 / marzo / 2024
Personal	· 1 maestro de obra
	· 1 Residente de obra
	· 1 Oficial
	· 4 Auxiliares de obra
Clima	Óptimas condiciones climáticas, día soleado con una temperatura de 24°c
Activid.	07:00 am: Inicio de actividades
	· Se realiza la fundición de los muros de la poceta
	· Finaliza armado y amarrado de acero de refuerzo de las aletas y muro de la alcantarilla Nº1 (PRO+041.184)
	· Finaliza la instalación y amarre de la formaleta en madera de aletas y muro de la alcantarilla Nº1 (PRO+041.184)
	· Se programa fundición de aletas y muro de la alcantarilla Nº1 para el proximo día.
	· Se realizó visita por parte de Interventoria y del laboratorio ESSUING para la toma de muestra de densidades
	· Se continua con el armado y amarre de acero de refuerzo para la alcantarilla Nº2
	· Se realizó la elaboración y vaciado de concreto para la placa de la poceta de la alcantarilla Nº2. (PRO+141.084)
	· Se realiza señalización del perimetro con cinta de seguridad
	05:00 pm: Finaliza jornada laboral
Elem Protecc Personal	· Se realiza entrega al personal de trabajo de dotación y elementos de protección personal (camisa, pantalón, guantes, botas, casco, gafas y tapaoidos)
Observ-	
	Camilo Andres Quintero Leiva — Interventoria
	Ing. Residente de Obra — Ing. Miguel Angel Soto

	20/marzo/2024
Personal	· 1 maestro de obra
	· 1 Residente de obra
	· 1 Oficial
	· 4 Auxiliares de obra
Clima	Óptimas condiciones climaticas, día soleado con una temperatura de 25°C
Actividades	07:00 am: Inicio de actividades
	· Se retira la formaleta de madera de los muros de la poceta de alcantarilla N°1 DE
	· Se realiza fundición de las aletas y muro de la alcantarilla N°1 (PRO+041.134)
	· Se continua con el armado y amarre del acero de refuerzo de los muros FG
	de la poceta de la alcantarilla N°2 (PRO+141.084)
	· Inicia el armado y amarre del acero de refuerzo de las aletas y muro HI
	de la alcantarilla N°2 (PRO+141.084)
	· Se realiza la elaboración y vaciado de concreto de la placa de JK
	descole de la alcantarilla N°2.
	· Se realiza la respectiva señalización del perimetro con cinta de LM
	seguridad para evitar accidentes.
	05:00 pm: Finaliza jornada laboral NO
Elementos	· Personal portando uniforme PQ
Proteccion	· casco
Personal	· Guantes R
	· Botas
	S
Observaciones	
	T
	U
	Camilo Andres Quintero Leiva — Interventoria.
	Ing. Residente de Obra — Ing. Miguel Angel Soto W
	Y

Powered by CamScanner

20

		21/marzo/2024
Personal	- 1 maestro de obra -1 Residente de obra - 1 Oficial - 4 Auxiliares de obra.	
Clima	Óptimas condiciones climaticas, día soleado con una temperatura de 24°C	
Actividades	07:00 am : Inicio de actividades. - Se retira formaleta de madera de las aletas y muro de la alcantarilla Nº1 - Se inicia con el armado y amarre de la formaleta de madera para los muros de la poreta de la alcantarilla Nº2 (PR 0+141.084) - Se continua con el armado y amarre del acero de refuerzo de las aletas y muro de la alcantarilla Nº2. - Finaliza instalación de formaleta en madera de la poreta de la alcantarilla Nº2 - Se programa fundición de poreta de la alcantarilla Nº2 para el proximo día. - Se realiza señalización del perimetro con cinta de seguridad 05:00 pm : Finaliza jornada laboral.	
Elem Protecc	- Personal portando uniforme	
Personal	- Guantes	
	- Casco	
Obsev.		

Camilo Andres Quintero Leiva
Ing. Residente de Obra

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

	22/marzo/2024
Personal	: 1 maestro de obra · 1 Residente de obra · 1 Oficial · 4 Auxiliares de obra
Clima	Óptimas condiciones climaticas, día soleado con una temperatura de 26°C.
Actividades	07:00 am : Inicio de actividades · Se realiza la fundición de los muros de la poceta de la alcantarilla N°2 · Inicia instalación y amarre de formaleta en madera para las aletas y muro de la alcantarilla N°2 (PRO+141.084) · Finaliza instalación y amarre de formaleta en madera para aletas y muro de la alcantarilla N°2 · Se realiza fundición de aletas y muro de la alcantarilla N°2 · Se realiza señalización del perimetro con cinta de seguridad 05:00 pm : Finaliza jornada laboral
Elementos Protección Personal	· Personal portando uniforme · Casco · Guantes
Observaciones	
	Camilo Andres Quintero Leiva Ing. Residente de Obra Interventoria Ing. Miguel Angel Soto

FG HI JK LM NO PQ R S T UV WX

22

	23/marzo/2024
Personal	· 1 maestro de obra -1 Residente de obra - 1 Oficial - 4 Auxiliares de obra
Clima	Óptimas condiciones climáticas, día soleado con una temperatura de 25°C.
Actividades	07:00 am: Inicio de actividades -Se realiza el retiro de la formaleta en madera de los muros de la poceta, las aletas y muro de la alcantarilla Nº2 (PR0+141.084) . La administración municipal de Paicol-Huila hace préstamo de la maquinaria, una motoniveladora new holland para realizar el extendido y nivelación de material de subbase granular, tambien se facilito por parte de la administración un vibrocompactador CASE para realizar la debida compactación de la subbase granular. · Mediante mangueras se realiza la irrigación de agua sobre la subbase granular, esto con el fin de garantizar una humedad optima que permita generar un alto porcentaje de compactación. · Se realiza señalización del perimetro con cinta de seguridad 05:00 pm: Finaliza jornada laboral
Elem. Protecc Personal	· Personal portando uniforme · Casco · Guantes
Observ.	

Camilo Andres Quintero Leiva
Ing. Residente de Obra

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

	24 /marzo /2024
Personal	N/A
Clima	N/A
Actividades	Día no laborado por ser día festivo
	25 /marzo/ 2024
Personal	·1 maestro de obra ·1 Residente de obra ·1 Oficial ·4 Auxiliares de obra
Clima	Moderadas condiciones climaticas, día con llovizna con una temperatura de 22°c
Actividades	7:00 am : Inicio de actividades ·Se inician actividades para la construcción de placa huella teniendo en cuenta los diseños aprobados. · Se realiza el armado de la formaleta en madera con las tablas suministradas, se forman los cajones donde se vaciara el concreto de huellas · Se realiza el armado y amarre del acero de refuerzo de la viga - riostras · Se realiza señalización del perimetro con cinta de seguridad: 05:00 pm : Finaliza jornada laboral
Elementos Protección Personal	· Personal portando uniforme · Casco · Guantes
Observaciones	
	Camilo Andres Quintero Leiva — Interventoria. Ing. Residente de obra — Ing. Miguel Angel Soto

24

	26/marzo/2024
Personal	· 1 maestro de obra
	· 1 Residente de obra
	· 1 Oficial
	· 4 Auxiliares de obra
Clima	Moderadas condiciones climáticas, día con llovizna con una temperatura de 22°C
Actividades	07:00 am : Inicio de actividades
	· Se inicia instalación de formaleta de madera para las huellas
	: Se realiza excavación de 10 cm en la subbase granular para garantizar la altura de 25 cm de la viga riostra.
	· Se realiza la instalación del acero de refuerzo una vez se encuentre correctamente armado y amarrado de acuerdo a los diseños de viga-riostras.
	· Se inicia el armado y amarrado del acero de refuerzo longitudinal y transversal de las huellas
	· Se realiza visita de interventoria para supervisión y revisión de avance de ob
	· Se realiza señalización del perimetro con cinta de seguridad
	05:00 pm : Finaliza jornada laboral.
Elem. Protecc Personal	- Personal porta uniforme · Casco · Guantes
Observ.	

Camilo Andres Quintero Leiva
Ing. Residente de Obra

Interventoria
Ing. Marcl Angel Soto

	27/marzo/2024
Personal	· 1 maestro de obra · 1 Residente de obra · 1 Oficial · 4 Auxiliares de obra
Clima	Moderadas condiciones climáticas, día nublado con una temperatura de 23°c
Actividades	07:00 am: Inicio de actividades · Se continua con el armado y amarre del acero de refuerzo longitudinal y transversal de las huellas siguiendo los diseños aprobados. · Se realiza instalación del acero de refuerzo para cunetas · Se realiza instalación de formaleta en madera para cunetas. · Inicio de fundición de huellas, viga riostra y cunetas · Se finaliza fundición con un avance de 39 metros lineales de huellas y cunetas · Se deja el lugar señalizado con cinta de seguridad y se prohibe el paso por este perimetro con el fin de evitar accidentes y proteger la obra. 05:00 pm: Finaliza jornada laboral
Elementos Protección Personal	· Personal porta uniforme · Casco · Guantes
Observaciones	

Camilo Andres Quintero Leiva
Ing. Residente de Obra

Interventoria
Ing. Miguel Angel Soto

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 8	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 12/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: LA REFORMA – PAICOL – HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3750
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
MILEIDY FIESCO		CONTADORA
CRISTINA SARRIAS		PRESIDENTA
SILVIA LORENA ORDOÑEZ		INTERVENTORA
JOSE MIGUEL ORTEGA		SUPERVISOR INVIAS
MIGUEL ANGEL SOTO		ING. RES. INTERVENTORIA
CAMILO ANDRES QUITERO		ING. RESIDENTE

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Aprobar valor del transporte.
2- Aprobar pago de maquinaria.
3- Aprobar compra de tubería de 36”
4- Resumen de obra
5- Resumen financiero
6- Valla
7- Otras transferencias
8- Imprevistos

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

<table>
<tr><th>Tema</th><th>Resumen</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Aprobar pago del transporte:

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA

NIT: 900359930-1

DEBE A:

JUAN CARLOS CHIMBACO NASAYO

C.C. 1004074403

LA SUMA DE: TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS.....3.770.000


POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE DE 13 VIAJES DE MATERIAL DESDE MASSEQ HASTA LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL.

Favor consignar a la cuenta de ahorro de Bancolombia 07680639323

No se aprueba esta cuenta de cobro ya que debe cambiarse a nombre de quien se consigna el dinero ya que no fue el proveedor con el que se contrató.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Aprobar pago de maquinaria:

Detalles de Productos
<table><tr><th rowspan="2">Nro.</th><th rowspan="2">Código</th><th rowspan="2">Descripción</th><th rowspan="2">U/M</th><th rowspan="2">Cantidad</th><th rowspan="2">Precio unitario</th><th rowspan="2">Descuento detalle</th><th rowspan="2">Recargo detalle</th><th colspan="4">IMPUESTOS</th><th rowspan="2">Precio unitario de venta</th></tr><tr><th>IVA</th><th>%</th><th>INC</th><th>%</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>MOVIMIENTO DE TIERRA</td><td>HUR</td><td>30,50</td><td>$ 120.000,00</td><td>$ 0,00</td><td>$ 0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>$ 3.660.000,00</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>

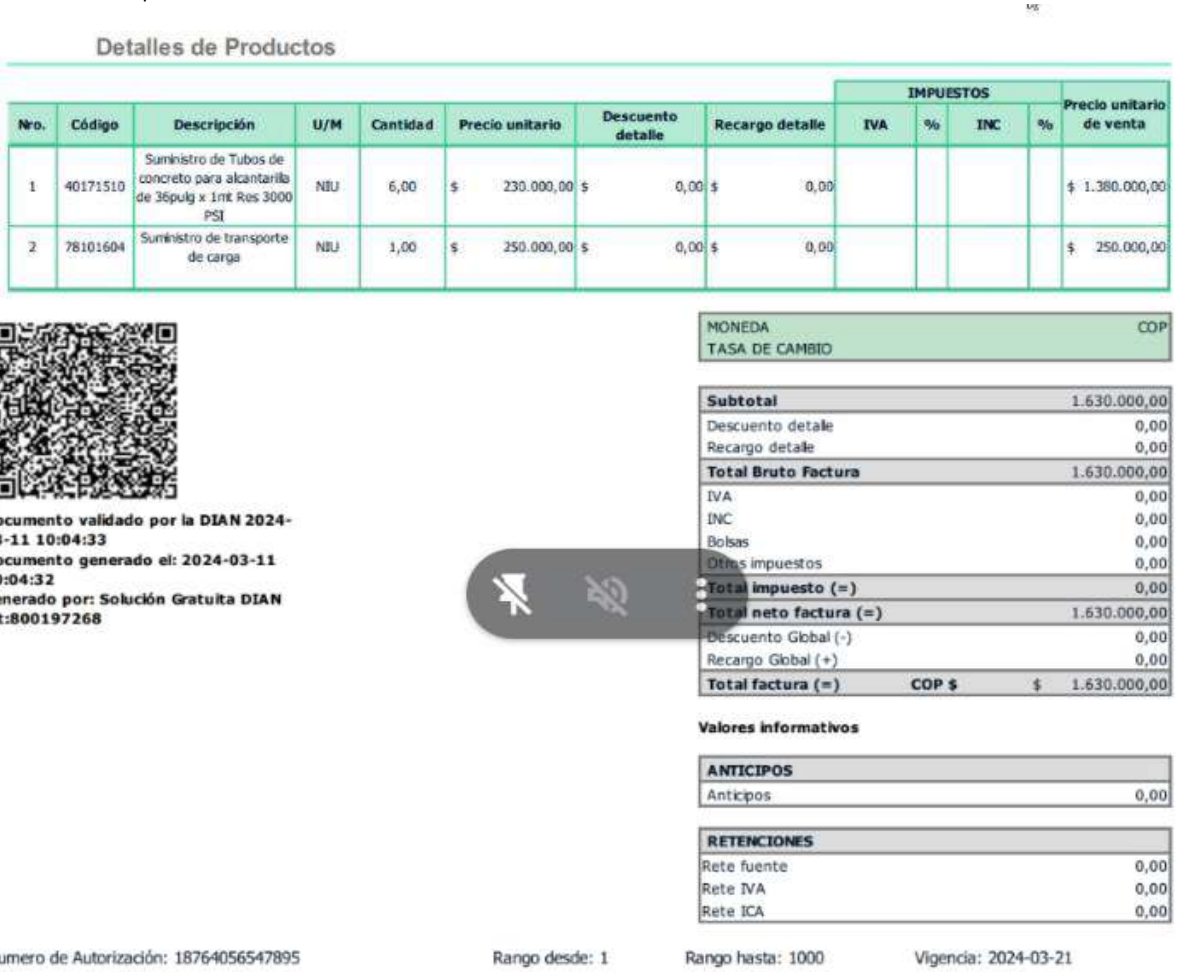Documento validado por la DIAN 2024-03-11 08:16:49
Documento generado el: 2024-03-11 08:16:49
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 3.660.000,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 3.660.000,00
IVA 0,00
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 0,00
Total neto factura (=) 3.660.000,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) COP $ $ 3.660.000,00
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764056716471 Rango desde: 160 Rango hasta: 300 Vigencia: 2024-03-25
Se aprueba pago de alquiler de maquinaria por un valor de 3.660.000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Aprobar compra de tubería de 36”:

Detalles de Productos
Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta
1 | 40171510 | Suministro de Tubos de concreto para alcantarilla de 36pulg x 1mt Res 3000 PSI | NIU | 6,00 | $ 230.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.380.000,00
2 | 78101604 | Suministro de transporte de carga | NIU | 1,00 | $ 250.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 250.000,00
Documento validado por la DIAN 2024-03-11 10:04:33
Documento generado el: 2024-03-11 10:04:32
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268
MONEDA COP
TASA DE CAMBIO
Subtotal 1.630.000,00
Descuento detalle 0,00
Recargo detalle 0,00
Total Bruto Factura 1.630.000,00
IVA 0,00
INC 0,00
Bolsas 0,00
Otros impuestos 0,00
Total impuesto (=) 0,00
Total neto factura (=) 1.630.000,00
Descuento Global (-) 0,00
Recargo Global (+) 0,00
Total factura (=) COP $ $ 1.630.000,00
Valores informativos
ANTICIPOS
Anticipos 0,00
RETENCIONES
Rete fuente 0,00
Rete IVA 0,00
Rete ICA 0,00
Numero de Autorización: 18764056547895 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2024-03-21
Se aprueba el pago de la tubería de 36” por un valor de $1.630.000</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Resumen de obra:</td></tr>
</table>

	Con colaboración del maestro y mingas por parte de la comunidad se están realizando la actividad de construcción de alcantarillas (instalación de tubería) ya que no se tenían previstas en el presupuesto. Cemento esta programado llegue el día 12/03/2024 Acero se programa arribo a la obra el día 12/03/2024 Subbase cantidad de viajes: 13 viajes el cual ya se extendió con ayuda de la pajarita y a la espera de que la alcaldía preste el vibro compactador para hacer la compactación del agregado.
5.	Resumen financiero:
6.	Valla informativa: Ya se había aprobado proveedor, se había tenido un problema con la cuenta del proveedor por lo cual no se había podido realizar el pago, por ende, nuevamente entra en este pago $ 380.000.
7.	Otras transferencias Pago de estudios y diseños: $ 2.000.000 se aprueba Pago de nomina del Ing. Residente (24 días): $ 2.800.000 se solicita informe de resumen con corte al 30 de febrero. Pago de nómina de la contadora (24 días): $ 1.120.000 se solicita informe de resumen con corte al 30 de febrero. Caja menor: se aprueba desembolso de caja menor por un valor de 300.000 Subsidio de transporte al dignatario: se aprueba desembolso de subsidio al dignatario por un valor de 400.000 (segundo desembolso). **INFORME GASTOS DE TRANSPORTE DE LOS DIGNATARIOS** • El 14 de julio del 2023, viajaron la presidenta y la tesorera a la ciudad de Neiva para una reunión en el Hotel Matamundo – Campestre a la 8:00 am. • El 25 de Julio del 2023, viajaron la presidenta y la tesorera al municipio de La Plata Huila, a una reunión en el restaurante El Portón, con el fin de dar apertura a la cuenta bancaria, la cual nos acompañó funcionarios de Invias y 2 asesoras del banco AVVILLAS. • El 01 de Agosto del 2023, viajaron la presidenta y la tesorera a la ciudad de Neiva para realizar la apertura de la cuenta. • El 16 de Noviembre del 2023, asistieron la presidenta y la Tesorera a una feria en la ciudad de Neiva , donde los acompaño el Ingeniero Jesús Rincón, dos funcionarios de planta Central y los asesores de Bancos, ARL, EPS, Aseguradoras, Caja de compensación y fondos de Pensión. Con el fin de guiarnos durante el proceso. • El 14 de Enero de 2024, viajaron la presidenta y la tesorera a la ciudad de Neiva para realizar la actualización de firmas de la cuenta. **NOTA:** Cada viaje a Neiva en viáticos le costó a la Junta $100.000 y a La Plata costo $50.000, por dignatario Total, de desembolso 16.060.000 para esta transferencia.
8.	Imprevistos:

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión

1.	
2.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: CRISTINA SARRIAS ROJAS
Cargo: PRESIDENTA

Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: INVIAS SUPERVISOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INVIAS INTERVENTORA

Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO
Cargo: ING. RES. INTERVENTORIA

Nombre: CARLA BIVIANA PALOMINO
Cargo: TESORERA

Nombre: DIANA MILEIDY FIESCO
Cargo: CONTADORA

Nombre: CAMILO ANDRES QUINTERO
Cargo: ING. RESIDENTE

Procedimientos a tener en cuenta para la construcción de las obras

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

9.3.4 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN MARCOS

Acta de aprobación de Estudios y Diseños, informes semanales, maquinaria y equipo, personal control aportes legales y seguridad social, informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios acta parcial de pagos de convenios, estado general del tiempo, bitácora, comités operativos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 3

FECHA 09/02/2024
(Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** D.T. HUILA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Mediante la suscripción de la presente acta de aprobación de estudios y diseños, se aprueba por el Contratista y el Interventor los estudios y diseños contratados para la ejecución del Convenio 3518 de 2023 suscrito entre el Invias y la Junta de Acción Comunal de San Marcos del municipio de Paicol.

CONVENIO No: 3518 DE 2023
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 189.457.015,00
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 30 (Día) DE 11 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2023 (Año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4520 DE 2023
(Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
001 DE 2023	26/09/2023	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 189.457.015	$ 189.457.015

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

FECHA 09/02/2024
(Día / Mes / Año)

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA PAICOL - ALTO SAN MIGUEL - CALOTO - SAN ANDRES A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIóN DE 128 ML DE PLACA HUELLA Y 2 ALCANTARILLAS.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIóN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	**Condiciones locales**	1	5 A 9	NO APLICA	**NOMBRE:** INFORME SAN MARCOS **ELAVORADO POR:** LESLY CAROLINA GUARÍN TORRES **M.P:** 01112-10636
	Diseño geométrico	1	10 A 15	5	**NOMBRE:** INFORME SAN MARCOS **ELAVORADO POR:** LESLY CAROLINA GUARÍN TORRES **M.P:** 01112-10636 **PLANOS:** DISEÑO GEOMÉTRICO PLANOS 1 A 5
	Condiciones climáticas e hidrológicas	1	35 A 47	NO APLICA	**NOMBRE:** DISEÑO VIAL PARA LA CONSTRUCCIóN DE PLACA HUELLA **ELAVORADO POR:** RAFAEL OSPITIA THOLA **M.P:** 19202084902 CAU
	Caracteriazción de materiales	1	78	NO APLICA	**NOMBRE:** ESTUDIO DE SUELOS **ELAVORADO POR:** JOSE LUIS VARGAS QUIMABAYA **M.P:** 70202170212 TLM
	Concepto de tránsito	1	18 A 23	NO APLICA	**NOMBRE:** DISEÑO VIAL PARA LA CONSTRUCCIóN DE PLACA HUELLA **ELAVORADO POR:** RAFAEL OSPITIA THOLA
	Concepto estructural	1	16 A 25	NO APLICA	**NOMBRE:** INFORME SAN MARCOS **ELAVORADO POR:** LESLY CAROLINA GUARÍN TORRES **M.P:** 01112-10636
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio	1	45 A 73	NO APLICA	**NOMBRE:** ESTUDIO DE SUELOS **ELAVORADO POR:** JOSE LUIS VARGAS QUIMABAYA **M.P:** 70202170212 TLM
ANEXO 2	Diseño de mezclas	2	2 2	NO APLICA	**NOMBRE:** "DISEÑO DE MEZCLA 3000 PSI" y "DISEÑO DE MEZCLA 2000 PSI" **ELAVORADO POR:** CARLOS ANDRES CUSCUE
ANEXO 3	Topográfia	1	18	NO APLICA	**NOMBRE:** INFORME TOPOGRÁFICO **ELAVORADO POR:** NELSON OSSO HERRERA **L.P:** 0121701
ANEXO 4	Memorias de cálculo	1	7	NO APLICA	**NOMBRE:** MEMORIA DE CANTIDADES **ELAVORADO POR:** LESLY CAROLINA GUARÍN **M.P:** 01112-10636

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIóN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

FECHA 09/02/2024
(Día / Mes / Año)

QUIEN ENTREGA

Firma:
LISA MINELLY CHAVRRO ARDILA
Representante legal de la Junta de Acción Comunal de San Marcos del municipio de Paicol
Contratista

Firma:
RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 19202084902 CAU

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante legal

Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Unidad Ejecutora
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 7/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3518

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 14 (Numeración consecutiva) del 1/03/2024 al 7/03/2024 Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 24 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 128 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	3518	VALOR INICIAL:	$ 189.457.015,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.457.015,00
PRÓRROGA No. 1:	1/01/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.673.500			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.673.500			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 141.608.762,00**	**75,05%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 32.037.934,54	22,62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 10.593.655,55	7,48%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (21.444.278,99)	-15,14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10.030.533,83	7,08%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.593.655,55	7,48%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 563.121,72	0,40%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.248.263,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.816.475,00**	**22,69%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 22.835.453,33	53,33%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 8.347.264,00	19,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.673.500,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 54.873.387,87	29,08%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 18.940.919,55	10,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 10.593.655,55	5,61%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 40.831.236,10	53,85%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.107.078,70	10,69%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.107.078,70	10,69%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 188.673.500,00**	**100,00%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ -	
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 66.798.361,88	35,40%

Observaciones:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 23%
Meta Física Ejecutada % 7%
Avance o Atraso Físico % -15%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	128
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	24				100,0%
Ejec					
Prog	2,4				100,0%
Ejec					
Prog	128				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec	1				50,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Marcos - Paicol

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	Km. 5 Via Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 7
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Marcos - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 11/12/2023
comite operativo #2: 18/12/2023
comite operativo #3: 29/01/2024
comite operativo #4: 31/01/2024
comite operativo #5: 07/02/2024
comite operativo #6: 14/02/2024
comite operativo #7: 20/02/2024


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades poara la reposición alacantarillas: Excavaciones varias sin clasificar, Rellenos para estructuras con material de la excavación, Concreto resistencia 21MPA, Concreto resistencia 14MPA, Tubería concreto reforzado, Saco suelo.; no se realizaron comites operativos, sin embargo se tuvo contacto con la OAC para resolver inquietudes de compra de materiales, alquiler de maquinaria entre otros.y administrativas.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

a) seguir la contrucción de alcantarillas encoles y descoles.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

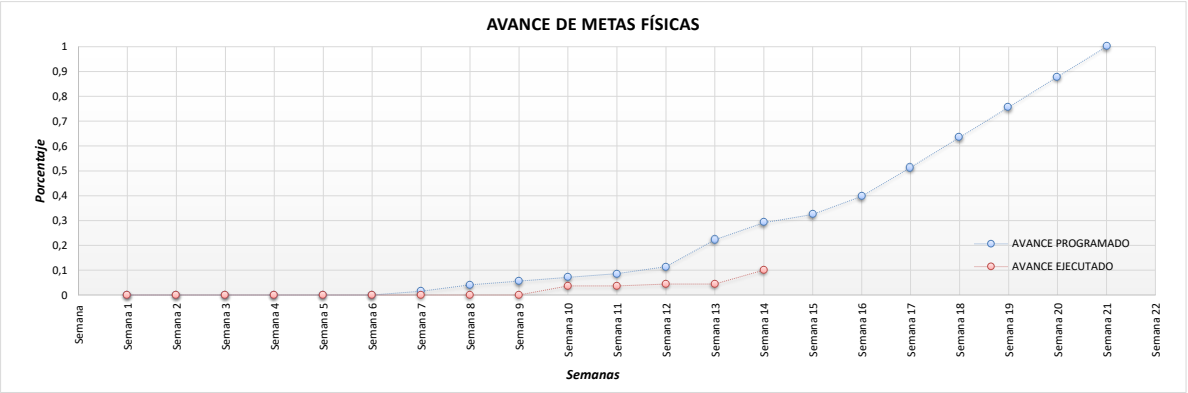

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Tramo vial curva No.1



Alcantarilla No.2



Alcantarilla No.2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

COMITES OPERATIVOS DE REVISION A LAS COTIZACIONES DE SUMINISTROS DE MATERILAES, ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS PARA SU APROBACION Y TRAMITE DE DESEMBOLSOS, CONTRATACION DE MAESTRO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3518

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 15 del 8/03/2024 al 14/03/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 36 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 128 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	3518	VALOR INICIAL:	$ 189.457.015,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.457.015,00
PRÓRROGA No. 1:	1/01/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.457.015			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.457.015			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.366.514,00**	**75,14%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 35.663.084,11	25,05%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 22.540.605,40	15,83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (13.122.478,71)	-9,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 3.453.713,79	2,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.946.949,85	8,39%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 8.493.236,06	5,97%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.270.995,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.819.506,00**	**22,60%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 25.691.703,60	60,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 9.637.264,00	22,51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.290.000,00	3,01%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 1.167,11	
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 189.457.015,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 61.354.787,71	32,38%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 32.177.869,40	16,98%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.236.949,85	6,99%

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 58.836.472,20	77,60%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.515.000,00

SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 189.457.015,00**	**100,00%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ 7.421.600,00	3,92%
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 74.219.961,88	39,18%

Observaciones:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 25%
Meta Física Ejecutada % 16%

Avance o Atraso Físico % -9%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
	Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	128
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	24				100,0%
Ejec					
Prog	2,4				100,0%
Ejec					
Prog	128				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec	1,5				75,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	
Total	1	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Marcos - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Km. 5 Via Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 9
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Marcos - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 11/12/2023
comite operativo #2: 18/12/2023
comite operativo #3: 29/01/2024
comite operativo #4: 31/01/2024
comite operativo #5: 07/02/2024
comite operativo #6: 14/02/2024
comite operativo #7: 20/02/2024
comite operativo #8: 22/02/2024
comite operativo #9: 12/03/2024
ACTA DE VEEDURIA. 6/12/2023


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 13/03/2024 ser realizo visita por parte delagados de la supervision para revisar avance fisico de la obra. durante esta semana se realizaron las siguientes actividades para la reposición alcantarillas: Excavaciones varias sin clasificar, Rellenos para estructuras con material de la excavación, Concreto resistencia 21MPA, Concreto resistencia 14MPA, Tubería concreto reforzado, Saco suelo; además de esto se inició obra de placa huella con la actividad de extensión de subbase ; el día 08/03/2024 se realiza transferencia No.3 en la cual se paga: VIVIANA GARAVITO AVENDAÑO, formaleta ($ 720.000), CORNELIA GALINDO ANDRADRE, uniformes ($ 910.000), GILLERMO SALAZAR, valla informativa ($ 380.000) y JAC, pago de retenciones ($ 1.142.000); el día 12/03/2024 se realizó comité operativo No. 9 en el cual sepresentó cotización del vibro compactador por un valor de $ 2.400.000 (transporte incluido),se presentó un cuadro resumen de transporte y horas de maquinaria requeridos hasta la fecha y se autorizaron los siguientes desembolsos: nómina de los ayudantes de obra del periodo del 04/03/2024 al 15/03/2024 por $3.369.600, anticipo del vibocompactador por $900,000, rendimientos financieros por un valor de $ 4.363,33 del mes diciembre, enero y febrero.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

a) Informe del residente de obra: entrega jueves 14 de marzo de 2024.
b) Informe de contadora:entrega jueves 12 de marzo de 2024.
c) Próxima reunión, viernes 15 de marzo del 2024
d) Instalaición de Subbase y compactación, se requiere la toma de desidades para dar inicio a las actividades de construcciön de placa huella.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

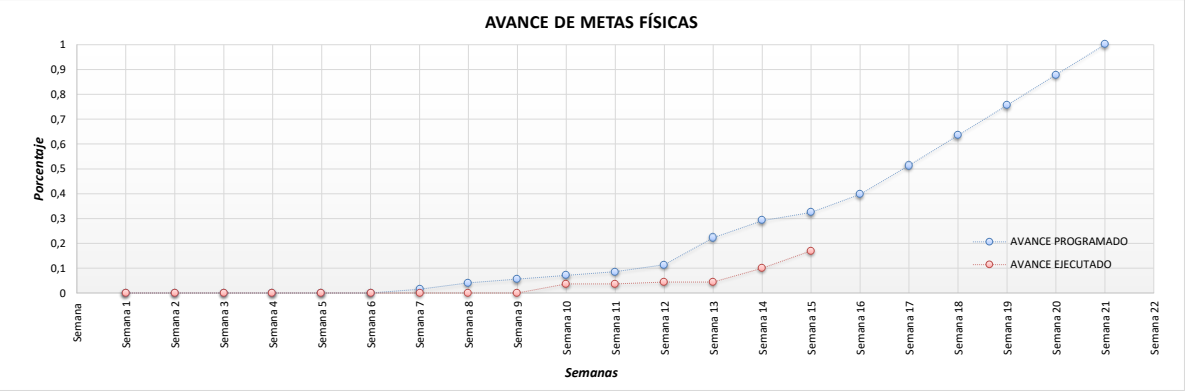

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION ALCANTARILLA No. 1



CONSTRUCCION ALCANTARILLA No. 2



VISITA INVIAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

HACER ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OBRA EN EL CUMPLIMIENTO DE ESPEFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑO Y CALIDAD DE OBRA ADEMAS DE REVISIÓN DE CANTIDADES, Y AUTORIZACION PARA TRAMITE DE DESEMBOLSOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO

Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3518

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 16 del 15/03/2024 al 21/03/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 36 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 128 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA
R. LEGAL:
CONVENIO No. 3518 — VALOR INICIAL: $ 189.457.015,00
FECHA DE INICIO: 4/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 189.457.015,00
PRÓRROGA No. 1: 1/01/2024 — $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
INTEGRANTES: DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ
CONTRATO No. 4520 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO: 1/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1: 28/12/2023 — VALOR ANTICIPO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/03/2024 — VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.457.015			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.457.015			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.366.514,00**	**75,14%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 46.723.904,58	32,82%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 32.114.553,80	22,56%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (14.609.350,78)	-10,26%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.060.820,47	7,77%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.573.948,40	6,72%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (1.486.872,07)	-1,04%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.270.995,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.819.506,00**	**22,60%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 28.546.337,33	66,67%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 9.637.264,00	22,51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 1.167,11	

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 68.734.629,60	90,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 189.457.015,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 75.270.241,92	39,73%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 41.751.817,80	22,04%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 9.573.948,40	5,05%
SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$ 189.457.015,00**	**100,00%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$ -	
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$ 74.219.961,88	39,18%

Observaciones:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.515.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 33%
Meta Física Ejecutada % 23%
Avance o Atraso Físico % -10%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	128
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Avance Físico	**Tramo 1**					**%**
Prog	24					100,0%
Ejec						
Prog	2,4					100,0%
Ejec						
Prog	128					100,0%
Ejec	10,47					8,2%
Prog	2					100,0%
Ejec	2					100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBRO COMPACTADOR	1	
Total	1	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Marcos - Paicol

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	Km. 5 Via Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 9
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Marcos - Paicol

OBSERVACIONES:
comite operativo #1: 11/12/2023
comite operativo #2: 18/12/2023
comite operativo #3: 29/01/2024
comite operativo #4: 31/01/2024
comite operativo #5: 07/02/2024
comite operativo #6: 14/02/2024
comite operativo #7: 20/02/2024
comite operativo #8: 22/02/2024
comite operativo #9: 12/03/2024
ACTA DE VEEDURIA. 6/12/2023


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El dia 18/03/2024 se relizaron labores de compactacion de la sub base con la ayuda de un vibro compactador, El 19/03/2024 se realizó en campo la toma de densidades de la subbase instalada en la obra; la compactación dio un resultado aceptable por lo cual se empezó con la construcción de la placa huella (excavaciones varias sin clasificar, instalacion de concreto ciclópeo resistencia 14MPa).

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con la construcción de placa huella en las actividades de (instalación de formaleta, acero de refuerzo y fundición de concreto)

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

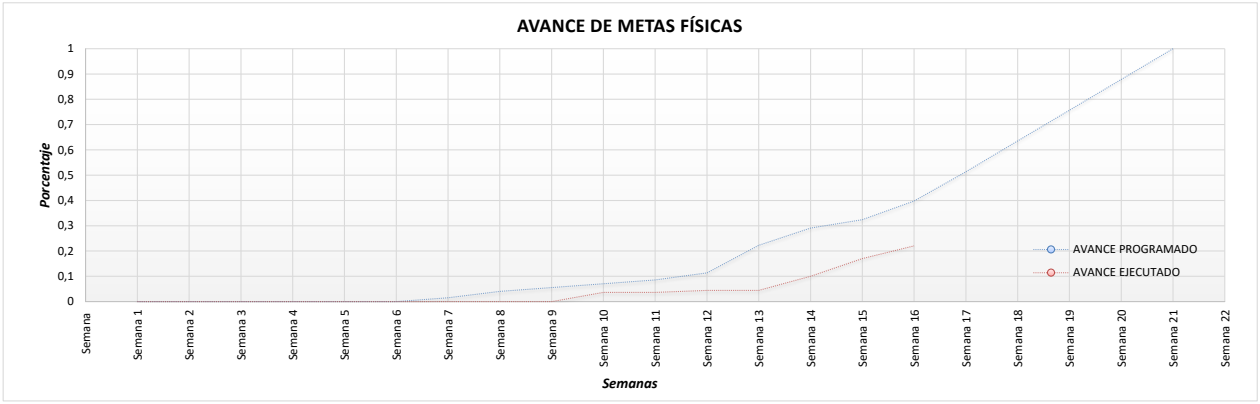

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMPACTACION DE LA SUBBASE



TOMA DE DENSIDADES EN CAMPO



FORMALETA PARA EL INICIO DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
HACER ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OBRA EN EL CUMPLIMIENTO DE ESPEFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑO Y CALIDAD DE OBRA ADEMAS DE REVISIÓN DE CANTIDADES, Y AUTORIZACION PARA TRAMITE DE DESEMBOLSOS.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3518

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 17 del 22/03/2024 al 28/03/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE 36 ml
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS 2,4 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 128 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 2 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA		
R. LEGAL:			
CONVENIO No.	3518	VALOR INICIAL:	$ 189.457.015,00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.457.015,00
PRÓRROGA No. 1:	1/01/2024		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO		
INTEGRANTES:	DIRECTOR: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO - RESIDENTE: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ		
CONTRATO No.	4520 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 75.820.315,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 75.820.315,00
PRÓRROGA No. 1:	28/12/2023	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRÓRROGA No. 2:	18/03/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 189.457.015			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.457.015			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 75.820.315			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 75.820.315			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.366.514,00**	**75,14%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 65.852.426,47	46,26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 49.439.771,01	34,73%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (16.412.655,46)	-11,53%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.128.521,88	13,44%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.419.398,31	12,24%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (1.709.123,57)	-1,20%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.270.995,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.819.506,00**	**22,60%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.400.971,07	73,33%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 9.637.264,00	22,51%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 75.820.315,00	100,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 68.734.629,60	90,65%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.949.078,70	6,53%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$	1.167,11	
VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$**	**189.457.015,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	97.253.397,53	51,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$	59.077.035,01	31,18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	17.419.398,31	9,19%
SEGUIMIENTO A DESEMBOLSO	**$**	**189.457.015,00**	**100,00%**
VALOR EJECUCIÓN SEMANAL	$	62.639.045,00	33,06%
VALOR EJECUCIÓN ACUMULADA	$	136.859.006,88	72,24%

Observaciones:A la fecha se ha realizado 6 desembolsos.

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.515.000,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 46%
Meta Física Ejecutada % 35%
Avance o Atraso Físico % -12%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	24
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2,4
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	128
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	2

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	24				100,0%
Ejec					
Prog	2,4				100,0%
Ejec					
Prog	128				100,0%
Ejec	16				12,5%
Prog	2				100,0%
Ejec	2				100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Marcos - Paicol

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	Km. 5 Via Tesalia-Neiva	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 15

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 10
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Marcos - Paicol

OBSERVACIONES:
comité operativo #1: 11/12/2023
comité operativo #2: 18/12/2023
comité operativo #3: 29/01/2024
comité operativo #4: 31/01/2024
comité operativo #5: 07/02/2024
comité operativo #6: 14/02/2024
comité operativo #7: 20/02/2024
comité operativo #8: 22/02/2024
comité operativo #9: 12/03/2024
comité operativo #10: 26/03/2024
ACTA DE VEEDURIA. 6/12/2023


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante el periodo reportado se realizo construcción de placa huella realizando actividades de excavaciones varias sin clasificar, instalación de formaleta, concreto reforzado resistencia 21 MPA, concreto ciclópeo resistencia 14 MPA y acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm2; debido a las festividades de semana santa, solo se laboró los días martes y miércoles; así mismo el día 26/03/2024 se realizo comité operativo No.10 en el cual se presentaron facturas y se autorizaron las transferencias de lo siguiente: nomina de 5 ayudantes y 1 oficial por el valor de $ 4.655.949, alquiler de retroexcavadora $ 7.740.000, alquiler de vibro compactador $ 2.250.000, material de ferretería CONSTRUCIVIL $ 11.428.000, pago de agregados MASSEQ $ 24.104.096, nomina del maestro 5.111.000, nomina del ing. residente $ 5.250.000 (15/01/2024 al 29/02/2024), nomina del contador 2.100.000 (15/01/2024 al 29/02/2024) para un total de $62.639.045.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la próxima semana se continuará con las actividades de construcción de placa huella mediante la instalación de acero de refuerzo, instalación de formaleta, fundición de concreto rígido y ciclópeo. Se realizará reunión en el sitio de las obras con el personal del contratista revisando programación y acciones a llevar a cabo para terminar dentro del plazo establecido.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

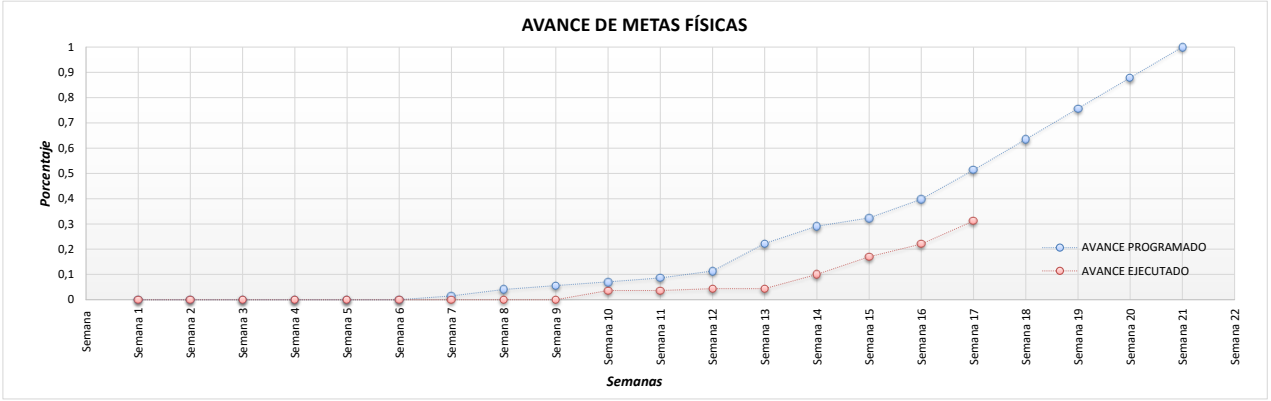

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACION DE ACERO



INSTALACION DE CONCRETO HUELLA



INSTALACION DE CONCRETO CICLOPEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
HACER ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE OBRA EN EL CUMPLIMIENTO DE ESPEFICACIONES TÉCNICAS, PROGRAMACIÓN DE OBFRA, DISEÑO Y CALIDAD DE OBRA ADEMAS DE REVISIÓN DE CANTIDADES, Y AUTORIZACION PARA TRAMITE DE DESEMBOLSOS.	FIRMA NOMBRE: JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO Matrícula Profesional No.: 1920265492 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIóN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CóDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIóN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Sub Dirección de Vías Regionales **DIRECCIóN TERRITORIAL:** Huila

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO **PROYECTO:** Mantenimineto y mejoramiento vial en el marco del programa " Caminos para la paza total"

CONVENIO No. 3518 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JAC Vereda San Marcos Municipio de Paicol Huila.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4520 de 2023 **INTERVENTORÍA:** Silvia Lorena Ordoñez Obrando

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIóN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIóN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA	CAT 426C	18 TON	V SAN MARCOS				X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X			X												
VIBRO COMPACTADOR	DYNAPAC	CA-15	V SAN MARCOS														X	X	X		X	X												
MEZCLADORA	TIPO TROMPO	1½ DE BULTO	V SAN MARCOS						X					X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X				
VIBRADOR CONCRETO	TIPO AGUJA	0.50 Mpa	V SAN MARCOS											X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X				
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO							A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A				
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIóN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIóN = R	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIóN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIó CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIóN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 192020284902 CAUCA

Firma

Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0649362 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No: 3518 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR DEL HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																																	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	MIGUEL ANGEL PUYO VITECHE	4.920.356	OBRERO	$ 1.300.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC SAN MARCOS	$ 1.170.000	$ 81.500	v	NUEVA EPS	9466190268	$ 146.300	COLPENSIONES	9466190268	$ 187.200	$ 46.800			
2	HENRY TRUJILLO SANTOFIMIO	4.920.283	OBRERO	$ 1.300.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC SAN MARCOS	$ 1.170.000	$ 81.500	v	NUEVA EPS	9466190268	$ 146.300	PORVENIR	9466190268	$ 187.200	$ 46.800			
3	YEFERSON ANDRES PUYO VITECHE	1.081.421.909	OBRERO	$ 1.300.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC SAN MARCOS	$ 1.170.000	$ 81.500	v	NUEVA EPS	9466190268	$ 146.300	PROTECCIÓN	9466190268	$ 187.200	$ 46.800			
4	LUIS FERNANDO BAUTISTA PUYO	1.079.390.147	OBRERO	$ 1.300.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC SAN MARCOS	$ 1.170.000	$ 81.500	v	SANITAS	9466190268	$ 146.300	COLFONDOS	9466190268	$ 187.200	$ 46.800			
5	URBANO ILLERA ARTEAGA	4.920.385	OBRERO	$ 1.300.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC SAN MARCOS	$ 1.170.000	$ 81.500	v	SANITAS	9466190268	$ 146.300	PORVENIR	9466190268	$ 187.200	$ 46.800			
6	CARLOS FERNEY DOMINGUEZ CASAMACHIN	12.278.539	OFICIAL DE OBRA	$ 1.600.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC SAN MARCOS	$ 1.440.000	$ 100.300	v	SANITAS	9466190268	$ 180.000	COLPENSIONES	9466190268	$ 230.400	$ 57.600			
7																																																

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:19202084902 CAU

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 2 **MES:** MARZO **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3518 DE 2023 (Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 **%**

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: **$ 189.461.285,00** **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Pre-factura	N° 054	07-mar-24	VIVIANA GARAVITO AVENDAÑO	$ 720.000,00	2	MADERA
Recibo Oficial DIAN		07-mar-24	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN MARCOS	$ 1.142.000,00	6	RETENCIÓN
Cuenta de Cobro		07-mar-24	CORNELIA GALINDO ANDRADE	$ 910.000,00	6	UNIFORMES
Factura Electronica	FE-15	07-mar-24	GUILLERMO SALAZAR CUCHIMBA	$ 380.000,00	6	VALLA
Nomina		15-mar-24	MIGUEL ANGEL PUYO VITECHE	$ 543.200,00	4	NOMINA
Nomina		15-mar-24	HENRY TRUJILLO SANTOFIMIO	$ 543.200,00	4	NOMINA
Nomina		15-mar-24	YEFERSON ANDRES PUYO VITECHE	$ 543.200,00	4	NOMINA
Nomina		15-mar-24	LUIS FERNANDO BAUTISTA PUYO	$ 543.200,00	4	NOMINA
Nomina		15-mar-24	URBANO ILLERA ARTEAGA	$ 543.200,00	4	NOMINA
Nomina		15-mar-24	CARLOS FERNEY DOMINGUEZ CASAMACHIN	$ 653.600,00	4	NOMINA
Cuenta de Cobro		15-mar-24	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA MEDINA	$ 864.000,00	3	TRANSPORTE VIBRO
Factura Electronica	FE-509	15-mar-24	RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA	$ 5.250.000,00	6	HONORARIOS
Cuenta de Cobro	N° 001	15-mar-24	DIANA MILEIDY FIESCO RAMIREZ	$ 2.100.000,00	6	HONORARIOS
Factura Electronica	FE-256	21-mar-24	ASOCIACION DE VOLQUETEROS VILLA DEL CAMBIS	$ 7.740.000,00	1	ALQUILER DE LA RETRO
Factura Electronica	GDE-372	21-mar-24	GUSTAVO ADOLFO DURAN PEREZ	$ 2.160.000,00	1	ALQUILER VIBRO
Factura Electronica	FE-2302	21-mar-24	FERRETERIA CONSTRUCIVIL G&C SAS	$ 11.187.915,98	2	MATERIAL FERRETERIA
Factura Electronica	FEV-255	21-mar-24	ASOCIACION DE VOLQUETEROS VILLA DEL CAMBIS	$ 24.104.096,55	2	MATERIAL DE PLAYA
Cuenta de Cobro	N° 01	23-mar-24	LEONARDO SALAZAR	$ 5.008.780,00	4	MAESTRO
Nomina		30-mar-24	MIGUEL ANGEL PUYO VITECHE	$ 750.251,00	4	NOMINA
Nomina		30-mar-24	HENRY TRUJILLO SANTOFIMIO	$ 750.251,00	4	NOMINA
Nomina		30-mar-24	YEFERSON ANDRES PUYO VITECHE	$ 750.251,00	4	NOMINA
Nomina		30-mar-24	LUIS FERNANDO BAUTISTA PUYO	$ 750.251,00	4	NOMINA
Nomina		30-mar-24	URBANO ILLERA ARTEAGA	$ 750.251,00	4	NOMINA
Nomina		30-mar-24	CARLOS FERNEY DOMINGUEZ CASAMACHIN	$ 904.694,00	4	NOMINA

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 21.053.935,00	$ -	$ 9.900.000,00	$ 9.900.000,00	$ 11.153.935,00
2	MATERIALES	$ 93.085.404,00	$ 58.637.097,00	$ 36.012.012,53	$ 94.649.109,53	$ (1.563.705,53)
3	TRANSPORTE	$ 8.856.410,00	$ -	$ 864.000,00	$ 864.000,00	$ 7.992.410,00
4	MANO DE OBRA	$ 19.378.262,00	$ -	$ 13.034.329,00	$ 13.034.329,00	$ 6.343.933,00
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.270.995,00	$ -		$ -	$ 4.270.995,00
6	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 42.816.279,00	$ 8.161.264,00	$ 9.782.000,00	$ 17.943.264,00	$ 24.873.015,00
	TOTALES	$ 189.461.285,00	$ 66.798.361,00	$ 69.592.341,53	$ 136.390.702,53	$ 53.070.582,47

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (FEBRERO) : $ 1.167,11
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 4.776,43
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
De acuerdo con la fecha de inicio de la profesional contable en el proyecto y del radicado de la transferencia No. 1, donde se solicitó el traslado de los rendimientos financieros generados a la fecha de corte, no se ha entregado el comprobante de consignación por parte de la entidad bancaria para tramitar a la Subdirección Financiera del INVIAS.

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma:
Nombre: LISA MINELLY CHAVARRO
Presidente
Junta de Acción Comunal de la Vereda SAN MARCOS

Firma:
Nombre: RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA
Ingeniero Residente Del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 19202084902 CAU

Firma:
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	VERSIÓN	
		PÁGINA	

31/03/2024
(Día / Mes / Año)

Acta **No.** 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 3750 DE 2023
(Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA: K17+380 de la vía NÁTAGA – LA ESMERALDA – CRUCE LA MESA código 41483-7

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4520-2023
(Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 30 (Día) DE 11 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 188.457.015,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 188.457.015,00

PLAZO (MESES): 3

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	VIVIANA GARAVITO AVENDAÑO	1.081.413.618	54	07/03/2024	$ 720.000,00	$ -	$ 720.000,00
2	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN MARCOS	813.010.422	1	08/07/2024	$ 1.141.924,38	$ -	$ 1.141.924
3	CORNELIA GALINDO ANDRADE	26.528.752	1	29/02/2024	$ 910.000,00	$ -	$ 910.000
4	GUILLERMO SALAZAR CUCHIMBA	12.280.346	15	23/02/2024	$ 380.000,00		$ 380.000,00
5	MIGUEL ANGEL PUYO VITECHE	4.920.356	1	15/03/2024	$ 543.200,00		$ 543.200,00
6	HENRY TRUJILLO SANTOFIMIO	4.920.283	1	15/03/2024	$ 543.200,00		$ 543.200,00
7	YEFERSON ANDRES PUYO VITECHE	1.081.421.909	1	15/03/2024	$ 543.200,00		$ 543.200,00
8	LUIS FERNANDO BAUTISTA PUYO	1.079.390.147	1	15/03/2024	$ 543.200,00		$ 543.200,00
9	URBANO ILLERA ARTEAGA	4.920.385	1	15/03/2024	$ 543.200,00		$ 543.200,00
10	CARLOS FERNEY DOMINGUEZ CASAMACHIN	12.278.539	1	15/03/2024	$ 653.600,00		$ 653.600,00
11	LUIS FERNANDO CASTAÑEDA MEDINA	12.281.944	1	12/03/2024	$ 900.000,00		$ 900.000,00
12	RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA	12.277.905	509	14/03/2024	$ 5.250.000,00		$ 5.250.000,00
13	DIANA MILEIDY FIESCO RAMIREZ	55.130.728	1	13/03/2024	$ 2.100.000,00		$ 2.100.000,00
14	ASOCIACION DE VOLQUETEROS VILLA DEL CAMBIS	900.031.425	256	21/03/2024	$ 7.695.882,00	$ 44.118,00	$ 7.740.000,00
15	GUSTAVO ADOLFO DURAN PEREZ	1.081.399.730	372	20/03/2024	$ 2.250.000,00		$ 2.250.000,00
16	FERRETERIA CONSTRUCIVIL G&C SAS	901.473.908	2302	20/03/2024	$ 9.603.361,00	$ 1.824.639,00	$ 11.428.000,00
17	ASOCIACION DE VOLQUETEROS VILLA DEL CAMBIS	900.031.425	255	21/03/2024	$ 21.793.441,00	$ 2.310.655,55	$ 24.104.096,55
18	LEONARDO SALAZAR	83.256.123	1	23/03/2024	$ 5.111.000,00		$ 5.111.000,00
19	MIGUEL ANGEL PUYO VITECHE	4.920.356	1	30/03/2024	$ 750.251,00		$ 750.251,00
20	HENRY TRUJILLO SANTOFIMIO	4.920.283	1	30/03/2024	$ 750.251,00		$ 750.251,00
21	YEFERSON ANDRES PUYO VITECHE	1.081.421.909	1	30/03/2024	$ 750.251,00		$ 750.251,00
22	LUIS FERNANDO BAUTISTA PUYO	1.079.390.147	1	30/03/2024	$ 750.251,00		$ 750.251,00
23	URBANO ILLERA ARTEAGA	4.920.385	1	30/03/2024	$ 750.251,00		$ 750.251,00
24	CARLOS FERNEY DOMINGUEZ CASAMACHIN	12.278.539	1	30/03/2024	$ 904.694,00		$ 904.694,00

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 65.881.157,38	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 124.798.123,67
VALOR IVA	$ 4.179.412,55	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 13.161.614,86
TOTAL PAGOS	$ 70.060.569,93	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 137.959.738,53

NOTAS:
1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: **LISA MINELLY CHAVARRO ARDILA**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: **SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202093187 CND

Firma:
Nombre: **RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA**
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:19202084902 CAU

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIóN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CóDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIóN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Sub Dirección de Vías Regionales **DIRECCIóN TERRITORIAL:** Huila

CONVENIO DE OBRA No: 3518 DEL 2023 **CONTRATISTA:** JAC Vereda San Marcos Municipio de Paicol Huila.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Marzo **PROYECTO:** Mantenimineto y mejoramiento vial en el marco del programa " Caminos para la paza total"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4520 de 2023 **INTERVENTOR:** Silvia Lorena Ordoñez Obrando

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco				12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12		12	12	12	9	12	12		12	6	8					239
Lluvias moderadas																					3					6	4					13
Lluvias intensas																																
Total horas				12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12		12	12	12	0	0	0	0	**252**

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

En el mes se presento solo seis días con lluvias moderadas y fuertes en la mañana, el cual retraso las labores en medio día, sin embargo la programación de obra no se retrazo lo suficiente para descompensar las actividades programadas según el cronograma de ejecución de obra, para le vereda la esmeralda Nátaga Huila

Firma
Nombre: RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202084902 CAU

Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0649362 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Marzo 04 de 2024.

Ing. Residente = 1.
Maestro : 1
Oficial. : 1
Ayudantes Construcción : 5

Estado del tiempo : seco
Se inician las labores con el reconocimiento de sitio por parte del maestro, identificando los puntos de inicio y final, las alcantarillas a sustituir, y el tramo de vía a intervenir, se encuentra en el sitio de Obra la Retro. cargador 426C, y en el trans de la mañana llega la tubería de concreto de 36", igualmente llega la mezcladora, se inicia la limpieza del sitio, la colocación de unos brackes en alambre de puas que permitirán el cierre de la vía.

Residente Interventoría

Marzo 05 de 2024

Ing. Residente = 1.
Maestro = 1
Oficial = 1.
Ayudantes = 5
Se inicia el proceso de excavación y demolición de la alcantarilla ubicada en el PR0+062., se excava y se retiran los restos de los tubos a un lado de la vía mientras se depositan adecuadamente, lo mismo se hace con los cabezotes y las caja de entrada, se continua limpiando el area de trabajo de maleza e iniciamos el retiro de unos cercos que se encuentran en el area de trabajo.

Powered by CamScanner

Marzo 06 de 2024.
Ing Residente = 1
Maestro = 1
Oficial = 1
Ayudantes = 5.
tiempo Seco.
se pasan niveles y se termina la excavación de la alcantarilla, comprobando niveles de desplante y pendiente de la tubería, se procede a fundir el solado de la tubería, en concreto simple con un espesor de 20 cm aproximadamente. se pasaron los tubos alineamos. y al finalizar los enbaquillamos con mezcla de cemento.

Marzo 07 de 2024
Ing. Residente = 1.
Maestro = 1.
Oficial = 1.
Ayudantes = 5.
tiempo Seco.
Se inicia con el llenado de los sacos suelo, para conformar el relleno de la tubería de concreto reforzado, colocandolos adecuadamente, se procede a realizar el relleno de esta tubería debidamente, con compactador de manual, se inicio la conformación de la corona de la vía, realizando los movimientos de tierra, esto despues de localizar el eje y determinar los anchos de la corona de acuerdo a cada abscisa.

Marzo 08 de 2024.
Ing. Residente = 1
Maestro = 1
Oficial = 1
Ayudantes = 5
Tiempo Seco.
Se continua con la conformación de la corona del tramo de vía a intervenir, esto con la participación de la retrocargador, se nivela y excava hasta la cota acordada la caja de la alcantarilla del PR0+162, se funde temprano el solado de limbieza y en horas de la tarde se organizan aceros y se funde el piso de la misma.

Marzo 09 de 2024.
Ing. Residente = 1.
Maestro = 1
Oficial = 1
Ayudantes = 5.
Tiempo Seco.
Se termino de Ampliar la corona, con la retro, en la alcantarilla se colocan los aceros transversales de la caja de entrada de la alcantarilla, se formaleteo con madera y se realiza la fundición de la caja de entrada.

Marzo 11 de 2024.
Ing. Residente = 1.
Maestro = 1
Oficial. = 1
Ayudante = 5
tiempo Seco.
se realizo la excavación del descole de salida de la alcantarilla PROH162, se determinan niveles y dejando los movimientos de tierra terminados ampliando los descoles y disponiendo los suelos de las excavaciones adecuadamente.
Se termina de conformar la corona del tramo a intervenir, estableciendo anchos mínimos y pendientes y peraltes aproximados.

Marzo 12 de 2024.
Ing. Residente = 1.
Maestro = 1.
Oficial = 1.
Ayudante = 5.
tiempo seco.
Se procede a Perfilar y fundir el piso de las aletas de salida de la alcantarilla PROH162, se colocan los aceros correspondientes para piso, aletas y cabezote.
llego a obra la subbase, empezamos la colocación actividad realizada con ayuda de la retro, por la dificultad de conseccion de motoniveladora se ayuda con trabajadores y personal de obra para perfilar niveles.

Marzo 13 de 2024.
Ing Residente = 1
Maestro = 1
Oficial = 1
Ayudantes = 5.
tiempo seco.
se colocan los aceros correspondientes a los dados y el cabezote de salida de la alcantarilla PROY162, se procede a formaletear los dados y su fundicion correspondiente.
se continua colocando la sub base, a medida que va llegando a la obra.

Marzo 14 de 2024.
Ing. Residente = 1.
Maestro = 1
Oficial = 1
Ayudantes = 5.
tiempo seco.
llego a la obra el vibrocompactador, de 7 toneladas, se inicio el proceso de compactacion de la subbase. de igual manera con ayuda de la retro se inicio la demolicion de la segunda alcantarilla los residuos generados se disponen adecuadamente en el sitio (potrero) previsto para eso.

Marzo 15 de 2024.
Ing. Residente = 1
Maestro = 1
Oficial. = 1
Ayudantes = 1.
tiempo seco.
continuamos vibrando el material de subbase, hemos tenido dificultades con el agua, no es suficiente cantidad. la disponible para todas las actividades que adelantamos.
se realizo la fundición del solado y atraque de la tubería con un espesor de 0,20m en concreto simple, se instalo la tubería y se emboquillo con masilla de cemento.

Marzo 16 de 2024.
Ing. Residente = 1
Maestro. = 1
Oficial = 1
Ayudantes = 5.
tiempo Seco.
se realizo la colocación de sacos de suelo, y conformar el relleno sobre la tubería de manera adecuada.
se continua vibrando la subbase instalada.
Seguimos teniendo problemas con el agua que nos entorpece las labores.
se adelanta el descole de solido de la alcantarilla PROTOZI, disponiendo el material resultante de manera adecuada en el sitio dispuesto para ello.

Marzo 18 de 2024.
Ing. Residente = 1
Maestro = 1
Oficial = 1
Ayudantes = 5
tiempo seco.
Debido a la falta de agua no se consigue una adecuada compactación del material de subbase, al preveer el no cumplimiento de las densidades, se determino la escarificación de toda la subbase, se empapa el suelo hasta saturar el material y se realizo nuevamente el proceso de colocación y compactación de este material. esto con ayuda de la retro y del vibrocompactador.
en la alcantarilla se termina de perfilar y establecer niveles y se procede a fundir el piso de la cajilla de entrada de la alcantarilla de PROTOS, colocando los aceros correspondientes.

Marzo 19 de 2024
Ing Residente = 1
Maestro = 1
Oficial = 1
Ayudantes = 5
tiempo Seco
se continua con la reconformación de la subbase por parte del equipo de vibro.
se ubican los aceros de las aletas y del cabezote de salida de la alcantarilla y se procede a fundir estos elementos en concreto 3000 psi.
Se toman los muestros de densidades para la subbase colocada.

Marzo 20 de. 2024.
Ing Residente = 1
Maestro. = 1
Oficial = 1
Ayudantes = 5.
tiempo Seco.
Se procede a realizar los excavaciones para las vigas riostras, se colocan los aceros de las vigas y de las huellas correspondientes de acuerdo a diseños, se formaleteo e iniciamos el proceso de fundición de la placa huella de los primeros 15 metros de huellas, correspondientes a cinco secciones.

Marzo 21 de 2024.
Ing. Residente = 1
Maestro = 1
Oficial = 1.
Ayudantes = 5
llueve en horas de la mañana, copiosamente.
Se procede a desencofrar. y a la fundición del concreto ciclopeo de los 5 tramos centrales, se formaleteo. y se funden los 10 tramos de concreto ciclopeo laterales a lado y lado con un ancho de 0,45m. cada uno de los lados.

Powered by CamScanner

Marzo 22 de 2024.
Ing Residente.- 1
Maestro.- 1
Oficial.- 1
Ayudantes.- 5.
Tiempo Seco.
Se realizo el retiro de la formaleta, se realizo la colocación del acero longitudinal y transversal, de la cuneta de la margen derecha, se amarro y poslcionó, se coloco la formaleta y los aceros de los sardineles y se funde la placa de la cuneta del margen derecho, con un espesor de 0,15 m, teniendo en cuenta sus niveles.

Marzo 23 de 2024.
Ing. Residente = 1.
Maestro = 1.
Oficial = 1.
Ayudantes = 5.
Tiempo Seco.
Se continua con la colocación del Acero de la margen izquierda sobre la cuneta, se formaleteo la placa de la cuneta izquierda y del sardinel de la margen derecho del mismo tramo.

Powered by CamScanner

Marzo 25 de 2024.
Ing. Residente = 1
Maestro = 1
Oficial = 1
Ayudantes = 5.
tiempo seco.
Se procede a la ejecución de cuatro espacios mas de huella, colocando las vigaretas y la acera tanto longitudinal como transversal de los siguientes 13 metros, Huellas que fueron fundidas con un espesor de 15 cm de acuerdo a diseños.

Marzo 26 de 2024.
Ing. Residente = 1.
Maestro = 1.
Oficial. = 1.
Ayudantes. = 5.
llovio durante la noche, fuertemente se inicio la desformaleteado de los huellas y se procede a fundir los tramos centrales, y a formaletear. los siguientes 12 metros de placa huella, se funden los dos margenes de concreto ciclopeo tambien.

Powered by CamScanner

Marzo 27 de 2024.
Ing. Residente = 1.
Maestro = 1
Oficial = 1
Ayudante = 5.
Llueve copiosamente fuerte:
se procede a la colocación de Aceros sobre la cuneta de la margen derecha del tramo de 12 metros, el cual depues de colocar aceros, formaletear y se funde el concreto de este espacio correspondiente.
En horas de la tarde al finalizar la jornada, llueve nuevamente, se tapa el concreto fundido.
Retiramos todos los equipos y materiales por celebración de semana santa no se realizaron mas actividades durante el resto de semana.

Abril 01 de 2024.
Ing. Residente = 1.
Maestro = 1.
Oficiales = 1
Ayudantes = 5.
Lluvias fuertes.
Se realiza el replanteo de la cuneta de la margen izquierda de este tramo, se colocan los aceros y se formaletea, fundiendo la cuneta y el sardinel derecho de este tramo.

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 09	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 12/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: SAN MARCOS – PAICOL – HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3518 - 2023
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
LISA MINELLY CHAVARRO	OAC	PRESIDENTE
MARÍA EUGENIA HERRERA	OAC	TESORERO
JOSÉ MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
RAFAEL OSPITIA	OAC	RESIDENTE – ASISTENTE
MILEIDY FIESCO	OAC	CONTADORA-ASISTENTE
MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Aprobación de nómina.
2- Maquinaria (vibro compactador).
3- Rendimientos financieros.
4- Materiales y horas de maquinaria
5- Estudios y diseños
6- Nómina de la contadora
7-

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Nomina: **JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL** **NIT 813.010.422-7** Vereda San Marcos - Paicol Huila **LIQUIDACION NOMINA** DEL 04 AL 15 DE MARZO DE 2024 **DEVENGADO** / **DEDUCCIONES** ITEM | CEDULA | NOMBRE EMPLEADO | CARGO | SALARIO | HRS LAB | VLR HRS | HON | VLR REC NOCT | HED | VLR HED | HEDF | VLR HEDF | SUBS TRANS | TOTAL | APORTE SALUD | APORTE PENSION | APORTE FSP | APORTES FONDOS | TOTAL DEDUCCION | VALOR QUINCENA 1 | 4.926.356 | MIGUEL ANGEL PUYO VITECHE | Ayudante | 1.300.000 | 94 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.800 | 584.800 | 20.800 | 20.800 | 0 | 0 | 41.600 | 543.200 2 | 4.926.283 | HENRY TRUJILLO SANTOFIMIO | Ayudante | 1.300.000 | 94 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.800 | 584.800 | 20.800 | 20.800 | 0 | 0 | 41.600 | 543.200 3 | 1.081.421.909 | YEFERSON ANDRES PUYO VITECH | Ayudante | 1.300.000 | 94 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.800 | 584.800 | 20.800 | 20.800 | 0 | 0 | 41.600 | 543.200 4 | 1.070.306.147 | LUIS FERNANDO BASTIDAS PUYO | Ayudante | 1.300.000 | 94 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.800 | 584.800 | 20.800 | 20.800 | 0 | 0 | 41.600 | 543.200 5 | 4.926.283 | URBANO ILLERA ARTEAGA | Ayudante | 1.300.000 | 94 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.800 | 584.800 | 20.800 | 20.800 | 0 | 0 | 41.600 | 543.200 6 | 12.278.539 | CARLOS FERNEY DOMINGUEZ | Oficial | 1.600.000 | 94 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.800 | 704.800 | 25.600 | 25.600 | 0 | 0 | 51.200 | 653.600 TOTAL NOMINA =======> TOTAL AUXILIO TRANSP 388.800 TOTAL DEVENGADO 3.628.800 TOTAL PARA PARAFISCALES 3.240.000 3.369.600 Se aprueba el pago de la nomina de los ayudantes por un total de $3.369.600
2.	Maquinaria: Aun no se ha definido el préstamo de la maquinaria por parte de la alcaldía. Hora de vibro compactador $100.000 con 4 horas de estambay Transporte de maquinaria $900.000 sin IVA (ida y vuelta) Se solicitan 15 horas de maquinaria Para un total de $ 2.400.000 Adelantar lo del transporte $900.000.
3.	Rendimientos financieros: Diciembre 2023: $ 1.599,99 Enero 2024; $ 1.596,23 Febrero 2024: $ 1.167,11 **Total** **$ 4.363,33** Se aprueba pago de rendimientos financieros por un valor de $ 4.363,33 hasta el mes de febrero.
4.	Materiales y horas de maquinaria:

	REPORTE TRABAJO ASOCIACION DE VOLQUETEROS **PLACA HUELLA VEREDA SAN MARCOS MUNICIPIO DE PAICOL** **ENTREGA DE MATERIALES PETREOS** Fecha | Descripcion | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total Mar 05 - 24 | Arena de Rio | M3 | 12 | 75.000 | 900.000 | Triturado 1" | M3 | 12 | 128.000 | 1.536.000 Mar 06 -24 | Sub-base Granular | M3 | 36 | 120.000 | 4.320.000 Mar 07 -24 | Sub-base Granular | M3 | 36 | 120.000 | 4.320.000 | SUB TOTAL | | | 11.076.000 **HORAS RETRO** Fecha | Descripcion | Horometro Inicial | Horometro Final | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total Mar 04 - 24 | Horas Retro | 5580,2 | 5587,3 | Hora /Maq | 7,1 | 120.000 | 852.000 Mar 05 - 24 | Horas Retro | 5587,3 | 5593,8 | Hora /Maq | 6,5 | 120.000 | 780.000 Mar 06 - 24 | Horas Retro | 5593,8 | 5600,8 | Hora /Maq | 7,0 | 120.000 | 840.000 Mar 07 - 24 | Horas Retro | 5600,8 | 5606,5 | Hora /Maq | 5,7 | 120.000 | 684.000 Mar 08 - 24 | Horas Retro | 5606,5 | 5613,3 | Hora /Maq | 6,8 | 120.000 | 816.000 Mar 09 - 24 | Horas Retro | 5613,3 | 5616,6 | Hora /Maq | 3,3 | 120.000 | 396.000 Mar 11 - 24 | Horas Retro | 5616,6 | 5620,7 | Hora /Maq | 4,1 | 120.000 | 492.000 | SUB TOTAL | | | 40,5 | | 4.860.000 Ya se realizó excavaciones de las alcantarillas 2.30m, perfilado, replanteo.
5.	Estudios y diseños : Fecha den entrega jueves 14 de marzo de 2024 Informe del ing. Residente lo entrega el jueves 14 de marzo de 2024
6.	Nómina de la contadora: El informe de la contadora para pago de nomina lo entrega el día 12/03/2024 en horas de la tarde.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	Se aprueba el pago de la nómina de los ayudantes por un total de $3.369.600
2.	No se requiere toma de decisiones.
3.	Se aprueba pago de rendimientos financieros por un valor de $ 4.363,33 hasta el mes de febrero.
4.	No se requiere toma de decisiones.
5.	No se requiere toma de decisiones.

6.	No se requiere toma de decisiones.
7.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Estudio y diseño		Fecha den entrega jueves 14 de marzo de 2024.
Informe de obra		Fecha den entrega jueves 14 de marzo de 2024.
Informe de contaduría		Fecha den entrega jueves 12 de marzo de 2024.
Próxima reunión		Viernes 15 de marzo del 2024
Pagos de: Contador e ing. Residente Corte de obra para pago de nómina del maestro Pago de agregados Retroexcavadora 50% de los diseños		

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: LISA MINELLY CHAVARRO
Cargo: PRESIDENTE

Maria Eugenia Herrera Garcia
Digitally signed by Maria Eugenia Herrera Garcia
Date: 2024.05.09 14:55:30 -05'00'

Nombre: MARÍA EUGENIA HERRERA
Cargo: TESORERO

Nombre: JOSÉ MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTOR

Nombre: RAFAEL OSPITIA
Cargo: RESIDENTE – ASISTENTE

Nombre: MILEIDY FIESCO
Cargo: CONTADORA-ASISTENTE

Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 10	Regional INVIAS: Huila	Fecha: 26/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: SAN MARCOS – PAICOL – HUILA
No. Convenio(s) Solidario(s): 3518 - 2023
Ejecutor(es): OAC

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
LISA MINELLY CHAVARRO	OAC	PRESIDENTE
MARÍA EUGENIA HERRERA	OAC	TESORERO
JOSÉ MIGUEL ORTEGA	INVIAS	SUPERVISOR
SILVIA LORENA ORDOÑEZ	INTERVENTORIA	DIRECTOR INTERVENTORIA
RAFAEL OSPITIA	OAC	RESIDENTE – ASISTENTE
MILEIDY FIESCO	OAC	CONTADORA-ASISTENTE
MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ	INTERVENTORIA	RESIDENTE INTERVENTORIA

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Pago de nomina  LIQUIDACION NOMINA DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2024 DEVENGADO / DEDUCCIONES ITEM · CEDULA · NOMBRE EMPLEADO · CARGO · SALARIO · HRS LAB · VLR HRS · HON · VLR REC NOCT · HED · VLR HED · HEDF · VLR HEDF · SUBS TRANS · TOTAL · APORTE SALUD · APORTE PENSION · APORTE FSP · APORTES FONDOS · TOTAL DEDUCCION · VALOR QUINCENA · FIRMA 1 · 4.920.356 · MIGUEL ANGEL PUYO VITECHE · Ayudante · 1.300.000 · 118 · 650.000 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 77.447 · 81.000 · 808.447 · 29.098 · 29.098 · 0 · 0 · 58.196 · 750.251 2 · 4.920.383 · HENRY TRUJILLO SANTOFIMIO · Ayudante · 1.300.000 · 118 · 650.000 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 77.447 · 81.000 · 808.447 · 29.098 · 29.098 · 0 · 0 · 58.196 · 750.251 3 · 1.061.421.909 · YEFERSON ANDRES PUYO VITECHE · Ayudante · 1.300.000 · 118 · 650.000 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 77.447 · 81.000 · 808.447 · 29.098 · 29.098 · 0 · 0 · 58.196 · 750.251 4 · 1.079.390.147 · LUIS FERNANDO BASTIDAS PUYO · Ayudante · 1.300.000 · 118 · 650.000 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 77.447 · 81.000 · 808.447 · 29.098 · 29.098 · 0 · 0 · 58.196 · 750.251 5 · 4.920.185 · URBANO ILLERA ARTEAGA · Ayudante · 1.300.000 · 118 · 650.000 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 77.447 · 81.000 · 808.447 · 29.098 · 29.098 · 0 · 0 · 58.196 · 750.251 6 · 12.278.139 · CARLOS FERNEY DOMINGUEZ · Oficial · 1.600.000 · 118 · 800.000 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 95.319 · 81.000 · 976.319 · 35.813 · 35.813 · 0 · 0 · 71.626 · 904.694 TOTAL NOMINA =======> · TOTAL AUXILIO TRANSP 486.000 · TOTAL DEVENGADO 5.018.553 · TOTAL PARA PARAFISCALES 4.532.553 · 4.655.949 Sin seguridad social Pago de retroexcavadora  Total items: 4 Valor en Letras: Siete millones setecientos cuarenta mil pesos m/cte Condiciones de Pago: Otros $ 7,740,000.00 Total Bruto 7,695,882.00 IVA 19% 44,118.00 Total a Pagar 7,740,000.00 Observaciones: Pago de 64.5 horas de retroexcavadora Arreglo de subbase y excavaciones de las alcantarillas. Pago de vibro compactador  Datos del Adquiriente / Comprador Nombre o Razón Social: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL Tipo de Documento: NIT · País: Colombia Número Documento: 813010422 · Departamento: Huila Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica · Municipio / Ciudad: Paicol Régimen fiscal: R-99-PN · Dirección: VDA SAN MARCOS Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica · Teléfono / Móvil: 3133270173 Correo: veredasanmarco2022@gmail.com Detalles de Productos Nro. · Código · Descripción · U/M · Cantidad · Precio unitario · Descuento detalle · Recargo detalle · IMPUESTOS (IVA · % · INC · %) · Precio unitario de venta 1 · ALQUILER MAQUINARIA · NIU · 1,00 · $ 2.250.000,00 · $ 0,00 · $ 0,00 · $ 2.250.000,00 Notas Finales Linea de negocio: 22 horas de maquinaria.

Ferretería



Construcivil FERRETERIA

CONSTRUCIVIL
NIT901473908- 1 Regimen Común
CL 10 1 44 LA ESTANCIA TEL: 3219536671-3209
RESOLUCION DIAN No. 18764059822496 AUTORIZA DESDE
EL Nro. 2001 AL Nro 5000 DEL 14/11/2023
CUFE: 46512c3bee2e8d218884cf86ac1d9589bc83bceb842682b481dd764299477b85

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.0002302

CLIENTE: JUNTA ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL **TELEFONOS:** 3133270173 3133270173
NIT: 813010422-7 **CIUDAD:** PAICOL
DIRECCION: VDA SAN MARCOS MCP PAICOL
NOTAS:

Fecha Fact.	Fecha Vencimiento
20/03/2024	04/04/2024

Hora Impresion: 17:40:05 *Página 1 de 1*

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	%IVA	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
100001001	CEMENTO CEMEX X 50 KLS	170.00	19.00	35,400.00	6,018,000.00
100101003	VARILLA CORR 3/8 N.3	224.00	19.00	18,500.00	4,144,000.00
100101006	VARILLA CORR 1/2 13 MM N.4	32.00	19.00	29,000.00	928,000.00
100102115	ALAMBRE NEGRO X KILO	20.00	19.00	6,400.00	128,000.00
100106711	ANTISOL BLANCO X 20 KLS	1.00	19.00	210,000.00	210,000.00

Son: Once Millones Cuatrocientos VeintiOcho Mil Pesos Moneda Corriente

SUBTOTAL: $ 9,603,361.00	**GRAVADA 19%:** $ 9,603,361.00	**IVA 19%:** $ 1,824,639.00	**DESCUENTO:** $ 0.00	**TOTAL A PAGAR**	
EXENTO: $ 0.00	**GRAVADA 5%:** $ 0.00	**IVA 5%:** $ 0.00		$ 11,428,000.00	
RETEICA: $ 0.00	**RETEIVA:** $ 0.00	**RETEFUENTE:** $ 0.00			

RECIBIDA Y ACEPTADA A ENTERA SATISFACCION

Fecha de Recibido D M A


001 DIANA CAROLINA
Vendedor

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 11,428,000.00

PLAZO PARA ENTREGA 30 DIAS

Impreso por Tecnologia Software J3 SYSTEM LTDA Cel 311 237 9427 - 8723526 - 8716766 DESPUES DE 10 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Pago de agregados:

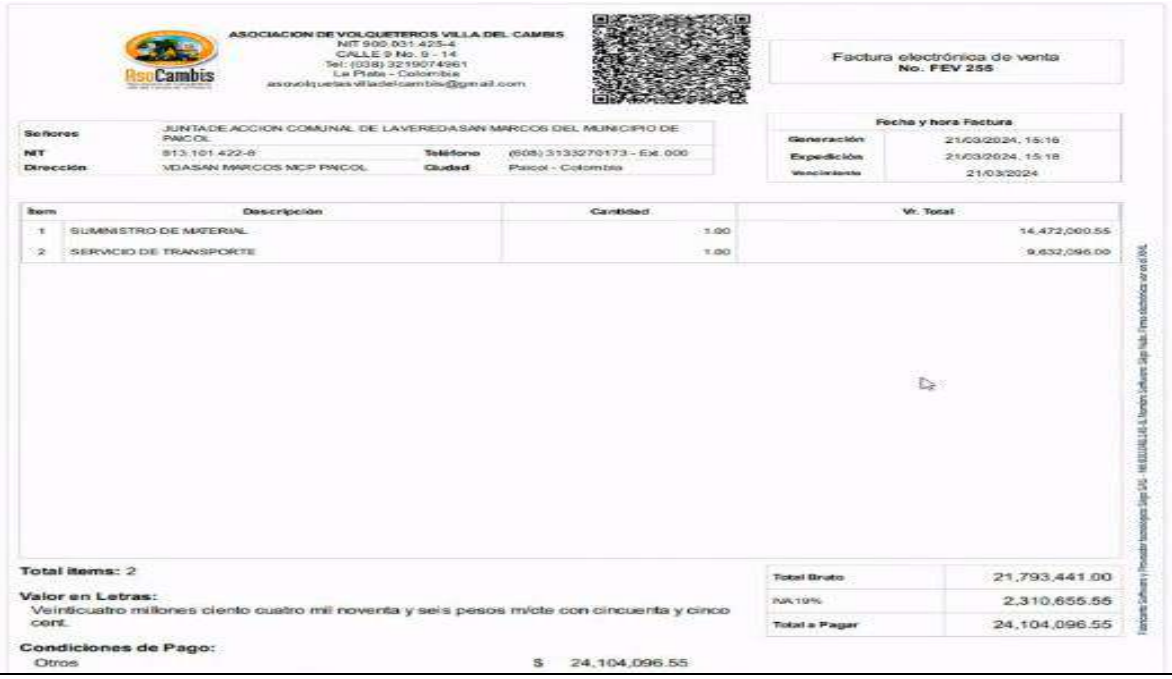

RsoCambis

ASOCIACION DE VOLQUETEROS VILLA DEL CAMBIS
NIT 900.031.425-4
CALLE 9 No. 9 - 14
Tel: (038) 3219074961
La Plata - Colombia
asovolquetasvilladelcambis@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 255

Señores	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAICOL		
NIT	813.101.422-6	**Teléfono**	(608) 3133270173 - Ext. 000
Dirección	VDA SAN MARCOS MCP PAICOL	**Ciudad**	Paicol - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/03/2024, 15:16
Expedición	21/03/2024, 15:18
Vencimiento	21/03/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE MATERIAL	1.00	14,472,000.55
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	9,632,096.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Veintícuatro millones ciento cuatro mil noventa y seis pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Total Bruto	21,793,441.00
IVA 19%	2,310,655.55
Total a Pagar	24,104,096.55

Condiciones de Pago:
Otros $ 24,104,096.55

	Pago nómina del maestro ***INFORMACIÓN*** *A continuación, relaciono el corte de obra según las actividades realizadas hasta la fecha y cumpliendo con el objeto del contrato:*

DESCRIPCION	UND MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Mano de obra para Construcción de Alcantarillas de cinco tubos de 36", de acuerdo a diseños	UND	2,0	1.000.000	2.000.000
Mano de Obra para la Construcción de Placa Huella E=0,15 m, Ancho=5,0 m de acuerdo a Diseños	ML	15,0	93.000	1.395.000
Mezcladora de Un bulto con motor a gasolina o diésel (Incluye Combustible, Aceites y Manto)	Día	22,0	74.000	1.628.000
Herramienta Menor (Picas, Palas, Canecas, Herramienta de Mano)	Día	22,0	4.000	88.000
TOTAL				**$ 5.111.000**

2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	
2.	
3.	
4.	

5.	
6.	
7.	

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: LISA MINELLY CHAVARRO
Cargo: PRESIDENTE

Maria Eugenia Herrera Garcia
Digitally signed by Maria Eugenia Herrera Garcia
Date: 2024.05.09 14:56:34 -05'00'

Nombre: MARÍA EUGENIA HERRERA
Cargo: TESORERO

Nombre: JOSE MIGUEL ORTEGA
Cargo: SUPERVISOR

Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Cargo: INTERVENTOR

Nombre: RAFAEL OSPITIA
Cargo: RESIDENTE – ASISTENTE

Nombre: MILEIDY FIESCO
Cargo: CONTADORA-ASISTENTE

Nombre: MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ
Cargo: RESIDENTE INTERVENTORIA

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

9.4 INTERVENTORÍA

Equipos y vehículos, personal control aportes legales y seguridad social, informe financiero y presupuestal, seguimiento de garantías, plan de cargas, correspondencia

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31 3 2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: **01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024**

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4520 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

CONTRATO DE OBRA No. 4110 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA
3385 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALOTO
3750 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA REFORMA
3518 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN MARCOS

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PC PORTAIL	ACER NITRO 5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PC PORTAIL	HP	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PC DE ESCRITORIO	LENOVO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IMPRESORA	EPSON L3250	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DOTACION DE OFICINA	ESCRITORIOS 4 SILLAS 4 BIBLIOTECA 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO	YAMAHA XTZ250	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO	HONDA XRE 190	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO	HONDA XRE 190	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula Profesional No: 25202-19149

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31 3 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

4110 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA
3385 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALOTO
3750 DE 2023 JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA REFORMA
CONTRATO DE OBRA No.: 3518 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN MARCOS

NOMBRE ARL: ARL POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO	76.318.775	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 2.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%		$ 2.400.000	$ 12.600	I	SANITAS	9465466656	$ 300.000	COLPENSIONES	9463702227	$ 384.000	$ -			
2	MIGUEL ANGEL SOTO SUAREZ	1.081.422.590	INGENIERO RESIDENTE	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	$ 2.600.000	$ 180.960	V	SANITAS	7924368696	$ 104.000	COLPENSIONES	7924368696	$ 416.000	$ 104.000			
3	DIANA CAROLINA MONTES COLLAZOS	36.068.181	INSPECTOR	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%		$ 1.400.000	$ 97.500	V	SANITAS	7924368696	$ 56.000	COLPENSIONES	7924368696	$ 224.000	$ 56.000			
4	JESUS ALFONSO FAJARDO ARTEAGA	79.794.953	INSPECTOR	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			100%		$ 1.400.000	$ 97.500	V	SANITAS	7924368696	$ 56.000	COLPENSIONES	7924368696	$ 224.000	$ 56.000			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 7.800.000**																																													

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31 mar 2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los dias no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional [illegible]

Escriba el texto aquí

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA **31 3 2024** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4520 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MES INFORME MENSUAL: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

4110 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA
3385 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALOTO
3750 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA REFORMA
CONTRATO DE OBRA No: 3518 DE 2023	**CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN MARCOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1295823	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	75.820.315,00	$ 75.820.315,00
					TOTAL	$ 75.820.315,00	$ 75.820.315,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 75.820.315

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por	Observaciones
1	DICIEMBRE	$ 0,00		$ 0,00				1295823 DE 2023	$ -	$ -		
2	ENERO	$ 16.515.000,00		$ 16.515.000,00				1295823 DE 2023	$ 59.305.315,00	$ 59.305.315,00		
3	FEBRERO	$ 18.102.000,00		$ 18.102.000,00				1295823 DE 2023	$ 41.203.315,00	$ 41.203.315,00		
4	MARZO	$ 20.212.000,00		$ 20.212.000,00				1295823 DE 2023	$ 20.991.315,00	$ 20.991.315,00		
TOTALES		$ 54.829.000,00	$ 0,00	$ 54.829.000,00					$ 20.991.315,00	$ 20.991.315,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Ejecutado Año 2024	$ 54.829.000	$ -	$ 54.829.000,00
*Ejecutado Año 2024	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ 54.829.000	$ -	$ 54.829.000,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-19749

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4520 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DE LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NÁTAGA EN EL EPARTAMENTO DEL HUILA.

FECHA DE INICIO: 01/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/03/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 75.820.315,00

VALOR ACUMULADO: $ 75.820.315,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 7.582.040	20	11	2023	31/12/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 15.164.080	20	11	2023	31	12	2026
Calidad del servicio	30	$ 22.746.120	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100010938

Certificado de modificación o anexo No.: 533018323

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 7.582.040	28	12	2023	31/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 15.164.080	28	12	2023	31	3	2027
Calidad del servicio	30	$ 22.746.120	31	3	2024	31	3	2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100010938

Certificado de modificación o anexo No.: 533018323 ANEXO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 7.582.040	18	3	2024	30/04/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales	20	$ 15.164.080	18	3	2024	30	4	2027
Calidad del servicio	30	$ 22.746.120	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100010938

Certificado de modificación o anexo No.: 533033583 ANEXO 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
Nombre: JOSÉ MIGUEL ORTEGA ORTIZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520219149 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

21/12/2023 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☑
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación d

PLAN DE CARGAS FINAL |

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4520 de 2023

HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 30/04/2024

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PAICOL Y NATAGA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA CAMINOS

11/12/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

INTERVENTOR: SILVIA LORNA ORDOÑEZ OBANDO

$ 75.820.315,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA 0

SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE MIGUEL ORETEGA ORTIZ

RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

$ 75.820.315,00

CONTRATO DE OBRA 3385-3750-3518-4110

CONTRATISTA: JAC VEREDA CALOTO MUNICIPIO DE PAICOL, JAC VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				2023		2024								TOTAL	
							DIC		ENE		FEB		MAR		ABR			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
1	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000,00		0,50	$ 2.900.000	0,00	$ -	0,50	$ 2.900.000	0,25	$ 1.450.000	0,25	$ 1.450.000	0,25	$ 1.450.000	1,25	$ 7.250.000
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000,00		2,00	$ 5.200.000		$ -	1,00	$ 2.600.000	1,00	$ 2.600.000	1,00	$ 2.600.000	1,00	$ 2.600.000	4,00	$ 10.400.000
3	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000		$ -	0,00	$ -	0,10	$ 280.000	0,10	$ 280.000	0,17	$ 462.000	0,37	$ 1.022.000
4	1	Profesional Social	$ 2.800.000,00		0,30	$ 840.000		$ -	0,00	$ -	0,10	$ 280.000	0,10	$ 280.000	0,16	$ 448.000	0,36	$ 1.008.000
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)			0,00	$ 4.929.234		$ -		$ -								$ -
5		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 4.800.000,00															
6		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 4.800.000,00															
7		Especialista en Estructuras	$ 4.800.000,00															
8		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.800.000,00															
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 4.800.000,00															
		PERSONAL TÉCNICO																
10	2	Inspector	$ 1.400.000,00		2,00	$ 5.600.000		$ -	1,00	$ 1.400.000	2,00	$ 2.800.000	2,00	$ 2.800.000	2,00	$ 2.800.000	7,00	$ 9.800.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 20.309.234**		**$ -**		**$ 6.900.000**		**$ 7.410.000**		**$ 7.410.000**		**$ 7.760.000**		**$ 29.480.000**
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,20**		**2,20**		**2,20**		**2,20**		**2,20**		**2,20**		**2,20**
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 44.680.315**		**$ -**		**$ 15.180.000**		**$ 16.302.000,0**		**$ 16.302.000,0**		**$ 17.072.000,0**		**$ 64.856.000**

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023		2024								TOTAL	
							DIC		ENE		FEB		MAR		ABR			
							H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIÁTICOS																
		Viaticos Director y/o Especialistas	DIA	120.000	3,00	$ 360.000	0,00	$ -	2,00	$ 240.000	1,00	$ 120.000	1,50	$ 180.000	1,50	$ 180.000	6,00	$ 720.000
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																
	3	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	MES	500.000	2,00	$ 3.000.000	0,00	$ -	0,67	$ 1.005.000	1,00	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	3,67	$ 5.505.000

	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	Según comprobante por mes	1.800.000	2,00	$ 3.600.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.800.000	1,00	$ 1.800.000	2,00	$ 3.600.000
	0	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	Según comprobante por mes	250.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 250.000	1,00	$ 250.000	2,00	$ 500.000
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	400.000	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
		OTROS COSTOS				$ -												
		Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	180.000	1,00	$ 180.000		$ -	0,50	$ 90.000	1,00	$ 180.000	1,00	$ 180.000	1,00	$ 180.000	3,50	$ 630.000
		Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	70.000	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	110.000	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ -
		Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	50.000	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -			0,00	$ -
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE		$ 38.500												$ -		
*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 7.140.000**	**$ -**		**$ 1.335.000**		**$ 1.800.000**		**$ 3.910.000**		**$ 3.910.000**		**$ 10.955.000**	
*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B)= (C)					**$ 51.820.315**	**$ -**		**$ 16.515.000**		**$ 18.102.000**		**$ 20.212.000**		**$ 20.982.000**		**$ 75.811.000**	
*	IVA = 19% * (C) = (E)																	
	PROVISION PARA AJUSTES					**$ 24.000.000**												
*	COSTO TOTAL = (C) + (E)					**$ 75.820.315**	**$ -**		**$ 16.515.000**		**$ 18.102.000**		**$ 20.212.000**		**$ 20.982.000**		**$ 75.811.000**	

INVIAS 4520-2023/03

Neiva, 13 de marzo de 2024

INGENIRO:
WILMER RAMÍREZ GONZÁLEZ
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

REFERENCIA: CONVENIO 4110 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE NÁTAGA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: Requerimientos técnicos para control y seguimiento de las obras

Cordial saludo

Por medio de la presente se solicita realizar las actividades mencionadas a continuación para lograr un correcto control de la calidad de las obras:


- Localización y replanteo para el control de espesores, peraltes y bombeo de la capa de subbase granular.
- Toma de densidades de la capa de subbase granular para verificar el grado de compactación del material instalado, previo al desarrollo de las actividades de fundición del concreto para la placa huella.
- Toma de muestras de concreto para verificación de la resistencia a la compresión.
- Construir las estructuras de acuerdo con los diseños presentados.

De igual manera se solicita cumplir con las normas de seguridad estipuladas contractualmente con el fin de preservar la integridad de los trabajadores y transeúntes de la zona, para lo cual se debe:

- Instalar la señalización preventiva e informativa pertinente en los sitios de las obras.
- Uso permanente de los elementos de protección personal (casco, botas con puntera, gafas de seguridad, guantes y demás elementos necesarios según cada actividad).
- Uso permanente del uniforme completo durante toda la jornada.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,



SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Interventor

CC. José Miguel Ortega, Supervisor INVIAS.

INVIAS 4520-2023/04

Neiva, 13 de marzo de 2024

INGENIRO:
NICOLÁS ALEXANDER GARZÓN BARRETO
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

REFERENCIA: CONVENIO 3385 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CALOTO DEL MUNICIPIO DE PAILCOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: Requerimientos técnicos para control y seguimiento de las obras

Cordial saludo

Por medio de la presente se solicita realizar las actividades mencionadas a continuación para lograr un correcto control de la calidad de las obras:


- Localización y replanteo para el control de espesores, peraltes y bombeo de la capa de subbase granular.
- Toma de densidades de la capa de subbase granular para verificar el grado de compactación del material instalado, previo al desarrollo de las actividades de fundición del concreto para la placa huella.
- Toma de muestras de concreto para verificación de la resistencia a la compresión.
- Construir las estructuras de acuerdo con los diseños presentados.

De igual manera se solicita cumplir con las normas de seguridad estipuladas contractualmente con el fin de preservar la integridad de los trabajadores y transeúntes de la zona, para lo cual se debe:

- Instalar la señalización preventiva e informativa pertinente en los sitios de las obras.
- Uso permanente de los elementos de protección personal (casco, botas con puntera, gafas de seguridad, guantes y demás elementos necesarios según cada actividad).
- Uso permanente del uniforme completo durante toda la jornada.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,



SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Interventor

CC. José Miguel Ortega, Supervisor INVIAS.

INVIAS 4520-2023/05

Neiva, 13 de marzo de 2024

INGENIRO:
RUBEN DARIO CERQUERA ALARCON
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

REFERENCIA: CONVENIO 3750 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA REFORMA DEL MUNICIPIO DE PAILCOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: Requerimientos técnicos para control y seguimiento de las obras

Cordial saludo

Por medio de la presente se solicita realizar las actividades mencionadas a continuación para lograr un correcto control de la calidad de las obras:


- Localización y replanteo para el control de espesores, peraltes y bombeo de la capa de subbase granular.
- Toma de densidades de la capa de subbase granular para verificar el grado de compactación del material instalado, previo al desarrollo de las actividades de fundición del concreto para la placa huella.
- Toma de muestras de concreto para verificación de la resistencia a la compresión.
- Construir las estructuras de acuerdo con los diseños presentados.

De igual manera se solicita cumplir con las normas de seguridad estipuladas contractualmente con el fin de preservar la integridad de los trabajadores y transeúntes de la zona, para lo cual se debe:

- Instalar la señalización preventiva e informativa pertinente en los sitios de las obras.
- Uso permanente de los elementos de protección personal (casco, botas con puntera, gafas de seguridad, guantes y demás elementos necesarios según cada actividad).
- Uso permanente del uniforme completo durante toda la jornada.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,



SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Interventor

CC. José Miguel Ortega, Supervisor INVIAS.

INVIAS 4520-2023/06

Neiva, 13 de marzo de 2024

INGENIRO:
RAFAEL ENRIQUE OSPITIA THOLA
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

REFERENCIA: CONVENIO 3518 DE 2023 "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE PAILCOL EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."

ASUNTO: Requerimientos técnicos para control y seguimiento de las obras

Cordial saludo

Por medio de la presente se solicita realizar las actividades mencionadas a continuación para lograr un correcto control de la calidad de las obras:


- Localización y replanteo para el control de espesores, peraltes y bombeo de la capa de subbase granular.
- Toma de densidades de la capa de subbase granular para verificar el grado de compactación del material instalado, previo al desarrollo de las actividades de fundición del concreto para la placa huella.
- Toma de muestras de concreto para verificación de la resistencia a la compresión.
- Construir las estructuras de acuerdo con los diseños presentados.

De igual manera se solicita cumplir con las normas de seguridad estipuladas contractualmente con el fin de preservar la integridad de los trabajadores y transeúntes de la zona, para lo cual se debe:

- Instalar la señalización preventiva e informativa pertinente en los sitios de las obras.
- Uso permanente de los elementos de protección personal (casco, botas con puntera, gafas de seguridad, guantes y demás elementos necesarios según cada actividad).
- Uso permanente del uniforme completo durante toda la jornada.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier inquietud.

Atentamente,



SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Interventor

CC. José Miguel Ortega, Supervisor INVIAS.
