Villavicencio, 17 de junio de 2024

Señores:
UT INTERVENTORÍA CCTV
ciudad

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES **MAYO** DE 2024

Respetados señores,

Conforme al contrato No. 775 de 2023, que tiene por objeto "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", a continuación, se presenta informe técnico de avance de las actividades en su última versión, conforme a revisiones y observaciones realizadas.

Atentamente,

FABIAN GUZMAN SOTO
R.P Data Link Smart Solutions

Proyectó: Julián Lozano /
Project Manager

MEGAPROYECTOS

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION DEL CONTRATO 3
2. OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO 3
2.1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 3
2.2. ENTREGABLES DEL CONTRATO 4
3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 6
3.1. ALCANCE DEL INFORME 6
3.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIVIDADES 6
3.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES 8
3.4. REPORTE DE AVANCE Y CURVA S 16
4. ESTADO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO DEL CONTRATO 17
4.1. FINANCIERO 17
4.2. ADMINISTRATIVO 20
4.3. JURIDICO 21
5. ANEXOS 21

MEGAPROYECTOS

1. INFORMACION DEL CONTRATO

TABLA RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
NÚMERO DE PROCESO	LP-37-2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE CONTRATO	775 DE 2023
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LETICIA
NIT	899.999.302-9
CONTRATISTA	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
NIT	900.714.956-5
REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN GUZMAN SOTO
CEDULA DE CIUDADANIA	86.079.311
VALOR DEL CONTRATO	$6.890.763.427,00
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	18 DE OCTUBRE DE 2024
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OTROSI DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 “FORMA DE PAGO”

2. OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

En este ítem se relacionan las obligaciones a cargo del DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, frente al contrato y su forma de cumplimiento. Se aclara que de momento se está adelantando la fase 1 de las obligaciones especificas correspondientes a los estudios y diseños.

2.1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACION	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1) Entrega de los trabajos de CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, conforme se estipula en la Cláusula Primera de este Contrato, en concordancia con la oferta presentada	Se finalizaron los entregables definidos en el “ANEXO 24 D “ENTREGABLES MÍNIMOS ESTUDIOS Y DISEÑOS – CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)” del ministerio del interior, teniendo en cuenta las especificaciones mínimas requeridas en el contrato 775 de 2024, pliego de condiciones y demás documentos anexos del proceso, cumpliendo así con los entregables de la fase I de estudios y diseños. Para la fase de implementación se ha adelantado el proceso de adquisición y transporte de las cantidades del proyecto (Ver numeral 3.3).
2) Atender las recomendaciones del supervisor, relacionadas con el objeto contractual.	Esta obligación se cumple de manera continua.
3) Las demás contenidas en el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el	Para la fase I de estudios y diseños se tuvo en cuenta lo definido en los pliegos de condiciones, estudios previos y

OBLIGACION	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
CONTRATISTA, y las que resulten de la normal ejecución del contrato.	anexos técnicos del proceso. De igual forma en la fase II de Implementación se ejecutan las actividades conforme a los entregables de los estudios y diseños, el presupuesto de cantidades definitivo y los requerimientos del proyecto en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

2.2. ENTREGABLES DEL CONTRATO

En el marco del contrato 775 de 2023, el presupuesto se cantidades definitivo, conforme a los resultados de la fase I de estudios y diseños, se muestra en la siguiente tabla, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1	Elaboración de estudios y diseños	GLB	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00
SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS - 123					
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.214.590,00	$ 280.931.310,00
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9	$ 5.806.390,00	$ 52.257.510,00
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA	UND	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00
4	Grabadora de voz	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00
8	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
EQUIPOS CCTV					
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.214.590,00	$ 93.643.770,00
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3	$ 5.806.390,00	$ 17.419.170,00
3	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
4	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00
5	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
6	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS	UND	0	$ 25.746.830,00	$ -
7	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS (CIDEO Y CONTROL) DE BACKBONE ONDAS MILIMETRICAS	UND	0	$ 67.587.450,00	$ -
8	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
9	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
10	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
11	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
12	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
13	UPS DE 1.5KVA	UND	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
14	UPS DE 15KVA	UND	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
15	PLANTA ELECTRICA DE 20KVA Y TRANSFERENCIA	UND	0	$ 81.845.866,00	$ -
16	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00
17	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
18	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00
20	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
21	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
	ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA				
1	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	UND	0	$ 5.120.616,00	$ -
2	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
3	ACOMETIDAS Y DISTRIBUCION ELECTRICA PUNTOS DE CAMARA Y NODOS	UND	0	$ 2.365.470,00	$ -
4	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00
5	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
6	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00
7	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
8	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
9	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
10	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
11	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
12	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00
13	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
14	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
	OBRAS CIVILES / ELECTRICAS / OTROS				
1	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	**GL**	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
2	**ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL**	**GL**	1	$ 97.642.992,00	$ 97.642.992,00
	ITEMS NUEVOS				
1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00
3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00
4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
	TOTAL				$ 6.982.465.908,00

Nota: En la tabla anterior, se muestran en relleno color amarillo, los ítems afectados, al final de la tabla se agregan los ítems nuevos que no estaban contemplados inicialmente (Ver ***ANEXO N°1 - PRESUPUESTO GENERAL APROBADO PROYECTO SIES LETICIA.pdf***).

En el informe del mes de mayo se presentó el detalle de los ajustes planteados en el presupuesto de cantidades del proyecto tras finalizar la fase I de estudios y diseños, sin embargo, se presenta anexo al presente informe el informe de mayores y menores, junto con sus respectivos soportes en el ***ANEXO N°2 - INFORME JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CON ANEXOS.rar***.

En referencia a los entregables de la FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS, entregados en físico y digital, y aprobados conforme al Anexo 24D del Ministerio del Interior, los cuales están disponibles para todas las partes interesadas en la carpeta de Google drive "**ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS - LETICIA**", con el siguiente link de acceso: https://drive.google.com/open?id=1DmP29qFAxMhcFxZtsm1Ty25LOuylpi-M&usp=drive_fs

Para la FASE II - IMPLEMENTACIÓN, el ministerio del interior tiene definido el "FORMATO ENTREGABLES MÍNIMOS IMPLEMENTACIÓN - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) ANEXO 24 E", para la cual se crea la carpeta compartida "**ENTREGABLES FASE II IMPLEMENTACIÓN - SIES LETICIA"**, con el link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1fMJxD2oUV7k5BxdC6rbn6KUxZI23GVMl?usp=sharing

3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO


El objetivo del presente informe es dar cumplimiento al objeto del contrato No. N°775 de 2023 suscrito con el municipio de Leticia y Datalink Smart Solutions SAS (Megaproyectos de tecnología) como ejecutor del proyecto para los estudios y diseños, e implementación sistema unificado CCTV y NUSE-123 para la ciudad de Leticia (Amazonas), solución tecnológica enfocada a la seguridad y convivencia ciudadana que impactará de manera positiva los indicadores de la ciudad.


3.1. ALCANCE DEL INFORME


El presente informe, está dirigido al supervisor y a la interventoría del Contrato de Suministro N°775 de 2023 y a los funcionarios del grupo de Infraestructura SIES del Ministerio del Interior, quienes, de una u otra manera, participan en el desarrollo y/o prestan asesoría a los servicios comprometidos en desarrollo del contrato. Abarca las actividades realizadas entre el 01 DE MAYO DE 2024 y el 31 DE MAYO DE 2024.

3.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Culminada la fase I de los estudios y diseños, con la aprobación de todas las partes y surtido todos los trámites administrativos en los referentes a la formalización del cierre de esta fase, así como la autorización del inicio de operaciones, concertada finalmente el 30 de mayo de 2024, se realiza la actualización del cronograma de ejecución del proyecto, estableciendo los hitos de aprobación final de los estudios y diseños y la autorización para el inicio de las operaciones, teniendo en cuenta las recomendaciones y observaciones de la interventoría, tiempos para revisión y pruebas, visita del ministerio, capacitaciones y demás. A continuación, se presentan pantallazos del cronograma actualizado elaborado en la herramienta Microsoft Project, así:

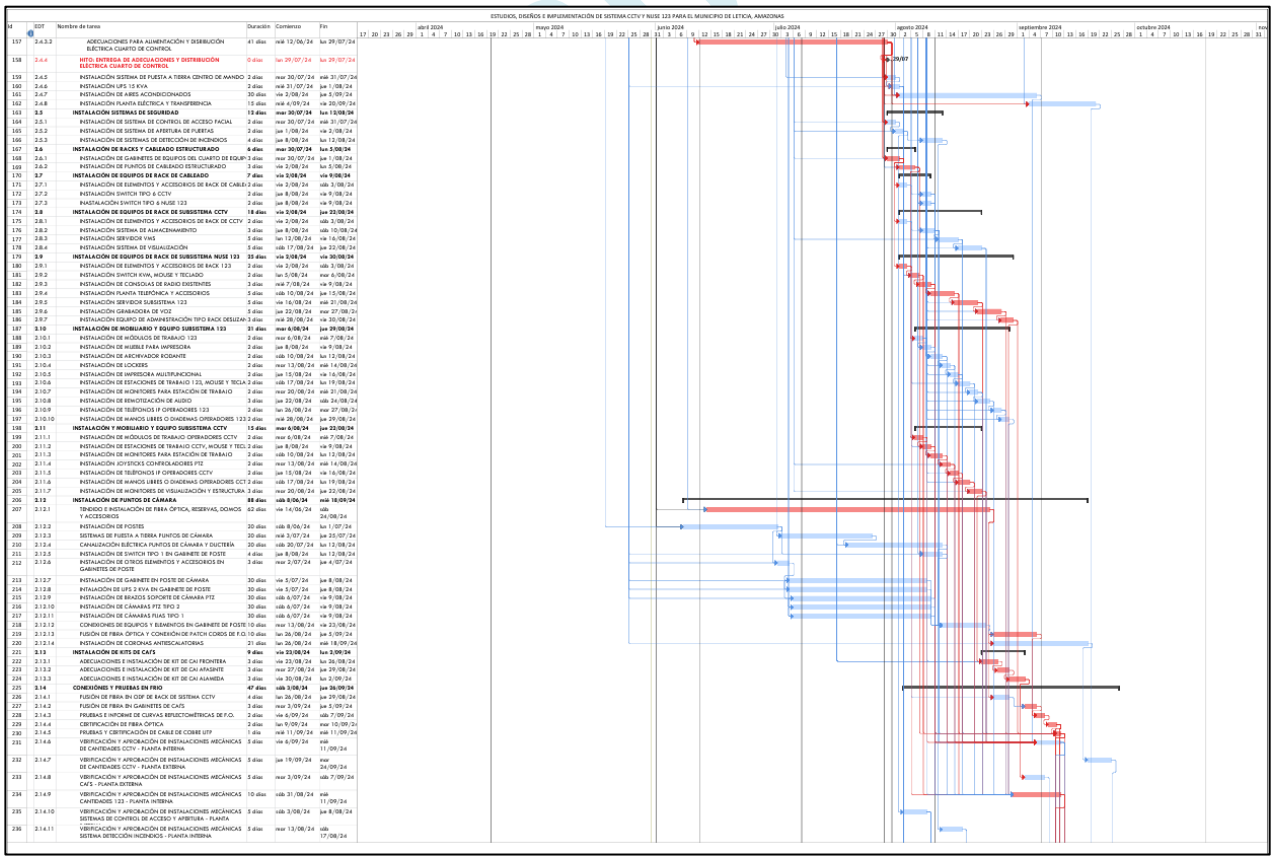

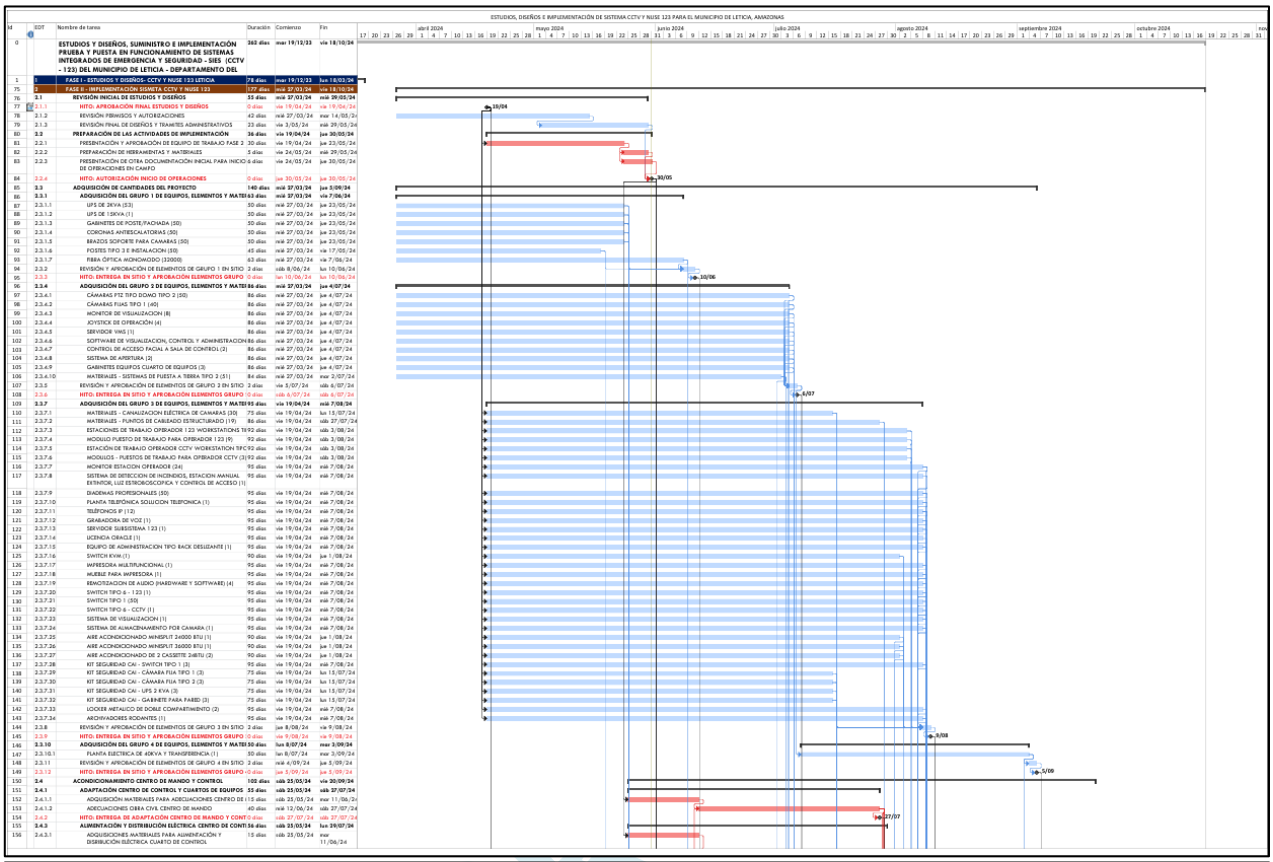

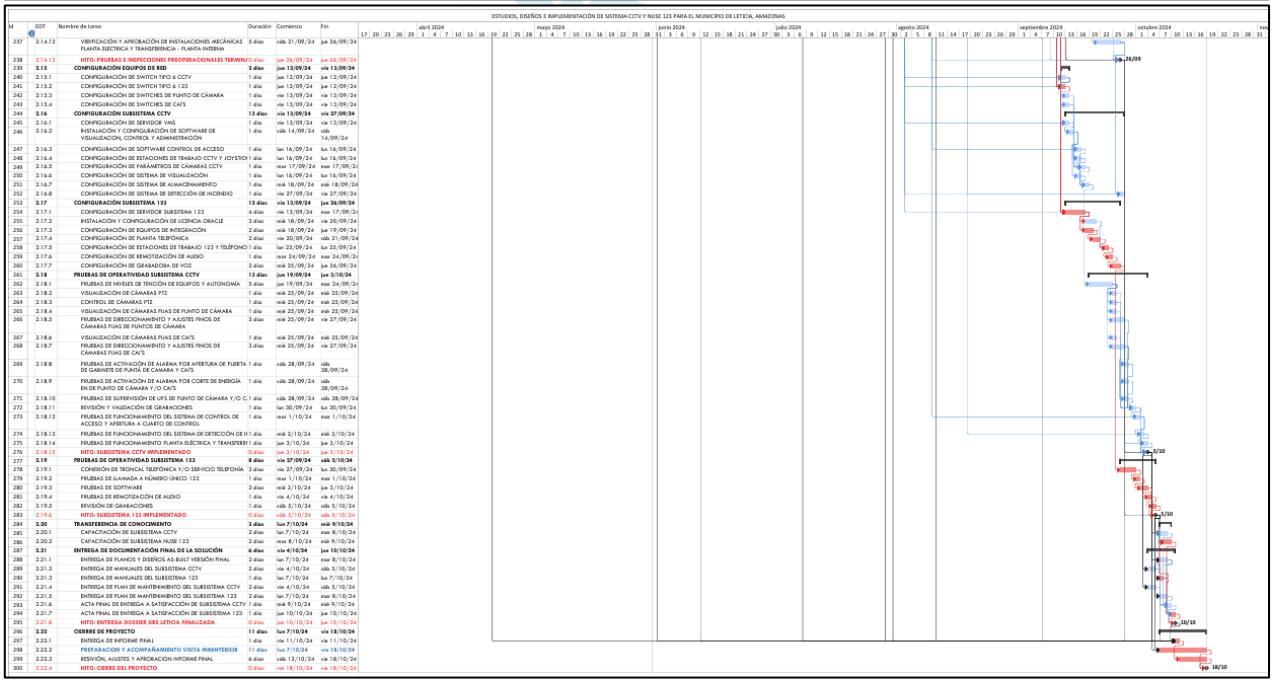

Para ver el detalle del cronograma actualizado al plan de choque ver el ***ANEXO N°3 - CRONOGRAMA PLAN CHOQUE IMPLEMENTACION SIES LETICIA VF.pdf***.

3.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES

Durante el mes de MAYOL de 2024; luego de aprobados los entregables de los estudios y diseños del proyecto SIES CCTV-NUSE 123 de Leticia, Amazonas, conforme con el anexo 24D del Ministerio del Interior y, los requerimientos del contrato 775 de 2023 y del proceso contractual, formalizado finalmente mediante el formato definido por el ministerio del Interior "ACTA DE RECIBO DE ENTREGABLES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ANEXO 22", con fecha del 19 de abril de 2024, se hace acompañamiento al municipio de Leticia en los requerimientos concernientes a los trámites administrativos para la legalización de los estudios y diseños ante el convenio marco 1340 de 2023, celebrado entre la nación- Ministerio del interior - fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana, FONSECON - con el municipio de leticia amazonas, así como el trámite del segundo desembolso. Se realiza acompaña visita de sitio y evaluación de avance con los funcionarios del ministerio del interior, se autoriza el inicio de las actividades de operación en campo y se presenta y aprueba el cronograma actualizado y plan de choque con la medición de avances para la fase II de implementación. De igual forma, se continua con el proceso de las adquisiciones de las cantidades del proyecto, conforme a las fichas técnicas aprodas por la interventoría, y se avanza con el transporte a sitio de los elementos adquiridos. Así mismo, se adelantan actividades de preparación de las actividades de implementación y de la logística para la operación en el municipio de Leticia. Se destacan las siguientes actividades y acciones desarrolladas en el presente periodo, presentadas de manera cronológica, así:

- Luego de la entrega formal de los estudios y diseños al ministerio del interior, conforme al mediante el formato del ministerio del interior "ACTA DE RECIBO DE ENTREGABLES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ANEXO 22", con fecha del 19 de abril de 2024. (ver ***ANEXO N°4 - ANEXO 22 ACTA RECIBO ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS.pdf***), se dio paso a los trámites administrativos del ministerio con el fin de concretar toda la documentación pertinente para el siguiente desembolso del convenio y dar la aprobación para el inicio de las operaciones del proyecto en su fase II de implementación. Se brindó acompañamiento y atención al municipio de leticia en lo requerido, consultas, aclaraciones del alcance de DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, como implementador del proyecto, con el fin de apoyar los trámites del municipio de Leticia referentes al convenio marco 1340 de 2023.

- El día 14 de mayo de 2024, el proveedor reporta la llegada de los cincuenta (50) postes de fibra de vidrio tipo 3 del fabricante INGAL, de 14 metros de altura y resistencia a la carga de 750Kgf, al puerto fluvial del municipio de Leticia.





- El día 16 de mayo de 2024, los postes son enviados a la bodega central de DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS en el municipio de leticia.






- El día 22 de mayo de 2024 llega embarcación al municipio de leticia por vía fluvial con los siguientes elementos: Cuarenta y tres (43) UPS de 2KVA, una (1) UPS de 1KVA, cincuenta (50) coronas antiescalatorias, cincuenta (50) brazos soporte para cámara PTZ.










- El día 24 de mayo de 2024 se presentan las novedades en el personal mínimo requerido para la fase II de implementación del proyecto SIES CCTV-NUSE 123 Leticia (Contrato 775 de 2023), mediante correo electrónico con los documentos soporte anexos (Ver ***ANEXO N°5 - NOVEDADES PERSONAL MINIMO REQUERIDO FASE II.pdf***).


  A continuación, se presenta tabla con las novedades del personal mínimo requerido para la FASE II de


Implementación del proyecto SIES CCTV-NUSE 123 de Leticia, Amazonas, así:


ITEM	CARGO	% DEDICA	NOMBRE	RATIFICADO O CAMBIADO
1	Gerente del Proyecto	100%	JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ	RATIFICADO
2	Consultor tecnológico	100%	JHON ALEXANDER SILVARA GUERRERO	RATIFICADO
3	Ingeniero civil o arquitecto	50%	ROBINSON DIAZ LOPEZ	RATIFICADO
4	ingeniero eléctrico o electricista	40%	CRISTIAN CAMILO GUTIERREZ LANDINEZ	RATIFICADO
5	Ingeniero de sistema de aire acondicionado	20%	DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ	RATIFICADO
6	Ingeniero de apoyo o residente	100%	CHIRISTIAN HELI ALVAREZ	CAMBIADO
7	Técnico de apoyo eléctrico	40%	JUAN HARVIN SANTOS HERNANDEZ	CAMBIADO
8	Técnico de apoyo de fibra óptica y/o radioenlaces	50%	BREZHVEV LEONARDO CUIA GOMEZ	CAMBIADO
9	Profesional de seguridad industrial y medioambiente	10%	ELIANE LETICIA GONZALEZ PATERNINA	CAMBIADO


En el **ANEXO N°5** se presenta el correo junto con el oficio presentando las novedades y las hojas de vida con sus respectivos soportes.

- Los días 7 de mayo y 16 de mayo de 2024, se realizaron comités de seguimiento con las partes interesadas del proyecto, DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS como implementador, UT INTERVENTORIA CCTV como interventor del proyecto, EL MUNICIPIO DE LETICIA con su delegado para la supervisión, y MINISTERIO DEL INTERIOR, con su apoyo a la supervisión, con el objetivo de revisar los avances presentados a la fecha y revisar compromisos. Las actas de estos comités están en poder de la interventoría.










- Finalmente, se definió visita a sitio, por parte de la supervisión del Ministerio del interior, la sub dirección y su equipo de trabajo, para los días 28, 28 y 30 de mayo de 2024. Durante esta visita, se revisaron los avances en cuanto a adquisiciones, previamente justificadas y autorizadas, así como los avances en la

preparación de las actividades para el inicio de la operación, se visitó las instalaciones del Departamento de Policía del Amazonas del municipio de Leticia, y específicamente el cuarto dispuesto para el Centro de Control y Monitoreo (CCM), así como las demás locaciones a intervenir, y se realizó visita a diferentes puntos de cámara y los tres CAI's a intervenir con el proyecto. La reunión cerró, con la presentación del cronograma actualizado y plan de choque propuesto por el implementador y aprobado por las partes, donde se detalla las actividades a desarrollar para la fase de implementación, utilizando técnicas de recuperación del cronograma como fast tracking, para lograr realizar la implementación, revisiones y pruebas, entrega y aceptación junto con la respectiva documentación en una fecha límite establecida para el 18 de octubre de 2024 (ver ***ANEXO N°3 - CRONOGRAMA PLAN CHOQUE IMPLEMENTACION SIES LETICIA VF.pdf***).

Se presentó además la matriz para el seguimiento y medición del avance del plan de choque, concertada y aprobada por la interventoría, teniendo en cuenta el cronograma actualizado y los entregables del proyecto definidos en el presupuesto de cantidades, asignando un peso porcentual a cada una de las cantidades, de acuerdo a su peso financiero con el valor total del proyecto y asignando pesos porcentuales a los hitos de avance para cada una de estas cantidades, con una periodicidad mensual, conforme a los requerimientos e indicaciones del ministerio del Interior, tal como se muestra a continuación.

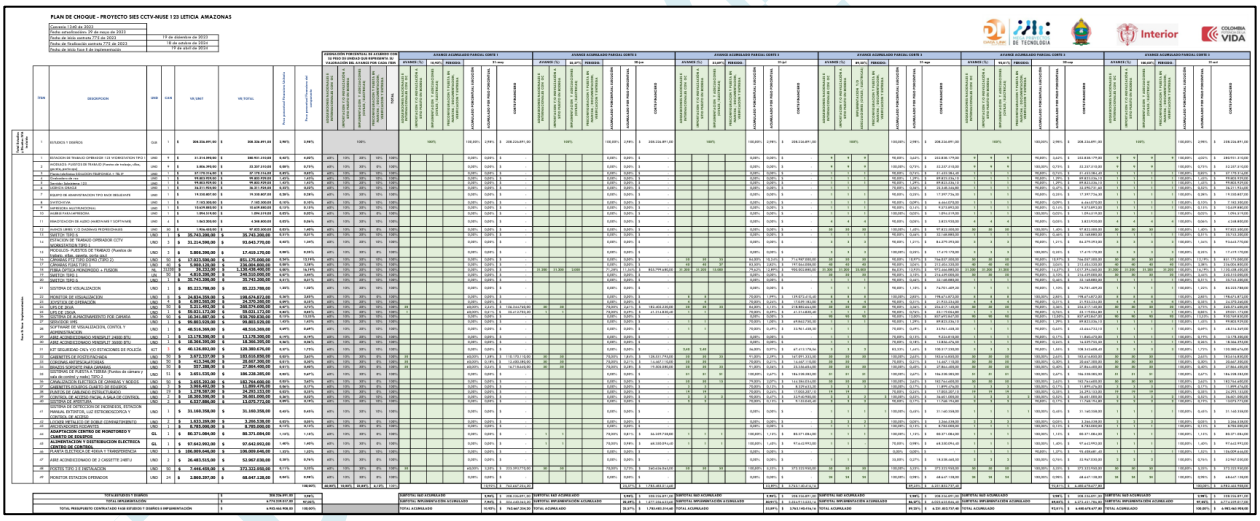

La tabla con las formulas asociadas y los detalles de los pesos porcentuales para definir los avances porcentuales mensuales para el plan de choque por las cantidades del proyecto, se presenta en la Hoja 1 "PLAN DE CHOQUE SIES LETICIA" de la hoja de cálculo del ***ANEXO N°6 - MATRIZ PLAN DE CHOQUE Y CURVA S VALOR GANADO.xlsx***.

De igual forma, se presenta la tabla resumen por las cantidades del proyecto, con el valor planeado de los porcentajes esperados de avance mensual en la hoja dos "CURVA S" del ***ANEXO N°6***, validado y aprobado por la interventoría y presentado ante el municipio y el ministerio del interior.

PLAN DE CHOQUE CON PLANIFICACIÓN DE AVANCE X VALOR GANADO

PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS					$ 6.982.465.908,00	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	10,92%	25,57%	53,89%	89,25%	92,81%	100,00%
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.214.590,00	$ 280.931.310,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%	4,02%
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO 123	UND	9	$ 5.806.390,00	$ 52.257.510,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,82%
4	Grabadora de voz	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,43%
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,43%
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,47%	0,52%
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,28%
8	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,10%
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,15%
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,06%
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	1,40%	1,40%
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,51%
14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.214.590,00	$ 93.643.770,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	1,34%
15	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO CCTV	UND	3	$ 5.806.390,00	$ 17.419.170,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,25%
16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,24%	10,97%	12,19%
17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,82%	3,04%	3,04%	3,38%
18	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,54%	12,89%	13,93%	14,57%	16,19%
19	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	3,10%	3,44%
20	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,51%
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	1,10%	1,22%
22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	2,85%	2,85%	2,85%
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,31%	0,31%	0,35%
24	UPS DE 2KVA	UND	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	2,61%	3,13%	3,36%	3,73%
25	UPS DE 15KVA	UND	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,59%	0,59%	0,76%	0,76%	0,85%
26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	12,00%	13,33%
27	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,29%	1,29%	1,43%
28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	0,63%	0,69%
29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,19%
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,24%	0,26%
31	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	1,44%	1,55%	1,72%
32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	1,84%	2,39%	2,63%	2,63%	2,63%
33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%	0,30%	0,30%
34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,28%	0,36%	0,40%	0,40%	0,40%
35	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,67%	2,67%	2,67%	2,67%
36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,07%	2,62%	2,62%	2,62%
37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,17%	0,17%	0,17%
38	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,35%	0,35%
39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,52%	0,52%	0,52%
40	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,17%	0,19%
41	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	0,45%
42	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%
43	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%	0,13%
44	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	GL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	1,15%	1,15%	1,15%	1,15%
45	**ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL**	GL	1	$ 97.642.992,00	$ 97.642.992,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	1,40%	0,98%	1,40%	1,40%
46	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	1,52%
47	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,76%	0,76%
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%	3,73%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%	0,98%
						$ -	$ -	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	$ 762.667.254,20	$ 1.785.483.514,60	$ 3.763.140.416,16	$ 6.231.852.737,40	$ 6.480.678.677,80	$ 6.982.465.908,00



JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ
GERENTE DE PROYECTO
DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS

ALAN DAVID MANOTAS LLINAS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
UT INTERVENTORÍA CCTV

El documento firmado y aprobado se puede observar en el ***ANEXO N°7 - PLAN DE CHOQUE Y CURVA S VALOR PLANEADO SIES LETICIA.pdf***.

Como evidencia de la visita y las decisiones allí tomadas se firma acta de reunión e informe de visita de

seguimiento a la ejecución contractual (proyectos e obra) anexo 20, de los días 29 a 30 de mayo (Ver ***ANEXO N°8 - ACTA DE VISITA LETICIA 29 AL 31 DE MAYO DE 2024.pdf***)

- El día 30 de mayo de 2024, se informa por parte del proveedor de los herrajes de fibra óptica, que los mismos llegaron por vía aérea al municipio de Leticia, y se nos envía registro fotográfico de evidencia, como se muestra a continuación:







Nota: El registro de las cantidades se entregará en el informe del mes de junio, cuando estos elementos estén en nuestro poder en la bodega central, y de igual forma, se informará a la interventoría para que se realice la respectiva visita para la validación de los elementos.

- Frente a los compromisos pactados en la reunión de 28 al 30 de mayo de 2023, el día 31 de mayo de 2024, se radica ante el instituto Nacional de Vías (INVIAS), vía correo electrónico con radicado 2024E-VUVRAZ-049222, solicitando la autorización para la instalación de los puntos de cámara en la vía Leticia-Tarapacá, la claridad en cuanto a partir de cual kilómetro aplicaría la solicitud de autorización.



Fwd: Resultado Radicación de Solicitud

Viernes, Mayo 31, 2024 12:18 -05

Site Manager site.manager@megaproyectos.net

Para Proyectos Erika Acosta

Cordial saludo;

Asunto: Resultado Radicación de Solicitud
Fecha: Viernes, Mayo 31, 2024 09:47 -05
De: enviorespuestas@invias.gov.co

Me permito enviar radicado solicitud INIVAS acorde a compromisos del día de ayer con MinInterior...

Atte;

Ing. Christian Alvarez R.
site.manager@megaproyectos.net
3132001000

Ha sido radicada la solicitud que usted ha generado vía correo electrónico: Número de Radicado: 2024E-VUVRAZ-049222 Remite: Site Manager Fecha: 2024-05-31 09:21:23 Para: atencionciudadano@invias.gov.co Asunto: Solicitud autorizacion implementacion Puntos de CCTV Leticia Amazonas Adjunto a este correo se incluye la solicitud original con la información de radicación

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

Solicitud_autorizacion_implementacion__Puntos_de_CCTV_____Leticia_Amazonas_1730392.pdf

2.1 MiB



COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA INVIAS

Remite: Site Manager <site.manager@megaproyectos.net>

Fecha: 2024-05-31 09:21:23

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: Solicitud autorizacion implementacion Puntos de CCTV Leticia Amazonas

Adjuntos: 04

Radicado: 2024E-VUVRAZ-049222

Fecha Radicación: 2024-05-31 09:47:30

Cc:

A corte 31 de mayo de 2024, no se ha recibido respuesta del oficio. Para ver el detalle de la trazabilidad de los correos con la solicitud con oficio MP-CE-2024-011 y la radicación ver ***ANEXO N°9 - SOLICITUD INVIAS PUNTOS DE CÁMARA VIA LETICIA-TARAPACA.pdf***.

- De igual forma el día 31 de mayo de 2024, se envía correo electrónico a la secretaría de Gobierno del municipio de Leticia, con el borrador del contrato de arrendamiento de la cartera de postes de la ENAM y suministro de energía, para su revisión y observaciones, y posterior perfeccionamiento (Ver ***ANEXO N°10 - REMISIÓN BORRADOR CONTRATO ARRENDAMIENTO ENAM.pdf***).

- **Resumen de adquisiciones:** A continuación, se presenta tabla con la trazabilidad de las adquisiciones de las cantidades aprobadas, por desembolsos del anticipo a través de la fiduciaria de occidente, así:

TÍTULO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANT.	PROVEEDOR	ESTADO	ORDEN DESEMB N°	FECHA GIRO
SISTEMA DE RECEPCION DE LLAMDAS	2.1. ESTACION DE TRABAJO OPERADOR	WORK STATION OPERADORES CCTV Y 123	HP	1C4A7AA	12	SENSAR INGENERIA SA	PEDIDO	O.D.004	12/03/2024
SISTEMA DE RECEPCION DE LLAMDAS	2.1. ESTACION DE TRABAJO OPERADOR	OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021 WORD-EXCEL - POWER POINT	MICROSOFT	T5D03487	12	SENSAR INGENERIA SA	PEDIDO	O.D.004	12/03/2024
EQUIPOS CCTV	3.1. CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	50	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.2. CÁMARAS FIJAS TIPO 1	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	HIKVISION	DS-2CD2646G2-IZS	40	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.3. FIBRA ÓPTICA MONOMODO	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	CABLES SUPERIORES	CSFO24H200NR	32.000	CABLES SUPERIIORES COLOMBIA SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	CONTROLADORA DE VIDEO WALL	HIKVISION	DS-C30S-S11(V2)	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	MODULO SALIDA HDMI PARA CONTROLADORA	HIKVISION	DS-C30S-04HO(V2)	2	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	MODULO ENTRADA HDMI PARA CONTROLADORA	HIKVISION	DS-C30S-04HI(V2)	5	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	DECODIFICADOR 4K	HIKVISION	DS-6916UDI(B)	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.9. MONITOR DE VISUALIZACIÓN	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	8	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.10. JOYSTICK DE OPERACIÓN	JOYSTICK DE OPERACIÓN	HIKVISION	DS-1600KI(B)	4	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.11. UPS 1.5KVA	UPS 1.5KVA	POWEST	POWEST 2KVA	50	SENSAR INGENERIA SA	BODEGA	O.D.004	12/03/2024
EQUIPOS CCTV	3.12. UPS 15 KVA	UPS 15 KVA	POWEST	POWEST 15KVA	1	SENSAR INGENERIA SA	BODEGA	O.D.004	12/03/2024
EQUIPOS CCTV	3.14. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	ALMACENAMIENTO EN CLUSTER 24 RANURAS	HIKVISION	DS-A82024D(B)	2	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.14. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	DISCO DURO	SEAGATE	EXOS 7E10 ST10000NM018B	34	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.15. SERVIDOR	SERVIDOR	HIKVISION	DS-VD22D-B/HW2	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-VSS-Base/64Ch	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-VSS-1Ch	61	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-ACS-Base/2Door	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION,	SOFTWARE DE VISUALIZACION,	HIKVISION	HikCentral-P-SmartWall-Module	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	0.D.005	03/04/2024

TÍTULO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANT.	PROVEEDOR	ESTADO	ORDEN DESEMB N°	FECHA GIRO
	CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	CONTROL Y ADMINISTRACIÓN							
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-Service	5	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.1. POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN	POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN	INGAL	14M X 750KGF	50	INGAL DE OCCIDENTE SAS	PEDIDO	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.2. GABINETES DE POSTE/FACHADA	GABINETES DE POSTE/FACHADA	QUEST	CE-2719	50	DAGA S.A.	PEDIDO	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.2. GABINETES DE POSTE/FACHADA	PLACA CON PROTECCIONES Y ELEMENTOS PARA GABINETE	N/A	N/A	50	SENSAR INGENERIA SA	PEDIDO	O.D.002	20/02/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.5. CORONAS ANTIESCALATORIAS	CORONAS ANTIESCALATORIAS	METALCO	MC-CA-18V-m	50	METALCO COMUNICACIONES SAS	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.6. BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	METALCO	MC-BMCD-1.5-m	50	METALCO COMUNICACIONES SAS	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.9. GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	POWEST	NGBP-10044	3	SENSAR INGENERIA SA	PEDIDO	O.D.004	12/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.11. CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	HIKVISION	DS-K1T673TDWX	2	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.12. SISTEMA DE APERTURA	ENROLADOR DE TARJETAS	HIKVISION	DS-K1F100-D8E	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	6.1. KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	HIKVISION	DS-2CD2646G2-IZS	3	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	6.1. KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	CÁMARAS FIJAS TIPO 2	HIKVISION	DS-2CD2646G2-IZS	3	USA VIRTUAL MARKET SAS	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	6.1. KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UPS 1.5KVA	POWEST	POWEST 2KVA	3	SENSAR INGENERIA SA	BODEGA	O.D.004	12/03/2024


3.4. REPORTE DE AVANCE Y CURVA S

Conforme a la matriz de seguimiento con el plan de choque aprobada por las partes, se presenta el avance acumulado a corte 31 de mayo de 2024, donde se registra el avance referente a las adquisiciones de los elementos adquiridos, relacionados en la siguiente tabla:

							ASIGNACION PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM					AVANCE ACUMULADO PARCIAL MAYO						
												AVANCE (%)	23,35%	PERIODO:	31-may		
	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	Peso porcentual Financiero Unitario	Peso porcentual Financiero del componente	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL	CORTE FINANCIERO
Total Estudios y Diseños IVA incluido	1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	2,98%	2,98%	100%					100%				100,00%	2,98%	$ 208.226.891,00
Fase II: fase implementación	16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	0,24%	12,19%	60%	10%	20%	10%	100%	50				60,00%	7,31%	$ 510.705.000,00
	17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	0,08%	3,38%	60%	10%	20%	10%	100%	40				60,00%	2,03%	$ 141.602.880,00
	22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	0,36%	2,85%	60%	10%	30%	0%	100%	8				60,00%	1,71%	$ 119.204.923,20
	23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	0,09%	0,35%	60%	10%	20%	10%	100%	4				60,00%	0,21%	$ 14.622.156,00
	24	UPS DE 2KVA	UND	50	0,07%	3,73%	60%	10%	20%	10%	100%	50				60,00%	2,24%	$ 156.344.760,00
	25	UPS DE 15KVA	UND	1	0,85%	0,85%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,51%	$ 35.412.703,20
	27	SERVIDOR VMS	UND	1	1,43%	1,43%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,86%	$ 59.882.357,40
	32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	0,05%	2,63%	60%	10%	30%	0%	100%	50				60,00%	1,58%	$ 110.170.110,00
	33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	0,01%	0,30%	60%	10%	30%	0%	100%	50				60,00%	0,18%	$ 12.400.380,00
	34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	0,01%	0,40%	60%	10%	30%	0%	100%	50				60,00%	0,24%	$ 16.718.640,00
	39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	0,26%	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%	2				60,00%	0,31%	$ 21.960.600,00
	48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	0,11%	5,33%	60%	10%	30%	0%	100%	50				60,00%	3,20%	$ 223.393.770,00

Las órdenes de compra, de los elementos adquiridos previa autorización de la interventoría, habían sido validadas en meses anteriores, a excepción de la orden de compra No. .MP-LET-0012024 con el proveedor GSP Global Security Protection (USA Virtual SAS), con la cual se soporta el avance reportado por "ADQUISICIONES NACIONALES O INTERNACIONALES CON ORDEN DE COMPRA" para: cincuenta (50) cámaras PTZ tipo 2; cuarenta (40) cámaras fijas tipo 1; ocho (8) monitores de visualización; cuatro (4) Joystick de operación; un (1) servidor VMS; dos (2) controles de acceso facial (ver ***ANEXO N°17 - ORDEN DE COMPRA .MP-LET-0012024 GSP.pdf***). Tal como se observa en la tabla anterior, cada elemento se registra en la matriz de seguimiento al plan de acción, con los respectivos pesos porcentuales financieros y peso porcentual de avance por adquisiciones.

De igual forma, se presenta gráficamente el comparativo entre el valor planeado y el valor ejecutado, mediante la curva S de seguimiento, así:

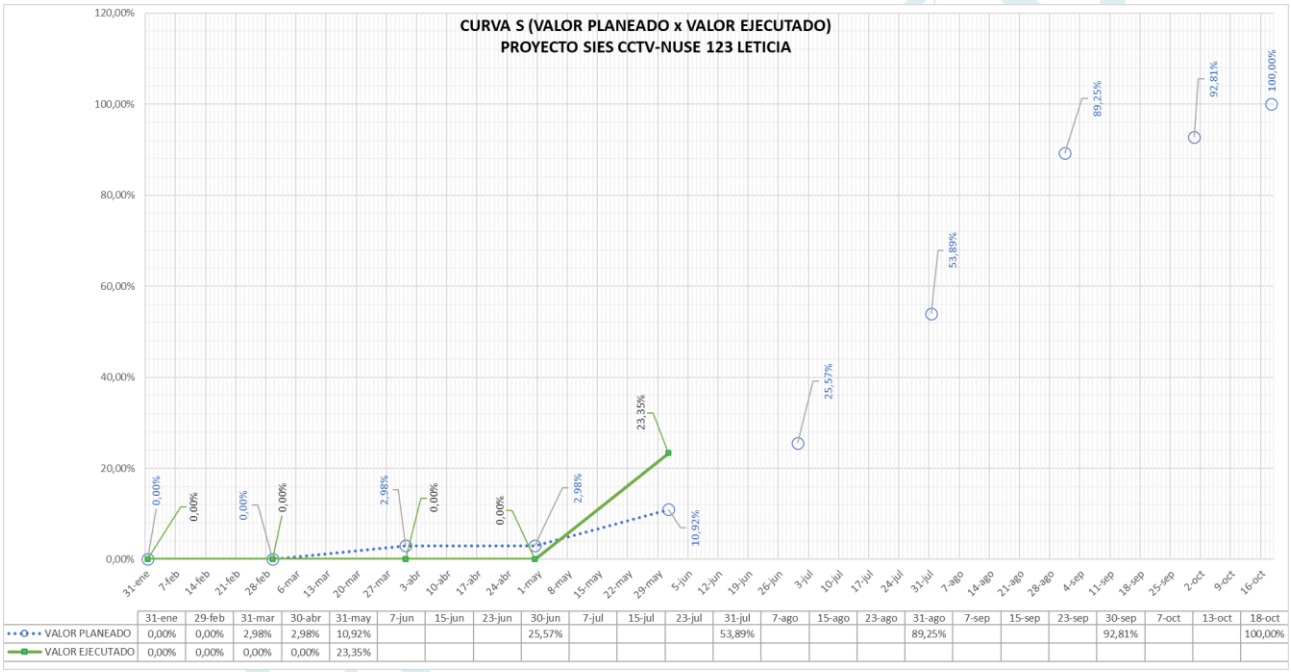

	31-ene	29-feb	31-mar	30-abr	31-may	7-jun	15-jun	23-jun	30-jun	7-jul	15-jul	23-jul	31-jul	7-ago	15-ago	23-ago	31-ago	7-sep	15-sep	23-sep	30-sep	7-oct	13-oct	18-oct
VALOR PLANEADO	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	10,92%				25,57%				53,89%				89,25%				92,81%			100,00%
VALOR EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,35%																			

Como se observa, corte 31 de mayo de 2024 se registra un avance del 23,35% frente al 10,92% esperado, teniendo en cuenta que se logró un gran avance en las adquisiciones, dada la autorización de iniciar con las mismas previamente acordadas en meses anteriores por las condiciones especiales del municipio de Leticia, y la validación anticipada de la orden de compra de GSP, que logró disponer de algunas cantidades con anterioridad a la fecha esperada. Para ver la Matriz de seguimiento diligenciada ver el ***ANEXO N°11 - MATRIZ SMTO PLAN CHOQUE Y CURVA S MAY 31.xlsx***). De igual forma se anexa el reporte general de avance y curva S (Ver ***ANEXO N°12 - SMTO PLAN DE CHOQUE Y CURVA S CORTE MAY 31.pdf***).

4. ESTADO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO DEL CONTRATO

4.1. FINANCIERO

- Se presenta en la siguiente tabla, el balance financiero del contrato 775 de 2023 a la fecha, así:

RESUMEN FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**%**	**PERIODO**
Valor FASE I de Estudios y Diseños	$ 208.226.891	2,98%	19/12/2023 – 18/03/2024
Valor FASE II de Implementación,	**$ 6.774.239.017**	97,02%	19/04/2024 – 18/10/2024
TOTAL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.982.465.908**	**100%**	**19/12/2023 – 18/10/2023**
ANTICIPO (FIDUCIA)	$ 1.309.245.051	18,75%	**GIRADO (2/01/2024)**
SALDO	**$ 5.673.220.857**	81,25%	

Nota: Se tabla anterior se ajusta al presupuesto definitivo (ver ***ANEXO N°1***), aprobado por las partes según ***ANEXO N°4***.

- Durante el mes de mayo no se realizaron solicitudes de desembolso que afectaran el anticipo depositado en el fideicomiso FID 3-18854, luego se presenta el consolidado de los desembolsos realizados a la fecha con el detalle del rubro del plan de inversión del anticipo afectado, el numero de la orden de desembolso, proveedor al que se le realizó el desembolso y su respectivo número de NIT, cuenta de cobro o factura, valor desembolsado.

RUBRO	VALOR	ORDEN DE DESEMBOLSO	NIT No.	NOMBRE DE PROVEEDOR	No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE GENERACION	VALOR EN PESOS	ANEXOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$208.226.891	O.D. N°001	900971683-0	JANAGER TECNOLOGIA SAS	CUENTA DE COBRO 001	19/01/2024	$42.500.000	VER INFORME ENERO
		O.D. N°001	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	CUENTA DE COBRO 001	19/01/2024	$98.000.000	VER INFORME ENERO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LOS ITEMS PROYECTO	$1.101.018.160	O.D. N°002	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	FACTURA PROFORMA 001	20/02/2024	$87.375.000	VER INFORME FEBRERO
		O.D. N°003	901020151-8	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	FACTURA PROFORMA 053	06/03/2024	$150.168.500	VER INFORME MARZO
		O.D. N°003	8605163143	DAGA SA EN REORGANIZACION	FACTURA ELECTRONICA DCE8857	06/03/2024	$58.803.850	VER INFORME MARZO
		O.D. N°003	9010878846	METALCO COMUNICACIONES SAS	FACTURA PROFORMA MC-010	06/03/2024	$34.093.500	VER INFORME MARZO
		O.D. N°004	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	FACTURA PROFORMA FP003	12/03/2024	$269.047.100	VER INFORME MARZO
		O.D. N°005	900284221-4	USA VIRTUAL MARKET SAS	FACTURA PROFORMA	03/04/2024	$436.464.170	VER INFORME ABRIL
		O.D. N°005	805022762-9	CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	PROFORMA 001	03/04/2024	$65.066.040	VER INFORME ABRIL
VALOR GIRADO-PAGO PROVEEDORES							**$1.241.518.160**	
VALOR ANTICIPO							**$1.309.245.051**	
SALDO ANTICIPO							**$67.726.891**	

Nota: Los soportes de os desembolsos reposan en los informes anteriores, dado que en el mes de mayo no se realizaron solicitudes de desembolso.

- Se presenta información a corte del mes de MAYO de 2024 (última información disponible), donde se reportan rendimientos del fideicomiso FID 3-18854 por valor de $11,475.07, los cuales fueron girados a la cuenta indicada por municipio de Leticia, cuenta de ahorros N°407300680 del Banco de Bogotá. (Ver ***ANEXO N°13 - PAGO RENDIMIENTOS MAYO FID 3-18854.pdf***). A corte 31 de MAYO de 2024, se han reportado un acumulado de rendimientos del fideicomiso por valor de **$ 1.315.661,97**, tal como se observa en la siguiente tabla:

MES	VALOR RENDIMIENTOS	SOPORTE
ENERO	$ 521.263,35	Ver Informe del mes de enero
FEBRERO	$ 453.347,67	Ver informe del mes de febrero

MARZO	$ 311.398,01	Ver informe del mes de marzo
ABRIL	$ 18.177,87	***ANEXO N°15 - INFORME MENSUAL Y RENDIMIENTOS FIDUOCCIDENTE ABRIL 2024.pdf***
MAYO	$ 11.475,07	***ANEXO N°13 - PAGO RENDIMIENTOS MAYO FID 3-18854.pdf***
TOTAL	**$ 1.315.661,97**	

- La Fiduciaria de Occidente S.A. envía informe mensual con corte al 31 DE MAYO DE 2024 (Ver ***ANEXO N°14 - INFORME MENSUAL FIDUOCCIDENTE CON SOPORTES MAY 2024.pdf***), en el cual se presenta la siguiente información:
  - Informe Mensual
  - Estados Financieros
  - Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
  - Relación de Recaudos y/o Pagos (si aplica)
  - Plan de inversión del anticipo

  A continuación, se presenta tabla resumen resultado con corte al mes de MAYO, con los desembolsos y rendimientos, reportada por FIDUOCCIDENTE:

FIDEICOMISO 3-18854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONTROL DE PAGOS Y RECURSOS DISPONIBLES

RUBRO	CONCEPTO DE LA INVERSION	VALOR TOTAL	NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHAS	O.P.	VALOR PAGADO	SALDO CONTRATO
RUBRO 1 -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	208,226,891.00	JANAGER TECNOLOGÍA SAS	DESEMBOLSO	19-ene-24	2024-001	42,500,000.00	67,726,891.00
			SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	19-ene-24	2024-001	98,000,000.00	
					TOTAL RUBRO PAGADO		140,500,000.00	
RUBRO 2 -	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LOS ITEMS PROYECTOS	1,101,018,160.00	SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	20-feb-24	2024-002	87,375,000.00	-
			INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	150,168,500.00	
			DAGA S.A EN REORGANIZACION	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	58,803,850.00	
			METALCO COMUNICACIONES SAS	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	34,093,500.00	
			SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	12-mar-24	2024-004	269,047,100.00	
			USA VIRTUAL MARKET SAS	DESEMBOLSO	1-abr-24	2024-005	436,464,170.00	
			CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	DESEMBOLSO	1-abr-24	2024-005	65,066,040.00	
					TOTAL RUBRO PAGADO		1,101,018,160.00	
GMF		-	Banco de Occidente		24-ene-24	GMF	562,052.59	80,298.65
			Banco de Occidente		22-feb-24	GMF	351,619.79	
			Banco de Occidente		8-mar-24	GMF	2,050,384.65	
			Data Link		26-mar-24	Reintergo	(2,030,000.00)	
			Data Link		1-abr-24	Reintergo	(3,021,900.00)	
			Banco de Occidente		5-abr-24	GMF	2,007,454.24	
			Banco de Occidente		8-may-24	GMF	90.08	
					TOTAL		(80,298.65)	
GASTOS BANCARIOS		-	Banco de Occidente		24-ene-24	IVA	2,099.50	78,004.50
			Banco de Occidente		24-ene-24	Comisión	11,050.00	
			Banco de Occidente		22-feb-24	IVA	1,387.00	
			Banco de Occidente		22-feb-24	Comisión	7,300.00	
			Banco de Occidente		8-mar-24	IVA	4,769.00	
			Banco de Occidente		8-mar-24	Comisión	25,100.00	
			Banco de Occidente		5-abr-24	IVA	3,505.50	
			Banco de Occidente		5-abr-24	Comisión	18,450.00	
			Banco de Occidente		8-may-24	IVA	693.50	
			Banco de Occidente		8-may-24	Comisión	3,650.00	
					TOTAL		78,004.50	
VALOR DE ANTICIPO		1,309,245,051.00			SALDOS TOTALES		1,241,515,865.85	67,729,185.15

GIRO SALDOS	
Rendimientos generados con recursos del Anticipo	1,315,661.97
Rendimientos Fondo de Reserva	64,821.22
Rendimientos Fondo de Comision Fiduciaria y Gtos.	166,217.09
Saldo Aportes para gastos bancarios realizado por Fideicomitente	(2,294.15)
Total Rendimientos a Trasladar Entidad Estatal	(11,475.07)
Total Rendimientos Trasladados a Entidad Estatal con corte a mayo 2024	1,304,186.90
Saldos Rubros Plan de Inversión.	67,729,185.15
Disponible Fiduciario	67,957,929.31
Los rendimientos mostrados corresponden a los rendimientos en cuentas de ahorros y son para trasladar de forma mensual a la Entidad Estatal.	

OBSERVACIONES:

El contrato No. 775 DE 2023 tiene un valor inicial de $ 6.890.763.427,00 con el objetivo de "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD – SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", y se administrarà el 19% en modalidad de anticipo en el Patrimonio Autonomo, por valor de $ 1.309.245.051 los cuales ingresaron a la cuenta del Fideicomiso el día 02 de enero de 2024.

Teniendo en cuenta que, en el informe del mes de abril no se pudo relacionar el informe mensual de la fiduciaria, dado que la fecha de su elaboración no había sido generado ni remitido por FIDUOCCIDENTE, y este fue enviado vía correo electrónico a la interventoría el día 27 de mayo de 2024, fecha en la se nos

allego, se agrega al presente informe como anexo junto con el reporte de rendimientos para que hagan parte del expediente (Ver ***ANEXO N°15 - INFORME MENSUAL Y RENDIMIENTOS FIDUOCCIDENTE ABRIL 2024.pdf***).

Nota: En la información relacionada anteriormente, ya se está teniendo en cuenta los rendimientos reportados en abril.

4.2. ADMINISTRATIVO

El área administrativa se encarga de garantizar el pago de seguridad social del personal de la fase II, de conformidad con los porcentajes de dedicación respectivos, en el mes de MAYO, así:

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
1	Gerente del Proyecto	100	JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ	9468692396	$786.900	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
2	Consultor tecnológico	100	JHON ALEXANDER SILVARA GUERRERO	N/A	N/A	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
3	Ingeniero civil o arquitecto	50	ROBINSON DIAZ LOPEZ	78022497	$203.500	EPS SURA	COLFONDOS	ARL SURA	N.A
4	Ingeniero Eléctrico o electricista	40	CRISTIAN GUTIERREZ LANDINEZ	9467404061	$384.600	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
5	Ingeniero de sistema de aire acondicionado	20	DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ	9468692396	$208.000	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
6	Ingeniero residente	100	RONALD ALEJANDRO RODRIGUEZ ULLOA	N/A	N/A	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA SEGUROS	N.A
7	Técnico de apoyo eléctrico	40	ALFONSO MORAN JEAN	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
8	Técnico De Apoyo De F.O o Radioenlace	50	ENRIQUE FRAY RODRIGUEZ RAMIREZ	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
9	Profesional de Seguridad Industrial y Medio Ambiental	10	YURI VANESA CUEVAS HUERTAS	7931260442	$121.700	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA SEGUROS	N.A
10	Consultor de seguridad	NA	FABIAN GUZMAN SOTO	9468692396	$929.100	SANITAS	COLFONDOS	COLPATRIA ARP	N.A
11	Financiero y/o contable	10	ERIKA LILIANA ACOSTA OLAYA	9468692396	$437.200	SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
12	Administrativo	10	ALBEIRO MENDEZ BURITCA	7928007957	$67.000	SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS DE VIDA COLPARIA SA	N.A
13	Jurídico	10	FABIAN LIBARDO MARTINEZ CUBIDES	9467976496	$382.900	SALUD TOTAL	PORVENIR	ARL SURA	N.A.

Se debe tener en cuenta que, finalizada la primera fase del proyecto de estudios y diseños del proyecto en el mes de marzo, se están realizando actividades de preparación y logística de la segunda fase de implementación, y aún no se han iniciado operaciones en campo. Para más información, ver ***ANEXO N°16 - CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MAYO 2024.pdf***).

A la fecha se ratifica el personal mínimo requerido para la fase II de implementación, presentado junto con la

propuesta inicial, a la espera de la aprobación de las novedades presentadas (ver numeral 3.3 y el ***ANEXO N°5***). Cabe resaltar que aún no se han iniciado labores en campo, y el personal necesario en esta etapa preoperacional.

4.3. JURIDICO

En cuanto a la gestión jurídica, durante el mes de MAYO se realizaron las gestiones tendientes a la revisión de los informes de la fiducia, así como la revisión de los contratos con el personal mínimo requerido y, los contratos, acuerdos u ordenes de servicio suscritos con proveedores en el marco de la ejecución de las actividades del proyecto.

5. ANEXOS

Se presentan los siguientes anexos al presente informe:

- ***ANEXO N°1 - PRESUPUESTO GENERAL APROBADO PROYECTO SIES LETICIA.pdf***
- ***ANEXO N°2 - INFORME JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CON ANEXOS.rar***
- ***ANEXO N°3 - CRONOGRAMA PLAN CHOQUE IMPLEMENTACION SIES LETICIA VF.pdf***
- ***ANEXO N°4 - ANEXO 22 ACTA RECIBO ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS.pdf***
- ***ANEXO N°5 - NOVEDADES PERSONAL MINIMO REQUERIDO FASE II.pdf***
- ***ANEXO N°6 - MATRIZ PLAN DE CHOQUE Y CURVA S VALOR GANADO.xlsx***
- ***ANEXO N°7 - PLAN DE CHOQUE Y CURVA S VALOR PLANEADO SIES LETICIA.pdf***
- ***ANEXO N°8 - ACTA DE VISITA LETICIA 29 AL 31 DE MAYO DE 2024 CON.pdf***
- ***ANEXO N°9 - SOLICITUD INVIAS PUNTOS DE CÁMARA VIA LETICIA-TARAPACA.pdf***
- ***ANEXO N°10 - REMISIÓN BORRADOR CONTRATO ARRENDAMIENTO ENAM.pdf***
- ***ANEXO N°11 - MATRIZ SMTO PLAN CHOQUE Y CURVA S MAY 31.xlsx***
- ***ANEXO N°12 - SMTO PLAN DE CHOQUE Y CURVA S CORTE MAY 31.pdf***
- ***ANEXO N°13 - PAGO RENDIMIENTOS MAYO FID 3-18854.pdf***
- ***ANEXO N°14 - INFORME MENSUAL FIDUOCCIDENTE CON SOPORTES MAY 2024.pdf***
- ***ANEXO N°15 - INFORME MENSUAL Y RENDIMIENTOS FIDUOCCIDENTE ABRIL 2024.pdf***
- ***ANEXO N°16 - CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL MAYO 2024.pdf***
- ***ANEXO N°17 - ORDEN DE COMPRA .MP-LET-0012024 GSP.pdf).***
