
DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C. 76.319.950

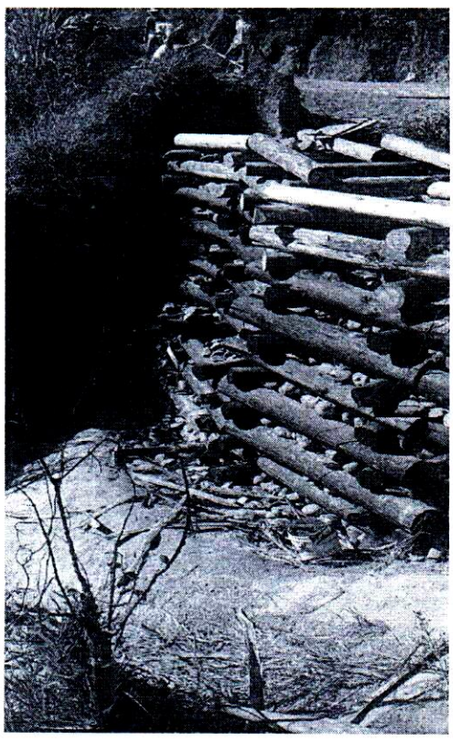

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATISTA
"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."
DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C. 76.319.950

INFORME DE OBRA

CONTRATO No. 20231800037567

DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C. 76.319.950

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se da a conocer el avance del CONTRATO No. 20231800037557 - Contrato de Obra, que tiene por **OBJETO: "RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."** tanto en el aspecto físico como administrativo, las actividades ejecutadas y las dificultades que se han presentado durante su desarrollo en el periodo comprendido entre el 13 de diciembre al 27 de diciembre.

En este periodo el contratista ha dedicado sus esfuerzos a lograr avanzar físicamente al 83 % del avance de obra

En el aspecto administrativo, se firma el Acta de inicio el 13 de diciembre.

1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO

1.1. CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE OBRA

CONTRATO:	**No. 20231800037567**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."**
CONTRATISTA	**DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA**
LOCALIZACION DEL PROYECTO:	**MUNICIPIO DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	**Hasta el 30 de diciembre del 2023.**
VALOR:	**$ 65.157.840,00**

DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C. 76.319.950

FORMA DE PAGO:	EL MUNICIPIO DE POPAYÁN pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante actas parciales según el avance de la obra, de conformidad con las actividades ejecutadas previa certificación por parte de la supervisión y previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. El acta final no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato, donde se certifique el recibo a satisfacción de la obra, de acuerdo con los términos de la propuesta económica presentada por el contratista y a las condiciones técnicas acordadas en la invitación pública. Para efectos de realizarse los pagos, LA PERSONA O ENTIDAD CONTRATISTA debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y parafiscales (SENA, ICBF y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR), estos últimos de ser necesarios. Parágrafo primero. Al formular la oferta, el contratista aceptó que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan a la Entidad. Se informa al público que en lo correspondiente a tributos (impuestos, tasas y contribuciones) del Municipio de Popayán, los mismos se encuentra regulados y pormenorizados en el Estatuto Tributario de esta entidad territorial, el cual fue consagrado mediante Acuerdo 024 del 2021 "Por medio del cual se adopta el estatuto tributario del municipio de Popayán", mismo que puede ser encontrado en el siguiente enlace: http://www.popayan.gov.co/sites/default/files/acuerdo_024_de_2021.pdf NOTA 2: EL MUNICIPIO DE POPAYÁN solo pagará lo debidamente entregado, ejecutado y soportado por parte del contratista, en el plazo y condiciones convenidas.
VIGENCIA FISCAL:	**2023**
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	**13/12/2023**
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	**30/12/2023**

2. INFORME TÉCNICO

2.1. AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

Durante el periodo comprendido del 13 de diciembre al 27 de diciembre, se han venido realizando actividades a buen ritmo.

Las cantidades de obra ejecutadas por parte del personal del Contratista de Obra durante este periodo son:

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANTIDADES CONTRACTUALES	CANTIDADES EJECUTADAS
1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	91	91,00
2	CONFORMACIÓN MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS DE MADERA	M2	48	45,00
3	CONSTRUCCION DE DE ALCATARILLA DE 1 METROS DE ALTO DE 1 LARGO Y 1 METRO DE ANCHO CON UN GROSOR DE 0,15 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN TAPA)	UND	1	0,00
4	ENCOFRAMIENTO DE ALCANTARILLA PARA CODUCCION DE AGUA	UND	1	1,00
5	COLOCACION DE TUBO 10" incluye excavacion y conformacion manual	ML	6,5	0,00
6	RELLENO Y COMPACTACION PARA COMPLETAR LA VIAS CON SUELO	M3	18	18,00
7	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ROMBO REFORZADO INCULUYE MATERIAL DE RELLENO.	UND	6	5,00
8	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UND	360	360,00
9	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBÁCEA	M2	72	72,00
10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DE MATERIAL ORGANICO	M2	9,1	9,10

Para cada una de las actividades realizadas en este periodo, el contratista ha contado con la maquinaria y el equipo humano necesario, también se ha implementado el sistema de seguridad en el trabajo por parte del contratista.

Todas las actividades realizadas en el periodo informado han sido verificadas y seguidas por el personal de la supervisión, realizando los debidos controles en calidad de los materiales, concretos y niveles de topografía.

2.2. PROGRAMA DE TRABAJO

Se anexa el avance físico realizado en periodo comprendido entre el 13 de diciembre al 29 de diciembre. El porcentaje de avance de obra realizado en el periodo es del 89 % con base al valor total del contrato.

3. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

3.1. BALANCE DE INVERSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

BALANCE FINANCIERO CON ADICIONAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 65.157.840,00
VALOR ADICIONAL	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 65.157.840,00
VALOR PRESENTE ACTA	$ 54.324.600,00
VALOR ACUMULADO ACTA ANTERIOR	$ -
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 54.324.600,00
SALDO POR EJECUTAR	$ 10.833.240,00

4. ASPECTOS AMBIENTALES, SOCIALES Y SISTEMAS DE GESTIÓN

Ambiental
En base a la identificación previa de los agentes y factores de riesgo ambiental, durante el desarrollo de las actividades del proyecto no se talo ningún tipo de árbol, además que se verificó que se cumplieran los protocolos establecidos para el manejo de residuos y material sobrante por parte de la supervisión.

Plan de gestión social
Para dar cumplimiento a las obligaciones laborales, salud ocupacional y de seguridad industrial, como contratista se entregó y dotó el personal bajo cargo, de los elementos de protección personal necesarios para la actividad de construcción.

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
En cumplimiento de los requerimientos del Ministerio de Trabajo, como contratista se implementar en obra el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y el acatamiento de lo consagrado en la ley 100, (Afiliación a ARP, EPS, Pensión, Caja de compensación, Sena e ICBF). Se anexa copia de los pagos de los aportes parafiscales correspondientes al personal que desarrollo actividades referentes al contrato.

DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C 76.319.950, expedida en Popayán Cauca
Dirección: Vereda el Tablón -- Sector Tablón II – Parcela 21
Teléfono: 3007873522
Correo: diegoftorresv@gmail.com
Contratista


ANEXOS


REGISTRO FOTOGRAFICO







DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C. 76.319.950

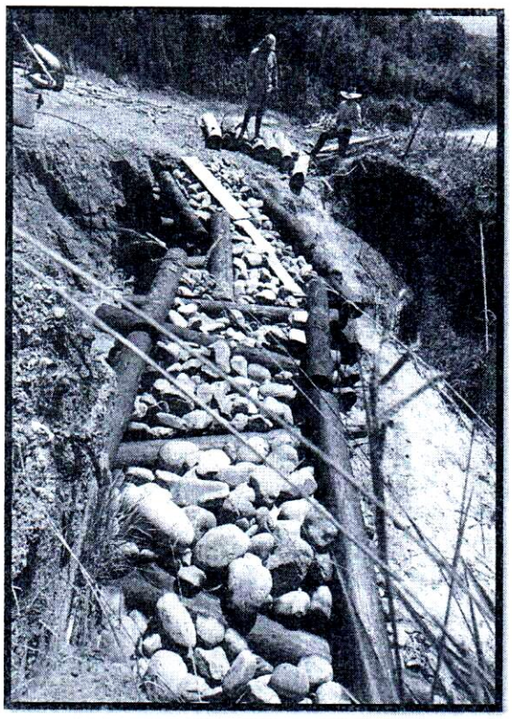

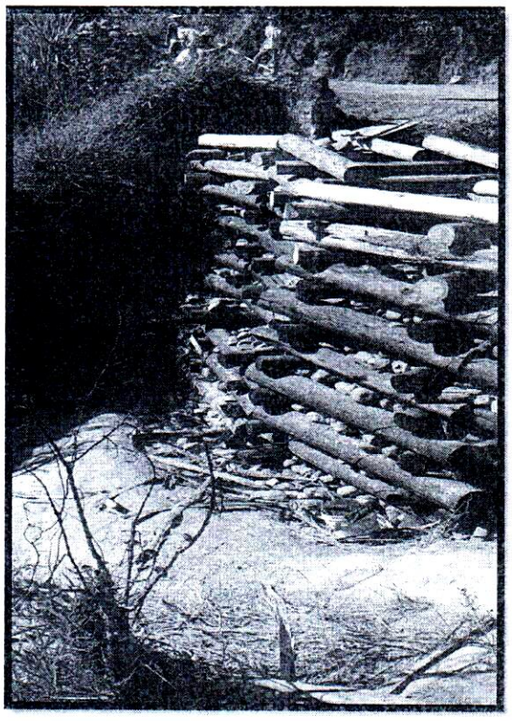


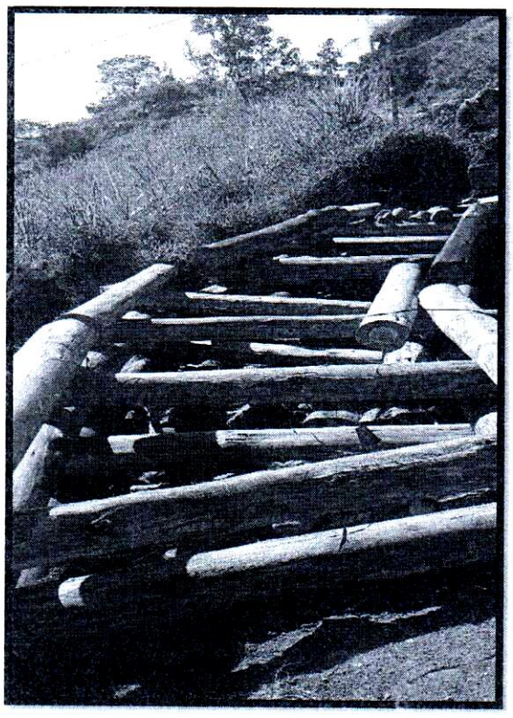



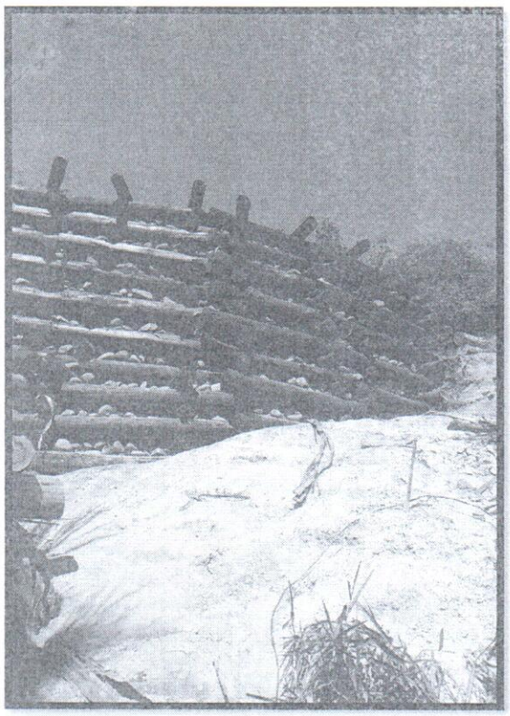





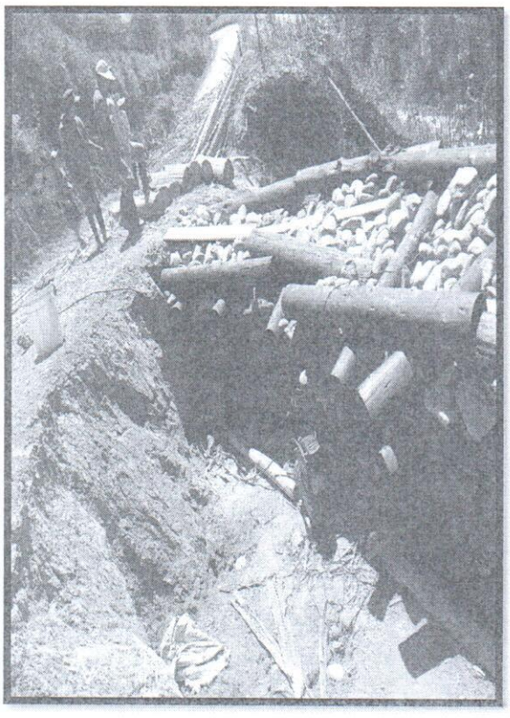



DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA
C.C. 76.319.950

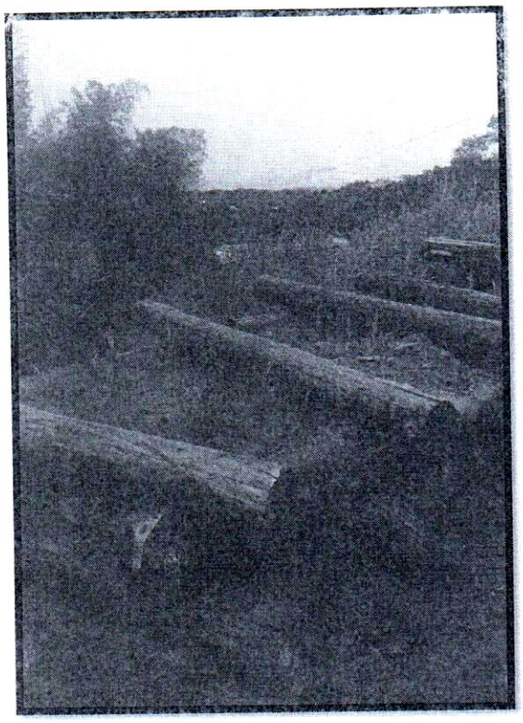

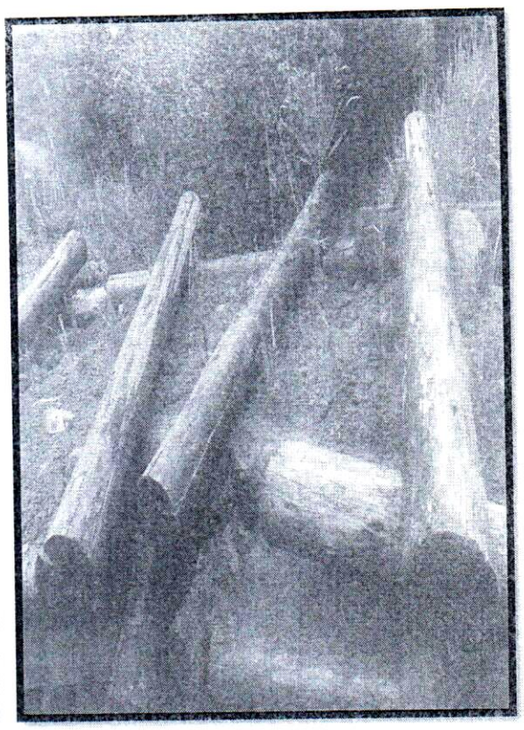


Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	9	ESTABLECIMIENTO DE COBERTURA VEGETAL HERBÁCEA	UNIDAD: M2

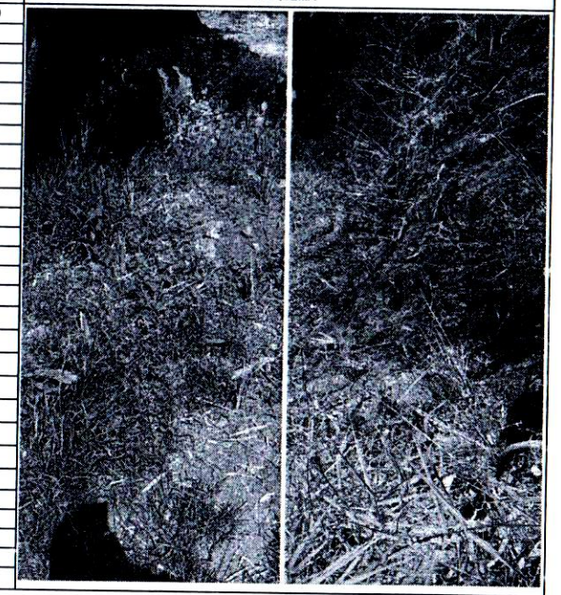SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto						
		6,50	11,08		1,00				72,00	
TOTAL									72,00	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR


Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DEMATERIAL ORGANICO	UNIDAD: M2

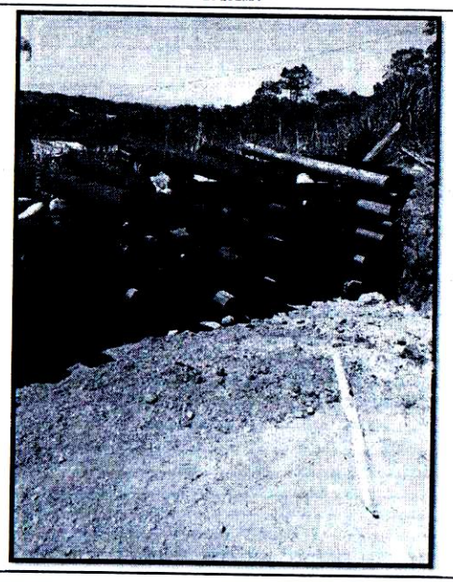SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto						
					9,10				9,10	
TOTAL									9,10	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:

Alcaldía de Popayán


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	7	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ROMBO REFORZADO INCULUYE MATERIAL DE RELLENO.	UNIDAD: UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES Largo	Ancho	Alto	CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
					5,00				5,00
TOTAL									5,00

ESQUEMA

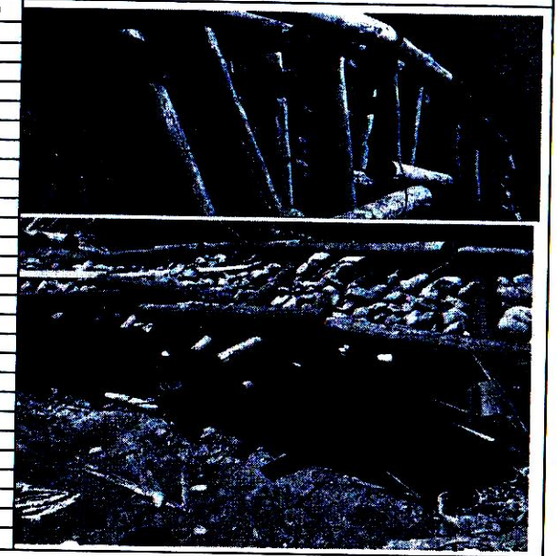

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:


Alcaldía de Popayán


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	8	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UNIDAD: UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto						
					360,00				360,00	
TOTAL									360,00	

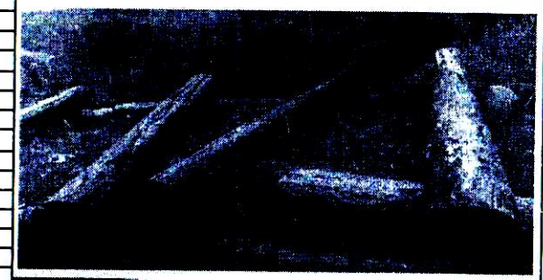





DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	5	COLOCACION DE TUBO 10" Incluye excavacion y conformacion manual	UNIDAD: ML

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho						0,00	
TOTAL									0,00	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	6	RELLENO Y COMPACTACION PARACOMPLETAR LA VIAS CON SUELO	UNIDAD: M3

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto						
		4,50	1,00	4,00	1,00				18,00	
TOTAL									18,00	





DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	3	CONSTRUCCION DE DE ALCATARILLA DE 1 METROS DE ALTO DE 1 LARGO Y 1 METRO DE ANCHO CON UN GROSOR DE 0,15 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN TAPA)	UNIDAD: UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto					0,00	
TOTAL									0,00	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	4	ENCOFRAMIENTO DE ALCANTARILLA PARA CODUCCION DE AGUA	UNIDAD: UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL
		Largo	Ancho	Alto					ACUMULADO
					1,00				1,00
TOTAL									1,00

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	2	CONFORMACIÓN MANUAL PARA ADECUACION DE MODULOS BIOLOGICOS DE MADERA	UNIDAD: M2

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			Coef Exp	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
		4,00		3,00	2,50				30,00
		4,00		1,50	2,50				15,00
TOTAL									45,00

ESQUEMA



DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán	14 MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231600037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD M2

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto						
		9,00	9,00		81,00				81,00	
		2,00	5,00		10,00				10,00	
TOTAL									91,00	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	1 LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD	M2

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto					ACUMULADO	
		9,00	9,00		81,00				81,00	
		2,00	5,00		10,00				10,00	
TOTAL									91,00	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:

Alcaldía de Popayán	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Versión
		01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		

ITEM	3	CONSTRUCCION DE DE ALCATARILLA DE 1 METROS DE ALTO DE 1 LARGO Y 1 METRO DE ANCHO CON UN GROSOR DE 0,15 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN TAPA)	UNIDAD	UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto					ACUMULADO	
									0,00	
TOTAL									0,00	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESITA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	4	ENCOFRAMIENTO DE ALCANTARILLA PARA CODUCCION DE AGUA	UNIDAD: UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
					1,00				1,00
TOTAL									1,00

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	6	RELLENO Y COMPACTACION PARACOMPLETAR LA VIAS CON SUELO	UNIDAD: M3

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO
		Largo	Ancho	Alto					
		4,50	1,00	4,00	1,00				18,00
TOTAL									18,00

ESQUEMA





DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	5	COLOCACION DE TUBO 10" Incluye excavacion y conformacion manual	UNIDAD: ML

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL	ESQUEMA
		Largo	Ancho						ACUMULADO	
									0,00	
TOTAL									0,00	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:



GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN "		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	7	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS BIOLOGICOS EN ENTRAMADO DE MADERA TIPO ROMBO REFORZADO INCULUYE MATERIAL DE RELLENO.	UNIDAD: UND

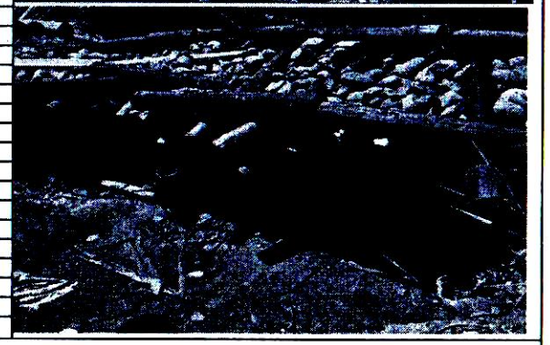SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto						
					5,00				5,00	
										
TOTAL									5,00	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:


Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 20231800037567	FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	8	REPOBLAMIENTO VEGETAL POR ESTABLECIMIENTO DE SIEMBRA DE ESTACA VIVA	UNIDAD: UND

SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto						
					360,00				360,00	
TOTAL									360,00	

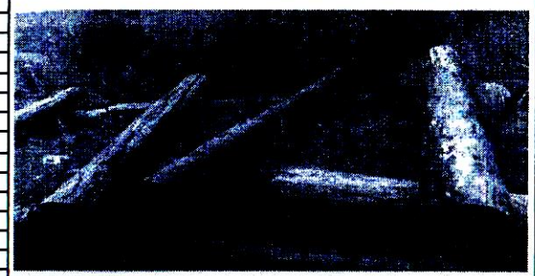





DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA
Firma:


GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR
Firma:

Alcaldía de Popayán

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

Versión 01

SOPORTE DEL ACTA No.	01	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO	"RECUPERACION Y RESTAURACION DE TALUD POR MEDIO DE LA TECNICA DE INGENIERIA NATURALISTICA ZONA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYAN."		
CONTRATO No.		FRENTE DE OBRA	ZONA DE RONDA VEREDA LA MESETA MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA	DIEGO FELIPE TORRES VALENCIA		
SUPERVISOR	GONZALO PAZ GONZALES		
ITEM	10	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DEMATERIAL ORGANICO	UNIDAD: M2

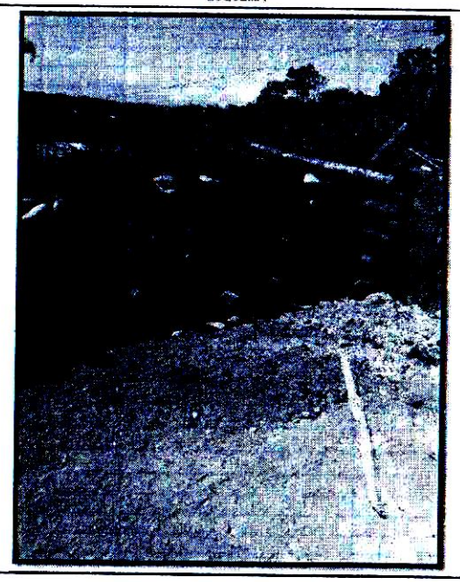SECTOR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANTIDAD			UNIDAD	TOTAL ACUMULADO	ESQUEMA
		Largo	Ancho	Alto						
					9,10				9,10	
TOTAL									9,10	

DIEGO FELIPE TORRES
CONTRATISTA

Firma:

GONZALO PAZ GONZALEZ
SUPERVISOR

Firma:
