SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1. PCCNTR. 5313251
CONSORCIO SANTA MARÍA 022
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 - 3013942384
Email: proyectos@soliunsas.com

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

INFORME MENSUAL No 5 - COMPONENTE TÉCNICO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE MARZO AL 29 DE MARZO DEL 2024

TOMO____DE____

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	**X**		COPIA NO CONTROLADA		

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Ronald Ricardo Lozano	Residente de Interventoría	
	Juan Carlos Delgado Correal	Residente de Interventoría	Juan Carlos Delgado Correal
APROBÓ	Edna Constanza Cepeda Sánchez	Directora de Interventoría	

ABRIL DE 2024 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 7
1.1. OBJETO DEL CONTRATO 7
2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS CONTRATOS 8
3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO: 9
3.1. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 10
3.2. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A 16
3.3 COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 17
3.4 COLEGIO VILLA RICA 19
3.5 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA 21
3.6 COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 23
3.7 COLEGIO ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ). 26
3.8 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 33
3.9 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 35
4. PROGRAMACION DE OBRA 40
AVANCE CONSOLIDADO 45
5. EMERGENCIAS 46
5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS – PORFIRIO BARBA JACOB 46
5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A 47
5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO EL PORVENIR 47
6. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO 48
6.1 SEGUIMIENTO SEDES EDUCATIVAS 48
7. SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES 49
8. SEGUIMIENTO JURIDICO 50
8.1 SEGUIMIENTO A POLIZAS CONTRACTUALES 50
8.2 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 52
9. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA: 52
9.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 52

9.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 54
9.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 55
9.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 57
9.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 58
9.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 60
9.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 61
9.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 62
9.9 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 64
9.10 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 65
9.11 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 67
9.12 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 68
9.13 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 69
9.14 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRNDA 70
9.15 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 72
9.16 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 73
9.17 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIO DE TRIANA 74
9.18 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 75
9.19 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 77
9.20 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 78
9.21 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) 79
9.22 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) 81
9.23 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) 86
9.24 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) 90
9.25 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JORGE ISAACS IED. SEDE PRINCIPAL 92
9.26 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS IED. SEDE PRINCIPAL 94
9.27 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 100
9.28 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 105
9.29 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL 107
9.30 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 110
9.31 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL 114

9.32 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL 118
9.33 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A 120
10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDDAS CORRECTIVAS 122
11. CLIMATOLOGÍA 122
12. INFORME ADMINISTRATIVO 123
12.1 ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME 123
12.2 ACTAS GENERALES GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME 123
12.3 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME 123
12.4 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE OBRA CO1-PCCNTR.5305583 de 2023 123
12.5 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1-PCCNTR.5313251 127
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO 129
14. ITEMS NO PREVISTOS 129
15. BITÁCORA 130
16. CORRESPONDENCIA 131
17. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 139
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 142

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. POLIZAS
ANEXO 2. CONTROL CLIMATOLOGICO
ANEXO 3. COPIAS ACTAS DE ENTREGA
ANEXO 4. INFORMES SEMANALES
ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 6. COPIAS ACTAS DE COMITE
ANEXO 7. BITACORA DE OBRA
ANEXO 8. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS
ANEXO 9. FORMATOS DE TRAZABILIDAD

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. CO1. PCCNTR. 5313251 de 2023, suscrito entre el CONSORCIO SANTA MARÍA 022 y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1, de acuerdo con el contrato No. CO1. PCCNTR. 5305583 de 2023.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al tercer mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 01 de marzo de 2024 hasta el 29 de marzo de 2024, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de Colegios de la SED y el Manual de Interventoría de la SED, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado. Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra, a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

LOCALIZACION DEL PROYECTO

En el presente periodo, el proyecto se desarrolla, principalmente en 14 Sedes Educativas que se describen a continuación:

COLEGIO	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	ALCANCE INICIAL
MANUEL CEPEDA	C -	CALLE 56 # 83 - 26 SUR	08 - KENNEDY	• Adecuación zonas recreativas y mantenimiento de cubierta
MANUEL CEPEDA	A - PRINCIPAL	CALLE 56 # 81 - 26 SUR	08 - KENNEDY	• Mantenimiento impermeabilización y adecuación cancha deportiva
RODRIGO DE TRIANA	C – CAMPO HERMOSO	CALLE 38 # 89 - 81 SUR	08 - KENNEDY	• Adecuación de domo cancha deportiva y adecuación ventilación
VILLA RICA	B -	CALLE 49 # 78 - 35 SUR	08 - KENNEDY	• Mejoramiento acústico auditorio. • Adecuación área recreativa primera infancia • Adecuación área administrativa con módulos de oficina abierta
FRANCISCO MIRANDA	A - PRINCIPAL	CARRERA 73 B Bis # 40 - 55 SUR	08 - KENNEDY	• Restitución de cubiertas bloque experimental y bloque administrativo. • Mejoramiento de baños semisótano bloque aulas, Puesta en funcionamiento del tanque de almacenamiento
MANUEL OLIVELLA ZAPATA	A - PRINCIPAL		08 - KENNEDY	• Adecuaciones estructurales mampostería 2 y 3 piso. • Impermeabilización parcial de cubiertas. • Adecuación barandas circulaciones
CARLOS ALBÁN HOLGUÍN	C - SAN JOSÉ	CARRERA 80 K # 85 A - 33 SUR	07 - BOSA	• Restitución de cubierta • adecuación baterías sanitarias, zonas deportivas y recreativas • acabados de aulas y carpintería metálica

JORGE ISACCS	A - PRINCIPAL	CARRERA 92 # 73 - 50 SUR CALLE 73 SUR # 91 - 35	07 - BOSA	• Doble cerramiento. • manejo de ALL y adecuación zonas exteriores
RURAL LA CONCEPCIÓN	A - PRINCIPAL		07 - BOSA	• Mejoramiento de acabados pisos, carpintería metálica, red eléctrica. • Adecuación baterías sanitarias
JOSE ANTONIO GALÁN			07 - BOSA	• Adecuación áreas recreativas y acabados como pisos y carpintería metálica. • Requiere aula modular
BOSANOVA			07 - BOSA	• Adecuación acabados pisos, carpintería metálica y pintura
SAN BERNARDINO	A - PRINCIPAL	CARRERA 89 C # 79 - 51 SUR	07 - BOSA	• Restitución de cubiertas y red eléctrica • Adecuación baterías sanitarias, zonas deportivas y carpintería metálica
MOTORISTA			07 - BOSA	• Adecuación lote cesión
DILE BOSA			07 - BOSA	• Mantenimiento bloque administrativo y adecuación de redes eléctricas
EMERGENCIAS				
FERNANDO SOTO APARICIO	B -	TRANSVERSAL 73 C BIS B N°1ª99	08 - KENNEDY	• Impermeabilización de cubierta
ESMERALDA ARBOLEDA	A	CL. 71a SUR #83-20	07 - BOSA	• Mantenimiento de bombas hidraulicas
CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	A	CL. 72 SUR #100A-71	07 - BOSA	• Cambio de la tubería de agua potable y agua residual en baterías de baños
PORFIRIO BARBA JACOB		CL. 70B SUR #81I-2	07 - BOSA	• Cambio de tubería con fugas en baños
EL PORVENIR		CL. 51 SUR #91D 56	07 - BOSA	• Cambio de tubería con fugas
LAUREL DE CERA		CL. 85 SUR #94-75	07 - BOSA	• Cambio de piso del cuarto frio

2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato CO1.PCCNTR.5305583
Contratista Consultoría y/obra UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1

Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADE FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Periodo inicial de obra	OCHO (8) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (8) MESES
Valor inicial del contrato (100%)	$6.738.166.067,00
Valor final total del contrato	$6.738.166.067,00
Fecha Inicio	30 de OCTUBRE 2023.
Fecha de Terminación del contrato:	29 de JUNIO DE 2024.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. de contrato	CO1.PCCNTR.5313251
Contratista de Interventoría	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
Objeto	"REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
Periodo etapa de obra:	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo total:	NUEVE (09) MESES
Valor inicial del contrato (100%)	$ 504.080.587,00
Valor final total del contrato	$ 504.080.587,00

3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO:

Desde el inicio del contrato, se ha realizado un reconocimiento de algunos frentes a intervenir, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Educación Distrital (SED), personal de la Interventoría CONSORCIO SANTA MARÍA 022 y personal del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1, donde se suscriben las respectivas Actas de Inicio y se realizan las Actas de Vecindad.

En esta visita se identificaron algunas sedes educativas priorizadas para intervenir dentro del alcance del presente contrato, en los cuales son fundamentalmente, obras de mantenimiento en cada uno de los frentes de obra.

En el presente periodo, se han priorizado las siguientes sedes educativas:

COLEGIO	SEDE	DIRECCIÓN	BARRIO	LOCALIDAD
MANUEL CEPEDA	C -	CALLE 56 # 83 - 26 SUR		08 - KENNEDY
MANUEL CEPEDA	A - PRINCIPAL	CALLE 56 # 81 - 26 SUR		08 - KENNEDY
RODRIGO DE TRIANA	C – CAMPO HERMOSO	CALLE 38 # 89 - 81 SUR		08 - KENNEDY
VILLA RICA	B -	CALLE 49 # 78 - 35 SUR		08 - KENNEDY
FRANCISCO MIRANDA	A - PRINCIPAL	CARRERA 73 B Bis # 40 - 55 SUR		08 - KENNEDY
MANUEL OLIVELLA ZAPATA	A - PRINCIPAL			08 - KENNEDY
CARLOS ALBÁN HOLGUÍN	C - SAN JOSÉ	CARRERA 80 K # 85 A - 33 SUR	EL JARDÍN	07 - BOSA
JORGE ISACCS	A - PRINCIPAL	CARRERA 92 # 73 - 50 SUR CALLE 73 SUR # 91 - 35	SAN BERNARDINO XXII	07 - BOSA
SAN BERNARDINO	A - PRINCIPAL	CARRERA 89 C # 79 - 51 SUR	SAN BERNARDINO	07 - BOSA

3.1. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CARRERA 83- # 46 B SUR



Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes al mejoramiento de graderías en cancha múltiple, mantenimiento de humedades en muros internos y externos del bloque de aulas, pintura general del bloque tipo alianza aulas, impermeabilización de placa con manto asfaltico zona entrada principal, mejoramiento de piso zona exterior resane y pintura, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	
	














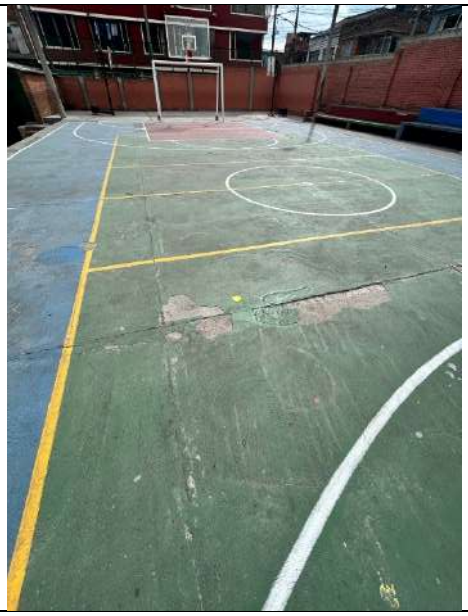



FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C











FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C

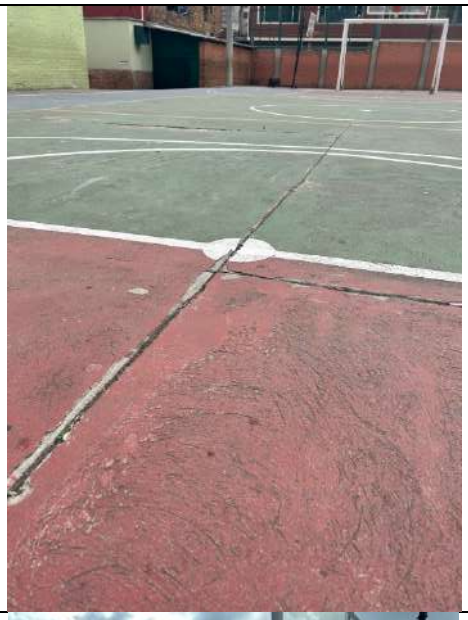






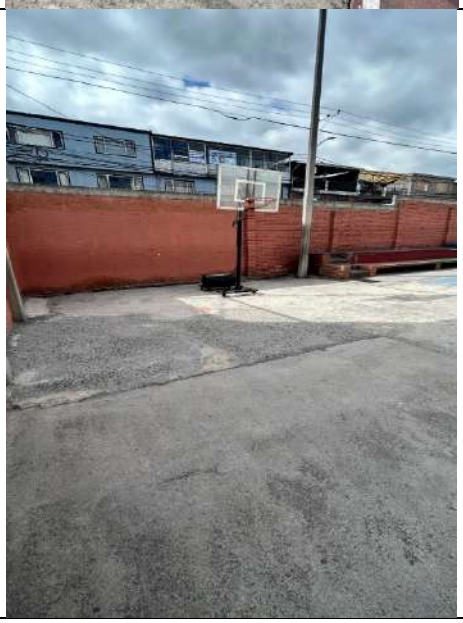

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	
	


3.2. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 56 SUR # 80H-63

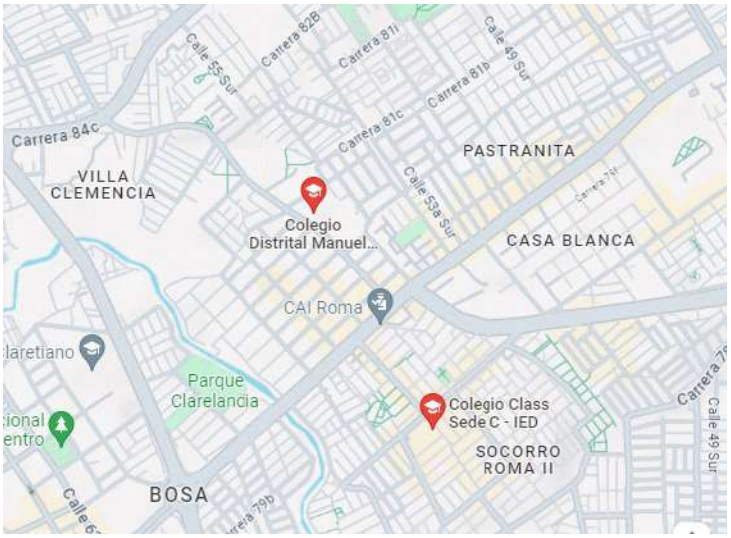

Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a impermeabilización de la cubierta de sistemas y primaria, cambio de grama sintética, mantenimiento de piso caucho zona de primaria, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A

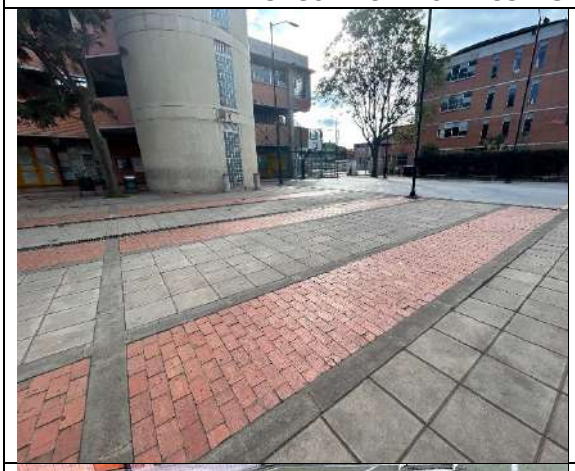







3.3 COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 38 SUR BIS # 89-81

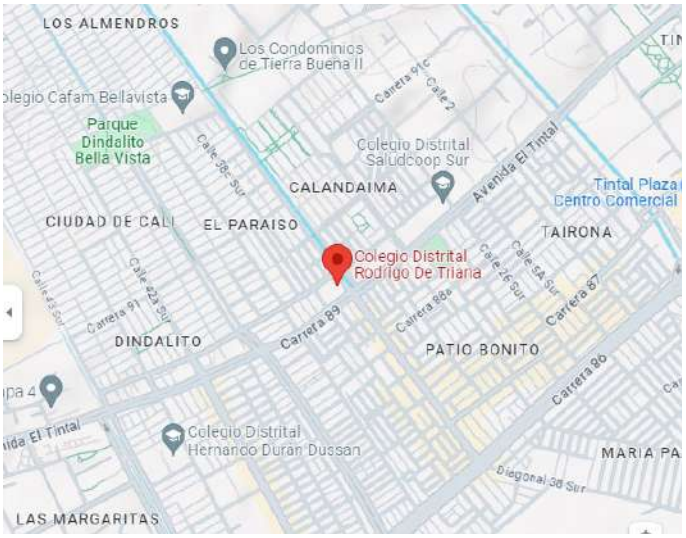

Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a cambio de ventanas de las aulas del primer y segundo nivel, dejando las rejas tipo bancaria y ventanas corredizas, instalar cubierta en patio central entre edificios e instalación de canales de aguas lluvias, instalar lamina microperforada en cerramiento occidental, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	
	






3.4 COLEGIO VILLA RICA

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 49 SUR # 78-35



Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a instalación de cielo raso en el aula del auditorio, instalar piso caucho, cubierta y mantenimiento de muros en patio de preescolar, instalación de divisiones en aluminio en zona administrativa, y construcción de shut de basuras, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO VILLA RICA














3.5 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la DIAGONAL 41 SUR #73ª-80

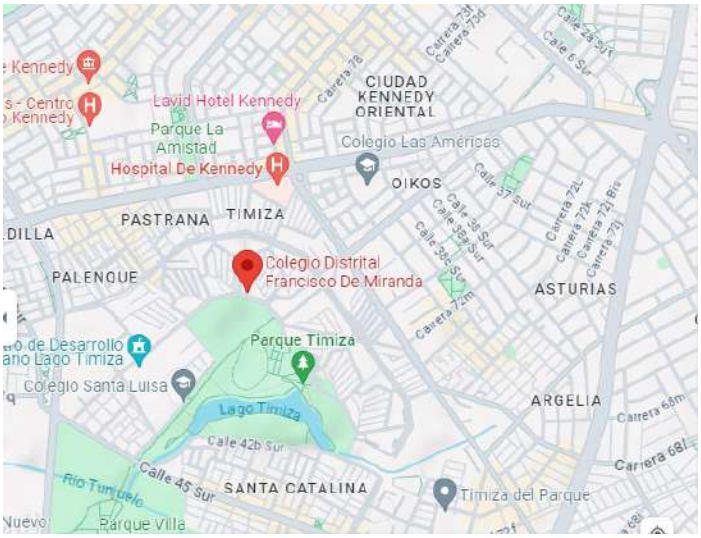


Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a cambio de cubierta y redes eléctricas en 4 aulas del tercer piso y aulas de sistemas, mantenimiento de baterías sanitaria, mantenimiento de redes de aguas luvias, cambio de cubierta plástica. se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA







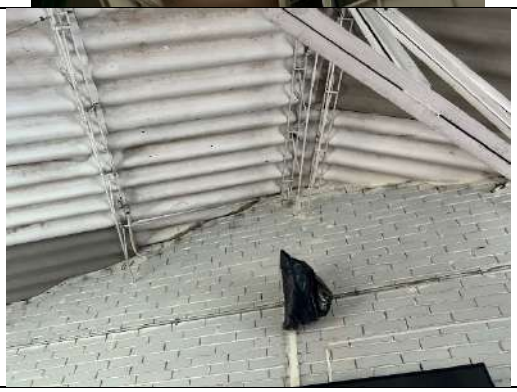










3.6 COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA


Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 1 BIS # 87-80




Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a impermeabilización de la cubierta, instalación de pasamanos en barandas del segundo y tercer piso, instalación de piso caucho, mantenimiento de humedades en muro en zona de preescolar. se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	
	

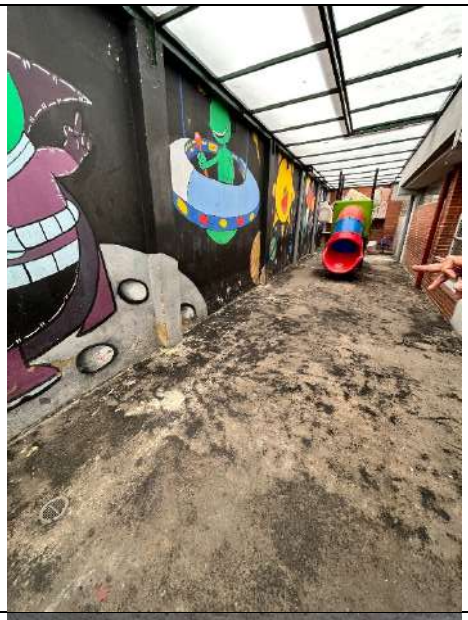

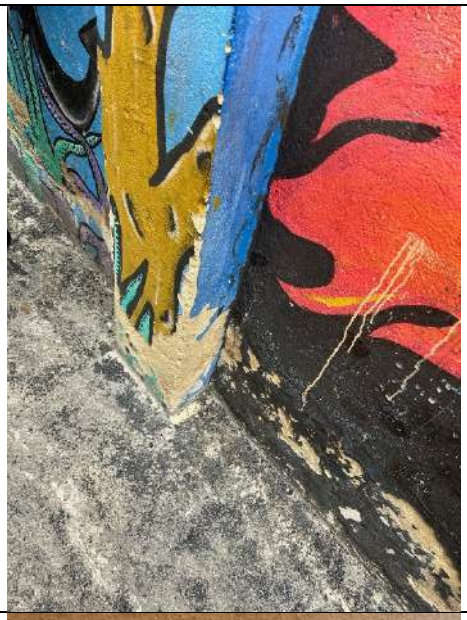



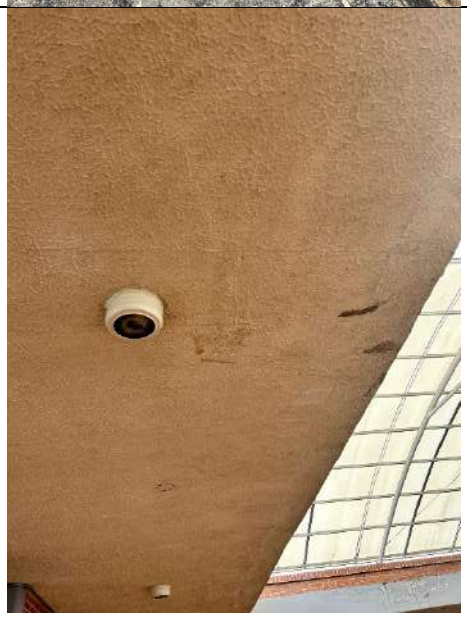

3.7 COLEGIO ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ).



Durante el recorrido conjunto (SED, IED, Interventoría y Contratista) realizado el 19 de septiembre de 2023, se identificaron y priorizaron de manera inicial, las siguientes actividades a ejecutar:

- Cambio de cubiertas.
- Cambio de puertas.
- Cambio de ventanería.
- Adecuar una zona de aseo en el baño de mujeres.
- Cambio de lavamanos en los baños.
- Demolición de muros divisorios en baños e instalación de divisiones en acero.
- Cambio de ventanería en baños de niños y niñas.
- Cambio de sanitarios en baños de niños y de niñas de básica primaria, es importante mejorar la capacidad de los baños.
- En los baños de preescolar se requiere la adecuación del baño, el cambio de mesones, el cambio de divisiones, el cambio de enchapes y el cambio de sanitarios.
- En el área de juegos se debe construir un placa o adecuar el piso, bien sea en caucho o en concreto.
- Adecuar el cerramiento en la zona posterior del colegio.
- Revisión de las canales de aguas lluvias, ya que presentan goteras y su capacidad es insuficiente.
- Demarcación de la cancha y pintura de las estructuras deportivas (arcos).
- Revisar y ajustar el sistema eléctrico para que cumpla con la normatividad vigente.

- Se requieren nuevos tomacorrientes.
- Hacer mejoramiento de la zona de bodega.
- Solucionar el tema de goteras de cubierta, en la cafetería del área de bodega.
- Cambio de las rejillas de los cárcamos.
- Adecuar un espacio para realizar actividades bajo cubierta en el patio principal.
- Adecuación de la bodega anexa al baño de preescolar.

Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
HALL INTERNO	BAÑOS
	
BAÑOS	BAÑOS

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
BAÑOS	BAÑOS
	
BAÑOS	BAÑOS
	
BAÑOS	BAÑOS

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
BAÑOS	JUEGOS INFANTILES
	
JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES
	
JUEGOS INFANTILES	PATIO POSTERIOR

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
POSTERIOR	HALL INTERIOR
	
HALL INTERIOR	VENTANERIA EN GENERAL
	
CU BIERTA EN GENERAL	ZONA DE JUEGOS

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
HALL INTERIOR	**ZONA DE JUEGOS**
	
ZONA DE JUEGOS	**ZONA DE BODEGA**
	
REJA DE ACCESO	REJA DE ACCESO

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
REJA DE ACCESO	REJA DE ACCESO
	
PATIO CENTRAL	PATIO CENTRAL

3.8 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL



Durante el recorrido conjunto (SED, IED, Interventoría y Contratista) realizado el 19 de septiembre de 2023, se identificaron y priorizaron de manera inicial, las siguientes actividades a ejecutar:


- Cambio del piso del auditorio exterior, pues la estructura de madera se encuentra deteriorada y se debe proponer un material para cambio.
- Instalación de pasamanos en las escaleras

Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL



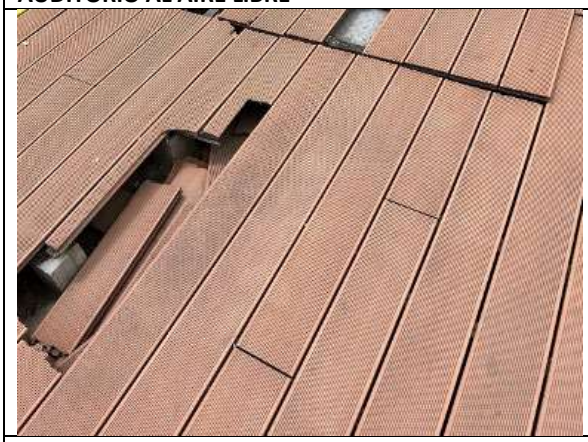

FOTOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	
	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	
	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	
	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	**ESCALERA**

	
ESCALERA	**ESCALERA**

3.9 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL



Durante el recorrido conjunto (SED, IED, Interventoría y Contratista) realizado el 19 de septiembre de 2023, se identificaron y priorizaron de manera inicial, las siguientes actividades a ejecutar:



- Cambio de las cuatro (4) cubiertas que actualmente son de asbesto cemento.
- Revisar y ajustar el sistema eléctrico para que cumpla con la normatividad vigente.
- Revisión, ajuste y cambio de luminarias al momento de cambiar las cubiertas.
- Revisión de los baños de coordinación y rectoría, ya que no cuentan con salida de aguas residuales.
- Limpieza de las canales de aguas lluvias en la cubierta




- En los baños se requiere cambio de mesones, cambio de sanitarios, cambio de pisos, cambio de puertas e instalación de orinales individuales.


Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL	
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA CON DOMO ACRÍLICO**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**

	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**VIGA CANAL PERIMETRAL**

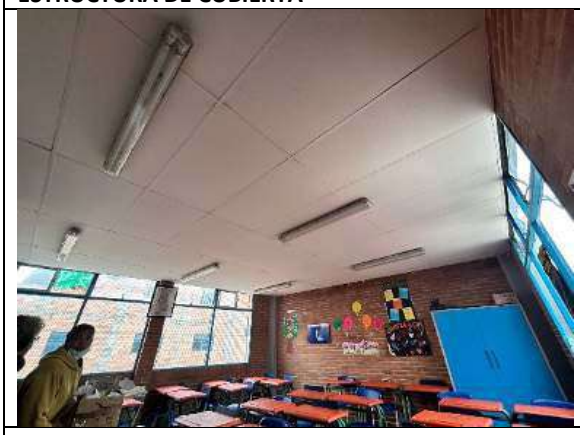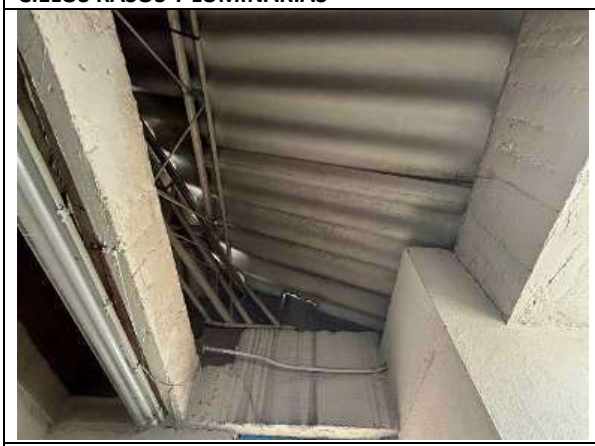	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**
	
CIELOS RASOS Y LUMINARIAS	**CIELOS RASOS Y LUMINARIAS**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**

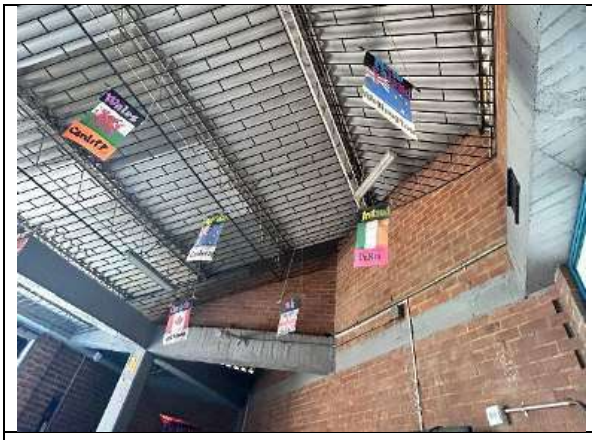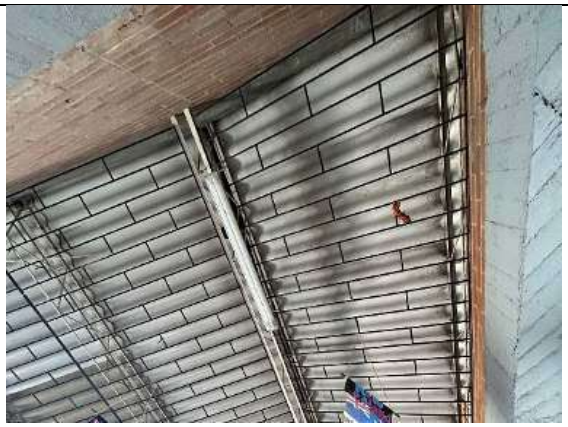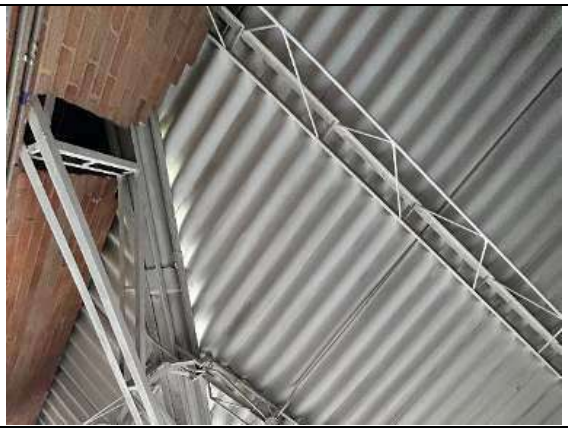	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**
	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**
	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**

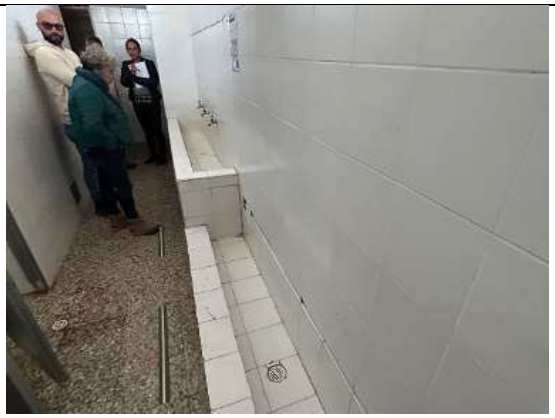	
LAVAMANOS CORRIDO	**LAVAMANOS CORRIDO**
	
BAÑOS DE NIÑOS	**BAÑOS DE NIÑOS**

4. PROGRAMACION DE OBRA

A la fecha del presente informe N°5 que abarca desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 29 de marzo del 2024, el Contratista de Obra UNION TEMPORAL GEPM 2023-1, ha realizado las obras o actividades constructivas y de mantenimiento en los distintos frentes de obra priorizados por la supervisión, a los cuales se les ha realizado el acompañamiento por parte de esta interventoría CONSORCIO SANTA MARIA 022, para ver, revisar y realizar el seguimiento correspondiente a cada una de las actividades realizadas.

Se les solicito avanzar en las obras concernientes a las obras que a la fecha estaban pendientes en las distintas sedes y realizar un constante ajuste al presupuesto y programación de cada frente de obra, ya que a medida que se avanza se evidencian actividades que no se tenían contempladas en el diagnóstico inicial y que son necesarias para el buen desarrollo del contrato.

De acuerdo a las programaciones entregada por el contratista y avaladas por la interventoría de la sede, se hace un resumen del avance de las obras ejecutadas en este periodo en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C

En este frente en particular se avanzó con la fundición de placa en graderías, emboquillado e impermeabilización en fachada principal de la institución, pintura en fachada principal, excavación manual del cuarto de rack y aula de inglés, acopio de material RCD, anclajes, mampostería, dovelas, acero de refuerzo instalación de metal deck para las graderías en cancha, instalación de geotextil y relleno de recebo con material reciclado en aula de inglés, remates de placa en graderías, el atraso de esta sede educativa se debe a que el contratista no ha terminado las obras correspondientes a las aulas de inglés y rack, por parte de la interventoría se ha realizado los respectivos requerimientos y en comité de obra se han hecho saber.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
26 de febrero al 03 de marzo de 2024	Informe Semanal 18	94.00%	92.85%
04 de marzo al 10 de marzo de 2024	Informe Semanal 19	97.00%	90.06%
11 de marzo al 17 de marzo de 2024	Informe Semanal 20	100%	92.56%
18 de marzo al 24 de marzo de 2024	Informe Semanal 21	100%	95.79%

En este frente en particular, el avance programado en la semana 22 no se observa avance por motivos de la semana santa y que el contratista no avanza en la fundición de las placas por motivo que la compactación no está acorde para fundir.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A

En este frente en particular se terminan todas las obras priorizadas y se realiza la respectiva acta de puesta en servicio

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de enero al 4 de febrero de 2024	Informe Semanal 14	100%	100%

AVANCE DE OBRA COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

En este frente en particular se avanza con remates de acabado de las ventanas, se avanza con demolición de placa de enchape y placa de contrapiso en aulas del primer nivel, se avanza con instalación de geotextil y malla electrosoldada, suministro e instalación de lámina microperforada en cerramiento perimetral exterior, pintura de baranda, afinado en 2 aulas del segundo nivel, compactación base granular aulas del primer nivel, se avanza con suministro e instalación de enchape de piso en granito en 2 aulas del segundo nivel.

AVANCE DE OBRA COLEGIO RODRIGO DE TRIANA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
26 de febrero al 03 de marzo de 2024	Informe Semanal 18	88.00%	60.19%
04 de marzo al 10 de marzo de 2024	Informe Semanal 19	45.00%	19.83%
11 de marzo al 17 de marzo de 2024	Informe Semanal 20	49.00%	20.44%
18 de marzo al 24 de marzo de 2024	Informe Semanal 21	53.00%	27.41%

En este frente en particular, el avance programado en la semana 19 respecto a la semana 18 se ve afectado debido a que se aprueba y se da inicio a las actividades adicionales relacionadas con el enchape de las 6 aulas del primer y segundo nivel, igualmente en este frente en particular el avance de ejecución se ha visto afectado debido a que el contratista no ha terminado el cerramiento en lamina microperforada, reja de las ventanas, placa de contrapiso de las aulas del primer nivel, lo que afecta la programación, por parte de la interventoría se ha realizado los respectivos requerimientos y en comité de obra se han hecho saber dicha situación.

AVANCE DE OBRA COLEGIO VILLA RICA

En este frente en particular se avanza con remates en la instalación de puertas y ventanas en oficina administrativa, se avanza con masilla y pintura de shut de basuras, se avanza en el desmonte de la estructura en patio de preescolar para realizar corrección respecto a su pendiente, se avanza con enchape shut de basuras, , la programación de este frente de obra se ha visto afectada debido a que le contratista no ha ingresado personal de obra y material de obra, para abarcar e intervenir las obras de la estructura de cubierta, piso caucho en patio de preescolar y terminar el shut de basuras.

AVANCE DE OBRA COLEGIO VILLA RICA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
26 de febrero al 03 de marzo de 2024	Informe Semanal 18	90.00%	81.20%

04 de marzo al 10 de marzo de 2024	Informe Semanal 19	96.00%	80.98%
11 de marzo al 17 de marzo de 2024	Informe Semanal 20	100%	88.19%
18 de marzo al 24 de marzo de 2024	Informe Semanal 21	100%	88.66%

En este frente en particular, el avance ejecutado en la semana 19 respecto a la semana 18 se ve afectado debido a que se realiza una actualización del presupuesto de este frente de obra.

AVANCE DE OBRA COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA

En este frente en particular el contratista avanza en remates de la batería sanitaria, avanza con la excavación para redes de aguas lluvias, avanza en la construcción de cajas de inspección y trampa de grasas, avanza en la instalación de la cubierta de patios internos, avanza en la excavación tanque aquacell, avanza en el desmonte de la cubierta y estructura de cubierta en sala de sistemas, la programación de este frente de obra se ha visto afectada por la no intervención del aula de sistemas, suministro e instalación de la cubierta traslucida para patios internos, terminación de batería sanitaria y obras de redes de aguas lluvias.

AVANCE DE OBRA COLEGIO RANCISCO DE MIRANDA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
26 de febrero al 03 de marzo de 2024	Informe Semanal 18	93.00%	63.56%
04 de marzo al 10 de marzo de 2024	Informe Semanal 19	98.00%	72.14%
11 de marzo al 17 de marzo de 2024	Informe Semanal 20	100%	86.25%
18 de marzo al 24 de marzo de 2024	Informe Semanal 21	100%	91.97%

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA

En este frente en particular se avanzó con el pasamanos en segundo y tercer piso, con observaciones de acabado, se avanza con la instalación de la lamina microperforada en piso 2, y realiza corrección del piso caucho, quedando pendientes instalación de lamina microperforada en el tercer nivel.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
26 de febrero al 03 de marzo de 2024	Informe Semanal 18	89.00%	94.84%

04 de marzo al 10 de marzo de 2024	Informe Semanal 19	96.00%	92.51%
11 de marzo al 17 de marzo de 2024	Informe Semanal 20	99.00%	94.71%
18 de marzo al 24 de marzo de 2024	Informe Semanal 21	100%	96.05%

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del Colegio **Carlos Albán Holguín. Sede C (San José**), las obras iniciaron el día 30 de octubre de 2023 y finalizan el 31 de mayo de 2024. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ)			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
26 de febrero al 03 de marzo de 2024	Informe Semanal 18	62.30 %	46.33 %
04 de marzo al 10 de marzo de 2024	Informe Semanal 19	67.16 %	46.68 %
11 de marzo al 17 de marzo de 2024	Informe Semanal 20	72.95 %	47.00 %
18 de marzo al 24 de marzo de 2024	Informe Semanal 21	73.85 %	47.77 %

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del Colegio **Jorge Isaacs. Sede Principal,** las obras iniciaron el día 4 de noviembre de 2023 y finalizaban el 06 de enero de 2024. Sin embargo, las obras inicialmente contratadas culminaron el 09 de marzo de 2024, y queda pendiente la aprobación de los NP del piso de la tarima, para terminar las actividades en este colegio. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
26 de febrero al 03 de marzo de 2024	Informe Semanal 18	100%	99.97 %
04 de marzo al 10 de marzo de 2024	Informe Semanal 19	100%	100%

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del **Colegio San Bernardino. Sede Principal,** las obras iniciaron el día 07 de noviembre de 2023 y finalizaban el 01 de marzo de 2024. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
26 de febrero al 03 de marzo de 2024	Informe Semanal 18	100%	85.00%
04 de marzo al 10 de marzo de 2024	Informe Semanal 19	100%	86.00%
11 de marzo al 17 de marzo de 2024	Informe Semanal 20	100%	86.25%
18 de marzo al 24 de marzo de 2024	Informe Semanal 21	100%	86.50%

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del **Colegio Rural La Concepción. Sede A**, las obras iniciaban el día 18 de marzo de 2024, pero por temas de ajuste logístico, iniciaron el 22 de marzo de 2024 y finalizan el 29 de junio de 2024.

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del **Colegio JOSÉ ANTONIO GALÁN. Sede A**, las obras iniciaban el día 22 de marzo de 2024, pero por temas de disponibilidad de los espacios por parte de la IED, comenzarán el 02 de abril de 2024 y finalizan el 28 de junio de 2024.

AVANCE CONSOLIDADO

A continuación, se presentan los porcentajes del avance general del contrato y el avance consolidado por todas las instituciones que se encuentran en ejecución.

AVANCE DE OBRA CONSOLIDADO			
	% PROGRAMADO	**% EJECUTADO**	**DIFERENCIA**
Avance general del contrato	59.52 %	48.44 %	-11.09 %
INSTITUCIONES EDUCATIVAS			
Colegio Manuel Cepeda Sede C	100.00 %	96.79 %	-4.21 %
Colegio Manuel Cepeda Sede A	100.00 %	100.00 %	0.00 %
Colegio Rodrigo de Triana	53.00 %	27.41 %	-25.59 %
Colegio Villa Rica	100.00 %	88.60 %	-11.40 %
Colegio Francisco Miranda	100.00 %	91.97 %	-8.03 %
Colegio Manuel Zapata Olivella	100.00 %	96.05 %	-3.95 %
Colegio Carlos Alban Holguín	73.85 %	47.77 %	-26.08 %
Colegio Jorge Isaacs	100.00 %	100.00 %	0.00 %
Colegio San Bernardino	100.00 %	86.50 %	-13.50 %

5. EMERGENCIAS

5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS – PORFIRIO BARBA JACOB

SEMANA 21

	
ADECUACION FILTRACIONES	**ADECUACION FILTRACIONES**
	
ADECUACION FILTRACIONES	**ADECUACION FILTRACIONES**

5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A
SEMANA 21

	
DESMONTE DE BATERIAS SANITARIAS	**INSPECCION DE CAJAS DE PASO**
	
INSPECCION DE BOMBAS DE SUMINISTRO	**INSPECCION DE CAJAS DE PASO**

5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO EL PORVENIR
SEMANA 21

	
REPARACION TUBERIA DE AGUA POTABLE	**LAMINA DE AGUA POR FUGA DE AGUA EXISTENTE**
	
LAMINA DE AGUA POR FUGA DE AGUA EXISTENTE	**LAMINA DE AGUA POR FUGA DE AGUA EXISTENTE**

6. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe, el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5305583 se ha venido desarrollando en concordancia con los términos legales establecidos contractualmente, presentado avance en el inicio de las actividades en las instituciones educativas establecidas, igualmente se han solicitados la actualización de algunas programaciones, así como de los presupuestos por parte de esta interventoría para poder llevar un adecuado control del contrato.

6.1 SEGUIMIENTO SEDES EDUCATIVAS

6.1.1 COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ): Para el periodo del presente informe, el contratista de obra continúa la instalación de ventanas en las aulas del Bloque B. Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1 y 2 del Bloque C. Avanza la instalación de la lámina inferior de la teja sándwich en la cubierta del aula 4 del Bloque C. Inicia el estuco de muros de las aulas del Bloque B. Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas del Bloque B. Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1, 2 y 4 del Bloque C. Continúa el estuco de muros de las

aulas del Bloque B. Inicia el estuco de muros de las aulas del Bloque C. Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas del Bloque B. Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1, 2 y 4 del Bloque C. Continúa el estuco de muros de las aulas de los Bloque B y C. Inicia la pintura de muros de las aulas de los Bloque B y C.

6.1.2 COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL: En este frente de obra se realizan retoques finales al pasamanos de la escalera No.3 y se da por recibida dicha actividad. Queda pendiente la aprobación de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima. No se desarrollan actividades de obra durante las dos últimas semanas de mes.

6.1.3 COLEGIO SAN BERNARDINO: En este frente de obra continúa el desmonte del manto asfáltico y la demolición del mortero de nivelación en las cubiertas planas de la sede educativa. Finaliza la instalación de luminarias de emergencia en el tercer piso. Se realiza reparación del cielo raso en el baño de hombres del segundo piso. Inicia la instalación de luminarias en el costado sur del tercer piso. Inicia la demolición del muro a la entrada del baño del tercer piso. Finaliza la instalación de luminarias en el costado sur del tercer piso. Finaliza la demolición del muro a la entrada del baño del tercer piso.

6.1.4 COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A: En este frente iniciaron las actividades de obra con el cerramiento del área de la biblioteca, el cuarto de refrigerios, la bodega, el cuarto de vigilantes y el cuarto de aseo. Posteriormente, se procedió a la demolición de los muros en fibrocemento de los anteriores cuartos, al desmonte del cielo raso y las luminarias de esta zona y a la demolición de la poceta lavatraperos. Inicia la regata de muros y pisos para las redes hidráulicas y sanitarias de las nuevas ubicaciones de los usos existentes en esta área de la sede educativa.

6.1.5 COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN. SEDE A: Se hicieron visitas preliminares para determinar la ruta operativa de la intervención. Se definió que primero se interviene el segundo piso a la izquierda de la escalera, después el ala frontal del segundo piso y por último el área administrativa, el piso del patio y la fachada principal. A solicitud de la rectoría del Colegio, las obras deberán iniciar el 2 de abril de 2024, teniendo en cuenta que no se había logrado desocupar las áreas de intervención por parte de la Institución Educativa.

6.1.6 COLEGIO EL MOTORISTA. SEDE A: Aunque las actividades de este frente de obra fueron priorizadas desde el 19 de septiembre de 2023, solo fue hasta el 14 de febrero de 2024 que se pudo efectuar en el sitio de obra la primera reunión conjunta (IED, SED, Interventoría y Contratista). Después de esta reunión, el 24 de febrero de 2024 se realizó un levantamiento topográfico del área a intervenir. Posteriormente se presentó una propuesta de intervención consistente en una placa de contrapiso en concreto al nivel del piso existente, con cerramiento tipo C y una rampa para garantizar la accesibilidad para PMR a este nuevo espacio.
Esta propuesta debe ser presentada a la Alcaldía Local de Bosa para poder iniciar las actividades en este frente de obra

7. SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES

A la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones en tiempo ni en valor al contrato de obra, ya que este se este se está realizando en las mismas condiciones a las iniciales, razón por la cual este contrato continúa establecido en los mismos términos iniciales, en cuanto a tiempo y valor contractual.

8. SEGUIMIENTO JURIDICO

8.1 SEGUIMIENTO A POLIZAS CONTRACTUALES

Se revisa el estado actual de las pólizas de los contratos de obra e interventoría, y se evidencia que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidas de manera contractual a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto: **ANEXO 1**

CONTRATO DE OBRA:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

a) POLIZAS CONTRACTUALES

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 21-44-101425116	Cumplimiento	$ 1.347.633.213,40	13/09/2023	13/01/2025
	Pago de salarios y Prestaciones Sociales	$ 673.816.606,70	13/09/2023	13/01/2027
	Estabilidad y Calidad de la obra	$ 1.347.633.213,40	Dos (2) años	
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101218837		$580.000.000,00	13/09/2023	13/05/2024
TODO RIESGO NB-100000567		$ 6.738.166.067,00	26/09/2023	27/10/2024

Imagen de Aprobación de pólizas en SECOP II

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12696963	Cumplimiento - Otros	Contrato de seguro	6.738.166.067 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SAS	27/10/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
CO1.WRT.12674336	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.369.083.033,5 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	13/05/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
CO1.WRT.12674332	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	580.000.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	13/05/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

b) POLIZAS CONTRACTUALES

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 21-44-101425116	Cumplimiento	$ 1.347.633.213,40	30/10/2023	01/03/2025
	Pago de salarios y Prestaciones Sociales	$ 673.816.606,70	30/10/2023	29/06/2027
	Estabilidad y Calidad de la obra	$ 1.347.633.213,40	Dos (2) años	
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101218837		$580.000.000,00	13/09/2023	13/05/2024
TODO RIESGO NB-100000567		$ 6.738.166.067,00	13/09/2023	27/10/2024


CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

a) POLIZAS CONTRACTUALES

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 155374	Cumplimiento	$100.816.117,4	29/09/2023	28/02/2025
	Salarios y Prestaciones Sociales	$50.408.058,7	29/09/2023	29/06/2027
	Calidad de servicio	$100.816.117,4	29/06/2024	29/06/2026

Imagen de Aprobación de pólizas en SECOP II



b) POLIZAS CONTRACTUALES

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 155374	Cumplimiento	$100.816.117,4	30/10/2023	30/03/2025
	Salarios y Prestaciones Sociales	$50.408.058,7	30/10/2023	30/07/2027
	Calidad de servicio	$100.816.117,4	30/07/2024	30/07/2026

CO1.WRT.12990757	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	252.040.293,50 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	30/07/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle

8.2 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta que se han presentado atrasos constantes en los frentes que se encuentran en ejecución, la interventoría realiza la entrega del informe del presunto incumplimiento mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-125 del 26 de febrero de 2024, mediante el cual se informa las obligaciones incumplidas por parte del contratista y las actividades que de acuerdo a la programación aprobada y vigente se encuentran con atrasos.

Del mismo modo la interventoría mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-190 del 08 de marzo de 2024, remite el informe de presunto incumplimiento actualizado con los atrasos presentados, al cual se solicito dar respuesta con las aclaraciones de los atrasos en un plazo no mayor a tres (03) días, sin embargo, no se entregó en el plazo solicitado, por ello, se remite el informe de presunto incumplimiento a la entidad contratante mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-195 del 12 de marzo de 2024 con radicado E-2024-51549, para que si la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO lo considera pertinente, inicie el proceso establecido en los términos contractuales según la cláusula del contrato de la referencia

9. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA:


9.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
SEMANA 18

	
CONSTRUCCION Y FUNDICION DE ESCALERA EN GRADERIAS	**FUNDICION DE PLACA GRADERIA**

	
FUNDICION DE PLACA GRADERIA	**ARMADO ACERO DEE REFUERZO DE PLACA GRADERIA**
	
PINTURA DE FACHADA	**PINTURA DE FACHADA**

9.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

SEMANA 18

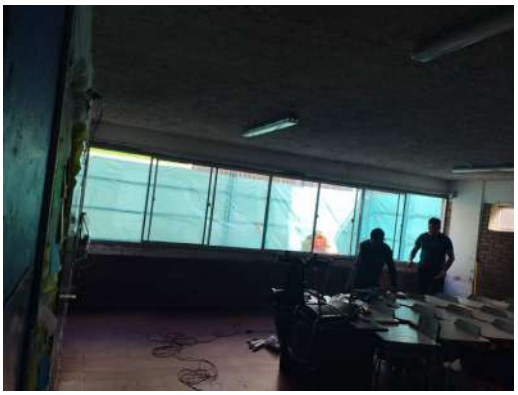	
EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES EN LA VENTANERIA	**EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES EN LA VENTANERIA**
	
EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES EN LA VENTANERIA	**EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES EN LA VENTANERIA**

	
EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES EN LA VENTANERIA	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**

9.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA

SEMANA 18

	
AVANCE DE OBRA REDES ELECTRICAS SHUT DE BASURAS	**AVANCE DE OBRA SUMINISTRO PISO CAUCHO EPDM PATIO DE PREESCOLAR**

	
AVANCE DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD SHUT DE BASURAS	**AVANCE DE OBRA REDES ELECTRICAS SHUT DE BASURAS**
	
AVANCE DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD SHUT DE BASURAS	**SIN AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR**

9.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA

SEMANA 18

	
SIN AVANCE DE OBRA EN REDES DE AGUAS LLUVIAS	**BATERIA SANITARIA SIN REMATAR**
	
AVANCE BATERIA SANITARIA	**DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE**

	
EXCAVACION MANUAL REDES AGUAS LLUVIAS	**REMATES PENDIENTES SIN REMATAR**

9.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA

SEMANA 18

	
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**

	
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**
	
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**

9.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C SEMANA 19

	
CONSTRUCCION Y FUNDICION DE ESCALERA EN GRADERIAS	**IMPERMEABILIZACION MUROS AULA DE RACK**
	
PINTURA DE FACHADA	**PINTURA DE FACHADA**
	

PINTURA DE FACHADA	**PINTURA DE FACHADA**

9.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEMANA 19

	
DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONTRAPISO	**DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONTRAPISO**
	
REMATES DE ACABADO DE LAS VENTANAS	**SIN AVANCE EN LA LAMINA MICROPERFORADA**

	
REMATES DE ACABADO DE LAS VENTANAS	**DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONTRAPISO**

9.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA SEMANA 19

	
PINTURA DE MUROS EN PATIO DE PREESCOLAR	**PINTURA DE MUROS EN PATIO DE PREESCOLAR**


	
SIN AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	**AVANCE DE OBRA POCETA SHUT DE BASURAS**
	
AVANCE DE OBRA MASILLA Y PINTURA SHUT DE BASURAS	**AVANCE DE OBRA MASILLA Y PINTURA SHUT DE BASURAS**

9.9 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
SEMANA 19

	
REMATES BATERIA SANITARIA	**CUBIERTA PATIOS INTERNOS**
	
CUBIERTA PATIOS INTERNOS	**REMATES BATERIA SANITARIA**

	
REMATES BATERIA SANITARIA	**REMATES BATERIA SANITARIA**

9.10 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA SEMANA 19

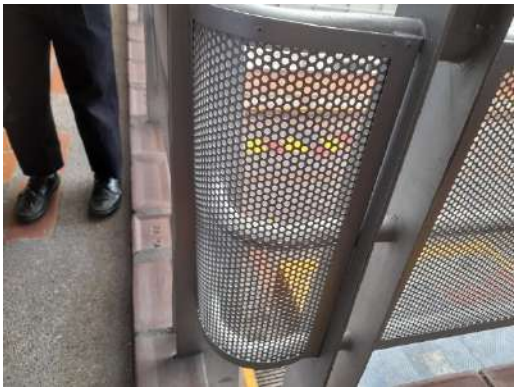	
REMATES PISO CAUCHO	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**

	
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**
	
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**

9.11 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
SEMANA 20

	
REMATES EN GRADERIAS	**REMATES EN GRADERIAS**
	
PINTURA DE FACHADA	**PINTURA DE FACHADA**

	
PINTURA DE FACHADA	**PINTURA DE FACHADA**

9.12 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEMANA 20

	
CINTA AJUSTE VENTANAS	**CINTA AJUSTE VENTANAS**
	

DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA AULAS PRIMER PISO	DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA AULAS PRIMER PISO
	
DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA AULAS PRIMER PISO	DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA AULAS PRIMER PISO

9.13 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA

SEMANA 20

	
AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	REMATES PENDIENTES EN ZONA ADMINISTRATIVA

	
AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	**AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR**
	
NO SE AVANZA EN OBRA SHUT DE BASURAS	**NO SE AVANZA EN OBRA SHUT DE BASURAS**

9.14 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRNDA
SEMANA 20

SIN AVANCE DE OBRA EN AULA DE SISTEMAS	**SIN AVANCE DE OBRA EN AULA DE SISTEMAS**
	
REMATES PENDIENTES BATERIA SANITARIA	**EXCAVACION TANQUE AQUACELL**
	
EXCAVACION TANQUE AQUACELL	**REMATES PENDIENTES BATERIA SANITARIA**

9.15 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
SEMANA 20

	
RETIRO DE ESCOMBROS	**RETIRO DE ESCOMBROS**
	
RETIRO DE ESCOMBROS	**RETIRO DE ESCOMBROS**
	

PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**

9.16 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C SEMANA 21

	
SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL SALA RACK	**PINTURA DE FACHADA**
	
REMATES GRADERIAS	**SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR**

	
ANTEPECHO ESCALERA	**TOMA DENSIDADES BASE GRANULAR**

9.17 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIO DE TRIANA
SEMANA 21

	
REMATES DE CALIDAD VENTANAS	**DEMOLICION DE ENCHAPE SEGUNDO NIVEL**
	

DEMOLICION DE ENCHAPE SEGUNDO NIVEL	GEOTEXTIL Y MALLA ELECTROSOLDADA AULAS SEGUNDO NIVEL
	
PINTURA CERRAMIENTO EXTERIOR	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA

9.18 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA
SEMANA 21

	
AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR

	
AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	**AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR**
	
ENCHAPE SHUT DE BASURAS	**ENCHAPE SHUT DE BASURAS**

9.19 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
SEMANA 21

	
DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS	**DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS**
	
DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS	**SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA AULA DE SISTEMAS**

	
DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS	**DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS**

9.20 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
SEMANA 21


	
PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA	**PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA**
	

PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA	PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA
	
PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA	PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA

9.21 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) SEMANA 18

	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**
	
RESANE DE ALFAJÍAS Y CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	**RESANE DE ALFAJÍAS Y CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B**
	
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 1 DEL BLOQUE C	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C**

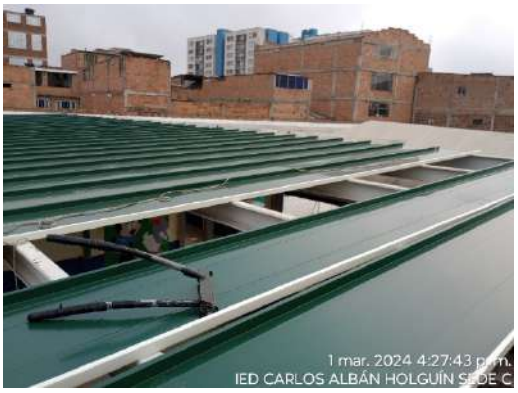	
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C**
	
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C**

ACTIVIDADES:

- Continúa la instalación de ventanas en las aulas del Bloque B
- Avanza la instalación de la lámina inferior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1 y 2 del Bloque C
- Continúa la instalación de la estructura de cubierta sobre el aula 4 del Bloque C

9.22 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ)
SEMANA 19

	
SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	**SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**
	
SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	**SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**
	
SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	**SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**

	
SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	**SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**
	
OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	**OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B**
	
OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	**OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B**

	
OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	**OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B**
	
OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	**OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B**
	
OBSERVACIONES A LOS CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	**OBSERVACIONES A LOS CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B**

	
OBSERVACIONES A LOS CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	**OBSERVACIONES A LOS CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B**
	
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 4 DEL BLOQUE C	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 4 DEL BLOQUE C**
	
INICIA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	**INICIA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**

ACTIVIDADES:

- Continúa la instalación de ventanas en las aulas del Bloque B.
- Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta del aula 1 y del

aula 2 del Bloque C.

- Avanza la instalación de la lámina inferior de la teja sándwich en la cubierta del aula 4 del Bloque C.
- Inicia el estuco de muros de las aulas del Bloque B.

9.23 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ)

	
AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	
	
AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	**AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**

	
AVANZA EL RESANE DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE C	
	
AVANZA EL RESANE DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE C	
	
INICIA EL RESANE DE FILOS EN LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	**INICIA EL RESANE DE FILOS EN LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B**

	
INICIA EL RESANE DE FILOS EN LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	
	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	
	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**

	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	
	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	
	
RETIRO DE RCD DEL SITIO DE OBRA	**RETIRO DE RCD DEL SITIO DE OBRA**

	
RETIRO DE RCD DEL SITIO DE OBRA	**ACOPIO DE MATERIAL DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO**

ACTIVIDADES:

- Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas del Bloque B.
- Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1, 2 y 4 del Bloque C.
- Continúa el estuco de muros de las aulas del Bloque B.
- Inicia el estuco de muros de las aulas del Bloque C.

9.24 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ)
SEMANA 21

	
AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE B Y C	**AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE B Y C**


	
AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE B Y C	**AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE B Y C**
	
INICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B Y C	**INICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B Y C**
	
INICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B Y C	**INICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B Y C**

	
INICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B Y C	**LLEGAN MÁS CARPINTERÍA DE ALUMINIO PARA LAS VENTANAS LOS BLOQUES B Y C**

ACTIVIDADES:

- Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas del Bloque B.
- Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1, 2 y 4 del Bloque C.
- Continúa el estuco de muros de las aulas de los Bloques B y C.
- Inicia la pintura de muros de las aulas de los Bloques B y C.
- Llega al sitio de obra carpintería de aluminio para las ventanas del los Bloques B y C.

9.25 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JORGE ISAACS IED. SEDE PRINCIPAL
SEMANA 18

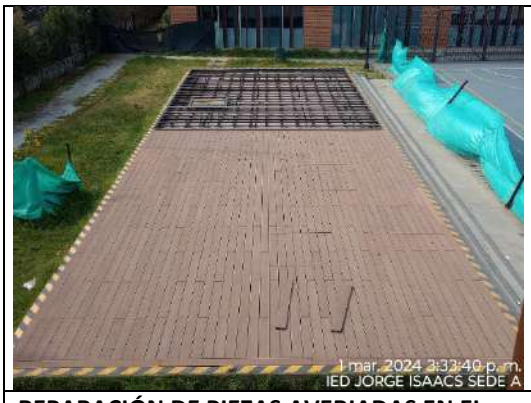	
REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	**REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA**

	
REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA	**REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA**
	
RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 1, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA	**RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 1, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA**
	
RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 2, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA	**RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 2, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA**

	
RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 4, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA	**RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 4, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA**

ACTIVIDADES:



- Se retiran los RCD ubicados al lado de la tarima
- Se realizan retoques finales a los pasamanos de las cuatro (4) escaleras

9.26 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS IED. SEDE PRINCIPAL


SEMANA 19

	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1**

	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1**
	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1**
	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1**

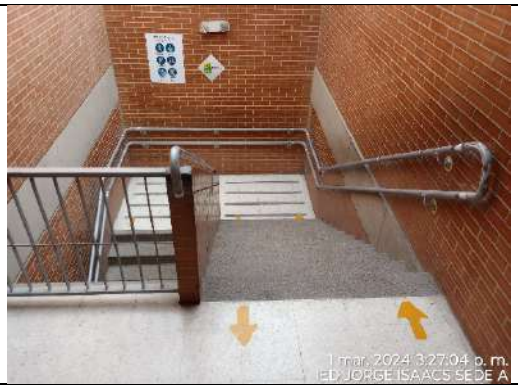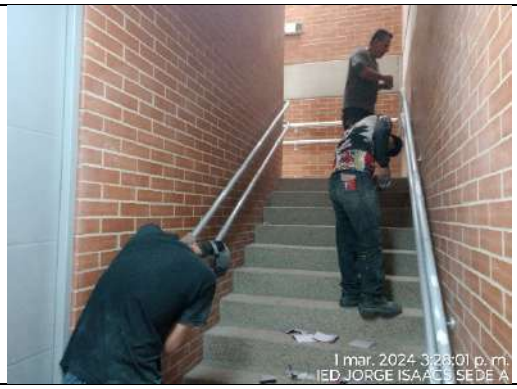	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1**
	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2**
	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2**

	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2**
	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2**
	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3**

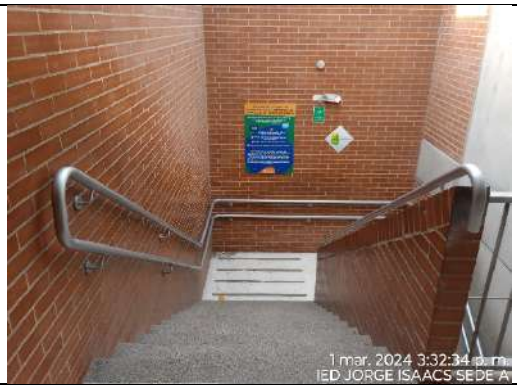	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3**
	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3**
	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4**

	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4**
	
RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4	**RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4**
	
PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA	**PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA**


ACTIVIDADES:

- Se realizan resanes al pasamanos de la escalera No. 1.
- Se realizan resanes al pasamanos de la escalera No. 2.

- Se realizan retoques finales al pasamanos de la escalera No.3 y se da por recibida dicha actividad.
- Se realizan resanes al pasamanos de la escalera No. 4.
- Queda pendiente la aprobación de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima.


9.27 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL
SEMANA 20

	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1**
	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1**

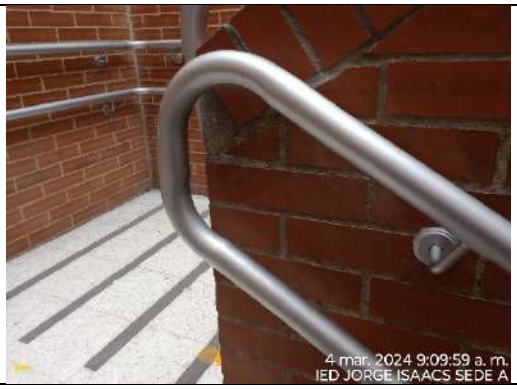	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1**
	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1**
	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2**

	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2**
	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2**
	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2**

	
PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA	**PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA**
	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3	**PENDIENTES ALGUNOS RESANES EN EL ACABADO FINAL DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3**
	
PENDIENTES ALGUNOS RESANES EN EL ACABADO FINAL DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3**

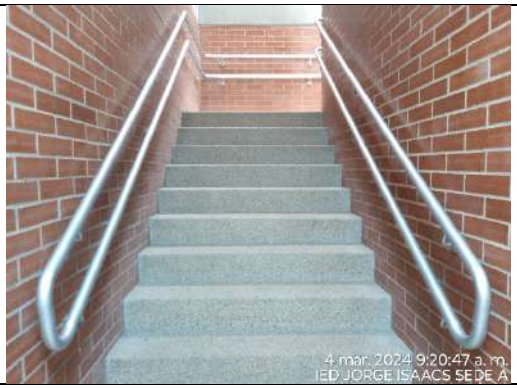	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3**
	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4**
	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4**

	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4**
	
PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4	**PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4**

ACTIVIDADES:

- Se realizan retoques finales a los pasamanos.
- Queda pendiente la aprobación de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima.

9.28 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL
SEMANA 21

	
PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA	**PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA**
	
PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA	**PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA**
	
CERRAMIENTO CON POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO POR LOS ESTUDIANTES	**CERRAMIENTO CON POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO POR LOS ESTUDIANTES**

	
CERRAMIENTO CON POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO POR LOS ESTUDIANTES	**CERRAMIENTO CON POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO POR LOS ESTUDIANTES**

ACTIVIDADES:

- Queda pendiente la aprobación de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima.

9.29 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL SEMANA 18

	
RECORRIDO CONJUNTO CON RECTORÍA Y SUPERVISIÓN PARA DETERMINAR MÁS ALCANCE	**CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO**

	
CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO	**CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO**
	
CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO	**CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO**
	
DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN	**DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN**

	
DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA	**DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA**
	
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DEL COSTADO ORIENTAL	**INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DEL COSTADO ORIENTAL**
	
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DEL COSTADO NORTE	**INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DEL COSTADO NORTE**

ACTIVIDADES:

- Avanza la instalación de red eléctrica para las luminarias de emergencia en el tercer piso
- Avanza la instalación de luminarias de emergencia en el tercer piso

- Continúa la instalación de los mesones en policuarzo en los baños del segundo y del tercer piso
- Inicia el desmonte del manto asfáltico y la demolición del mortero de nivelación en las cubiertas planas de la sede educativa

9.30 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL
SEMANA 19

	
DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA	**DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA**
	
DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN	**DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN**
	

RETIRO DEL MORTERO DE NIVELACIÓN DESDE LA CUBIERTA PLANA	**RETIRO DEL MORTERO DE NIVELACIÓN DESDE LA CUBIERTA PLANA**
	
RETIRO DEL MORTERO DE NIVELACIÓN DESDE LA CUBIERTA PLANA DE LA ESCALERA	**RETIRO DEL MORTERO DE NIVELACIÓN DESDE LA CUBIERTA PLANA DE LA ESCALERA**
	
LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO	**LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO**
	
LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO	**LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO**

	
LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO	**LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO**
	
LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO	**LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO**
	
LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO	**LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO**

	
LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO	**LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO**
	
LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO	**LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO**
	
LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO	**LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO**

ACTIVIDADES:

- Continúa el desmonte del manto asfáltico en las cubiertas planas de la sede educativa.
- Continúa la demolición del mortero de nivelación en cubiertas planas de la sede educativa.

- Finaliza la instalación de luminarias de emergencia en el tercer piso

9.31 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL

SEMANA 20

	
RETIRO DE RCD ACOPIADO EN EL PATIO CENTRAL	**RETIRO DE RCD ACOPIADO EN EL PATIO CENTRAL**
	
RETIRO DE RCD ACOPIADO EN EL PATIO CENTRAL	**RETIRO DE RCD ACOPIADO EN EL PATIO CENTRAL**
	
CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO	**CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO**

	
CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO	**CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO**
	
TABLERO ELÉCTRICO DEL AUDITORIO	**CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO**
	
CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO	**CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO**

	
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR	**INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR**
	
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR	**INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR**
	
SANITARIOS PENDIENTES DE INSTALAR EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO	**SANITARIOS PENDIENTES DE INSTALAR EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO**

	
DIVISIONES EN ACERO EN PROCESO DE REPARACIÓN EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO	**DIVISIONES EN ACERO EN PROCESO DE REPARACIÓN EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO**
	
DEMOLICIÓN DE MURO A LA ENTRADA DE LOS BAÑOS DEL TERCER PISO	**REPARACIÓN DE CIELO RASO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO**
	
REPARACIÓN DE CIELO RASO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO	**REPARACIÓN DE CIELO RASO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO**

ACTIVIDADES:

- Se retiran los RCD acopiados en el patio central de la Sede Educativa.

- Se realiza reparación del cielo raso en el baño de hombres del segundo piso.
- Inicia la instalación de luminarias en el costado sur del tercer piso.
- Inicia la demolición del muro a la entrada del baño del tercer piso.

9.32 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL
SEMANA 21

	
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR	**INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR**
	
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR	**INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR**

	
INUNDACIÓN EN EL TERCER PISO POR CAUSA DEL RETIRO DEL MANTO ASFÁLTICO Y LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO	**INUNDACIÓN EN EL TERCER PISO POR CAUSA DEL RETIRO DEL MANTO ASFÁLTICO Y LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO**
	
INUNDACIÓN EN EL TERCER PISO POR CAUSA DEL RETIRO DEL MANTO ASFÁLTICO Y LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO	**INUNDACIÓN EN EL TERCER PISO POR CAUSA DEL RETIRO DEL MANTO ASFÁLTICO Y LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO**
	
DEMOLICIÓN DE MURO A LA ENTRADA DE LOS BAÑOS DEL TERCER PISO	**DEMOLICIÓN DE MURO A LA ENTRADA DE LOS BAÑOS DEL TERCER PISO**

	
FILOS ENCIMA DE ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO	**FILOS EN EL POYO DEBAJO DEL LAVAMANOS DEL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO**
	
FILOS EN EL POYO DEBAJO DEL LAVAMANOS DEL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO	**FILOS ENCIMA DE ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO**

ACTIVIDADES:

- Finaliza la instalación de luminarias en el costado sur del tercer piso.
- Finaliza la demolición del muro a la entrada del baño del tercer piso.

9.33 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A SEMANA 21

	
INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO	**INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO**
	
INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO	**INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO**
	
INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO	**INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO**

	
INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO	**INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO**

ACTIVIDADES:

- Inicia el desmonte de muros en fibrocemento en el área de intervención.

10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDDAS CORRECTIVAS

Las principales dificultades que se deben enfrentar en el desarrollo de la presente intervención conciernen a la conciliación de precios de insumos y precios unitarios que guiarán el capítulo de costos del presente contrato de obra. Por ende, el Contratista deberá subsanar las observaciones formuladas por esta Interventoría antes de suscribirse de inicio de las diferentes sedes educativas

Otra problemática que pudiera afectar el desarrollo de las actividades de obra está directamente relacionada con su ubicación, sobre todo las condiciones de seguridad ciudadana en este sector de la ciudad. Dicha problemática potencial deberá ser gestionada por el Contratista, articulando con la comunidad educativa (Estudiantes, padres de familia, directivas, docentes y vecinos), para establecer un frente común que permita dinamizar la ejecución de las actividades objeto del presente contrato de obra.

Para las emergencias que se lleguen a presentar, se debe realizar en el sitio una visita e inspección para evaluar los daños; dependiendo de la magnitud de la falla y el alcance de recursos, se resuelven y/o corrigen de manera inmediata, durante el presente informe se atendieron la emergencia del colegio soto Aparicio, y se realzo visita de emergencia al colegio Porfirio barba Jacob.

Algunas de las actividades al ser nuevas y cuyos ítems, no están contempladas dentro de las cantidades del Contrato de obra; se hace necesario que el Contratista presente los análisis unitarios de los ítems que son No Previstos, para el estudio y análisis de aprobación ante la Entidad, respectivamente.

11. CLIMATOLOGÍA

Se ha llevado el control del estado del tiempo durante el presente periodo, el cual se registra en la bitácora de obra y en los formatos de calidad establecidos para tal fin. De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2023 al 29 de marzo de 2024 objeto del presente informe, en el **(ANEXO 02**) se adjunta formato de control de lluvias.

12. INFORME ADMINISTRATIVO

12.1 ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2024 al 29 de marzo de 2024 objeto del presente informe en el **(ANEXO 06)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta No. 16 – Comité de seguimiento No. 16	07/03/2024
Acta No. 17 – Comité de seguimiento No. 17	14/03/2024
Acta No. 18 – Comité de seguimiento No. 18	21/03/2024

12.2 ACTAS GENERALES GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta reunión revisión nps	11/03/2024
Acta recorrido ambiental	15/03/2024

12.3 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME

A continuación, se relacionan los informes semanales realizados por la interventoría **(ANEXO 04)**, en el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2024 al 29 de marzo de 2024, objeto del presente informe.

RELACIÓN DE INFORME SEMANALES	
Número	**Periodo**
Informe semanal No. 18	26 de febrero al 03 de marzo de 2024
Informe semanal No. 19	04 de marzo al 10 de marzo de 2024
Informe semanal No. 20	11 de marzo al 17 de marzo de 2024
Informe semanal No. 21	18 de marzo al 24 de marzo de 2024

12.4 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE OBRA CO1-PCCNTR.5305583 de 2023

A continuación, se relaciona el personal del contrato de obra No. CO1-PCCNTR.5305583 De 2023, que se encuentra aprobado por la interventoría al corte del presente informe:

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA

Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023

PROFESIONALES CONTRATISTA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO APROBACION INTERVENTORIA		OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
DIRECTOR DE OBRA	LIDIA ASUNCION MONROY RAMIREZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
RESIDENTE DE OBRA	LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
RESIDENTE DE OBRA	ANA JUDITH PARDO DUARTE	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-189	8/03/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-191 con radicado No.	11/03/2024
RESIDENTE DE OBRA	DIANA DEL PILAR OROZCO DIAZ		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
RESIDENTE DE OBRA	FELIX ANDRES CHAVEZ PIRAVAGUEN	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
RESIDENTE DE OBRA	JAIME FERNEY MOLINA BRICEÑO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-149	13/02/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-150 con radicado No.E-2024-32574	13/02/2024
ASESOR ESTRUCTURAL	LUIS GUILLERMO LINARES GONGORA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
ASESOR AMBIENTAL	ROMMEL ADALBERTO BONILLA CORTES		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
ASESOR AMBIENTAL	SANDRA MARCELA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con	23/10/2023

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA

Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023

PROFESIONALES CONTRATISTA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO APROBACION INTERVENTORIA		OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
	PINZON CASTRO					radicado No. E-2023-149717	
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DANNA YANETH RODRIGUEZ DE LA CRUZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SANDRA MARCELA PINZON CASTRO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-089	2/01/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-090 con radicado No.E-2024-282	2/01/2024
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO	OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	DAVID ESTEBAN BAQUERO BASTOS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	JUDINSSA ELIANA ROJAS PARDO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SANDRA MILENA CIFUENTES DAZA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y	DANNA YANETH	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-089	2/01/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-090	2/01/2024

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA							
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PROFESIONALES CONTRATISTA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO APROBACION INTERVENTORIA		OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
SALUD EN EL TRABAJO.	RODRIGUEZ DE LA CRUZ					con radicado No.E-2024-282	
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	VIHELKA GERALDINNE VILLAMIZAR OÑATE	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-149	13/02/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-150 con radicado No.E-2024-32574	13/02/2024
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	DIANA PAOLA RODRIGUEZ URIBE		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-166	22/02/2024		
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SANDRA LILIANA GUAYAMBUCO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-184	6/03/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-200 con radicado No. E-2024-51999	13/03/2024
INSPECTOR DE OBRA	JULIAN CAMILO IBAÑEZ CAICEDO		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
INSPECTOR DE OBRA	JOSE LUIS OROS ACEVEDO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-016	19/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
INSPECTOR DE OBRA	ALDAIR RIKKER VANEGAS RAMIREZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
MAESTRO DE OBRA	CARLOS FERNANDO CIPAGAUTA RONCANCIO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-007	10/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
MAESTRO DE OBRA	WILSON FRANCISCO PEREZ ALONSO		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA							
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PROFESIONALES CONTRATISTA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO APROBACION INTERVENTORIA		OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
MAESTRO DE OBRA	RAUL PARADA AVILA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
MAESTRO DE OBRA	JOSE VICENTE MOLANO ORTIZ		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-184	6/03/2024		

PERSONAL RETIRADO
PERSONAL ACTUAL APROBADO

12.5 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1-PCCNTR.5313251

A continuación, se relaciona el personal del contrato de interventoría No. CO1-PCCNTR.5313251 de 2023, que se encuentra aprobado por el IDRD al corte del presente informe:

RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA							
Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PERSONAL ETAPA OBRA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO RADICADO ALSED		OFICIO APROBACION SED	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDNA CONSTANZA CEPEDA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	RONALD RICARDO LOZANO JIMENEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JAIRO HERNAN TORRES PRIETO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023

RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023

PERSONAL ETAPA OBRA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO RADICADO ALSED		OFICIO APROBACION SED	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JUAN CARLOS DELGADO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-032 Radicado No. E-2023-157727	9/11/2023		
ASESOR ESTRUCTURAL	GERMAN CAMILO ALFONSO GONZALEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR AMBIENTAL	LAURA SOFIA FERNANDEZ FLECHAS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	LAURA SOFIA FERNANDEZ FLECHAS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	YENNY PAOLA REYES COSTILLA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO	CLAUDIA PATRICIA VERGEL JIMENEZ		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023		
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO	ALVARO VERGARA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-024 Radicado No. E-2023-153759	31/10/2023	S-2023-330858	30/10/2023
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	YINETH CRUZ ARANZALEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023

RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA							
Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PERSONAL ETAPA OBRA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO RADICADO ALSED		OFICIO APROBACION SED	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	ANDRES GOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	JEAN PAUL REYES MORALES	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR JURIDICO	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ COBOS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023

PERSONAL RETIRADO
PERSONAL ACTUAL APROBADO

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el **(ANEXO 05)** del presente informe se incluye el registro fotográfico efectuado por esta interventoría donde se registran las principales actividades de obra realizadas por el contratista dentro del periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2024 al 29 de marzo de 2024.

14. ITEMS NO PREVISTOS

Se realiza reunión el 05 de febrero de 2024, en compañía de la profesional de presupuestos de la entidad, apoyo a la supervisión, contratista e interventoría, a través de la cual se dan las directrices y los lineamientos contractuales para la entrega de los ítems no previstos; teniendo en cuenta esto, los ítems no previstos entregados previos a la reunión del 5 de febrero de 2024, no cumplían con lo requerido. El contratista se compromete a realizar la entrega de los ítems ajustados para ser remitidos a la entidad en debida forma.

Mediante el comunicado OB-UTGEPM2023-102-23 el contratista hace entrega de 13 ítems no previsto los cuales fueron observados por la interventoría mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-165, ya que no se adjuntaron las cotizaciones para realizar la revisión adecuada.

La interventoría mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-173 del 27 de febrero de 2024, realiza la reiteración de la entrega de los ítems no previstos subsanados, ya que en la reunión con la entidad donde se informaron los lineamientos, se realizó a comienzos del mes de febrero de 2024.

Posteriormente el contratista realiza la entrega nuevamente de los ítems mediante el comunicado OB-UTGEPM2023-109-23 del 28 de febrero de 2024, sin embargo, aún se presentan observaciones de los ítems, toda vez que en la entrega anterior, no venía completa la información.

15. BITÁCORA

Se consignan las actividades más relevantes de acuerdo con el proceso de ejecución, realizadas para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2023 al 29 de marzo de 2024, objeto del presente informe. En el **(ANEXO 07)** se adjuntan copias que son los soportes correspondientes a lo registrado en la bitácora de obra.

16. CORRESPONDENCIA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 30 de enero de 2023 al 29 de febrero de 2024, objeto del presente informe en el **(ANEXO 08)** se adjunta la relación de correspondencia obtenida en el transcurso del periodo.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-179	viernes, 1 de marzo de 2024	Respuesta OB-UTGEPM2023-109-23	CONTRATISTA	Subsanación ítems NP	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 1-03-2024 a las 9:16 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-180	viernes, 1 de marzo de 2024	Solicitud de retiro material colegio Manuel Cepeda Sede A Y Sede C	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 1-03-2024 a las 13:38 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-181	lunes, 4 de marzo de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-112-23 ajuste cubierta José Antonio Galán	CONTRATISTA	Se da aval del concepto	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 4-03-2024 a las 15:36 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-182	martes, 5 de marzo de 2024	Estabilidad y calidad piso caucho Manuel zapata olivella	CONTRATISTA	Se remiten observaciones del piso caucho	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 5-03-2024 a las 14:22 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-183	martes, 5 de marzo de 2024	Remisión informe semanal No. 18	SED	Se remite informe semanal No. 18	MCMM	Radicado: E-2024-47535 código de verificación TS90B. Se remite por ventanilla virtual del día 05-03-2024 a las 05:27 pm

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-184	miércoles, 6 de marzo de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-113-23 H.V cambio personal	CONTRATISTA	Se avala la H.V propuesta	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 6-03-2024 a las 9:11 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-185	miércoles, 6 de marzo de 2024	Solicitud inicio frentes faltantes	CONTRATISTA	Se solicita agilizar obras	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 6-03-2024 a las 14:07 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-186	miércoles, 6 de marzo de 2024	Solicitud componente ambiental	CONTRATISTA	Se remiten observaciones componente ambiental	SF	Se remite vía correo electrónico el día 6-03-2024 a las 16:28 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-187	jueves, 7 de marzo de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-116-23 Cambio de personal	CONTRATISTA	Se solicita subsanación	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 7-03-2024 a las 13:35 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-188	viernes, 8 de marzo de 2024	Aprobación propuesta cubierta	CONTRATISTA	Se remite aval del profesional	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 8-03-2024 a las 10:42 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-189	viernes, 8 de marzo de 2024	Rta 118 cambio personal	CONTRATISTA	Se da aval del cambio del profesional	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 8-03-2024 a las 11:27 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-190	viernes, 8 de marzo de 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento	SED	Se remite informe donde se relacionan productos atrasados	MCMM	Radicado físico SED No. E-2024-50157 el 11-03-2024 y aseguradora 24E00005356.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-191	lunes, 11 de marzo de 2024	Remisión hojas de vida personal cambio	SED	Se remite cambio de hoja de vida	MCMM	
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-192	lunes, 11 de marzo de 2024	Incumplimiento entrega propuesta motorista	SED	Se remite situación de propuesta arquitectónica	MCMM	Radicado: E-2024-50636 código de verificación 5FWQP. Se remite por ventanilla virtual del día 11-03-2024 a las 03:00 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-193	lunes, 11 de marzo de 2024	Solicitud desarrollo jornadas de orden y aseo	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 8-03-2024 a las 11:27 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-194	lunes, 11 de marzo de 2024	Observaciones ítems no previstos 11 al 14	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 12-03-2024 a las 11:11 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-195	martes, 12 de marzo de 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento contrato de obra	SED	Se remite informe de presunto incumplimiento	MCMM	Radicado físico: E-2024-51549 código de verificación FDHE7. Se remite el día 12-03-2024 a las 14:51 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-196	martes, 12 de marzo de 2024	Aprobación informe SST N°4	CONTRATISTA	Se da aval al informe	SF	Se remite vía correo electrónico el día 12-03-2024 a las 16:10 Pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-197	martes, 12 de marzo de 2024	Remisión presupuestos puestas a tierra estructuras metálicas	SED	Se remite presupuesto de puesta a tierra	MCMM	Radicado: E-2024-51743 código de verificación U8U6P. Se remite por

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
						ventanilla virtual del día 12-03-2024 a las 04:37 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-198	martes, 12 de marzo de 2024	Remisión informe SST N°4- Interventoría	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de enero al 29 de febrero de 2024	SF	Radicado: E-2024-51842 código de verificación UEWQ5. Se remite por ventanilla virtual del día 12-03-2024 a las 08:25 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-199	miércoles, 13 de marzo de 2024	Actualización de Plan de Inspección y Ensayo incluyendo ítems de NP'S aprobados	CONTRATISTA	Actualización de Plan de Inspección y Ensayo incluyendo ítems de NP'S aprobados	VLU	Se remite vía correo electrónico el día 13-03-2024 a las 8:20 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-199	miércoles, 13 de marzo de 2024	Solicitud entrega informe mensual No. 4 componente técnico	CONTRATISTA	Se solicita entrega del informe mensual	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 13-03-2024 a las 8:08 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-200	miércoles, 13 de marzo de 2024	Remisión hojas de vida personal cambio	SED	Se remite hoja de vida aprobada	MCMM	Radicado: E-2024-51999 código de verificación V8IZ5. Se remite por ventanilla virtual del día 13-03-2024 a las 09:26 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-201	miércoles, 13 de marzo de 2024	Remisión Nps	SED	Se remiten ítems no previstos aprobados	MCMM	Radicado: E-2024-52294 código de verificación PNGFL. Se remite por ventanilla virtual del día

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
						13-03-2024 a las 12:40 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-202	miércoles, 13 de marzo de 2024	Remisión informe semanal No. 19	SED	Se remite informe semanal No. 19	MCMM	Radicado: E-2024-52575 código de verificación 0TGKF. Se remite por ventanilla virtual del día 13-03-2024 a las 4:37 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-203	jueves, 14 de marzo de 2024	Apremio atraso de obras colegio san Bernardino	CONTRATISTA	Se solicite se presente plan de contingencia	MCMM	Radicado aseguradora: 24E00005982 el día 19-03-2024 a las 15:03 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-204	jueves, 14 de marzo de 2024	Remisión informe mensual No. 4 componente SST obra.	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de enero al 29 de febrero de 2024	SF	Radicado: E-2024-52906 código de verificación 0BOUG5. Se remite por ventanilla virtual del día 14-03-2024 a las 10:12 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-205	jueves, 14 de marzo de 2024	Remisión respuesta solicitud atrasos san Bernardino	SED	se remite respuesta a la entidad	MCMM	Radicado: E-2024-55130 código de verificación SXVTC. Se remite por ventanilla virtual del día 14-03-2024 a las 10:12 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-206	viernes, 15 de marzo de 2024	Apremio por atrasos	CONTRATISTA	Se remite apremio por actividades atrasadas de obra	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 15-03-2024 a las 9:27 am, para fines pertinentes.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-207	viernes, 15 de marzo de 2024	Solicitud presupuestos	CONTRATISTA	Se requiere actualizar los presupuestos	MCMM	Radicado: E-2024-52906 código de verificación 0BOUG5. Se remite por ventanilla virtual del día 19-03-2024 a las 07:51 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-208	viernes, 15 de marzo de 2024	Solicitud retiro elementos de seguridad	SED	Se solicita retiro de equipos	MCMM	Radicado: E-2024-54054 código de verificación JYYFN. Se remite por ventanilla virtual del día 15-03-2024 a las 3:41 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-209	viernes, 15 de marzo de 2024	Observaciones cronograma y presupuesto colegio B. Jorge Antonio Galán	CONTRATISTA	Observaciones	JCO	Se remite vía correo electrónico el día 15-03-2024 a las 16:42 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-210	lunes, 18 de marzo de 2024	Remisión informe mensual técnico No. 4 interventoría.	CONTRATISTA	Se remite informe mensual No. 4 para revisión y aprobación	MCMM	Radicado: E-2024-54475 código de verificación 2K7HA. Se remite por ventanilla virtual del día 18-03-2024 a las 9:47 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-211	lunes, 18 de marzo de 2024	Solicitud envió informe ambiental N°4	CONTRATISTA	Se solicita remitir informe	SF	Se remite vía correo electrónico el día 18-03-2024 a las 10:47 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-212	lunes, 18 de marzo de 2024	Observaciones informe mensual técnico No. 4	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 18-03-2024 a las 7:35 am, para fines pertinentes.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-213	martes, 19 de marzo de 2024	Remisión informe ambiental N°4-Interventoría	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de enero al 29 de febrero de 2024	SF	Radicado: E-2024-55430 código de verificación L3H6Q. Se remite por ventanilla virtual del día 19-03-2024 a las 1:45 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-214	martes, 19 de marzo de 2024	Solicitud componente SST	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 19-03-2024 a las 14:19 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-215	martes, 19 de marzo de 2024	Respuesta concepto hidráulico colegio Carlos Pizarro.	CONTRATISTA	Se remite observaciones del concepto hidráulico	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 19-03-2024 a las 14:36 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-216	miércoles, 20 de marzo de 2024	Observaciones ítems no previstos 07 - 10 al 14	CONTRATISTA	Se remite observaciones de ítems no previstos	JCO	Se remite vía correo electrónico el día 20-03-2024 a las 14:28 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-217	miércoles, 20 de marzo de 2024	Remisión informe semanal No. 20	SED	Se remite informe semanal No. 20	MCMM	Radicado: E-2024-55985 código de verificación YIZ4U. Se remite por ventanilla virtual del día 20-03-2024 a las 11:29 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-218	miércoles, 20 de marzo de 2024	Reiteración entrega de presupuestos	CONTRATISTA	Se solicitan presupuestos y programaciones	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 20-03-2024 a las 14:40 pm, para fines pertinentes.

CORRESPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-219	viernes, 22 de marzo de 2024	Notificación comportamiento personal de obra	CONTRATISTA	Se remite información	SF	Se remite vía correo electrónico el día 22-03-2024 a las 16:12 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-220	sábado, 23 de marzo de 2024	Remisión acta parcial de obra No. 4	SED	Se remite acta parcial	MCMM	Radicado: E-2024-57738 código de verificación VM8YQ. Se remite por ventanilla virtual del día 23-03-2024 a las 12:04 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-221	sábado, 23 de marzo de 2024	Remisión acta parcial de interventoría No. 4	SED	Se remite acta parcial	MCMM	Radicado: E-2024-57727 código de verificación GJJ5B. Se remite por ventanilla virtual del día 23-03-2024 a las 10:36 am

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**	**RESPUESTA**
UB-UTGEPM2023-113-23	1/3/2024	H.V reemplazo personal	Se remite para revisión y aprobación	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-184 el día 6-03-2024
OB-UTGEPM2023-115-23	5/3/2024	Estabilidad y calidad piso	Se da respuesta a lo solicitado	

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**	**RESPUESTA**
OB-UTGEPM2023-114-23	5/3/2024	Propuesta cerramiento Motorista	Se remiten propuesta de cerramiento	
OB-UTGEPM2023-116-23	6/3/2024	H.V reemplazo personal	Se remite para revisión y aprobación	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-187 el día 7-03-2024
OB-UTGEPM2023-117-23	6/3/2024	Ppto emergencias	Se remite presupuesto	
OB-UTGEPM2023-118-23	8/3/2024	Rta 187 observ	Se da respuesta a cada una de las observaciones	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-189 el día 8-03-2024
OB-UTGEPM2023-119-23	14/3/2024	Inf mensual 4	Se remite listado de materiales	
OB-UTGEPM2023-120-23	15/3/2024	Retiro elementos seguridad	Se solicita la suspensión se los sensores	
OB-UTGEPM2023-121-23	20/3/2024	Propuesta cerramiento	Se remite propuesta cerramiento	
OB-UTGEPM2023-122-23	20/3/2024	Pozo inyector	Se entrega presupuesto	

17. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido el 30 de enero de 2024 al 29 de febrero de 2023 objeto del presente informe, a la fecha del presente informe se han tramitado actas parciales.

CONTRATO DE OBRA - UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1								
ACTA NO.	**PERIODO**	**VALOR DIRECTO**	**AIU**	**VALOR TOTAL**	**VALOR PAGADO**	**ACUMULADO PAGADO**	**SALDO**	**PORCENTAJE DE AVANCE**
1	30/10/2023 29/11/2023	$ 784.157.092	$ 217.211.514	$ 1.001.368.607	$ 1.001.368.607	$ 1.001.368.607	$ 5.736.797.460	14,86%
2	30/11/2023 29/01/2024	$ 237.042.929	$ 65.660.891	$ 302.703.820,00	$ 302.703.820,00	$ 1.304.072.427	$ 5.434.093.640	4.49%
3	30/01/2024 29/02/2024	$ 381.019.160	$ 105.542.307	$ 486.561.467,00	$ 486.561.467,00	$ 1.790.633.894	$ 4.947.532.173	7,22%
4	01/3/2024 29/03/2024	$ 537.124.880	$ 148.783.592	$ 685.908.472,00	$ 685.908.472,00	$ 2.476.542.366	$ 4.261.623.701	10,18%
	TOTALES	$ 1.939.344.062	$ 537.198.305	$ 2.476.542.366	$ 2.476.542.366,00	$ 2.476.542.366	$ 4.261.623.701	36,75%

CONTRATO DE INTERVENTORIA - CONSORCIO SANTA MARIA 022							
ACTA NO.	**PERIODO**	**VALOR SIN IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**PORCENTAJE COBRADO**
1	30/10/2023 29/11/2023	$ 59.803.813	$ 11.362.725	$ 71.166.538	$ 71.166.538	$ 423.914.049	14,12%
2	30/11/2023 29/01/2024	$ 18.078.101	$ 3.434.839	$ 21.512.940	$ 92.679.478	$ 411.401.109	4,27%

CONTRATO DE INTERVENTORIA - CONSORCIO SANTA MARIA 022							
ACTA NO.	**PERIODO**	**VALOR SIN IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**PORCENTAJE COBRADO**
3	30/01/2024 29/02/2024	$ 29.058.462	$ 5.521.108	$ 34.579.569	$ 127.259.047	$ 376.821.540	6,86%
4	01/3/2024 29/03/2024	$ 40.963.879	$ 7.783.137	$ 48.747.016	$ 176.006.063	$ 328.074.524	9,67%
	TOTALES	$ 147.904.255	$ 28.101.808	$ 176.006.063	$ 176.006.063	$ 328.074.524	34,92%

COLEGIO	PRESUPUESTO INCLUYE AIU
MANUEL CEPEDA VARGAS C	$237.487.899
MANUEL CEPEDA VARGAS A	$145.401.475
INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$371.665.872
VILLA RICA	$196.033.652
FRANCISCO DE MIRANDA	$540.915.917
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$272.320.438
CARLOS ALBAN HOLGUIN	$1.528.837.538
JORGE ISAACS	$209.535.090
RURAL LA CONCEPCION	$253.510.561
JOSE ANTONIO GALAN	$543.111.194
BOSANOVA	$158.793.260
SAN BERNARDINO	$900.000.000
MOTORISTA	$214.029.550
DILE	$364.078.581
TOTAL	**$5.935.721.026**

VALOR TOTAL CONTRATO	$6.738.166.067,00
VALOR OBRA CIVIL	$6.330.812.340
VALOR EMERGENCIAS	$407.353.727
DIFERENCIA (VALOR POR DEFINIR OBRA CIVIL FRENTES CONTRACTUALES)	$ 395.091.313,52

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría CONSORCIO SANTA MARIA 022 ejerció permanentemente seguimiento, a las actividades técnicas, administrativas, jurídicas, financieras y ambientales para cada uno de los procesos constructivos que se llevan a cabo en cada uno de los frentes priorizados, para garantizar el normal desarrollo de la obra.

- Esta Interventoría realiza los comités de seguimiento semanales, donde se manifiesta al contratista los compromisos para terminar cada uno de los frentes de obra.

- Se realizo revisión de cada una de las actividades ejecutadas por el Contratista de obra con registro Fotográfico de todas las áreas donde se realizaron actividades

- Se le solicito al contratista realizar las actividades pendientes que a la fecha no se han iniciado, al igual que dar inicio con los cinco (05) frente de obra que se encuentran pendientes por iniciar.

- Se le solicitó al contratista de obra de atender las emergencias presentadas en cada uno de los colegios priorizados por la supervisión.

- Se remitió informe de presunto incumplimiento, toda vez que se presentan atrasos de obra del 6% en el avance general del contrato.

- El personal de Interventoría estuvo presente a todo momento revisando las actividades que realizo el contratista de obra para revisar que se realizaran bien y que los materiales utilizados fueran de buena calidad.

- Se recomienda dinamizar el equipo de trabajo para optimizar el avance de obra, teniendo en cuenta los atrasos que se han venido presentando, causados por la ausencia de personal y falta de materiales.

- Dada la problemática de orden público y seguridad ciudadana del sector de la ciudad donde se ubican las sedes educativas priorizadas para su intervención y que puede afectar el desarrollo del contrato, se recomienda gestionar con las directivas de cada colegio, un espacio dentro de la sede educativa a intervenir, con buena seguridad para el almacén y el equipo administrativo de obra.

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**FRANCISCO MIRANDA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**1 DE MARZO AL 29 DE MARZO**

FECHA	CLIMA
1 DE MARZO	SOLEADO
2 DE MARZO	SOLEADO
3 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
4 DE MARZO	SOLEADO
5 DE MARZO	SOLEADO
6 DE MARZO	SOLEADO
7 DE MARZO	SOLEADO
8 DE MARZO	SOLEADO
9 DE MARZO	SOLEADO
10 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
11 DE MARZO	SOLEADO
12 DE MARZO	SOLEADO
13 DE MARZO	SOLEADO
14 DE MARZO	NUBLADO
15 DE MARZO	SOLEADO
16 DE MARZO	SOLEADO
17 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
18 DE MARZO	SOLEADO
19 DE MARZO	SOLEADO
20 DE MARZO	SOLEADO
21 DE MARZO	NUBLADO
22 DE MARZO	SOLEADO
23 DE MARZO	SOLEADO
24 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
25 DE MARZO	FESTIVO SANTO
26 DE MARZO	SOLEADO
27 DE MARZO	SOLEADO
28 DE MARZO	FESTIVO SANTO
29 DE MARZO	FESTIVO SANTO

Firma:

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. RONALD LOZANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**MANUEL OLIVELLA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**1 DE MARZO AL 29 DE MARZO**

FECHA	CLIMA
1 DE MARZO	SOLEADO
2 DE MARZO	SOLEADO
3 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
4 DE MARZO	SOLEADO
5 DE MARZO	SOLEADO
6 DE MARZO	SOLEADO
7 DE MARZO	SOLEADO
8 DE MARZO	SOLEADO
9 DE MARZO	SOLEADO
10 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
11 DE MARZO	SOLEADO
12 DE MARZO	SOLEADO
13 DE MARZO	SOLEADO
14 DE MARZO	NUBLADO
15 DE MARZO	SOLEADO
16 DE MARZO	SOLEADO
17 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
18 DE MARZO	SOLEADO
19 DE MARZO	SOLEADO
20 DE MARZO	SOLEADO
21 DE MARZO	NUBLADO
22 DE MARZO	SOLEADO
23 DE MARZO	SOLEADO
24 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
25 DE MARZO	FESTIVO SANTO
26 DE MARZO	SOLEADO
27 DE MARZO	SOLEADO
28 DE MARZO	FESTIVO SANTO
29 DE MARZO	FESTIVO SANTO
28 DE FEBRERO	SOLEADO
29 DE FEBRERO	SOLEADO

Firma:

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. RONALD LOZANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**RODRIGO DE TRIANA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**1 DE MARZO AL 29 DE MARZO**

FECHA	CLIMA
1 DE MARZO	SOLEADO
2 DE MARZO	SOLEADO
3 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
4 DE MARZO	SOLEADO
5 DE MARZO	SOLEADO
6 DE MARZO	SOLEADO
7 DE MARZO	SOLEADO
8 DE MARZO	SOLEADO
9 DE MARZO	NUBLADO
10 DE MARZO	NUBLADO
11 DE MARZO	NUBLADO
12 DE MARZO	SOLEADO
13 DE MARZO	SOLEADO
14 DE MARZO	SOLEADO
15 DE MARZO	SOLEADO
16 DE MARZO	SOLEADO
17 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
18 DE MARZO	SOLEADO
19 DE MARZO	SOLEADO
20 DE MARZO	SOLEADO
21 DE MARZO	SOLEADO
22 DE MARZO	NUBLADO
23 DE MARZO	SOLEADO
24 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
25 DE MARZO	FESTIVO SANTO
26 DE MARZO	SOLEADO
27 DE MARZO	SOLEADO
28 DE MARZO	FESTIVO SANTO
29 DE MARZO	FESTIVO SANTO

Firma:

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. RONALD LOZANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**MANUEL CEPEDA SEDE C**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**1 DE MARZO AL 29 DE MARZO**

FECHA	CLIMA
1 DE MARZO	SOLEADO
2 DE MARZO	SOLEADO
3 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
4 DE MARZO	SOLEADO
5 DE MARZO	SOLEADO
6 DE MARZO	SOLEADO
7 DE MARZO	SOLEADO
8 DE MARZO	NUBLADO
9 DE MARZO	NUBLADO
10 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
11 DE MARZO	NUBLADO
12 DE MARZO	SOLEADO
13 DE MARZO	SOLEADO
14 DE MARZO	NUBLADO
15 DE MARZO	NUBLADO
16 DE MARZO	SOLEADO
17 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
18 DE MARZO	SOLEADO
19 DE MARZO	SOLEADO
20 DE MARZO	SOLEADO
21 DE MARZO	SOLEADO
22 DE MARZO	SOLEADO
23 DE MARZO	SOLEADO
24 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
25 DE MARZO	FESTIVO SANTO
26 DE MARZO	SOLEADO
27 DE MARZO	SOLEADO
28 DE MARZO	FESTIVO SANTO
29 DE MARZO	FESTIVO SANTO

Firma:

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. RONALD LOZANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**VILLA RICA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**1 DE MARZO AL 29 DE MARZO**

FECHA	CLIMA
1 DE MARZO	SOLEADO
2 DE MARZO	SOLEADO
3 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
4 DE MARZO	SOLEADO
5 DE MARZO	SOLEADO
6 DE MARZO	SOLEADO
7 DE MARZO	SOLEADO
8 DE MARZO	NUBLADO
9 DE MARZO	NUBLADO
10 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
11 DE MARZO	SOLEADO
12 DE MARZO	SOLEADO
13 DE MARZO	SOLEADO
14 DE MARZO	NUBLADO
15 DE MARZO	SOLEADO
16 DE MARZO	SOLEADO
17 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
18 DE MARZO	SOLEADO
19 DE MARZO	SOLEADO
20 DE MARZO	SOLEADO
21 DE MARZO	SOLEADO
22 DE MARZO	SOLEADO
23 DE MARZO	SOLEADO
24 DE MARZO	DOMINGO SIN TRABAJO
25 DE MARZO	FESTIVO SANTO
26 DE MARZO	SOLEADO
27 DE MARZO	SOLEADO
28 DE MARZO	FESTIVO SANTO
29 DE MARZO	FESTIVO SANTO

Firma:

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. RONALD LOZANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ)**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**01 DE MARZO DE 2024 AL 29 DE MARZO DE 2024**

FECHA	CLIMA
01 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
2 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
4 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE SOLEADA
5 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
6 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
7 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
8 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
9 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
11 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
12 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
13 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
14 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
15 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
16 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
18 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
19 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE LLUVIOSA Y NUBLADA
20 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
21 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE DE AGUACERO
22 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
23 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
26 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
27 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**01 DE MARZO DE 2024 AL 29 DE MARZO DE 2024**

FECHA	CLIMA
01 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
2 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
4 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE SOLEADA
5 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
6 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
7 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
8 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
9 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
11 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
12 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
13 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
14 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
15 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
16 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
18 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
19 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE LLUVIOSA Y NUBLADA
20 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
21 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE DE AGUACERO
22 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
23 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
26 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
27 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**01 DE MARZO DE 2024 AL 29 DE MARZO DE 2024**

FECHA	CLIMA
22 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
23 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
26 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
27 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**SAN BERNANDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**01 DE MARZO DE 2024 AL 29 DE MARZO DE 2024**

FECHA	CLIMA
01 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
2 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
4 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE SOLEADA
5 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
6 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
7 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
8 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
9 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
11 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
12 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
13 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
14 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
15 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
16 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
18 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
19 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE LLUVIOSA Y NUBLADA
20 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
21 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE DE AGUACERO
22 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
23 DE MARZO DE 2024	MAÑANA SOLEADA
26 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
27 DE MARZO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-47535

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	05/03/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL DELGADO
Documento	79573492
Teléfono	
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA

Dependencias Responsables

OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Copias

Información Adicional

Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-183 - Remision informe semanal No. 18, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-183 - Remision informe semanal No. 18
No. Folios	0
Anexos	

Documentos Adjuntos

E-2024-47535_1.pdf

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-183

Bogotá D.C., 05 de marzo de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 18

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 18, correspondiente al periodo comprendido entre el 23 de febrero al 03 de marzo de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (33) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

			18	Interventor:	CONSORCIO SANTA MARIA 022
26/02/2024	al	3/03/2024			

1. Datos Generales

Nombre:

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
COLEGIO SAN	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

Localidad:

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			CONSORCIO SANTA MARIA 022						
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	
				Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00						
Adición:			$ -						
Anticipo:			$ -						
Retegarantía:			$ -						
			Neto Acta						
			Acumulado						

4.	**Programación.**			Semana No.	**18**	Fecha de corte:	3-mar-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

N°	**Capítulos:**	**LOCALIDAD**	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**% Inversión**
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	27-feb-24	$ 194.622.636,11	**3,07%**	94,00%	92,91%	-1,09%	$ 180.823.891
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 151.182.427,00	**2,39%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 151.182.427
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	18-mar-24	$ 344.901.566,19	**5,45%**	88,00%	60,19%	-27,81%	$ 207.596.253
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 170.122.931,19	**2,69%**	90,00%	81,20%	-8,80%	$ 138.139.820
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 590.052.374,46	**9,32%**	93,00%	63,56%	-29,44%	$ 375.037.289
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 271.075.854,17	**4,28%**	89,00%	94,84%	5,84%	$ 257.088.340
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.528.837.537,71	**24,15%**	62,30%	46,33%	-15,97%	$ 708.310.431
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 150.113.989,56	**2,37%**	100,00%	99,97%	-0,03%	$ 150.068.955
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 253.510.561,49	**4,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 543.111.193,70	**8,58%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 158.793.259,67	**2,51%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.000.000,00	**14,22%**	100,00%	85,00%	-15,00%	$ 765.000.000
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 214.029.550,15	**3,38%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 364.078.580,55	**5,75%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	**6,43%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 6.241.784.650**	**98,59%**	**56,60%**	**46,33%**	**-**	**$ 2.933.247.407**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**

-10,27%	**DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

Se requiere al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*entregar la propuesta de cubierta de jose antonio galan ajustada.
*entregar la propuesta del colegio motorista, para porder defnir un presupuesto
*Tambien es importante ajustar el presupuesto de la emergencia del colegio carlos pizarro. Por otro lado solicitamos a la entidad la pronta definicion del diseño del colegio la concepcion de acuerdo con la visita del arq alejandro y programar la visita del Dile Bosa para definir el alcance final y sacar el presupuesto. Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

6

PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	**TOTAL**
6.330.813.879,00									**6.330.813.879,00**
29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista avanza con fundicion de placa en graderias, se avanza con pintura en fachada principal de la institucionl, se avanza con demolicion de placa y excavacion manual en cuarto de rack y aula 107, se avanza con anclajes, mampostaeria, dovelas, acero de refuerzo instalacion de metal deck para las graderias en cancha
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	el contratista realiza detalles de acabado en ciertas ventanas
COLEGIO VILLA RICA	el contratista avanza con muros en superboard del shut de basuras, avanza con redes electricas en shut de basuras, avanza con el suministro de piso caucho SBR y EPDM para patio de preescolar, NO se avanza en la instalacion de la estructura de la cubierta de preescolar.
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	el contratista no avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias, no avanza en la construccion de cajas de inspeccion y trampa de grasas, no avanza en la instalacion de tuberia sanitaria de aguas lluvias, no avanza en bateria sanitaria, no avanza en cubierta de patios internos por falta de material de obra y falta de personal.
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	el contratista avanza en la instalacion de laminas microperforadas, y se avanza con pintura del pasamanos.
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Continúa la instalación de ventanas en las aulas del Bloque B, Avanza la instalación de la lámina inferior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1 y 2 del Bloque C, Continúa la instalación de la estructura de cubierta sobre el aula 4 del Bloque C
COLEGIO JORGE ISAAC	Se retiran los RCD ubicados al lado de la tarima, Se realizan retoques finales a los pasamanos de las cuatro (4) escaleras
COLEGIO SAN BERNARDINO	Avanza la instalación de red eléctrica para las luminarias de emergencia en el tercer piso, Avanza la instalación de luminarias de emergencia en el tercer piso, Continúa la instalación de los mesones en policuarzo en los baños del segundo y del tercer piso, Inicia el desmonte del manto asfáltico y la demolición del mortero de nivelación en las cubiertas planas de la sede educativa

8 **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST


- El contratista de obra realizo el retiro del andamio utilizados en el Colegio Francisco Miranda
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe SST N°4
- Se requiere atender el requerimiento de ausencia de profesional SST.

9 **SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**

- Se remite a la entidad el informe ambiental N°3 del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD acopiados en los colegios Manuel Cepeda Sede C y Sede A
- Se solicita
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4

10 **REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				
COLEGIO VILLA RICA:	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**

				
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:
				
EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:
				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				

COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	18
26/02/2024	3/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C		CARRERA 83- # 46 B SUR		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	18	Fecha de corte:	domingo, 3 de marzo de 2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	16-mar-24	194.622.636,11	100,00%	94,00%	92,91%	1,09%	180.823.891,21
TOTAL			**194.622.636,11**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	16-mar-24

6. Pendientes

			VALORES CON AIU		
PRIORIZADOS	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 26/02/24	DIFERENCIA	
x	MANUEL CEPEDA VARGAS C	$196.472.139	$194.622.636	$1.849.503	
x	MANUEL CEPEDA VARGAS A	$278.280.423	$151.182.427	$127.097.996	
x	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$360.222.540	$344.901.566	$15.320.974	
x	VILLA RICA	$381.217.029	$191.848.028	$189.369.001	
x	FRANCISCO DE MIRANDA	51.054.005.882	$526.854.850	$527.151.032	
x	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$398.952.605	$289.105.906	$145.808.699	
x	CARLOS ALBAN HOLGUIN	$993.476.169	$1.178.347.276	- $184.871.107	
	JORGE ISAACS	$192.258.140	$209.535.090	- $17.281.750	
	RURAL LA CONCEPCION	$357.407.722	$253.510.561	$103.897.161	
	JOSE ANTONIO GALAN	$484.590.223	$543.111.194	- $58.520.971	
	BOSANOVA	$281.266.586	$158.793.260	$122.473.326	
x	SAN BERNARDINO	$805.249.158	$983.871.679	- $178.622.521	
	MOTORISTA	$294.680.169	$214.029.550	- $6.349.381	
	DILE	$334.284.887	$384.078.581	- $28.793.694	
	SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$6.298.358.872	$5.563.832.604	$734.526.268	
		EMERGENCIAS			
	FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B		$ 43.286.525,00		
	ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A		$ 16.231.373,00		
	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		$ 64.222.267,00		
	SUBTOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165		
	VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$ 6.330.812.340,00	$5.563.832.604	$ 766.979.735,81	
	VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	$ 283.613.562,00	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.738.166.067,00	$5.687.572.769	$ 1.050.593.297,81	

Adelanto/Atraso (Días):

Fecha Proyectada de Terminación: 16-mar-24

Pendiente que el contratista termine la actividad de excavacion manual de las aulas de ingles, iniciar placa de contrapiso de aulas de ingles y rack, de igual manera Solicitamos al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con fundicion de placa en graderias

7.2 el contratista avanza con emboquillado e impermeabilizacion en fachada principal de la institucion

7.3 el contratista avanza con pintura en fachada principal

7.4 el contratista avanza con excavacion manuel del cuarto de rack y aula 107, y acopio de material RCD

7.5 el contratista avanza con anclajes, mamposteria, dovelas, acero de refuerzo instalacion de metal deck para las graderias en cancha

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la pintura en fachada principal, excavacion manual en cuarto de rack e ingles, anclajes, mampostaeria, dovelas, acero de refuerzo instalacion de metal deck para las graderias en cancha, fundicion de placa en graderias, impermeabilizacion de aula de rack.

8.2. . Componente ambiental
- Se remite a la entidad el informe ambiental N°3 del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD acopiados en los colegios Manuel Cepeda Sede C y Sede A
- Se solicita
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4

8.3. .Componente SST
- El contratista de obra realizo el retiro del andamio utilizados en el Colegio Francisco Miranda
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe SST N°4
- Se requiere atender el requerimiento de ausencia de profesional SST.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza revisión y aprobación de informe 3 de contratista quedando pendiente la entrega del certificado de igol denso

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista avanzar con las obras de las escaleras de la cancha multiple, las cuales presentan atraso en la programacion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
CONSTRUCCION Y FUNDICION DE ESCALERA EN GRADERIAS	FUNDICION DE PLACA GRADERIA	CONSTRUCCION Y FUNDICION DE ESCALERA EN GRADERIAS	FUNDICION DE PLACA GRADERIA
			
CONSTRUCCION Y FUNDICION DE ESCALERA EN GRADERIAS	ARAMADO ACERO DEE REFUERZO DE PLACA GRADERIA	DEMOLICION DE PLACA AULA 107	DEMOLICION DE PLACA AULA RACK
			
PINTURA DE FACHADA	PINTURA DE FACHADA	PINTURA DE FACHADA	MEDIA CAÑA EN MURO EXTERIOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	18		INTERVENTORIA
26/02/2024	3/03/2024		CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C		CALLE 38 SUR BIS # 89-81		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	18	Fecha de corte:	domingo, 3 de marzo de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	14-nov-23 18-mar-24	112.624.338,50	100,00%	88,00%	60,19%	27,81%	67.788.589,34
TOTAL		**112.624.338,50**	**100,00%**	**-**		**27,81%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	18-mar-24

6. Pendientes

		VALORES CON AIU		
PRIORIZADOS	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 26/02/24	DIFERENCIA
X	MANUEL CEPEDA VARGAS C	$196.472.139	$194.622.636	$1.849.503
X	MANUEL CEPEDA VARGAS A	$278.280.428	$151.182.427	$127.097.998
X	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$360.222.540	$344.901.566	$15.320.974
X	VILLA RICA	$361.217.029	$191.848.028	$169.369.001
X	FRANCISCO DE MIRANDA	$1.654.005.882	$526.854.850	$527.151.032
X	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$394.952.605	$249.145.906	$145.806.699
X	CARLOS ALBAN HOLGUIN	$993.478.169	$1.178.347.276	- $184.871.107
	JORGE ISAACS	$192.253.340	$209.535.090	- $17.281.750
	RURAL LA CONCEPCION	$357.407.722	$253.510.561	$103.897.161
	JOSE ANTONIO GALAN	$484.590.223	$543.111.194	- $58.520.971
	BOSANOVA	$281.266.586	$158.793.260	$122.473.326
X	SAN BERNARDINO	$805.249.158	$983.871.679	- $178.622.521
	MOTORISTA	$204.680.169	$214.029.550	- $9.349.381
	DILE	$334.284.887	$364.078.581	- $29.793.694
	SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$6.298.358.822	$5.563.832.804	$734.526.268
	EMERGENCIAS			
	FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B		$ 48.286.525,00	
	ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A		$ 16.251.373,00	
	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		$ 64.222.267,00	
	SUBTOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	
	VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$ 6.190.812.340,00	$5.563.832.804	$ 766.979.735,81
	VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	$ 283.613.502,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.738.166.067,00	$5.687.572.769	$ 1.050.593.207,81

Adelanto/Atraso (Días):

Fecha Proyectada de Terminación: 18-mar-24

durante la semana se realizo visita a la sede educativa con el residente de obra y se informa el tema de pendientes para ser rematados de la ventaneria, de igual manera el contratista avanza en estos remates, quedando pendientes detalles de acabado

Solicitamos al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con remates y obras pendientes, aun queda pendiente los remates de acabado, no se realiza nuinguna otra actividad

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento a la sede educativa, ecidenviando que el contratista no avanza con ninguna actividad durante la semana

8.2. . Componente ambiental
- Se remite a la entidad el informe ambiental N°3 del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD acopiados en los colegios Manuel Cepeda Sede C y Sede A
- Se solicita
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4

8.3. .Componente SST
- El contratista de obra realizo el retiro del andamio utilizados en el Colegio Francisco Miranda
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe SST N°4
- Se requiere atender el requerimiento de ausencia de profesional SST.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza revisión y aprobación de informe 3 de contratista quedando pendiente la entrega del certificado de igol denso

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista termine las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio, que coordine con el rector de la institucion el inicio de las obras de los pisos en las aulas, que el contratista suministre e instale las laminas microperforadas en el cerramiento exterior

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**	**EL CONTRATISTA NO AVANZA CON NINGUNA ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA DE REMATES**	**EL CONTRATISTA INSTALA VENTANA**

			
EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES EN LA VENTANERIA	EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES EN LA VENTANERIA	EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES EN LA VENTANERIA	EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES EN LA VENTANERIA
			
EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES EN LA VENTANERIA	EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES EN LA VENTANERIA	EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES EN LA VENTANERIA	EL CONTRATISTA AVANZA CON REMATES EN LA VENTANERIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	18	
26/02/2024	3/03/2024	

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	VILLA RICA SEDE B		CALLE 49 SUR # 78-35		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	18	Fecha de corte:	domingo, 3 de marzo de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23 15-mar-24	170.122.931,19	100,00%	90,00%	81,20%	8,80%	138.139.820,13
TOTAL		**170.122.931,19**	**100,00%**	**-**		**8,80%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

		VALORES CON AIU		
PRIORIZADOS	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 26/02/24	DIFERENCIA
x	MANUEL CEPEDA VARGAS C	$196.472.139	$194.622.636	$1.849.503
x	MANUEL CEPEDA VARGAS A	$278.280.423	$151.182.427	$127.097.996
x	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$360.222.540	$344.901.566	$15.320.974
x	VILLA RICA	$361.217.029	$191.848.028	$169.369.001
x	FRANCISCO DE MIRANDA	$1.054.005.882	$526.854.850	$527.151.032
x	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$394.952.605	$249.145.906	$145.806.699
x	CARLOS ALBAN HOLGUIN	$993.476.169	$1.178.347.276	- $184.871.107
	JORGE ISAACS	$192.253.340	$209.535.090	- $17.281.750
	RURAL LA CONCEPCION	$357.407.722	$253.510.561	$103.897.161
	JOSE ANTONIO GALAN	$484.590.223	$543.111.194	- $58.520.971
	BOSANOVA	$281.266.586	$158.793.260	$122.473.326
x	SAN BERNARDINO	$805.249.158	$983.871.679	- $178.622.521
	MOTORISTA	$204.680.169	$214.029.550	- $9.349.381
	DILE	$334.284.887	$364.078.581	- $29.793.694
	SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$6.298.358.872	$5.563.837.604	$734.526.268
	EMERGENCIAS			
	FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B		$ 43.286.525,00	
	ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A		$ 16.231.373,00	
	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		$ 64.222.267,00	
	SUBTOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	
	VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$ 6.330.812.340,00	$5.563.832.604	$ 766.979.735,81
	VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	$ 283.613.562,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.738.166.067,00	$5.687.572.769	$ 1.050.593.297,81

Adelanto/Atraso (Días):

Fecha Proyectada de Terminación: 15-mar-24

durante la semana se realizo visita a la sede educativa y el contratista no avanza con la estructura metalica de la cubierta

Solicitamos al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se avanza con remates en la instalacion de puertas y ventanas en oficina administrativa

7.2 NO se avanza con la adecuacion del carcamo en patio de preescolar

7.3 NO se avanza con muros en superboard del shut de basuras, debido a que no se realiza ninguna actividad electrica

7.4 NO se avanza en la instalacion de la estructura de la cubierta de preescolar.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de redes y puntos hidraulicos del shut de basuras, remates en la instalacion de puertas y ventanas en oficina administrativa, adecuacion del carcamo en patio de preescolar, instalacion de la estructura de la cubierta de preescolar.

8.2. . Componente ambiental
- Se remite a la entidad el informe ambiental N°3 del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD acopiados en los colegios Manuel Cepeda Sede C y Sede A
- Se solicita
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4

8.3. .Componente SST
- El contratista de obra realizo el retiro del andamio utilizados en el Colegio Francisco Miranda
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe SST N°4
- Se requiere atender el requerimiento de ausencia de profesional SST.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza revisión y aprobación de informe 3 de contratista quedando pendiente la entrega del certificado de igol denso

9. Observaciones:

9,1 que el contratista ingrese personal y material de obra, que avance con laas obras del patio de preescolar, shut de basuras y zona administrativa

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
AVANCE DE OBRA REDES ELECTRICAS SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA REDES ELECTRICAS SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA SUMINISTRO PISO CAUCHO EPDM PATIO DE PREESCOLAR	SIN AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR
			
AVANCE DE OBRA REDES ELECTRICAS SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA SUMINISTRO PISO CAUCHO SBR PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE OBRA REDES ELECTRICAS SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR
			
AVANCE DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA REDES ELECTRICAS SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA REDES ELECTRICAS SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD SHUT DE BASURAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	18
26/02/2024	3/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 18 — Fecha de corte: domingo, 3 de marzo de 2024

FRANCISCO MIRANDA	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	14-mar-24	590.052.374,46	100,00%	93,00%	63,56%	29,44%	375.037.289,21
TOTAL			**590.052.374,46**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-mar-24

6. Pendientes

		VALORES CON AIU		
PRIORIZADOS	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 26/02/24	DIFERENCIA
x	MANUEL CEPEDA VARGAS C	$196.472.139	$194.622.636	$1.849.503
x	MANUEL CEPEDA VARGAS A	$278.280.423	$151.183.427	$127.097.996
x	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$360.222.540	$344.901.566	$15.320.974
x	VILLA RICA	$361.217.029	$191.848.028	$169.369.001
x	FRANCISCO DE MIRANDA	$1.054.005.882	$526.854.850	$527.151.032
x	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$394.952.605	$249.145.906	$145.806.699
x	CARLOS ALBAN HOLGUIN	$993.476.169	$1.178.347.276	- $184.871.107
	JORGE ISAACS	$192.253.340	$209.535.090	- $17.281.750
	RURAL LA CONCEPCION	$357.407.722	$253.510.561	$103.897.161
	JOSE ANTONIO GALAN	$484.590.223	$543.111.194	- $58.520.971
	BOSANOVA	$281.266.586	$158.793.260	$122.473.326
x	SAN BERNARDINO	$805.249.158	$983.871.679	- $178.622.521
	MOTORISTA	$204.680.169	$214.029.550	- $9.349.381
	DILE	$334.284.887	$364.078.581	- $29.793.694
	SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$6.298.358.872	$5.564.832.604	$734.526.268
	EMERGENCIAS			
	FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B		$ 43.286.525,00	
	ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A		$ 16.231.373,00	
	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		$ 64.222.267,00	
	SUBTOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	
	VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$ 6.330.812.840,00	$5.563.832.604	$ 766.979.735,81
	VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.165	$ 283.613.562,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.738.166.067,00	$5.687.572.769	$ 1.050.593.297,81

Adelanto/Atraso (Días):

Fecha Proyectada de Terminación: 14-mar-24

Durante la semana se presento ausencia de personal en la zona de trabajo, con respecto a lo anterior la interventoria le envia comunicado al contratista para subsanar dicho tema, pendiente que el contratista finalice detalles de bateria sanitaria, y suministre e instale cubierta en patios internos, asi mismo y teniendo en cuenta los valores que se tienen conciliados a la fecha de los frentes contractuales, como se muestra en la imagen, tenemos un saldo para los frentes contractuals de $ 766 millones y teniendo en cuenta lo ejecutado en emergencias a la fecha , se tiene un saldo de $283 millones para un total de $1050 millones.

Solicitamos al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 En esta semana el contratista no avanza en remates de la bateria sanitaria

7.2 el contratista no avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias

7.3 el contratista no avanza en la construccion de cajas de inspeccion y trampa de grasas

7.4 el contratista no avanza en la instalacion de tuberia sanitaria de aguas lluvias

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento y oberva ue el contratista no avanza en ninguna actividad de la bateria sanitaria, redes de aguas lluvias y cubierta de patios internos

8.2. . Componente ambiental
- Se remite a la entidad el informe ambiental N°3 del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD acopiados en los colegios Manuel Cepeda Sede C y Sede A
- Se solicita
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4

8.3. .Componente SST
- El contratista de obra realizo el retiro del andamio utilizados en el Colegio Francisco Miranda
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe SST N°4
- Se requiere atender el requerimiento de ausencia de profesional SST.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza revisión y aprobación de informe 3 de contratista quedando pendiente la entrega del certificado de igol denso

9. Observaciones:

9,1 Pendiente que el contratista realice remates de acabado en bateria sanitaria, asi mismo intervenir aula de sistemas

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
SIN AVANCE DE OBRA EN REDES DE AGUAS LLUVIAS	SIN AVANCE DE OBRA EN REDES DE AGUAS LLUVIAS	SIN AVANCE DE OBRA EN REDES DE AGUAS LLUVIAS	BATERIA SANITARIA SIN REMATAR
			
ESTADO ACTUAL DE PATIO EXTERNO	BATERIA SANITARIA SIN REMATAR	SIN AVANCE EN LA CUBIERTA DE PATIOS INTERNOS	SIN AVANCE EN LA CUBIERTA DE PATIOS INTERNOS
			
BATERIA SANITARIA SIN REMATAR	BATERIA SANITARIA SIN REMATAR	BATERIA SANITARIA SIN REMATAR	BATERIA SANITARIA SIN REMATAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	18	
26/02/2024	3/03/2024	

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	MANUEL ZAPATA OLIVELLA		CALLE 1 BIS # 87-84		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	18	Fecha de corte:	domingo, 3 de marzo de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	20-nov-23	19-mar-24	271.075.854,17	100,00%	89,00%	94,84%	-5,84%	257.088.340,09
TOTAL			**271.075.854,17**	**100,00%**	**-**		**-5,84%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	19-mar-24

6. Pendientes

		VALORES CON AIU		
PRIORIZADOS	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 26/02/24	DIFERENCIA
X	MANUEL CEPEDA VARGAS C	$196.472.197	$194.622.936	$1.849.261
X	MANUEL CEPEDA VARGAS A	$278.280.423	$151.182.427	$127.097.996
X	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$260.222.540	$244.901.566	$15.320.974
X	VILLA RICA	$341.217.829	$191.840.829	$149.369.001
X	FRANCISCO DE MIRANDA	$1.054.005.882	$526.854.850	$527.151.032
X	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$394.952.605	$249.145.906	$145.806.699
X	CARLOS ALBAN HOLGUIN	$993.476.169	$1.178.347.276	-$184.871.107
	JORGE ISAACS	$192.233.340	$209.535.090	-$17.301.750
	RURAL LA CONCEPCION	$357.497.722	$253.510.561	$103.987.161
	JOSE ANTONIO GALAN	$648.580.223	$648.111.198	-$68.530.975
	BOSANOVA	$281.266.598	$158.793.280	$122.475.326
X	SAN BERNARDINO	$865.249.158	$983.871.675	-$176.622.521
	MOTORISTA	$204.680.169	$214.025.550	-$9.345.381
	DELE	$534.284.857	$564.070.581	-$29.785.094
	SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$6.238.350.877	$5.563.832.909	$734.520.268
	EMERGENCIAS			
	FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B		$ 43.290.525,00	
	ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A		$ 16.231.375,00	
	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		$ 61.222.267,00	
	SUBTOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.166	
	VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$ 6.330.812.340,00	$5.563.832.909	$ 766.979.235,81
	VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$123.740.166	$ 283.613.562,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.738.166.067,00	$5.687.572.769	$ 1.050.591.257,81

Adelanto/Atraso (Días):

Fecha Proyectada de Terminación: 19-mar-24

pendiente que el contratista retire rcd de la zona exterior, termine pasamanos, termine lamina microperforada, y termine pintura de baranda

Solicitamos al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza en la instalacion de laminas microperforadas, se avanza en pintura del pasamanos.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de laminas microperforadas, se pinta una parte del pasamanos.

8.2. . Componente ambiental
- Se remite a la entidad el informe ambiental N°3 del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD acopiados en los colegios Manuel Cepeda Sede C y Sede A
- Se solicita
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4

8.3. .Componente SST
- El contratista de obra realizo el retiro del andamio utilizados en el Colegio Francisco Miranda
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe SST N°4
- Se requiere atender el requerimiento de ausencia de profesional SST.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza revisión y aprobación de informe 3 de contratista quedando pendiente la entrega del certificado de igol denso

9. Observaciones:

9,1 que realice detalles de acabado del pasamanos, e instale lamina microperforada, y realice correccion del piso caucho en patio de preescolar

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS

			
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	PASAMANOS SIN REMATAR
			
DESPRENDIMIENTO DE GRANULO DE CAUCHO EN PATIO DE PREESCOLAR	DESPRENDIMIENTO DE GRANULO DE CAUCHO EN PATIO DE PREESCOLAR	DESPRENDIMIENTO DE GRANULO DE CAUCHO EN PATIO DE PREESCOLAR	PINTURA LEVANATADA EN PATIO DE PREESCOLAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

		INTERVENTORIA
	18	CONSORCIO SANTA MARIA 022
26/02/2024	3/03/2024	

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	PORFIRIO BARBA JACOB	CALLE 70 A SUR # 81G-13	BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	18	Fecha de corte:	domingo, 3 de marzo de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
PORFIRIO BARBA JACOB	Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	4-mar-24 25-mar-24	1.872.883,38	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
TOTAL		**1.872.883,38**	**100,00%**	**-**		**0,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	25-mar-24

6. Pendientes

Teniendo en cuenta los valores que se tienen conciliados a la fecha de los frentes contractuales,

			VALORES CON AIU		
PRIORIZADOS	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 26/02/24	DIFERENCIA
X	MANUEL CEPEDA VARGAS C	$196.472.139	$194.622.930	$1.849.209
X	MANUEL CEPEDA VARGAS A	$278.280.423	$151.182.427	$127.097.996
X	INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$360.222.580	$344.901.599	$15.320.974
X	VILLA RICA	$361.217.829	$191.848.828	$169.369.001
X	FRANCISCO DE MIRANDA	$1.054.005.882	$526.854.850	$527.151.032
X	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$394.952.505	$249.145.906	$145.806.599
X	CARLOS ALBAN HOLGUIN	$993.476.169	$1.178.347.270	-$184.871.107
	JORGE ISAACS	$192.233.340	$209.535.090	-$17.301.750
	RURAL LA CONCEPCION	$357.497.722	$253.510.561	$103.987.161
	JOSE ANTONIO GALAN	$488.591.223	$568.111.194	-$68.520.971
	BOSANOVA	$281.266.560	$158.793.260	$122.475.326
X	SAN BERNARDINO	$805.249.158	$983.871.475	-$178.622.323
	MOTORISTA	$204.680.169	$214.025.550	-$9.345.381
	DILE	$534.784.887	$564.079.581	-$29.755.894
	SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$6.298.330.877	$5.583.837.899	$714.520.208
	EMERGENCIAS			
	FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B		$ 43.200.525,00	
	ESPERALDA ARBOLEDA SEDE A		$ 16.233.375,00	
	CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		$ 61.222.267,00	
	SUBTOTAL EMERGENCIAS	$ 407.393.727,00	$123.740.169	
	VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$ 6.330.812.340,00	$5.563.932.904	$ 766.879.215,81
	VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 407.393.727,00	$123.740.169	$ 283.653.562,00
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 6.738.106.067,00	$5.687.572.769	$ 1.050.561.257,81

Adelanto/Atraso (Días):

Fecha Proyectada de Terminación: 25-mar-24

como se muestra en la imagen, tenemos un saldo para los frentes contractuals de $ 766 millones y teniendo en cuenta lo ejecutado en emergencias a la fecha , se tiene un saldo de $283 millones para un total de $1050 millones.

Solicitamos al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*entregar la propuesta de cubierta de jose antonio galan ajustada.
*entregar la propuesta del colegio motorista, para porder defnir un presupuesto
*Tambien es importante ajustar el presupuesto de la emergencia del colegio carlos pizarro. Por otro lado solicitamos a la entidad la pronta definicion del diseño del colegio la concepcion de acuerdo con la visita del arq alejandro y programar la visita del Dile Bosa para definir el alcance final y sacar el presupuesto. Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se realiza visita en compañía de la interventoria y contratista a la sede educativa para analizar la emergencia, se verifica en sitio que la emergencia es por motivo de filtraciones de agua de dos sanitarios en la bateria sanitaria de mujeres del tercer piso,

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la visita a la sede educativa para analizar la emergencia, se verifica en sitio que la emergencia es por motivo de filtraciones de agua de dos sanitarios en la bateria sanitaria de mujeres del tercer piso,

8.2. . Componente ambiental
- Se remite a la entidad el informe ambiental N°3 del contratista de obra.
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD acopiados en los colegios Manuel Cepeda Sede C y Sede A
- Se solicita
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4

8.3. .Componente SST
- El contratista de obra realizo el retiro del andamio utilizados en el Colegio Francisco Miranda
- Se solicita al contratista de obra remitir el informe SST N°4
- Se requiere atender el requerimiento de ausencia de profesional SST.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza revisión y aprobación de informe 3 de contratista quedando pendiente la entrega del certificado de igol denso

9. Observaciones:

9,1 que entregue propuesta de intervencion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS




PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS

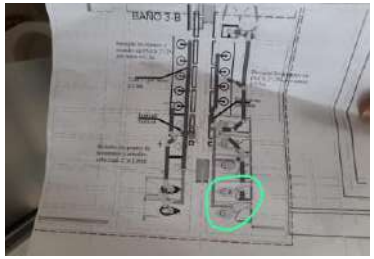			
PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**	**PASAMANOS SIN REMATAR**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	18
26/02/2024	3/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 18 — Fecha de corte: 3/03/2024

CARLOS ALBAN HOLGUIN	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.528.837.537,71	100,00%	62,30%	46,33%	-15,97%	708.310.431,22
TOTAL			**1.528.837.537,71**	**100,00%**	**-**		**-15,97%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Continúa la instalación de ventanas en las aulas del Bloque B

7.2. Avanza la instalación de la lámina inferior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1 y 2 del Bloque C

7.3. Continúa la instalación de la estructura de cubierta sobre el aula 4 del Bloque C

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.El Contratista debe continuar con la ejecución de las obras de acuerdo con la programación presentada y aprobada por la Interventoría

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B



AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B



AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B



AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B



AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B



AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B



AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B



AVANZA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

			
RESANE DE ALFAJÍAS Y CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	RESANE DE ALFAJÍAS Y CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	RESANE DE ALFAJÍAS Y CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	RESANE DE ALFAJÍAS Y CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B
			
SE EVIDENCIAN MANCHAS DE ESTUCO EN LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO DEL BLOQUE B	SE EVIDENCIAN MANCHAS DE ESTUCO EN LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO DEL BLOQUE B	SE EVIDENCIAN MANCHAS DE ESTUCO EN LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO DEL BLOQUE B	SE EVIDENCIAN MANCHAS DE ESTUCO EN LA CARPINTERÍA DE ALUMINIO DEL BLOQUE B
			
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 1 DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 1 DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C
			
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C	INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 2 DEL BLOQUE C

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	18
26/02/2024	3/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	18	Fecha de corte:	3/03/2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23 6-ene-23	150.113.989,56	100,00%	100,00%	99,97%	-0,03%	150.068.955,36
TOTAL		**150.113.989,56**	**100,00%**	**-**		**-0,03%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	6-ene-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24

6. Pendientes

* Sigue pendiente que el Contratista remate las actividades de los pasamanos de las escaleras e instale el nuevo piso de la tarima en el patio central

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Se retiran los RCD ubicados al lado de la tarima

7.2. Se realizan retoques finales a los pasamanos de las cuatro (4) escaleras

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra

9. Observaciones:

9.1. Durante la presente semana se evidencia que iniciaron las actividades de obra, disminuyó la brecha de atraso del avance ejecutado vs el avance programado.

9.2. El Contratista debe rematar las actividades de obra, para subsanar el atraso evidenciado

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA



REPARACIÓN DE PIEZAS AVERIADAS EN EL MADERAMEN SINTÉTICO DE LA TARIMA



REINSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO EN POLISOMBRA AL LADO DE LA TARIMA






REINSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO EN POLISOMBRA AL LADO DE LA TARIMA



REINSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO EN POLISOMBRA AL LADO DE LA TARIMA



REINSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO EN POLISOMBRA AL LADO DE LA TARIMA

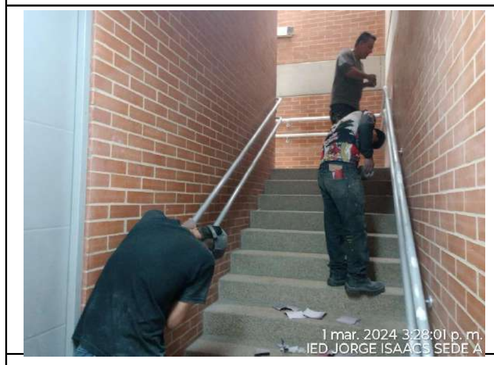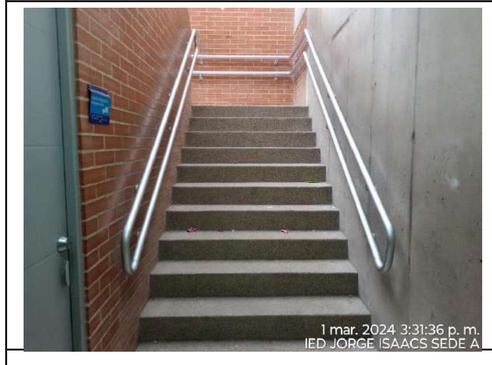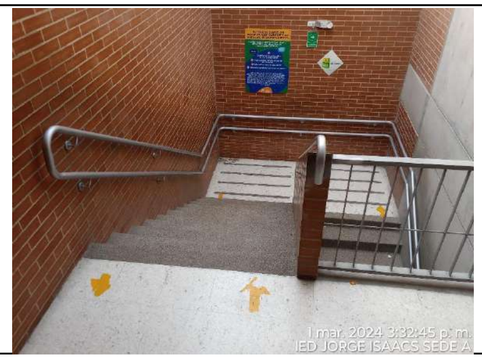			
RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 1, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA	**RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 1, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA**	**RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 1, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA**	**RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 1, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA**
			
LIJADO DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 2	**LIJADO DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 2**	**LIJADO DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 2**	**LIJADO DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 2**
			
PINTURA APLICADA A LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3	**PINTURA APLICADA A LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3**	**PINTURA APLICADA A LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3**	**PINTURA APLICADA A LOS PASAMANOS DE LA ESCALERA 3**
			
RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 4, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA	**RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 4, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA**	**RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 4, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA**	**RESANES DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA 4, PENDIENTES DE REMATE DE PINTURA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	18
26/02/2024	3/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 18 | Fecha de corte: 3/03/2024

SAN BERNARDINO	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.000.000,00	100,00%	100,00%	85,00%	-15,00%	765.000.000,00
TOTAL			**900.000.000,00**	**100,00%**	**-**		**-15,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista finalice la obra en la cubierta de Auditorio y del área de Orientación

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza la instalación de red eléctrica para las luminarias de emergencia en el tercer piso

7.2. Avanza la instalación de luminarias de emergencia en el tercer piso

7.3. Continúa la instalación de los mesones en policuarzo en los baños del segundo y del tercer piso

7.4. Inicia el desmonte del manto asfáltico y la demolición del mortero de nivelación en las cubiertas planas de la sede educativa

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. Se realiza un ajuste al balance de esta Sede Educativa, depurando las actividades que no se van a ejecutar e incorporando las actividades requeridas por la supervisión del contrato durante el recorrido conjunto del 27 de febrero de 2024. Para efectos del presente informe semanal se establece un avance cercano al 85 % sobre un presupuesto estimado en $ 900.000.000

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



RECORRIDO CONJUNTO CON RECTORÍA Y SUPERVISIÓN PARA DETERMINAR MÁS ALCANCE



RECORRIDO CONJUNTO CON RECTORÍA Y SUPERVISIÓN PARA DETERMINAR MÁS ALCANCE



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO



ESCENARIO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

			
DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA	DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA	DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA	DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA
			
DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO Y DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN	DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO Y DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN	DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO Y DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN	DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN
			
DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN	DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DEL COSTADO ORIENTAL	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DEL COSTADO ORIENTAL
			
INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DEL COSTADO NORTE	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DEL COSTADO NORTE	SE REITERA LA SOLICITUD DE RETIRAR LOS RCD	SE REITERA LA SOLICITUD DE RETIRAR LOS RCD

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-52575

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	13/03/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL DELGADO
Documento	79573492
Teléfono	
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	
OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	
Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-202 - Remision informe semanal No. 19, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-202 - Remision informe semanal No. 19. El usuario adjuntó 1 archivos.
No. Folios	1
Anexos	
Documentos Adjuntos	
E-2024-52575_1.pdf	

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-202

Bogotá D.C., 13 de marzo de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 19

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 19, correspondiente al periodo comprendido entre el 04 de marzo al 10 de marzo de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (33) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

			19	Interventor:	CONSORCIO SANTA MARIA 022
4/03/2024	al	10/03/2024			

1. Datos Generales

Nombre:

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
COLEGIO SAN	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

Localidad:

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			CONSORCIO SANTA MARIA 022						
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	
				Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00						
Adición:			$ -						
Anticipo:			$ -						
Retegarantía:			$ -						
			Neto Acta						
			Acumulado						

4.	**Programación.**			Semana No.	**19**	Fecha de corte:	10-mar-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

N°	**Capítulos:**	**LOCALIDAD**	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**% Inversión**
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	27-feb-24	$ 237.282.418,19	**3,75%**	97,00%	91,95%	-5,05%	$ 218.181.184
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 146.522.599,47	**2,31%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 146.522.599
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	18-mar-24	$ 346.476.368,55	**5,47%**	45,00%	19,83%	-25,17%	$ 68.706.264
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 168.135.174,39	**2,66%**	96,00%	80,98%	-15,02%	$ 136.155.864
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 524.154.439,77	**8,28%**	98,00%	72,14%	-25,86%	$ 378.125.013
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 273.358.609,63	**4,32%**	96,00%	92,51%	-3,49%	$ 252.884.050
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.528.837.537,71	**24,15%**	67,16%	46,68%	-20,48%	$ 713.661.363
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 150.113.989,56	**2,37%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 150.113.990
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 253.510.561,49	**4,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 543.111.193,70	**8,58%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 158.793.259,67	**2,51%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.000.000,00	**14,22%**	100,00%	86,00%	-14,00%	$ 774.000.000
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 214.029.550,15	**3,38%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 364.078.580,55	**5,75%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	**6,43%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 6.215.756.471**	**98,18%**	**56,03%**	**44,83%**	**-**	**$ 2.838.350.326**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**

-11,19%	**DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

Se requiere al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
*entregar la propuesta de cubierta de jose antonio galan ajustada.
*entregar la propuesta del colegio motorista, para porder defnir un presupuesto
*Tambien es importante ajustar el presupuesto de la emergencia del colegio carlos pizarro. Por otro lado solicitamos a la entidad la pronta definicion del diseño del colegio la concepcion de acuerdo con la visita del arq alejandro y programar la visita del Dile Bosa para definir el alcance final y sacar el presupuesto. Finalmente solicitamos al contratista entregar los NPS ajustados, de las observaciones enviadas el pasado jueves. hay frentes como jorge isaac que requiere urgente la ejecucion de una actividad que es un no previsto.

6

PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	**TOTAL**
6.330.813.879,00									**6.330.813.879,00**
29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista avanza con fundicion de placa en graderias, se avanza con pintura en fachada principal de la institucionl, se avanza con demolicion de placa y excavacion manual en cuarto de rack y aula 107,
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	el contratista avanza con remates de acabado de las ventanas, se avanza con demolicion de placa de enchape y placa de contrapiso.
COLEGIO VILLA RICA	el contratista avanza con muros en superboard del shut de basuras, se avanza con masilla y pintura de shut de basuras, avanza con redes electricas en shut de basuras, avanza con el suministro de piso caucho SBR y EPDM para patio de preescolar, se avanza en el desmonte de la estructura en patio de preescolar para realziar correccion.
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	el contratista no avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias, avanza en la construccion de cajas de inspeccion y trampa de grasas, avanza en la instalacion de tuberia sanitaria de aguas lluvias, se avanza en la instlacion de la cubierta de patios internos
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	el contratista avanza en la instalacion de laminas microperforadas, y se avanza con pintura del pasamanos.
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Continúa la instalación de ventanas en las aulas del Bloque B, Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1 y 2 del Bloque C, Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta del aula 4 del Bloque C, Inicia el estuco de muros de las aulas del Bloque B
COLEGIO JORGE ISAAC	Se realizan retoques finales al pasamanos de la escalera No.3 y se da por recibida dicha actividad, Queda pendiente la aprobación de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima
COLEGIO SAN BERNARDINO	Continúa el desmonte del manto asfáltico y la demolición del mortero de nivelación en las cubiertas planas de la sede educativa, Finaliza la instalación de luminarias de emergencia en el tercer piso

8 **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se recibe el informe SST N°4 del contratista, el cual fue revisado y cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Desde la coordinación de interventoría se aprobó la hoja de vida de la nueva profesional sst del contratista, así mismo, se revisa y se aprueba su documentación de ingreso.

9 **SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**

- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y demás materiales ubicados en los acopios ubicados en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se solicita al contratista de obra remitir los formatos pendientes de trazabilidad RCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

10 **REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				
COLEGIO VILLA RICA:	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**

				
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**	**COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:**
				
EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	**EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:**	**EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:**	**EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:**	**EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:**
				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:**	**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:**	**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:**	**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:**
				

COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO:**	**COLEGIO SAN BERNARDINO:**	**COLEGIO SAN BERNARDINO:**	**COLEGIO SAN BERNARDINO:**
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	19
4/03/2024	10/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	19	Fecha de corte:	10/03/2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
CARLOS ALBAN HOLGUIN	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.528.837.537,71	100,00%	67,16%	46,68%	-20,48%	713.661.362,60
TOTAL			**1.528.837.537,71**	**100,00%**	**-**		**-20,48%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24	

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Continúa la instalación de ventanas en las aulas del Bloque B

7.2. Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1 y 2 del Bloque C

7.3. Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta del aula 4 del Bloque C

7.4. Inicia el estuco de muros de las aulas del Bloque B

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y demás materiales ubicados en los acopios ubicados en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se solicita al contratista de obra remitir los formatos pendientes de trazabilidad RCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°4 del contratista, el cual fue revisado y cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Desde la coordinación de interventoría se aprobó la hoja de vida de la nueva profesional sst del contratista, así mismo, se revisa y se aprueba su documentación de ingreso.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza consolidado de temas pendientes correspondientes al componente de calidad para documentación de presunto incumplimiento

9. Observaciones:

9.1.El Contratista debe continuar con la ejecución de las obras de acuerdo con la programación presentada y aprobada por la Interventoría

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B



SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B



SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B



SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

			
SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B
			
OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B
			
OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B
			
OBSERVACIONES A LOS CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	OBSERVACIONES A LOS CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	OBSERVACIONES A LOS CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	OBSERVACIONES A LOS CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

			
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 4 DEL BLOQUE C	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 4 DEL BLOQUE C**	**INICIA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**	**INICIA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	19
4/03/2024	10/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	19	Fecha de corte:	10/03/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
SAN BERNARDINO	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.000.000,00	100,00%	100,00%	86,00%	-14,00%	774.000.000,00
TOTAL			**900.000.000,00**	**100,00%**	**-**		**-14,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24	

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista finalice la obra en la cubierta de Auditorio y del área de Orientación

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Continúa el desmonte del manto asfáltico y la demolición del mortero de nivelación en las cubiertas planas de la sede educativa

7.2. Finaliza la instalación de luminarias de emergencia en el tercer piso

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y demás materiales ubicados en los acopios ubicados en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se solicita al contratista de obra remitir los formatos pendientes de trazabilidad RCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°4 del contratista, el cual fue revisado y cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Desde la coordinación de interventoría se aprobó la hoja de vida de la nueva profesional sst del contratista, así mismo, se revisa y se aprueba su documentación de ingreso.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza consolidado de temas pendientes correspondientes al componente de calidad para documentación de presunto incumplimiento

9. Observaciones:

9.1. Se realiza un ajuste al balance de esta Sede Educativa, depurando las actividades que no se van a ejecutar e incorporando las actividades requeridas por la supervisión del contrato durante el recorrido conjunto del 27 de febrero de 2024. Para efectos del presente informe semanal se establece un avance cercano al 85 % sobre un presupuesto estimado en $ 900.000.000

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA



DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA



DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN



DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO



ESCENARIO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

			
LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO	LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO	LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO	LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO
			
LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO	LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO	LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO	LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO
			
LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO	LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO	LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO	LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO
			
LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO	LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO	LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO	LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	19
4/03/2024	10/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	19	Fecha de corte:	10/03/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	6-ene-23	150.113.989,56	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	150.113.989,56
TOTAL			**150.113.989,56**	**100,00%**	**-**		**0,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	6-ene-24	* Queda pendiente la aprobación del NP para la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Se realizan retoques finales al pasamanos de la escalera No.3 y se da por recibida dicha actividad

7.2. Queda pendiente la aprobación de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y demás materiales ubicados en los acopios ubicados en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se solicita al contratista de obra remitir los formatos pendientes de trazabilidad RCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°4 del contratista, el cual fue revisado y cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Desde la coordinación de interventoría se aprobó la hoja de vida de la nueva profesional sst del contratista, así mismo, se revisa y se aprueba su documentación de ingreso.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza consolidado de temas pendientes correspondientes al componente de calidad para documentación de presunto incumplimiento

9. Observaciones:

9.1. Durante la presente semana se evidencia que iniciaron las actividades de obra, disminuyó la brecha de atraso del avance ejecutado vs el avance programado.

9.2. El Contratista debe rematar las actividades de obra, para subsanar el atraso evidenciado

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
PINTURA FINAL EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS	**PINTURA FINAL EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**	**PINTURA FINAL EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**	**PINTURA FINAL EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**

			
PINTURA FINAL EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS	**PINTURA FINAL EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**	**PINTURA FINAL EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**	**PINTURA FINAL EN LOS PASAMANOS DE LAS ESCALERAS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	19
4/03/2024	10/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	CARRERA 83- # 46 B SUR	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	19	Fecha de corte:	domingo, 10 de marzo de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	16-mar-24	237.282.418,19	100,00%	97,00%	91,95%	5,05%	218.181.183,53
TOTAL			**237.282.418,19**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	16-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

Pendiente que el contratista termine relleno en recebo, placa de contrapiso, enchape de pisos, termine pintura de aulas de ingles y rack, pendiente remates en las graderias

	Fecha Proyectada de Terminación:	16-mar-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con fundicion de placa en graderias

7.2 el contratista avanza con pintura en fachada principal de la institucion

7.3 el contratista avanza con excavacion manual del cuarto de rack y aula 107, y acopio de material RCD

7.4 el contratista avanza con instalacion de geotextil y relleno de recebo con material reciclado en aula de ingles

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la pintura en fachada principal, excavacion manual del cuarto de rack y aula 107, y acopio de material RCD, fundicion de placa en graderias, instalacion de geotextil y relleno de recebo con material reciclado en aula de ingles

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y demás materiales ubicados en los acopios ubicados en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se solicita al contratista de obra remitir los formatos pendientes de trazabilidad RCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°4 del contratista, el cual fue revisado y cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Desde la coordinación de interventoría se aprobó la hoja de vida de la nueva profesional sst del contratista, así mismo, se revisa y se aprueba su documentación de ingreso.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza consolidado de temas pendientes correspondientes al componente de calidad para documentación de presunto incumplimiento

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista avanzar con las obras de relleno, placa de contrapiso y enchape de aulas ingles y rack

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
CONSTRUCCION Y FUNDICION DE ESCALERA EN GRADERIAS	**CONSTRUCCION Y FUNDICION DE ESCALERA EN GRADERIAS**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y SIN AVANCE EN RELLENO AULA DE INGLES**	**FUNDICION DE PLACA GRADERIA**

			
CONSTRUCCION Y FUNDICION DE ESCALERA EN GRADERIAS	IMPERMEABILIZACION MUROS AULA DE RACK	CONSTRUCCION Y FUNDICION DE ESCALERA EN GRADERIAS	PINTURA DE FACHADA
			
PINTURA DE FACHADA	PINTURA DE FACHADA	PINTURA DE FACHADA	PINTURA DE FACHADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	19	
4/03/2024	10/03/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C		CALLE 38 SUR BIS # 89-81		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	19	Fecha de corte:	domingo, 10 de marzo de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	14-nov-23	18-mar-24	346.476.368,55	100,00%	45,00%	19,83%	25,17%	68.706.263,88
TOTAL			**346.476.368,55**	**100,00%**	**-**		**25,17%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	18-mar-24	**6. Pendientes**

	Adelanto/Atraso (Días):		termine los detalles de acabado de las ventanas, suministre e instale lamina microperforada
	Fecha Proyectada de Terminación:	18-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con remates de acabado de las ventanas, se avanza con demolicion de placa de enchape y placa de contrapiso.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento a la sede educativa, con remates de acabado de las ventanas, se avanza con demolicion de placa de enchape y placa de contrapiso.

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y demás materiales ubicados en los acopios ubicados en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se solicita al contratista de obra remitir los formatos pendientes de trazabilidad RCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°4 del contratista, el cual fue revisado y cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Desde la coordinación de interventoría se aprobó la hoja de vida de la nueva profesional sst del contratista, así mismo, se revisa y se aprueba su documentación de ingreso.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza consolidado de temas pendientes correspondientes al componente de calidad para documentación de presunto incumplimiento

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista termine las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio, que coordine con el rector de la institucion el inicio de las obras de los pisos en las aulas, que el contratista suministre e instale las laminas microperforadas en el cerramiento exterior

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
CERRAMIENTO DE ZONA DE TRABAJO	**DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONTRAPISO**	**DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONTRAPISO**	**DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONTRAPISO**

			
DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONTRAPISO	REMATES DE ACABADO DE LAS VENTANAS	REMATES DE ACABADO DE LAS VENTANAS	SIN AVANCE EN LA LAMINA MICROPERFORADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	19	INTERVENTORIA
4/03/2024	10/03/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	VILLA RICA SEDE B		CALLE 49 SUR # 78-35			KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	19	Fecha de corte:	domingo, 10 de marzo de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	15-mar-24	168.135.174,39	100,00%	96,00%	80,98%	15,02%	136.155.864,22
TOTAL			**168.135.174,39**	**100,00%**	**-**		**15,02%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

	Adelanto/Atraso (Días):		pendiente que el contratista termine las obras de enchape, cubierta, puertas, ventanas, iluminacion, tomas e interruptores en el shut de basuras, termine estructura y piso caucho en patio de preescolar
	Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se avanza con masilla y pintura de shut de basuras

7.2 se avanza en el desmonte de la estructura en patio de preescolar para realziar correccion.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de masilla y pintura de shut de basuras, y en el desmonte de la estructura en patio de preescolar para realziar correccion.

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y demás materiales ubicados en los acopios ubicados en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se solicita al contratista de obra remitir los formatos pendientes de trazabilidad RCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°4 del contratista, el cual fue revisado y cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Desde la coordinación de interventoría se aprobó la hoja de vida de la nueva profesional sst del contratista, así mismo, se revisa y se aprueba su documentación de ingreso.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza consolidado de temas pendientes correspondientes al componente de calidad para documentación de presunto incumplimiento

9. Observaciones:

9,1 que el contratista ingrese personal y material de obra, que avance con laas obras del patio de preescolar, shut de basuras y zona administrativa

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
PINTURA DE MUROS EN PATIO DE PREESCOLAR	**PINTURA DE MUROS EN PATIO DE PREESCOLAR**	**PINTURA DE MUROS EN PATIO DE PREESCOLAR**	**SIN AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR**

			
AVANCE DE OBRA POCETA SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA MASILLA Y PINTURA SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA MASILLA Y PINTURA SHUT DE BASURAS	AVANCE DE OBRA MASILLA Y PINTURA SHUT DE BASURAS
			
DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA PATIO DDE PREESCOLAR	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA PATIO DDE PREESCOLAR	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA PATIO DDE PREESCOLAR	ACOPIO DE RCD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

		INTERVENTORIA
	19	CONSORCIO SANTA MARIA 022
4/03/2024	10/03/2024	

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	19	Fecha de corte:	domingo, 10 de marzo de 2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
FRANCISCO MIRANDA	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	14-mar-24	524.154.439,77	100,00%	98,00%	72,14%	25,86%	378.125.012,85
TOTAL			**524.154.439,77**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine detalles de acabado de la bateria sanitaria, termine excavacion de tanque de almacenamiento y excavacion e instalacion de redes de aguas lluvias

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 En esta semana el contratista avanza en remates de la bateria sanitaria

7.2 el contratista avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias

7.3 el contratista avanza en la construccion de cajas de inspeccion y trampa de grasas

7.4 el contratista avanza en la instalacion de la cubierta de patios internos

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en remates de la bateria sanitaria, excavacion para redes de aguas lluvias, instalacion de la cubierta de patios internos

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y demás materiales ubicados en los acopios ubicados en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se solicita al contratista de obra remitir los formatos pendientes de trazabilidad RCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°4 del contratista, el cual fue revisado y cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Desde la coordinación de interventoría se aprobó la hoja de vida de la nueva profesional sst del contratista, así mismo, se revisa y se aprueba su documentación de ingreso.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza consolidado de temas pendientes correspondientes al componente de calidad para documentación de presunto incumplimiento

9. Observaciones:

9,1 Pendiente que el contratista realice remates de acabado en bateria sanitaria, asi mismo intervenir aula de sistemas

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



AVANCE DE OBRA EN REDES DE AGUAS LLUVIAS



LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE LADRILLOS BATERIA SANITARIA



ACOPIO DE RCD



INSTALACION CUBIERTA PATIOS INTERNOS









INSTALACION CUBIERTA PATIOS INTERNOS	INSTALACION CUBIERTA PATIOS INTERNOS	EXCAVACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO	AVANCE DE OBRA EN REDES DE AGUAS LLUVIAS
			
REMATES BATERIA SANITARIA	REMATES BATERIA SANITARIA	REMATES BATERIA SANITARIA	REMATES BATERIA SANITARIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	19	INTERVENTORIA
4/03/2024	10/03/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	MANUEL ZAPATA OLIVELLA		CALLE 1 BIS # 87-84		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	19	Fecha de corte:	domingo, 10 de marzo de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	20-nov-23 19-mar-24	273.358.609,63	100,00%	96,00%	92,51%	3,49%	252.884.049,77
TOTAL		**273.358.609,63**	**100,00%**	**-**		**3,49%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	19-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista retire rcd de la zona exterior, termine pasamanos, termine lamina

		microperforada, y termine pintura de baranda
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	19-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza en la instalacion de laminas microperforadas, se avanza en pintura del pasamanos, y realiza correcion del piso caucho

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de laminas microperforadas, se pinta una parte del pasamanos, y arreglo piso caucho

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y demás materiales ubicados en los acopios ubicados en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se solicita al contratista de obra remitir los formatos pendientes de trazabilidad RCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°4 del contratista, el cual fue revisado y cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Desde la coordinación de interventoría se aprobó la hoja de vida de la nueva profesional sst del contratista, así mismo, se revisa y se aprueba su documentación de ingreso.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza consolidado de temas pendientes correspondientes al componente de calidad para documentación de presunto incumplimiento

9. Observaciones:

9,1 que realice detalles de acabado del pasamanos, e instale lamina microperforada, y realice correccion del piso caucho en patio de preescolar

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS









PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	ARREGLO PISO CAUCHO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	19	INTERVENTORIA
4/03/2024	10/03/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	PORFIRIO BARBA JACOB	CALLE 70 A SUR # 81G-13	BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	19	Fecha de corte:	domingo, 10 de marzo de 2024

PORFIRIO BARBA JACOB	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	4-mar-24	25-mar-24	1.872.883,38	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
TOTAL			**1.872.883,38**	**100,00%**	-		**0,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	25-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

avanzar con las obras de demolicion y adecuacion de las filtraciones

Fecha Proyectada de Terminación:	25-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se realiza cerramiento de la zona a intervenir y se comienza con apiques y demoliciones bajo la placa para revisar filtraciones, se realiza mamposteria y pañete

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en el cerramiento de la zona a intervenir y se comienza con apiques y demoliciones bajo la placa para revisar filtraciones, se realiza mamposteria y pañete

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro de RCD y demás materiales ubicados en los acopios ubicados en los colegios donde se están ejecutando actividades.
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se solicita al contratista de obra remitir los formatos pendientes de trazabilidad RCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°4 del contratista, el cual fue revisado y cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Desde la coordinación de interventoría se aprobó la hoja de vida de la nueva profesional sst del contratista, así mismo, se revisa y se aprueba su documentación de ingreso.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza consolidado de temas pendientes correspondientes al componente de calidad para documentación de presunto incumplimiento

9. Observaciones:

9,1 que entregue propuesta de intervencion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
ADECUACION FILTRACIONES BATERIA SANITARIA	ADECUACION FILTRACIONES BATERIA SANITARIA	ADECUACION FILTRACIONES BATERIA SANITARIA	ADECUACION FILTRACIONES BATERIA SANITARIA
			
ADECUACION FILTRACIONES BATERIA SANITARIA	ADECUACION FILTRACIONES BATERIA SANITARIA	ADECUACION FILTRACIONES BATERIA SANITARIA	ADECUACION FILTRACIONES BATERIA SANITARIA

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-55985

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	20/03/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL DELGADO
Documento	79573492
Teléfono	
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	

OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-217 - Remision informe semanal No. 20, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-217 - Remision informe semanal No. 20
No. Folios	0
Anexos	
Documentos Adjuntos	

E-2024-55985_1.pdf

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-217

Bogotá D.C., 20 de marzo de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 20

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 20, correspondiente al periodo comprendido entre el 11 de marzo al 17 de marzo de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (31) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

11/03/2024	**al**	**17/03/2024**	**Interventor:**	**CONSORCIO SANTA MARIA 022**

1. Datos Generales

Nombre:

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
COLEGIO SAN	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

Localidad:

2.

Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	**No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3.

Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**No. CO1.PCCNTR.5313251**				

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			CONSORCIO SANTA MARIA 022						
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	
				Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00						
Adición:			$ -						
Anticipo:			$ -						
Retegarantía:			$ -						
			Neto Acta						
			Acumulado						

4.	**Programación.**			Semana No.	**20**	Fecha de corte:	17-mar-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

N°	**Capítulos:**	**LOCALIDAD**	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**% Inversión**
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	16-mar-24	$ 239.369.541,34	**3,78%**	100,00%	92,56%	-7,44%	$ 221.560.447
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 146.522.599,47	**2,31%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 146.522.599
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	29-abr-24	$ 346.476.368,55	**5,47%**	49,00%	20,44%	-28,56%	$ 70.830.651
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 168.135.174,39	**2,66%**	100,00%	88,19%	-11,81%	$ 148.284.350
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 524.154.439,77	**8,28%**	100,00%	86,25%	-13,75%	$ 452.087.449
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 273.358.609,63	**4,32%**	99,00%	94,71%	-4,29%	$ 258.903.948
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.528.837.537,71	**24,15%**	72,95%	47,00%	-25,95%	$ 718.553.643
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 150.113.989,56	**2,37%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 150.113.990
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 253.510.561,49	**4,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 543.111.193,70	**8,58%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 158.793.259,67	**2,51%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.000.000,00	**14,22%**	100,00%	86,25%	-13,75%	$ 776.250.000
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 214.029.550,15	**3,38%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 364.078.580,55	**5,75%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	**6,43%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 6.217.843.594**	**98,22%**	**58,19%**	**46,49%**	**-**	**$ 2.943.107.077**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**

-11,70%	**DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

Se requiere al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
terminar los frentes de obra que a la fecha tienen fecha de programacion al 100%

6

PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	**TOTAL**
6.330.813.879,00									**6.330.813.879,00**
29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista termina con fundicion de placa en graderias, se avanza con pintura en fachada principal de la institucionl, durante la semana no se avanza con demolicion de placa y excavacion manual en cuarto de rack y aula 107,
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	el contratista avanza con remates de acabado de las ventanas, se avanza con demolicion de placa de enchape y placa de contrapiso.
COLEGIO VILLA RICA	el contratista avanza con muros en superboard del shut de basuras, se avanza con masilla y pintura de shut de basuras, avanza con la estructura en patio de preescolar
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	el contratista avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias y tanque aquacell, avanza con reates y cambio de lavamanos en bateria sanitaria
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	el contratista no avanza en la instalacion de laminas microperforadas, y no se avanza con pintura del pasamanos. Se realiza aseo zona exterior
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas del Bloque B, Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1, 2 y 4 del Bloque C, Continúa el estuco de muros de las aulas del Bloque B, Inicia el estuco de muros de las aulas del Bloque C
COLEGIO JORGE ISAAC	No se desarrollan actividades de obra esta semana, Queda pendiente la aprobación de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima
COLEGIO SAN BERNARDINO	Se realiza reparación del cielo raso en el baño de hombres del segundo piso, Inicia la instalación de luminarias en el costado sur del tercer piso, Inicia la demolición del muro a la entrada del baño del tercer piso

8 **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se aprueba y se radica en la entidad el informe SST N°4 del contratista de obra.
- Se radica en la entidad el informe SST N°4 de interventoría.
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra, residente y maestro de obra.

9 **SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**

- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se revisan y se remiten observaciones a los formatos de trazabilidad RCD y PGRCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El día viernes 15/03/2024 se realiza recorrido del componente ambiental con los profesionales de la entidad y contratista.

10 **REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				
COLEGIO VILLA RICA:	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**

				
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:
				
EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:
				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	20
11/03/2024	17/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	20	Fecha de corte:	17/03/2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
CARLOS ALBAN HOLGUIN	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.528.837.537,71	100,00%	72,95%	47,00%	-25,95%	718.553.642,72
TOTAL			**1.528.837.537,71**	**100,00%**	**-**		**-25,95%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24	

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas del Bloque B

7.2. Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1, 2 y 4 del Bloque C

7.3. Continúa el estuco de muros de las aulas del Bloque B

7.4. Inicia el estuco de muros de las aulas del Bloque C

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST
- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.El Contratista debe continuar con la ejecución de las obras de acuerdo con la programación presentada y aprobada por la Interventoría

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B</td>
<td>AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B</td>
<td>AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B</td>
<td>AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>AVANZA EL RESANE DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE C</td>
<td>AVANZA EL RESANE DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE C</td>
<td>AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE C</td>
<td>AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE C</td>
</tr>
</table>

			
INICIA EL RESANE DE FILOS EN LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	INICIA EL RESANE DE FILOS EN LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	INICIA EL RESANE DE FILOS EN LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B	INICIA EL RESANE DE FILOS EN LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B
			
AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B
			
AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B	AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B
			
RETIRO DE RCD DEL SITIO DE OBRA	RETIRO DE RCD DEL SITIO DE OBRA	RETIRO DE RCD DEL SITIO DE OBRA	ACOPIO DE MATERIAL DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	20
11/03/2024	17/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	20	Fecha de corte:	17/03/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
SAN BERNARDINO	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.000.000,00	100,00%	100,00%	86,25%	-13,75%	776.250.000,00
TOTAL			**900.000.000,00**	**100,00%**	**-**		**-13,75%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista finalice la obra en la cubierta de Auditorio y del área de Orientación

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Se realiza reparación del cielo raso en el baño de hombres del segundo piso

7.2. Inicia la instalación de luminarias en el costado sur del tercer piso

7.3. Inicia la demolición del muro a la entrada del baño del tercer piso

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. Se realiza un ajuste al balance de esta Sede Educativa, depurando las actividades que no se van a ejecutar e incorporando las actividades requeridas por la supervisión del contrato durante el recorrido conjunto del 27 de febrero de 2024. Para efectos del presente informe semanal se establece un avance cercano al 85 % sobre un presupuesto estimado en $ 900.000.000

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
RETIRO DE RCD ACOPIADO EN EL PATIO CENTRAL	RETIRO DE RCD ACOPIADO EN EL PATIO CENTRAL	RETIRO DE RCD ACOPIADO EN EL PATIO CENTRAL	RETIRO DE RCD ACOPIADO EN EL PATIO CENTRAL
			
CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO	CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO	CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO	ESCENARIO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

			
TABLERO ELÉCTRICO DEL AUDITORIO	CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO	CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO	ESCENARIO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO
			
INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR	INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR	INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR	INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR
			
SANITARIOS PENDIENTES DE INSTALAR EN EL BAÑO DE MHOMBRES DEL TERCER PISO	SANITARIOS PENDIENTES DE INSTALAR EN EL BAÑO DE MHOMBRES DEL TERCER PISO	DIVISIONES EN ACERO EN PROCESO DE REPARACIÓN EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO	DIVISIONES EN ACERO EN PROCESO DE REPARACIÓN EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL PISO 2
			
DEMOLICIÓN DE MURO A LA ENTRADA DE LOS BAÑOS DEL TERCER PISO	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO	REPARACIÓN DE CIELO RASO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	20
11/03/2024	17/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	20	Fecha de corte:	17/03/2024

JORGE ISAACS IED	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	6-ene-23	150.113.989,56	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	150.113.989,56
TOTAL			**150.113.989,56**	**100,00%**	**-**		**0,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	6-ene-24	* Queda pendiente la aprobación del NP para la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. No se desarrollan actividades de obra esta semana

7.1. Queda pendiente la aprobación de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escomboro producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra

9. Observaciones:

9.1. Durante la presente semana se evidencia que iniciaron las actividades de obra, disminuyó la brecha de atraso del avance ejecutado vs el avance programado.

9.2. El Contratista debe rematar las actividades de obra, para subsanar el atraso evidenciado

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	20
11/03/2024	17/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C		CARRERA 83- # 46 B SUR		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	20	Fecha de corte:	domingo, 17 de marzo de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	16-mar-24	239.369.541,34	100,00%	100,00%	92,56%	7,44%	221.560.447,46
TOTAL			**239.369.541,34**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	16-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

Pendiente que el contratista termine relleno en recebo, placa de contrapiso, enchape de pisos, termine pintura de aulas de ingles y rack, pendiente remates en las graderias

Fecha Proyectada de Terminación:	16-mar-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con remates de placa en graderias

7.2 el contratista avanza con pintura en fachada principal de la institucion

7.3 el contratista avanza con excavacion manual del cuarto de rack y aula 107, y acopio de material RCD

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la pintura en fachada principal, excavacion manual del cuarto de rack y aula 107, y acopio de material RCD, fundicion de placa en graderias, instalacion de geotextil en aula de ingles

8.2. . Componente ambiental
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se revisan y se remiten observaciones a los formatos de trazabilidad RCD y PGRCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El día viernes 15/03/2024 se realiza recorrido del componente ambiental con los profesionales de la entidad y contratista.

8.3. .Componente SST
- Se aprueba y se radica en la entidad el informe SST N°4 del contratista de obra.
- Se radica en la entidad el informe SST N°4 de interventoría.
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra, residente y maestro de obra.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza solicitud al contratista de la actualización del plan de inspección y ensayo en el cual se incluyan los controles a los ítems de los np aprobados

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista avanzar con las obras de relleno, placa de contrapiso y enchape de aulas ingles y rack

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



REMATES EN GRADERIAS



REMATES EN GRADERIAS



PINTURA DE FACHADA



PINTURA DE FACHADA









PINTURA DE FACHADA	PINTURA DE FACHADA	PINTURA DE FACHADA	PINTURA DE FACHADA
			
AULA DE RACK SIN AVANCE	AULA DE INGLES SIN AVANCE	PINTURA DE FACHADA	RETIRO DE MATERIAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	20	
11/03/2024	17/03/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C		CALLE 38 SUR BIS # 89-81		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	20	Fecha de corte:	domingo, 17 de marzo de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	14-nov-23	29-abr-24	346.476.368,55	100,00%	49,00%	20,44%	28,56%	70.830.650,76
TOTAL			**346.476.368,55**	**100,00%**	**-**		**28,56%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-abr-24	

6. Pendientes

termine los detalles de acabado de las ventanas, suministre e instale lamina microperforada

	Adelanto/Atraso (Días):		termine los detalles de acabado de las ventanas, suministre e instale lamina microperforada, terminar demolicion de placa, excavacion, relleno de recebo y placa en aulas del primer nivel
	Fecha Proyectada de Terminación:	29-abr-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con remates de acabado de las ventanas, se avanza con demolicion de placa de enchape y placa de contrapiso.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento a la sede educativa, con remates de acabado de las ventanas, se avanza con demolicion de placa de enchape y placa de contrapiso.

8.2. . Componente ambiental
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se revisan y se remiten observaciones a los formatos de trazabilidad RCD y PGRCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El día viernes 15/03/2024 se realiza recorrido del componente ambiental con los profesionales de la entidad y contratista.

8.3. .Componente SST
- Se aprueba y se radica en la entidad el informe SST N°4 del contratista de obra.
- Se radica en la entidad el informe SST N°4 de interventoría.
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra, residente y maestro de obra.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza solicitud al contratista de la actualización del plan de inspección y ensayo en el cual se incluyan los controles a los ítems de los np aprobados

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista termine las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio, que coordine con el rector de la institucion el inicio de las obras de los pisos en las aulas, que el contratista suministre e instale las laminas microperforadas en el cerramiento exterior

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA AULAS PRIMER PISO	**CINTA VENTANAS**	**CINTA VENTANAS**	**DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA AULAS PRIMER PISO**

			
DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA AULAS PRIMER PISO	ACOPIO DE MATERIAL	CERRAMIEENTO DE ZONA A INTERVENIR	SIN AVANCE EN LA LAMINA MICROPERFORADA
			
DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA AULAS PRIMER PISO	DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA AULAS PRIMER PISO	DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA AULAS PRIMER PISO	DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA AULAS PRIMER PISO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	20	INTERVENTORIA
11/03/2024	17/03/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	VILLA RICA SEDE B	CALLE 49 SUR # 78-35	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	20	Fecha de corte:	domingo, 17 de marzo de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	15-mar-24	168.135.174,39	100,00%	100,00%	88,19%	11,81%	148.284.350,08
TOTAL			**168.135.174,39**	**100,00%**	**-**		**11,81%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

	Adelanto/Atraso (Días):		pendiente que el contratista termine las obras de enchape, cubierta, puertas, ventanas, iluminacion, tomas e interruptores en el shut de basuras, termine estructura y piso caucho en patio de preescolar
	Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se avanza con masilla y pintura de shut de basuras

7.2 se avanza con la estructura en patio de preescolar.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de masilla y pintura de shut de basuras, y en el desmonte de la estructura en patio de preescolar para realziar correccion.

8.2. . Componente ambiental
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se revisan y se remiten observaciones a los formatos de trazabilidad RCD y PGRCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El día viernes 15/03/2024 se realiza recorrido del componente ambiental con los profesionales de la entidad y contratista.

8.3. .Componente SST
- Se aprueba y se radica en la entidad el informe SST N°4 del contratista de obra.
- Se radica en la entidad el informe SST N°4 de interventoría.
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra, residente y maestro de obra.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza solicitud al contratista de la actualización del plan de inspección y ensayo en el cual se incluyan los controles a los ítems de los np aprobados

9. Observaciones:

9,1 que el contratista ingrese personal y material de obra, que avance con laas obras del patio de preescolar, shut de basuras y zona administrativa

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
REMATES PENDIENTES EN ZONA ADMINISTRATIVA	**REMATES PENDIENTES EN ZONA ADMINISTRATIVA**	**AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR**	**AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR**

			
AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	SIN AVANCE DE OBRA SHUT DE BASURAS
			
SIN AVANCE DE OBRA SHUT DE BASURAS	AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	20
11/03/2024	17/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	20	Fecha de corte:	domingo, 17 de marzo de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
FRANCISCO MIRANDA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
VALOR PARCIAL	7-nov-23	14-mar-24	434.764.439,77	100,00%	100,00%	86,25%	13,75%	374.987.850,06
TOTAL			**524.154.439,77**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine detalles de acabado de la bateria sanitaria, termine excavacion de tanque de almacenamiento aquacell y excavacion e instalacion de redes de aguas lluvias, e iniciar aula de sistemas

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 En esta semana el contratista avanza en remates de la bateria sanitaria

7.2 el contratista avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias

7.3 el contratista avanza en la excavacion tanque aquacell

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en remates de la bateria sanitaria, excavacion para redes de aguas lluvias,

8.2. . Componente ambiental
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se revisan y se remiten observaciones a los formatos de trazabilidad RCD y PGRCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El día viernes 15/03/2024 se realiza recorrido del componente ambiental con los profesionales de la entidad y contratista.

8.3. .Componente SST
- Se aprueba y se radica en la entidad el informe SST N°4 del contratista de obra.
- Se radica en la entidad el informe SST N°4 de interventoría.
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra, residente y maestro de obra.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza solicitud al contratista de la actualización del plan de inspección y ensayo en el cual se incluyan los controles a los ítems de los np aprobados

9. Observaciones:

9,1 Pendiente que el contratista realice remates de acabado en bateria sanitaria, asi mismo intervenir aula de sistemas, redes aguas lluvias, presentar NP de tanque aquacell

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



REMATES PENDIENTES BATERIA SANITARIA



SIN AVANCE DE OBRA EN AULA DE SISTEMAS



SIN AVANCE DE OBRA EN AULA DE SISTEMAS



REMATES PENDIENTES BATERIA SANITARIA









SIN AVANCE DE OBRA EN AULA DE SISTEMAS	SIN AVANCE DE OBRA EN AULA DE SISTEMAS	REMATES PENDIENTES BATERIA SANITARIA	EXCAVACION TANQUE AQUACELL
			
EXCAVACION TANQUE AQUACELL	REMATES PENDIENTES BATERIA SANITARIA	REMATES PENDIENTES BATERIA SANITARIA	NUEVO LAVAMANOS BATERIA SANITARIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	20	
11/03/2024	17/03/2024	

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	CALLE 1 BIS # 87-84	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	20	Fecha de corte:	domingo, 17 de marzo de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	20-nov-23 19-mar-24	273.358.609,63	100,00%	99,00%	94,71%	4,29%	258.903.947,61
TOTAL		**273.358.609,63**	**100,00%**	**-**		**4,29%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación: 19-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine pasamanos, termine lamina microperforada, y termine

		pintura de baranda
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	19-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza en la instalacion de laminas microperforadas, se avanza en pintura del pasamanos, y realizaaseo zona exterior

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de laminas microperforadas, se pinta una parte del pasamanos, y arreglo piso caucho

8.2. . Componente ambiental
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se revisan y se remiten observaciones a los formatos de trazabilidad RCD y PGRCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El día viernes 15/03/2024 se realiza recorrido del componente ambiental con los profesionales de la entidad y contratista.

8.3. .Componente SST
- Se aprueba y se radica en la entidad el informe SST N°4 del contratista de obra.
- Se radica en la entidad el informe SST N°4 de interventoría.
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra, residente y maestro de obra.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza solicitud al contratista de la actualización del plan de inspección y ensayo en el cual se incluyan los controles a los ítems de los np aprobados

9. Observaciones:

9,1 que realice detalles de acabado del pasamanos, e instale lamina microperforada, y realice correccion del piso caucho en patio de preescolar

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
REMATES D PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	**REMATES D PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**	**PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS**
			

REMATES D PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	REMATES D PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA EN CIERTOS TRAMOS	RETIRO DE ESCOMBROS
			
RETIRO DE ESCOMBROS	RETIRO DE ESCOMBROS	RETIRO DE ESCOMBROS	RETIRO DE ESCOMBROS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	20	
11/03/2024	17/03/2024	

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	PORFIRIO BARBA JACOB		CALLE 70 A SUR # 81G-13		BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	20	Fecha de corte:	domingo, 17 de marzo de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
PORFIRIO BARBA JACOB	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	4-mar-24	25-mar-24	1.872.883,38	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
TOTAL			**1.872.883,38**	**100,00%**	**-**		**0,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	25-mar-24	

6. Pendientes

Adelanto/Atraso (Días):		avanzar con las obras de demolicion y adecuacion de las filtraciones
Fecha Proyectada de Terminación:	25-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se realiza cerramiento de la zona a intervenir y se comienza con apiques bajo la placa para revisar filtraciones

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la mamposteria y páñete, arreglo de tuberia

8.2. . Componente ambiental
- En comité de seguimiento se reitera al contratista de obra remitir el informe ambiental N°4
- Se revisan y se remiten observaciones a los formatos de trazabilidad RCD y PGRCD.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.
- El día viernes 15/03/2024 se realiza recorrido del componente ambiental con los profesionales de la entidad y contratista.

8.3. .Componente SST
- Se aprueba y se radica en la entidad el informe SST N°4 del contratista de obra.
- Se radica en la entidad el informe SST N°4 de interventoría.
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra, residente y maestro de obra.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza solicitud al contratista de la actualización del plan de inspección y ensayo en el cual se incluyan los controles a los ítems de los np aprobados

9. Observaciones:

9,1 que tengan personal en obra constante, ya que se observan dias sin intervencion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
ADECUACION FILTRACIONES	**ADECUACION FILTRACIONES**	**ADECUACION FILTRACIONES**	**ADECUACION FILTRACIONES**
			

ADECUACION FILTRACIONES	ADECUACION FILTRACIONES	ADECUACION FILTRACIONES	ADECUACION FILTRACIONES

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-59473

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	01/04/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL DELGADO
Documento	79573492
Teléfono	
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	

OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-222 - Remision informe semanal No. 21, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-222 - Remision informe semanal No. 21
No. Folios	0
Anexos	
Documentos Adjuntos	

E-2024-59473_1.pdf

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-222

Bogotá D.C., 01 de abril de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 21

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 21, correspondiente al periodo comprendido entre el 18 de marzo al 24 de marzo de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (27) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

			21	Interventor:	CONSORCIO SANTA MARIA 022
18/03/2024	al	24/03/2024			

1. Datos Generales

Nombre:

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
COLEGIO SAN	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

Localidad:

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			CONSORCIO SANTA MARIA 022						
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	
				Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00						
Adición:			$ -						
Anticipo:			$ -						
Retegarantía:			$ -						
			Neto Acta						
			Acumulado						

4.	**Programación.**			Semana No.	**21**	Fecha de corte:	24-mar-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

N°	**Capítulos:**	**LOCALIDAD**	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**% Inversión**
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	16-mar-24	$ 237.487.898,92	**3,75%**	100,00%	95,79%	-4,21%	$ 227.490.190
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 145.401.475,07	**2,30%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 145.401.475
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	29-abr-24	$ 371.665.872,21	**5,87%**	53,00%	27,41%	-25,59%	$ 101.875.587
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 196.033.652,00	**3,10%**	100,00%	88,60%	-11,40%	$ 173.682.914
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 540.915.916,58	**8,54%**	100,00%	91,97%	-8,03%	$ 497.480.368
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 272.320.438,14	**4,30%**	100,00%	96,05%	-3,95%	$ 261.554.547
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.528.837.537,71	**24,15%**	73,85%	47,77%	-26,08%	$ 730.325.692
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 150.113.989,56	**2,37%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 150.113.990
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 253.510.561,49	**4,00%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 543.111.193,70	**8,58%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 158.793.259,67	**2,51%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.000.000,00	**14,22%**	100,00%	86,50%	-13,50%	$ 778.500.000
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 214.029.550,15	**3,38%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	30-oct-23	29-jun-24	$ 364.078.580,55	**5,75%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	**6,43%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 6.283.652.114**	**99,26%**	59,52%	48,44%	-	**$ 3.066.424.763**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**

-11,09%	**DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

Se requiere al contratista lo siguiennte:
*ajuste de los presupuestos de los frentes que no han iniciado, con los alcances ajustados de las visitas que se han hecho
*ajuste de los presupuestos de los colegios que estan en ejecucion que les falta inlcuir alguna actividades.
terminar los frentes de obra que a la fecha tienen fecha de programacion al 100%

6

PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	**TOTAL**
6.330.813.879,00									**6.330.813.879,00**
29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista avanza con remates de placa en graderias, el contratista termina con pintura en fachada principal de la institucion, el contratista avanza con geotextil, relleno base granular, densidades cuarto de rack y aula 107, y acopio de material RCD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	el contratista avanza con remates de acabado de las ventanas, se avanza con demolicion de placa de enchape y placa de contrapiso, instalacion de geotextil y malla electrosoldada, se avanza con suministro e instalacion de lamina microperforada, pintura de baranda
COLEGIO VILLA RICA	se avanza con enchape shut de basuras, se avanza con la estructura en patio de preescolar.
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	En esta semana el contratista avanza en remates de la bateria sanitaria, el contratista avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias, el contratista avanza en la excavacion tanque aquacell, el contratista avanza en el desmonte de la cubierta en sala de sistemas
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	el contratista avanza en pintura del pasamanos y baranda, y realiza aseo zona exterior
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas del Bloque B, Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1, 2 y 4 del Bloque C, Continúa el estuco de muros de las aulas de los Bloque B y C, Inicia la pintura de muros de las aulas de los Bloque B y C
COLEGIO JORGE ISAAC	No se desarrollan actividades de obra esta semana, Queda pendiente la aprobación de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima
COLEGIO SAN BERNARDINO	Finaliza la instalación de luminarias en el costado sur del tercer piso, Finaliza la demolición del muro a la entrada del baño del tercer piso

8 **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra.
- Se solicita al contratista de obra instalar protección en la excavación del colegio Francisco de Miranda
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro del material y herramientas de obra acopiados en la zona del patio escolar del colegio Manuel Cepeda sede C.

9 **SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**

- Se recibió la versión 1 del informe ambiental N°4, sin embargo cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Se radicó en la entidad el informe ambiental n°4 de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo

10 **REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				
COLEGIO VILLA RICA:	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**

				
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA:
				
EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:	EMERGENCIA COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB:
				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	21
18/03/2024	24/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C		CARRERA 83- # 46 B SUR		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	21	Fecha de corte:	domingo, 24 de marzo de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23 16-mar-24	237.487.898,92	100,00%	100,00%	95,79%	4,21%	227.490.190,23
TOTAL		**237.487.898,92**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	16-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

Pendiente que el contratista termine placa de contrapiso, enchape de pisos, termine pintura de aulas de ingles y rack, pendiente remates en las graderias

Fecha Proyectada de Terminación:	16-mar-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con remates de placa en graderias

7.2 el contratista termina con pintura en fachada principal de la institucion

7.3 el contratista avanza con geotextil, relleno base granular, densidades cuarto de rack y aula 107, y acopio de material RCD

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la pintura en fachada principal, avanza con geotextil, relleno base granular cuarto de rack y aula 107, y acopio de material RCD

8.2. . Componente ambiental
- Se recibió la versión 1 del informe ambiental N°4, sin embargo cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Se radicó en la entidad el informe ambiental n°4 de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo

8.3. .Componente SST
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra.
- Se solicita al contratista de obra instalar protección en la excavación del colegio Francisco de Miranda
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro del material y herramientas de obra acopiados en la zona del patio escolar del colegio Manuel Cepeda sede C.

8.4. .Componente calidad
•No se ha realizado la entrega de la la actualización del plan de inspección y ensayo en el cual se incluyan los controles a los ítems de los np aprobados

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista avanzar con las obras de placa de contrapiso y enchape de aulas ingles y rack, entrega de certificadios de calidad

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



GEOTEXTIL SALA RACK



PINTURA DE FACHADA



PINTURA DE FACHADA



SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR









PINTURA DE FACHADA	PINTURA DE FACHADA	PINTURA DE FACHADA	ANTEPECHO ESCALERA
			
PINTURA DE FACHADA	PINTURA DE FACHADA	TOMA DENSIDADES BASE GRANULAR	TOMA DENSIDADES BASE GRANULAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	21	
18/03/2024	24/03/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C		CALLE 38 SUR BIS # 89-81		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	21	Fecha de corte:	domingo, 24 de marzo de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	14-nov-23 29-abr-24	371.665.872,21	100,00%	53,00%	27,41%	25,59%	101.875.586,60
TOTAL		**371.665.872,21**	**100,00%**	**-**		**25,59%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-abr-24

6. Pendientes

termine los detalles de acabado de las ventanas, suministre e instale lamina microperforada,

	Adelanto/Atraso (Días):		terminar demolicion de placa, excavacion y relleno de recebo en aulas del primer nivel, iniciar placa de contrapiso,
	Fecha Proyectada de Terminación:	29-abr-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con remates de acabado de las ventanas,

7.2 se avanza con demolicion de placa de enchape y placa de contrapiso, instalacion de geotextil y malla electrosoldada

7.3 se avanza con suministro e instalacion de lamina microperforada, pintura de baranda

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento a la sede educativa, con remates de acabado de las ventanas, se avanza con demolicion de placa de enchape y placa de contrapiso, suministro e instalacion de lamina microperforada, pintura de baranda

8.2. . Componente ambiental
- Se recibió la versión 1 del informe ambiental N°4, sin embargo cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Se radicó en la entidad el informe ambiental n°4 de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo

8.3. .Componente SST
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra.
- Se solicita al contratista de obra instalar protección en la excavación del colegio Francisco de Miranda
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro del material y herramientas de obra acopiados en la zona del patio escolar del colegio Manuel Cepeda sede C.

8.4. .Componente calidad
•No se ha realizado la entrega de la la actualización del plan de inspección y ensayo en el cual se incluyan los controles a los ítems de los np aprobados

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista termine las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio, que coordine con el rector de la institucion el inicio de las obras de los pisos en las aulas, que el contratista suministre e instale las laminas microperforadas en el cerramiento exterior

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
REMATES DE CALIDAD VENTANAS	**DEMOLICION DE ENCHAPE SEGUNDO NIVEL**	**DEMOLICION DE ENCHAPE SEGUNDO NIVEL**	**DEMOLICION DE ENCHAPE SEGUNDO NIVEL**

			
GEOTEXTIL Y MALLA ELECTROSOLDADA AULAS SEGUNDO NIVEL	GEOTEXTIL Y MALLA ELECTROSOLDADA AULAS SEGUNDO NIVEL	GEOTEXTIL Y MALLA ELECTROSOLDADA AULAS SEGUNDO NIVEL	GEOTEXTIL Y MALLA ELECTROSOLDADA AULAS SEGUNDO NIVEL
			
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA	PINTURA CERRAMIENTO EXTERIOR	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	21	INTERVENTORIA
18/03/2024	24/03/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	VILLA RICA SEDE B	CALLE 49 SUR # 78-35	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	21	Fecha de corte:	domingo, 24 de marzo de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	15-mar-24	196.033.652,00	100,00%	100,00%	88,60%	11,40%	173.682.914,28
TOTAL			**196.033.652,00**	**100,00%**	**-**		**11,40%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

	Adelanto/Atraso (Días):		pendiente que el contratista termine las obras de enchape, cubierta, puertas, ventanas, iluminacion, tomas e interruptores en el shut de basuras, termine estructura y piso caucho en patio de preescolar
	Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se avanza con enchape shut de basuras

7.2 se avanza con la estructura en patio de preescolar.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de masilla y pintura de shut de basuras, y en el desmonte de la estructura en patio de preescolar para realziar correccion.

8.2. . Componente ambiental
- Se recibió la versión 1 del informe ambiental N°4, sin embargo cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Se radicó en la entidad el informe ambiental n°4 de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo

8.3. .Componente SST
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra.
- Se solicita al contratista de obra instalar protección en la excavación del colegio Francisco de Miranda
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro del material y herramientas de obra acopiados en la zona del patio escolar del colegio Manuel Cepeda sede C.

8.4. .Componente calidad
•No se ha realizado la entrega de la la actualización del plan de inspección y ensayo en el cual se incluyan los controles a los ítems de los np aprobados

9. Observaciones:

9,1 que el contratista ingrese personal y material de obra, que avance con laas obras del patio de preescolar, shut de basuras.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
REMATES PENDIENTES EN ZONA ADMINISTRATIVA	**REMATES PENDIENTES EN ZONA ADMINISTRATIVA**	**AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR**	**AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR**

			
AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	SIN AVANCE DE OBRA SHUT DE BASURAS
			
SIN AVANCE DE OBRA SHUT DE BASURAS	AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR	AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	21
18/03/2024	24/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	21	Fecha de corte:	domingo, 24 de marzo de 2024		

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
FRANCISCO MIRANDA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
VALOR PARCIAL	7-nov-23	14-mar-24	451.525.916,58	100,00%	100,00%	91,97%	8,03%	415.268.385,48
TOTAL			**540.915.916,58**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine detalles de acabado de la bateria sanitaria, termine excavacion de tanque de almacenamiento aquacell y excavacion e instalacion de redes de aguas lluvias, y avanzar en aula de sistemas

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 En esta semana el contratista avanza en remates de la bateria sanitaria

7.2 el contratista avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias

7.3 el contratista avanza en la excavacion tanque aquacell

7.4 el contratista avanza en el desmonte de la cubierta en sala de sistemas

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en remates de la bateria sanitaria, excavacion para redes de aguas lluvias,

8.2. . Componente ambiental
- Se recibió la versión 1 del informe ambiental N°4, sin embargo cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Se radicó en la entidad el informe ambiental n°4 de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo

8.3. .Componente SST
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra.
- Se solicita al contratista de obra instalar protección en la excavación del colegio Francisco de Miranda
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro del material y herramientas de obra acopiados en la zona del patio escolar del colegio Manuel Cepeda sede C.

8.4. .Componente calidad
•No se ha realizado la entrega de la la actualización del plan de inspección y ensayo en el cual se incluyan los controles a los ítems de los np aprobados

9. Observaciones:

9,1 Pendiente que el contratista realice remates de acabado en bateria sanitaria, asi mismo intervenir aula de sistemas, redes aguas lluvias, presentar NP de tanque aquacell

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS



DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS



DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS



DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS









DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS	DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS	DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS	DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS
			
DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METALICA AULA DE SISTEMAS	AVANCE DE REDES DE AGUAS LLUVIAS	DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	21	INTERVENTORIA
18/03/2024	24/03/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL ZAPATA OLIVELLA	CALLE 1 BIS # 87-84	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	21	Fecha de corte:	domingo, 24 de marzo de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	20-nov-23	19-mar-24	272.320.438,14	100,00%	100,00%	96,05%	3,95%	261.554.547,06
TOTAL			**272.320.438,14**	**100,00%**	**-**		**3,95%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	19-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine lamina microperforada y termine pintura de baranda

		pendiente que el contratista termine lamina microperforada, y termine pintura de baranda
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	19-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza en pintura del pasamanos, y baranda

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la instalacion de laminas microperforadas, se pinta una parte del pasamanos, y arreglo piso caucho

8.2. . Componente ambiental
- Se recibió la versión 1 del informe ambiental N°4, sin embargo cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Se radicó en la entidad el informe ambiental n°4 de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo

8.3. .Componente SST
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra.
- Se solicita al contratista de obra instalar protección en la excavación del colegio Francisco de Miranda
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro del material y herramientas de obra acopiados en la zona del patio escolar del colegio Manuel Cepeda sede C.

8.4. .Componente calidad
•No se ha realizado la entrega de la la actualización del plan de inspección y ensayo en el cual se incluyan los controles a los ítems de los np aprobados

9. Observaciones:

9,1 que realice e instale lamina microperforada,

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
REMATES DE PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA	**REMATES DE PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA**	**REMATES DE PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA**	**REMATES DE PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA**
			

REMATES DE PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA	REMATES DE PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA	REMATES DE PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA	REMATES DE PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA
			
REMATES DE PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA	REMATES DE PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA	REMATES DE PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA	REMATES DE PENDIENTES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	21	INTERVENTORIA
18/03/2024	24/03/2024	CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	PORFIRIO BARBA JACOB		CALLE 70 A SUR # 81G-13		BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	21	Fecha de corte:	domingo, 24 de marzo de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
PORFIRIO BARBA JACOB	Fecha inicio/Final	Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	4-mar-24 31-mar-24	1.872.883,38	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
TOTAL		**1.872.883,38**	**100,00%**	**-**		**0,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-mar-24

6. Pendientes

Adelanto/Atraso (Días):		avanzar con las obras de demolicion y adecuacion de las filtraciones
Fecha Proyectada de Terminación:	31-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 se realiza cerramiento de la zona a intervenir y se comienza con apiques bajo la placa para revisar filtraciones

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría realizo el acompañamiento y seguimiento en la mamposteria y páñete, arreglo de tuberia

8.2. . Componente ambiental
- Se recibió la versión 1 del informe ambiental N°4, sin embargo cuenta con observaciones por parte de esta interventoría.
- Se radicó en la entidad el informe ambiental n°4 de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo

8.3. .Componente SST
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra.
- Se solicita al contratista de obra instalar protección en la excavación del colegio Francisco de Miranda
- Se solicita al contratista de obra realizar el retiro del material y herramientas de obra acopiados en la zona del patio escolar del colegio Manuel Cepeda sede C.

8.4. .Componente calidad
•No se ha realizado la entrega de la la actualización del plan de inspección y ensayo en el cual se incluyan los controles a los ítems de los np aprobados

9. Observaciones:

9,1 que tengan personal en obra constante, ya que se observan dias sin intervencion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
ADECUACION FILTRACIONES	**ADECUACION FILTRACIONES**	**ADECUACION FILTRACIONES**	**ADECUACION FILTRACIONES**
			

ADECUACION FILTRACIONES	ADECUACION FILTRACIONES	SANITARIO EN MAL ESTADO	ADECUACION FILTRACIONES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	21
18/03/2024	24/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 21 | Fecha de corte: 24/03/2024

SAN BERNARDINO	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.000.000,00	100,00%	100,00%	86,50%	-13,50%	778.500.000,00
TOTAL			**900.000.000,00**	**100,00%**	**-**		**-13,50%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista finalice la obra en la cubierta de Auditorio y del área de Orientación

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Finaliza la instalación de luminarias en el costado sur del tercer piso

7.2. Finaliza la demolición del muro a la entrada del baño del tercer piso

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. Se realiza un ajuste al balance de esta Sede Educativa, depurando las actividades que no se van a ejecutar e incorporando las actividades requeridas por la supervisión del contrato durante el recorrido conjunto del 27 de febrero de 2024. Para efectos del presente informe semanal se establece un avance cercano al 85 % sobre un presupuesto estimado en $ 900.000.000

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR



INUNDACIÓN EN EL TERCER PISO POR CAUSA DEL RETIRO DEL MANTO ASFÁLTICO Y LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO



INUNDACIÓN EN EL TERCER PISO POR CAUSA DEL RETIRO DEL MANTO ASFÁLTICO Y LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO



INUNDACIÓN EN EL TERCER PISO POR CAUSA DEL RETIRO DEL MANTO ASFÁLTICO Y LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO



INUNDACIÓN EN EL TERCER PISO POR CAUSA DEL RETIRO DEL MANTO ASFÁLTICO Y LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	21
18/03/2024	24/03/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 21 — Fecha de corte: 24/03/2024

CARLOS ALBAN HOLGUIN	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.528.837.537,71	100,00%	73,85%	47,77%	-26,08%	730.325.691,76
TOTAL			**1.528.837.537,71**	**100,00%**	**-**		**-26,08%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas del Bloque B

7.2. Avanza la instalación de la lámina superior de la teja sándwich en la cubierta de las aulas 1, 2 y 4 del Bloque C

7.3. Continúa el estuco de muros de las aulas de los Bloque B y C

7.4. Inicia la pintura de muros de las aulas de los Bloque B y C

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.El Contratista debe continuar con la ejecución de las obras de acuerdo con la programación presentada y aprobada por la Interventoría

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE B y C</td>
<td>AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE B y C</td>
<td>AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE B y C</td>
<td>AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE B y C</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>INICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B y C</td>
<td>AINICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B y C</td>
<td>INICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B y C</td>
<td>AINICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B y C</td>
</tr>
</table>

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (1)



CONSTRUCCION Y FUNDICION DE ESCALERA EN GRADERIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (2)



FUNDICION DE PLACA GRADERIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (3)



ARMADO ACERO DEE REFUERZO DE PLACA GRADERIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (4)



PINTURA DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (5)



REMATES EN LA VENTANERIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (6)



REMATES EN LA VENTANERIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (7)



SIN AVANCE EN CERRAMIENTO EXTERIOR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (8)



REMATES EN LA VENTANERIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (9)



AVANCE DE OBRA REDES ELECTRICAS SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (10)



AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (11)



AVANCE DE OBRA REDES ELECTRICAS SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (12)



AVANCE DE OBRA REDES ELECTRICAS SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (13)



AVANCE DE OBRA MUROS EN SUPERBOARD SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (14)



AVANCE DE OBRA REDES ELECTRICAS SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (15)



AVANCE DE OBRA EN REDES DE AGUAS LLUVIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (16)



AVANCE BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (17)



AVANCE EN LA CUBIERTA DE PATIOS INTERNOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (18)



AVANCE BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (19)



BATERIA SANITARIA SIN REMATAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (20)



DIVISIONES BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (21)




PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (22)

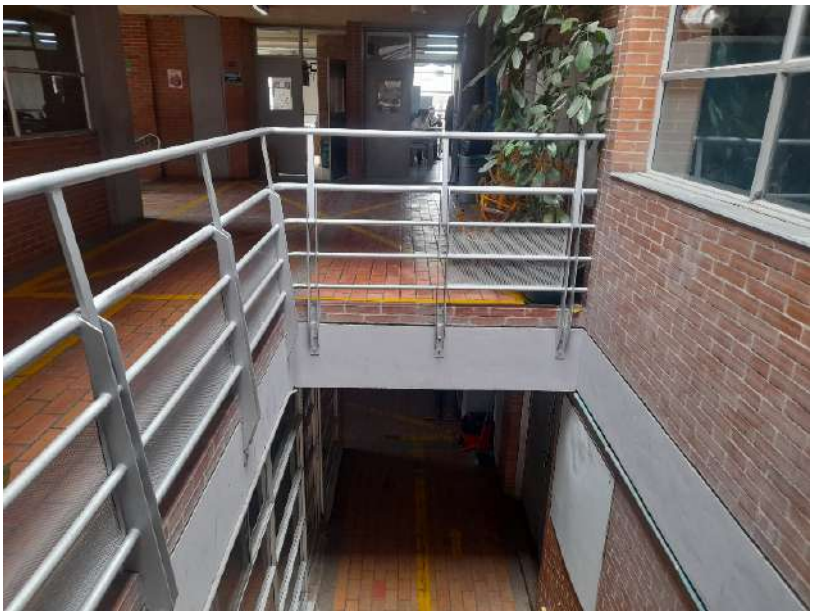


PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (23)

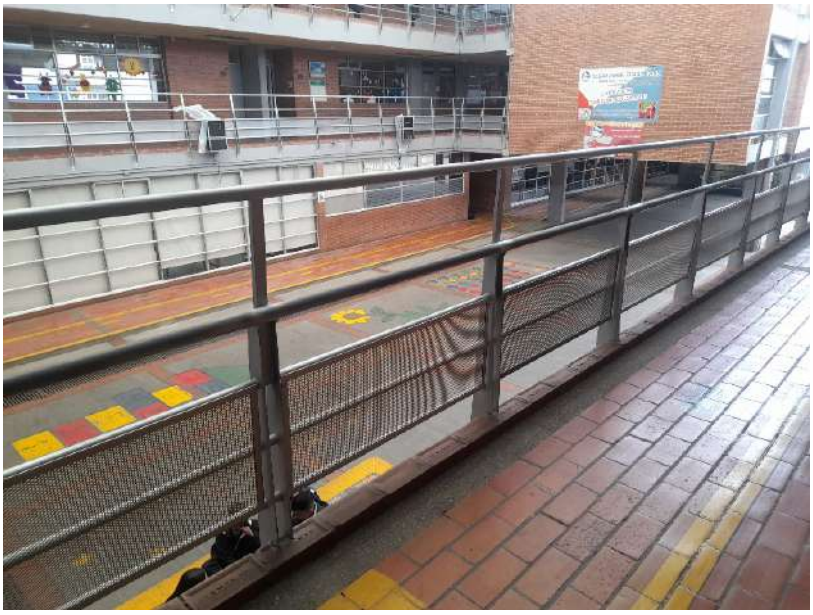

PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (24)



DESPRENDIMIENTO DE GRANULO DE CAUCHO EN PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (25)



CONSTRUCCION Y FUNDICION DE ESCALERA EN GRADERIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (26)



SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL Y RELLENO AULA DE INGLES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (27)



PINTURA DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (28)



CONSTRUCCION Y FUNDICION DE ESCALERA EN GRADERIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (29)



PINTURA DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (30)



PINTURA DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (31)



DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONTRAPISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (32)



DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA DE CONTRAPISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (33)



PINTURA DE MUROS EN PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (34)



PINTURA DE MUROS EN PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (35)



AVANCE DE OBRA MASILLA Y PINTURA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (36)



AVANCE DE OBRA POCETA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (37)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (38)



AVANCE DE OBRA BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (39)



INSTALACION CUBIERTA PATTIOS INTERNOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (40)



EXCABVACION TANQUE AQUACECLL AGUAS LLUVIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (41)



AVANCE DE OBRA REDES AGUAS LLUVIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (42)




IMPERMEABILIZACION MUROS BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (43)

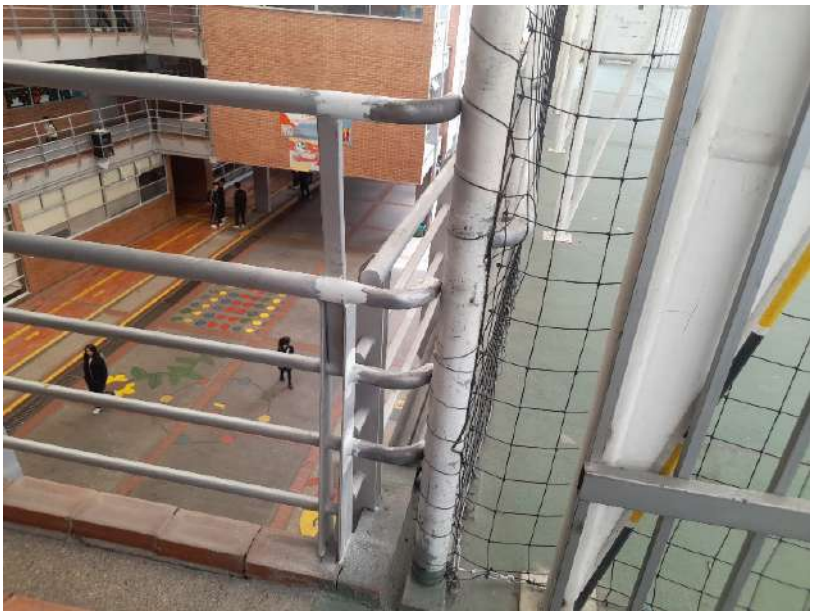


MASILLA Y PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (44)

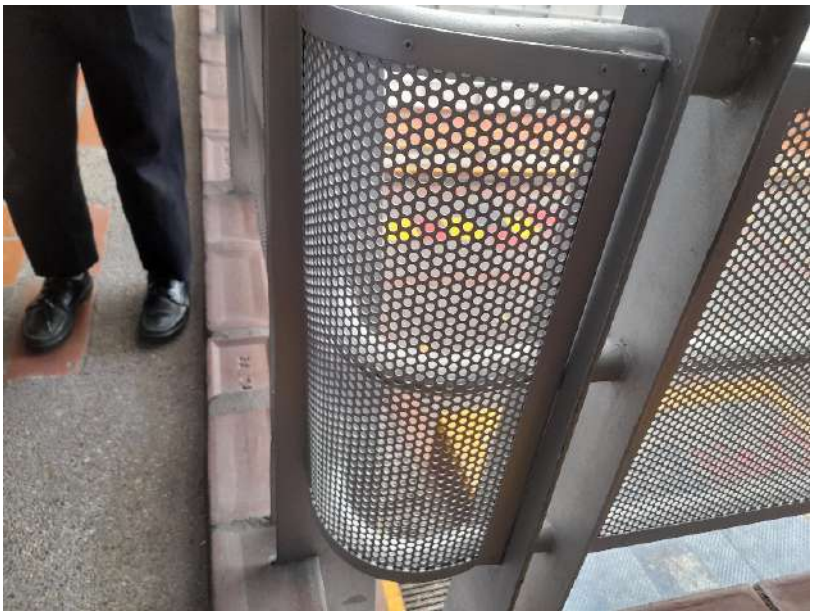

MUESTRA DE CURVA LAMINA MICROPERFORADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (45)



ARREGLO PISO CAUCHO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (46)



AVANCE GRADERIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (47)



PINTURA DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (48)



PINTURA DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (49)



PINTURA DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (50)



PINTURA DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (51)



AVANCE AULA DE RACK

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (52)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (53)



AVANCE DE OBRA ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (54)



AVANCE DE OBRA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (55)



AVANCE DE OBRA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (56)



EXCAVACION TANQUE AQUACELL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (57)



INSTALACION LAVAMANOS BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (58)



EXCAVACION TANQUE AQUACELL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (59)



SIN AVANCE DE OBRA EN AULA DE SISTEMAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (60)



FALTA SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (61)



AVANCE BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (62)



PINTURA DE PASAMANOS E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (63)



RETIRO DE ESCOMBROS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (64)



DEMOLICION DE ENCHAPE Y PLACA AULAS PRIMER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (65)



IMPERMEABILIZACION DE MUUROS AULA RACK

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (66)



PINTURA DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (67)



SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (68)



PINTURA DE FACHADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (69)



TOMA DENSIDADES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (70)



DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (71)



DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (72)



DESMONTE DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (73)



REVISION EMERGENCIA DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (74)



REVISION EMERGENCIA DE FILTRACION EN BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (75)



REMATES DE CALIDAD VENTANAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (76)



DEMOLICION DE ENCHAPE SEGUNDO NIVEL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (77)



GEOTEXTIL Y MALLA ELECTROSOLDADA AULAS SEGUNDO NIVEL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (78)



SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (79)



AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (80)




AVANCE DE ENCHAPE SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (81)

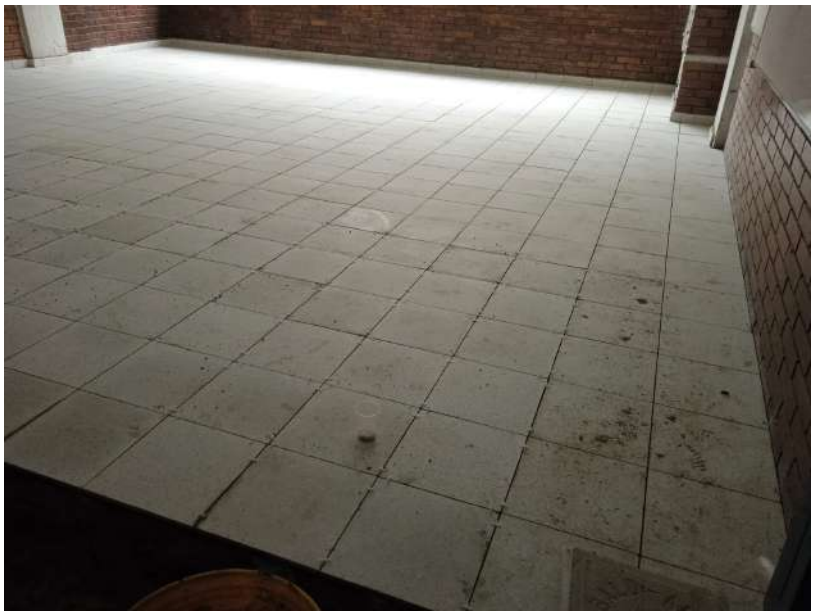

SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE AUALS SEGUNDO NIVEL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (82)



SUMINISTRO E INSTALACION ENCHAPE AUALS SEGUNDO NIVEL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (83)



SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (84)



AVANCE DE ENCHAPE SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO VILLA RICA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (85)



AVANCE DE ESTRUCTURA EN PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (86)



AVANCE DE ESTRUCTURA METALICA AULA DE SISTEMAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (87)



AVANCE DE ESTRUCTURA METALICA AULA DE SISTEMAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (88)



SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS BATERIA SANITARIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (89)




REMATES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARIA 022

NOMBRE DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS"
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1.PCCNTR.5305583 DE 2023
MES DEL REPORTE:	1 de marzo al 29 marzo del 2024

FOTOGRAFÍA (90)

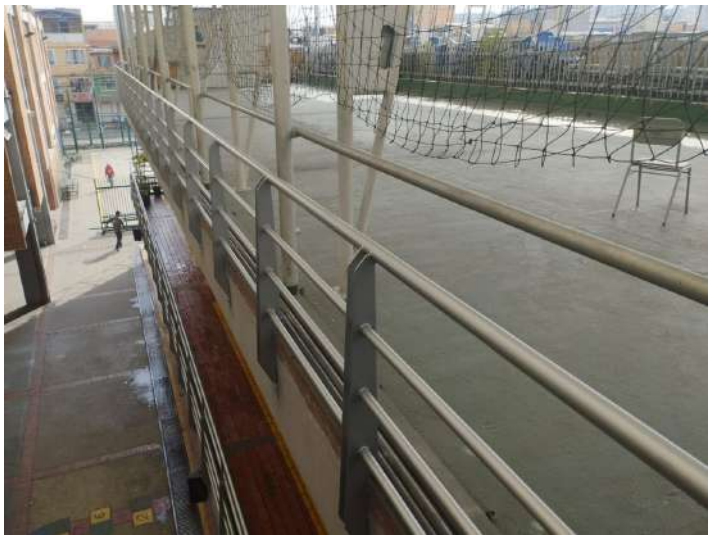

REMATES DE PINTURA DE PASAMANOS Y BARANDA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (001)



SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (002)



SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (003)



SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (004)



SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (005)



SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (006)



SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (007)



SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (008)



SE FORMULAN OBSERVACIONES A LAS VENTANAS DE ALUMINIO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (009)



OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (010)



OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (011)



OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (012)



OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (013)



OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (014)



OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (015)



OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (016)



OBSERVACIONES A LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (017)



OBSERVACIONES A LOS CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (018)



OBSERVACIONES A LOS CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (019)



OBSERVACIONES A LOS CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (020)



OBSERVACIONES A LOS CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (021)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 4 DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (022)



INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE TEJA SÁNDWICH EN EL AULA 4 DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (023)



INICIA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (024)



INICIA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (025)



AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (026)



AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (027)



AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (028)



AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (029)



AVANZA EL RESANE DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (030)



AVANZA EL RESANE DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (031)



AVANZA EL RESANE DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (032)



AVANZA EL RESANE DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (033)



INICIA EL RESANE DE FILOS EN LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (034)



INICIA EL RESANE DE FILOS EN LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (035)



INICIA EL RESANE DE FILOS EN LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (036)



INICIA EL RESANE DE FILOS EN LAS ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (037)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (038)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (039)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (040)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (041)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (042)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (043)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (044)



AVANZA LA INSTALACIÓN DE RELLENO Y LÁMINA SUPERIOR EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (045)



RETIRO DE RCD DEL SITIO DE OBRA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (046)



RETIRO DE RCD DEL SITIO DE OBRA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (047)



RETIRO DE RCD DEL SITIO DE OBRA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (048)



ACOPIO DE MATERIAL DENTRO DEL ÁREA DE TRABAJO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (049)



AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE B Y C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (050)



AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE B Y C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (051)



AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE B Y C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (052)



AVANZA EL ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE B Y C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (053)



INICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B Y C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (054)



INICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B Y C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (055)



INICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B Y C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (056)



INICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B Y C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (057)



INICIA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN LAS AULAS DE LOS BLOQUES B Y C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (058)



LLEGAN MÁS CARPINTERÍA DE ALUMINIO PARA LAS VENTANAS LOS BLOQUES B Y C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (059)



PERSONAL DE UN OUTSOURCING DE LA S.E.D. LAVA LOS CÁRCAMOS DEL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (060)



PERSONAL DE UN OUTSOURCING DE LA S.E.D. LAVA LOS CÁRCAMOS DEL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (061)



PERSONAL DE UN OUTSOURCING DE LA S.E.D. LAVA LOS CÁRCAMOS DEL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (062)



PERSONAL DE UN OUTSOURCING DE LA S.E.D. LAVA LOS CÁRCAMOS DEL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (063)



PERSONAL DE UN OUTSOURCING DE LA S.E.D. LAVA LOS CÁRCAMOS DEL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (064)



PERSONAL DE UN OUTSOURCING DE LA S.E.D. LAVA LOS CÁRCAMOS DEL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (065)



DETALLADO DE ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (066)



DETALLADO DE ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (067)



DETALLADO DE ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (068)



DETALLADO DE CANTOS VERTICALES EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (069)



CONTINÚA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN AULAS DE LOS BLOQUES B Y C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (070)



CONTINÚA LA PINTURA INTERIOR DE MUROS EN AULAS DE LOS BLOQUES B Y C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (071)



INICIA LA INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (072)



INICIA LA INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (073)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (074)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (075)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (076)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (077)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (078)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (079)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (080)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024


FOTOGRAFÍA (081)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (082)

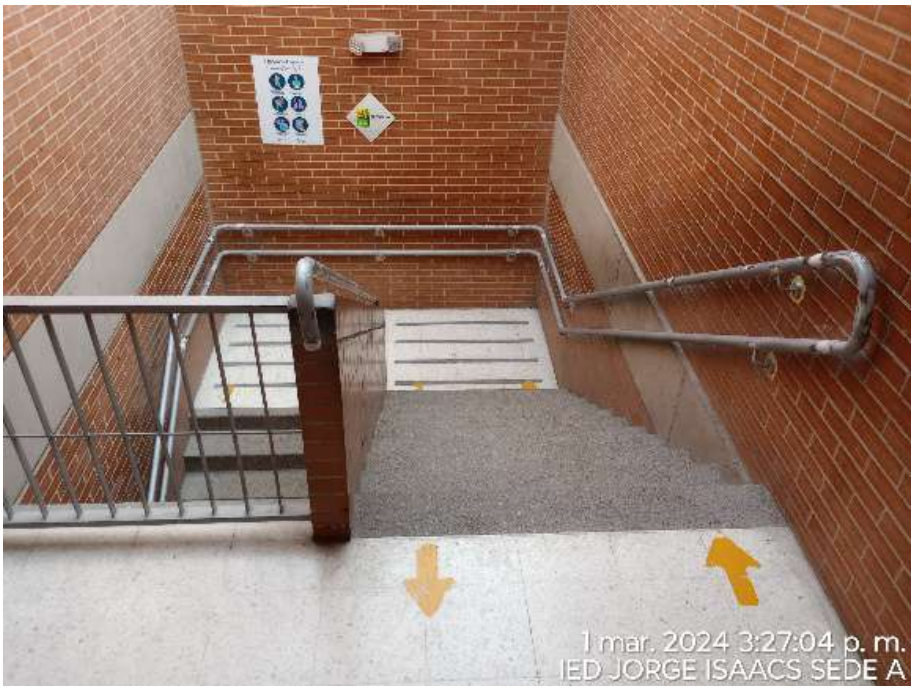

RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (083)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (084)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (085)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (086)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (087)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (088)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (089)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (090)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (091)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (092)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (093)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024


FOTOGRAFÍA (094)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024


FOTOGRAFÍA (095)

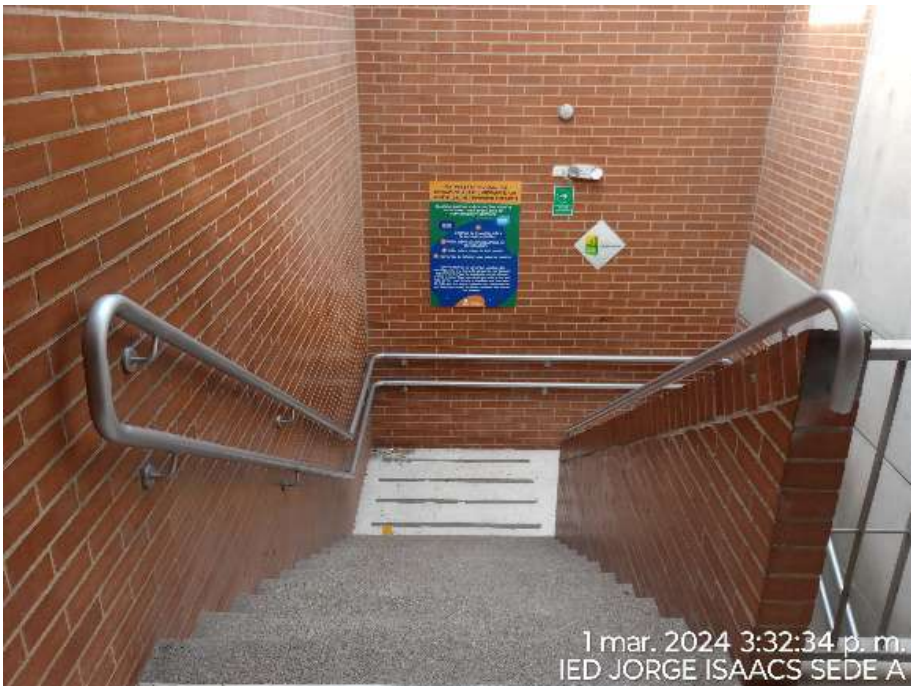

RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (096)

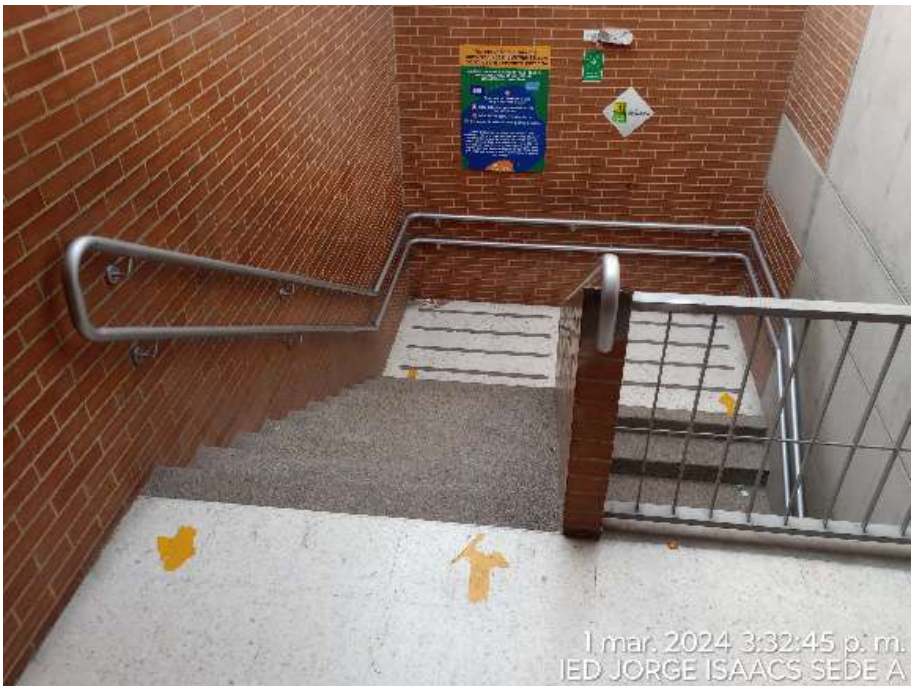

RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (097)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (098)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (099)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (100)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (101)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (102)



RESANES EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (103)



PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (104)



PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (105)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (106)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (107)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024


FOTOGRAFÍA (108)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (109)

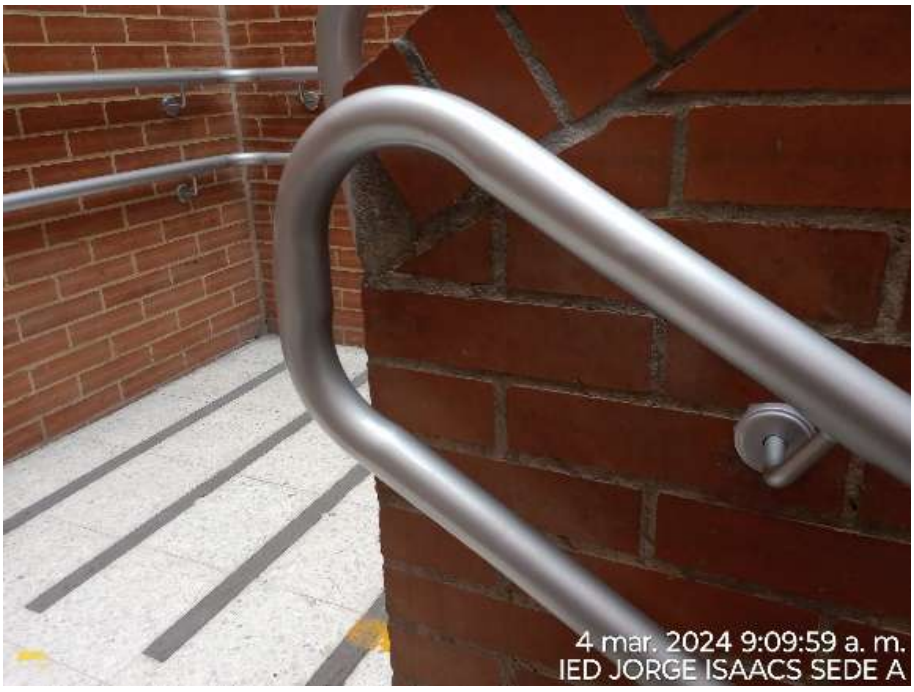

PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (110)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (111)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (112)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (113)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (114)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (115)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (116)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (117)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (118)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (119)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (120)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (121)



PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024


FOTOGRAFÍA (122)



PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (123)

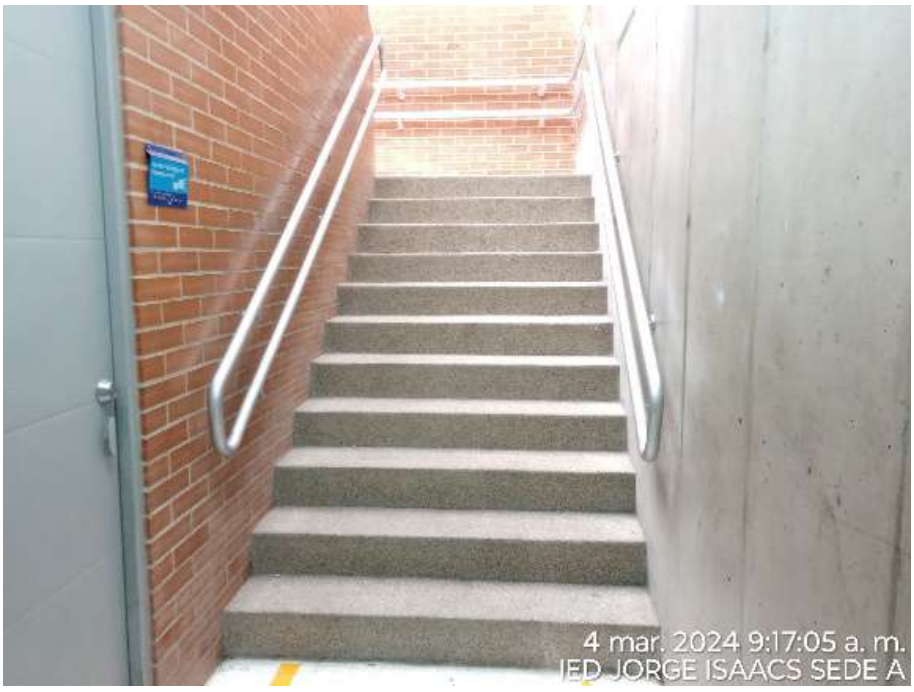

PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (124)



PENDIENTE ALGUNOS RESANES EN ACABADO FINAL DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (125)



PENDIENTE ALGUNOS RESANES EN ACABADO FINAL DEL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (126)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (127)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (128)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (129)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (130)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (131)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (132)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (133)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (134)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (135)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (136)



PINTURA ACABADO FINAL EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (137)



PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (138)



PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (139)



PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (140)



PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (141)



CERRAMIENTO CON POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO POR LOS ESTUDIANTES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (142)



CERRAMIENTO CON POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO POR LOS ESTUDIANTES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (143)



CERRAMIENTO CON POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO POR LOS ESTUDIANTES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (144)



CERRAMIENTO CON POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO POR LOS ESTUDIANTES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (145)



DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (146)



DESMONTE DE MANTO ASFÁLTICO EN PLACA PLANA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (147)



DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (148)



DEMOLICIÓN DE MORTERO DE NIVELACIÓN

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (149)



RETIRO DEL MORTERO DE NIVELACIÓN DESDE LA CUBIERTA PLANA DE LA ESCALERA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (150)



RETIRO DEL MORTERO DE NIVELACIÓN DESDE LA CUBIERTA PLANA DE LA ESCALERA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (151)



RETIRO DEL MORTERO DE NIVELACIÓN DESDE LA CUBIERTA PLANA DE LA ESCALERA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (152)



RETIRO DEL MORTERO DE NIVELACIÓN DESDE LA CUBIERTA PLANA DE LA ESCALERA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (153)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (154)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (155)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (156)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (157)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (158)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (159)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (160)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (161)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (162)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (163)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (164)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (165)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (166)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (167)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (168)



LAVAMANOS Y DIVISIONES EN ACERO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (169)



RETIRO DE RCD ACOPIADO EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (170)



RETIRO DE RCD ACOPIADO EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (171)



RETIRO DE RCD ACOPIADO EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (172)



RETIRO DE RCD ACOPIADO EN EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (173)



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (174)



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (175)



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (176)



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (177)



TABLERO ELÉCTRICO DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (178)



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (179)



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (180)



CIELO RASO ACUSTICO Y LUMINARIAS DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (181)



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (182)



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (183)



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (184)



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (185)



SANITARIOS PENDIENTES DE INSTALAR EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (186)



SANITARIOS PENDIENTES DE INSTALAR EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (187)



DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE EN PROCESO DE REPARACIÓN EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (188)



DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE EN PROCESO DE REPARACIÓN EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (189)



DEMOLICIÓN DE MURO A LA ENTRADA DE LOS BAÑOS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (190)



REPARACIÓN DE CIELO RASO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (191)



REPARACIÓN DE CIELO RASO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (192)



REPARACIÓN DE CIELO RASO EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (193)



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (194)



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (195)



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (196)



INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y LUMINARIAS EN EL COSTADO SUR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (197)



INUNDACIÓN EN EL TERCER PISO POR CAUSA DEL RETIRO DEL MANTO ASFÁLTICO Y LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (198)



INUNDACIÓN EN EL TERCER PISO POR CAUSA DEL RETIRO DEL MANTO ASFÁLTICO Y LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (199)



INUNDACIÓN EN EL TERCER PISO POR CAUSA DEL RETIRO DEL MANTO ASFÁLTICO Y LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (200)



INUNDACIÓN EN EL TERCER PISO POR CAUSA DEL RETIRO DEL MANTO ASFÁLTICO Y LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (201)



DEMOLICIÓN DE MURO A LA ENTRADA DE LOS BAÑOS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (202)



HUELLA DE LA DEMOLICIÓN DE MURO A LA ENTRADA DE LOS BAÑOS DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (203)



FILOS ENCIMA DE ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (204)



FILOS EN EL POYO DEBAJO DEL LAVAMANOS DEL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (205)



FILOS EN EL POYO DEBAJO DEL LAVAMANOS DEL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (206)



FILOS ENCIMA DE ENCHAPE DE MUROS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (207)



REPARACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA QUE QUEDARÁ EMBEBIDA EN EL MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (208)



REPARACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA QUE QUEDARÁ EMBEBIDA EN EL MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (209)



REPARACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA QUE QUEDARÁ EMBEBIDA EN EL MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (210)



REPARACIÓN DE TUBERÍA ELÉCTRICA QUE QUEDARÁ EMBEBIDA EN EL MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (211)



INICIA LA FUNDIDA DEL MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN EN LA PLACA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (212)



INICIA LA FUNDIDA DEL MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACIÓN EN LA PLACA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (213)



INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (214)



INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (215)



INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (216)



INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (217)



INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (218)



INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (219)



INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (220)



INICIA EL DESMONTE DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE TRABAJO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (221)



CERRAMIENTO CON POLISOMBRA VERDE PARA EL ÁREA DE TRABAJO EN EL PISO 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (222)



CERRAMIENTO CON POLISOMBRA VERDE PARA EL ÁREA DE TRABAJO EN EL PISO 1

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (223)



SEÑALIZACIÓN UTILIZADA EN EL CERRAMIENTO CON POLISOMBRA VERDE PARA EL ÁREA DE TRABAJO EN EL PRIMER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (224)



ACOPIO DE RCD EN EL ÁREA DE TRABAJO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (225)



ACOPIO DE RCD EN EL ÁREA DE TRABAJO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (226)



ACOPIO DE RCD EN EL ÁREA DE TRABAJO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (227)



ACOPIO DE RCD DE PERFILERÍA DE DRY WALL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (228)



ACOPIO DE RCD DE PERFILERÍA DE DRY WALL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (229)



ESTRUCTURA METÁLICA DEL CIELO RASO Y RED ELÉCTRICA EXISTENTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (230)



ESTRUCTURA METÁLICA DEL CIELO RASO Y RED ELÉCTRICA EXISTENTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (231)



ESTRUCTURA METÁLICA DEL CIELO RASO Y RED ELÉCTRICA EXISTENTE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (232)



ACOPIO DE RCD ELÉCTRICO: TUBERÍA CONDUIT Y LÁMPARAS DESMONTADAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (233)



DESMONTE DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE EN EL ÁREA DE TRABAJO DEL PRIMER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (234)



DESMONTE DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE EN EL ÁREA DE TRABAJO DEL PRIMER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (235)



DESMONTE DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE EN EL ÁREA DE TRABAJO DEL PRIMER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (236)



DESMONTE DE RED ELÉCTRICA EXISTENTE EN EL ÁREA DE TRABAJO DEL PRIMER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (237)



ESPACIOS DONDE SE DESMONTÓ EL FIBROCEMENTO DE MUROS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (238)



DEMOLICIÓN DE POCETA LAVATRAPEROS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (239)



DEMOLICIÓN DE POCETA LAVATRAPEROS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (240)



DEMOLICIÓN DE POCETA LAVATRAPEROS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (241)



INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN FIBROCEMENTO PARA EL MÓDULO DE VIGILANTES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	01 DE MARZO DE 2024 - 29 DE MARZO DE 2024

FOTOGRAFÍA (242)



INICIA LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN FIBROCEMENTO PARA EL MÓDULO DE VIGILANTES

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
07	03	2024
DD	MM	AAAA

LUGAR DE REUNION: Institucion Educactiva San bernardino

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS
1. Aprobación del acta anterior
2. Revisión de compromisos
3. Avance Ejecución del contrato

II. TEMAS TRATADOS

1. Aprobación del acta anterior: El contratista informa que en el acta anterior se debía incluir que no se realizó el pago de las memorias eléctricas del acta parcial No.3, por demora de la interventoría. Del mismo modo se informa que estas memorias eléctricas presentaron observaciones que fueron remitidas el 4 de marzo de 2024, para subsanación e inclusión dentro del acta parcial No. 4.

2. Revisión compromisos: 2.1 Revisión propuesta ajustada estructura José Antonio Galán (interventoria) - Cumplió: La interventoría hace revisión de la propuesta ajustada entregada por el contratista, y da aval el día martes 05/03/2024 la cual es remitida a la entidad para programar reunión con la rectora de este colegio. Sin embargo, no se tiene respuesta de la entidad. El contratista informa que se requiere la entrega de esta aprobación para proceder con la elaboración de programación y presupuesto.

2.2. Finalización laminas microperforadas Manuel zapata olivella (contratista) - No cumplió: La interventoría manifiesta que en la reunión llevada a cabo con los representantes legales se informó que el avance registrado no coincide con lo pagado, se da claridad de que no se pueden hacer pagos hasta no tener actividades recibidas a satisfacción, se reitera a diario la atención de las observaciones de las actividades pero no se atienden, es importante ajustarlo para poder gestionar los pagos oportunamente. El contratista manifiesta que se debería reconocer un porcentaje de las actividades, sin embargo, a interventoría informa que solo se reconocerán avances cuando la actividad incluya otras actividades de las cuales está comprendido.

La interventoría propone que se haga un listado con las actividades que están pendientes por cobrar, y se realice un recorrido con el profesional apoyo a la supervisión y que se dé el aval por la entidad de cuales actividades se aprueba el pago.

Se informa que se da aprobación para el pago del ítem 20.1.2 DISPOSICIÓN FINAL TEJA EN ASBESTO, para los frentes que aplique.

2.3 Ajuste de observaciones de calidad ventaneria rodrigo de Triana y entrega a interventoría (contratista) - No cumplió: Contratista informa que continúa trabajando en las observaciones

2.4 Ajuste del presupuesto de Carlos Pizarro (contratista) - Cumplió: Se entrega el día miércoles 06/03/2024, el cual fue revisado entre los residentes y está por un valor de 94 millones, sin embargo, se deben hacer ajustes hidráulicos conforme la visita realizada el día de ayer martes 06/03/2024, ya que se debe contemplar una red sanitaria del primer piso y se incluirá dependiendo si con los ajustes que se hagan se solucione el problema. Por ello se suspenderá la actividad hasta tener el diseño hidráulico del profesional. se aclara que se debe suspender el suministro de agua de todo el colegio, ya que no se tiene un registro en la zona de los baños, por ello la actividad se debe hacer el viernes y fin de semana. Es importante socializar con el colegio que no se cuenta por un registro en los baños para poder avanzar en las actividades durante la semana.

2.5 Presupuesto de puesta a tierra de estructuras metálicas (contratista) - Cumplió: Se remiten los presupuestos de puestas a tierra de san Bernardino, Carlos Alban, villa rica y francisco miranda, José Antonio galán y la concepción, el cual será revisado y remitido a la entidad, para evaluar si se incluye dentro del alcance de los frentes y cobro en acta parcial.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA

07	03	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

2.6 Inicio instalación piso caucho villa rica (contratista) - Vigente: la interventoría solicita se informe cuando se hará la instalación del piso caucho, el contratista manifiesta que ha tenido problemas en el suministro eléctrico para terminar las obras en la estructura metálica, y hasta que no se tenga ajustada no se podrá iniciar con el piso caucho. se cuenta con el suministro del piso caucho, pero aún no se instala

2.7 Complementación de los formatos de trazabilidad de RCD para cargue en la SDA (contratista) - Vigente: la interventoría solicita se informe si este compromiso se cumplirá el día de mañana, el contratista manifiesta que no cuenta con unos de los certificados de diciembre y enero, de uno de los proveedores, la interventoría solicita que se envié la información que se tiene para ir haciendo la revisión y poder cargas más ágilmente la información en la secretaria de ambiente.

2.8 Entrega propuesta motorista (contratista) - Cumplió parcialmente: El contratista hace entrega de la propuesta del cerramiento del colegio motorista, pero no se presenta propuesta arquitectónica para la superficie que conformará el patio, que material, a que nivel se hará el patio etc. El contratista informa que no podrá hacer el diseño arquitectónico sin tener un estudio de suelos, la entidad informa que no se requiere un estudio de suelos para esta propuesta. par a la propuesta en esta área se recomienda no rellenar y ajustar la pendiente en un nivel diferente al del patio actual.

2.9 Definición diseño propuesta colegio la concepción (SED) - Cumplió: se recibió la aprobación por parte de la entidad el 01/03/2024, de forma que de este colegio se debería definir el presupuesto y la programación para dar inicio a este frente de obra. Se aclara que el colegio estaba definido para iniciar el 7 de febrero ya ha pasado un mes y no se pueden dar más largas para el inicio de las obras. Se programará reunión el día martes 12/03/2024 para socializar con el colegio las obra y contingencias que se deban realizar.

2.10 Inicio instalación cubierta patio interno de francisco miranda (contratista) - No cumplió: El contratista manifiesta que el día de hoy 07/03/2024 está llegando la teja para esta área y se iniciara a instalar el sábado 09/03/2024.

2.11 Revisión nps (interventoria) - Cumplió: La interventoría realiza la entrega de las observaciones de los no previstos, son devueltos toda vez que no se cumplen con las solicitudes realizadas por la entidad el día viernes 01/03/2024, los cuales serán remitidos el día de hoy posteriormente a la reunión que se llevara con la secretaria de educación.

2.12 concepto de cimentación del colegio Carlos Alban Holguín (SED) - No cumplió: Se había hablado que el profesional estructural de la entidad se encargaría de revisar y conceptuar, toda vez que no se ha podido avanzar en el frente con actividades. El contratista informa que hizo revisión con el profesional estructural del contratista y se enviará la propuesta, informo que se haría un grouting que diseñará y en la parte superior se propondrá un perfil cuadrado para amarrarlo con las correas existentes. Se aclara que el atraso presentado en este frente no es imputable al contratista.

3. Avance ejecución del contrato: 3.1 Componente técnico: Como avance general del contrato en la semana 18 de ejecución se tiene un porcentaje programado del 56,60% contra un porcentaje ejecutado 46,33% con un atraso de 10,27%.

A. Colegio Manuel Cepeda Sede C: *Se presenta un porcentaje programado del 94,00% y un porcentaje ejecutado del 92,91% con un atraso del 1,09%

* este frente finalizaría el 13 de marzo con las nuevas actividades incluidas.

* El atraso corresponde a la finalización de la placa de la gradería que ya finalizo en esta semana, se solicita iniciar con la placas de piso de la aulas.

* Se informa por interventoría que las actividades se atrasaron debido a que la semana pasara no hubo personal, estas actividades se midieron para pasar en el corte, sin embargo no fueron finalizadas por ello toco sacarlas del acta parcial

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
07	03	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

B. Colegio Rodrigo Triana: *Se presenta un porcentaje programado del 88,00% y un porcentaje ejecutado del 60,19% con un atraso del 27,81%.

* Se cuenta con el mismo avance de la semana pasada, toda vez que no se han hecho actividades distintas al ajuste de la ventaneria, no se ha suministrado la malla microperforada. El presupuesto del frente presentado de 112 millones no incluye las actividades del piso de modo que aumentaría el valor a 344 millones. Se informo por el colegio que el día de mañana se entregarían 3 aulas para iniciar el día sábado 9/03/2024.

C. Colegio Villa Rica: * Se presenta un porcentaje programado del 90,00% y un porcentaje ejecutado del 81,20% con un atraso del 8,80%.

* Se aclara que este frente tiene como fecha de finalización el 15 de marzo. Se ha evidenciado la ausencia de personal y material.

* El contratista informa que la falta de personal se debe a inconvenientes del subcontratista y ya se están realizando las medidas pertinentes, para reestructurar el personal, del mismo modo, informa que no ha sido fácil conseguir el material para la estructura metálica de la cubierta.

D. Colegio Francisco de Miranda: * Se presenta un porcentaje programado del 93,00% y un porcentaje ejecutado del 63,56% con un atraso del 29,44%.

* la interventoría aclara que este frente tiene como fecha de finalización el 14 de marzo. Para terminar las obras del aula de sistemas se debe presentar una programación adicional, del mismo modo se informa que se actualice el presupuesto para las obrad de redes de aguas lluvias

* No se han finalizado con las obras de los baños y se hará el cambio de los lavamanos toda vez que presento errores de calidad.

E. Colegio Manuel Zapata Olivella: * Se presenta un porcentaje programado del 89,00% y un porcentaje ejecutado del 94,84% con un avance del 5,84%.

* La interventoría informa que no se instaló lamina microperforada ni pintura en barandas.

* La interventoría realizo un requerimiento de la calidad de los pisos de caucho instalados, ya que se está desprendiendo. se aclara que la interventoría hizo las recomendaciones al momento de la instalación las cuales no fueron tenidas en cuenta. La interventoría nota con preocupación que el piso no tiene ni dos meses de instalado y ya se está deteriorando. El contratista que el día sábado de harán los ajustes en el piso caucho

* La entidad solicita que se retiren los escombros y cortar los tubos que quedaron del filtro francés.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA

07	03	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

F. Colegio Carlos Alban Holguín: * Se presenta un porcentaje programado del 62,30% y un porcentaje ejecutado del 46,33% con un atraso del 15,97%.

* Se informa que para este frente está pendiente el ajuste de las alfajías, pañetar muros, redes eléctricas, estuco y carpintería de puertas, ninguna de las actividades pendientes se puede hacer con niños dentro del colegio. Se informa por parte del contratista se hará la entrega en 20 días, aproximandamente el 21 de marzo de 2024. Sin embargo, se informa que el bloque C no será entregado en esta fecha, por el problema estructural que se presentó con los muros. la entidad informa que se compartió una ficha a la secretaria donde se informaban las fechas para la propuesta de contingencias.



Los bloques B y C deberían ser entregados para la semana posterior a semana santa y el bloque A deberá entregarse para el 31 de mayo de 2024, como se definió. No se avanzará en las aulas del bloque C que tienen los problemas estructurales, se espera que el próximo lunes se entregue la propuesta estructural.

* Se informa que se ha avanzado en la instalación de carpintería de las ventanas, sin embargo, no se ha reconocido el avance toda vez que se tendrán que desmontar para ajustar las alfajías y este avance se eliminaría.
* Se encuentran detalles pendientes por terminar para poder finalizar las actividades en baños. Se informa que el presupuesto actualizado es de $1.528 millones el cual incluye todas las obras adicionales ya socializadas con la rectora.
* Respecto al cerramiento que se debe hacer en la parte posterior del colegio, se informa que debe ubicarse lo más cerca del vecino, evitando que el vecino se corra aún más hacia el interior del colegio, toda vez que el vecino está soportando la teja en el cerramiento actual del colegio.
* Se solicita incluir dentro de la programación las actividades del bloque de la cafetería para medir los avances allí.

G. Colegio San Bernardino: *Se presenta un porcentaje programado del 100,00% y un porcentaje ejecutado del 85,00% con un atraso del 15,00%.

* Se realizo la decantación de las actividades a realzar y la obra debía terminarse el 1 de marzo y se tiene un presupuesto aproximado de $ 900 millones, quitando actividades que no se van a realizar. Es importante la elaboración de un plan de contingencia para las obras que se van a ejecutar.
* En los baños no se han instalado sanitarios y no se han arreglado las puertas que debían desmontarse y pintarse.

H. Colegio Jorge Isaac: *Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 99,97% con un atraso del 0,03%.

* La interventoría informa que ay se realizaron las subsanaciones de las barandas, y se está a la espera de la aprobación del NP del piso para la instalación. Se informa que la rectora del colegio no recibirá la tarima toda vez que el gestor territorial informo que se le cambiaria la totalidad del piso de la tarima.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
07	03	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

I. Emergencias: * **Colegio Porfirio Barba Jacob:** Se solicita iniciar con las actividades, se hizo la visita y se generó el presupuesto, pero no se han iniciado con las actividades. El contratista informa que hoy jueves 07/03/2024 se iniciarán las actividades

***Colegio Laurel de Cera:** las obras de este frente se harán en semana santa, ya que son actividades en la cocina y no puede dejarse sin funcionamiento, de modo que se debe inicia el viernes antes de semana santa y ejecutar actividades en esta semana para entregar la obra la semana siguiente a semana santa. esta intervención es de aproximandamente $1 millón de pesos. Importante aprovechar este momento y tener el personal listo para ejecutar allí actividades.

* **Colegio El Porvenir:** Se intervinieron los puntos críticos de la emergencia y el contratista está revisando las actividades para hacer el cobro de la actividad.

* **Colegio Carlos Pizarro:** Se intervinieron los puntos críticos de la emergencia y el contratista está revisando las actividades para hacer el cobro de la actividad.

* La entidad solicita se informe como está el presupuesto general, ya que se requiere saber en qué se destinara los valores saldo en el resto de los frentes, la interventoría informa que no se han definido los presupuestos de los frentes pendientes por iniciar, lo cual se requiere para tener un balance.

J. Otros Temas: * Se informa que el acta parcial de obra No. 4 debe estar entregada el día 20 de marzo de 2024, para hacer la revisión y tramite.

* La interventoría informa que no se ha entregado el informe técnico, el contratista informa que se entregara el día de mañana 08/03/2024.

J. Frentes por iniciar: * **Dile Bosa:** Se programa recorrido en este frente para definir el alcance a las 10 am, el viernes 08/03/2024

* **Colegio José Antonio galán:** Se programará la visita para la próxima semana para iniciar la socialización e inicio de obras.

* **Colegio La concepción:** se programará la visita para la próxima semana para iniciar la socialización e inicio de obras.

* **Colegio Bosanova:** se realizó la visita y está pendiente la entrega del presupuesto y la programación, para socializar con el rector.

4.2 Componente ambiental: * Se programa recorrido de obra por la entidad con la profesional ambiental de la entidad, se solicita al contratista la asistencia del profesional ambiental del contratista.

* La interventoría informa que no ha recibido el informe ambiental, el contratista informa que el lunes 11/03/2024 hará entrega.

* La interventoría informa que se debe da cumplimiento del porcentaje de aprovechamiento el cual es 30% y la meta de recircularidad de materiales que es del 5%. Se debe revisar la lista de proveedores y/o autorizados por la SDA para dar cumplimiento a este porcentaje, no se puede dar justificación del no cumplimiento y que no se permite.

4.3 Componente SST: * Se realiza el cambio de la profesional SST la cual ya se encuentra aprobada y abarcara los mismos frentes de la profesional retirada.

* Del informe SST mensual faltan dos paz y salvos, para dar la aprobacion.

4.4 Componente Calidad: * se realiza revisión y aprobación de informe 3 de contratista quedando pendiente la entrega del certificado de igol denso, que debe ser entregado en informe no. 4

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
07	03	2024
DD	MM	AAAA

III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
Revisión presupuesto de puesta a tierra de estructuras metálicas	interventoría	8/03/2024
entrega presupuesto y programación la concepción	contratista	8/03/2024
Entrega propuesta estructural para estabilidad en Carlos Alban Holguín	contratista	11/03/2024
Entrega del acta parcial No. 4	contratista	20/03/2024
Reunión revisión alcance Dile bosa	Todas las partes	8/03/2024
Entrega Informe Técnico de obra No. 4	contratista	8/03/2024
Entrega Informe ambiental de obra No. 4	contratista	11/03/2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

Siete	7	del mes de	marzo	3	2024
(Día en letras)	(Día en números)		(mes en letras)	(mes en números)	

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA

07	03	2024
DD	MM	AAAA

IV. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
ENRIQUE CAMPOS	Ap. Supervisión	DCCEE	
Ronald Orano	Residente	Interventoría	
Edna Cepeda	Directora	Interventoría	
Juan Carlos Delgado Correal	Residente Interventoría	CSM 022	
Aidan Vanegas R.	Resp obra.	UT-GEPM	
Sandra J. Mayambuco	Res. HSE.	UT-GEPM	Sandra Mayambuco
Eliana Rojas Pardo	Ing. SST.	UT GEPM.	Eliana Rojas.
Jaime Molina B.	Residente Obra	UT GEPM	
Victoria Prado	Coordinación Obra	UT GEPM	
LIDIA MORA	D/OBRA	UT GEPM	
EDGARDO SUERO CAJIGAS	GERENTE OBRAS	U.T. GEPM	
Julián Ibañez	Inspector Obra	UT GEPM	
Guillermo. Gómez	INSPECTOR	Interventoría	
Jean Paul Reyes M	Inspector interventor	Interventoría	Jean Reyes
Jofia Fernández	SST-MA Interventor	Interventor	
Maria Claudia Muñoz	coordinacion interventoria	CSM022	

INFORMACION GENERAL

OBJETO “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS”.

CONTRATO DE OBRA NO. CO1.PCCNTR.5305583
CONTRATISTA UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
VALOR CONTRATO: $ 6.738.166.067,00
DURACIÓN 8 MESES

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTORIA CONSORCIO SANTA MARIA 022
VALOR CONTRATO: $ 504.080.587,00
DURACIÓN 9 MESES

ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN
AVANCE GENERAL SEMANA 18
PROGRAMADO 56,60%
EJECUTADO 46,33%
AVANCE -10,27%

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 13-03-2024
VALOR $ 194.622.636,11





AVANCE PROGRAMADO 94,00%
AVANCE EJECUTADO 92,91%
AVANCE -1,09%

OBRAS EJECUTADAS

PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL, EXCAVACIÓN EN CUARTO DE RACK Y AULA 107, ANCLAJES, MAMPOSTERIA, DOVELAS, ACERO DE REFUERZO INSTALACION DE METAL DECK PARA LAS GRADERIAS EN CANCHA, FUNDICION DE PLACA Y ESCALERAS EN GRADERIAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 4-03-2024 HASTA 10-03-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA TERMINE PLACA DE GRADERIA, PLACA DE CONTRAPISO DE AULAS, INSTALACION DE ENCHAPE EN AULAS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

PROGRAMACION 14-11-2023 HASTA 18-03-2024

VALOR $112.624.338,50









AVANCE PROGRAMADO 88,00%

AVANCE EJECUTADO 60,19%

AVANCE -27,81%

OBRAS EJECUTADAS

EL CONTRATISTA AVANZA EN REMATES DE ACABADO Y CALIDAD DE VENTANAS

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 04-03-2024 HASTA 10-03-2024

PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA REALICE SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MICROPERFORADA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO VILLA RICA

PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 15-03-2024

VALOR $ 170.122.931,19









AVANCE PROGRAMADO 90,00%

AVANCE EJECUTADO 81,20%

AVANCE -8,80%

OBRAS EJECUTADAS

INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS, MUROS EN SUPERBOARD DEL SHUT DE BASURAS, SUMINISTRO DE PISO CAUCHO SBR Y EPDM

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 04-03-2024 HASTA 10-03-2024

PENDIENTE SIMINISTRE E INSTALE CARCAMO, AVANZAR CON EL SHUT DE BASURAS EN CUANTO A SU RECUBRIMIENTO, INICIAR CON EL PISO CAUCHO DE LA ZONA DE PREESCOLAR, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA, ENCHAPE DE PISOS EN SHUT, PINTURA TIPO KORAZA EN PATIO,

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación





AVANCE DE OBRA

COLEGIO FRANCISCO MIRANDA

PROGRAMACION 7-11-2023 HASTA 14-03-2024
VALOR $ 526.052.374,46





AVANCE PROGRAMADO 93,00%
AVANCE EJECUTADO 63,56%
AVANCE -29,44%

OBRAS EJECUTADAS
DURANTE LA SEMANA NO SE AVANZO EN ACTIVIDADES DEBIDO A FALTA DE PERSONAL DE OBRA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 04-03-2024 HASTA 10-03-2024
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA AVANCE CON EL SUMINISTRO DE CUBIERTA DE PATIOS INTERNOS, REMATE DE BATERIA SANITARIA, AVANZAR CON REDES DE AGUA LLUVIAS.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA





COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
PROGRAMACION 20-11-2023 HASTA 19-03-2024
VALOR $ 271.075.854,17





AVANCE PROGRAMADO 89,00%
AVANCE EJECUTADO 94,84%
AVANCE +5,84%

OBRAS EJECUTADAS
EL CONTRATISTA AVANZA EN PINTURA Y DETALLES EN UNA PARTE DEL PASAMANOS.

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 04-03-2024 HASTA 10-03-2024
PENDIENTE QUE EL CONTRATISTA FINALICE DETALLES DE ACABADO CON EL PASAMANOS DE BARANDAS, PINTURA DE BARANDA, INSTALACION LAMINA MICROPERFORADA EN BARANDA EN TOTAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN


PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 31-05-2024
VALOR $ $ 1.528.837.537,71





AVANCE PROGRAMADO 62,30%
AVANCE EJECUTADO 46,33%
ATRASO – 15,97%



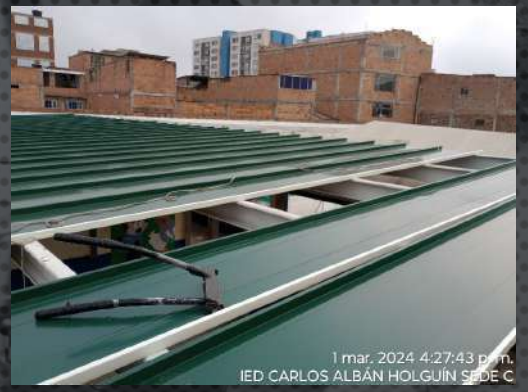

OBRAS EJECUTADAS

CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE VENTANAS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA LÁMINA INFERIOR DE LA TEJA SÁNDWICH EN LA CUBIERTA DE LAS AULAS 1 Y 2 DEL BLOQUE C
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA SOBRE EL AULA 4 DEL BLOQUE C

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 04-03-2024 HASTA 10-03-2024
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA
INSTALACIÓN DE LA TEJA TIPO SÁNDWICH PARA LA CUBIERTA
RED ELÉCTRICA PARA TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE B Y C

AVANCE DE OBRA

COLEGIO SAN BERNARDINO
PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 01-03-2024
VALOR $ 900.000.000,00



EN EL AJUSTE AL BALANCE SE ESTABLECE UN PRESUPUESTO CERCANO A LOS $900.000.000,00 Y UN AVANCE EJECUTADO DEL 85%. TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SOLICITADAS POR LA SUPERVISIÓN

AVANCE PROGRAMADO 100,00%
AVANCE EJECUTADO 85,00%
ATRASO - 15,00%







OBRAS EJECUTADAS
AVANZA LA INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL TERCER PISO
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL TERCER PISO
CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE LOS MESONES EN POLICUARZO EN LOS BAÑOS DEL SEGUNDO Y DEL TERCER PISO
INICIA EL DESMONTE DEL MANTO ASFÁLTICO Y LA DEMOLICIÓN DEL MORTERO DE NIVELACIÓN EN LAS CUBIERTAS PLANAS DE LA SEDE EDUCATIVA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 04-04-2024 HASTA 10-03-2024
INSTALACIÓN DE CUBIERTA, CANALETA METÁLICA, RED ELÉCTRICA, RETIRO MANTO DE ALUMINIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA

COLEGIO JORGE ISAAC

PROGRAMACION 30-10-2023 HASTA 3-01-2024

VALOR $ 209.535.090,29









AVANCE PROGRAMADO 100,00%

AVANCE EJECUTADO 99,97%

ATRASO – 0,03%

OBRAS EJECUTADAS

FINALSE REALIZAN RETOQUES FINALES A LOS PASAMANOS DE LAS CUATRO (4) ESCALERA

OBRAS SIGUIENTE SEMANA 04-03-2024 HASTA 10-03-2024

ASEO Y LIMPIEZA DE LAS ESCALERAS.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

EMERGENCIAS ASIGNADAS

1. COLEGIO FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B - FINALIZADA
2. COLEGIO ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A - FINALIZADA
3. COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A – EN EJECUCION
4. COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB – EN EJECUCION
5. COLEGIO EL PORVENIR – EN EJECUCION
6. COLEGIO LAUREL DE CERA – EN EJECUCION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA
COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A
VALOR $ 64.222.267,21

AVANCE PROGRAMADO 00,00%
AVANCE EJECUTADO 00,00%

OBRAS EN EJECUCION
* DEMOLICIÓN DE PLACA INFERIOR DE ENTREPISO EN LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO













ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA
COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB
VALOR $ 1.872.883,38

AVANCE PROGRAMADO 00,00%
AVANCE EJECUTADO 00,00%


OBRAS EJECUTADAS

* SE REALIZA VISITA EN COMPAÑÍA DE LA INTERVENTORIA Y CONTRATISTA A LA SEDE EDUCATIVA PARA ANALIZAR LA EMERGENCIA, SE VERIFICA EN SITIO QUE LA EMERGENCIA ES POR MOTIVO DE FILTRACIONES DE AGUA DE DOS SANITARIOS EN LA BATERIA SANITARIA DE MUJERES DEL TERCER PISO.








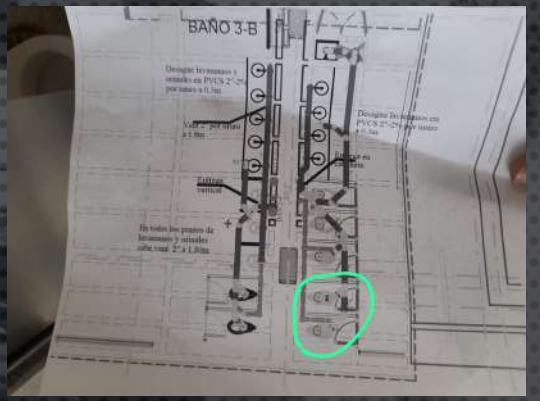



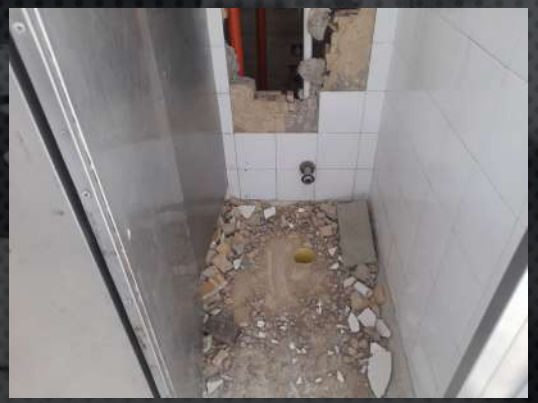

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA
COLEGIO EL PORVENIR
VALOR $ SIN DEFINIR

AVANCE PROGRAMADO 00,00%
AVANCE EJECUTADO 00,00%

OBRAS EJECUTADAS
***** SE PRESENTA UNA FUGA DE AGUA EN PASILLO DESPUÉS DEL TANQUE DE RESERVA. TUBO DE 3 "













ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

AVANCE DE OBRA
COLEGIO LAUREL DE CERA
VALOR $ SIN DEFINIR

AVANCE PROGRAMADO 00,00%
AVANCE EJECUTADO 00,00%

OBRAS EJECUTADAS

* SE REALIZA VISITA AL CUARTO FRIO, SE REQUIERE EL CAMBIO DEL PISO YA QUE SE CRISTALIZO Y LOS ALIMENTOS DEBEN PONERSE EN ESTIBAS.













ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE AMBIENTAL

- SE REMITE A LA ENTIDAD EL INFORME AMBIENTAL N°3 DEL CONTRATISTA DE OBRA.
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR EL RETIRO DE RCD ACOPIADOS EN LOS COLEGIOS MANUEL CEPEDA SEDE C Y SEDE A
- SE SOLICITA
- SE LE REITERA AL CONTRATISTA DE OBRA REALIZAR JORNADAS DE ORDEN Y ASEO DIARIAMENTE AL FINALIZAR LAS JORNADAS DE TRABAJO.
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA REMITIR EL INFORME AMBIENTAL N°4.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE SST

- EL CONTRATISTA DE OBRA REALIZO EL RETIRO DEL ANDAMIO UTILIZADOS EN EL COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA REMITIR EL INFORME SST N°4
- SE REQUIERE ATENDER EL REQUERIMIENTO DE AUSENCIA DE PROFESIONAL SST.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

COMPONENTE CALIDAD

- SE REALIZA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME 3 DE CONTRATISTA QUEDANDO PENDIENTE LA ENTREGA DEL CERTIFICADO DE IGOL DENSO, QUE DEBE SER ENTREGADO EN INFORME NO. 4


MUCHAS GRACIAS

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
14	03	2024
DD	MM	AAAA

LUGAR DE REUNION Soliun ingeniería

(Indique el lugar o medio virtual por el que se lleva a cabo el contrato suscrito)

I. PROPÓSITO DE LA REUNIÓN - LECTURA ACTA ANTERIOR - VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS
1. Aprobación del acta anterior
2. Revisión de compromisos
3. Avance Ejecución del contrato

II. TEMAS TRATADOS
1. Aprobación del acta anterior: el contratista manifiesta que no ha hecho lectura del acta de comité No. 16 del 07/03/2024, queda pendiente la aprobación, la entidad informa que da aprobación del acta.
2. Revisión compromisos: 2.1 Revisión presupuesto de puesta a tierra de estructuras metálicas (interventoría) - Cumplió: La interventoría hace la revisión de las propuestas de las puestas a tierra de los frentes San Bernardino, Carlos Alban Holguín, Villa Rica, Francisco Miranda, José Antonio Galán y la Concepción y se evidencia que cumple con lo requerido, por ello se remite a la entidad para que se de aval o no de incluir estas actividades dentro del alcance de estos frentes. Se queda a la espera de la revisión de la entidad con los profesionales eléctricos, para revisar viabilidad, el contratista informa que el presupuesto de esta alternativa está elaborada con ítems contractuales, a excepción de un ítem del cable No. 2, el cual debe armarse como no previsto construido a partir de ítems contractuales.
2.2. entrega presupuesto y programación la concepción (contratista) - Cumplió: Se recibió la programación de obra y presupuesto del colegio la concepción sin embargo se evidencia que presenta observaciones, toda vez que la programación no incluye valores de las actividades. Se da claridad que se hará un ajuste del presupuesto, debido a las observaciones de la rectora del colegio, por ello debe ajustarse en diseño y presupuesto. El contratista informa que hará entrega del presupuesto el próximo sábado 16/03/2024. La interventoría manifiesta que se debe revisar la propuesta hidrosanitaria conforme a los lineamientos de diseño ajustados y las condiciones actuales del colegio y tomar decisiones al respecto.
2.3 Entrega propuesta estructural para estabilidad en Carlos Alban Holguín (contratista) - No cumplió: El contratista informa que no se ha entregado la propuesta por el estructural y el día martes 19/03/024 se hará la visita por parte de los estructurales de las partes, de modo que así se pueda definir en sitio la solución y dejarlo en acta y bitácora, para no afectar con más atrasos este frente
2.4 Entrega del acta parcial No. 4 (contratista) - Vigente: Este compromiso se encuentra vigente, para entrega el día 20 de marzo, se recuerda que la cuenta debe pasarse el 22 de marzo.
2.5 Reunión revisión alcance Dile bosa (contratista) - Cumplió: La reunión se realizó el jueves y se solicito entrega de presupuesto y programación, para poder ser socializado con el personal del dile bosa, se informa por el contratista que habrá dos días donde se tiene que quitar la energía, debido a las obras eléctricas que se deben ejecutar en día hábil, ya que lo realiza Codensa. El contratista informa que no cuenta con la propuesta de la cubierta, y debido a ello no ha podido entregar el presupuesto y la programación. La interventoría informa que solo se cuentan con 3 meses y medio para ejecutar 5 frentes de obra. La entidad informa que la propuesta de cubierta debió haberse elaborado hace un mes antes de iniciar el frente, para haber ganado tiempo Se informa que la cubierta a instalar será tipo sándwich de color rojo. La interventoría informa que la propuesta debe quedar a más tardar el día lunes 18/03/2024, para la reunión que se llevará acabo el martes

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
14	03	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

2.6 Entrega Informe Técnico de obra No. 4 (contratista) - No cumplió: El contratista manifiesta que hará entrega del informe mensual del componente técnico el día de hoy jueves 14/03/2024

2.7 Entrega Informe ambiental de obra No. 4 (contratista) - No cumplió: El contratista manifiesta que hará entrega del informe mensual del componente técnico el día de hoy jueves 14/03/2024

2.8 Otros compromisos pendientes: 2.8.1 Complementación de los formatos de trazabilidad de RCD para cargue en la SDA (contratista) - Cumplió: se hizo la entrega de los formatos de los RCD pero aun presentan observaciones, se informa que del mes de noviembre faltan firmas del Representante Legal, y de acuerdo al decreto 507 se debe tener una auto certificación de no generación de RCD, para el mes de diciembre faltan firmas del Representante Legal en los formatos y dos formatos adicionales, porque si se hizo generación de RCD. Estas observaciones fueron remitidas el día lunes al correo electrónico. Del mismo modo se solicita que los formatos del plan deben venir diligenciados con las cantidades proyectadas. El contratista informa que hará entrega de la información subsanada el día lunes 18/03/2024

3. Avance ejecución del contrato: 3.1 Componente técnico: Como avance general del contrato en la semana 19 de ejecución se tiene un porcentaje programado del 56,03% contra un porcentaje ejecutado 44,83% con un atraso de 11,19%.

A. Colegio Manuel Cepeda Sede C: *Se presenta un porcentaje programado del 97,00% y un porcentaje ejecutado del 91,91% con un atraso del 5,05%

* Se informa que la institución hizo llamados de atención, ya que el frente esta abandonado y no hay material. Se realizo el retiro del cerramiento de la gradería, sin embargo, hay detalles pendientes por solucionar, pero se hizo el retiro toda vez que no se estaban ejecutando actividades y esto impedía actividades en la cancha.

* Las dos aulas que se le esta cambiando el piso, no se ha avanzado en nada. Solo se ha realizado pintura

* Se informa que para la próxima semana el corte estará en el 100%, y no se avanza en las actividades para finalizar. La interventoría informa que se tendrá reunión el día de mañana viernes 15/03/2024 con personal del colegio, el contratista informa que se giraran recursos el día de mañana y se podrán finalizar estas aulas, del mismo modo se informa que se han tenido inconvenientes por dinero que no ha sido pagado, como lo son las actividades eléctricas. La interventoría solicita se entreguen las memorias de cantidades del componente eléctrico subsanadas el día lunes 18/03/2024, de acuerdo a lo conversado por los previsionales eléctricos para poder hacer el pago de esta actividades

B. Colegio Rodrigo Triana: *Se presenta un porcentaje programado del 45,00% y un porcentaje ejecutado del 19,83% con un atraso del 25,17%.

* Se informa que bajo el atraso ya que se evidencio la intervención de los pisos en las aulas, se hará un mejoramiento con rajón para estos pisos. Se cuenta con un atraso a la instalación de lámina microperforada y rejas den la ventaneria. El contratista informa que se realizara la instalación en el menor tiempo posible durante la semana

*La interventoría informa que con dos o tres personas no será posible finalizar las actividades a tiempo

C. Colegio Villa Rica: * Se presenta un porcentaje programado del 96,00% y un porcentaje ejecutado del 80,98% con un atraso del 15,02%.

* El frente tiene como fecha de finalización el 15/03/2024, la interventoría informa que no se ha finalizado con la estructura, ni con el shut de basuras, no ha llegado la carpintería metálica ni enchapes para el shut de basuras, no se ha avanzado con la instalación de los interruptores ni con la acometida eléctrica. La interventoría informa que el personal y el material ha estado de manera intermitente.

*Se informa que se esta armando la viga perimetral y las vigas que se instalaran no serán necesarias todas conforme al peso que recibirá esta cubierta.

*la entidad informa que este frente debía ser entregado hace muchos días y no se han finalizado las actividades

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
14	03	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

D. Colegio Francisco de Miranda: * Se presenta un porcentaje programado del 98,00% y un porcentaje ejecutado del 72,14% con un atraso del 25,86%.

* la programación finaliza el día de hoy 14/03/2024. La interventoría informa que se llevaron una división de acero del baño debido a que tenia observaciones, no se ha suministrado el lavamanos con las observaciones ajustadas, no se han finalizado detalles de la viga canal del baño, falta un caballete de la cubierta. Por todo esto es importante que el contratista informe cuando se finalizaran estos detalles para poder hacer entrega al rector que se entregue el espacio del aula de sistemas para hacer las actividades

*Durante la semana se hizo visita con el profesional hidráulicos del contratista de obra y se colocó en bitácora que se hará el desagüe a la cancha mientras se hace el trámite para conectar a las redes exteriores. El contratista informa que hará una nueva propuesta para desaguar las aguas lluvias a ras del cerramiento para desaguar en el andén. Por ello se requiere el prepuesto ajustado con esta propuesta nueva el cual entregada el lunes 18/03/2024, toda vez que no se incluye el tanque aquacell. La interventoría informa que la excavación que se inicio debe entibarse para evitar accidentes y garantizar u cerramiento para que no se vean afectados los niños

*El contratista informa que hará entrega de las obras pendientes por detalles el día lunes 18/03/2024 y ahí mismo se hablara con el rector para que se haga entrega del espacio de aula de sistemas, con el plan de trabajo que será entregado por el contratista socializado con el rector

*La interventoría solicita la entrega del NP del tanque de aguacell, el contratista manifiesta que este solo tendrá una cotización ya que Pavco es el único que distribuye en Colombia, la interventoría solicita que se entregue el certificado de único proveedor conforme lo que requiere la entidad para aprobación de no previstos

E. Colegio Manuel Zapata Olivella: * Se presenta un porcentaje programado del 96,00% y un porcentaje ejecutado del 92,51% con un avance del 3,49%.

*La interventoría informa que el fin de semana no se colocaron las láminas del tercer piso, se pintó pasamanos del segundo nivel y falta el del segundo nivel. Se realizo el ajuste del piso caucho con un parche de otro color, la intervenía continua con la preocupación de la calidad y buena instalación del piso caucho, aun se presentan levantamiento de partículas, desde el inicio de la actividad se hizo la recomendación toda vez que este material tiene unas dosificaciones y especificaciones que no se cumplieron.

*se informa que no se han retirado los escombros del exterior, los cuales deben ser retirados lo antes posible para dar cumplimiento a la junta de acción comunal, y hacer corte de los tubos de filtro francés.

*la interventoría informa que este frente ya no está avanzado porque no se han terminado pasamanos y lamina microperforada. La entidad informa que en semana santa se debe finalizar esta actividad este frente

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
14	03	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

F. Colegio Carlos Alban Holguín: * Se presenta un porcentaje programado del 67,16% y un porcentaje ejecutado del 46,88% con un atraso del 20,48%.

* se realizó visita en el colegio con rector y coordinador. La interventoría informa que no se ha avanzado mucho en las obras por falta de personal, se informa que se estableció el compromiso de la entrega del bloque B y aulas 1 y 2 de bloque C el lunes 01/04/2024.

*se realizo recorrido con la rectora y no se va poder mover la fecha final de la entrega de las obras que esta para el 31/05/2024, es decir quedan dos meses y medio para finalizar el frente, se recomienda aumentar el personal. El contratista informa que el día de hoy jueves 14/03/2024 ingresaron nuevas cuadrillas.

*se evidencio que los muros fueron estucados, no tienen el mejor acabado debido a la uniformidad de los muros del colegio, se recomendó la aplicación de pañete, sin embargo, el contratista tendría que demoler el estuco que ya se aplicó y demoraría más con la aplicación de pañete en la totalidad de los muros de todas las aulas, por ello no se aplicara pañete en los muros.

*el contratista solicita se informa el color que será aplicado para los muros de las aulas en la parte interior y en la parte exterior, la entidad informa que se hará la consulta con el arquitecto Alejandro y se definirían los colores.

G. Colegio San Bernardino: *Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 86,00% con un atraso del 14,00%.

* se informa que la programación termino el 1 de marzo de 2024. La entidad informa que en este colegio podría presentar llamados de atención por secretaria de salud al no tener los baños terminados y se cerraría el colegio

*la entidad informa que el atraso presentado corresponde a la programación vigente, ya que no se ha entregado otra, del mismo modo se informa que se evidencia poco personal y generando atrasos.

*la interventora solicita que en la nueva programación se contemplen las actividades que están pendientes por ejecutar que no estaban incluidas. Se había informado por parte del contratista que el 4 de marzo de iniciaría con el desmonte de la cubierta del auditorio y orientación y lo cual a la fecha no se ha realizado.

*el contratista informa que los baños que estaban pendientes llegan el fin de semana para poder finalizar con los baños, sin embargo aun está pendiente lijado y pintado de puertas y la instalación de los vidrios, lo cual quedara para el 1 de abril de 2024.

*se informa que la placa que se va a impermeabilizar se hará con manto frio, debido a que es un espacio transitable y el manto de aluminio se deterioraría.

*la interventoría informa que es pude intervenir el aula de orientación, ya que allí no hay cielo raso y se pueden iniciar con las actividades

H. Colegio Jorge Isaac: *Se presenta un porcentaje programado del 100% y un porcentaje ejecutado del 100%.

* la obra ya se encuentra finalizada, sin tener en cuenta el piso del deck ya que no esta incluido dentro del presupuesto contractual. La interventoría solicita la entrega del ítem del piso del deck el cual esta pendiente y es urgente para poder dar finalización a este frente. El contratista informa que hará entrega el día de hoy 14/03/2024de los ítems del deck tanto de la instalación nueva como el de la recuperación del piso

Del mismo modo se solicita la entrega de los nps que fueron observados

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
14	03	2024
DD	MM	AAAA

II. TEMAS TRATADOS

I. Emergencias:* **Soto Aparicio:** se solicita retirar los escombros que aun están en el frente

* **Carlos Pizarro:** se realizó reunión con rectora y almacenista y se informo que secretaria de salud hizo llamado de atención por no tener los baños en funcionamiento, del mismo modo se informo que la obra lleva mas o menos un mes y no se ha avanzado y se tienen problemas con el cerramiento. El contratista informa que el porcentaje de dedicación del profesional hidráulico es muy bajo para que el diseño hubiera sido entregado con mayor agilidad para darle solución al problema. Como conclusión de la reunión llevada a cabo se informo que se entregara un plan de trabajo y se socializara en reunión el día lunes 18/3/2024.

* El Porvenir: la interventoría informa que sigue brotando agua desde otra parte diferente a donde se realizó el mantenimiento, la emergencia principal ya fue solucionada, sin embargo en otra zona se presenta otra afectación que no se sabe de donde proviene. Se informa que se hará un informe con la entrega de la primera obra de mantenimiento, dejando el soporte documental y paralelamente se identificara cual es el inconveniente que genera el otro problema y hacer la entrega al colegio, y la otra emergencia que se está presentando será atendida a través de una nueva solicitud por parte de la secretaria de educación.

* **Porfirio:** Se informa que la filtración que se presentó debido a que al momento de instalar los sanitario quedo corrido y se perforo la placa perforando tubería lo que genero las filtraciones, se recomendó dejar sin uso el baño una semana

* **Laural de cera:** la interventoría informa que se entregue el plan de trabajo de las actividades que se harán en el cuarto frio, para socializarlo con el colegio, del mismo modo nombres de obra e interventoría para tramitar el ingreso.

J. Otros Temas: * La entidad solicita que se de agilidad con las obras, ya que se han recibido llamados de atención de los rectores de los frentes de trabajo y de secretaria de salud, por obras inconclusas como lo son los baños.

*la interventoría informa que hizo entrega del informe de presunto incumplimiento, y se esta a la espera de que la entidad haga revisión y si lo considera realice el trámite correspondiente, la entidad informa que espera que en el momento que surta el proceso ya no se presenten los atrasos.

*Se solicita que se entregue el listado de las actividades que no es han podido pagar, para hacer revisión y poder sacar en el menos tiempo posible firma de memorias y entrega oportuna del acta parcial que esta para el 20 de marzo de 2024.

J. Frentes por iniciar: Motorista: * el contratista informa que para la placa que se va a realizar se requiere un estudio de suelos e informa que si se le informa de manera formal por interventoría o la entidad que no se requiere estudio de suelos, no se realizaría. La entidad informa que se revisara el tema con el profesional estructural de la entidad para revisar la viabilidad. La necesidad del estudio de suelos corresponde a la garantía que se pueda dar de la obra, dependiendo de las condiciones del suelo.

*la entidad informa que se requiere hacer a presentación del diseño arquitectónico a la alcaldía de la localidad, para recibir la aprobación, se está generando atraso para iniciar este frente. El contratista informa que hará la entrega del esquema arquitectónico el día lunes 18/03/2024

4.2 Componente ambiental: * se recuerda al contratista la asistencia del recorrido programado para el día de mañana y solicita se informe quien asistirá del contratista, se informa que asistirá el ingeniero Romen Bonilla apoyo ambiental.

*se solicita la entrega del informe mensual No. 4, que esta como compromiso para el día de hoy. Es importante hacer la entrega ya que no se ha recibido en primera versión

*se solicita la entrega de los formatos de los RCD subsanados conforme las observaciones remitidas vía correo electrónico

* El contratista manifiesta que los proveedores no han implementado aun el decreto nuevo, por ello los certificados no van a venir con el nuevo, la interventoría informa que los generadores y gestores tienen como plazo un año para hacer el cambio al nuevo decreto, por esto la interventoría solicita se entreguen los soportes de las solicitudes realizadas a gestores y generadores y se anexen

4.3 Componente SST: *se informa que se remitió el informe SST No. 4 de obra y de interventoría.

*se solicita la entrega del paz y salvo del arquitecto residente retirado el cual se encuentra pendiente.

4.4 Componente Calidad: *se solicita incluir dentro del plan de inspección y ensayos los ítems no previstos aprobados, en caso de que se requieran

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
14	03	2024
DD	MM	AAAA

III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
Revisión viabilidad propuestas de puesta a tierra	SED	20/03/2024
Entrega presupuesto ajustado colegio la concepción (ajuste de rectora)	Contratista	16/03/2024
Visita profesionales hidráulicos colegio Carlos Alban Holguín	Todas las partes	19/03/2024
Entrega del acta parcial No. 4	Contratista	20/03/2024
Entrega propuesta de cubierta dile bosa	Contratista	18/03/2024
entrega informe mensual de obra no. 4 componente técnico y ambiental	Contratista	14/03/2024
Entrega de memorias eléctricas	Contratista	18/03/2024
Propuesta desagües colegio Francisco miranda	Contratista	18/03/2024
Presupuesto ajustado con nueva propuesta de desagües colegio francisco miranda	Contratista	18/03/2024
Entrega obras pendientes francisco miranda	Contratista	18/03/2024
Entrega de bloque B y aulas 1 y 2 de bloque C	Contratista	1/04/2024
Entrega de baños san Bernardino	Contratista	1/04/2024
Entrega propuesta arquitectónica colegio motorista	Contratista	18/03/2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

Catorce	14	del mes de	marzo	3	2024
(Día en letras)	(Día en números)		(mes en letras)	(mes en números)	

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23	CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:		OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA		
14	03	2024
DD	MM	AAAA

III. DECISIONES Y/O COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA
Revisión viabilidad propuestas de puesta a tierra	SED	20/03/2024
Entrega presupuesto ajustado colegio la concepción (ajuste de rectora)	Contratista	16/03/2024
Visita profesionales estructurales colegio Carlos Alban Holguín	Todas las partes	19/03/2024
Entrega del acta parcial No. 4	Contratista	20/03/2024
Entrega propuesta de cubierta dile bosa	Contratista	18/03/2024
entrega informe mensual de obra no. 4 componente técnico y ambiental	Contratista	14/03/2024
Entrega de memorias eléctricas	Contratista	18/03/2024
Propuesta desagües colegio Francisco miranda	Contratista	18/03/2024
Presupuesto ajustado con nueva propuesta de desagües colegio francisco miranda	Contratista	18/03/2024
Entrega obras pendientes francisco miranda	Contratista	18/03/2024
Entrega de bloque B y aulas 1 y 2 de bloque C	Contratista	1/04/2024
Entrega de baños san Bernardino	Contratista	1/04/2024
Entrega propuesta arquitectónica colegio motorista	Contratista	18/03/2024

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C. el día:

Catorce (Día en letras) 14 (Día en números) del mes de marzo (mes en letras) 3 (mes en números) 2024

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	DIR-FR-002
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ELABORACIÓN	23/10/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	CO1.PCCNTR.5313251-23
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	

CONTRATO DE OBRA No:	CO1-PCCNTR-5305583-23
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1
OBJETO:	

REUNIÓN No.

FECHA

DD	MM	AAAA
14	03	2024

IV. LISTADO DE ASISTENCIA

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
Jean Paul Reyes M	Ins Tecnico	Interventoria	Jean Reyes
Guillermo Gómez. J	Ins Tecnico Residente	interventoria	
Ronald bravo	Ing. SST.	Interventoria	
Eliana Rojas Pardo	Ing SST	Obra.	Eliana Rojas
Sandra Berrocambuco	Arq. Residente obra.	Obra	Sandra Berr
Ana Judith Pardo.	Arq. Residente Interventoria	UT GEPM	Ana Pardo.
Juan Carlos Delgado Correal	Coordinacion interventoria	CSM 022	
Nana Claudia Natecha	Gerente proyecto	CSM 022	
EDUARDO ACERO CARREÑO	Dirección Obra	U.T. GEPM	
LUIS MORENO R	Coordinación Obras	U1 GEPM	
Victoria Arevalo V.	Apoyo supervisión	UT GEPM	
EURICHE CAMPOS	Arq. Residente	DCCEE-SED	
Jaime Molina B.	Insp obra c	UT GEPM	
Aidan Vanegas Rancers		GEPM	Aidan Vanegas
