SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1. PCCNTR. 5313251
CONSORCIO SANTA MARÍA 022
DIRECCIÓN: CARRERA 70C No. 48 -55
TELÉFONO: 76530168 - 3013942384
Email: proyectos@soliunsas.com

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

INFORME MENSUAL No 7 - COMPONENTE TÉCNICO
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DEL 2024

TOMO____DE____

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

TABLA DE CONTROL

COPIA CONTROLADA	**X**		COPIA NO CONTROLADA		

	Nombre	Cargo	Firma
ELABORÓ	Ronald Ricardo Lozano	Residente de Interventoría	
	Juan Carlos Delgado Correal	Residente de Interventoría	Juan Carlos Delgado Correal
APROBÓ	Edna Constanza Cepeda Sánchez	Directora de Interventoría	

JUNIO DE 2024 / BOGOTÁ D.C.

CONTENIDO

1. CONDICIONES CONTRACTUALES 8

1.1. OBJETO DEL CONTRATO 8

2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS CONTRATOS 9

3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO: 11

3.1. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 11

3.2. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A 17

3.3 COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 18

3.4 COLEGIO VILLA RICA 20

3.5 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA 22

3.6 COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA 24

3.7 COLEGIO ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ). 27

3.8 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 34

3.9 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL 36

4. PROGRAMACION DE OBRA 41

AVANCE CONSOLIDADO 49

5. EMERGENCIAS 49

5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS PIZARRO 50

5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB 50

5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO EL PORVENIR 50

5.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A 51

5.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB 52

5.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO DEBORA ARANGO 52

5.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO LOS PERIODISTAS 52

5.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ 52

5.9 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB 53

5.10 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO DEBORA ARANGO 53

5.11 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO LOS PERIODITAS 54

5.12 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ 54
5.13 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB 54
5.14 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO DEBORA ARANGO 55
5.15 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO LOS PERIODISTAS 55
5.16 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 56
6. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO 56
6.1 SEGUIMIENTO SEDES EDUCATIVAS 56
7. SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES 58
8. SEGUIMIENTO JURIDICO 58
8.1 SEGUIMIENTO A POLIZAS CONTRACTUALES 58
8.2 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 61
9. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA: 62
9.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 62
9.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 63
9.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 64
9.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 65
9.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO BOSANOVA 66
9.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) 67
9.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL 68
9.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A 69
9.9 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JORGE ISAACS 71
9.11 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN 72
9.12 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MOTORISTA 73
9.13 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 74
9.14 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 75
9.15 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA 76
9.16 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 77
9.17 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO BOSANOVA 78
9.18 ACTIVIDADES EJECUTADAS – DILE BOSA 79
9.19 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN 80

9.20 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO SAN BERNARDINO 82
9.21 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RURAL LA CONCEPCION 83
9.22 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JORGE ISAACS 84
9.23 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JOE ANTONIO GALAN 85
9.24 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MOTORISTA 87
9.25 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 89
9.26 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 89
9.27 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO VILLA RICA 90
9.28 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 91
9.29 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO BOSANOVA 92
9.30 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO DIEL BOSA 93
9.31 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN 94
9.32 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO 96
9.33 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO RURAL LA CONCEPCION 98
9.34 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO JORGE ISAACS 99
9.35 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN 100
9.36 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO MOTORISTA 102
9.37 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C 103
9.38 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO RODRIGO DE TRIANA 104
9.39 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO VILLA RICA 105
9.40 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO FRANCISCO MIRANDA 106
9.41 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO BOSANOVA 107
9.42 ACTIVIDADES EJECUTADAS DILE BOSA 108
9.43 ACTIVIDADES EJECUTADAS CARLOS ALBAN HOLGUIN 109
9.44 ACTIVIDADES EJECUTADAS SAN BERNARDINO 110
9.45 ACTIVIDADES EJECUTADAS RURAL LA CONCEPCION 111
9.46 ACTIVIDADES EJECUTADAS JORGE ISAACS 112
9.47 ACTIVIDADES EJECUTADAS JOSE ANTONIO GALAN 113
9.48 ACTIVIDADES EJECUTADAS MOTORISTA 114
10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS 115

11. CLIMATOLOGÍA 116
12. INFORME ADMINISTRATIVO 116
12.1 ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME 116
12.2 ACTAS GENERALES GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME 116
12.3 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME 117
12.4 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE OBRA CO1-PCCNTR.5305583 de 2023 117
12.5 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1-PCCNTR.5313251 120
13. REGISTRO FOTOGRÁFICO 122
14. ITEMS NO PREVISTOS 122
15. BITÁCORA 125
16. CORRESPONDENCIA 126
17. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 138
18. CONTROL PRESUPUESTAL 141
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 142

TABLA DE ANEXOS

ANEXO 1. POLIZAS
ANEXO 2. CONTROL CLIMATOLOGICO
ANEXO 3. COPIAS ACTAS DE ENTREGA
ANEXO 4. INFORMES SEMANALES
ANEXO 5. REGISTRO FOTOGRAFICO
ANEXO 6. COPIAS ACTAS DE COMITE
ANEXO 7. BITACORA DE OBRA
ANEXO 8. COMUNICACIONES ENVIADAS Y RECIBIDAS
ANEXO 9. FORMATOS DE TRAZABILIDAD

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde al seguimiento, verificación y control realizado por esta Interventoría en cumplimiento del contrato No. CO1. PCCNTR. 5313251 de 2023, suscrito entre el CONSORCIO SANTA MARÍA 022 y la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL - SED, a las actividades ejecutadas por el Contratista de Obra UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1, de acuerdo con el contrato No. CO1. PCCNTR. 5305583 de 2023.

La revisión se efectuó para el periodo correspondiente al sexto mes de ejecución del contrato de obra definido desde el 30 de abril de 2024 hasta el 29 de mayo de 2024, donde se tuvieron en cuenta los aspectos técnicos, administrativos, financieros, ambientales, SST y legales, según las condiciones contractuales establecidas; cabe resaltar que el seguimiento se realiza acorde con los lineamientos establecidos en el Anexo Técnico del contrato respectivo, así como lo indicado en la cartilla de lineamientos para el diseño de Colegios de la SED y el Manual de Interventoría de la SED, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo antes mencionado, dentro del presente informe se describen las labores realizadas por el Contratista en el periodo de tiempo enunciado anteriormente; así mismo, se presentan las observaciones, comentarios y recomendaciones a las actividades ejecutadas en el periodo reportado. Finalmente, se resumen los estados de los Contratos de obra e interventoría, exponiendo al final del documento las respectivas conclusiones del estado del contrato de obra, a la fecha de entrega de este reporte.

1. CONDICIONES CONTRACTUALES

1.1. OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."

LOCALIZACION DEL PROYECTO

En el presente periodo, el proyecto se desarrolla, principalmente en 14 Sedes Educativas que se describen a continuación:

COLEGIO	SEDE	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	ALCANCE INICIAL
MANUEL CEPEDA	C -	CALLE 56 # 83 - 26 SUR	08 - KENNEDY	• Adecuación zonas recreativas y mantenimiento de cubierta
MANUEL CEPEDA	A - PRINCIPAL	CALLE 56 # 81 - 26 SUR	08 - KENNEDY	• Mantenimiento impermeabilización y adecuación cancha deportiva
RODRIGO DE TRIANA	C – CAMPO HERMOSO	CALLE 38 # 89 - 81 SUR	08 - KENNEDY	• Adecuación de domo cancha deportiva y adecuación ventilación
VILLA RICA	B -	CALLE 49 # 78 - 35 SUR	08 - KENNEDY	• Mejoramiento acústico auditorio. • Adecuación área recreativa primera infancia • Adecuación área administrativa con módulos de oficina abierta
FRANCISCO MIRANDA	A - PRINCIPAL	CARRERA 73 B Bis # 40 - 55 SUR	08 - KENNEDY	• Restitución de cubiertas bloque experimental y bloque administrativo. • Mejoramiento de baños semisótano bloque aulas, Puesta en funcionamiento del tanque de almacenamiento
MANUEL OLIVELLA ZAPATA	A - PRINCIPAL		08 - KENNEDY	• Adecuaciones estructurales mampostería 2 y 3 piso. • Impermeabilización parcial de cubiertas. • Adecuación barandas circulaciones
CARLOS ALBÁN HOLGUÍN	C - SAN JOSÉ	CARRERA 80 K # 85 A - 33 SUR	07 - BOSA	• Restitución de cubierta • adecuación baterías sanitarias, zonas deportivas y recreativas • acabados de aulas y carpintería metálica

JORGE ISACCS	A - PRINCIPAL	CARRERA 92 # 73 - 50 SUR CALLE 73 SUR # 91 - 35	07 - BOSA	• Doble cerramiento. • manejo de ALL y adecuación zonas exteriores
RURAL LA CONCEPCIÓN	A - PRINCIPAL		07 - BOSA	• Mejoramiento de acabados pisos, carpintería metálica, red eléctrica. • Adecuación baterías sanitarias
JOSE ANTONIO GALÁN			07 - BOSA	• Adecuación áreas recreativas y acabados como pisos y carpintería metálica. • Requiere aula modular
BOSANOVA			07 - BOSA	• Adecuación acabados pisos, carpintería metálica y pintura
SAN BERNARDINO	A - PRINCIPAL	CARRERA 89 C # 79 - 51 SUR	07 - BOSA	• Restitución de cubiertas y red eléctrica • Adecuación baterías sanitarias, zonas deportivas y carpintería metálica
MOTORISTA			07 - BOSA	• Adecuación lote cesión
DILE BOSA			07 - BOSA	• Mantenimiento bloque administrativo y adecuación de redes eléctricas
EMERGENCIAS				
FERNANDO SOTO APARICIO	B -	TRANSVERSAL 73 C BIS B N°1ª99	08 - KENNEDY	• Impermeabilización de cubierta
ESMERALDA ARBOLEDA	A	CL. 71a SUR #83-20	07 - BOSA	• Mantenimiento de bombas hidráulicas
CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ	A	CL. 72 SUR #100A-71	07 - BOSA	• Cambio de la tubería de agua potable y agua residual en baterías de baños
PORFIRIO BARBA JACOB		CL. 70B SUR #81I-2	07 - BOSA	• Cambio de tubería con fugas en baños
EL PORVENIR		CL. 51 SUR #91D 56	07 - BOSA	• Cambio de tubería con fugas
LAUREL DE CERA		CL. 85 SUR #94-75	07 - BOSA	• Cambio de piso del cuarto frio
LOS PERIODISTAS		CL 41 C Sur No. 78 H - 85	07 - BOSA	• Cambio de sanitarios y lavamanos
LA FELICIDAD				• Ajuste sillas de auditorio
DEBORA ARANGO		CARRERA 84 A No 57 B 04 Sur	07 - BOSA	• Mantenimiento inundación parqueaderos
MANUEL CEPEDA	C	CALLE 56 # 83 - 26 SUR	08 - KENNEDY	• Atención red eléctrica

2. DESCRIPCION GENERAL DE LOS CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA

No. de contrato CO1.PCCNTR.5305583
Contratista Consultoría y/obra UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1

Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADE FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Periodo inicial de obra	OCHO (8) MESES
Plazo total del contrato	OCHO (8) MESES
Valor inicial del contrato (100%)	$6.738.166.067,00
Valor final total del contrato	$6.738.166.067,00
Fecha Inicio	30 de OCTUBRE 2023.
Fecha de Terminación del contrato:	29 de JUNIO DE 2024.

CONTRATO DE INTERVENTORIA

No. de contrato	CO1.PCCNTR.5313251
Contratista de Interventoría	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
Objeto	"REALIZAR INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
Periodo etapa de obra:	OCHO (08) MESES
Plazo de liquidación	UN (01) MES
Plazo total:	NUEVE (09) MESES
Valor inicial del contrato (100%)	$ 504.080.587,00
Valor final total del contrato	$ 504.080.587,00

3. ESTADO INICIAL DEL PROYECTO:

Desde el inicio del contrato, se ha realizado un reconocimiento de algunos frentes a intervenir, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Educación Distrital (SED), personal de la Interventoría CONSORCIO SANTA MARÍA 022 y personal del contratista de obra UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1, donde se suscriben las respectivas Actas de Inicio y se realizan las Actas de Vecindad.

En esta visita se identificaron algunas sedes educativas priorizadas para intervenir dentro del alcance del presente contrato, en los cuales son fundamentalmente, obras de mantenimiento en cada uno de los frentes de obra.

En el presente periodo, se han priorizado las siguientes sedes educativas:

COLEGIO	SEDE	DIRECCIÓN	BARRIO	LOCALIDAD
MANUEL CEPEDA	C -	CALLE 56 # 83 - 26 SUR		08 - KENNEDY
MANUEL CEPEDA	A - PRINCIPAL	CALLE 56 # 81 - 26 SUR		08 - KENNEDY
RODRIGO DE TRIANA	C – CAMPO HERMOSO	CALLE 38 # 89 - 81 SUR		08 - KENNEDY
VILLA RICA	B -	CALLE 49 # 78 - 35 SUR		08 - KENNEDY
FRANCISCO MIRANDA	A - PRINCIPAL	CARRERA 73 B Bis # 40 - 55 SUR		08 - KENNEDY
MANUEL OLIVELLA ZAPATA	A - PRINCIPAL			08 - KENNEDY
CARLOS ALBÁN HOLGUÍN	C - SAN JOSÉ	CARRERA 80 K # 85 A - 33 SUR	EL JARDÍN	07 - BOSA
JORGE ISACCS	A - PRINCIPAL	CARRERA 92 # 73 - 50 SUR CALLE 73 SUR # 91 - 35	SAN BERNARDINO XXII	07 - BOSA
SAN BERNARDINO	A - PRINCIPAL	CARRERA 89 C # 79 - 51 SUR	SAN BERNARDINO	07 - BOSA

3.1. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CARRERA 83- # 46 B SUR



Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes al mejoramiento de graderías en cancha múltiple, mantenimiento de humedades en muros internos y externos del bloque de aulas, pintura general del bloque tipo alianza aulas, impermeabilización de placa con manto asfaltico zona entrada principal, mejoramiento de piso zona exterior resane y pintura, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	
	

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	
	
	

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C









FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C











FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C

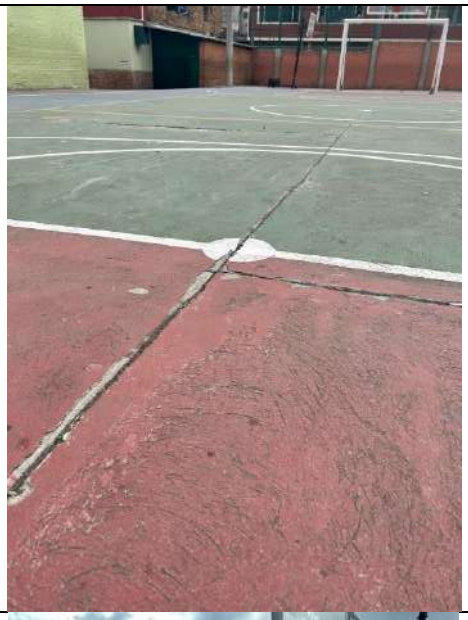






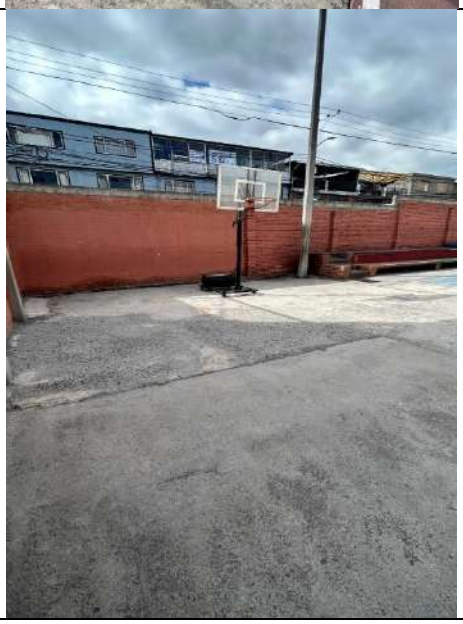

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	
	



3.2. COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 56 SUR # 80H-63

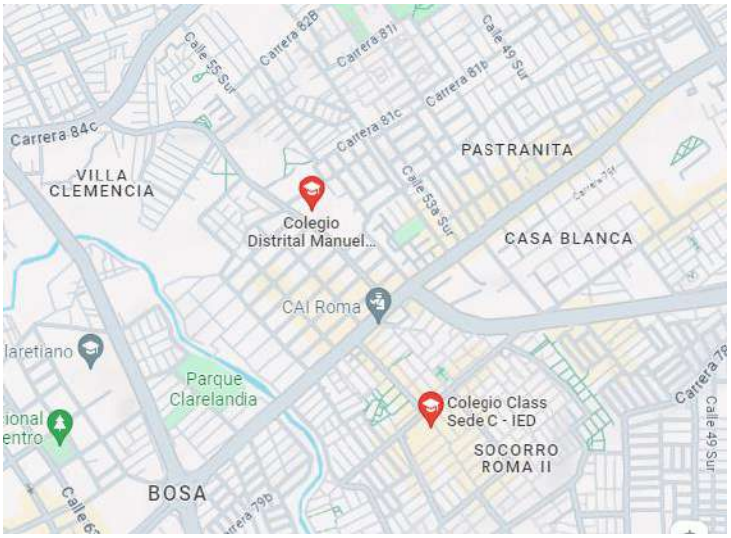

Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a impermeabilización de la cubierta de sistemas y primaria, cambio de grama sintética, mantenimiento de piso caucho zona de primaria, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A

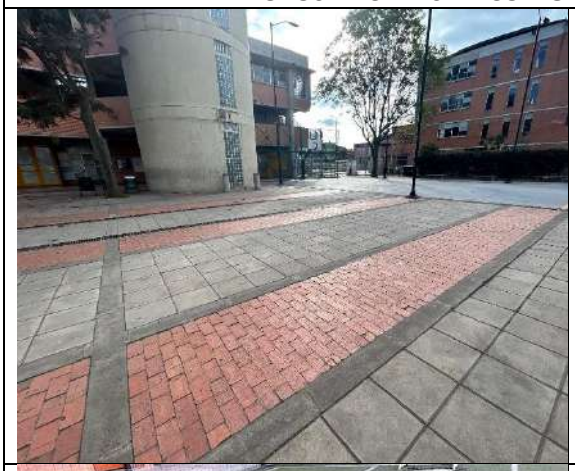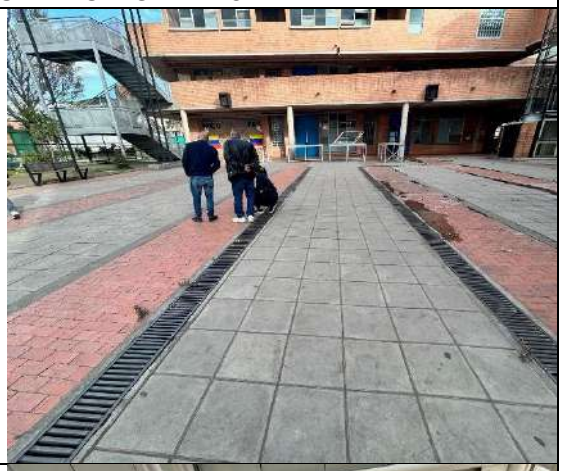







3.3 COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 38 SUR BIS # 89-81

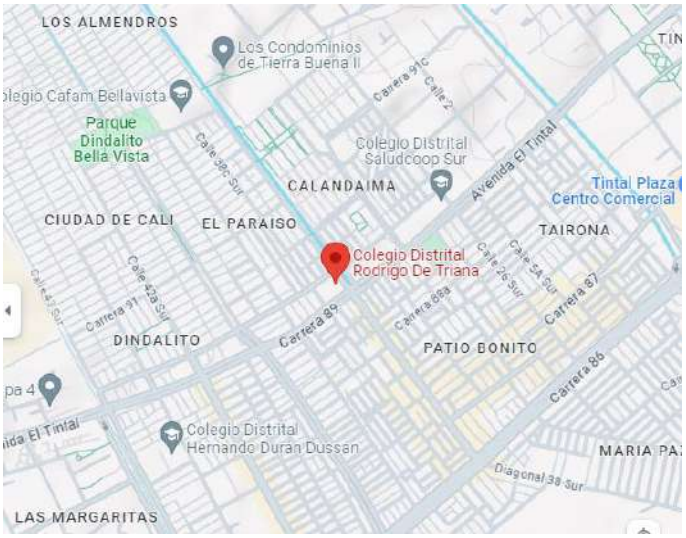

Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a cambio de ventanas de las aulas del primer y segundo nivel, dejando las rejas tipo bancaria y ventanas corredizas, instalar cubierta en patio central entre edificios e instalación de canales de aguas lluvias, instalar lamina microperforada en cerramiento occidental, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	
	

FOTOS INICIALES COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	
	
	

3.4 COLEGIO VILLA RICA

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 49 SUR # 78-35




Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a instalación de cielo raso en el aula del auditorio, instalar piso caucho, cubierta y mantenimiento de muros en patio de preescolar, instalación de divisiones en aluminio en zona administrativa, y construcción de shut de basuras, se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO VILLA RICA








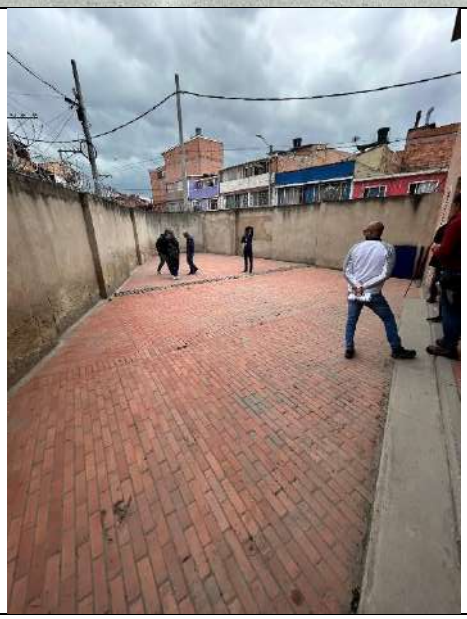

FOTOS INICIALES COLEGIO VILLA RICA	
	

3.5 COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la DIAGONAL 41 SUR #73ª-80

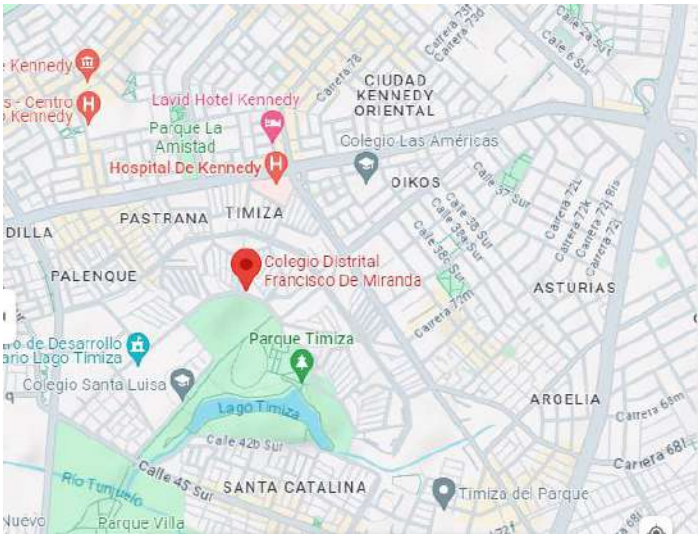


Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a cambio de cubierta y redes eléctricas en 4 aulas del tercer piso y aulas de sistemas, mantenimiento de baterías sanitaria, mantenimiento de redes de aguas luvias, cambio de cubierta plástica. se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA








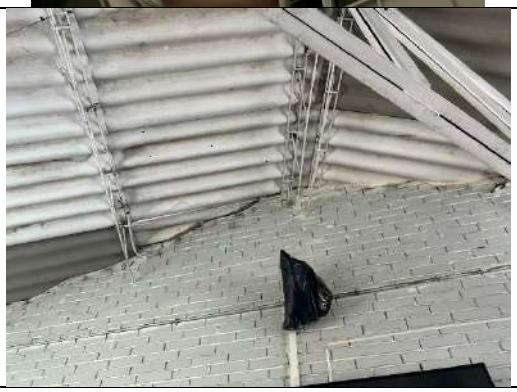

FOTOS INICIALES COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	
	
	


3.6 COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA

Se encuentra ubicado en la localidad de Kennedy en la CALLE 1 BIS # 87-80

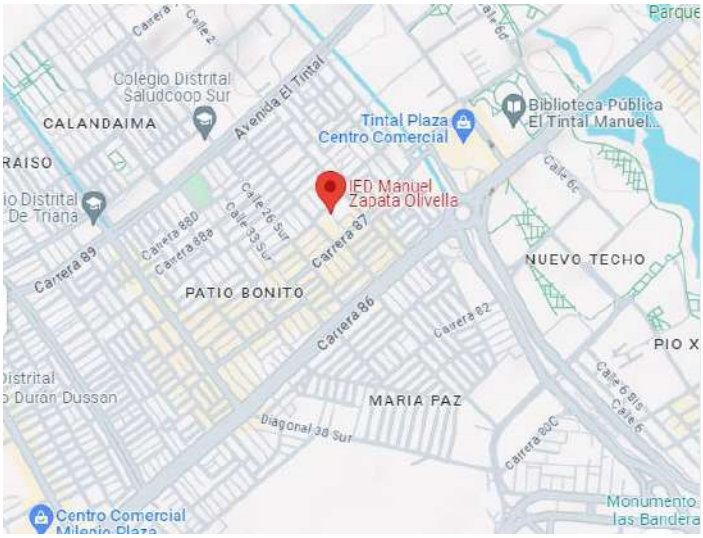

Las actividades de este frente de obra y priorizadas a realizar son correspondientes a impermeabilización de la cubierta, instalación de pasamanos en barandas del segundo y tercer piso, instalación de piso caucho, mantenimiento de humedades en muro en zona de preescolar. se realiza una breve descripción de las obras a ejecutar. Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.


FOTOS INICIALES COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA

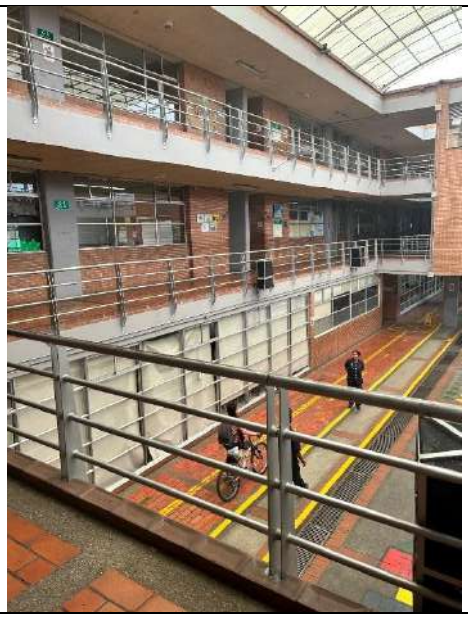




FOTOS INICIALES COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA



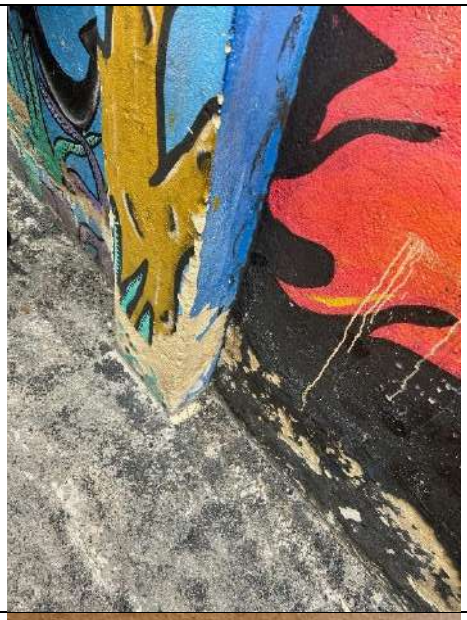



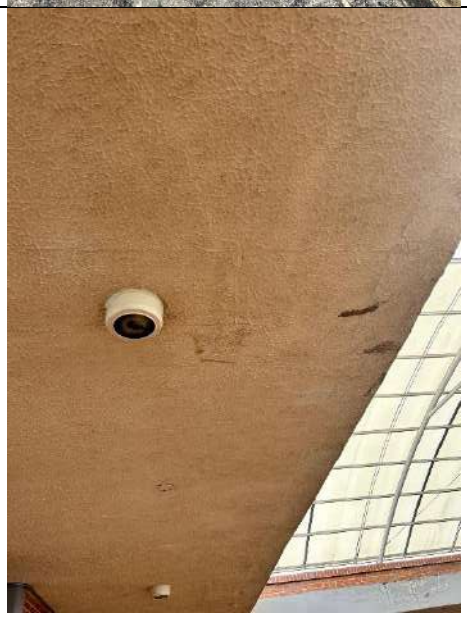

3.7 COLEGIO ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ).



Durante el recorrido conjunto (SED, IED, Interventoría y Contratista) realizado el 19 de septiembre de 2023, se identificaron y priorizaron de manera inicial, las siguientes actividades a ejecutar:

- Cambio de cubiertas.
- Cambio de puertas.
- Cambio de ventanería.
- Adecuar una zona de aseo en el baño de mujeres.
- Cambio de lavamanos en los baños.
- Demolición de muros divisorios en baños e instalación de divisiones en acero.
- Cambio de ventanería en baños de niños y niñas.
- Cambio de sanitarios en baños de niños y de niñas de básica primaria, es importante mejorar la capacidad de los baños.
- En los baños de preescolar se requiere la adecuación del baño, el cambio de mesones, el cambio de divisiones, el cambio de enchapes y el cambio de sanitarios.
- En el área de juegos se debe construir un placa o adecuar el piso, bien sea en caucho o en concreto.
- Adecuar el cerramiento en la zona posterior del colegio.
- Revisión de las canales de aguas lluvias, ya que presentan goteras y su capacidad es insuficiente.
- Demarcación de la cancha y pintura de las estructuras deportivas (arcos).
- Revisar y ajustar el sistema eléctrico para que cumpla con la normatividad vigente.

- Se requieren nuevos tomacorrientes.
- Hacer mejoramiento de la zona de bodega.
- Solucionar el tema de goteras de cubierta, en la cafetería del área de bodega.
- Cambio de las rejillas de los cárcamos.
- Adecuar un espacio para realizar actividades bajo cubierta en el patio principal.
- Adecuación de la bodega anexa al baño de preescolar.

Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
HALL INTERNO	BAÑOS
	
BAÑOS	BAÑOS

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
BAÑOS	BAÑOS
	
BAÑOS	BAÑOS
	
BAÑOS	BAÑOS

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
BAÑOS	JUEGOS INFANTILES
	
JUEGOS INFANTILES	JUEGOS INFANTILES
	
JUEGOS INFANTILES	PATIO POSTERIOR

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
POSTERIOR	HALL INTERIOR
	
HALL INTERIOR	VENTANERIA EN GENERAL
	
CU BIERTA EN GENERAL	ZONA DE JUEGOS

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
HALL INTERIOR	**ZONA DE JUEGOS**
	
ZONA DE JUEGOS	**ZONA DE BODEGA**
	
REJA DE ACCESO	REJA DE ACCESO

FOTOS INICIALES DE DIAGNOSTICO COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C – SAN JOSE	
	
REJA DE ACCESO	REJA DE ACCESO
	
PATIO CENTRAL	PATIO CENTRAL

3.8 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL



Durante el recorrido conjunto (SED, IED, Interventoría y Contratista) realizado el 19 de septiembre de 2023, se identificaron y priorizaron de manera inicial, las siguientes actividades a ejecutar:


- Cambio del piso del auditorio exterior, pues la estructura de madera se encuentra deteriorada y se debe proponer un material para cambio.
- Instalación de pasamanos en las escaleras

Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL



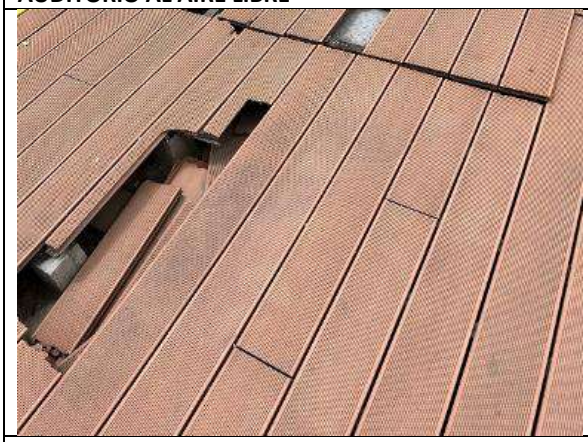

FOTOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	**AUDITORIO AL AIRE LIBRE**
	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	**AUDITORIO AL AIRE LIBRE**
	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	**AUDITORIO AL AIRE LIBRE**
	
AUDITORIO AL AIRE LIBRE	**ESCALERA**

FOTOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL	
	
ESCALERA	**ESCALERA**

3.9 COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL



Durante el recorrido conjunto (SED, IED, Interventoría y Contratista) realizado el 19 de septiembre de 2023, se identificaron y priorizaron de manera inicial, las siguientes actividades a ejecutar:



- Cambio de las cuatro (4) cubiertas que actualmente son de asbesto cemento.
- Revisar y ajustar el sistema eléctrico para que cumpla con la normatividad vigente.
- Revisión, ajuste y cambio de luminarias al momento de cambiar las cubiertas.
- Revisión de los baños de coordinación y rectoría, ya que no cuentan con salida de aguas residuales.
- Limpieza de las canales de aguas lluvias en la cubierta




- En los baños se requiere cambio de mesones, cambio de sanitarios, cambio de pisos, cambio de puertas e instalación de orinales individuales.


Las respectivas actas de priorización y actas de inicio se presentaron en el informe N°1.

FOTOS INICIALES DE DIAGNÓSTICO COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL	
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA CON DOMO ACRÍLICO**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**

	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**VIGA CANAL PERIMETRAL**

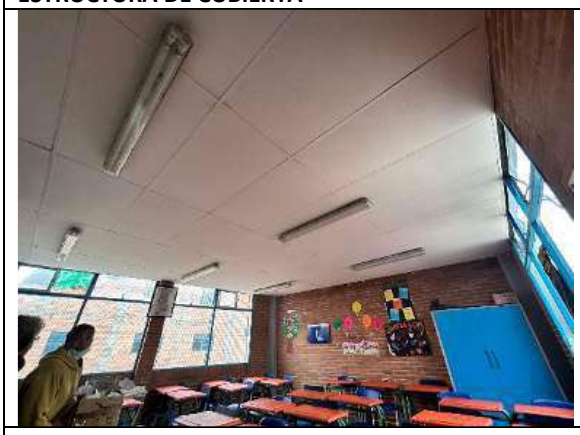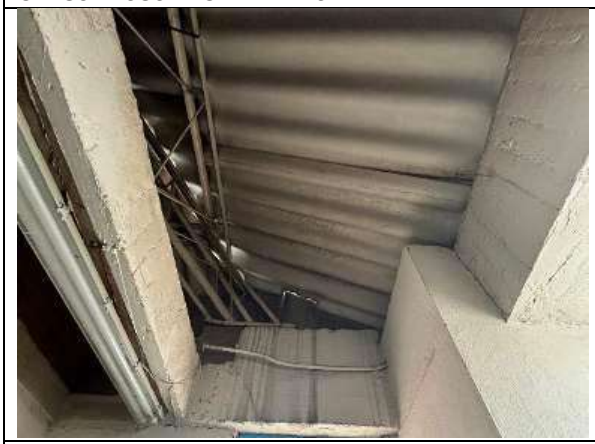	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**
	
CIELOS RASOS Y LUMINARIAS	**CIELOS RASOS Y LUMINARIAS**
	
CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO	**CUBIERTA EN ASBESTO CEMENTO**

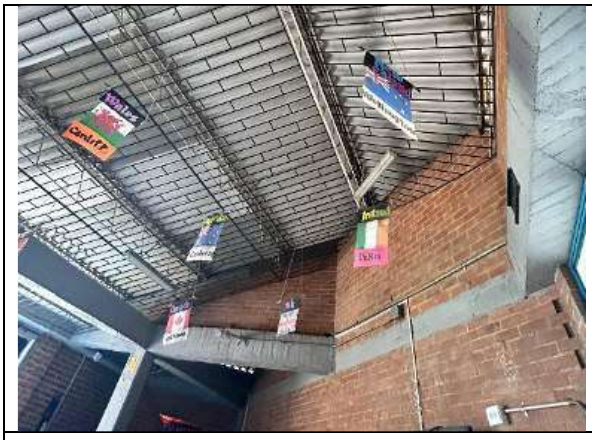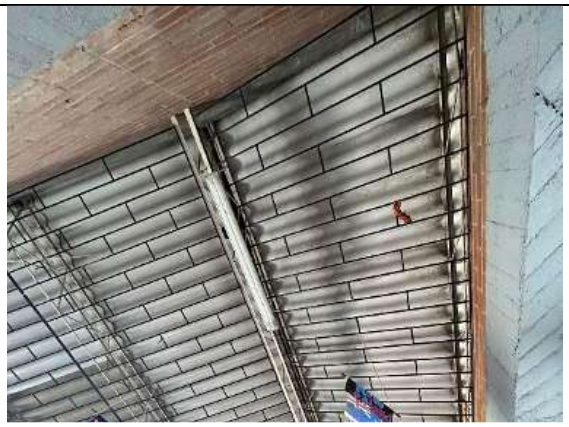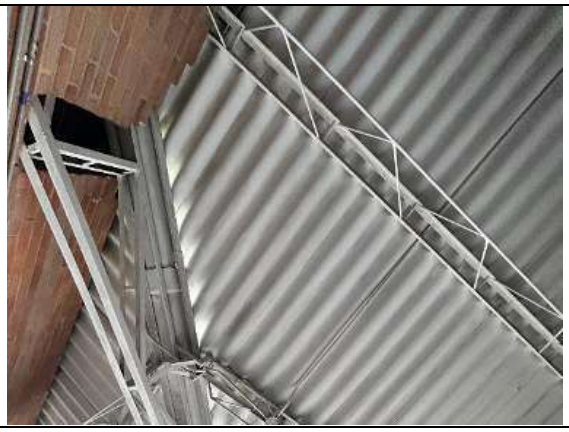	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**
	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**
	
ESTRUCTURA DE CUBIERTA	**ESTRUCTURA DE CUBIERTA**

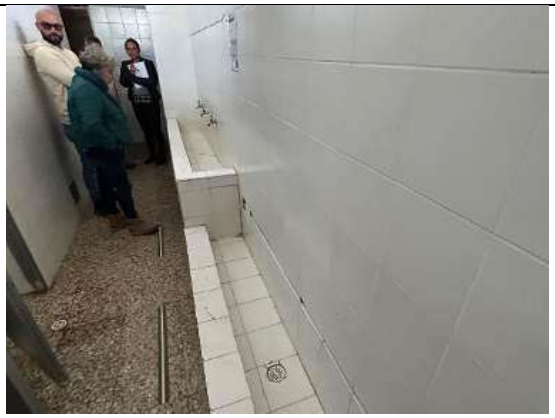	
LAVAMANOS CORRIDO	**LAVAMANOS CORRIDO**
	
BAÑOS DE NIÑOS	**BAÑOS DE NIÑOS**

4. PROGRAMACION DE OBRA

A la fecha del presente informe N°7 que abarca desde el 30 de abril de 2024 hasta el 29 de mayo del 2024, el Contratista de Obra UNION TEMPORAL GEPM 2023-1, ha realizado las obras o actividades constructivas y de mantenimiento en los distintos frentes de obra priorizados por la supervisión, a los cuales se les ha realizado el acompañamiento por parte de esta interventoría CONSORCIO SANTA MARIA 022, para ver, revisar y realizar el seguimiento correspondiente a cada una de las actividades realizadas.

Se les solicito avanzar en las obras concernientes a las obras que a la fecha estaban pendientes en las distintas sedes y realizar un constante ajuste al presupuesto y programación de cada frente de obra, ya que a medida que se avanza se evidencian actividades que no se tenían contempladas en el diagnóstico inicial y que son necesarias para el buen desarrollo del contrato.

De acuerdo a las programaciones entregada por el contratista y avaladas por la interventoría de la sede, se hace un resumen del avance de las obras ejecutadas en este periodo en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C

En este frente en particular se avanzó con instalación de pañetes impermeabilizados en muros de salones de ingles y cuarto de rack, instalación de pintura en cuarto de ingles y cuarto de rack, remates de placa en graderías (aún están sin recibir porque quedan pendientes de acabados), instalación de barandas en graderías; el atraso de esta sede educativa durante el mes de mayo se debe a que el contratista tiene pendiente la ejecución de actividades de remates en puertas de salones preescolar, remates en graderías y remates finales para entregas, se realiza entregas parciales de las aulas de ingles y cuarto de rack para su puesta en servicio, sin embargo quedan pendientes para realizar acta final y cierre de frente de obra.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de abril al 05 de mayo del 2024	Informe Semanal 27	100.00%	99.64%
06 de mayo al 12 de mayo del 2024	Informe Semanal 28	100.00%	99.64%
13 de mayo al 19 de mayo del 2024	Informe Semanal 29	100.00%	99.64%
20 de mayo al 26 de mayo del 2024	Informe Semanal 30	100.00%	96.64%

En este frente en particular, el quedan actividades muy puntuales y pequeñas para terminar el 100% de ejecución, sin embargo, no se ha dispuesto del tiempo para terminarlas. Se le solicita al contratista en reiteradas ocasiones cerrar pendientes para entregar el frente por completo sin observaciones a la institución educativa.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A

En este frente en particular se terminan todas las obras priorizadas y se realiza la respectiva acta de puesta en servicio

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de enero al 4 de febrero de 2024	Informe Semanal 14	100%	100%

AVANCE DE OBRA COLEGIO RODRIGO DE TRIANA

En este frente en particular se avanza con destroncado y pulido de piso, con la instalación de estructura de cielo raso en una aula del primer nivel, con suministro e instalación de enchape de piso en granito en 3 aulas del segundo nivel y primer nivel, instalación de pintura en aulas de primer piso, actividades de destroncado y pulido de piso aulas primer y segundo piso, se avanza con destroncado y pulido de piso primer nivel para acabado final, con la instalación de paneles drywall de cielo raso en una aula del primer nivel, instalación de pintura en aulas de primer piso, Se realiza la instalación de las rejas en ventanearía, con reemboquillado de muros salones segundo piso. con pintura en esmalte de colores salones primer piso, con pulido de pisos primer piso, con instalación de luminarias salones primer piso, con pintura en esmalte de colores salones primer piso, reemboquillado de muros salones segundo piso, se termina pintura esmalte en paredes y techos salones primer piso. Se avanza con reemboquillado salones segundo piso y primeras manos de pintura en hall segundo piso . El atraso de este frente se presenta por suministro de materiales y rendimiento de obra, por la no frecuencia de personal en obra durante todo el mes.

AVANCE DE OBRA COLEGIO RODRIGO DE TRIANA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de abril al 05 de mayo del 2024	Informe Semanal 27	100.00%	83.57%
06 de mayo al 12 de mayo del 2024	Informe Semanal 28	100.00%	93.42%
13 de mayo al 19 de mayo del 2024	Informe Semanal 29	100.00%	95.41%
20 de mayo al 26 de mayo del 2024	Informe Semanal 30	100.00%	98.10%

En este frente en particular el avance de ejecución se ha visto afectado debido a que el contratista no mantiene personal constante durante todo el mes, por parte de la interventoría se ha realizado los respectivos requerimientos y en comité de obra se han hecho saber dicha situación, ya que el plazo de ejecución para este colegio ya esta finalizado de acuerdo a programación presentada por el contratista. Adicionalmente se determinan actividades adicionales en el Hall del segundo piso, y escaleras en reemboquillado y pintura de muros.

AVANCE DE OBRA COLEGIO VILLA RICA

En este frente en particular se avanza con remates de pintura shut de basuras y plataforma para acceso, se instalan las bajantes de las canales de cubierta patio preescolar, se avanza con fabricación de plataforma y rampa para acceso al shut de basuras, se avanza con fabricación de baranda para plataforma shut de basuras, la instalación de SBR para piso caucho en patio de preescolar donde se hacen correcciones de resina solicitadas por interventoría. Se inicia la instalación de SBR para piso caucho en patio de preescolar, se avanza con instalación de angeo en puertas persianas shut de basuras. Se termina la instalación de EPDM piso caucho colores en patio de preescolar; la programación de este frente de obra se ha visto afectada por demoras en la instalación del piso caucho, actividad que genera el mayor

atraso, sin embargo, ya se ejecuto y quedan pendientes detalles menores de pintura en shut de basuras y pintura en muros patio de preescolar afectada con resina del piso caucho.

AVANCE DE OBRA COLEGIO VILLA RICA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de abril al 05 de mayo del 2024	Informe Semanal 27	100.00%	96.25%
06 de mayo al 12 de mayo del 2024	Informe Semanal 28	100.00%	98.77%
13 de mayo al 19 de mayo del 2024	Informe Semanal 29	100.00%	96.08%
20 de mayo al 26 de mayo del 2024	Informe Semanal 30	100.00%	96.47%

En este frente en particular, se aclara que en el informe semanal 29 el porcentaje disminuye debido a actualización de presupuesto e inclusión de las actividades adicionales. Adicionalmente interventoría ha sido muy insistente con la calidad de instalación, adherencia y propiedades de SBR y EPDM para la instalación de piso caucho, donde ha realizado varias recomendaciones sobre la dosificación de resina y proceso de instalación. Cualquier tema de garantía será por parte del contratista. Se le recomienda al contratista realizar las actividades pendientes y entregar el frente de obra a la institución educativa.

AVANCE DE OBRA COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA

En este frente en particular el contratista avanza con la instalación de dinteles en superboard para aulas de sistemas, realiza instalación de tomacorrientes, interruptores y luminarias en sala de sistemas, termina detalles e instala espejos en baterías de baños, avanza parcialmente con la submuración de la excavación del tanque aquacell donde se recomienda mejorar rendimiento y se realiza pintura de muros en aulas de sistemas, la programación de este frente de obra se ha visto afectada por la demora en la intervención del aula de sistemas, suministro de materiales, y obras de redes de aguas lluvias, y demora en presentación y aprobación de NP para el tanque aquacell. Adicionalmente existen NP de instalaciones eléctricas y de instalaciones de voz y datos aulas de sistemas.

AVANCE DE OBRA COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de abril al 05 de mayo del 2024	Informe Semanal 27	100.00%	92.06%
06 de mayo al 12 de mayo del 2024	Informe Semanal 28	100.00%	94.67%
13 de mayo al 19 de mayo del 2024	Informe Semanal 29	100.00%	94.72%
20 de mayo al 26 de mayo del 2024	Informe Semanal 30	100.00%	97.01%

En particular en este frente en los informes 30 y 31 se disminuye el avance de obra por actualización de actividades e inclusión de actividades adicionales que tienen gran peso presupuestal, las cuales son el tanque aquacell, instalaciones eléctricas, y cableado y reemplazo cableado datos aulas de sistemas y por el atraso del contratista en ejecución de las actividades pendientes, por parte de la SED no se ha dado aval al NP del tanque aquacell por tener un valor considerable, y de esta depende la realización de demás actividades como cajas y canalizaciones de aguas lluvias; interventoría a evidenciado demoras y riesgo en la excavación del tanque aquacell por la demora en la ejecución de la submuración, donde se han dejado varias observaciones en bitácora y a través de oficios, aclarando que cualquier daño o perjuicio a las instalaciones o personal de la institución educativa será responsabilidad directa del contratista y todos los costos de reparación deberán ser solventados por el mismo.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA

En este frente se finalizan las actividades.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
01 de abril al 07 de abril del 2024	Informe Semanal 23	100.00%	100.00%

AVANCE DE OBRA COLEGIO BOSANOVA

En este frente en particular el contratista avanza labores de enchape de pasillo, hall y escaleras segundo piso, realiza pulidos de piso e instalación de ventanearía en aulas 210-209-207-206 y se entregan parcialmente a la institución educativa para su uso con pendientes de pintura y guardaescobas, adicionalmente se realiza la demolición y alistado de piso de pasillo frente al aula 204 para enchape en tableta de gress y cenefas en granito lavado. Se evidencian atrasos en programación por la demora del suministro de material de obra, falta de personal y reprocesos constructivos. Es también importante mencionar que la entrega de espacios por parte de la institución educativa no ha sido de acuerdo a lo programado lo que también a sumado a los atrasos en cronograma.

AVANCE DE OBRA COLEGIO BOSANOVA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de abril al 05 de mayo del 2024	Informe Semanal 27	9.00%	4.09%
06 de mayo al 12 de mayo del 2024	Informe Semanal 28	11.00%	10.89%
13 de mayo al 19 de mayo del 2024	Informe Semanal 29	17.00%	15.21%
20 de mayo al 26 de mayo del 2024	Informe Semanal 30	24.00%	20.08%

El atraso de este frente se debe principalmente al rendimiento de obra y suministro de materiales. Adicionalmente de el poco espacio para maniobrabilidad y disponibilidad de entregas de salones y áreas de trabajo por parte de la institución. Se recibe plan de contingencia por parte del contratista donde manifiestan terminar actividades en el tiempo contractual.

AVANCE DE OBRA DILE BOSA

En este frente en particular el contratista avanza en etapa 1 denominada atención al usuario, donde se realiza desmonte de teja existente, pintura de estructura existente, instalación de estructura de refuerzo, instalación de teja tipo sándwich, pañete y pintura de área atención al usuario; el atraso en programación se ve reflejado principalmente por demora en suministro de materiales y falta de personal por mas de una semana ya que se realizo cambio de subcontratista. En diversas reuniones con personal del DILE el contratista ha manifestado realizar las actividades faltantes en el tiempo contractual.

AVANCE DE OBRA DILE BOSA			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
06 de mayo al 12 de mayo del 2024	Informe Semanal 28	8.00%	0.46%
13 de mayo al 19 de mayo del 2024	Informe Semanal 29	16.00%	2.78%
20 de mayo al 26 de mayo del 2024	Informe Semanal 30	30.00%	16.15%

En este frente en particular en informe 30 a 31 el avance programado disminuye de acuerdo al ajuste por parte del contratista de la programación ajustada en el tiempo contractual. El atraso en este frente se debe principalmente a la falta de personal durante la primera semana de inicio de obra y a la demora en suministro de materiales; el contratista manifiesta recuperar estos tiempos y terminar en el tiempo contractual.

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del Colegio **Carlos Albán Holguín. Sede C (San José)**, las obras iniciaron el día 30 de octubre de 2023 y finalizan el 31 de mayo de 2024. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular, indicando que el avance programado y el avance ejecutado se viene realizando sobre el presupuesto y la programación iniciales, toda vez que el Contratista no ha presentado la información respectiva actualizada a los cambios presentados en el alcance y el presupuesto, solicitados por la Entidad Contratante.

AVANCE DE OBRA COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ)			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de abril al 05 de mayo del 2024	Informe Semanal 27	96.04%	60.00%

06 de mayo al 12 de mayo del 2024	Informe Semanal 28	96.04%	60.23%
13 de mayo al 19 de mayo del 2024	Informe Semanal 29	97.51%	63.26%
20 de mayo al 26 de mayo del 2024	Informe Semanal 30	98.54%	64.32%

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del **Colegio Jorge Isaacs. Sede Principal**, las obras iniciaron el día 4 de noviembre de 2023 y finalizaban el 06 de enero de 2024. Sin embargo, las obras inicialmente contratadas culminaron el 09 de marzo de 2024, y queda pendiente la aprobación de los NP de mantenimiento piso de la tarima, para terminar las actividades en este colegio. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE PRINCIPAL			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
04 de marzo al 10 de marzo de 2024	Informe Semanal 19	100%	100%

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del **Colegio San Bernardino. Sede Principal**, las obras iniciaron el día 07 de noviembre de 2023 y finalizaban el 01 de marzo de 2024. Es preciso aclarar que a pesar de haberse cumplido el plazo establecido y haberse solicitado por parte de la Interventoría una actualización de la programación, no ha sido presentada por el Contratista. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de abril al 05 de mayo del 2024	Informe Semanal 27	100.00 %	87.20%
06 de mayo al 12 de mayo del 2024	Informe Semanal 28	100.00 %	87.20%
13 de mayo al 19 de mayo del 2024	Informe Semanal 29	100.00 %	87.30%
20 de mayo al 26 de mayo del 2024	Informe Semanal 30	100.00 %	87.30%

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del Colegio **Rural La Concepción. Sede A**, las obras iniciaban el día 18 de marzo de 2024, pero por temas de ajuste logístico, iniciaron el 22 de marzo de 2024 y culminan el 29 de junio de 2024.

Es preciso informar que, adicional a las dificultades planteadas por la rectoría de la IED para dar autorización de ingreso al personal técnico y operativo de obra, la programación fue planteada por el

Contratista muy extendida al principio con actividades preliminares y de aprestamiento logístico, de ahí su poco avance programado; lo cual hace suponer que la curva "S" del proyecto se irá empinando con el pasar de las semanas, generando un eventual riesgo de no cumplir con el plazo establecido para este frente de obra. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de abril al 05 de mayo del 2024	Informe Semanal 27	17.00%	7.00%
06 de mayo al 12 de mayo del 2024	Informe Semanal 28	24.00%	9.95%
13 de mayo al 19 de mayo del 2024	Informe Semanal 29	33.00%	13.23%
20 de mayo al 26 de mayo del 2024	Informe Semanal 30	44.00%	14.47%

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del **Colegio José Antonio Galán. Sede A**, las obras iniciaban el día 22 de marzo de 2024, pero por temas de disponibilidad de los espacios por parte de la IED, comenzaban el 02 de abril de 2024 y posteriormente iniciaron el 11 de abril de 2024. Las obras finalizan el 28 de junio de 2024.

Es importante comentar que, adicional a las dificultades planteadas por la rectoría de la IED para desocupar las aulas del segundo piso del Bloque A y disponerlas para la ejecución de las obras, la programación fue planteada por el Contratista muy extendida al principio con actividades preliminares y de aprestamiento logístico, de ahí su poco avance programado; lo cual hace suponer que la curva "S" del proyecto se irá empinando con el pasar de las semanas, generando un eventual riesgo de no cumplir con el plazo establecido para este frente de obra. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de abril al 05 de mayo del 2024	Informe Semanal 27	19.00%	3.06%
06 de mayo al 12 de mayo del 2024	Informe Semanal 28	26.00%	8.64%
13 de mayo al 19 de mayo del 2024	Informe Semanal 29	36.00%	9.29%
20 de mayo al 26 de mayo del 2024	Informe Semanal 30	42.00%	11.57%

De acuerdo con la programación entregada por el contratista y avalada por la interventoría del **Colegio**

MOTORISTA. Sede Principal, después de lograrse la aprobación de la propuesta de intervención por parte del personal profesional de la Alcaldía Local de Bosa el día 10 de abril de 2024, las obras iniciaron el día 15 de abril de 2024 y finalizan el 29 de junio de 2024. De acuerdo con lo anterior se hace un resumen del avance de las obras en este frente de obra en particular.

AVANCE DE OBRA COLEGIO MOTORISTA I.E.D. SEDE PRINCIPAL			
FECHA	**PERIODO**	**% PROGRAMADO**	**% EJECUTADO**
29 de abril al 05 de mayo del 2024	Informe Semanal 27	13.21%	8.02%
06 de mayo al 12 de mayo del 2024	Informe Semanal 28	17.43%	12.13%
13 de mayo al 19 de mayo del 2024	Informe Semanal 29	29.71%	20.30%
20 de mayo al 26 de mayo del 2024	Informe Semanal 30	56.69%	20.30%

AVANCE CONSOLIDADO


A continuación, se presentan los porcentajes del avance general del contrato y el avance consolidado por todas las instituciones que se encuentran en ejecución.

AVANCE DE OBRA CONSOLIDADO			
	% PROGRAMADO	**% EJECUTADO**	**DIFERENCIA**
Avance general del contrato	77.18 %	60.31 %	-16.87 %
INSTITUCIONES EDUCATIVAS			
Colegio Manuel Cepeda Sede C	100.00 %	99.64 %	-0.36 %
Colegio Manuel Cepeda Sede A	100.00 %	100.00 %	0.00%
Colegio Rodrigo de Triana	100.00 %	98.10 %	-1.90%
Colegio Villa Rica	100.00 %	96.47 %	-3.53%
Colegio Francisco Miranda	100.00 %	97.01 %	-2.99%
Colegio Manuel Zapata Olivella	100.00 %	100.00 %	0.00%
Colegio Carlos Alban Holguín	98.54 %	64.32 %	-34.22%
Colegio Jorge Isaacs	100.00 %	100.00 %	0.00%
Colegio Rural la Concepción	44.00 %	14.47 %	-29.53%
Colegio José Antonio Galán	42.00 %	11.57 %	-30.43%
Colegio Bosanova	24.00 %	20.08 %	-3.92 %
Colegio San Bernardino	100.00 %	87.30 %	-12.70 %
Colegio Motorista	56.69 %	20.30 %	-36.39 %
Dile Bosa	30.00 %	16.15 %	-13.85 %

5. EMERGENCIAS

5.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS PIZARRO

SEMANA 27

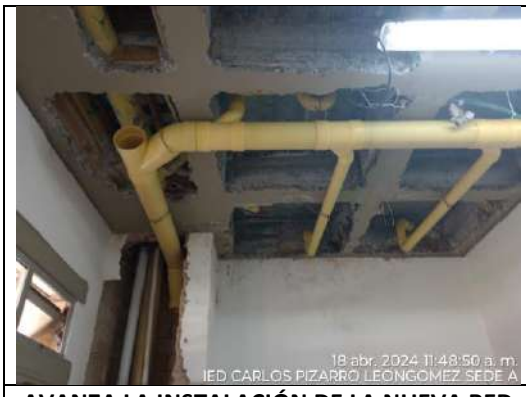	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS**
	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS**

5.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB

SEMANA 27

No se realiza ninguna actividad durante la semana

5.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO EL PORVENIR

SEMANA 22

	
SE CUBRIÓ, SE REINSTALÓ EL ADOQÚIN DE PISO Y SE FUNDIERON LAS PEQUEÑAS PLACAS EN EL PUNTO AL FRENTE DEL PATIO DE PREESCOLAR Y EN EL PUNTO DIAGONAL A LA CAFETERÍA.	**SE CUBRIÓ, SE REINSTALÓ EL ADOQÚIN DE PISO Y SE FUNDIERON LAS PEQUEÑAS PLACAS EN EL PUNTO AL FRENTE DEL PATIO DE PREESCOLAR Y EN EL PUNTO DIAGONAL A LA CAFETERÍA.**

Se entregó a la I.E.D. y se puso en servicio a la comunidad educativa.

5.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ SEDE A
SEMANA 28

	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS**

	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS**

5.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB

SEMANA 28

No se realiza ninguna actividad durante la semana

5.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO DEBORA ARANGO

SEMANA 28

	
SE REALIZÓ LA EVACUACION DEL AGUA EMPOSADA EN AREA DE PARQUEADEROS CON MOTOBOMBA.	**SE REALIZÓ LA EVACUACION DEL AGUA EMPOSADA EN AREA DE PARQUEADEROS CON MOTOBOMBA.**

5.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO LOS PERIODISTAS

SEMANA 28

No se realiza ninguna actividad durante la semana

5.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ

SEMANA 29

	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS**
	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS**

5.9 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB

SEMANA 29

No se realiza ninguna actividad durante la semana

5.10 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO DEBORA ARANGO

SEMANA 29

	
SE REALIZÓ LA EVACUACION DEL AGUA	**SE REALIZÓ LA EVACUACION DEL AGUA**

EMPOSADA EN AREA DE PARQUEADEROS CON MOTOBOMBA.	**EMPOSADA EN AREA DE PARQUEADEROS CON MOTOBOMBA.**

5.11 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO LOS PERIODITAS
SEMANA 29

No se realiza ninguna actividad durante la semana

5.12 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ
SEMANA 30


	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS**
	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA RED HIDRÁULICA Y SANITARIAS EN EL ÁREA DE BAÑOS**

5.13 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB
SEMANA 30

No se realiza ninguna actividad durante la semana


5.14 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO DEBORA ARANGO

SEMANA 30

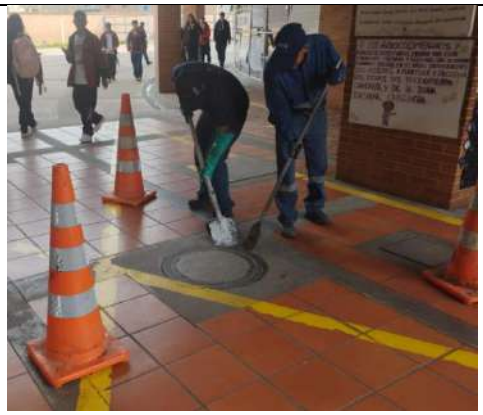	
SE LIMPIARON POZOS DE PRIMER NIVEL	**SE LIMPIARON POZOS DE PRIMER NIVEL**
	
SE REQUIERE REVISAR EL TEMA DE LA CAJA PARA BOMBAS EN SOTANO	**SE REQUIERE REVISAR EL TEMA DE LA CAJA PARA BOMBAS EN SOTANO**

5.15 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO LOS PERIODISTAS

SEMANA 30

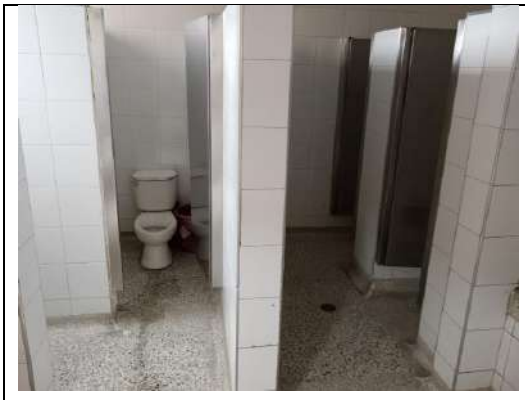	
SE EJECUTA UNICAMENTE EL CAMBIO DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE	**SE EJECUTA UNICAMENTE EL CAMBIO DE DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE**

5.16 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
SEMANA 30


SE ATIENDE LA EMERGENCIA DEL CAMBIO DE ACOMETIDA AL MEDIDOR.

6. SEGUIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO

Para el periodo del presente informe, el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.5305583 se ha venido desarrollando en concordancia con los términos legales establecidos contractualmente, presentado avance en el inicio de las actividades en las instituciones educativas establecidas, igualmente se han solicitados la actualización de algunas programaciones, así como de los presupuestos por parte de esta interventoría para poder llevar un adecuado control del contrato.

6.1 SEGUIMIENTO SEDES EDUCATIVAS

6.1.1 COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ): Se funden y desencofran las alfajías de las ventanas del No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Continúa la instalación de la estructura metálica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Continúa la excavación de zanjas para las vigas de cimentación del cerramiento posterior en mampostería. Se funden los pedestales de cimentación en mampostería. Se corta un lineal de cerámica de muro a la entrada del baño de preescolar para el marco de la puerta. Continúa la instalación de la estructura metálica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Se arman los aceros de refuerzo para las vigas de cimentación del cerramiento posterior en mampostería. Se realiza el encofrado para las vigas de cimentación del cerramiento posterior en mampostería. Inicia la instalación de las puertas de los baños en el Bloque A. Finaliza la instalación de la estructura metálica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Se realizan pruebas de líquidos penetrantes a la soldadura de la estructura metálica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Inicia la instalación de la teja sándwich de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Inicia el resane de juntas y el estuco de muros en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Avanza la instalación de la teja sándwich de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A; pendiente las tapas laterales. Avanza el pañete de muros en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Avanza la fundida de alfajías en las ventanas de las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Se desmonta el piso de las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Se instalan vidrios en las puertas de los baños. Avanza la instalación de rejillas superiores en las aulas del Bloque B.

6.1.2 COLEGIO JORGE ISAACS. SEDE PRINCIPAL: No se desarrollan actividades de obra durante el periodo del presente informe. Se evidencian algunos puntos críticos donde se despegó la soldadura en los pasamanos de las escaleras. Sigue pendiente la aprobación por parte de la SED de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima. Siguen sin atenderse la subsanación de algunos puntos críticos donde se despegó la soldadura en los pasamanos de las escaleras

6.1.3 COLEGIO SAN BERNARDINO: Se verifican medidas de espejos por parte del instalador. Se instala la estructura de soporte de la cubierta del área de orientación. Se realizan pruebas de líquidos penetrantes a las soldaduras de esta estructura de soporte. Se instalan los espejos en los baños del segundo y del tercer piso. Queda pendiente un espejo en el baño de hombres del tercer piso. Se instala la puerta de acceso posterior a la Sede Educativa. Se desmontan las tejas de asbesto cemento de la cubierta del área de orientación. Inicia la instalación de la teja tipo sándwich de la cubierta del área de orientación. Queda pendiente un espejo en el baño de hombres del tercer piso. Se instala la puerta de acceso posterior a la Sede Educativa.

6.1.4 COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A: Se instalan 11,55 m de tubería EMT, 6 codos Conduit de 1/2", y 6 cajas eléctricas. Se desmonta la canaleta eléctrica en la parte baja del muro oriental de la ludoteca. Se realiza socialización con la comunidad de las obras de fachada del proyecto. Se aumenta la altura de la demolición del pañete en el muro posterior de la Ludoteca. Se aumenta la altura de la demolición del pañete en el muro posterior de la Biblioteca. Cerramiento provisional en polisombra verde alrededor de la Sede Educativa. Regata de muro para la media caña en la fachada principal. Demolición del pañete exterior en la fachada lateral y posterior. Se aumenta la altura de la demolición del pañete en el muro posterior de la Ludoteca y la Biblioteca. Continúa la demolición del pañete exterior en la fachada lateral y posterior. Excavación para el cárcamo lateral hacia el sumidero de la esquina. Excavación para base del andén perimetral de la parte posterior.

6.1.5 COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN. SEDE A: Finaliza el desmonte de láminas de cielos rasos en las aulas del segundo piso del Bloque A. Finaliza el desmonte de puertas y ventanas en las aulas del segundo piso del Bloque A. Finaliza el desmonte de lámparas en las aulas del segundo piso del Bloque A. Continúa la remoción de pintura de muros en las aulas del segundo piso del Bloque A. Fundida de alfajías en las ventanas de las aulas del segundo piso del Bloque A. Continúa la remoción de pintura de muros en las aulas del segundo piso del Bloque A. Continúa la ejecución de filos en vanos de puertas y ventanas del segundo piso del Bloque A. Continúa el repañetado de muros del segundo piso del Bloque A. Inicia el desmonte de cubiertas en las aulas del segundo piso del Bloque A. Aplicación de anticorrosivo para la estructura metálica de la cubierta del segundo piso del Bloque A. el desmonte de las tejas en asbesto cemento del segundo piso del Bloque A. Se protege con plástico negro las aulas del segundo piso del Bloque A. Repañetado de muros en las aulas del segundo piso del Bloque A. Se realizan preparativos para la instalación de la estructura metálica en dos aulas del segundo piso del Bloque A.

6.1.6 COLEGIO EL MOTORISTA. SEDE A: Inicia el retiro de rebaba de concreto de la viga de cimentación del muro del patio. Continúa el pañete de culatas externas de la Sede Educativa hacia el nuevo patio. Continúa el retiro de material de excavación en el área de trabajo. Continúa el pañete de culatas externas de la Sede Educativa hacia el nuevo patio. Continúa el retiro de material de excavación en el área de trabajo. Se tiende una capa de recebo común como sello para el piso del nuevo patio. Los resultados de las densidades del piso fueron satisfactorios. Continúa el pañete de culatas externas de la Sede Educativa hacia el nuevo patio. Continúa el retiro de material de excavación en el área de trabajo. Se tiende una capa de recebo común como sello para el piso del nuevo patio.

7. SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES CONTRACTUALES

A la fecha del presente informe no se han presentado modificaciones en tiempo ni en valor al contrato de obra, ya que este se este se está realizando en las mismas condiciones a las iniciales, razón por la cual este contrato continúa establecido en los mismos términos iniciales, en cuanto a tiempo y valor contractual.

8. SEGUIMIENTO JURIDICO

8.1 SEGUIMIENTO A POLIZAS CONTRACTUALES

Se revisa el estado actual de las pólizas de los contratos de obra e interventoría, y se evidencia que los mismos a la fecha están debidamente actualizados según las condiciones establecidas de manera contractual a nivel de las garantías.

De acuerdo con lo antes descrito, a continuación, se presenta la evidencia del cumplimiento a los parámetros establecidos al respecto: **ANEXO 1**

CONTRATO DE OBRA:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

a) POLIZAS CONTRACTUALES (SUSCRIPCION CONTRATO)

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 21-44-101425116	Cumplimiento	$ 1.347.633.213,40	13/09/2023	13/01/2025
	Pago de salarios y Prestaciones Sociales	$ 673.816.606,70	13/09/2023	13/01/2027
	Estabilidad y Calidad de la obra	$ 1.347.633.213,40	Dos (2) años	
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101218837		$580.000.000,00	13/09/2023	13/05/2024
TODO RIESGO NB-100000567		$ 6.738.166.067,00	26/09/2023	27/10/2024

Imagen de Aprobación de pólizas en SECOP II

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12696963	Cumplimiento - Otros	Contrato de seguro	6.738.166.067 COP	MUNDIAL DE SEGUROS SAS	27/10/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
CO1.WRT.12674336	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.369.083.033,5 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	13/05/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
CO1.WRT.12674332	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	580.000.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	13/05/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

b) POLIZAS CONTRACTUALES (ACTA DE INICIO)

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 21-44-101425116	Cumplimiento	$ 1.347.633.213,40	30/10/2023	01/03/2025
	Pago de salarios y Prestaciones Sociales	$ 673.816.606,70	30/10/2023	29/06/2027
	Estabilidad y Calidad de la obra	$ 1.347.633.213,40	Dos (2) años	
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101218837		$580.000.000,00	13/09/2023	13/05/2024
TODO RIESGO NB-100000567		$ 6.738.166.067,00	13/09/2023	27/10/2024

c) POLIZAS CONTRACTUALES (ACTA DE INICIO)

Se ajusta póliza de responsabilidad civil y póliza de todo riesgo

AMPARO		Emisión inicial		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 21-44-101425116	Cumplimiento	$ 1.347.633.213,40	30/10/2023	01/03/2025
	Pago de salarios y Prestaciones Sociales	$ 673.816.606,70	30/10/2023	29/06/2027
	Estabilidad y Calidad de la obra	$ 1.347.633.213,40	Dos (2) años	
Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101218837		$580.000.000,00	30/10/2023	29/06/2024
TODO RIESGO NB-100000567		$ 6.738.166.067,00	30/10/2023	30/11/2024

Imagen de Aprobación de pólizas en SECOP II

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12874332	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	580.000.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	3 días de tiempo transcurrido (12/05/2024 12:00 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Vencida
CO1.WRT.14270504	Cumplimiento - Otros	Contrato de seguro	6.738.166.067 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA	30/11/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
CO1.WRT.14302451	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.369.083.033,5 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/06/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada
CO1.WRT.14301924	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	650.000.000 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	29/06/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

a) POLIZAS CONTRACTUALES (SUSCRIPCIÓN CONTRATO)

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 155374	Cumplimiento	$100.816.117,4	29/09/2023	28/02/2025
	Salarios y Prestaciones Sociales	$50.408.058,7	29/09/2023	29/06/2027
	Calidad de servicio	$100.816.117,4	29/06/2024	29/06/2026

Imagen de Aprobación de pólizas en SECOP II

CO1.WRT.12739159	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	252.040.293,50 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	29/06/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle

b) POLIZAS CONTRACTUALES (ACTA DE INICIO)

AMPARO		Actualización acta de inicio		
		VALOR (Bruto)	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 155374	Cumplimiento	$100.816.117,4	30/10/2023	30/03/2025
	Salarios y Prestaciones Sociales	$50.408.058,7	30/10/2023	30/07/2027
	Calidad de servicio	$100.816.117,4	30/07/2024	30/07/2026

CO1.WRT.12990757	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	252.040.293,50 COP	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	30/07/2027 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aceptado	Detalle

8.2 PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

El 02 de enero de 2024 el contratista de obra UNON TEMPORAL GEPM 2023-1 realiza la entrega del segundo plan de contingencia, subsanado con las observaciones y recomendaciones realizadas por la interventoría, sin embargo, se evidencia que no se esta dando cumplimento al plan de contingencia presentado, toda vez que en el comité de seguimiento No.8 del 11 de enero de 2024, los atrasos incrementan al 10.35%. Motivo por el cual se hace la entrega del **PRIMER INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO** al contratista de obra, con copia a la aseguradora (Seguros del Estado S.A), mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-125 del 26 de enero de 2024, solicitando respuesta para cada una de las actividades atrasadas.

El contratista mediante el comunicado OB-UTGEPM2023-091-23 del 01 de febrero de 2024, remite la respuesta a cada una de las actividades atrasadas presentadas en el primer informe de presunto incumplimiento, donde manifiesta que realizará las reprogramaciones de las actividades y justifica el inicio tardío de actividades debido a la demora en las aprobaciones de interventoría; sin embargo, es importante aclarar que las aprobaciones por parte de interventoría solo son posibles hasta que se haga entrega de la información por parte del contratista. De modo que, si el contratista realiza entregas tardías, las aprobaciones de igual manera serán tardías.

Mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-190 del 08 de marzo de 2024, la interventoría CONSORCIO SANA MARIA 022 realiza la entrega de la **SEGUNDA VERSIÓN DEL INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO** al contratista de obra con copia a la aseguradora (Seguros del Estado S.A), el cual también es radicado formalmente a la entidad (Secretaría de Educación del Distrito) mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-195 del 12 de marzo de 2024 con radicado SED No. E-2024-51549.

Mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-272 del 23 de abril de 2024, la interventoría CONSORCIO SANTA MARIA 022 realiza la entrega de la **TERCERA VERSIÓN DEL INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO** a la entidad (Secretaría de Educación del Distrito),

mediante con radicado SED No. E-2024-72156, mediante el cual se informa por interventoría el riesgo del no cumplimento del contrato dentro de los plazos establecidos.

La interventoría mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-294 del 03 de mayo de 2024 y radicado 24E00008514 remite a la aseguradora Seguros del Estado S.A la **TERCERA VERSIÓN DEL INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO**, con los productos atrasados a fecha del día 21 de abril del 2024, informando que el contratista UNION TEMPORAL GEPM-2023 no ha entregado un plan de contingencia efectivo, por ello el riesgo de no cumplimiento del contrato es alto.

El viernes 10 de mayo de 2024, se realiza reunión virtual en compañía del profesional apoyo a la supervisión de la SED – Enrique Campos y el abogado de la SED– Christian Vitery, donde se realiza la solicitud de **TRANSCRIPCIÓN DEL INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO** entregado en su tercera versión, al formato solicitado por la entidad (secretaria de educación del distrito), para poder ser tramitado ante la oficina de contratos de la SED, el cual es entregado por la interventoría el martes 15 de mayo de 2024, mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-314 con radicado E-2024-81979.

Esta interventoría da claridad que el informe de presunto incumplimiento ha sido entregado y actualizado desde el 26 de enero de 2024, toda vez que los atrasos se han venido presentando desde la semana No.5, reportado mediante comité de seguimiento No. 4 del 05 de diciembre de 2023 y hasta el 10 de mayo de 2024 se tuvo pronunciamiento por parte de la entidad, respecto al último informe entregado.

La interventoría mediante el comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-364 del 07 de junio de 2024 y radicado E-2024-93708 realiza la entrega de la **QUINTA VERSIÓN DEL INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO**, con los productos atrasados a fecha del día 07 de junio del 2024, donde se evidencia que respecto a las programaciones de obra entregadas por el contratista y aprobadas por la interventoría hay atrasos en actividades de (172) ciento setenta y dos días.

Se esta ala espera del pronunciamiento por parte de la entidad, respecto a la última actualización del informe de presunto incumplimiento.

9. INFORME GENERAL DE GESTIÓN TÉCNICA:

9.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C

SEMANA 27

	
ACABADOS CUARTO DE RACK	**ACABADOS AULA DE INGLES**
	
ENCHAPE DE PISO AULA DE INGLES	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO CUARTO DE RACK**
	
ENCHAPE DE PISO AULA DE INGLES	**ENCHAPE DE PISO AULA DE INGLES**

9.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
SEMANA 27

	
ESTRUCTURA CIELO RASO SALONES PRIMER NIVEL	**ESTRUCTURA CIELO RASO SALONES PRIMER NIVEL**
	
PULIDO DE PISO SALONES PRIMER NIVEL	**PINTURA PRIMERA MANO MUROS SALONES PRIMER NIVEL**
	
PULIDO DE PISO SALONES SEGUNDO NIVEL	**PULIDO DE PISO SALONES PRIMER NIVEL**

9.3 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA

SEMANA 27

	
CANAL PARA CUBIERTA PREESCOLAR	CANAL PARA CUBIERTA PREESCOLAR
	
CANAL PARA CUBIERTA PREESCOLAR	ACABADOS SHUT DE BASURAS
	
ACABADOS SHUT DE BASURAS	A ACABADOS SHUT DE BASURAS

9.4 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
SEMANA 27

	
ESTRUCTURA PARA DINTELES EN	INSTALACIÓN DE SALIDAS PARA

SUPERBOARD AULAS SISTEMAS	LUMINARIAS
	
TUBERÍA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN Y LUMINARIAS DE EMERGENCIA	**CUBIERTA AULAS DE SISTEMAS**
	
CAJAS DE AGUAS LLUVIAS	**CANALIZACIONES PARA AGUAS LLUVIAS**

9.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO BOSANOVA SEMANA 27

	
ENCHAPE PISO HALL SEGUNDO NIVEL	**DESMONTE DE VENTANEARÍA**

	
ELABORACIÓN DE CENEFAS EN GRANITO LAVADO	**ELABORACIÓN DE CENEFAS EN GRANITO LAVADO**
	
ENCHAPE PISO HALL SEGUNDO NIVEL	**DESMONTE DE VENTANEARÍA**

9.6 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN. SEDE C (SAN JOSÉ) SEMANA 27

	
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE AULAS DEL BLOQUE A	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE AULAS DEL BLOQUE A**

	
SE DESENCOFRAN LAS ALFAJÍAS DE LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE A	**SE DESENCOFRAN LAS ALFAJÍAS DE LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE A**
	
SE FUNDEN PEDESTALES DE CIMENTACIÓN PARA EL CERRAMIENTO POSTERIOR	**SE FUNDEN PEDESTALES DE CIMENTACIÓN PARA EL CERRAMIENTO POSTERIOR**

ACTIVIDADES:

- Se funden y desencofran las alfajías de las ventanas del No. 3, 4 y 5 del Bloque A
- Continúa la instalación de la estructura metálica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.
- Continúa la excavación de zanjas para las vigas de cimentación del cerramiento posterior en mampostería.
- Se funden los pedestales de cimentación en mampostería.
- Se corta un lineal de cerámica de muro a la entrada del baño de preescolar para el marco de la puerta.

9.7 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE PRINCIPAL SEMANA 27

	
LA IED RECOGIÓ EL CERRAMIENTO PARA PODER UTILIZAR EL PATIO CENTRAL	**PENDIENTE LA PINTURA DEL PISO DEL PATIO DE PREESCOLAR**
	
PENDIENTE LA PINTURA DE LA PUERTA DE ACCESO POSTERIOR	**PENDIENTE INSTALACIÓN DE LA ESCALERA DE ACCESO A LOS TANQUES DE RESERVA**

ACTIVIDADES:

- No se ejecutan actividades de obra durante la presente semana.
- Se verifican medidas de espejos por parte del instalador.


9.8 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A SEMANA 27

	
SE EVIDENCIA ALTA HUMEDAD Y FILTRACIONES EN EL MURO POSTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA	**SE EVIDENCIA ALTA HUMEDAD Y FILTRACIONES EN LA PARTE BAJA DEL MURO DE LA LUDOTECA**
	
PENDIENTE EL REMATE DE LA INSTALACIÓN DE LÁMINAS EN FIBROCEMENTO	**PENDIENTE EL REMATE DE LA INSTALACIÓN DE LÁMINAS EN FIBROCEMENTO**
	
INICIA LA INSTALACIÓN DE REDE ELÉCTRICA	**INICIA LA INSTALACIÓN DE REDE ELÉCTRICA**

ACTIVIDADES:

- Se instalan 11,55 m de tubería EMT, 6 codos Conduit de 1/2", y 6 cajas eléctricas.
- No se desarrollan actividades de obra civil

9.9 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JORGE ISAACS
SEMANA 27

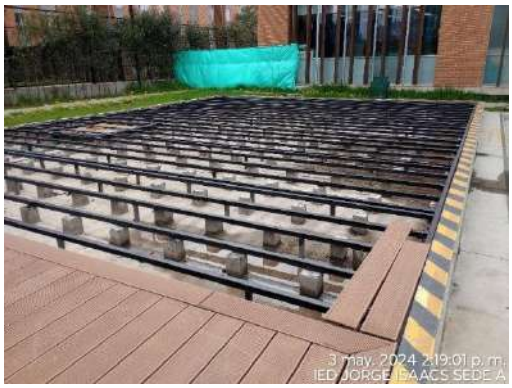	
PISO DE LA TARIMA PENDIENTE DE LA APROBACIÓN DEL NP PARA SER INSTALADO	**PISO DE LA TARIMA PENDIENTE DE LA APROBACIÓN DEL NP PARA SER INSTALADO**
	
LA IED REINSTALA EL CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE	**LA IED REINSTALA EL CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE**

ACTIVIDADES:

- No se ejecutan actividades de obra durante la semana.
- Queda pendiente la aprobación de los NP por parte de la Entidad Contratante, que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima.

9.11 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN SEMANA 27

	
REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS	**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS**
	
REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS	**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS**
	

ENCOFRADO Y FUNDIDA DE ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS	**ENCOFRADO Y FUNDIDA DE ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS**
	
FINALIZA EL DESMONTE DE LÁMPARAS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A	**FINALIZA EL DESMONTE DE LÁMPARAS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A**

ACTIVIDADES:

- Finaliza el desmonte de láminas de cielos rasos en aulas del segundo piso del Bloque A.
- Finaliza el desmonte de puertas y ventanas en las aulas del segundo piso del Bloque A.
- Finaliza el desmonte de lámparas en las aulas del segundo piso del Bloque A.
- Continúa la remoción de pintura de muros en las aulas del segundo piso del Bloque A.
- Encofrado y fundida de alfajías en las ventanas de las aulas del segundo piso del Bloque A.

9.12 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MOTORISTA
SEMANA 27

	
CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA	CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA

	
CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA	**CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA**
	
INICIA EL RETIRO DE LA REBABA DE CONCRETO DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL MURO DEL PATIO	**INICIA EL RETIRO DE LA REBABA DE CONCRETO DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL MURO DEL PATIO**

ACTIVIDADES:

- Inicia el retiro de rebaba de concreto de la viga de cimentación del muro del patio.
- Continúa el pañete de culatas externas de la Sede Educativa hacia el nuevo patio.
- Continúa el retiro de material de excavación en el área de trabajo.

9.13 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
SEMANA 28

	
ENTREGA CUARTO DE RACK	**ENTREGA DE CUARTO DE RACK**
	
ENTREGA CUARTO DE INGLES	**FUNDICION PLACA DE CONTRAPISO AULA DE RACK**
	
ENTREGA CUARTO DE INGLES	**ENTREGA DE CUARTO DE RACK**

9.14 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
SEMANA 28

	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO AULA PRIMER NIVEL	**FUNDICION DE PLACA DE CONTRAPISO AULAS PRIMER NIVEL**
	
DEMOLICION DE NICHOS AULAS PRIMER NIVEL	**REEMBOQUILLADO DE MUROS AULAS PRIMER NIVEL**
	
FUNDICION DE PLACA DE CONTRAPISO AULAS PRIMER NIVEL	**REEMBOQUILLADO DE MUROS AULAS PRIMER NIVEL**

9.15 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO VILLA RICA
SEMANA 28

	
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA SHUT DE BASURAS	**CONSTRUCCION DE PLATAFORMA SHUT DE BASURAS**
	
INSTALACIÓN DE CANALETA Y BAJANTE CUBIERTA PREESCOLAR	**AVANCE DE ENCHAPE Y MEDIA CAÑA SHUT DE BASURAS**
	
AVANCE DE ENCHAPE Y MEDIA CAÑA SHUT DE BASURAS	**AVANCE DE ENCHAPE Y MEDIA CAÑA SHUT DE BASURAS**

9.16 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
SEMANA 28

	
DINTELES EN SUPERBOARD AULA DE SISTEMAS	**DINTELES EN SUPERBOARD AULA DE SISTEMAS**
	
DINTELES EN SUPERBOARD AULA DE SISTEMAS	**LLEGADA DE VENTANERIA**
	
AVANCE SUBMURACIÓN EXCAVACION TANQUE AQUACELL	**INSTALACIÓN DE ESPEJOES EN BAÑOS**

9.17 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO BOSANOVA

SEMANA 28

	
PULIDA DE PISO SALONES	**INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO**
	
REMATES ENCHAPE PISO SEGUNDO PISO	**ALISTADO DE ESCALERAS PARA ENCHAPE**
	
AVANCE EN CONTRUCCION DE VENTANERIA	**PULIDO DE PISO SALONES**

9.18 ACTIVIDADES EJECUTADAS – DILE BOSA

SEMANA 28

	
DESMONTE DE CIELO RASO	**DESMONTE DE CIELO RASO**
	
DIVISION EN POLISOMBRA	**DESMONTE DE CIELO RASO**

9.19 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN
SEMANA 28

	
INSTALACIÓN DE LA LÁMINA INFERIOR DE LA TEJA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A	**INSTALACIÓN DE LA TEJA TIPO SÁNDWICH PARA LA CUBIERTA DEL AULA No. 3 DEL BLOQUE A**

	
INSTALACIÓN DE LA TEJA TIPO SÁNDWICH PARA LA CUBIERTA DEL AULA No. 4 DEL BLOQUE A	**INSTALACIÓN DE LA TEJA TIPO SÁNDWICH PARA LA CUBIERTA DEL AULA No. 5 DEL BLOQUE A**
	
INSTALACIÓN DE LA LÁMINA SUPERIOR DE LA TEJA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A	**INSTALACIÓN DE LA LÁMINA SUPERIOR DE LA TEJA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A**
	
INICIA EL RESANE Y EL ESTUCADO DE MUROS	**INICIA EL RESANE Y EL ESTUCADO DE MUROS**

ACTIVIDADES:

- Finaliza la instalación de la estructura metálica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.
- Se realizan pruebas de líquidos penetrantes a la soldadura de la estructura metálica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.
- Inicia la instalación de la teja sándwich de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.
- Inicia el resane de juntas y el estuco de muros en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.

9.20 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO SAN BERNARDINO
SEMANA 28

	
PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL PISO 2	**PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE ESPEJOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO**
	
PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO	**PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE ESPEJOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO**

ACTIVIDADES:

- No se ejecutan actividades de obra durante la presente semana.

No se instalan los espejos en los baños del segundo y del tercer piso.

9.21 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO RURAL LA CONCEPCION
SEMANA 28

	
SE EVIDENCIA QUE LA CANALETA DE DATOS ESTÁ EN MAL ESTADO EN LA LUDOTECA	**SE EVIDENCIA QUE LA CANALETA DE DATOS ESTÁ EN MAL ESTADO EN LA LUDOTECA**
	
SE DESMONTA LA CANALETA DE DATOS EN LA LUDOTECA	**SE DESMONTA LA CANALETA DE DATOS EN LA LUDOTECA**

	
SE AUMENTA LA ALTURA DE LA DEMOLICIÓN DEL PAÑETE EN EL MURO POSTERIOR DE LA LUDOTECA	**DEMOLICIÓN DE PAÑETE EN LA PARTE BAJA DEL MURO DEL ÁREA DE MÓDULOS**
	
SE REINSTALAN LAS CAJAS ELÉCTRICAS SOBRE PERFILES CALIBRE 26	**SE REINSTALAN LAS CAJAS ELÉCTRICAS SOBRE PERFILES CALIBRE 26**

ACTIVIDADES:

- Se desmonta la canaleta eléctrica en la parte baja del muro oriental de la ludoteca.
- Se realiza socialización con la comunidad de las obras de fachada del proyecto .
- No se desarrollan actividades de obra civil, solo obra eléctrica.

9.22 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JORGE ISAACS

SEMANA 28

	
PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA	**PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA**
	
PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA	**PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA**

ACTIVIDADES:

- No se ejecutan actividades de obra durante la semana.
- Queda pendiente la aprobación de los NP por parte de la Entidad Contratante, que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima.

9.23 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO JOE ANTONIO GALAN

SEMANA 28

	
REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS	**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS**
	
REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS	**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS**
	
REPAÑETADO DE MUROS	**REPAÑETADO DE MUROS**

	
REPAÑETADO DE MUROS	**EJECUCIÓN DE FILOS DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS**
	
EJECUCIÓN DE FILOS DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS	**EJECUCIÓN DE FILOS DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS**

ACTIVIDADES:

- Continúa la remoción de pintura de muros en las aulas del segundo piso del Bloque A.
- Continúa la ejecución de filos en vanos de puertas y ventanas del piso 2 del Bloque A.
- Continúa el repañetado de muros del segundo piso del Bloque A.
- Inicia el desmonte de cubiertas en las aulas del segundo piso del Bloque A.

9.24 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MOTORISTA

SEMANA 28

	
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN DEL SITIO DE OBRA	**RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN DEL SITIO DE OBRA**
	
INICIA EL TENDIDO DE RECEBO COMÚN COMO CAPA DE SELLO PARA EL ÁREA DE TRABAJO	**INICIA EL TENDIDO DE RECEBO COMÚN COMO CAPA DE SELLO PARA EL ÁREA DE TRABAJO**
	
INICIA EL TENDIDO DE RECEBO COMÚN COMO CAPA DE SELLO PARA EL ÁREA DE TRABAJO	**INICIA EL TENDIDO DE RECEBO COMÚN COMO CAPA DE SELLO PARA EL ÁREA DE TRABAJO**

ACTIVIDADES:

- Continúa el pañete de culatas externas de la Sede Educativa hacia el nuevo patio.
- Continúa el retiro de material de excavación en el área de trabajo.
- Se tiende una capa de recebo común como sello para el piso del nuevo patio.

9.25 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
SEMANA 29

	
CUARTO DE RACK	**CUARTO DE RACK**
	
PENDIENTE INSTALACION DE BARANDAS	**AULA DE INGLES**
	
PENDIENTE INSTALACION DE BARANDAS	**CUARTO DE RACK**

9.26 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
SEMANA 29

	
PINTURA DE MUROS EN SALONES	**PINTURA DE MUROS EN SALONES**
	
PINTURA DE MUROS EN SALONES	**SALIDAS PARA LUMINARIAS**
	
PULIDA DE PISO SALONES	**REEMBOQUILLADO MUROS SALONES**

9.27 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO VILLA RICA

SEMANA 29

	
ACABADOS EN FACHADA SHUT DE BASURA	**CANALETA Y BAJANTE SHUT DE BASURA**
	
INSTALACION DE BARANDA SHUT DE BASURA	**INICIO INSTALACIÓN SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR**
	
INICIO INSTALACIÓN SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR	**ACABADOS EN FACHADA SHUT DE BASURA**

9.28 ACTIVIDADES EJECUTADAS – COLEGIO FRANCISCO MIRANDA

SEMANA 29

	
ENTIBADO EXCAVACION TANQUE AQUACELL	**DINTELES EN SUPERVOARD AULAS DE SISTEMAS**
	
ESTADO DE CUBIERTA AULA DE SISTEMAS	**ESTRUCTURA PARA DINTELES EN SUPERBOARD**
	
DINTELES EN SUPERBOARD AULAS DE SISTEMAS	**DINTELES EN SUPERBOARD AULAS DE SISTEMAS**

9.29 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO BOSANOVA

SEMANA 29

	
INSTALACION DE VENTANERIA	**PULIDO DE PISO SALONES**
	
INSTALACION DE VENTANERIA	**LAVADO Y REMATES ENCHAPE PISO HALL SEGUNDO NIVEL**
	
LAVADO Y REMATES ENCHAPE PISO HALL SEGUNDO NIVEL	**ALISTADO DE PISO ESTCALERAS**

9.30 ACTIVIDADES EJECUTADAS - COLEGIO DIEL BOSA

SEMANA 29

	
ESTADO DE AVANCE CUBIERTA ATENCION AL USUARIO	**ESTADO DE AVANCE CUBIERTA ATENCION AL USUARIO**
	
PINTURA DE CERCHAS EXISTENTES	**PERFILERIA DE REFUERZO ESTRUCTURA PARA CUBIERTA**

9.31 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN SEMANA 29

ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE A	**ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE A**
	
FUNDIDA DE ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE A	**FUNDIDA DE ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE A**
	
SE DESMONTA EL PISO CERÁMICO DE LAS AULAS DEL BLOQUE A	**SE DESMONTA EL PISO EN VINISOL DEL AULA DE SISTEMAS**
	
SE DESMONTA EL PISO EN VINISOL DEL AULA DE SISTEMAS	**SE DESMONTA EL PISO EN VINISOL DEL AULA DE SISTEMAS**

	
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LAS REJILLAS SUPERIORES DE LAS AULAS DEL BLOQUE B	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LAS REJILLAS SUPERIORES DE LAS AULAS DEL BLOQUE B**

ACTIVIDADES:

- Avanza la instalación de la teja sándwich de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A; pendiente las tapas laterales.
- Avanza el pañete de muros en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.
- Avanza la fundida de alfajías en las ventanas de las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.
- Se desmonta el piso de las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.
- Se instalan vidrios en las puertas de los baños.
- Avanza la instalación de rejillas superiores en las aulas del Bloque B.

9.32 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO SAN BERNARDINO
SEMANA 29

	
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN**

	
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN	**INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN**
	
INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO	**INSTALACIÓN DE ESPEJOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO**
	
INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO	**LA INSTALACIÓN DE ESPEJOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO**

ACTIVIDADES:

- Se instala la estructura de soporte de la cubierta del área de orientación
- Se realizan pruebas de líquidos penetrantes a las soldaduras de esta estructura de soporte.
- Se instalan los espejos en los baños del segundo y del tercer piso. Queda pendiente un espejo en el baño de hombres del tercer piso.
- Se instala la puerta de acceso posterior a la Sede Educativa.

9.33 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO RURAL LA CONCEPCION
SEMANA 29

	
SE AUMENTA LA ALTURA DE LA DEMOLICIÓN DEL PAÑETE EN EL MURO POSTERIOR DE LA LUDOTECA	**REMOCIÓN DE PINTURA DEL CIELO RASO DE LA BIBLIOTECA**
	
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE ALREDEDOR DE LA SEDE	**CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE ALREDEDOR DE LA SEDE**

	
REGATA EN LA PÁRTE BAJA DEL MURO PARA LA MEDIACAÑA EN LA FACHADA PRINCIPAL	**DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXTERIOR EN LA FACHADA LATERAL Y POSTERIOR**
	
DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXTERIOR EN LA FACHADA LATERAL Y POSTERIOR	**DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXTERIOR EN LA FACHADA LATERAL Y POSTERIOR**

ACTIVIDADES:

- Se aumenta la altura de la demolición del pañete en el muro posterior de la Ludoteca.
- Se aumenta la altura de la demolición del pañete en el muro posterior de la Biblioteca.
- Cerramiento provisional en polisombra verde alrededor de la Sede Educativa.
- Regata de muro para la media caña en la fachada principal.
- Demolición del pañete exterior en la fachada lateral y posterior.

9.34 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO JORGE ISAACS

SEMANA 29

	
PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA	**PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA**
	
PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA	**PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA**

ACTIVIDADES:

- No se ejecutan actividades de obra durante la semana.
- Queda pendiente la aprobación de los NP por parte de la Entidad Contratante, que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima.

9.35 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN
SEMANA 29

	
APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO BLANCO A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA	**APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO BLANCO A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA**
	
DESMONTE DE LA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	**DESMONTE DE LA TEJA EN ASBESTO CEMENTO**
	
DESMONTE DE LA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	**DESMONTE DE LA TEJA EN ASBESTO CEMENTO**

ACTIVIDADES:

- Aplicación de anticorrosivo para la estructura metálica de la cubierta del segundo piso del Bloque A.
- Continúa el desmonte de las tejas en asbesto cemento del segundo piso del Bloque A.
- Se protege con plástico negro las aulas del segundo piso del Bloque A.

9.36 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO MOTORISTA

SEMANA 29

	
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DE COMPACTACIÓN B-200	**INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DE COMPACTACIÓN B-200**
	
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DE COMPACTACIÓN B-200	**INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DE COMPACTACIÓN B-200**

	
SE DEBE PROTEGER LA BASE DE LOS MUROS EXISTENTES	**SE DEBE PROTEGER LA BASE DE LOS MUROS EXISTENTES**

ACTIVIDADES:

- Se suspende temporalmente el pañete de culatas externas hasta que lleguen andamios certificados.
- Se extiende geotextil sobre la capa de sello con recebo común.
- Se tiende una capa de material de compactación B-200.

9.37 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
SEMANA 30

	
CUARTO DE RACK	**CUARTO DE RACK**

	
ESCALERAS GRADERIAS PENDIENTE BARANDA	**AULA DE INGLES FUNCIONAL**
	
ESCALERAS PATIO PENDIENTE BARANDA	**CUARTO DE RACK**

9.38 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
SEMANA 30

	
ACABADOS AULAS DE PRIMER PISO	**INSTALACION DE CIELO RASO Y LUMINARIAS AULAS PRIMER PISO**

	
ACABADOS AULAS PRIMER PISO	**ACABADOS AULAS PRIMER PISO**
	
REEMBOQUILLADO AULAS SEGUNDO PISO	**REEMBOQUILLADO AULAS SEGUNDO PISO**

9.39 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO VILLA RICA

SEMANA 30

	
ACABADOS SHUT DE BASURAS	**INSTALACION SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR**

	
INSTALACION SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR	**INSTALACION SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR**
	
INSTALACION SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR	**INSTALACION SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR**

9.40 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO FRANCISCO MIRANDA
SEMANA 30

	
DINTELES SUPERBOARD AULAS DE SISTEMAS	**DINTELES SUPERBOARD AULAS DE SISTEMAS**

	
EXCAVACION Y ENTIBADO TANQUE AQUACELL	**DINTELES SUPERBOARD AULAS DE SISTEMAS**
	
DINTELES SUPERBOARD AULAS DE SISTEMAS	**INSTALACIONES ELECTRICAS DE ILUMINCACIÓN**

9.41 ACTIVIDADES EJECUTADAS COLEGIO BOSANOVA

SEMANA 30

	
ENCHAPE ESCALERAS	**INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO**

	
ENCHAPE PASILLO SEGUNDO PISO	**ENCHAPE PASILLO SEGUNDO PISO**
	
INSTALACION DE VENTANERIA EN ALUMINIO	**SALONES EN USO PRE ENTREGA**

9.42 ACTIVIDADES EJECUTADAS DILE BOSA

SEMANA 30

	
INTERVENCION CUBIERTA EXISTENTE	**MANTENIMIENTO Y PINTURA CERCHAS EXISTENTES**
	

DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE Y PAÑETE MUROS CUCHILLA CUBIERTA

9.43 ACTIVIDADES EJECUTADAS CARLOS ALBAN HOLGUIN SEMANA 30

	
CONTINÚA REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A	**INICIA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A**
	
INICIA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A	**ENCOFRADO DE ALFAJÍAS EN VENTANAS DE AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A**

	
CONTINÚA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A	**CONTINÚA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A**

ACTIVIDADES:

- Continúa la instalación de la estructura metálica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.
- Se arman los aceros de refuerzo para las vigas de cimentación del cerramiento posterior en mampostería.
- Se realiza el encofrado para las vigas de cimentación del cerramiento posterior en mampostería.
- Inicia la instalación de las puertas de los baños en el Bloque A

9.44 ACTIVIDADES EJECUTADAS SAN BERNARDINO

SEMANA 30

	
INSTALACIÓN DE UNA NUEVA PUERTA EN EL ACCESO POSTERIOR	**INSTALACIÓN DE UNA NUEVA PUERTA EN EL ACCESO POSTERIOR**

	
DESMONTE DE LA TEJA DE ASBESTO CEMENTO EN EL ÁREA DE ORIENTACIÓN	**INSTALACIÓN DE ESPEJOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO**
	
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN**

ACTIVIDADES:

- Se desmontan las tejas de asbesto cemento de la cubierta del área de orientación.
- Inicia la instalación de la teja tipo sándwich de la cubierta del área de orientación.
- Queda pendiente un espejo en el baño de hombres del tercer piso.
- Se instala la puerta de acceso posterior a la Sede Educativa.

9.45 ACTIVIDADES EJECUTADAS RURAL LA CONCEPCION

SEMANA 30

	
EXCAVACIÓN PARA CÁRCAMO LATERAL	**EXCAVACIÓN PARA CÁRCAMO LATERAL**
	
VERIFICANDO QUE EL AGUA LLEGA AL SUMIDERO DE LA ESQUINA	**DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXTERIOR EN LA FACHADA LATERAL Y POSTERIOR**

ACTIVIDADES:

- Se aumenta la altura de la demolición del pañete en el muro posterior de la Ludoteca y la Biblioteca.
- Continúa la demolición del pañete exterior en la fachada lateral y posterior.
- Excavación para el cárcamo lateral hacia el sumidero de la esquina.
- Excavación para base del andén perimetral de la parte posterior.

9.46 ACTIVIDADES EJECUTADAS JORGE ISAACS

SEMANA 30

	
PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1. INICIO	**DETALLE DE SOPORTE DAÑADO EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No.1**
	
PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1. LLEGADA	**PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA**

ACTIVIDADES:

- No se ejecutan actividades de obra durante la semana.
- Queda pendiente la aprobación de los NP por parte de la Entidad Contratante, que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima.
- Se evidencian algunos puntos críticos donde se despegó la soldadura en los pasamanos de las escaleras

9.47 ACTIVIDADES EJECUTADAS JOSE ANTONIO GALAN

SEMANA 30

	
APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO BLANCO A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA	**APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO BLANCO A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA**
	
SE HA CORRIDO EL PLÁSTICO DE PROTECCIÓN DE LAS AULAS SIN CUBIERTA	**SE HA CORRIDO EL PLÁSTICO DE PROTECCIÓN DE LAS AULAS SIN CUBIERTA**

ACTIVIDADES:

- Repañetado de muros en las aulas del segundo piso del Bloque A.
- Se realizan preparativos para la instalación de la estructura metálica en dos aulas del segundo piso del Bloque A.

9.48 ACTIVIDADES EJECUTADAS MOTORISTA

SEMANA 30

	
TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	**TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO**
	
TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	**TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO**

ACTIVIDADES:

- No se desarrollan actividades de obra durante la semana.
- Los resultados de las densidades del piso fueron satisfactorios.

10. ÁREAS PROBLEMÁTICAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

Las principales dificultades que se deben enfrentar en el desarrollo de la presente intervención conciernen a la conciliación de precios de insumos y precios unitarios que guiarán el capítulo de costos del presente contrato de obra. Por ende, el Contratista deberá subsanar las observaciones formuladas por esta Interventoría antes de suscribirse de inicio de las diferentes sedes educativas

Otra problemática que pudiera afectar el desarrollo de las actividades de obra está directamente relacionada con su ubicación, sobre todo las condiciones de seguridad ciudadana en este sector de

la ciudad. Dicha problemática potencial deberá ser gestionada por el Contratista, articulando con la comunidad educativa (Estudiantes, padres de familia, directivas, docentes y vecinos), para establecer un frente común que permita dinamizar la ejecución de las actividades objeto del presente contrato de obra.

11. CLIMATOLOGÍA

Se ha llevado el control del estado del tiempo durante el presente periodo, el cual se registra en la bitácora de obra y en los formatos de calidad establecidos para tal fin. De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 30 de abril de 2023 al 29 de mayo de 2024 objeto del presente informe, en el **(ANEXO 02**) se adjunta formato de control de lluvias.

12. INFORME ADMINISTRATIVO

12.1 ACTAS DE COMITÉ GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 30 de abril de 2024 al 29 de mayo de 2024 objeto del presente informe en el **(ANEXO 06)** se adjuntan las actas suscritas en el periodo.

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta No. 19 – Comité de seguimiento No. 23	02/05/2024
Acta No. 20 – Comité de seguimiento No. 24	09/05/2024
Acta No. 21 – Comité de seguimiento No. 25	17/05/2024

12.2 ACTAS GENERALES GENERADAS EN EL PERIODO DEL INFORME

ACTA DE SEGUIMIENTO	FECHA
Acta recorrido eléctrico colegios	30/04/2024
Acta reunión hidráulica tanque francisco miranda	03/05/2024
Acta parcial entrega Manuel cepeda	07/05/2024
Acta parcial batería de baños Francisco miranda	17/05/2024
Acta de reunión concepción socialización obras exteriores	10/05/2024
Acta de reunión hidráulica tanque aquacell	16/05/2024
Acta de reunión frente bosa	20/05/2024

12.3 RELACIÓN DE INFORMES SEMANALES PERIODO DEL INFORME

A continuación, se relacionan los informes semanales realizados por la interventoría **(ANEXO 04)**, en el periodo comprendido entre el 30 de abril de 2024 al 29 de mayo de 2024, objeto del presente informe.

RELACIÓN DE INFORME SEMANALES		
Número	**Periodo**	**Radicado**
Informe semanal No. 27	29 de abril al 05 de mayo del 2024	E-2024-78464
Informe semanal No. 28	06 de mayo al 12 de mayo del 2024	E-2024-81795
Informe semanal No. 29	13 de mayo al 19 de mayo del 2024	E-2024-85432
Informe semanal No. 30	20 de mayo al 26 de mayo del 2024	E-2024-89612

12.4 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE OBRA CO1-PCCNTR.5305583 de 2023

A continuación, se relaciona el personal del contrato de obra No. CO1-PCCNTR.5305583 De 2023, que se encuentra aprobado por la interventoría al corte del presente informe:

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA							
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PROFESIONALES CONTRATISTA	**NOMBRE**	**CUMPLE**		**OFICIO APROBACION INTERVENTORIA**		**OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD**	
		SI	**NO**	**NO.**	**FECHA**	**NO.**	**FECHA**
DIRECTOR DE OBRA	LIDIA ASUNCION MONROY RAMIREZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
RESIDENTE DE OBRA	LUIS MIGUEL GUEVARA MARTINEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
RESIDENTE DE OBRA	ANA JUDITH PARDO DUARTE	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-189	8/03/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-191 con radicado No.	11/03/2024
RESIDENTE DE OBRA	ERNESTO JOSE GUERRERO GONZALEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-189	8/03/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-327 con radicado No. E-2024-84241	20/05/2024

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA

Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023

PROFESIONALES CONTRATISTA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO APROBACION INTERVENTORIA		OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
RESIDENTE DE OBRA	DIANA DEL PILAR OROZCO DIAZ		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
RESIDENTE DE OBRA	FELIX ANDRES CHAVEZ PIRAVAGUEN	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
RESIDENTE DE OBRA	JAIME FERNEY MOLINA BRICEÑO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-149	13/02/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-150 con radicado No.E-2024-32574	13/02/2024
ASESOR ESTRUCTURAL	LUIS GUILLERMO LINARES GONGORA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
ASESOR AMBIENTAL	ROMMEL ADALBERTO BONILLA CORTES		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
ASESOR AMBIENTAL	SANDRA MARCELA PINZON CASTRO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DANNA YANETH RODRIGUEZ DE LA CRUZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SANDRA MARCELA PINZON CASTRO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-089	2/01/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-090 con radicado No.E-2024-282	2/01/2024
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	LUIS ARBEY BUENO DIAZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA							
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PROFESIONALES CONTRATISTA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO APROBACION INTERVENTORIA		OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO	OMAR JOHANNY ARCHILA MENDOZA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	DAVID ESTEBAN BAQUERO BASTOS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	JUDINSSA ELIANA ROJAS PARDO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SANDRA MILENA CIFUENTES DAZA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	DANNA YANETH RODRIGUEZ DE LA CRUZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-089	2/01/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-090 con radicado No.E-2024-282	2/01/2024
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	VIHELKA GERALDINNE VILLAMIZAR OÑATE	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-149	13/02/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-150 con radicado No.E-2024-32574	13/02/2024
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	DIANA PAOLA RODRIGUEZ URIBE		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-166	22/02/2024		
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	SANDRA LILIANA GUAYAMBUCO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-184	6/03/2024	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-200 con radicado No. E-2024-51999	13/03/2024
INSPECTOR DE OBRA	JULIAN CAMILO IBAÑEZ CAICEDO		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		

RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA							
Contrato de Obra No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PROFESIONALES CONTRATISTA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO APROBACION INTERVENTORIA		OFICIO REMITIDO A LA ENTIDAD	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
INSPECTOR DE OBRA	JOSE LUIS OROS ACEVEDO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-016	19/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
INSPECTOR DE OBRA	ALDAIR RIKKER VANEGAS RAMIREZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-005	9/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
MAESTRO DE OBRA	CARLOS FERNANDO CIPAGAUTA RONCANCIO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-007	10/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
MAESTRO DE OBRA	WILSON FRANCISCO PEREZ ALONSO		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-002	3/10/2023		
MAESTRO DE OBRA	RAUL PARADA AVILA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-008	17/10/2023	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-017 con radicado No. E-2023-149717	23/10/2023
MAESTRO DE OBRA	JOSE VICENTE MOLANO ORTIZ		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-184	6/03/2024		

PERSONAL RETIRADO
PERSONAL ACTUAL APROBADO

12.5 RELACIÓN DE PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1-PCCNTR.5313251

A continuación, se relaciona el personal del contrato de interventoría No. CO1-PCCNTR.5313251 de 2023, que se encuentra aprobado por la SED al corte del presente informe:

RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA							
Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PERSONAL ETAPA OBRA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO RADICADO ALSED		OFICIO APROBACION SED	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDNA CONSTANZA CEPEDA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	RONALD RICARDO LOZANO JIMENEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JAIRO HERNAN TORRES PRIETO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JUAN CARLOS DELGADO	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-032 Radicado No. E-2023-157727	9/11/2023		
ASESOR ESTRUCTURAL	GERMAN CAMILO ALFONSO GONZALEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR AMBIENTAL	LAURA SOFIA FERNANDEZ FLECHAS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	LAURA SOFIA FERNANDEZ FLECHAS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	YENNY PAOLA REYES COSTILLA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO	CLAUDIA PATRICIA VERGEL JIMENEZ		X	SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023		

RELACIÓN DE PERSONAL DE INTERVENTORIA							
Contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.5313251 de 2023							
PERSONAL ETAPA OBRA	NOMBRE	CUMPLE		OFICIO RADICADO ALSED		OFICIO APROBACION SED	
		SI	NO	NO.	FECHA	NO.	FECHA
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, DE GAS Y RED CONTRA INCENDIO	ALVARO VERGARA	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-024 Radicado No. E-2023-153759	31/10/2023	S-2023-330858	30/10/2023
PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA	JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	YINETH CRUZ ARANZALEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	ANDRES GOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	JEAN PAUL REYES MORALES	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023
ASESOR JURIDICO	LINA DEL PILAR RODRIGUEZ COBOS	X		SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-009 Radicado No. E-2023-147672	18/10/2023	S-2023-330854	30/10/2023

PERSONAL RETIRADO
PERSONAL ACTUAL APROBADO

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el **(ANEXO 05)** del presente informe se incluye el registro fotográfico efectuado por esta interventoría donde se registran las principales actividades de obra realizadas por el contratista dentro del periodo comprendido entre el 30 de abril de 2024 al 29 de mayo de 2024.

14. ITEMS NO PREVISTOS

A continuación, se relacionan los ítems no previstos revisados y aprobados por parte de la entidad a la fecha de corte del presente informe:

ITEM NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO CON AIU	FECHA APROBACION SED
NP-01	Reinstalación de juegos infantiles. incluye todos los elementos para su correcta instalación	UND	$ 176.578,00	25/05/2024
NP-02	desmonte y retiro de superficie de piso de cancha sintética en el área deportiva (incluye limpieza para posterior instalación)	M2	$ 10.302,00	25/05/2024
NP-05	Imprimación con aditivo para mejoramiento (aditivo mejorador de adherencia y de resistencia para morteros incluye cemento)	M2	$ 19.061,00	25/05/2024
NP-07	Suministro instalación piso deck 2 cm sobre estructura existente	M2	$ 482.696,00	25/05/2024
NP-09	Suministro e instalación de rejilla tipo cúpula en aluminio de 3"	UND	$ 25.449,00	25/05/2024

Del mismo modo, se ha realizado la entrega de los siguientes ítems no previstos, para revisión y aprobación:

ITEM NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR (ANTES DE AIU)	FECHA RADICACION SED*
NP-04	suministro e instalación de malla gallinero en las Zonas donde se requiera. incluye lamina y tornillería (incluye construcción del marco perimetral de soporte)	ML	$ 112.532,00	13/03/2024
NP-06	Mantenimiento de estructura de cubierta (incluye limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas)	ML	$ 28.511,00	13/03/2024
NP-08	Suministro e instalación de arena silice para grama sintética	KG	$ 3.497,00	13/03/2024
NP-10	Instalación piso deck en WPC recuperado, sobre estructura existente incluye (mantenimiento piso deck en WPC, descontaminación y aplicación de sellante para WPC)	M2	$ 155.939,00	10/04/2024
NP-11	Desmonte de teja de asbesto cemento altura máxima 7.78 incluye (trasiego y transporte al centro de disposición)	M2	$ 28.172,00	10/04/2024
NP-12	Desmonte de todo tipo de cielo raso existente a altura máxima 7.78	M2	$ 22.524,00	10/04/2024
NP-14	Ampliación de pintura bituminosa de aluminio	ML	$ 3.980,00	10/04/2024
NP-03	Retiro de malla gallinero existente	ML	$ 2.493,00	12/04/2024
NP-13	Pintura de barandas de un trasversal	ML	$ 32.734,00	12/04/2024

** Es importante aclarar que las fechas de entrega de los ítems no previstos se hicieron previamente en el mes de enero, sin embargo, solo hasta el 05 de febrero de 2024, se realiza reunión en compañía de la profesional de presupuestos de la entidad, apoyo a la supervisión, contratista e interventoría, donde se dan las directrices y los lineamientos contractuales para la entrega de los ítems no previstos; teniendo en cuenta esto, los ítems no previstos entregados previos a la reunión del 5 de febrero de 2024, no cumplían con lo requerido, por ello se realizo una segunda entrega.*

El 25 de abril de 2024 vía correo electrónico se remite por parte de la entidad, las observaciones de todos los ítems no previstos remitidos, excepto el ítem No. 03 y No. 13, debido a que fueron entregados posteriormente.

Dichas observaciones son subsanadas y revisadas por la interventoría y remitidas vía correo electrónico el 30 de abril de 2024, al profesional apoyo a la supervisión para la respectiva revisión, se da claridad que el contratista no realiza la subsanación de la totalidad de las observaciones por ello queda pendiente la entrega de los ítems No. 7. No. 10, No. 11, No. 12 y No. 14. Dentro de estas observaciones **NO** se da aprobación del ítem No.11, No. 12 y No. 14 toda vez que estos ítems se cuentan dentro de los ítems contractuales.

Vía correo electrónico el 03 de mayo de 2024 la interventoría realiza a entrega de los ítems No. 7 y No. 14, subsanados por el contratista.

El contratista el 9 de mayo hace entrega de dos ítems no previstos **NP No. 16** *alistado de piso en mortero 1:3 para zonas con espesor de 0.06 a 0.08 m* y **NP No. 17** *pañete muro 1:4, incluye filos y dilataciones y andamio certificado para una altura de hasta 12 m,* sin embargo, es devuelto con observaciones por la interventoría.

Teniendo en cuenta que no se dio aprobación de los nps **No. 11, No. 12 y No. 14** por parte de la entidad, se realiza el uso de los consecutivos No. 11 y no. 12 para los siguientes ítems:

NP-11- SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE AQ NG 20 M3 CON GEOMEMBRANA HDPE 30 MILS Y GEOTEXTIL NO TEJIDO
NP-12- ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 PARA ZONAS CON ESPESOR DE 0.06 A 0.08 M

ITEM NO.	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR (ANTES DE AIU)	FECHA RADICACION SED
NP-11**	Suministro e instalación de tanque aquacell ng 20 m3 con geomembrana HDPE 30 MILS y geotextil no tejido	UND	$ 106.148.614,00	21/05/2024
NP-12	Alistado de piso en mortero 1:3 para zonas con espesor de 0.06 a 0.08 m	M2	$ 50.331,00	21/05/2024

*** Teniendo en cuenta el la reunión hidráulica llevada a cabo el 16 de mayo de 2024 con la participación del profesional hidráulico de la entidad (Secretaria de Educación del Distrito), se dio visto bueno a la propuesta presentada del tanque aquacell, del cual ya se tenía conocimiento del ítem presentado en el presente comunicado.*

Estos ítems fueron entregados oficialmente a la entidad mediante comunicado de la interventoría SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-332 del 21 de mayo de 2024 con radicado No. E-2024-85332, para la revisión y aprobación.

Mediante comunicado interno de la entidad SED no. I-2024-62234 se hace devolución de los ítems No. 3 y No. 13, toda vez que no se atendieron las observaciones realizadas.

A la fecha de corte del presente informa se ha realizado la subsanación de los ítems relacionados a continuación y se encuentran en revisión por parte de la entidad.

- **NP-03:** Retiro de malla gallinero existente
- **NP-04:** suministro e instalación de malla gallinero en las Zonas donde se requiera. incluye lamina y tornillería (incluye construcción del marco perimetral de soporte)
- **NP-06:** Mantenimiento de estructura de cubierta (incluye limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas)
- **NP-08:** Suministro e instalación de arena silice para grama sintética
- **NP-10:** Instalación piso deck en WPC recuperado, sobre estructura existente incluye (mantenimiento piso deck en WPC, descontaminación y aplicación de sellante para WPC)
- **NP-11:** Suministro e instalación de tanque aquacell ng 20 m3 con geomembrana HDPE 30 MILS y geotextil no tejido
- **NP-12:** Alistado de piso en mortero 1:3 para zonas con espesor de 0.06 a 0.08 m
- **NP-13:** Pintura de barandas de un trasversal

15. BITÁCORA

Se consignan las actividades más relevantes de acuerdo con el proceso de ejecución, realizadas para el periodo comprendido entre el 30 de abril de 2023 al 29 de mayo de 2024, objeto del presente informe. En el **(ANEXO 07)** se adjuntan copias que son los soportes correspondientes a lo registrado en la bitácora de obra.

16. CORRESPONDENCIA

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido entre el 30 de abril de 2023 al 29 de mayo de 2024, objeto del presente informe en el **(ANEXO 08)** se adjunta la relación de correspondencia obtenida en el transcurso del periodo.

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-286	martes, 30 de abril de 2024	Observaciones ítems no previstos no. 15 y No. 16	CONTRATISTA	Se emiten observaciones	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 30-04-2024 a las 15:06 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-287	martes, 30 de abril de 2024	Revisión plan de inspección y ensayo	CONTRATISTA	Se emiten observaciones	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 30-04-2024 a las 15:22 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-288	martes, 30 de abril de 2024	Respuesta OB-UTGEPM2023-153-23 detalle típico Carlos Alban	CONTRATISTA	Se da visto bueno	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 30-04-2024 a las 15:29 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-289	martes, 30 de abril de 2024	Remisión concepto no ejecución cubierta Rodrigo de Triana	SED	Se remite concepto	MCMM	Radicado: E-2024-75920 código de verificación NHAMR. Se remite por ventanilla virtual del día 30-04-2024 a las 3:56 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-290	martes, 30 de abril de 2024	Observaciones componente ambiental y SST	CONTRATISTA	Se emiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 30-04-2024 a las 16:53 pm, para fines pertinentes.

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-291	martes, 30 de abril de 2024	Observaciones informe ambiental N°6	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 30-04-2024 a las 20:34 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-292	jueves, 2 de mayo de 2024	Se remite aprobación presupuesto emergencia Los Periodistas	CONTRATISTA	Se remite aprobación presupuesto emergencia Los Periodistas en respuesta a oficio OB-UTGEPM2023-157-23	MECC	Se remite vía correo electrónico el día 2-05-2024 a las 22:27 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-293	jueves, 2 de mayo de 2024	Se remite requerimiento para protección equipos de sistemas Francisco Miranda	CONTRATISTA	Se remite requerimiento para protección equipos de sistemas Francisco Miranda	MECC	Se remite vía correo electrónico el día 2-05-2024 a las 22:45 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-294	viernes, 3 de mayo de 2024	Remisión informe de presunto incumplimiento contrato de obra (actualizado)	SEGUROS DEL ESTADO	Se remite informe de presunto incumplimiento	MCMM	Radicado: 24E00008514 el día 3 de mayo de 2024 a las 10:45 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-295	viernes, 3 de mayo de 2024	Requerimiento actividades atrasadas Colegios	CONTRATISTA	Requerimiento actividades atrasadas Colegios	MECC	Se remite vía correo electrónico el día 3-05-2024 a las 18:28 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-296	viernes, 3 de mayo de 2024	Solicitud de autorización retiro de residuos aprovechables	SED	Se remite solicitud	SF	Radicado: E-2024-77509 código de verificación MXBK2. Se remite por ventanilla virtual del día 03-05-2024 a las 3:58 pm

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-297	lunes, 6 de mayo de 2024	Solicitud concepto estructural tanque de almacenamiento lluvias	CONTRATISTA	Se solicita concepto estructural	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 6-05-2024 a las 17:32 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-298	lunes, 6 de mayo de 2024	Remisión informe semanal No. 26	SED	Se remite informe semanal No. 26	MCMM	Radicado: E-2024-78421 código de verificación M2I3X. Se remite por ventanilla virtual del día 06-05-2024 a las 3:57 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-299	lunes, 6 de mayo de 2024	Remisión informe semanal No. 27	SED	Se remite informe semanal No. 27	MCMM	Radicado: E-2024-78464 código de verificación 89EDG. Se remite por ventanilla virtual del día 06-05-2024 a las 4:29 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-300	martes, 7 de mayo de 2024	Reiteración observaciones colegio Francisco de Miranda	CONTRATISTA / SED	Se reiteración observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 07-05-2024 a las 06:30 am, para fines pertinentes. Radicado: E-2024-78649 código de verificación NRVE7. Se remite por ventanilla virtual del día 07-05-2024 a las 8:06 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-301	martes, 7 de mayo de 2024	Reiteración solicitud definición inversión recursos saldo	SED	Se solicita la definición de inversión de recursos saldo	MCMM	Radicado: E-2024-79236 código de verificación E47G0. Se remite por ventanilla virtual del día 07-05-2024 a las 05:04 pm

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-302	miércoles, 8 de mayo de 2024	Solicitud subsanación inf 5 y entrega inf 6	CONTRATISTA	Se solicita la entrega del informe subsanado.	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 8-05-2024 a las 15:00 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-303	jueves, 9 de mayo de 2024	Observaciones plan de inspección y ensayo	CONTRATISTA	Observaciones plan de inspección y ensayo	VLU	Se remite vía correo electrónico el día 9-05-2024 a las 17:00 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-304	jueves, 9 de mayo de 2024	Reiterada solicitud de listado semanal de materiales	CONTRATISTA	Reiterada solicitud de listado semanal de materiales	VLU	Se remite vía correo electrónico el día 9-05-2024 a las 17:10 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-305	jueves, 9 de mayo de 2024	Aprobación informe ambiental N°6	CONTRATISTA	Se remite aprobación	SF	Se remite vía correo electrónico el día 9-05-2024 a las 17:16 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-306	jueves, 9 de mayo de 2024	Información para autorización retiro de residuos	SED	Se remite información	SF	Radicado: E-2024-80552 código de verificación 4QBCO. Se remite por ventanilla virtual del día 09-05-2024 a las 05:52 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-307	viernes, 10 de mayo de 2024	Respuesta OB-UTGEPM2023-163-23 revisión ítems no previstos No. 16 y No. 17	CONTRATISTA	Se envían observaciones del ítems no previstos	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 10-05-2024 a las 9:34 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-308	viernes, 10 de mayo de 2024	Respuesta OB-UTGEPM2023-162-23 informe mensual técnico No. 5 VS2	CONTRATISTA	Se envían observaciones del informe técnico No. 5	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 10-05-2024 a las 9:51 am, para fines pertinentes.

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-309	viernes, 10 de mayo de 2024	Requerimiento colegio Motorista	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 10-05-2024 a las 14:35 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-310	viernes, 10 de mayo de 2024	Remisión informe mensual No. 6 AMBIENTAL interventoría	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de marzo al 29 de abril de 2024	SF	Radicado: E-2024-80957 código de verificación R5FBV Se remite por ventanilla virtual del día 10-05-2024 a las 02:52 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-311	viernes, 10 de mayo de 2024	Remisión informe mensual No. 6 AMBIENTAL Obra	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 30 de marzo al 29 de abril de 2024	SF	Radicado: E-2024-80966 código de verificación V4DMG Se remite por ventanilla virtual del día 10-05-2024 a las 02:58 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-312	sábado, 11 de mayo de 2024	Requerimiento colegio Francisco de Miranda	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 11-05-2024 a las 10:50 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-313	sábado, 11 de mayo de 2024	CONTOL Y REPORTE DE MATERIALES	CONTRATISTA	CONTOL Y REPORTE DE MATERIALES	VLU	Se remite vía correo electrónico el día 11-05-2024 a las 12:09 m, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-314	martes, 14 de mayo de 2024	Alcance radicado E-2024-72156 informe de presunto incumplimiento contrato de obra (actualizado)	SED	Se remite informe de presunto incumplimiento	MCMM	Radicado: E-2024-81979 el día 15-05-2024 a las 9:18 am

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-315	martes, 14 de mayo de 2024	Remisión informe semanal No. 28	SED	Se remite informe semanal No. 28	MCMM	Radicado: E-2024-81795 código de verificación 8VZJ6 Se remite por ventanilla virtual del día 14-05-2024 a las 05:05 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-316	miércoles, 15 de mayo de 2024	Revisión presupuesta Devora Arango	SED	Se remiten observaciones	MECC	Se remite vía correo electrónico el día 15-05-2024 a las 8:16 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-317	miércoles, 15 de mayo de 2024	Revisión presupuesto obras otic	CONTRATISTA	Se remiten observaciones de presupuesto eléctrico	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 15-05-2024 a las 16:36 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-318	miércoles, 15 de mayo de 2024	Requerimiento Colegio Francisco de Miranda Submuracion	CONTRATISTA	Requerimiento Colegio Francisco de Miranda Submuración	MECC	Se remite vía correo electrónico el día 15-05-2024 a las 9:20 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-319	miércoles, 15 de mayo de 2024	Requerimiento Intervención emergencias	CONTRATISTA	Requerimiento Intervención emergencias	MECC	Se remite vía correo electrónico el día 15-05-2024 a las 9:36 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-320	miércoles, 15 de mayo de 2024	Remisión informe SST N°6-Interventoría	SED	Se remite informe mensual para el periodo comprendido entre el 29 de marzo al 30 de abril de 2024	SF	Radicado: E-2024-82265 código de verificación UH1SB Se remite por ventanilla virtual del día 15-05-2024 a las 02:24 pm

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-321	miércoles, 15 de mayo de 2024	Requerimiento SST colegio San Bernardino	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 15-05-2024 a las 14:47 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-322	jueves, 16 de mayo de 2024	Incumplimiento entrega Shut de basuras y patio preescolar Villa Rica	CONTRATISTA	Incumplimiento entrega Shut de basuras y patio preescolar Villa Rica	MECC	Se remite vía correo electrónico el día 15-05-2024 a las 11:17 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-323	viernes, 17 de mayo de 2024	Remisión informe mensual técnico No. 6 interventoría	SED	Se remite informe mensual no. 6	MCMM	Radicado: E-2024-83526 código de verificación X9BFQ Se remite por ventanilla virtual del día 17-05-2024 a las 12:01 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-324	lunes, 20 de mayo de 2024	Observaciones informe mensual técnico No. 6	CONTRATISTA	Se remiten observaciones del informe mensual técnico no 6	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 20-05-2024 a las 10:34 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-325	lunes, 20 de mayo de 2024	Respuesta OB-UTGEPM2023-168-23 - observaciones informe técnico No. 5	CONTRATISTA	Se remiten observaciones del informe mensual técnico no 5	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 20-05-2024 a las 11:15 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-326	lunes, 20 de mayo de 2024	Respuesta OB-UTGEPM2023-164-23 cambio de personal	CONTRATISTA	Se da aprobación de hoja de vida	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 20-05-2024 a las 11:54 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-327	lunes, 20 de mayo de 2024	Remisión hojas de vida personal cambio	SED	Se remite aprobación de hoja de vida	MCMM	Radicado: E-2024-84241 código de verificación 84XBM Se remite por ventanilla

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
						virtual del día 20-05-2024 a las 12:00 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-328	lunes, 20 de mayo de 2024	Propuesta bodega Carlos Alban	CONTRATISTA	Se da visto bueno de propuesta de bodega	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 20-05-2024 a las 14:35 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-329	lunes, 20 de mayo de 2024	Requerimiento SST DILE- Bosa	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 20-05-2024 a las 14:00 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-330	lunes, 20 de mayo de 2024	Aprobación plan de inspección y ensayo	CONTRATISTA	Se da visto bueno del plan de inspección y ensayo	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 20-05-2024 a las 14:48 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-331	martes, 21 de mayo de 2024	Información manejo residuos metálicos colegio Rodrigo de Triana	SED	Se remite información	SF	Radicado: E-2024-85199 código de verificación VRTQN Se remite por ventanilla virtual del día 21-05-2024 a las 03:07 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-332	martes, 21 de mayo de 2024	Remisión nps	SED	Se remite el np no 11 y no 12	MCMM	Radicado: E-2024-85332 código de verificación IQ7QW Se remite por ventanilla virtual del día 21-05-2024 a las 05:01 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-333	miércoles, 22 de mayo de 2024	Remisión informe semanal No. 29	SED	Se remite informe semanal No. 29	MCMM	Radicado: E-2024-85432 código de verificación PDN6R Se remite por ventanilla

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
						virtual del día 22-05-2024 a las 07:47 am
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-334	miércoles, 22 de mayo de 2024	Solicitud definición inversión recursos saldo del contrato.	SED	Se solicita se defina la inversión de los recursos	MCMM	Se radica ante la entidad el día 22-05-2024
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-335	miércoles, 22 de mayo de 2024	Observaciones componente SST y ambiental	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 22-05-2024 a las 19:33 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-336	sábado, 25 de mayo de 2024	Requerimiento SST-Colegio San Bernardino	CONTRATISTA	Se remite requerimiento	SF	Se remite vía correo electrónico el día 25-05-2024 a las 17:03 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-337	lunes, 27 de mayo de 2024	Remisión comunicado aprobación ítems no previstos.	CONTRATISTA	Se da aprobación de ítems no previstos	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 27-05-2024 a las 10:55 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-338	lunes, 27 de mayo de 2024	Trazabilidad residuos aprovechables retirados	SED	Se remite información	SF	Radicado: E-2024-87612 código de verificación 70P42 Se remite por ventanilla virtual del día 27-05-2024 a las 12:05 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-339	lunes, 27 de mayo de 2024	Solicitud entrega de ítems no previstos ajustados.	CONTRATISTA	se solicita la entrega de los ítems no previstos corregidos	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 27-05-2024 a las 11:20 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-340	lunes, 27 de mayo de 2024	Compromisos reunión 23 de mayo de 2024.	CONTRATISTA	Se remite para conocimiento	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 27-05-2024

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
						a las 12:05 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-341	lunes, 27 de mayo de 2024	Remisión acta parcial de obra No. 6	SED	Se remite para aprobación	MCMM	Radicado: E-2024-89473 código de verificación T06RD Se remite por ventanilla virtual del día 29-05-2024 a las 04:38 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-342	lunes, 27 de mayo de 2024	Remisión acta parcial de interventoría No. 6	SED	Se remite para aprobación	MCMM	Radicado: E-2024-89478 código de verificación 8YA3H Se remite por ventanilla virtual del día 29-05-2024 a las 04:42 pm
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-343	lunes, 27 de mayo de 2024	Requerimiento SST Colegio Carlos Pizarro	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 27-05-2024 a las 16:10 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-344	martes, 28 de mayo de 2024	Plan de contingencia proyectado interventoría	CONTRATISTA	Se remite plan de contingencia de la interventoría	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 28-05-2024 a las 10:42 am, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-345	miércoles, 29 de mayo de 2024	Respuesta OB-UTGEPM2023-175-23 informe atrasos de obra	CONTRATISTA	Se remite comunicado respuesta	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 29-05-2024 a las 14:02 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-346	martes, 28 de mayo de 2024	Requerimiento Colegio Francisco de Miranda Submuración	CONTRATISTA	Requerimiento Colegio Francisco de Miranda Submuración	MECC	Se remite vía correo electrónico el día 28-05-2024 a las 2:05 Pm, para fines pertinentes.

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA ENVIADA						
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**DIRIGIDO A:**	**OBSERVACIONES**	**ENCARGADO**	**SEGUIMIENTO**
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-347	miércoles, 29 de mayo de 2024	Rta OB-UTGEPM2023-179-23 respuestas interventoría	CONTRATISTA	Se remite comunicado respuesta	MCMM	Se remite vía correo electrónico el día 29-05-2024 a las 12:24 pm, para fines pertinentes.
SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-348	miércoles, 29 de mayo de 2024	Observaciones componente ambiental y SST	CONTRATISTA	Se remiten observaciones	SF	Se remite vía correo electrónico el día 29-05-2024 a las 16:57 pm, para fines pertinentes.

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA				
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**	**RESPUESTA**
OB-UTGEPM2023-157-23	30/4/2024	Atención emergencias	Se remiten propuestas	
OB-UTGEPM2023-158-23	3/5/2024	Solicitud retiro residuos	Se solicita apoyo y gestión	
OB-UTGEPM2023-159-23	3/5/2024	Definición placa IED motorista	Se entrega documento con los ajustes solicitados	
OB-UTGEPM2023-160-23	6/5/2024	Respuesta 297	Se manifiesta inconformidad	
OB-UTGEPM2023-161-23	8/5/2024	Respuesta 291	Se da respuesta a lo solicitado	
OB-UTGEPM2023-162-23	8/5/2024	Respuesta 265	Se da respuesta a lo solicitado	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-308 el día 10-05-2024
OB-UTGEPM2023-163-23	9/5/2024	NPS 16-17	Se entregan NPs	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-307 el día 10-05-2024

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA				
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**	**RESPUESTA**
OB-UTGEPM2023-164-23	15/5/2024	Hoja de vida reemplazo personal técnico	Se remite para revisión y aprobación	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-326 el día 20-05-2024
OB-UTGEPM2023-165-23	15/5/2024	Informe 6	Se remite para revisión y aprobación	
OB-UTGEPM2023-166-23	15/5/2024	Respuesta 316	Se remite para revisión y aprobación	
OB-UTGEPM2023-167-23	16/5/2024	Diseño cuarto almacenamiento	Se remite para revisión y aprobación	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-327 el día 20-05-2024
OB-UTGEPM2023-168-23	16/5/2024	Respuesta 308 Observaciones informe	Se entregan correcciones de las observaciones	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-325 el día 20-05-2024
OB-UTGEPM2023-169-23	20/5/2024	Programación	Se realizan los ajustes correspondientes	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-350 el día 30-05-2024
OB-UTGEPM2023-171-23	21/5/2024	Ambiental	Se solicita apoyo y gestión	
OB-UTGEPM2023-172-23	21/5/2024	Cuantía acero refuerzo	Se solicita apoyo y gestión	
OB-UTGEPM2023-173-23	21/5/2024	Acta vecindad DILE Bosa	Se entrega acta de vecindad	

CONSECUTIVO CORREPONDENCIA RECIBIDA				
No. CONSECUTIVO	**FECHA**	**CONCEPTO**	**OBSERVACIONES**	**RESPUESTA**
OB-UTGEPM2023-174-23	22/5/2024	Alcance 172	Se remite registro fotográfico	
OB-UTGEPM2023-175-23	23/5/2024	Trazabilidad ejecución obra	Se solicita se estudie la restitución del tiempo.	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-345 el día 29-05-2024
OB-UTGEPM2023-176-23	24/5/2024	Retiro elementos metálicos	Se solicita intervención y supervisión	
OB-UTGEPM2023-177-23	28-05-2024	Solicitud entrega ítem	Se da respuesta a lo solicitado	
OB-UTGEPM2023-178-23	28/5/2024	Entrega corte 6	Se entrega la documentación solicitada	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-341 el día 28-05-2024
OB-UTGEPM2023-179-23	28/5/2024	Plan contingencia	Se manifiesta inconformidad	Se da respuesta mediante comunicado SED-CO1.PCCNTR.5313251-2023-347 el día 29-05-2024

17. AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

De acuerdo con el proceso de ejecución de las labores realizadas para el periodo comprendido el 30 de marzo de 2024 al 29 de abril de 2023 objeto del presente informe, a la fecha del presente informe se han tramitado actas parciales.

CONTRATO DE OBRA - UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1								
ACTA NO.	**PERIODO**	**VALOR DIRECTO**	**AIU**	**VALOR TOTAL**	**VALOR PAGADO**	**ACUMULADO PAGADO**	**SALDO**	**PORCENTAJE DE AVANCE**
1	30/10/2023 29/11/2023	$ 784.157.092	$ 217.211.514	$ 1.001.368.607	$ 1.001.368.607	$ 1.001.368.607	$ 5.736.797.460	14,86%
2	30/11/2023 29/01/2024	$ 237.042.929	$ 65.660.891	$ 302.703.820,00	$ 302.703.820,00	$ 1.304.072.427	$ 5.434.093.640	4.49%
3	30/01/2024 29/02/2024	$ 381.019.160	$ 105.542.307	$ 486.561.467,00	$ 486.561.467,00	$ 1.790.633.894	$ 4.947.532.173	7,22%
4	01/3/2024 29/03/2024	$ 537.124.880	$ 148.783.592	$ 685.908.472,00	$ 685.908.472,00	$ 2.476.542.366	$ 4.261.623.701	10,18%
5	30/03/2024 29/04/2024	$ 320.605.793	$ 88.807.805	$ 409.413.598,00	$ 409.413.598,00	$ 2.884.514.341	$ 3.853.651.726	6,08%
6	30/04/2024 29/05/2024	$ 437.646.994	$ 121.228.217	$ 558.875.211,00	$ 558.875.211,00	$ 3.443.389.552	$ 3.294.776.515	8,29%
	TOTALES	$ 2.696.467.935	$ 746.921.618	$ 3.443.389.552	$ 3.443.389.552,00	$ 3.443.389.552	$ 3.294.776.515	51,10%

CONTRATO DE INTERVENTORIA - CONSORCIO SANTA MARIA 022							
ACTA NO.	**PERIODO**	**VALOR SIN IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**PORCENTAJE COBRADO**
1	30/10/2023 29/11/2023	$ 59.803.813	$ 11.362.725	$ 71.166.538	$ 71.166.538	$ 423.914.049	14,12%
2	30/11/2023 29/01/2024	$ 18.078.101	$ 3.434.839	$ 21.512.940	$ 92.679.478	$ 411.401.109	4,27%
3	30/01/2024 29/02/2024	$ 29.058.462	$ 5.521.108	$ 34.579.569	$ 127.259.047	$ 376.821.540	6,86%
4	01/3/2024 29/03/2024	$ 40.963.879	$ 7.783.137	$ 48.747.016	$ 176.006.063	$ 328.074.524	9,67%

CONTRATO DE INTERVENTORIA - CONSORCIO SANTA MARIA 022							
ACTA NO.	**PERIODO**	**VALOR SIN IVA**	**IVA**	**VALOR TOTAL**	**ACUMULADO**	**SALDO**	**PORCENTAJE COBRADO**
5	30/03/2024 29/04/2024	$ 24.451.031	$ 4.645.696	$ 29.096.726	$ 205.000.335	$ 299.080.252	5,77%
6	30/04/2024 29/05/2024	$ 33.377.189	$ 6.341.666	$ 39.718.854	$ 244.719.189	$ 259.361.398	7,88%
	TOTALES	$ 205.646.377	$ 39.072.812	$ 244.719.189	$ 244.719.189	$ 259.361.398	48,55%

ESPACIO EN BLANCO

18. CONTROL PRESUPUESTAL

A continuación, se presenta el balance presupuestal de cada uno de los frentes a corte del presente informe, donde se realiza el comparativo respecto a los presupuestos inicialmente asignados. A la fecha se presenta un saldo sin definir para ejecución de frentes contractuales correspondiente a $392.452.436 y un saldo sin definir para ejecución de emergencias correspondiente a $ 235.104.596,11, para un total de $ 627.557.032,45 sin definir dentro el contrato. Por ello la interventoría ha venido solicitando a la entidad SED la definición de la inversión de estos recursos, toda vez que es el encargado de priorizar que frentes deben recibir mas recursos y ampliar los alcances ya establecidos al inicio del contrato.

COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	BALANCE OBRA 29/05/24	DIFERENCIA
MANUEL CEPEDA VARGAS C	$191.984.011	$248.978.481,38	- $56.994.471
MANUEL CEPEDA VARGAS A	$275.266.450	$145.401.475,07	$129.864.975
INSTITUTO TECNICO RODRIGO DE TRIANA	$358.692.556	$253.199.133,75	$105.493.422
VILLA RICA	$359.697.929	$236.381.487,48	$123.316.442
FRANCISCO DE MIRANDA	$1.064.973.548	$508.777.489,13	$556.196.059
MANUEL ZAPATA OLIVELLA	$392.648.301	$279.166.969,08	$113.481.332
CARLOS ALBAN HOLGUIN	$1.003.064.617	$1.544.151.602,35	- $541.086.985
JORGE ISAACS	$187.690.105	$133.128.173,40	$54.561.932
RURAL LA CONCEPCION	$355.819.476	$253.510.561,00	$102.308.915
JOSE ANTONIO GALAN	$485.296.407	$543.111.193,70	- $57.814.787
BOSANOVA	$278.305.825	$235.786.410,59	$42.519.414
SAN BERNARDINO	$811.726.610	$900.527.799,60	- $88.801.190
MOTORISTA	$200.339.692	$246.835.890,70	- $46.496.199
DILE	$365.306.813	$409.403.236,43	- $44.096.423
SUBTOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$6.330.812.340	$5.938.359.904	$392.452.436
EMERGENCIAS			
FERNANDO SOTO APARICIO SEDE B		$ 31.394.279,86	
ESMERALDA ARBOLEDA SEDE A		$ 16.231.347,84	
CARLOS PIZARRO LEON GOMEZ		$ 93.896.197,63	
PORFIRIO BARBA JACOB		$ 1.872.883,38	
LAUREL DE CERA		$ 954.308,19	
EL PORVENIR		$ 3.313.177,68	
LOS PERIODISTAS		$ 17.574.072,85	
LA FELICIDAD		$ -	
DEBORA ARANGO		$ 7.012.863,46	SALDOS

VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 407.353.727,00	$ 172.249.131	**$ 235.104.596,11**
VALOR TOTAL FRENTES CONTRACTUALES	$ 6.330.812.340,00	$ 5.938.359.904	**$ 392.452.436,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 6.738.166.067,00**	**$ 6.110.609.034,55**	**$ 627.557.032,45**

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Interventoría CONSORCIO SANTA MARIA 022 ejerció permanentemente seguimiento, a las actividades técnicas, administrativas, jurídicas, financieras y ambientales para cada uno de los procesos constructivos que se llevan a cabo en cada uno de los frentes priorizados, para garantizar el normal desarrollo de la obra.

- Esta Interventoría realiza los comités de seguimiento semanales, donde se manifiesta al contratista los compromisos para terminar cada uno de los frentes de obra.

- Se realizo revisión de cada una de las actividades ejecutadas por el Contratista de obra con registro Fotográfico de todas las áreas donde se realizaron actividades

- Dada la problemática de orden público y seguridad ciudadana del sector de la ciudad donde se ubican las sedes educativas priorizadas para su intervención y que puede afectar el desarrollo del contrato, se recomienda gestionar con las directivas de cada colegio, un espacio dentro de la sede educativa a intervenir, con buena seguridad para el almacén y el equipo administrativo de obra.

- Se le solicito al contratista realizar las actividades pendientes que a la fecha no se han entregado, al igual agilizar con las obras de los frentes recientemente abiertos, toda vez que el contrato cuenta con un mes de ejecución y a la fecha se tiene un atraso general del contrato del 16,87%

- Se remitió alcance a la entidad en cinco (05) ocasiones del informe de presunto incumplimiento, toda vez que se presentan atrasos de obra superiores al 16% en el avance general del contrato, se esta a la espera del pronunciamiento por parte de la entidad contratante, considerando o no el proceso correspondiente ante el contratista de obra.

- Se le solicitó al contratista de obra de atender las emergencias presentadas en cada uno de los colegios priorizados por la supervisión.

- El personal de Interventoría estuvo presente a todo momento revisando las actividades que realizo el contratista de obra para revisar que se realizaran bien y que los materiales utilizados fueran de buena calidad.

- Se recomienda dinamizar el equipo de trabajo para optimizar el avance de obra, teniendo en cuenta los atrasos que se han venido presentando, causados por la ausencia de personal y falta de materiales.

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**MANUEL CEPEDA SEDE C**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO**

FECHA	CLIMA
1 DE MAYO	DIA NO LABORADO
2 DE MAYO	SOLEADO
3 DE MAYO	SOLEADO
4 DE MAYO	NUBLADO
5 DE MAYO	SOLEADO
6 DE MAYO	SOLEADO
7 DE MAYO	SOLEADO
8 DE MAYO	SOLEADO
9 DE MAYO	SOLEADO
10 DE MAYO	NUBLADO
11 DE MAYO	NO SE LABORA POR PERSONAL
12 DE MAYO	NO SE LABORA POR PERSONAL
13 DE MAYO	NO SE LABORA POR PERSONAL
14 DE MAYO	SOLEADO
15 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
16 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
17 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
18 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
19 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
20 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
21 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
22 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
23 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
24 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
25 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
26 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
27 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
28 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
29 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES
30 DE MAYO	NO SE EJECUTAN ACTIVIDADES

Firma:

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. RONALD LOZANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**RODRIGO DE TRIANA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO**

FECHA	CLIMA
1 DE MAYO	DIA NO LABORADO
2 DE MAYO	SOLEADO
3 DE MAYO	NUBLADO
4 DE MAYO	NO LABORADO
5 DE MAYO	NO LABORADO
6 DE MAYO	SOLEADO
7 DE MAYO	SOLEADO
8 DE MAYO	LLUVIOSO TODO EL DIA
9 DE MAYO	NUBLADO
10 DE MAYO	LLUVIOSO TODO EL DIA
11 DE MAYO	NUBLADO
12 DE MAYO	
13 DE MAYO	
14 DE MAYO	SOLEADO- LLUVIAS EN LA TARDE
15 DE MAYO	LLUVIOSO
16 DE MAYO	LLUVIAS TODO EL DIA
17 DE MAYO	NUBLADO
18 DE MAYO	NO HAY PERSONAL
19 DE MAYO	SOLEADO
20 DE MAYO	NO HAY PERSONAL
21 DE MAYO	NUBLADO
22 DE MAYO	NUBLADO
23 DE MAYO	NUBLADO
24 DE MAYO	NUBLADO
25 DE MAYO	LLUVIAS TODO EL DIA
26 DE MAYO	SOLEADO
27 DE MAYO	SOLEADO
28 DE MAYO	SOLEADO
29 DE MAYO	SOLEADO
30 DE MAYO	NUBLADO

Firma:

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. RONALD LOZANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CODIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**VILLA RICA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO**

FECHA	CLIMA
1 DE MAYO	DIA NO LABORADO
2 DE MAYO	NUBLADO
3 DE MAYO	SOLEADO
4 DE MAYO	NUBLADO
5 DE MAYO	NO LABORADO
6 DE MAYO	NUBLADO
7 DE MAYO	NUBLADO
8 DE MAYO	NUBLADO
9 DE MAYO	SOLEADO
10 DE MAYO	SOLEADO
11 DE MAYO	SOLEADO
12 DE MAYO	
13 DE MAYO	
14 DE MAYO	SOLEADO
15 DE MAYO	
16 DE MAYO	LLUVIAS
17 DE MAYO	LLUVIAS EN LA MANANA
18 DE MAYO	LLUVIAS
19 DE MAYO	
20 DE MAYO	NUBLADO
21 DE MAYO	NUBLADO
22 DE MAYO	SOLEADO
23 DE MAYO	SOLEADO
24 DE MAYO	SOLEADO
25 DE MAYO	LLUVIAS TODO EL DIA
26 DE MAYO	NO LABORADO
27 DE MAYO	NUBLADO
28 DE MAYO	SOLEADO
29 DE MAYO	SOLEADO
30 DE MAYO	SOLEADO

Firma:

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. RONALD LOZANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**FRANCISCO MIRANDA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO**

FECHA	CLIMA
1 DE MAYO	DIA NO LABORADO
2 DE MAYO	NUBLADO
3 DE MAYO	
4 DE MAYO	SOLEADO
5 DE MAYO	DIA NO LABORADO
6 DE MAYO	NUBLADO
7 DE MAYO	SOLEADO
8 DE MAYO	NUBLADO
9 DE MAYO	LLUVIAS TODO EL DIA
10 DE MAYO	LLUVIAS TODA LA MAÑANA
11 DE MAYO	NUBLADO
12 DE MAYO	NO LABORADO
13 DE MAYO	NO LABORADO
14 DE MAYO	SOLEADO
15 DE MAYO	LLUVIAS EN LA MAÑANA
16 DE MAYO	SOLEADO
17 DE MAYO	SOLEADO
18 DE MAYO	LLUVIAS
19 DE MAYO	NO LABORADO
20 DE MAYO	SOLEADO
21 DE MAYO	NUBLADO
22 DE MAYO	SOLEADO
23 DE MAYO	SOLEADO
24 DE MAYO	LLUVIAS
25 DE MAYO	LLUVIAS
26 DE MAYO	NO LABORADO
27 DE MAYO	SOLEADO
28 DE MAYO	SOLEADO
29 DE MAYO	NUBLADO
30 DE MAYO	SOLEADO

Firma:

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. RONALD LOZANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CODIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**BOSANOVA**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO**

FECHA	CLIMA
1 DE MAYO	DIA NO LABORADO
2 DE MAYO	NUBLADO
3 DE MAYO	SOLEADO
4 DE MAYO	NUBLADO
5 DE MAYO	NO LABORADO
6 DE MAYO	SOLEADO
7 DE MAYO	NUBLADO
8 DE MAYO	LLUVIAS
9 DE MAYO	LLUVIAS
10 DE MAYO	SOLEADO
11 DE MAYO	NUBLADO
12 DE MAYO	NO LABORADO
13 DE MAYO	NO LABORADO
14 DE MAYO	SOLEADO
15 DE MAYO	NUBLADO
16 DE MAYO	LLUVIOSO
17 DE MAYO	SOLEADO
18 DE MAYO	NUBLADO
19 DE MAYO	NUBLADO
20 DE MAYO	SOLEADO
21 DE MAYO	SOLEADO
22 DE MAYO	SOLEADO
23 DE MAYO	SOLEADO
24 DE MAYO	SOLEADO
25 DE MAYO	SOLEADO
26 DE MAYO	NO LABORADO
27 DE MAYO	SOLEADO
28 DE MAYO	SOLEADO
29 DE MAYO	SOLEADO
30 DE MAYO	SOLEADO

Firma:

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. RONALD LOZANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CODIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	No. CO1.PCCNTR.5313251
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**DILE**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL:	**30 DE ABRIL AL 29 DE MAYO**

FECHA	CLIMA
1 DE MAYO	DIA NO LABORADO
2 DE MAYO	DIA NO LABORADO
3 DE MAYO	DIA NO LABORADO
4 DE MAYO	DIA NO LABORADO
5 DE MAYO	DIA NO LABORADO
6 DE MAYO	DIA NO LABORADO SIN PERSONAL
7 DE MAYO	NUBLADO
8 DE MAYO	NUBLADO
9 DE MAYO	LLUVIAS
10 DE MAYO	NUBLADO
11 DE MAYO	DIA NO LABORADO SIN PERSONAL
12 DE MAYO	DIA NO LABORADO SIN PERSONAL
13 DE MAYO	DIA NO LABORADO SIN PERSONAL
14 DE MAYO	SOLEADO
15 DE MAYO	LLUVIAS
16 DE MAYO	LLUVIAS
17 DE MAYO	SOLEADO
18 DE MAYO	DIA NO LABORADO SIN PERSONAL
19 DE MAYO	DIA NO LABORADO SIN PERSONAL
20 DE MAYO	SOLEADO
21 DE MAYO	SOLEADO
22 DE MAYO	SOLEADO
23 DE MAYO	SOLEADO
24 DE MAYO	SOLEADO
25 DE MAYO	LLUVIAS
26 DE MAYO	SOLEADO
27 DE MAYO	SOLEADO
28 DE MAYO	SOLEADO
29 DE MAYO	NUBLADO
30 DE MAYO	SOLEADO

Firma:

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. RONALD LOZANO

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C (SAN JOSÉ)**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE ABRIL DE 2024 AL 29 DE MAYO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE ABRIL DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
2 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
3 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
4 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
6 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
7 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE LLUVIOSA
8 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
9 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
10 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
11 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
14 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
15 DE MAYO DE 2024	MAÑANA LLUVIOSA Y NUBLADA -TARDE SOLEADA
16 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA Y NUBLADA -TARDE NUBLADA Y LLOVIZNA
17 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
18 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
20 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
21 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
22 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA Y SOLEADA
23 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
24 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
25 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA Y LLUVIOSA
27 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
28 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLOVIZNA
29 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE ABRIL DE 2024 AL 29 DE MAYO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE ABRIL DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
2 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
3 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
4 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
6 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
7 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE LLUVIOSA
8 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
9 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
10 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
11 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
14 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
15 DE MAYO DE 2024	MAÑANA LLUVIOSA Y NUBLADA -TARDE SOLEADA
16 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA Y NUBLADA -TARDE NUBLADA Y LLOVIZNA
17 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
18 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
20 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
21 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
22 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA Y SOLEADA
23 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
24 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
25 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA Y LLUVIOSA
27 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
28 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLOVIZNA
29 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE ABRIL DE 2024 AL 29 DE MAYO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE ABRIL DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
2 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
3 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
4 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
6 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
7 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE LLUVIOSA
8 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
9 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
10 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
11 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
14 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
15 DE MAYO DE 2024	MAÑANA LLUVIOSA Y NUBLADA -TARDE SOLEADA
16 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA Y NUBLADA -TARDE NUBLADA Y LLOVIZNA
17 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
18 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
20 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
21 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
22 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA Y SOLEADA
23 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
24 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
25 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA Y LLUVIOSA
27 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
28 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLOVIZNA
29 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE ABRIL DE 2024 AL 29 DE MAYO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE ABRIL DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
2 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
3 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
4 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
6 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
7 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE LLUVIOSA
8 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
9 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
10 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
11 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
14 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
15 DE MAYO DE 2024	MAÑANA LLUVIOSA Y NUBLADA -TARDE SOLEADA
16 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA Y NUBLADA -TARDE NUBLADA Y LLOVIZNA
17 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
18 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
20 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
21 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
22 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA Y SOLEADA
23 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
24 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
25 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA Y LLUVIOSA
27 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
28 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLOVIZNA
29 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE ABRIL DE 2024 AL 29 DE MAYO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE ABRIL DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
2 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
3 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
4 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
6 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
7 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE LLUVIOSA
8 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
9 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
10 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
11 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
14 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
15 DE MAYO DE 2024	MAÑANA LLUVIOSA Y NUBLADA -TARDE SOLEADA
16 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA Y NUBLADA -TARDE NUBLADA Y LLOVIZNA
17 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
18 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
20 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
21 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
22 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA Y SOLEADA
23 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
24 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
25 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA Y LLUVIOSA
27 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
28 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLOVIZNA
29 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	CONTROL DE LLUVIAS	CÓDIGO:	FS-CGE-30
		VERSIÓN:	1
		VIGENCIA:	2023-12-31

CONTRATO DE OBRA No:	C01-PCCNTR 5305583
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GEPM-2023-1
OBJETO:	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACION.MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS FISICAS DE LA SECRETARIA DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCION DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIOS GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA	No. 3443 de 2022
INTERVENTOR :	CONSORCIO SANTA MARIA 022
OBJETO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
COLEGIO:	**SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A**
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE	**30 DE ABRIL DE 2024 AL 29 DE MAYO DE 2024**

FECHA	CLIMA
30 DE ABRIL DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
2 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
3 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
4 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
6 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
7 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE LLUVIOSA
8 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
9 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
10 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
11 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA
14 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
15 DE MAYO DE 2024	MAÑANA LLUVIOSA Y NUBLADA -TARDE SOLEADA
16 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA Y NUBLADA -TARDE NUBLADA Y LLOVIZNA
17 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE NUBLADA
18 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
20 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
21 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
22 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA Y SOLEADA
23 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA
24 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE SOLEADA
25 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA Y LLUVIOSA
27 DE MAYO DE 2024	MAÑANA SOLEADA -TARDE NUBLADA
28 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLOVIZNA
29 DE MAYO DE 2024	MAÑANA NUBLADA -TARDE LLUVIOSA

Firma: Juan Carlos Delgado Correal

CONSORCIO SANTA MARIA 022

Nombre: Arq. JUAN CARLOS DELGADO CORREAL

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-78464

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	06/05/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL DELGADO
Documento	79573492
Teléfono	
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	
OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	
Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-299 - Remision informe semanal No. 27, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-299 - Remision informe semanal No. 27
No. Folios	0
Anexos	
Documentos Adjuntos	
E-2024-78464_1.pdf	

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-299

Bogotá D.C., 06 de mayo de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 27

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 27, correspondiente al periodo comprendido entre el 29 de abril al 05 de mayo de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (37) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

			27	Interventor:	CONSORCIO SANTA MARIA 022
29/04/2024	al	5/05/2024			

1. Datos Generales

Nombre:	NOMBRE	Localidad:	LOCALIDAD
	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C		KENNEDY
	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A		KENNEDY
	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA		KENNEDY
	COLEGIO VILLA RICA		KENNEDY
	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA		KENNEDY
	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA		KENNEDY
	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN		BOSA
	COLEGIO JORGE ISAAC		BOSA
	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION		BOSA
	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN		BOSA
	COLEGIO BOSANOVA		BOSA
	COLEGIO SAN BERNARDINO		BOSA
	COLEGIO MOTORISTA		BOSA
	COLEGIO DILE BOSA		BOSA
	EMERGENCIAS		BOSA-KENNEDY

2. Contrato de Obra

	CONTRATO DE OBRA No.	**No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			CONSORCIO SANTA MARIA 022						
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	
				Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00						
Adición:			$ -						
Anticipo:			$ -						
Retegarantía:			$ -						
			Neto Acta						
			Acumulado						

4.	**Programación.**			Semana No.	**27**	Fecha de corte:	5-may-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

N°	**Capítulos:**	**LOCALIDAD**	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**% Inversión**
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	16-mar-24	$ 248.978.481,38	**3,93%**	100,00%	99,64%	-0,36%	$ 248.090.300
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 145.401.475,07	**2,30%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 145.401.475
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	29-abr-24	$ 252.065.850,69	**3,98%**	100,00%	83,57%	-16,43%	$ 210.643.977
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 212.048.177,90	**3,35%**	100,00%	96,25%	-3,75%	$ 204.103.946
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 502.792.596,13	**7,94%**	100,00%	92,06%	-7,94%	$ 462.883.636
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 279.166.969,08	**4,41%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 279.166.969
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.544.151.602,35	**24,39%**	96,04%	60,00%	-36,04%	$ 926.490.961
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 133.128.173,40	**2,10%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 133.128.173
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	11-mar-24	29-jun-24	$ 253.510.561,00	**4,00%**	17,00%	7,00%	-10,00%	$ 17.745.739
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 543.111.193,70	**8,58%**	19,00%	3,06%	-15,94%	$ 16.619.203
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	15-abr-24	29-jun-24	$ 268.819.390,66	**4,25%**	9,00%	4,09%	-4,91%	$ 10.990.863
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.527.799,60	**14,22%**	100,00%	87,20%	-12,80%	$ 785.260.241
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 246.835.890,70	**3,90%**	13,21%	8,02%	-5,19%	$ 19.796.238
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 293.809.176,39	**4,64%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	**6,43%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 5.824.347.338**	**92,00%**	**68,87%**	**54,66%**	**-**	**$ 3.460.321.723**

VR TOTAL EJECUTADO	**$**	**-**
VR INICIAL CONTRATO	**$**	**6.330.813.879,00**
ADICION	**$**	**-**
VR TOTAL CONTRATO	**$**	**6.330.813.879,00**

-14,21%	**DIFERENCIA**

5. **Estado de la Programación**

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

que el contratiste finalice toos los frentes de obra que a la fecha ya llegaron a su finalizacion según programacion como francisco miranda, manuel cepeda sede C, villa rica, Rodrigo de Triana, igualmente avanzar en los frentes de bosanova, iniciar DILE.

6

PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
6.330.813.879,00									**6.330.813.879,00**
29/6/2024									0%

7 **ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista avanza con enchape de piso aula ingles y rack, avanza con Pintura de salones, avanza con remates finales para entrega
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	Se avanza con destroncado y pulido de piso, con la instalacion de estructura de cielo raso en una aula del primer nivel, con suministro e instalacion de enchape de piso en granito en 3 aulas del segundo nivel y primer nivel, instalacion de pintura en aulas de primer piso, actividades de destroncado y pulido de piso aulas primer y segundo piso
COLEGIO VILLA RICA	Se avanza con remates de pintura shut de basuras, la instalación de canal cubierta patio preescolar.
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	el contratista avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias en cajas y redes, con la funcicion de placa zonas de excavacion aguas lluvias, con la instalacion de tuberia aguas lluvias en canalizaciones, con la instalación de perfileria para muros superboard aula de sistemas, con lla instalacion y cableado de tuberia emet para alimentación luminarias aulas de sistemas.
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	se finalizan las obras
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Se funden y desencofran las alfajías de las ventanas del No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Continúa la instalación de la estructura métalica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Continúa la excavación de zanjas para las vigas de cimentación del cerramiento posterior en mampostería. Se funden los pedestales de cimentación en mampostería. Se corta un lineal de cerámica de muro a la entrada del baño de preescolar para el marco de la puerta.
COLEGIO JORGE ISAAC	No se desarrollan actividades de obra esta semana, Queda pendiente la aprobación por parte de la SED de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	Se instalan 11,55 m de tubería EMT, 6 codos conduit de 1/2", y 6 cajas eléctricas, No se desarrollan actividades de obra civil.
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	Finaliza el desmonte de láminas de cielos rasos en las aulas del segundo piso del Bloque A. Finaliza el desmonte de puertas y ventanas en las aulas del segundo piso del Bloque A. Finaliza el desmonte de lámparas en las aulas del segundo piso del Bloque A. Continúa la remoción de pintura de muros en las aulas del segundo piso del Bloque A. Encofrado y fundida de alfajías en las ventanas de las aulas del segundo piso del Bloque A.
COLEGIO BOSANOVA	Avances instalacion enchape segundo piso y fundicion de cintas confinamiento piso, antepechos para instalacion nueva ventaneria, desmonte ventaneria interna existente.
COLEGIO SAN BERNARDINO	No se ejecutan actividades de obra durante la presente semana. Se verifican medidas de espejos por parte del instalador
COLEGIO MOTORISTA	Inicia el retiro de rebaba de concreto de la viga de cimentación del muro del patio, Inicia el pañete de culatas externas de la Sede Educativa hacia el nuevo patio. Continúa el retiro de material de excavación en el área de trabajo
COLEGIO DILE BOSA	no ha iniciado actividades

8 **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra.
- Se reitera al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, teniendo en cuenta que la excavación se estaba socavando y aún no contaba con una protección hacia el exterior.

9 **SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**

- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue revisado y enviado con observaciones para subsanar
- Se realizó mesa de trabajo con la profesional ambiental del contratista para revisión y ajustes de formatos de trazabilidad RCD.
- Se solicitó al contratista de obra realizar retiro y limpieza de acopios de RCD y materiales aprovechables.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

10 REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				
COLEGIO VILLA RICA:	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**

				
COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:
				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				
COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:

				
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:**	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:**	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:**	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:**
				
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:**	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:**	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:**	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:**
				
COLEGIO EL MOTORISTA:	**COLEGIO EL MOTORISTA:**	**COLEGIO EL MOTORISTA:**	**COLEGIO EL MOTORISTA:**	**COLEGIO EL MOTORISTA:**
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	27	
29/04/2024	5/05/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		DIRECCION		Localidad:	
	BOSANOVA		CALLE 59B SUR # 8-72		BOSA	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	27	Fecha de corte:	domingo, 5 de mayo de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
BOSANOVA	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
VALOR PARCIAL	15-abr-24 28-jun-24	268.819.390,66	100,00%	9,00%	4,09%	4,91%	10.990.863,27
TOTAL		**268.819.390,66**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	28-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24

6. Pendientes

Instalacion de enchapes primer y sogundo piso, instalacion de cubierta patio, suministro e instalacion de ventaneria aulas, construccion de cuarto para camilla

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7,1 Avances instalacion enchape segundo piso y fundicion de cintas confinamiento piso

7,2 Avances antepechos para instalacion nueva ventaneria

7,3 Avances desmonte ventaneria interna existente

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en instalacion de enchape psio y avance dde alistamiento marcos en mamposteria para instalacion de ventaneria

8.2. . Componente ambiental

- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue revisado y enviado con observaciones para subsanar
- Se realizó mesa de trabajo con la profesional ambiental del contratista para revisión y ajustes de formatos de trazabilidad RCD.
- Se solicitó al contratista de obra realizar retiro y limpieza de acopios de RCD y materiales aprovechables.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST

- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra.
- Se reitera al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, teniendo en cuenta que la excavación se estaba socavando y aún no contaba con una protección hacia el exterior.

8.4. .Componente calidad

Se realiza entrega por parte del contratista de plan de inspección y ensayo dando alcance a los NP a incluir en el proyecto, se envían observaciones al respecto las cuales no han sido atendidas

9. Observaciones:

9,1 Se recomienda el suministros de materiales, ventaneria y cubierta para poder poner al dia la programacion acordada con la institucion educativa

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



DESMONETE DE VENTANAS INTERNAS



AVANCE INSTALACION DE ENCHAPE PISO SEGUNDO PISO



ESTADO ACTUAL DE AULAS SIN INTERVENIR



ESTADO ACTUAL DE AULAS SIN INTERVENIR

			
AVANCE INSTALACION DE ENCHAPE PISO SEGUNDO PISO	AVANCE INSTALACION DE ENCHAPE PISO SEGUNDO PISO	AVANCE DESMONTE VENTANERIA INTERNA EXISTENTE	AVANCE DESMONTE VENTANERIA INTERNA EXISTENTE
			
AVANCE INSTALACION DE ENCHAPE PISO SEGUNDO PISO	AVANCE INSTALACION DE ENCHAPE PISO SEGUNDO PISO	AVANCE INSTALACION DE ENCHAPE PISO SEGUNDO PISO	AVANCE INSTALACION DE ENCHAPE PISO SEGUNDO PISO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	27	
29/04/2024	5/05/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C		CARRERA 83- # 46 B SUR		KENNEDY	

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **CONSORCIO SANTA MARIA 022**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 27 | Fecha de corte: domingo, 5 de mayo de 2024

MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	16-mar-24	248.978.481,38	100,00%	100,00%	99,64%	0,36%	$ 248.090.299,93
TOTAL			**248.978.481,38**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	16-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	16-mar-24

6. Pendientes

Pendiente detalles finales y aseo para entrega

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con enchape de piso aula ingles y rack

7.2 el contratista avanza con Pintura de salones

7.3 el contratista avanza con remates finales para entrega

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental

- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue revisado y enviado con observaciones para subsanar
- Se realizó mesa de trabajo con la profesional ambiental del contratista para revisión y ajustes de formatos de trazabilidad RCD.
- Se solicitó al contratista de obra realizar retiro y limpieza de acopios de RCD y materiales aprovechables.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST

- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra.
- Se reitera al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, teniendo en cuenta que la excavación se estaba socavando y aún no contaba con una protección hacia el exterior.

8.4. .Componente calidad

Se realiza entrega por parte del contratista de plan de inspección y ensayo dando alcance a los NP a incluir en el proyecto, se envían observaciones al respecto las cuales no han sido atendidas

9. Observaciones:

9,1 se requiere al contratista dar avance y dar cumplimiento al plan de contingencia para las actividades faltantes. entrega de certificadios de calidad

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



ENCHAPE Y PINTURA AULA DE RACK



AVANCE ENCHAPES DE PISO AULA INGLES



AVANCE ENCHAPES DE PISO AULA INGLES



AVANCE ENCHAPES DE PISO AULA INGLES

			
ESTADO ACTUAL DE ACOPIO DE MATERIALES SOBRANTES, FALTA SEÑALIZACION	PINTURA Y ENCHAPE PISO AULA DE ONGLES	TEMINACION DE PAÑETE E INICIO INSTALACION DE PINTURA AULA RACK	ENCHAPE PISO AULA INGLES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	27
29/04/2024	5/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	27	Fecha de corte:	domingo, 5 de mayo de 2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
FRANCISCO MIRANDA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
VALOR PARCIAL	7-nov-23	14-mar-24	502.792.596,13	100,00%	100,00%	92,06%	7,94%	462.883.636,00
TOTAL			**502.792.596,13**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	14-mar-24	pendiente que el contratista termine actividades de tanque de almacenamiento aquacell o fibra de vidrio y excavacion e instalacion de redes de aguas lluvias, terminar remates de cubierta, ventanas, muros cuhilla frontales y posteriores en superboard, pintura y acabados y remates en cubiertas de aulas de sistemas. Falta suministro e instalacion de espejos en baños y remates de pintura y cubierta baños
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con la excavacion para redes de aguas lluvias en cajas y redes

7.2 el contratista avanza con la funcicion de placa zonas de excavacion aguas lluvias

7.3 el contratista avanza con la instalacion de tuberia aguas lluvias en canalizaciones

7.4 el contratista avanza con la instalación de perfileria para muros superboard aula de sistemas

7.5 el contratista avanza con lla instalacion y cableado de tuberia emet para alimentación luminarias aulas de sistemas

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en reuniones con OTIC para la reinstalacion de redes voz y datos y puntos electricos.

8.2. . Componente ambiental
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue revisado y enviado con observaciones para subsanar
- Se realizó mesa de trabajo con la profesional ambiental del contratista para revisión y ajustes de formatos de trazabilidad RCD.
- Se solicitó al contratista de obra realizar retiro y limpieza de acopios de RCD y materiales aprovechables.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles.
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra.
- Se reitera al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, teniendo en cuenta que la excavación se estaba socavando y aún no contaba con una protección hacia el exterior.

8.4. .Componente calidad
Se realiza entrega por parte del contratista de plan de inspección y ensayo dando alcance a los NP a incluir en el proyecto, se envían observaciones al respecto las cuales no han sido atendidas

9. Observaciones:

9,1 Pendiente que el contratista realice remates de acabado en bateria sanitaria, aula de sistemas, redes aguas lluvias, definicion de NP tanque Aquacell o fibra de vidrio de acuerdo a la reunion sostenida el dia viernes 3 de mayo con profesionales hidrulicos de contratista e interventoria . Se recibe informe de OTIC, donde se le solicita al contratista presetntar cotizacion de lo requerido para reestablecer el servicio.
9,2, SE SOLICITA A CONTRATISTA INTERVENCION URGENTE DE AULAS DE SISTEMAS Y REMATES FALTANTES EN CUBIERTAS SALONES TERCER PISO

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INSTALACION DE PERFILERIA MUROS SUPERBOARD AULAS DE SISTEMAS	INSTALACION DE PERFILERIA MUROS SUPERBOARD AULAS DE SISTEMAS	AVANCES EN TUBERIA ELECTRICA AULAS DE SISTEMAS	AVANCES EN TUBERIA ELECTRICA AULAS DE SISTEMAS
			
AVANCE DE OBRA CAJAS DE INSPECCION REDES AGUAS LLUVIAS	EXCAVACION DE TANQUE DE RECOLECCION AGUAS LLUVIAS EN STOP POR DEFINCION	ESTADO ACTUAL AULAS DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE VOZ Y DATOS	ESTADO ACTUAL CUBIERTA AULA DE SISTEMAS
			
AVANCE DE OBRA REDES AGUAS LLUVIAS	AVANCE DE OBRA REDES AGUAS LLUVIAS	ESTADO ACTUAL EXCAVACION PARA EL TANQUE	ESTADO ACTUAL EXCAVACION PARA EL TANQUE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	27
29/04/2024	5/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C	CALLE 38 SUR BIS # 89-81	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	27	Fecha de corte:	domingo, 5 de mayo de 2024	
		Ppto.		% Ejecución Acumulado	

RODRIGO DE TRIANA SEDE C	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	14-nov-23	29-abr-24	252.065.850,69	100,00%	100,00%	83,57%	16,43%	210.643.977,18
TOTAL			**252.065.850,69**	**100,00%**	**-**		**16,43%**	**$0,00**

5.	Estado de la Programación		6. Pendientes
	Fecha de Terminación:	29-abr-24	Instalacion de la reja de ventanas, finalizar limpieza y destrinque de baldosa terrazo primer piso, terminar cielo raso aulas primer piso, terminacion de pintura e instalacion en granito boca puertas, instalacion de luminarias, tomacorrientes e interruptores
	Adelanto/Atraso (Días):		
	Fecha Proyectada de Terminación:	29-abr-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 Se avanza con destroncado y pulido de piso

7.2 se avanza con la instalacion de estructura de cielo raso en una aula del primer nivel

7.3 se avanza con suministro e instalacion de enchape de piso en granito en 3 aulas del segundo nivel y primer nivel

7.5 Se adelantan instalacion de pintura en aulas de primer piso

7.6 Se adelantan actividades de destroncado y pulido de piso aulas primer y segundo piso

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental

- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue revisado y enviado con observaciones para subsanar
- Se realizó mesa de trabajo con la profesional ambiental del contratista para revisión y ajustes de formatos de trazabilidad RCD.
- Se solicitó al contratista de obra realizar retiro y limpieza de acopios de RCD y materiales aprovechables.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST

- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles.
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra.
- Se reitera al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, teniendo en cuenta que la excavación se estaba socavando y aún no contaba con una protección hacia el exterior.

8.4. .Componente calidad

Se realiza entrega por parte del contratista de plan de inspección y ensayo dando alcance a los NP a incluir en el proyecto, se envían observaciones al respecto las cuales no han sido atendidas

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista termine las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio, que coordine con el rector de la institucion el inicio de las obras de los pisos en las aulas, que el contratista suministre e instale las laminas microperforadas en el cerramiento exterior.
9.2 Se le recomienda al contratista mejorar la densidad de la pintura de muros aplicada, ya que se evidencia la dosificacion de agua muy alta lo que no permite una correcta aplicacion. NO SE ALCANZAN A TERMINAR LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
BOQUILLA ENCHAPE PISO AULAS PRIMER PISO	INICIO DE INSTALACION DE PINTURA AULAS PRIMER NIVEL	INICIO DE INSTALACION DE PINTURA AULAS PRIMER NIVEL	INICIO DE INSTALACION DE PINTURA AULAS PRIMER NIVEL
			
INSTALACION ESTRUCTURA CIELO RASO AULAS PRIMER NIVEL	ENCHAPE DE PISO AULAS PRIMER PISO	AREAS DE ACOPIO DE MATERIAALES	ENCHAPE DE PISO AULAS PRIMER PISO
			
ENCHAPE DE PISO AULAS PRIMER PISO	LIMPIEZA DE PULIDO DE PISO AULAS SEGUNDO PISO	LIMPIEZA DE PULIDO DE PISO AULAS SEGUNDO PISO	PULIDO DE PISO AULAS SEGUNDO PISO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	27	
29/04/2024	5/05/2024	

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	VILLA RICA SEDE B	CALLE 49 SUR # 78-35	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **CONSORCIO SANTA MARIA 022**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	27	Fecha de corte:	domingo, 5 de mayo de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	15-mar-24	212.048.177,90	100,00%	100,00%	96,25%	3,75%	204.103.945,88
TOTAL			**212.048.177,90**	**100,00%**	**-**		**3,75%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine las obras instalacion piso caucho en patio de preescolar, y conexión definitiva a tablero electrico alimentacion shut de basuras, pendiente instalacion de canales cubierta shut de basuras, pendiente rampa y plataforema de acceso shut de basuras

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 Se avanza con remates de pintura shut de basuras

7.2 Se realiza la instalación de canal cubierta patio preescolar

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental

- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue revisado y enviado con observaciones para subsanar
- Se realizó mesa de trabajo con la profesional ambiental del contratista para revisión y ajustes de formatos de trazabilidad RCD.
- Se solicitó al contratista de obra realizar retiro y limpieza de acopios de RCD y materiales aprovechables.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST

- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles.
- Se revisa y se aprueba documentación para nuevo personal de obra.
- Se reitera al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, teniendo en cuenta que la excavación se estaba socavando y aún no contaba con una protección hacia el exterior.

8.4. .Componente calidad

Se realiza entrega por parte del contratista de plan de inspección y ensayo dando alcance a los NP a incluir en el proyecto, se envían observaciones al respecto las cuales no han sido atendidas

9. Observaciones:

9,1 que el contratista ingrese personal y material de obra, que avance con las obras del patio de preescolar, shut de basuras rampa y plataforma, ya que no se ha podido entregar ninguna zona pendiente

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INSTALACIÓN DE CANAL PATIO PREESCOLAR	INSTALACIÓN DE CANAL PATIO PREESCOLAR	INSTALACIÓN DE CANAL PATIO PREESCOLAR	INSTALACIÓN DE CANAL PATIO PREESCOLAR
			
TERMINACION REMATES SHUT DE BASURAS	TERMINACION REMATES SHUT DE BASURAS	TERMINACION REMATES SHUT DE BASURAS	TERMINACION REMATES SHUT DE BASURAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	27
29/04/2024	5/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 27 — Fecha de corte: 5/05/2024

CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.544.151.602,35	100,00%	96,04%	60,00%	-36,04%	926.490.961,41
TOTAL			**1.544.151.602,35**	**100,00%**	**-**		**-36,04%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Se funden y desencofran las alfajías de las ventanas del No. 3, 4 y 5 del Bloque A.

7.2. Continúa la instalación de la estructura métalica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.

7.3. Continúa la excavación de zanjas para las vigas de cimentación del cerramiento posterior en mampostería.

7.4. Se funden los pedestales de cimentación en mampostería.

7.5. Se corta un lineal de cerámica de muro a la entrada del baño de preescolar para el marco de la puerta.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST
- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.Durante la semana pasada no registra avance de obra, dado que las actividades realizadas fueron resanes y subsanación de observaciones formuladas a la calidad de la obra

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



SIGUE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A



CONTINÚA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A



SIGUE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A



SE DESENCOFRAN LAS ALFAJÍAS DE LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE A



SE DESENCOFRAN LAS ALFAJÍAS DE LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE A

			
SE FUNDEN PEDESTALES PARA LA CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR	SE FUNDEN PEDESTALES PARA LA CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR	SE FUNDEN PEDESTALES PARA LA CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR	SE FUNDEN PEDESTALES PARA LA CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR
			
SE FUNDEN PEDESTALES PARA LA CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR	SE FUNDEN PEDESTALES PARA LA CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR	SE FUNDEN PEDESTALES PARA LA CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR	SE FUNDEN PEDESTALES PARA LA CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR
			
AJUSTE DE ENCHAPE PARA DAR CAMPO AL MARCO DE LA PUERTA DEL BAÑO DE PREESCOLAR	AJUSTE DE ENCHAPE PARA DAR CAMPO AL MARCO DE LA PUERTA DEL BAÑO DE PREESCOLAR	AJUSTE DE ENCHAPE PARA DAR CAMPO AL MARCO DE LA PUERTA DEL BAÑO DE PREESCOLAR	AJUSTE DE ENCHAPE PARA DAR CAMPO AL MARCO DE LA PUERTA DEL BAÑO DE PREESCOLAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	27
29/04/2024	5/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

			Semana No.	27	Fecha de corte:	5/05/2024		
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	**Fecha inicio**	**Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	6-ene-23	133.128.173,40	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	133.128.173,40
TOTAL			**133.128.173,40**	**100,00%**	**-**		**0,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	6-ene-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24

6. Pendientes

* Queda pendiente la aprobación del NP para la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. No se desarrollan actividades de obra esta semana

7.2. Queda pendiente la aprobación por parte de la SED de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente


8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra

9. Observaciones:

9.1. Queda pendiente la aprobación del NP para la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

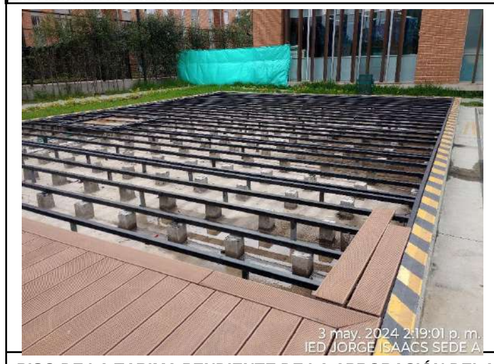

PISO DE LA TARIMA PENDIENTE DE LA APROBACIÓN DEL NP PARA PODER SER INSTALADO



PISO DE LA TARIMA PENDIENTE DE LA APROBACIÓN DEL NP PARA PODER SER INSTALADO



PISO DE LA TARIMA PENDIENTE DE LA APROBACIÓN DEL NP PARA PODER SER INSTALADO



PISO DE LA TARIMA PENDIENTE DE LA APROBACIÓN DEL NP PARA PODER SER INSTALADO



LA IED REINSTALA EL CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE



LA IED REINSTALA EL CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE



LA IED REINSTALA EL CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE



LA IED REINSTALA EL CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	27
29/04/2024	5/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JOSÉ ANTONIO GALÁN	CARRERA 78 J No. 58 M - 22 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 27 — Fecha de corte: 5/05/2024

JOSÉ ANTONIO GALÁN	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	11-abr-24	29-jun-24	$ 543.111.193,70	100,00%	19,00%	3,06%	-15,94%	16.619.202,53
TOTAL			**543.111.193,70**	**100,00%**	**-**		**-15,94%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	28-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista dinamizar el proceso de obra, para cerrar la brecha de atraso evidenciada con el avance programado.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Finaliza el desmonte de láminas de cielos rasos en las aulas del segundo piso del Bloque A.

7.2. Finaliza el desmonte de puertas y ventanas en las aulas del segundo piso del Bloque A.

7.3. Finaliza el desmonte de lámparas en las aulas del segundo piso del Bloque A.

7.4. Continúa la remoción de pintura de muros en las aulas del segundo piso del Bloque A.

7.5. Encofrado y fundida de alfajías en las ventanas de las aulas del segundo piso del Bloque A.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.Inician las actividades de obra con los desmontes de lámparas, cielos rasos y carpintería metálica.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE



CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE



CERRAMIENTO PROVISIONAL CON POLISOMBRA VERDE



DEMARCACIÓN DE CIRCULACIÓN SEGURA



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS

			
REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS	**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS**	**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS**	**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS**
			
REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS	**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS**	**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS**	**REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS**
			
ENCOFRADO Y FUNDIDA DE ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS	**ENCOFRADO Y FUNDIDA DE ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS**	**ENCOFRADO Y FUNDIDA DE ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS**	**ENCOFRADO Y FUNDIDA DE ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	27
29/04/2024	5/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	RURAL LA CONCEPCIÓN	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	27	Fecha de corte:	5/05/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RURAL LA CONCEPCIÓN	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	18-mar-24	29-jun-24	$ 253.510.561,00	100,00%	17,00%	7,00%	-10,00%	17.745.739,27
TOTAL			**253.510.561,00**	**100,00%**	**-**		**-10,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

No se evidencia personal de obra ni ejecución de actividades durante la semana.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Se instalan 11,55 m de tubería EMT, 6 codos conduit de 1/2", y 6 cajas eléctricas

7.2. No se desarrollan actividades de obra civil

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. Se debe

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>SE EVIDENCIA ALTA HUMEDAD Y FILTRACIONES EN EL MURO POSTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA</td>
<td>SE EVIDENCIA ALTA HUMEDAD Y FILTRACIONES EN EL MURO POSTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA</td>
<td>SE EVIDENCIA ALTA HUMEDAD Y FILTRACIONES EN EL MURO POSTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA</td>
<td>SE EVIDENCIA ALTA HUMEDAD Y FILTRACIONES EN EL MURO POSTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>SE EVIDENCIA ALTA HUMEDAD Y FILTRACIONES EN LA PARTE BAJA DEL MURO DE LA LUDOTECA</td>
<td>SE EVIDENCIA ALTA HUMEDAD Y FILTRACIONES EN LA PARTE BAJA DEL MURO DE LA LUDOTECA</td>
<td>SE EVIDENCIA ALTA HUMEDAD Y FILTRACIONES EN LA PARTE BAJA DEL MURO DE LA LUDOTECA</td>
<td>SE EVIDENCIA ALTA HUMEDAD Y FILTRACIONES EN LA PARTE BAJA DEL MURO DE LA LUDOTECA</td>
</tr>
</table>

			
PENDIENTE EL REMATE DE LA INSTALACIÓN DE LÁMINAS EN FIBROCEMENTO	PENDIENTE EL REMATE DE LA INSTALACIÓN DE LÁMINAS EN FIBROCEMENTO	PENDIENTE EL REMATE DE LA INSTALACIÓN DE LÁMINAS EN FIBROCEMENTO	PENDIENTE EL REMATE DE LA INSTALACIÓN DE LÁMINAS EN FIBROCEMENTO
			
INICIA LA INSTALACIÓN DE REDE ELÉCTRICA	INICIA LA INSTALACIÓN DE REDE ELÉCTRICA	INICIA LA INSTALACIÓN DE REDE ELÉCTRICA	INICIA LA INSTALACIÓN DE REDE ELÉCTRICA
			
INSTALACIÓN DE CAJA ELÉCTRICA SOBRE LA LÁMINA DE FIBROCEMENTO	TRASPASARON LA LÁMINA DE FIBROCEMENTO	INSTALACIÓN DE CAJA ELÉCTRICA SOBRE LA LÁMINA DE FIBROCEMENTO	TRASPASARON LA LÁMINA DE FIBROCEMENTO
			
INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS SOBRE LA LÁMINA DE FIBROCEMENTO	TRASPASARON LA LÁMINA DE FIBROCEMENTO	INSTALACIÓN DE ABRAZADERAS SOBRE LA LÁMINA DE FIBROCEMENTO	TRASPASARON LA LÁMINA DE FIBROCEMENTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	27
29/04/2024	5/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	EL MOTORISTA	CALLE 57 N BIS SUR No. 75 F - 27	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 27 — Fecha de corte: 5/05/2024

EL MOTORISTA	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	15-abr-24	29-jun-24	$ 246.835.890,70	100,00%	13,21%	8,02%	-5,19%	19.796.238,43
TOTAL			**246.835.890,70**	**100,00%**	**-**		**-5,19%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

* Queda pendiente el diseño del detalle constructivo de la placa de contrapiso, por parte de la Entidad Contratante.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Inicia el retiro de rebaba de concreto de la viga de cimentación del muro del patio

7.2. Inicia el pañete de culatas externas de la Sede Educativa hacia el nuevo patio.

7.3. Continúa el retiro de material de excavación en el área de trabajo

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1. Para el presente informe semanal, El Contratista presentó una programación ajustada que permite identificar con certeza el porcentaje real de avance ejecutado. De igual manera, presenta un presupuesto que incorpora el conjunto de actividades solicitadas por la Supervisión del Contrato, incluyendo las especificaciones de la placa de contrapiso del nuevo patio. Queda pendiente por parte de la SED, el diseño del detalle de esta placa.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA CON POLISOMBRA VERDE



INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA CON POLISOMBRA VERDE



INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA CON POLISOMBRA VERDE



INSTALACIÓN DEL CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA CON POLISOMBRA VERDE



CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA



CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA



CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA



CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA

			
CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA	**CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA**
			
PENDIENTE DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE UNA VIVIENDA QUE SE DEMOLIÓ ANTES	**PENDIENTE DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE UNA VIVIENDA QUE SE DEMOLIÓ ANTES**	**INICIA EL RETIRO DE LA REBABA DE CONCRETO DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL MURO DEL PATIO**	**INICIA EL RETIRO DE LA REBABA DE CONCRETO DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL MURO DEL PATIO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	27
29/04/2024	5/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 27 — Fecha de corte: 5/05/2024

SAN BERNARDINO	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.000.000,00	100,00%	100,00%	87,20%	-12,80%	784.800.000,00
TOTAL			**900.000.000,00**	**100,00%**	**-**		**-12,80%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista finalice la obra en la cubierta de Auditorio y del área de Orientación y que presente una programación actualizada que incluya todas las actividades pendientes por ejecutar.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. No se ejecutan actividades de obra durante la presente semana

7.2. Se verifican medidas de espejos por parte del instalador

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. Se realiza un ajuste al balance de esta Sede Educativa, depurando las actividades que no se van a ejecutar e incorporando las actividades requeridas por la supervisión del contrato durante el recorrido conjunto del 27 de febrero de 2024 y se proyecta un presupuesto estimado en $ 900.000.000

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



LA IED RECOGIÓ EL CERRAMIENTO PARA PODER UTILIZAR EL PATIO CENTRAL



LA IED RECOGIÓ EL CERRAMIENTO PARA PODER UTILIZAR EL PATIO CENTRAL



PENDIENTE LA PINTURA DEL PISO DEL PATIO DE PREESCOLAR



PENDIENTE LA PINTURA DEL PISO DEL PATIO DE PREESCOLAR



PENDIENTE LA PINTURA DE LA PUERTA DE ACCESO POSTERIOR



PENDIENTE LA PINTURA DE LA PUERTA DE ACCESO POSTERIOR



PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LA ESCALERA DE ACCESO A LOS TANQUES DE RESERVA



PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LA ESCALERA DE ACCESO A LOS TANQUES DE RESERVA

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-81795

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	14/05/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL DELGADO
Documento	79573492
Teléfono	
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	

OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-315 - Remision informe semanal No. 28, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-315 - Remision informe semanal No. 28
No. Folios	0
Anexos	
Documentos Adjuntos	

E-2024-81795_1.pdf

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-315

Bogotá D.C., 14 de mayo de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 28

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 28, correspondiente al periodo comprendido entre el 06 de mayo al 12 de mayo de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (39) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

		28	Interventor:	CONSORCIO SANTA MARIA	
6/04/2024	al	12/04/2024		022	

1. Datos Generales

Nombre:

NOMBRE
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
COLEGIO VILLA RICA
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN
COLEGIO JORGE ISAAC
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN
COLEGIO BOSANOVA
COLEGIO SAN
COLEGIO MOTORISTA
COLEGIO DILE BOSA
EMERGENCIAS

Localidad:

LOCALIDAD
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA-KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto:

Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto:

INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista:			**CONSORCIO SANTA MARIA 022**							
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.		
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A		
				Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**	
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00							
Adición:			$ -							
Anticipo:			$ -							
Retegarantía:			$ -							
			Neto Acta							
			Acumulado							

4.	**Programación.**			Semana No.	**28**	Fecha de corte:	12-abr-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			
N°	**Capítulos:**	**LOCALIDAD**	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**% Inversión**
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	16-mar-24	$ 248.978.481,38	**3,93%**	100,00%	99,64%	-0,36%	$ 248.090.300
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 145.401.475,07	**2,30%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 145.401.475
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	29-abr-24	$ 252.065.850,69	**3,98%**	100,00%	93,42%	-6,58%	$ 235.481.124
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 212.048.177,90	**3,35%**	100,00%	98,77%	-1,23%	$ 209.443.609
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 502.792.596,13	**7,94%**	100,00%	94,67%	-5,33%	$ 475.975.258
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 279.166.969,08	**4,41%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 279.166.969
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.544.151.602,35	**24,39%**	96,04%	60,23%	-35,81%	$ 930.042.510
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 133.128.173,40	**2,10%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 133.128.173
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	11-mar-24	29-jun-24	$ 253.510.561,00	**4,00%**	24,00%	9,95%	-14,05%	$ 25.224.301
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 543.111.193,70	**8,58%**	26,00%	8,64%	-17,36%	$ 46.924.807
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	15-abr-24	29-jun-24	$ 268.819.390,66	**4,25%**	11,00%	10,89%	-0,11%	$ 29.281.564
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.527.799,60	**14,22%**	100,00%	87,20%	-12,80%	$ 785.260.241
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 246.835.890,70	**3,90%**	17,43%	12,13%	-5,30%	$ 29.941.194
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 293.809.176,39	**4,64%**	8,00%	0,46%	-7,54%	$ 1.356.621

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	**6,43%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 5.824.347.338**	**92,00%**	**70,37%**	**56,47%**	-	**$ 3.574.718.146**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**

-13,91%	**DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

que el contratiste finalice toos los frentes de obra que a la fecha ya llegaron a su finalizacion según programacion como francisco miranda, manuel cepeda sede C, villa rica, Rodrigo de Triana, igualmente avanzar en los frentes de bosanova, iniciar DILE.

6	PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
	6.330.813.879,00									**6.330.813.879,00**
	29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista finaliza la ejecucion de cuarto de ingles y cuarto de rack (pendiente humedad en cuarto de rack)
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	Se avanza con destroncado y pulido de piso primer nivel para acabado final, con la instalacion de paneles drywall de cielo raso en una aula del primer nivel, instalacion de pintura en aulas de primer piso, Se realiza la instalacion de las rejas en ventaneria
COLEGIO VILLA RICA	Se avanza con remates de pintura shut de basuras y plataforma para acceso, Se instalan las bajantes de las canales de cubierta patio preescolar
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	el contratista NO AVANZA con las actividades de aguas lluvia ya que se esta a la espera la definicion de tanque. avanza con la instalacion de espejos en baños, avanza con la instalacion de dinteles en superboard en aulas de sistemas, llega venateneria pero no las ha instalado, avanza con la instalación de salidas electricas para luminarias aulas de sistemas.
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	se finalizan las obras
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Continúa la instalación de la estructura métalica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Se arman los aceros de refuerzo para las vigas de cimentación del cerramiento posterior en mampostería. Se realiza el encofrado para las vigas de cimentación del cerramiento posterior en mampostería. Inicia la instalación de las puertas de los baños en el Bloque A.
COLEGIO JORGE ISAAC	No se desarrollan actividades de obra esta semana, Sigue pendiente la aprobación por parte de la SED de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima, Se evidencian algunos puntos críticos donde se despegó la soldadura en los pasamanos de las escaleras.

COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	Se desmonta la canaleta eléctrica en la parte baja del muro oriental de la ludoteca, Se realiza socialización con la comunidad de las obras de fachada del proyecto, No se desarrollan actividades de obra civil.
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	Continúa la remoción de pintura de muros en las aulas del segundo piso del Bloque A. Continúa la ejecución de filos en vanos de puertas y ventanas del segundo piso del Bloque A. Continúa el repañetado de muros del segundo piso del Bloque A. Inicia el desmonte de cubiertas en las aulas del segundo piso del Bloque A.
COLEGIO BOSANOVA	Avances instalacion enchape segundo piso y fundicion de cintas confinamiento piso, Avances antepechos para instalacion nueva ventaneria, Avances desmonte ventaneria interna existente.
COLEGIO SAN BERNARDINO	No se ejecutan actividades de obra durante la presente semana, No se instalan los espejos en los baños del segundo y del tercer piso.
COLEGIO MOTORISTA	Continúa el pañete de culatas externas de la Sede Educativa hacia el nuevo patio. Continúa el retiro de material de excavación en el área de trabajo. Se tiende una capa de recebo común como sello para el piso del nuevo patio.
COLEGIO DILE BOSA	El contratista avanza con el desmonte del cielo raso existente

8 **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se recibe el informe SST N°6, el cual fue revisado y observado por esta interventoría.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.


9 **SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**

- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue aprobado y radicado.
- El informe N°6 de interventoría fue radicado en la ventanilla virtual de SED.
- Se recibió por parte del contratista los formatos de trazabilidad RCD ajustados, estos están en verificación de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

10 **REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				

COLEGIO VILLA RICA:	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**	**COLEGIO VILLA RICA:**
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:**
				
COLEGIO BOSANOVA:	**COLEGIO BOSANOVA:**	**COLEGIO BOSANOVA:**	**COLEGIO BOSANOVA:**	**COLEGIO BOSANOVA:**
				
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:**	**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:**	**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:**	**COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:**
				

COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				
COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:
				
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:
				

COLEGIO EL MOTORISTA:	COLEGIO EL MOTORISTA:	COLEGIO EL MOTORISTA:	COLEGIO EL MOTORISTA:	COLEGIO EL MOTORISTA:
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	28
6/04/2024	12/04/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	BOSANOVA	CALLE 59B SUR # 8-72	BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	28	Fecha de corte:	viernes, 12 de abril de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
BOSANOVA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
VALOR PARCIAL	15-abr-24	28-jun-24	230.327.579,78	100,00%	11,00%	10,89%	0,11%	25.088.784,82
TOTAL			**230.327.579,78**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	28-jun-24	
Adelanto/Atraso (Días):		Instalacion de enchapes primer y sogundo piso, instalacion de cubierta patio, suministro e instalacion de ventaneria aulas, construccion de cuarto para camilla
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7,1 Avances instalacion enchape segundo piso y fundicion de cintas confinamiento piso

7,2 Avances antepechos para instalacion nueva ventaneria

7,3 Avances desmonte ventaneria interna existente

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en instalacion de enchape psio y avance dde alistamiento marcos en mamposteria para instalacion de ventaneria

8.2. . Componente ambiental
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue aprobado y radicado.
- El informe N°6 de interventoría fue radicado en la ventanilla virtual de SED.
- Se recibió por parte del contratista los formatos de trazabilidad RCD ajustados, estos están en verificación de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°6, el cual fue revisado y observado por esta interventoría.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad
- Se realiza revisión al PIE presentado por el contratista, evidenciando que no se atienden las observaciones emitidas, se reiteran por medio de oficio
- Se revisa inf 5 presentado por el contratista, sin que se atiendan la totalidad de las observaciones
- Se envía oficio reiterando la entrega del listado semanal de materiales
- Se realiza oficio solicitando caracterización de b-200 ingresado a obra el cual no cuenta con caracterización ni aprobación por interventoria, reiterando reporte de materiales

9. Observaciones:

9,1 Se recomienda el suministros de materiales, ventaneria y cubierta para poder poner al dia la programacion acordada con la institucion educativa

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



DESMONETE DE VENTANAS INTERNAS



AVANCE INSTALACION DE ENCHAPE PISO SEGUNDO PISO



AVANCES VENTANERIA EN ALUMINIO



PULIDO DE PISO EXISTENTE SALONES

			
PULIDO DE PISO EXISTENTE SALONES	PULIDO DE PISO EXISTENTE SALONES	DEMOLICION ENCHAPE ESCALERAS	AVANCE FABRICACION DE VENTANERIA
			
DEMOLICION PISO ESCALERAS	DEMOLICION PISO ESCALERAS	FABRICACION DE VENTANERIA	LIMPIEZA PISO EXISTENTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	28
6/05/2024	12/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **CONSORCIO SANTA MARIA 022**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 28 — Fecha de corte: 12/05/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.544.151.602,35	100,00%	97,02%	60,23%	-36,79%	930.042.510,10
TOTAL			**1.544.151.602,35**	**100,00%**	**-**		**-36,79%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Continúa la instalación de la estructura métalica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.

7.2. Se arman los aceros de refuerzo para las vigas de cimentación del cerramiento posterior en mampostería.

7.3. Se realiza el encofrado para las vigas de cimentación del cerramiento posterior en mampostería.

7.4. Inicia la instalación de las puertas de los baños en el Bloque A.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.Durante la semana pasada no registra avance de obra, dado que las actividades realizadas fueron resanes y subsanación de observaciones formuladas a la calidad de la obra

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>SIGUE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A</td>
<td>CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A</td>
<td>CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A</td>
<td>CONTINÚA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>SIGUE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A</td>
<td>CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A</td>
<td>SE DESENCOFRAN LAS ALFAJÍAS DE LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE A</td>
<td>SE DESENCOFRAN LAS ALFAJÍAS DE LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE A</td>
</tr>
</table>

			
ENCOFRADO PARA LA CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR	**ENCOFRADO PARA LA CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR**	**ENCOFRADO PARA LA CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR**	**ENCOFRADO PARA LA CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

		INTERVENTORIA
		CONSORCIO SANTA MARIA 022
6/04/2024	12/04/2024	

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	DILE BOSA	CALLE 61 SUR # 80H-28	BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	28	Fecha de corte:	viernes, 12 de abril de 2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
DILE BOSA	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
VALOR PARCIAL	6-may-24	28-jun-24	293.809.176,39	100,00%	8,00%	0,46%	7,54%	1.356.620,95
TOTAL			**293.809.176,39**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	28-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24

6. Pendientes

Terminacion desmonte de cilo raso, reforzamiento estructura y cambio de cubierta fase 1 y fase 2

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7,1 El contratista avanza con el desmonte del cielo raso existente

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue aprobado y radicado.
- El informe N°6 de interventoría fue radicado en la ventanilla virtual de SED.
- Se recibió por parte del contratista los formatos de trazabilidad RCD ajustados, estos están en verificación de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°6, el cual fue revisado y observado por esta interventoría.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad
- Se realiza revisión al PIE presentado por el contratista, evidenciando que no se atienden las observaciones emitidas, se reiteran por medio de oficio
- Se revisa inf 5 presentado por el contratista, sin que se atiendan la totalidad de las observaciones
- Se envía oficio reiterando la entrega del listado semanal de materiales
- Se realiza oficio solicitando caracterización de b-200 ingresado a obra el cual no cuenta con caracterización ni aprobación por interventoria, reiterando reporte de materiales

9. Observaciones:

El contratista hace cambio de personal, se considera un atraso bastante y por parte de la direccion local de Bosa y de la SED en conjunto de la interventoria, se le manifiesta al contratista ponere al dia en programacion y ejecutar las actividades lo antes posible. Se realiza acta con personal del Dile con los compromisos de acta de vecindad y avance de actividades proxima semana.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



DESMONTE DE CIELO RASO



DESMONTE DE CIELO RASO



PROTECCION DE ACCESOS FASE 1



DESMONTE DE CIELO RASO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	28	
6/04/2024	12/04/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **CONSORCIO SANTA MARIA 022**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	28	Fecha de corte:	viernes, 12 de abril de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
FRANCISCO MIRANDA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
VALOR PARCIAL	7-nov-23	14-mar-24	502.792.596,13	100,00%	100,00%	94,67%	5,33%	475.975.257,72
TOTAL			**502.792.596,13**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine actividades de tanque de almacenamiento aquacell o fibra de vidrio y excavacion e instalacion de redes de aguas lluvias, terminar remates de cubierta, ventanas, muros cuhilla frontales y posteriores en superboard, pintura y acabados y remates en cubiertas de aulas de sistemas. Falta remates de pintura y cubierta baños

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista NO AVANZA con las actividades de aguas lluvia ya que se esta a la espera la definicion de tanque.

7.2 el contratista avanza con la instalacion de espejos en baños

7.3 el contratista avanza con la instalacion de dinteles en superboard en aulas de sistemas, llega venateneria pero no las ha instalado

7.4 el contratista avanza con la instalación de salidas electricas para luminarias aulas de sistemas

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue aprobado y radicado.
- El informe N°6 de interventoría fue radicado en la ventanilla virtual de SED.
- Se recibió por parte del contratista los formatos de trazabilidad RCD ajustados, estos están en verificación de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
.- Se recibe el informe SST N°6, el cual fue revisado y observado por esta interventoría.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza revisión al PIE presentado por el contratista, evidenciando que no se atienden las observaciones emitidas, se reiteran por medio de oficio
•Se revisa inf 5 presentado por el contratista, sin que se atiendan la totalidad de las observaciones
•Se envía oficio reiterando la entrega del listado semanal de materiales
•Se realiza oficio solicitando caracterización de b-200 ingresado a obra el cual no cuenta con caracterización ni aprobación por interventoria, reiterando reporte de materiales

9. Observaciones:

9,1 Pendiente que el contratista realice remates de acabado en bateria sanitaria, aula de sistemas, redes aguas lluvias, definicion de NP tanque Aquacell o fibra de vidrio de acuerdo a la reunion sostenida el dia viernes 3 de mayo con profesionales hidrulicos de contratista e interventoria . Se recibe informe de OTIC, donde se le solicita al contratista presentar cotizacion de lo requerido para reestablecer el servicio.
9,2, SE SOLICITA A CONTRATISTA INTERVENCION URGENTE DE AULAS DE SISTEMAS Y REMATES FALTANTES EN CUBIERTAS SALONES TERCER PISO

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



DINTELES SUPERBOARD AULAS DE SISTEMAS



DINTELES SUPERBOARD AULAS DE SISTEMAS



DINTELES SUPERBOARD AULAS DE SISTEMAS



DINTELES SUPERBOARD AULAS DE SISTEMAS

			
ESTADO ACTUAL EXCAVACION TANUQE AQUACELL	ESTADO ACTUAL EXCAVACION TANUQE AQUACELL	INSTALACION DE ESPEJOS BATERIA DE BAÑOS	INSTALACION DE ESPEJOS BATERIA DE BAÑOS
			
SUMINISTRO VENTANERIA AULAS DE SISTEMAS	DINTELES AULA DE SISTEMAS CON AISLANTE	INCIO ENTIBADO SOCAVACION EXCAVACION	DINTELES AULA DE SISTEMAS CON AISLANTE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	28
6/05/2024	12/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	28	Fecha de corte:	12/05/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	6-ene-23	133.128.173,40	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	133.128.173,40
TOTAL			**133.128.173,40**	**100,00%**	**-**		**0,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	6-ene-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24

6. Pendientes

* Queda pendiente la aprobación del NP para la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. No se desarrollan actividades de obra esta semana

7.2. Sigue pendiente la aprobación por parte de la SED de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima

7.3. Se evidencian algunos puntos críticos donde se despegó la soldadura en los pasamanos de las escaleras

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra

9. Observaciones:

9.1. Queda pendiente la aprobación del NP para la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1. INICIO



DETALLE DE SOPORTE DAÑADO EN EL PASAMANOS DE LA ESCALERA No.1



PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 1. LLEGADA




PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2. INICIO



PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 2. LLEGADA



PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA

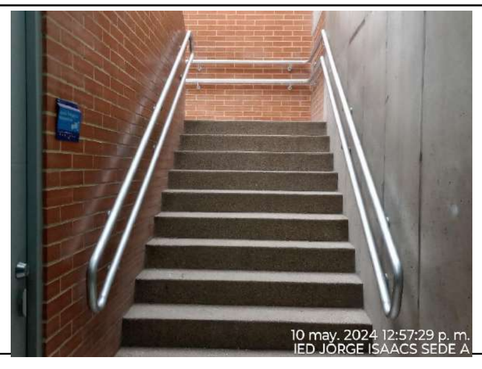

PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3. INICIO



PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 3. LLEGADA

			
PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA	**PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4. INICIO**	**PASAMANOS DE LA ESCALERA No. 4. LLEGADA**	**PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	28
6/05/2024	12/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JOSÉ ANTONIO GALÁN	CARRERA 78 J No. 58 M - 22 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. **No. CO1.PCCNTR.5305583**

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. **No. CO1.PCCNTR.5313251**

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: **CONSORCIO SANTA MARIA 022**

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	28	Fecha de corte:	12/05/2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JOSÉ ANTONIO GALÁN	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	11-abr-24 / 29-jun-24	$ 543.111.193,70	100,00%	26,00%	8,64%	-17,36%	46.924.807,14
TOTAL		**543.111.193,70**	**100,00%**	**-**		**-17,36%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	28-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista dinamizar el proceso de obra, para cerrar la brecha de atraso evidenciada con el avance programado.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Continúa la remoción de pintura de muros en las aulas del segundo piso del Bloque A.

7.2. Continúa la ejecución de filos en vanos de puertas y ventanas del segundo piso del Bloque A.

7.3. Continúa el repañetado de muros del segundo piso del Bloque A.

7.4. Inicia el desmonte de cubiertas en las aulas del segundo piso del Bloque A.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.Inician las actividades de obra con los desmontes de lámparas, cielos rasos y carpintería metálica.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS

			
REPAÑETADO DE MUROS	**REPAÑETADO DE MUROS**	**REPAÑETADO DE MUROS**	**REPAÑETADO DE MUROS**
			
EJECUCIÓN DE FILOS DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS	**EJECUCIÓN DE FILOS DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS**	**EJECUCIÓN DE FILOS DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS**	**EJECUCIÓN DE FILOS DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS**
			
ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA	**ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA**	**APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO BLANCO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA**	**ANTICORROSIVO BLANCO PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	28
6/05/2024	12/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	RURAL LA CONCEPCIÓN	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A

			Suspensión (días)					
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 28 | Fecha de corte: 12/05/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RURAL LA CONCEPCIÓN	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	18-mar-24	29-jun-24	$ 253.510.561,00	100,00%	24,00%	9,95%	-14,05%	25.224.300,82
TOTAL			**253.510.561,00**	**100,00%**	**-**		**-14,05%**	**$0,00**

5.	Estado de la Programación		6. Pendientes
	Fecha de Terminación:	29-jun-24	No se evidencia personal de obra ni ejecución de actividades durante la semana.
	Adelanto/Atraso (Días):		
	Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Se desmonta la canaleta eléctrica en la parte baja del muro oriental de la ludoteca

7.2. Se realiza socialización con la comunidad de las obras de fachada del proyecto

7.3. No se desarrollan actividades de obra civil

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. Se debe

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>SE EVIDENCIA QUE LA CANALETA DE DATOS ESTÁ EN MAL ESTADO EN LA LUDOTECA</td><td>SE EVIDENCIA QUE LA CANALETA DE DATOS ESTÁ EN MAL ESTADO EN LA LUDOTECA</td><td>SE EVIDENCIA QUE LA CANALETA DE DATOS ESTÁ EN MAL ESTADO EN LA LUDOTECA</td><td>SE EVIDENCIA QUE LA CANALETA DE DATOS ESTÁ EN MAL ESTADO EN LA LUDOTECA</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>SE DESMONTA LA CANALETA DE DATOS EN LA LUDOTECA</td><td>SE DESMONTA LA CANALETA DE DATOS EN LA LUDOTECA</td><td>SE AUMENTA LA ALTURA DE LA DEMOLICIÓN DEL PAÑETE EN EL MURO POSTERIOR DE LA LUDOTECA</td><td>SE AUMENTA LA ALTURA DE LA DEMOLICIÓN DEL PAÑETE EN EL MURO POSTERIOR DE LA BIBLIOTECA</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

SE REINSTALAN LAS CAJAS ELÉCTRICAS SOBRE PERFILES CALIBRE 26	SE REINSTALAN LAS CAJAS ELÉCTRICAS SOBRE PERFILES CALIBRE 26	SE REINSTALAN LAS CAJAS ELÉCTRICAS SOBRE PERFILES CALIBRE 26	DEMOLICIÓN DE PAÑETE EN LA PARTE BAJA DEL MURO DEL ÁREA DE MÓDULOS
			
PERÍMETRO EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA	PERÍMETRO EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA	PERÍMETRO EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA	PERÍMETRO EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA
PERÍMETRO EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA	PERÍMETRO EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA	PERÍMETRO EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA	PERÍMETRO EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	28
6/04/2024	12/04/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	CARRERA 83- # 46 B SUR	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	28	Fecha de corte:	viernes, 12 de abril de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	16-mar-24	248.978.481,38	100,00%	100,00%	99,64%	0,36%	$ 248.090.299,93
TOTAL			**248.978.481,38**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	16-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	

6. Pendientes

Pendiente detalles finales en graderias , instlacion de barandas, ajustes de puertas y tratamiento humedad cuarto rack

Fecha Proyectada de Terminación:	16-mar-24

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista finaliza la ejecucion de cuarto de ingles y cuarto de rack (pendiente humedad en cuarto de rack)

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue aprobado y radicado.
- El informe N°6 de interventoría fue radicado en la ventanilla virtual de SED.
- Se recibió por parte del contratista los formatos de trazabilidad RCD ajustados, estos están en verificación de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
.- Se recibe el informe SST N°6, el cual fue revisado y observado por esta interventoría.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza revisión al PIE presentado por el contratista, evidenciando que no se atienden las observaciones emitidas, se reiteran por medio de oficio
•Se revisa inf 5 presentado por el contratista, sin que se atiendan la totalidad de las observaciones
•Se envía oficio reiterando la entrega del listado semanal de materiales
•Se realiza oficio solicitando caracterización de b-200 ingresado a obra el cual no cuenta con caracterización ni aprobación por interventoria, reiterando reporte de materiales

9. Observaciones:

9,1 Se realiza la pre entrega a la insttitucion de las areas de ingles y cuarto de rack para su uso, qudando unicamente la observacion de la humedad en muros inferiores de cuarto de rack y detalles muy minimos de las úertas de estos cuartos. Como actividades adicionales se aprobao la intervencion de 3 puertas de salones que no cierran. Se recomienda al contratista en comite de obra cerrar los pendientes de graderia y las actividades adicionales como barandas en graderias

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
CUARTO DE RACK	**REMATES MINIMOS FALTANTES DE PURTAS RACK E INGLES**	**ENTREGA DE AULA DE INGLES**	**CUARTO DE RACK**
			
CUARTO DE RACK PENDIENTE TRATAMIENTO DE HUMEDAD MUROS	**CUARTO DE RACK PENDIENTE TRATAMIENTO DE HUMEDAD MUROS**	**ENTREGA DE AULA DE INGLES**	**ENTREGA DE AULA DE INGLES**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	28
6/05/2024	12/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	EL MOTORISTA	CALLE 57 N BIS SUR No. 75 F - 27	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	28	Fecha de corte:	12/05/2024

			Ppto.	% Ejecución Acumulado			
EL MOTORISTA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	15-abr-24	29-jun-24	$ 246.835.890,70	100,00%	17,43%	12,13%	-5,30%	29.941.193,54
TOTAL			**246.835.890,70**	**100,00%**	**-**		**-5,30%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

* Queda pendiente el diseño del detalle constructivo de la placa de contrapiso, por parte de la Entidad Contratante.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Continúa el pañete de culatas externas de la Sede Educativa hacia el nuevo patio.

7.2. Continúa el retiro de material de excavación en el área de trabajo.

7.3. Se tiende una capa de recebo común como sello para el piso del nuevo patio.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST
- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1. Para el presente informe semanal, El Contratista presentó una programación ajustada que permite identificar con certeza el porcentaje real de avance ejecutado. De igual manera, presenta un presupuesto que incorpora el conjunto de actividades solicitadas por la Supervisión del Contrato, incluyendo las especificaciones de la placa de contrapiso del nuevo patio. Queda pendiente por parte de la SED, el diseño del detalle de esta placa.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN DEL SITIO DE OBRA



RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN DEL SITIO DE OBRA



RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN DEL SITIO DE OBRA



RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN DEL SITIO DE OBRA



INICIA EL TENDIDO DE RECEBO COMÚN COMO CAPA DE SELLO PARA EL ÁREA DE TRABAJO



INICIA EL TENDIDO DE RECEBO COMÚN COMO CAPA DE SELLO PARA EL ÁREA DE TRABAJO



INICIA EL TENDIDO DE RECEBO COMÚN COMO CAPA DE SELLO PARA EL ÁREA DE TRABAJO



INICIA EL TENDIDO DE RECEBO COMÚN COMO CAPA DE SELLO PARA EL ÁREA DE TRABAJO

			
INICIA EL TENDIDO DE RECEBO COMÚN COMO CAPA DE SELLO PARA EL ÁREA DE TRABAJO	**CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA**	**CONTINÚA EL PAÑETE DE LA CULATA EXTERIOR DE LA SEDE EDUCATIVA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	28
6/04/2024	12/04/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C	CALLE 38 SUR BIS # 89-81	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	28	Fecha de corte:	viernes, 12 de abril de 2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	14-nov-23	29-abr-24	252.065.850,69	100,00%	100,00%	93,42%	6,58%	235.481.123,61
TOTAL			**252.065.850,69**	**100,00%**	-		**6,58%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-abr-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-abr-24

6. Pendientes

finalizar limpieza y destrOnque de baldosa terrazo primer piso, terminar cielo raso aulas primer piso, terminacion de pintura e instalacion en granito boca puertas, instalacion de luminarias, tomacorrientes e interruptores, pintura en esmalte, reemboquillado pasillo y salones segundo piso.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 Se avanza con destroncado y pulido de piso primer nivel para acabado final

7.2 se avanza con la instalacion de paneles drywall de cielo raso en una aula del primer nivel

7.5 Se adelantan instalacion de pintura en aulas de primer piso

7.6 Se realiza la instalacion de las rejas en ventaneria

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue aprobado y radicado.
- El informe N°6 de interventoría fue radicado en la ventanilla virtual de SED.
- Se recibió por parte del contratista los formatos de trazabilidad RCD ajustados, estos están en verificación de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°6, el cual fue revisado y observado por esta interventoría.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad
- Se realiza revisión al PIE presentado por el contratista, evidenciando que no se atienden las observaciones emitidas, se reiteran por medio de oficio
- Se revisa inf 5 presentado por el contratista, sin que se atiendan la totalidad de las observaciones
- Se envía oficio reiterando la entrega del listado semanal de materiales
- Se realiza oficio solicitando caracterización de b-200 ingresado a obra el cual no cuenta con caracterización ni aprobación por interventoria, reiterando reporte de materiales

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista termine las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio, que coordine con el rector de la institucion el inicio de las obras de los pisos en las aulas, que el contratista suministre e instale las laminas microperforadas en el cerramiento exterior.
9.2 Se le recomienda al contratista mejorar la densidad de la pintura de muros aplicada, ya que se evidencia la dosificacion de agua muy alta lo que no permite una correcta aplicacion. NO SE ALCANZAN A TERMINAR LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INSTALACION DE REJILLAS EN VENTANERIA	INSTALACION DE REJILLAS EN VENTANERIA	INSTALACION DE REJILLAS EN VENTANERIA	SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS LED SALONES
			
ACABADOS AULES PRIMER NIVEL	INSTALACION DE CIELO RASO AULAS PRIMER PISO	INSTALACION DE CIELO RASO AULAS PRIMER PISO	ACOPIO DE MATERIALES
			
SALIDAS ELECTRICAS PARA LUMINARIAS LED SALONES	ACABADOS AULAS PRIMER PISO	ACABADOS AULAS PRIMER PISO	INSTALACION DE REJILLAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	28
6/05/2024	12/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 28 — Fecha de corte: 12/05/2024

SAN BERNARDINO	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	Ppto. %/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	% Ejecución Acumulado Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.000.000,00	100,00%	100,00%	87,20%	-12,80%	784.800.000,00
TOTAL			**900.000.000,00**	**100,00%**	**-**		**-12,80%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista finalice la obra en la cubierta de Auditorio y del área de Orientación y que presente una programación actualizada que incluya todas las actividades pendientes por ejecutar.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. No se ejecutan actividades de obra durante la presente semana

7.2. No se instalan los espejos en los baños del segundo y del tercer piso

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. Se realiza un ajuste al balance de esta Sede Educativa, depurando las actividades que no se van a ejecutar e incorporando las actividades requeridas por la supervisión del contrato durante el recorrido conjunto del 27 de febrero de 2024 y se proyecta un presupuesto estimado en $ 900.000.000

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



LA IED RECOGIÓ EL CERRAMIENTO PARA PODER UTILIZAR EL PATIO CENTRAL



SE RETIRARON LOS RCD UBICADOS EN EL PATIO CENTRAL



PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LA PUERTA DE ACCESO POSTERIOR



PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LA ESCALERA DE ACCESO A LOS TANQUES DE RESERVA



PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO



PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE ESPEJOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO



PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO



PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE ESPEJOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	28	
6/04/2024	12/04/2024	

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	VILLA RICA SEDE B		CALLE 49 SUR # 78-35		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	28	Fecha de corte:	viernes, 12 de abril de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	15-mar-24	212.048.177,90	100,00%	100,00%	98,77%	1,23%	209.443.609,34
TOTAL			**212.048.177,90**	**100,00%**	**-**		**1,23%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine las obras instalacion piso caucho en patio de preescolar, , pendiente finalizacion rampa y plataforema de acceso shut de basuras

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 Se avanza con remates de pintura shut de basuras y plataforma para acceso

7.2 Se instalan las bajantes de las canales de cubierta patio preescolar

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue aprobado y radicado.
- El informe N°6 de interventoría fue radicado en la ventanilla virtual de SED.
- Se recibió por parte del contratista los formatos de trazabilidad RCD ajustados, estos están en verificación de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°6, el cual fue revisado y observado por esta interventoría.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad
- •Se realiza revisión al PIE presentado por el contratista, evidenciando que no se atienden las observaciones emitidas, se reiteran por medio de oficio
- •Se revisa inf 5 presentado por el contratista, sin que se atiendan la totalidad de las observaciones
- •Se envía oficio reiterando la entrega del listado semanal de materiales
- •Se realiza oficio solicitando caracterización de b-200 ingresado a obra el cual no cuenta con caracterización ni aprobación por interventoria, reiterando reporte de materiales

9. Observaciones:

9,1 Se le solicita al contratista que mejore las condiciones del material de piso caucho, ya que la prueba realizada el material ya esta presentando despredniemitno y contiene mucho resido como "polvillo de caucho que afecta la adherencia, adicionalmente la granulometria sigue sin cumplir; se persistir estas incinsitencias interventoria no aprueba la instalacion del piso caucho.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INSTALACIÓN DE CANAL PATIO PREESCOLAR	**INSTALACIÓN DE CANAL PATIO PREESCOLAR**	**INSTALACIÓN DE CANAL PATIO PREESCOLAR**	**INSTALACIÓN DE CANAL PATIO PREESCOLAR**
			
CANAL SHUT DE BASURAS	**BAJANTES CUBIERTA PREESCOLAR**	**BAJANTES CUBIERTA PREESCOLAR**	**ACOPIO DE MATERIAL PISO CAUCHO A MEJORAR**

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-85432

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	22/05/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL DELGADO
Documento	79573492
Teléfono	
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	
OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO	
Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-333 - Remision informe semanal No. 29, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-333 - Remision informe semanal No. 29
No. Folios	0
Anexos	
Documentos Adjuntos	
E-2024-85432_1.pdf	

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-333

Bogotá D.C., 22 de mayo de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.

Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 29

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 29, correspondiente al periodo comprendido entre el 13 de mayo al 19 de mayo de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (41) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

			29	Interventor:	CONSORCIO SANTA MARIA 022
13/04/2024	al	19/04/2024			

1. Datos Generales

Nombre:

NOMBRE
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
COLEGIO VILLA RICA
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN
COLEGIO JORGE ISAAC
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN
COLEGIO BOSANOVA
COLEGIO SAN
COLEGIO MOTORISTA
COLEGIO DILE BOSA
EMERGENCIAS

Localidad:

LOCALIDAD
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
KENNEDY
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA
BOSA-KENNEDY

2. Contrato de Obra

				CONTRATO DE OBRA No.	**No. CO1.PCCNTR.5305583**				
Objeto:				Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".					
Contratista:				**UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**					

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

				CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**No. CO1.PCCNTR.5313251**				
Objeto:				INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".					

Contratista:			CONSORCIO SANTA MARIA 022						
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	
				Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00						
Adición:			$ -						
Anticipo:			$ -						
Retegarantía:			$ -						
			Neto Acta						
			Acumulado						

4.	**Programación.**			Semana No.	**29**	Fecha de corte:	19-abr-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

N°	**Capítulos:**	**LOCALIDAD**	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**% Inversión**
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	16-mar-24	$ 248.978.481,38	**3,93%**	100,00%	99,64%	-0,36%	$ 248.090.300
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 145.401.475,07	**2,30%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 145.401.475
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	29-abr-24	$ 253.199.133,75	**4,00%**	100,00%	95,41%	-4,59%	$ 241.577.294
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 236.381.487,48	**3,73%**	100,00%	96,08%	-3,92%	$ 227.115.333
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 508.777.489,13	**8,04%**	100,00%	94,72%	-5,28%	$ 481.914.038
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 279.166.969,08	**4,41%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 279.166.969
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.544.151.602,35	**24,39%**	97,51%	63,26%	-34,25%	$ 976.830.304
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 133.128.173,40	**2,10%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 133.128.173
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	11-mar-24	29-jun-24	$ 253.510.561,00	**4,00%**	33,00%	13,23%	-19,77%	$ 33.539.447
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 543.111.193,70	**8,58%**	36,00%	9,29%	-26,71%	$ 50.455.030
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	15-abr-24	29-jun-24	$ 235.786.410,59	**3,72%**	17,00%	15,21%	-1,79%	$ 35.863.113
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.527.799,60	**14,22%**	100,00%	87,30%	-12,70%	$ 786.160.769
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 246.835.890,70	**3,90%**	29,71%	20,30%	-9,41%	$ 50.107.686
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 298.506.222,13	**4,72%**	16,00%	2,78%	-13,22%	$ 8.298.473

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	6,43%	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 5.827.462.889**	**92,05%**	73,48%	58,41%	-	**$ 3.697.648.404**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**

-15,07% **DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

que el contratiste finalice toos los frentes de obra que a la fecha ya llegaron a su finalizacion según programacion como francisco miranda, manuel cepeda sede C, villa rica, Rodrigo de Triana, igualmente avanzar en los frentes de bosanova, iniciar DILE.

6

PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
6.330.813.879,00									**6.330.813.879,00**
29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista no ejecuta actividades durante la semana
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	Se avanza con reemboquillado de muros salones segundo piso. con pintura en esmalte de colores salones primer piso. instalacion de cielo raso, queda pendiente acabado y pintura. el pulido de pisos primer piso
COLEGIO VILLA RICA	Se avanza con fabricación de plataforma y rampa para acceso al shut de basuras. Se inicia la instalacion de SBR para piso caucho en patio de preescolar
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	el contratista avanza con la submuracion de la excavación del tanque aquacell. avanza con la instalacion de dinteles en superboard en aulas de sistemas, no se han instalado las ventanas. realiza ajustes de detalles en las baterias de baños
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	se finalizan las obras
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Finaliza la instalación de la estructura métalica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Se realizan pruebas de líquidos penetrantes a la soldadura de la estructura métalica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Inicia la instalación de la teja sándwich de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Inicia el resane de juntas y el estuco de muros en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.
COLEGIO JORGE ISAAC	No se desarrollan actividades de obra esta semana. Sigue pendiente la aprobación por parte de la SED de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima. Siguen sin atenderse la subsanación de algunos puntos críticos donde se despegó la soldadura en los pasamanos de las escaleras

COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	Se aumenta la altura de la demolición del pañete en el muro posterior de la Ludoteca. Se aumenta la altura de la demolición del pañete en el muro posterior de la Biblioteca. Cerramiento provisional en polisombra verde alrededor de la Sede Educativa. Regata de muro para la media ca
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	Aplicación de anticorrosivo para la estructura metálica de la cubierta del segundo piso del Bloque A. Continúa el desmonte de las tejas en asbesto cemento del segundo piso del Bloque A. Se protege con plástico negro las aulas del segundo piso del Bloque A.
COLEGIO BOSANOVA	Avances instalacion enchape segundo piso y fundicion de cintas confinamiento piso y guardaescobas. fabricacion marquteria ventanas para 3 salones. desmonte ventaneria interna existente
COLEGIO SAN BERNARDINO	Se instala la estructura de soporte de la cubierta del área de orientación. Se realizan pruebas de líquidos penetrantes a las soldaduras de esta estructura de soporte. Se instalan los espejos en los baños del segundo y del tercer piso. Queda pendiente un espejo en el baño de hombres del tercer piso. Se instala la puerta de acceso posterior a la Sede Educativa
COLEGIO MOTORISTA	Se suspnde temporalmente el pañete de culatas externas hasta que lleguen andamios certificados. Se extiende geotextil sobre la capa de sello con recebo común. Se tiende una capa de material de compactación B-200.
COLEGIO DILE BOSA	El contratista avanza con el desmonte del cielo raso existente

8 **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.
- Se recomienda al contratista de obra dar cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en altura desarrollados en el Colegio San Bernardino.

9 **SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**

- El contratista de obra realizó el cargue de la información correspondiente a la trazabilidad RCD de los meses de octubre de 2024 a marzo de 2024 en la plataforma de la SDA.
- Se solicita al contratista de obra mantener en condiciones óptimas de orden y aseo los espacios de intervención en el Colegio Motorista.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

10 **REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				

COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:
				
COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:
				
DILE BOSA:	DILE BOSA:	DILE BOSA:	DILE BOSA:	DILE BOSA:
				

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				
COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:
				

COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:**	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:**	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:**	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:**
				
COLEGIO EL MOTORISTA:	**COLEGIO EL MOTORISTA:**	**COLEGIO EL MOTORISTA:**	**COLEGIO EL MOTORISTA:**	**COLEGIO EL MOTORISTA:**
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	29
13/04/2024	19/04/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:	
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C		CARRERA 83- # 46 B SUR			KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	29	Fecha de corte:	viernes, 19 de abril de 2024

MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	16-mar-24	248.978.481,38	100,00%	100,00%	99,64%	0,36%	$ 248.090.299,93
TOTAL			**248.978.481,38**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	16-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	16-mar-24

6. Pendientes

Pendiente detalles finales en graderias , instlacion de barandas, ajustes de puertas y tratamiento humedad cuarto rack

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista no ejecuta actividades durante la semana

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- El contratista de obra realizó el cargue de la información correspondiente a la trazabilidad RCD de los meses de octubre de 2024 a marzo de 2024 en la plataforma de la SDA.
- Se solicita al contratista de obra mantener en condiciones óptimas de orden y aseo los espacios de intervención en el Colegio Motorista.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.
- Se recomienda al contratista de obra dar cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en altura desarrollados en el Colegio San Bernardino.

8.4. .Componente calidad
•Revision y aprobación de plan de inspección y ensayo presentado por el contratista, haciendo aclaración que a pesar de no registrar claramente la norma o especificación a cumplir y los criterios de aceptación no exime presentar la evidencia de cumplimiento de las mismas

9. Observaciones:

9,1 Se realiza la pre entrega a la insttitucion de las areas de ingles y cuarto de rack para su uso, qudando unicamente la observacion de la humedad en muros inferiores de cuarto de rack y detalles muy minimos de las úertas de estos cuartos. Como actividades adicionales se aprobao la intervencion de 3 puertas de salones que no cierran. Se recomienda al contratista en comite de obra cerrar los pendientes de graderia y las actividades adicionales como barandas en graderias

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
ESTADO ACTUAL	**ESTADO ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**

			
ESTADO ACTUAL	ESTADO ACTUAL	ESTADO ACTUAL	ESTADO ACTUAL

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	28	
13/04/2024	19/04/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C		CALLE 38 SUR BIS # 89-81		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	28	Fecha de corte:	viernes, 19 de abril de 2024			
		Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	**Fecha inicio/Final**	**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	14-nov-23 29-abr-24	253.199.133,75	100,00%	100,00%	95,41%	4,59%	241.581.895,03
TOTAL		**253.199.133,75**	**100,00%**	-		**4,59%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	29-abr-24	finalizar limpieza de baldosa terrazo primer piso, terminaracabados de cielo raso aulas primer piso, terminacion de pintura e instalacion en granito boca puertas, instalacion de luminarias, tomacorrientes e interruptores, pintura en esmalte, reemboquillado pasillo y salones segundo piso. Falta reenboquillado de salones segundo piso y hall principal y pintura en esmalte
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	29-abr-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 Se avanza con reemboquillado de muros salones segundo piso

7.2 se avanza con pintura en esmalte de colores salones primer piso

7.5 Se termina instalacion de cielo raso, queda pendiente acabado y pintura

7.6 Se realiza el pulido de pisos primer piso

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue aprobado y radicado.
- El informe N°6 de interventoría fue radicado en la ventanilla virtual de SED.
- Se recibió por parte del contratista los formatos de trazabilidad RCD ajustados, estos están en verificación de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°6, el cual fue revisado y observado por esta interventoría.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad
- Se realiza revisión al PIE presentado por el contratista, evidenciando que no se atienden las observaciones emitidas, se reiteran por medio de oficio
- Se revisa inf 5 presentado por el contratista, sin que se atiendan la totalidad de las observaciones
- Se envía oficio reiterando la entrega del listado semanal de materiales
- Se realiza oficio solicitando caracterización de b-200 ingresado a obra el cual no cuenta con caracterización ni aprobación por interventoria, reiterando reporte de materiales

9. Observaciones:

9,1 pendiente que el contratista termine las correcciones de acabado de las ventanas de aluminio y correccion de niveles de enchape de piso en segundo nivel.
9.2 Se le recomienda al contratista mejorar la densidad de la pintura de muros aplicada, ya que se evidencia la dosificacion de agua muy alta lo que no permite una correcta aplicacion. SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA TERMINAR ACTIVIDADES LO MAS PRONTO POSIBLE EN EL FRENTE YA QUE LA PROGRAMACION YA ESTA AL 100%

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
PINTURA AULAS PRIMER PISO	PINITURA SALONES PRIMER PISO	PINITURA SALONES PRIMER PISO	PINITURA SALONES PRIMER PISO
			
CIELO RASO AULAS PRIMER PISO	PISNTURA AULAS PRIMER PISO	SALIDAS LUMINARIAS AULAS PRIMER PISO	BRILLADO DE PISO AULAS PRIMER PISO
			
ESTADP ACTUAL FACHADA INTERNA	PULIDO Y BRILLADO PISO AULAS PRIMER PISO	PINTURA TECHO AULA 1 PRIMER PISO	REEMBOQUILLADO MUROS SEGUNDO PISO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	29
13/04/2024	19/04/2024

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	VILLA RICA SEDE B		CALLE 49 SUR # 78-35		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

			Semana No.	29	Fecha de corte:	viernes, 19 de abril de 2024			
			Ppto.			% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	15-mar-24	236.381.487,48	100,00%	100,00%	96,08%	3,92%	227.107.288,92
TOTAL			**236.381.487,48**	**100,00%**	**-**		**3,92%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine las obras instalacion piso caucho en patio de preescolar, , pendiente finalizacion rampa y plataforma de acceso shut de basuras

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 Se avanza con fabricación de plataforma y rampa para acceso al shut de basuras

7.2 Se inicia la instalacion de SBR para piso caucho en patio de preescolar

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue aprobado y radicado.
- El informe N°6 de interventoría fue radicado en la ventanilla virtual de SED.
- Se recibió por parte del contratista los formatos de trazabilidad RCD ajustados, estos están en verificación de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°6, el cual fue revisado y observado por esta interventoría.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad
- •Se realiza revisión al PIE presentado por el contratista, evidenciando que no se atienden las observaciones emitidas, se reiteran por medio de oficio
- •Se revisa inf 5 presentado por el contratista, sin que se atiendan la totalidad de las observaciones
- •Se envía oficio reiterando la entrega del listado semanal de materiales
- •Se realiza oficio solicitando caracterización de b-200 ingresado a obra el cual no cuenta con caracterización ni aprobación por interventoria, reiterando reporte de materiales

9. Observaciones:

9,1 Se le solicita al contratista que mejore la instalacion de SBR para piso caucho y que siga recomendaciones de dosificacion para que el piso tenga buena adherencia, ya que se evicendia desprendimiento de material. **POR PARTE DE INTERVENTORIA NO SE DARA AVAL DE INSTALACION EPDM HASTA QUE NO SE REEMPLACE EL SBR MAL ADHERIDO**.

9,2 El porcentaje de avance se refleja menor vs el informe de la semana anterior ya que para este informe se incluyen los valores y avances de las actividades adicionales

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
FABRICACION DE PLATAFORMA SHUT DE BASURA	FABRICACION DE PLATAFORMA SHUT DE BASURA	FABRICACION DE PLATAFORMA SHUT DE BASURA	PINTURA DE CANAL Y BAJANTE SHUT DE BASURAS
			
PINTURA DE CANAL Y BAJANTE SHUT DE BASURAS	FABRICACION DE BARNADA PLATAFORMA SHUT BASURAS	FABRICACION DE BARNADA PLATAFORMA SHUT BASURAS	FABRICACION DE BARNADA PLATAFORMA SHUT BASURAS
			
RESINA PARA PISO CAUCHO PREESCOLAR	INSTALACION DE SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR	INSTALACION DE SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR	INSTALACION DE SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	29
13/04/2024	19/04/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	29	Fecha de corte:	viernes, 19 de abril de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
FRANCISCO MIRANDA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
VALOR PARCIAL	7-nov-23	14-mar-24	508.777.489,13	100,00%	100,00%	94,72%	5,28%	481.930.700,64
TOTAL			**508.777.489,13**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	14-mar-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24	

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine actividades de tanque de almacenamiento aquacell o fibra de vidrio y excavacion e instalacion de redes de aguas lluvias, terminar remates de cubierta, ventanas, muros cuhilla frontales y posteriores en superboard, pintura y acabados y remates en cubiertas de aulas de sistemas. Falta remates de pintura y cubierta baños

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista avanza con la submuracion de la excavación del tanque aquacell

7.2 el contratista avanza con la instalacion de dinteles en superboard en aulas de sistemas, no se han instalado las ventanas

7.3 el contratista realiza ajustes de detalles en las baterias de baños

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue aprobado y radicado.
- El informe N°6 de interventoría fue radicado en la ventanilla virtual de SED.
- Se recibió por parte del contratista los formatos de trazabilidad RCD ajustados, estos están en verificación de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
.- Se recibe el informe SST N°6, el cual fue revisado y observado por esta interventoría.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad
•Se realiza revisión al PIE presentado por el contratista, evidenciando que no se atienden las observaciones emitidas, se reiteran por medio de oficio
•Se revisa inf 5 presentado por el contratista, sin que se atiendan la totalidad de las observaciones
•Se envía oficio reiterando la entrega del listado semanal de materiales
•Se realiza oficio solicitando caracterización de b-200 ingresado a obra el cual no cuenta con caracterización ni aprobación por interventoria, reiterando reporte de materiales

9. Observaciones:

9,1 Pendiente que el contratista realice remates de acabado en bateria sanitaria, aula de sistemas, redes aguas lluvias, definicion de NP tanque Aquacell . Se recibe informe de OTIC, donde se le solicita al contratista presentar cotizacion de lo requerido para reestablecer el servicio.
9,2, SE SOLICITA A CONTRATISTA INTERVENCION URGENTE DE AULAS DE SISTEMAS Y REMATES FALTANTES EN CUBIERTAS SALONES TERCER PISO
9,3 El porcentaje de avance se refleja menor vs el informe de la semana anterior ya que para este informe se actualizan cantidades de ejecucion, sin estimar los adicionales que son el tanque aquacell, la redes otic y electricas aulas de sistemas, los tableros electricos y redes electricas a reemplazar llegando asi a un prespuesto general total de $ 791.128.351,73
9,4 Pendiente que contratista presente cotizacion de arreglos tableros y redes electricas de acuerdo a lo solicitado por la SED

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
SUBMURACION EXCAVACION TANQUE	SUBMURACION EXCAVACION TANQUE	ESTADO ACTUAL AULAS DE SISTEMAS	ESTADO ACTUAL AULAS DE SISTEMAS
			
ESTADO ACTUAL AULAS DE SISTEMAS	ESTADO ACTUAL AULAS DE SISTEMAS	ESTADO ACTUAL AULAS DE SISTEMAS	ESTADO ACTUAL AULAS DE SISTEMAS
			
DINTELES DE SUPERBOARD AULAS SISTEMAS	ACOPIO DE MATERIALES		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	29
13/04/2024	19/04/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		DIRECCION		Localidad:	
	BOSANOVA		CALLE 59B SUR # 8-72			BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

	Semana No.	29	Fecha de corte:	viernes, 19 de abril de 2024				
		Ppto.		% Ejecución Acumulado				
BOSANOVA	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
VALOR PARCIAL	15-abr-24	28-jun-24	235.786.410,59	100,00%	17,00%	15,21%	1,79%	35.869.883,89
TOTAL			**235.786.410,59**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	28-jun-24	
Adelanto/Atraso (Días):		Instalacion de enchapes primer y sogundo piso, instalacion de cubierta patio, suministro e instalacion de ventaneria aulas, construccion de cuarto para camilla
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7,1 Avances instalacion enchape segundo piso y fundicion de cintas confinamiento piso y guardaescobas

7,2 Avances fabricacion marquteria ventanas para 3 salones

7,3 Avances desmonte ventaneria interna existente

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en instalacion de enchape psio y avance de fabricacion e instalación de ventaneria

8.2. . Componente ambiental
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue aprobado y radicado.
- El informe N°6 de interventoría fue radicado en la ventanilla virtual de SED.
- Se recibió por parte del contratista los formatos de trazabilidad RCD ajustados, estos están en verificación de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°6, el cual fue revisado y observado por esta interventoría.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad
- Se realiza revisión al PIE presentado por el contratista, evidenciando que no se atienden las observaciones emitidas, se reiteran por medio de oficio
- Se revisa inf 5 presentado por el contratista, sin que se atiendan la totalidad de las observaciones
- Se envía oficio reiterando la entrega del listado semanal de materiales
- Se realiza oficio solicitando caracterización de b-200 ingresado a obra el cual no cuenta con caracterización ni aprobación por interventoria, reiterando reporte de materiales

9. Observaciones:

9,1 Se recomienda el suministros de materiales, ventaneria y cubierta para poder poner al dia la programacion acordada con la institucion educativa
9,2 Se recomienda cumplir con los compromisos de entrega con la institucion, los cuales se han incumplido en dos oportunidades
9,3 se Evidencia que no esta el suficiente personal para el ritmo de obra, se recomienda a contratista mejorar rendimiento y suministro de materiales

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INSTALACION DE VENTANERIA	**INSTALACION DE VENTANERIA**	**PULIDO DE PISO SALONES**	**INSTALACION DE VENTANERIA**

			
FABRICACION DE VENTANERIA	INSTALACION DE VENTANERIA	FABRICACION DE VENTANERIA	PULIDO DE PISO SALONES
			
ALISTADO DE PISO PARA ESCALERAS	LAVADO DE ENCHAPE DE GRESS INSTALADO	LAVADO DE ENCHAPE DE GRESS INSTALADO	LAVADO DE ENCHAPE DE GRESS INSTALADO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	29
13/04/2024	19/04/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	DILE BOSA	CALLE 61 SUR # 80H-28	BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	29	Fecha de corte:	viernes, 19 de abril de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
DILE BOSA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
VALOR PARCIAL	6-may-24	28-jun-24	298.506.222,13	100,00%	16,00%	2,78%	13,22%	8.298.472,98
TOTAL			**298.506.222,13**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	28-jun-24	

6. Pendientes

Adelanto/Atraso (Días):			Terminacion desmonte de cilo raso, reforzamiento estructura y cambio de cubierta fase 1 y fase 2
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24		

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7,1 El contratista avanza con el desmonte del cielo raso existente

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
- Se recibe el informe ambiental N°6, el cual fue aprobado y radicado.
- El informe N°6 de interventoría fue radicado en la ventanilla virtual de SED.
- Se recibió por parte del contratista los formatos de trazabilidad RCD ajustados, estos están en verificación de interventoría.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe el informe SST N°6, el cual fue revisado y observado por esta interventoría.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad
- •Se realiza revisión al PIE presentado por el contratista, evidenciando que no se atienden las observaciones emitidas, se reiteran por medio de oficio
- •Se revisa inf 5 presentado por el contratista, sin que se atiendan la totalidad de las observaciones
- •Se envía oficio reiterando la entrega del listado semanal de materiales
- •Se realiza oficio solicitando caracterización de b-200 ingresado a obra el cual no cuenta con caracterización ni aprobación por interventoria, reiterando reporte de materiales

9. Observaciones:

El contratista hace cambio de personal, se considera un atraso bastante y por parte de la direccion local de Bosa y de la SED en conjunto de la interventoria, se le manifiesta al contratista ponere al dia en programacion y ejecutar las actividades lo antes posible. Se realiza acta con personal del Dile con los compromisos de acta de vecindad y avance de actividades proxima semana. Hasta el momento no se han cumplido compromisos y los avances de obra no se han ejecutado de acuerdo a programacion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
ESTADO ACTUAL	**ESTADO ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**	**SUMINISTRO DE PERFILES PARA REFORZAMIENTO CUBIERTA FASE 1**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	29
13/05/2024	19/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	29	Fecha de corte:	19/05/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.544.151.602,35	100,00%	97,51%	63,26%	-34,25%	976.830.303,65
TOTAL			**1.544.151.602,35**	**100,00%**	-		**-34,25%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Finaliza la instalación de la estructura métalica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.

7.2. Se realizan pruebas de líquidos penetrantes a la soldadura de la estructura métalica de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.

7.3. Inicia la instalación de la teja sándwich de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.

7.4. Inicia el resane de juntas y el estuco de muros en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.Durante la semana pasada no registra avance de obra, dado que las actividades realizadas fueron resanes y subsanación de observaciones formuladas a la calidad de la obra

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INSTALACIÓN DE LA LÁMINA INFERIOR DE LA TEJA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A



INSTALACIÓN DE LA LÁMINA INFERIOR DE LA TEJA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A



INSTALACIÓN DE LA TEJA TIPO SÁNDWICH PARA LA CUBIERTA DEL AULA No. 3 DEL BLOQUE A



INSTALACIÓN DE LA TEJA TIPO SÁNDWICH PARA LA CUBIERTA DEL AULA No. 3 DEL BLOQUE A



INSTALACIÓN DE LA TEJA TIPO SÁNDWICH PARA LA CUBIERTA DEL AULA No. 4 DEL BLOQUE A



INSTALACIÓN DE LA TEJA TIPO SÁNDWICH PARA LA CUBIERTA DEL AULA No. 4 DEL BLOQUE A



INSTALACIÓN DE LA TEJA TIPO SÁNDWICH PARA LA CUBIERTA DEL AULA No. 5 DEL BLOQUE A



INSTALACIÓN DE LA TEJA TIPO SÁNDWICH PARA LA CUBIERTA DEL AULA No. 5 DEL BLOQUE A

			
INSTALACIÓN DE LA LÁMINA SUPERIOR DE LA TEJA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A	**INSTALACIÓN DE LA LÁMINA SUPERIOR DE LA TEJA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A**	**INSTALACIÓN DE LA LÁMINA SUPERIOR DE LA TEJA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A**	**INSTALACIÓN DE LA LÁMINA SUPERIOR DE LA TEJA PARA LA CUBIERTA DE LAS AULAS DEL BLOQUE A**
			
PRUEBAS DE TINTAS A LA SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA	**PRUEBAS DE TINTAS A LA SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA**	**PRUEBAS DE TINTAS A LA SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA**	**PRUEBAS DE TINTAS A LA SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA**
			
INICIA EL RESANE Y EL ESTUCADO DE MUROS	**INICIA EL RESANE Y EL ESTUCADO DE MUROS**	**INICIA EL RESANE Y EL ESTUCADO DE MUROS**	**INICIA EL RESANE Y EL ESTUCADO DE MUROS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	29
13/05/2024	19/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	29	Fecha de corte:	19/05/2024

JORGE ISAACS IED	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	7-nov-23	6-ene-23	133.128.173,40	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	133.128.173,40
TOTAL			**133.128.173,40**	**100,00%**	-		**0,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	6-ene-24	* Queda pendiente la aprobación del NP para la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. No se desarrollan actividades de obra esta semana

7.2. Sigue pendiente la aprobación por parte de la SED de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima

7.3. Siguen sin atenderse la subsanación de algunos puntos críticos donde se despegó la soldadura en los pasamanos de las escaleras

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra

9. Observaciones:

9.1. Queda pendiente la aprobación del NP para la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA	PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA	PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA	PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA
			
PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA	PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA	PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA	PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	29
13/05/2024	19/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JOSÉ ANTONIO GALÁN	CARRERA 78 J No. 58 M - 22 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	29	Fecha de corte:	19/05/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JOSÉ ANTONIO GALÁN	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	11-abr-24	29-jun-24	$ 543.111.193,70	100,00%	36,00%	9,29%	-26,71%	50.455.029,89
TOTAL			**543.111.193,70**	**100,00%**	-		**-26,71%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	28-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista dinamizar el proceso de obra, para cerrar la brecha de atraso evidenciada con el avance programado.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Aplicación de anticorrosivo para la estructura metálica de la cubierta del segundo piso del Bloque A.

7.2. Continúa el desmonte de las tejas en asbesto cemento del segundo piso del Bloque A.

7.3. Se protege con plástico negro las aulas del segundo piso del Bloque A.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.Inician las actividades de obra con los desmontes de lámparas, cielos rasos y carpintería metálica.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO BLANCO A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA



APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO BLANCO A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA



APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO BLANCO A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA



APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO BLANCO A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS



DESMONTE DE LA TEJA EN ASBESTO CEMENTO



DESMONTE DE LA TEJA EN ASBESTO CEMENTO



DESMONTE DE LA TEJA EN ASBESTO CEMENTO

			
DESMONTE DE LA TEJA EN ASBESTO CEMENTO	**DESMONTE DE LA TEJA EN ASBESTO CEMENTO**	**TEJAS PRÓXIMAS A SER DESMONTADAS**	**TEJAS PRÓXIMAS A SER DESMONTADAS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	29
13/05/2024	19/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	RURAL LA CONCEPCIÓN	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. | No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	29	Fecha de corte:	19/05/2024

RURAL LA CONCEPCIÓN	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	18-mar-24	29-jun-24	$ 253.510.561,00	100,00%	33,00%	13,23%	-19,77%	33.539.447,22
TOTAL			**253.510.561,00**	**100,00%**	**-**		**-19,77%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	29-jun-24	No se evidencia personal de obra ni ejecución de actividades durante la semana.
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Se aumenta la altura de la demolición del pañete en el muro posterior de la Ludoteca.

7.2. Se aumenta la altura de la demolición del pañete en el muro posterior de la Biblioteca.

7.3. Cerramiento provisional en polisombra verde alrededor de la Sede Educativa.

7.4. Regata de muro para la media caña en la fachada principal.

7.5. Demolición del pañete exterior en la fachada lateral y posterior.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. Se debe avanzar en la obra exterior del proyecto para garantizar el control de humedad en el primer piso

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>SE AUMENTA LA ALTURA DE LA DEMOLICIÓN DEL PAÑETE EN EL MURO POSTERIOR DE LA LUDOTECA</td>
<td>REMOCIÓN DE PINTURA DEL CIELO RASO DE LA BIBLIOTECA</td>
<td>SE AUMENTA LA ALTURA DE LA DEMOLICIÓN DEL PAÑETE EN EL MURO POSTERIOR DE LA BIBLIOTECA</td>
<td>SE AUMENTA LA ALTURA DE LA DEMOLICIÓN DEL PAÑETE EN EL MURO POSTERIOR DE LA LUDOTECA</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>INICIA EL CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE ALREDEDOR DE LA SEDE</td>
<td>INICIA EL CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE ALREDEDOR DE LA SEDE</td>
<td>INICIA EL CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE ALREDEDOR DE LA SEDE</td>
<td>INICIA EL CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE ALREDEDOR DE LA SEDE</td>
</tr>
</table>

			
CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE ALREDEDOR DE LA SEDE	**CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE ALREDEDOR DE LA SEDE**	**REGATA EN LA PÁRTE BAJA DEL MURO PARA LA MEDIA CAÑA EN LA FACHADA PRINCIPAL**	**REGATA EN LA PÁRTE BAJA DEL MURO PARA LA MEDIA CAÑA EN LA FACHADA PRINCIPAL**
			
DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXTERIOR EN LA FACHADA LATERAL Y POSTERIOR	**DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXTERIOR EN LA FACHADA LATERAL Y POSTERIOR**	**DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXTERIOR EN LA FACHADA LATERAL Y POSTERIOR**	**DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXTERIOR EN LA FACHADA LATERAL Y POSTERIOR**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	29
13/05/2024	19/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. | No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	29	Fecha de corte:	19/05/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
SAN BERNARDINO	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.000.000,00	100,00%	100,00%	87,30%	-12,70%	785.700.000,00
TOTAL			**900.000.000,00**	**100,00%**	**-**		**-12,70%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24	
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24	

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista finalice la obra en la cubierta de Auditorio y del área de Orientación y que presente una programación actualizada que incluya todas las actividades pendientes por ejecutar.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Se instala la estructura de soporte de la cubierta del área de orientación

7.2. Se realizan pruebas de líquidos penetrantes a las soldaduras de esta estructura de soporte

7.3. Se instalan los espejos en los baños del segundo y del tercer piso. Queda pendiente un espejo en el baño de hombres del tercer piso

7.4. Se instala la puerta de acceso posterior a la Sede Educativa

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. Se realiza un ajuste al balance de esta Sede Educativa, depurando las actividades que no se van a ejecutar e incorporando las actividades requeridas por la supervisión del contrato durante el recorrido conjunto del 27 de febrero de 2024 y se proyecta un presupuesto estimado en $ 900.000.000

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN



INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN



PRUEBAS DE TINTAS A LA SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ORIENTACIÓN



PRUEBAS DE TINTAS A LA SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ORIENTACIÓN



PRUEBAS DE TINTAS A LA SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ORIENTACIÓN



PRUEBAS DE TINTAS A LA SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE ORIENTACIÓN

			
INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO	**INSTALACIÓN DE ESPEJOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO**	**INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO**	**LA INSTALACIÓN DE ESPEJOS EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO**
			
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE LA CUBIERTA DEL AUDITORIO Y DE ORIENTACIÓN	**VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE LA CUBIERTA DEL AUDITORIO Y DE ORIENTACIÓN**	**RESANES CON MORTERO EN LAS GOTERAS DE LAS CUBIERTAS PLANAS**	**RESANES CON MORTERO EN LAS GOTERAS DE LAS CUBIERTAS PLANAS**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	29
13/05/2024	19/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	EL MOTORISTA	CALLE 57 N BIS SUR No. 75 F - 27	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	29	Fecha de corte:	19/05/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
EL MOTORISTA	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	15-abr-24	29-jun-24	$ 246.835.890,70	100,00%	29,71%	20,30%	-9,41%	50.107.685,81
TOTAL			**246.835.890,70**	**100,00%**	-		**-9,41%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

* Queda pendiente el diseño del detalle constructivo de la placa de contrapiso, por parte de la Entidad Contratante.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Se suspnde temporalmente el pañete de culatas externas hasta que lleguen andamios certificados.

7.2. Se extiende geotextil sobre la capa de sello con recebo común.

7.3. Se tiende una capa de material de compactación B-200.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1. Para el presente informe semanal, El Contratista presentó una programación ajustada que permite identificar con certeza el porcentaje real de avance ejecutado. De igual manera, presenta un presupuesto que incorpora el conjunto de actividades solicitadas por la Supervisión del Contrato, incluyendo las especificaciones de la placa de contrapiso del nuevo patio. Queda pendiente por parte de la SED, el diseño del detalle de esta placa.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DE COMPACTACIÓN B-200	**INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DE COMPACTACIÓN B-200**	**INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DE COMPACTACIÓN B-200**	**INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DE COMPACTACIÓN B-200**
			
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DE COMPACTACIÓN B-200	**INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DE COMPACTACIÓN B-200**	**INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DE COMPACTACIÓN B-200**	**INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y RELLENO CON MATERIAL DE COMPACTACIÓN B-200**

			
SE DEBE PROTEGER LA BASE DE LOS MUROS EXISTENTES	SE DEBE PROTEGER LA BASE DE LOS MUROS EXISTENTES	SE DEBE PROTEGER LA BASE DE LOS MUROS EXISTENTES	SE DEBE PROTEGER LA BASE DE LOS MUROS EXISTENTES

FORMULARIO ÚNICO DE TRÁMITES

BOGOTÁ Secretaría de Educación

Consulta web

Volver a consultar

RADICACION ENTRADA NÚMERO E-2024-89612

ESTADO ACTUAL **RADICADO**

Radicación | Reparto y Gestión | En Trámite | Finalizado

TRÁMITE ESTÁ AQUÍ

Días hábiles del trámite: 15

Días hábiles transcurridos: 0

Tiempo legal del trámite

Tiempo que lleva su proceso

Historial

DETALLE RADICADO

Radicador	SISTEMA FUT
Fecha de Radicación	30/05/2024
No. Origen	
Documentos Referenciados	
Datos del Solicitante	
Entidad/Origen	RAUL DELGADO
Documento	79573492
Teléfono	
Celular	3013942384
Correo Electrónico	proyectos@soliunsas.com
Dirección	KR 70 C #48-55 NORMANDIA
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.
País	COLOMBIA
Dependencias Responsables	

OFICINA VIRTUAL DE SERVICIO AL CIUDADANO

Copias	
Información Adicional	
Asunto	Radicado desde el FUT. Tipo ciudadano solicitante: Contactenos. Trámite: VENTANILLA DE RADICACIÓN VIRTUAL. ¿Cómo se enteró de nosotros? = Recomendación, Asunto de la Petición = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-349 - Remision informe semanal No. 30, Describa su Petición: Señor ciudadano recuerde registrar una descripción completa de su solicitud, clara y detallada, con datos relevantes como (localidad, nombre del colegio, grado, número de documento de identidad, nombre completo de los estudiantes, etc.), o los datos que considere pertinentes de acuerdo con el tipo de petición que radique a la entidad, con el objetivo de dar trámite de manera completa. = SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-349 - Remision informe semanal No. 30
No. Folios	0
Anexos	
Documentos Adjuntos	

E-2024-89612_1.pdf

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

Radicados Relacionados

Volver a consultar

Para una mejor experiencia, por favor utilice Internet Explorer Edge, Opera, Google Chrome y Mozilla Firefox. V1.1.1

EDUCACIÓNBOGOTÁ
Secretaría de Educación del Distrito

SED-CO1.PCCNTR.5313251-2024-349

Bogotá D.C., 30 de mayo de 2024

Señores
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn. Enrique Campos
Apoyo a la Supervisión
Bogotá D.C.


Referencia: **Contrato de Interventoría** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" GRUPO 8".**

Asunto: Remisión informe semanal No. 30

Cordial Saludo,

En cumplimiento de nuestras obligaciones, por medio de la presente nos permitimos remitir el informe semanal de interventoría No. 30, correspondiente al periodo comprendido entre el 20 de mayo al 26 de mayo de 2024 para el contrato descrito en la referencia.

Cordialmente,



RAÚL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: (41) folios.
Con copia: No aplica.
Elaboró: MCMM
Revisó: No aplica

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION

20/05/2024	**al**	**26/05/2024**	**30**	**Interventor:**	**CONSORCIO SANTA MARIA 022**

1. Datos Generales

Nombre: **Localidad:**

NOMBRE	LOCALIDAD
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY
COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA
COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA
COLEGIO BOSANOVA	BOSA
COLEGIO SAN	BOSA
COLEGIO MOTORISTA	BOSA
COLEGIO DILE BOSA	BOSA
EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY

2.

Contrato de Obra

				CONTRATO DE OBRA No.				
Objeto:					**No. CO1.PCCNTR.5305583**			
	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".						
Contratista:			**UNION TEMPORAL GEPM 2023-1**					

F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23		8 MESES	29-jun-24	N.A.	29-jun-24	N.A	N.A	N.A	N.A

		Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**
Valor Contrato:	$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 :	$ -						
Anticipo:	$ -						
Retegarantía:	$ -						
	Neto Acta						
	Acumulado						

3.

Contrato de Interventoría

	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	**No. CO1.PCCNTR.5313251**			
Objeto:					
INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".				

Contratista:			**CONSORCIO SANTA MARIA 022**							
F.I.		PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.		
30-oct-23		9 MESES	29-jul-24	N.A.	29-jul-24	N.A	N.A	N.A		
				Acta 1	**Acta 2**	**Acta 3**	**Acta 4**	**Acta 5**	**Acta 6**	
Valor Contrato:			$ 504.080.587,00							
Adición:			$ -							
Anticipo:			$ -							
Retegarantía:			$ -							
			Neto Acta							
			Acumulado							

4.	**Programación.**			Semana No.	**30**	Fecha de corte:	26-may-24			
				Ppto.			% Ejecución Acumulado			

N°	**Capítulos:**	**LOCALIDAD**	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**% Inversión**
1	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	KENNEDY	30-oct-23	16-mar-24	$ 248.978.481,38	**3,93%**	100,00%	99,64%	-0,36%	$ 248.090.300
2	COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	KENNEDY	30-oct-23	26-ene-24	$ 145.401.475,07	**2,30%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 145.401.475
3	COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	KENNEDY	14-nov-23	29-abr-24	$ 253.199.133,75	**4,00%**	100,00%	98,10%	-1,90%	$ 248.388.350
4	COLEGIO VILLA RICA	KENNEDY	7-nov-23	15-mar-24	$ 236.381.487,48	**3,73%**	100,00%	96,47%	-3,53%	$ 228.037.221
5	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	KENNEDY	7-nov-23	14-mar-24	$ 508.777.489,13	**8,04%**	100,00%	97,01%	-2,99%	$ 493.565.042
6	COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	KENNEDY	20-nov-23	19-mar-24	$ 279.166.969,08	**4,41%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 279.166.969
7	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	BOSA	30-oct-23	31-may-24	$ 1.544.151.602,35	**24,39%**	98,54%	64,32%	-34,22%	$ 993.198.311
8	COLEGIO JORGE ISAAC	BOSA	7-nov-23	6-ene-23	$ 133.128.173,40	**2,10%**	100,00%	100,00%	0,00%	$ 133.128.173
9	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	BOSA	11-mar-24	29-jun-24	$ 253.510.561,00	**4,00%**	44,00%	14,47%	-29,53%	$ 36.682.978
10	COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 543.111.193,70	**8,58%**	42,00%	11,57%	-30,43%	$ 62.837.965
11	COLEGIO BOSANOVA	BOSA	15-abr-24	29-jun-24	$ 235.786.410,59	**3,72%**	24,00%	20,08%	-3,92%	$ 47.345.911
12	COLEGIO SAN BERNARDINO	BOSA	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.527.799,60	**14,22%**	100,00%	87,30%	-12,70%	$ 786.160.769
13	COLEGIO MOTORISTA	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 246.835.890,70	**3,90%**	56,69%	20,30%	-36,39%	$ 50.107.686
14	COLEGIO DILE BOSA	BOSA	1-abr-24	29-jun-24	$ 409.403.236,43	**6,47%**	30,00%	16,15%	-13,85%	$ 66.129.719

15	EMERGENCIAS	BOSA-KENNEDY	30-oct-23	29-jun-24	$ 407.352.188,00	**6,43%**	0,00%	0,00%	0,00%	$ -
	TOTAL				**$ 5.938.359.904**	**93,80%**	77,18%	60,31%	-	**$ 3.818.240.870**

VR TOTAL EJECUTADO	**$ -**
VR INICIAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**
ADICION	**$ -**
VR TOTAL CONTRATO	**$ 6.330.813.879,00**

-16,87% **DIFERENCIA**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-jun-24
FECHA DE TERMINACION PRORROGA	N.A.
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24

6. Pendientes

que el contratiste finalice toos los frentes de obra que a la fecha ya llegaron a su finalizacion según programacion como francisco miranda, manuel cepeda sede C, villa rica, Rodrigo de Triana, igualmente avanzar en los frentes de bosanova, iniciar DILE.

6	PAC	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
	6.330.813.879,00									**6.330.813.879,00**
	29/6/2024									0%

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C	el contratista no ejecuta actividades durante la semana
COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE A	se finalizan las obras
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA	Se avanza con instalacion de luminarias salones primer piso, con pintura en esmalte de colores salones primer piso, instalacion de cielo raso, queda pendiente acabado y pintura, reemboquillado de muros salones segundo piso
COLEGIO VILLA RICA	Se avanza con fabricacion de baranda para plataforma shut de basuras, la instalacion de SBR para piso caucho en patio de preescolar donde se hacen correciones de resina solicitadas por interventoria.
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA	el contratista no avanza mas con la submuración del la excavacion del tanque aquacell, se solicita al cotratista realizar estas actividades. avanza con la instalacion de dinteles en superboard en aulas de sistemas, se instalan las ventanas y se realiza avances en pintura, realiza instalacion de luminiarias, tomacorrientes e interruptores en aulas de sistemas
COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA	se finalizan las obras
COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN	Avanza la instalación de la teja sándwich de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A; pendiente las tapas laterales. Avanza el pañete de muros en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Avanza la fundida de alfajías en las ventanas de las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Se desmonta el piso de las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A. Se instalan vidrios en las puertas de los baños. Avanza la instalación de rejillas superiores en las aulas del Bloque B.
COLEGIO JORGE ISAAC	No se desarrollan actividades de obra esta semana. Sigue pendiente la aprobación por parte de la SED de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima. Siguen sin atenderse la subsanación de algunos puntos críticos donde se despegó la soldadura en los pasamanos de las escaleras

COLEGIO RURAL LA CONCEPCION	Se aumenta la altura de la demolición del pañete en el muro posterior de la Ludoteca y la Biblioteca. Continúa la demolición del pañete exterior en la fachada lateral y posterior. Excavación para el cárcamo lateral hacia el sumidero de la esquina. Excavación para base del andén perimet
COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN	Repañetado de muros en las aulas del segundo piso del Bloque A. Se realizan preparativos para la instalación de la estructura metálica en dos aulas del segundo piso del Bloque A.
COLEGIO BOSANOVA	Avances instalacion enchape escaleras , Avances instalacion de ventanerida, pulida de piso aulas 209-207-206 para entrega parcial al colegio
COLEGIO SAN BERNARDINO	Se desmontan las tejas de asbesto cemento de la cubierta del área de orientación.Inicia la instalación de la teja tipo sándwich de la cubierta del área de orientación. Queda pendiente un espejo en el baño de hombres del tercer piso. Se instala la puerta de acceso posterior a la Sede Educativa
COLEGIO MOTORISTA	No se desarrollan actividades de obra durante la semana. Los resultados de las densidades del piso fueron satisfactorios
COLEGIO DILE BOSA	El contratista avanza con la pintura de la estructura existente zona de atencion al usuario, avanza con fabricacion de estructura para cubierta de zona administrativa

8 **ACTIVIDADES EJECUTADAS:**

SEGUIMIENTO GESTIÓN SST

- Se recibe documentación para el ingreso de nuevo personal a obra.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en altura desarrollados en el Colegio San Bernardino y Dile Bosa.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas..


9 **SEGUIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL**

Se solicita al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

10 **REGISTRO FOTOGRAFICO**

COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C:**
				
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA:**
				

COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:	COLEGIO VILLA RICA:
				
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:	COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA:
				
COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:	COLEGIO BOSANOVA:
				
DILE BOSA:	DILE BOSA:	DILE BOSA:	DILE BOSA:	DILE BOSA:
				

COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:	COLEGIO CARLOS ALBAN HOLGUIN:
				
COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:	COLEGIO SAN BERNARDINO:
				
COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:	COLEGIO JORGE ISAAC:
				
COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:	COLEGIO RURAL LA CONCEPCION:
				

COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:**	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:**	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:**	**COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN:**
				
COLEGIO EL MOTORISTA:	**COLEGIO EL MOTORISTA:**	**COLEGIO EL MOTORISTA:**	**COLEGIO EL MOTORISTA:**	**COLEGIO EL MOTORISTA:**
				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	30	
20/05/2024	26/05/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO		Direccion		Localidad:
	MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C		CARRERA 83- # 46 B SUR		KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	30	Fecha de corte:	domingo, 26 de mayo de 2024	

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
MANUEL CEPEDA VARGAS SEDE C	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	16-mar-24	248.978.481,38	100,00%	100,00%	99,64%	0,36%	$ 248.090.299,93
TOTAL			**248.978.481,38**	**100,00%**	-			

5.	Estado de la Programación		6. Pendientes
	Fecha de Terminación:	16-mar-24	
	Adelanto/Atraso (Días):		Pendiente detalles finales en graderias , instalacion de barandas, ajustes de puertas y tratamiento humedad cuarto rack
	Fecha Proyectada de Terminación:	16-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista no ejecuta actividades durante la semana

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
Se solicita al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevo personal a obra.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en altura desarrollados en el Colegio San Bernardino y Dile Bosa.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.


8.4. .Componente calidad

9. Observaciones:

9,1 Se realiza la pre entrega a la insttitucion de las areas de ingles y cuarto de rack para su uso, qudando unicamente la observacion de la humedad en muros inferiores de cuarto de rack y detalles muy minimos de las úertas de estos cuartos. Como actividades adicionales se aprobao la intervencion de 3 puertas de salones que no cierran. Se recomienda al contratista en comite de obra cerrar los pendientes de graderia y las actividades adicionales como barandas en graderias

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
ESTADO ACTUAL	**ESTADO ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**

			
ESTADO ACTUAL	**ESTADO ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	30
20/05/2024	26/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	RODRIGO DE TRIANA SEDE C	CALLE 38 SUR BIS # 89-81	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	30	Fecha de corte:	domingo, 26 de mayo de 2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
RODRIGO DE TRIANA SEDE C	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	14-nov-23	29-abr-24	253.199.133,75	100,00%	100,00%	98,10%	1,90%	248.377.417,53
TOTAL			**253.199.133,75**	**100,00%**	-		**1,90%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	29-abr-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	29-abr-24

6. Pendientes

terminar acabados de cielo raso aulas primer piso, terminacion de pintura e instalacion en granito boca puertas, terminar instalacion de luminarias, tomacorrientes e interruptores, reemboquillado pasillo y salones segundo piso.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 Se avanza con instalacion de luminarias salones primer piso

7.2 se avanza con pintura en esmalte de colores salones primer piso

7.3 Se termina instalacion de cielo raso, queda pendiente acabado y pintura

7.4 Se inicia reemboquillado de muros salones segundo piso

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
Se solicita al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevo personal a obra.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en altura desarrollados en el Colegio San Bernardino y Dile Bosa.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad

9. Observaciones:

Se recomienda al contratista terminar las actividades de aulas de primer piso para entregar a la institucion y poder realizar actividades pendientes en segundo piso

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
REMATE DESNIVEL ENCHAPE SEGUNDO PISO	**SUMINISTRO DE LUMINARIAS SALONES PRIMER PISO**	**INSTALACION DE LUMINARIAS SALONES PRIMER NIVEL**	**PINITURA SALONES PRIMER PISO**
			
PINITURA SALONES PRIMER PISO	**PISNTURA AULAS PRIMER PISO**	**INSTALACION DE LUMINARIAS SALONES PRIMER NIVEL**	**PINITURA SALONES PRIMER PISO**
			
PINITURA SALONES PRIMER PISO	**PINITURA SALONES PRIMER PISO**	**PINITURA SALONES PRIMER PISO**	**REEMBOQUILLADO MUROS SEGUNDO PISO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	30	
20/05/2024	26/05/2024	

INTERVENTORIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	Direccion	Localidad:
	VILLA RICA SEDE B	CALLE 49 SUR # 78-35	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	30	Fecha de corte:	domingo, 26 de mayo de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
VILLA RICA SEDE B	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	15-mar-24	236.381.487,48	100,00%	100,00%	96,47%	3,53%	228.031.018,92
TOTAL			**236.381.487,48**	**100,00%**	-		**3,53%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	15-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	15-mar-24

6. Pendientes

pendiente que el contratista termine las obras instalacion piso caucho en patio de preescolar, , detalles de rampa, instalacion de malla angeo y remates de pintura shut de basura

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 Se avanza con fabricacion de baranda para plataforma shut de basuras

7.2 Se inicia la instalacion de SBR para piso caucho en patio de preescolar donde se hacen correciones de resina solicitadas por interventoria

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental

Se solicita al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevo personal a obra.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en altura desarrollados en el Colegio San Bernardino y Dile Bosa.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad

9. Observaciones:

9,1 Se le solicita al contratista que mejore la instalacion de SBR para piso caucho y que siga recomendaciones de dosificacion para que el piso tenga buena adherencia, ya que se evicendia desprendimiento de material. **POR PARTE DE INTERVENTORIA NO SE DARA AVAL DE INSTALACION EPDM HASTA QUE NO SE MEJORE LAS CONDICIONES DE ADHERENCIA Y NIVELACION DE SBR**

9,2 Se recomienda a contratistas terminar con las actividades pendientes del shut de basuras para hacer entrega a la institucion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
AVANCES PLATAFORMA SHUT DE BASURA	INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR	INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR	INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR
			
INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR	INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR	INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR	INSTALACION DE SBR PATIO PREESCOLAR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	30	
20/05/2024	26/05/2024	

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	FRANCISCO MIRANDA	DIAGONAL 41 SUR #73ª-80	KENNEDY

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

		Semana No.	30	Fecha de corte:	domingo, 26 de mayo de 2024			
			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
FRANCISCO MIRANDA	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
VALOR PARCIAL	7-nov-23	14-mar-24	508.777.489,13	100,00%	100,00%	97,01%	2,99%	493.571.160,92
TOTAL			**508.777.489,13**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	14-mar-24	pendiente que el contratista termine actividades de tanque de almacenamiento aquacell y excavacion e instalacion de redes de aguas lluvias, terminar remates de cubierta, ventanas, muros cuhilla frontales y posteriores en superboard, pintura y acabados y remates en cubiertas de aulas de sistemas. Falta remates de pintura, adecuacion teja en aulas tercer piso y acabados pendientes
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	14-mar-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1 el contratista no avanza mas con la submuración del la excavacion del tanque aquacell, se solicita al cotratista realizar estas actividades.

7.2 el contratista avanza con la instalacion de dinteles en superboard en aulas de sistemas, se instalan las ventanas y se realiza avances en pintura

7.3 el contratista realiza instalacion de luminiarias, tomacorrientes e interruptores en aulas de sistemas

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
Se solicita al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevo personal a obra.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en altura desarrollados en el Colegio San Bernardino y Dile Bosa.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad

9. Observaciones:

9,1, SE SOLICITA A CONTRATISTA INTERVENCION URGENTE DE AULAS DE SISTEMAS Y REMATES FALTANTES EN CUBIERTAS SALONES TERCER PISO
9,2 El porcentaje de avance se refleja menor vs el informe de la semana anterior ya que para este informe se actualizan cantidades de ejecucion, sin estimar los adicionales que son el tanque aquacell, la redes otic y electricas aulas de sistemas, los tableros electricos y redes electricas a reemplazar llegando asi a un prespuesto general total de $ 791.128.351,73
9,3 Pendiente que contratista presente cotizacion de arreglos tableros y redes electricas de acuerdo a lo solicitado por la SED

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
INSTALACION DE AISLANTE EN ICOPOER DINTELES AULAS DE SISTEMAS	INSTALACION DE AISLANTE EN ICOPOER DINTELES AULAS DE SISTEMAS	ESTADO A LA FECHA EXCAVACION TANQUE	ESTADO A LA FECHA EXCAVACION TANQUE
			
MASILLA Y DETALLES PARA DINTELES SUPERBOARD AULA DE SISTEMAS	MASILLA Y DETALLES PARA DINTELES SUPERBOARD AULA DE SISTEMAS	ESTADO A LA FECHA EXCAVACION TANQUE	MASILLA Y DETALLES PARA DINTELES SUPERBOARD AULA DE SISTEMAS
			
MASILLA Y DETALLES PARA DINTELES SUPERBOARD AULA DE SISTEMAS	ESTADO A LA FECHA EXCAVACION TANQUE	INSTALACION DE LUMINARIAS AULAS DE SISTEMAS E INSTALACION DE PINTURA	INSTALACION DE LUMINARIAS AULAS DE SISTEMAS E INSTALACION DE PINTURA
			
INSTALACION DE LUMINARIAS AULAS DE SISTEMAS E INSTALACION DE PINTURA	INSTALACION DE LUMINARIAS AULAS DE SISTEMAS E INSTALACION DE PINTURA	INSTALACION DE VENTANAS AULAS DE SISTEMAS	INSTALACION DE VENTANAS AULAS DE SISTEMAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	30
20/05/2024	26/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	BOSANOVA	CALLE 59B SUR # 8-72	BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	30	Fecha de corte:	domingo, 26 de mayo de 2024		
	Ppto.		% Ejecución Acumulado		

BOSANOVA	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
VALOR PARCIAL	15-abr-24	28-jun-24	235.786.410,59	100,00%	24,00%	20,08%	3,92%	47.347.419,33
TOTAL			**235.786.410,59**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	28-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24

6. Pendientes

Instalacion de enchapes primer y segundo piso, instalacion de cubierta patio, suministro e instalacion de ventaneria aulas, construccion de cuarto para camilla, pintura para fachada, instalacion de pelicula san blasting y ventaneria instalada y proyectada, pitura de fachadas internas, instalacion de rejas de proteccion, pintura de salones

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7,1 Avances instalacion enchape escaleras

7,2 Avances instalacion de ventanerida, pulida de piso aulas 209-207-206 para entrega parcial al colegio

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. . SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: la interventoria realiza acompañamiento en instalacion de enchape psio y avance de fabricacion e instalación de ventaneria

8.2. . Componente ambiental
Se solicita al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevo personal a obra.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en altura desarrollados en el Colegio San Bernardino y Dile Bosa.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas.

8.4. .Componente calidad

9. Observaciones:

9,1 Se recomienda el suministros de materiales, ventaneria y cubierta para poder poner al dia la programacion acordada con la institucion educativa, se recomienda realizar fabricacion en taller de ventaneria de todos los salones para que se reduzcan los tiempos en obra.
9,2 se Evidencia que no esta el suficiente personal para el ritmo de obra, se recomienda a contratista mejorar rendimiento y suminitro de material.
9,3 Se recomienda actualizar la programacion por etapas de dos salones hasta el 14 de junio y en temporada vacacional terminar zonas faltantes
9,4 Se realiza entrega parcial de aulas 209-207-206 a la institucion para poder liberar otrs salones, sin embargo estas aulas quedan con pendientes de guardaescobas, remates ventaneria pintura.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
ENCHAPE ESCALERAS	**ENCHAPE ESCALERAS**	**ENCHAPE ESCALERAS**	**ENCHAPE ESCALERAS**

			
VENTANERIA INSTALADA SALONES SEGUNDO PISO	ENTREGA PROVISIONAL DE SALONES	PASILLO SEGUNDO PISO	PULIDO DE PISO SALONES
			
PULIDO DE PISO SALONES	VENTANERIA INSTALADA SALONES SEGUNDO PISO	PASILLO SEGUNDO PISO	VENTANERIA INSTALADA SALONES SEGUNDO PISO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	30
20/05/2024	26/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	DILE BOSA	CALLE 61 SUR # 80H-28	BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No.	No. CO1.PCCNTR.5305583
Objeto:	Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:		$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. CO1.PCCNTR.5313251
Objeto:	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".
Contratista:	CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	30	Fecha de corte:	domingo, 26 de mayo de 2024		
	Ppto.		% Ejecución Acumulado		

DILE BOSA	Fecha inicio/Final		Valor	%/Total	Prog.	Real	Diferencia	Inversión
VALOR PARCIAL	6-may-24	28-jun-24	409.403.236,43	100,00%	30,00%	16,15%	13,85%	66.129.719,29
TOTAL			**409.403.236,43**	**100,00%**	-			

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	28-jun-24	
Adelanto/Atraso (Días):		Terminacion desmonte de cielo raso, reforzamiento estructura y cambio de cubierta fase 1 y fase 2
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7,1 El contratista avanza con la pintura de la estructura existente zona de atencion al usuario

7,12 El contratista avanza con fabricacion de estructura para cubierta de zona administrativa

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.2. . Componente ambiental
Se solicita al contratista de obra realizar la protección de los individuos arbóreos en las actividades externas del colegio La Concepción
- Se solicita al contratista mantener los acopios de materiales granulares cubiertos y señalizados.
- Se le reitera al contratista de obra realizar jornadas de orden y aseo diariamente al finalizar las jornadas de trabajo.

8.3. .Componente SST
- Se recibe documentación para el ingreso de nuevo personal a obra.
- Se continúa a la espera de recibir el informe SST N°6 subsanado por parte del contratista de obra.
- Se reitera al contratista de obra dar cumplimiento a la Resolución 4272 de 2021, con relación a los trabajos en altura desarrollados en el Colegio San Bernardino y Dile Bosa.
- Se continúa reiterando al contratista de obra tomar las medidas preventivas en la zona de excavación del colegio Francisco de Miranda, donde aún no se toman las medidas preventivas y de seguridad solicitadas..

8.4. .Componente calidad

9. Observaciones:

El contratista hace cambio de personal, se considera un atrasoconsiderable respecto a la programacion y por parte de la direccion local de Bosa y de la SED en conjunto de la interventoria, se le manifiesta al contratista ponerse al dia en programacion y ejecutar las actividades lo antes posible. Se realiza acta con personal del Dile con los compromisos de acta de vecindad y avance de actividades proxima semana. Hasta el momento no se han cumplido compromisos y los avances de obra no se han ejecutado de acuerdo a programacion

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
ESTADO A LA FECHA AREA DE ATENCION AL USUARIO	PINTURA DE CERCHAS EXISTENTES EN ZONA DE ATENCION AL USUARIO	ESTADO A LA FECHA AREA DE ATENCION AL USUARIO	ESTADO A LA FECHA AREA DE ATENCION AL USUARIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	30
20/05/2024	26/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C	CARRERA 89 BIS No. 85 A 20 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 30 — Fecha de corte: 26/05/2024

CARLOS ALBAN HOLGUIN. SEDE C	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	30-oct-23	31-may-24	$ 1.544.151.602,35	100,00%	98,54%	64,32%	-34,22%	993.198.310,63
TOTAL			**1.544.151.602,35**	**100,00%**	**-**		**-34,22%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	31-may-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	31-may-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista avanzar en el desarrollo de obra en las cubiertas de la Sede Educativa

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Avanza la instalación de la teja sándwich de la cubierta en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A; pendiente las tapas laterales.

7.2. Avanza el pañete de muros en las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.

7.3. Avanza la fundida de alfajías en las ventanas de las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.

7.4. Se desmonta el piso de las Aulas No. 3, 4 y 5 del Bloque A.

7.5. Se instalan vidrios en las puertas de los baños

7.6. Avanza la instalación de rejillas superiores en las aulas del Bloque B.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:


8.1. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST
- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1.Durante la semana pasada no registra avance de obra, dado que las actividades realizadas fueron resanes y subsanación de observaciones formuladas a la calidad de la obra

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

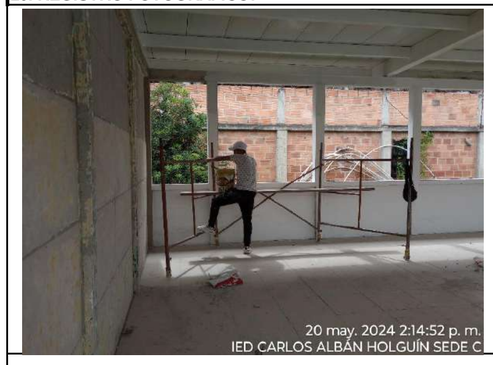

ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE A



ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE A



ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE A



ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE A



ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE A



ESTUCO DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE A



FUNDIDA DE ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE A



FUNDIDA DE ALFAJÍAS EN LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE A

			
SE DESMONTA EL PISO CERÁMICO DE LAS AULAS DEL BLOQUE A	**SE DESMONTA EL PISO CERÁMICO DE LAS AULAS DEL BLOQUE A**	**SE DESMONTA EL PISO EN VINISOL DEL AULA DE SISTEMAS**	**SE DESMONTA EL PISO EN VINISOL DEL AULA DE SISTEMAS**
			
SE FUNDE EL SOLADO DE LIMPIEZA DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR	**SE FUNDE EL SOLADO DE LIMPIEZA DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR**	**SE FUNDE EL SOLADO DE LIMPIEZA DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR**	**SE FUNDE EL SOLADO DE LIMPIEZA DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN DEL CERRAMIENTO POSTERIOR**
			
AVANZA LA INSTALACIÓN DE LAS REJILLAS SUPERIORES DE LAS AULAS DEL BLOQUE B	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LAS REJILLAS SUPERIORES DE LAS AULAS DEL BLOQUE B**	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LAS REJILLAS SUPERIORES DE LAS AULAS DEL BLOQUE B**	**AVANZA LA INSTALACIÓN DE LAS REJILLAS SUPERIORES DE LAS AULAS DEL BLOQUE B**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	30
20/05/2024	26/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	SAN BERNARDINO	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 30 — Fecha de corte: 26/05/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
SAN BERNARDINO	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	30-oct-23	1-mar-24	$ 900.000.000,00	100,00%	100,00%	87,50%	-12,50%	787.500.000,00
TOTAL			**900.000.000,00**	**100,00%**	**-**		**-12,50%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	1-mar-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	1-mar-24

6. Pendientes

* Esta pendiente que el Contratista finalice la obra en la cubierta de Auditorio y que presente una programación actualizada que incluya todas las actividades pendientes por ejecutar.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Se desmontan las tejas de asbesto cemento de la cubierta del área de orientación.

7.2. Inicia la instalación de la teja tipo sándwich de la cubierta del área de orientación.

7.3. Queda pendiente un espejo en el baño de hombres del tercer piso

7.4. Se instala la puerta de acceso posterior a la Sede Educativa

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. Se realiza un ajuste al balance de esta Sede Educativa, depurando las actividades que no se van a ejecutar e incorporando las actividades requeridas por la supervisión del contrato durante el recorrido conjunto del 27 de febrero de 2024 y se proyecta un presupuesto estimado en $ 900.000.000

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



INSTALACIÓN DE UNA NUEVA PUERTA EN EL ACCESO POSTERIOR



INSTALACIÓN DE UNA NUEVA PUERTA EN EL ACCESO POSTERIOR



INSTALACIÓN DE UNA NUEVA PUERTA EN EL ACCESO POSTERIOR



INSTALACIÓN DE UNA NUEVA PUERTA EN EL ACCESO POSTERIOR



DETALLES POR SUBSANAR EN EL ANCLAJE DEL MARCO DE LA PUERTA AL MURO



DETALLES POR SUBSANAR EN EL ANCLAJE DEL MARCO DE LA PUERTA AL MURON



DETALLES POR SUBSANAR EN EL ANCLAJE DEL MARCO DE LA PUERTA AL MURO



DETALLES POR SUBSANAR EN EL ANCLAJE DEL MARCO DE LA PUERTA AL MURO

			
DESMONTE DE LA TEJA DE ASBESTO CEMENTO EN EL ÁREA DE ORIENTACIÓN	**DESMONTE DE LA TEJA DE ASBESTO CEMENTO EN EL ÁREA DE ORIENTACIÓN**	**INSTALACIÓN DE LA LÁMINA INFERIOR DE LA TEJA TIPO SÁNDWICH EN LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN**	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN**
			
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN**	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN**	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN**
			
INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN**	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN**	**INSTALACIÓN DE LÁMINA INFERIOR DE LA CUBIERTA DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	30
20/05/2024	26/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JORGE ISAACS IED	CALLE 73 SUR - 91 - 35	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	30	Fecha de corte:	26/05/2024

			Ppto.		% Ejecución Acumulado			
JORGE ISAACS IED	**Fecha inicio/Final**		**Valor**	**%/Total**	**Prog.**	**Real**	**Diferencia**	**Inversión**
	7-nov-23	6-ene-23	133.128.173,40	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	133.128.173,40
TOTAL			**133.128.173,40**	**100,00%**	**-**		**0,00%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	6-ene-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	6-ene-24

6. Pendientes

* Queda pendiente la aprobación del NP para la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. No se desarrollan actividades de obra esta semana

7.2. Sigue pendiente la aprobación por parte de la SED de los NP que permitan culminar la tarea de instalación del piso de la tarima

7.3. Siguen sin atenderse la subsanación de algunos puntos críticos donde se despegó la soldadura en los pasamanos de las escaleras

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Interventoría solicita al Contratista avanzar en las actividades de obra programadas para este frente

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se verifican condiciones de trabajo del personal de obra

9. Observaciones:

9.1. Queda pendiente la aprobación del NP para la instalación del nuevo piso de la tarima en el patio central

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA



PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA



PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA



PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA



PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA



PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA



PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA



PENDIENTE INSTALACIÓN DEL PISO DE LA TARIMA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	30
20/05/2024	26/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	JOSÉ ANTONIO GALÁN	CARRERA 78 J No. 58 M - 22 SUR	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 30 — Fecha de corte: 26/05/2024

JOSÉ ANTONIO GALÁN	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	11-abr-24	29-jun-24	$ 543.111.193,70	100,00%	42,00%	11,57%	-30,43%	62.837.965,11
TOTAL			**543.111.193,70**	**100,00%**	**-**		**-30,43%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación

Fecha de Terminación:	28-jun-24
Adelanto/Atraso (Días):	
Fecha Proyectada de Terminación:	28-jun-24

6. Pendientes

* Se solicita al Contratista dinamizar el proceso de obra, para cerrar la brecha de atraso evidenciada con el avance programado.

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Repañetado de muros en las aulas del segundo piso del Bloque A.

7.2.Se realizan preparativos para la instalación de la estructura metálica en dos aulas del segundo piso del Bloque A.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1. Se debe dinamizar el proceso de instalación de la nueva cubierta del segundo piso del Bloque A.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO BLANCO A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA



APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO BLANCO A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA



APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO BLANCO A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA



APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO BLANCO A LA ESTRUCTURA METÁLICA DE LA CUBIERTA



DESMONTE DE LA TEJA EN ASBESTO CEMENTO



DESMONTE DE LA TEJA EN ASBESTO CEMENTO



DESMONTE DE LA TEJA EN ASBESTO CEMENTO



DESMONTE DE LA TEJA EN ASBESTO CEMENTO

			
SE HA CORRIDO EL PLÁSTICO DE PROTECCIÓN DE LAS AULAS SIN CUBIERTA	**SE HA CORRIDO EL PLÁSTICO DE PROTECCIÓN DE LAS AULAS SIN CUBIERTA**	**SE HA CORRIDO EL PLÁSTICO DE PROTECCIÓN DE LAS AULAS SIN CUBIERTA**	**SE HA CORRIDO EL PLÁSTICO DE PROTECCIÓN DE LAS AULAS SIN CUBIERTA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	30
20/05/2024	26/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	RURAL LA CONCEPCIÓN	TRANSVERSAL 87 B No. 79 - 51 SUR	07 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A

			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No.	30	Fecha de corte:	26/05/2024

RURAL LA CONCEPCIÓN	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	18-mar-24	29-jun-24	$ 253.510.561,00	100,00%	44,00%	14,47%	-29,53%	36.682.978,18
TOTAL			**253.510.561,00**	**100,00%**	**-**		**-29,53%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	29-jun-24	No se evidencia personal de obra ni ejecución de actividades durante la semana.
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. Se aumenta la altura de la demolición del pañete en el muro posterior de la Ludoteca y la Biblioteca.

7.2. Continúa la demolición del pañete exterior en la fachada lateral y posterior.

7.3. Excavación para el cárcamo lateral hacia el sumidero de la esquina.

7.4. Excavación para base del andén perimetral de la parte posterior.

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORIA:

8.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES: Para el presente contrato de hace un ajuste en conjunto con el Contratista al balance del presente frente de obra

8.3. COMPONENTE AMBIENTAL
- Se solicita al Contratista demarcar los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.4. COMPONENTE SST
- Se informa al Contratista acerca de la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra, en particular el color de los overoles

9. Observaciones:

9.1. Se debe avanzar en la obra exterior del proyecto para garantizar el control de humedad en el primer piso

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:



EXCAVACIÓN PARA CÁRCAMO LATERAL



EXCAVACIÓN PARA CÁRCAMO LATERAL



EXCAVACIÓN PARA CÁRCAMO LATERAL



EXCAVACIÓN PARA CÁRCAMO LATERAL



INICIO DEL CÁRCAMO LATERAL



DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXTERIOR EN LA FACHADA LATERAL Y POSTERIOR



DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXTERIOR EN LA FACHADA LATERAL Y POSTERIOR



TUBO QUE CONDUCE AL SUMIDERO DE LA ESQUINA

			
VERIFICANDO QUE EL AGUA LLEGA AL SUMIDERO DE LA ESQUINA	**VERIFICANDO QUE EL AGUA LLEGA AL SUMIDERO DE LA ESQUINA**	**EXCAVACIÓN PARA CÁRCAMO LATERAL**	**DEMOLICIÓN DE PAÑETE EXTERIOR EN LA FACHADA LATERAL Y POSTERIOR**
			
PUESTA A TIERRA EXISTENTE, SIN TUBERÍA	**DESAGÜE DE UNA TERRAZA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR**	**ACOPIO DE RCD PARA SER RETIRADOS DEL SITIO DE OBRA**	**ACOPIO DE RCD PARA SER RETIRADOS DEL SITIO DE OBRA**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

Reporte Semanal

	30
20/05/2024	26/05/2024

INTERVENTORIA
CONSORCIO SANTA MARIA 022

1. Datos Generales

Nombre:	COLEGIO	DIRECCION	Localidad:
	EL MOTORISTA	CALLE 57 N BIS SUR No. 75 F - 27	7 - BOSA

2. Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA No. No. CO1.PCCNTR.5305583

Objeto: Contrato No. CO1.PCCNTR.5305583 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: UNION TEMPORAL GEPM 2023-1

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.		F.S. #02	F.R.#2	F.T.
30-oct-23	8 MESES	29-jun-24	N/A	29-jun-24		N.A	N.A	N.A
					Suspensión (días)			
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 6.738.166.067,00						
Adición No. 01 >:		$ -						
Anticipo:	0%	$ -						
Retegarantía:								
		Neto Acta						
		Acumulado						

3. Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. No. CO1.PCCNTR.5313251

Objeto: INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Contratista: CONSORCIO SANTA MARIA 022

F.I.	PLAZO	F.T.	Adición días	F.T.	Suspensión (días)	F.S.	F.R.	F.T.
30-oct-23	9 MESES	29-jul-24	N/A	29-jul-24	N.A	N.A	N.A	N.A
			Acta 1	Acta 2	Acta 3	Acta 4	Acta 5	Acta 6
Valor Contrato:		$ 504.080.587,00						
Adición:								
Anticipo:		-						
Retegarantía:		-						
		Neto Acta						
		Acumulado						

4. Programación.

Semana No. 30 — Fecha de corte: 26/05/2024

EL MOTORISTA	Fecha inicio/Final		Ppto. Valor	%/Total	% Ejecución Acumulado Prog.	Real	Diferencia	Inversión
	15-abr-24	29-jun-24	$ 246.835.890,70	100,00%	56,69%	20,30%	-36,39%	50.107.685,81
TOTAL			**246.835.890,70**	**100,00%**	**-**		**-36,39%**	**$0,00**

5. Estado de la Programación		6. Pendientes
Fecha de Terminación:	29-jun-24	* Queda pendiente el diseño del detalle constructivo de la placa de contrapiso, por parte de la Entidad Contratante.
Adelanto/Atraso (Días):		
Fecha Proyectada de Terminación:	29-jun-24	

7 ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRATISTA DE OBRA:

7.1. No se desarrollan actividades de obra durante la semana

7.2. Los resultados de las densidades del piso fueron satisfactorios

8 ACTIVIDADES REALIZADAS POR INTERVENTORÍA:

8.1. COMPONENTE AMBIENTAL

- Se verifica que el Contratista haya demarcado los sitio de acopio de material desmontado de obra y escombros producidos por la obra.

8.2. COMPONENTE SST

- Se verifica que el Contratista esté cumpliendo con la dotación y EPP que deben tener los trabajadores en el sitio de obra.

9. Observaciones:

9.1. Para el presente informe semanal, El Contratista presentó una programación ajustada que permite identificar con certeza el porcentaje real de avance ejecutado. De igual manera, presenta un presupuesto que incorpora el conjunto de actividades solicitadas por la Supervisión del Contrato, incluyendo las especificaciones de la placa de contrapiso del nuevo patio. Queda pendiente por parte de la SED, el diseño del detalle de esta placa.

10. REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO
			
TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO

			
TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO	**TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO**	**TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO**	**TERRENO COMPACTADO A LA ESPERA DEL MATERIAL PARA LA PLACA DE CONTRAPISO**

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (001)



CUARTO DE RACK

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (002)



AULA DE INGLES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (003)



AULA DE INGLES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (004)



PAÑETE CUARTO RACK

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (005)



PISO AULA INGLES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (006)



CUARTO RACK

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (007)



ENTREGAS CUARTO RACK E INGLES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (008)



CUARTO INGLES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (009)



CUARTO INGLES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (010)



BARANDAS GRADERIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO MANUEL CEPEDA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (011)



BARANDAS PATIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (012)



CIELO RASO SALONES PRIMER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (013)



ENCHAPE PISO SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (014)



REJAS VENTANERIA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (015)



ENCHAPE PISO SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (016)



INSTALACION DE CIELO RASO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (017)



PINTURA SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (018)



PINTURA SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (019)



PINTURA SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (020)



SALIDAS PARA LUMINARIAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (021)



PINTURA SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (022)



LUMINARIAS SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (023)



PISNTURA SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (024)



REEMBOQUILLADO DE MUROS SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (025)



SALONES EN USO PRIMER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (026)



PINTURA SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (027)



REEMBOQUILLADO SALONES SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (028)



PINTURA SALONES SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RODRIGO DE TRIANA SEDE C**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (029)



PINTURA SALONES SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (030)



CANALES PATIO PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (031)



ACABADOS SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (032)



ACABADOS SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (033)



CANAL SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (034)



PLATAFORMA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (035)



PLATAFORMA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (036)



INSTALACION DE SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (037)



INSTALACION DE SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (038)



BARANDAS Y PLATAFORMA SHUT DE BASURAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (039)



INSTALACION DE SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (040)



INSTALACION DE SBR PISO CAUCHO PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (041)



INSTALACION DE EPDM COLO PISO CAUCHO PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (042)



INSTALACION DE EPDM COLO PISO CAUCHO PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO VILLA RICA SEDE B**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (043)



INSTALACION DE EPDM COLO PISO CAUCHO PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (044)



ESTRUCTURA DINTELES SUPERBOARD

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (045)



ESTRUCTURA DINTELES SUPERBOARD

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (046)



SALIDAS LUMINARIAS AULAS DE SISTEMAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (047)



DINTELES EN SUPERBOARD

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (048)



DINTELES EN SUPERBOARD

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (049)



SUBMURACION DE EXCAVACION TANQUE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (050)



DINTELES EN SUPERBOARD CON AILSAMIENTO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (051)



LUMINARIAS AULAS DE SISTEMAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (052)



ACABADOS AULAS DE SISTEMAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (053)



VENTANERIAS AULAS DE SISTEMAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (054)



VENTANERIAS AULAS DE SISTEMAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (055)



ACABADOS AULAS DE SISTEMAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (056)



ACABADOS AULAS DE SISTEMAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO BOSANOVA SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (057)



ENCHAPE PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO BOSANOVA SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (058)



ENCHAPE PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO BOSANOVA SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (059)



ENCHAPE PSIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO BOSANOVA SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (060)



INSTALACION DE VENTANERIA SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO BOSANOVA SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (061)



INSTALACION DE VENTANERIA SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO BOSANOVA SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (062)



PULIDA DE PISO SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO BOSANOVA SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (063)



INSTALACION DE VENTANERIA SALONES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO BOSANOVA SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (064)



ENCHAPE DE PISO HALL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO BOSANOVA SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (065)



ENCHAPE PISO PASILLOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO BOSANOVA SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (066)



ENCHAPE ESCALERAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO BOSANOVA SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (067)



INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO BOSANOVA SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (068)



INSTALACION DE PUERTAS EN ALUMINIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**DILE BOSA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (069)



PINTURA Y CAMBIO DE CUBIERTA ATENCION AL USUARIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**DILE BOSA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (069)



RESANE DE MUROS ATENCION AL USUSARIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**DILE BOSA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (069)



RESANE DE MUROS ATENCION AL USUSARIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**DILE BOSA**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (069)



PINTURA Y CAMBIO DE CUBIERTA ATENCION AL USUARIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (001)



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (002)



PINTURA GRIS EN EL MURO DEL FONDO EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (003)



INICIA LA INSTALACIÓN DE PUERTAS EN LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (004)



PINTURA NARANJA EN EL MURO DEL FONDO EN LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (005)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL HALL DE AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (006)



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA EN EL HALL DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (007)



INSTALACIÓN DE CERRADURAS Y MANIJAS EN PUERTAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (008)



INSTALACIÓN DE BANDA ANTIMACHUCÓN EN PUERTAS DE LAS AULAS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (009)



RETIRO DEL GRANO CAUCHO DE LA PISTA ATLÉTICA DETRÁS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (010)



RETIRO DEL GRANO CAUCHO DE LA PISTA ATLÉTICA DETRÁS DEL BLOQUE B

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (011)



PINTURA NARANJA EN EL MURO DEL FONDO EN EL AULA DE SISTEMAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (012)



AVANZA EL RESANE DE MUROS EN LAS AULAS DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (013)



PINTURA DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (014)



PINTURA DE LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LA CUBIERTA DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (015)



PINTURA KORAZA BLANCA EN MURO CULATA DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (016)



PINTURA KORAZA GRIS EN FACHADA POSTERIOR DEL BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (017)



FACHADA INTERNA EN LAS AULAS DE LOS BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (018)



SE TRASLADAN LOS ESTUDIANTES A LAS AULAS DE LOS BLOQUE C

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (019)



INICIA LA INSTALACIÓN DE POLISOMBRA PARA EL CERRAMIENTO DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (020)



INICIA LA INSTALACIÓN DE POLISOMBRA PARA EL CERRAMIENTO DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (021)



INICIA REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS EN LAS AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (022)



INICIA LA EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA EL CERRAMIENTO POSTERIOR EN MAMPOSTERÍA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (023)



INICIA EL DESMONTE DE PUERTAS DE LAS AULAS DEL FONDO DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (024)



INICIA EL DESMONTE DE PUERTAS DE LAS AULAS DEL FONDO DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (025)



INICIA LA DEMOLICIÓN DE ALFAJÍAS EN LAS AULAS DEL FONDO DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (026)



EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA LOS PEDESTALES DEL CERRAMIENTO EN MAMPOSTERÍA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (027)



CONTINÚA REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (028)



INICIA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (029)



INICIA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (030)



ENCOFRADO DE ALFAJÍAS EN VENTANAS DE AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (031)



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE C - SAN JOSÉ**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (032)



CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AULAS 3, 4 Y 5 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (033)



CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (034)



CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (035)



CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (036)



CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA VERDE VANDALIZADO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (037)



PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (038)



PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (039)



PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (040)



PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (041)



PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (042)



PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (043)



PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (044)



PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (045)



CERRAMIENTO EN POLISOMBRA VANDALIZADO POR LOS ESTUDIANTES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (046)



PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (047)



PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JORGE ISAACS I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (048)



PISO REUTILIZADO EN LA TARIMA DEL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (049)



CARGUE DE MORTERO DE NIVELACIÓN EN PLACA PLANA DE LA CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (050)



CARGUE DE MORTERO DE NIVELACIÓN EN PLACA PLANA DE LA CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (051)



MEDIA CAÑA EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (052)



MEDIA CAÑA EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (053)



DOMO ACRÍLICO ROTOS EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (054)



DOMO ACRÍLICO ROTOS EN LA PLACA PLANA DE CUBIERTA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (055)



REMATES FINALES EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO. PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (056)



REMATES FINALES EN EL BAÑO DE MUJERES DEL SEGUNDO PISO. PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (057)



REMATES FINALES EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO. PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (058)



REMATES FINALES EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL SEGUNDO PISO. PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (059)



REMATES FINALES EN EL BAÑO DE MUJERES DEL TERCER PISO. PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (060)



REMATES FINALES EN EL BAÑO DE HOMBRES DEL TERCER PISO. PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LOS ESPEJOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (061)



INSTALACIÓN PRIMERA CAPA TELA ACRÍLICA EN LAS CUBIERTAS PLANAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (062)



INSTALACIÓN PRIMERA CAPA TELA ACRÍLICA EN LAS CUBIERTAS PLANAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (063)



INSTALACIÓN PRIMERA CAPA TELA ACRÍLICA EN LAS CUBIERTAS PLANAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (064)



INSTALACIÓN PRIMERA CAPA TELA ACRÍLICA EN LAS CUBIERTAS PLANAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (065)



INSTALACIÓN PRIMERA CAPA TELA ACRÍLICA EN LAS CUBIERTAS PLANAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (066)



INSTALACIÓN PRIMERA CAPA TELA ACRÍLICA EN LAS CUBIERTAS PLANAS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (067)



REUNIÓN CON LA SED EN EL AUDITORIO, PARA DEFINIR RUTA DE INTERVENCIÓN

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (068)



REUNIÓN CON LA SED EN EL AUDITORIO, PARA DEFINIR RUTA DE INTERVENCIÓN

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (069)



FILTRACIONES DE AGUA EN LA CUBIERTA DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024


FOTOGRAFÍA (070)



FILTRACIONES DE AGUA EN LA CUBIERTA DEL AUDITORIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (071)

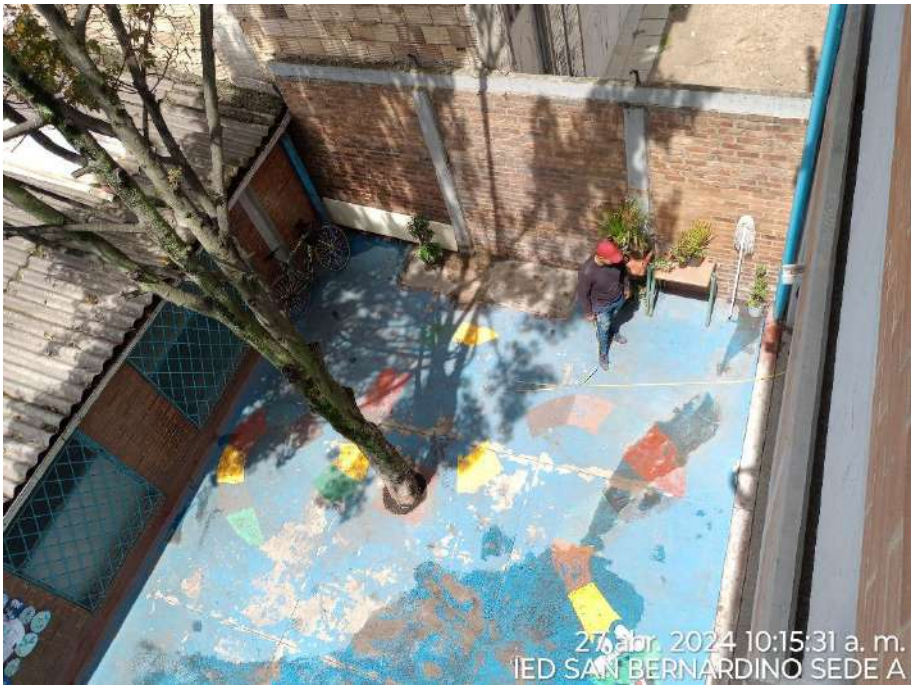

VERIFICACIÓN DE MEDIDAS EN EL PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (072)



VERIFICACIÓN DE MEDIDAS EN EL PATIO DE PREESCOLAR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (073)



PENDIENTE EN CAMBIO DE LA PUERTA DE ACCESO POSTERIOR

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (074)



PENDIENTE LA INSTALACIÓN DE LA ESCALERA DE ACCESO A LOS TANQUES ELEVADOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (075)



LA I.E.D. RETIRO EL CERRAMIENTO Y OCUPÓ EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO SAN BERNARDINO I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (076)



LA I.E.D. RETIRO EL CERRAMIENTO Y OCUPÓ EL PATIO CENTRAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (077)



CERRAMIENTO CON POLISOMBRA DOBLE ALTURA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (078)



SEÑALIZACIÓN EN EL CERRAMIENTO PROVISIONAL DE OBRA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (079)



INICIA LA RED HIDROSANIARIA EN EL ÁREA DE MÓDULOS DEL PRIMER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (080)



INICIA LA RED HIDROSANIARIA EN EL ÁREA DE MÓDULOS DEL PRIMER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (081)



LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL CUBÍCULO DE VIGILANTES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (082)



PERFILERÍA DE CIELO RASO EN EL CUBÍCULO DE VIGILANTES

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (083)



ACOPIO DE RCD EN EL ÁREA DE TRABAJO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (084)



ÁREA DISPONIBLE PARA UN CUARTO DE DEPÓSITO EN EL PRIMER PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (085)



EL CUBÍCULO DE VIGILANTES SE UTILIZA COMO CUARTO DE REFRIGERIOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (086)



EL CUBÍCULO DE VIGILANTES SE UTILIZA COMO CUARTO DE REFRIGERIOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (087)



LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE MÓDULOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (088)



LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE MÓDULOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (089)



EXCAVACIÓN DE LA CAJA DE INSPECCIÓN EN EL ÁREA DE MÓDULOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (090)



EXCAVACIÓN DE LA CAJA DE INSPECCIÓN EN EL ÁREA DE MÓDULOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (091)



INICIA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (092)



INICIA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (093)



LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE MÓDULOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (094)



LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE MÓDULOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (095)



EXCAVACIÓN DE LA CAJA DE INSPECCIÓN EN EL ÁREA DE MÓDULOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (096)



EXCAVACIÓN DE LA CAJA DE INSPECCIÓN EN EL ÁREA DE MÓDULOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (097)



FINALIZA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (098)



FINALIZA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (099)



FINALIZA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (100)



FINALIZA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (101)



LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE MÓDULOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (102)



LAMINADO DE MUROS EN FIBROCEMENTO EN EL ÁREA DE MÓDULOS

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (103)



PENDIENTE APROBACIÓN DE NP PARA EL PISO DE LA TARIMA

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO RURAL LA CONCEPCIÓN I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (104)



FINALIZA LA DEMOLICIÓN DE PAÑETES EN LA LUDOTECA INFANTIL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (105)



INICIA EL DESMONTE DE CIELOS RASOS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (106)



INICIA EL DESMONTE DE CIELOS RASOS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (107)



INICIA EL DESMONTE DE CIELOS RASOS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (108)



INICIA EL DESMONTE DE LÁMPARAS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (109)



INICIA EL DESMONTE DE LÁMPARAS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (110)



INICIA EL DESMONTE DE VENTANAS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (111)



INICIA EL DESMONTE DE PUERTAS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (112)



INICIA EL DESMONTE DE PUERTAS EN LAS AULAS DEL PISO 2 DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (113)



CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA CONTROL DE ACCESO AL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (114)



CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA CONTROL DE ACCESO AL SEGUNDO PISO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (115)



CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA EL ÁREA PARA ACOPIO DE MATERIALES Y RCD

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (116)



CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA EL ÁREA PARA ACOPIO DE MATERIALES Y RCD

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (117)



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS EN LAS AULAS DEL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (118)



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS EN LAS AULAS DEL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (119)



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS EN LAS AULAS DEL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (120)



REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS EN LAS AULAS DEL SEGUNDO PISO DEL BLOQUE A

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (121)



INICIA LA FUNDIDA DE ALFAJÍAS PARA LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL PISO 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN I.E.D. SEDE A - PRINCIPAL**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (122)



INICIA LA FUNDIDA DE ALFAJÍAS PARA LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL PISO 2

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (123)



CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL OBRA CON POLISOMBRA VERDE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (124)



CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL OBRA CON POLISOMBRA VERDE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (125)



CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL OBRA CON POLISOMBRA VERDE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (126)



CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL OBRA CON POLISOMBRA VERDE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (127)



CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL OBRA CON POLISOMBRA VERDE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (128)



CERRAMIENTO PROVISIONAL DEL OBRA CON POLISOMBRA VERDE

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (129)



DEMOLICIÓN DE MURO VECINO ADOSADO AL MURO DE LA I.E.D.

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (130)



DEMOLICIÓN DE MURO VECINO ADOSADO AL MURO DE LA I.E.D.

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (131)



EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (132)



EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (133)



INICIA EL PAÑETE DE MUROS DE LA I.E.D. HACIA EL FUTURO NUEVO PATIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (134)



INICIA EL PAÑETE DE MUROS DE LA I.E.D. HACIA EL FUTURO NUEVO PATIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (135)



INICIA EL PAÑETE DE MUROS DE LA I.E.D. HACIA EL FUTURO NUEVO PATIO

CONSORCIO SANTA MARIA 022	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
	CONSORCIO SANTA MARÍA 022
NOMBRE DEL PROYECTO:	"INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS."
LOZALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**COLEGIO EL MOTORISTA I.E.D. SEDE A**
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL GEPM 2023-1
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	CO1. PCCNTR. 5313251
MES DEL REPORTE:	30 DE ABRIL DE 2024 - 29 DE MAYO DE 2024

FOTOGRAFÍA (136)



INICIA EL PAÑETE DE MUROS DE LA I.E.D. HACIA EL FUTURO NUEVO PATIO
