Sábado. Abril 27 de 2024

Nota 314 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado y Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 315 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 29 de 2024

Nota 316 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 317 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Abril 30 de 2024.

Nota 318 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 319 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Mayo 02 de 2024

Nota 320 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 321 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Viernes. Mayo 03 de 2024

Nota 322 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 323 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Sábado. Mayo 04 de 2024.

Nota 324 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 325 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Lunes. Mayo 06 de 2024.

Nota 326 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 327 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Mayo 07 de 2024.

Nota 328 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 329 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Nota 330 NOTA DE INTERVENTORÍA: Se evidencia que se despegó la soldadura en algunos puntos de los pasamanos de las escaleras. Se solicita al Contratista subsanar esta garantía.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Mayo 08 de 2024

Nota 331 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 332 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Mayo 09 de 2024.

Nota 333 PERSONAL DE OBRA. 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Lluvioso. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 334 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Nota 335 NOTA DE INTERVENTORÍA: Sigue pendiente la aprobación por parte de la SED, de los NP's de la tarima del patio central.

Viernes. Mayo 10 de 2023.

Nota 336 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 337 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Sábado. Mayo 11 de. 2024.

Nota 338 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 339 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Martes. Mayo 14 de 2024.

Nota 340 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 341 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Miércoles. Mayo 15 de 2024.

Nota 342 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Lluvioso. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 343 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Nota 344 NOTA DE INTERVENTORÍA: Se reitera la solicitud al Contratista de subsanar la garantía de la soldadura que se despegó en diferentes puntos de los pasamanos de las escaleras de la sede Educativa.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Jueves. Mayo 16 de 2024

Nota 345 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA: Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Nublado y llovizna. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 346. ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Mayo 17 de 2024.

Nota 347 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 348 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Sábado. Mayo 18 de 2024.

Nota 349 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 350 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Lunes. Mayo 20 de 2024.

Nota 351 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente. 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 352 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Martes. Mayo 21 de 2024.

Nota 353 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado y Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 354 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Miércoles. Mayo 22 de 2024

Nota 355 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado y Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 356 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Jueves. Mayo 23 de 2024.

Nota 357 PERSONAL OBRA: Residente, Inspector. PERSONAL INTERVENTORÍA: Residente, Inspector. ESTADO DEL CLIMA Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 358 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Viernes. Mayo 24 de 2024.

Nota 359 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector.
ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 360 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Sábado. Mayo 25 de 2024.

Nota 361 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector.
ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado y lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 362 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Nota 363 ~~lunes~~ lunes 27 de Mayo de 2024
Personal de obra: sin personal
Personal interventoria: 1 Residente - 1 Inspector

Nota 364 sin actividades de obra

Nota 365 Martes 28 de Mayo de 2024
Personal de obra: sin personal
Personal interventoria: 1 Residente - 1 Inspector

Nota 366 sin actividades de obra

Nota 367 Miercoles 29 de Mayo de 2024
Personal de obra: sin personal
Personal interventoria: 1 Residente - 1 Inspector

Nota 368 sin actividades de obra

Nota 369 Jueves 30 de Mayo de 2024
Personal de obra: sin personal
Personal interventoria: 1 Residente - 1 Inspector

Nota 370 sin personal de obra

Nota 371 viernes 31 de mayo de 2024
personal de obra: sin personal
personal interventoría: Residente - y inspector

Nota 372 sin personal sin actividades de obra

las actividades de pañete y estuco. en ciertos muros aun siguen en la remoción de pintura y pañete.

Arq. Ana Pardo
Residente obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

UT. 6EPM.

Lunes 29 de Abril de 2024

Nota 025 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 3 ayudantes 2 oficiales, personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector Estado del clima: nublado.

Nota 026 Actividades ejecutadas: se continua con el pañete de muros y filos junto a la remoción de pintura y pañete.

Arq. Ana Pardo
Residente obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

UT 6EPM.

Martes 30 de Abril de 2024

Nota 027 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 3 oficiales. personal ~~ad~~ Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. Estado del clima: Nublado lluvioso.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 028 Actividades ejecutadas: remoción pintura pañete y o estuco con copa. pañete de muros y filos.

Arq. Ana Pardo
Residente obra

f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

UT EEPM

Jueves 02 de mayo de 2024

Nota 029 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 Residente sst, 1 maestro, 2 oficiales. personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. Estado de clima: Nublado

Nota 030 Actividades ejecutadas: se continua con remoción de pintura y o estuco, pañete en muros y filos de Ventaneria, columnas y Vigas.

Arq. Ana Pardo
Residente obra

f/ Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

UT EEPM.

Viernes 03 de mayo de 2024

Nota 031 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, 1 ayudante, 2 oficiales, Personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. Estado del clima. mañana nublado soleado tarde lluviosa

Nota 032 Actividades ejecutadas: se socializa con el colegio el desmonte de cubierta para el dia sabado 04 de

Norma

Powered by CamScanner

mayo lo cual obtenemos su aprobación mas solo faltaria confirmación de rectoria en su momento solo nos atendio la almacenista ~~marl~~ Patricia lo cual en la tarde nos notifican que no tenemos el permiso para dicha actividad se habla con el Arq. enrique campos notificando la situación lo cual el colegio nos avala el desmonte apartir del dia martes 07 de mayo teniendo 3 dias de retraso por dicha información tambien se solicito por parte del colegio que se hiciera por parte de los salones internamente y no todo el campo si no de 9 2 aulas. dicha información es notificada por llamada. lo cual se continua en el campo existente actividades ole pañete y remoción de pintura.

Arq. Ana Pardo.
Residente obra
U.E. Gepm.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Sabado 4 de mayo de 2024

Nota 033 personal obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst. 1 maestro, 2 oficiales, personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector, Estado del clima: lluvioso.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 034 Actividades ejecutadas: se continua con la remoción de pañete y estuco, se trabaja en aula 5 para adelantar. en pañete y estuco puesto que debido a la decisión de la cubierta y su desmonte se debe esperar.

Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT. GEPM.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Lunes 06 de mayo de 2024

Nota 035 personal obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 Residente sst, 1 maestro, 3 oficiales Personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. Estado del clima: lluvioso.

Nota 036 Actividades ejecutadas: Se continua con la remoción de pintura y estuco en aula 4 y 3 se esta pañetando muros en aula 1.

Arq. Ana Pardo Duarte.
Residente Obra
UT GEPM

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Martes 07 de mayo de 2024

Nota 037 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro personal Interventoria: 1 residente 1 Inspector. Estado del clima: lluvioso y Nublado

Norm

Powered by CamScanner

Nota 038 Actividades ejecutadas: Sin personal de obra.
Miercoles 8 de mayo de 2024 Arq. Ana Pardo. ut. 6epm

Nota 039 personal obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro, personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector. Estado del clima: lluvioso nublado.

Nota 040 Actividades ejecutadas: sin personal de obra.
~~Jueves 04 de mayo de 2024~~ Arq. Ana Pardo.
Residente obra
UT 6EPM.

40 Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Jueves 09 de mayo de 2024

Nota 041 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 residente sst, 1 maestro 1 oficial. personal de Interventoria: 1 residente, 1 Inspector, Estado del clima: lluvioso

Nota 042 Actividades ejecutadas: remoción de pintura, ingresa a la entidad o colegio los tubulares para iniciar con la fabricación de estructura de cubierta.
Arq. Ana Pardo
Residente obra
UT. 6EPM

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Viernes 10 de mayo de 2024

Nota 043 personal de obra: 1 residente, 1 Inspector, 1 resi-

Norma

Powered by CamScanner

dente SST, 1 maestro, 1 oficial. personal Interventoria. 1 residente, 1 Inspector. Estado del clima. lluvioso.

Nota 044 Actividades Ejecutadas: pintura anticorrosivo para perfileria tubular para estructura. de cubierta.

Arq. Ana Pardo
Residente obra

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

UT CEPM

Nota 045 Sábado. Mayo 11 de 2024.

PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector.

ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 046 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Aplicación de pintura anticorrosiva para perfilería metálica de la estructura de la nueva cubierta.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Martes. Mayo 14 de 2024

Nota 047 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector.

ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Norm

Powered by CamScanner

Nota 048 ACTIVIDADES EJECUTADAS: El fin de semana se desmontó la cubierta en asbesto-cemento de dos (2) aulas del segundo piso. Continúa la aplicación de pintura anticorrosiva sobre perfilería metálica para la estructura de la cubierta.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Miércoles. Mayo 15 de 2024.

Nota 049 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: lluvioso y nublado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 050 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se informa que se instaló una capa plástica sobre las aulas sin cubierta. Continúa la aplicación de pintura anticorrosiva blanca sobre perfilería metálica para la estructura de la cubierta. Avanza la actividad de pañetado de muros en las aulas del segundo piso.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Jueves. Mayo 16 de 2024.

Nota 051 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial de obra, 2 Instaladores de estructura. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Nublado y lluvioso. EQUIPOS Y

Norma

Powered by CamScanner

Jueves. Mayo 16 de 2024.

HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 052 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la aplicación de pintura anticorrosiva blanca sobre perfilería metálica para la estructura de la cubierta. Continúa la actividad de pañetado de muros en las aulas del segundo piso.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Ernesto José Guerrero G
Residente de Obra.
UT GEPM 2023-1.

Nota 053 NOTA DE INTERVENTORÍA: La Interventoría expresa no conformidad sobre el método de aplicación de la pintura anticorrosiva con rodillo, el cual no garantiza una cobertura total de la perfilería, el cual es el propósito principal de este tipo de recubrimientos.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Viernes. Mayo 17 de 2024.

Nota 054 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente. 1 Inspector. 1 Residente SST. 1 Maestro. 2 oficiales. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 054' ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la actividad de pañetado de muros en los aulas del segundo piso.

Ernesto J. Guerrero G.
Residente de Obra.
UT GePM 2023-1.

Juan Carlos Delgado Coneal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

Sábado. Mayo 18 de 2024.

Nota 055 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 056 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero G.
Residente de Obra.
UT GEPH 2023-1.

Lunes. Mayo 20 de 2024.

Nota 057 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 oficiales. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 058 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la actividad de pañetado de muros en las aulas del segundo piso.

Ernesto José Guerrero G.
Residente de Obra.
UT GEPH 2023-1.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Martes. Mayo 21 de 2024.

Nota 059 PERSONAL DE LA SED: 2 Apoyos a la Supervisión. 1 Gestora Territorial. PERSONAL DE OBRA: No hay personal de obra. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Norma

Powered by CamScanner

Martes. Mayo 21 de 2024.

Nota 060 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Nota 061 NOTA DE INTERVENTORÍA: No hay personal de obra, No hay avance de obra, El anticorrosivo no ofrece las condiciones de recubrimiento que requieren los elementos estructurales de la cubierta. Se presentó un inconveniente con la red eléctrica del Bloque A; el electricista vino, subió un taco y se fue. el problema sigue latente. El recubrimiento en plástico se ha venido corriendo, dejando los salones a la intemperie. En concepto general, la obra está abandonada. Aún no se hacen pruebas de líquidos penetrantes a la soldadura de la estructura metálica de la cubierta, que se encuentra en el sitio de obra.

Juan Carlos Delgado Correa
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Ernesto Guerrero.
Residente Obra.
UT GEPA 2023-1.

Miércoles. Mayo 22 de 2024

Nota 062 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 063 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra. La rectoría se queja por la falta de personal de obra.

Juan Carlos Delgado Correa
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Ernesto J. Guerrero G.
Residente de Obra.
UT GEPA 2023-1

Norma

Powered by CamScanner

JUEVES 23 de Mayo de 2023.

Nota 064. PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Residente SST, 1 Inspector, 1 Maestro, PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 Residente, 1 Inspector, ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA y Tarde Soleada, HERRAMIENTA MENOR: Herramienta menor.

Nota 065. El contratista de obra manifiesta no conformidad con las notas 063 y nota 053 con el método de aplicación de pintura anticorrosiva, ya que en las especificaciones técnicas de fabricante permite su aplicación con brocha o rodillo En la nota 063 no esta conforme a lo escrito con el tema electrico, ya que el problema se arreglo y a las 6:30 p.m que estuvo el contratista de obra el miercoles 22 de Mayo de 2023 la interventoría no estuvo presente, solo estuvo a esa hora el residente de obra y el electricista.

Nota 066 Personal de Obra: 1 residente, 1 inspector,

Norma

Powered by CamScanner

1 residente SST, 1 maestro. Personal interventoría: 1 residente, 1 inspector. Personal operativo: Sin personal operativo en los sitios de la obra.

Viernes 24 de Mayo

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero G.
Residente de Obra.
UT GEPM 2023-1.

Viernes 24 de Mayo de 2024

Nota 067. Personal de obra: 1 residente, 1 residente SST, 1 inspector, 1 Maestro. personal interventoría: 1 residente, 1 inspector. Personal operativo: 1 Maestro, 1 oficial, 1 ayudante. Estado del clima: Mañana y tarde soleada. Herramienta menor: Herramienta menor.

Nota 068 Actividades Realizadas: se inicia retiro de estructura metálica para cubierta, se inicia en la cuchilla oeste.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Ernesto J. Guerrero T.
Residente obra.
UT GEPM 2023-1.

Sábado 25 de Mayo de 2024.

Nota 069 Personal de obra: 1 residente, 1 residente SST, 1 inspector, 1 maestro. Personal interventoría: 1 residente, 1 ~~oficial~~ inspector.

Norm

Powered by CamScanner

Personal operativo: 1 oficial, 1 maestro, 1 ayudante de obra de estructura.

Nota 070 Actividades Realizadas: Se continuo con montaje de estructura de cubierta.

Nota 071. Estado del Clima: Mañana lluviosa.

Herramienta menor: Herramienta menor.

Juan Carlos Delgado Coneal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Ernesto S. Guerrero A.
Residente de obra
UT GEPA 2023-1.

Lunes 27 de Mayo de 2024.

Nota 072. Personal Obra: 1 residente, 1 residente SST, 1 inspector, 1 maestro, Personal interventoría: 1 residente, 1 inspector. Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante. Estado del Clima: Mañana y tarde soleadas. Herramienta y Equipos: Herramienta Menor.

Nota 073. Actividades Realizadas: Se continua con el izaje de estructura en 2da fase en un total de cuatro (4) estructuras. La interventoria autorizo el movimiento de una tuberia de PVC presión de media pulgada que alimenta los baños

Norma

Powered by CamScanner

del primer piso en la entrada del colegio, ya que esta interfiriendo con la estabilidad de la estructura, se hara un movimiento de esta red.

Juan Carlos Delgado Coneal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Ernesto S. Guerrero A.
Residente de Obra.
UT GEPM 2023-1.

Martes 28 de Mayo de 2024.

Nota 094 Personal de obra: 1 residente, 1 residente SST, 1 inspector, 1 maestro. Personal de interventoría: 1 residente, 1 inspector. Personal operativo: 1 oficial y 1 ayudante de estructura metálica, 1 oficial para estuco y pintura. Estado del clima: mañana y tarde soleada. Herramienta y Equipos: Herramienta menor.

Nota 095 Actividades realizadas: Se hace el movimiento del tubo en PVC presión en la cuchilla occidental como autorizo interventoría.

Juan Carlos Delgado Coneal
Residente de Interventoría.

Miercoles 29 de Mayo de 2024.

Nota 096 Personal de obra: 1 residente, 1 inspector, 1 residente SST, 1 maestro. Personal

Norma

Powered by CamScanner

interventoria: 1 residente, 1 inspector. Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante estructura metálica. 1 oficial pintura. Estado del clima: Mañana soleada, tarde lluviosa. Maquinaria y equipo: Herramienta menor.

Nota 077 Actividades Realizadas: Llegada de correa para instalación de estructura metálica y se prosigue con pintura.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Ernesto S. Guerrero G.
Residente de Obra
UT GEPM 2023-1

Jueves 30 de Mayo de 2024

Nota 078 Personal de obra: 1 residente, 1 inspector, 1 residente SST, 1 maestro. personal de interventoría: 1 residente, 1 inspector. Personal operativo: 2 oficiales, 1 Ayudante de estructura metálica. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Lluvioso EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 079 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia la instalación de correas para la estructura metálica de la cubierta de las aulas del segundo piso.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Norma

Powered by CamScanner

Martes. Abril 30 de 2024.

Nota 059 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado

Nota 060 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Mayo 02 de 2024

Nota 061 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial eléctrico, 1 Ayudante eléctrico. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta eléctrica. Herramienta ~~de~~ menor.

Nota 062 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se instalan 11,50 ml de tubería EMT, seis (6,00) codos conduit de 1/2" y seis (6,00) cajas eléctricas. Al instalar las cajas y las abrazaderas de los tubos, traspasaron las láminas de fibrocemento - las cajas se fijan con soportes en la misma perfilería calibre 26.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Viernes. Mayo 03 de 2024

Nota 063 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado.

Nota 064 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Norma

Powered by CamScanner

Sábado. Mayo 04 de 2024.

Nota 065 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado.

Nota 066 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Lunes. Mayo 06 de 2024

Nota 067 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado.

Nota 068 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Se efectúa recorrido conjunto (SED, Interventoría y Contratista) para definir lineamientos de intervención en cuanto a humedad se refiere; revisión de cubiertas y canales. Acerca del tema de la canaleta troquelada, se programa una reunión con personal OTiC, pactada para mañana martes 07 de mayo de 2024 a las 2:00 pm.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Mayo 07 de 2024

Nota 069 ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Lluvioso.

Nota 070 ACTIVIDADES EJECUTADAS: OTiC no asiste a la reunión programada el día anterior por el apoyo a la Supervisión

Powered by CamScanner

del contrato para establecer lineamientos de intervención sobre las redes de datos existentes en la ludoteca infantil y el nuevo espacio de intervención del primer piso. De otra parte, se evidencia que no hay desarrollo de actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Miercoles 08 de 2024 (mayo)

Nota 071 Estado del clima: nublado con llovizna y sol.

Nota 072 Personal de obra: 1 residente de obra, 1 Inspectora de obra, 1 sst, 1 residente de obra Interventoria, 1 Inspector de obra, Interventoria. Actividades ejecutadas: se continua labores en el colegio como limpieza de canal sobre pachada lateral, y remoción de pañete en muros. tambien se retira la canaleta de la ludoteca para que otic se haga Cargo de actividades acordadas.

Jueves 09 de 2024 (mayo)

Nota 073 estado de clima lluvioso.

Nota 074 Personal obra: 1 residente de obra. 1 Inspector de obra, 1 sst, 1 residente (a) Interventoria, 1 Inspector Interventoria, 1 oficial, 1 ayudantes. Actividades ejecutadas: Se continua con actividad como remoción de pañete

Norma

Powered by CamScanner

en muros internos sin contar con la presencia de otic para continuar labores en ludoteca.

Viernes 10 de 2024 (mayo)

Nota 075 Estado del clima: mañana lluviosa con un poco de sol

Nota 076 Actividades ejecutadas: sin presencia a la fecha por parte de otic sin poder completar labores en ludoteca. 1 residente (admi) de obra, 1 sst, 1 Inspector de obra, 1 residente interventoria, 1 Inspector de interventoria, 1 oficial, 2 ayudantes. se realizan trabajos internos como la remoción de pañete en zonas de 1 piso.

Nota 077 Se realiza reunión con padres de familia, representantes de la sed, interventoria y residente de obra contratista para la ayuda con la comunidad en actividades exteriores aledañas al parque despues de la socialización se concreto que se iniciaran laborer de cerramiento y continuar con labores para tratar la humedad del inmueble por parte del parque el dia martes 14 de mayo de 2024.

Ana Pardo
Residente obra

Powered by CamScanner

Sabado 11 de Mayo de 2024

Nota 028 De acuerdo a la reunion el dia viernes 10 de mayo se retomaran actividades a partir del dia 14 de mayo de acuerdo a las nuevas actividades socializadas con Secretaria de educacion. (Arq. Luis Enrique), interventoria (Arq. Juan Carlos) y Por Parte del contratista Arq. Ana. Lado.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022.

Martes 14 de Mayo de 2024

Nota 029 Dia Soleado durante la mañana. Tarde: Nublado.

Personal en Obra:

1 Residente interventoria Arq. Juan Carlos Delgado

1 Inspector SST Ing. Sandra Guaycambuco

1 Ins. de obra Johanna Rodriguez.


Mano de Obra calificada 5 (4 Ay. 1 ofl.

Se continuan labores en el colegio, realizando cerramiento en polisombra en el costado Nororiental, se realiza lavado con rodillo para levantamiento de Pintura en aceite de placa cubierta en la biblioteca, Adicionalmente se define en concilacia de interventoria que en las fachada

Norma


Powered by CamScanner

Posterior se realizara un Anden con un ancho de 0.50 cm con una (semi) media cana de 0.10 m, un bordillo de confinamiento de h = 0.40 o 0.50 cm pendiente por definir en terreno segun condiciones. y del costado Posterior se realizara un Pañete impermeabilizado a nivel con una he 1.20 m, asi mismo se realizara en el costado nororiental donde tambien se realizara una cañuela de 0.50 m



→ Detalle. cañuela.

- Detalle Anden.

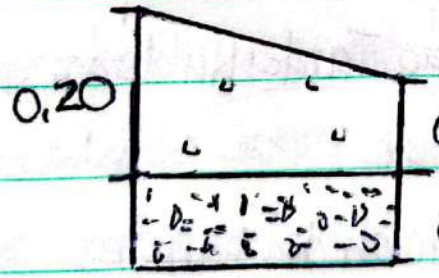

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Miércoles. Mayo 15 de 2024.

Nota 080 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector. 1 Residente SST, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Lluvioso y Nublado. Tarde: Nublado y Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 081 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia la demolición del pañete exterior en la fachada posterior. Inicia la demolición de la parte baja del muro de la fachada principal, para hacer una regata que permita hacer una media caña.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Mayo 16 de 2024

Nota 082 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 Residente, 1 Residente SST, 1 oficial, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 083 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la demolición del pañete exterior en la fachada posterior. Continúa la demolición de la parte baja del muro de la fachada principal, para hacer una media caña.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Ernesto José Guerrero González
Residente de obra.
UT GCPH 2023-1.

Norma

Powered by CamScanner

Viernes Mayo 17 de 2024.

Nota 084 Personal de Obra: 1 inspector, 1 residente, 1 residente SST, 1 oficial, 2 ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 residente, 1 inspector. ESTADO CLIMA MAÑANA: Soleado, TARDE: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 085 Actividades Ejecutadas: Demolición Puente exterior, corte con pulidora en el frente para construcción de media caña.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Ernesto José Guevara G.
Residente de Obra.
GEPM 2023-1.

Sábado
Viernes 18 de Mayo de 2024.

Nota 086 Personal de Obra: 1 inspector, 1 residente, 1 residente SST, 1 oficial, 2 ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 residente, 1 inspector. ESTADO CLIMA MAÑAN: Soleado. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Herramienta menor.

Nota 087. ACTIVIDADES EJECUTADAS: Demolición puente exterior, corte pulidora en frente para construcción de puente y media caña.

Powered by CamScanner

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero G.
Residente de Obra.
UT GEPM 2023-1.

LUNES 30 de Mayo de 2024.

Nota 088. PERSONAL DE OBRA: 1 inspector, 1 residente, 1 residente SST, 1 oficial, 2 ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 residente, 1 inspector, ESTADO DEL CLIMA: Mañana seca, soleada, tarde soleada EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 089. ACTIVIDADES EJECUTADAS: Excavación por dados del colegio para anden, medianera.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero G.
UT GEPM 2023-1.
Residente de Obra.

Martes 31 de Mayo de 2024.

Nota 090. PERSONAL DE OBRA: 1 inspector, 1 residente, 1 residente SST, 1 oficial, 2 ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORIA: 1 residente, 1 inspector, ESTADO DEL CLIMA: Mañana oscura, sin lluvia. Tarde
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramientas menor

Nota 091. ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se desistale

Norma

Powered by CamScanner

Tuberiz de bajantes de aguz lluvizs en un 100% de colmatación.

Nota 092 En horas de la tarde el Inspector Jeen Pool autorizo la demolición de la plaza anden en al lado trasero del colegio.

Ing. Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero G.
Residente de Obra.
UT GeM 2023-1.

Miercoles 22 de Mayo de 2024.

Nota 093 Personal de obra: 1 inspector, 1 residente, 1 residente SST, 1 oficial, 2 ayudantes. Personal de Interventoria: 1 residente, 1 inspector. Estado del clima: Mañana y tarde soleada. Equipos y Herramientas: Herramienta menor.

Nota 094. Actividades ejecutadas: Se termino la demolición de la plaza posterior al colegio autorizada por interventoría.

Se considera pertinente cambiar la cuneta por un cárcamo con tapa rejilla sobre la fachada oriental. Se deben construir cajas de inspección para cambio de dirección de las aguas lluvias que llegan al sumidero ubicado en la esquina. OK

Norma

Powered by CamScanner

Miércoles. Mayo 22 de 2024.

Se autoriza que el andén perimetral de la fachada posterior sea de 60 cm de ancho con pendiente y que las esquinas sean rematadas a 45°.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero A.
Residente de Obra.
UT GEPM 2023-1.

Jueves 23 de Mayo de 2024.

Nota 095: Personal de obra: 1 inspector, 1 residente, 1 residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes. Personal de interventoría: 1 residente, 1 inspector. Estado del clima: mañana y tarde fresca. Equipos y Herramientas: Herramienta menor.

Nota 096 Actividades ejecutadas: Excavación sitios externos perimetral para la construcción de cerramo y andén.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero A.
Residente Obra
UT GEPM 2023-1.

Viernes 24 de Mayo de 2024.

Nota 097. Personal de Obra: 1 residente, 1 inspector, 1 residente SST, 1 maestro, 2 oficiales, 3 ayudantes, Personal interventoría: 1 residente, 1 ayudante.

Norma

Powered by CamScanner

Estado del Clima: Mañana y tarde soleada.
Herramientas y Equipos: Herramienta
menor.

Nota 98 Actividades Ejecutadas: Se sigue excava-
ción para cajeme y sardinel.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero A.
Residente de obra.
UT GEPM 2023-3.

Sábado 25 de Mayo de 2024.

Nota 99 Personal de obra: 1 residente, 1 inspector,
1 residente SST, 1 maestro. Personal
interventoría: 1 residente, 1 inspector.
Estado del Clima: Mañana lluviosa.
Equipos y Herramientas: Herramienta s
menor.

Nota 100 Actividades realizadas: Sin personal
operativo.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero A.
Residente obra.
UT GEPM 2023-1.

Lunes 27 de Mayo de 2024.

Nota 101. Personal de obra: 1 residente, 1 inspector,
1 inspector SST, 1 maestro. Personal Inter-
ventoría: 1 residente, 1 inspector.

Norma

Powered by CamScanner

Estado del Clima: Mañana y tarde soleadas. Herramienta y Equipo: Herramienta menor.

Nota 102. Actividades Realizadas: Sin personal operativo.

Ing. Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero G.
Residente Obra.
UT GEPM 2023-1.

Neiva 28 de Mayo de 2024.

Nota 103. Personal de Obra: 1 residente, 1 inspector, 1 residente SST, 1 maestro. Personal Interventoría: 1 residente, 1 inspector. Estado del clima. Mañana y tarde soleadas. Herramientas y Equipos: Herramienta Menor. Personal operativo: 2 oficiales, 3 ayudantes.

Nota 104. Actividades Realizadas: piso de cerramo, llegada de mortero sika para zonas a impermeabilizar.

Ing. Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Ernesto J. Guerrero
Residente Obra.
UT GEPM 2023-1.

Miércoles. Mayo 29 de 2024.

Nota 105 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residentesst, 1 Maestro.

Norma

Powered by CamScanner

Miércoles. Mayo 29 de 2024

2 oficiales, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector.

ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 105 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Geotextil en el cárcamo. Inicia el impermeabilizado de muros con SiKa.

f: Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa Maria 022

Norma

Powered by CamScanner

Nota 318: Martes 30 de Abril de 2024
Horario: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 1 de obra civil

Nota 319: Se adelantan actividades de pintura en muros superiores cuarto de rack. La parte inferior de la pintura se le da espera para que seque humedad, Sin embargo esta persiste a pesar de la impermeabilización

Nota 320: Jueves 02 de ~~Abril~~ Mayo de 2024
Horario: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 2 personas de obra civil, 2 de enchape

Nota 321: Se adelantan actividades de terminacion empates con muro enchape piso aula de ingles y boquilla. Se adelanta parte faltante de enchape piso cuarto de rack y pintura primera mano en parte inferior muros cuarto de rack

Nota 322: Viernes 03 de Mayo de 2024
Clima: Soleado
Horario: 7:00 am
Personal: 2 de obra civil

Powered by CamScanner

Nota 323: Sabado 04 de Mayo 2024
Horario: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 2 de obra civil

Nota 324:
Se adelantan remates y acabados en pintura de cuarto de rack aulo de ingles, guarda escobas cachapes pisos

Nota 325: Domingo 05 de Mayo 2024
Horario de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 2 de obra civil

Nota 326: Lunes
Se realizan remates generales para entrega de aulas de rack y aula de ingles. Se evidencia humedad en pintura muros parte inferior cuarto de rack. Se solicita levantar pintura y repintar

Nota 327: Lunes 06 de Mayo 2024
Horario de inicio
clima: Soleado
personal: 2 de obra civil

Nota 328: Se realizan remates boquillas cachapa piso cuarto de rack, Se evidencia de nuevo humedad en pintura muros inferiores cuarto de rack, Se solicita arreglar

Powered by CamScanner

Nota 329: Martes 07 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 2 de obra civil

Nota 330: Se realiza recorrido con residente contratista y con interventoria para realizar entrega a la institucion, sin embargo no se puede realizar acta por las siguientes observaciones

1. Humedad en muros parte inferior del cuarto de rack.
2. Detalles en pintura de puertas cuarto de rack y cuarto de ingles
3. Detalles en graderias como dilataciones sin terminar, mal acabado en caras verticales de graderia, pañete con mala terminacion, media cañas mal terminadas, Falta limpieza y lavado de ladrillo graderias.
4. Limpieza en patio oledaño a graderias por rebaba de concreto.
5. Detalles de pintura en filos contra cubierta por fogueo en la teja, se debe limpiar. Cuarto ingles

Por otro lado se evidencia la terminacion de las siguientes actividades:

1. Terminacion de enchapes de pisos aula de ingles y cuarto de rack
2. Terminación pintura muros aula de ingles
3. pintura cuarto de rack pero se debe corregir humedad.

Miguel Cumbanza
Interventoria

Ing Prob.

Nota 331: Se libera aula de inglés a la institucion para el traslado de mobiliario y una vez se haya este traslado se realizan remates finales en puertas inglés, rack, salon 3, 4 y 5 para ajuste de puertas. En el cuarto del rack se hace entrega con la observación de la reparación en la humedad muro inferior una vez se seque. Esta reparación se realizará al final del mes de mayo una vez se haya evidenciado la curación de la humedad.

Miguel Lombana

Erica Prado.
Residente de obra.

CC 79852694
Almacenista
Carlos Julio Diaz

Powered by CamScanner

Nota 331: Se libera aula de ingles a la institucion para el traslado de mobiliario y una vez se haya este traslado se realizan remates finales en puertas ingles, rack, salon 3, 4 y 5 para ajuste de puertas. En el cuarto del rack se hace entrega con la observación de la reparación en la humedad muro inferior una vez se seque. Esta reparación se realizará al final del mes de mayo una vez se haya evidenciado la curación de la humedad.

Miguel Lamboriza

Ana Pardo.
Residente de obra.

cc 79852604
Almacenista
Carlos Julio Diaz

Nota 332: Miercoles 08 de Mayo de 2024
personal: No hay
Clima: Nublado
Actividades: No se ejecuta ninguna actividades, pendientes remates en puertas cuarto rack, cuarto ingles y graderias. Actividades adicionales barandas graderias

Nota 333: Para dar trazabilidad a seguimiento de calidad, se aclara la liberación de placas contrapiso, alistado de piso, enchape piso, aulas ingles y cuarto rack; pintura de aula ingles, pintura cuarto rack (con observación de humedad).

Powered by CamScanner

Nota 334: Jueves 09 de Mayo de 2024
Clima: Soleado
Personal: no hay personal
Actividades: No se ejecuta ninguna actividad, pendientes remates graderías, Adicionales de puertas 3 aulas preescolar y Barandas graderías

Nota 335: viernes 10 de Mayo de 2024
clima: Nublado
personal: No hay personal
Actividades: No se ejecuta ninguna actividad, pendientes remates graderías, Adicionales de puertas 3 aulas preescolar y Barandas graderías. Adecuación de cuarto usado como Bodega

Nota 336: Martes 14 de Mayo de 2024
clima: Soleado
personal: No hay personal
Actividades: No se ejecuta ninguna actividad, pendientes remates graderías, Adicionales de puertas 3 aulas preescolar y Barandas graderías. Adecuación de cuarto usado como Bodega

Nota 337: Se recomienda a contratista avanzar con las actividades pendientes y adicionales ya que llevan tiempo considerable de ser solicitadas, para así hacer entrega final y Acta con la institución

Powered by CamScanner

Nota 338: Del 15 de Mayo del 2024 al 30 de Mayo de 2024 No se ejecutan actividades en el frente de obra, quedando pendiente unicamente observaciones de remates en graderias, retoques de puertas y tratamiento de humedades en cuarto de rack e instalacion de barandas graderias.

Nota 339: Viernes 31 de Mayo de 2024 clima soleado:
Inicio: 7:00 am
Personal: 2 obra civil, 1 Residente.

Nota 340: Se realiza instalacion de barandas en graderias, remates de cañuelas y dilataciones y lavado de Mamposteria, se realiza pre-acta de entrega quedando como observaciones pendientes la instalacion de tapa registro agua potable, tapa-caja ciega punto electrico oficina a poste iluminacion graderias y se define realizar pintura en trafico pesado para las graderias aprobado por Arq Luis Enrique Compos apoyo a la supervision. Quedan como compromiso realizar entrega a la institución el dia 06 de junio de 2024.

Nota 341: Del 01 de junio de 2024 al 05 de junio de 2024 no se realiza ninguna actividad en el Colegio ni se cuenta con personal de obra. Se solicita a contratista en comite semanal realizar las actividades pendientes para entregar Frente

Powered by CamScanner

Nota 342: Jueves 06 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado - Lluvias en la tarde
personal: 2 de obra civil

Nota 343: Se realiza tratamiento y arreglo humedad en muros cuarto de rack y se realizan retoques de pintura solicitados en puertas de cuarto de rack y aula de Ingles. No se puede ejecutar pintura en graderias por lluvias.

Nota 344: Viernes 07 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 2 de obra civil

Nota 345: Se realiza pintura de placas en concreto y media cañas graderias cancha. Queda pendiente la instalacion de tapa registro agua y caja-tapa ciega aledaño a poste de iluminación graderias. Se solicita a contratista cerrar pendiente para realizar entrega el morte 11 de junio de 2024 de acuerdo a compromiso con el comite de obra..

Powered by CamScanner

Nota 184: Se adelantan actividades de enchape piso baldosa terrazo salones primer piso, y se realiza el destronque del enchape en salones segundo piso. por el procedimiento las paredes y puertas quedan sucias. Se recomienda al contratista limpiarlas de forma inmediata o protegerlas.

Nota 185: Lunes 29 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 2 electricistas, 2 de destrocado

Nota 186: Se adelantan actividades de destroncado enchape piso 2 en salones y pasillo central. Adicionalmente se hacen adecuaciones de desmonte luminarias existentes en salones primer piso

Nota 187: Martes 30 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 4 de obra civil

Nota 188: Se adelantan actividades de enchape de piso primer piso, limpieza de piso destroncado segundo nivel. En el salon derecho primer piso se evidencia cable enterrado, se solicita encamisarlo y si es necesario regatear para protegerlo y asi poder instalar la baldosa faltante.

Powered by CamScanner

Nota 189: Jueves 02 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 4 de obra civil

Nota 190: Se adelantan actividades enchape de piso salones primer piso, faltan guarda escobas y boyalla. Los salones del segundo piso quedan habilitados para clase, sin embargo la limpieza de los muros y puertas no se ha realizado.

Nota 191: Viernes 03 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 2 desmanchando y 3 obra civil

Nota 192: Se realiza la instalacion de boyalla enchape piso salones primer piso e instalación de guarda escobas, se realiza pulido de enchape segundo piso y desmanche piso primer piso avances

Nota 193: Lunes 06 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 2 de pulido piso

Nota 194: Se adelantan actividades de desmanchado y pulido piso salones primer nivel

Nota 193: Martes 07 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 7 de pulido piso.

Nota 194: Se adelantan actividades de pulido y limpieza enchape primer piso salones. No se evidencian mas actividades

Nota 195: A la fecha no se evidencian ajustes en la ventaneria instalada, se evidencia desnivel de piso enchape entre pasillo central y dos salones mano derecha ( ) donde puede generar empozamientos de agua a la hora de lavar piso salones y/o devolución del agua a uno de los salones. Se le solicita al contratista arreglar este desnivel ya que a través de interventoría se habían determinado los niveles. Tambien se le solicita al contratista ponerse al dia con las actividades atrasadas, para la entrega inmediata a la constitución

Powered by CamScanner

dando el anchope y olivado de los 2 aros
del segundo nivel, se libera esta actividad
para dar inicio a la instalacion del
anchope en los 2 aros.

CTP Ronald Lorero

Nota 123: sabado 30 de marzo 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
clima soleado
Personal: 8 obreros civil.

CTP

Nota: 124: en el dia de hoy se termina
de instalar y entoquillar el anchope en
2 aros del 2 nivel, quedando pendiente
la deshaverado y polida, se empieza con la
instalacion de la lamina micropetforada en el
cerramiento exterior.

CTP Ronald Lorero

Nota 125: Lunes 1 de Abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 A.
clima: soleado en la mañana: Horas de 3:00 - 4:30 P.M.
Personal: 1 Residente, 1 maestro, 2 ayudantes

CTP Ronal Lorero

Nota: 126: en el dia de hoy se empieza con la
lamina micropetforada en el cerramiento exterior,
se requiere el contratista empezar con la
compactacion de la sobrecimiento de los 3 aros
del primer nivel y poder tapar la placa
de entrepiso, se requiere deshaverar y
polir los 2 aros del segundo nivel.

CTP Ronald Lorero


Nota 127: Martes 2 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M.
clima: Nublado: Horas 2:30 P.M. - 4:15 P.M.
Personal: 1 inspector, 1 residente, (5) ayudantes

CTP Ronald Lorero

NKA

Powered by CamScanner

Nota 128: En el día de hoy se acuerda con la instalación de la lámina micropalizada del cerramiento perimetral exterior, se revisa la solución en cuanto existe de los 3 ados, del primer nivel y se decide retirar o excavar la capa de 20cm y reemplazarlo y así poder hundir la placa de cimentación y se realiza detalle constructivo.

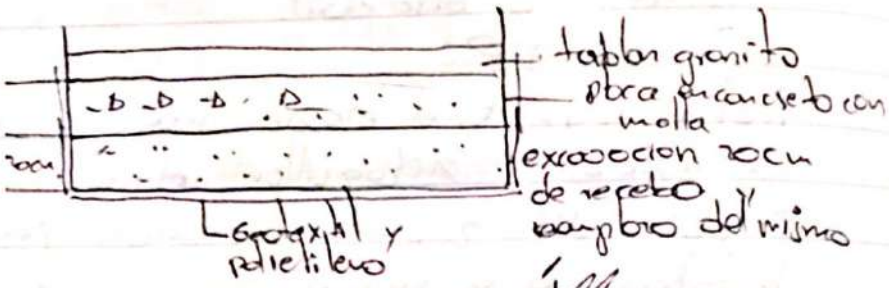

Ronald Lozano

Jaime Molina

Nota 129: Para llegar una adecuada trazabilidad se toma la decisión del anclaje y elimina ados 2 ados del segundo nivel, para poder acceder con el anclaje de granito.

Ronald Lozano

Nota 130. Miercoles 3 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 h.
Clima: Nublado. Lluvias 2:15 P.M. - 3:30 P.M.
Personal: (5) Albañiles, 1 inspector, 1 residente

Ronald Lozano

Nota: 131: Como actividad programada se acuerda con la instalación de la lámina micropalizada del cerramiento exterior, se inicia con la excavación de la capa de 20cm según la nota 128, se observa que la sobrecarga presenta desplazamiento por que se remueva y requiere de contratar personal y maquinaria si se excava más y se rellena con relleno.

Ronald Lozano

Powered by CamScanner

Nota 132: Jueves 4 de abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: Nublado. Nubosidad en la mañana.
Personal: 1 residente, 1 inspector, 3 obrero civil.
Ing. Ronald Linares
Nota 133: En el día de hoy se realiza retiro de escombros a sitios autorizados, se continua con la excavación del recebo que se encuentra en mal estado en una cola, se le recuerda al contratista entregar propuesta para solventar el talud ó acolchonado que presenta la subrasante.
Ing. Ronald Linares
Nota 134: Viernes 5 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: soleado.
Personal: 1 residente, 1 maestro, 8 obrero civil,
Ing. Ronald Linares
Nota 135: En el día de hoy se acuerda con dirección de anchope y olvido de una cola perdiente en el segundo piso, se continua excavando una cola en el primer nivel. segun nota. 128, de acuerdo a lo antes se decide por la dirección de interventoría y supervisión. que se rellene con roban y relleno con base granular, y los otros 2 colas del primer nivel realizar mejoramiento de la subrasante con recebo caliche, igualmente realizar densidades, para su liberación.
Ing. Ronald Linares
Nota: 136: Para llegar una adecuada trabajabilidad se labora la dirección de anchope y olvido de las colas del 2 nivel, segun recomendaciones de la supervisión.
Ing. Ronald Linares

Powered by CamScanner

Nota 137: Sabado 6 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M.
Clima: Soleado
Personal: 1 residente. 8 obrero.
Ronald Lozano

Nota 138: Para llenar una adecuada trabajabilidad el contratista realiza el suministro de 7 m³ de concreto para las vigas del 2 nivel, se suministran 70 m² de anclaje en granito y 70 ml de guardaescoba para los pasillos y pasillo del segundo nivel.
Ronald Lozano

Nota: 139: Para llenar una adecuada trabajabilidad el contratista realiza el suministro de 6 m³ de relleno para mejoramiento de una viga del primer nivel, para la estabilización de la soldadura según recomendación dada en la nota 135.
Ronald Lozano

Nota 140: En el día de hoy se continua con la instalación de anclaje en el pasillo y una viga del segundo nivel, se realiza la demolición de unos nichos que se encuentran en las vigas por petición del coordinador de la instalación, se continua con el relleno de relleno y compactación de la capa de subbase granular, se termina la pintura de la lamina micropanelada.
Ronald Lozano

Nota 141: Lunes 8 de Abril. 2024
Hora de inicio 7:00 A.M.
Clima: Nublado.
Personal: 8 obreros, 1 residente, 1 maestro
Ronald Lozano

Nota 142: Para llenar una adecuada trabajabilidad el contratista realiza el suministro de 12 m³

Powered by CamScanner

de recebo para la compactacion de la sobrante en las 3 aulas del primer nivel.

Ronald Lacayo

Nota 143: En el dia de hoy se acuerda con compactacion de la sobrante en 2 aulas del primer nivel, se continua con relleno de receba en la 3 aula del 1 nivel, y se continua con echope en 1 aula del 2 nivel.

Ronald Lacayo.

Nota 144: Martes 9 de Abril. 2024.
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: Nublado.
Personal: 1 maestro, 1 ayudante, 8 albañil.

Ronald Lacayo

Nota 145: En el dia de hoy se termina de rellenar y compactar las 3 aulas del primer nivel. para tomar densidades, se acuerda con el emboquillado de la tercera aula en el segundo nivel, se acupa material rad.

Ronald Lacayo

Nota 146: Para llevar una adecuada trazabilidad el contratista realiza toma de densidades de la capa de recebo en las 3 aulas del primer nivel, quedo pendiente los resultados para liberar la capa y aprobar la fundicion de la placa de contrapiso.

Ronald Lacayo

Nota 147: Miercoles 10 de Abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 Am.
Clima: soleado.
Personal: 8 albañil, 1 ayudante, 1 maestro.

Ronald Lacayo

Nota 148: En el dia de hoy se acuerda con el reemboquillado de los muros interiores en los 3 aulas del primer nivel, se acuerda

Powered by CamScanner

en la instalacion de la estructura del cielo raso en 2 aulas del primer nivel, se requiere al contratista retirar los escombros y equipos provisionales con la logistica de la institucion, CTR Ronald Lozano

Nota 144: Para llevar una adecuada trazabilidad el contratista suministra estructura en general para el cielo raso de dos aulas del primer nivel, como amegas, perfiles y angulos.
CTR Ronald Lozano

Nota 150: Jueves 11 de Abril 2024.
Horario empleo: 7:00 A.
Clima: soleado.
Personal: 8 obreros.
CTR Ronald Lozano

Nota 151: Para llevar una adecuada trazabilidad el contratista hace entrega de los resultados de las densidades tomados el dia 9 de abril segun nota 146, los resultados obtenidos son del 96.7%, 95.5% y 96.2% de acuerdo a lo anterior se libera la subrasante y se anab el procedimiento siguiente correspondiente a la fundicion del placa de concreto.
CTR Ronald Lozano

Nota 152: En el dia de hoy se inicia la elevacion de muros internos en los 3 aulas del primer nivel, segun requerimiento de la coordinacion del colegio, se inicia en el rompimiento de los muros internos de los aulas del primer nivel, y se inicia con la estructura del cielo raso de aula de primer nivel, se recuerda al contratista tener en cuenta los niveles

del cielo raso.

CTP Ronald lozano

Nota 153: Viernes 12 de abril. 2024.
Hora de empezo. 7:00 A.
clima soleado.
Personal: 1 residente, 1 inspector, 1 maestro
8 obrero.

CTP Ronald lozano

Nota 154: En el dia de hoy se coorna en la fundicion del tercer nicho en los ejes del primer nivel, se coorna con repello y cernido de muros, se coorna con enchapa de cielo raso en todo del primer nivel, de acuerdo a la inspección dejada por el apoyo de supervision se entrega que la pintura de los muros seran de la siguiente forma, el muro donde estan los ventanas de 1m de altura seran de color gris, y los otros 3 muros seran de color blanco.

CTP Ronald lozano

Nota 155: sabado 13 de abril. 2024
Hora de empezo: 7:00 A.
clima soleado.
Personal: 1 residente, 1 inspector, 1 maestro
8 obrero. CTP Ronald lozano

Nota 156: Para llevar una adecuada trazabilidad el contratista realiza el suministro de 40 bultos de cemento, 3 m³ de arena de rio, 3 m³ de gravilla.

CTP Ronald lozano

Nota 157: En el dia de hoy se coorna en la fundicion de placa de contrapiso con malla electrosoldada en una cuda del primer

Powered by CamScanner

nivel, se ocurra en la instalacion de la estructura del techo raso en uno edo del primer nivel. la entrevistada observando el orgio de material RCD, requiere se retire y a que hay mucho material. Ronald Lozano

Nota 158: Lunes 15 de Abril. 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M.
Clima: soleado.
Personal: 1 residente, 1 SST, 1 maestro, 8 obra civil. Ronald Lozano

Nota 159: Para llenar una adecuada trabajabilidad el contratista realiza el suministro de 5 m³ de arena de rio y 60 bultos de Cemento para las placas de entrepiso.
Ronald Lozano

Nota 160: como actividad importante se avanza con la fundicion de la placa del segundo piso en el primer nivel, se toman los respectivos muestras y ensayos de concreto, el concreto se realiza segun diseño de mezclas entregado por el contratista el dia 5 de Abril. del laboratorio sierra laboratorio de suelos y pavimento S.A.S.
Ronald Lozano

Nota 161: Martes 16 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.M.
Clima: soleado.
Personal: 1 residente, 1 SST, 1 maestro, 8 obra civil.
Ronald Lozano

Nota 162: Para llenar una adecuada trabajabilidad el contratista entrega el suministro de 3 m³ de arena de rio. y 3 m³ de grava para la fundicion de los pisos del primer nivel.

Nota 163: En el dia de hoy se ocarre y continua con la estructura del cielo 100 en las 2 alas del primer nivel, se ocarra en la instalacion de malla electrosoldada en la 3 ala del primer nivel para mejorar la condicion.

Ronald Bravo

Nota 164 Miercoles 17 de abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 A-
Clima: Nublado.
Personal: 1 residente, 1 inspector, 1 maestro, 5 obrero.

Ronald Bravo

Nota 165: En el dia de hoy se ocarra en la condicion de la tercera ala del primer nivel segun diseño de marcha encargado por el contratista, se realiza instala el geotextil, la malla electrosoldada y se toman los respectivos muestras del concreto para tener resultados, en el dia de hoy se realiza retiro de encofrados o sistema ocupado.

Ronald Bravo

Nota 166: Jueves 18 de Abril 2024
Hora de inicio: 7:00 A.
Clima: Nublado
Personal: 1 Residente, 1 inspector, 1 maestro.
4 obrero civil.

Ronald Bravo

Nota 167: La supervisoria observando el avance de las obras, le requiere al contratista suministrar el material pendiente para el cielo raso de las alas del primer nivel, se requiere se suministre encofrado del para de las 3 alas del primer nivel.

Ronald Bravo

Nota 168: Viernes 19 de abril 2024.
Hora de inicio: 7:00 A-

Powered by CamScanner

Nota 193: Martes 07 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: Soleado
personal: 7 ole pulido piso.

Nota 194: Se adelantan actividades de pulido y limpieza enchape primer piso salones. No se evidencian mas actividades

Nota 195: A la fecha no se evidencian ajustes en la ventaneria instalada, se evidencia desnivel de piso enchape entre pasillo central y dos salones mano derecha ( ) donde puede generar empozamientos de agua a la hora de lavar piso salones y/o devolución del agua a uno de los salones. Se le solicita al contratista arreglar este desnivel ya que a través de interventoría se habían determinado los niveles. Tambien se le solicita al contratista ponerse al dia con las actividades atrasadas, para la entrega inmediata a la constitución

Nota 196: Miercoles 08 de Abril de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
clima: lluvioso todo el día
personal: 7 de dos civil

Nota 197: Se adelanta pulido de piso de salones primer nivel, falta cielo raso y pintura cdor.

Nota 199: Jueves 09 de Mayo de 2024
Clima: Nublado
Hora inicio: 7:00 am
Personal: 2 de obra civil

Nota 199: se adelantan actividades de acabados salones prima piso. No ha llegado mas material de obra.

Nota 200: Viernes 10 de Mayo de 2024
Clima: Lluvioso
Hora inicio: 7:00 am
Personal: 2 de obra civil.

Nota 201: Se adelantan actividades de cielo raso aulas primer piso, llegan 39 laminas de Drywall para cielo raso.

Nota 202: Se autoriza a contratista realizar remate en Aula 3 en granito pulido en la esquina donde esta el cable para rematar piso, los boca puertas se realizarán en granito lavado; Se autoriza recompa y relleno adicional para hall pasillo central. El contratista se compromete a ajustar nivel de piso en empalmes entre pasillo, Aula 5 y Aula 6.

Powered by CamScanner

Nota 198: Jueves 09 de Mayo de 2024
clima: Nublado
Hora inico: 7:00 am
personal: 2 de obra civil

Nota 199: se adelantan actividades de acabados salones primer piso. No ha llegado mas material de obra.

Nota 200: Viernes 10 de Mayo de 2024
Clima: Lluvioso
Hora inico: 7:00 am
personal: 2 de obra civil.

Nota 201: Se adelantan actividades de cielo raso aulas primer piso, Mayan 39 laminas de Drywall para cielo raso.

Nota 202: Se autoriza a contratista realizar remate en Aula 3 en granito pulido en la esquina donde esta el cable para rematar piso, los boca puertas se realizaran en granito lavado; Se autoriza recomposyallado adicional muro hall pasillo central. El contratista se compromete a ajustar nivel de piso en empalmes entre pasillo, Aula 5 y Aula 6.

Nota 203: 11 de Mayo de 2024 Sabado
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 3 obra civil y 1 pulidor piso

Powered by CamScanner

Nota 204: Se adelanta actividades de brillado enchape piso salones primer nivel, Instalacion de regas en ventaneria e instalacion de cielo raso.

Nota 205: Martes 14 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado - En la tarde lluvias
personal: 3 obra civil, 1 brillando piso

Nota 206: Se adelantan actividades de brillado de piso en salones primer nivel, pintura en techo Aula 1; y se terminas con la instalación del cielo raso salones prima piso; falta pintura del cielo raso, boca ductos, Pintura en esmalte, reembayetado salones segundo piso, instalación de paneles led.

Nota 207: por trazabilidad de calidad, se aclara la liberación de placas contrapiso, Alistado de piso para enchape en salones primer nivel y salones de segundo nivel. El enchape no se libera aun por falta de remates en brillado y ajuste de niveles en 2do piso.

Nota 208: Se sigue recomendado a contratista realizar ajustes de acabados en ventaneria ya instalado para su liberación

Powered by CamScanner

Nota 204: Se adelanta actividades de brillado enchape piso salones primer nivel, Instalacion de reglas en ventaneria e instalacion de cielo raso.

Nota 205: Martes 14 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado - En la tarde llueve
Personal: 3 obra civil, 1 brillando piso

Nota 206: Se adelantan actividades de brillado de piso en salones primer nivel, pintura en techo Aula 1; y se terminan con la instalación del cielo raso salones prima piso; falta pintura del cielo raso, boca puertas, Pintura en esmalte, reemboyillado salones segundo piso, instalación de paneles led.

Nota 207: por trazabilidad de calidad, se aclara la liberación de placas contrapiso, Alistado de piso para enchape en salones primer nivel y salones de segundo nivel. El enchape no se libera aun por falta de remates en brillado y ajuste de niveles en 2do piso.

Nota 208: Se sigue recomendado a contratista realizar ajustes de acabados en ventaneria ya instalada para su liberación

Nota 209: Miercoles 15 de Mayo de 2024
clima: Lluvioso
Hora inicio: 7:00 am
Personal: 3 obra civil y 1 brillando piso

Nota 210: Se adelantan actividades de brillado de piso, pintura muros Aulas primer piso pintura muros blancos y grises.

Nota 211: Jueves 16 de Mayo de 2024
Clima: Lluvias todo el día
Hora inicio: 7:00 am
~~Hora~~ personal: 3 de obra civil, 1 residente

Nota 212: Se adelantan actividades de pintura esmalte Aulas primer piso, rembaquille Aulas segundo piso. Se recomienda a contratista terminar trabajos en Aulas primer piso para poder terminar pendientes en Aulas 2do Piso.

Nota 213: Se le solicita al contratista arreglar canal y tubería en fachada por obras y cabales de ventanería.

Powered by CamScanner

Nota 210: Se adelantan actividades de brillado de piso, pintura muros Aulas primer piso pintura muros blancos y grises.

Nota 211: Jueves 16 de Mayo de 2024
Clima: Lluvias todo el día
Hora inicio: 7:00 am
~~Hom~~ personal: 3 de obra civil, 1 residente

Nota 212: Se adelantan actividades de pintura esmalte Aulas primer piso, resanboquille Aulas segundo piso. Se recomienda a contratista terminar trabajos en Aulas primer piso para poder terminar pendientes en Aulas 2do Piso.

Nota 213: Se le solicita al contratista arreglar canal y tubería en fachada por obras y labores de ventanería.

Nota 214: Viernes 17 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
personal: 3 obra civil
Clim.: Nublado

Nota 215: Se adelantan Actividades de pintura Aulas primer piso y resanboquillado Muros Segundo piso, y brillado de piso Aulas primer piso. Se recomienda a contratista Mejor la calidad de pintura aulas primer piso.

Powered by CamScanner

Nota 216: Lunes 20 de Mayo de 2024
Hora inicio: No hay personal
Clima: Soleado
personal: No hay personal
Actividades: No se ejecutan actividades en Rodrigo de Triana por falta de personal, se solicita a contratista personal quienes manifiesta no tener recursos

Nota 217: Martes 21 de Mayo de 2024
Hora inicio: No hay personal civil; 7:00 am personal electrico
Clima: Nublado
personal: No hay personal civil,
Actividades: No se ejecutan actividades en obra que que el contratista manifiesta no tener el recurso. Es responsabilidad del contratista. el no avance de obra. los electricos instalan Luminarias. Llegan 18 luminarias

Nota 218: Miercoles 22 de Mayo de 2024
Hora inicio: No hay personal
Clima: Nublado
personal: No hay personal de obra

Nota 219: No hay personal de obra por responsabilidad de Contratista quien no cuenta con el recurso. No es responsabilidad de interventoria ni de la entidad ni instalacion la no ejecucion y avance de actividades

Nota 220: Jueves 23 de Mayo de 2023
Hora de inicio: 7:00 am

Powered by CamScanner

clima: Nublado
personal: No hay personal de obra
Actividades: No se ejecutan actividades de obra civil ni electrica por responsabilidad del contratista por falta de recursos. Se Solicita a contratista tomar acciones urgentes para avanzar con las actividades o presentar justificación sustentado de el porque la falta de personal:

Nota 221: Viernes: 24 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 3 de obra civil

Nota 222: Se adelanta masillado y pintura de cielo raso aulas 2 y 3 primer piso. Aun falta Bocaporta, remate piso Aula 3, reemboquillado salones piso 2 y hall y pintura

Nota 223: Sabado 25 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Lluvias todo el dia
personal: 3 de obra civil

Nota 224: Se adelantan actividades de pintura cielo raso y reemboquillado fachada salones segundo piso

Nota 225: Se concelan cantidad ejecutadas a la Fecha para cobro corte numero 6:

- Remoción de pintura exist: 85,29m²
- Reemboyuelado Muros primer piso: 85,29m²
- Sum. Inst. Panel Led ; 18 und
- Sumin. Inst. granito Baldas 1er paso = 147,46m²
- Desbastar y pulido Baldas = 300,59m²
- Sum. Inst. reja protecc ventanas = 57,65m²
- Pintura Vinilo Tipo 1 = 95,96m²
- Pintura Esmalte = 154,22m²
- Sumin. Inst Cielo Raso = 93,73m²

Powered by CamScanner

Nota 225: Se concilian cantidad ejecutadas a la Fecha para cobro corte numero 6:

- Remoción de pintura exist: 85,29m²
- Reemboquillado Muros primer piso: 85,29m²
- Sum. Inst. Panel Led ; 18 und
- Suma Inst. granito Baldosa 1er paso = 147.46m²
- Decolorante y pulido Baldosa = 300,59m²
- Sum. Inst. reja proteccion ventanas = 57,65m²
- Pintura Vinilo Tipo 1 = 95,96m²
- Pintura Esmalte = 154,22m²
- Suministro Inst cielo Raso = 93,73m²

Nota 226: Domingo 26 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3ok obra civil

Nota 227: Se adelantan actividades de pintura, cielo raso y reemboquillado de muros salones segundo piso

Nota 228: Lunes 27 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 de pintura

Nota 229: Se adelantan actividades de pintura y acabados en aulas 1, 2 y 3 primer piso para hacer entrega de aulas parcialmente y asi poder finalizar actividades en segundo piso.

Powered by CamScanner

Nota 230: Martes 28 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 de obra civil, 1 m.

Nota 231: Se adelantan actividades de remates pilos salones segundo piso, instalacion de tableros, Se realiza la adecuacion para la entrega provisional el dia de hoy en la torre a la institucion para poder trabajar en los salones del segundo piso; Se realiza la entrega provisional de aula 1, 2 y 3 con las siguientes observaciones:

- Aula 1:
  - Cambio de interruptor
  - Pintura de Puerta y Marco
  - Arreglos puntuales de Marqueteria y limpieza de vidrios ventaneria
  - Instalacion tapacieyo en caja de interruptor
  - Instalacion tapa ciega en techo al lado de luminaria
- Aula 2:
  - Arreglo filos Dintel sobre puerta.
  - Pintura de Puerta y Marco
  - Remates pintura dinteles ventana interna
  - Pintar tuberia Emt y cajas
  - Detalles pintura cielo raso y dilataciones
  - Cambio interruptor
- Aula 3:
  - Cambio de 1 luminaria que no Funciona
  - Cambio de interruptor
  - Limpieza de ventanas - persiana a cielo
  - Sikaflex ventana interna
  - Pintura puerta y Marco

Powered by CamScanner

Las anteriores observaciones deben ser subsanadas en el transcurso de la semana junto con la actividades del segundo piso

Jaime Molina
Residente Obra
UT GePM

Powered by CamScanner

Las anteriores observaciones deben ser subsanadas en el transcurso de la semana junto con la actividades del segundo piso

Jaime Molina
Residente Obra
UT GePM

Nota 232: Miercoles 29 de Mayo de 2024
clima; Soleado
Hora de inicio: 7:00 am
personal: 3 de obra civil

Nota 233: Se adelantan actividades de rembayuillos salones segundo piso y de hall segundo piso, primera mano de pintura blanca Salones segundo piso, Se recomienda a contratista tener atención al detalle de acabados en pintura muros y techos.

Nota 234: para dar trazabilidad a seguimiento de calidad, se han liberado placas y alistado de pisos de todos los salones, falta por liberar pintura de Muros en estuelte, en vinilo, cielo raso, luminarias, tomacorrientes, enchape piso en tableta terrazo por pendientes y detalles de acabados que se le solicitan al contratista corregir, de igual manera la ventaneria y vidrieria instalada.

Nota 235: Jueves 30 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Nublado

Powered by CamScanner

Personal: 4 de obra civil, 1 residente, 1 maestro

Nota 236: Se adelantan actividades de pintura en salones del segundo piso muros y estructura portico y se sigue avanzando con reemboquillado de muros en Hall y escaleras

Nota 237: Viernes 31 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 4 de obra civil, 1 residente, 1 inspector

Nota 238: Se adelantan actividades de pintura en cemstite muros y estructura (portico) salones segundo piso y se realiza remates de filos y reemboquillado es Hall y escaleras segundo piso. Se recomienda al contratista terminar actividades lo antes posible, ya que hay un atraso en entrega de acuerdo a programación.

Nota 239: Se define con apoyo a la Supervision y con el contratista la intervención de la fachada interna del Bloque de preescolar, realizando actividades de resane y pintura. Se le solicita avanzar al contratista con este alcance y enviar presupuesto

Powered by CamScanner

Nota 240: Sabado 01 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 4 de obra civil

Nota 241: Se adelantan actividades de pintura y acabados salones del segundo piso y se realiza pintura primera mano en Hall y escaleras segundo piso

Nota 242: Martes 04 de junio de 2024.
Hora inicio: 7:00 am
clima: Soleado
Personal: 7 de obra civil

Nota 243: Se adelantan actividades de remates pintura salones segundo piso, hall y escaleras, Se adelanta la construccion de bocapuertos en granito salones segundo piso. Se Solicita a contratista realizar la pintura de los puertos de los 6 salones intervenidos y revisar detalles de filos, ventaneria, y acabados de pintura

Nota 244: Miercoles 05 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
clima: Soleado
Personal: 3 de obra civil

11 11

NKA

Powered by CamScanner

Nota 245: Se adelantan actividades de bocaporitos en granito sobre segundo piso y recortes de pintura en Hall y escaleras segundo piso. Los salones del primer piso estan en fraccionamiento por parte de la institucion sin embargo no se ha realizado entrega formal debido a detalles pendientes en cielo raso, interruptores, ventaneria, pintura puertas, y filos intervenidos.

Nota 246: Jueves 06 de junio de 2024
clima: Soleado
personal: No hay personal
Actividades: No se ejecutan actividades por falta de personal

Nota 247: viernes 07 de junio de 2024
clima: Nublado
personal: No hay personal
Actividades: No se ejecutan actividades por falta de personal

Nota 248: Actividades pendientes para entrega final no se han realizado, se solicita a contratista realizar acabados finales de pintura, cielo raso, luminarias, tomacorrientes, brillado de piso Hall segundo nivel, pintura de puertas y recortes ventaneria. A la fecha no se ha recibido el presupuesto para la pintura de fachada interna

Sábado. Abril 27 de 2024.

Nota 335 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 336 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra. Se verifican medidas.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Lunes. Abril 29 de 2024.

Nota 337 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente. 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 338 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Abril 30 de 2024

Nota 339 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 340 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Mayo 02 de 2024.

Nota 341 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 342 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Viernes. Martes Mayo 03 de 2024

Nota 343 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 344 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Powered by CamScanner

Sábado. Mayo 04 de 2024.

Nota 345 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 Instalador. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 346 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra, se verifican medidas de los espejos de los baños del segundo y del tercer piso, por parte del instalador.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Lunes. Mayo 06 de 2024

Nota 347 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 348 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Martes. Mayo 07 de 2024.

Nota 349 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 350 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Miércoles. Mayo 08 de 2024.

Nota 351 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST. 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 352 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Jueves. Mayo 09 de 2024.

Nota 353 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Lluvioso. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Powered by CamScanner

Jueves. Mayo 09 de 2024

Nota 354 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se retiran RCD del patio central. No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Viernes. Mayo 10 de 2024.

Nota 355 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 356 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Sábado. Mayo 11 de 2024.

Nota 357 PERSONAL DE OBRA. 1 Residente, 1 Inspector. 1 Residente SST, Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 358 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

Martes. Mayo 14 de 2024

Nota 359 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente. 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 360 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal,
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Nota 361 P.D. Llega material de obra para la estructura de la cubierta del Salón de orientación.

Miércoles. Mayo 15 de 2024.

Nota 362 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 1 Ayudante, 2 Instaladores. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Lluvioso y Nublado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 2 Secciones de andamio. MATERIALES: Espejos para los baños del segundo y del tercer piso. Tambien llega un espejo para la sala de Artes.

Powered by CamScanner

Miércoles. Mayo 15 de 2024.

Nota 363 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia la instalación de los anclajes de soporte del refuerzo de la estructura metálica para la cubierta del salón de orientación. Llegan los espejos para los baños del segundo y tercer piso, y para el aula de artes, Inician la instalación de los espejos.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Jueves. Mayo 16 de 2024

Nota 364 PERSONAL DE OBRA: 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 1 Ayudante, 1 Instalador. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. Tarde: Llovizna. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: Dos secciones de andamios.

Nota 365 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Continúa la instalación de los anclajes de soporte del refuerzo de la estructura metálica para la cubierta del salón de orientación. Continúa la instalación de los espejos en los baños del segundo y del tercer piso, donde se partió un espejo en el baño de hombres.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022

UT GePM 2023-1.
Ernesto José Guerrero González.
Residente de ~~Inter~~ Obra.

Nota 366 Viernes Mayo 17 de 2024
Personal de obra: 1 Residente sin personal de obra
Personal interventoria: 1 Residente - 1 inspectos
clima: nublado

Nota 367 Se realiza inspección visual al andamio ubicado en el aula de orientacion y este no cuenta con seguros correspondientes en sus uniones. Asi mismo, no es un andamio certificado para la actividad. Recomendamos hacer el cambio de andamio para actividades de trabajo en alturas.

SST-MA Interventoría

Nota 368 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se ejecutan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ernesto José Guerrero González
Residente de obra.
UT GePM 2023-1.

Powered by CamScanner

Sábado. Mayo 18 de 2024.

Nota 369 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 Instaladores. 1 Inspector de soldaduras. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado y Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Dos secciones de andamio que no cumplen con la normatividad vigente.

Nota 370 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Los instaladores de la cubierta del auditorio y de orientación verifican medidas. Se realizan pruebas de líquidos penetrantes a la soldadura de los refuerzos de la estructura metálica de la cubierta del auditorio, dando como resultado dos aprobaciones y un rechazo a la soldadura. Se solicita al Contratista las medidas correctivas del caso.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ernesto José Guerrero González.
Residente de Obra.
UT GePA 2023-1.

Lunes. Mayo 20 de 2024

Nota 371 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 Ayudante. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 372 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Se informa la instalación de la puerta del acceso posterior, el día sábado en horas de la mañana. No se desarrollan otras actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022

Ernesto José Guerrero González.
Residente de Obra.
UT GePA 2023-1.

Martes. Mayo 21 de 2024.

Nota 373 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector. 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 374 ACTIVIDADES DE OBRA: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ernesto José Guerrero G.
Residente de Obra.
UT GEPA 2023-1.

Miércoles. Mayo 22 de 2024.

Nota 375 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Nublado y soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Powered by CamScanner

Miércoles. Mayo 22 de 2024.

Nota 376 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero T.
Residente Obra.
UT GEPH 2023-1.

Jueves. Mayo 23 de 2024.

Nota 377 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado. Tarde: Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: N/A.

Nota 378 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero G.
Residente Obra
UT GEPH 2023-1.

Viernes. Mayo 24 de 2024.

Nota 379 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 1 oficial, 3 Ayudantes. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Soleado. Tarde: Soleado. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 380 ACTIVIDADES EJECUTADAS: No se desarrollan actividades de obra complementarias, Se desmonta la Teja de asbesto cemento de la cubierta del aula de orientación.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Ernesto Guerrero.
Residente Obra.
UT GEPH 2023-1.

Sábado. Mayo 25 de 2024.

Nota 381 PERSONAL DE OBRA: 1 Residente, 1 Inspector, 1 Residente SST, 1 Maestro, 2 Instaladores. PERSONAL DE INTERVENTORÍA: 1 Residente, 1 Inspector. ESTADO DEL CLIMA. Mañana: Nublado y Lluvioso. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: Herramienta menor.

Nota 382 ACTIVIDADES EJECUTADAS: Inicia la instalación de la teja tipo sándwich en la cubierta del aula de orientación estudiantil.

Ernesto J. Guerrero T.
Residente Obra
UT GEPH 2023-1.

Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Nota 383 NOTA DE INTERVENTORÍA: Se manifiesta producto no conforme en la estructura metálica de la cubierta del aula de orientación. No se subsanaron los rechazos a la soldadura de esta estructura, tampoco se limpió, ni se pintó. Con estas falencias se procedió a la instalación de la teja tipo sándwich, sin EPP ni línea de vida, por parte de los instaladores quienes estaban ejecutando la actividad en estas condiciones bajo la lluvia.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoria
Consorcio Santa María 022.

Powered by CamScanner

Lunes 27 de Mayo 2024.

Nota 384. Personal de obra: 1 residente, 1 inspector, 1 residente SST, 1 Maestro. Personal interventoría: 1 residente, 1 inspector.

Nota 385. Actividades Realizadas: No se ejecutaron actividades.

Atl
Juan Carlos Delgado Correal
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero G.
Residente Obra
UT GEPA 2023-1.

Martes 28 de Mayo 2024.

Nota 386. Personal de Obra: 1 residente, 1 inspector. 1 residente SST, 1 Maestro. Personal interventoría: 1 residente, 1 inspector.

Nota 387. Actividades Realizadas: No se ejecutaron actividades.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero G.
Residente Obra.
UT GEPA 2023-1.

Miercoles 29 de Mayo de 2024.

Nota 388. Personal de obra: 1 residente, 1 inspector, 1 residente SST, 1 Maestro. Personal interventoría: 1 residente, 1 inspector. Personal operativo: 1 operario y 1 ayudante de cubiertas. Estado clima: Mañana soleada, Tarde nublada y lluvia en la tarde. Herramientas y Equipos: Herramienta menor.

Nota 389. Actividades Ejecutadas: Se trabajo en cubierta en horas de la mañana.

Juan Carlos Delgado Correal.
Residente de Interventoría
Consorcio Santa María 022.

Ernesto J. Guerrero G.
Residente Obra.
UT GEPA 2023-1.

Powered by CamScanner

Nota 346: Martes 30 de Abril de 2024
Hora inicio: 7:00am
Clima: Soleado
Personal: 3 obra civil, 1 maestro, 1 sst, 3 electricos

Nota 347: Llega material, tubería emt, 28 tubos, cable, cajas, luminarias.

Nota 348: Definiciones: Muro superboard estampillado a los caras delas cerchas con el aislante y respectivos filos. La fachada frontal de aulas de sistemas ira con el muro en superboard a filo externo y la tuberia existente debera ir sobre la viga en concreto existente en la parte interna. Se recomienda urgentemente darle tratamiento a la socavación dela excavación del tanque; estas actividades no seran reconocidas economicamente por interventoria, ya que se evidencia y recomienda precumente mejor el entibamiento existente al cual esta con polines de madera y cuñillos de madera.

Nota 349: Se realiza visita técnica con especialista electricos para dar alcance de voz y datos y parte electrica Aula de sistemas. Se deja acta con compromisos y definiciones.

Nota 350: Jueves 02 de Abril de 2024
Hora de inicio:
Clima: Nublado
Personal: 2 eléctricos, 1 maestro, 3 obra civil

Norma

Powered by CamScanner

Nota 351: Se adelantan actividades de instalación electrica en aula de sistemas de tubería Emt para luminarias. Se adelantan actividades de canalizaciones de Aguas lluvias. Se vuelve a recomendar la correcta protección de los equipos de sistemas (rack, tableros electricos, reguladores etc), a la fecha no cuentan con una debida proteccion rigida contra impacto y polución; de presentarse algún daño de estos equipos no se reconocerá su reparación y/o reemplazo. Adicionalmente se evidencia nuevamente socavación y fisuración en estratos de excavación del tanque Agua coll, a pesar que se mejoro la entibación, aun esta no cuenta con especificaciones técnicas de un entibamiento ya que esta con Madera rolliza y Comillas y no hay elementos caracteristicos del entibado, por lo anterior si se llegan a presentar afectaciones en la infraestructura del colegio aledaños a la excavación, la Interventoría no reconocerá estos sobrecostos por afectaciones, ni los sobrecostos para estabilización de la socavación.

Nota 352:

Powered by CamScanner

Nota 355 : Sabado 04 de Mayo 2024
Hora inicio 7:00 am
Clima: Soleado
Personal : 07 de obra Civil ; 2 electricos

Nota 356: Se adelantan actividades de instalacion estructura para dinteles superboard aula de sistemas, e instalacion de tuberia EMT para alimentacion eléctrica luminarias.

Nota 357: Se evidencia que la excavación del tanque se llena de agua por escorrentia por lo tanto se sigue recomendando mejor el sistema de entibamiento con porales telescopicos y plataformas de contencion para frenar la socavación del terreno

Nota 358: Lunes 06 de Mayo de 2024
Hora inicio 7:00 am
Clima : Nublado
personal : 3 de obra civil , 2 electricos

Nota 359: Se adelantan actividades de estructura de superboard para dinteles aulas de sistemas. se recomienda al contratista ir tapando con superboard. se adelantan actividades electricas en aula de sistemas y acomodacion de tuberia existente.

Nota 360: Se evidencia mayor desprendimiento y socavación en la excavacion del tanque, por lo cual se sigue recomendando al contratista mejorar el sistema de entibamiento y recomposicion del terreno con concreto inyectado o material retable. Se empieza a presenciar afectacion en andén aledaño y posiblemente en jardinera,

Norma

Powered by CamScanner

Nota 361: Martes 07 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 obra civil, 1 maestro

Nota 362; Se sigue evidenciando socavacion en excavación del tanque y aun no se mejora el sistema de entibamiento o tratamiento al material. Se solicita urgentemente al contratista tomar acciones inmediatas para evitar daños mayores a elementos aledaños, La Interventoria no reconocera el costo de estas reparaciones ya que ha evidenciado falencias en el entibamiento que aun persisten,

Nota 363: Se adelantan actividades de estructura para Superboard en diferentes aulas de sistemas. No se ha podido instalar superboard porque aun ha llegado dilataciones a obra. No se adelantan más actividades.

Nota 364: A la fecha no se han instalado los espejos en baños, por lo cual no se han recibido. Se evidencian daños en unidades sanitarias por desprendimiento de boscochos sanitario.

Powered by CamScanner

Nota 361: Martes 07 de Mayo de 2024
Hora inici: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 obra civil, 1 maestro

Nota 362: Se sigue evidenciando socavacion en excavación del tanque y aun no se mejora el sistema de entibamiento o tratamiento al material. Se solicita urgentemente al contratista tomar acciones inmediatas para evitar daños mayores a elementos aledaños. La Interventoria no reconocera el costo de estas reparaciones ya que ha evidenciado falencias en el entibamiento que aun persisten.

Nota 363: Se adelantan actividades de estructura para Superboard en dinteles aula de sistemas. No se ha podido instalar superboard porque no ha llegado dilataciones a obra. No se adelantan más actividades.

Nota 364: A la fecha no se han instalado los espejos en baños, por lo cual no se han recibido. Se evidencian daños en unidades sanitarias por desprendimiento de boquillas sanitario.

Nota 365: Miercoles 08 de Mayo de 2024
Hora de inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 3 de obra civil.

Nota 366: Se adelantan actividades en dinteles superboard aulas de sistemas con avance en ICOPOR 5cm. No se adelantan actividades en excavaciones aguas lluvia.

Powered by CamScanner

Nota 367: Llegan ventanas - persianas para aulas de sistemas, Llega un viaje sencillo de rajón, un viaje de arena de río, un viaje de gravilla. Llegan 15 bultos de cemento.

Nota 368: Se realiza la instalación de espejos batería de baños; se realiza la observación de instalarlos y asegurarlos bien hacia la pared y que no queden puntas ni bordes sobresalientes como factores de riesgo en su uso.

Nota 369: Se sigue recomendando a contratista que en el momento de mitigar la socavación de la excavación en tanque aguas lluvias, se implementen sistema con planchones y puntales telescopicos los cuales garantizan de mejor manera la contención del material

Nota 370: Se esta a la espera de presupuesto electrico y presupuesto de tanques opcion fibra de vidrio para revisión y aprobacion con la SED.

Nota 371: Jueves 09 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Lluvias todo el día
Personal: 3 de obra civil

Nota 372: Se adelantan actividades de instalacion dinteles superboard y muro divisorio aulas de sistemas, No se ejecutan actividades en excavacion de tanque por condiciones de Seguridad por lluvias, se hace el drenado del agua acumulada. En Comite de obra semanal se aprueba la ejecución de Sub-muracion con concreto ciclopeo para la contención de la socavacion, se recomienda usar planchones y puntales telescopicos.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 373: Viernes 10 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Lluvias toda la mañana - tarde nublada
Personal: 3 de obra civil.

Nota 374: Se adelantan actividades dinteles aula de Sistemas, no se adelantan mas actividades se recomienda a contratista avanzar con instalaciones electricas y acabados en aula de sistemas ya que no se cuenta con buen rendimiento y son actividades atrasadas.

Nota 375: Se hace revisión con contratista y se solicita varios detalles para la liberacion de baterrias de baño:

- Tubiertas pringada de pintura blanca de la estructura
- Divisiones en acero inoxidable desajustadas (puertas y divisiones),
- Remates de pintura y filos en baño mujeres
- Remates ajustes silicona espejos y empates entre secciones de espejos
- Pintura en general

Nota 376: No se evidencia buen rendimiento en Aula de sistemas por falta de mocilla, cinta malla y madera para asegurar e instalar ventaneria

Nota 373: Viernes 10 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Lluvias toda la mañana - tarde nublada
personal: 3 de obra civil.

Nota 374: Se adelantan actividades dentelos aula de sistemas, no se adelantan mas actividades x se recomienda a contratista avanzar con instalaciones electricas y acabados en aula de sistemas ya que no se cuenta con buen rendimiento y son actividades atrasadas.

Nota 375: Se hace revisión con contratista y se solicita varios detalles para la liberacion de baterrias de baño:
- Tuberia pringada de pintura blanca de la estructura
- Divisiones en acero inoxidable desajustadas (puertas y divisiones),
- Remates de pintura y filos en baño mujeres
- Remates ajustes silicona espejos y empates entre secciones de espejos
- Pintura en general • Remate vertical posterior en teja

Nota 376: No se evidencia buen rendimiento en Aula de sistemas por falta de mocilla, cinta malla y madera para asegurar e instalar ventaneria

Nota 377: No se evidencian remates faltantes en cubiertas, electricos, pintura de area de salones. Se solicita a contratista intervenirlos inmediatamente para cerrar pendientes

Nota 373: Viernes 10 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Lluvias toda la mañana - tarde nublada
Personal: 3 de obra civil.

Nota 374: Se adelantan actividades dentelos aula de sistemas, no se adelantan mas actividades. Se recomienda a contratista avanzar con instalaciones electricas y acabados en aula de sistemas ya que no se cuenta con buen rendimiento y son actividades atrasadas.

Nota 375: Se hace revisión con contratista y se solicitan varios detalles para la liberacion de baterias de baño:
- Tejuela prinyada de pintura blanca de la estructura
- Divisiones en acero inoxidable desajustadas (puertas y divisiones),
- Remates de pintura y filos en baño mujeres
- Remates ajustes silicona espejos y empates entre secciones de espejos
- Pintura en general - Remate vertical posterior en tejá

Nota 376: No se evidencia buen rendimiento en Aula de sistemas por falta de macilla, cinta malla y madera para asegurar e instalar ventaneria

Nota 377: No se evidencian remates faltantes en cubiertas, electricos, pintura de area de salones. Se solicita a contratista intervenirlos inmediatamente para cerrar pendientes

Nota 378: Sabado 11 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado - Lluvias en la tarde
Personal: 5 de obra civil

Nota 379: Se adelantan actividades de dinteles en superboard aulas de sistemas, no ha llegado madera para fijación de ventanería por lo tanto no se han instalado, esta actividad ya presenta gran atraso e incumplimiento de entrega. Se adelantan actividades de retiro de material suelto en excavación del tanque aguas lluvias, sin embargo se evidencia al personal sin EPPS, sin equipos de alturas o kit de rescate, sin medios de acceso a la excavación, por lo tanto se remite un requerimiento de seguridad a la arca SST. Se adelanta con una fundición en ciclopeo de aproximadamente 0,70m de altura, sin embargo no se atiende a la recomendación de usar parales telescopicos y plunthones para garantizar la estabilidad, por lo que la formaleta (comillos de madera y polos rollizos) se bombeo, lo cual puede interferir en el momento de la instalación del tanque por sus dimensiones, o puede causar que la formaleta falle ocasionando perdida del material. Es responsabilidad 100% del contratista garantizar la buena ejecución de los trabajos realizados y de las consecuencias que puedan generar las malas practicas empleadas. Por parte de Interventoría ya se han realizado varios requerimientos por estas inconsistencias.

Nota 380: Martes 14 de Mayo de 2024
Hora inico: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 obra civil

Nota 381: Se adelantan actividades de instalacion de superboard dinteles aula de sistemas, se evidencia bajo rendimiento por falta de Materiales (parales de madera para ventanas), generando un mayor incumplimiento en la entrega de estas aulas a la instalación

Norma

Powered by CamScanner

Nota 382: Se evidencia el drenado del agua en la excavacion del tanque, sin embargo no se evidencia personal ni actividades en esta zona. Se recomienda al contratista tomar acciones inmediatas y permanentes para subsanar esta actividad, de ser requerido aumentar la capacidad de la bomba para un drenaje mas rapido

Nota 383: Se evidencia un ajuste en los divisiones de acero inoxidable batiria de baños, sin embargo persisten los demas pendientes de acabados descritos en la nota 375 por lo anterior no se puede liberar esta zona por calidad.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 382: Se evidencia el drenado del agua en la excavacion del tanque, sin embargo no se evidencia personal ni actividades en esta zona. Se recomienda al contratista tomar acciones inmediatas y permanentes para subsanar esta actividad, de ser requerido aumentar la capacidad de la bomba para un drenaje mas rapido

Nota 383: Se evidencia un ajuste en los divisiones de acero inoxidable bateria de baños, sin embargo persisten los demas pendientes de acabados descritos en la nota 375 por lo anterior no se puede liberar esta zona por calidad.

Nota 384: Miercoles 15 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Lluvias en la mañana
Personal: 5 de obra civil

Nota 385: Se adelantan actividades en Aulas de Sistemas dinteles en Superboard y resanes y Submuracion con concreto ciclopeo en excavacion tanque agua lluvia

Nota 385: Jueves 16 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 5 de obra civil

Nota 386: Se adelantan actividades de submuración y resanes de caja excavación tanque e instalación vapor, Superboard en aula de sistemas, esta pendiente que llegue madera para instalacion de ventanas.

Nota 387: Viernes 17 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado

Norma

Powered by CamScanner

Personal: 3 de obra civil.

Nota 388: Se adelantan actividades de muro intermedio entre salones 210 - 209 de sistemas, en superboard. Se adelantan dinteles en superboard, se recomienda mejor rendimiento para entrega de zonas al colegio.

Nota 389: para dar trazabilidad a seguimiento de calidad, se hace la liberacion provisional, de los baterios de baños con observaciones y se deja en acta con fecha 17-05-2024.

Powered by CamScanner

Personal: 3 de abril mil.

Nota 389: Se coordinaron actividades de mure interno entre salas 210 - 208 de sistemas, 10 Superboard. Se coordinaron dudas en superboard. Se recomienda mejor mantenimiento para entrega de pares al colegio.

Nota 389: para dar factibilidad a seguimiento de calidad, se hace la liberación personal, de los bancos de hojas con observaciones y se deja en cada caso fecha 10-03-2019.

Nota 390: Sábado 19 de Mayo de 2018
Hora inicio: 7:00 am
Clase: diversa
Personal: Taboo mil

Nota 391: Se coordinaron actividades de mantenimiento de superboard y respaldo de datos en aulas de sistemas, No se ejecutan actividades en la recepción y subrogación de turnos. Se recomienda se termine esta actividad y se entregue las aulas de Sistemas lo antes posible ya que se han interrumpido los compromisos con la institución en las fechas acordadas.

Nota 392: Lunes 20 de Mayo de 2018
Hora inicio: 7:00 am
Clase: Idiomas
Personal: 3 de abril, 3 de Mayo

Nota 393: Se adelantan actividades de dinteles en superboard cuba de sistemas en la cubierta de cubierta laterales. Adicional se adelantan actividades para la instalacion de redes electricas de toma corrientes, iluminación, lamparas de emergencia, se le recomienda al Contratista mejorar el rendimiento y suministro de Materiales para poder entregar en fechas de compromiso las obras en base a lo acordado con la instalación.

Nota 394: No se evidencia ejecución de actividades en la excavación del tanque aguacedl, solo se ha ejecutado la submuracion de una cara de la excavación, Se solicita al contratista ejecutar esta actividad lo antes posible

Nota 395: Martes 21 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
personal: 3 de obra civil

Nota 396: Se adelantan actividades de Superboard en la cara posterior de los muros de los sabores de sistems, Llegan repisos de Madera para reforzamiento de Marco para la instalacion de la ventaneria, se solicita realizar esta instalacion lo antes posible, se adelantan dilataciones y Masillado de Muros en Superboard.

Nota 397: No se adelantan actividades de agyor lluvia ni entibacion con submuracion en la Excavacion del tanque.

Nota 398: Miercoles 22 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am.
Clima: Soleado
Personal: 1 oficial - 2 ayudantes - 1 Residente - 1 SST.

Nota 399: Se realiza revisión de las observaciones y se constata la atención a las mismas en bateria sanitaria; por lo tanto, se procede a entregar en buen estado, el funcionamiento correcto de los elementos de la bateria sanitaria de baños de mujeres y hombres al señor rector Hernando Martinez.

Rector

Jaime Molina
Residente Obra

Nota 400: Se adelantan actividades de Mosillado dinteles de Superboard, aun no se instala ventaneria. No se adelantan más actividades. Se solicita a Contratista terminar las actividades pendientes para realizar entrega de las zonas.

Nota 401: Jueves 23 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 5 de obra civil, 2 electricos, 1 residente, 1 Maestro

Nota 402: Se adelantan actividades de Superboard, Mosillado en dinteles y ducto de sistemas y remate contra Cubierta, No se adelantan actividades en la excavacion del tanque aguacell ni en Construcciones aguas lluvia.

Nota 403: Llego Material de obra electrica, 26 Canaletas Metalicas, 20 luminarias, 4 lamparas de emergencia, cajas interruptores, cajas tomacorrientes

Nota 404: Viernes 24 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Lluvioso
Personal: 3 de obra Civil, 6 electricos

Nota 405: Se adelanto lijado y primera mano de pintura en dinteles aulas de sistemas., aun no se han instalado las ventanas, Se adelanta actividades de Montaje luminarios Aulas de Sistemas, tomacorrientes & interruptores, Se realiza la instalacion de luminarios de Emergencia en pasillo frontal aulas. No se adelantan actividades en submuracion del tanque.

Nota 406: Para dar trazabilidad a seguimiento de Calidad aun no se han liberado actividades en aulas de Sistemas, Se libera Bateria de Baños; divisiones en acero inoxidable, pintura, unidades sanitarias, espejos, lavamanos, pisos, ya que fue recibido por el recinto segun la nota 398 de la presente Bitacora.

Nota 407: Sabado 25 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00am
Clima: Llueve todo el dia
Personal: 2 obra civil, 4 electricos

Nota 408: Se adelantan actividades de instalacion de canaleta Metalica mano cableado otic y electrico puestos de trabajo aulas de sistemas, Se adelantan detalles y pintura dinteles Superboard y pintura mano divisorio entre aulas de Sistemas.

Nota 409: Se realiza la conciliacion de Cantidades de obra ejecutadas a la fecha de acuerdo con avances

Norma

Powered by CamScanner

de obra en Areas intervenidas. Los contadores concluidos son:

- Desmonte de luminarias : 16 und
- Suministro e instalación. : 3 interruptores Sencillo,
- Suministro + Instalación Interr. Doble : 2 und
- Suministro e instalación Salida luminaria : 25 und
- Suminist. e inst. Salid. Lumi. Energy : 4 und
- Suministro e inst. Lumin +8 ext : 4+5 = 9 und
- Suminist e inst. Luminaria LED Aula. Sistemas = 16 und
- Suministro e inst luminaria emergencia : 4 und
- Kit de guayas : 16 und
- Superboard 2 caras m² = 34,06 m²
- Suministro. Inst. Cabellete cub sandwich = 28,90mL
- Sum. Inst. Plancha lam Galv = 178,00mL
- Sum Inst Espejos Baños = 1,80 + 1.56 + 1,76 + 1,62 = 6,74 m²

de obra en Areas intervenidas. Los cantidades conciliadas son:

- Desmonte de luminarias: 16 und
- Suministro e instalación: 3 interruptores Sencillos
- Suministro e instalación Interr. Doble: 2 und
- Suministro e instalación Salida luminaria: 25 und
- Suminst. e inst. Salid. Lumi. Emerg: 4 und
- Suministro e inst. Lumin tipo ext: 4+5 = 9 und
- Suinst e inst. luminaria LED Aub. Sistemas = 16 und
- Suinst e inst luminarias emergencia: 9 und
- Kit de guayas: 16 und
- superboard 2 caras m² = 34,06 m²
- Suminst. inst. Cabullete cub sandwich = 28,90 mL
- Sum. Inst. filoncho lam Galv = 18,00 mL
- Sum Inst Espejos Baños = 1,80 + 1.56 + 1,76 + 1,62 = 6,74 m²

Nota 410; Lunes 27 de Mayo de 2024
Horario Inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 5 de obra civil

Nota 411: Se adelantan actividades de pintura dinteles en aulas de sistemas. Se realiza instalación de ventanería en aula de sistemas.

Nota 412: Martes 28 de Mayo de 2024
Hora. Inicio: 7:00 am
Clima: soleado
Personal: 2 de obra civil

Norma

Powered by CamScanner

Nota 413: Se adelantan actividades de pintura y remates en dinteles y portones sin de sistemas. Se recomienda a contratista proteger los equipos existentes.

Nota 414: No se evidencia ejecución en Submuración excavación tanque aguacal, se ha reiterado esta Solicitud, se cuenta con autorización de cobro y materiales y aun después de casi 1 mes no se ha realizado la actividad, permaneciendo el riesgo de afectación de áreas aledañas y personal de las instituciones.

Norma

Powered by CamScanner

Nota 413: Se adelantan actividades de pintura y remates en dinteles y porticos aula de sistemas. Se recomienda a contratista proteger los equipos existentes.

Nota 414: No se evidencia ejecución en Submuracion excavacion tanque aguacatl, se ha reiterado esta solicitud, se cuenta con autorizacion de cobro y materiales y aun despues de casi 1 mes no se ha realizado la actividad, permaneciendo el riesgo de afectacion de áreas aledañas y personal de las instituciones.

Nota 415: Miercoles 29 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Nublado
Personal: 3 obra civil, 2 electricos

Nota 416: Se adelantan actividades de pintura porticos estructura en aula de sistemas y remates generales en muros. Se avanza con instalacion de canaleta electrica.

Nota 417: No se evidencia avance en submuracion de excavacion de tanque. Interventoria sigue recomendando ejecutar esta actividad lo antes posible.

Nota 418: Jueves 30 de Mayo de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
Personal: 3 obra civil, 2 electricos

Norma

Powered by CamScanner

Nota 419: Se adelantan actividades de pintura en porticos y aulas de sistemas. y se avanza con modulación e instalación de canaleta para cableado electrico y datos. No se evidencia avance en la submuracion de la excavación del tanque.

Nota 420: Viernes 31 de Mayo de 2024
Clima: Soleado
Hora inico: 7:00 am
personal: 3 de obra civil, 2 electricos

Nota 421: Se adelantan actividades de pintura en porticos aula de sistemas. Se le recomienda a contratista prestar atencion al detalle de acabados. Tambien se adelanta instalacción de canaleta electrica

Nota 422: No se evidencia avance en la submuracion del tanque aguacell ni en las canalizaciones y cajas aguas lluvia ya que a la fecha no se cuenta con aprobacion del NP del tanque

Nota 423: Dando trazabilidad a seguimiento de calidad, se liberan estructura y montaje de superboard aulas de sistemas y montaje de ventaneria de aulas de sistemas,, Las demas actividades electricas y de acabados no se pueden liberar ya que faltan detalles de acabado

Nota 424: Martes 04 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 obra civil, 2 eléctricos

Nota 425: Se avanza con la submuración de la excavación del tanque aquacell. Están pendientes actividades en Aulas de sistemas como guardaescobas muro intermedio aseo y limpieza.

Nota 426: Miercoles 05 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 de O.C y 2 electricos

Nota 427: Se adelanta la submuración de la excavacion del tanque aquacell, y se adelanta instalación de canaletas para red electrica y datos. No se han terminado los pendientes de aulas de sistemas. Se recomienda a contratista mejorar el rendimiento de obra en la parte electrica y de entibación

Nota 428: Jueves 06 de junio de 2024
Hora inicio: 7:00 am
Clima: Soleado
personal: 3 de O.C. y 2 eléctricos

Nota 429: Se adelantan actividades de submuracion excavación tanque aquacell y la instalacion de Canaleta eléctrica.

Norma

Powered by CamScanner

94

Nota 430 : Viernes 07 de junio de 2024
Hora inicio : 7:00 am
Clima : Soleado
personal : 3 de obra civil

Nota 431 : Se adelantan actividades de Submuración en excavacion de tanque aguacell, se evidencia bajo rendimiento en esta actividad. No se adelantan más actividades.

Nota 432 : Se le recomienda a contratista por parte de la interventoría ejecutar las actividades pendientes con mayor rendimiento para cumplir con programación y poder entregar el frente lo antes posible. A la fecha no se cuenta con aprobacion del NP tanque Aguacell por parte de la SED.

Norma

Powered by CamScanner
