UT. INTERCOMEDOR ITSI

FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	6	2024	2. No. INFORME	66	3. SEMANA No.	66
4. INFORME CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE:	03/06/2024 AL 09/06/2024			5. ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	0756-23	7. FECHA CONTRATO:	23	2	2023	8. VALOR CONTRATO:	$ 3.684.062.560,88	
9. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	11. PLAZO: 18 Meses
12. PRORROGAS:	4	13. SUSPENSIONES:	1			14. ADICIONES:	$ 1.389.880.309,00	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA							
16. CONTRATISTA:	WRUSSY INGENIEROS S.A.S							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	0757-23	18. FECHA CONTRATO:	22	2	2023	19. VALOR CONTRATO:	$ 272.766.458,00	
20. FECHA ACTA INICIO:	6	3	2023	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	10	9	2024	22. PLAZO: 18 Meses
23. PRORROGAS:	4	24. SUSPENSIONES:	1			25. ADICIONES:	$ 102.851.142,00	
26. INTEVENTORÍA:	UT INTERCOMEDOR ITSI							
27. SUPERVISOR :	ARQ. ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	VALOR DEL CAPITULO	Peso en % del capitulo en relación al valor total del contrato (costos directos) (A)	% Acumulado programado por capitulo (B)	% Total Programado del capitulo (C)=AxB	% Acumulado de ejecución física por capitulo (D)	% Total ejecutado por capitulo (E)=AxD	(% Ejecución Física - % Acumulado programado) (F)= D-B	% Total de adelanto o atraso (G)=E-C
PRELIMINARES	$ 64.216.038,86	1,76%	100,00%	1,76%	99,51%	1,75%	-0,49%	-0,01%
MOVIMIENTO DE TIERRA	$ 263.478.007,52	7,20%	100,00%	7,20%	75,26%	5,42%	-24,74%	-1,78%
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y ACERO	$ 1.037.144.034,60	28,36%	97,00%	27,51%	98,56%	27,95%	1,56%	0,44%
MAMPOSTERIA Y FRISOS	$ 44.021.107,71	1,20%	98,00%	1,18%	91,31%	1,10%	-6,69%	-0,08%
ARQUITECTURA Y ACABADO	$ 430.812.976,96	11,78%	39,00%	4,59%	84,10%	9,91%	45,10%	5,31%
INSTALACIONES HIDRAULICAS	$ 26.309.452,11	0,72%	99,00%	0,71%	93,75%	0,67%	-5,25%	-0,04%
INSTALACIONES SANITARIAS	$ 38.646.962,16	1,06%	100,00%	1,06%	58,04%	0,61%	-41,96%	-0,44%
ALCANTARILLADO	$ 36.154.407,39	0,99%	100,00%	0,99%	100,00%	0,99%	0,00%	0,00%
INSTALACIONES DE GAS	$ 17.555.284,59	0,48%	100,00%	0,48%	54,48%	0,26%	-45,52%	-0,22%
INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 163.690.373,33	4,48%	3,00%	0,13%	94,23%	4,22%	91,23%	4,08%
EQUIPOS COCINA	$ 158.304.638,52	4,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OTROS	$ 536.526.900,75	14,67%	0,00%	0,00%	11,21%	1,64%	11,21%	1,64%
DOTACIÓN	$ 12.807.869,00	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ITEM NO PREVISTOS	$ 827.918.838,37	22,64%	63,00%	14,26%	59,95%	13,57%	-3,05%	-0,69%
TOTAL	**$ 3.657.586.891,87**	**100,00%**		**59,87%**		**68,09%**		**8,22%**

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA


EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	67,99%	59,29%	8,70%
Durante el periodo	0,10%	0,58%	-0,48%
Acumulado Actual	68,09%	59,87%	8,22%

33.1. CONSOLIDADO AVANCE PRESUPUESTAL

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,58%	59,87%
Valor de la Obra Programada	$ 21.214.003,97	$ 2.189.784.097,61

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,10%	68,09%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 3.657.586,89	$ 2.490.369.752,03

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

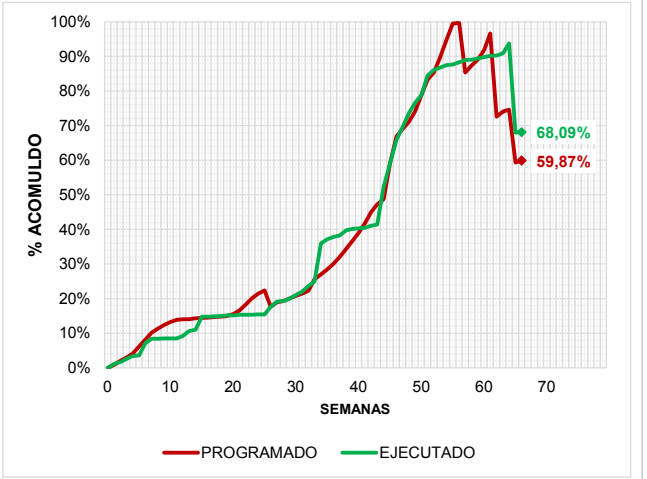

UT. INTERCOMEDOR ITSI	FORMATO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	CANTIDAD	DIA	ESTADO
OBREROS	4	DEMOLEDOR	1	LUNES	F
PERSONAL INSTALACIÓN CUBIERTA METÁLICA	0	HERRAMIENTA MENOR	15	MARTES	F
PERSONAL SST Y AMBIENTAL	1	PULIDORA	1	MIERCOLES	F
MAESTRO	0	MINICARGADOR O BOBCAT	0	JUEVES	F
OFICIAL	1	MOTOBOMBA	0	VIERNES	F
TRABAJADORA SOCIAL	1	COMPACTADOR TIPO SALTARÍN	1	SÁBADO	F
RESIDENTE	1	VIBROCOMPACTADOR	0	**LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)**	

D. TECNICO

1. El contratista realiza el replanteo e instalación de malla de refuerzo para la posterior la fundida de concreto de 3000 PSI (E=0,10) para rampa y andenes.
2. El contratista finalizo el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS EN ALUMINIO.
3. El contratista finalizo el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANAS NATURAL EN ALUMINIO (incluye todos los accesorios para su correcta instalación).
4. El contratista realiza la acometida de gas natural y la posterior instalación del regular de primera etapa.
5. La interventoría verifica que las actividades ejecutadas por el contratista se realicen de acuerdo a las especificaciones técnicas.

E. ADMINISTRATIVO

1. La interventoría en conjunto con el contratista, realizan el registro diario en Bitácora, de todas las actividades ejecutadas y decisiones tomadas en obra.
2. Interventoría verifica constantemente que en obra se encuentre el personal mínimo para iniciar cualquier tipo de actividades y aprobar el permiso de trabajo.

F. FINANCIERA

1. Durante el periodo del presente informe no se presentaron modificaciones al los valores de los contratos de obra e interventoria.

G. SOCIAL

1. En el periodo de este informe no se realizan actividades del componente social.

H. SST

1. Durante este periodo se realizan las respectivas charlas diarias de SST, impartidas por el profesional HSE.
2. Por parte del contratista, el profesional HSE, realiza recambio continuo y entrega de EPP's que se encuentran en mal estado.
3. Se realiza jornada de orden y aseo general en la obra.

I. AMBIENTAL

1. Se realiza limpieza continua de los baños portátiles y se realiza la disposición final de los residuos obtenidos por parde de la empresa ASSEAR.
2. Las basuras generadas por la obra, son debidamente recogidas y llevadas al sitio adecuado para que sean recogidas continuamente por el camión recolector de residups solidos.
3. Los RCD generados por las actividades constructivas son debidamente acopiados.

J. CONTABLE

1. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°1 por acta parcial al contratista y la interventoría.
2. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°2 por acta parcial al contratista y la interventoría.
3. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°3 por acta parcial al contratista y la interventoría.
4. A la fecha de corte del presente informe se ha realizado el pago N°4 por acta parcial al contratista y la interventoría.

K. JURIDICA

1. Durante el presente periodo se realizo la modificación en valor a los contratos de obra e interventoria, lo cual modifica los valores iniciales de los mismos.
2. Hasta la fecha de este informe se ha firmado el acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°1, acta de pactaciòn de precios e ítem no previstos N°2, el acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°1, acta de modificación de cantidades de mayores y menores e ítem no previstos N°2, acta de modificación de cantidades de mayores y menores N°3 del contrato de obra 0756-23, acta de adición en plazo N°4 y en valor N°1.

Nombre: **LEONARDO MANTILLA NOGUERA**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Nombre: **ALEJANDRO ALFONSO ENRIQUEZ MORA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

UT. INTERCOMEDOR ITSI

REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

FECHA ELABORACIÓN:	10	6	2024	No. INFORME	66	SEMANA No.	66

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMEDOR Y COCINA DEL INSTITUTO TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA		
CONTRATO OBRA No:	0756-23	CONTRATISTA	WRUSSY INGENIEROS S.A.S
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	0757-23	INTEVENTORÍA	UT INTERCOMEDOR ITSI

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Instalación de la acometida de gas natural.



DESCRIPCIÓN: Instalación del regulador de primera etapa.



DESCRIPCIÓN: Alistamiento del paso posterior del área de cocina para posterior instalación de mortero de nivelación.



DESCRIPCIÓN: Alistamiento del paso posterior del área de cocina para posterior instalación de mortero de nivelación.



DESCRIPCIÓN: Replanteo del área de anden.



DESCRIPCIÓN: Replanteo del área de anden.
