JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No 20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	1,00	Localización, trazado y replanteo de conducciones de acueducto y alcantarillado	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA

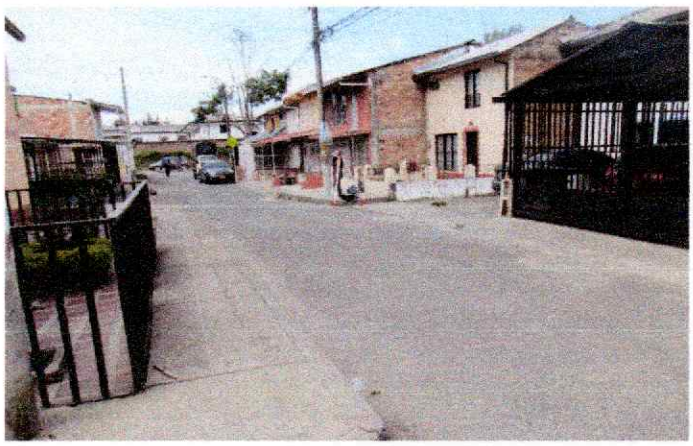

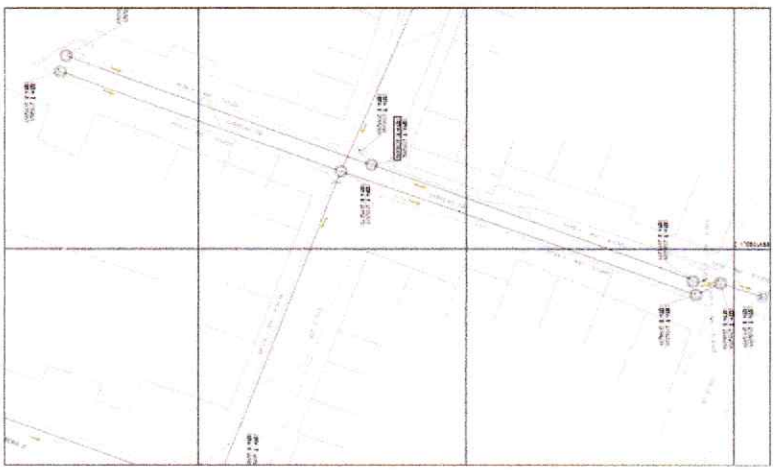

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
COLECTOR SANITARIO					
RECAMARA 7- RECAMARA 8	42,56			1,00	42,56
RECAMARA 8- RECAMARA 9	44,88			1,00	44,88
RECAMARA 9- RECAMARA 10	3,58			1,00	3,58
RECAMARA 10- RECAMARA 11	4,60			1,00	4,60
REDES DOMICILIARIAS					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	3,00			1,00	3,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	3,00			1,00	3,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27	4,00			1,00	4,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	3,60			1,00	3,60
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33	4,00			1,00	4,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	3,00			1,00	3,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39	5,00			1,00	5,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	3,00			1,00	3,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45	5,60			1,00	5,60
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46	2,50			1,00	2,50
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51	5,20			1,00	5,20
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52	2,00			1,00	2,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-18	3,65			1,00	3,65
REDES DOMICILIARIAS					
VIVIENDAS MARGUEN IZQUIERDO					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-05	5,60			1,00	5,60
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-11-CJ1	3,60			1,00	3,60
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-11-CJ2	2,60			1,00	2,60
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-17	5,60			1,00	5,60
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	5,9			1,00	5,90
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	5,3			1,00	5,30
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	6,4			1,00	6,40
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	6			1,00	6,00
VIVIENDA MARGEN DERECHO					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-12	4,70			1,00	4,70
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-18	2,9			1,00	2,90
VIVIENDA NOMENCLATURA 18-18(18A-24)	4,4			1,00	4,40
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18 A 30)	4,95			1,00	4,95
			Subtotal		201,12
			Vienen		0,00
			TOTAL		201,12

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	2,00	Corte de pavimento asfaltico con cortadora	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
COLECTOR SANITARIO					
RECAMARA 7- RECAMARA 8	40,00			2,00	80,00
RECAMARA 8- RECAMARA 9	42,63			2,00	85,26
RECAMARA 9- RECAMARA 10	1,92			2,00	3,84
RECAMARA 10- RECAMARA 11	4,60			2,00	9,20
CONEXIÓN DE RED DE CAJAS DOMICILIARIAS A COLECTOR RECAMARA 8 A RECAMARA 9					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	2,00			2,00	4,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	2,10			2,00	4,20
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	2,10			2,00	4,20
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	2,15			2,00	4,30
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	1,75			2,00	3,50
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-16	2,80			2,00	5,60
CONEXIÓN DE CAJAS DOMICILIARIASA RED COLECTOR RECAMARA 7 A RECAMARA 8					
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-05	1,50			1,00	1,50
	1,45			1,00	1,45
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-11 CAJA 1	1,30			1,00	1,30
	1,35			1,00	1,35
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-11 CAJA 2	1,70			1,00	1,70
	1,80			1,00	1,80
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-17	0,80			1,00	0,80
	0,7			1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	1,5			1,00	1,50
	1,45			1,00	1,45
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	1,45			1,00	1,45
	1,3			1,00	1,30
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	1,45			1,00	1,45
	1,25			1,00	1,25
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	1,3			1,00	1,30
	1,3			1,00	1,30
CORTE PARA RECAMARAS					
RECAMARA 7	5,03			1,00	5,03
RECAMARA 8	5,03			1,00	5,03
RECAMARA 9	5,03			1,00	5,03
RECAMARA 10	5,03			1,00	5,03
Subtotal					245,82
Vienen					0,00
TOTAL					**245,82**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB. SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-8	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	3,00	Demolición pavimento flexible e<=10cm	UNID.	m2	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
COLECTOR SANITARIO					
RECAMARA 7- RECAMARA 8	40,00	0,90		1,00	36,00
RECAMARA 8- RECAMARA 9	42,63	0,90		1,00	38,37
RECAMARA 9- RECAMARA 10	1,92	0,90		1,00	1,73
RECAMARA 10- RECAMARA 11	4,60	0,90		1,00	4,14
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE RECAMARA 8 A RECAMARA 9					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	2,00	0,70		1,00	1,40
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	2,10	0,70		1,00	1,47
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	2,10	0,70		1,00	1,47
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	2,15	0,70		1,00	1,51
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	1,75	0,70		1,00	1,23
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-16	2,80	0,70		1,00	1,96
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE RECAMARA 7 A RECAMARA 8					
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-05	1,47	0,70		1,00	1,03
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-11 CAJA 1	1,33	0,70		1,00	0,93
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-11 CAJA 2	1,75	0,70		1,00	1,23
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-17	0,75	0,70		1,00	0,53
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	1,48	0,70		1,00	1,04
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	1,38	0,70		1,00	0,97
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	1,35	0,70		1,00	0,95
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	1,30	0,70		1,00	0,91
RECAMARAS					
RECAMARA 7	2,01			1,00	2,01
RECAMARA 8	2,01			1,00	2,01
RECAMARA 9	2,01			1,00	2,01
RECAMARA 10	2,01			2,00	4,02
Subtotal					106,92
Vienen					0,00
TOTAL					**106,92**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB. SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	4,00	Demolición de andenes en concreto	UNID.	m2	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA








Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
DEMOLICION DE ANDEN TRAMO CAMARAS 8, 9 Y 10					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -16	0,95	0,80		1,00	0,76
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	1,15	1,80		1,00	2,07
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	1,20	0,87		1,00	1,04
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27	0,65	0,80		1,00	0,52
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	0,58	0,80		1,00	0,46
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33	1,65	0,70		1,00	1,16
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33	2,30	1,25		1,00	2,88
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	4,73	0,70		1,00	3,31
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	1,35	1,20		1,00	1,62
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39	0,74	0,90		1,00	0,67
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39	1,20	1,30		1,00	1,56
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	2,00	1,55		1,00	3,10
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	1,90	0,40		1,00	0,76
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45	0,90	1,40		1,00	1,26
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45	1,30	0,70		1,00	0,91
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46	3,00	0,38		1,00	1,14
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46	3,15	0,86		1,00	2,71
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51	0,77	0,60		1,00	0,46
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52	1,00	0,65		1,00	0,65
DEMOLICION DE ANDEN PARA CAJAS DESDE RECAMARA 7-RECAMARA 8					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 A-12	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-18	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-24(CASA DICE 18-18)	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-30(CASA DICE 18A-24)	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-05	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-11	0,80	0,80		2,00	1,28
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-17	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-23	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-29	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-35	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-41	0,80	0,80		1,00	0,64
DEMOLICION DE ANDEN PARA TUBERIA DOMICILIARIA					
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	0,60	0,70		1,00	0,42
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	0,70	0,60		1,00	0,42
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	0,40	0,80		1,00	0,32
Viviendas nomenclatura 18A-17	0,70	0,90		1,00	0,63
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-11	2,30	0,88		1,00	2,02
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-18	3,80	0,75		1,00	2,85
VIVIENDA NOMENCLATURA 18-18(18 A 24)	2,35	0,6		1,00	1,41
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18A-30)	3,00	0,60		1,00	1,80

OBSERVACIONES:

Subtotal	44,59
Vienen	0,00
TOTAL	44,59

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB. SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	5,00	Excavación a mano hasta 2.5 m en seco en material común	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





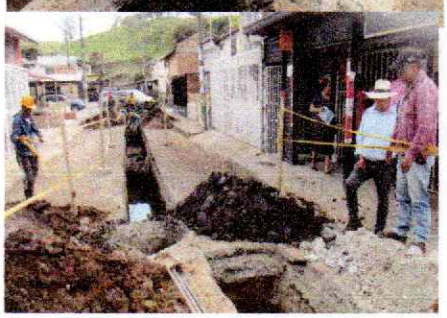





Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Prof inicio	Prof final	No Elem.	Medida Total
COLECTOR SANITARIO						
RED DE RECAMARA 7- RECAMARA 8	40,00	0,90	1,30	1,80	1,00	55,80
RECAMARAS	**Area**		**Altura**		**No. Elem**	**MEDIDA TOTAL**
RECAMARA 7 D=1,6	2,01		1,40		1,00	2,81
Localización	**Dimensiones Largo**	**Ancho**	**Prof inicio**	**Prof final**	**No Elem.**	**Medida Total**
EXCAVACIÓND E REDES DOMICILIARIAS RECAMARA 7 A RECAMARA 8						
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 A-12	4,60	0,70	1,10	1,45	1,00	4,11
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18 A-30)	4,95	0,70	1,10	1,45	1,00	4,42
VIVIENDA NOMENCLATURA 18-18(18A-24)	4,40	0,70	1,10	1,45	1,00	3,93
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-18	2,90	0,70	1,10	1,45	1,00	2,59
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-05	5,50	0,70	1,10	1,45	1,00	4,91
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-11	3,50	0,70	1,10	1,45	1,00	3,12
	2,50	0,70	1,10	1,45	1,00	2,23
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-17	5,50	0,70	1,10	1,45	1,00	4,91
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	5,90	0,70	1,10	1,45	1,00	5,27
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	5,30	0,70	1,10	1,45	1,00	4,73
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	6,40	0,70	1,10	1,45	1,00	5,71
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	6,00	0,70	1,10	1,45	1,00	5,36
EXCAVACIÓN CAJAS DOMICILIARIAS DE RECAMARA 7 A RECAMARA 8						
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 A-12	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-18	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-20(CASA DICE 18-18)	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18 A-30)	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-05	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-11	0,80	0,80	1,10		2,00	1,41
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-17	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
				Subtotal		118,31
				Vienen		0,00
				TOTAL		118,31

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	7,00	Excavación a mano hasta 2.5 m en seco en conglomerado	UNID.	m3	USICACIÓN	URB. SANTA MONICA









Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Prof inicio	Prof final	No Elem.	Medida Total
COLECTOR SANITARIO						
RED DE RECAMARA 8- RECAMARA 9	42,63	0,90	1,80	2,34	1,00	79,42
RED DE RECAMARA 9- RECAMARA 10	1,92	0,90	2,34	2,60	1,00	4,27
RED DE RECAMARA 10- RECAMARA 11	4,60	0,90	2,60	2,86	1,00	11,30
RECAMARAS	**Area**		**Altura**		**No. Elem**	**MEDIDA TOTAL**
RECAMARA 8 D=1,6	2,01		1,90		1,00	3,82
RECAMARA 9 D=1,6	2,01		2,44		1,00	4,90
RECAMARA 10 D=1,6	2,01		2,70		1,00	5,43
DOMICILIARIAS DE LA RECAMARA 8 A RECAMARA 10						
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	3,00	0,70	1,10	1,72	1,00	2,96
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	3,00	0,70	1,10	1,72	1,00	2,96
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27	4,00	0,70	1,00	1,72	1,00	3,81
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	3,60	0,70	1,10	1,72	1,00	3,55
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33	4,00	0,70	1,10	1,72	1,00	3,95
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	3,00	0,70	1,10	1,72	1,00	2,96
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39	5,00	0,70	1,10	1,72	1,00	4,94
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	3,00	0,70	1,10	1,72	1,00	2,96
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45	5,60	0,70	1,10	1,72	1,00	5,53
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46	2,50	0,70	1,10	1,72	1,00	2,47
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51	5,20	0,70	1,10	1,72	1,00	5,13
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52	2,00	0,70	1,10	1,72	1,00	1,97
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-16	3,65	0,70	1,10	1,72	1,00	3,60
EXCAVACION DE CAJAS DOMICILIARIAS DE RECAMARA 8 A RECAMARA 10						
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52	0,80	0,80	1,10		1,00	0,70
				Subtotal		164,33
				Vienen		0,00
				TOTAL		**164,33**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	8,00	Excavaciones en túnel en material común	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA

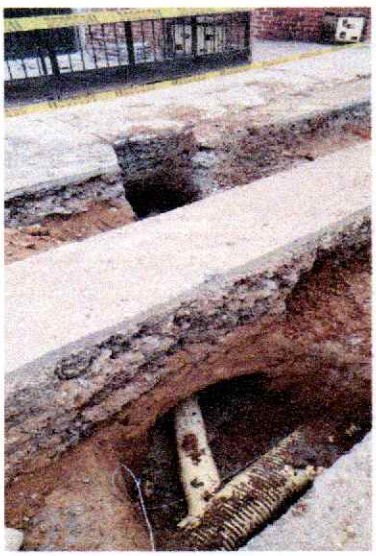







Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Prof	No Elem.	Medida Total
TUNEL PARA DOMICILIARIAS EN ANDEN DE RECAMARA 8 A RECAMARA 10					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	1,50	0,70	0,70	1,00	0,74
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	1,50	0,70	0,70	1,00	0,74
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27	1,50	0,70	0,70	1,00	0,74
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	1,50	0,70	0,70	1,00	0,74
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33	1,50	0,70	0,70	1,00	0,74
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	1,50	0,70	0,70	1,00	0,74
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39	1,50	0,70	0,70	1,00	0,74
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	1,50	0,70	0,70	1,00	0,74
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45	1,50	0,70	0,70	1,00	0,74
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46	1,50	0,70	0,70	1,00	0,74
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51	1,50	0,70	0,70	1,00	0,74
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52	1,50	0,70	0,70	1,00	0,74
TUNEL PARA CONECTAR VIVIENDAS QUE ATRAVIESAN LA VIA					
VIVIENDAS DE LA RECAMAR 8 A 10	0,90	0,80	0,70	6,00	3,02
TUNEL PARA DOMICILIARIAS EN ANDEN					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-05	1,50	0,70	0,80	1,00	0,84
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18A-12	1,70	0,70	0,90	1,00	1,07
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-18	2,50	0,70	0,60	1,00	1,05
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-11	1,05	0,70	0,70	1,00	0,51
	1,10	0,70	0,70	1,00	0,54
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-17	1,90	0,70	0,95	1,00	1,26
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	0,4	0,7	0,80	1,00	0,22
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	0,5	0,7	0,80	1,00	0,28
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	0,70	0,80	0,60	1,00	0,34
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18 A-30)	1,10	0,70	0,80	1,00	0,62
VIVIENDA NOMENCLATURA 18-18(18A-24)	0,45	0,70	0,80	1,00	0,25
	0,45	0,70	0,80	1,00	0,25
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-18	3,15	0,60	0,80	1,00	1,51
Excavacion con tunel para pasar debajo de tuberia pluvial					
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	0,8	0,8	0,8	1,00	0,51
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	0,8	0,8	0,8	1,00	0,51
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	0,8	0,8	0,8	1,00	0,51
TUNEL PARA VIVIENDAS QUE ATRAVIESAN LA VIA					
VIVIENDAS DE LA RECAMAR 7 A 8	0,90	0,80	0,70	5,00	2,52
Excavacion en tunel para tuberia de conexión sanitaria que atraviesa eje de via					
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	0,80	0,90	1,10	1	0,79
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	0,80	0,90	1,10	1	0,79
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	0,8	0,9	1,1	1	0,79
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	0,8	0,9	1,1	1	0,79
			Subtotal		27,85
			Vienen		0,00
			TOTAL		**27,85**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024


OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901282624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	9,00	Relleno tipo II con material importado suministrado por el contratista, compactado con equipo mecánico al 95% p.m. compactado en capas de máximo 0.30 m de espesor, según norma INVIAS E-220; CBR≥5%, LL<40%, pasa 200 ≤ 35%, tamaño máximo 2"; contenido de materia orgánica < 1%	UNID.	m3	UBICACION	URB. SANTA MONICA

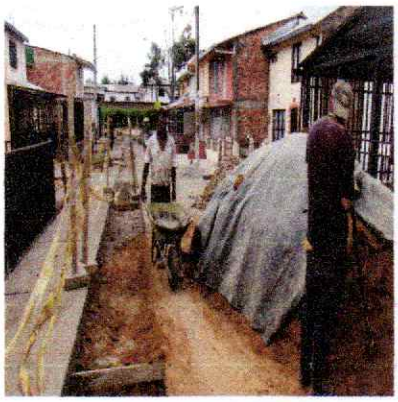





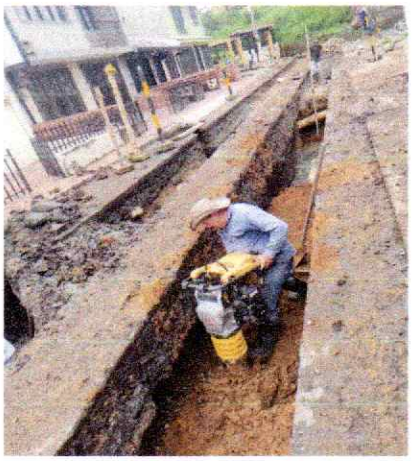

Localización	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Prof Inicio	Prof final		
RED SANITARIA PRINCIPAL						
RED RECAMARA 7- RECAMARA 8	40,00	0,90	1,30	1,80	1,00	55,80
RED RECAMARA 8- RECAMARA 9	42,63	0,90	1,80	2,34	1,00	79,42
RED RECAMARA 9- RECAMARA 10	1,92	0,90	2,34	2,60	1,00	4,27
RED DE RECAMARA 10- RECAMARA 11	4,60	0,90	2,60	2,86	1,00	11,30
DESCUENTOS						
MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO+TUBO	89,15	0,90	0,25		1,00	-20,38
CIMENTACION DE TUBERIA	89,15	0,90	0,10		1,00	-8,02
SUB BASE	89,15	0,90	0,20		1,00	-16,05
BASE	89,15	0,90	0,15		1,00	-12,04
DOMICILIARIAS DE RECAMARA 8 A RECAMARA 10						
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	3,00	0,70	1,10	1,72	1,00	2,96
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	3,00	0,70	1,10	1,72	1,00	2,96
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27	4,00	0,70	1,00	1,72	1,00	3,81
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	3,60	0,70	1,10	1,72	1,00	3,55
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33	4,00	0,70	1,10	1,72	1,00	3,95
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	3,00	0,70	1,10	1,72	1,00	2,96
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39	5,00	0,70	1,10	1,72	1,00	4,94
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	3,00	0,70	1,10	1,72	1,00	2,96
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45	5,60	0,70	1,10	1,72	1,00	5,53
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46	2,50	0,70	1,10	1,72	1,00	2,47
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51	5,20	0,70	1,10	1,72	1,00	5,13
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52	2,00	0,70	1,10	1,72	1,00	1,97
DESCUENTOS						
MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO+TUBO	43,90	0,70	0,25		1,00	-7,81
CIMENTACION DE TUBERIA	43,90	0,70	0,10		1,00	-3,07
DOMICILIARIAS DE RECAMARA 7 A RECAMARA 8						
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-12	4,60	0,70	1,10	1,45	1,00	4,11
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-05	5,50	0,70	1,10	1,45	1,00	4,91
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-11	3,50	0,70	1,00	1,45	1,00	3,00
	2,50	0,70	1,00	1,45	1,00	2,14
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-17	5,50	0,70	1,10	1,45	1,00	4,91
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	5,90	0,70	1,10	1,45	1,00	5,27
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	5,30	0,70	1,10	1,45	1,00	4,73
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	6,40	0,70	1,10	1,45	1,00	5,71
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	6,00	0,70	1,10	1,45	1,00	5,36
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18 A	4,95	0,70	1,10	1,45	1,00	4,42
VIVIENDA NOMENCLATURA 18-18(18A-24	4,40	0,70	1,10	1,45	1,00	3,93
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-18	2,90	0,70	1,10	1,45	1,00	2,59
DESCUENTOS						
MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO+TUBO	57,45	0,70	0,15		1,00	-6,03
CIMENTACION DE TUBERIA	57,45	0,70	0,10		1,00	-4,02
				Subtotal		167,64
				Vienen		0,00
				TOTAL		**167,64**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB. SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231600038647 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	10,00	Entibado apuntalado cara en contacto con talud - dos usos	UNID.	m2	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones			cantidad de caras	factor de uso	Medida Total
	Largo	prof inicial	Prof final			
COLECTOR SANITARIO						
RED DE RECAMARA 7- RECAMARA 8	40,00	1,30	1,80	2,00	0,5	82,00
RED DE RECAMARA 8- RECAMARA 9	42,63	1,80	2,34	2,00	0,5	88,24
RED DE RECAMARA 9- RECAMARA 10	1,92	2,34	2,60	2,00	0,5	4,74
RED DE RECAMARA 10- RECAMARA 11	4,80	2,60	2,86	2,00	0,5	12,56
					Subtotal	167,54
					Vienen	0,00
					TOTAL	**167,54**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	11,00	Suministro y colocación de material granular para filtro en grava 3/4"	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA







Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Prof	No Elem.	Medida Total
MAT GRANULAR EN COLECTOR SANITARIO					
RED RECAMARA 7- RECAMARA 8	40,00	0,90	0,25	1,00	9,00
RED RECAMARA 8- RECAMARA 9	42,63	0,90	0,25	1,00	9,59
RED RECAMARA 9- RECAMARA 10	1,92	0,90	0,25	1,00	0,43
RED RECAMARA 10- RECAMARA 11	4,60	0,90	0,25	1,00	1,04
DESCUENTOS					
VOLUMEN DEL TUBO	89,15	0,05		1,00	-4,46
DOMICILIARIAS DE RECAMARA 8 A 10					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	3,00	0,70	0,25	1,00	0,53
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	3,00	0,70	0,25	1,00	0,53
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27	4,00	0,70	0,25	1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	3,60	0,70	0,25	1,00	0,63
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33	4,00	0,70	0,25	1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	3,00	0,70	0,25	1,00	0,53
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39	5,00	0,70	0,25	1,00	0,88
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	3,00	0,70	0,25	1,00	0,53
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45	5,60	0,70	0,25	1,00	0,98
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46	2,50	0,70	0,25	1,00	0,44
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51	5,20	0,70	0,25	1,00	0,91
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52	2,00	0,70	0,25	1,00	0,35
DESCUENTOS					
VOLUMEN DEL TUBO	43,90	0,02		1,00	-0,88
DOMICILIARIAS DE RECAMARA 7 A 8					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-12	4,60	0,70	0,15	1,45	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-05	5,50	0,70	0,15	1,45	0,84
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-11	3,50	0,70	0,15	1,45	0,53
	2,50	0,70	0,15	1,45	0,38
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-17	5,50	0,70	0,15	1,45	0,84
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	5,90	0,70	0,15	1,45	0,90
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	5,30	0,70	0,15	1,45	0,81
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	6,40	0,70	0,15	1,45	0,97
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	6,00	0,70	0,15	1,45	0,91
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18 A-30)	4,95	0,70	0,15	1,45	0,75
VIVIENDA NOMENCLATURA 18-18(18A-24)	4,40	0,70	0,15	1,45	0,67
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-18	2,90	0,70	0,15	1,45	0,44
DESCUENTOS					
VOLUMEN DEL TUBO	57,45	0,02		1,00	-1,15
			Subtotal		30,02
			Vienen		
			TOTAL		**30,02**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA SARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	12,00	Suministro y colocación de material granular para cimentación de tubería	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA











Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Espesor		
COLECTOR SANITARIO					
RECAMARA 7- RECAMARA 8	40,00	0,90	0,10	1,00	3,60
RECAMARA 8- RECAMARA 9	42,63	0,90	0,10	1,00	3,84
RECAMARA 9- RECAMARA 10	1,92	0,90	0,10	1,00	0,17
RECAMARA 10- RECAMARA 11	4,60	0,90	0,10	1,00	0,41
DOMICILIARIAS DE RECAMARA 8 A RECAMARA 10					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	3,00	0,70	0,10	1,00	0,21
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	3,00	0,70	0,10	1,00	0,21
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27	4,00	0,70	0,10	1,00	0,28
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	3,60	0,70	0,10	1,00	0,25
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33	4,00	0,70	0,10	1,00	0,28
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	3,00	0,70	0,10	1,00	0,21
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39	5,00	0,70	0,10	1,00	0,35
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	3,00	0,70	0,10	1,00	0,21
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45	5,60	0,70	0,10	1,00	0,39
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46	2,50	0,70	0,10	1,00	0,18
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51	5,20	0,70	0,10	1,00	0,36
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52	2,00	0,70	0,10	1,00	0,14
DOMICILIARIAS DE RECAMARA 7 A RECAMARA 8					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-12	4,60	0,70	0,10	1,00	0,32
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-05	5,50	0,70	0,10	1,00	0,39
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-11	3,50	0,70	0,10	1,00	0,25
	2,50	0,70	0,10	1,00	0,18
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-17	5,50	0,70	0,10	1,00	0,39
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	5,90	0,70	0,10	1,00	0,41
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	5,30	0,70	0,10	1,00	0,37
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	6,40	0,70	0,10	1,00	0,45
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	6,00	0,70	0,10	1,00	0,42
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18 A-30)	4,95	0,70	0,10	1,00	0,35
VIVIENDA NOMENCLATURA 18-18(18A-24)	4,40	0,70	0,10	1,00	0,31
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-18	2,90	0,70	0,10	1,00	0,20
				Subtotal	15,13
				Vienen	0,00
				TOTAL	15,13

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

1-12-24

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-8	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	13,00	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 160 (6")	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Espeser		
DOMICILIARIAS DE RECAMARA 8 A RECAMARA 10					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	3,00			1,00	3,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	3,00			1,00	3,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27	4,00			1,00	4,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	3,80			1,00	3,80
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33	4,00			1,00	4,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	3,00			1,00	3,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39	5,00			1,00	5,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	3,00			1,00	3,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45	5,80			1,00	5,80
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46	2,50			1,00	2,50
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51	5,20			1,00	5,20
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52	2,00			1,00	2,00
DOMICILIARIAS DE RECAMARA 7 A RECAMARA 8					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-05	5,60			1,00	5,60
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-11	3,60			1,00	3,60
	2,60			1,00	2,60
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-17	5,60			1,00	5,60
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	5,90			1,00	5,90
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	5,30			1,00	5,30
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	6,40			1,00	6,40
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	6,00			1,00	6,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-12	4,70			1,00	4,70
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-18	2,90			1,00	2,90
VIVIENDA NOMENCLATURA 18-18(18A-24)	4,40			1,00	4,40
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18A-30)	4,95			1,00	4,95
Subtotal					101,85
Vienen					0,00
TOTAL					**101,85**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL

URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	CONTRATO N°	18-12-2023

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	14,00	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 250 (10")	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA



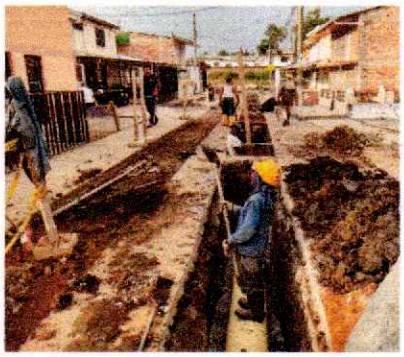

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Espesor		
COLECTOR SANITARIO DE 10"					
RECAMARA 7- RECAMARA 8	40,40			1,00	40,40
RECAMARA 8- RECAMARA 9	43,03			1,00	43,03
RECAMARA 9- RECAMARA 10	2,32			1,00	2,32
Subtotal					85,75
Vienen					0,00
TOTAL					85,75

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	15,00	Suministro e instalación de Silla Yee PVC 10" x 6"	UNID.	und	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Espesor		
CONEXIÓN DOMICILIARIAS SOBRE LA CARRERA 2B (CALLE 18 A CALLE18A)					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-26				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52				1,00	1,00
CONEXIÓN DOMICILIARIAS SOBRE LA CARRERA 2B (CALLE18A)					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-05				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-11				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-17				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-12				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-18				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18 A-30)				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18-18(18A-24)				1,00	1,00
			Subtotal		23,00
			Vienen		0,00
			TOTAL		23,00

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800036847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	16,00	Construcción cilindro concreto de 4000 PSI (cámara tipo B), Dint = 1.20, e=0.15	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA

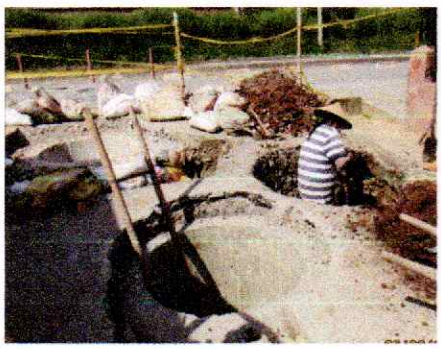



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Espesor		
RECAMARAS RED SANITARIA					
RECAMARA 7	1,00			1,00	1,00
RECAMARA 8	1,50			1,00	1,50
RECAMARA 9	2,04			1,00	2,04
RECAMARA 10	2,30			1,00	2,30
Subtotal					6,84
Vienen					0,00
TOTAL					**6,84**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800036847 DEL 2023			
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-8	SUPERVISOR: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	17,00	Construcción de losa de fondo en concreto de 4000 PSI para cámara de inspección, D=1.5m, E=0.15m	UNID.	und	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Espesro		
RECAMARAS RED SANITARIA					
RECAMARA 7				1,00	1,00
RECAMARA 8				1,00	1,00
RECAMARA 9				1,00	1,00
RECAMARA 10				1,00	1,00
			Subtotal		4,00
			Vienen		0,00
			TOTAL		**4,00**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	18,00	Construcción de brocal en concreto de 4000 PSI D=1.5m, E=0.20m, con tapa de concreto	UNID.	und	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Espesro		
RECAMARAS RED SANITARIA					
RECAMARA 7					
RECAMARA 8				1,00	1,00
RECAMARA 9				1,00	1,00
RECAMARA 10				1,00	1,00
			Subtotal		3,00
			Vienen		0,00
			TOTAL		3,00

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	20,00	Construcción de cajas de inspección en concreto de 3000 PSI 0,6m x 0,6m x 1m tapa e=0,1m	UNID.	und	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA

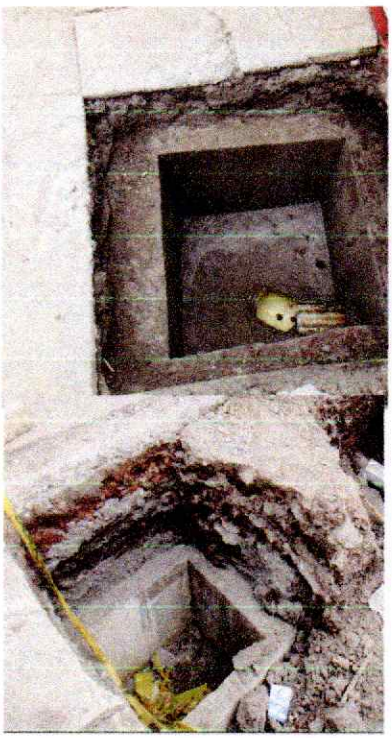

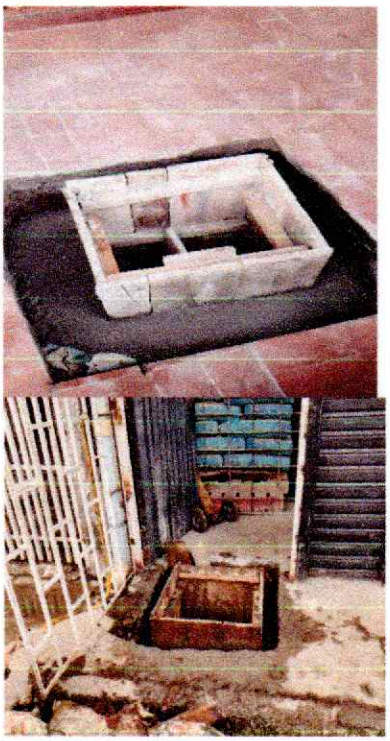

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Espesro		
CAJAS DE INSPECCIÓN SOBRE LA CARRERA 2B (CALLE 18 A CALLE18A)					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52				1,00	1,00
CAJAS DE INSPECCIÓN SOBRE LA CARRERA 2B (CALLE18A)					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-05				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-11				1,00	1,00
				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-17				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-12				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-18				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18 A-30)				1,00	1,00
VIVIENDA NOMENCLATURA 18-18(18A-24)				1,00	1,00
			Subtotal		24,00
			Vienen		0,00
			TOTAL		24,00

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	22,00	Suministro, riego y compactación de sub base mecánico clase A	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	EspesDR		
SUBBASE EN COLECTOR SANITARIO DE 10"					
RED RECAMARA 7- RECAMARA 8	40,00	0,90	0,20	1,00	7,20
RED RECAMARA 8- RECAMARA 9	42,63	0,90	0,20	1,00	7,67
RED RECAMARA 9- RECAMARA 10	1,92	0,90	0,20	1,00	0,35
RED RECAMARA 10- RECAMARA 11	4,60	0,90	0,20	1,00	0,83
SUBBASE DOMICILIARIAS DE RECAMARA 8 A RECAMARA 10					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	3,00	0,70	0,20	1,00	0,42
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	3,00	0,70	0,20	1,00	0,42
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27	4,00	0,70	0,20	1,00	0,56
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	3,60	0,70	0,20	1,00	0,50
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33	4,00	0,70	0,20	1,00	0,56
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	3,00	0,70	0,20	1,00	0,42
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39	5,00	0,70	0,20	1,00	0,70
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	3,00	0,70	0,20	1,00	0,42
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45	5,60	0,70	0,20	1,00	0,78
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46	2,50	0,70	0,20	1,00	0,35
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51	5,20	0,70	0,20	1,00	0,73
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52	2,00	0,70	0,20	1,00	0,28
DOMICILIARIAS DE RECAMARA 7 A RECAMARA 8					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-05	5,60	0,70	0,20	1,00	0,78
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-11	3,60	0,70	0,20	1,00	0,50
	2,60	0,70	0,20	1,00	0,36
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-17	5,60	0,70	0,20	1,00	0,78
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	5,90	0,70	0,20	1,00	0,83
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	5,30	0,70	0,20	1,00	0,74
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	6,40	0,70	0,20	1,00	0,90
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	6,00	0,70	0,20	1,00	0,84
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-12	4,70	0,70	0,20	1,00	0,66
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-18	2,90	0,70	0,20	1,00	0,41
VIVIENDA NOMENCLATURA 18-18(18A-24)	4,40	0,70	0,20	1,00	0,62
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18 A-30)	4,95	0,70	0,20	1,00	0,69
				Subtotal	30,30
				Vienen	0,00
				TOTAL	30,30

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB. SANTA MONICA

"Por un Desarrollo Sostenible y Sustentable"

JUNTA DE ACCION COMUNAL

URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	23,00	Suministro, riego y compactación de base mecánico clase A	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA







Localización	Dimensiones Largo	Ancho	EspesOR	No Elem.	Medida Total
BASE EN COLECTOR SANITARIO DE 10"					
RED RECAMARA 7- RECAMARA 8	40,00	0,90	0,15	1,00	5,40
RED RECAMARA 8- RECAMARA 9	42,63	0,90	0,15	1,00	5,76
RED RECAMARA 9- RECAMARA 10	1,92	0,90	0,15	1,00	0,26
RED RECAMARA 10- RECAMARA 11	4,60	0,90	0,15	1,00	0,62
BASE DOMICILIARIAS DE RECAMARA 8 A RECAMARA 10					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	3,00	0,70	0,15	1,00	0,32
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	3,00	0,70	0,15	1,00	0,32
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27	4,00	0,70	0,15	1,00	0,42
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	3,60	0,70	0,15	1,00	0,38
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33	4,00	0,70	0,15	1,00	0,42
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	3,00	0,70	0,15	1,00	0,32
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39	5,00	0,70	0,15	1,00	0,53
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	3,00	0,70	0,15	1,00	0,32
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45	5,60	0,70	0,15	1,00	0,59
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46	2,50	0,70	0,15	1,00	0,26
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51	5,20	0,70	0,15	1,00	0,55
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52	2,00	0,70	0,15	1,00	0,21
BASE DOMICILIARIAS RECAMARA 7 A RECAMARA 8					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-05	5,60	0,70	0,10	1,00	0,39
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-11	3,60	0,70	0,10	1,00	0,25
	2,60	0,70	0,10	1,00	0,18
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-17	5,60	0,70	0,10	1,00	0,39
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	5,90	0,70	0,10	1,00	0,41
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	5,30	0,70	0,10	1,00	0,37
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	6,40	0,70	0,10	1,00	0,45
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	6,00	0,70	0,10	1,00	0,42
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-12	4,70	0,70	0,10	1,00	0,33
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-18	2,90	0,70	0,10	1,00	0,20
VIVIENDA NOMENCLATURA 18-18(18A-24)	4,40	0,70	0,10	1,00	0,31
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18 A-30)	4,95	0,70	0,10	1,00	0,35
				Subtotal	20,73
				Vienen	0,00
				TOTAL	20,73

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	25,00	Solado en concreto e= 0,05 de 2500 PSI	UNID.	m2	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Espesor		
SOLADOS CAJAS DE RECAMARA 8 A RECAMARA 10					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -21	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA #18 -22	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-27	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-28	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-33	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-34	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-39	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-40	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA # 18-45	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-46	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-51	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA #18-52	0,80	0,80		1,00	0,64
SOLADOS CAJAS DE RECAMARA 7 A RECAMARA 8					
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-05	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-11	0,80	0,80		1,00	0,64
	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-17	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-23	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-29	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-35	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-41	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA #18A-12	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-18	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA 18-18(18A-24)	0,80	0,80		1,00	0,64
VIVIENDA NOMENCLATURA 18A-24(18 A-30)	0,80	0,80		1,00	0,64
			Subtotal		15,36
			Vienen		0,00
			TOTAL		15,36

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB. SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	26,00	Acero de refuerzo 420 Mpa (6000psi), incluye figurado, amarre e instalación	UNID.	Kg	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA

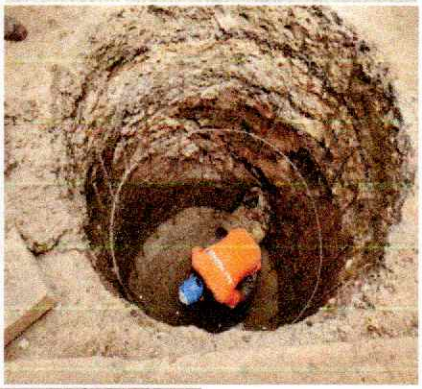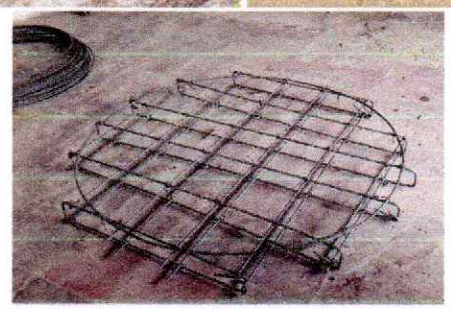

Localización	Dimensiones			No Elem.	cant total
	Longitud	varilla	peso (Kg/m)		
ACERO DE CILINDRO DE RECAMARA					
RECAMARA 7					
ACERO LONG PAREDES	1,40	3/8"	0,56	20,00	15,68
ACERO TRANSVERSAL PAREDES	4,40	3/8"	0,56	7,00	17,25
ACERO LOSA FONDO	3,00	3/8"	0,56	2,00	3,36
	2,80	3/8"	0,56	2,00	3,14
	2,00	3/8"	0,56	2,00	2,24
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,00	3/8"	0,56	2,00	1,12
RECAMARA 8					
ACERO LONG PAREDES	1,90	3/8"	0,56	20,00	21,28
ACERO TRANSVERSAL PAREDES	4,40	3/8"	0,56	11,00	27,10
ACERO LOSA FONDO	3,00	3/8"	0,56	2,00	3,36
	2,80	3/8"	0,56	2,00	3,14
	2,00	3/8"	0,56	2,00	2,24
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,00	3/8"	0,56	2,00	1,12
RECAMARA 9					
ACERO LONG PAREDES	2,44	3/8"	0,56	20,00	27,33
ACERO TRANSVERSAL PAREDES	4,40	3/8"	0,56	12,00	29,57
ACERO LOSA FONDO	3,00	3/8"	0,56	2,00	3,36
	2,80	3/8"	0,56	2,00	3,14
	2,00	3/8"	0,56	2,00	2,24
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,00	3/8"	0,56	2,00	1,12
RECAMARA 10					
ACERO LONG PAREDES	2,70	3/8"	0,56	20,00	30,24
ACERO TRANSVERSAL PAREDES	4,40	3/8"	0,56	14,00	34,50
ACERO LOSA FONDO	3,00	3/8"	0,56	2,00	3,36
	2,80	3/8"	0,56	2,00	3,14
	2,00	3/8"	0,56	2,00	2,24
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,00	3/8"	0,56	2,00	1,00
				Subtotal	253,95
				Vienen	0,00
				TOTAL	253,95

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB. SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	30,00	Disposición de sobrantes	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones VOLUMEN				No Elem.	VOLUMEN TOTAL
SOBRANTES DE EXCAVACION						
VOLUMEN EXCAVACION MATERIAL COMUN	118,31					118,31
VOLUMEN EXCAVACION CONGLOMERA	164,33					164,33
VOLUMEN EXCAVACION TUNEL	27,85				1,00	27,85

Localización	AREA		ESPESOR		No. Elem.	VOLUMEN TOTAL
VOLUMEN DE CARPETA	106,92		0,10		1,00	10,69
VOLUMEN ANDEN	44,59		0,10		1,00	4,46

Subtotal	325,64
Vienen	0,00
TOTAL	**325,64**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023			
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM 31,00	Retiro de material de excavación sobrante y limpieza en general	UNID.	m3/km	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones VOLUMEN EXCAVADO	DISTANCIA	FACTOR EXPANSION	VOLUMEN TOTAL
MATERIAL DE EXCAVACION COMUNE	118,31	12,00	1,30	1.845,64
MATERIAL DE EXCAVACION COMUNE	164,33	12,00	1,20	2.366,35
CARPETA	10,69	12,00	1,00	128,28
VOLUMEN DE EXCAVACION TUNEL	27,85	12,00	1,30	434,46
VOLUMEN DE ANDEN	4,46	12,00	1,00	53,52
			Subtotal	4.828,25
			Vienen	0,00
			TOTAL	4.828,25

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023			
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	1,00	Localización, trazado y replanteo de conducciones de acueducto y alcantarillado	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA

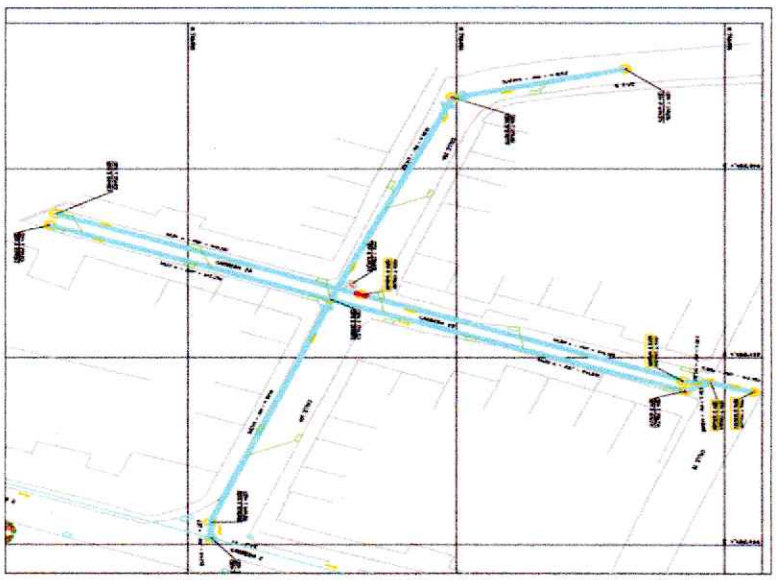

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
COLECTOR PLUVIAL					
RECAMARA 12- RECAMARA 3	40,35			1,00	40,35
RECAMARA 3- RECAMARA 13	45,20			1,00	45,20
RECAMARA 13- RECAMARA 10	1,80			1,00	1,80
SUMIDEROS DE RECAMARA 3 A 13					
CONEXIÓN SUMIDERO 1	2,40			1,00	2,40
CONEXIÓN SUMIDERO 2	0,50			1,00	0,50
CONEXIÓN SUMIDERO 3	3,40			1,00	3,40
CONEXIÓN SUMIDERO 4	0,50			1,00	0,50
SUMIDEROS DE RECAMARA 12 A 3					
CONEXIÓN SUMIDERO 1	1,10			1,00	1,10
CONEXIÓN SUMIDERO 2	5,00			1,00	5,00
CONEXIÓN SUMIDERO 3	5,50			1,00	5,50
Subtotal					105,75
Vienen					0,00
TOTAL					105,75

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

1-10-24

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	2,00	Corte de pavimento asfaltico con cortadora	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA



Localización	Dimensiones Largo	Ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
RED PRINCIPAL					
RECAMARA 12- RECAMARA 3	40,35			2,00	80,70
RECAMARA 3- RECAMARA 13	45,20			2,00	90,40
RECAMARA 13- RECAMARA 10	1,80			2,00	3,60
SUMIDEROS DE RECAMARA 3 A 13					
CONEXIÓN SUMIDERO 1	2,40			2,00	4,80
CONEXIÓN SUMIDERO 2	0,50			2,00	1,00
CONEXIÓN SUMIDERO 3	3,40			2,00	6,80
CONEXIÓN SUMIDERO 4	0,50			2,00	1,00
SUMIDEROS DE RECAMARA 12 A 3					
CONEXIÓN SUMIDERO 1	1,10			2,00	2,20
CONEXIÓN SUMIDERO 2	5,00			2,00	10,00
CONEXIÓN SUMIDERO 3	5,50			2,00	11,00
CORTE PARA RECAMARAS					
RECAMARA 12	5,03			1,00	5,03
RECAMARA 3	5,03			1,00	5,03
RECAMARA 13	5,03			1,00	5,03
Subtotal					226,59
Vienen					0,00
TOTAL					**226,59**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No 20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	3,00	Demolición pavimento flexible e<=10cm	UNID.	m2	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA

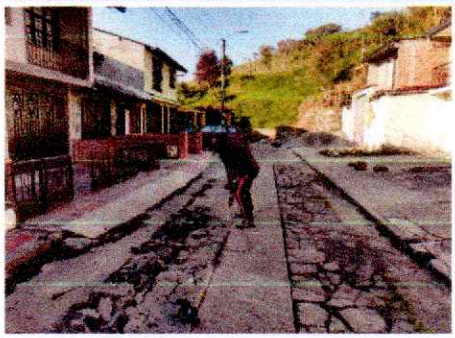



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
COLECTOR PLUVIAL					
RECAMARA 12- RECAMARA 3	40,35	0,90		1,00	36,32
RECAMARA 3- RECAMARA 13	45,20	0,90		1,00	40,68
RECAMARA 13- RECAMARA 10	1,80	0,90		1,00	1,62
SUMIDEROS DE RECAMARA 3 A 13					
CONEXIÓN SUMIDERO 1	2,40	0,70		1,00	1,68
CONEXIÓN SUMIDERO 2	0,50	0,70		1,00	0,35
CONEXIÓN SUMIDERO 3	3,40	0,70		1,00	2,38
CONEXIÓN SUMIDERO 4	0,50	0,70		1,00	0,35
SUMIDEROS DE RECAMARA 12 A 3					
CONEXIÓN SUMIDERO 1	1,10	0,70		1,00	0,77
CONEXIÓN SUMIDERO 2	5,00	0,70		1,00	3,50
CONEXIÓN SUMIDERO 3	5,50	0,70		1,00	3,85
RECAMARAS					
RECAMARA 12	2,01			1,00	2,01
RECAMARA 3	2,01			1,00	2,01
RECAMARA 13	2,01			1,00	2,01
RECAMARA 10	2,01			1,00	2,01
			Subtotal		99,54
			Vienen		0,00
			TOTAL		**99,54**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA

NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	4,00	Demolición de sumidero sencillo	UNID.	und	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA



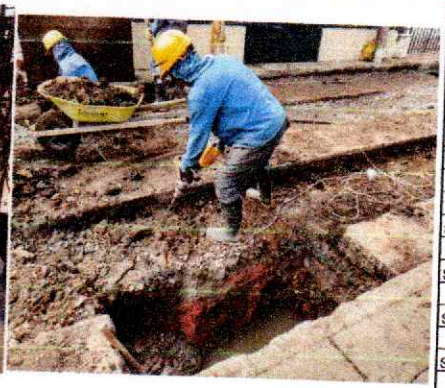

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
TRAMO RECAMARA 12 A 3					
SUMIDERO 1				1,00	1,00
SUMIDERO 2				1,00	1,00
TRAMO RECAMARA 3 A 13					
SUMIDERO 1				1,00	1,00
SUMIDERO 2				1,00	1,00
SUMIDERO 3				1,00	1,00
SUMIDERO 4				1,00	1,00
Subtotal					6,00
Vienen					0,00
TOTAL					6,00

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	5,00	Excavación a mano hasta 2.5 m en seco en material común	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA

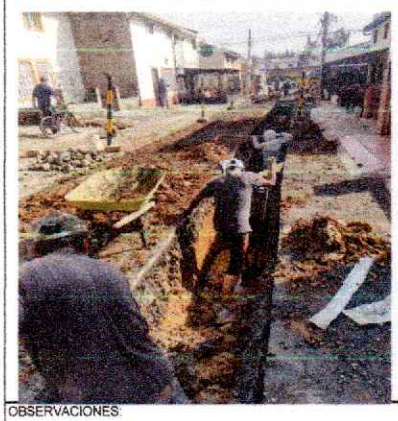



Localización	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Prof inicial	Prof final		
COLECTOR PLUVIAL						
RED RECAMARA 12-RECAMARA 3	40,35	0,90	1,40	1,56	1,00	53,75
SUMIDEROS DE RECAMARA 12 A 3						
CONEXIÓN SUMIDERO 1 M.D	1,15	0,70	1,10	1,85	1,00	1,19
CONEXIÓN SUMIDERO 3 M.I	3,25	0,70	1,10	1,85	1,00	3,36
CONEXIÓN SUMIDERO 4 M.D	3,90	0,70	1,10	1,85	1,00	4,03
RECAMARAS						
RECAMARA 12	2,01		1,50		1,00	3,02
				Subtotal		65,35
				Vienen		0,00
				TOTAL		65,35

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	7,00	Excavaciones en túnel en material común	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Prof		
TUNEL PARASUMIDEROS QUE ATRAVIESAN LA VIA					
SUMIDEROS RECAMARA 3 A 13	0,90	0,80	0,70	3,00	1,51
SUMIDEROS RECAMARA 12 A 3	0,90	0,80	0,70	4,00	2,02
Subtotal					3,53
Vienen					0,00
TOTAL					3,53

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	8,00	Relleno tipo II con material importado suministrado por el contratista, compactado con equipo mecánico al 95% p.m. compactado en capas de máximo 0.30 m de espesor, según norma INVIAS E-220; CBR≥5%, LL<40%, pasa 200 ≤ 35%, tamaño máximo 2"; contenido de materia orgánica < 1%	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA









Localización	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Prof inicial	Prof final		
COLECTOR PLUVIAL						
RED RECAMARA 12-RECAMARA 3	40,35	0,90	1,40	1,56	1,00	53,75
RED RECAMARA 3- RECAMARA 13	45,20	0,90	1,56	2,30	1,00	78,51
RED RECAMARA 13- RECAMARA 10	1,80	0,90	2,30	2,60	1,00	3,97
DESCUENTOS						
MATERIAL FILTRANTE	87,35	0,90	0,41		1,00	-31,95
CIMENTACION TUBERIA	87,35	0,90	0,10		1,00	-7,86
SUB BASE	87,35	0,90	0,20		1,00	-15,72
BASE	87,35	0,90	0,15		1,00	-11,79
RED DE CONEXIÓN SUMIDEROS TRAMO RECAMARA 12 A RECAMARA 3						
CONEXIÓN SUMIDERO 1 M.D	1,15	0,70	1,10	1,85	1,00	1,19
CONEXIÓN SUMIDERO 3 M.I	3,25	0,70	1,10	1,85	1,00	3,38
CONEXIÓN SUMIDERO 4 M.D	3,90	0,70	1,10	1,85	1,00	4,03
DESCUENTOS						
MATERIAL FILTRANTE	8,30	0,70	0,25		1,00	-1,48
CIMENTACION TUBERIA	8,30	0,70	0,10		1,00	-0,58
RED DE CONEXIÓN SUMIDEROS TRAMO RECAMARA 3 A RECAMARA 13						
CONEXIÓN SUMIDERO 1 M.D	0,50	0,70	1,10	1,45	1,00	0,45
CONEXIÓN SUMIDERO 2 M.I	3,80	0,70	1,10	1,45	1,00	3,39
CONEXIÓN SUMIDERO 3 M.D	0,50	0,70	1,10	1,45	1,00	0,45
CONEXIÓN SUMIDERO 4 M.I	1,30	0,70	1,10	1,45	1,00	1,16
DESCUENTOS						
MATERIAL FILTRANTE	6,10	0,70	0,25		1,00	-1,08
CIMENTACION TUBERIA	6,10	0,70	0,10		1,00	-0,43
					Subtotal	79,37
					Vienen	0,00
					TOTAL	79,37

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	9,00	Entibado apuntalado cara en contacto con talud - dos usos	UNID.	m2	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones				Factor de uso	Medida Total
	Largo	Prof inicial	Prof final	Cant caras		
COLECTOR PLUVIAL						
RED RECAMARA 12-RECAMARA 3	40,35	1,40	1,56	2	0,50	59,72
RED RECAMARA 3- RECAMARA 13	45,20	1,56	2,30	2	0,50	87,24
RED RECAMARA 13- RECAMARA 10	1,80	2,30	2,60	2	0,50	4,41
					Subtotal	151,37
					Vienen	0,00
					TOTAL	151,37

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA

NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	10,00	Suministro y colocación de material granular para filtro en grava 3/4"	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA



Localización	Dimensiones			No. elementos	Medida Total
	Largo	ancho	Profundidad		
COLECTOR PLUVIAL					
RED RECAMARA 12-RECAMARA 3	40,35	0,90	0,41	1,00	14,89
RED RECAMARA 3- RECAMARA 13	45,20	0,90	0,41	1,00	16,68
RED RECAMARA 13- RECAMARA 10	1,80	0,90	0,41	1,00	0,66
TRAMO RECAMARA 12 A RECAMARA 3					
CONEXIÓN SUMIDERO 1 M.D	1,15	0,70	0,15	1,00	0,12
CONEXIÓN SUMIDERO 3 M.I	3,25	0,70	0,15	1,00	0,34
CONEXIÓN SUMIDERO 4 M.D	3,90	0,70	0,15	1,00	0,41
TRAMO RECAMARA 3 A RECAMARA 13					
CONEXIÓN SUMIDERO 1 M.D	0,50	0,70	0,15	1,00	0,05
CONEXIÓN SUMIDERO 2 M.I	3,80	0,70	0,15	1,00	0,40
CONEXIÓN SUMIDERO 3 M.D	0,50	0,70	0,15	1,00	0,05
CONEXIÓN SUMIDERO 4 M.I	1,30	0,70	0,15	1,00	0,14
LOSA DE SUMIDEROS	1,50	0,60	0,15	7,00	0,95
				Subtotal	34,69
				Vienen	0,00
				TOTAL	**34,69**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	11,00	Suministro y colocación de material granular para cimentación de tubería	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones			No. elementos	Medida Total
	Largo	ancho	Profundidad		
COLECTOR PLUVIAL					
RED RECAMARA 12-RECAMARA 3	40,35	0,90	0,12	1,00	4,36
RED RECAMARA 3- RECAMARA 13	45,20	0,90	0,12	1,00	4,88
RED RECAMARA 13- RECAMARA 10	1,80	0,90	0,12	1,00	0,19
TRAMO RECAMARA 12 A RECAMARA 3					
CONEXIÓN SUMIDERO 1 M.D	1,15	0,70	0,10	1,00	0,08
CONEXIÓN SUMIDERO 3 M.I	3,25	0,70	0,10	1,00	0,23
CONEXIÓN SUMIDERO 4 M.D	3,90	0,70	0,10	1,00	0,27
CONEXIÓN SUMIDERO 2 M.D	4,50	0,70	0,10	1,00	0,32
TRAMO RECAMARA 3 A RECAMARA 13					
CONEXIÓN SUMIDERO 1 M.D	0,50	0,70	0,10	1,00	0,04
CONEXIÓN SUMIDERO 2 M.I	3,80	0,70	0,10	1,00	0,27
CONEXIÓN SUMIDERO 3 M.D	0,50	0,70	0,10	1,00	0,04
CONEXIÓN SUMIDERO 4 M.I	1,30	0,70	0,10	1,00	0,09
CANAL					1,67
				Subtotal	12,44
				Vienen	0,00
				TOTAL	12,44

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

9-09-24

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL

URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800036847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	13,00	Suministro e instalación de tuberia PVC unión mecánica para alcantarillado d= 250 (10")	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA



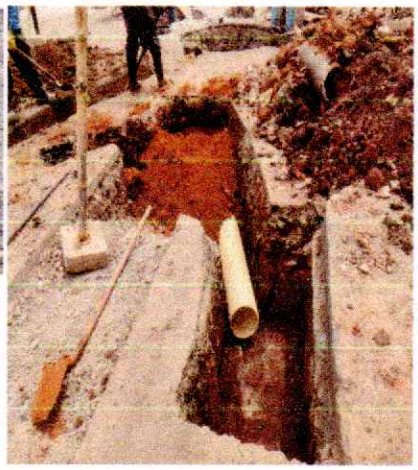



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Espesro		
CONEXIÓN DE SUMISEROS A COLECTOR					
TRAMO RECAMARA 12 A RECAMARA 3					
CONEXIÓN SUMIDERO 1 M.D	1,15			1,00	1,15
CONEXIÓN SUMIDERO 3 M.I	3,25			1,00	3,25
CONEXIÓN SUMIDERO 4 M.D	3,90			1,00	3,90
TRAMO RECAMARA 3 A RECAMARA 13					
CONEXIÓN SUMIDERO 1 M.D	0,50			1,00	0,50
CONEXIÓN SUMIDERO 2 M.I	3,80			1,00	3,80
CONEXIÓN SUMIDERO 3 M.D	0,50			1,00	0,50
CONEXIÓN SUMIDERO 4 M.I	1,30			1,00	1,30
			Subtotal		14,40
			Vienen		0,00
			TOTAL		**14,40**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	14,00	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 400 (16")	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones			No. elementos	Medida Total
	Largo	ancho	Profundidad		
RED PRINCIPAL					
RED RECAMARA 12- RECAMARA 3	40,75			1,00	40,75
RED RECAMARA 3- RECAMARA 13	45,60			1,00	45,60
RED RECAMARA 13- RECAMARA 10	2,20			1,00	2,20
RED RECAMARA 10- RECAMARA 11	5,00			1,00	5,00
				Subtotal	93,55
				Vienen	0,00
				TOTAL	93,55

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-8	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	15,00	Construcción cilindro concreto de 4000 PSI (cámara tipo B), Dint = 1.20, e=0.15	UNID.	mi	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





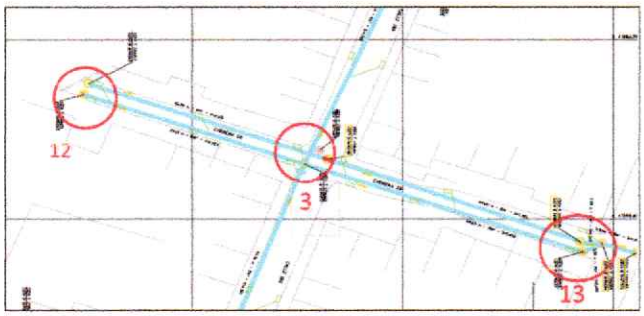

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Espesro		
RECAMARAS RED SANITARIA					
RECAMARA 12	1,10			1,00	1,10
RECAMARA 3	1,26			1,00	1,26
RECAMARA 13	2,00			1,00	2,00
Subtotal					4,36
Vienen					0,00
TOTAL					4,36

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	16,00	Construcción de losa de fondo en concreto de 4000 PSI para cámara de inspección, D=1.5m, E=0.15m	UNID.	und	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA



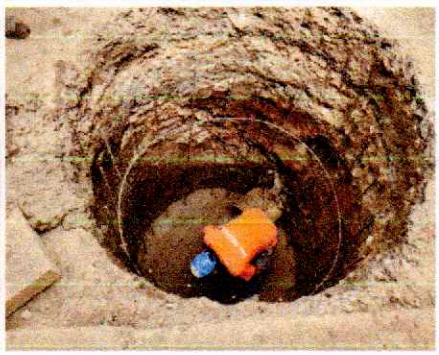

Localización	Dimensiones			No. elementos	Medida Total
	Largo	ancho	Profundidad		
COLECTOR PLUVIAL					
RECAMARA 12				1,00	1,00
RECAMARA 3				1,00	1,00
RECAMARA 13				1,00	1,00
Subtotal					3,00
Vienen					0,00
TOTAL					3,00

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023			
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	17,00	Construcción de brocal en concreto de 4000 PSI D=1.5m, E=0.20m, con tapa de concreto	UNID.	und	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones			No. elementos	Medida Total
	Largo	ancho	Profundidad		
COLECTOR PLUVIAL					
RECAMARA 12					
RECAMARA 3				1,00	1,00
RECAMARA 13				1,00	1,00
Subtotal					2,00
Vienen					0,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	26,00	Acero de refuerzo 420 Mpa (6000psi), incluye figurado, amarre e instalación	UNID.	Kg	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA







Localización	Dimensiones			No Elem.	cant total
	Longitud	varilla	peso (Kg/ml)		
ACERO DE CILINDRO DE RECAMARA					
RECAMARA 12					
ACERO LONG PAREDES	1,50	3/8"	0,56	20,00	16,80
ACERO TRANSVERSAL PAREDES	4,40	3/8"	0,56	8,00	19,71
ACERO LOSA FONDO	3,00	3/8"	0,56	2,00	3,36
	2,80	3/8"	0,56	2,00	3,14
	2,00	3/8"	0,56	2,00	2,24
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,00	3/8"	0,56	2,00	1,12
RECAMARA 3					
ACERO LONG PAREDES	1,70	3/8"	0,56	20,00	19,04
ACERO TRANSVERSAL PAREDES	4,40	3/8"	0,56	9,00	22,18
ACERO LOSA FONDO	3,00	3/8"	0,56	2,00	3,36
	2,80	3/8"	0,56	2,00	3,14
	2,00	3/8"	0,56	2,00	2,24
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,00	3/8"	0,56	2,00	1,12
RECAMARA 13					
ACERO LONG PAREDES	2,40	3/8"	0,56	20,00	26,88
ACERO TRANSVERSAL PAREDES	4,40	3/8"	0,56	12,00	29,57
ACERO LOSA FONDO	3,00	3/8"	0,56	2,00	3,36
	2,80	3/8"	0,56	2,00	3,14
	2,00	3/8"	0,56	2,00	2,24
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,00	3/8"	0,56	2,00	1,12
				Subtotal	172,52
				Vienen	0,00
				TOTAL	**172,52**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB. SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023			
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	20,00	Suministro, riego y compactación de sub base mecánico clase A	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA

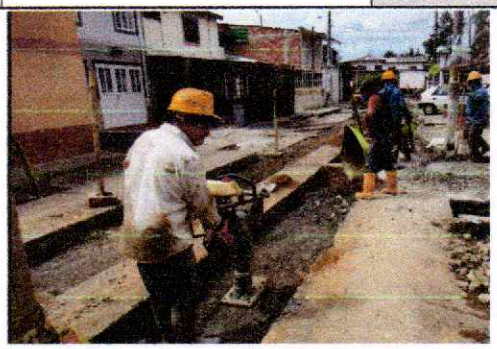



Localización	Dimensiones			No. elementos	Medida Total
	Largo	ancho	Profundidad		
COLECTOR PLUVIAL					
RED RECAMARA 12 - RECAMARA 3	20,00	0,90	0,20	1,00	3,60
RED RECAMARA 3- RECAMARA 13	45,20	0,90	0,20	1,00	8,14
RED RECAMARA 13- RECAMARA 10	1,80	0,90	0,20	1,00	0,32
TRAMO RECAMARA 3 A RECAMARA 13					
CONEXIÓN SUMIDERO 1 M.D	0,50	0,70	0,20	1,00	0,07
CONEXIÓN SUMIDERO 2 M.I	3,80	0,70	0,20	1,00	0,53
CONEXIÓN SUMIDERO 3 M.D	0,50	0,70	0,20	1,00	0,07
CONEXIÓN SUMIDERO 4 M.I	1,30	0,70	0,20	1,00	0,18
TRAMO RECAMARA 12 A RECAMARA 3					
CONEXIÓN SUMIDERO 1 M.D	1,15	0,70	0,20	1,00	0,16
CONEXIÓN SUMIDERO 3 M.I	3,25	0,70	0,20	1,00	0,46
CONEXIÓN SUMIDERO 4 M.D	3,90	0,70	0,20	1,00	0,55
				Subtotal	14,08
				Vienen	0,00
				TOTAL	14,08

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL

URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	21,00	Suministro, riego y compactación de base mecánico clase A	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones Largo	ancho	Profundidad	No. elementos	Medida Total
COLECTOR PLUVIAL					
RED RECAMARA 12 - RECAMARA 3	20,00	0,90	0,15	1,00	2,70
RED RECAMARA 3- RECAMARA 13	45,20	0,90	0,15	1,00	6,10
RED RECAMARA 13- RECAMARA 10	1,80	0,90	0,15	1,00	0,24
TRAMO RECAMARA 3 A RECAMARA 13					
CONEXIÓN SUMIDERO 1 M.D	0,50	0,70	0,15	1,00	0,05
CONEXIÓN SUMIDERO 2 M.I	3,80	0,70	0,15	1,00	0,40
CONEXIÓN SUMIDERO 3 M.D	0,50	0,70	0,15	1,00	0,05
CONEXIÓN SUMIDERO 4 M.I	1,30	0,70	0,15	1,00	0,14
TRAMO RECAMARA 12 A RECAMARA 3					
CONEXIÓN SUMIDERO 1 M.D	1,15	0,70	0,15	1,00	0,12
CONEXIÓN SUMIDERO 3 M.I	3,25	0,70	0,15	1,00	0,34
CONEXIÓN SUMIDERO 4 M.D	3,90	0,70	0,15	1,00	0,41
				Subtotal	10,55
				Vienen	0,00
				TOTAL	10,55

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	22,00	Disposición de sobrantes	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones VOLUMEN				No Elem.	Medida Total
MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION COLECTOR PLUVIAL						
EXCAVACIONES						
EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	65,35				1,00	65,35
EXCAVACION EN CONGLOMERADO	96,09				1,00	96,09
EXCAVACION EN TUNEL	3,53				1,00	3,53
Localización	**AREA**		**ESPESOR**		**No. Elem.**	**VOLUMEN TOTAL**
CARPETA						
VOLUMEN	99,54		0,10			9,95

OBSERVACIONES:

Subtotal	174,92
Vienen	0,00
TOTAL	**174,92**

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	23,00	Retiro de material de excavación sobrante y limpieza en general	UNID.	m3/km	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones		FACTOR EXPANSION	VOLUMEN TOTAL
	VOLUMEN EXCAVADO	DISTANCIA		
MATERIAL DE EXCAVACION COMUN	65,35	12,00	1,30	1.019,46
MATERIAL DE EXCAVACION CONGLOMERAD	96,09	12,00	1,30	1.499,00
MATERIAL EXCAVACIÓ TUNEL	3,53	12,00	1,30	55,07
CARPETA	9,95	12,00	1,00	119,40
			Subtotal	2.692,93
			Vienen	0,00
			TOTAL	2.692,93

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIC SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	1,00	Localización, trazado y replanteo de conducciones de acueducto y alcantarillado	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
RECAMARA 14- RECAMARA 15	33,79			1,00	33,79
RECAMARA 15-RECAMARA 16	15,47			1,00	15,47
Subtotal					49,26
Vienen					0,00
TOTAL					49,26

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No,	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No,	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO
CONTRATANTE	

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	2,00	Corte de pavimento asfaltico con cortadora	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB.SANTA MONICA



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
RECAMARA 14- RECAMARA 15	32,03			2,00	64,06
RECAMARA 15-RECAMARA 16	14,00			2,00	28,00
Subtotal					92,06
Vienen					0,00
TOTAL					92,06

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	3,00	Demolición pavimento flexible e<=10cm	UNID.	m2	UBICACIÓN	URB. SANTA MÓNICA





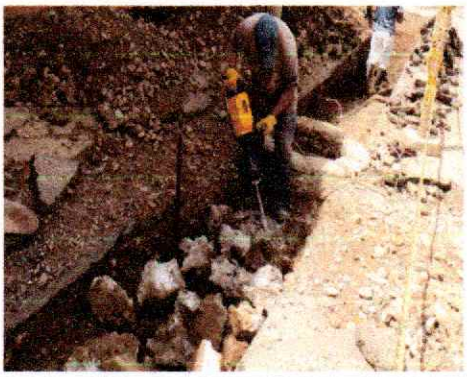

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA RED PRINCIPAL					
RECAMARA 14- RECAMARA 15	32,03	0,90		1,00	28,83
RECAMARA 15-RECAMARA 16	14,00	0,90		1,00	12,60
DEMOLICION DE LOSA DE PROTECCION EXISTENTE					
LOSA	39,03	0,90		1,00	35,13
			Subtotal		76,56
			Vienen		0,00
			TOTAL		76,56

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	6,00	Demolición de cámara de inspección + retiro hasta 10 km	UNID.	mi	UBICACIÓN	URB. SANTA MÓNICA

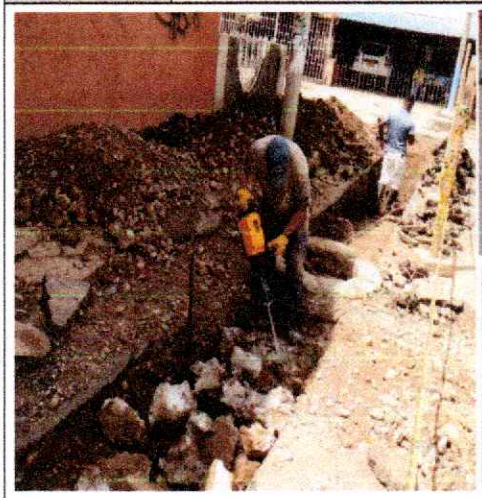





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Prof				
RECAMARA 14	0,75			1,00	0,75
RECAMARA 15	0,73			1,00	0,73
			Subtotal		1,48
			Vienen		0,00
			TOTAL		1,48

OBSERVACIONES

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No 20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	7,00	Demolición de sumidero sencillo	UNID.	und	UBICACIÓN	URB. SANTA MÓNICA

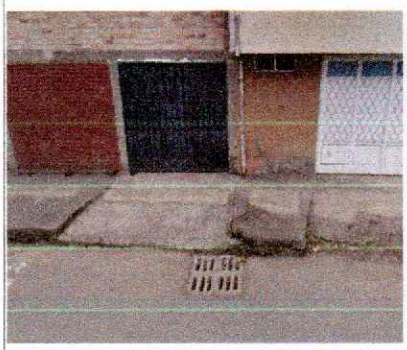



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Long	Ancho	Alto		
SUMIDERO EXISTENTE				1,00	1,00
Subtotal					1,00
Vienen					0,00
TOTAL					1,00

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	06	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	11,00	Excavación a mano hasta 2.5 m en seco en conglomerado	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MÓNICA





Localización	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	Long	Ancho	Prof inicial	Prof final		
RED RECAMARA 14 A 15	32,03	0,90	1,02	0,82	1,00	26,52
RED RECAMARA 15 A 16	14,00	0,90	0,82	1,62	1,00	15,37
	Area	Prof			No. Elem	Medida total
CAMARA 14	2,01	1,12			1,00	2,25
CAMARA 15	2,01	0,92			1,00	1,85
Subtotal						45,99
Vienen						0,00
TOTAL						45,99

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA

NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	15,00	Suministro y colocación de material granular para filtro en grava 3/4"	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MÓNICA

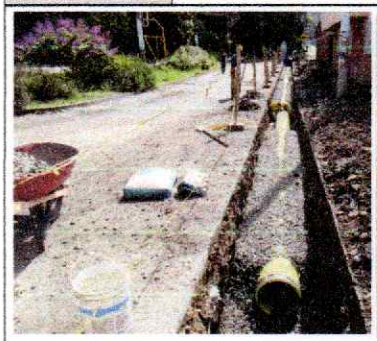

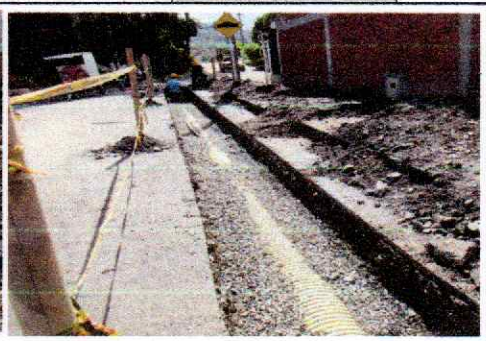

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Long	Ancho	Alto		
RED RECAMARA 14 A 15	32,03	0,90	0,41	1,00	11,82
RED RECAMARA 15 A 16	14,00	0,90	0,41	1,00	5,17
DESCUENTO					
TUBO	46,03	0,13		1,00	-5,98
				Subtotal	11,01
				Vienen	0,00
				TOTAL	11,01

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	16,00	Suministro y colocación de material granular para cimentación de tubería	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MÓNICA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Long	Ancho	Alto		
RED RECAMARA 14 A 15	32,03	0,90	0,10	1,00	2,88
RED RECAMARA 15 A 16	14,00	0,90	0,10	1,00	1,26
Subtotal					4,14
Vienen					0,00
TOTAL					4,14

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	17,00	Retiro de tubería existente entre 2" y 12"	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB. SANTA MÓNICA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Long	Ancho	Alto		
RED RECAMARA 14 A 15	32,43			1,00	32,43
RED RECAMARA 15 A 16	14,40			1,00	14,40
Subtotal					46,83
Vienen					0,00
TOTAL					46,83

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	21,00	Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica para alcantarillado d= 400 (16")	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB. SANTA MÓNICA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Long	Ancho	Alto		
RED RECAMARA 14 A 15	32,43			1,00	32,43
RED RECAMARA 15 A 16	14,40			1,00	14,40
Subtotal					46,83
Vienen					0,00
TOTAL					46,83

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023			
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	23,00	Construcción cilindro concreto de 4000 PSI (cámara tipo B), Dint = 1.20, e=0.15	UNID.	ml	UBICACIÓN	URB. SANTA MÓNICA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Long	Ancho	Prof		
RECAMARA 14			0,72	1,00	0,72
RECAMARA 15			0,53	1,00	0,53
Subtotal					1,25
Vienen					0,00
TOTAL					1,25

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB. SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	24,00	Construcción de losa de fondo en concreto de 4000 PSI para cámara de inspección, D=1.5m, E=0.15m	UNID.	und	UBICACIÓN	URB. SANTA MÓNICA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Long	Ancho	Alto		
RECAMARA 14				1,00	1,00
RECAMARA 15				1,00	1,00
Subtotal					2,00
Vienen					0,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No 20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	25,00	Construcción de brocal en concreto de 4000 PSI D=1.5m, E=0.20m, con tapa de concreto	UNID.	und	UBICACIÓN	URB. SANTA MÓNICA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Long	Ancho	Alto		
RECAMARA 14				1,00	1,00
RECAMARA 15				1,00	1,00
Subtotal					2,00
Vienen					0,00
TOTAL					2,00

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	27,00	Construcción de sumidero pluvial sencillo en concreto de 3000 PSI. Incluye tapa	UNID.	und	UBICACIÓN	URB. SANTA MÓNICA





Localización	Dimensiones Long	Ancho	Alto	No Elem.	Medida Total
SUMIDERO				1,00	1,00
Subtotal					1,00
Vienen					0,00
TOTAL					1,00

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	30,00	Suministro, riego y compactación de sub base mecánico clase A	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB SANTA MONICA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
RECAMARA 14- RECAMARA 15	32,03	0,90	0,20	1,00	5,77
RECAMARA 15-RECAMARA 16	14,00	0,90	0,20	1,00	14,00
				Subtotal	19,77
				Vienen	0,00
				TOTAL	19,77

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023

CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	30,00	Suministro, riego y compactación de sub base mecánico clase A	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB SANTA MONICA





Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
RECAMARA 14- RECAMARA 15	32,03	0,90	0,20	1,00	5,77
RECAMARA 15-RECAMARA 16	14,00	0,90	0,20	1,00	14,00
Subtotal					19,77
Vienen					0,00
TOTAL					19,77

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	31,00	Suministro, riego y compactación de base mecánico clase A	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB.SANTA MONICA



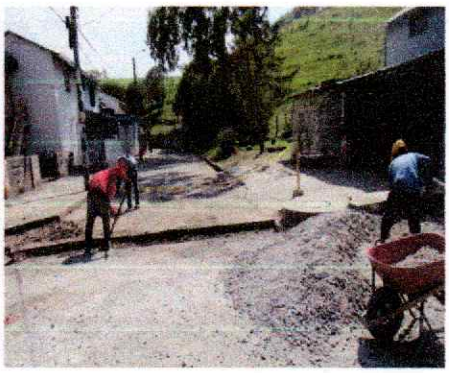

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
RECAMARA 14- RECAMARA 15	32,03	0,90	0,15	1,00	4,32
RECAMARA 15-RECAMARA 16	14,00	0,90	0,15	1,00	14,00
Subtotal					18,32
Vienen					0,00
TOTAL					18,32

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTIELA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB, SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA — NIT O C.C. 901292624-6 — SUPERVISOR CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	32,00	Concreto de 3000 psi para vias	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB.SANTA MONICA

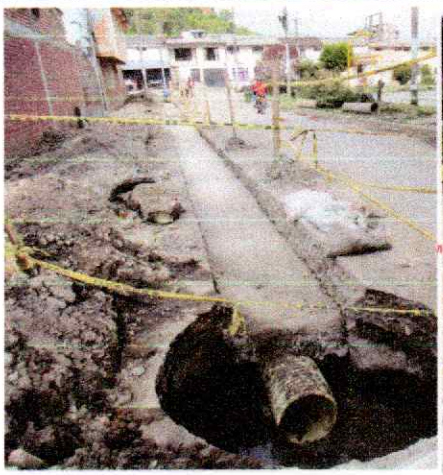

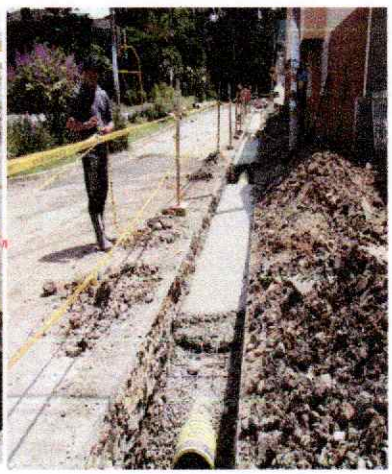

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Largo	Ancho	Alto		
LOSA PARA PROTECCION DE TUBERIA					
RECAMARA 14- RECAMARA 15	32,03	0,90	0,15	1,00	4,32
RECAMARA 15-RECAMARA 16	7,00	0,90	0,15	1,00	7,00
				Subtotal	11,32
				Vienen	0,00
				TOTAL	**11,32**

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB. SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	33,00	Disposición de sobrantes	UNID.	m3	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones				No Elem.	VOLUMEN TOTAL
	Largo	Ancho	Prof inicio	Prof final		
SOBRANTES DE EXCAVACION DE RED Y RECAMARAS						
RED RECAMARA 14 A 15	32,03	0,90	0,92	0,72	1,00	23,64
RED RECAMARA 15 A 16	14,00	0,90	0,72	1,52	1,00	14,11
	Area	Prof			No. Elem	Medida total
CAMARA 14	2,01	0,92			1,00	1,85
CAMARA 15	2,01	0,72			1,00	1,45
VOLUMEN DE CARPETA	76,56	0,10			1,00	7,66
				Subtotal		48,71
				Vienen		0,00
				TOTAL		48,71

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB. SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO CRA 2B CON CLL 18 Y 18A	ITEM	34,00	Retiro de material de excavación sobrante y limpieza en general	UNID.	m3/km	UBICACIÓN	URB. SANTA MONICA





Localización	Dimensiones		FACTOR EXPANSION	VOLUMEN TOTAL
	VOLUMEN EXCAVADO	DISTANCIA		
MATERIAL DE EXCAVACION	41,05	12,00	1,30	640,38
CARPETA ASLFALTICA	7,86	12,00	1,00	91,92
		Subtotal		732,30
		Vienen		0,00
		TOTAL		732,30

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB. SANTA MONICA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
URBANIZACIÓN SANTA MONICA

ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYÁN


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	20	MM	05	AA	24	SOPORTE DEL ACTA No.	1	PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE	15 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 10 AL 20 DE MAYO DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCION COLECTOR SANITARIO CARRERA 2B CON CALLES 18 Y 18A Y REPOSICION DE COLECTORES SANITARIOS, PLUVIAL Y/O COMBINADOS CALLE 18 A CON CARRERA 2 Y 2B Y CALLE 19 CON CARRERA 1 EN EL BARRIO SANTA MONICA.				
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No.20231800038847 DEL 2023				
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCION COMUNAL URBANIZACION SANTA MONICA	NIT O C.C.	901292624-6	SUPERVISOR	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

SECTOR	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO COMBINADO CLL 19 CON CRA 1	ITEM	35,00	Acero de refuerzo 420 Mpa (6000psi), incluye figurado, amarre e instalación	UNID.	Kg	UBICACIÓN	URB.SANTA MONICA

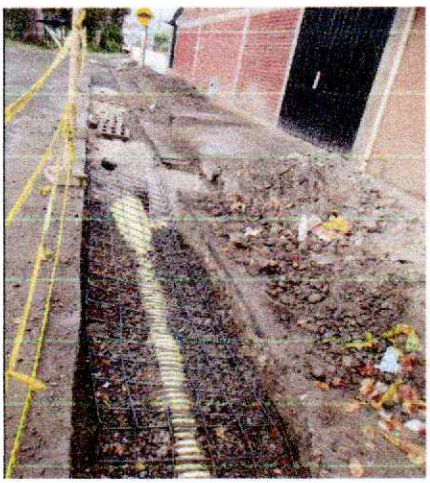



Localización	Dimensiones				Medida Total
	Largo	varilla #	peso(kg/m)	cantidad	
LOSA PARA PROTECCION DE TUBERIA					
acero longitudinal	39,00	3/8"	0,56	6,00	131,04
acero transversal	0,90	3/8"	0,56	260,00	131,04
RECAMARA 14					
ACERO LONG PAREDES	0,92	3/8"	0,56	20,00	10,30
ACERO TRANSVERSAL PAREDES	4,40	3/8"	0,56	5,00	12,32
ACERO LOSA FONDO	3,00	3/8"	0,56	2,00	3,36
	2,80	3/8"	0,56	2,00	3,14
	2,00	3/8"	0,56	2,00	2,24
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,00	3/8"	0,56	2,00	1,00
RECAMARA 15					
ACERO LONG PAREDES	0,72	3/8"	0,56	20,00	8,06
ACERO TRANSVERSAL PAREDES	4,40	3/8"	0,56	4,00	9,86
ACERO LOSA FONDO	3,00	3/8"	0,56	2,00	3,36
	2,80	3/8"	0,56	2,00	3,14
	2,00	3/8"	0,56	2,00	2,24
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,30	3/8"	0,56	2,00	1,46
	1,00	3/8"	0,56	2,00	1,00
				Subtotal	327,94
				Vienen	0,00
				TOTAL	327,94

OBSERVACIONES:

ING. JAVIER MONTILLA CARDONA
RESIDENTE DE OBRA

FREDY ESCARRAGA
R.L. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL URB. SANTA MONICA
