SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 22 MAYO al 21 JUNIO 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.


INFORME DE ACTIVIDADES PERIODICAS

DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación delinforme:	**JUNIO / 2024**	Numero de contrato:	**CD-12-2024-0671**
Datos del Contratista (nombres y apellidos-número de identificación)	REYNALDO OLIVA BABILONIA C.C. 8.731.664		
Periodo del informe:	Informe comprendido del 22 de mayo al 21 de junio de 2024.	Informe número:	4
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($ 57.000.000,oo)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.662.605		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Durante este periodo comprendido desde el 22 de mayo al 21 de junio del 2024 se realizó asesoría a la supervisión administrativa, técnica, a los proyectos que se relaciona en el siguiente informe.

1-Realizar y gestionar oficios para empresas de servicio público, solicitando los diseños, planos y memorias de las vías de los programas: barrios a la obra 8 etapa, ampliaciones viales carreras: 49C, 50, calle 79 y 98. Canalización del arroyo en carrera 18 entre 39 a la calle 47 (la cordialidad).



S-2024-02467

Triple A S.A. E.S.P.

Radicado Externo No.: S-2024-02467
Rad. Interno No.: **GP-2120-02467**

MC-GD-FR-1. V.1

Señores
EDUBAR
MANUEL MANOTAS
Ingeniero de apoyo técnico
Barranquilla, Atlántico.

Asunto: **"ENTREGA DE INFORMACIÓN TECNICA - CONTRATO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN (PARES VIALES CR 49C, CR 50, CL 79)"**

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que en este mes de Junio de 2024 se iniciaron los trabajos de intervención de vías y se requiere la instalación de las respectivas reposiciones de los sistemas de acueducto y

2-Visita de campos a la carrera 18 entre calle 39 a la 47 (vía cordialidad), para validación con la Triple A SA ESP, contratista Unión Temporal Gran Vía R90 e interventoría EDUBAR SA, para revisar los diseños de la tubería de alcantarillado y acueducto existente así:

2.1-El avance de la reposición de la tubería para el alcantarillado existentes entre calles 39 a la 41 con la carrera 18, se informa que se ha instalado los colectores en los diámetros de 20,24 y 8 pulgadas. Se informa que el contratista se le solicito por oficio colocar tapas provisionales en los pozos existentes para evitar taponamiento en el sistema por material al sistema. La empresa Triple A SA ESP ha asistido al contratista. Adicionalmente, se realizó la conexión del colector de 24 al de 20 pulgadas, para instalar el primer colector sin agua, y viceversa. Y así, se evitó el equipo de transvase, que seria un costo adicional al proyecto, reducción en la movilidad vehicular en las bocacalles 39-40-40B-41,por la instalación superficial provisional sobre el terreno de las tuberías de la trasvase, también reducción de emisión de ruidos del equipo.



FOTO No. 01: tapas provisionales para los pozos existentes de inspección del sistema de alcantarillado.



FOTO No.02: Carro de succión presión asistencia para destapar tuberías con material suelto del terreno.

En el avance de sistema pluvial se informa que el avance de construcción del boxcoulvert en concreto reforzado con acero y lleva un avance de 20 metros, está hecha la unión con la estructura existente. En la instalación de tubos de 60 pulgadas para sistema pluvial solo se ha instalado en la calle 41, no se ha instalado por no tener tubería. El contratista ha manifestado inconvenientes con el proveedor en la entrega de los tubos.

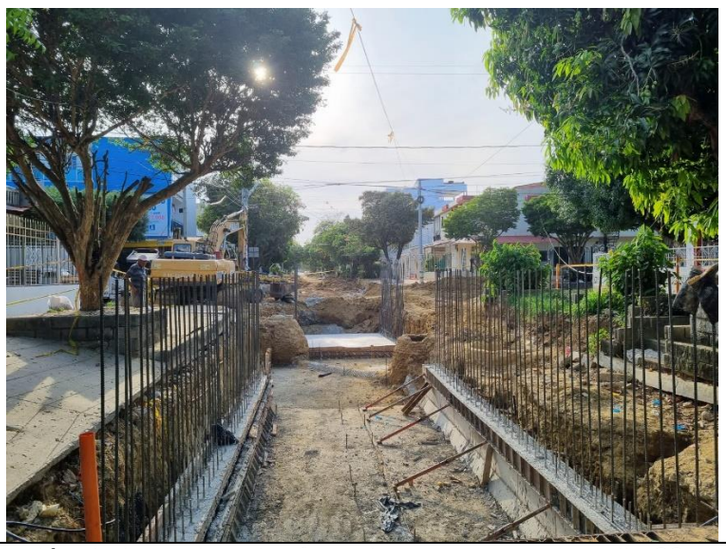


FOTO No.03: Construcción de boxcoluvert reforzado en acero en la calle 39, unión con la captación existente

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 22 MAYO al 21 JUNIO 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.



FOTO No.04: Construcción de canal reforzado en acero de concreto (boxcoulvert), unión la captación existente



FOTO No.05: Instalación de tuberías para alcantarillado en PVC diámetros 20-24-8 pulgadas



FOTO No.06: Conexiones tubería PVC 24 al de 20 pulgadas provisionales para instalación del colector de 24. Procesos constructivos para manejo de las aguas servidas sin equipo de trasvase.



FOTO No.07: Conexión de tubería para alcantarillado en PVC 20 y 24 pulgadas.

Con respecto a la tubería de agua potable se han presentado daños en las redes secundarias por estar muy superficiales, es decir debajo de la losa de pavimento y la triple A SA ESP atendido los daños. También se determinó la existencia de tubería de asbesto cemento con diámetro 10 pulgadas al ingeniero Horacio Caicedo encargado de la zona y redes de acueducto el día viernes 17 de mayo del 2024 para que informe los trabajos a realizar en esta tubería. Se informa que a la fecha no se ha manifestado de los trabajos a realizar por la empresa prestadora de servicio, a la de espera respuesta; desde el 20 al 24 de mayo del 2024.



FOTO No.08: Arreglo de daños a la red de distribución de agua potable en la calle 47(cordialidad) carrera 18.

Se realizó recorrido con el contratista ala vía la calle 47 (cordialidad) entre las carreras 13 a la 23. Con la ADI, Gerencia de Ciudad, Control Urbano, Contratista, EDUBAR, en el recorrido se observaron que el contratista no ha terminado algunos tramos que están por resolver la adquisición de una parte del frente de estos, el área encargada de esto esta en la gestión y entregara los predios al final o la segunda semana del próximo mes, depende de la voluntad de los propietarios antes de llegar una vial legal de expropiación. El contratista debe incrementar el personal o cuadrillas para atender los detalles del espacio público. Con

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 22 MAYO al 21 JUNIO 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.





FOTO No.09: Recorrido a la calle 47 (cordialidad) entre las carreras 13 a la 23.



(a)



(b)

FOTO No.10: vista (a) franja de predios por negociar , la vista (b) se observa la línea de propiedad se debe mover hacia el predio para instalar redes de alcantarillado.







FOTO No.11: Tuberías pendientes subterranizar acueducto y la tubería de alcantarillado por instalar en franja por compra de Distrito.

Para el avance de la instalación de la tubería en PVC diámetro 48 pulgadas para el alcantarillado pluvial en la calle 47 entre carreras 13 a la 18 se informa que el contratista ha terminado la instalación de la intersección de la carrera 18 y sus redes secundarias de acueducto y alcantarillado. Se informa que el contratista ha tenido dificultad con el suministro de la tubería de 48 pulgadas con el proveedor. Adicionalmente se informa que l contratista no ha instalado un tramo de tubería para alcantarillado en la carrera 10 entre calles 46B a la 47 , lo tanto, esto tiene al sistema botando a cielo abierto, se la interventoría le ha solicitado al contratista la instalación de este tramo provisional para evitar el agua servida corra por la vía. El contratista le llegaron el día 19 de junio del presente año, dos (02) tubos para instalar una vez al cierre de l informe procederá con la tubería pendiente de alcantarillado. Se ha programado una reunión con el operador de redes de acueducto y alcantarillado para darle las recomendaciones que debe tener el contratista con las redes de saneamiento básico.

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 22 MAYO al 21 JUNIO 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.







(a). (b). (c).

FOTO No.12: (a) instalación de tubería pvc novalock 48 pulgadas constricion de caja de inspección carrera 18 con cordialidad. (b):Tuberia 48 pulgadas para instalar. (c): Instalación de tubería en PVC 48 pulgadas

3- En barrios a la obra 8 etapa. Recorrido en el modulo 5 y sociabilización en el corregimiento de la playa. La instalación a iniciado.











Instalacion

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 22 MAYO al 21 JUNIO 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.





En el modulo 5 de barrios a la obra se tiene la construcción de la vía de la carrera 40B entre calle 11 a la 28 en la zona del mercado, precisando en el mercado de granos. Se realizo una jornada de limpieza al sitio y mantenimiento de las redes de alcantarillado para evitar el agua en a la vía intervenir. Se detecto vertimiento de agua de escorrentía aguas arriba por lavado.







Se realizo la gestión de aseo a la calle 29 entre carreras 41 a la 43 que circunda la ronda del caño de la ahuyama con la empresa prestadora de servicio la Triple A SA ESP. La SDOP esta en la ejecución de la mencionada vía y posiblemente se realice una zona verde en el sector. Se adjuntafotos. Del ates y el después. Ver fotos No.13

Antes:







Después:

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 22 MAYO al 21 JUNIO 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.







FOTO No.13:fotos de la jornada de aseo dela calle 29 entre carreras 41 a la 43.

4- El avance a los tres pares viales de la carrera 49C – 50 entre calle 76 a la 88 y la calle 79 entre carreras 43 a la 53, Con la empresa Triple A SA ESP, representada con la interventoría, Proyectos de Ingeniería SAS, EDUBAR como Gerencia Administrativa del Proyecto, asi:

En la carrera 49C: el contratista a iniciado con la demilocion de zona duras por el lado par desde la calle 76 a la 79. Se instaló el banco de ducto de las redes (secas) o voz y dato, la interventoría del proyecto, Proyectos de Interventoria, PI SAS, ha manifestado que se debe cambiar las redes de alcantarillado que están en concreto simple de 8 pulgadas. El proyecto tiene un rubro para cambio de redes, pero, éste no cubre el costo total de obra civil y suministro, y se le ha solicitado a la empres prestadora del servicio Triple A SA ESP, el suministro del material para lo cual accedió y el Distrito realizara la obra civil a través del contratista de la obra. Al cierre del informe se informa que la interventoría y contratista no han concertado los precios de la instalación, ni realizado el inventario del suministro. Se informa que lado impar se dio inicio el dia 19 de junio con la instalación del banco de ducto. Ver foto14.







FOTO No.14: imágenes del carrera 49C, demolición y retiro del lado impar e instalación de ducto de las redes voz y dato.

Se realizo comité de seguimiento para tratar con la interventoria PI SAS, EDUBAR la encargada de la gerencia del proyecto, la SDOP como contratante, y los contratistas el avance de laobra. Se derminó el cambio de tuberia de alcantarillado, revisión del diseño del pavimento. Ver foto15.





FOTO No.15: Seguimiento a los pares viales con EDUBAR- SDOP- INTERVENTORIA, PI SAS,

Para la carrera 50, se ha iniciado la ampliación de la vía desde la calle 87 al 86, donde finaliza el proyecto. Se informa que las redes de vos y datos están instaladas en ambos lados. Las redes de acueducto no se van a cambiar por que son en polietileno, solo la reubicación de medidores de las acometidas domiciliarias, lo cual se ha hecho y coordinado bien con la empresa prestadora delservicio; se da aviso que las redes fueron abjeto de vandalismo como robo de medidors¿es y válvulas. Para las redes de alcantarillado existente la interventoria requiere el cabio de las redes por se concreto simple, se presenta la misma situación que en el tramo de la carrera 49C. ala espera de solución de los predios y aprobación de la interventoria del levantamiento topográfico.



(a).



(b).



(c).

FOTO No.16: (a) tubería para el banco de ductos de voz y dato y tubos para el alcantarillado. (b) recorrido para determinar redes de alcantarillado. /c) toma de muestra para estudio de suelo para diseño de pavimento CBR.

En la calle 79 entre carreras 43 a la 52, el contratista no ha iniciado, en proceso de legalización del contrato.

5-Coordinar, definir, programar, planear el inicio del módulo uno del programa barrios a la obra etapa 8, con la gerencia del proyecto de EDUBAR, la interventoría consorcio DS, se informa que no ha iniciado debido a que falta legalizar contrato. El módulo dos a iniciado los trabajos del cambio de redes de alcantarillado. Como se ve en las foto No. 17. Para el modulo 3 de barrios a la obra 8 etapa se ha a presentado inconvenientes en la carrera 3E calle 19 a la 30, por que la Triple A no ha defino el material del cambio de tubería de conducción de agua potable para el miércoles 19 de junio tendrían una reunión para definir el material.





MODULO 2			
1	CARRERA 7A ENTRE CALLES 17E Y 19	350	SIMON BOLIVAR
2	CALLE 18 ENTRE CARRERA 6B Y 7A	200	SIMON BOLIVAR
3	CARRERA 6C ENTRE CALLE 17E Y 19	70	SIMON BOLIVAR
4	CARRERA 7D ENTRE CALLES 45B Y 46B	160	SANTUARIO
5	CALLE 46B ENTRE CARRERA 7C Y 7F	70	SANTUARIO
6	CARRERA 7G ENTRE CALLE 51B Y 52	120	SANTUARIO
7	CARRERA 8H ENTRE CALLES 51A Y 52	120	SANTUARIO
8	CARRERA 23 ENTRE CALLES 82F Y 83	80	ME QUEJO
9	CARRERA 24 ENTRE CALLES 82C Y 82F	160	ME QUEJO
10	CALLE 82F ENTRE CARRERAS 23 Y 24	110	ME QUEJO

FOTO No.17: adecuación e terreno , entrega de material por la Triple A al contratista, listado actualizado de las vias del modulo dod

6-Asesoria y coordinación técnica para la ejecución de las conexiones de las tuberías nuevas y las existentes con: el Contratista **Unión Temporal Gran Vía R90**, La Triple A SA ESP, la interventoría **EDUBAR SA** y la SDOB. Se coordino el arreglo de fuga de acueducto y alcanaraillado con la empresa Triple A. se realizo asistencia a las fugas reportadas por el contratista en ejecución de los trabajos.

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 22 MAYO al 21 JUNIO 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.





FOTO No.18: Imágenes de personal de la triple A asistiendo al contratista en la redes de alcantarillado en la carrera 18 con calle 47, y arreglo de fugas existentes por daños ala red distribución en la calle 46B.

7 Visita Técnica y recorrido al proyecto del intercambiador vial de la carrera 43 calle 110 (circunvalar). En donde la empresa de prestación de servicio público La Triple A SA ESP, instalará tubería de conducción en polietileno de 315 mm (12”), en la zona de anden lado impar de la carrera 43. Se informa que al cierre del informe del mes la empresa no ha enviado ofico con los requerimientos solicitados por la SDOP. Ver Foto No. 19.









Foto No. 19, carrera 43 acceso desde la circunvalar al barrio Miramar, adecuación de zona intervenidas por la AAA.

8. Elaboración y planificación de listados del las vías priorizadas en los modulos de barios a la obra con la ejecución según directrices ces de la SDOP.


SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS					
PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA					
CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCION DE VÍAS URBANAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES Y/O BOXCULVERT EN CONCRETO REFORZADO, PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MÓDULOS I, II, III, IV, Y V EN LAS LOCALIDADES SUR ORIENTE, NORTE CENTRO HISTÓRICO, RIOMAR, SUR OCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.					
OBRA No	DIRECCION	LONGITUD EN METROS	BARRIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
MODULO 1					
1	CARRERA 16A ENTRE CALLES 5 Y DIAGONAL 5	450	LA LUZ	DISTRITO	DISTRITO
2	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 26 Y 28	160	REBOLO	DISTRITO	DISTRITO
3	CARRERA 26 ENTRE CALLES 9 Y 17	500	REBOLO	DISTRITO	TRIPLE A
4	CALLE 11 ENTRE CARRERAS 15 Y 17B	200	LA LUZ	TRIPLE A	DISTRITO
5	CALLE 15 ENTRE CARRERAS 25 Y 27	250	REBOLO	-	COLECTOR 52"
6	CALLE 15 ENTRE CARRERAS 28 Y 30	280	REBOLO	TRIPLE A	DISTRITO

10.Cordinacion con la Triple A SA ESP, para asistenciaa las redes de los sistemas de acueducto y alcanarillado del sector del al intercambiador de la carrera 43 calle 110. Sector alamaeda.

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICA.

INFORME DE ACTIVIDAD PERIODICA – 22 MAYO al 21 JUNIO 2024.

Por: ING. Reynaldo Oliva Babilonia.

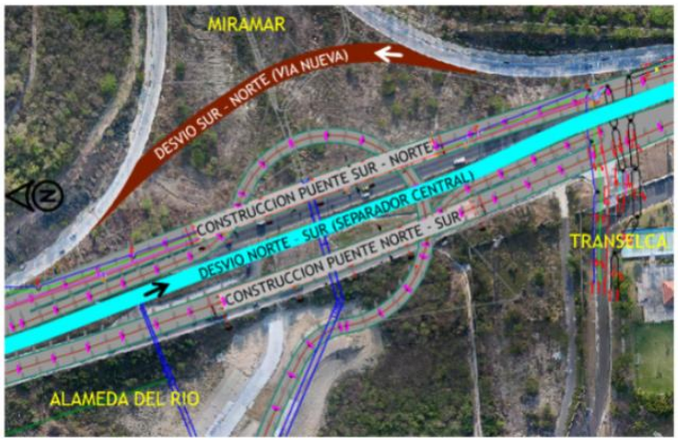

9. Coordinación, asistencia técnica, a la SDOP como enlace entre la gerencia administrativa del programa barrios a la obra 8 etapa que realiza EDUBAR SA con la empresa prestadora de servicio Triple A SA ESP. y los contratista que ejecutaran las vías.

MODULO	N° DE CONTRATO	CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
1	SA-EDU-003-2024	CONSORCIO VIAS BAREM	EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
2	SA-EDU-007-2024	CONSORCIO SAN CHARBEL EDU	CARLOS KARLO COTES MADERA
3	SA-EDU-008-2024	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024	JAVIER AUGUSTO MOLINA RODRIGUEZ
4	SA-EDU-009-2024	CONSORCIO G3 PAVIMENTAR BARRANQUILLA 24	IVAN ENRIQUE STEVENSON DEL VECCHIO
5	SA-EDU-010-2024	CONSORCIO EDUBAR 2024	ENETH TALINA AVENDAÑO
6	SA-EDU-023-2024	CONSORCIO VIAS QUILLA	SANTIAGO ANDRES DOMINGUEZ CAÑA
7	SA-EDU-004-2024	CONSORCIO COMPETITIVIDAD BARRANQUILLA	ALVARO HERNANDO CALDERON TORO
8	SA-EDU-011-2024	CONSORCIO DP 2024	ROBERTO CARLO DONADO ARCE
9	SA-EDU-005-2024	CONSORCIO DESARROLLO VIAL	OLEARIS ALONSO HERNANDEZ ORELLANO
INTERVENTORIA			
MODULO		CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL
1	SA-EDU-021-2024	CONSORCIO DS	ALEJANDRO ALBA QUINTERO
2	SA-EDU-022-2024	PI S.A.S	WILSON GIOVANNI URREA URREA

Atentamente,

REYNALDO OLIVA BABILONIA
C.C. 8.731.664 de Barranquilla
