GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORÍA No:	**9**		FECHA:	31	de	MAYO	de	2024			
PERIODO: DEL	25	de	ABRIL	de	2024	AL	24	de	MAYO	de	2024

CONTRATO No:	**2**	DE	2023	REGISTRO BP Y P No	**N.A.**

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LOCALIZACION:

Provincia de occidente en el departamento de Boyacá (En los municipios de Pauna, Maripi, Coper, La Victoria, San Pablo de Borbur, Puerto Boyacá, Muzo y Briceño).

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

Mejores vías para Boyacá que avanza

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S	**JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO**
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	NOMBRE DEL SUPERVISOR:
CONSORCIO CARINGA R. L. **JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO**	**OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRÁN**

ADICIONALES Y PRORROGAS


No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA No. 1	N.A.	SEIS (06) MESES
2	PRORROGA No. 2	N.A.	SEIS (06) MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0.00	ONCE (17) MESES

VALOR INICIAL:	$ 1,522,157,240.00	VALOR ADICIONALES:	$ 0.00	VALOR TOTAL:	$ 1,522,157,240.00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	29	de	DICIEMBRE	de	**2024**
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	29	de	DICIEMBRE	de	**2024**

AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	**88.1%**	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	**0.0%**	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	**91.5%**



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

						FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
No PÓLIZA	CBC-100041968	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		23	1	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	4	1	2023	4	6	2023	$ 228,323,586.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	4	1	2023	4	6	2023	$ 456,647,172.00
PRESTACIONES SOCIALES	4	1	2023	4	6	2026	$ 228,323,586.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	4	1	2023	4	6	2026	$ 304,431,448.00

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

No PÓLIZA	CBC-100041968	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							22	9	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	25	8	2023	25	1	2024	$ 228,323,586.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	25	8	2023	25	1	2024	$ 456,647,172.00
PRESTACIONES SOCIALES	25	8	2023	25	1	2027	$ 228,323,586.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	25	1	2024	25	1	2027	$ 304,431,448.00

No PÓLIZA	CBC-100041968	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							9	10	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	25	8	2023	1	7	2024	$ 228,323,586.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	25	8	2023	25	1	2024	$ 456,647,172.00
PRESTACIONES SOCIALES	25	8	2023	1	7	2027	$ 228,323,586.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	25	1	2024	25	1	2027	$ 304,431,448.00

No PÓLIZA	CBC-100041968	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							5	1	2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	25	8	2023	1	1	2025	$ 228,323,586.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	25	8	2023	25	7	2024	$ 456,647,172.00
PRESTACIONES SOCIALES	25	8	2023	1	1	2028	$ 228,323,586.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	25	7	2024	25	7	2027	$ 304,431,448.00

No PÓLIZA	CBC-100041968	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							28	2	2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO	7	2	2024	1	1	2025	$ 228,323,586.00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	7	2	2024	25	7	2024	$ 456,647,172.00
PRESTACIONES SOCIALES	7	2	2024	1	1	2028	$ 228,323,586.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	25	7	2024	25	7	2027	$ 304,431,448.00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

No PÓLIZA	CBC-100007126	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							23	1	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	4	1	2023	4	6	2023	$ 348,000,000.00
PATRONAL	4	1	2023	4	6	2023	$ 104,400,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4	1	2023	4	6	2023	$ 104,400,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPOS	4	1	2023	4	6	2023	$ 104,400,000.00

No PÓLIZA	CBC-100007126	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							10	9	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	4	1	2023	1	7	2024	$ 348,000,000.00
PATRONAL	4	1	2023	1	7	2024	$ 104,400,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4	1	2023	1	7	2024	$ 104,400,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPOS	4	1	2023	1	7	2024	$ 104,400,000.00

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

No PÓLIZA	CBC-100007126	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							9	10	2023

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	4	1	2023	1	7	2024	$ 348,000,000.00
PATRONAL	4	1	2023	1	7	2024	$ 104,400,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4	1	2023	1	7	2024	$ 104,400,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPOS	4	1	2023	1	7	2024	$ 104,400,000.00

No PÓLIZA	CBC-100007126	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							5	1	2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	4	1	2023	1	1	2025	$ 348,000,000.00
PATRONAL	4	1	2023	1	1	2025	$ 104,400,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4	1	2023	1	1	2025	$ 104,400,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPOS	4	1	2023	1	1	2025	$ 104,400,000.00

No PÓLIZA	CBC-100007126	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							28	2	2024

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	4	1	2023	2	1	2025	$ 390,000,000.00
PATRONAL	4	1	2023	2	1	2025	$ 117,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	4	1	2023	2	1	2025	$ 117,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPOS	4	1	2023	2	1	2025	$ 117,000,000.00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR	X	MALO		PÉSIMO	

Descripción: Las condiciones climaticas no fueron favorables para el desarrollo del contrato de obra, se presentaron lluvias y cambios en la topografía a intervenir.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
Acta de inicio	25	8	2023
Prorroga No. 1	28	12	2023
Prorroga No. 2	17	6	2024

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
RADICACION DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DEL INFORME No. 8	N.A.
SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 002 DE 2023	N.A.
SE REALIZAN MESAS DE TRABAJO Y REUNIONES VIRTUALES CON LA PARTICIPACION DEL CONTRATISTA DE OBRA, LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION D ELA GOBERNACION ABORDANDO TEMAS CON RESPECTO A LOS DISEÑOS DE CADA UNO DE LOS PUNTOS CONTRACTUALES.	N.A.
SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA EN SU REPRESENTACION LEGAL	N.A.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Subsanacion de las observaciones del Informe No. 8 de interventoria (Planillas pendientes)	N.A.
Revisión Verificación y Aprobación de planillas de Seguridad Social y parafiscales del contratista del mes de abril de 2024.	N.A.
Radicación de la aprobacion del informe No. 8 del contrato de interventoria No. 2422 del 2023, mediante oficio.	N.A.
Se realizan mesas de trabajo y reuniones virtuales con la participación del contratista de obra, la interventoría y la supervisión de la gobernación abordando temas con respecto a los diseños de cada uno de los puntos contractuales.	N.A.

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
Estación Total TOPCON Modelo GTS – 246NW	Replanteo Topográfico	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
Nivel Topográfico Colimador Marca SOUTH Modelo LF – 3B	Nivelación - Translado de puntos de referencia	15%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
TUBO SHELBY SPT	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
MALACATE DE ROTACION	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
VARILLAS MO TUBOS DE PERFORACIÓN	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
BROCAS TRICONO	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos
BARRENAS HELICOIDALES DE VASTAGO HUECO	Perforaciones - Extraccion de muestras para realizar Ensayos	10%	Cumple con los requisitos minimos requeridos

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
N.A.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0.00**

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
N.A.		
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 0.00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
14/05/2024	Oscar David Avendaño Beltrán supervisor contrato de interventoría gobernación de Boyacá.	RESPUESTA RADICADO No: S-2024-009293-SECCON SEGUNDA DEVOLUCION MODIFICATORIO CONTRATO DE OBRA No. 002 de 2023.	Radicado por Correo Electronico.
26/05/2024	Oscar David Avendaño Beltrán supervisor contrato de interventoría gobernación de Boyacá.	Remisión del Informe Mensual No. 8 Contrato de Interventoría No. 2422 de 2023.	Radicado por Correo Electronico.

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	PERIODO HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
ABRIL DE 2024										
JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO	80217561	X	X	X	1	4	2024	30	4	2024
NELSON ODENS MORA FRANCO	18386964	X	X	X	1	4	2024	30	4	2024
CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	74373208	X	X	X	1	4	2024	30	4	2024
VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	79383126	X	X	X	1	4	2024	30	4	2024
JIMMY VERGARA SILVA	74321878	X	X	X	1	4	2024	30	4	2024
JIMMY VERGARA SILVA	74321878	X	X	X	1	4	2024	30	4	2024
VICTOR MANUEL CAMACHO REYES	9658759	X	X	X	1	4	2024	30	4	2024
JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	1053328390	X	X	X	1	4	2024	30	4	2024
MAYO DE 2024										
JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO	80217561	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
NELSON ODENS MORA FRANCO	18386964	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	74373208	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	79383126	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
JIMMY VERGARA SILVA	74321878	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
JIMMY VERGARA SILVA	74321878	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
VICTOR MANUEL CAMACHO REYES	9658759	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024
JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	1053328390	X	X	X	1	5	2024	31	5	2024

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	X	NO	

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO	80217561
DIRECTOR DE OBRA	NELSON ODENS MORA FRANCO	18386964
RESIDENTE DE OBRA	CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	74373208
GEOLOGO	VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	79383126
ASESOR EN GEOTECNIA VIAL	JIMMY VERGARA SILVA	74321878
ASESOR EN ESTRUCTURAS	JIMMY VERGARA SILVA	74321878
ASESOR HUDRAHULICO O HDROLOGICO	VICTOR MANUEL CAMACHO REYES	9658759
REVISOR FISCAL - PERSONAL EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	1053328390

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	X	NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	1010200976
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO	1010200976
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JHONATAN BRAYAN MENESES SANCHEZ	1053341203

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
N.A.	N.A.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
N.A.	N.A.

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Profundidad del Sondeo (m)	13	1	2024	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Limites de Atterberg	13	1	2024	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Contenido de agua (Humedad) INV – E 122.	13	1	2024	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Análisis Granulométrico por lavado Tamiz No. 200	13	1	2024	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad

Determinación del Límite Líquido INV – E 125.	13	1	2024	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Determinación del Límite Plástico e Índice de Plasticidad INV – E 126.	13	1	2024	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Compresión Inconfinada en muestras de suelos INV – E 152.	13	1	2024	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Ensayos de penetración estándar SPT INV E-111.	13	1	2024	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad
Compresión Inconfinada en muestras de suelos INV – E 152.	13	1	2024	La interventoria realizo acompañamiento a esta actividad

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
N.A.				N.A.

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Comité No. 1 - Socialización de estudios y diseños	22	12	2023	Seguimiento en la socializacion de los estudios y diseños de los puntos contractuales expuestos por el contratista, con la participacion del supervisor.
Comité No. 2 - Seguimiento en el cumplimiento de Informes Mensuales y Documentacion contractual	26	2	2024	Socializacion y aclaracion de formatos de informes mensuales, Seguimiento en la documentacion pendiente (Cambio de Representante legal).

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 0.	N.A.			N.A.			Informe previo al acta de inicio
Informe de Interventoría No. 1.	25	8	2023	24	9	2023	Etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 2.	25	9	2023	24	10	2023	Etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 3.	25	10	2023	24	11	2023	Etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 4.	25	11	2023	24	12	2023	Etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 5.	25	12	2023	24	1	2024	Etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 6.	25	1	2024	24	2	2024	Etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 7.	25	2	2024	24	3	2024	Etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 8.	25	3	2024	24	4	2024	Etapa de estudios y diseños
Informe de Interventoría No. 9.	**25**	**4**	**2024**	**24**	**5**	**2024**	**presente Informe.**

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

OBSERVACIONES:

La inteventoria durante este periodo realizó acompañamiento a la etapa de estudios y diseños a fin de realizar el debido control a cada una de las actividades que contempla esta etapa. En relacion a los ajustes de diseños que el contratista ha realizado durnte el mes.

Adicionalmente mencionamos que a la fecha el contratista de obra ha radicado los estudios y diseños de los puntos contractuales, los cuales se ha realizado el seguimiento continuo en cumplimiento a lo descrito en el contrato de Obra, así mismo manifestamos que se han radicado a la supervisión.

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	Ver Anexo B y Anexo G
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	Ver Anexo F
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	NO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	SI	Contenido del Informe Pág .27 y 28.
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría	N.A.	
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	N.A.	
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.	N.A.	
Memorias y planos de diseño aprobados	NO	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	NO	
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	Ver Anexo A
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	N.A.	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	Ver Anexo B
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	NO	
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción	N.A.	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)	NO	
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	N.A.	
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes	NO	
Generales		
Registro fotográfico	N.A.	
Soportes de Correspondencia enviada y recibida	SI	Ver Anexo C

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)

Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Interventor / RL. Interventoría - Consorcio Caringa

NOMBRE: JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO

SECRETARIA DE CONTRATACION
REVISADO
GABRIEL MONSALVE BOTIA
FECHA 26-06-2024

CC-2422-2024-064

Bogotá D.C., 24 de junio de 2024

Ingeniero
OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRÁN
Supervisor contrato de interventoría
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

REF: INTERVENTORÍA No. 2422, OBJETO - "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

ASUNTO: Remisión del Informe Mensual No. 9 Contrato de Interventoría No. 2422 de 2023.

Cordial saludo,

En cumplimiento con las obligaciones contractuales y considerando lo estipulado dentro de la cláusula ***"Cláusula 7– A. Obligaciones Generales del Contratista.*** *3. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el supervisor"* … (subrayado y en cursiva), esta Interventoría hace entrega del Informe Mensual No. 9 correspondiente al periodo comprendido entre el 25 de abril al 24 de mayo de 2024. Este informe corresponde a la etapa de estudios y diseños del contrato de Obra No. 002 de 2023, para su revisión y aprobación por parte del supervisor.

Cordialmente,

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CARINGA
NIT. 901.716.198-1

DIRECCIÓN: Carrera 72 L 35 – 06 Sur, Bogotá D.C.
EMAIL: consorciocaringa@hotmail.com
TELEFONO: 311 4 77 82 52

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CONTRATO No. 2422 DE 2023

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

R/L JUAN FRANISCO PACHON RONCANCIO
CONSORCIO CARINGA
INTERVENTOR

INFORME No. 9

BOGOTÁ D.C. – MAYO 2024

DIRECCIÓN:
Carrera 72 L 35 – 06 Sur,
Bogotá D.C.

EMAIL:
consorciocaringa@hotmail.com

TELEFONO:
311 4 77 82 52

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. Localización general 4
2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto. 4
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 12
3.1. Información general del contrato 12
3.2. Alcance e impacto del proyecto 12
3.3. Proceso precontractual 13
3.4. Proceso contractual 15
3.5. Estado financiero del contrato de obra 16
3.6. Seguimiento a las garantías contractuales 16
3.7. Relación de personal del contrato de obra. 20
3.8. Resumen de las actividades que ejecutara el contratista de obra en cada municipio 21
3.9. Maquinaria, pruebas y ensayos de laboratorio 39
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 41
4.1. Información general del contrato 41
4.2. Proceso contractual 41
4.3. Estado financiero del contrato de interventoría 42
4.4. Recurso físico de interventoría 42
4.5. Seguimiento de las garantías contractuales 43
4.6. Relación de personal de interventoría 45
4.7. Descripción de los trabajos realizados en el mes por la interventoría. 46
5. RELACION DE CORRESPONDENCIA 48
5.1 Correspondencia Enviada 48
5.2 Correspondencia Recibida. 49
6. CONCLUSIONES 49
7. ANEXOS 49

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta las obligaciones del contrato No. 2422 de 2023, de presentar informes mensuales, el objeto del contrato de realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y ambiental al contrato de obra pública No. 002 de 2023, y las obligaciones generales de realizar un reconocimiento técnico y detallado del contrato actual. En el presente informe se describe el control y seguimiento que se realizará durante el plazo contractual, con el fin de cumplir el objeto previsto en el alcance.

El documento se desarrolla de la siguiente manera: En primer lugar, se describe la localización del proyecto, estado inicial del sitio de implantación, así como las características técnicas del proyecto desde el punto de vista arquitectónico y estructural.

Posteriormente, se presenta la información general del contrato de obra, que incluye el presupuesto inicial, las garantías contractuales, la descripción de las actividades que se van a ejecutar. De igual manera se presenta la información del contrato de interventoría con las mismas especificaciones.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización general

El proyecto se desarrolla en el occidente del departamento de Boyacá en los municipios de Briceño, Coper, La Victoria, Maripi, Muzo, Pauna, Puerto Boyacá y San Pablo de Borbur, donde se llevará acabo la construcción de obras de mitigación sobre la red vial departamental afectada por temporada de lluvias.

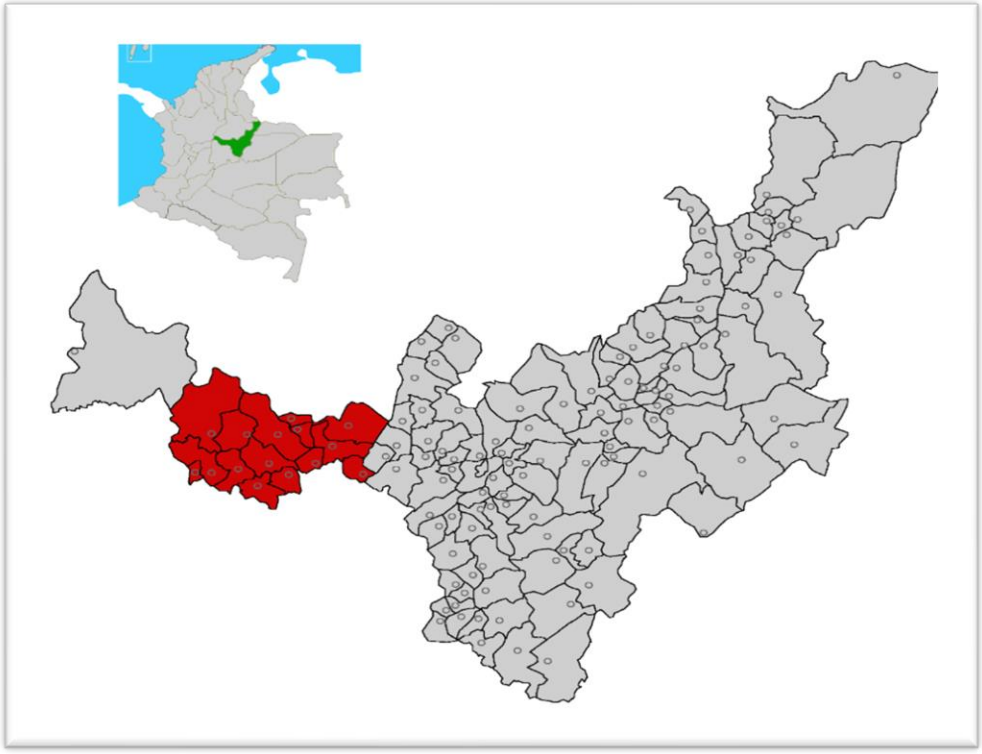


Ilustración 1. *Localización geográfica del Occidente del departamento de Boyacá*

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El proyecto se desarrollará en los siguientes municipios al Occidente del departamento de Boyacá:

Localización General.

Briceño

Briceño es un municipio colombiano, ubicado en la provincia de occidente del departamento de Boyacá. Se encuentra aproximadamente a 130 km a la ciudad de Tunja, capital del departamento.

Los puentes objeto de protecciones en su mayoría se localizan sobre la red vial del departamento, identificada con código 60BY06, denominada: CRUCE RUTA 60 (PIEDRA GORDA) - LA VENTA SECTOR PIEDRA GORDA LIMITES CON SANTANDER; no obstante, también se encuentran puentes de la red municipal o terciaria.

COORDENADAS		
LATITUD	**LONGITUD**	**ALTITUD**
5°40'11.95"N	73°55'51.94"O	1278



Ilustración 2. *Localización proyecto en Briceño, Boyacá*

Coper

Coper es un municipio colombiano, ubicado en la Provincia de Occidente, en el departamento de Boyacá. Se encuentra aproximadamente a 133 km de la ciudad de Tunja, capital del departamento y a 65 km aproximadamente del municipio de Chiquinquirá capital de la provincia. Limita con los municipios de Maripí, Paime, San Cayetano, Muzo, Buenavista y Carmen de Carupa.

COORDENADAS ESCUELA CUCUNUBA		
LATITUD	**LONGITUD**	**ALTITUD**
5°26´7.99"	74°2´15.61"	1194



Ilustración 3. *Localización proyecto en Coper, Boyacá.*

La Victoria

Los municipios de Quipama y la Victoria se localizan en la provincia de Occidente, en el departamento de Boyacá. Quipama limita con los municipios de Muzo, Otanche y La Victoria (Departamento de Boyacá), y con los municipios de Paime y Yacopí (Departamento de Cundinamarca). La Victoria limita al norte y este, con el municipio de Quipama, Boyacá; al sur y al oeste, con el departamento de Cundinamarca.

COORDENADAS		
LATITUD	**LONGITUD**	**ALTITUD**
5°32'04.07" N	74°11"38.08" W	1277



Ilustración 4. *Localización proyecto en La Victoria, Boyacá*

Maripi

Maripi es un municipio colombiano, ubicado en la Provincia de occidente, en el departamento de Boyacá. Se encuentra aproximadamente a 115 km de la ciudad de Tunja, capital del departamento y a 40 km aproximadamente del municipio de Chiquinquirá capital de la provincia. Limita con los municipios de Pauna, Buenavista, Coper, San pablo de Borbur, Caldas y Muzo.

COORDENADAS SECTOR LAGUNAS		
LATITUD	**LONGITUD**	**ALTITUD**
5°34'43.21" N	74°01´15.65" W	1312

COORDENADAS SECTOR LAS CRUCES		
LATITUD	**LONGITUD**	**ALTITUD**
5°31'37.56" N	74°02´19.06" W	1088

COORDENADAS SECTOR NARAPAY		
LATITUD	**LONGITUD**	**ALTITUD**
5°31'09.31" N	74°02´16.94" W	904



Ilustración 5. *Localización proyectos en Maripi, Boyacá*

Muzo

Localización general.

Muzo es un municipio colombiano, localizado en la provincia de occidente del departamento de Boyacá. El municipio es conocido por sus yacimientos esmeraldíferos. Se encuentra a 170 km de Tunja la capital del departamento y a 90 km de Chiquinquirá la capital de la provincia.

Los puntos objeto de la visita se encuentran ubicados en la red vial entre los sectores Cantino - La Vega, Muzo - la Mina y Santa Bárbara – Muzo.

COORDENADAS		
LATITUD	**LONGITUD**	**ALTITUD**
5°35´43.5" N	74°07´58.8" W	647



Ilustración 6. *Localización proyecto Puente la Caco en Muzo, Boyacá*

Pauna.

Pauna es un municipio colombiano, ubicado en la Provincia de occidente, en el departamento de Boyacá. Se encuentra a 149 km de Tunja, la capital del departamento. El municipio limita al norte con Florián (Santander), al sur con Caldas y Maripí, al oriente con Briceño y Tununguá y al occidente con Otanche y San Pablo de Borbur.

COORDENADAS		
LATITUD	**LONGITUD**	**ALTITUD**
5°41'29.48"N	73°59'37.61"O	1278



Ilustración 7*. Localización proyecto en Pauna, Boyacá.*

Puerto Boyacá

Localización General.

Puerto Boyacá es un municipio y puerto colombiano del departamento de Boyacá. Es uno de los principales puertos de la región del Magdalena Medio y con una población cercana a los 50.000 habitantes.

También es a la vez el principal puerto fluvial del departamento de Boyacá. El tramo vial Departamental D1557201 (Las Mercedes – El 14) visitado hace parte de la red terciaria a cargo de la Gobernación de Boyacá este tramo comunica a las veredas de Las Mercedes, Las Pavitas, Puerto Pineda, El Trapiche y Los Naranjos.

COORDENADAS		
LATITUD	**LONGITUD**	**ALTITUD**
5°50'51.40" N	74°24'30.48"O	278

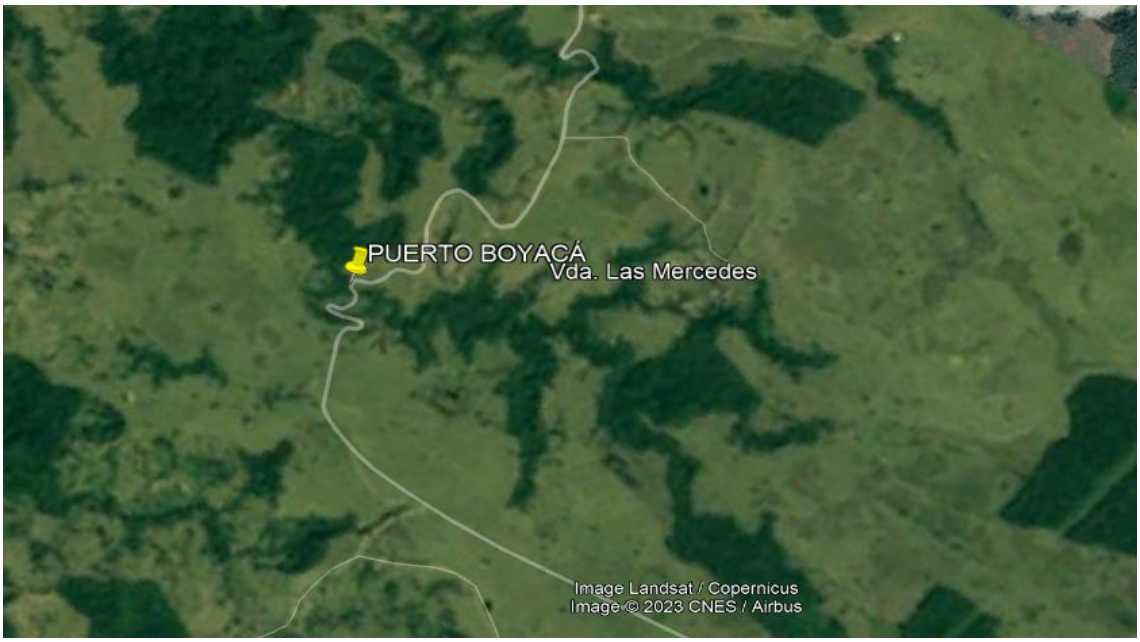


Ilustración 8. *Localización proyecto en Puerto Boyacá, Boyacá.*

San Pablo de Borbur

San Pablo de Borbur es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Occidente en el departamento de Boyacá. El municipio está situado a unos 65 km de la ciudad de Chiquinquirá, capital de la provincia y limita al norte con Otanche y Pauna, al sur con Muzo, al oriente con Maripí y Pauna y al occidente con Otanche.

COORDENADAS		
LATITUD	**LONGITUD**	**ALTITUD**
5°37'31.79" N	74° 9'7.47" O	1251



Ilustración 9. *Localización proyecto en San Pablo de Borbur, Boyacá*

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato.

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NIT.	891.800.498-1
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.	002 DE 2023
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
NIT. CONTRATISA	901.063.647-3
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
OBJETO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA.
VALOR CONTRATO	MIL QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS ($1,522,157,240.00)
FECHA FIRMA CONTRATO	4/01/2023
FECHA DE INICIO:	25/08/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA No.1:	28/12/2023 – SEIS (06) MESES
FECHA DE PRÓRROGA No.2:	17/06/2024 - SEIS (06) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	29/12/2024

3.2. Alcance e impacto del proyecto.

El objeto del contrato de obra es realizar la construcción de diferentes obras de mitigación sobre la red vial departamental del occidente de Boyacá en ocho municipios del departamento, los cuales se ha visto afectados por la temporada de

lluvias, por ende, se deberán atender las necesidades urgentes y garantizar la protección de las estructuras a intervenir.

3.3. Proceso precontractual

El contratista de obra previo al inicio de la etapa contractual presentó la documentación que se relaciona a continuación:

DOCUMENTOS JURÍDICOS	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO, EN CONDICIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S COMO PROPONENTE A FIN DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS HABILITANTES PRESENTÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA SUSCRITA, CERTIFICADO DE EXISTENCIA, CEDULA DE CIUDADANÍA R/L, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES, CERTIFICADO DEL REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS, REGISTRÓ ÚNICO TRIBUTARIO (RUT), GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES, CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.
DOCUMENTOS TÉCNICOS	CONSTRUCTORA PAÍS S.A.S PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES ADJUNTÓ LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: **EXPERIENCIA GENERAL:** CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ DONDE SE EJECUTO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 076 DE 2019, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VIA 60BY09 GUANARES – SANTA ROSA – MARIPI – LA VEGA DEL TIGRE, MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA".

	EXPERIENCIA ESPECIFICA: • CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ DONDE SE EJECUTO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 087 DE 2018, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS SANTA ROSA Y SABANETA DEL MUNICIPIO DE MARIPI-BOYACÁ". • CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA, DONDE SE EJECUTO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 008 DE 2019, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VIA SECTOR ALTO DE LA CRUZ Y SECTOR LA VIRGEN HACIA LA VEREDA MIRQUE Y VALERO DEL MUNICIPIO DE RAQUIRA, DEPARTAMENTO DE BOYACA". • CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ DONDE SE EJECUTO EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 071 DE 2019, CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y CONSTRUCCION MURO EN GAVIONES VIA ZULIA, GUARUMAL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA". • CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA DONDE SE EJECUTO EL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. CMA-CO-03-2019, CUYO OBJETO ES "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑO DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ENTRADA AL MUNICIPIO DE COVARACHIA-BOYACÁ". **EQUIPO HUMANO MÍNIMO DE TRABAJO:** EL CONTRATISTA ADJUNTÓ COPIA DEL DIPLOMA DE GRADO COMO PROFESIONAL Y COMO ESPECIALISTA, LA TARJETA PROFESIONAL Y VIGENCIA DE LA MATRICULA, CEDULA DE CIUDADANÍA Y LAS CERTIFICACIONES PARA

	ACREDITAR LA EXPERIENCIA DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES EXIGIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
DOCUMENTOS FINANCIEROS	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S PRESENTÓ CAPACIDAD RESIDUAL DONDE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS
DOCUMENTOS EVALUATIVOS	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S PRESENTO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: **OFERTA ECONÓMICA:** LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA FUE POR VALOR DE $ 1'522.157.240,00 **FACTOR DE CALIDAD:** • ACREDITO LA EXPERIENCIA ADICIONAL REQUERIDA PARA CADA PROFESIONAL. • PRESENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA • ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS **APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL:** PRESENTO LA CEDULA **VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD:** PRESENTÓ CERTIFICADO POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y CERTIFICADO DE VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. **MIPYME:** ADJUNTÓ FORMATO ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES.

3.4. Proceso contractual

El día 04 de enero del 2023, se firmó virtual el Contrato de Obra No. 002 de 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA.", entre CONSTRUCTORA PAIS S.A.S, en su calidad de CONTRATISTA, y el DEPARTAMENTO DE BOYACA en su calidad de CONTRATANTE.

El día 27 de septiembre del 2023 se expidieron las pólizas correspondientes al contrato de obra.

3.5. Estado financiero del contrato de obra

FORMA DE PAGO CONTRATO DE OBRA				
PAGO	**COMPONENTE**	**FORMA DE PAGO**	**PORCENTAJE**	**VALOR A PAGAR**
1	CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA	ANTICIPO	30%	$ 456.647.172,00
2		ACTAS DE RECIBO PARCIAL	60%	$ 913.294.344,00
3		ACTA DE LIQUIDACIÓN	10%	$ 152.215.724,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA				$ 1.522.157.240,00

3.6. Seguimiento a las garantías contractuales

El contrato de obra pública No. 002 de 2023 en su CLÁUSULA DECIMA SEXTA "GARANTÍAS", establece que el contratista debe presentar garantía de cumplimiento para cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, de igual manera debe contar con un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual, con las siguientes especificaciones:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR DEL ANTICIPO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ES DECIR POR EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE ESTE.	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS, CONTADOS A PARTIR DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL QUINCE POR CIENTO (15%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VIGENCIA POR EL TÉRMINO DE TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.	EL VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE PORCIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
EL AMPARO DEBE PROTEGER AL DEPARTAMENTO DE EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL QUE SURJA DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DE SU CONTRATISTA; IGUALMENTE DEBE CUBRIR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR EVENTUALES RECLAMACIONES DE TERCEROS DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL QUE SURJAN DE LAS ACTUACIONES, HECHOS U OMISIONES DE LOS SUBCONTRATISTAS AUTORIZADOS O EN SU DEFECTO, QUE ACREDITE QUE EL SUBCONTRATISTA CUENTA CON UN SEGURO PROPIO CON EL MISMO OBJETO Y QUE LA ENTIDAD ESTATAL SEA EL ASEGURADO	IGUAL AL PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EL VALOR ES EQUIVALENTE A 300 SMMLV

A partir de lo anterior el contratista suscribió las siguientes pólizas actualizadas según prórroga No.1 del contrato de obra, Pólizas de Cumplimiento expedidas el 08 de febrero del 2024 por la entidad aseguradora (MUNDIAL DE SEGUROS S.A.).

Por otra parte, queremos mencionar que durante el mes de mayo se tramitó la prórroga 2 al contrato de referencia, la cual fue aprobada. Asimismo, se solicitó a la aseguradora la actualización de las pólizas. A la fecha de corte del presente informe, aún no se han recibido estas actualizaciones.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ASEGURADORA		**MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**	
POLIZA No. CBC-100041968		**ANEXO 4**	
FECHA DE EXPEDICIÓN		**08/02/2024**	
CONCEPTO	**VIGENCIAS (FECHAS)**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	07/02/2024	01/01/2025	$ 228.323.586,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.	07/02/2024	25/07/2024	$ 456.647.172,00
PRESTACIONES SOCIALES	07/02/2024	01/01/2028	$ 228.323.586,00

ESTABILIDAD DE LA OBRA	25/07/2024	25/07/2027	$ 304.431.448,00

Las Garantías de Responsabilidad Civil Extracontractual actualizadas de acuerdo a prórroga No. 1 del contrato de obra No. 002 de 2023, Pólizas expedidas el 07 de febrero del 2023 por la entidad aseguradora (MUNDIAL DE SEGUROS S.A.).

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA		**MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**	
POLIZA No. CBC-100007126		**ANEXO 4**	
FECHA DE EXPEDICIÓN		**7/02/2024**	
CONCEPTO	**VIGENCIAS (FECHAS)**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	04/01/2023	02/01/2025	$ 390.000.000,00
PATRONAL	04/01/2023	02/01/2025	$ 117.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	04/01/2023	02/01/2025	$ 117.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	04/01/2023	02/01/2025	$ 117.000.000,00

El 28 de febrero de 2024, la Secretaría de Contratación de la Gobernación de Boyacá aprobó las pólizas de cumplimiento y la responsabilidad civil extracontractual a través de la plataforma SECOP II. Este paso es fundamental para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la protección en caso de eventuales contingencias durante la ejecución del proyecto.

A la fecha las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad Civil Extracontractual se encuentran actualizadas de acuerdo a prórroga No. 1 del 28 de diciembre de 2023, sin embargo, no fueron aceptadas por secretaria de contratación puesto que no cumplía con las vigencias de acuerdo al artículo 11 de la ley 1150 de 2007, por parte del contratista realizaron los ajustes necesarios y a la fecha cumplen de acuerdo a la prorroga No. 1

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS 28-02-2024 19:10

Id de la garantía CO1.WRT.13667212

Referencia de la garantía PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 4

Estado Aceptada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra
- [ ] Responsabilidad civil extra contractual

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS MUNDIAL

Número de póliza 100041968

Tomador CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.

Beneficiario GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	456.647.172,00 COP	25/07/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	228.323.586,00 COP	1/01/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Ilustración 10. Aprobación póliza de cumplimiento (28-02-2024)



DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS 28-02-2024 19:10

Id de la garantía	CO1.WRT.13667219
Referencia de la garantía	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ANEXO 4
Estado	Aceptada
Justificación	☐ Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ☐ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ☐ Cumplimiento - Pago de salarios ☐ Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra ☑ Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de garantía	◉ Contrato de seguro ○ Patrimonio autónomo ○ Garantía bancaria
Entidad aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Número de póliza	CBC-100007126
Tomador	CONSTRUCTORA PAIS S.A.S.
Beneficiario	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Responsabilidad civil extra contractual	390.000.000,00 COP	2/01/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento

Ilustración 11. *Aprobación póliza de Responsabilidad civil extracontractual del contrato (28-02-2024).*

3.7. Relación de personal del contrato de obra.

Durante la ejecución del contrato se referencia el personal de obra que estará presente:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	PROFESIÓN
DIRECTOR DE OBRA	NELSON ODENS MORA FRANCO	C.C. No. 18´386.964 DE CALARCA, QUINDIO	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRA	CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	C.C. No. 74´373.208 DE DUITAMA, BOYACÁ	INGENIERO CIVIL

GEÓLOGO	VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	C.C. No. 79´383.126 DE BOGOTÁ D.C.	GÉOLOGO
ASESOR EN GEOTECNIA VIAL	JIMMY VERGARA SILVA	C.C. No. 74´321.878 DE SOCHA, BOYACÁ	INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS)
ASESOR EN ESTRUCTURAS	JIMMY VERGARA SILVA	C.C. No. 74´321.878 DE SOCHA, BOYACÁ	INGENIERO CIVIL (ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS)
ASESOR HIDRÁULICO O HIDROLÓGICO	VICTOR MANUEL CAMACHO REYES	C.C. No. 9´658.759 DE YOPAL CASANARE	INGENIERO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE SISTEMAS HIDRICOS URBANOS

Al verificar esta información, el contratista está cumpliendo con el personal mínimo requerido establecido en la propuesta. Por lo tanto, se anexa las planillas de seguridad social de cada uno d ellos profesionales.

Las planillas de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales del personal administrativo, operativo y de obra utilizados en desarrollo del objeto contratado se adjuntarán mes a mes de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes de conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios), para el contrato de obra.

3.8. Resumen de las actividades que ejecutara el contratista de obra en cada municipio

Muzo

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE MUZO-SECTOR LA CACO			
1	**PRELIMINARES**		
1,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
2	**RECTIFICACIÓN DEL CAUCE, RECALCE REFORZADO DEL ESTRIBO, MURO ACOMPAÑAMIENTO (PROTECCIÓN) JARILLÓN, ESPIGON.**		
2,1	3.02.08	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	METRO CÚBICO

2,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
2,3	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	METRO CÚBICO
2,4	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
2,5	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 M, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	METRO LINEAL
2,6	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
2,7	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	METRO CÚBICO
2,8	3.03.07	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	METRO CÚBICO
2,9	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
2,10	3.08.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	METRO LINEAL
2,11	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	METRO CÚBICO
2,12	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Maripi – Sector las Cruces

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE MARIPI-SECTOR LAS CRUCES			
3	**PRELIMINARES**		
3,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
4	**ESTRUCTURA DE CONTENCION, DISIPADORES Y FILTROS**		
4,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	METRO CÚBICO
4,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
4,3	3.03.07	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	METRO CÚBICO
4,4	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	METRO CÚBICO
4,5	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN,	METRO CÚBICO

		INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	
4,6	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
4,7	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
4,8	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
4,9	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
4,10	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	METRO CÚBICO
4,11	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

La Victoria

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE LA VICTORIA			
5	**PRELIMINARES**		
5,1	3.01.04	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO	KILÓMETRO
5,2	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
6	**DESLIZAMIENTO VIAL Y PUNTOS CRÍTICOS A LO LARGO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL D1558005 QUÍPAMA - LA VICTORIA TERRACEO, AMPLIACIÓN DE LA VÍA HACIA EL TALUD, SEÑALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO, APLICACIÓN DE SUBBASE Y BASE, FILTRO EN LA CORONA DEL TALUD Y CONFORMACIÓN DE BANCA VÍA, CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES**		
6,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	METRO CÚBICO
6,2	3.02.08	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	METRO CÚBICO
6,3	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
6,4	3.13.15	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	METRO CÚBICO
6,5	3.03.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	METRO LINEAL
6,6	3.03.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (SOLADOS)	METRO CÚBICO
6,7	3.03.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000) PARA BASES	METRO CÚBICO

6,8	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	METRO CUADRADO
6,9	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	METRO CÚBICO
6,10	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
6,11	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	METRO CÚBICO
6,12	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
6,13	3.03.07	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	METRO CÚBICO
6,14	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACIÓN)	KILÓMETRO
6,15	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
6,16	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	METRO CÚBICO
6,17	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Puerto Boyacá

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ - SECTOR LA CONFUSA			
7	**PRELIMINARES**		
7,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
8	**CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBO, CONFORMACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE, APLICACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO**		
8,1	3.13.15	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	METRO CÚBICO
8,2	3.02.08	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	METRO CÚBICO
8,3	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
8,4	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	METRO CÚBICO
8,5	3.10.03	CONCRETO DE 28 MPA - (4000 PSI) PARA PLACAS Y VIGAS, LONGITUD DE 0 A 7.0 MTS.	METRO CÚBICO

8,6	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
8,7	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
8,8	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	METRO CÚBICO
8,9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Briceño

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE BRICEÑO			
9	**PRELIMINARES**		
9,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
10	**RECTIFICACIÓN DEL CAUCE, RECALCE REFORZADO DEL ESTRIBO, MURO ACOMPAÑAMIENTO (PROTECCIÓN) JARILLÓN, ESPIGON.**		
10,1	3.02.08	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	METRO CÚBICO
10,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
10,3	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPA - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	METRO CÚBICO
10,4	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
10,5	621.1.2	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIÁMETRO 1.2 M, INCLUYE EXCAVACIÓN EN ROCA, BAJO AGUA	METRO LINEAL
10,6	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
10,7	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	METRO CÚBICO
10,8	3.03.07	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	METRO CÚBICO
10,9	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
10,10	3.08.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO 20 X 35 CM	METRO LINEAL
10,11	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO	METRO CÚBICO

		LIBRE DE 5 KM.	
10,12	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Briceño

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE PAUNA - SECTOR CARARE			
11	**PRELIMINARES**		
11,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
12	**RECTIFICACIÓN DEL CAUCE, RECALCE REFORZADO DEL ESTRIBO, MURO ACOMPAÑAMIENTO (PROTECCIÓN) JARILLÓN, ESPIGON.**		
12,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	METRO CÚBICO
12,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
12,3	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	METRO CÚBICO
12,4	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
12,5	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
12,6	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
12,7	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
12,8	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Maripi – Sector Lagunas Santa Rosa

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
7. MUNICIPIO DE MARIPI-SECTOR LAGUNAS SANTA ROSA			
13	**PRELIMINARES**		
13,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
14	**TERRACEO FILTRO EN LA CORONA DEL TALUD Y CONFORMACIÓN DE BANCA VÍA**		
14,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE	METRO

		ACARREO LIBRE DE 5 KM	CÚBICO
14,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
14,3	1.02.14	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN CAL. 12	METRO CÚBICO
14,4	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	METRO CÚBICO
14,5	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
14,6	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
14,7	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
14,8	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
14,9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Maripi – Sector Narapay

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
8. MUNICIPIO DE MARIPI-SECTOR NARAPAY			
15	**PRELIMINARES**		
15,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
16	**TERRACEO FILTRO EN LA CORONA DEL TALUD Y CONFORMACIÓN DE BANCA VÍA, APLICACIÓN DE MATERIAL**		
16,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	METRO CÚBICO
16,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
16,3	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	METRO CÚBICO
16,4	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
16,5	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
16,6	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
16,7	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL	METRO

		SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	CÚBICO
16,8	3.02.10	PEDRAPLÉN COMPACTO	METRO CÚBICO
16,9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

Coper

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE COPER - SECTOR ESCUELA CUCUNUBA			
17	**PRELIMINARES**		
17,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
18	**AMPLIACIÓN DE LA VÍA HACIA EL TALUD, SEÑALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO, REDIRECCIONAMIENTO CAUCE QUEBRADA**		
18,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	METRO CÚBICO
18,2	3.02.08	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	METRO CÚBICO
18,3	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
18,4	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	METRO CÚBICO
18,5	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
18,6	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM	UNIDAD
18,7	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
18,8	3.02.10	PEDRAPLÉN COMPACTO	METRO CÚBICO
18,9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM

San Pablo de Borbur

ITEM	ITEM GOBER	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR - SECTOR CAIPAL VÍA MUZO			
19	**PRELIMINARES**		
19,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	METRO CUADRADO
20	**TERRACEO, AMPLIACIÓN DE LA VÍA HACIA EL TALUD, SEÑALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO, APLICACIÓN DE SUBBASE Y BASE, CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES.**		
20,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	METRO CÚBICO
20,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	METRO CÚBICO
20,3	1.02.14	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSIÓN CAL. 12	METRO CÚBICO
20,4	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	METRO CÚBICO
20,5	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	METRO LINEAL
20,6	3.03.06	DISIPADOR DE ENERGÍA Y SEDIMENTADOR EN CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI), (NO INCLUYE REFUERZO)	METRO CÚBICO
20,7	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 X 60 CM	UNIDAD
20,8	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KILOGRAMO
20,9	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
20,10	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	METRO CÚBICO
20,11	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	M3-KM
11. TRANSPORTE MATERIALES SUELTOS DESPUES DE 5 KM			
21	**PRELIMINARES**		
21,1	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	M3-KM

- **Actividades Ejecutadas por el Contratista de Obra.**

Durante el periodo comprendido entre el 25 de abril al 24 de mayo de 2024, el contratista **Obra CONSTRUCTORA PAIS S.A.S** continuó realizando ajustes de diseño en todos los puntos contractuales, atendiendo a las observaciones notificadas por parte de la secretaria de contratación Además, en algunos puntos críticos, el contratista junto con los especialistas encargados implementó alternativas de diseño con el objetivo de reducir el presupuesto presentado y ajustarse al valor contractual establecido. Este enfoque demuestra el compromiso del contratista con la eficiencia económica y la viabilidad del proyecto.

A la fecha el contratista de Obra ha realizado la entrega de los 10 puntos contractuales nombrados a continuación:

- MARIPI – SECTOR NARAPAE.
- MARIPI – SECTOR LAS CRUCES.
- MARIPI – SECTOR LAGUNAS.
- SAN PABLO DE BORBUR.
- PAUNA.
- LA VICTORIA.
- BRICEÑO.
- MUZO – PUENTE LA CACO.
- COPER – SECTOR ESCUELA CUCUNUBA.
- PUERTO BOYACA – SECTOR LA CONFUSA.

Una vez revisados y aprobados los ajustes de diseño por parte de la interventoría, los documentos han sido radicados ante la supervisión de la Gobernación. Este proceso garantiza la transparencia y la adecuada comunicación entre las partes involucradas en el proyecto de los puntos de mitigación fortaleciendo así la coordinación y el seguimiento de las actividades contractuales.

A continuación, se ilustra un registro fotográfico para cada uno de los componentes de los frentes, los cuales han sido radicados a supervisión, sin embargo, una vez fueron notificadas las observaciones por parte de dirección técnica, se realizaron los ajustes solicitados.

ESTUDIO TOPOGRAFICO

Se describe el levantamiento topográfico que se realizó En los puntos críticos del occidente de Boyacá localizados en los municipios de Maripi, san pablo de Borbur, Pauna, Puerto Boyacá, Briceño, Coper, la Victoria y Muzo Puente la Caco.

En los sectores del presente estudio, se materializaron puntos, con descripción sobre la misma permitiendo la identificación del punto en campo, con una nomenclatura consecutiva, de acuerdo a los requerimientos establecidos.




levantamiento Topográfico – Maripi Sector Lagunas




Levantamiento Topográfico – Maripi Sector las Cruces






Levantamiento Topográfico – Maripi Sector Narapae





Levantamiento Topográfico – San Pablo de Borbur



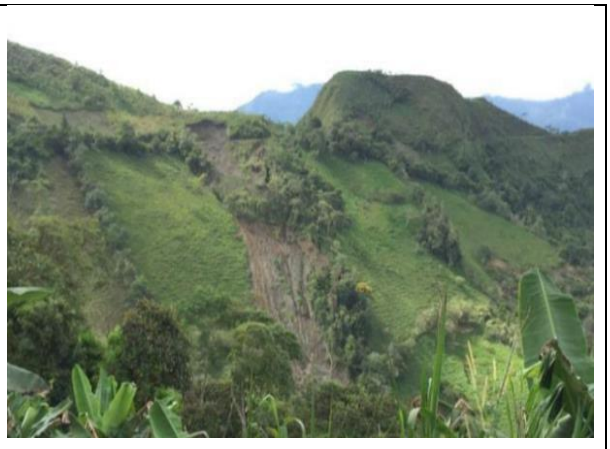

Levantamiento Topográfico – Pauna





Levantamiento Topográfico – Puente la Caco Muzo





Levantamiento Topográfico – Briceño





Levantamiento Topográfico – Puerto Boyacá





Levantamiento Topográfico – Coper

ESTUDIO DE SUELOS Y RECOMENDACIÓN DE CIMENTACIÓN

El presente estudio tiene como propósito el reconocimiento de las condiciones geotécnicas, estratigráficas e hidrogeológicas presentes en la zona con las cuales servirán de base para la determinación de las características de capacidad portante y análisis de asentamientos para la obra proyectada.

El alcance del estudio prevé análisis de estabilidad de taludes, la zona de estudio de los 5 puntos críticos presenta pendientes diferentes. No se prevé ensayos de colapso y tipo REMI.





Exploración de Suelos – Maripi Sector Lagunas





Exploración de Suelos – Maripi Sector las Cruces





Exploración de Suelos – Maripi Sector Narapae.





Exploración de Suelos – San Pablo de Borbur




Exploración de Suelos – Pauna.




Exploración de Suelos – Puente la Caco Muzo.




Exploración de Suelos – Briceño.







Exploración de Suelos – Puerto Boyacá.

DISEÑO HIDRÁULICO Y MODELO GEOMETRICO DEL CAUCE.


El diseño hidráulico para obras de mitigación sobre la red vial Afectada por la temporada de lluvias es una parte crucial del proceso de construcción. Este tipo de obras se enfocan en minimizar los impactos negativos de las lluvias en las carreteras, como inundaciones erosión del suelo y daños a la infraestructura vial.

El presente informe se ilustra el detalle de filtro proyectado, los drenajes y muros de contención que se realizaron para cada uno de los frentes contractuales.

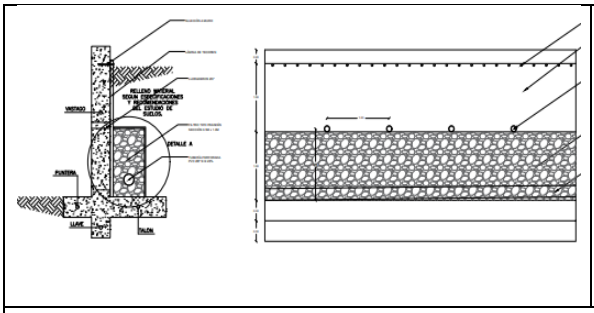


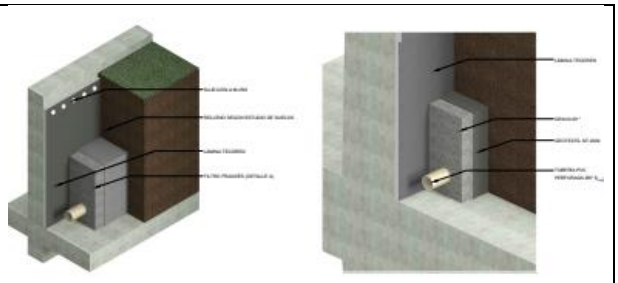


Detalle de filtro proyectado, Drenaje Muro de contención – Maripi Sector Lagunas.

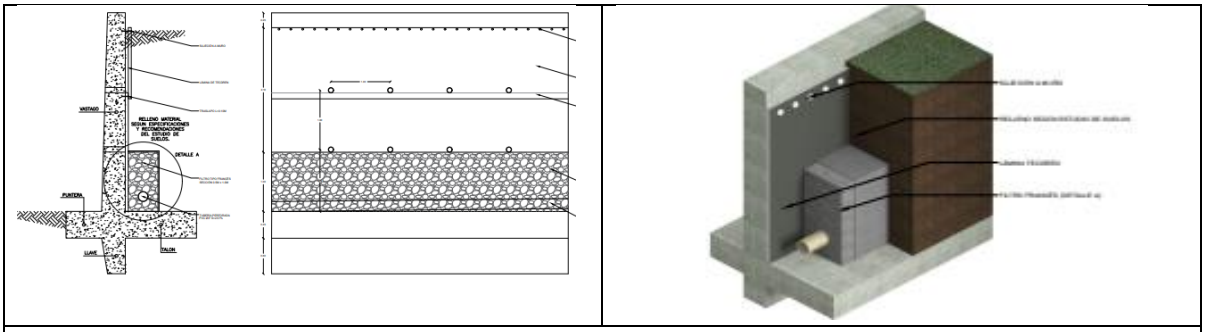


Detalle de filtro proyectado, Drenaje Muro de contención – Maripi Sector Las Cruces.

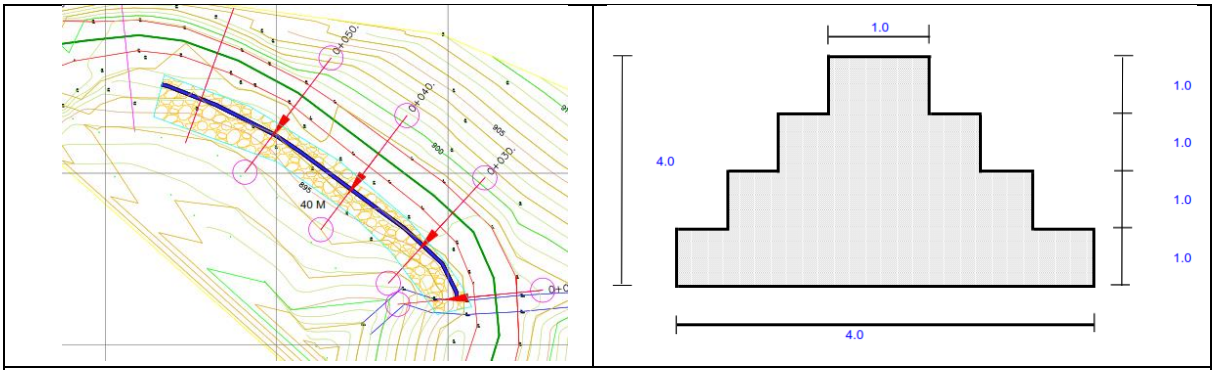


Detalle del Gavión – Maripi Sector Narapae.

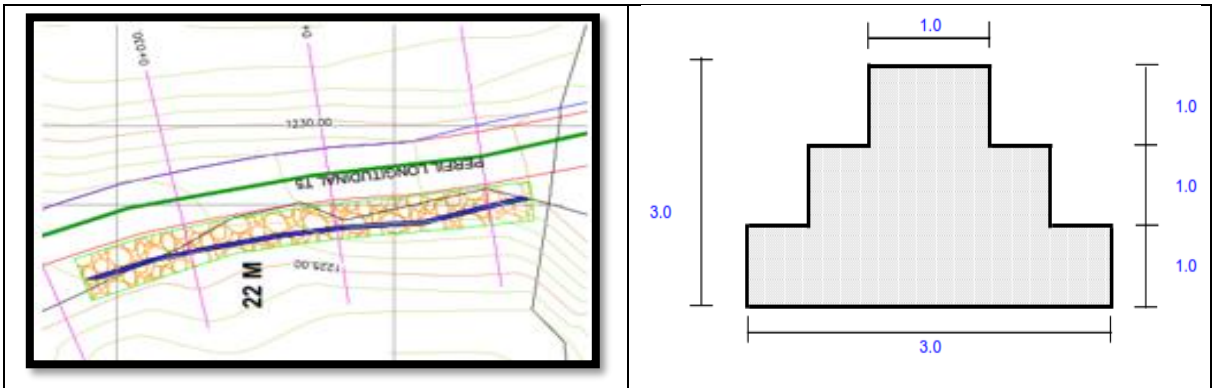



Detalle del Gavión – San Pablo de Borbur

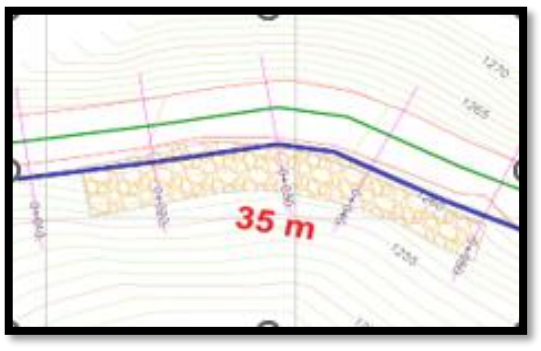

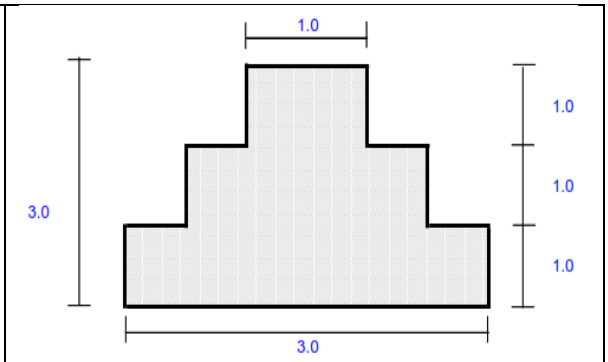



Detalle del Gavión – Pauna

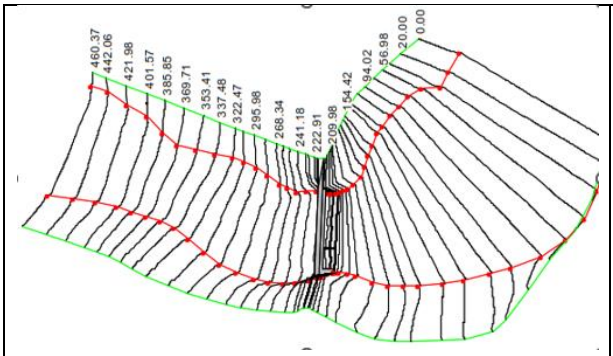

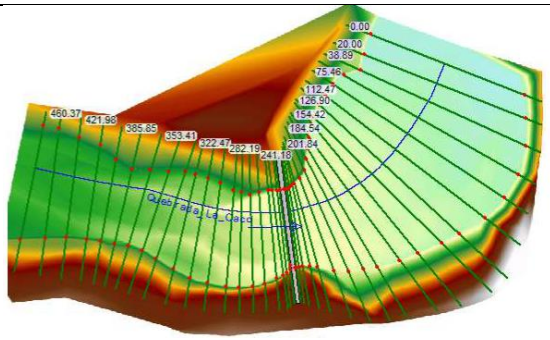


Modelo Geométrico del Cauce. – Puente la Caco Muzo

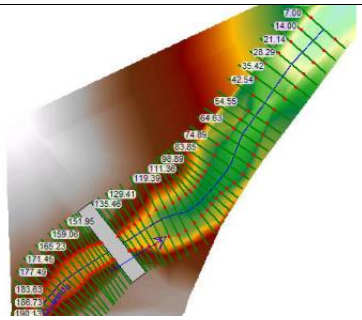

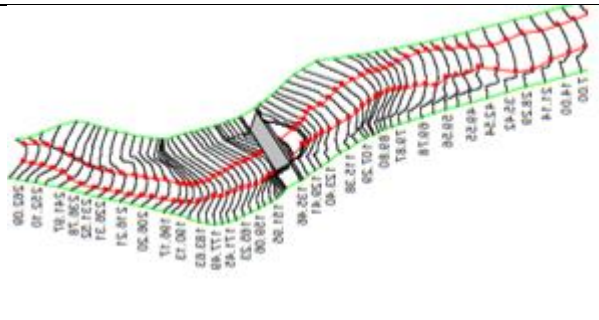

Modelo y análisis Hidrológico – Briceño.

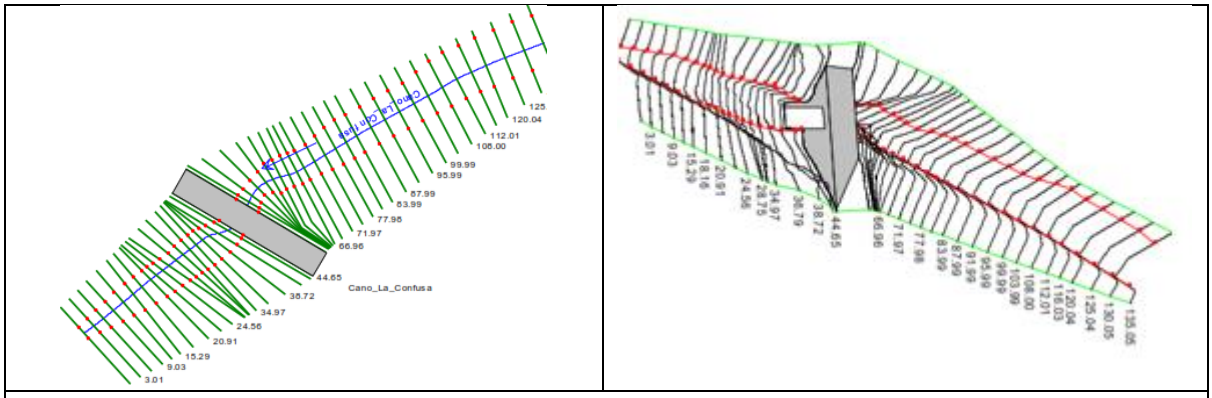

Modelo y análisis Hidrológico – Puerto Boyacá.

3.9. Maquinaria, pruebas y ensayos de laboratorio

- **Maquinaria y Equipo**

Una vez se realice la visita a campo junto con los especialistas se realizará el listado de la maquinaria y equipos a usar en cada uno de los ítems durante la etapa de construcción, se anexa certificado de calidad del equipo de topografía.

- **Pruebas de calidad**

Para las pruebas de ensayo de laboratorio de suelos y ensayos de resistencia del concreto se hará a través del laboratorio GLOBAL CIVIL SAS, se anexan los certificados de calibración de los equipos.

- **Certificados de Calidad**

Se anexarán los certificados correspondientes a los materiales que se utilizan para la ejecución de la obra.

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. Información general del contrato

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
NIT.	891.800.498-1
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO.	2422 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CARINGA
REPRESENTANTE LEGAL	JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHEZ
NIT. CONTRATISA	901.716.198-1
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
VALOR CONTRATO	OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($85.903.638.40) M/CTE.
FECHA FIRMA CONTRATO	25/05/2023
ACTA DE INICIO	25/08/2023
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA No.1:	28/12/2023 – SEIS (06) MESES
FECHA DE PRÓRROGA No.2:	17/06/2024 - SEIS (06) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	29/12/2024

4.2. Proceso contractual

El día 25 de mayo de 2023, se firmó virtualmente el contrato de interventoría No. 2422 del 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO

OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". Entre CONSORCIO CARINGA R/L JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHEZ en su calidad de CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO DE BOYACA en su calidad de CONTRATANTE.

El día nueve (09) de junio de dos mil veintitrés (2023) se expidieron las pólizas correspondientes al contrato.

Para el día (08) de septiembre de 2023 se expiden nuevamente las pólizas actualizadas de acuerdo a acta de inicio del día 25 de agosto del 2023.

4.3. Estado financiero del contrato de interventoría

FORMA DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA				
PAGO	**COMPONENTE**	**FORMA DE PAGO**	**PORCENTAJE**	**VALOR A PAGAR**
1	INTERVENTORIA	ACTAS PARCIALES	90%	$ 77.313.274,56
2		ACTA DE LIQUIDACIÓN	10%	$ 8.590.363,84
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DEINTERVENTORÍA				$ 85.903.638,40

4.4. Recurso físico de interventoría

A continuación, se presenta la localización de la oficina y el vehículo disponible para el desplazamiento del personal:

- **Ubicación oficina:** Carrera 72 L 35 – 06 Sur, Bogotá D.C
- **Horario de atención:** lunes a viernes - 8 am a 12 pm y de 2 pm a 6 pm.
- **Vehículo:** Vitara gris de placa CWZ 297
- **Equipo de topografía:** la interventoría dispondrá del equipo de topografía y por tanto se anexa los certificados correspondientes.

4.5. Seguimiento de las garantías contractuales

El contrato de interventoría No. 2422 de 2023 en su CLÁUSULA NOVENA "GARANTÍAS", establece que el oferente y el contratista se obliga a constituir, a favor del Departamento de Boyacá garantía única que ampare lo siguiente:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO		
AMPARO	**VIGENCIA**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (03) AÑOS MÁS.	EL VALOR ES EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO
CALIDAD DEL SERVICIO	VIGENCIA POR EL TÉRMINO DEL CONTRATO Y CINCO (05) AÑOS MÁS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA.	EL VALOR EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

A partir de lo anterior el contratista suscribió las siguientes pólizas actualizadas según contrato de interventoría.

pólizas actualizadas de acuerdo a prórroga No. 1 del día 28 de diciembre de 2023. Expedidas el día 3 de enero de 2024, por la compañía aseguradora (SEGUROS DEL ESTADO S.A.).

Por otra parte, queremos mencionar que durante el mes de mayo se tramitó la prórroga 2 al contrato de referencia, la cual fue aprobada. Asimismo, se solicitó a la aseguradora la actualización de las pólizas. A la fecha de corte del presente informe, aún no se han recibido estas actualizaciones.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL			
ASEGURADORA		**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**	
POLIZA No. 14-44-101183475		**ANEXO 7**	
FECHA DE EXPEDICIÓN		**03/01/2024**	
CONCEPTO	**VIGENCIAS (FECHAS)**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/08/2023	28/07/2025	$ 17.180.727,68
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/08/2023	28/11/2027	$ 17.180.727,68
CALIDAD DE SERVICIO	25/08/2023	28/05/2029	$ 17.180.727,68

En la ***ilustración 11***, se presenta el detalle de la póliza actualizada conforme a la prórroga No. 1, emitida el 28 de diciembre de 2024. Esta póliza ha sido aprobada por la Secretaría de Contratación, con fecha de aprobación el 15 de enero de 2024. Esto asegura que la cobertura de la póliza se encuentra actualizada y en conformidad con los términos establecidos en el contrato, proporcionando la debida seguridad financiera para el desarrollo del proyecto.



DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO BURGOS GUIO 15-01-2024 10:46

Id de la garantía CO1.WRT.13390634

Referencia de la garantía PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 7

Estado Aceptada

Justificación
- ☑ Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- ☑ Cumplimiento - Pago de salarios
- ☑ Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- ◉ Contrato de seguro
- ○ Patrimonio autónomo
- ○ Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS DEL ESTADO

Número de póliza 14-44-101183475

Tomador CONSORCIO CARINGA

Beneficiario GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	17.180.727,68 COP	28/11/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	17.180.727,68 COP	28/11/2027 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	17.180.727,68 COP	28/05/2029 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

***Ilustración 11**. Aprobación de la póliza de cumplimiento del contrato de interventoría (15-01-2024).*

4.6. Relación de personal de interventoría

Durante la ejecución del contrato se referencia el personal de interventoría que estará presente para el periodo comprendido entre el 25 de abril al 24 de mayo de 2024:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	PROFESIÓN
DIRECTOR DE OBRA	JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO	C.C. No. 1.010.200.976 DE BOGOTÁ D.C.	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRA	JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHEZ	C.C. No. 1.053.341.203 DE CHIQUINQUIRÁ	INGENIERO EN TRANSPORTE Y VIAS

Esta interventoría está cumpliendo con el personal mínimo requerido establecido en la propuesta. Por lo tanto, fue anexada la identificación, la tarjeta profesional y hojas de vidas correspondiente a cada uno de los profesionales, certificación de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales de policía y medidas correctivas, información radicada en **el informe 0**. cabe resaltar que el personal profesional anteriormente mencionado es el mismo equipo presentado en la propuesta.

Las planillas de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales y parafiscales del personal administrativo, operativo y de obra utilizados en desarrollo del objeto contratado se adjuntarán mes a mes de acuerdo con las bases de cotización establecidas en las normas vigentes de conformidad con la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios), para el contrato de interventoría.

4.7. Descripción de los trabajos realizados en el mes por la interventoría.

La interventoría estará presente en el desarrollo de todas las actividades que se llevaran a cabo a lo largo del tiempo en que se ejecutara el proyecto:

Para el presente informe que comprende desde el 25 de abril al 24 de mayo de 2024 del presente año, se describen las actividades desarrolladas:

Aspectos técnicos:

- Se adelanto las revisiones a las cantidades propuestas por el contratista teniendo como base los estudios y diseños finales suministrados por parte de los especialistas.

- Se realizo el informe mensual No. 9 de interventoría correspondiente a la etapa de Estudios y Diseños, donde se reporta las actividades realizadas por el contratista de Obra, acciones administrativas, ajuste de diseños de acuerdo a las observaciones notificadas por la Gobernación de Boyacá.
- Se realiza el control y seguimiento al cronograma de actividades de obra.
- Se reportan los estados de avance del contrato de obra, correspondientes a la etapa de Estudios y Diseños.
- Se ha llevado a cabo la revisión de las observaciones subsanadas por el contratista, las cuales fueron notificadas por la Secretaría de Contratación.
- Se realiza la solicitud de modificación al contrato de interventoría en su Representación Legal
- Se realizan mesas de trabajo y reuniones virtuales con la participación del contratista de obra, la interventoría y la supervisión de la gobernación abordando temas con respecto a los diseños de cada uno de los puntos contractuales.

Estados de Avance Contrato de Obra

A la fecha no se da inicio a la obra civil, el contratista continúa ajustando y rediseñando los puntos contractuales.

Para el presente informe con corte al día 24 de mayo se reportan los siguientes estados de Avance correspondientes a la etapa de estudios y diseños:

- Avance de Tiempo Transcurrido: **88, 06 %**
- Avance de Obra Ejecutada: **0 %**
- Avance de Obra Programada: **91.52 %**

- Asistencia a la socialización del proyecto.
- Asistencia a comités de obra donde se realizará la revisión técnica del proyecto junto al contratista de obra.

A la fecha de corte del presente informe al día 24 de mayo del presente año, el contratista de obra ha radicado los estudios y diseños de los siguientes puntos:

- MARIPI – SECTOR NARAPAE
- MARIPI – SECTOR LAS CRUCES
- MARIPI – SECTOR LAGUNAS
- SAN PABLO DE BORBUR – SECTOR EL SILENCIO.
- PAUNA – SECTOR CARARE
- LA VICTORIA
- MUZO – PUENTE LA CACO
- COPER – SECTOR ESCUELA CUCUNUBA.
- BRICEÑO – SECTOR PEÑA QUEMADA
- PUERTO BOYACA – SECTOR LA CONFUSA

Una vez revisados y aprobados los ajustes de diseño por parte de la interventoría, los documentos han sido radicados ante la supervisión de la Gobernación. Este proceso garantiza la transparencia y la adecuada comunicación entre las partes involucradas en el proyecto de los puntos de mitigación fortaleciendo así la coordinación y el seguimiento de las actividades contractuales.

5. RELACION DE CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona el listado de correspondencia enviada y recibida, Gestión realizada por Obra e interventoría durante el mes del presente informe.

5.1 Correspondencia Enviada.

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA DE ENVIO**	**ENVIADO A**	**ASUNTO**
CC-2422-2023-059	14-may-24	Ingeniero OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRÁN Supervisor contrato de interventoría GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.	RESPUESTA RADICADO No: S-2024-009293-SECCON SEGUNDA DEVOLUCION MODIFICATORIO CONTRATO DE OBRA No. 002 de 2023.

CC-2422-2023-060	26-may-24	Ingeniero OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRÁN Supervisor contrato de interventoría GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.	Remisión del Informe Mensual No. 8 Contrato de Interventoría No. 2422 de 2023.

5.2 Correspondencia Recibida.

Para el presente informe que comprende desde el 25 de abril al 24 de mayo de 2024 no se reporta relación de correspondencia recibida.

6. CONCLUSIONES


- A la fecha del presente informe correspondiente a la etapa de Estudios y Diseños se presenta un avance ejecutado del 0 % del total del proyecto contra un programado acumulado del 91.52 %. de acuerdo al cronograma de Obra presentado por el contratista, A la fecha no se ha iniciado la Obra civil de los proyectos.
- Durante la etapa de Estudios y Diseños el contratista reporta atrasos en el cronograma de Obra, a solicitud de la Gobernación recomiendan nuevamente rediseñar y minimizar los estudios y diseños ya radicados, puesto que no cumplen al presupuesto contractual.
- Para el periodo comprendido entre el 25 de abril al 24 de mayo de 2024, el contratista presenta un avance en tiempo acumulado del 88,06 %. de acuerdo al cronograma de obra.

7 ANEXOS

ANEXO A

SEGUIMIENTO AL CONOGRAMA DE ACTIVIDADES - MAYO /24

			FECHA DE INICIO	DURACION EN DÍAS	FECHA DE FINALIZACION			
		1. MUNICIPIO DE MUZO-SECTOR LA CACO	28/12/2023	89	26/03/2024	28/12/2023	89	26/03/2024
1,0		PRELIMINARES						
1,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	28/12/2023	1	29/12/2023			
2,0		RECTIFICACIÓN DEL CAUCE, RECALCE REFORZADO DEL ESTRIBO, MURO ACOMPAÑAMIENTO (PROTECCIÓN) JARILLÓN, ESPIGON.						
2,4	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	14/01/2024	10	24/01/2024			
INP 1		INP ESTABILIZACION ALETA Y TALUD						
NP1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	12/01/2024	17	29/01/2024			
NP2	1.02.43	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO CON VIBROCOMPACTADOR	13/01/2024	55	8/03/2024			
NP3	APU 1	MURO EN TIERRA REFORZADA	2/02/2024	3	5/02/2024			
NP4	APU 2	COLCHACRETO ARTICULADO	14/01/2024	72	26/03/2024			
NP5	APU 3	SUMINISTRO E HINCADO TUBERÍA H.G. D=4" Y ANCLAJE A ALETAS	6/02/2024	1	7/02/2024			
		2. MUNICIPIO DE MARIPI-SECTOR LAS CRUCES	28/12/2023	71	8/03/2024			
3,0		PRELIMINARES						
3,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	28/12/2023	1	29/12/2023			
4,0		ESTRUCTURA DE CONTENCION, DISIPADORES Y FILTROS						
4,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	12/01/2024	13	25/01/2024			
4,6	1.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC D=4" DRENAJE SIN FILTRO	13/02/2024	1	14/02/2024			
4,7	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	13/01/2024	7	20/01/2024			
4,9	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	6/03/2024	1	7/03/2024			
4,10	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	6/03/2024	2	8/03/2024			
4,11	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	4/03/2024	2	6/03/2024			
21,10	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	4/03/2024	2	6/03/2024			
INP		INP MURO DE CONTENCIÓN						
INP 1	APU 3	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO 2.01MTS H 3,5 MTS 2.01MTS H 3,5 MTS	13/01/2024	30	12/02/2024			
INP 2	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	14/01/2024	26	9/02/2024			
INP 3	2.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	12/01/2024	1	13/01/2024			
INP 4	APU 4	LAMINA TECDREN	13/02/2024	2	15/02/2024			
INP 5	1.02.38.	TUBERÍA PVC 3`` SANIT	13/02/2024	1	14/02/2024			
INP6	APU 7	"CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2500"	13/02/2024	4	17/02/2024			
		3. MUNICIPIO DE LA VICTORIA	28/12/2023	50	16/02/2024			
5,0		PRELIMINARES						
5,2	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	28/12/2023	1	29/12/2023			
6,0		DESLIZAMIENTO VIAL Y PUNTOS CRÍTICOS A LO LARGO DE LA VÍA DEPARTAMENTAL D1558005 QUÍPAMA - LA VICTORIA TERRACEO ,AMPLIACIÓN DE LA VÍA HACIA EL TALUD ,SEÑALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO ,APLICACIÓN DE SUBBASE Y BASE, FILTRO EN LA CORONA DEL TALUD Y CONFORMACIÓN DE BANCA VÍA, CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES						
6,4	3.13.15	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	12/01/2024	13	25/01/2024			
6,5	3.03.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO D=36", INCLUYE EMBOQUILLADA	2/02/2024	2	4/02/2024			
6,6	3.03.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES (solados)	26/01/2024	1	27/01/2024			
6,8	3.03.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 21 MPA (3000 PSI) PARA ELEVACIONES, H<3.0 MTS	26/01/2024	13	8/02/2024			
6,12	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	26/01/2024	3	29/01/2024			
6,16	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	9/02/2024	1	10/02/2024			
6,17	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	7/02/2024	2	9/02/2024			
21,10	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	7/02/2024	2	9/02/2024			
NP		ITEMS NO PREVISTOS						
NP1	3.02.07	EXCAVACIONES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO	25/01/2024	1	26/01/2024			
NP2	3.11.04	LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERADE LA ZONA DE LA VIA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	10/02/2024	6	16/02/2024			
		4. MUNICIPIO PUERTO BOYACA -SECTOR LA CONFUSA	28/12/2023	50	16/02/2024			
7,0		PRELIMINARES						
7,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	28/12/2023	1	29/12/2023			
8,0		CONSTRUCCIÓN DE ESTRIBO ,CONFORMACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE ,APLICACIÓN DE AFIRMADO COMPACTADO TALUD ,SEÑALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO ,APLICACIÓN DE SUBBASE Y BASE, FILTRO EN LA CORONA DEL TALUD Y CONFORMACIÓN DE BANCA VÍA, CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES						
8,1	3.13.15	DEMOLICION OBRAS EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	12/01/2024	12	24/01/2024			
8,3	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	24/01/2024	2	26/01/2024			
8,4	2.07.04	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA MUROS	26/01/2024	12	7/02/2024			
8,6	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	26/01/2024	9	4/02/2024			
8,8	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA, INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM.	12/02/2024	4	16/02/2024			
8,9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	11/02/2024	2	13/02/2024			
21,10	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	11/02/2024	2	13/02/2024			
INP		INP						
INP 1	1.02.29	SOLADO CONCRETO ESPESOR E=0.07MTS 14MPa (2000PSI)	26/01/2024	12	26/01/2024			
		10. MUNICIPIO SAN PABLO BORBUR -SECTOR CAIPAL VIA MUZO	28/12/2023	66	3/03/2024			
19,0		PRELIMINARES						
19,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	28/12/2023	1	29/12/2023			
20,0		TERRACEO ,AMPLIACIÓN DE LA VÍA HACIA EL TALUD, SEÑALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO ,APLICACIÓN DE SUBBASE Y BASE , CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES .						
20,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	12/01/2024	2	14/01/2024			
20,11	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	23/02/2024	2	25/02/2024			
INP		ITEMS NO PREVISTOS						
NP1	3.11.04	LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE LA VIA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	25/02/2024	2	27/02/2024			
INP 2	3.03.07	DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	15/01/2024	38	22/02/2024			
INP 3	1.01.06	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	29/02/2024	3	3/03/2024			
INP 4	3.13.20	EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS	25/02/2024	2	27/02/2024			
INP 5	1.02.34	"SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS"	22/02/2024	1	23/02/2024			
INP 6	3.03.15	"RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR"	25/02/2024	4	29/02/2024			
INP 7	2.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	12/01/2024	2	14/01/2024			
INP 8	3.02.10.	PEDRAPLEN COMPACTO	14/01/2024	1	15/01/2024			
		6. MUNICIPIO DE PAUNA-SECTOR CARARE	26/03/2024	74	8/06/2024	26/03/2024	94	28/06/2024
11,0		PRELIMINARES						
11,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	26/03/2024	1	27/03/2024			
12,0		RECTIFICACIÓN DEL CAUCE, RECALCE REFORZADO DEL ESTRIBO, MURO ACOMPAÑAMIENTO (PROTECCIÓN) JARILLÓN, ESPIGON.						
12,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	11/04/2024	4	15/04/2024			
12,8	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	1/06/2024	2	3/06/2024			
INP		ITEMS NO PREVISTOS						
NP1	3.11.04	LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERADE LA ZONA DE LA VIA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	3/06/2024	3	6/06/2024			
INP 2	3.03.07	DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	16/04/2024	44	30/05/2024			
INP 3	1.01.06	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	5/06/2024	3	8/06/2024			
INP 4	3.13.20	EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS	3/06/2024	2	5/06/2024			
INP 5	1.02.34	"SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS"	30/05/2024	2	1/06/2024			
INP 6	3.03.15	"RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR"	3/06/2024	4	7/06/2024			
INP 7	3.02.10.	PEDRAPLEN COMPACTO	15/04/2024	1	16/04/2024			
INP 8	2.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	11/04/2024	4	15/04/2024			
		8. MUNICIPIO DE MARIPI-SECTOR NARAPAY	26/03/2024	94	28/06/2024			
15,0		PRELIMINARES						
15,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	26/03/2024	1	27/03/2024			
16,0		TERRACEO FILTRO EN LA CORONA DEL TALUD Y CONFORMACIÓN DE BANCA VÍA, APLICACIÓN DE MATERIAL						
16,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	15/04/2024	3	18/04/2024			
16,8	3.02.10	PEDRAPLÉN COMPACTO	15/04/2024	1	16/04/2024			
16,9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	17/06/2024	2	19/06/2024			
INP		INP MURO DE CONTENCIPON						
NP1	3.11.04	LIMPIEZA DE CUNETAS EN TIERRA CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE LA VIA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM)	23/06/2024	5	28/06/2024			
INP 2	1.01.06	CONFORMACIÓN COMPACTACIÓN SUBRASANTE CBR=95%	23/06/2024	3	26/06/2024			
INP 3	3.03.07	DISIPADOR DE ENERGIA Y SEDIMENTADOR EN GAVIONES, CON RECUBRIMIENTO EN MORTERO 1:3	16/04/2024	60	15/06/2024			
INP 4	3.13.20	EMPRADIZACION DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED SEGUN NORMA INVIAS	24/06/2024	2	26/06/2024			
INP 5	1.02.27	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM	23/06/2024	1	24/06/2024			
INP 6	1.02.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 1600 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	15/06/2024	2	17/06/2024			
INP 7	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	17/06/2024	6	23/06/2024			
INP 8	2.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	15/04/2024	3	18/04/2024			
		MUNICIPIO DE COPER-SECTOR ESCUELA CUCUNUBA	26/03/2024	7	2/04/2024			
18,0		AMPLIACIÓN DE LA VÍA HACIA EL TALUD, SEÑALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE FILTRO, REDIRECCIONAMIENTO CAUCE QUEBRADA						
18,1	1.02.15	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	26/03/2024	4	30/03/2024			
18,2	3.02.08	EXCAVACIONES MECÁNICAS VARIAS EN ROCA BAJO AGUA	29/03/2024	4	2/04/2024			
18,6	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 60 x 60 CM	26/03/2024	1	27/03/2024			
		5. MUNICIPIO DE BRICEÑO	26/03/2024	20	15/04/2024			
9,0		PRELIMINARES						
9,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	26/03/2024	1	27/03/2024			
10,0		RECTIFICACIÓN DEL CAUCE, RECALCE REFORZADO DEL ESTRIBO, MURO ACOMPAÑAMIENTO (PROTECCIÓN) JARILLÓN, ESPIGON.						
10,4	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	11/04/2024	2	13/04/2024			
10,7	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	14/04/2024	1	15/04/2024			
		ITEMS NO PREVISTOS						
NP1	APU 8	MURO EN TIERRA REFORZADA	11/04/2024	3	14/04/2024			
NP2	3.09.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES (PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA) 75 x 75 CM	14/04/2024	1	15/04/2024			
NP3	APU 2	SUMINISTRO E HINCADO TUBERÍA H.G. D=4" Y ANCLAJE A ALETAS	14/04/2024	1	15/04/2024			
NP4	APU 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESALTO EN PVC PARA CONTROL DE TRÁFICO	14/04/2024	1	15/04/2024			
		7. MUNICIPIO DE MARIPI-SECTOR LAGUNAS SANTA ROSA	26/03/2024	67	1/06/2024			
13,0		PRELIMINARES						
13,1	1.01.68	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA	26/03/2024	1	27/03/2024			
14,0		TERRACEO FILTRO EN LA CORONA DEL TALUD Y CONFORMACIÓN DE BANCA VÍA						
14,2	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	11/04/2024	1	12/04/2024			
14,4	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACIÓN, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	27/04/2024	4	1/05/2024			
14,7	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	12/04/2024	12	24/04/2024			
14,9	3.12.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).	7/05/2024	2	9/05/2024			
21,1	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO	7/05/2024	2	9/05/2024			
INP		INP MURO DE CONTENCIPON						
INP 1	1.02.25	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO 2.01MTS H 3,5 MTS 2.01MTS H 3,5 MTS	12/04/2024	15	27/04/2024			
INP 2	APU 6	PERFORACIÓN Y EXCAVACION MANUAL EN ROCA PARA ANCLAJE INCLUYE EPOXICO	11/04/2024	5	16/04/2024			
INP 3	1.02.34.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC D=6" DRENAJE SIN FILTRO	16/04/2024	1	17/04/2024			
INP 4	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR	9/05/2024	23	1/06/2024			
INP 5	APU 4	LAMINA TECDREN	16/04/2024	2	18/04/2024			
INP 6	1.02.38.	TUBERÍA PVC 3`` SANIT	16/04/2024	1	17/04/2024			
INP 7	2.01.02	ENTIBADOS EN MADERA TIPO 1 PARA EXCAVACIONES 1 A 7 USOS	11/04/2024	1	12/04/2024			

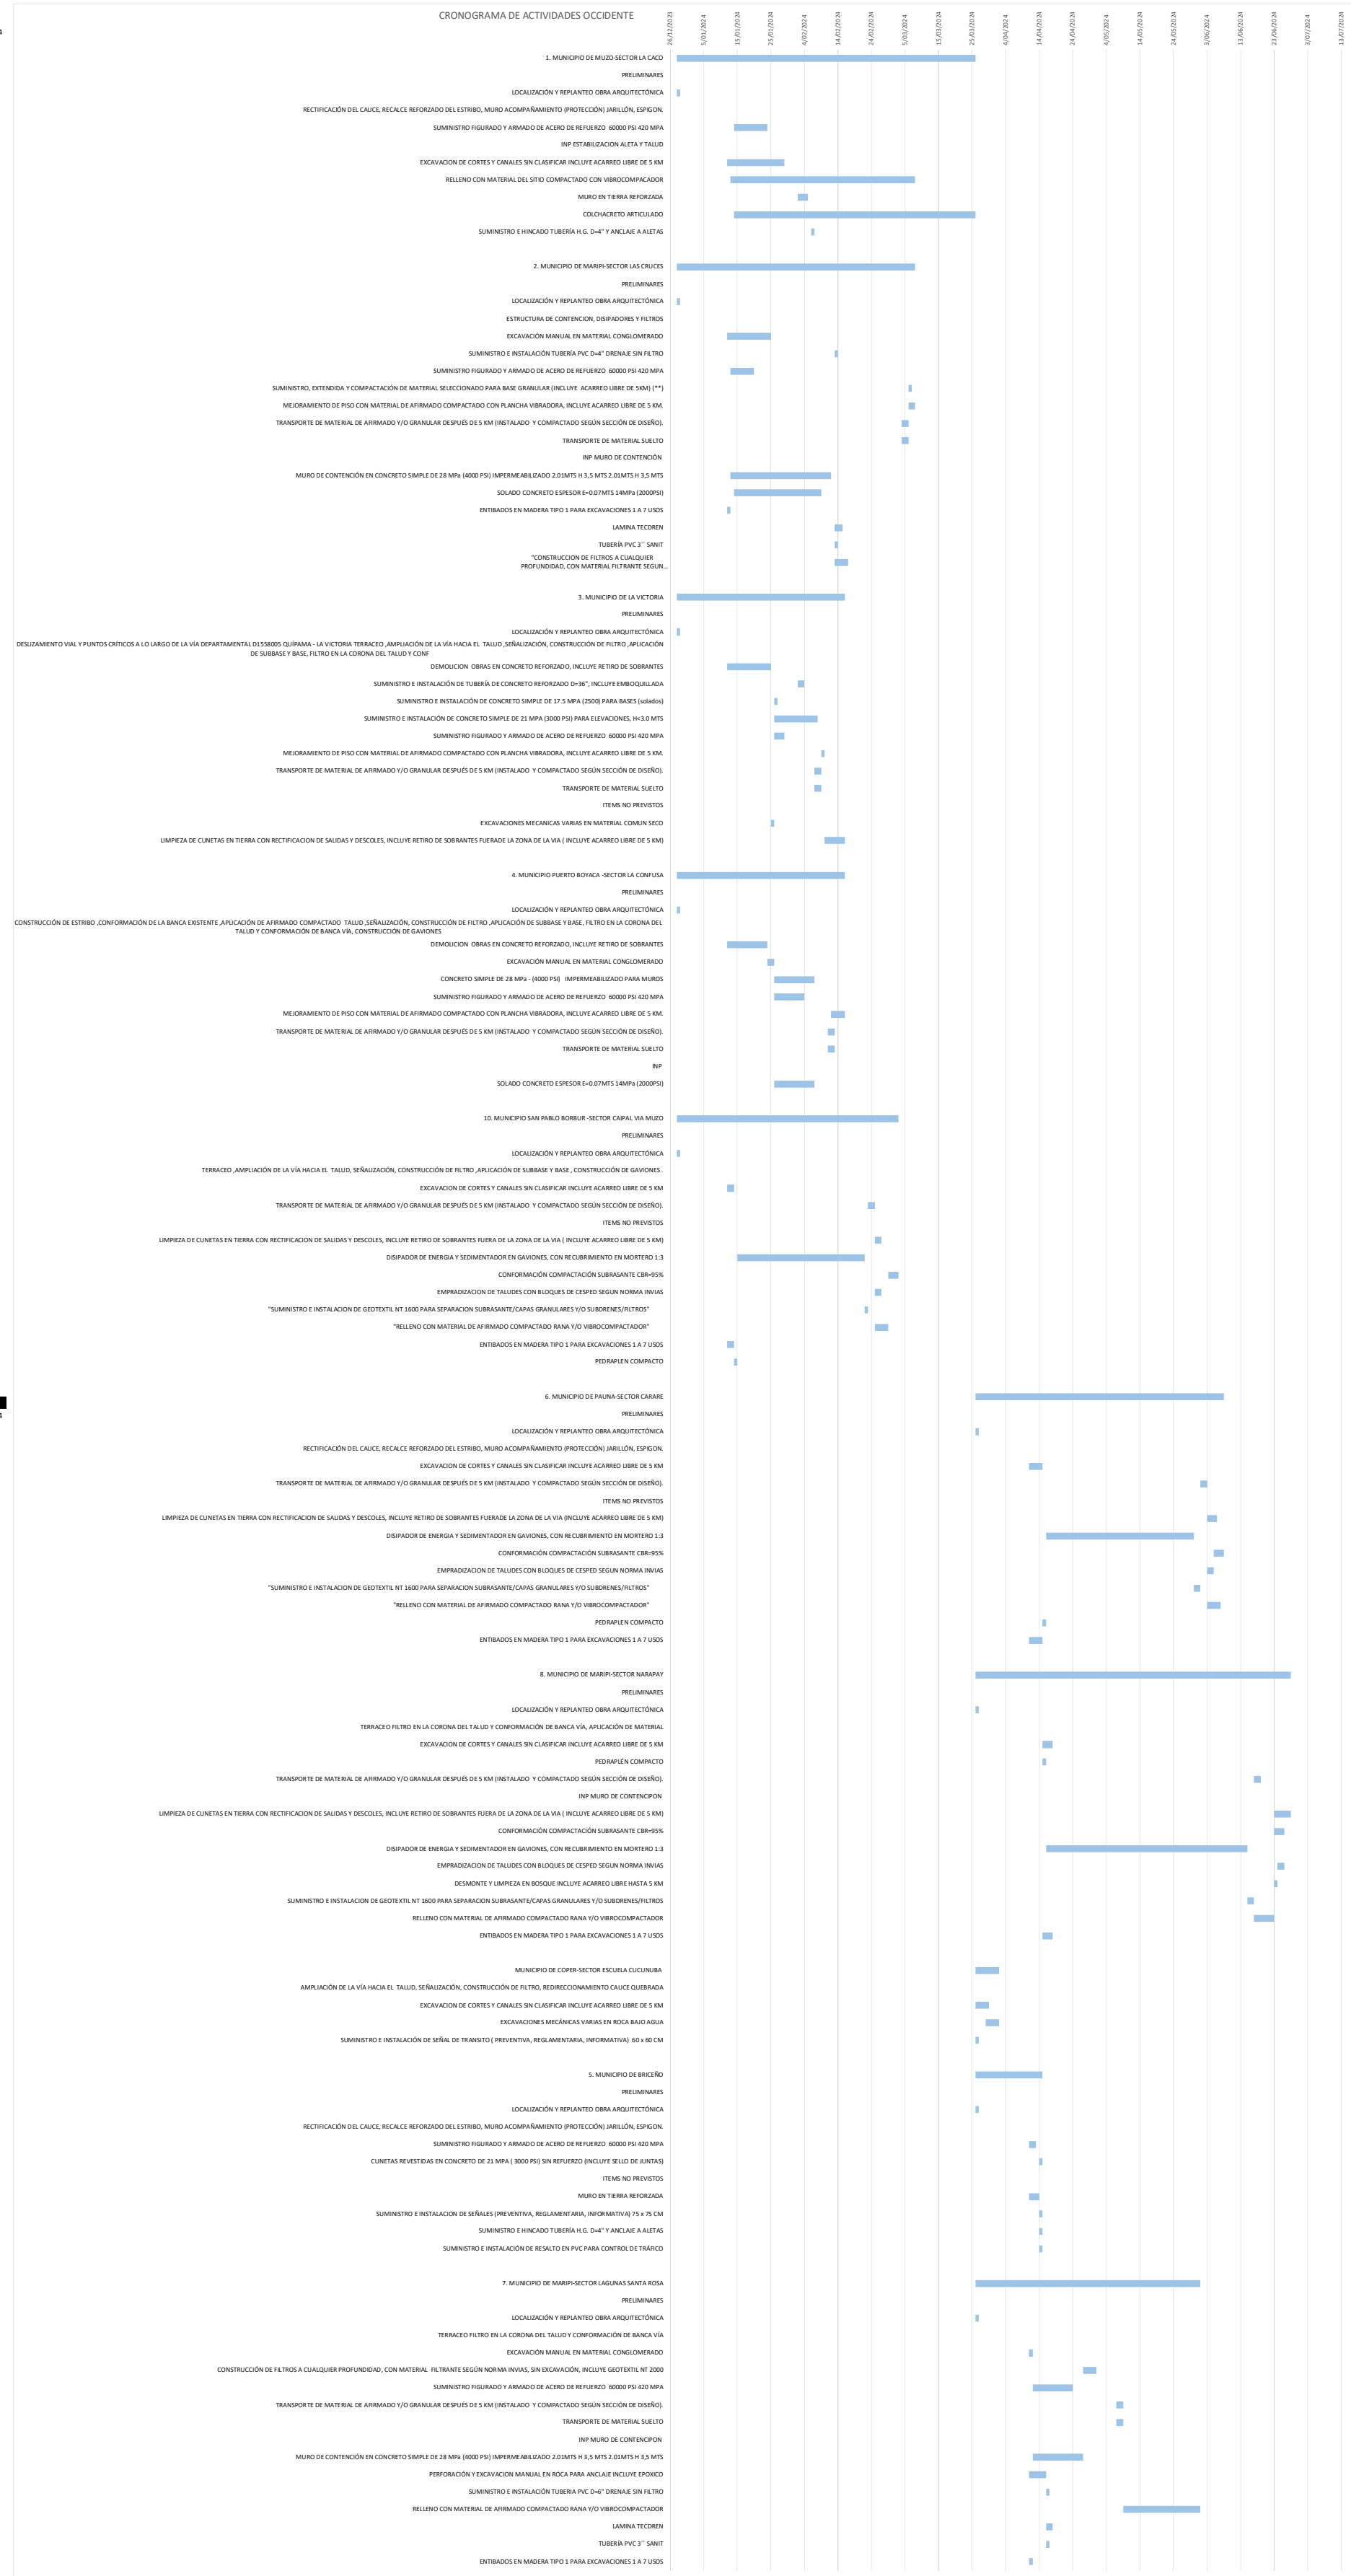

ANEXO B

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES DEL CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 2023 DEL MES DE MAYO DE 2024 - EXPEDIDA POR LA INTERVENTORIA

Bogotá D.C., 06 de junio de 2024

Ingeniero
JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA PAIS S.A.S

C.C
Ingeniero
OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRÁN
Supervisor contrato de interventoría
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.

REF: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA DE OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ."

ASUNTO: Revisión Verificación y Aprobación de planillas de Seguridad Social y parafiscales del contratista de Obra del mes de mayo de 2024.

Cordial saludo,

La interventoría a través del seguimiento SST revisa, verifica y aprueba las planillas de los aportes de seguridad social, afiliaciones y parafiscales del período comprendido entre el 25 de abril al 24 de mayo del 2024, de los profesionales del contratista CONSTRUCTORA PAIS S.A.S conforme a lo requerido por la entidad contratante.

Cordialmente,

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CARINGA
NIT. 901.716.198-1

DIRECCIÓN: Carrera 72 L 35 – 06 Sur, Bogotá D.C.
EMAIL: consorciocaringa@hotmail.com
TELEFONO: 311 4 77 82 52

CONSTRUCTORA PAIS
Cumplimiento Total

NIT. 901.063.647-3

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.053.328.390 de Chiquinquirá, Boyacá y con Tarjeta Profesional No. 212722-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de CONSTRUCTORA PAIS S.A.S identificada con NIT 901.063.647-3, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros de la empresa, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la empresa durante los últimos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que la empresa CONSTRUCTORA PAIS S.A.S se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, el pago al Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción (artículo *3 Decreto 1047 de 1983)* se realizará en cuanto se obtenga el acta de recibo final.

Lo anterior se certifica en Chiquinquirá, Boyacá, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2024.

JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO
REVISOR FISCAL

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
R/LEGAL

ANEXO C

SOPORTE Y RELACIÓN DE CORRESPONDECIA ENVIADA Y RECIBIDA
Periodo del 25 de abril al 24 de mayo /24

CORRESPONDECIA ENVIADA

DIRECCIÓN:
Carrera 72 L 35 – 06 Sur,
Bogotá D.C.

EMAIL:
consorciocaringa@hotmail.com

TELEFONO:
311 4 77 82 52

CORRESPONDENCIA ENVIADA			
CONSECUTIVO	**FECHA DE ENVIO**	**ENVIADO A**	**ASUNTO**
CC-2422-2023-059	14-may-24	Ingeniero OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRÁN Supervisor contrato de interventoría GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.	RESPUESTA RADICADO No: S-2024-009293-SECCON SEGUNDA DEVOLUCION MODIFICATORIO CONTRATO DE OBRA No. 002 de 2023.
CC-2422-2023-060	26-may-24	Ingeniero OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRÁN Supervisor contrato de interventoría GOBERNACIÓN DE BOYACÁ.	Remisión del Informe Mensual No. 8 Contrato de Interventoría No. 2422 de 2023.

SUBSANACIÓN A LA SEGUNDA DEVOLUCIÓN DE LA SOLICITUD DE MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002 - 2023

CONSORCIO CARINGA <consorciocaringa@hotmail.com>

Mar 14/05/2024 17:11

Para:PROCESOS DE SELECCION - CONTRATACION <procesosdeseleccion@boyaca.gov.co>;OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRAN <oscar.avendano@boyaca.gov.co>

7 archivos adjuntos (3 MB)

0 - SUBSANACIÓN A LA SEGUNDA DEVOLUCIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICATORIO.pdf; 1 - CC-2422-2024-059 RESPUESTA SEGUNDA DEVOLUCION MODIFICATORIO CTO. DE OBRA 002 DE 2023.pdf; 2 - OF C.P. 002-23-022 SUBSANACIONES MODIFICATORIO 1.pdf; 3 - APUS ITEM COMPLEMENTARIOS.pdf; 4 - APU Y E.D.M NP 1.02 - ITEM REF N7 MUZO.pdf; 5 - APU Y E.D.M NP 1.14 - ITEM REF N5 STA ROSA.pdf; 6 - MEMORIA CANTIDADES DEL ITEM 8.06 - PTO BOYACA.pdf;

Cordial Saludo.

Doctora
Sofia Esperanza Burgos Guio.

Atendiendo las observaciones realizadas, me permito adjuntar la información solicitada como complemento a la solicitud de modificatorio del contrato de Obra Pública No. 002 de 2023.

Quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional necesario para formalizar esta solicitud.

Cordialmente,

JUAN FRANCISCO PACHÓN RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CARINGA
CARRERA 72 L 35 – 06 SUR BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO CARINGA
NIT. 901.716.198-1



Libre de virus.www.avast.com

CC-2422-2024-060 REMISION DEL INFORME MENSUAL No. 8 INTERVENTORIA_ABRIL 2024

CONSORCIO CARINGA <consorciocaringa@hotmail.com>

Dom 26/05/2024 12:08

Para:OSCAR DAVID AVENDAÑO BELTRAN <oscar.avendano@boyaca.gov.co>

2 archivos adjuntos (16 MB)

CC-2422-2024-060 REMISION DEL INFORME MENSUAL No. 8 INTERVENTORIA_ABRIL 2024.pdf; INFORME MENSUAL No.8 INTERVENTORIA_ABRIL_2024.rar;

Buenas tardes.

Nos permitimos hacer la entrega del Informe Mensual No. 8 del contrato de Interventoría No. 2422 del 2023, para su revisión y aprobación.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,

JUAN FRANCISCO PACHON RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CARINGA
CARRERA 72 L 35 – 06 SUR BOGOTÁ D.C.

CONSORCIO CARINGA
NIT. 901.716.198-1

SOPORTE Y RELACIÓN DE CORRESPONDECIA RECIBIDA

Durante el periodo no se reporta relacion de correspondencia Recibida

DIRECCIÓN:
Carrera 72 L 35 – 06 Sur, Bogotá D.C.

EMAIL:
consorciocaringa@hotmail.com

TELEFONO:
311 4 77 82 52

ANEXO D

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2422 DE 2023 FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

LUIS FELIPE RODRIGUEZ MONTES identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.053.327.095 de Chiquinquirá, Boyacá y con Tarjeta Profesional No. 211327 -T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público del CONSORCIO CARINGA identificado con NIT 901.691.672-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los Estados Financieros del Consorcio, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por el consorcio durante los últimos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que el CONSORCIO CARINGA se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en Chiquinquirá, Boyacá, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2024.

LUIS FELIPE RODRIGUEZ MONTES
CONTADOR PÚBLICO
CONSORCIO CARINGA

ANEXO G

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024

PLANILLAS DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 002 DEL 2023 MAYO 2024		
CARGO	**NOMBRE**	**IDENTIFICACION**
DIRECTOR DE OBRA	NELSON ODENS MORA FRANCO	C.C. No. 18´386.964 DE CALARCA, QUINDIO
RESIDENTE DE OBRA	CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO	C.C. No. 74´373.208 DE DUITAMA, BOYACÁ
GEÓLOGO	VICTOR HUGO DIAZ HERRERA	C.C. No. 79´383.126 DE BOGOTÁ D.C.
ASESOR EN GEOTECNIA VIAL	JIMMY VERGARA SILVA	C.C. No. 74´321.878 DE SOACHA, CUNDINAMARCA
ASESOR EN ESTRUCTURAS	JIMMY VERGARA SILVA	C.C. No. 74´321.878 DE SOACHA, CUNDINAMARCA
ASESOR HIDRÁULICO O HIDROLÓGICO	VICTOR MANUEL CAMACHO REYES	C.C. No. 9´658.759 DE YOPAL CASANARE
REVISOR FISCAL	JEHISSON EDGARDO POVEDA CASTRO	C.C No. 1053328390 DE CHIQUINQUIRA - BOYACÁ
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO	C.C. No. 80.217.561 DE BOGOTA D.C.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29944809
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-06-18

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	NELSON ODENS MORA FRANCO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	18386964	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 12 NO33 55	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	NELSONODENS@YAHOO.COM	TELÉFONO	3457072
FAX	3457072	SUCURSAL	7	NOMBRE SUCURSAL	GOBERNACION
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 05	Año: 2024	Mes: 05	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$4.000.000		29944809

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-18386964	59	No	No	No	66	1	3711001	Salario	MORA FRANCO NELSON ODENS	$4.000.000

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 18386964																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 18386964	COLPENSIONES	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 18386964	EPS SURA	30	$4.000.000	0.1250000	$500.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	3711001	0.0243600	$97.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-18386964	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$4.000.000	0.0060000	$24.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 05											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$640.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$640.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$500.000	$0	0	$0	0	$0	$500.000	0	$0	$0	$500.000	$0	0	$0	$0	$500.000	$0	$0	$500.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	1	$97.500	0	$0	$0	$97.500	0	$0	$97.500	0	$0	$0	$97.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	1	$24.000	0	$0	$24.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$500.000
PENSIONES	1	$640.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$97.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$24.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.261.500

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CARLOS AUGUSTO RINCON ZAMBRANO
IDENTIFICACIÓN:	CC-74373208
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-06-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-06-12
FECHA DE PAGO:	2024-06-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2024-05
PERÍODO SALUD:	2024-05
NÚMERO PLANILLA:	29913137
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29913137
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 1.000	$ 200.000	$ 201.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 1.300	$ 256.000	$ 257.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 456.000	$ 458.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/07/2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79383126
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTOR HUGO DIAZ HERRERA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CARRERA 45 # 75SUR-81 APTO.1201	TELÉFONO:	5505231
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7925409574**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/06/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		687931893	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										**$ 352.000**	**$ 0**	**$ 352.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													**$ 275.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 275.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 153.200	$ 153.200	$ 0	$ 0	$ 153.200
SUBTOTALES:									**$ 153.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 153.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 44.000	$ 0	$ 44.000
SUBTOTALES:			**$ 44.000**	**$ 0**	**$ 44.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									ADMIN	TOTAL APORTE				
1	CC 79383126	DIAZ HERRERA VICTOR HUGO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO									01-31									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.200.000	79383126	$ 153.200	30	$ 2.200.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 824.200**

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
CC 74321878		VERGARA SILVA JIMMY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 8 # 7 - 06	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7263604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**		
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2024-05	2024-05	711511938	9467994428	I	2024/06/21	2024/06/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior
1	CC	74321878	VERGARA SILVA JIMMY	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No	
Total	**Afiliados(1)**							

No.	NOVEDADES																									
	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
1																										

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION														SALUD					
:t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 1.300.000	No		PORVENIR	30	$ 1.300.000	16%	SIN RIESGO	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000		SANITAS	30	$ 1.300.000	12,5%	$ 162.500	$
																					$ 208.000						$ 162.500	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 162.500			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 1.300.000	0,522%	1	$ 6.800	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 162.500						$ 0						$ 6.800				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 74321878		VERGARA SILVA JIMMY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 8 # 7 - 06	CHIQUINQUIRA-BOYACA	7263604	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	711511938	9467994428	I	2024/06/21	2024/06/17	BANCO CAJA SOCIAL	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

2024/06/17 03:35 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9658759
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			VICTOR MANUEL CAMACHO REYES
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CARRERA 24 NO 10 - 23	TELÉFONO:	6356149
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7924963756**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/06/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	686790970

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000	$ 0	$ 448.000
SUBTOTALES:										**$ 448.000**	**$ 0**	**$ 448.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000	$ 0	$ 0	$ 350.000
SUBTOTALES:													**$ 350.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 350.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 68.300	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 68.300
SUBTOTALES:									**$ 68.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 68.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																														
1	CC 9658759	CAMACHO REYES VICTOR MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.800.000				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.800.000	$ 448.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 448.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.800.000	$ 350.000	$ 0	$ 350.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.800.000	9658759	$ 68.300		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 866.300**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	14/05/2024	77084211	$5.196.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	208.000	0		0		0	0	0	0	208.000	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	169.900	0		0		0	0	0	0	169.900	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	156.000	0		0		0	0	0	0	156.000	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	117.900	0		0		0	0	0	0	117.900	3
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	263.500	0	0	0	0	0	0		263.500	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.511.500	0	0	0	0	0	0		1.511.500	8
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	832.000	0	0	0	0	0	0		832.000	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	973.800				973.800	0	0	973.800			9.738	973.800	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	703.800	0	0	703.800	15

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	14/05/2024	77084211	$5.196.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	703.800	703.800
Pensión	4	2.815.000	2.815.000
Riesgos Laborales	1	973.800	973.800
CCF	1	703.800	703.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	5.196.400	5.196.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901063647-3	CONSTRUCTORA PAIS SAS		CLL 18 7 28	3043947366	CONSTRUCTORAPAIS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	UNICA	SUC UNICA	BOYACÁ	CHIQUINQUIRÁ	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-05	2024-04	E	14/05/2024	77084211	$5.196.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1014220852	GONZALEZ RINCON EDNA YULIANA	1	0			S																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	MIN002	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	1055551012	BELTRAN VEGA ELVER ALFONSO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	1071328533	RODRIGUEZ RONCANCIO DIETRICH	1	0			S	X																230201	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS017	346.667	13.900	14-4	346.667	5	24.200	CCF10	346.667	13.900	0	0	0	0	0
4	CC	80217561	VELASQUEZ FORERO JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	1049634400	BAUTISTA MACIAS IVAN FERNANDO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	1053325259	PINEDA GONZALEZ ANDRES CAMILO	1	0			S		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	11210975	ZAMORA HERNANDEZ JHON ALVARO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
8	CC	3146849	LIZARAZO ESTEPA JOSE QUERUBIN	1	0			S		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS041	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	79351146	LINARES BEJARANO MIGUEL ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1055963886	RAMOS MURCIA DANIELA DEL PILAR	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS017	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	1023022995	RAMIREZ GUARNIZO JORGE WALTER	1	0			S		X															230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
12	CC	79503522	USGAME CARDENAL LISARDO	1	0			S	X																230301	346.667	55.500	0	0	0	0	EPS041	346.667	13.900	14-4	346.667	5	24.200	CCF10	346.667	13.900	0	0	0	0	0
13	CC	1053328390	POVEDA CASTRO JEHISSON EDGARDO	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
14	CC	1056412289	GARCIA BENITEZ IVETH DAYANA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	1	6.800	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
15	CC	1053340500	MARIN SOTELO SONIA MALENA	1	0			S																	230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-4	1.300.000	5	90.500	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO F

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2422 del 2023. MAYO 2024

PLANILLAS DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2422 DEL 2023 MAYO 2024		
CARGO	**NOMBRE**	**IDENTIFICACION**
DIRECTOR DE OBRA	JUAN FRANCISCO PACHÓN	C.C. No. 1.010.200.976 DE BOGOTÁ D.C.
RESIDENTE DE OBRA	JHONATHAN BRYAN MENESES SANCHE	C.C. No. 1.053.341.203 DE CHIQUINQUIRÁ

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010200976		PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 18 7 28	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3222186	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	718282349	9468040130	I	2024/06/21	2024/06/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$461,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0
1	CC	1010200976	PACHON JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$90,500	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$90,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010200976		PACHON RONCANCIO JUAN FRANCISCO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cll 18 7 28	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3222186	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	718282349	9468040130	I	2024/06/21	2024/06/20	BANCO CAJA SOCIAL	0	$461,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$0	$0	$90,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$90,500	$0	$0	$90,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$461,000	$0	$0	$461,000
