Fecha Acto Administrativo	Número Acto Administrativo	Rubro	Fuente	Valor Incorporado
		MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DEL CAUCA	categoría	
Total				364.092.300,00

Que el proyecto de inversión se ejecutó según el siguiente balance financiero:

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Que los recursos girados al proyecto se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

	DESCRIPCION	Valor	% del Valor aprobado
1	Valor del proyecto	1.217.155.950,oo	100,oo
1.1	Valor SGR- MUNICIPIO DE SUCRE	364.092.300,	29,91
1.2	Valor aporte de COLOMBIANA DE REDES SC SAS E.S.P.(en especie)	853.063.650,oo	70,09
2	Girado (fondos o transferencias)	0,00	0,oo
3	Contratado	364.092.300,00	29,91
4	Ejecutado (valor ejecutado y liquidado)	364.092.300,00	29,91
5	Pago a contratistas	364.092.300,00	29,91
6	Saldos no ejecutados a reintegrar	0,00	0,00
7	Saldos no ejecutados reintegrados	0,00	0,00

Que de conformidad con el acta de recibo a satisfacción y liquidación final firmada por planeación municipal en su calidad de supervisor y la Alcaldesa Municipal representante legal del Municipio, se certifica que la totalidad de los contratos suscritos para la ejecución del proyecto de inversión se encuentran liquidados, en los términos de la Ley 80 de 1993 y; demás normas concordantes.

Que según la información de ejecución de las actividades reportadas, el proyecto fue terminado con el siguiente avance físico y financiero:

Avance físico	Avance financiero
100	100

Que, el proyecto contempló las siguientes metas e indicadores de cumplimiento, los cuales se reportan en los siguientes productos:

Indicador de Producto	Año Inicial Meta	Año Final Meta	Valor Meta	Valor Ejecutado	% Ejecución
Viviendas conectadas a la red local de gas combustible	2023	2023	450,00	450,00	100,00

Que el proyecto de inversión SI, ha cumplido con los objetivos del proyecto aprobado.

Relación de contratos suscritos en la ejecución del proyecto de inversión BPIN No.2023197850023 DENOMINADO Implementación subsidios al derecho de conexión a la red de gas para usuarios de estratos 1 y 2 en el casco urbano del municipio de Sucre departamento del Cauca.

Contrato	Fecha Suscripción Contrato	Tipo Contrato	Identificación Contratista	Valor Contrato Proyecto	Valor Pagado	Valor Liquidado
267	25/07/23	Obra pública	901478783	364.092.300,00	364.092.300,00	364.092.300,00
Valor Total Ejecución de Inversión				364.092.300,00	364.092.300,00	364.092.300,00
Valor Total Interventoría				0,00	0,00	0,00
Valor Total Contratado en el Proyecto				364.092.300	364.092.3000	364.092.300

Que la entidad ejecutora del proyecto dio cumplimiento al registro de información en los aplicativos informáticos dispuestos por el DNP, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.4.2.1.4. del Decreto 1082 de 2015.

Que la información y documentación del proyecto, así como los soportes documentales del presente acto administrativo es verídica, fidedigna y cumple con los requisitos señalados en la Ley 1530 de 2012, Decreto 1082 de 2015, Acuerdo 045 de 2017 de la Comisión Rectora del SGR y demás normas complementarias y concordantes. En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

Artículo 1. Cerrar el proyecto BPIN No 2023197850023, denominado "IMPLEMENTACIÓN SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN A LA RED DE GAS PARA USUARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DEL CAUCA" , financiado con recursos de Asignación para la Inversión Local, según NBI y municipios de cuarta, quinta y sexta categoría del Sistema General de Regalías-SGR, por encontrarse terminado, en las condiciones expuestas anteriormente.

Artículo 2. Declarar que NO existe saldo pendiente a reintegrar para el proyecto.

Artículo 3. Remitir el presente acto administrativo, en cumplimiento del Artículo 2.2.4.2.6.1 del Decreto 1082 de 2015, a la Secretaria Técnica del municipio de Sucre Cauca/ Secretaria de Planeación é Infraestructura y al Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación – SMSCE del Sistema General de Regalías, a través del aplicativo GESPROY – SGR, dentro del mes siguiente a su expedición.

Artículo 4. La presente Resolución rige a partir de su publicación.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en el municipio de Sucre Cauca a los diez (10) días del mes de abril de dos mil veinticuatro - 2024

CARLOS RUBER MORA MORA
Alcalde municipal
Sucre Cauca
Representante legal, entidad ejecutora.

Revisó: Deyby Antonio Armero Cerón, Secretario de Planeación municipal
Proyectó: Oscar Mayorga, apoyo a la Secretario de Planeación municipal

Anexo: 2.1

SOPORTE ACTIVIDAD 2.1: Durante este periodo se apoyó a la Secretaria de Planeación municipal de Sucre , en el reporte de información en la plataforma del SIRECI- Contraloría General de la República, el diligenciamiento y reporte del formato N° 64-M7.4-REGALIAS CONTRATOS Y PROYECTOS, el cual se debe hacer de manera mensual, para este caso se reportó el mes de marzo de 2024 el 5 de abril de 2024 y el mes de abril de 2024 el 7 de mayo de 2024.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2024/04/05
HORA DE GENERACIÓN:18:34:15
CONSECUTIVO:2527269812024-03-31

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
NIT:817003440
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CARLOS RUBER MORA MORA

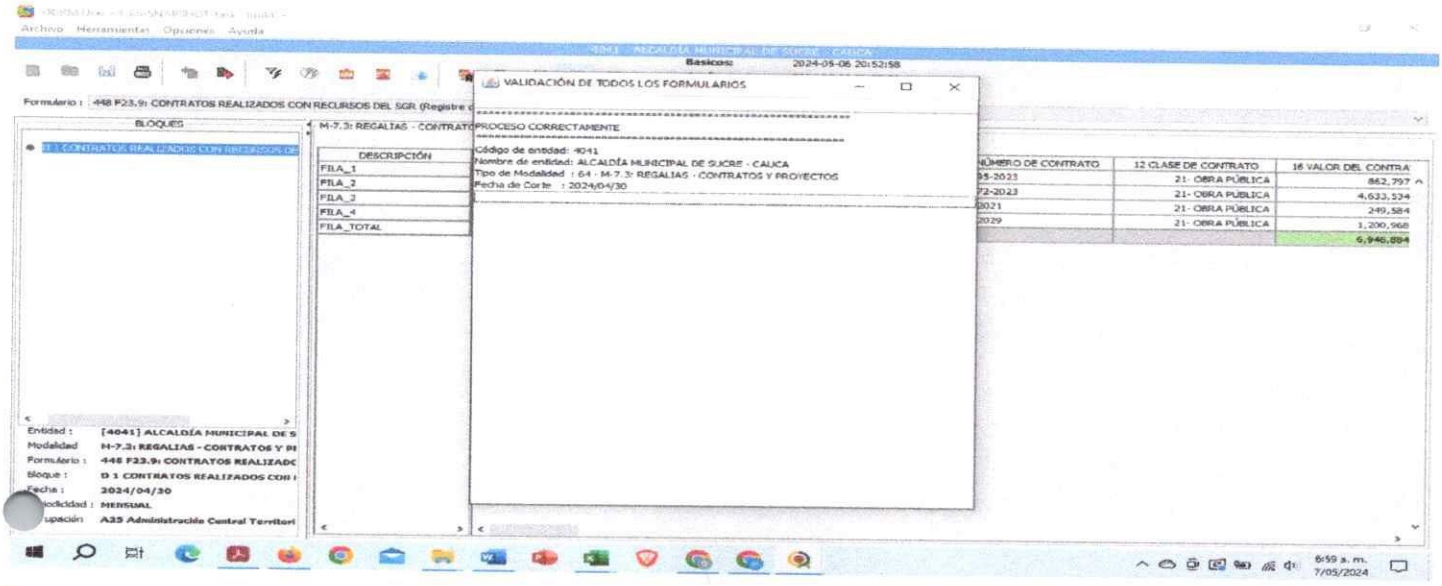
MODALIDAD:M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2024-03-31
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2024-04-08

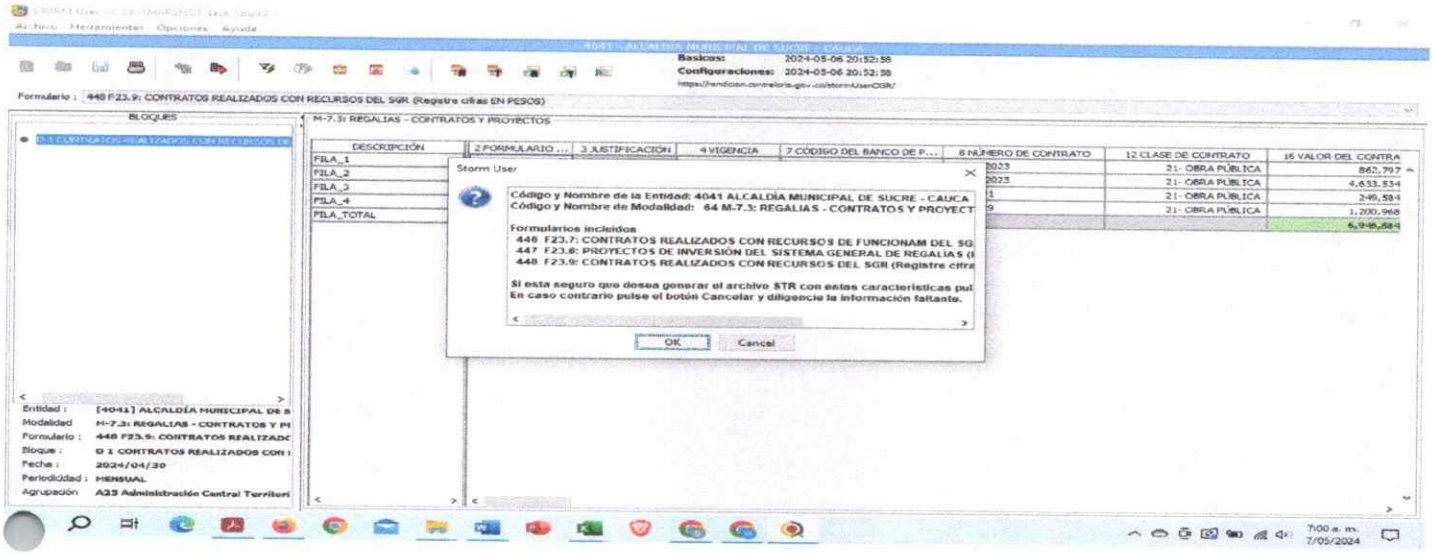
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

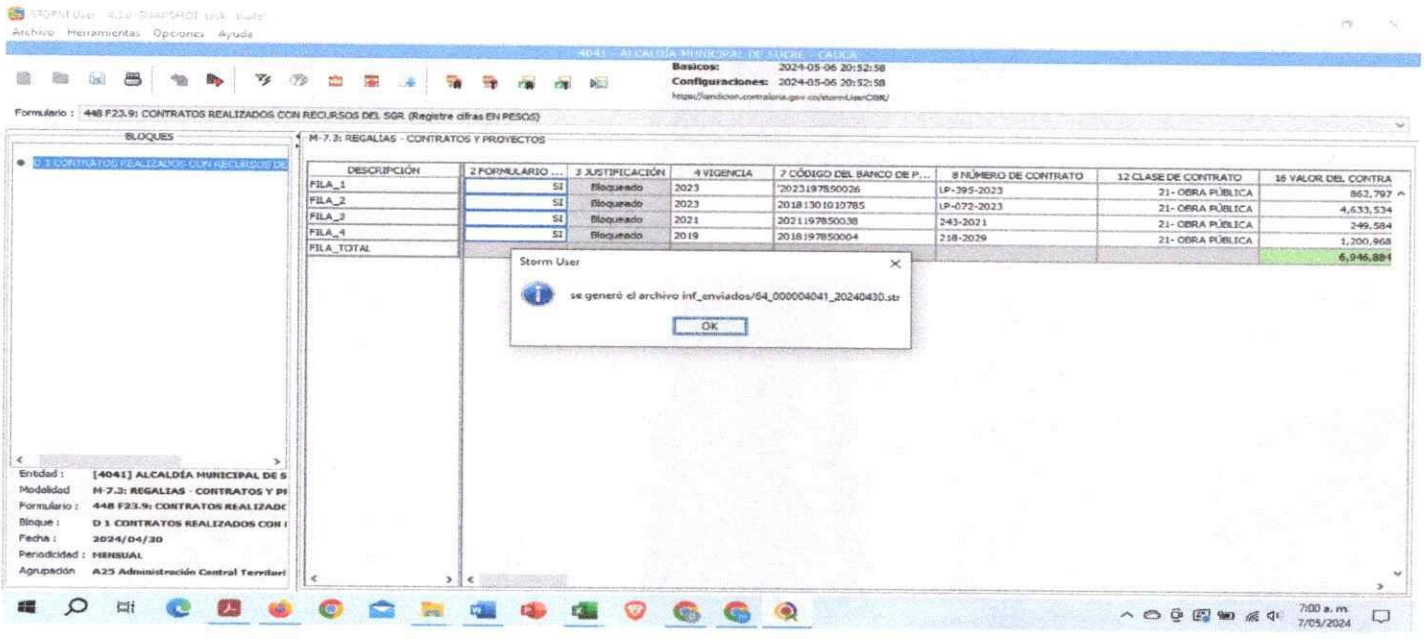
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F23.7: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE FUNCIONAM DEL SGR Y DEL SMSCE (Registre cifras EN PESOS)	2024/04/05 18:31:50
Formulario electrónico	F23.8: PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Registre cifras EN PESOS)	2024/04/05 18:31:50
Formulario electrónico	F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)	2024/04/05 18:31:50

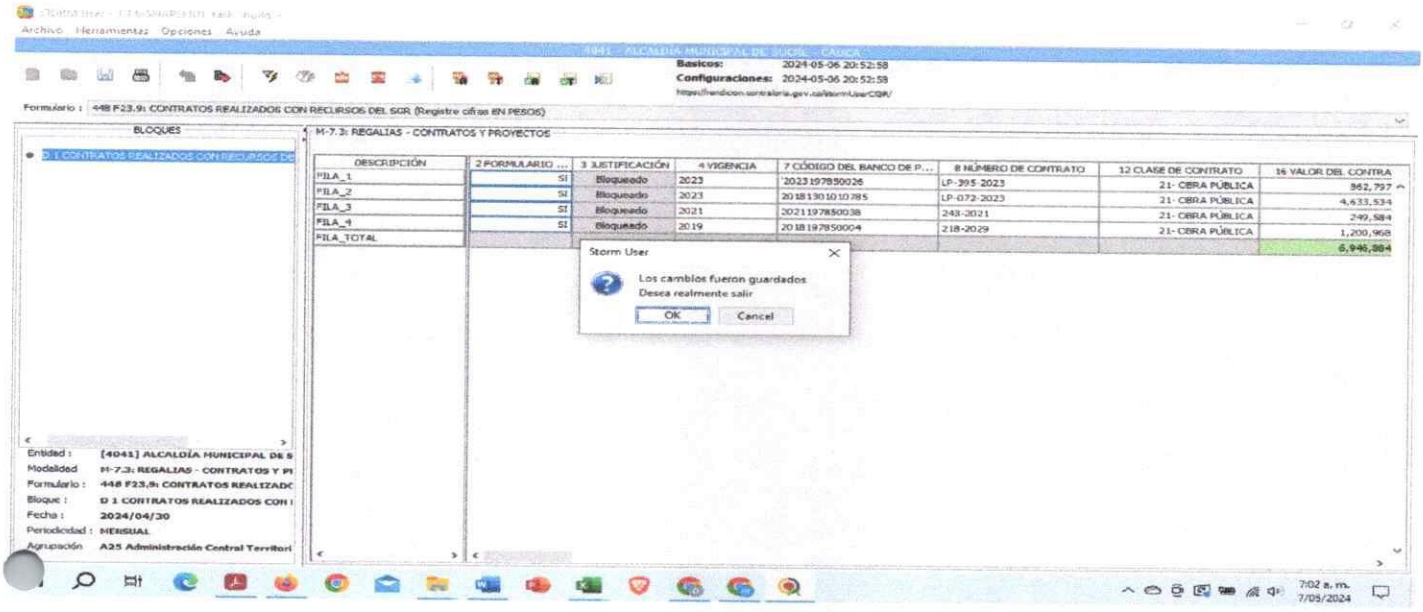
La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA, NIT 817003440, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

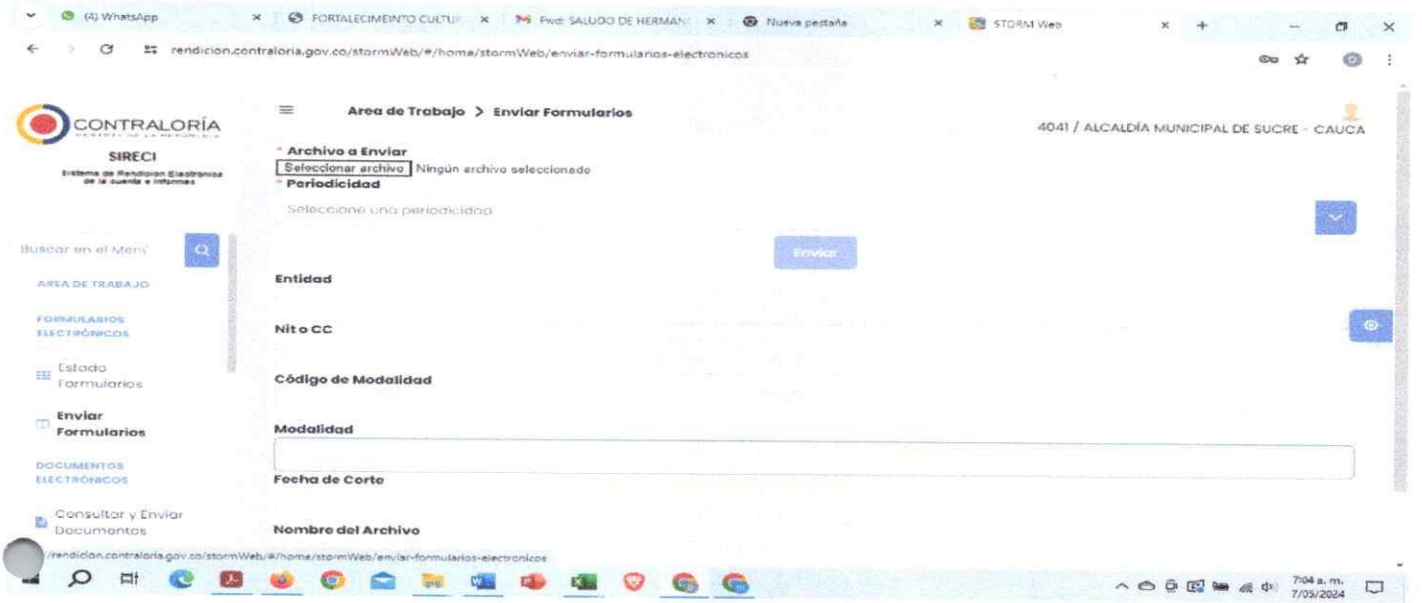
Reporte del mes de abril de 2024 el 7 de mayo de 2024

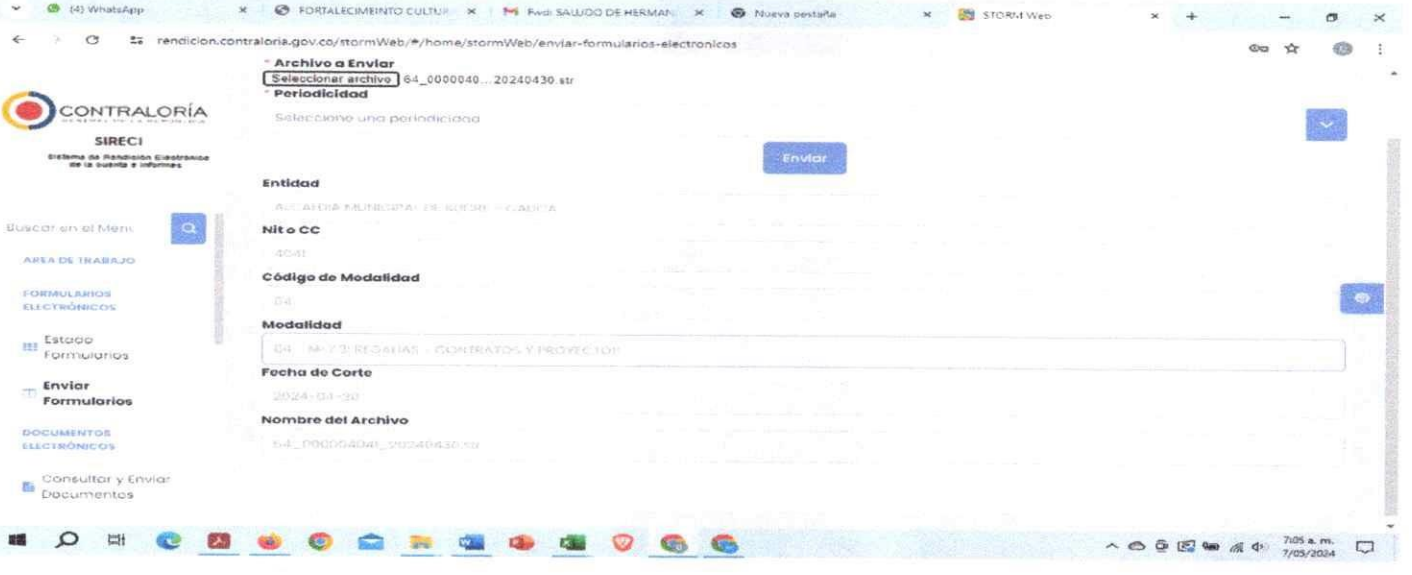


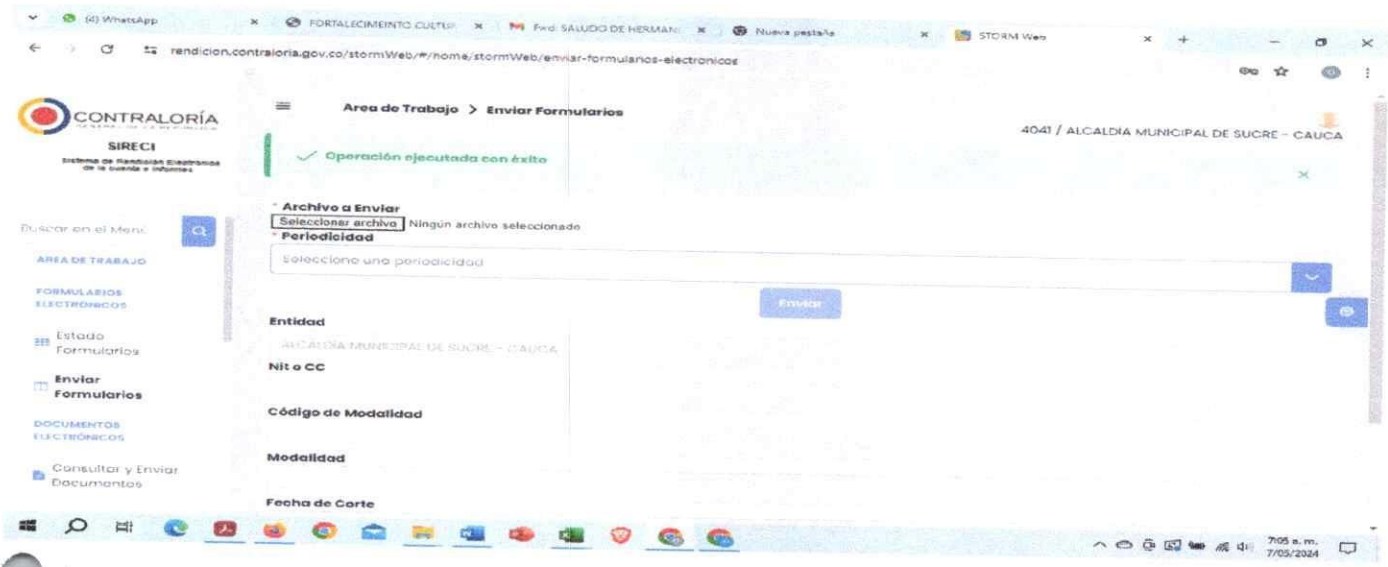





Archivo Herramientas Opciones Ayuda
4041 - ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
Básicos: 2024-05-06 20:52:58
Configuraciones: 2024-05-06 20:52:58
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)
BLOQUES
D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE
M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
DESCRIPCIÓN | 2 FORMULARIO ... | 3 JUSTIFICACIÓN | 4 VIGENCIA | 7 CÓDIGO DEL BANCO DE P... | 8 NÚMERO DE CONTRATO | 12 CLASE DE CONTRATO | 16 VALOR DEL CONTRA
FILA_1 | SI | Bloqueado | 2023 | 2023197850026 | LP-395-2023 | 21- OBRA PÚBLICA | 862,797
FILA_2 | SI | Bloqueado | 2023 | 2018130101785 | LP-072-2023 | 21- OBRA PÚBLICA | 4,633,534
FILA_3 | SI | Bloqueado | 2021 | 2021197850038 | 243-2021 | 21- OBRA PÚBLICA | 249,584
FILA_4 | SI | Bloqueado | 2019 | 2018197850004 | 218-2029 | 21- OBRA PÚBLICA | 1,200,968
FILA_TOTAL | | | | | | | 6,946,884
Storm User
Los cambios fueron guardados
Desea realmente salir
OK
Cancel
Entidad : [4041] ALCALDÍA MUNICIPAL DE S
Modalidad : M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PI
Formulario : 448 F23.9: CONTRATOS REALIZADC
Bloque : D 1 CONTRATOS REALIZADOS CON
Fecha : 2024/04/30
Periodicidad : MENSUAL
Agrupación : A25 Administración Central Territori
7:02 a. m.
7/05/2024


(4) WhatsApp
FORTALECIMIENTO CULTUR
Fwd: SALUDO DE HERMAN
Nueva pestaña
STORM Web
rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/#/home/stormWeb/enviar-formularios-electronicos
CONTRALORÍA
SIRECI
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes
Area de Trabajo > Enviar Formularios
4041 / ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
* Archivo a Enviar
Seleccionar archivo
Ningún archivo seleccionado
* Periodicidad
Seleccione una periodicidad
Enviar
Entidad
Nit o CC
Código de Modalidad
Modalidad
Fecha de Corte
Nombre del Archivo
Buscar en el Menú
AREA DE TRABAJO
FORMULARIOS ELECTRÓNICOS
Estado Formularios
Enviar Formularios
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS
Consultar y Enviar Documentos
7:04 a. m.
7/05/2024


(4) WhatsApp
FORTALECIMIENTO CULTUR
Fwd: SALUDO DE HERMAN
Nueva pestaña
STORM Web
rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/#/home/stormWeb/enviar-formularios-electronicos
* Archivo a Enviar
Seleccionar archivo
64_0000040...20240430.str
* Periodicidad
Seleccione una periodicidad
Enviar
Entidad
Nit o CC
4041
Código de Modalidad
04
Modalidad
04 - M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
Fecha de Corte
2024-04-30
Nombre del Archivo
7:05 a. m.
7/05/2024



ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2024/05/07
HORA DE GENERACIÓN:07:08:58
CONSECUTIVO:2627289612024-04-30

RAZÓN SOCIAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA
NIT:817003440
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:CARLOS RUBER MORA MORA

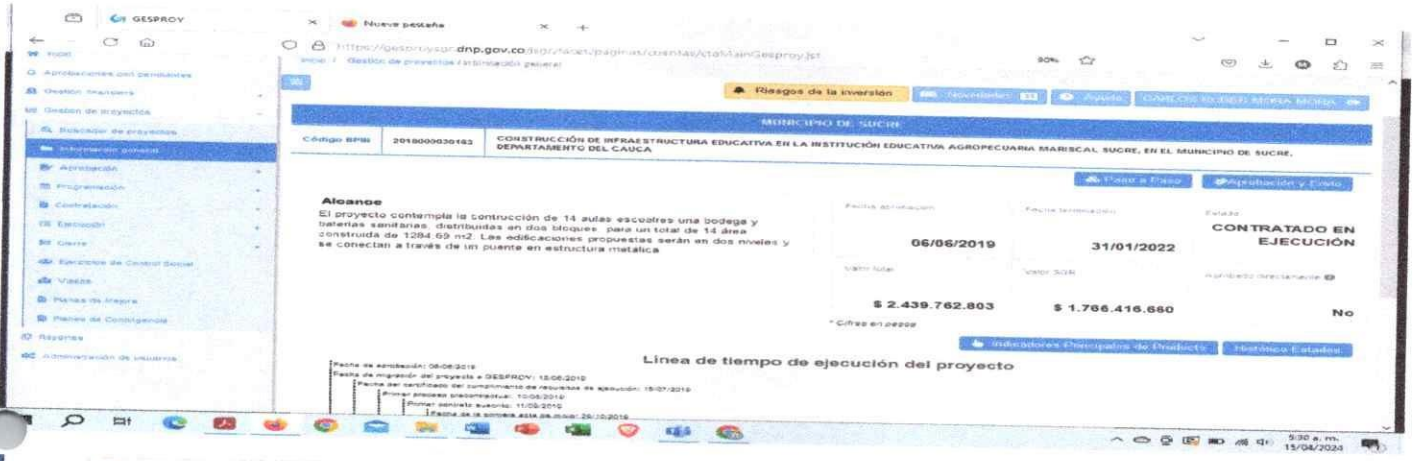
MODALIDAD:M-7.3: REGALIAS - CONTRATOS Y PROYECTOS
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2024-04-30
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2024-05-09 00:00:00.0

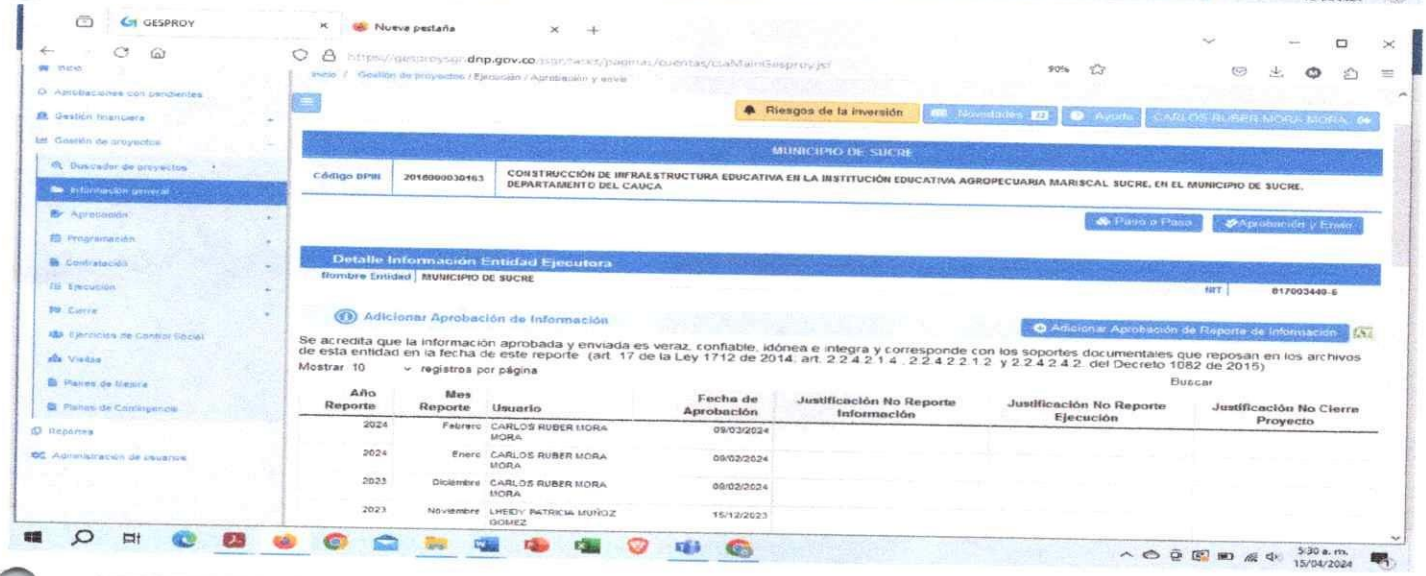
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

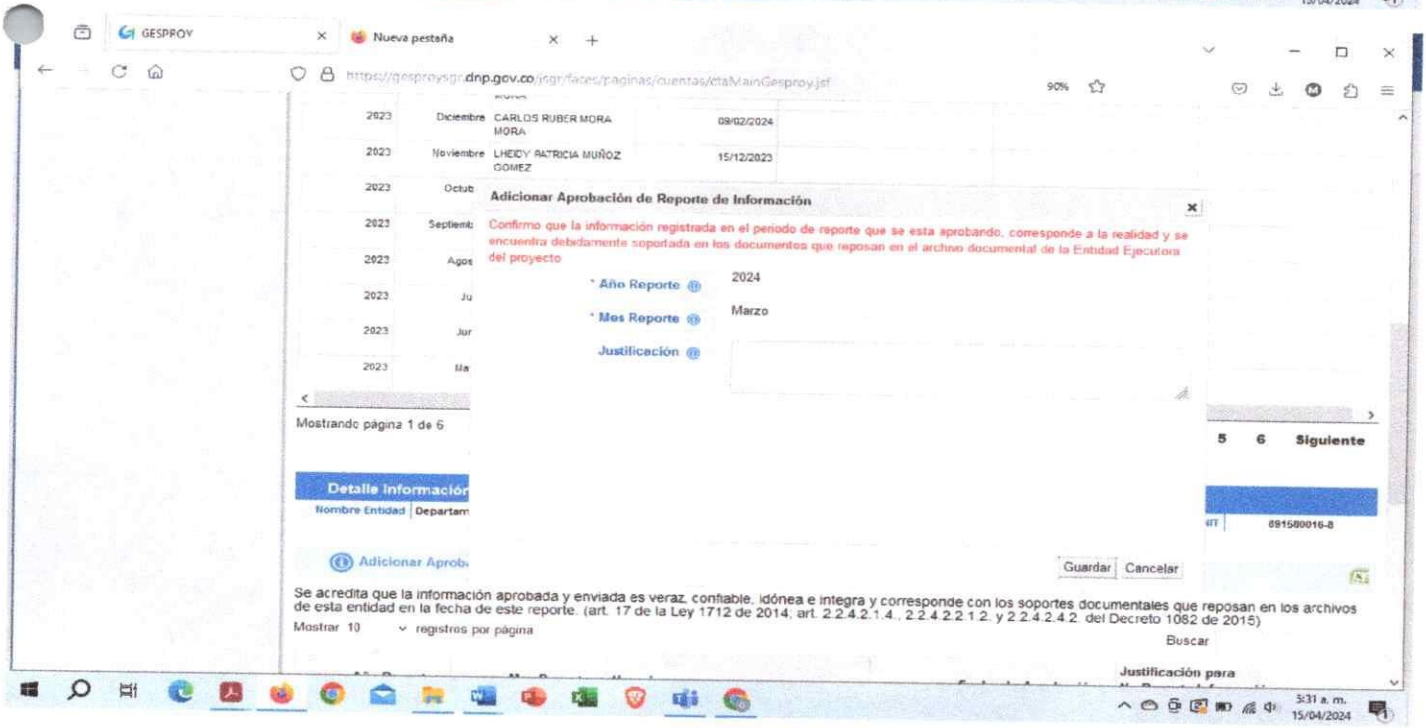
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F23.7: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DE FUNCIONAM DEL SGR Y DEL SMSCE (Registre cifras EN PESOS)	2024/05/07 7:05:54
Formulario electrónico	F23.8: PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (Registre cifras EN PESOS)	2024/05/07 7:05:54
Formulario electrónico	F23.9: CONTRATOS REALIZADOS CON RECURSOS DEL SGR (Registre cifras EN PESOS)	2024/05/07 7:05:54

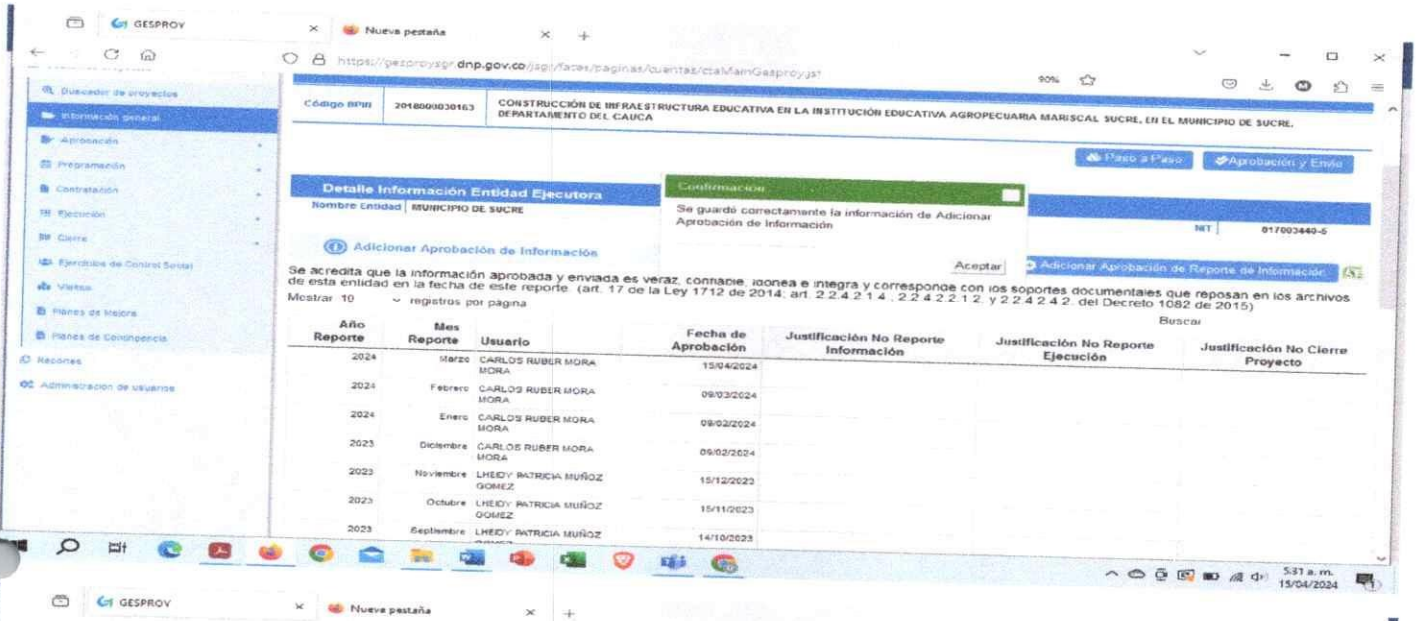
La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal ALCALDÍA MUNICIPAL DE SUCRE - CAUCA, NIT 817003440, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

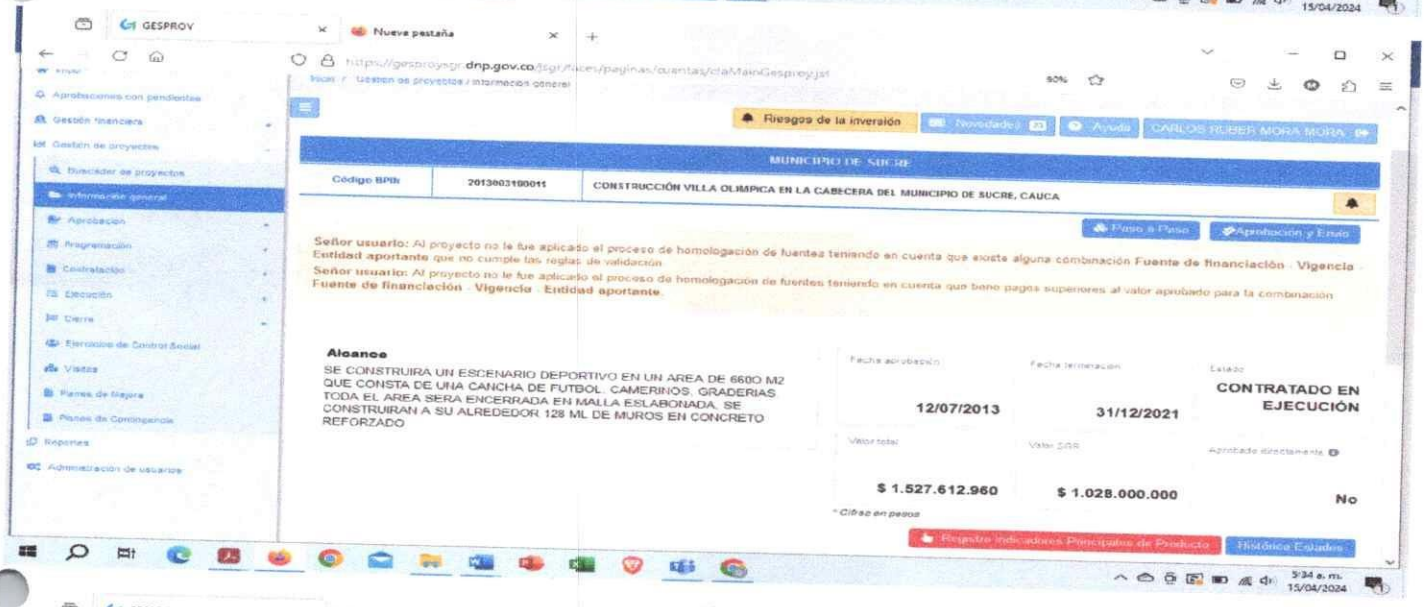
SOPORTE DE LA ACTIVIDAD 2.2: Se hace el reporte de información de los proyectos con el Rol "APRUEBA Y EN VÍA", en la plataforma GESPROY, correspondiente al mes de marzo realizado el 15 de abril de 2024 y el mes de abril de 2024, el 14 de mayo de 2024.

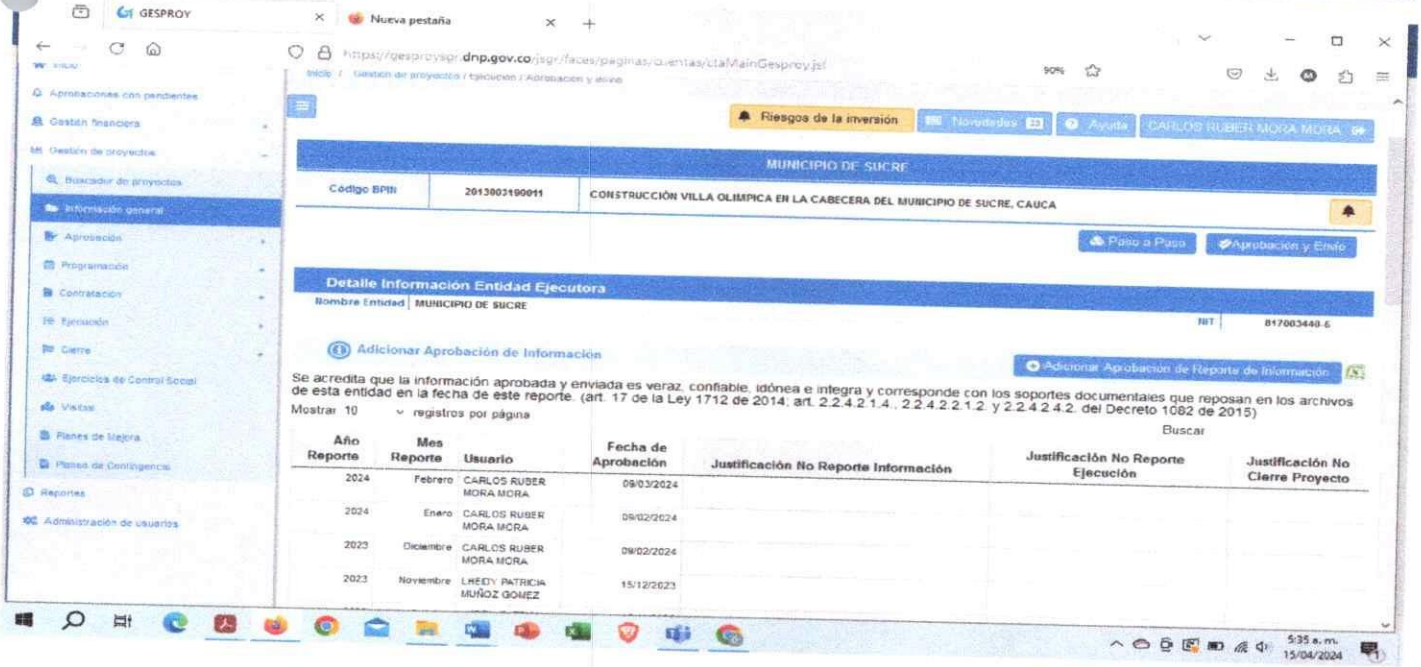




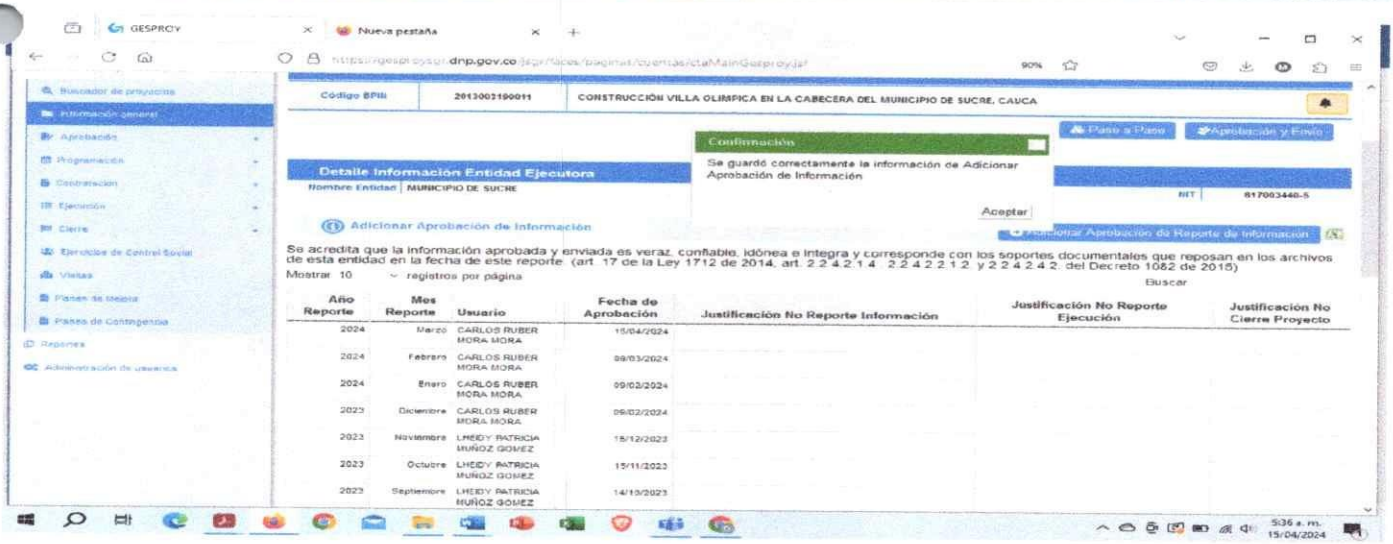


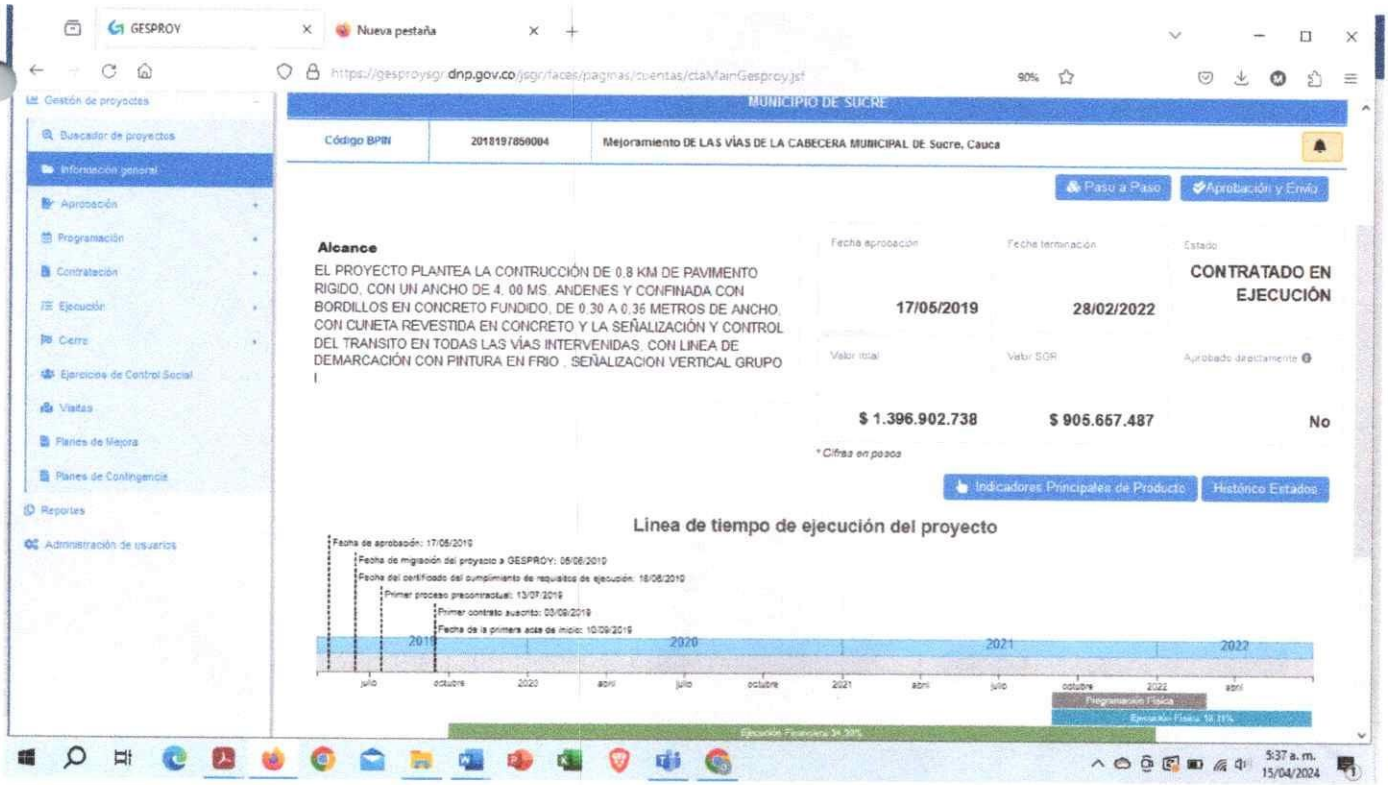

GESPROY
Nueva pestaña
Código BPIN
2018000030163
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA MARISCAL SUCRE, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad MUNICIPIO DE SUCRE
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Adicionar Aprobación de Información
Aceptar
NIT 817003440-6
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2024 Marzo CARLOS RUBER MORA MORA 15/04/2024
2024 Febrero CARLOS RUBER MORA MORA 09/03/2024
2024 Enero CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
2023 Diciembre CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
2023 Noviembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/12/2023
2023 Octubre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/11/2023
2023 Septiembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ
5:31 a. m. 15/04/2024

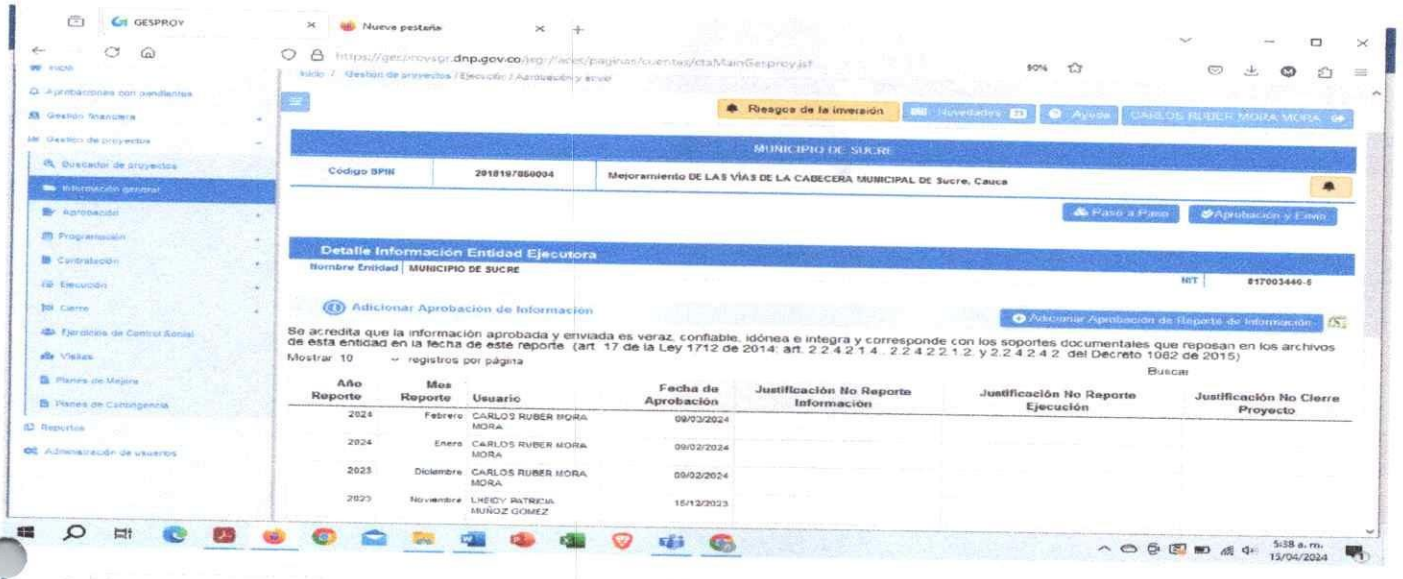

GESPROY
Nueva pestaña
Riesgos de la inversión
Novedades
Ayuda
CARLOS RUBER MORA MORA
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
20130031900011
CONSTRUCCIÓN VILLA OLIMPICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Señor usuario: Al proyecto no le fue aplicado el proceso de homologación de fuentes teniendo en cuenta que existe alguna combinación Fuente de financiación - Vigencia - Entidad aportante que no cumple las reglas de validación.
Señor usuario: Al proyecto no le fue aplicado el proceso de homologación de fuentes teniendo en cuenta que tiene pagos superiores al valor aprobado para la combinación Fuente de financiación - Vigencia - Entidad aportante.
Alcance
SE CONSTRUIRA UN ESCENARIO DEPORTIVO EN UN AREA DE 6600 M2 QUE CONSTA DE UNA CANCHA DE FUTBOL, CAMERINOS, GRADERIAS TODA EL AREA SERA ENCERRADA EN MALLA ESLABONADA, SE CONSTRUIRAN A SU ALREDEDOR 128 ML DE MUROS EN CONCRETO REFORZADO
Fecha aprobación 12/07/2013
Fecha terminación 31/12/2021
Estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total $ 1.527.612.960
Valor SGR $ 1.028.000.000
Aprobado directamente No
* Cifras en pesos
Registro Indicadores Principales de Producto
Histórico Estados
5:34 a. m. 15/04/2024

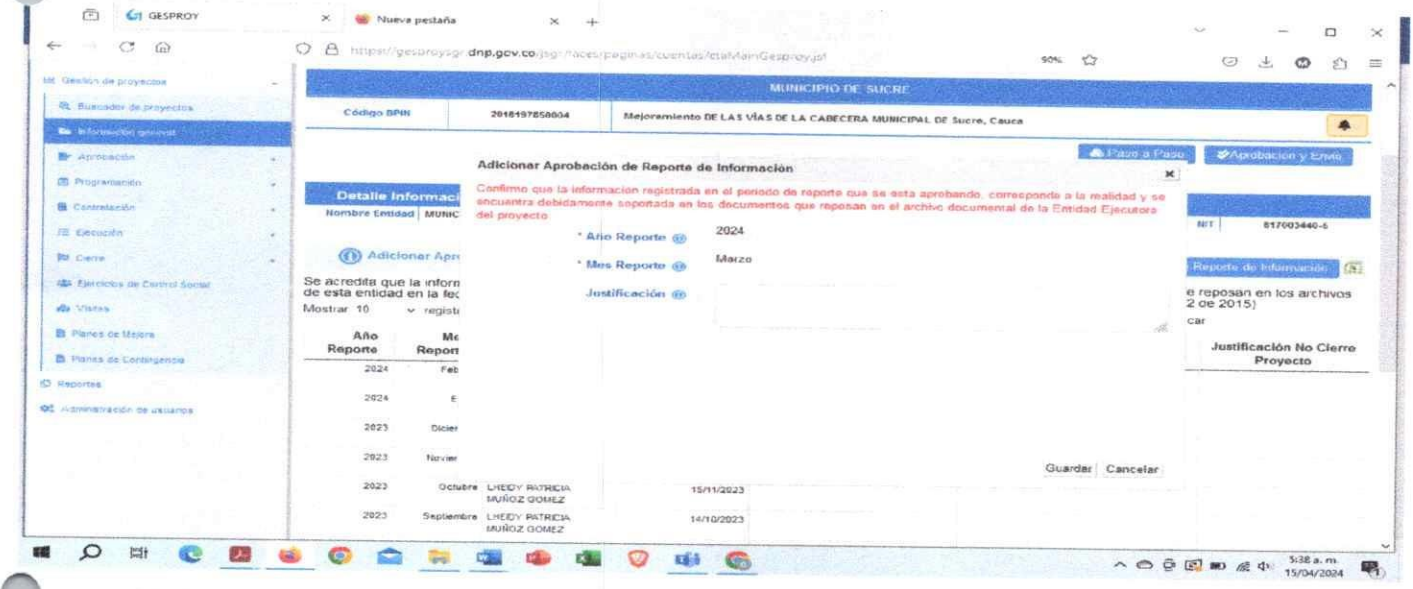

GESPROY
Nueva pestaña
Riesgos de la inversión
Novedades
Ayuda
CARLOS RUBER MORA MORA
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
20130031900011
CONSTRUCCIÓN VILLA OLIMPICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad MUNICIPIO DE SUCRE
NIT 817003440-6
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2024 Febrero CARLOS RUBER MORA MORA 09/03/2024
2024 Enero CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
2023 Diciembre CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
2023 Noviembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/12/2023
5:35 a. m. 15/04/2024

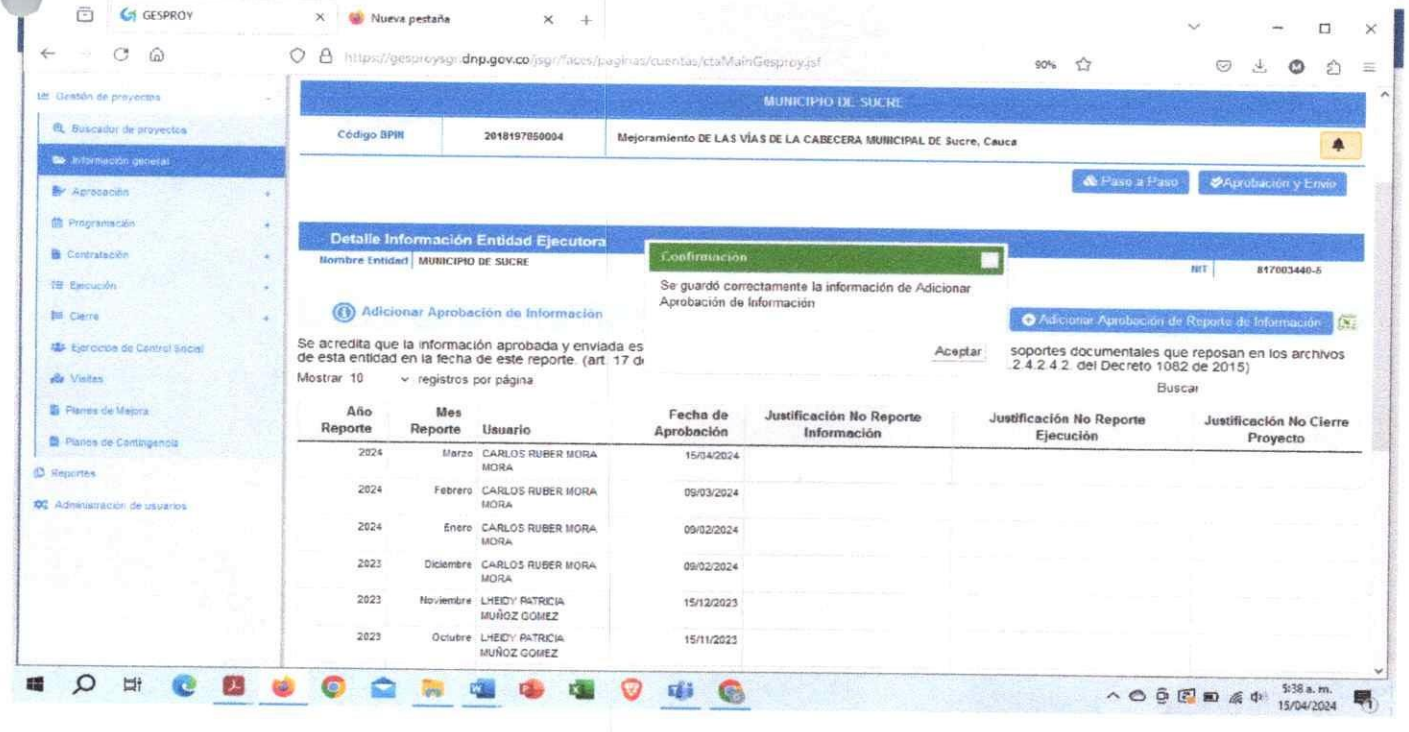

GESPROY
Nueva pestaña
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Confirmo que la información registrada en el periodo de reporte que se esta aprobando, corresponde a la realidad y se encuentra debidamente soportada en los documentos que reposan en el archivo documental de la Entidad Ejecutora del proyecto.
* Año Reporte 2024
* Mes Reporte Marzo
Justificación
Guardar Cancelar
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte (art. 17 de la Ley 1712 de 2014, art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación para No Reporte Información
Mostrando página 1 de 13
13 Siguiente

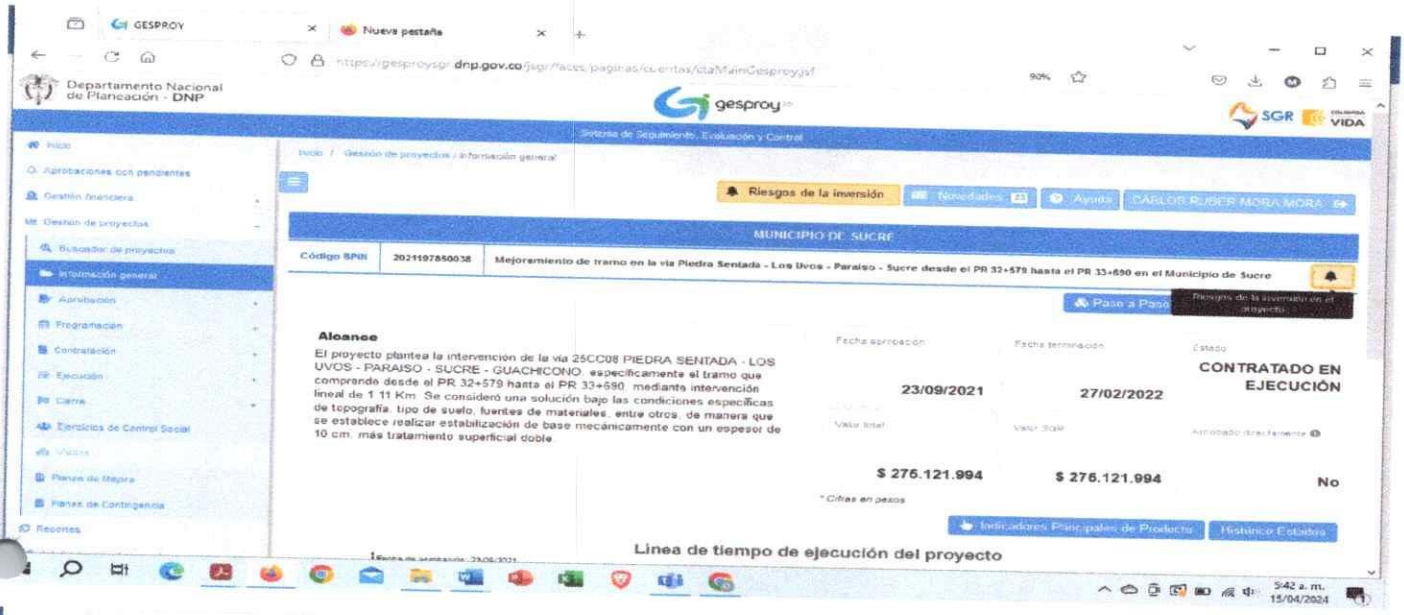

GESPROY
Nueva pestaña
Código BPIN 2013003190011
CONSTRUCCIÓN VILLA OLIMPICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Adicionar Aprobación de Información
Aceptar
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad MUNICIPIO DE SUCRE
NIT 817003448-5
Adicionar Aprobación de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte (art. 17 de la Ley 1712 de 2014, art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto
2024 Marzo CARLOS RUBER MORA MORA 15/04/2024
2024 Febrero CARLOS RUBER MORA MORA 09/03/2024
2024 Enero CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
2023 Diciembre CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
2023 Noviembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/12/2023
2023 Octubre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/11/2023
2023 Septiembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 14/10/2023

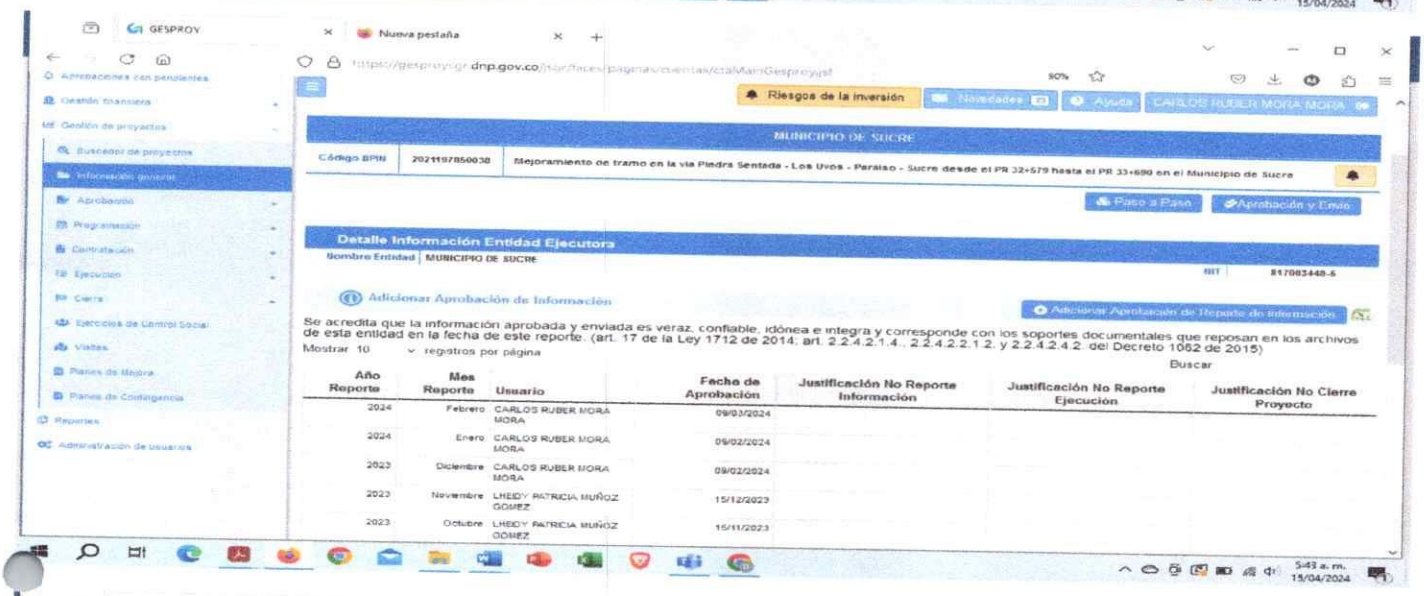

GESPROY
Nueva pestaña
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN 2018197850004
Mejoramiento DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE Sucre, Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Alcance
EL PROYECTO PLANTEA LA CONTRUCCIÓN DE 0.8 KM DE PAVIMENTO RIGIDO, CON UN ANCHO DE 4. 00 MS. ANDENES Y CONFINADA CON BORDILLOS EN CONCRETO FUNDIDO, DE 0.30 A 0.35 METROS DE ANCHO, CON CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO Y LA SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSITO EN TODAS LAS VÍAS INTERVENIDAS, CON LINEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO , SEÑALIZACION VERTICAL GRUPO I
Fecha aprobación 17/05/2019
Fecha terminación 28/02/2022
Estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total $ 1.396.902.738
Valor SGR $ 905.657.487
Aprobado anteriormente No
* Cifras en pesos
Indicadores Principales de Producto
Histórico Estados
Línea de tiempo de ejecución del proyecto
Fecha de aprobación: 17/05/2019
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 05/06/2019
Fecha del certificado del cumplimiento de requisitos de ejecución: 18/06/2019
Primer proceso precontractual: 13/07/2019
Primer contrato suscrito: 03/09/2019
Fecha de la primera acta de inicio: 10/09/2019
2019
2020
2021
2022
Programación Física
Ejecución Física: 18.18%
Ejecución Financiera 34.39%

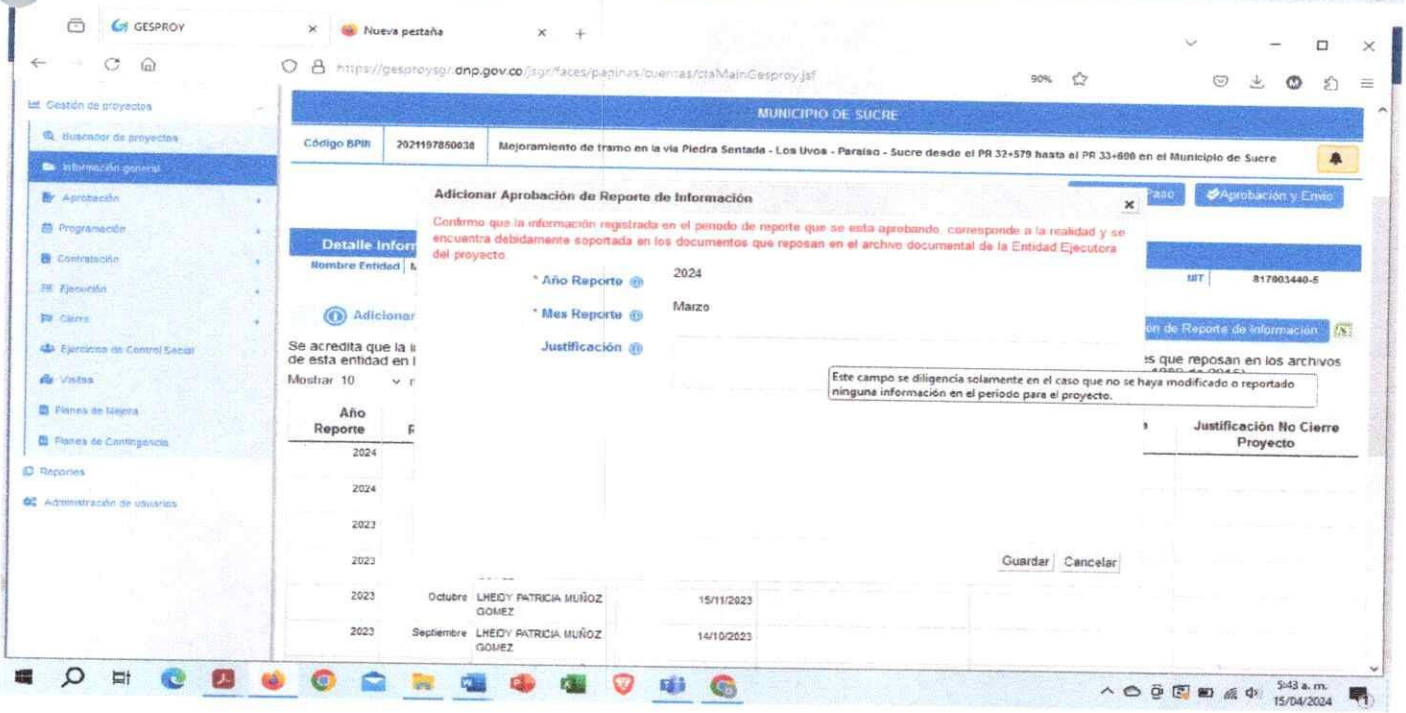

GESPROY
Nueva pestaña
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018197850004
Mejoramiento DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE Sucre, Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad | MUNICIPIO DE SUCRE
NIT 817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de esté reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto
2024 Febrero CARLOS RUBER MORA MORA 09/03/2024
2024 Enero CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
2023 Diciembre CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
2023 Noviembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/12/2023
5:38 a. m. 15/04/2024

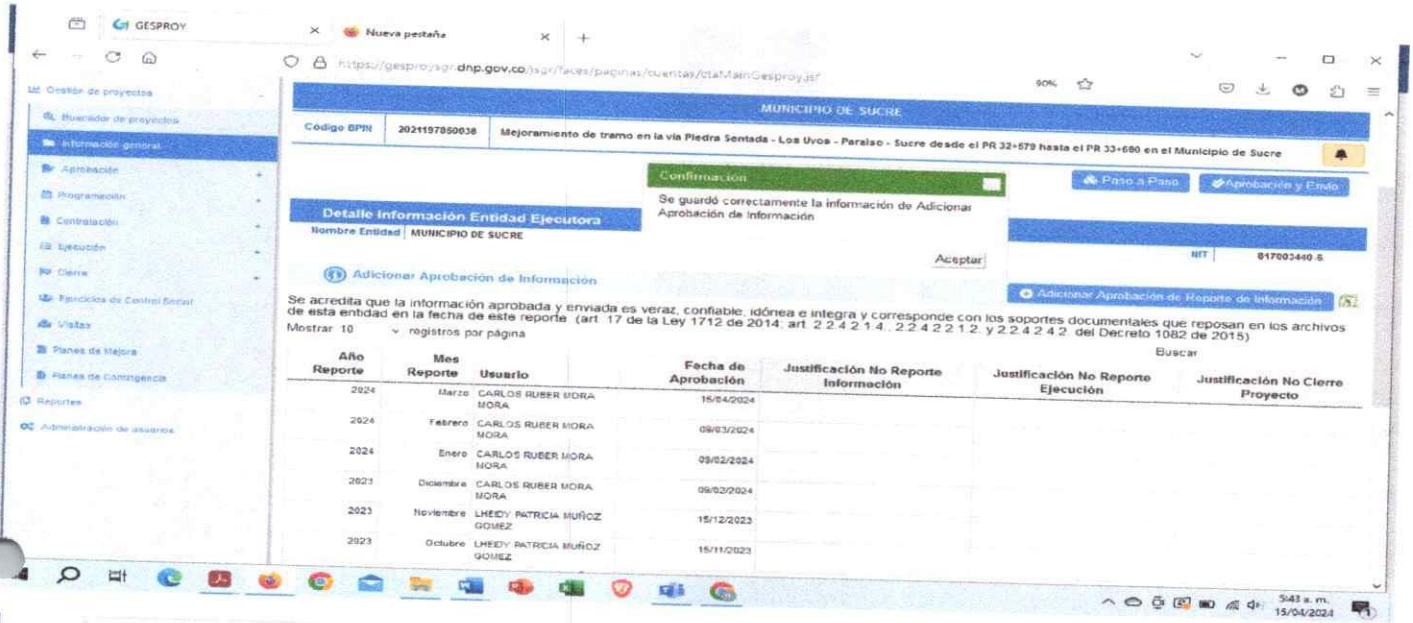

GESPROY
Nueva pestaña
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018197850004
Mejoramiento DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE Sucre, Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Confirmo que la información registrada en el periodo de reporte que se esta aprobando, corresponde a la realidad y se encuentra debidamente soportada en los documentos que reposan en el archivo documental de la Entidad Ejecutora del proyecto
* Año Reporte 2024
* Mes Reporte Marzo
Justificación
Guardar
Cancelar
2023 Octubre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/11/2023
2023 Septiembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 14/10/2023
5:38 a. m. 15/04/2024

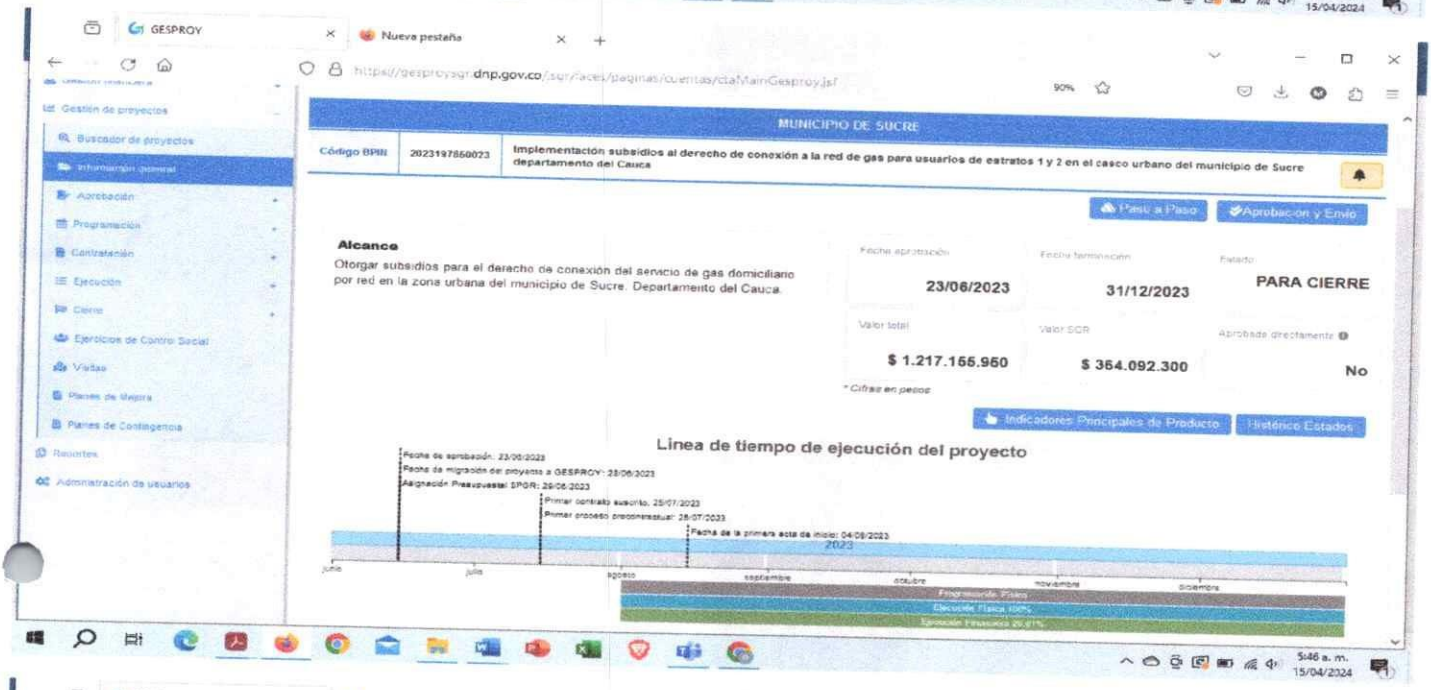

GESPROY
Nueva pestaña
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2018197850004
Mejoramiento DE LAS VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE Sucre, Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad | MUNICIPIO DE SUCRE
NIT 817003440-5
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Adicionar Aprobación de Información
Aceptar
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
soportes documentales que reposan en los archivos
2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Buscar
Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto
2024 Marzo CARLOS RUBER MORA MORA 15/04/2024
2024 Febrero CARLOS RUBER MORA MORA 09/03/2024
2024 Enero CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
2023 Diciembre CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
2023 Noviembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/12/2023
2023 Octubre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/11/2023
5:38 a. m. 15/04/2024

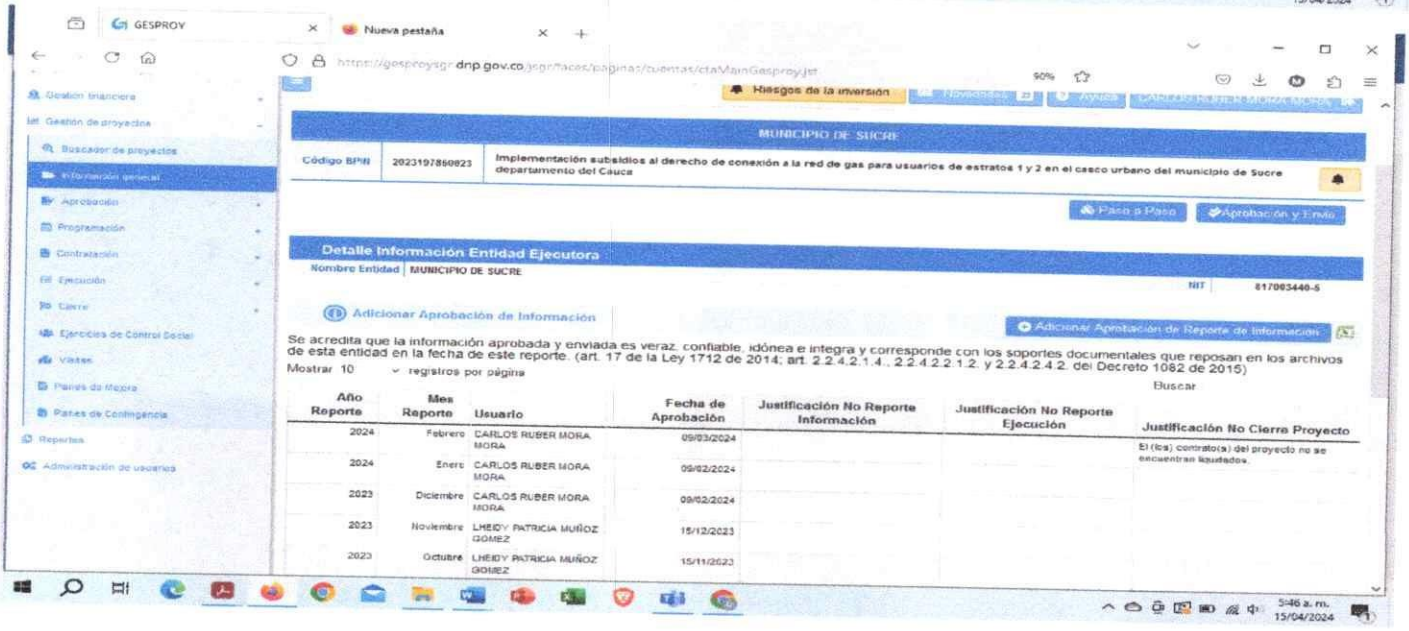

GESPROY
Nueva pestaña
Departamento Nacional de Planeación - DNP
gesproy
Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control
Riesgos de la inversión
Novedades
Ayuda
CARLOS RUBER MORA MORA
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2021197850038
Mejoramiento de tramo en la via Piedra Sentada - Los Uvos - Paraiso - Sucre desde el PR 32+579 hasta el PR 33+690 en el Municipio de Sucre
Paso a Paso
Alcance
El proyecto plantea la intervención de la vía 25CC08 PIEDRA SENTADA - LOS UVOS - PARAISO - SUCRE - GUACHICONO, especificamente el tramo que comprende desde el PR 32+579 hasta el PR 33+690, mediante intervención lineal de 1.11 Km. Se consideró una solución bajo las condiciones especificas de topografía, tipo de suelo, fuentes de materiales, entre otros, de manera que se establece realizar estabilización de base mecánicamente con un espesor de 10 cm, más tratamiento superficial doble.
Fecha aprobación
23/09/2021
Fecha terminación
27/02/2022
Estado
CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total
$ 276.121.994
Valor SGR
$ 276.121.994
Aprobado oficialmente
No
* Cifras en pesos
Indicadores Principales de Producto
Histórico Estados
Linea de tiempo de ejecución del proyecto
5:42 a. m.
15/04/2024

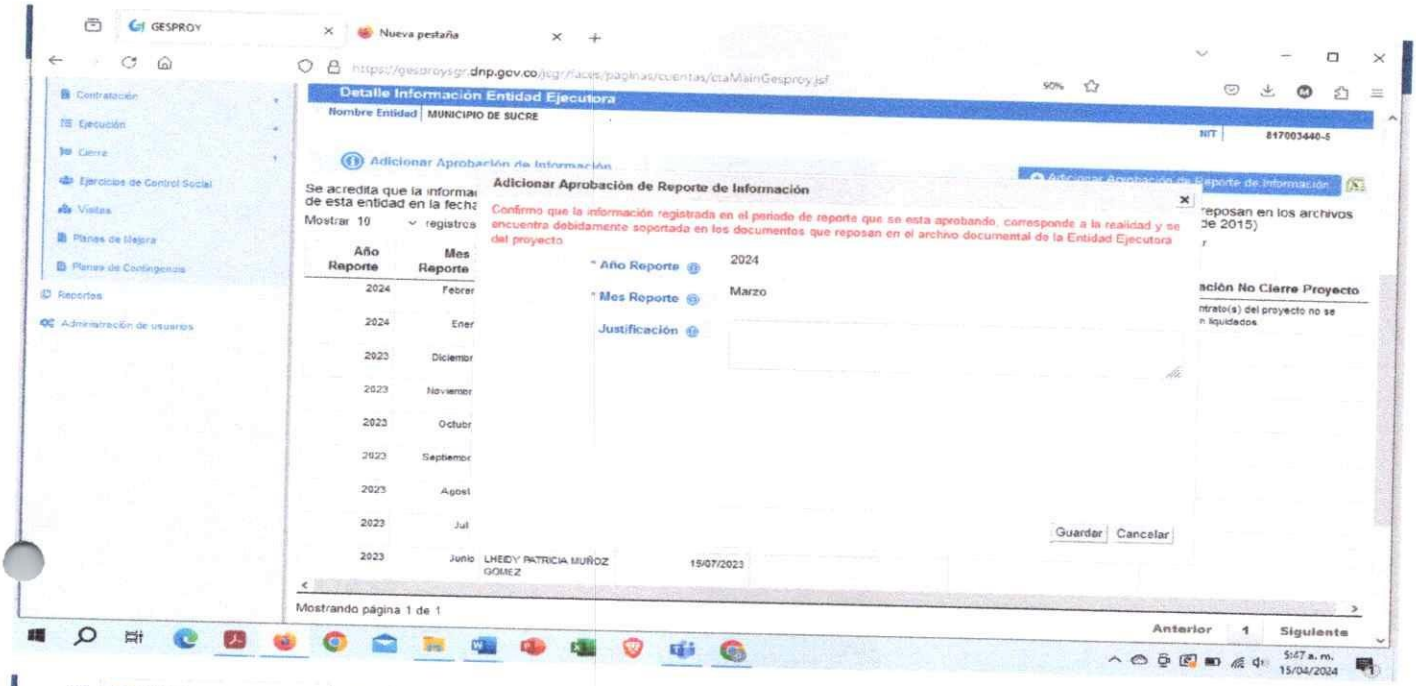

GESPROY
Nueva pestaña
Riesgos de la inversión
Novedades
Ayuda
CARLOS RUBER MORA MORA
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2021197850038
Mejoramiento de tramo en la via Piedra Sentada - Los Uvos - Paraiso - Sucre desde el PR 32+579 hasta el PR 33+690 en el Municipio de Sucre
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT
817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014, art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte
Mes Reporte
Usuario
Fecha de Aprobación
Justificación No Reporte Información
Justificación No Reporte Ejecución
Justificación No Cierre Proyecto
2024 Febrero CARLOS RUBER MORA MORA 09/03/2024
2024 Enero CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
2023 Diciembre CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
2023 Noviembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/12/2023
2023 Octubre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/11/2023
5:43 a. m.
15/04/2024

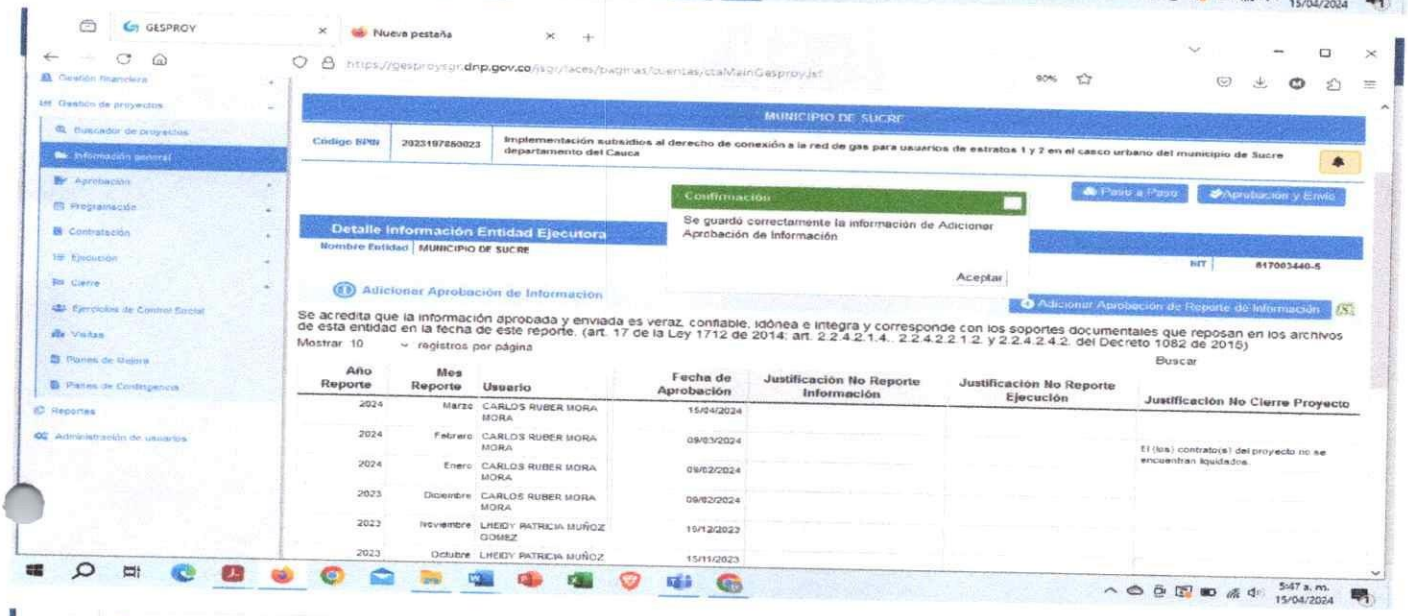

GESPROY
Nueva pestaña
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN
2021197850038
Mejoramiento de tramo en la via Piedra Sentada - Los Uvos - Paraiso - Sucre desde el PR 32+579 hasta el PR 33+690 en el Municipio de Sucre
Aprobación y Envío
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Confirmo que la información registrada en el periodo de reporte que se esta aprobando, corresponde a la realidad y se encuentra debidamente soportada en los documentos que reposan en el archivo documental de la Entidad Ejecutora del proyecto.
* Año Reporte
2024
* Mes Reporte
Marzo
Justificación
Este campo se diligencia solamente en el caso que no se haya modificado o reportado ninguna información en el periodo para el proyecto.
Guardar
Cancelar
Año Reporte
Justificación No Cierre Proyecto
2024
2024
2023
2023
2023 Octubre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/11/2023
2023 Septiembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 14/10/2023
5:43 a. m.
15/04/2024

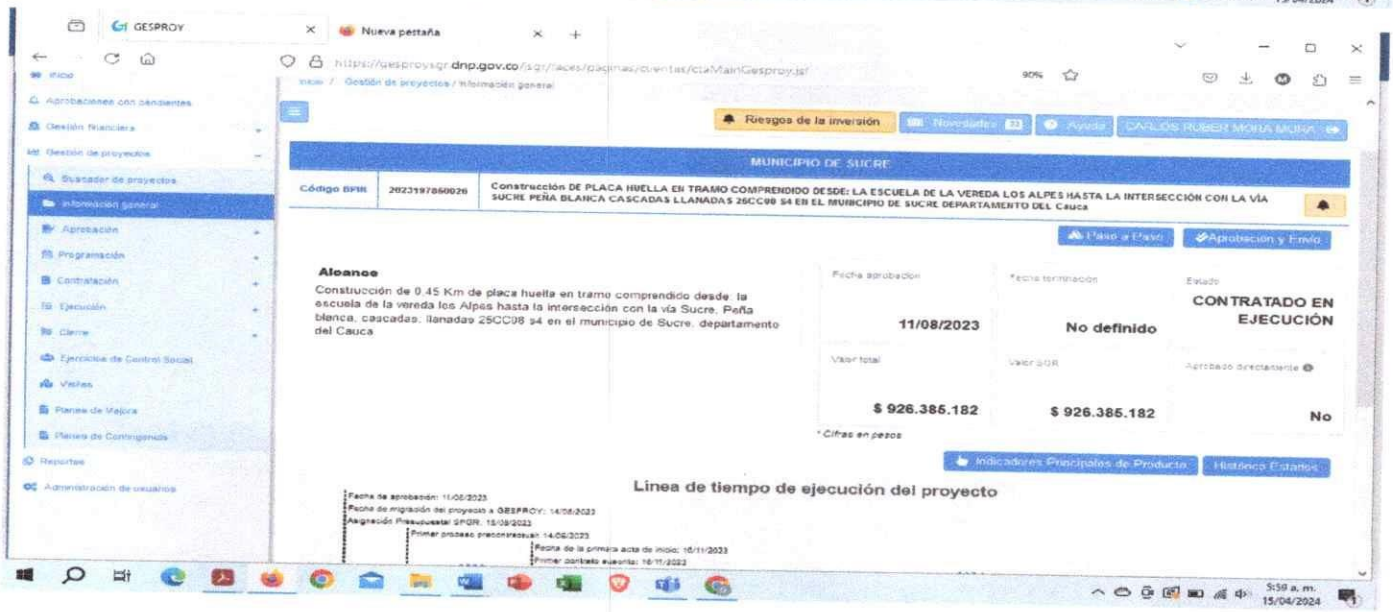

GESPROY
Nueva pestaña
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN 2021197850038
Mejoramiento de tramo en la vía Piedra Sentada - Los Uvos - Paraíso - Sucre desde el PR 32+579 hasta el PR 33+680 en el Municipio de Sucre
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Adicionar Aprobación de Información
Aceptar
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad MUNICIPIO DE SUCRE
NIT 817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto
2024 | Marzo | CARLOS RUBER MORA MORA | 15/04/2024
2024 | Febrero | CARLOS RUBER MORA MORA | 09/03/2024
2024 | Enero | CARLOS RUBER MORA MORA | 09/02/2024
2023 | Diciembre | CARLOS RUBER MORA MORA | 09/02/2024
2023 | Noviembre | LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ | 15/12/2023
2023 | Octubre | LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ | 15/11/2023
5:43 a. m. 15/04/2024


GESPROY
Nueva pestaña
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN 2023197860023
Implementación subsidios al derecho de conexión a la red de gas para usuarios de estratos 1 y 2 en el casco urbano del municipio de Sucre departamento del Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Alcance
Otorgar subsidios para el derecho de conexión del servicio de gas domiciliario por red en la zona urbana del municipio de Sucre. Departamento del Cauca.
Fecha aprobación 23/06/2023
Fecha terminación 31/12/2023
Estado PARA CIERRE
Valor total $ 1.217.155.960
Valor SGR $ 354.092.300
Aprobado directamente No
* Cifras en pesos
Indicadores Principales de Producto
Histórico Estados
Línea de tiempo de ejecución del proyecto
Fecha de aprobación: 23/06/2023
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 28/06/2023
Asignación Presupuestal SPGR: 29/06/2023
Primer contrato suscrito: 25/07/2023
Primer proceso precontractual: 28/07/2023
Fecha de la primera acta de inicio: 04/09/2023
2023
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
Programación Físico
Ejecución Física 100%
Ejecución Financiera 29,01%
5:46 a. m. 15/04/2024


GESPROY
Nueva pestaña
Riesgos de la inversión
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN 2023197860023
Implementación subsidios al derecho de conexión a la red de gas para usuarios de estratos 1 y 2 en el casco urbano del municipio de Sucre departamento del Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad MUNICIPIO DE SUCRE
NIT 817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto
2024 | Febrero | CARLOS RUBER MORA MORA | 09/03/2024
2024 | Enero | CARLOS RUBER MORA MORA | 09/02/2024 | El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2023 | Diciembre | CARLOS RUBER MORA MORA | 09/02/2024
2023 | Noviembre | LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ | 15/12/2023
2023 | Octubre | LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ | 15/11/2023
5:46 a. m. 15/04/2024


GESPROY
Nueva pestaña
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad | MUNICIPIO DE SUCRE
NIT | 817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Confirmo que la información registrada en el periodo de reporte que se esta aprobando, corresponde a la realidad y se encuentra debidamente soportada en los documentos que reposan en el archivo documental de la Entidad Ejecutora del proyecto
* Año Reporte 2024
* Mes Reporte Marzo
Justificación
Guardar
Cancelar
Año Reporte
Mes Reporte
2024 Febrer
2024 Ener
2023 Diciembr
2023 Noviembr
2023 Octubr
2023 Septiembr
2023 Agost
2023 Jul
2023 Junio LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/07/2023
Mostrando página 1 de 1
Anterior 1 Siguiente
5:47 a. m. 15/04/2024


GESPROY
Nueva pestaña
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN 2023197650023
Implementación subsidios al derecho de conexión a la red de gas para usuarios de estratos 1 y 2 en el casco urbano del municipio de Sucre departamento del Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Confirmación
Se guardó correctamente la información de Adicionar Aprobación de Información
Aceptar
Detalle Información Entidad Ejecutora
Nombre Entidad | MUNICIPIO DE SUCRE
NIT | 817003440-5
Adicionar Aprobación de Información
Adicionar Aprobación de Reporte de Información
Se acredita que la información aprobada y enviada es veraz, confiable, idónea e integra y corresponde con los soportes documentales que reposan en los archivos de esta entidad en la fecha de este reporte. (art. 17 de la Ley 1712 de 2014; art. 2.2.4.2.1.4., 2.2.4.2.2.1.2. y 2.2.4.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015)
Mostrar 10 registros por página
Buscar
Año Reporte | Mes Reporte | Usuario | Fecha de Aprobación | Justificación No Reporte Información | Justificación No Reporte Ejecución | Justificación No Cierre Proyecto
2024 Marzo CARLOS RUBER MORA MORA 15/04/2024
2024 Febrero CARLOS RUBER MORA MORA 09/03/2024
2024 Enero CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
El (los) contrato(s) del proyecto no se encuentran liquidados.
2023 Diciembre CARLOS RUBER MORA MORA 09/02/2024
2023 Noviembre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ GOMEZ 15/12/2023
2023 Octubre LHEIDY PATRICIA MUÑOZ 15/11/2023
5:47 a. m. 15/04/2024


GESPROY
Nueva pestaña
Riesgos de la inversión
Novedades
Ayuda
CARLOS RUBER MORA MUÑOZ
MUNICIPIO DE SUCRE
Código BPIN 2023197650026
Construcción DE PLACA HUELLA EN TRAMO COMPRENDIDO DESDE: LA ESCUELA DE LA VEREDA LOS ALPES HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA VÍA SUCRE PEÑA BLANCA CASCADAS LLANADAS 25CC08 54 EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DEL Cauca
Paso a Paso
Aprobación y Envío
Alcance
Construcción de 0.45 Km de placa huella en tramo comprendido desde: la escuela de la vereda los Alpes hasta la intersección con la vía Sucre, Peña blanca, cascadas; llanadas 25CC08 54 en el municipio de Sucre, departamento del Cauca
Fecha aprobación 11/08/2023
Fecha terminación No definido
Estado CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Valor total $ 926.385.182
Valor SGR $ 926.385.182
Aprobado directamente No
* Cifras en pesos
Indicadores Principales de Producto
Histórico Estados
Linea de tiempo de ejecución del proyecto
Fecha de aprobación: 11/08/2023
Fecha de migración del proyecto a GESPROY: 14/08/2023
Asignación Presupuestal SPGR: 15/08/2023
Primer proceso precontractual: 14/08/2023
Fecha de la primera acta de inicio: 16/11/2023
Primer contrato suscrito: 16/11/2023
5:59 a. m. 15/04/2024
