UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAMAN-GRULA

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: Julio. Año: 2024

CONTRATO N°. 027-00-M-CAMAN-GRULA-2024

CONTRATISTA: AIREFLEX DE COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO: $ 18.331.950

FORMA DE PAGO:

PAC X MES	VALOR ESTIMADO A PAGAR	CANTIDAD DE VISITAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	VIGENCIA DEL RECURSO
JUNIO (de acuerdo con las actividades ejecutadas desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de mayo del 2024)	$6.110.650	1	2024
AGOSTO (de acuerdo con las actividades ejecutadas desde el 01 de junio del 2024 hasta el 31 de julio del 2024)	$6.110.650	1	2024
OCTUBRE (de acuerdo con las actividades ejecutadas desde el 01 de agosto del 2024 hasta el 30 de septiembre del 2024)	$6.110.650	1	2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 10. Mes 5. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO CONTROL AMBIENTAL

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Hasta el 30 de septiembre de 2024

Plazo Ejecución Contractual, desde el 24 de mayo hasta el 30 de septiembre de 2024 (129 días)

Porcentaje Avance en tiempo: 31,00 % (40 días)

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 40%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 33,33 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 66,67%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DANIEL RICARDO MERCADO CALDERON	INGENIERO DE SISTEMAS	MATRICULA PROFESIONAL
ALARCON APONTE JHON FREDDY	TECNICO DE MANTENIMIENTO	N/A
CAMARGO CAMARGO CESAR DIEGO	TECNICO DE MANTENIMIENTO	N/A
COGOLLO ZUÑIGA OSWALDO	AYUDANTE	N/A
DELGADO CASTILLO YILMER ELIAN	AUTOMATIZACION	N/A
QUIMBAYO PATIÑO ARLEY SEBASTIAN	AYUDANTE	N/A
SIABATO SIABATO GUILLERMO	COORDINADOR	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X. Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí x

Sin embargo, para el mes de junio no se tenían trabajos establecidos

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

En el mes de Junio no se realizaron trabajos, sin embargo la empresa entrego la siguiente información.

informe técnico final acerca de los trabajos realizados a cada equipo realizada en la primera visita del mes de mayo

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente realizar las siguientes actividades:

1. Segunda visita de Matenimiento preventivo en el mes de Julio
2. Tercera visita de Mantenimiento preventivo en el mes de Septiembre
3. El contratista tiene pendiente organizar un archivo historial de los equipos, en los que se registran las lecturas de operación, revisiones, cambios anomalías y diagnósticos de cada unidad
4. El contratista tiene pendiente la entrega en la última jornada una proyección con la respectiva justificación de mantenimiento planificado acorde a los hallazgos encontrados por el personal técnico de AIREFLEX para la vigencia 2025

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO: X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: TE ASTAIZA COLLAZOS JUAN FERNANDO

FIRMA:

C.C. No. 1.144.206.909

DEPENDENCIA: GRULA-CAMAN

Visto Bueno

GERENTE DE PROYECTO: TC OMAR LEONARDO SALAS GALINDO

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	03
		VIGENCIA:	23-10-2023

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor			
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo		**X**	**NO APLICA**
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	**EN EJECUCION**

Bogotá D.C. junio 5 de 2024 **TAW24- 208**

Señores:
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Madrid Cundinamarca.

REF: INFORME DE MANTENIMIENTO, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO CAMAN MADRID - LABORATORIOS METROLOGIA.

Apreciados señores:

De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes, con el fin de presentarles bajo registro fotográfico el mantenimiento preventivo a los equipos de precisión DATA 01, 02, 03, 04, 05, 06 + UNIDAD- CHILER, el cual fue ejecutado del 27 al 31 de mayo 2024.

MANTENIMIENTO CHILLER



MATENIMIENTO DURANTE













PRODUCTO TERMINADO:






VOLTAJE UNIDAD EXTERIOR – CHILER:






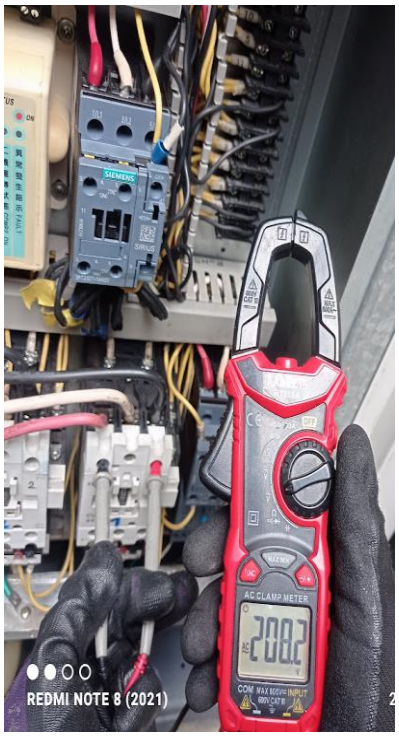


AMPERAJE COMPRESOR 1:





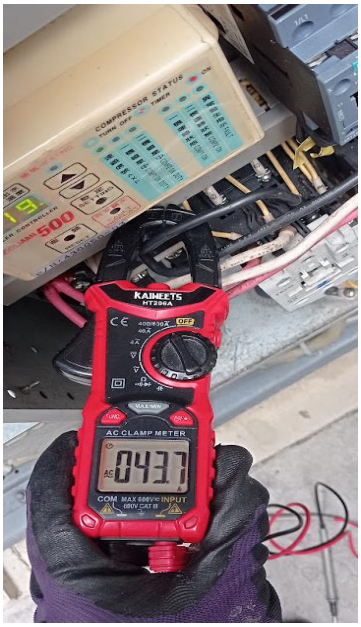

AMERAJE COMPRESOR 2

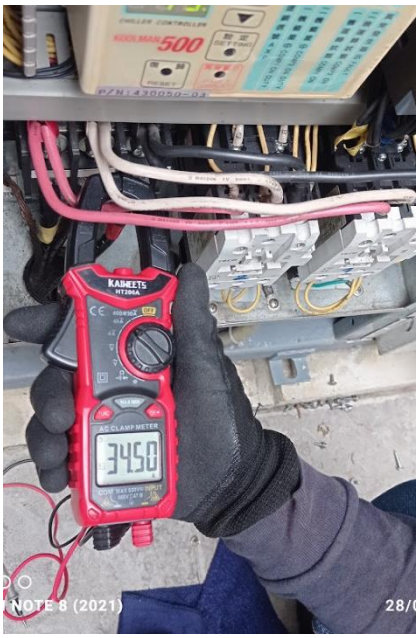






AMPERAJE MOTOR VENTILADOR 1 – CHILLER:








AMPERAJE MOTOR VENTILADOR 2 – CHILLER:

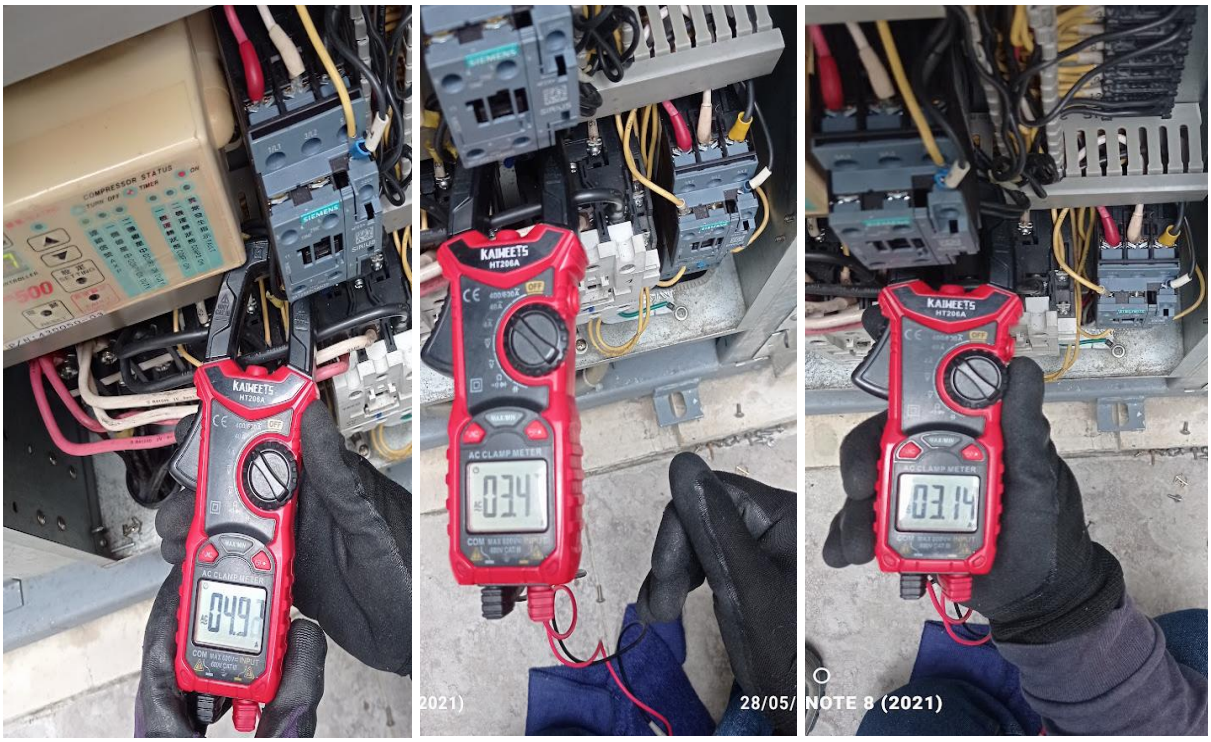

VOLTAJE BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA – CHILLER:



AMPERAJE BOMBA RECIRCULACION DEL AGUA:

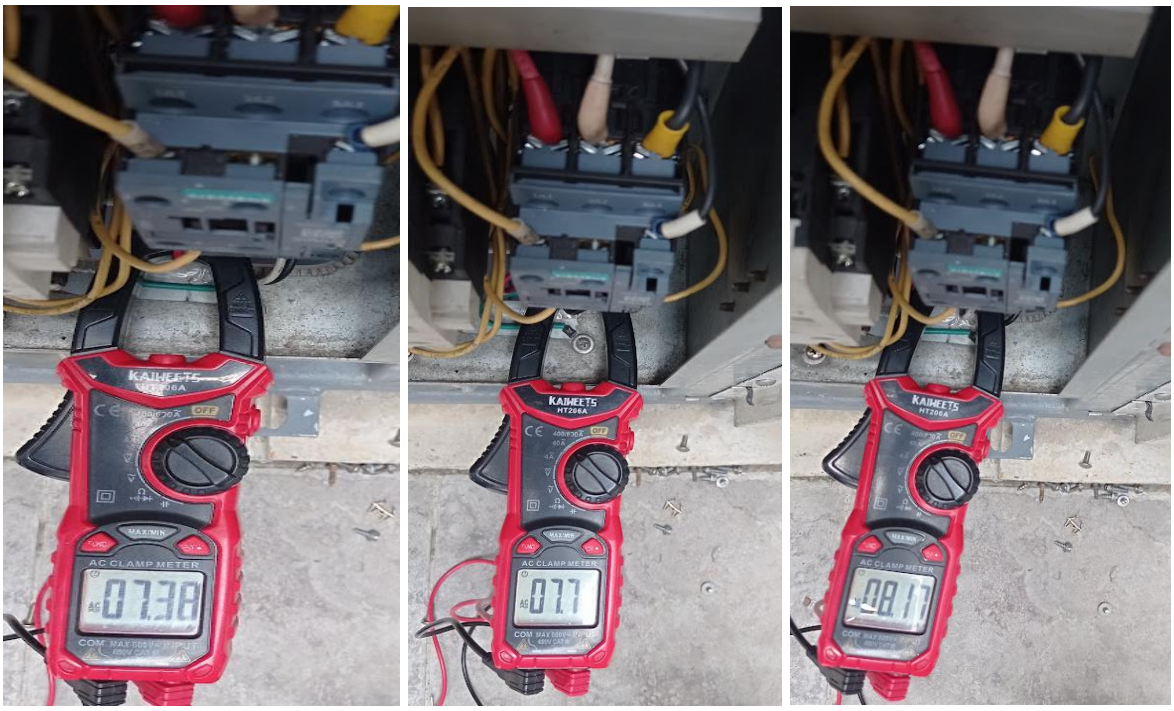


COMPRESOR 1 / BAJA 77 PSI ALTA 250 PSI:




TEMPERATURA DE SUCCION 11.2° COMPRESOR 1:




TEMPERATURA DE SUCCION 13.0°C / COMPRESOR 2:

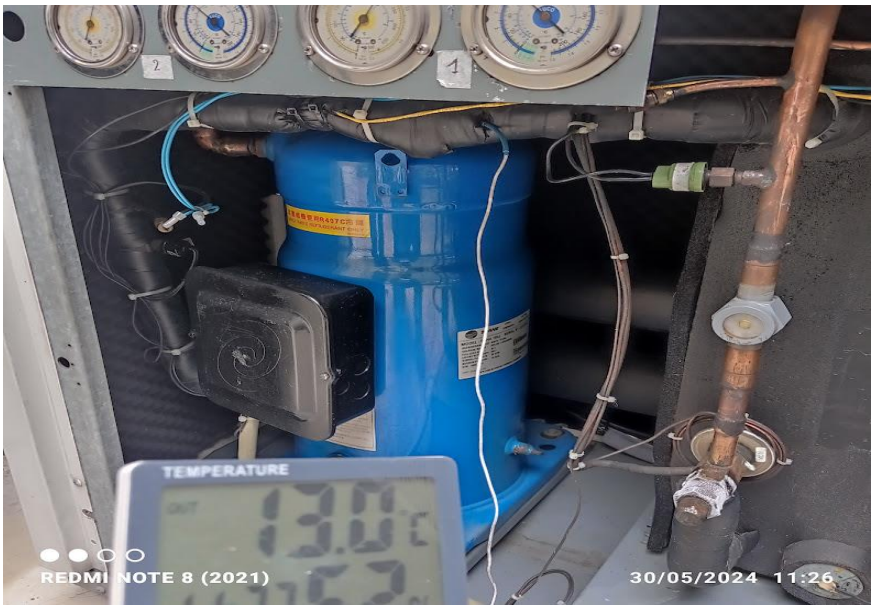

COMPRESOR 2 / BAJA 75 PSI ALTA 275 PSI:

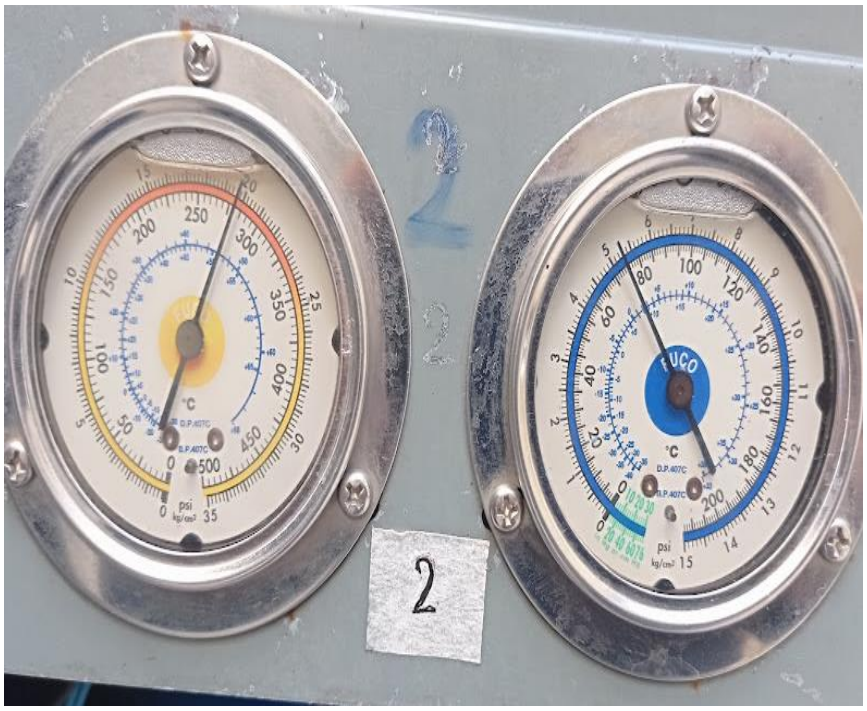


TEMP. DE SUMINISTRO AGUA 11.5 °C PSI BAJA AGUA 73 PSI:

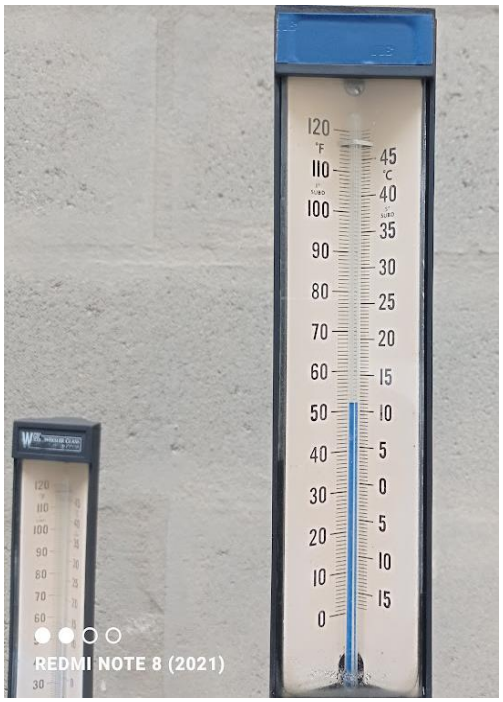



TEMP. DE RETORNO DEL AGUA 14.0 °C PSI SUCCION DEL AGUA 94 PSI:

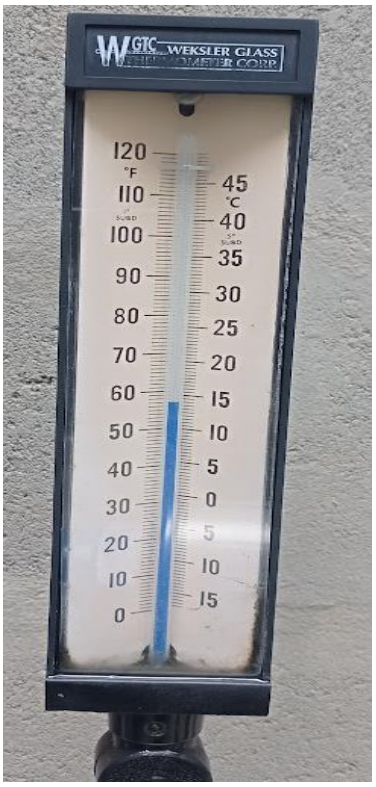



MANTENIMIENTO REALIZADO POR AIREFLEX - MAYO 2024				
ITEMS	**CHILLER**	**CONSUMO**	**NOMINAL**	**PARAMETROS**
1	Voltaje compresor 1	206 - 208 - 208	208 - 230 voltios	NORMAL
2	Voltaje compresor 2	206 - 208 - 208	208 - 230 voltios	NORMAL
3	Amperaje motor compresor 1.	36.8 – 37,7 – 43,7	64.0 amperios	NORMAL
4	Amperaje motor compresor 2.	34,5 – 40.4 – 39,8	64.0 amperios	NORMAL
5	Amperaje motor ventilador 1	4,1-4,2-3,4	4.5 C/U, amperios	NORMAL
5	Amperaje motor ventilador 2	4,9-3,4-3,1	4.5 C/U, amperios	NORMAL
6	Voltaje bomba de recirculacion del agua	203-205-204	208 - 230 voltios	NORMAL
7	Presion por alta	220	N/A	NORMAL
8	Presion por Baja	65	N/A	NORMAL
9	Amperaje bomba recirculacion del agua	7,3-7,7-8,1	208 - 230 voltios	NORMAL
11	Temperatura de suministro del agua	11,5 °C	7 - 15 °C	NORMAL
10	Presion de succion del agua	94	N/A	NORMAL
11	Temperatura de succion del agua	14 °C	7 - 15 °C	NORMAL
De acuerdo a los parametros relacionados los equipos se encuentran trabajando dentro de los parametros relacionados.				

DATA 01 FUERZA:



DURANTE:









PRODUCTO TERMINADO.





LIMPIEZA DE REJILLAS







VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:







AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR:







REGULACION TEMPERATURA 22. 10 °C / HUMEDAD RELATIVA 56%






TEMPERATURA DE SUMINISTRO 15.°C



ITEMS	DATA 01 FUERZA	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	205 - 208 -209 V	208 - 230	NORMAL
2	Amperaje motor Evaporador:	3,7 – 3.7- 3.2	6.8 amperios	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	17.6°C	12 - 18 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	22.1°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	56%	N/A	N/A
Observaciones: El equipo DATA se encuentran trabajando dentro de los parametros relacionados.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

DATA No 2 MASA Y BALANZA

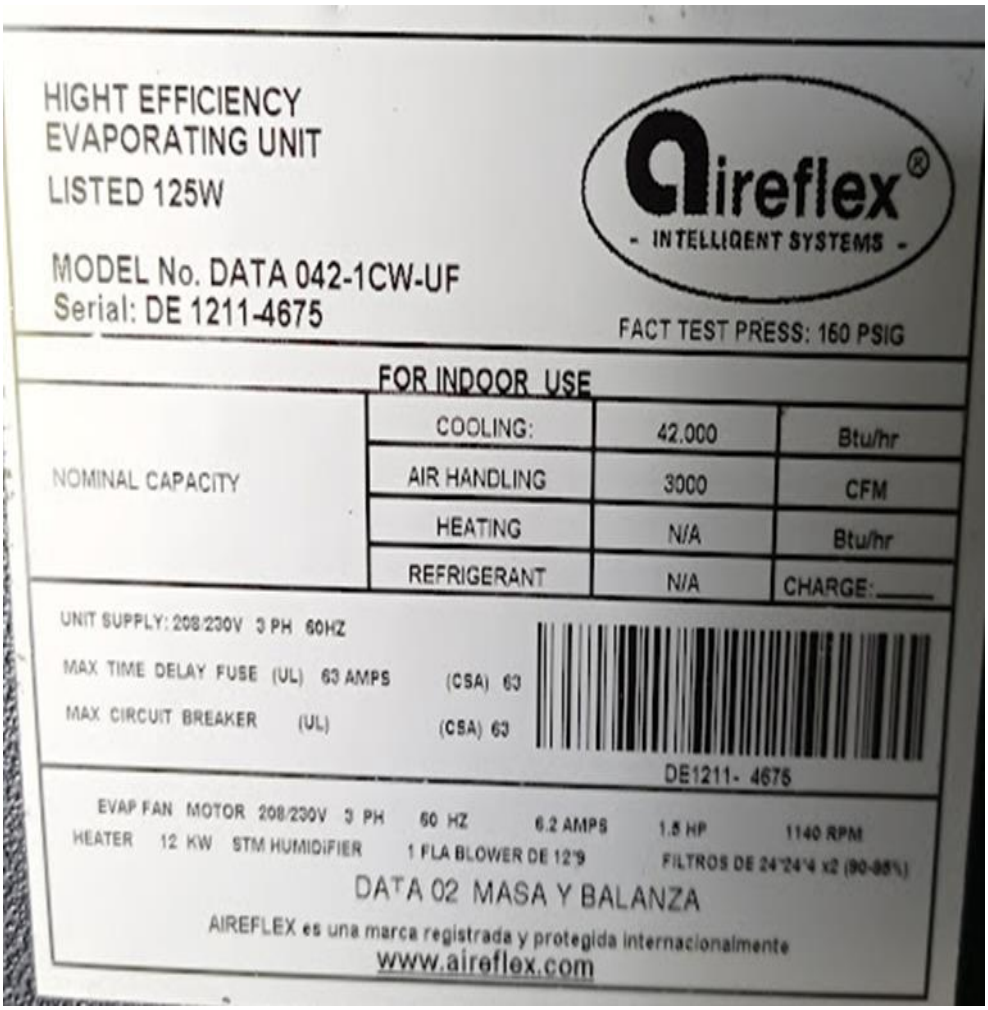

DURANTE:





LIMPIEZA DE FOLTROS MER, Y CAMBIO DE MEDIO FITRANTE





TERMINADO:





VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:








AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR:





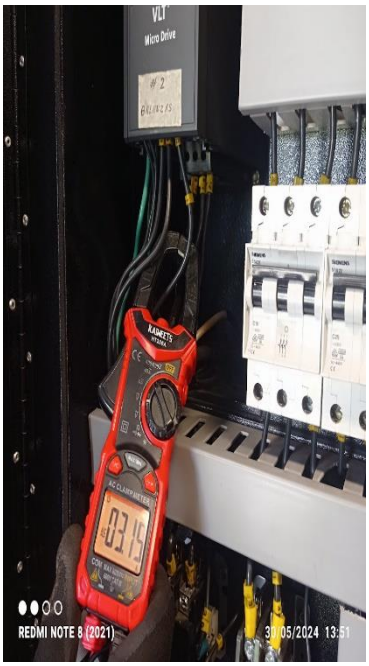

TEMPERATURA AMBIENTE 22,7°C / HUMEDAD RELATIVA 55 %





TEMPERATURA DE SUMINISTRO 15,5 °C




LIMPIEZA DE REJILLAS




ITEMS	DATA No 2 MASA Y BALANZA	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	207 – 208– 209 V	208 - 230 voltios	NORMAL
2	amperaje motor Evaporador:	1,9 - 2,3 - 3,5	(6.2 amperios)	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	15.5°C	10 - 18 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	22.0°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	57%	N/A	N/A
Observaciones: El equipo DATA se encuentran trabajando dentro de los parametros relacionados.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera.

DATA 03 CORRIENTE:

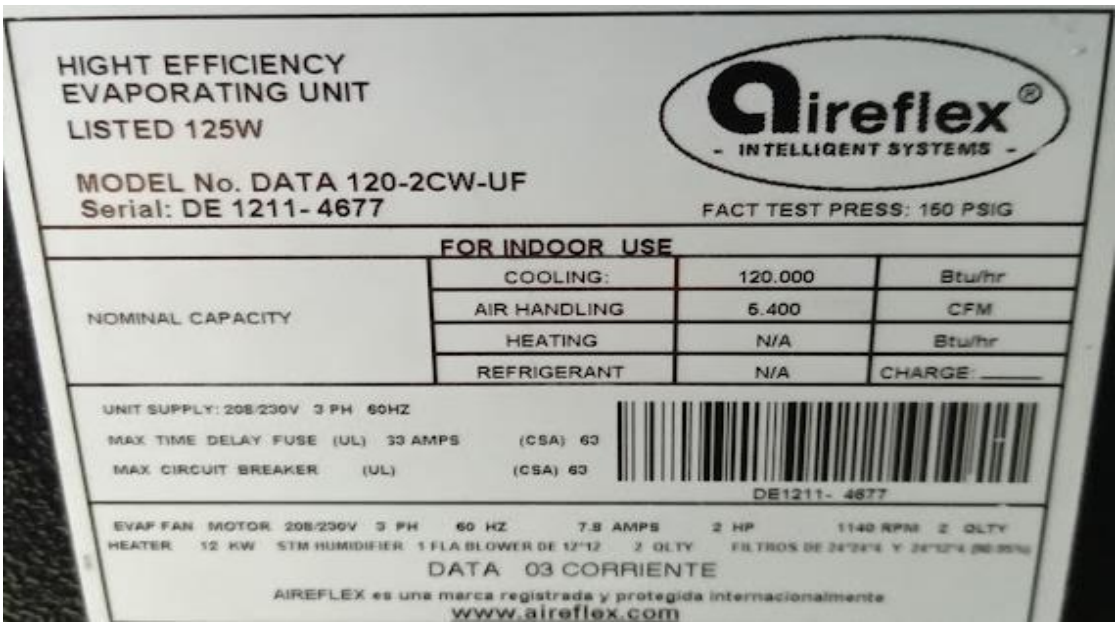


DURANTE:

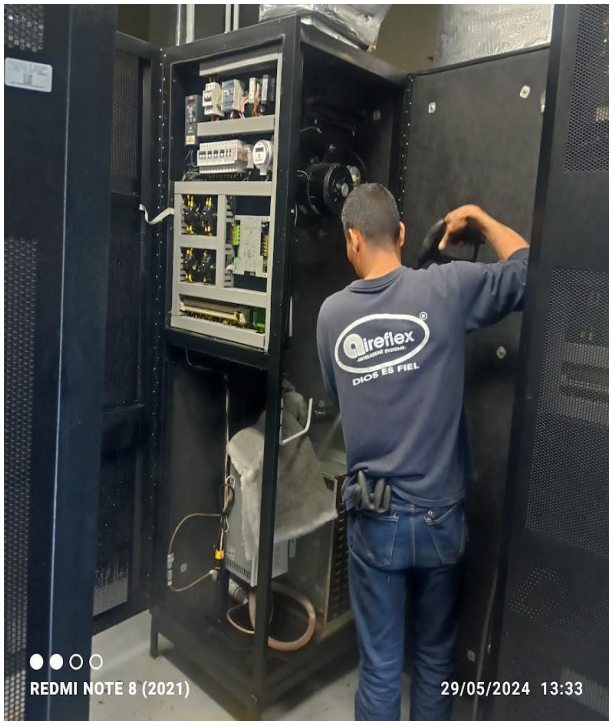



LIMPIEZA DE FOLTROS MER, Y CAMBIO DE MEDIO FITRANTE

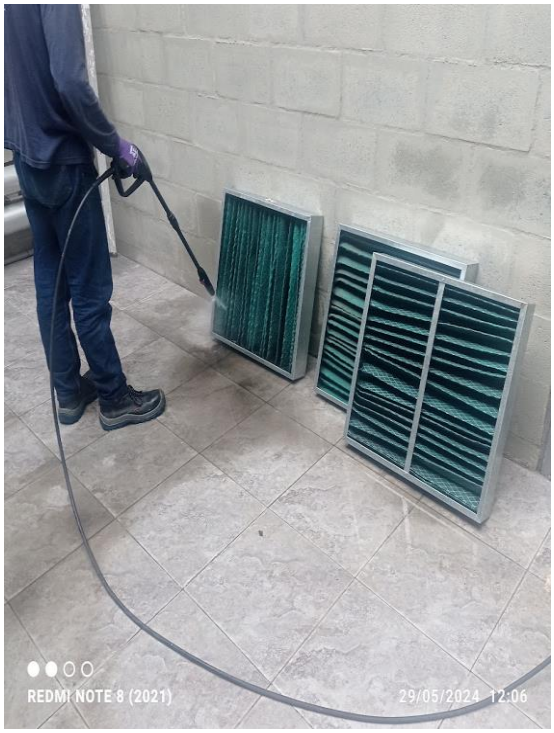



TERMINADO:







VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:







AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR 1:








AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR 2:



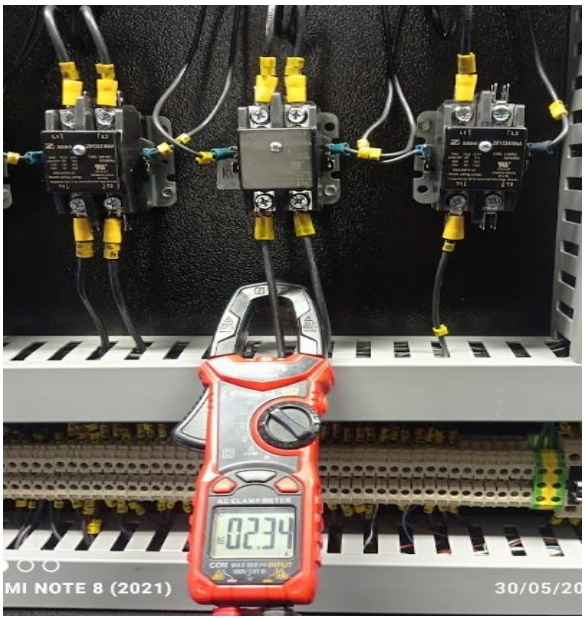


TEMPERATURA AMBIENTE 22,3°C / HUMEDAD RELATIVA 57 %





TEMPERATURA DE SUMINISTRO - LIMPIEZA DE REJILLAS




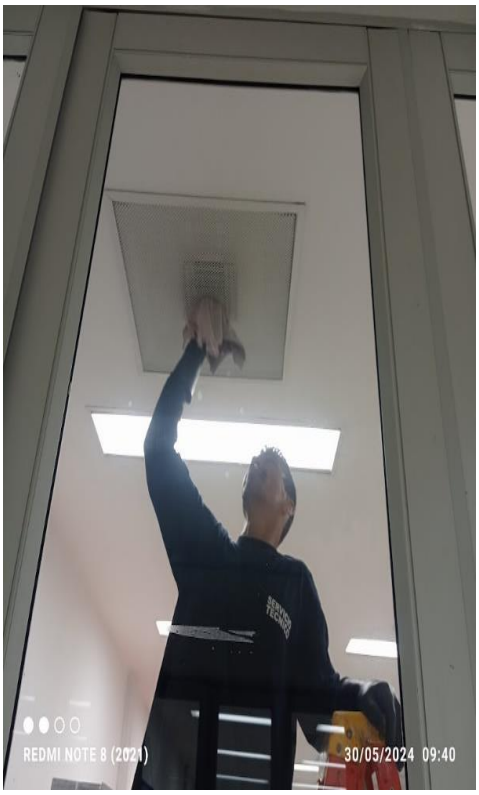


ITEMS	DATA 03 CORRIENTE	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	208 -209-210	208 - 230 voltios	NORMAL
2	Amperaje motor Evaporador: 1	6,5 - 6,02- 6,2 /	6.2 amperios	NORMAL
2	Amperaje motor Evaporador:2	2,2 - 2,3	N/D	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	15,5 °C	10 - 18 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	22,3 °C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	57%	N/A	N/A
Observaciones: El equipo DATA se encuentran trabajando dentro de los parametros relacionados.				


Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

DATA 04 TIEMPO Y FRECUENCIA:

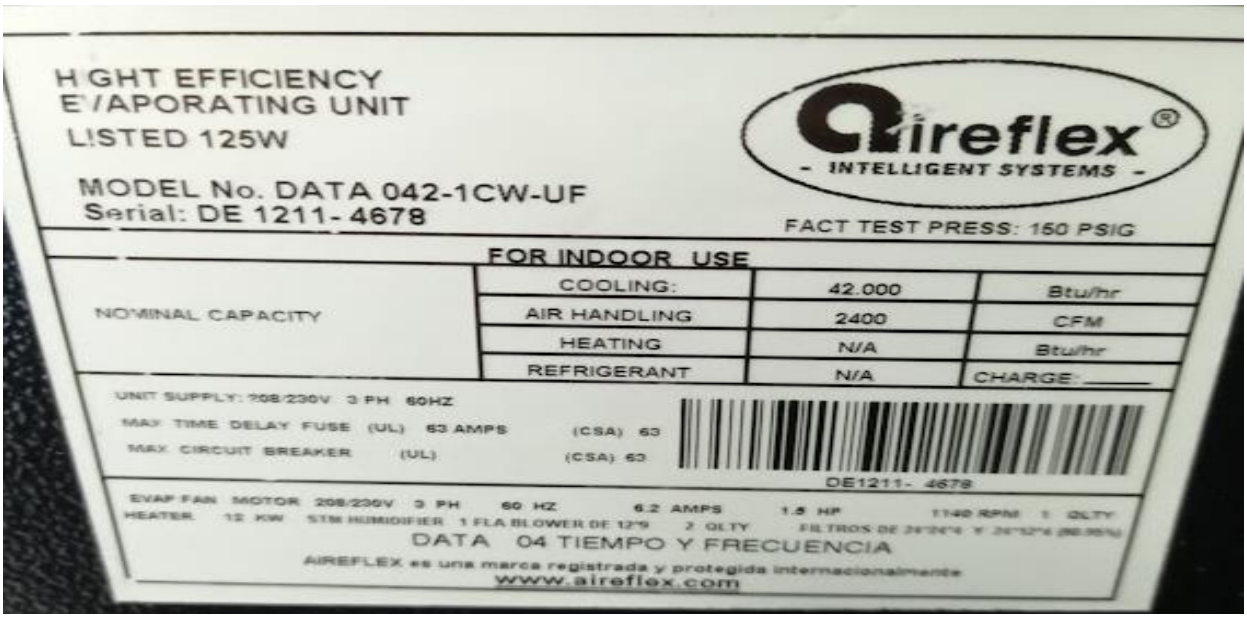

DURANTE:

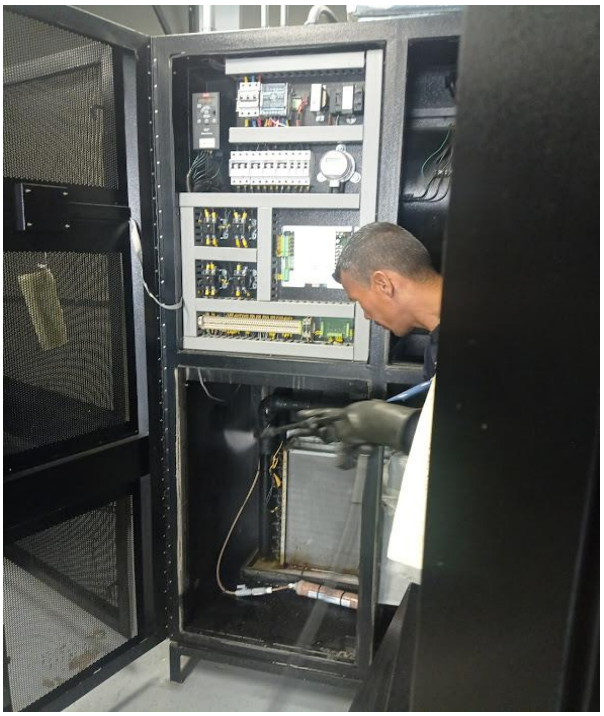

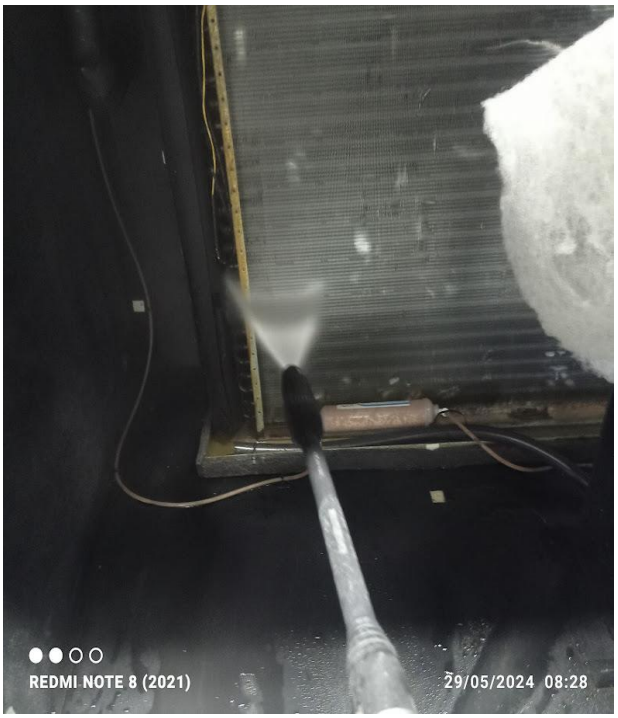





LIMPIEZA DE REJILLAS





TERMINADO:





VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:








AMPERAJE MOTOR VENTILADOR:



REGULACION TEMPERATURA 22.2°C – HUMEDAD RELATIVA 51 %




TEMPERATURA DE SUMINISTRO: 18.3 °C

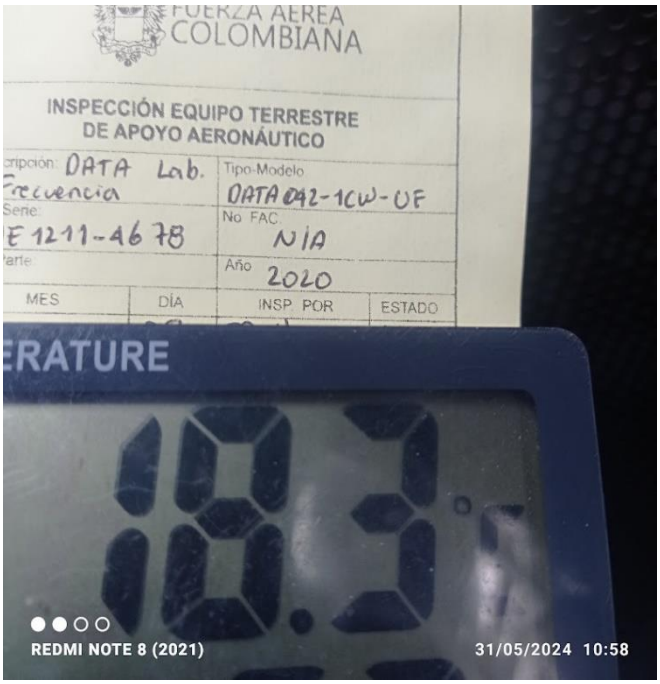

ITEMS	DATA 04 TIEMPO Y FRECUENCIA	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	207 -202-208	208 - 230 voltios	NORMAL
2	amperaje motor Evaporador:	4,8 - 4,7- 4,7	5.7 ampererios	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	18.2°C	10 - 18 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	21.2°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	51%	N/A	N/A
Observaciones: El equipo DATA se encuentran trabajando dentro de los parametros relacionados.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

DATA 05 DIMENCIONAL:

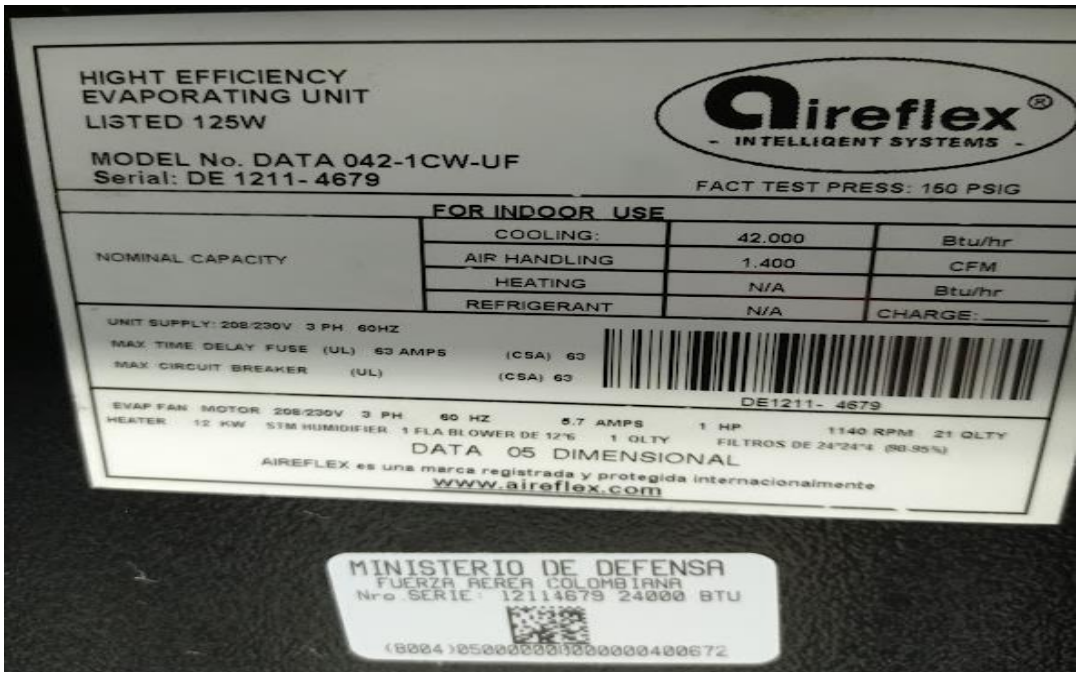

DURANTE:





TERMINADO:











LIMPIEZA DE REJILLAS



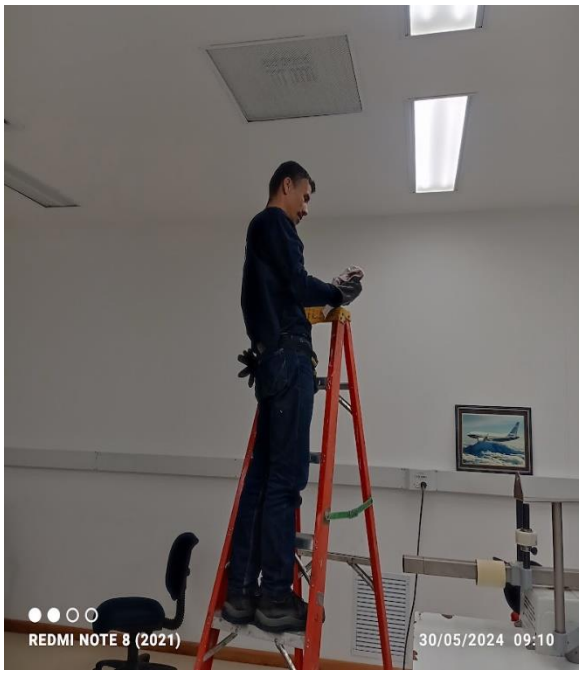

VOLTAJE MOTOR EVAPORADOR:



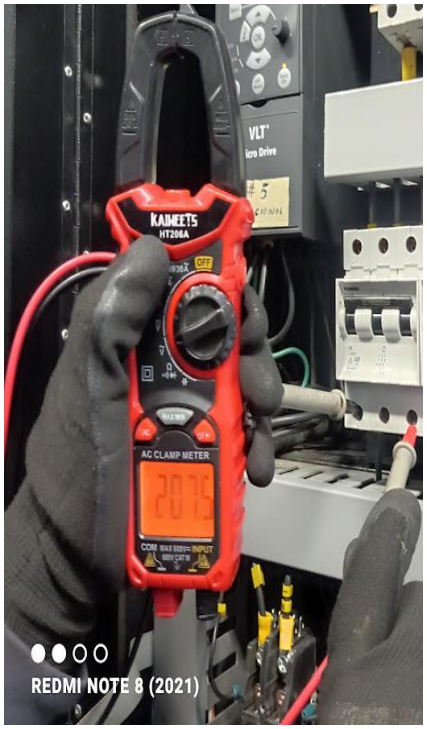



AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR:







REGULACION TEMPERATURA 23.3°C - HUMEDAD RELATIVA 55 %






TEMPERARTURA DE SUMINISTRO



ITEMS	DATA 05 DIMENCIONAL	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	208 – 207-206 V	208 - 230 voltios	NORMAL
2	amperaje motor Evaporador:	2,5 -2,5- 3,1	5.7 amperios	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	18.3. °C	10 - 18 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	23.3°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	55%	N/A	N/A
Observaciones: El equipo DATA se encuentran trabajando dentro de los parametros relacionados.				


Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

DATA 06 PRESION:

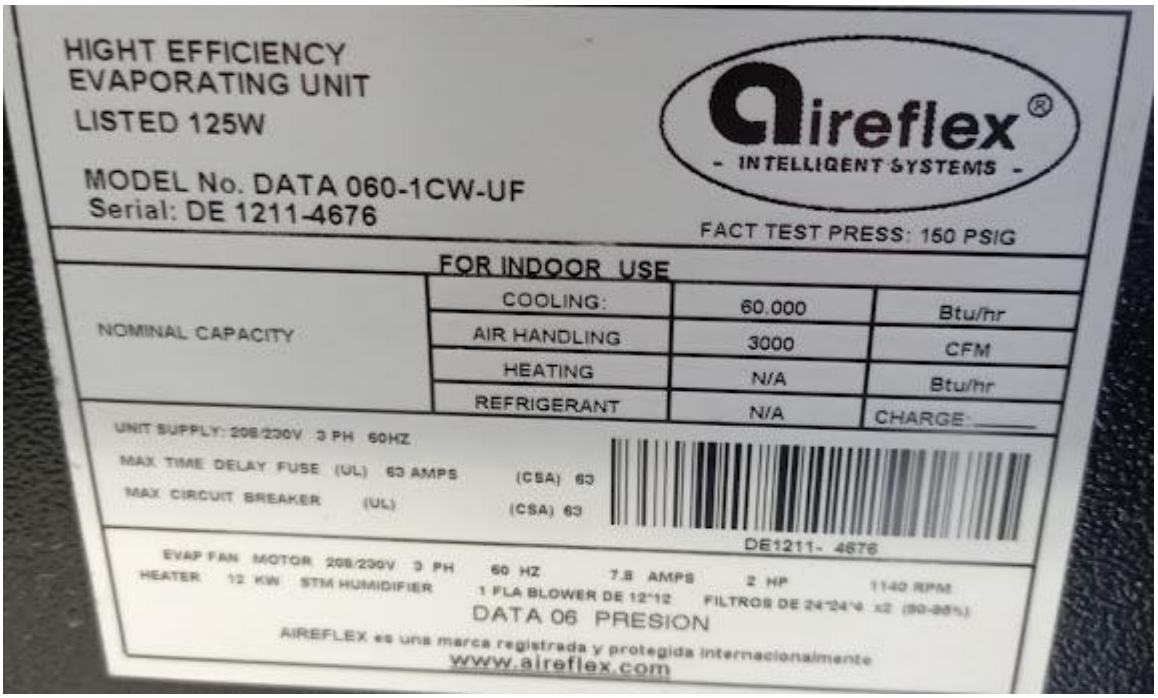

DURANTE:



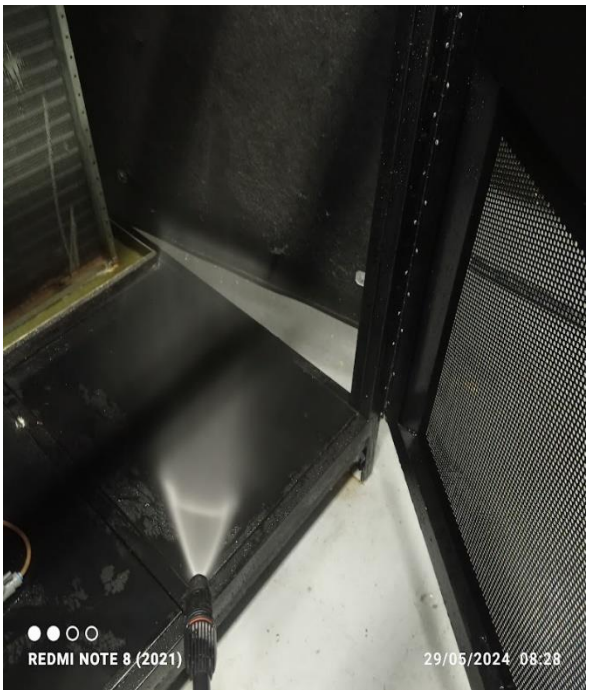

LIMPIEZA DE FOLTROS MER, Y CAMBIO DE MEDIO FITRANTE






PRODUCTO TERMINADO





LIMPIEZA DE REJILLAS



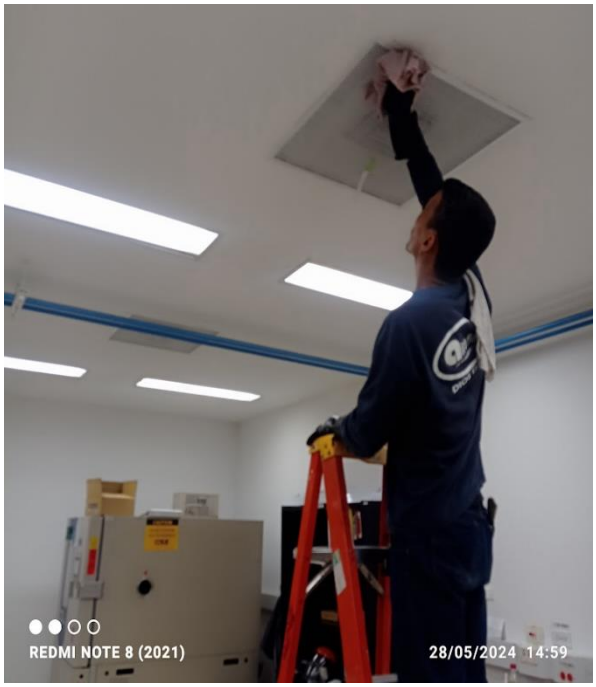

VOLTAJE MOTOR VAPORADOR:








AMPERAJE MOTOR EVAPORADOR:





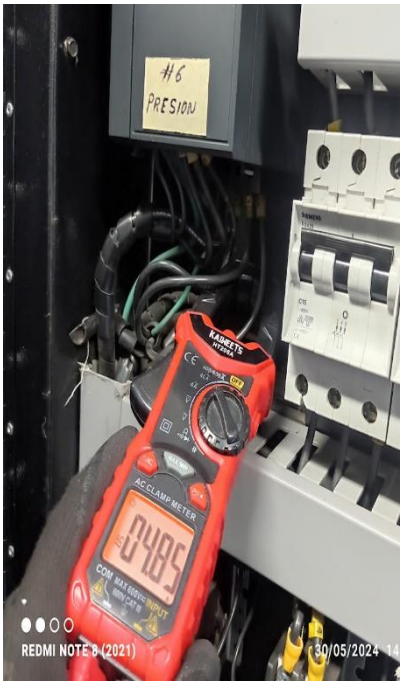

REGULACION TEMPERATURA 22°C - HUMEDAD RELATIVA 59 %





NN

TEMPERATURA DE SUMINISTRO: 18.3 °C




ITEMS	DATA 06 RESION	CONSUMO	NOMINAL	PARAMETROS
1	Voltaje motor Evaporador:	206 – 206 – 207	208 - 230 voltios	NORMAL
2	amperaje motor Evaporador:	5.2 – 5,2- 4,8	7.8 amperios	NORMAL
3	Temperatura de suministro de aire	17.2°C	10 - 13 °C	NORMAL
4	Temperatura Interna o ambiente	22,4°C	20 - 26 °C	NORMAL
5	Humedad Relativa:	59%	N/A	N/A
Observaciones: El equipo DATA se encuentran trabajando dentro de los parametros relacionados.				

Se recomienda continuar con la ejecución del servicio de mantenimiento preventivo de manera periódica.

Una vez más quedamos a su entera disposición, atentos a aclarar cualquier inquietud que pueda presentárseles al respecto.

Cordialmente.

AIREFLEX DE COLOMBIA SAS.



ALADINO TORRES VEGA.
Coordinador de Mantenimiento.

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE:	P. A. C		C.C.:		28 05 24
SEDE:	MADRID	CONTACTO		TELEFONO	
DIRECCIÓN:	BOSC ALEGRE Madrid	CIUDAD:	BOG	MADRID	

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATA #1	LABORATORIO FUERZA		A.TOPPKY	PHM 042 1CW	DE1211-4680
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
		Patio	Trane	CGAM2002EBW9X	2A0612-00229

SECCIÓN EVAPORADORA	SI	NO
Voltaje manejadora	205, 208, 209	
Lavado de serpentín	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor manejadora	6,8	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
3,79	-	3,79	-	3,82	-

SECCIÓN CONDENSADORA	SI	NO
Voltaje condensadora	206, 208, 209	
Lavado de serpentín	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Ajuste de conexiones eléctricas	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor ventiladora	9.	
Nominal motor compresor	(2) 6,4,8	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
4,16	4,9	4,26	3,4	3,40	3,1

Amperajes de Operación de Compresores

L1		L2		L3	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2
36,8	34,5	37,7	40,4	39,8	43,7

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	DVA 043	25-10-17
Manómetro refrigeración	/	/
Termohigrometro	/	/
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	SI	NO
Voltaje del equipo		✓
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
+	-	+	-	+	-

SISTEMA ELÉCTRICO		
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓	
Revisión contadores y relevos	✓	
Regulación de termostato		
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	✓ SI	NO
Ajuste y soporteria	✓	
Revisión de fugas de aire	✓	
Limpieza de difusores y rejillas	✓	
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	✓ SI	NO
Revisión de fugas	✓	
Revisión filtro secador y mirilla	✓	
Revisión de aislamientos	✓	
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	✓ SI	NO
Temperatura de succión	13°C, 13,0°C	
Temperatura de suministro de aire	13,6°C	
Temperatura interna o ambiente	22,0°C	
Humedad relativa	56%	

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	✓ SI	NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	SI	✓ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	SI	✓ NO

En caso de encontrar anomalias en estos items cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
7:15	Oswaldo Cogollo Guillermo Estrada
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
16:00	

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

Nota: pendiente informe detallado sistema control equipo y analisis recambio de los filtros internos

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE:	P. A. C	C.C.:		28 05 24	
SEDE:	Madrid	CONTACTO		TELEFONO	
DIRECCIÓN:	Base Aerea	CIUDAD:	Madrid		

ID SISTEMA	DEPENDENCIA	MARCA	MODELO	SERIE
DATA A2	Laboratorio MASAS	Aireflex	DATA #42 CU	DE1211-4695
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
		patio	Trane	CYAM200E3WQR	2A0617-00274

SECCIÓN EVAPORADORA	☑ SI	☐ NO
Voltaje manejadora	207, 208 208	
Lavado de serpentín	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor manejadora	6,2	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
7.4	9	2,39		3,15	

SECCIÓN CONDENSADORA	☑ SI	☐ NO
Voltaje condensadora	206, 208 20	
Lavado de serpentín	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Ajuste de conexiones eléctricas	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor ventiladora	9 ✓	
Nominal motor compresor	(2) 64.8	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
4.16	4.9	4.26	3.4	39.8	3,1

Amperajes de Operación de Compresores

L1		L2		L3	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2
36.8	34.5	37.7	40.4	39.8	43.7

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS		
Instrumento	**Código**	**Fecha**
Pinza voltiamperimetrica	pvm 043	25-10-17
Manómetro refrigeración	/	/
Termohigrometro	/	/
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☐ SI	☒ NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		✓
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

SISTEMA ELÉCTRICO		
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes		✓
Revisión contadores y relevos		✓
Regulación de termostato		
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☑ SI	☐ NO
Ajuste y soporteria		✓
Revisión de fugas de aire		✓
Limpieza de difusores y rejillas		✓
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☑ SI	☐ NO
Revisión de fugas		✓
Revisión filtro secador y mirilla		✓
Revisión de aislamientos		✓
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☐ SI	☐ NO
Temperatura de succión	11,2 , 13 °C	
Temperatura de suministro de aire	15, 5 °C	
Temperatura interna o ambiente	22,7 B °C	
Humedad relativa	57,8%	
REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES	
¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☑ NO

En caso de encontrar anomalias en estos Items cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
09:15	Oswaldo Cajal, Guillermo Sirlo
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
16:00	

T J Cámeno Tobia

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

78256

REVISADO

Nota: pendiente informe detallado estado del equipo y analisis recambio de los filtros interno.

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE:	F. A. C		C.C.:		30 05 24
SEDE:	Madrid	CONTACTO		TELEFONO	
DIRECCIÓN:	Base Aerea.		CIUDAD:	Madrid.	

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
DATA #3	Laboratorio Corriente		Aireflex	DATA 120 ICW	DE7217-4877
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
		Patio	Trane	CGAK200EBWGR	2A0612.00274

SECCIÓN EVAPORADORA	☑ SI	☐ NO
Voltaje manejadora	208, 209, 210	
Lavado de serpentín	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornilleria	✓	
Nominal motor manejadora	6,2 A	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
6,05	2,21	6,27	2,34	6,29	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

SECCIÓN CONDENSADORA	☑ SI	☐ NO
Voltaje condensadora	208, 209, 210	
Lavado de serpentín	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Ajuste de conexiones eléctricas	✓	
Ajuste estructural y tornilleria	✓	
Nominal motor ventiladora	9 ✓	
Nominal motor compresor	(2) 64.8	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
4.16	4.9	4.26	3.4	3.40	3.1
V1	V2	V1	V2	V1	V2

Amperajes de Operación de Compresores

L1				L2				L3			
36.8		34.5		37.7		40.4		39.6		43.7	
Comp1		Comp2		Comp1		Comp2		Comp1		Comp2	

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 043	25-10-17
Manómetro refrigeración	/	/
Termohigrometro	/	/
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☐ SI	☑ NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		/
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		/
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
	/		/		/
V1	V2	V1	V2	V1	V2

SISTEMA ELÉCTRICO		
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes		✓
Revisión contadores y relevos		✓
Regulación de termostato		
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☑ SI	☐ NO
Ajuste y soporteria		✓
Revisión de fugas de aire		✓
Limpieza de difusores y rejillas		✓
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☑ SI	☐ NO
Revisión de fugas		✓
Revisión filtro secador y mirilla		✓
Revisión de aislamientos		✓
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☑ SI	☐ NO
Temperatura de succión	11.2	13°C
Temperatura de suministro de aire	16.5°C	
Temperatura interna o ambiente	22,3°C	
Humedad relativa	58.5%	

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☐ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☑ NO

En caso de encontrar anomalias en estos items cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s): Oswaldo Cogollo, Guillermo Sierra
Hora fin del Servicio:	Revisión Coordinador:

TS Camelo Lobo

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

78257

REVISADO EL [illegible]

Nota: Producto interno dañado estado del equipo y ordenar recambio de los tubos interno

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE:	F. A. C			C.C.:		29	05	24
SEDE:	Madrid	CONTACTO		TELEFONO			
DIRECCIÓN:	Base Aerea	CIUDAD:	Madrid				

ID SISTEMA	DEPENDENCIA	MARCA	MODELO	SERIE
DATA N° 4	DATA Frecuencia	Aireflex	DATA 042 1CW	DE1111-4678

DATOS EQUIPOS	ID EQUIPOS	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE
		Patio	Trane	CGAK2004EBW7B	2A0641 00274

SECCIÓN EVAPORADORA	☐ SI	☐ NO
Voltaje manejadora	207, 207, 207	
Lavado de serpentín	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor manejadora	5.7 A	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
4.8	-	4.7	-	4.7	-

SECCIÓN CONDENSADORA	☐ SI	☐ NO
Voltaje condensadora	206, 208, 208	
Lavado de serpentín	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Ajuste de conexiones eléctricas	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor ventiladora	9.0	
Nominal motor compresor	64.8	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
4.16	4.9	4.26	3.4	3,40	3,1

Amperajes de Operación de Compresores

L1		L2		L3	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2
36.8	34.5	37.7	40.4	39.8	43,7

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS		
Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVA 041	25-10-17
Manómetro refrigeración		
Termohigrometro	/	/
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☐ SI	☒ NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	✓
Regulación de termostato	
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☑ SI ☐ NO
Ajuste y soporteria	✓
Revisión de fugas de aire	✓
Limpieza de difusores y rejillas	✓
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☑ SI ☐ NO
Revisión de fugas	✓
Revisión filtro secador y mirilla	✓
Revisión de aislamientos	✓
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☑ SI ☐ NO
Temperatura de succión	11,2 °C 13,0 °C
Temperatura de suministro de aire	18,1
Temperatura interna o ambiente	21,2 2
Humedad relativa	57,7 %

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☑ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☑ NO

En caso de encontrar anomalias en estos items cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
07:15	Oswaldo Cogollo Guillermo Ortiz
Hora fin del Servicio:	Revisión Coordinador:
16:00	

TT Comercio Fabio
NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

78259

RECHAZADO

Nota: Puede tener fallas estando el equipo

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE:	F.A.C			C.C.:		29 05 24
SEDE:	Madrid	CONTACTO		TELEFONO		
DIRECCIÓN: Base Acuartelamiento		CIUDAD: Madrid				

ID SISTEMA	DEPENDENCIA	MARCA	MODELO	SERIE
DATA N: 5	Laboratorio Dimensional	Aireflex	DATA 042 ICW	561211-4679
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
		Patio	Trane	CGAK2002EB/JA	210612-00227

SECCIÓN EVAPORADORA	☑ SI	☐ NO
Voltaje manejadora	208, 207, 206	
Lavado de serpentín	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor manejadora	5,19	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
2,5	1 -	2,52	-	3,11	-

SECCIÓN CONDENSADORA	☑ SI	☐ NO
Voltaje condensadora	206, 208, 208	
Lavado de serpentín	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Ajuste de conexiones eléctricas	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor ventiladora	0,4	
Nominal motor compresor	64.8	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
4.16	4.7	4.26	3,4	3.40	3,4

Amperajes de Operación de Compresores

L1		L2		L3	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2
36.8	34,5	37,7	40.4	39.8	43,7

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PVM 043	25-10-17
Manómetro refrigeración		
Termohigrometro	/	/
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☐ SI	☒ NO
Voltaje del equipo		✓
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
-	-	-	-	-	-

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	✓
Regulación de termostato	

DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☑ SI	☐ NO
Ajuste y soporteria	✓	
Revisión de fugas de aire	✓	
Limpieza de difusores y rejillas	✓	

CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☑ SI	☐ NO
Revisión de fugas	✓	
Revisión filtro secador y mirilla	✓	
Revisión de aislamientos	✓	

CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☑ SI	☐ NO
Temperatura de succión	11,2	13,0 °C
Temperatura de suministro de aire	18.3 °C	
Temperatura interna o ambiente	23,3 °C	
Humedad relativa	55,7 %	

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES

	☑ SI	☐ NO
¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	✓	
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?		✓
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?		✓

En caso de encontrar anomalias en estos items cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
07:15	Oswaldo Cajal, Guillermo Siegel
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
16:00	

J. Conesa Rebu

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

78260

REVISADO

Nota: Reporte interno detallado estado del equipo

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE:	F. A. C		C.C.:		30 05 24
SEDE:	Madrid.	CONTACTO		TELEFONO	
DIRECCIÓN:	Lucca Acreg	CIUDAD:	Madrid.		

ID SISTEMA	DEPENDENCIA		MARCA	MODELO	SERIE
Data H6	Laboratorio	PRESION	Aireflex	DATA 060 · ICW	D61211-4676
DATOS EQUIPOS	**ID EQUIPOS**	**UBICACIÓN**	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**
		patio	Trane	CGAK200E3WG	2A06T2.00324

SECCIÓN EVAPORADORA	☑ SI	☐ NO
Voltaje manejadora	206, 206, 208	
Lavado de serpentin	✓	
Limpieza y purga de desagües	✓	
Limpieza de bandeja de condensados	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Cambio de filtros de aire	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor manejadora	7.8	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
5,29	-	5,27	-	4.85	-

SECCIÓN CONDENSADORA	☑ SI	☐ NO
Voltaje condensadora	206, 208, 208	
Lavado de serpentín	✓	
Revisión de fugas	✓	
Limpieza de ejes	✓	
Ajuste de conexiones eléctricas	✓	
Ajuste estructural y tornillería	✓	
Nominal motor ventiladora	9.01	
Nominal motor compresor	64.8	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
4.19	4.9	4.26	3.4	3.40	3.1

Amperajes de Operación de Compresores

L1		L2		L3	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2
26,8	34,5	33,7	40.4	39.8	43,7

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	PUN 093	25-11-17
Manómetro refrigeración	/	/
Termohigrometro	/	/
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☐ SI	☒ NO
Voltaje del equipo		
Lavado del equipo		
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornilleria y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	✓
Regulación de termostato	

DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☑ SI	☐ NO
Ajuste y soporteria	✓	
Revisión de fugas de aire	✓	
Limpieza de difusores y rejillas	✓	

CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☑ SI	☐ NO
Revisión de fugas	✓	
Revisión filtro secador y mirilla	✓	
Revisión de aislamientos	✓	

CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☐ SI	☐ NO
Temperatura de succión	11,2 °C	13 °C
Temperatura de suministro de aire	17,2 °C	
Temperatura interna o ambiente	22,4 °C	
Humedad relativa	59,2 %	

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☐ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☑ NO

En caso de encontrar anomalias en estos items cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s)/Técnico(s):
07:15	Oswaldo Cajamarca Guillermo Stopel
Hora fin del Servicio:	**Revisión Coordinador:**
16:00	

TS Camilo Tebo

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

78261

Impresos por: Tránsito Galtán • C.C.51.714.580 • Cel.: 315 702 60 04

Nota: Pendiente informe estado del equipo

M.B.

Aireflex	INFORME DE MANTENIMIENTO	FR06-02
	MANTENIMIENTO	Versión: 15

CLIENTE:	F. A. C			C.C.:		21705	24
SEDE:	Madrid.	CONTACTO		TELEFONO			
DIRECCIÓN:	Base Aereq	CIUDAD:	Madrid.				

ID SISTEMA	DEPENDENCIA	MARCA	MODELO	SERIE
Chiller	Laboratorios	Trane	RAK200ZEBWQRHB	210672-00224

DATOS EQUIPOS	ID EQUIPOS	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE
		patio	Trane		
7	1	7	1	1	1

SECCIÓN EVAPORADORA	☐ SI	☒ NO
Voltaje manejadora		/
Lavado de serpentín		/
Limpieza y purga de desagües		/
Limpieza de bandeja de condensados		/
Revisión de fugas		/
Limpieza de ejes		/
Cambio de filtros de aire		/
Ajuste estructural y tornillería		/
Nominal motor manejadora	64.8	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
+		+		+	

SECCIÓN CONDENSADORA	☐ SI	☒ NO
Voltaje condensadora	206 208 208	
Lavado de serpentín		/
Revisión de fugas		/
Limpieza de ejes		/
Ajuste de conexiones eléctricas		/
Ajuste estructural y tornillería		/
Nominal motor ventiladora	90	
Nominal motor compresor	64.8	

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
4.16	4.9	4.26	3.4	3.40	3.1

Amperajes de Operación de Compresores

L1		L2		L3	
Comp1	Comp2	Comp1	Comp2	Comp1	Comp2
36.8	34.5	39.7	40.4	37.8	43.7

TRAZABILIDAD DE INSTRUMENTOS

Instrumento	Código	Fecha
Pinza voltiamperimetrica	pza 093	25-10-17
Manómetro refrigeración	/	/
Termohigrometro	/	/
Otros:		

VENTILACIÓN Y/O EXTRACCIÓN	☐ SI	☑ NO
Voltaje del equipo	Noto Bomba.	
Lavado del equipo	203, 205, 207	
Lubricacion de rodamientos y ejes		
Cambio de filtros de aire		
Ajuste estructural, tornillería y correas		
Nominal motor equipo		

Amperajes de Operación de Motores

L1		L2		L3	
V1	V2	V1	V2	V1	V2
7.37	-	6.82	-	5.08	-

SISTEMA ELÉCTRICO	
Limpieza y revisión tablero, cableado y bornes	✓
Revisión contadores y relevos	✓
Regulación de termostato	- N. A.
DUCTOS, DIFUSORES Y REJILLAS	☑ SI ☐ NO
Ajuste y soporteria	✓
Revisión de fugas de aire	✓
Limpieza de difusores y rejillas	- -
CIRCUITO Y TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN	☐ SI ☒ NO
Revisión de fugas	
Revisión filtro secador y mirilla	/
Revisión de aislamientos	
CONDICIONES TERMODINÁMICAS	☐ SI ☒ NO
Temperatura de succión	11.2 13°C
Temperatura de suministro de aire	/
Temperatura interna o ambiente	/
Humedad relativa	/

REPUESTOS SUMINISTRADOS	# REMISIONES

¿EL EQUIPO QUEDA EN OPERACIÓN NORMAL?	☐ SI	☐ NO
¿SE EVIDENCIAN FALLAS DEL VOLTAJE?	☐ SI	☑ NO
¿SE PRESENTARON DAÑOS DURANTE EL MANTENIMIENTO?	☐ SI	☑ NO

En caso de encontrar anomalias en estos items cuales son las acciones y oportunidades de mejora a tomar (Fr06-03)

Hora Inicio del servicio:	Nombre(s) Técnico(s):
07:15	Oswaldo Castillo Guillermo Salcedo
Hora fin del Servicio:	Revisión Coordinador:
16:00	

TS Camilo Febio [signature]

NOMBRE, FIRMA, CARGO Y SELLO

78262

REVISADO [illegible] Nota parcial informe detallado estado del equipo

Aireflex
INTELLIGENT SYSTEMS

SISTEMAS INTELIGENTES DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECANICA FILTRACION ABSOLUTA CONTROL DE HUMEDAD RELATIVA CENTROS DE COMPUTO.

CALLE 21 44-30 Tel. 2958548 Fax: 4104300 Bogotá, D.C., Colombia

SALIDA DE ALMACEN

MATERIAL ENTREGADO A TRANSPORTADOR

No. IVA 19429

SEÑOR (ES): FAC COMANDO AEREO DE MANTENIMIENTO

FECHA: 24-may-24

DIRECCIÓN: CR 5 2 SUR 91

CIUDAD: Madrid

TÉCNICO: GUILLERMO SIBATO

CONTRATO: FAC MADRID

COTIZACION:

DESPACHAMOS A UD.(S) LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS

C.Costos	REFERENCIA	CANT	UND	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	BODEGA	N° SERIE
4840014 001 FAC	GT MTTYTX 0200 PLSTR	4,70	m	GUATA MOTTYTEX 0200 POLIESTER	uno	3 UND DE 60 X 60 CMS/ 2 UND DE 60 X 1,00 CMS/ 2 UND DE 90 X90 CMS/ 1 UND DE 1,00 X 70 CMS
4840014 001 FAC	DTRGNT PLV	1,00	kg	DETERGENTE EN POLVO	uno	
4840014 001 FAC	DSNGRSNT HDRSLBL AG	2,00	l	DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE AGUA ORGANICA	uno	

OTROS MATERIALES DESPACHADOS:

OBSERVACIONES:

RECIBIDO POR:	DESPACHADO POR: MAGDA CALDERON	TRANSPORTADO POR:	ELABORADO POR: MAGDA CALDERON
			AUTORIZADO POR:

24-05-24

TS Corrected Febru
