SNR **SUPERINTENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO**	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)."	**CONSORCIO SEDE MARSAF**
	CONTRATO 2391 DE 2023	**PERIODO DEL INFORME:** 05/02/2024 –24/02/2024

INFORME MENSUAL N°2

"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)."

CONTRATISTA: CONSORCIO SEDE MARSAF

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERAGRUPACIONES

REALIZADO POR: JOSÉ LUIS OROS ACEVEDO

FEBRERO 2024

Contenido

INTRODUCCIÓN 3
1. OBJETIVO 4
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 5
2.1. LOCALIZACIÓN 5
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
3. INFORMACIÓN DE CONTRATO 6
3.1. CONTRATO DE OBRA 6
3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.2.1 POLIZAS DE LEGALIZACIÓN 7
3.2.2 POLIZAS SEGÚN PRORROGA No.1 8
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 9
4.1. PERSONAL EN OBRA 9
4.1.1. PERSONAL PROFESIONAL 9
4.2. ESTADO FINANCIERO 9
4.3. CANTIDAD DE OBRA EJECUTADAS 10
4.3.1 CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA 1ER CORTE (30%) 10
4.3.2 CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA 2DO CORTE (30%) 12
4.3.3 CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA 3ER CORTE (30%) 13
4.3.4 CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA 4TO CORTE (10%) 15
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENRALES 17

INTRODUCCIÓN

Con el fin de "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)." se suscribe el contrato 2391 de 2023, entre Superintendencia de notariado y registro y Consorcio sede MARSAF, con el propósito de continuar con la conservación y el mantenimiento de la infraestructura de los centros regionales a Nivel Nacional, específicamente en las sedes de: La Plata, Chaparral, Espinal, Melgar, Guaduas, La mesa, Pacho, Zipaquirá, Gacheta, Cachira y Chiquinquirá.

Con el fin de realizar la supervisión, seguimiento y control a las actividades, se evidencia el presente informe de avance mensual por Consorcio sede MARSAF a la Superintendencia de notariado y registro en la sede de Cachira con una descripción y análisis de las actividades ejecutadas en el periodo comprendido del mes de FEBRERO.

1. OBJETIVO

Realizar el mantenimiento locativo, preventivo y correctivo a todo costo incluido, a los bienes que tiene en uso la unidad y los inmuebles donde funciona, ubicados en la sede de Cachira, sedes administrativas, centros regionales y puntos de atención de conformidad con el anexo no. 1 – especificaciones técnicas mínimas.

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar diagnósticos de obra con el fin de determinar actividades a ejecutar
- Ejecutar las actividades de obra de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas y al cronograma de obra.
- Presentar balances de obra teniendo en cuenta los cambios que se pueden presentar en el desarrollo del contrato.
- Elaborar informes periódicos de avance en ejecución y control de obra con su respectivo registro fotográfico.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

La Superintendencia de notariado y registro es una entidad pública, reconocida como una unidad administrativa especial con personería jurídica y patrimonio autónomo; cuenta con diferentes sedes regionales a nivel nacional.

2.1. LOCALIZACIÓN

La localización del proyecto corresponde a la sede la Superintendencia de notariado y registro de Cachira, ubicada en la Calle 6 No. 5 – 21 Cachira (Norte de Santander).



2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene como objeto de "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)", el cuál como se menciona, se realizará en las sedes del territorio nacional específicamente en 11 Sedes Regionales ubicadas en los departamentos de Huila, Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander. Estas sedes se dividen tal como se indica en la siguiente tabla:

ZONA POR INTERVENIR	DEPARTAMENTOS DE ZONA
La plata	Huila
Chaparral	Tolima
Espinal	
Melgar	
Guaduas	Cundinamarca
La mesa	
Pacho	
Zipaquirá	
Gacheta	
Chiquinquirá	Boyacá
Cachira	Norte de Santander

3. INFORMACIÓN DE CONTRATO

3.1. CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	2391 DE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO SEDE MARSAF
REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA
NIT	901.762.215-4
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACION YMEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA" 1)
VALOR INICIAL	$ 600.182.493,03
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Dos (2) meses y Veinte (20) días
FECHA DE INICIO	05 DE DICIEMBRE0 DE 2023
PRORROGA N°1	Un (01) mes y Veinticuatro (24) días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE FEBRERO DE 2024

3.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA

3.2.1 POLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas de legalización fueron expedidas el 30 de octubre de 2023 por aseguradora solidaria de Colombia, tomadas por CONSORCIO SEDE MARSAF, como beneficiario la superintendencia de notariado y registro.

Póliza cumplimiento de contrato de obra: No. 340-47-994000049361 **Anexo 0**

Fecha de expedición 30 de octubre 2023

POLIZAS CONTRATO DE CUMPLIMIENTO PARA ENTIDADES ESTATALES			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	26-10-2023	30-06-2024	$ 120.036.498,80
PRESTACIONES SOCIALES	26-10-2023	31-12-2026	$ 30.009.124,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	*Ver Nota Aclaratoria*		$ 120.036.498,80

NOTA ACLARATORIA: *el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria.*

Póliza RCE contrato de obra: No. 340-74-994000006525 Anexo 0

Fecha de expedición 30 de octubre 2023

POLIZAS CONTRATO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26-10-2023	31-12-2023	$348.000.000,00

MODIFICACION ANEXO 0

Las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual fueron modificada y expedidas el día 13 de diciembre de 2023 y el 01 de noviembre de 2023, por aseguradora solidaria de Colombia, tomadas por CONSORCIO SEDE MARSAF, como beneficiario la superintendencia de notariado y registro.

Póliza cumplimiento de contrato de obra: No. 340-47-994000049361 **Anexo 1**

Fecha de expedición 13 de diciembre 2023

POLIZAS CONTRATO DE CUMPLIMIENTO PARA ENTIDADES ESTATALES			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	04-12-2023	30-06-2024	$ 120.036.498,80
PRESTACIONES SOCIALES	04-12-2023	31-12-2026	$ 30.009.124,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	*Ver Nota Aclaratoria*		$ 120.036.498,80

NOTA ACLARATORIA: *el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria.*

Póliza RCE contrato de obra: No. 340-74-994000006525 Anexo 1

Fecha de expedición 01 de noviembre 2023

POLIZAS CONTRATO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26-10-2023	31-12-2023	$348.000.000,00

3.2.2 POLIZAS SEGÚN PRORROGA No.1

Las pólizas de según prorroga No.1 fueron expedidas el 18 de enero de 2024 y 22 de enero de 2024, por aseguradora solidaria de Colombia, tomadas por CONSORCIO SEDE MARSAF, como beneficiario la superintendencia de notariado y registro.

Póliza cumplimiento de contrato de obra: No. 340-47-994000049361 **Anexo 2**

Fecha de expedición 18 de enero 2024

POLIZAS CONTRATO DE CUMPLIMIENTO PARA ENTIDADES ESTATALES			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	04-12-2023	24-08-2024	$ 120.036.498,80
PRESTACIONES SOCIALES	04-12-2023	24-02-2027	$ 30.009.124,70
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	*Ver Nota Aclaratoria*		$ 120.036.498,80

NOTA ACLARATORIA: *el amparo de estabilidad otorgado mediante la presente póliza, tiene vigencia de (5) años, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción por parte de la entidad contratante, lo cual deberá ser reportado oportunamente y por escrito a aseguradora solidaria.*

Póliza RCE contrato de obra: No. 340-74-994000006525 **Anexo 3**
Fecha de expedición 22 de enero 2024

POLIZAS CONTRATO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	31-12-2023	24-02-2024	$348.000.000,00

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1. PERSONAL EN OBRA

4.1.1. PERSONAL PROFESIONAL

En la ejecución del proyecto se elabora con el siguiente personal de obra:

DIRECTOR DE OBRA	JUAN CARLOS MARIN
RESIDENTE DE OBRA	JOSE LUIS OROS ACEVEDO
RESIDENTE DE OBRA	MARIO LONDOÑO JIMÉNEZ
INSPECTOR DE OBRA	YOHAN CAMILO JIMÉNEZ ZUBIETA
SISO	ZAYDE SUAREZ ORTIZ

4.1.2. PERSONAL MANO DE OBRA CACHIRA

MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS	MAESTRO DE OBRA
CARLOS JULIO CARDENAS PACHON	AYUDANTE DE OBRA

4.2. ESTADO FINANCIERO

RELACIÓN ACTAS DE OBRA			
VALOR DEL CONTRATO		**$29.246.647,32**	
ACTA No	**% AVANCE**	**VALOR ACTA**	**ESTADO**
ACTA 1	30.00%	$8.773.994,20	En trámite
ACTA 2	30.00%	$8.773.994,20	En trámite
ACTA 3	30.00%	$8.773.994,20	En trámite
ACTA 4	10.00%	$2.924.664,72	En trámite

4.3. CANTIDAD DE OBRA EJECUTADAS

4.3.1 CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA 1ER CORTE (30%)

A EL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA, Y CESAR ASHLEY MORA REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
ACTUALIZACION LICENCIAS (SI APLICA)								
1	**PRELIMINARES**							$ 1.676.155,00
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	10,00	10,00	10,00	$ 9.689,00	$ 96.890,00	
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	un	0,00	0,00	0,00	$ 42.042,00	$ -	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	0,00	0,00	0,00	$ 27.095,00	$ -	
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	0,00	0,00	0,00	$ 34.941,00	$ -	
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m²	4,00	4,00	4,00	$ 11.291,00	$ 45.164,00	
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	0,00	0,00	0,00	$ 101.666,00	$ -	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	0,00	0,00	0,00	$ 417.474,00	$ -	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	79,00	79,00	79,00	$ 19.419,00	$ 1.534.101,00	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	0,00	0,00	0,00	$ 26.491,00	$ -	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**							$ 164.310,00
2,12	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	m²	0,00	0,00	0,00	$ 52.100,00	$ -	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	2,00	2,00	2,00	$ 82.155,00	$ 164.310,00	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	3,00	0,00	0,00	$ 127.039,00	$ -	
3	**CARPINTERIA METALICA**							$ -
3,03	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	m	5,61	0,00	0,00	$ 442.245,00	$ -	
3,16	REJA TIPO BANCO	m²	0,00	0,00	0,00	$ 164.385,00	$ -	
4	CIELORRASOS							$ -
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	99,00	0,00	0,00	$ 29.284,00	$ -	
5	**CONCRETO Y MORTEROS**							$ 422.708,00
5,05	PAÑETE MUROS 1:4 IMPERMEABILIZADO	m²	11,00	11,00	11,00	$ 38.428,00	$ 422.708,00	
7	**ENCHAPE MUROS**							$ 739.277,00
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	4,00	4,00	4,00	$ 16.396,00	$ 65.584,00	
7,03	RESANE	m²	10,00	10,00	10,00	$ 17.327,00	$ 173.270,00	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	67,00	67,00	67,00	$ 7.469,00	$ 500.423,00	
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	m²	0,00	0,00	0,00	$ 71.419,00	$ -	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**							$ 1.008.546,00
10,03	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	m2	42,00	42,00	42,00	$ 24.013,00	$ 1.008.546,00	
11	IMPERMEABILIZACIÓN							$ -
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	10,00	0,00	0,00	$ 39.237,00	$ -	
11,05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	0,00	0,00	0,00	$ 23.371,00	$ -	
13	**PINTURAS**							$ 2.740.827,16
13,07	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	m	40,0	40,00	40,00	$ 21.495,00	$ 859.800,00	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	297,1	90,02	90,02	$ 20.895,00	$ 1.881.027,16	
16	**RED HIDRAULICA**							$ -
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	3,00	0,00	0,00	$ 129.681,00	$ -	
16,15	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	un	0,00	0,00	0,00	$ 294.062,00	$ -	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 279.205,00	$ -	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 70.187,00	$ -	

17	**RED SANITARIA**							**$ -**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	0,00	0,00	0,00	$ 17.282,00	$ -	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	0,00	0,00	0,00	$ 27.888,00	$ -	
19	**ASEO - SEÑALIZACIÓN**							**$ -**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	0,00	0,00	$ 433.045,00	$ -	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	0,00	0,00	$ 37.909,00	$ -	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	0,00	0,00	0,00	$ 517.020,00	$ -	
	ACTVIDADES ADICIONALES							**$ -**
4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	m2	30,00	0,00	0,00	$ 95.050,00	$ -	
15,11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	6,00	0,00	0,00	$ 101.498,00	$ -	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	m	1,20	0,00	0,00	$ 76.467,00	$ -	
13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	10,00	0,00	0,00	$ 14.522,00	$ -	
13,06	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	m	50,00	0,00	0,00	$ 14.916,00	$ -	
	TOTAL COSTO DIRECTO							
	COSTOS INDIRECTOS							**$ 6.751.823,16**
	IVA	%	16					
	VALOR TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS							
	OBRA (SI APLICA)							
	TOTAL COSTO DIRECTO							
	ADMINISTRACIÓN	%	**23%**					**$ 1.552.919,33**
	IMPREVISTOS	%	**1%**					**$ 67.518,23**
	UTILIDADES	%	**5%**					**$ 337.591,16**
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	**19%**					**$ 64.142,32**
								8.773.994,20
	VALOR TOTAL OBRA							
	MUEBLES (SI APLICA)							
	TOTAL COSTO DIRECTO							
	COSTOS INDIRECTOS							**$ 8.773.994,20**

4.3.2 CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA 2DO CORTE (30%)

A EL DIA 26 DE ENERO DE 2024, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA, REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA, Y CESAR ASHLEY MORA REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LAS OBRAS EJECUTADAS SEGÚN EL OBJETO DEL CONTRATO.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
ACTUALIZACION LICENCIAS (SI APLICA)								
1	**PRELIMINARES**							$ -
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	10,00	0,00	0,00	$ 9.689,00	$ -	
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	un	0,00	0,00	0,00	$ 42.042,00	$ -	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	0,00	0,00	0,00	$ 27.095,00	$ -	
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	0,00	0,00	0,00	$ 34.941,00	$ -	
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m²	4,00	0,00	0,00	$ 11.291,00	$ -	
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	0,00	0,00	0,00	$ 101.666,00	$ -	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	0,00	0,00	0,00	$ 417.474,00	$ -	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	79,00	0,00	0,00	$ 19.419,00	$ -	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	0,00	0,00	0,00	$ 26.491,00	$ -	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**							$ -
2,12	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	m²	0,00	0,00	0,00	$ 52.100,00	$ -	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	2,00	0,00	0,00	$ 82.155,00	$ -	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	3,00	0,00	0,00	$ 127.039,00	$ -	
3	**CARPINTERIA METALICA**							$ -
3,03	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	m	5,61	0,00	0,00	$ 442.245,00	$ -	
3,16	REJA TIPO BANCO	m²	0,00	0,00	0,00	$ 164.385,00	$ -	
4	CIELORRASOS							$ -
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	99,00	0,00	0,00	$ 29.284,00	$ -	
5	**CONCRETO Y MORTEROS**							$ -
5,05	PAÑETE MUROS 1:4 IMPERMEABILIZADO	m²	11,00	0,00	0,00	$ 38.428,00	$ -	
7	**ENCHAPE MUROS**							$ -
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	4,00	0,00	0,00	$ 16.396,00	$ -	
7,03	RESANE	m²	10,00	0,00	0,00	$ 17.327,00	$ -	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	67,00	0,00	0,00	$ 7.469,00	$ -	
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	m²	0,00	0,00	0,00	$ 71.419,00	$ -	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**							$ -
10,03	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	m2	42,00	0,00	0,00	$ 24.013,00	$ -	
11	IMPERMEABILIZACIÓN							$ -
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	10,00	0,00	0,00	$ 39.237,00	$ -	
11,05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	0,00	0,00	0,00	$ 23.371,00	$ -	
13	**PINTURAS**							$ 3.959.803,16
13,07	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	m	40,0	0,00	0,00	$ 21.495,00	$ -	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	297,1	189,51	189,51	$ 20.895,00	$ 3.959.803,16	
16	**RED HIDRAULICA**							$ -
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	3,00	0,00	0,00	$ 129.681,00	$ -	
16,15	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	un	0,00	0,00	0,00	$ 294.062,00	$ -	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 279.205,00	$ -	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 70.187,00	$ -	

17	**RED SANITARIA**							**$ -**
17,19	SONDEO Y LIMPIEZA BAJANTE AGUAS LLUVIAS	m	0,00	0,00	0,00	$ 17.282,00	$ -	
17,20	SONDEO Y LIMPIEZA RED SANITARIA	m	0,00	0,00	0,00	$ 27.888,00	$ -	
19	**ASEO - SEÑALIZACIÓN**							**$ -**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	0,00	0,00	$ 433.045,00	$ -	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	0,00	0,00	$ 37.909,00	$ -	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	0,00	0,00	0,00	$ 517.020,00	$ -	
	ACTVIDADES ADICIONALES							**$ 2.792.020,00**
4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	m2	30,00	20,00	20,00	$ 95.050,00	$ 1.901.000,00	
15,11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	6,00	0,00	0,00	$ 101.498,00	$ -	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	m	1,20	0,00	0,00	$ 76.467,00	$ -	
13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	10,00	10,00	10,00	$ 14.522,00	$ 145.220,00	
13,06	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	m	50,00	50,00	50,00	$ 14.916,00	$ 745.800,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO							
	COSTOS INDIRECTOS							**$ 6.751.823,16**
	IVA	%	16					
	VALOR TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS							
	OBRA (SI APLICA)							
	TOTAL COSTO DIRECTO							
	ADMINISTRACIÓN	%	**23%**					**$ 1.552.919,33**
	IMPREVISTOS	%	**1%**					**$ 67.518,23**
	UTILIDADES	%	**5%**					**$ 337.591,16**
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	**19%**					**$ 64.142,32**
								8.773.994,20
	VALOR TOTAL OBRA							
	MUEBLES (SI APLICA)							
	TOTAL COSTO DIRECTO							
	COSTOS INDIRECTOS							**$ 8.773.994,20**

4.3.3 CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA 3ER CORTE (30%)


ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
ACTUALIZACION LICENCIAS (SI APLICA)								
1	**PRELIMINARES**							$ -
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	10,00	0,00	0,00	$ 9.689,00	$ -	
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	un	0,00	0,00	0,00	$ 42.042,00	$ -	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	0,00	0,00	0,00	$ 27.095,00	$ -	
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	0,00	0,00	0,00	$ 34.941,00	$ -	
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m²	4,00	0,00	0,00	$ 11.291,00	$ -	
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	0,00	0,00	0,00	$ 101.666,00	$ -	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	0,00	0,00	0,00	$ 417.474,00	$ -	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	79,00	0,00	0,00	$ 19.419,00	$ -	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	0,00	0,00	0,00	$ 26.491,00	$ -	
2	**CARPINTERÍA EN MADERA**							$ 381.117,00
2,12	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	m²	0,00	0,00	0,00	$ 52.100,00	$ -	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	2,00	0,00	0,00	$ 82.155,00	$ -	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	3,00	3,00	3,00	$ 127.039,00	$ 381.117,00	
3	**CARPINTERIA METALICA**							$ 190.165,35
3,03	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	m	5,61	0,43	0,43	$ 442.245,00	$ 190.165,35	
3,16	REJA TIPO BANCO	m²	0,00	0,00	0,00	$ 164.385,00	$ -	
4	CIELORRASOS							$ 1.464.200,00
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	50,00	50,00	50,00	$ 29.284,00	$ 1.464.200,00	
5	**CONCRETO Y MORTEROS**							$ -
5,05	PAÑETE MUROS 1:4 IMPERMEABILIZADO	m²	11,00	0,00	0,00	$ 38.428,00	$ -	
7	**ENCHAPE MUROS**							$ -
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	4,00	0,00	0,00	$ 16.396,00	$ -	
7,03	RESANE	m²	10,00	0,00	0,00	$ 17.327,00	$ -	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	67,00	0,00	0,00	$ 7.469,00	$ -	
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	m²	0,00	0,00	0,00	$ 71.419,00	$ -	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**							$ -
10,03	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	m2	42,00	0,00	0,00	$ 24.013,00	$ -	
11	IMPERMEABILIZACIÓN							$ 392.370,00
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	10,00	10,00	10,00	$ 39.237,00	$ 392.370,00	
11,05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	0,00	0,00	0,00	$ 23.371,00	$ -	
13	**PINTURAS**							$ 750.130,50
13,07	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	m	40,0	0,00	0,00	$ 21.495,00	$ -	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	315,4	35,90	35,90	$ 20.895,00	$ 750.130,50	
16	**RED HIDRAULICA**							$ 389.043,00
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	3,00	3,00	3,00	$ 129.681,00	$ 389.043,00	
16,15	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	un	0,00	0,00	0,00	$ 294.062,00	$ -	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 279.205,00	$ -	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 70.187,00	$ -	

19	ASEO - SEÑALIZACIÓN							$ 470.954,00
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	1,00	1,00	$ 433.045,00	$ 433.045,00	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	1,00	1,00	$ 37.909,00	$ 37.909,00	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	0,00	0,00	0,00	$ 517.020,00	$ -	
	ACTVIDADES ADICIONALES							$ 2.712.658,40
4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	m2	30,00	10,00	10,00	$ 95.050,00	$ 950.500,00	
15,11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	6,00	6,00	6,00	$ 101.498,00	$ 608.988,00	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	m	1,20	1,20	1,20	$ 76.467,00	$ 91.760,40	
13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	10,00	0,00	0,00	$ 14.522,00	$ -	
13,06	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	m	50,00	0,00	0,00	$ 14.916,00	$ -	
13,11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	m2	70,00	70,00	70,00	$ 15.163,00	$ 1.061.410,00	
	TOTAL COSTO DIRECTO							
	COSTOS INDIRECTOS							$ 6.750.638,25
	IVA	%	16					
	VALOR TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS							
	OBRA (SI APLICA)							
	TOTAL COSTO DIRECTO							
	ADMINISTRACIÓN	%	23%					$ 1.552.646,80
	IMPREVISTOS	%	1%					$ 67.506,38
	UTILIDADES	%	5%					$ 337.531,91
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19%					$ 64.131,06
								8.772.454,41
	VALOR TOTAL OBRA							

4.3.4 CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA 4TO CORTE (10%)

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. PRESENTE ACTA	CANT. ACUMULADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
1	PRELIMINARES							$ -
1,31	DESMONTA DE MANTO EN VIGA CANAL	m	10,00	0,00	0,00	$ 9.689,00	$ -	
1,33	DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	un	0,00	0,00	0,00	$ 42.042,00	$ -	
1,38	DEMOLICIÓN DE MESÓN EXTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	0,00	0,00	0,00	$ 27.095,00	$ -	
1,39	DEMOLICIÓN DE MESÓN INTERNO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO	m	0,00	0,00	0,00	$ 34.941,00	$ -	
1,44	DEMOLICIÓN DE PAÑETE MURO (E=1-3CM)	m²	4,00	0,00	0,00	$ 11.291,00	$ -	
1,52	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO HASTA 48.000 BTU	un	0,00	0,00	0,00	$ 101.666,00	$ -	
1,57	PROTECCIÓN DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	glb	0,00	0,00	0,00	$ 417.474,00	$ -	
1,58	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ONDULADA	m²	79,00	0,00	0,00	$ 19.419,00	$ -	
1.67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	m³	0,00	0,00	0,00	$ 26.491,00	$ -	
2	CARPINTERÍA EN MADERA							$ -
2,12	MANTENIMIENTO VENTANA EN MADERA	m²	0,00	0,00	0,00	$ 52.100,00	$ -	
2,17	MANTENIMIENTO PUERTA EN MADERA	m²	2,00	0,00	0,00	$ 82.155,00	$ -	
2,18	CERRADURA DE POMO PARA OFICINA	un	3,00	0,00	0,00	$ 127.039,00	$ -	

3	**CARPINTERIA METALICA**							**$ 2.251.027,05**
3,03	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	m	5,61	5,09	5,09	$ 442.245,00	$ 2.251.027,05	
3,16	REJA TIPO BANCO	m²	0,00	0,00	0,00	$ 164.385,00	$ -	
4	CIELORRASOS							**$ -**
4,06	MANTENIMIENTO DE CIELORRASO EN FIBRA MINERAL	m²	50,00	0,00	0,00	$ 29.284,00	$ -	
5	**CONCRETO Y MORTEROS**							**$ -**
5,05	PAÑETE MUROS 1:4 IMPERMEABILIZADO	m²	11,00	0,00	0,00	$ 38.428,00	$ -	
7	**ENCHAPE MUROS**							**$ -**
7,02	ESTUCO PLASTICO INTERIOR	m²	4,00	0,00	0,00	$ 16.396,00	$ -	
7,03	RESANE	m²	10,00	0,00	0,00	$ 17.327,00	$ -	
7,04	BOQUILLA PARA CERÁMICA 2MM	m²	67,00	0,00	0,00	$ 7.469,00	$ -	
7,06	CERÁMICA FORMATO 20X20CM	m²	0,00	0,00	0,00	$ 71.419,00	$ -	
10	**FACHADAS Y REVESTIMIENTOS**							**$ -**
10,03	PINTURA PREMIUM DE MAXIMA RESISTENCIA Y DURABILIDAD PARA SUPERFICIES EXTERIORES EXPUESTAS A LA INTEMPERIE [3 MANOS]	m2	42,00	0,00	0,00	$ 24.013,00	$ -	
11	IMPERMEABILIZACIÓN							**$ -**
11,04	MONOCAPA MANTO ASFÁLTICO PARA VIGACANAL	m	10,00	0,00	0,00	$ 39.237,00	$ -	
11,05	MORTERO DE NIVELACIÓN IMPERMEABILIZADO VIGA CANAL	m	0,00	0,00	0,00	$ 23.371,00	$ -	
13	**PINTURAS**							**$ -**
13,07	ESMALTE SOBRE MARCOS MADERA	m	40,0	0,00	0,00	$ 21.495,00	$ -	
13,10	VINILO TIPO 1 MANOS 3 MANOS	m²	315,4	0,00	0,00	$ 20.895,00	$ -	
16	**RED HIDRAULICA**							**$ -**
16,13	CAMBIO DE ARBOL Y FLOTADOR POR SISTEMA AHORRADOR	un	3,00	0,00	0,00	$ 129.681,00	$ -	
16,15	CAMBIO KIT REPUESTO FLUXÓMETRO	un	0,00	0,00	0,00	$ 294.062,00	$ -	
16,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 279.205,00	$ -	
16,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGUE PARA LAVAMANOS	un	0,00	0,00	0,00	$ 70.187,00	$ -	
19	**ASEO - SEÑALIZACIÓN**							**$ -**
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	glb	1,00	0,00	0,00	$ 433.045,00	$ -	
19,04	PLACA DE SEÑALIZACIÓN 21X30CM	un	1,00	0,00	0,00	$ 37.909,00	$ -	
19,07	SUMINISTRO DE PUNTO ECOLÓGICO	un	0,00	0,00	0,00	$ 517.020,00	$ -	
	ACTVIDADES ADICIONALES							**$ -**
4,05	CIELORRASO EN TABLILLA DE PVC 7 mm	m2	30,00	0,00	0,00	$ 95.050,00	$ -	
15,11	LUMINARIA LED REDONDA 18W DE SOBREPONER/DESCOLGADA	un	6,00	0,00	0,00	$ 101.498,00	$ -	
6,20	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	m	1,20	0,00	0,00	$ 76.467,00	$ -	
13,01	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	m	10,00	0,00	0,00	$ 14.522,00	$ -	
13,06	ESMALTE SOBRE MARCOS LÁMINA	m	50,00	0,00	0,00	$ 14.916,00	$ -	
13,11	VINILO TIPO 2 CIELORRASOS 2 MANOS	m2	70,00	0,00	0,00	$ 15.163,00	$ -	
	TOTAL COSTO DIRECTO							
	COSTOS INDIRECTOS							**$ 2.251.027,05**
	IVA	%	16					
	VALOR TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS							
	OBRA (SI APLICA)							
	TOTAL COSTO DIRECTO							
	ADMINISTRACIÓN	%	**23%**					**$ 517.736,22**
	IMPREVISTOS	%	**1%**					**$ 22.510,27**
	UTILIDADES	%	**5%**					**$ 112.551,35**
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	**19%**					**$ 21.384,76**
								2.925.209,65

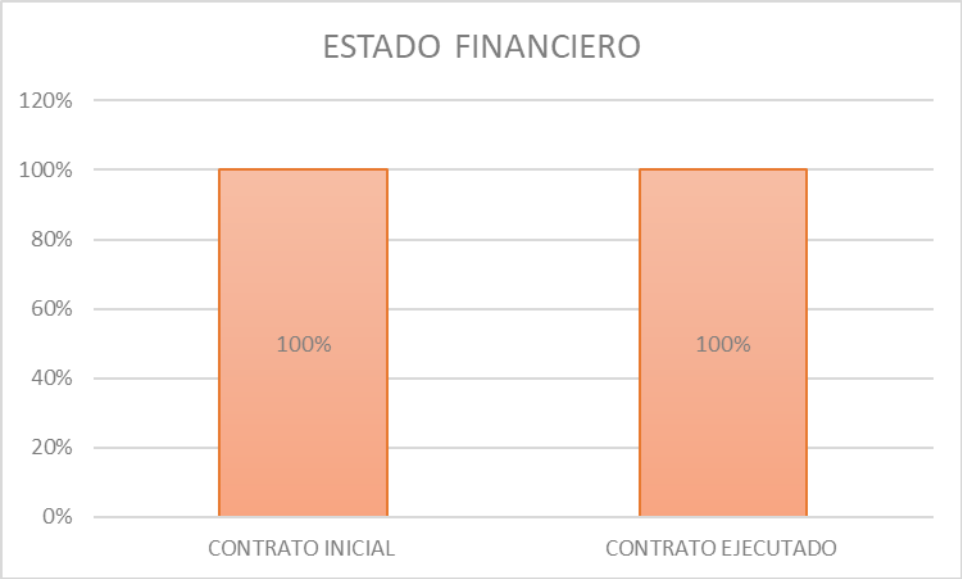

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENRALES

- A la fecha de corte del presente informe se cuenta con un avance ejecutado del 100% de las actividades, encontrándose así un 0% por encima de lo programado teniendo en cuenta el programado con un porcentaje del 100%. Así, se evidencia que por parte del **CONSORCIO SEDE MARSAF** se realizar un buen seguimiento y control en la ejecución de la obra y una organización en obra que favorece el avance de la ejecución de este.

- Todas las actividades de obra se ejecutaron cumpliendo con las especificaciones técnicas de obra.

- Por parte del contratista se ejecutaron todas las actividades contractuales, realizando entrega a interventoría, donde se recibieron a satisfacción.

ANEXOS

ANEXO 1. Registros fotográficos

REGISTRO FOTOGRAFICO (SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO EN LA SEDE CACHIRA-NORTE DE SANTANDER)



FOTO 1.

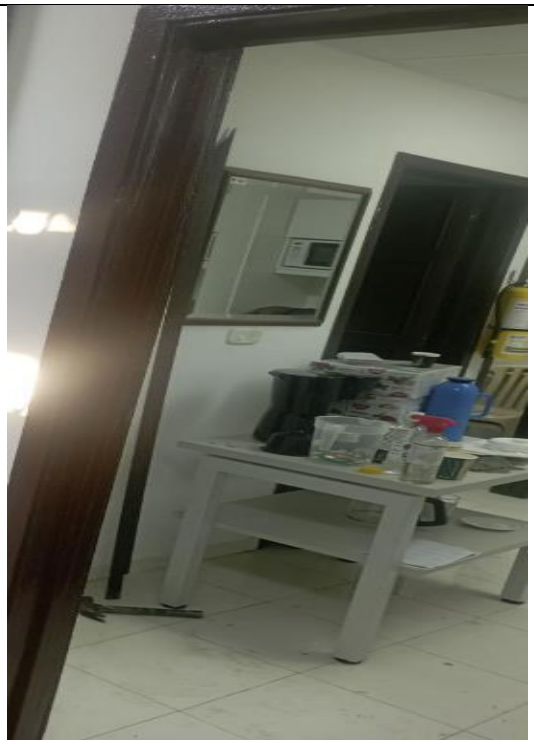


FOTO 2.



FOTO 3.



FOTO 4.



FOTO 5.



FOTO 6.



FOTO 7.



FOTO 8.

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL

CONDICIONES ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023, SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIO Y REGISTRO NIT: 899.999.007-0 Y EL CONSORCIO SEDE MARSAF IDENTIFICADO NIT: 901.762.215-4

ZAYDE SUAREZ ORTIZ
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
CONSORCIO SEDE MARSAF

PERIODO:
05 de febrero del 2023 hasta el 24 de febrero del 2024

1. INTRODUCCIÓN

CONSORCIO SEDE MARSAF, diseñó y estructuró el Plan de Gestión en Seguridad y Saluden el Trabajo y el Plan de Gestión Ambiental para el Contrato de obra N° 2391 de 2023, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de los trabajadores, preservando el estado de salud, físico, mental y social. De igual manera la prevención de accidentes y enfermedades laborales, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Según las actividades ejecutadas en obra, en el periodo comprendido desde el 05 de febrero de 2024 hasta el 24 de febrero del 2024, el **CONSORCIO SEDE MARSAF** participa en el proceso de las actividades del SG-SST y de manejo ambiental, vinculando a los trabajadores contratistas y partes interesadas, en la implementación del mismo, estableciendo las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) según el Decreto 1072 de 2015.

2. OBJETIVO

Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y medio ambiente para el Proyecto del Contrato No 383-23 a cargo del **CONSORCIO SEDE MARSAF.**

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Realizar seguimiento a los subcontratistas en el pago oportuno de las Prestaciones Sociales del personal vinculado para la ejecución de la obra, dentro de los períodos y plazos estipulados por la Ley.
II. Identificar, evaluar e intervenir los factores de riesgo que puedan afectar la salud e integridad de las personas que laboran en el proyecto.
III. Ejecutar actividades de promoción y prevención que permitan mejorar las condiciones de trabajo, seguridad y salud de los trabajadores.
IV. Apoyar el proceso de capacitación de los trabajadores en cada uno de losriesgos identificados y la forma de controlarlos y mitigarlos.
V. Cumplir con los lineamientos del Protocolo de Bioseguridad.

VI. Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente, que regula los distintos aspectos en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambientales dentro del proyecto.

3. RESPONSABILIDADES EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL PROYECTO CONTRATO No 383-23

La responsabilidad para la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo está en cabezade la Alta dirección de la empresa, se han asignado responsabilidades dentro de los cargos cuya actuación tienen injerencia directa sobre la Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo.

CARGO	RESPONSABILIDADES
GERENTE	Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-SST.
	Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones.
	Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
	Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo.
	Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.
	Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y Valoración de riesgos.

CARGO	RESPONSABILIDADES
RESIDENTE DE OBRA/JEFE DE ÁREA	Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
	Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Promover la comprensión de la política en los trabajadores.
	Participar en las inspecciones de seguridad.

CARGO	RESPONSABILIDADES
COORDINADORA SST	Informar a la alta dirección sobre el funcionamiento y los resultados del SG-SST.
	Promover la participación de todos los trabajadores de la empresa en la implementación del SG-SST.
	Elaboración y/o actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y hacer la priorización para focalizar la intervención.
	Promover la comprensión de la política en todos los niveles de la organización.
	Gestionar los recursos para cumplir con el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer seguimiento a los indicadores.

CARGO	RESPONSABILIDADES
	Coordinar las necesidades de capacitación en materia de prevención según los riesgos prioritarios.
	Apoyar la investigación de los accidentes e incidentes de trabajo
	Participar de las reuniones del COPASST
	Implementación y seguimiento del SG-SST.

CARGO	RESPONSABILIDADES
TRABAJADORES CONTRATISTAS	Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Procurar el cuidado integral de su salud
	Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud
	Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
	Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
	Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato
	Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente. Cumplir con los lineamientos ambientales

4. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Para el periodo del presente informe, se realizó la verificación del pago de Seguridad Social correspondiente por medio de la Planilla de pago. De igual forma se verificó la afiliación al SSSI del nuevo personal, revisando que estas personas cuenten con la documentación reglamentaria vigente.

A los contratistas se les exige el cumplimiento de la normatividad vigente en este aspecto, es por esto que actualmente envían la documentación requerida, la cual permanece en el archivo de la oficina.

***Anexo 1**. Soporte de afiliaciones de seguridad social.*

4.1 PERSONAL EN OBRA:

Para la ejecución de las actividades programadas, se empleó mano de obra por parte del subcontratista vinculado al Proyecto Contrato No 2391 de 2023 del **CONSORCIO SEDE MARSAF**.

CONTRATISTA	SEDES	N° DE TRABAJADORES
	CHIQUINQUIRA	3
	PACHO	2
	GACHETA	2
	CACHIRA	2
	TOTAL, PERSONAL	**10**

TOTAL, DE PERSONAL EN GENERAL	**10**

Anexo 2*. Consolidado del personal de obra.*

5. INDUCCIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el periodo del 05 de febrero al 24 de febrero de 2024, no hubo ingresos de personal nuevo al proyecto Contrato No 1374 de 2022.

.

6. CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los contratistas vinculados al Proyecto Contrato No 2391 de 2023 aplicaron las actividades de capacitación de **CONSORCIO SEDE MARSAF**, teniendo como propósito el desarrollo de habilidades y capacidades de todo el personal con el fin de formar un talento humano más competente y hábil. Además, se busca promocionar la salud, el autocuidado, prevenir enfermedades laborales y la materialización de riesgos.

Más allá de esto, se buscó estimular el interés de todos los colaboradores acerca de los beneficios de aplicar el sistema de gestión en SST, incentivar la participación en las diferentes actividades sobre: autocuidado, factores de riesgo y condiciones inseguras, busca mejorar el clima laboral, la productividad, la salud física y mental, y mejorar la capacidad de los trabajadores para identificar y reportar factores de riesgos presentes en su labor.

Anexo 3. Soportes de capacitaciones por sede.

7. DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

La entrega de elementos de protección personal es un requisito fundamental y obligatorio en el proyecto Contrato No 2391 de 2023. Es necesario que todo el personal de obra tenga y porte dichos elementos durante toda la jornada laboral y que el uso sea el adecuado para cumplir con las normas de seguridad. Por lo cual se verificó la entrega de estos por parte de los subcontratistas.

Anexo 4. Soporte de control de entrega de EPP.

8. INSPECCIONES EN SST

Las inspecciones realizadas por los contratistas son con el fin de identificar los peligros que puedan afectar la integridad física de los trabajadores.

Anexo 5. Soporte de inspección SST.

9. MANEJO DE EQUIPOS

En las obras del Proyecto operaron equipos eléctricos como pulidoras, taladros.

Anexo 6. Pre operacional de equipos eléctricos.

Los operarios diligenciaron el respectivo formato de inspección pre operacional, en pro de garantizar el buen funcionamiento de estos y su operación segura.

10. ACCIDENTES E INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

En el periodo, se presentó cero (0) accidentes de trabajo por tanto la taza de accidentalidad es 0%.

INDICADOR	FÓRMULA
Severidad de accidentalidad	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100
Frecuencia de accidentalidad	Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100
Ausentismo por causa médica	(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100

Indicadores mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo - Resolución 0312 de 2019

INDICADOR*	CHIQUINQUIRA	PACHO	CACHIRA	GACHETA
Severidad de accidentalidad	0	0	0	0
Frecuencia de accidentalidad	0	0	0	0
Ausentismo por causa médica	0	0	0	0

11. ACTIVIDADES MANEJO AMBIENTAL

11.1 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN OBRA

Los Proyectos del Contrato No 1374 de 2022 cuenta en sus diferentes etapas de desarrollo, es responsable de velar por los pasos y acciones ejecutadas en el manejo de residuos sólidos.
Se desarrollaron actividades de gestión ambiental para el manejo de residuos sólidos encaminadas a prevenir impactos en el paisaje del área del proyecto, así como de su entorno inmediato. Es necesario desarrollar buenas prácticas ambientales a fin de impulsar una actividad constructiva en armonía con el ambiente, para lo cual se tuvo en cuenta.

11.2 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS

Se encuentra punto ecológico en las sedes donde se encuentra ubicados los proyectos en cada región, los cuales son utilizados para disposición de residuos sólidos según las indicaciones de los colores reglamentarios.

11.3 LIMPIEZA EN SITIO DE OBRA

Los lugares de trabajo permanecieron limpios y ordenados, esto con el fin de optimizar el uso del espacio, mejorar la eficiencia del trabajo, evitar problemas sanitarios y en general, por conservar un entorno más seguro para toda la población vinculada directa o indirectamente a los proyectos.

Actividades realizadas:

- Limpieza en los frentes
- Limpieza y retiro de residuos, disposición adecuada en el Shut de las sedes donde se ubican los proyectos.

CONTRATISTA	CENTRO REGIONAL	TIPO DE RESIDUOS	CANT. (KG)
JOSE OROS	CHIQUINQUIRA	APROVECHABLES	1
		ORGANICOS APROVECHABLES	0
		NO APROVECHABLES	0
	PACHO	APROVECHABLES	1
		ORGANICOS APROVECHABLES	0
		NO APROVECHABLES	0
	CACHIRA	APROVECHABLES	1
		ORGANICOS APROVECHABLES	0
		NO APROVECHABLES	0
	GACHETA	APROVECHABLES	1

		ORGANICOS APROVECHABLES	0
		NO APROVECHABLES	0

12. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19

12.1 LAVADO DE MANOS

El personal contratista vinculado a los proyectos, realiza lavado de manos de manera frecuente, dando cumplimiento a las medidas de prevención y con el fin de mitigar el contagio del virus COVID 19.

12.2 DISTANCIAMIENTO FÍSICO

CONSORCIO SEDE MARSAF, está comprometida a garantizar la Salud y la Seguridad de los trabajadores, manteniendo en el lugar de trabajo el distanciamiento social de persona a persona en las áreas sociales como el comedor, cuartos de cambio y en lo posible en los frentes de obra.

13. CONCLUSIONES


- Durante el periodo se socializando al personal de obra las medidas de SST implementadas por parte del CONSORCIO SEDE MARSAF, con el fin de promover y mantener comportamientos seguros durante la ejecución de las actividades diarias.

- Se realizó la retroalimentación por medio de charlas de sensibilización por parte de los inspectores SST de los contratistas al personal de obra del uso obligatorio de los elementos de protección personal de acuerdo al nivel de riesgo y su exposición.

- La prevención frente al Covid 19 se retroalimento por medio de charlas de sensibilización sobre el lavado de manos, distanciamiento y autocuidado. Durante el proceso constructivo en este periodo hubo cero (0) contagios y ceros (0) casos sospechosos en el proyecto de obra.

- Se continuaron con las medidas de manejo ambiental previstas, para el cumplimiento de la normatividad legal vigente. De igual manera se contempla dentro de las actividades de obra el inicio del proceso de limpieza y recolección de residuos en los frentes de obras.

ELABORO:



ZAYE SUAREZ ORTIZ
Profesional SST
CONSORCIO
SEDE MARSAF

CONSORCIO SEDE MARSAF

CONSORCIO SEDE MARSAF

BASE DE DATOS DE PERSONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: | **CIUDAD:** CACHIRA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	IDENTIFICAR SI EL TRABAJADOR ES DE LA REGION		CIUDAD	EPS	ARL	AFP	EXAMEN DE INGRESO				CERTIFICADO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS			FECHA INGRESO A LA OBRA	FECHA RETIRO DE LA OBRA
				SI	NO					SI	NO	BASICO	ENFASIS EN T.S.A	SI	NO	FECHA		
1	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO	11.342.436	OFICIAL		X	CACHIRA	FAMISANAR	SURA	COLPENSIONES	X			X		X	N/A	22/01/2024	24/02/2024
2	MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS	11.348.160	OFICIAL		X	CACHIRA	NUEVA EPS	SURA	PORVENIR	X			X		X	N/A	22/01/2024	24/02/2024
3																		

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-08, 02:28:34 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 69646419

Periodo Cotización: enero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 01/05/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE LUIS OROS ACEVEDO	**Nombre Sucursal**	01	**Código Sucursal**	01
Documento	CC1026275607	**Dirección**	CL 26B #17 - 04 BARRIO SAN LUIS		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3212145252		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			
Total Afiliados	15	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007598705	JORGE SALOMON IBARRA CORTES	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1033702448	LUIS ARIEL SEVILLA ROA	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 1053330186	MARCO FERNANDO LOPEZ VALERIANO	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 390.000	$ 62.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 390.000	$ 15.600	6,960	$ 390.000	$ 27.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800
CC 1053332986	ANDRES ZAMIR BUITRAGO GONZALEZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1053339624	JAVIER MAURICIO BUITRAGO GONZALEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 390.000	$ 62.400	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 390.000	$ 15.600	6,960	$ 390.000	$ 27.200	(CCF69) COMFACASANARE	$ 390.000	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800
CC 1073607034	HAROL MIGUEL ORDOÑEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1077920836	FRANKIL ESNEYDER SEVILLA ROA	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 1106791262	JOHAN ORLANDO VALDERRAMA SANCHEZ	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 1117547435	FABIAN STIVEN TOVAR	01	00		X															0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 86.667	$ 13.900	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 11342436	CARLOS JULIO CARDENAS PACHON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 11348160	MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 11518721	JOSE MILCIADES MORENO GRANADOS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 14135246	JAIME ANDRES CASTAÑO GONZALEZ	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 86.667	$ 13.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 86.667	$ 3.500	6,960	$ 86.667	$ 6.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 19394939	RODRIGO OBANDO CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF69) COMFACASANARE	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 79047847	WILLIAM CHAPARRO GUERRERO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 43.334	$ 7.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF69) COMFACASANARE	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 7.843.337	$ 7.843.337	$ 7.843.337	$ 7.843.337	$ 1.255.300	$ 314.100	$ 546.700	$ 314.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.430.200	$ 189.900	$ 2.620.100

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-08, 02:29:51 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 69734497

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 01/05/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE LUIS OROS ACEVEDO	**Nombre Sucursal**	01	**Código Sucursal**	01
Documento	CC1026275607	**Dirección**	CL 26B #17 - 04 BARRIO SAN LUIS		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3212145252		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	ARAUCA	**Departamento**	ARAUCA		
Representante Legal		**Identificación**			
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1053330186	MARCO FERNANDO LOPEZ VALERIANO	01	00		X															0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION	$ 606.667	$ 97.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 606.667	$ 24.300	6,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000
CC 1053339624	JAVIER MAURICIO BUITRAGO GONZALEZ	01	00		X															0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 606.667	$ 97.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 606.667	$ 24.300	6,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000
CC 1073607034	HAROL MIGUEL ORDOÑEZ MARTINEZ	01	00		X															0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 606.667	$ 97.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 606.667	$ 24.300	6,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000
CC 11342436	CARLOS JULIO CARDENAS PACHON	01	00		X															0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 996.667	$ 159.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 996.667	$ 39.900	6,960	$ 996.667	$ 69.400	(CCF69) COMFACASANARE	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 11348160	MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS	01	00		X															0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 996.667	$ 159.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 996.667	$ 39.900	6,960	$ 996.667	$ 69.400	(CCF69) COMFACASANARE	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.700
CC 11518721	JOSE MILCIADES MORENO GRANADOS	01	00		X															0	14	14	14	14	(231001) COLFONDOS	$ 606.667	$ 97.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 606.667	$ 24.300	6,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000
CC 19394939	RODRIGO OBANDO CARDENAS	01	00		X															0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 606.667	$ 97.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 606.667	$ 24.300	6,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF69) COMFACASANARE	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 5.026.669	$ 5.026.669	$ 5.026.669	$ 5.026.669	$ 804.500	$ 201.300	$ 350.300	$ 201.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.557.400	$ 78.600	$ 1.636.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONSORCIO SEDE MARSAF	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SSTA-F-17
	SOPORTE DE CAPACITACION, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 0
		Fecha: 13-09-2023

AREA: SST

FECHA: 10/02/2024

TEMA: Medidas preventivas y técnicas de autocuidado: aplicar el autocuidado como algo indispensable para la vida desde la esencia del amor propio, tanto en el ámbito laboral como en el social y familiar.

OBJETIVO: Sencibilizar al personal en la importancia de tener autocuidado en las actividades que realiza.

LUGAR DE CAPACITACION: FRENTE DE OBRA

HORA INICIO: 11:00 a. m.

HORA FINAL: 11:30 a. m.

TIPO DE EVENTO:

CHARLA DE SEGURIDAD		ENTRENAMIENTO		RECREACION	
INDUCCION		CAPACITACION	X	FORMACION	

RESPONSABLE: ZAYDE SUAREZ ORTIZ

FIRMA

ITEM	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO	11.342.436	OFICIAL	
2	MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS	11.348.160	OFICIAL	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES

(Espacio exclusivo para evaluar la eficacia de la capacitación)

CONSORCIO SEDE MARSAF	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SSTA-F-17
	SOPORTE DE CAPACITACION, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 0
		Fecha: 13-09-2023

AREA: SST

FECHA: 17/02/2024

TEMA: Capacitación en reporte oportuno de los accidentes de trabajo e incidentes y proceso de investigación de accidentes. De igual manera socializar las sanciones que acarrea a la empresa en reporte extemporáneo y las sanciones al trabajador.

OBJETIVO: Socializar la importancia del reporte oportuno de los accidentes de trabajo.

LUGAR DE CAPACITACION: FRENTE DE OBRA

HORA INICIO: 11:00 a. m.

HORA FINAL: 11:30 a. m.

TIPO DE EVENTO:

CHARLA DE SEGURIDAD		ENTRENAMIENTO		RECREACION	
INDUCCION		CAPACITACION	X	FORMACION	

RESPONSABLE: ZAYDE SUAREZ ORTIZ

FIRMA

ITEM	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO	11.342.436	OFICIAL	
2	MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS	11.348.160	OFICIAL	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES

(Espacio exclusivo para evaluar la eficacia de la capacitación)

CONSORCIO SEDE MARSAF	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: SSTA-F-17
	SOPORTE DE CAPACITACION, FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Versión: 0
		Fecha: 13-09-2023

AREA: SST

FECHA: 23/02/2024

TEMA: Prevención en el uso de herramientas manuales: sensibilizar que las herramientas pueden ser peligrosas y tienen el potencial de causar lesiones graves cuando se usan o mantienen de manera incorrecta.

OBJETIVO: Sencibilizar la importancia del uso preventivo y correctivo del uso de herramientas.

LUGAR DE CAPACITACION: FRENTE DE OBRA

HORA INICIO: 11:00 a. m.

HORA FINAL: 11:30 a. m.

TIPO DE EVENTO:

CHARLA DE SEGURIDAD		ENTRENAMIENTO		RECREACION	
INDUCCION		CAPACITACION	X	FORMACION	

RESPONSABLE: ZAYDE SUAREZ ORTIZ

FIRMA

ITEM	NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
1	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO	11.342.436	OFICIAL	
2	MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS	11.348.160	OFICIAL	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

OBSERVACIONES

(Espacio exclusivo para evaluar la eficacia de la capacitación)

CONSORCIO SEDE MARSAF	PROCESO	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO	FT-SST-006
			VERSIÓN	1
	FORMATO	CONTROL ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	FECHA:	Septiembre 15/2023

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023	EMPRESA:	CONSORSCIO SEDE MARSAF

RESPONSABLE DE LA ENTREGA	NOMBRE:	JOSE LUIS OROS
	CARGO:	SUBCONTRATISTA
QUIEN SUPERVISA	NOMBRE:	ZAYDE SUAREZ ORTIZ
	CARGO:	PROFESIONAL SST

DATOS DEL TRABAJADOR				ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL																	RECIBIDO
				SEGURIDAD												DOTACIÓN					
FECHA	NOMBRE	CEDULA	CARGO	Protector respirtorio industrial	Protector respiratorio con filtro	Gafas de seguridad oscuras	Gafas de seguridad transparentes	Protector auditivo de inserción	Protector auditivo de copa	Guantes de carnaza /vaqueta	Guantes de nitrilo/vinilo	Guantes de caucho	Casco de seguridad	Barbuquejo	Tapaboas antifluidos/desechables	Botas de seguriad (cuero)	Botas de caucho (punta de acero)	Camisa	Camibuso	Pantalon	FIRMA
22/01/2024	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO	11.342.436	OFICIAL	X		X		X		X	X		X	X		X	X	X		X	
22/01/2024	MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS	11.348.160	OFICIAL	X		X		X		X	X		X	X		X	X	X		X	Manuel Alfonso Garzon
30/01/2024	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO	11.342.436	OFICIAL	X							X										
30/01/2024	MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS	11.348.160	OFICIAL	X							X										Manuel Alfonso Garzon
7/02/2024	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO	11.342.436	OFICIAL	X							X										
7/02/2024	MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS	11.348.160	OFICIAL	X							X										Manuel Alfonso Garzon
16/02/2024	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO	11.342.436	OFICIAL	X							X										
16/02/2024	MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS	11.348.160	OFICIAL	X							X										Manuel Alfonso Garzon

a. Utilizar de manera correcta el elemento de protccion personal durante la jornada de trabajo.
b. Consultar cualquier duda sobre su correcta utilización, cuidando de su perfecto estado y conservación.
c. Cuidar y realizar mantenimiento a los elementos de protección personal.
d. Solicitar un nuevo equipo en caso de pérdida o deterioro del mismo.

CONSORCIO SEDE MARSAF	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-046
	SG-SST	
FORMATO INSPECCIÓN HERRAMIENTAS	**Fecha:**	Septiembre 15/2023
	Versión	001
		Pagina 1 de 1

FECHA: 14/02/2024
OBRA CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023
AREA INSPECCIONADA FRENTE DE OBRA
NOMBRE DE QUIEN REPORTA: CARLOS JULIO CARDENAS PACHO

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	DESCRIPCIÓN	ESTADO		
A	**HERRAMIENTAS MANUALES**	**B**	**M**	**NA**
1	Se usa la adecuada al trabajo	X		
2	Se encuentran en buen estado	X		
3	Se guardan y portan adecuadamente	X		
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente adheridos.	X		
B	**HERRAMIENTAS DE CORTE**	**B**	**M**	**NA**
1	Los cinceles no presentan su cabeza tipo hongo			
2	Los cinceles se encuentran afilados			
3	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos			
4	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias			
5	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos			
6	Los cuchillos disponen de mangos y fundas			
C	**HERRAMIENTAS DE GOLPE**	**B**	**M**	**NA**
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X		
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X		
3	Su mango no está quebrado, astillado ni flojo	XX		
D	**HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES**	**B**	**M**	**NA**
1	Cuentan con llaves de pulgadas y milimétricas			
2	Se observan en la llave huellas y palancas			
3	Se dispone de llaves para golpear			
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas			
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente			
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado			
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.			
E	**HERRAMIENTAS ELECTRICAS**	**B**	**M**	**NA**
1	Las herramientas según Las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)	X		
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada	X		
3	Están limpia y lubricadas	X		
4	Tienen sus guardas	X		
5	Posee aislamiento doble o conexión a tierra por enchufe de tres patas	X		
6	El cable y enchufe no presentan daños	X		
7	En los taladros se observa el mandil con golpes	X		
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños	X		
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados	X		
10	Se observa deterioro en las roscas o tornillo en las ruedas abrasivas.	X		
11	Se almacenan las pulidoras y discos en sitios donde puedan ser golpeados	X		
F	**HERRAMIENTA NEUMATICA**	**B**	**M**	**NA**
1	Las mangueras y acoples se encuentran en buen estado			
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta			
3	Se trabaja a las presiones indicadas			
4	La herramienta es descargada al terminar.			

OBSERVACIONES HERRAMIENTRAS ELECTRICAS SE UTILIZO PULIDORA Y TALADRO

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

REVISO COORDINADOR SST

CONSORCIO SEDE MARSAF	FORMATO INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO			Código: FT-SST-031
	GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			Versión: 01
	PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DEL SG-SST			Fecha: 15/09/2023
				Páginas: 1

I. INFORMACIÓN GENERAL			
PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023	**CIUDAD:**	CACHIRA
AREA:	FRENTE DE OBRA	**DIRECCION:**	
QUIEN INSPECCIONA:	MANUEL ALFONSO GARZON BALLESTEROS	**FECHA:**	13/02/2024

II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
Deficiente (D) = 1	No cumple el criterio de evaluación a satisfacción, existe una probabilidad alta en generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Aceptable (A) = 3	Cumple parcialmente el criterio de evaluación, existe una probabilidad media en generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Excelente (E) = 5	Cumple el criterio de evaluación a satisfacción, existe una probabilidad baja en generar accidentes de trabajo y enfermedades laborales

5 "S"	L	CALIFICACIÓN
SEIRI - Seleccionar: Distinguir entre lo necesario y lo que no lo es	¿Los escritorios están despejados de objetos innecesarios?	
	¿Alrededor y debajo de los escritorios se encuentra despejado de objetos?	
	¿Los escritorios están libres de objetos personales?	
	TOTAL	**0**
	CUMPLIMIENTO SELECCIONAR	**0%**
OBSERVACIONES		
SEITON- ORGANIZAR: Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar	¿Todos los objetos u herramientas tienen una ubicación especifica?	**5**
	¿Se cuenta con un área de almacenamiento de objetos o herramientas?	**5**
	¿Las áreas de almacenamiento de objetos o herramientas de uso frecuente esta organizada?	**5**
	¿Están identificados y almacenados los obejtos o herramientas en un lugar especifico?	**5**
	¿Las herramientas de trabajo se encuentran organizados en un sitio específico y dispuestos de manera que se tenga un fácil acceso a ellos?	**5**
	¿Los equipos como: impresoras, computadores, sillas, extintores, camillas, puntos ecológicos y botiquines principalmente, están ubicados en lugares específicos sin interrumpir las vías de circulación de personas?	
	TOTAL	**25**
	CUMPLIMIENTO ORGANIZAR	**83%**
OBSERVACIONES		
SEISO - LIMPIAR: mantener el área de trabajo libre de suciedad.	¿Los sitios de trabajo en general se encuentran en buenas condiciones de limpieza?	**5**
	¿Se evidencia buenas condiciones de limpieza en áreas comunes (pisos, pasillos y escaleras) de trabajo?	**5**
	¿Se tiene claridad de cómo se deben clasificar los residuos sólidos en los puntos ecológicos?	**5**
	¿Las paredes, techos, ventanas y puertas están limpias?	**5**
	¿La estantería, archivos, escritorios y muebles en general están limpios?	
	¿La señalización, camillas, botiquines y extintores se observan limpios?	**5**
	¿Los servicios sanitarios, cafetería y demas áreas se encuentran en buenas condiciones higiénicas y de limpieza?	**5**
	TOTAL	**30**
	CUMPLIMIENTO LIMPIAR	**86%**
OBSERVACIONES		
SEIKETSU- ESTANDARIZAR: Evitar retroceso de los resultados obtenidos	¿Se evidencia la aplicación de las 3 primeras "S" al interior de las areas?	**5**
	¿Se evidencia un compromiso y participación activa de todos los trabajadores por mantener sus áreas de trabajo en buenas condiciones de orden y limpieza?	**5**
	¿Se observan todos los puestos de trabajo organizados y limpios?	**5**
	¿Se observa unificación del programa de orden y limpieza de la empresa?	**5**
	¿Se ha comunicado el estándar del programa de orden y aseo a todos los trabajadores (evidenciar con listas de asistencia)	**5**
	¿Hay definidas estrategias de mejora continua para el programa de orden y limpieza?	**5**
	TOTAL	**30**
	CUMPLIMIENTO ESTANDARIZAR	**75%**
OBSERVACIONES		
SHITSUKE- AUTODISCIPLINA: Mantener los buenos hábitos	¿Se evidencia un compromiso por parte de todos los trabajadores y empleador por mantener los estándares del programa de orden y limpieza?	**5**
	¿Se evidencia en los trabajadores que el programa de orden y limpieza se convirtió en habito?	**5**
	¿Se percibe motivación en los trabajadores en la aplicación del programa de orden y limpieza?	**5**
	¿Se cuenta por parte del empleador metas específicas para el cumplimiento del programa de orden y limpieza?	**5**
	¿Por iniciativa de la empresa, se cuenta con alguna estrategia establecida para que todos los trabajadores fortalezcan el hábito del programa de orden y limpieza?	**5**
	TOTAL	**25**
	CUMPLIMIENTO AUTODISCIPLINA	**100%**
REVISA SST		

CALIFICACIÓN TOTAL	**110**
PORCENTAJE TOTAL DE CUMPLIMIENTO	**76%**
CUMPLE CON EL PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO	**CUMPLE**

CONSORCIO SEDE MARSAF

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTICA

Código: FT-SST-057
Verión: 1
Fecha: 15/09/2023

FECHA:

DIA __5__ ALDIA__10_ MES___02___AÑO_____2024__

MARCA _____DELWALT____

PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		OBERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	X		X		X		X		X		X				
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	X		X		X		X		X		X				
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	X		X		X		X		X		X				
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	X		X		X		X		X		X				
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	X		X		X		X		X		X				
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	X		X		X		X		X		X				
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DEL DISCO	X		X		X		X		X		X				
NOMBRE DEL OPERADOR															
CARGO	OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL				

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OPERADOR	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO
V°B° INSPECTOR SST	ZAYDE SUAREZ ORTIZ
REVISO COORDINADOR SST	

CONSORCIO SEDE MARSAF

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTICA

Código: FT-SST-057
Verión: 1
Fecha: 15/09/2023

FECHA:

DIA __12__ ALDIA__17_ MES___02___AÑO____2024__

MARCA _____DELWALT____

PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		OBERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	X		X		X		X		X		X				
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	X		X		X		X		X		X				
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	X		X		X		X		X		X				
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	X		X		X		X		X		X				
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	X		X		X		X		X		X				
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	X		X		X		X		X		X				
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DEL DISCO	X		X		X		X		X		X				
NOMBRE DEL OPERADOR															
CARGO	OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL				

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OPERADOR	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO
V°B° INSPECTOR SST	ZAYDE SUAREZ ORTIZ
REVISO COORDINADOR SST	

CONSORCIO SEDE MARSAF	**PROCESO:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FT-SST-056
		Versión: 1
	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	Fecha: 15/09/2023
		Página: 1

PROYECTO	**CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023**					**SEMANA DEL**	8	**AL**	7	**DE**	feb-24
AREA DE TRABAJO	**FRENTE DE OBRA**	**MARCA**	**Bosch**	**MODELO**		**NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: JOSE FARDI ACHIPIZ**					
NOMBRE DEL OPERADOR	**CARLOS JULIO CARDENAS PACHO**					**CARGO:** OFICIAL					

ITEM	REVISION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
1	ESTADO DE CONEXCIONES ELECTRICAS (CABLES, EXTENSIONES, TOMAS	X			X			X			X			X			X						
2	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	X			X			X			X			X			X						
3	ESTADO DEL MANGO	X			X			X			X			X			X						
4	ESTADO GENERAL DE LA GUIA Y LA GUARDA	X			X			X			X			X			X						
5	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURA, RUPTURA,ETC)	X			X			X			X			X			X						
6	ESTADO GENERAL DEL MANDRIL	X			X			X			X			X			X						
7	ESTADO DE LAS BROCAS	X			X			X			X			X			X						
8	LLAVE PARA PORTA BROCAS	X			X			X			X			X			X						
9	PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES	X			X			X			X			X			X						
10	SELECTOR DE MODALIDAD	X			X			X			X			X			X						
11	CARCASA	X			X			X			X			X			X						
12	INTERRUPTOR	X			X			X			X			X			X						
13	UTILIZA ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	X			X			X			X			X			X						
Operador	**Nombre**	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO			CARLOS JULIO CARDENAS PACHO			CARLOS JULIO CARDENAS PACHO			CARLOS JULIO CARDENAS PACHO			CARLOS JULIO CARDENAS PACHO									
	Firma																						
Quien inspecciona SST	**Nombre**																						
	Firma																						
V°B° SST	**Nombre**	**ZAYDE SUAREZ**			**ZAYDE SUAREZ**			**ZAYDE SUAREZ**			**ZAYDE SUAREZ**			**ZAYDE SUAREZ**			**ZAYDE SUAREZ**						
	Firma																						

CONVENCIONES
B: BUENO **M:** MALO **N/A:** NO APLICA

CONSORCIO SEDE MARSAF

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTICA

Código: FT-SST-057
Verión: 1
Fecha: 15/09/2023

FECHA:

DIA __5__ ALDIA__10_ MES___02___AÑO_____2024__

MARCA _____DELWALT____

PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		OBERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	X		X		X		X		X		X				
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	X		X		X		X		X		X				
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	X		X		X		X		X		X				
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	X		X		X		X		X		X				
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	X		X		X		X		X		X				
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	X		X		X		X		X		X				
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DEL DISCO	X		X		X		X		X		X				
NOMBRE DEL OPERADOR															
CARGO	OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL				

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OPERADOR	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO
V°B° INSPECTOR SST	ZAYDE SUAREZ ORTIZ
REVISO COORDINADOR SST	

CONSORCIO SEDE MARSAF

INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA ELECTICA

Código: FT-SST-057
Verión: 1
Fecha: 15/09/2023

FECHA:

DIA __12__ ALDIA__17_ MES___02___AÑO____2024__

MARCA _____DELWALT____

PREOPERACIONAL DE PULIDORAS

DESCRIPCIÓN	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		OBERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	X		X		X		X		X		X				
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	X		X		X		X		X		X				
ESTADO E INSTALACION DEL MANGO	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DEL INTERUPTOR DE INCENDIO Y SU SEGURO	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	X		X		X		X		X		X				
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADO PARA LA TAREA	X		X		X		X		X		X				
ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC)	X		X		X		X		X		X				
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	X		X		X		X		X		X				
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	X		X		X		X		X		X				
ESTADO DEL DISCO	X		X		X		X		X		X				
NOMBRE DEL OPERADOR															
CARGO	OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL		OFICIAL				

NOTA: Esta lista se deberà entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

OPERADOR	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO
V°B° INSPECTOR SST	ZAYDE SUAREZ ORTIZ
REVISO COORDINADOR SST	

CONSORCIO SEDE MARSAF	**PROCESO:** SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: FT-SST-056
		Versión: 1
	FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TALADRO ELECTRICO	Fecha: 15/09/2023
		Página: 1

PROYECTO	**CONTRATO DE OBRA N° 2391 DE 2023**					**SEMANA DEL**	8	**AL**	7	**DE**	feb-24
AREA DE TRABAJO	**FRENTE DE OBRA**	**MARCA**	**Bosch**	**MODELO**		**NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONA: JOSE FARDI ACHIPIZ**					
NOMBRE DEL OPERADOR	**CARLOS JULIO CARDENAS PACHO**					**CARGO:** OFICIAL					

ITEM	REVISION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO			OBSERVACIONES
		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	
1	ESTADO DE CONEXCIONES ELECTRICAS (CABLES, EXTENSIONES, TOMAS	X			X			X			X			X			X						
2	ESTADO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y SU SEGURO	X			X			X			X			X			X						
3	ESTADO DEL MANGO	X			X			X			X			X			X						
4	ESTADO GENERAL DE LA GUIA Y LA GUARDA	X			X			X			X			X			X						
5	ESTADO GENERAL DEL TALADRO (FISURA, RUPTURA,ETC)	X			X			X			X			X			X						
6	ESTADO GENERAL DEL MANDRIL	X			X			X			X			X			X						
7	ESTADO DE LAS BROCAS	X			X			X			X			X			X						
8	LLAVE PARA PORTA BROCAS	X			X			X			X			X			X						
9	PROTECTOR DE CABLE CON SUJETA LLAVES	X			X			X			X			X			X						
10	SELECTOR DE MODALIDAD	X			X			X			X			X			X						
11	CARCASA	X			X			X			X			X			X						
12	INTERRUPTOR	X			X			X			X			X			X						
13	UTILIZA ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	X			X			X			X			X			X						
Operador	**Nombre**	CARLOS JULIO CARDENAS PACHO			CARLOS JULIO CARDENAS PACHO			CARLOS JULIO CARDENAS PACHO			CARLOS JULIO CARDENAS PACHO			CARLOS JULIO CARDENAS PACHO									
	Firma																						
Quien inspecciona SST	**Nombre**																						
	Firma																						
V°B° SST	**Nombre**	**ZAYDE SUAREZ**			**ZAYDE SUAREZ**			**ZAYDE SUAREZ**			**ZAYDE SUAREZ**			**ZAYDE SUAREZ**			**ZAYDE SUAREZ**						
	Firma																						

CONVENCIONES
B: BUENO **M:** MALO **N/A:** NO APLICA
