ACTA DE JUSTIFICACIÓN No. 3 PRORROGA PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CLPIH373 DE 2023 Y EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM400 DE 2023 "CELEBRADO CON EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA, LA RECREACION Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA".

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CLPIH373 DE 2023
OBJETO:	"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
CONTRATISTA:	CONSORCIO GLOBAL CC
NIT	901.765.554-1
REPRESÉNTATE LEGAL:	YOHAN FERNANDO SALAZAR BAENA C.C: 7.709.122 DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO:	QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($557.117. 258.oo) M/CTE
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
FECHA DE INICIO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSION 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO:	16 DE MAYO DE 2024

DATOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CIHCM400 DE 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".
CONTRATISTA INTERVENTORIA	ING. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON

NIT	7706737-6
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. NATALIA BUSTOS BOTERO
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECEINTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($45.738.299,oo) M/CTE
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION Y APROBACION DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL
FECHA DE INICIO:	17 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSION 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO:	16 DE MAYO DE 2024

FECHA PRESENTE ACTA: 03 de julio de 2024.

En Neiva (H), a los tres (03) días de julio de 2024, se reunieron en las oficinas del Instituto Departamental del Deporte, La Recreación, la Educación Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA; los suscritos FELIPE VICTORIA BARRAGAN, en calidad de DIRECTOR DEL INDERHUILA - Supervisor, la Ingeniera NATALIA BUSTOS BOTERO quien actúa en calidad de apoyo a la supervisión, de otra parte; el Ing. YOHAN FERNANDO SALAZAR BAENA Represéntate legal del CONSORCIO GLOBAL CC, en calidad de contratista de obra y el Ing. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON, en calidad de Interventor; con el fin de suscribir la presente Acta de Justificación No. 3, para la ampliación en tiempo del Contrato de Obra Pública No. CLPIH373 de 2023 y el Contrato de Interventoría No. CIHCM400 de 2023, bajo las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

El INDERHUILA, realizo el proceso contractual bajo la modalidad de LICITACION DE OBRA PUBLICA, bajo el numero interno LPIH012-2023 cuyo Objeto fue *"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

Producto de la licitación se adjudicó y suscribió el Contrato de Obra Pública No. CLPIH373 DE 2023, con el CONSORCIO GLOBAL CC, Representado legalmente por el Ing. YOHAN FERNANDO SALAZAR BAENA.

De igual forma, se realizó el proceso de invitación publica concurso de méritos, para la selección del INTERVENTOR, bajo el numero interno IHCM013-2023, por lo que se adjudicó y suscribió el Contrato de Interventoría No. CMCIH400 de 2023 celebrado con EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON.

CONTRATO DE OBRA CLPIH373 DE 2023.

- ✓ El 28 de agosto de 2023 por medio de Resolución No. 191, se apertura el proceso de licitación pública del mencionado proceso de obra cuyo objeto es "***CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA***" y mediante resolución 323 del 27 de septiembre de 2023 se adjudica el contrato en mención al CONSORCIO GLOBA CC.

- ✓ El día 02 de noviembre de 2023, se suscribió el Contrato de Obra Pública No. CLPIH373 DE 2023 Celebrado entre el Instituto Departamental Del Deporte, La Educación Física, La Recreación y El Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - "INDERHUILA" y el CONSORCIO GLOBA CC, por un valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($557.117. 258.oo) M/CTE

- ✓ El día 17 de noviembre de 2023 se suscribe el acta de inicio del contrato de obra pública No. CLPIH373 DE 2023, para dar inicio al proyecto cuyo objeto es *"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"*.

- ✓ El día 28 de diciembre de 2023 se suscribe el acta de justificación No.1 y acta de suspensión No. 1 al contrato de obra pública No. CLPIH373 DE 2023; por los motivos expuestos en el acta referida.

- ✓ Que el día 14 de mayo se suscribió el acta de justificación No. 2 para el reinicio del contrato de obra No. CLPIH373 DE 2023, y contrato de interventoría No. CIHCM400 DE 2023; por los motivos expuestos en el acta referida.

- ✓ Que el día 16 de Mayo de 2024 se suscribe el acta de reinicio No. 1 al contrato de obra pública No. CLPIH373 DE 2023 según acta de justificación No.2.

- ✓ Que el 28 de junio de 2024, se realizó solicitud por parte del contratista CONSORCIO GLOBAL CC, al interventor ING. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON con la finalidad de solicitar la aplicación en el tiempo de ejecución por tres (3) meses más, para cumplir con la finalidad del objeto contratado.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIHCM 400 DE 2023

- ✓ El 15 de septiembre de 2023 por medio de la resolución No. 282 del 2023, por la cual se adjudica el mencionado proceso de interventoría No. IHCM013 DE 2023 cuyo objeto es "*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ,ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".*; El Contrato de Interventoría No. CIHCM 400 DE 2023 Celebrado Entre El Instituto Departamental Del Deporte, La Educación Física, La Recreación y El Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - INDERHUILA y el ING. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON, Identificado con NIT 7.706.737-6, fue suscrito el día 31 de octubre de 2023 por un valor CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECEINTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($45.738.299,oo) M/CTE.

- ✓ El día 17 de noviembre de 2023 se suscribe el acta de inicio del contrato de interventoría No. CIHCM400 DE 2023, para dar inicio al proyecto cuyo objeto es "*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

- ✓ El día 28 de diciembre de 2023 se suscribe el acta de justificación No.1 y acta de suspensión No. 1 al contrato de interventoría No. No. CIHCM400 DE 2023; por los motivos expuestos en el acta referida.

- ✓ Que el día 14 de mayo se suscribió el acta de justificación No. 2 para el reinicio del contrato de obra No. CLPIH373 DE 2023, y contrato de interventoria No. CIHCM400 DE 2023; por los motivos expuestos en el acta referida.

- ✓ Que el día 16 de Mayo de 2024 se suscribe el acta de reinicio No. 1 al contrato de interventoria No. CIHCM400 DE 2023 según acta de justificación No.2.

- ✓ Que el 2 de julio de 2024, EDWIN MAUIRICIO ROJAS ALARCON en calidad de interventor del contrato de obra Nro. 373 DE 2023, por medio de oficio dirigido al Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA, contratante avala solicitud de ampliación en el tiempo de ejecución por dos (2) meses más, para cumplir con la finalidad del objeto contratado.

RAZONES TECNICAS

- ✓ Que el día 28 de junio de 2024, el contratista de obra No. CLPIH325 -2023 solicitó a la interventoría mediante oficio un adicional en tiempo contractual por tres (03) meses, por los siguientes hechos:

1. *(...) El departamento del Huila ha sido golpeado en estos primeros meses del año 2024 por la temporada de fuertes lluvias que se han presentado en los diferentes municipios en especial los municipios del sur del Huila (...)*

Lo anterior ha imposibilitado el correcto desarrollo y cumplimiento del cronograma de obra toda vez que una vez reiniciado el día 16 de mayo, se procedió continuar con actividades de excavación, corte, figurado y armado de hierro y fundición de elementos estructurales, pero en el mes de junio se han presentado lluvia constante generando empozamiento de agua en las excavaciones realizadas como se evidencia en los registros fotográficos anexos a la presente acta de justificación, generando retrocesos en las actividades a desarrollar.

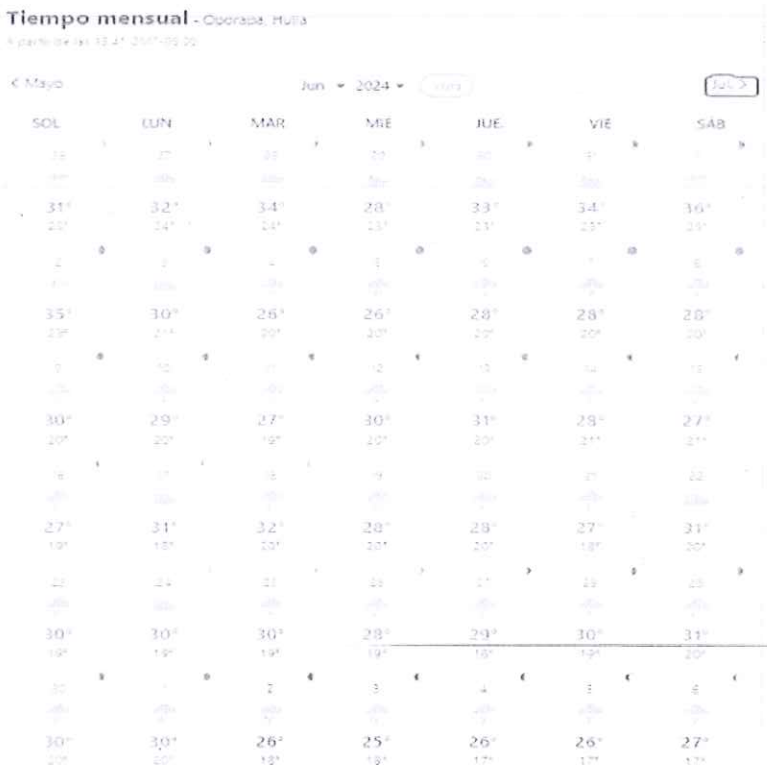


Ilustración 1. Registro de lluvias mes de junio



Ilustración 2. Registro de empozamiento en excavaciones

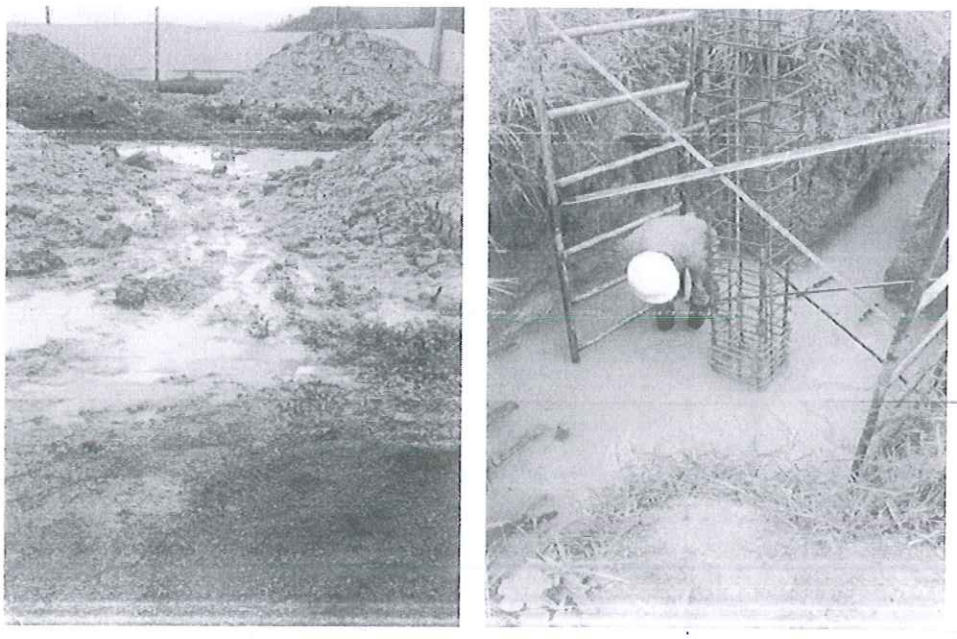


Ilustración 3. Registro afectaciones en obra a causa de lluvias.

2. *(...) Otra de las situaciones dificultosas para el consorcio ha sido la falta de personal de mano de obra ya que esta región y muchas más del departamento del Huila se encuentran para estas fechas en temporadas de recolección de cosechas de CAFÉ y la gente se ausenta por periodos largos, motivo por el cual la mano de obra esta escasa, por consiguiente, esta situación limita también un poco el avance en la obra (...)*

✓ Que el día 02 de julio de 2024 mediante oficio No.1-22024-1117, el contratista de interventoría No. CIHCM400 -2023 Ing. EDWIN MAURICIO ROJAS, avala y remite al Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila, solicitud del contratista de obra a la entidad contratante y solicita una ampliación de tiempo al contrato de obra pública No. CLPIH325-2023 por el término de dos (2) meses el cual manifiesta:

(...) Se anexa oficio con 1 e anexa oficio con 12 hojas, en donde el contratista de obra solicita 3 meses mas de ampliación de plazo del contrato, nosotros como interventoría avalamos esta solicitud de acuerdo al fundamento presentado por parte del contratista de obra en donde se evidencia la información correspondiente.

Esta interventoría aprueba las justificaciones que el contratista de obra alude, además teniendo en cuenta que el personal de interventoría en obra da fe de las situaciones expuestas, por consiguiente, CERTIFICO y doy aprobación para esta ampliación de tiempo que se dará por 2 meses.(...)

CONCLUSIONES

✓ Que una vez revisada la información presentada por el contratista de obra GLOBAL CC, a la interventoría Ing. EDWIN MAURICIO ROJAS, quien avala la solicitud elevada por el contratista, la entidad contratante procede a autorizar la prórroga al contrato de obra CLPIH373 de 2023 por un lapso de dos (02) meses más.

✓ Que atendiendo la regla lógica por la que se ordena que aquello que sea accesorio al objeto fundamental de una obligación siga el mismo destino que la primera, la entidad mediante acto Administrativo, procederá igualmente con la prórroga del Contrato de Interventoría No. CIHCM400 de 2023 por un lapso dos (02) meses más.

✓ Las partes acuerdan que la prórroga no genera costos adicionales en el valor del contrato ni dará lugar a futuras reclamaciones e indemnizaciones por parte del contratista por mayor permanencia en la obra y cambio de precios en el mercado de los insumos y materiales, hasta la firma del presente documento.

- ✓ El contratista realizará los respectivos ajustes a las pólizas, bajo sus costas, una vez se suscriba el otro si modificatorio de los respectivos contratos.

- ✓ Se adjuntan los siguientes documentos soporte de la presente Acta de Justificación No.3:

  Oficio de solicitud de prórroga - Contratista
  Oficio de Aval - solicitud de prórroga – Interventoría

No siendo otro el objeto de la presente reunión se da por terminada esta Acta de Justificación No. 3 – para la prórroga al contrato de obra No. CLPIH373 de 2023 y contrato de interventoría No. CIHCM400 de 2023, con la firma de las personas que en ella intervinieron el día miércoles tres (03) de julio de 2024.

Ing. YOHAN FERNANDO SALAZAR BAENA
R.L. CONSORCIO GLOBAL CC
CONTRATISTA DE OBRA

Ing. EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
INTERVENTOR

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
DIRECTOR DEL INDERHUILA

Ing. NATALIA BUSTOS BOTERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Aprobó. Jaime Enrique Jimenez Lopez
Asesor Jurídico Externo

Visto. Bueno. Daniela Rivera Garcia
Abogada – Contratista

Proyectó Juan Sebastián Flórez García
Abogado – Contratista Inderhuila

Kmrp
3/jul/24

EMRP
EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
INGENIERIA CIVIL

Neiva, 02 de Julio de 2024

INDERHUILA
No. Radicado: 1-2024-1124
No. de Folios: 1
Fecha: 2/07/2024
Hora: 9:00 PM
Recibido por: correo electronico

Doctor
FELIPE VICTORIA
Supervisor contrato.
Neiva – Huila

Asunto: Solicitud de ampliación de tiempo por parte de la interventoría a **INDERHUILA**, de la solicitud del contratista de obra respecto a la ampliación de tiempo para el contrato de **Obra Pública N° 373 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Por medio del presente, me dirijo a usted para hacerle entrega de la solicitud de ampliación de tiempo al contrato de la referencia para el municipio de Oporapa vereda San Roque, solicitud presentada por parte del contratista **CONSORCIO GLOBAL CC.**

Se anexa oficio con 12 hojas, en donde el contratista de obra solicita 3 meses mas de ampliación de plazo del contrato, nosotros como interventoría avalamos esta solicitud de acuerdo al fundamento presentado por parte del contratista de obra en donde se evidencia la información correspondiente.

Esta interventoría aprueba las justificaciones que el contratista de obra alude, además teniendo en cuenta que el personal de interventoría en obra da fe de las situaciones expuestas, por consiguiente, **CERTIFICO** y doy aprobación para esta ampliación de tiempo que se dará por 2 meses.

Solicito por favor la respuesta positiva o negativa al balance de obra final ajustado radicado el día 13 de junio de 2024.

Dirección: Calle 73 No. 22 - 88**Barrio:** Villa Sol **Celular:** 316 5208147
email emrp21@gmail.com

EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
INGENIERIA CIVIL

Sin otro en particular esta interventoría deja a discrecionalidad de la entidad **INDERHUILA** para que determine si concede la viabilidad de esta adición de tiempo.

Agradezco la atención prestada y su valiosa colaboración, quedando pendiente de su pronta respuesta,



EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
C.C. 7.706.737
Interventor

Dirección: Calle 73 No. 22 - 88**Barrio:** Villa Sol **Celular:** 316 5208147
email emra31@gmail.com

Consorcio

GLOBAL CC

Neiva, 28 de Junio 2024

Ingeniero.

EDWIN MAURICIO ROJAS ALARCON
Interventor INDERHUILA
Neiva Huila

Asunto: Solicitud de Ampliación de Tiempo Contrato de la Referencia.

REFERENCIA: En el marco del **contrato de Obra Pública N° 373 DE 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Reciba un cordial saludo,

- **CONTRATO:** **373 DE 2023**
- **VALOR CONTRATO:** **$ 557.117.258**
- **FECHA DE ACTA INICIO:** **17 de Noviembre de 2023**
- **FECHA DE SUSPENSION:** **28 de Diciembre de 2022**
- **FECHA DE REINICIO:** **16 de Mayo de 2024**
- **PLAZO DE EJECUCIÓN:** **Tres (03) meses**
- **PLAZO ADICIONAL OTROSI No.1:** **Tres (03) Meses**
- **FECHA DE TERMINACION:** **01 de Octubre de 2024**

Conforme a los hechos que se describen a continuación en el presente oficio, nos permitimos respetuosamente solicitar la adición en tiempo contractual de Tres (03 Meses), teniendo como fecha final de entrega el mes de octubre de 2024, con el fin de dar la correcta terminación al proyecto de la referencia.

La anterior solicitud es en base a los siguientes hechos:

1- El departamento del Huila ha sido golpeado en estos primeros meses del año 2024 por la temporada de fuertes lluvias que se han presentado en los diferentes municipios en especial los municipios del sur del Huila, a continuación, se presenta información respecto a estos hechos.

- **REGISTRO FOTOGRAFICO NOTICIAS SOBRE LLUVIAS**



RTVC NOTICIAS

VER EN VIVO

LO MÁS RECIENTE | NACIÓN | INTERNACIONAL | POLÍTICA | DEPORTES | ECONOMÍA | CULTURA | JUSTICIA

ÚLTIMO MINUTO:

COLOMBIA

¿Mayo, mes de lluvias con intensidad? Este sería el pronóstico en el país según el MinAmbiente

RELACIONADO: #Lluvias #Ministerio de Ambiente #Ideam #Mayo

Compartir en: Facebook Twitter Whatsapp Linkedin

Publicado: 30 de Abril 2024, 11:06 AM

Conozca cuál sería el pronóstico del estado del clima para el mes de mayo en Colombia en medio de jornadas de nubosidad, tiempo seco y precipitaciones.

Gobernación del Huila

Inicia

Buscar...

Inicio | Transparencia y Acceso a la Información Pública | Atención Ciudadana | Participa | Quiénes Somos

Inicio > En marcha el Plan de Contingencia para afrontar primera temporada de lluvias de 2024

En marcha el Plan de Contingencia para afrontar primera temporada de lluvias de 2024

Compartir Buscar




Primer festivo de junio, pasado por lluvia: Ideam prevé mucha agua en 25 departamentos del país

En Bogotá, por el contrario, se prevé tiempo seco durante los primeros días del fin de semana y lluvias moderadas entre domingo y lunes.

Anuncios Google

Enviar comentarios ¿Por qué este anuncio? ⓘ

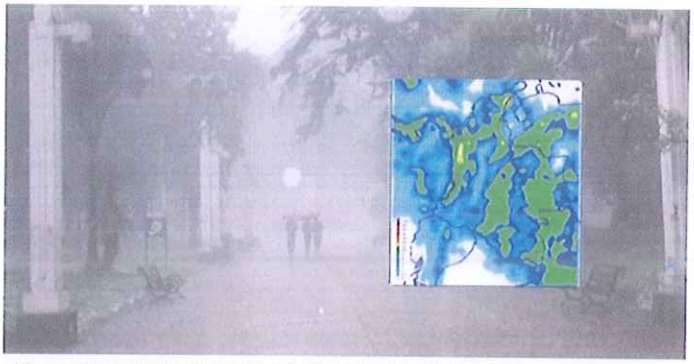

Anuncios Google

Dejar de ver anuncio


¿Por qué este anuncio? ⓘ

El Ideam prevé lluvias durante el primer festivo de junio 2024. Foto: Ministerio de Ambiente - Ideam.

Consorcio

GLOBAL CC


TIEMPO MENSUAL DE LLUVIAS – MES DE MAYO DE 2024

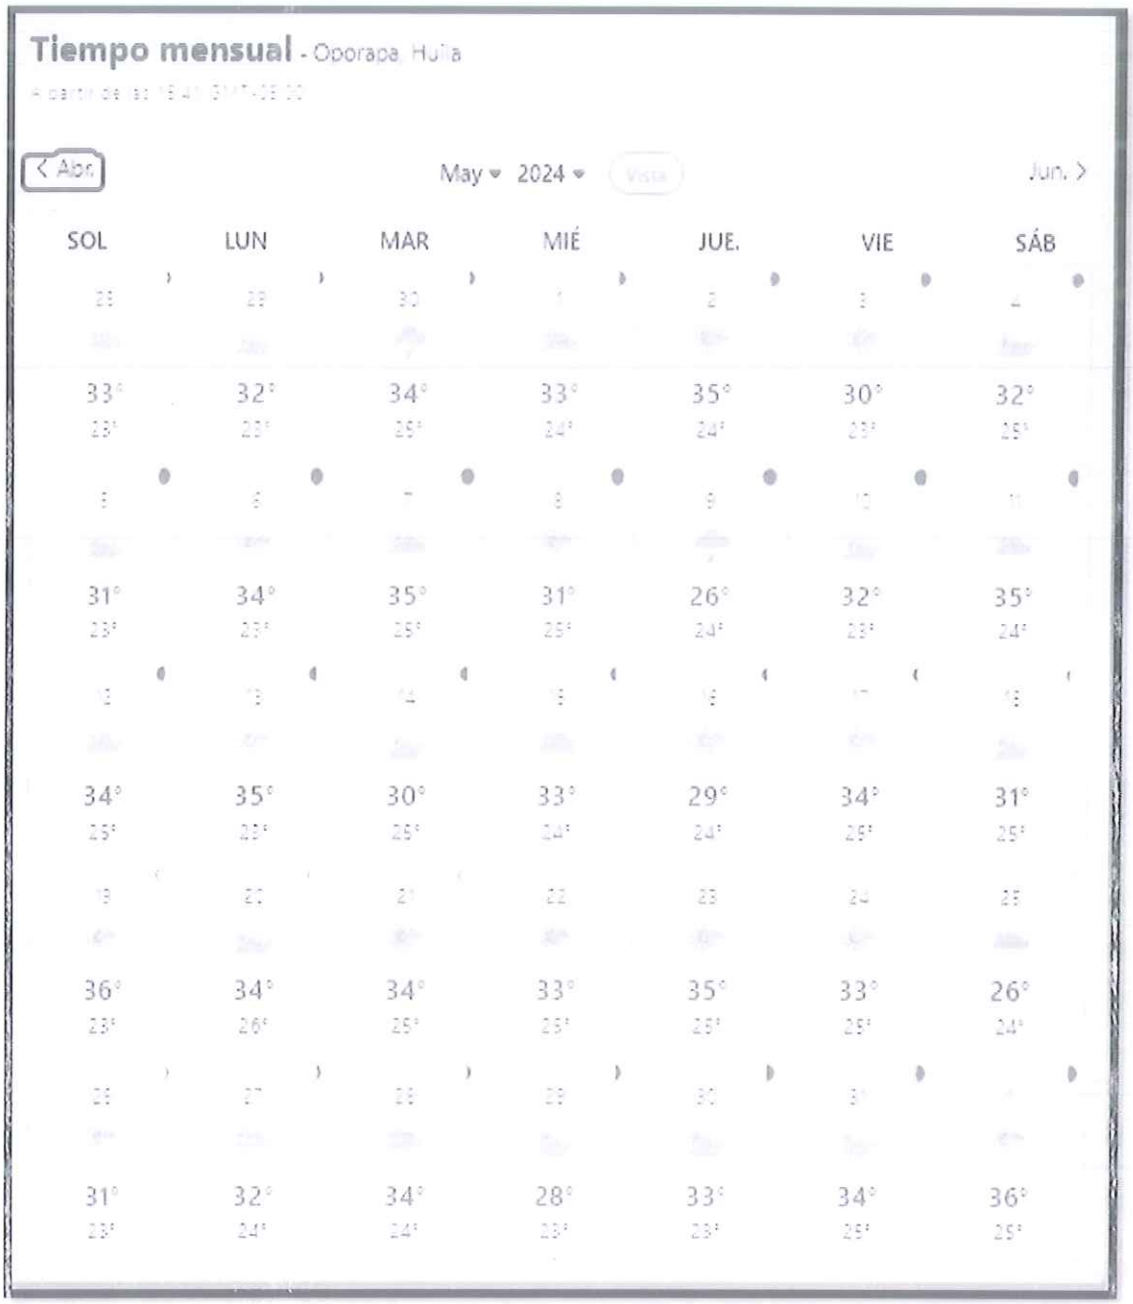

Consorcio

GLOBAL CC

TIEMPO MENSUAL DE LLUVIAS – MES DE JUNIO DE 2024

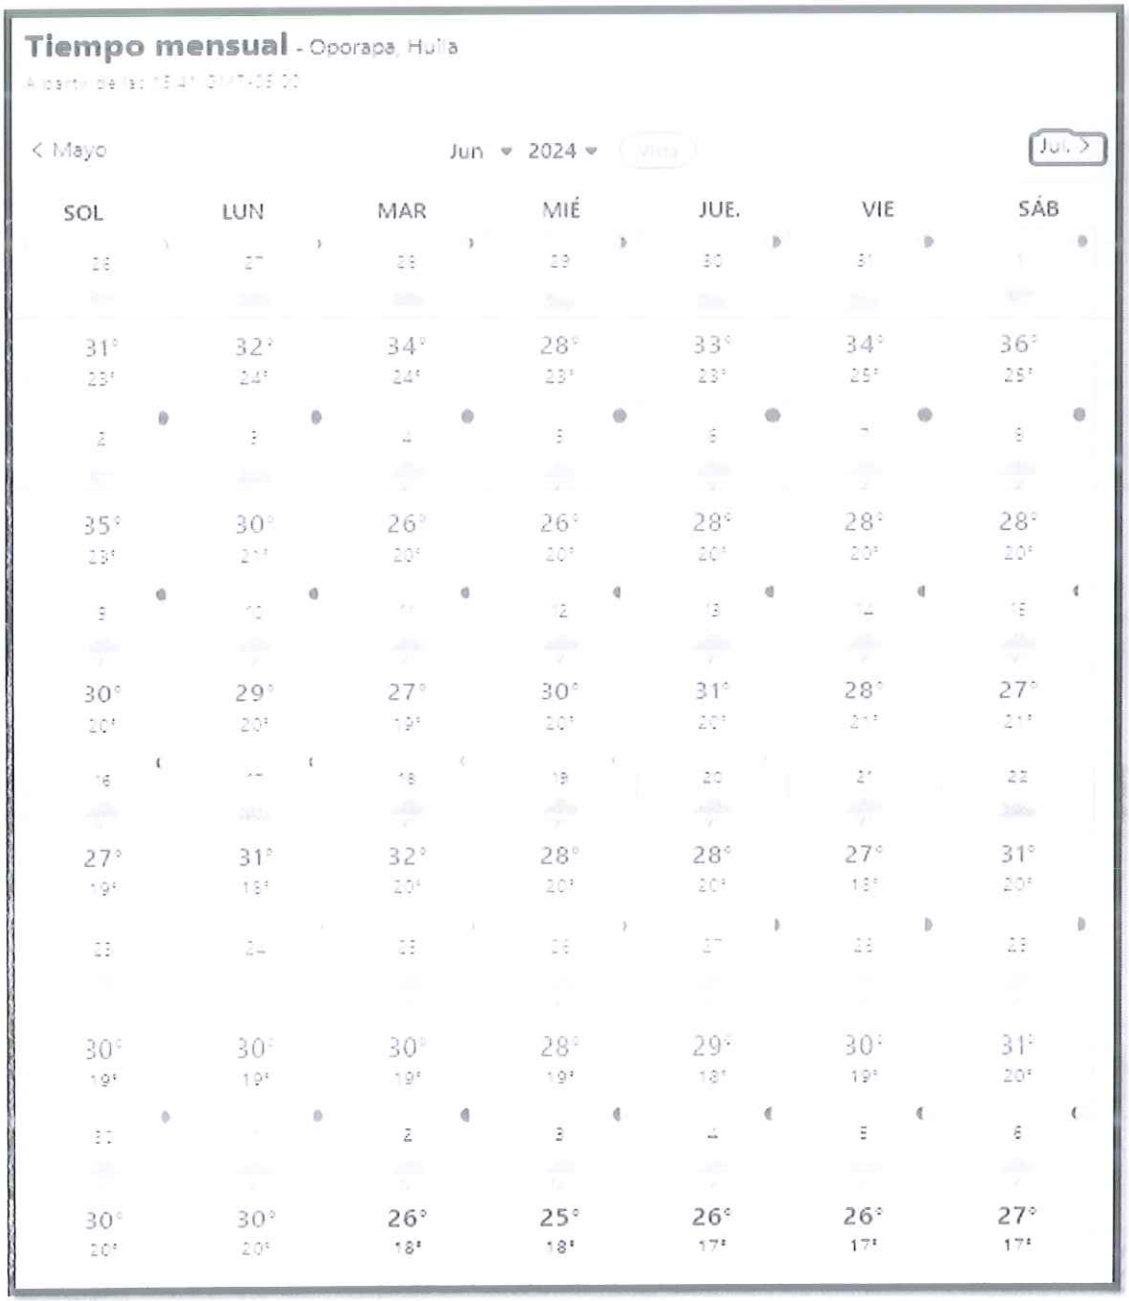

Tiempo mensual - Oporapa, Huila

< Mayo | Jun | 2024 | Hoy | Jul. >

SOL	LUN	MAR	MIÉ	JUE.	VIE	SÁB
26	27	28	29	30	31	1
31° 23°	32° 24°	34° 24°	28° 23°	33° 23°	34° 25°	36° 25°
2	3	4	5	6	7	8
35° 23°	30° 21°	26° 20°	26° 20°	28° 20°	28° 20°	28° 20°
9	10	11	12	13	14	15
30° 20°	29° 20°	27° 19°	30° 20°	31° 20°	28° 21°	27° 21°
16	17	18	19	20	21	22
27° 19°	31° 18°	32° 20°	28° 20°	28° 20°	27° 18°	31° 20°
23	24	25	26	27	28	29
30° 19°	30° 19°	30° 19°	28° 19°	29° 18°	30° 19°	31° 20°
30	1	2	3	4	5	6
30° 20°	30° 20°	26° 18°	25° 18°	26° 17°	26° 17°	27° 17°

FUENTE: https://www.weather-atlas.com/es/colombia/oporapa-el-tiempo-en-abril

Marzo – Abril - Mayo

Abril pronóstico del tiempo Oporapa, Colombia

Hoy | Mañana | A Largo Plazo

Año E F M Abril M J J A S O N D

Index + Expandir

	Mar	Abril	May
Promedio de temperatura alta	23°C 73.4°F	22.1°C 71.8°F	21.7°C 71.1°F
Promedio de temperatura baja	13.7°C 56.7°F	13.5°C 56.3°F	13.4°C 56.1°F
Presión promedio	1012.7mbar 29.91inHg	1013.4mbar 29.93inHg	1014.1mbar 29.95inHg
Velocidad promedio del viento	4.2km/h 2.6mph	4.3km/h 2.7mph	4.3km/h 2.7mph
Velocidad máxima promedio del viento	4.6km/h 2.9mph	4.6km/h 2.9mph	4.6km/h 2.9mph
Ráfagas promedio de viento	6.8km/h 4.2mph	6.9km/h 4.3mph	7km/h 4.3mph
Humedad media	83%	84%	84%
Precipitación media	183mm 7.2'	168mm 6.61'	144mm 5.67'
Promedio de días de lluvia	30.3	29.1	26.8
Luz diurna media	12h 1min	12h 1min	12h 1min
Promedio de insolación	7h 1min	7h 5min	8h 4min
Días promedio de sol	0.2	0.7	3
Promedio del índice UV	5	5	5
Cobertura nubosa promedio	51%	53%	52%
Visibilidad promedio	8km 5mi	7km 4.3mi	8km 5mi

FUENTE: https://www.weather-atlas.com/es/colombia/oporapa-el-tiempo-en-abril

Junio – Julio - Agosto

Julio pronóstico del tiempo Oporapa, Colombia

Hoy | Mañana | A Largo Plazo

Año E F M A M J Julio A S O N D

Index + Expandir

	Jun	Julio	Ago
Promedio de temperatura alta	20.6°C 69.1°F	19.8°C 67.6°F	21.4°C 70.5°F
Promedio de temperatura baja	12.8°C 55°F	12.1°C 53.8°F	12.3°C 54.1°F
Presión promedio	1015.1mbar 29.98inHg	1015.4mbar 29.98inHg	1014.9mbar 29.97inHg
Velocidad promedio del viento	4.5km/h 2.8mph	4.5km/h 2.8mph	4.8km/h 3mph
Velocidad máxima promedio del viento	4.8km/h 3mph	4.8km/h 3mph	5.3km/h 3.3mph
Ráfagas promedio de viento	7.4km/h 4.6mph	7.4km/h 4.6mph	8km/h 5mph
Humedad media	84%	85%	80%
Precipitación media	80mm 3.15"	81mm 3.19"	57mm 2.24"
Promedio de días de lluvia	22.1	20.9	17.7
Luz diurna media	12h 1min	12h 1min	12h 1min
Promedio de insolación	8h 1min	6h 5min	7h 4min
Días promedio de sol	6.6	7.7	10.3
Promedio del índice UV	5	5	5
Cobertura nubosa promedio	53%	54%	46%
Visibilidad promedio	7km 4.3mi	7km 4.3mi	8km 5mi

REGISTRO FOTOGRAFICO LLUVIAS EN LA OBRA











Nit. 901.765.554-1 Cel. 3204776530 E-mail. construaval@yahoo.com
Dirección. Calle 24 No 1 G – 50 Barrio Rojas Trujillo
Neiva – Huila - Colombia



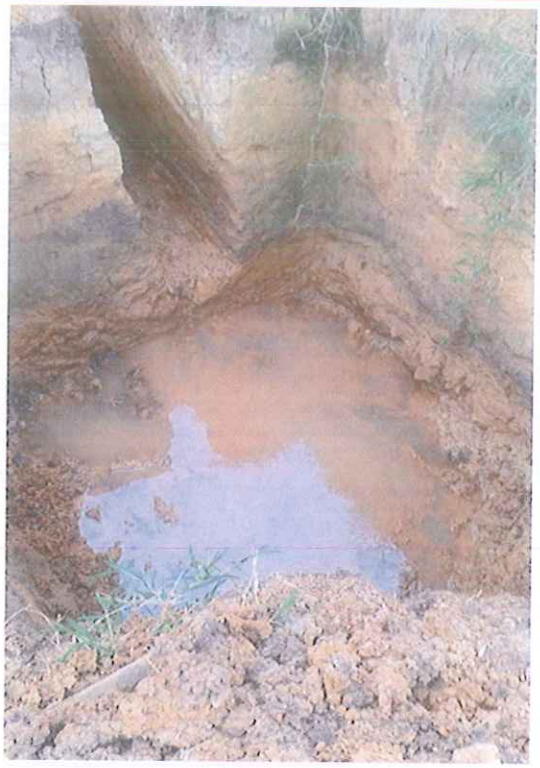



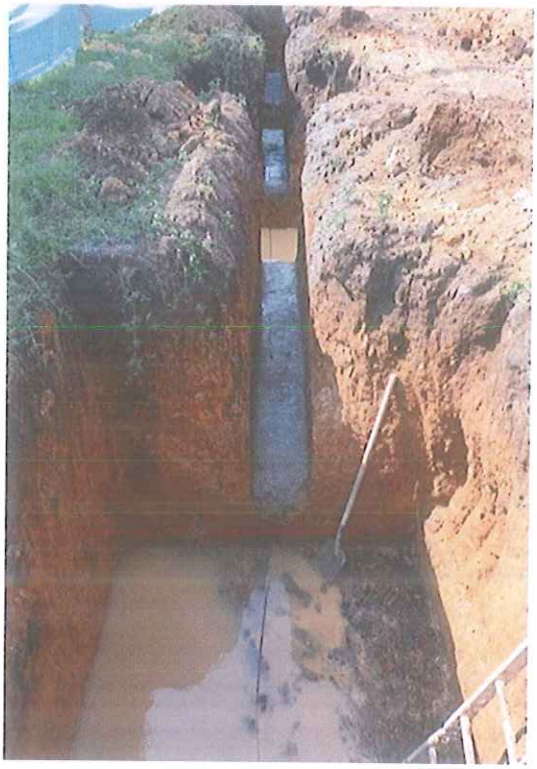

Nit. 901.765.554-1 Cel. 3204776530 E-mail. construaval@yahoo.com
Dirección. Calle 24 No 1 G – 50 Barrio Rojas Trujillo
Neiva – Huila - Colombia









Nit. 901.765.554-1 Cel. 3204776530 E-mail. construaval@yahoo.com
Dirección. Calle 24 No 1 G – 50 Barrio Rojas Trujillo
Neiva – Huila - Colombia









2- Otra de las situaciones dificultosas para el consorcio ha sido la falta de personal de mano de obra ya que esta región y muchas más del departamento del Huila se encuentran para estas fechas en temporadas de recolección de cosechas de CAFÉ y la gente se ausenta por periodos largos, motivo por el cual la mano de obra esta escasa, por consiguiente, esta situación limita también un poco el avance en la obra.

De ante mano agradezco la colaboración prestada a esta solicitud

Atentamente,

Ing. Yohan Fernando Salazar Baena
CC 7.709.122 de Neiva - Huila
Representante Legal
Consorcio Global CC
Nit. 901.765.554-1
