Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	21/06/2024
CONTRATO №	CE-17-2024
OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS,ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. De acuerdo a la oferta económica presentada por el CONTRATISTA, los valores unitarios para realizar la Cuarta fase de la MODERNIZACIÓN AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PALACIO DE JUSTICIA "FANNY GONZALEZ FRANCO" DE MANIZALES CALDAS – PISOS 2 y SÓTANO UNO
FECHA DE INICIO	19 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE JUNIO DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	70 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
VALOR	$ 387.282.492,48
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA No1	
SUSPENSION No1	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GLOBAL AST SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S

TIPO DE OBRA

		MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN	x		

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZ	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
1	CAPITULO 1 PISO 3														
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS														
1.01	Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W	UN	201	$ 423.101	$ 85.043.301				201,0	$ 85.043.301	48	$ 20.308.848	165	$ 69.811.665	82%
1.02	Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED	UN	48	$ 153.122	$ 7.349.856				48,0	$ 7.349.856		$ -	44	$ 6.737.368	92%
1.03	Suministro e instalación de Luminaria - HERMETICA IT 1OO AQ DUNA LENS E10 660X95X100 SOBRE PONER18W	UN	8	$ 262.004	$ 2.096.032				8,0	$ 2.096.032		$ -	4	$ 1.048.016	50%
1.04	Suministro e instalación de Luminaria BALA LED REDONDA 22W pasillos	UN	28	$ 169.031	$ 4.732.868				28,0	$ 4.732.868		$ -	28	$ 4.732.868	100%
	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES											$ -	0	$ -	0%
1,05	Retiro de Luminaria Existente de 60x60	UN	201	$ 23.214	$ 4.666.014				201,0	$ 4.666.014		$ -	172	$ 3.992.808	86%
1,06	Retiro de Luminaria Existente bala led de 22 w en pasillos	UN	28	$ 23.214	$ 649.992		1,0		29,0	$ 673.206			29	$ 673.206	100%
1,07	Suspensión aislada de punto eléctrico existente	UN	60	$ 11.386	$ 683.160				60,0	$ 683.160		$ -	45	$ 512.370	75%
1,08	Reubicación de punto eléctrico	UN	60	$ 44.019	$ 2.641.140				60,0	$ 2.641.140		$ -	60	$ 2.641.140	100%
1,09	Adecuación de Alimentación de luminarias existentes para unificar circuito de emergencia y circuito Normal	UN	60	$ 219.889	$ 13.193.340				60,0	$ 13.193.340		$ -	60	$ 13.193.340	100%

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	21/06/2024
CONTRATO №	CE-17-2024
OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS,ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. De acuerdo a la oferta económica presentada por el CONTRATISTA, los valores unitarios para realizar la Cuarta fase de la MODERNIZACIÓN AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PALACIO DE JUSTICIA "FANNY GONZALEZ FRANCO" DE MANIZALES CALDAS – PISOS 2 y SÓTANO UNO
FECHA DE INICIO	19 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE JUNIO DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	70 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
VALOR	$ 387.282.492,48
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA No1	
SUSPENSION No1	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GLOBAL AST SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S

TIPO DE OBRA					
		MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN	x		

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZ	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO				$ -					$ -		$ -	0	$ -	0%
1,10	Suministro e instalación de sensor provolt	UN	23	$ 2.001.431	$ 46.032.913				23,0	$ 46.032.913		$ -	18	$ 36.025.758	78%
1,11	Suministro e instalación de Botonera 4 botones para atenuar luminarias a través de sensor	UN	23	$ 476.289	$ 10.954.647				23,0	$ 10.954.647		$ -	13	$ 6.191.757	57%
1,12	Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x20 AWG que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v	ML	1250	$ 11.662	$ 14.577.500				1250,0	$ 14.577.500		$ -	981	$ 11.440.422	78%
1,13	Suministro e instalación de encauchetado 3x16AWG desde caja de paso hasta luminaria con accesorios de fijación y empalme eléctrico	ML	350	$ 12.694	$ 4.442.900				350,0	$ 4.442.900		$ -	303,8144	$ 3.856.620	87%
1,14	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP. No incluye tubería, ni circuitos de alimentación.	UN	27,00	$ 122.853	$ 3.317.031				27,0	$ 3.317.031		$ -	27	$ 3.317.031	100%
1,15	Suministro e instalación interruptor sencillo.	UN	16,00	$ 28.093	$ 449.488				16,0	$ 449.488		$ -	13	$ 365.209	81%
	CIVILES				$ -							$ -		$ -	0%
1,16	Reparación de hueco de luminaria retirada	UN	165,00	$ 22.195	$ 3.662.175				165,0	$ 3.662.175		$ -	159	$ 3.529.005	96%
1,17	Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	M2	125,00	$ 32.874	$ 4.109.250				125,0	$ 4.109.250		$ -	115	$ 3.780.510	92%
1,18	Reparación de muro afectado por interruptor de encendido por luminarias nuevas	ML	8,00	$ 34.726	$ 277.808		11,0		19,0	$ 659.794		$ -	19	$ 659.794	100%
1,19	Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria	UN	126,00	$ 21.818	$ 2.749.068				126,0	$ 2.749.068	16,46	$ 359.076	87,24778	$ 1.903.572	69%
1,2	Pintura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas en archivos	M2	12,00	$ 29.677	$ 356.124				12,0	$ 356.124		$ -	0	$ -	0%
1,21	Pintura de Techo zonas afectadas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	UN	8,00	$ 29.677	$ 237.416				8,0	$ 237.416		$ -	0	$ -	0%

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	21/06/2024
CONTRATO №	CE-17-2024
OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS,ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. De acuerdo a la oferta económica presentada por el CONTRATISTA, los valores unitarios para realizar la Cuarta fase de la MODERNIZACIÓN AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PALACIO DE JUSTICIA "FANNY GONZALEZ FRANCO" DE MANIZALES CALDAS – PISOS 2 y SÓTANO UNO
FECHA DE INICIO	19 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE JUNIO DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	70 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
VALOR	$ 387.282.492,48
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA No1	
SUSPENSION No1	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GLOBAL AST SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S

TIPO DE OBRA

		MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN	x		

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZ	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
2	**CAPÍTULO 2 - PISO 4**														0%
	SUMINISTRO DE LUMINARIAS NUEVAS - LUMINARIAS EN OFICINAS Y PASILLOS				$ -							$ -	0	$ -	0%
2,01	Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W	UN	20	$ 423.101	$ 8.462.020				20,0	$ 8.462.020		$ -	0	$ -	0%
2,02	Suministro e instalación de Luminaria BALA LED REDONDA 22W	UN	4	$ 169.031	$ 676.124				4,0	$ 676.124		$ -	0	$ -	0%
2,03	Suministro e instalación de Luminaria - CCCE 36 de descolgar	UN	28	$ 236.182	$ 6.613.096				28,0	$ 6.613.096		$ -	0	$ -	0%
2,04	Suministro e instalación de Luminaria - HERMETICA IT 1OO AQ DUNA LENS E10 660X95X100 SOBRE PONER18W	UN	6	$ 262.004	$ 1.572.024				6,0	$ 1.572.024		$ -	0	$ -	0%
2,05	Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED	UN	7	$ 153.122	$ 1.071.854				7,0	$ 1.071.854		$ -	0	$ -	0%
	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES				$ -					$ -		$ -	0	$ -	0%
2,06	Retiro de Luminaria Existente de 60x60	UN	20,00	$ 23.214	$ 464.280				20,0	$ 464.280		$ -	0	$ -	0%
2,07	Retiro de Luminaria Colgante	UN	28,00	$ 23.214	$ 649.992				28,0	$ 649.992		$ -	0	$ -	0%
	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO														0%
2,08	Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x20 AWG que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v	ML	50	$ 11.662	$ 583.100				50,0	$ 583.100		$ -	0	$ -	0%
2,09	Suministro e instalación de sensor provolt	UN	1	$ 2.001.431	$ 2.001.431				1,0	$ 2.001.431		$ -	0	$ -	0%
2,10	Suministro e instalación de Botonera 4 botones para atenuar luminarias a través de sensor	UN	1	$ 476.289	$ 476.289				1,0	$ 476.289		$ -	0	$ -	0%
2,11	Suministro e instalación de encauchetado 3x16AWG desde caja de paso hasta luminaria con accesorios de fijación y empalme eléctrico	ML	200	$ 12.694	$ 2.538.800				200,0	$ 2.538.800		$ -	0	$ -	0%
2,12	Suministro e instalación interruptor sencillo.	UN	9	$ 28.093	$ 252.837		1,0		10,0	$ 280.930			0	$ -	0%
					$ -					$ -		$ -	0	$ -	0%

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	21/06/2024
CONTRATO №	CE-17-2024
OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS,ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. De acuerdo a la oferta económica presentada por el CONTRATISTA, los valores unitarios para realizar la Cuarta fase de la MODERNIZACIÓN AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PALACIO DE JUSTICIA "FANNY GONZALEZ FRANCO" DE MANIZALES CALDAS – PISOS 2 y SÓTANO UNO
FECHA DE INICIO	19 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE JUNIO DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	70 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
VALOR	$ 387.282.492,48
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA No1	
SUSPENSION No1	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GLOBAL AST SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S

TIPO DE OBRA

		MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN	x		

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZ	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	OBRAS CIVILES				$ -					$ -		$ -	0	$ -	0%
2,13	Reparación de hueco de luminaria retirada	M2	20	$ 22.195	$ 443.900				20,0	$ 443.900		$ -	0	$ -	0%
2,14	Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	M2	24	$ 32.874	$ 788.976				24,0	$ 788.976		$ -	0	$ -	0%
2,15	Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria	UN	64	$ 21.818	$ 1.396.352				64,0	$ 1.396.352		$ -	0	$ -	0%
2,16	Pintura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas	M2	15	$ 34.726	$ 520.890				15,0	$ 520.890					
3	**SÓTANO UNO**				$ -					$ -		$ -	0	$ -	0%
3,1	Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W	UN	36	$ 423.101	$ 15.231.636				36,0	$ 15.231.636		$ -	0	$ -	0%
3,2	Suministro e instalación de Luminaria EMERGENCIA LED	UN	28	$ 153.122	$ 4.287.416				28,0	$ 4.287.416		$ -	0	$ -	0%
3,3	Suministro e instalación de Luminaria - CCCE 36 de descolgar	UN	108	$ 236.182	$ 25.507.656				108,0	$ 25.507.656		$ -	0	$ -	0%
3,4	Suministro e instalación de Luminaria - HERMETICA IT 1OO AQ DUNA LENS E10 660X95X100 SOBRE PONER18W	UN	2	$ 262.004	$ 524.008				2,0	$ 524.008		$ -	0	$ -	0%
3,5	Suministro e instalación de Luminaria BALA LED REDONDA 22W	UN	11	$ 169.031	$ 1.859.341				11,0	$ 1.859.341		$ -	0	$ -	0%
	ADECUACIONES EN OFICINA Y EDIFICIO - ELECTRICAS DE REDES EXISTENTES				$ -				0,0	$ -		$ -	0	$ -	0%
3,6	Retiro de Luminaria Existente de 60x60	UN	36	$ 23.214	$ 835.704				36,0	$ 835.704		$ -	0	$ -	0%
3,7	Retiro de Luminaria Existente de 2 x 32 w	UN	108	$ 23.214	$ 2.507.112				108,0	$ 2.507.112		$ -	0	$ -	0%
3,8	Suministro e instalación DPS tipo 2 tablero de emergencia eléctrico	UN	1	$ 988.288	$ 988.288				1,0	$ 988.288		$ -	0	$ -	0%

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	21/06/2024
CONTRATO №	CE-17-2024
OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS,ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. De acuerdo a la oferta económica presentada por el CONTRATISTA, los valores unitarios para realizar la Cuarta fase de la MODERNIZACIÓN AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PALACIO DE JUSTICIA "FANNY GONZALEZ FRANCO" DE MANIZALES CALDAS – PISOS 2 y SÓTANO UNO
FECHA DE INICIO	19 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE JUNIO DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	70 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
VALOR	$ 387.282.492,48
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA No1	
SUSPENSION No1	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GLOBAL AST SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S

TIPO DE OBRA

		MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN	x		

CONTROL FÍSICO

						CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	CONDICIONES ACTUALIZ	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL		CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	ELECTRICAS DE CONTROL DE ALUMBRADO				$ -						$ -		$ -	0	$ -	0%
3,9	Suministro e instalación de sensor provolt	UN	1	$ 2.001.431	$ 2.001.431		1,0		2,0	$ 4.002.862		$ -	0	$ -	0%
3,10	Suministro e instalación de Botonera 4 botones para atenuar luminarias a través de sensor	UN	1	$ 476.289	$ 476.289		1,0		2,0	$ 952.578		$ -	0	$ -	0%
3,11	Suministro e instalación de salida para iluminación en zona de iluminación de lámparas de emergencia para cumplir requerimiento RETILAP. incluye tubería, y circuitos de	UN	28	$ 195.769	$ 5.481.532			12,0	16,0	$ 3.132.304		$ -	0	$ -	0%
3,12	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo en zona de iluminación de archivo incluye afectación civil rompiendo pared para la ubicación del mismo.	UN	1	$ 200.211	$ 200.211		2,0	1,0	2,0	$ 400.422		$ -	0	$ -	0%
3,13	Suministro e instalación interruptor sencillo.	UN	29	$ 28.093	$ 814.697				29,0	$ 814.697		$ -	0	$ -	0%
3,14	Suministro e instalación de interconexión de control de lampara a lampara con cable de control de 2x20 AWG que va en las luminarias que utilizan atenuador de 0-10v	MT	50	$ 11.662	$ 583.100		50,0		100,0	$ 1.166.200		$ -	0	$ -	0%
3,15	Suministro e instalación de encauchetado 3x16AWG desde caja de paso hasta luminaria con accesorios de fijación y empalme eléctrico	MT	250	$ 12.694	$ 3.173.500			113,1	137,0	$ 1.738.443		$ -	0	$ -	0%
	OBRAS CIVILES				$ -				0,0	$ -		$ -	0	$ -	0%
3,16	Reparación de hueco de luminaria retirada	UN	36	$ 22.195	$ 799.020				36,0	$ 799.020		$ -	0	$ -	0%
3,17	Reparación de techo en oficinas por adecuaciones realizadas para salidas eléctricas en control	M2	16	$ 32.874	$ 525.984				16,0	$ 525.984		$ -	0	$ -	0%
3,18	Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria	UN	28	$ 21.818	$ 610.904				28,0	$ 610.904		$ -	0	$ -	0%
3,19	Pintura de muro zonas afectadas por interruptor de encendido por luminarias nuevas	M2	10	$ 34.726	$ 347.260				10,0	$ 347.260		$ -	0	$ -	0%
	SUBTOTAL				**$ 307.489.077**					**$ 307.399.116,00**		**$ 20.667.923,84**		$ 174.412.459	
	ADMINISTRACION			19,00%	$ 58.422.925				19,00%	$ 58.405.832	19,00%	$ 3.926.906	19,00%	$ 33.138.367	57%
	IMPREVISTOS			1,00%	$ 3.074.891				1,00%	$ 3.073.991	1,00%	$ 206.679	1,00%	$ 1.744.125	57%
	UTILIDAD			5,00%	$ 15.374.454				5,00%	$ 15.369.956	5,00%	$ 1.033.396	5,00%	$ 8.720.623	57%
	IVA SOBRE U			19,00%	$ 2.921.146				19,00%	$ 2.920.292	19,00%	$ 196.345	19,00%	$ 1.656.918	57%
											.				
	COSTO TOTAL CONTRATO				**$ 387.282.492,5**					**$ 387.169.187**	.	**$ 26.031.250**		**$ 219.672.492**	57%

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	2
FECHA	21/06/2024
CONTRATO №	CE-17-2024
OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS,ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL. De acuerdo a la oferta económica presentada por el CONTRATISTA, los valores unitarios para realizar la Cuarta fase de la MODERNIZACIÓN AL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LAS OFICINAS DEL PALACIO DE JUSTICIA "FANNY GONZALEZ FRANCO" DE MANIZALES CALDAS – PISOS 2 y SÓTANO UNO
FECHA DE INICIO	19 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE JUNIO DE 2024
PLAZO (MESES O DÍAS)	70 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
VALOR	$ 387.282.492,48
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA No1	
SUSPENSION No1	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	
ADICIONES	N/A
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	GLOBAL AST SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S

TIPO DE OBRA

		MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN	x		

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZ	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.2		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO	$	387.282.492	VALOR ANTICIPO		
VALOR ACTAS ANTERIORES	$	193.641.242,00	AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA	$	26.031.250	AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR EJECUTAR	$	167.610.000	SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES					
SUMAS IGUALES	$	387.282.492,48	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA	$	26.031.250		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO			VALOR A PAGAR EN LETRAS	VEINTISEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL DOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/C
VALOR A PAGAR	$	26.031.250		

Por medio de la presente Acta, se hace entrega al Contratista del sitio donde se realizarán los trabajos, quedando bajo su responsabilidad y manejo, dejando constancia de que el personal arriba anotado se encuentra afiliado al sistema de seguridad integral, según constancias de afiliación anexas. El Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado.

FIRMA
GLOBAL AST S.A.S
NIT: **800228515-3**
JORGE ALBERTO CARDONA CEBALLOS
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE:INGENIERIA Y DISEÑO DE OCCIDENTE S.A.S
NIT: 900448366
D.I ALEXANDER BEDOYA DUQUE .
INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.


	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1


FECHA:	21 de junio del 2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	CE-17-2024
OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES, la cuarta fase de modernización al sistema de iluminación a un sistema inteligente y autónomo de las oficinas del Palacio De Justicia Fanny González Franco de Manizales – Caldas
CONTRATISTA	GLOBAL ASTI S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INGENIERÍA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS


N° ITEM	1,01 CAPITULO 1 PISO 2	DESCRIPCIÓN ITEM	Suministro e instalación de Luminaria-PANEL LED de 610X600X80 SOBREPONER 50W	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Retiradas	Unidad	Otro			
										0	
1	SALA 201									**0**	
2	SALA 202								**2,00**	**2**	
3	SALA 203									**2**	
4	SALA 206									**2**	
5	SALA 210									**2**	
6	SALA 211									**2**	
7	SALA 212									**2**	
8	SALA 218									**2**	
9	SALA 219								**6,00**	**8**	
10	SALA 220								**6,00**	**14**	
11	SALA 221								**8,00**	**22**	
12	SALA 222								**8,00**	**30**	
13	SALA 223								**8,00**	**38**	
14	SALA 224								**10,00**	**48**	
15	SALA 225								**0,00**	**48**	
16	SALA 226									**48**	
17	SALA 227									**48**	
18	SALA 228									**48**	
19	SALA 229									**48**	
20	SALA 230									**48**	
21	SALA 231									**48**	

22	SALA 232									**48**
23	SALA 233									**48**
24	SALA 234									**48**
25	SALA 235									**48**
26	CUARTOS TÉCNICOS									**48**
27	PASILLO CARRERA 24								**0,00**	**48**
28	PASILLO CALLE 22								**0,00**	**48**
	TOTAL								**48,0**	

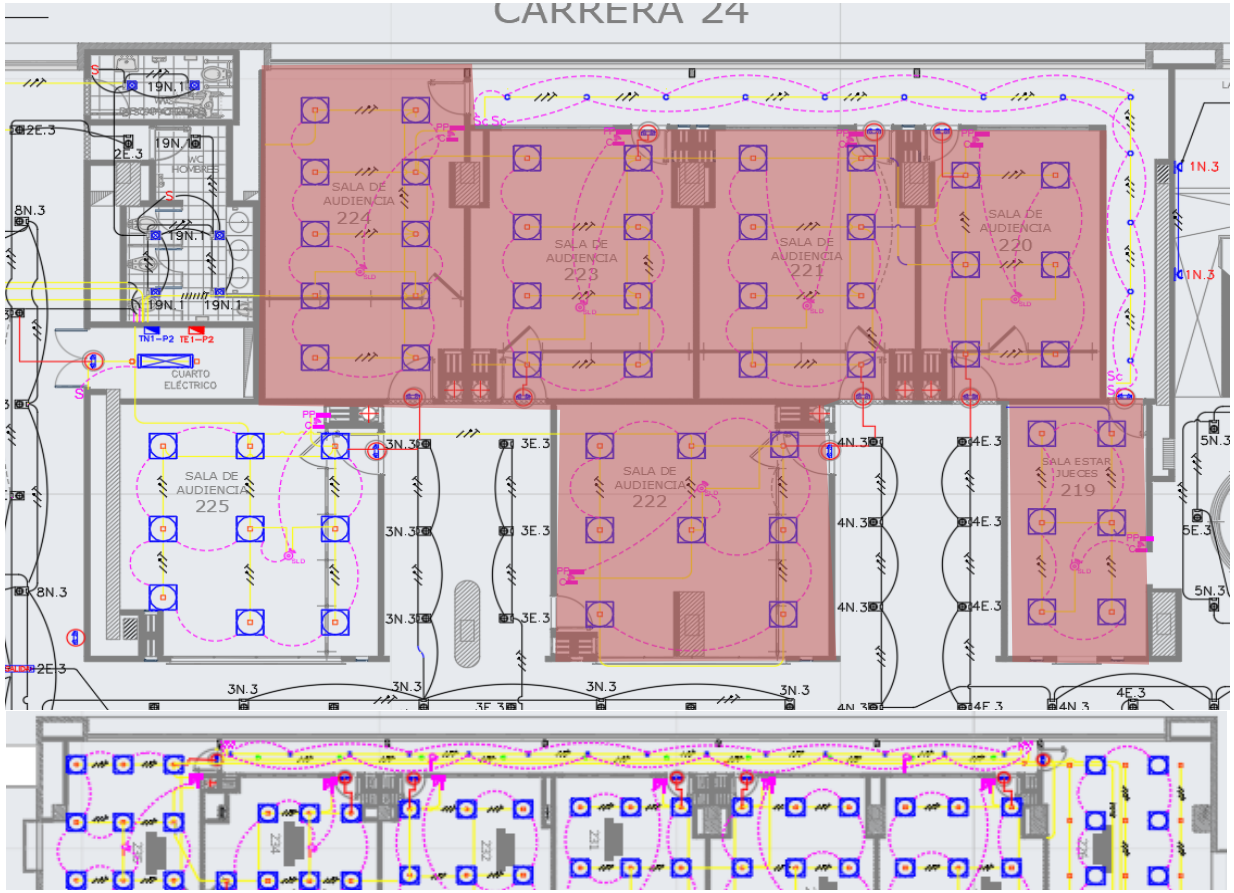

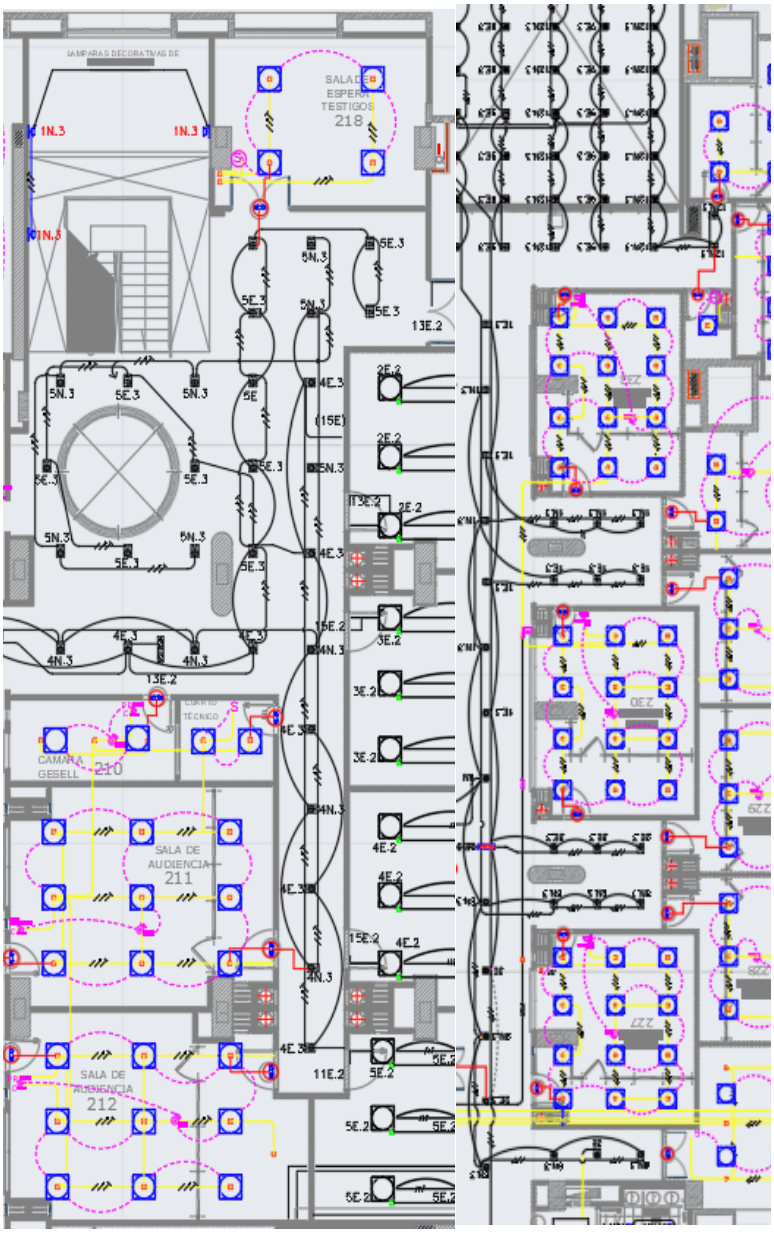
LAMPARAS DECORATIVAS DE
SALA DE ESPERA TESTIGOS
218
1N.3
CAMARA GESELL
210
SALA DE AUDIENCIA
211
SALA DE AUDIENCIA
212

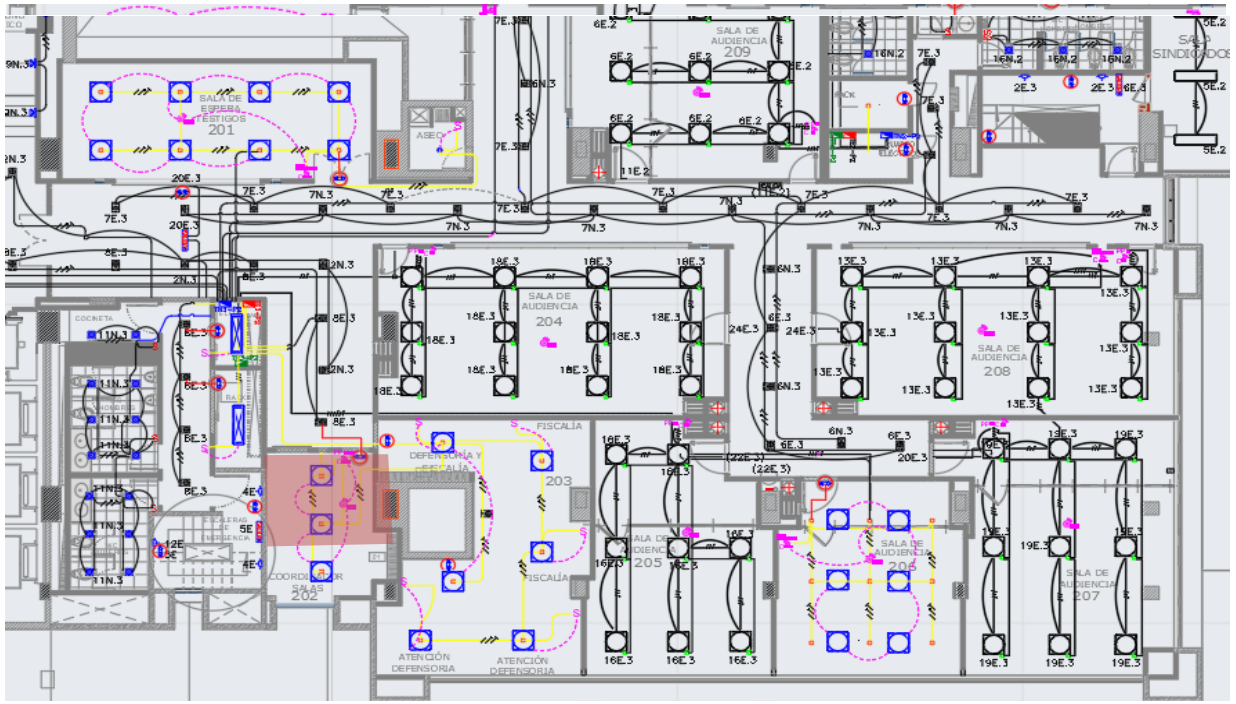

FIRMA	
INTERVENTOR	INGENIERÍA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS
CC/NIT:	900448366
RL	INGENIERO ALEXANDER BEDOYA DUQUE

FIRMA	
CONTRATISTA	**GLOBAL ASTI**
CC/NIT:	800228515-3
RL	JORGE ALBERTO CARDONA CEBALLOS

	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	21 de junio del 2024
PREACTA N°	1
CONTRATO N°	CE-17-2024
OBJETO	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES, la cuarta fase de modernización al sistema de iluminación a un sistema inteligente y autónomo de las oficinas del Palacio De Justicia Fanny González Franco de Manizales – Caldas
CONTRATISTA	GLOBAL ASTI S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INGENIERÍA Y DISEÑO DE OCCIDENTE SAS

N° ITEM	1,19 CAPITULO 1 PISO 2	DESCRIPCIÓN ITEM	Pintura de Techo zonas afectadas por hueco de luminaria	Unidad de Medida	UND

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Retiradas	Unidad	Otro			
										0	
1	SALA 201									**0**	
2	SALA 202									**0**	
3	SALA 203									**0**	
4	SALA 206									**0**	
5	SALA 210									**0**	
6	SALA 211									**0**	
7	SALA 212									**0**	
8	SALA 218									**0**	
9	SALA 219									**0**	
10	SALA 220									**0**	
11	SALA 221									**0**	
12	SALA 222									**0**	
13	SALA 223									**0**	
14	SALA 224									**0**	
15	SALA 225									**0**	
16	SALA 226									**0**	
17	SALA 227									**0**	
18	SALA 228								**1,21**	**1**	
19	SALA 229								**5,00**	**6**	
20	SALA 230								**3,00**	**9**	
21	SALA 231								**7,25**	**16**	
