CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1765 de 2023. R.L DAVID LEONARDO RODRIGUEZ

INFORME MENSUAL INTERVENTORIA No. 03





OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.

PERDIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2023

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION DEL PROYECTO 7
1.1. GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS 7
1.1.1 Ficha técnica del contrato de obra: 7
1.1.2 Fichas técnicas contrato interventoría: 8
1.2 GARANTIA UNICA DEL CONTRATO 9
1.2.1 Pólizas de garantía contrato de obra 9
1.2.2 Pólizas de garantía contrato de interventoría. 11
1.3 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL PROYECTO. 12
1.3.1 Descripción objeto contrato de obra. 12
1.4 ALCANCE. 12
1.5 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 13
1.6 DESCRIPCION OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA 14
2 INFORME TECNICO 15
2.1 CRONOGRAMA 15
2.2 CURVA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO 15
2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA. 16
2.4 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA. 18
2.5 DESCRIPCION DE ENSAYOS DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 19
2.6 CALIDAD DE LOS MATERIALES. 19
2.7 ENSAYOS DE LABORATORIO. 19
2.8 CLIMATOLOGIA. 19
2.8.1 Tabla. Estado del tiempo 20
2.9 CONTROL DE EQUIPO EN OBRA: 21
2.9.1 Tabla de relación de maquinaria y equipo. 21
2.10 OFICINA DEL CONTRATO 21
2.11 RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 21
2.11.1 Relacion de personal profesional de obra: 21
2.11.2 Relacion de personal profesional de interventoria: 22
3 INFORME DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 23

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

3.1 SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES 24
3.2 LABORAL 26
3.2.1 Registro de personal de obra. 26
3.3 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL 28
3.4 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 28
3.5 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL IMPLEMENTADO POR LA INTERVENTORÍA. 29
3.6 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 31
4 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO (conforme a la ley ambiental) 32
4.1 SEÑALIZACIÓN 36
4.2 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. 37
4.3 MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS. 38
4.4 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES 39
4.5 USO RACIONAL DEL PAPEL. 40
4.6 ENERGÍA ELECTRICA. 41
4.7 SUELOS. 42
4.8 AIRE. 43
4.9 AGUA. 44
4.10 RUIDO. 45
5 GESTION SOCIAL 46
5.1 PROGRAMA SOCIAL 46
5.2 MARCO LEGAL 47
5.2.1 Normatividad 47
5.3 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 48
5.3.1 Programa De Atención Al Usuario: 49
5.3.2 Programa De Educación Y Capacitación Al Personal Vinculado Al Proyecto: 50
5.3.3 Programa De Información Y Participación Comunitaria 51
5.3.4 Conformación de comité o veeduría: 52
5.3.5 Programa de vinculación de mano de obra 53
5.3.6 Programa de cultura vial 55
5.3.7 Programa de acompañamiento a la gestión socio predial 56

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

6 DOCUMENTACION DEL CONTRATO 60
6.1 ACTAS LEGALES GENERADAS 60
6.2 ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES 60
6.3 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO 60
6.4 COPIA DE LA BITACORA 62
7 INFORME FINANCIERO 62
7.1 MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 1279. 62
7.2 PAGOS REALIZADOS. 63
7.2.1 Cuadro de control financiero. 63
7.3 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL 63
8 NFORME LEGAL 64
8.1 CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS. 64
9 CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES 64
10 LISTA DE ANEXOS 65

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

1. INFORMACION DEL PROYECTO

1.1. GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS

1.1.1 Ficha técnica del contrato de obra:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Contratista de Interventoría:	CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023
Supervisión:	SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
Objeto del Contrato:	RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.
Contrato No:	1279 DE 2023
Contratista de la obra:	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH
Representante Legal:	MAURICIO MEJIA HOYOS
Valor del Contrato:	$25.094.607.822,56
Valor del Anticipo:	$5.018.921.564,51 – (20%)
Fecha de terminación inicial:	31 DE DICIEMBRE 2023
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	N/A
Valor del Contrato + Adicional:	$25.094.607.822,56
Adición valor del anticipo:	N/A
Plazo de ejecución inicial:	10 MESES
Fecha de inicio:	20 DE MAYO DE 2023
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reinicio:	N/A
Total de días transcurridos de suspensión.	N/A
Fecha de Prorroga:	N/A
Adición plazo:	DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Plazo de ejecución modificado:	7 MESES 11 DIAS

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

Fecha de terminación actualizada:	31 DE DICIEMBRE 2023
Fecha de Corte del Informe:	31 DE MAYO DE 2023
Días Transcurridos:	15 DIAS
INFORMACION FINANCIERA	
Acta parcial 1	N/A
Acta parcial 2	N/A
Acumulado	N/A
Anticipo	$5.018.921.564,51 - 20%
Anticipo desembolsado:	N/A
Fecha de desembolso	N/A
Amortización Acta parcial 1	N/A
Amortización Acta parcial 2	N/A
Pendiente por amortizar	N/A

1.1.2 Fichas técnicas contrato interventoría:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Supervisión:	SEBASTIAN OICATA QUIMBAYA
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATICA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.
Contrato No:	1765 DE 2023
Contratista de la obra:	CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023
Representante Legal:	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ
Valor del Contrato:	$834.992.894
Valor del Anticipo:	$250.497.868,20 DEL– (30%)
Fecha de terminación inicial:	31 DE DICIEMBRE 2023
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	N/A
Valor del Contrato + Adicional:	N/A
Adición valor del anticipo:	N/A

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

Plazo de ejecución inicial:	7 MESES 15 DIAS
Fecha de inicio:	16 DE MAYO DE 2023
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reinicio:	N/A
Total de días transcurridos de suspensión.	N/A
Fecha de Prorroga:	N/A
Adición plazo:	N/A
Plazo de ejecución modificado:	N/A
Fecha de terminación actualizada:	31 DE DICIEMBRE 2023
Fecha de Corte del Informe:	30 DE JUNIO DE 2023
Días Transcurridos:	45 DIAS
INFORMACION FINANCIERA	
Acta parcial 1	N/A
Acta parcial 2	N/A
Acumulado	N/A
Anticipo	$250,497,868.20 –DEL 30%
Anticipo desembolsado:	N/A
Fecha de desembolso	N/A
Amortización Acta parcial 1	N/A
Amortización Acta parcial 2	N/A
Pendiente por amortizar	N/A

1.2 GARANTIA UNICA DEL CONTRATO

Se relaciona a continuación la información de las pólizas de garantía para el contrato de obra 1279 de obra y 1765 de interventoría de 2023, teniendo en cuenta el estado actual de los contratos.

1.2.1 Pólizas de garantía contrato de obra

La siguiente póliza corresponde al estado inicial del contrato de obra.

CONDICIONES INICIALES					
SEGURO	GARANTIAS	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
SEGURO MUNDIAL	Cumplimiento de contrato	CV-100031880	16/03/2023	17/05/2024	$2.509.460.782,30

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

CONDICIONES INICIALES					
SEGURO	GARANTIAS	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		16/03/2023	17/05/2024	$5.018.921.564,60
	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		16/03/2023	17/01/2027	$1.254.730.391,15
	Calidad de servicio		16/03/2023	16/01/2029	$12.547.303.911,50
	Predios, labores y operaciones	CV-100008195	16/03/2023	17/01/2024	$1.254.730.391

La siguiente póliza de cumplimiento estatal con respecto a la primera modificatoria del contrato de obra según principio de anualidad, con plazo establecido de siete (7) meses y once (11) días.

MODIFICACION No 01 EN TIEMPO					
SEGURO	GARANTIAS	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
SEGURO MUNDIAL	Cumplimiento de contrato	CV-100031880	15/05/2023	27/02/2024	$2.509.460.782,30
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		15/05/2023	27/02/2024	$5.018.921.564,60
	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		15/05/2023	27/10/2026	$1.254.730.391,15
	Calidad de servicio		27/10/2023	27/10/2028	$12.547.303.911,50
	Predios, labores y operaciones	CV-100008195	16/03/2023	18/01/2024	$1.254.730.391

Las siguientes pólizas corresponden a la actualización con fecha de acta de inicio del 20 de mayo de 2023.

MODIFICACIONES REINICIO ADICIONES					
SEGURO	GARANTIAS	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
SEGURO MUNDIAL	Cumplimiento de contrato	CV-100031880	20/05/2023	30/06/2024	$2.509.460.782,30
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		20/05/2023	30/06/2024	$5.018.921.564,60

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

MODIFICACIONES REINICIO ADICIONES					
SEGURO	GARANTIAS	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		20/05/2023	31/12/2026	$1.254.730.391,15
	Calidad de servicio		31/12/2023	31/12/2028	$12.547.303.911,50
	Predios, labores y operaciones.	CV-100008195	20/05/2023	31/12/2023	$1.254.730.391.15

1.2.2 Pólizas de garantía contrato de interventoría.

Las siguientes pólizas corresponden a la firma y fecha de adjudicación del contrato de obra.

CONDICIONES INICIALES					
SEGURO	GARANTIAS	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado S.A	Cumplimiento de contrato	30-44-101052422	08/05/2023	24/04/2024	$184,761,907.80
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		08/05/2023	24/04/2024	$277,142,861.70
	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		08/05/2023	24/12/2026	$46,190,476.95
	Calidad de servicio		24/12/2023	24/12/2028	$184,761,907.80

Las siguientes pólizas corresponden a la actualización con la fecha del acta de inicio del 16 de mayo de 2023.

MODIFICACIONES REINICIO ADICIONES					
SEGURO	GARANTIAS	No POLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
Seguros del Estado S.A	Cumplimiento de contrato	30-44-101052422	16/05/2023	02/05/2024	$184,761,907.80
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo		16/05/2023	02/05/2024	$277,142,861.70
	Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales		16/05/2023	01/01/2027	$46,190,476.95
	Calidad de servicio		01/01/2024	01/01/2029	$184,761,907.80

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

1.3 DESCRIPCION DEL OBJETO DEL PROYECTO.

1.3.1 Descripción objeto contrato de obra.

Según la Resolución 1500.56.03/1327 de 2018 que obliga a todas las instituciones oficiales y no oficiales a garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad a todas las personas que por diversas circunstancias no puedan acceder a una formación académica y convivencia permanente, que promueva el libre desarrollo de sus habilidades cognitivas y sociales, y la inserción, como sujeto activo, a un contexto global y cultural.

Teniendo en cuenta lo anterior en pro de contribuir a continuar cumpliendo con los estándares de calidad de la educación para la comunidad escolar, en el municipio de Villavicencio la alcaldía municipal en su plan de desarrollo contempla realizar la demolición total de la estructura antigua y **"RECONSTRUCCIÓN NUEVA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO COMO SEDE PRINCIPAL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, TENIENDO EN CUENTA EL ALCANCE DEL OBJETO DE CONTRATO DE OBRA".**

1.4 ALCANCE.

La reconstrucción de la nueva sede principal de la institución educativa Alfonso López Pumarejo en el municipio de Villavicencio, brindara las comodidades y adecuaciones debidas para la comunidad estudiantil del centro poblado de Pompeya

Dentro del marco normativo el contratista deberá cumplir para el desarrollo de las actividades contratadas una metodología constructiva que garantice los aspectos relacionados con las calidades y especificaciones de los diseños, la estabilidad de la obra, el cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos, cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra, el cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismo resistente de acuerdo con la NSR 10 vigente.

El contrato de obra contempla la construcción de los siguientes espacios educativos, recreativos y administrativo.

ESPACIO	DESCRIPCION	AREA DISEÑADA M2
MODULO AUDITORIO 3 NIVELES	NIVEL 1 AUDITORIO NIVEL 2 RESTAURANTE NÍVEL 3 LABORATORIOS	2.457,30
	NIVEL 1 OFIC ADMINISTRATIVAS	1.015,8

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

ESPACIO	DESCRIPCION	AREA DISEÑADA M2
MODULO ADMINISTRATIVO Y ESP COMP 3 NIVELES	NIVEL 2 SALA DE PROFESORES Y SALA DE SISTEMAS	891,6
	NIVEL 3 BIBLIOTECA	891,6
AREA EDUCATIVA 3 NIVELES	NIVEL 1 AULAS DE PRIMARIA Y AULAS LUDICAS	2.284,8
	NIVEL 2 AULAS SECUNDARIA	2,330
	NIVEL 3 DANZAS ARTISTICAS Y AULAS ESPECIALES	1,434.30
MODULO POLIDEPORTIVO	NIVEL 1 GRADERIAS Y POLIDEPORTIVO, MALLA CONTRABALONES	1.088,58
AREA PREESCOLAR	NIVEL 1, AULAS PREESCOLAR	280.20
OTRAS AREAS	PORTERIA	8.89
	CUARTO DE BASURAS	15.12
TOTAL, AREAS DISEÑADAS		**12.698,89**

1.5 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

El proyecto será ejecutado en la sede principal de la INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL ALFONSO LOPEZ PUMAREJO del Municipio de Villavicencio-meta, en la zona rural, corregimiento 4 denominada Vereda Alto Pompeya, con dirección calle 6 No 19-36 del centro poblado RINCON DE POMPEYA.

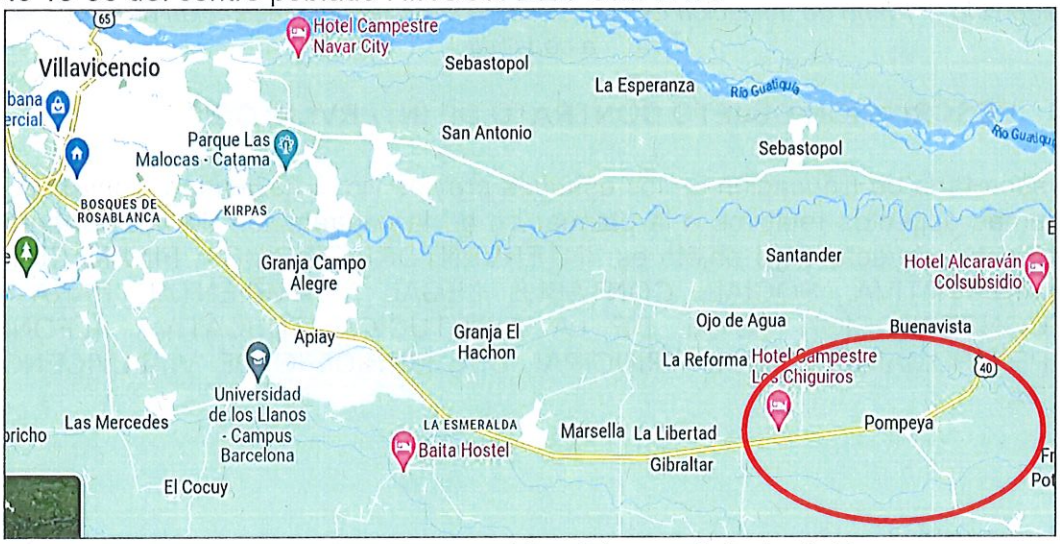


Imagen No 1 Localización geográfica del corregimiento de Pompeya.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

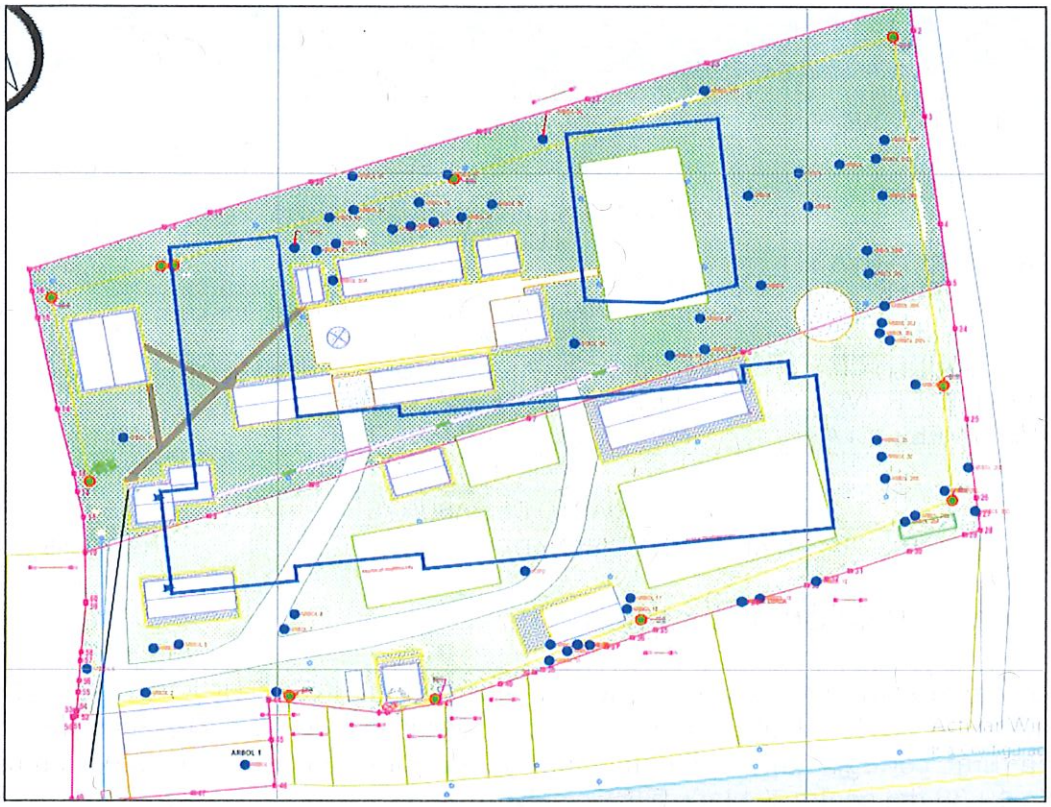


Imagen No 2. Plano de ubicación de las estructuras existentes e ubicación de lo que se va a construir.

1.6 DESCRIPCION OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA

La secretaria de Educación en los estudios previos vio la necesidad, conveniencia y demás aspectos relativos a la planeación de la contratación de la interventoría para este proyecto cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, FINANACIERA, ADMINISTRTIVA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VIALLVICENCIO META.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com


2 INFORME TECNICO

2.1 CRONOGRAMA

El contratista hace entrega de la programación de obra ajustada con la fecha del acta de inicio del Contrato de Obra, teniendo que para el presente mes se tiene un porcentaje programado acumulado de **1.87%** vs el porcentaje ejecutado acumulado de **1.94%.**

PERIODO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	PROGRAMADO MES	EJECUTADO MES
MAY/2023	0.03%	0.00%	0.03%	0.00%
JUN/2023	0.36%	0.21%	0.34%	0.21%
JUL/2023	**1.87%**	**1.94%**	**1.50%**	**1.73%**
AGO/2023	3.73%		1.87%	
SEP/2023	15.94%		12.21%	
OCT/2023	36.81%		20.86%	
NOV/2023	65.96%		29.16%	
DIC/2023	**100.00%**		34.04%	
TOTAL			**100.00%**	

2.2 CURVA DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

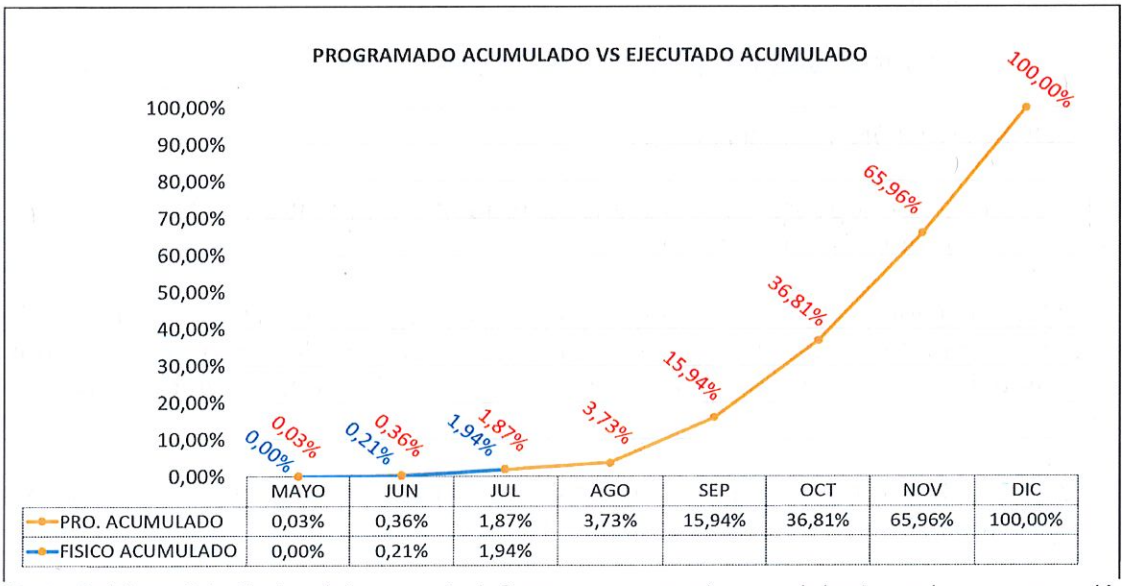

Ruta Crítica: *A la fecha del presente informe se presenta un adelanto en la programación de obra de 0.07%, correspondientes a las actividades de Disposición de residuos de material de construcción y sobre acarreo de material.*

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

Áreas Problemáticas y Medidas Correctivas: Se inicia el día 23 de julio de 2023 la verificación del estudio de suelos, el contratis ta realiza sondeos de acuerdo a la norma sismo resistente en toda el área del proyecto, con la finalidad de corroborar los datos del estudio de suelos entregado por la entidad contratante.

2.3 ACTIVIDADES REALIZADAS DEL CONTRATISTA.

El contratista inicia la ejecución del proyecto con las actividades preliminares del presupuesto de obra tales como se mencionan a continuación se incluye registro fotográfico anexo al presente informe:

(Cap. 1) DEMOLICIONES Y PRELIMINARES:

1.1 DEMOLICIONES GENERALES

1.1.1 Demolición de edificaciones incluye (muros, estruct, confinam, cubierta, desmontes aparatos, carp, y retiros sobrantes): Se termina la actividad de desmonte de rejas, puertas, ventanas, cubierta, cerchas y se termina demolición de todas las estructuras existentes exceptuando las aulas y baños que el contratista dejo como oficinas, bodegas y baños en la zona de la fachada frontal.

1.1.2 Demolición placas piso e=0.10m inc cargue manual, retiro 5km: Se termina la demolición de las áreas de los senderos, vías, andenes, placas de contrapiso de canchas deportivas.

(Cap. 2) ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

2.1 LOCALIZACION Y REPLANTEO

2.1.1 Localización topográfica (sardineles y redes): Se continua con la actividad de localización y replanteo de los senderos.

2.1.2 Localización y nivelación topográfica para vías (excavación y conformación de banca – ancho de calzada 6-8m: Se continua el levantamiento topográfico de todas las vías existentes y se replantea las zonas a construir andenes, vías y zonas de parqueo.

2.1.3 Trazado y replanteo arquitectónico: Se continua el replanteo de todas las áreas de urbanismo y zonas deportivas.

2.2. DESCAPOTE MAQ/MANUAL.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

2.2.1. Descapote mecánico. e= <0.2m, Inc retiro. 5kms: se inició la actividad de descapote mecánico en zona del edificio del preescolar.

(Cap. 22) SOBREACARREO – TRANSPORTE MATERIAL

22.1 Disposición final de residuos de construcción y demolición en bioagricola (rcd): Se inicia retiro del material producto de la demolición al sitio de disposición final autorizado por Bioagricola y se toma el peso por volqueta arrojado en la báscula de Bioagricola.

22.2 SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta. El sitio dispuesto por Bioagricola se encuentra ubicado en la vereda del municipio de Villavicencio a 35km aproximadamente de la ubicación del proyecto.

Cap. DOCUMENTOS TÉCNICOS:

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO PMT

El contratista hace entrega en el comunicado CE-201-125-040 del 14 de julio del plan de manejo de tránsito PMT aprobado por la secretaria de movilidad con radicado 1703-19-18/0932 el 12 de julio de 2023.

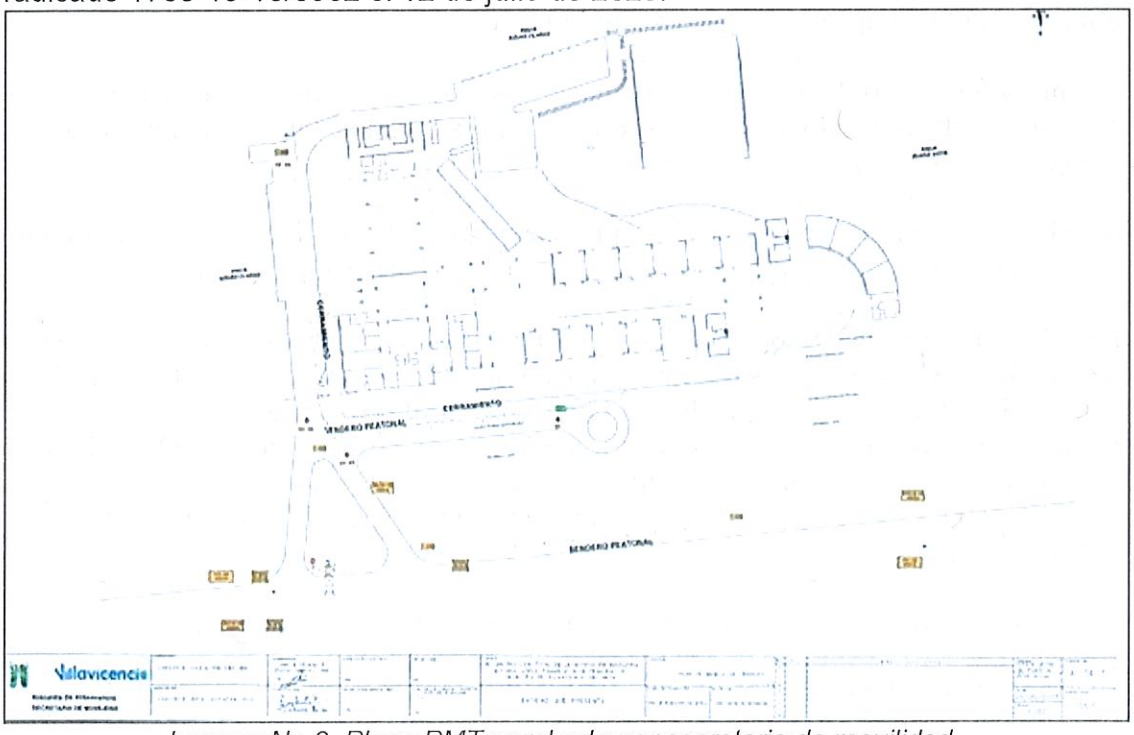


Imagen No 3. Plano PMT aprobado por secretaria de movilidad.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

2.4 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA.

La interventoría realiza la revisión de los estudios y diseños entregados por la entidad contratante y presenta las respectivas observaciones a la entidad de los diseños estructurales, eléctricos y estudio de suelos, y remite las observaciones de la revisión por parte del contratista.

Se realiza la supervisión y control de las actividades de desmonte, acopio de estos elementos y demolición de las edificaciones existentes; se toma registro fotográfico de las actividades ejecutadas.

Mediante comunicados se realiza las respectivas solicitudes al contratista para que remita las afiliaciones del personal que se encuentra en obra (topografía).

La interventoría realiza la solicitud a la Supervisión del contrato de interventoría, para que se incluya el profesional de seguridad y salud en el trabajo, toda vez que en el presupuesto contractual no se tuvo en cuenta y es necesario contar con este debido a la complejidad de la obra.

La interventoría remite a la supervisión el cambio de las hojas de vida del personal de obra, especialista estructural, director de obra y profesional SST, y residente de obra, revisadas y aprobadas por la interventoría.

La interventoría realiza la solicitud al contratista en la entrega de los informes mensuales de obra, toda vez que este no presenta los informes dentro de los tiempos establecidos.

La interventoría revisó y remitió a la supervisión las actas de vecindad debidamente diligenciadas y firmadas por los propietarios, contratista e interventoría.

La interventoría utiliza toda su capacidad técnica y administrativa para realizar constante seguimiento y control al cumplimiento de las obligaciones del contratista con la ejecución del contrato de obra, en cuanto al cumplimiento con el plan de manejo de tránsito, planes de calidad, implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, plan de gestión social y demás requerimientos que se deben llevar a cabo en obra para continuar con el normal desarrollo y ejecución del proyecto.

La interventoría solicitó al contratista dar mayor cumplimiento en cuanto a los pagos y presentación de soportes de las planillas de la seguridad social de todo el personal en general vinculado en el proyecto, ya que a la fecha del presente informe no se ha evidenciado la totalidad de los mismos.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

La interventoría solicitó al contratista el cumplimiento con la documentación requerida para el ingreso de personal nuevo a obra, lo cual mediante recomendaciones se ha venido cumpliendo con estas obligaciones por parte del contratista, de igual forma la documentación para el ingreso de equipo y maquinaria al proyecto.

La interventoría hace entrega de los informes mensuales de interventoría correspondientes a los meses de mayo y junio de 2023.

2.5 DESCRIPCION DE ENSAYOS DE CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

A la fecha de corte de este periodo de seguimiento, el contratista no ha realizado actividades que requiera de ensayos de calidad de materiales o certificados de calidad de los materiales.

Al presente informe se anexan los certificados de calibración de los equipos de topografía por parte del Consorcio Educación C&G MH, los cuales se encuentran vigentes.

2.6 CALIDAD DE LOS MATERIALES.

A la fecha del presente informe solo se ha realizado actividades de desmonte, demolición, localización y replanteo, por tanto, no ha llegado materiales a obra que requiera certificaciones de calidad emitidos por sus proveedores y/o fabricantes.

2.7 ENSAYOS DE LABORATORIO.

Durante el presente periodo no se realizaron ensayos de laboratorio de ningún tipo ya que no se han realizado actividades que sean verificables o liberables mediante ensayos de laboratorio.

CONTRATO No 1279 de 2023				FRENTE/PROYECTO: COLEGIO POMPEYA		
ESPECIFICACIONES RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						
No. Orden	DESCRIPCION/ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA	No. Muestras	RANGO CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBTENIDO %
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8 CLIMATOLOGIA.

Durante el periodo de seguimiento se presentó clima mayormente soleado con algunos días de lluvias moderadas, intensas y nubosidad de acuerdo con el reporte

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

diario en bitácora de obra realizado en conjunto con el contratista, tal como se evidencia en la tabla adjunta.

2.8.1 Tabla. Estado del tiempo.


ESTADO DEL CLIMA COLEGIO POMPEYA JULIO

PERIODO	01 JUL - 31 JUN	AÑO	2023

SECO 1 = 1 | LLUVIA MODERADA 2 = 2 | LLUVIA INTENSA 3 = 3 | NUBOSIDAD 4

HORAS	FECHA																													OCURRENCIA (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
7:00 - 8:00	1	SABDO	FESTIVO NO LABORAL	1	1	4	4	4	DOMINGO	1	4	4	1	1	4	DOMINGO	1	2	4	1	4	SABDO	1	1	1	4	1	4	1	1	DOMINGO	2	1 64,00% 1
8:00 - 9:00	1			1	1	4	3	4		1	4	4	1	1	2		1	2	2	1	4		1	1	1	4	1	4	1	1		2	
9:00 - 10:00	1			1	1	2	2	4		1	4	2	1	1	2		1	2	2	1	2		1	1	1	4	1	2	1	1		4	
10:00 - 11:00	1			1	1	3	4	4		1	4	2	1	1	4		1	4	3	1	2		1	1	1	4	1	2	1	1		4	2 11,00% 2
11:00 - 12:00	1			1	1	3	4	4		1	4	4	1	1	4		1	4	3	1	4		1	1	1	4	1	4	1	1		4	
12:00 - 13:00				1	1	4	2			1	1	1	1	1			1	1	4	1	4		1	1	1	1	1	4				1	
13:00 - 14:00				1	1	2	4			1	1	1	1	1			1	1	4	1	4		1	1	1	1	1	4				1	3 2,00% 3
14:00 - 15:00				1	1	2	1			1	1	1	1	1			2	1	4	1	4		1	1	1	1	1	4				1	
15:00 - 16:00				1	1	2	1			1	1	1	1	1			2	1	4	1	4		1	1	1	1	1	4				1	
16:00 - 17:00				1	1	2	1			1	1	1	1	1			2	1	4	1	1		1	1	1	1	1	4				1	4 23,00% 4

- Diagrama de torta del clima:

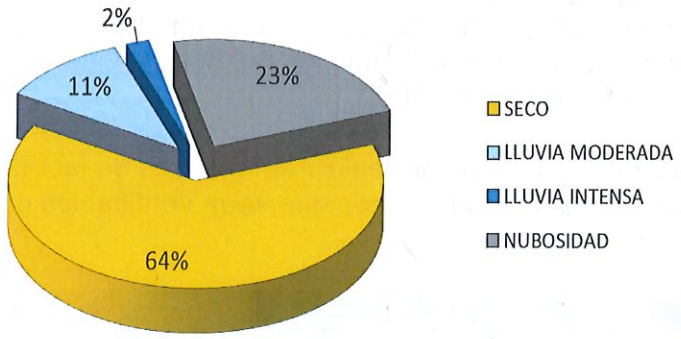

Se observa que, según el análisis realizado al comportamiento del clima en el proyecto, se evidencia que se ha presentado mayormente clima soleado, con pocas lluvias leves y algunas fuertes con menor ocurrencia, lo cual es considerado un clima óptimo para el desarrollo de las actividades realizadas durante el mes de seguimiento.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

2.9 CONTROL DE EQUIPO EN OBRA:

Se relaciona a continuación la maquinaria que llega a obra, a la cual se revisa la documentación y se verifica su cumplimiento con los requisitos establecidos.

2.9.1 Tabla de relación de maquinaria y equipo.

MAQUINARIA Y EQUIPO	MARCA/REFERENCIA	CANTIDAD
RETROEXCAVADORA	CATERPILAR 311 CU	1
RETROEXCAVADORA	HYUNDAI	1
VOLQUETA	TMU856	1
VOLQUETA	SXC452	1
VOLQUETA	STO585	1
VOLQUETA	SWK398	1
VOLQUETA	SWK397	1
VOLQUETA	COI710	1

2.10 OFICINA DEL CONTRATO

La oficina de interventoría se encuentra ubicada en la calle 19 con carrera 41-39 Barrio Villa María.

2.11 RELACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

2.11.1 Relacion de personal profesional de obra:

En el presente periodo, el contratista realizó solicitud de cambio de los profesionales director de obra y especialista estructural mediante el oficio CE-201-125-019 del 21 de junio de 2023 y cambio de la profesional del sistema de seguridad y salud en el trabajo mediante el oficio CE-201-125-032 del 07 de julio de 2023, la interventoría una vez revisada la documentación de las hojas de vida con respecto al cumplimiento en el anexo del pliego de condiciones, avala el cumplimiento de los mismos mediante el oficio CI-1765-2023-OF-028 enviado el 18 de julio de 2023 al municipio.

De igual forma, mediante oficio CE-201-125-047 del 19 de julio de 2023, el contratista solicita el cambio de dos (2) profesionales residentes de obra, lo cual esta interventoría avala el cambio de los mismos luego de revisada la documentación respectiva mediante el oficio CI-1765-2023-OF-032 del 28 de julio de 2023, relacionados de la de la siguiente manera:

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

CARGO	PREFIONAL INICIAL	CAMBIO
PROFESIONAL SST	Natalia Quecho Sarmiento	Diana Carolina Vega castillo
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	Jose Manuel Galeano Valenzuela	Jaime Eliseo Buitrago Novoa
DIRECTOR DE OBRA	Luis Clavijo Olmos	Jose Marx Lenin Reyes
RSIDENTE DE OBRA	Diego Fernando Suarez Gómez	Pedro Alexander López Ostos
RESIDENTE DE OBRA	Nohora Juliana Jones Ordoñez	Lina Fernanda Urrego Cortez

De esta manera se relaciona a continuación el equipo de profesionales que hacen parte del contrato de obra:

NOMBRE	CEDULA	TARJETA PROFESIONAL	CARGO	%
José Marx Lenin Reyes Castellanos	79.782.465	25202-086513 CND	Director de obra	100
Pedro Alexander López Costos	79.949.909	25202-112099 CND	Residente de obra	100
Lina Fernanda Urrego Cortez	1.053.797.649	17202-195361 CND	Residente de obra	100
Jeimy Viviana Echeverry Rodríguez	1.014.272.125	25202-356744 CND	Residente de obra	100
Jaime Eliseo Buitrago Nova	79.464.037	25202.43302 CND	Especialista de Estructuras	100
Fabián Andrés Calderón	1.019.023.694	CN 205-86803	Ingeniero eléctrico	50
Yesenia Lamprea Naranjo	1.016.016.318	25202-215101 CND	Ingeniero hidráulico	50
Diana Carolina Vega Castillo	40.217.089		PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	100
María del Pilar Sepúlveda Suarez	1.018.427.594	1779151023	Profesional Social	50
Astrid Ruiz Gonzales	40.341.812	25238-366217 CND	Ingeniera ambiental	50

2.11.2 Relacion de personal profesional de interventoria:

En el periodo de seguimiento del presente informe, esta interventoría solicitó mediante oficio CI-1765-2023-OF-023 el 30 de junio a la supervisión del contrato de interventoría, el cambio de los profesionales de siguiente manera:

CARGO	PREFIONAL INICIAL	CAMBIO
ESPECILISTA EN ESTRUCTURAS	Osvald Jose Guzman	Juan Carlos Restrepo Restrepo

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Luis Francisco España	Ingrid Carolina Gamboa
RESIDENTE DE INTEVRVENTORIA	Nelson Eduardo Ruiz Maldonado	Álvaro Augusto Castro

Lo cual, mediante el oficio 1201-19. 18/0775 del 12 de julio de 2023, la supervisión del contrato de interventoría No 1765 de 2023 avala el respectivo cambio de dichos profesionales con su respectiva documentación.

De esta manera se relaciona a continuación el equipo de profesionales que hacen parte del contrato de interventoría:

NOMBRE	CEDULA	TARJETA PROFESIONAL	CARGO	%
David Leonardo Rodríguez Bermúdez	7.172.871	25202125987 CND	Director de Interventoría	100
Ingrid Carolina Gamboa	30.083.309	252020945555 CND	Residente de Interventoría	100
Lisbelia Ariza Garzón	35.262.355	25202106779 CND	Residente de Interventoría	100
Álvaro Augusto Castro	86.081.630	25202151770 CND	Residente de Interventoría	100
Juan Carlos Restrepo Restrepo	9.726.138	63202098436 QND	Especialista de Estructuras	50
Rafael Eduardo Guerrero	80.222.800	CN 20563992	Ingeniero eléctrico	50
Wilson Alexander González Riveros	86.066.292	25202115057 CND	Ingeniero hidráulico	50
Eliana Andrea Moreno	33.366.311	15236139904 BYC	Ingeniera ambiental	50
Rosalba Alba Moreno	1.049.624.370	CODIGO: 333651029-1	Trabajador(a) Social	50

3 INFORME DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el siguiente informe se muestra el cumplimiento de la ejecución del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST que consiste en el cumplimiento a lo establecido en la ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 y demás normativa vigente y todas aquellas que se sustituyan o modifiquen en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia. **EL CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023** ha estructurado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

formulación de las acciones conjuntas entre el consorcio y los trabajadores sin importar el tipo de contratación, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

En el presente capitulo se describen las actividades de seguridad y salud en el trabajo, realizados por el Contratista y la Interventoría, en la etapa constructiva del proyecto **"RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META.".** En el cumplimiento del contrato de interventoría **1765 DE 2023,** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATICA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META."**

3.1 SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS LABORALES.

CONSORCIO INTER EDUCATIVAS 2023, en calidad de interventoría busca vigilar y controlar el desarrollo del contrato de obra No. 1279 DE 2023. Con el fin del cumplimiento de lo estipulado por la normatividad legal vigente; según el objetivo de destinar procedimientos de prevención, promoción y atención en diferentes entidades.

Se realiza la verificación de los pagos a los aportes y afiliaciones al Sistema General de aportes parafiscales (EPS, ARL, AFP) de cada uno de los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO					OBSERVACIONES
	Quincena No 1		Quincena No 2		N/A	
	SI	NO	SI	NO		
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARL, FIC de todo el personal.	X					Se verifico documentaciones correspondientes al personal vinculado al contrato
Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT • Seguro de automóviles contra todo riesgo	X					Se verifico documentación correspondiente a maquinaria y vehículos vinculados al contrato

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

• Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable						
El contratista ha entregado a la gestoría copia de todos los documentos antes mencionados.			X			
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X					
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X					
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.					X	Durante el periodo reportado no se generó retiro del personal

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

3.2 LABORAL

3.2.1 Registro de personal de obra.

DATOS GENERALES MANO DE OBRA CALIFICADA									PLANILLAS DE SEG. SOCIAL
	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CC	INGRESO	RETIRO	CARGO	DIAS (JULIO) LABORADOS	No PLANILLA
1	JOSE MARX LENIN	REYES	CASTELLANOS	79.782.465	20/06/2023	ACTUAL	DIRECTOR DE OBRA	30	-
2	PEDRO ALEXANDER	LOPEZ	OSTOS	79.949.909	01/07/2023	ACTUAL	RESIDENTE DE OBRA	30	-
3	LINA FERNANDA	URREGO	CORTES	1.053.797.649	01/07/2023	ACTUAL	RESIDENTE DE OBRA	30	-
4	JEIMMY VIVIANA	ECHEVERREY	RODRIGUEZ	1.014.272.125	20/05/2023	ACTUAL	RESIDENTE DE OBRA	30	-
5	JAIME ELISEO	BUITRAGO	NOVA	79.464.037	20/06/2023	ACTUAL	INGENIERO ESTRUCTURAL	30	-
6	FABIAN ANDRES	CALDERON	HERNANDEZ	1.019.023.694	20/05/2023	ACTUAL	INGENIERO ELECTRICO	30	-
7	YESENIA	LAMPREA	NARANJO	1.016.016.318	20/05/2023	ACTUAL	INGENIERO HIDRAULICO	30	-
8	MARIA DEL PILAR	SEPULVEDA	SUAREZ	1.018.427.594	20/05/2023	ACTUAL	PROFESIONAL SOCIAL	30	-
9	ASTRID	RUIZ	GONZALEZ	40.341.812	20/05/2023	ACTUAL	INGENIERA AMBIENTAL	30	-
10	RIGOBERTO	MARIN	AYA	79.719.186	26/06/2023	ACTUAL	TOPOGRAFO	30	-
11	DIANA CAROLINA	VEGA	CASTILLO	40.217.089	17/07/2023	ACTUAL	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	30	-

DATOS GENERALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA									No PLANILLA
	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CC	INGRESO	RETIRO	CARGO	DIAS LABORADOS	JULIO
1	WILSON ERIBERTO	CARDENAS	SABOGAL	17.343.650	26/06/2023	29/07/2023	CONTRATISTA	29	-
2	ENRIQUE ALBEIRO	RINCON	-	86.078.703	26/06/2023	29/07/2023	MAESTRO DE OBRA	29	-
3	YEISON ALEXANDER	SANCHEZ	PALACIOS	1.121.840.577	26/06/2023	29/07/2023	AYUDANTE DE OBRA	29	-

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023

DATOS GENERALES MANO DE OBRA NO CALIFICADA									No PLANILLA
	NOMBRES	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	CC	INGRESO	RETIRO	CARGO	DIAS LABORADOS	JULIO
4	DEIBER ENRIQUE	MUÑOZ	TIQUE	1.121.908.902	26/06/2023	29/07/2023	AYUDANTE DE OBRA	29	-
5	LEOVIGILDO	VEGA	QUIÑONEZ	17.667.978	26/06/2023	ACTUAL	AYUDANTE DE OBRA	30	-
6	RODRIGO	NARANJO	MARTINEZ	80.843.490	26/06/2023	ACTUAL	AYUDANTE DE OBRA	30	-
7	DIOSNELL JOSE	MOSQUERA	TORRES	5.386.773	26/06/2023	29/07/2023	AYUDANTE DE OBRA	29	-
8	JUAN DAVID	VEGA	MARIN	1.006.859.443	26/06/2023	29/07/2023	AYUDANTE DE OBRA	29	-
9	FERNANDO	MEJIA	DELGADO	1.121.897.377	26/06/2023	ACTUAL	CADENERO	30	-
10	CAMILO ANDRES	OSORIO	MORALES	1.002.800.293	20/07/2023	29/07/2023	CONDUCTOR	10	-
11	GERMAN	RIAÑO	LEON	2.976.329	18/07/2023	26/07/2023	CONDUCTOR	09	-
12	JORGE ANDRES	TORRES	RAMIREZ	1.121.836.304	20/07/2023	26/07/2023	CONDUCTOR	07	-
13	MARCO FIDEL	SUAREZ	-	17.318.652	19/07/2023	29/07/2023	CONDUCTOR	11	-
14	PEDRO ANTONIO	RINCON	GOMEZ	17.333.765	19/07/2023	29/07/2023	CONDUCTOR	11	-
15	WILMER RICARDO	PARRADO	GARCIA	86.055.417	20/07/2023	26/07/2023	CONDUCTOR	07	-
16	FRANCISCO JAVIER	MONROY	DIAZ	74.359.579	28/06/2023	28/07/2023	OPERADOR DE RETRO	28	-
17	JUAN PABLO	AVILA	ROJAS	1.121.901.385	31/072023	ACTUAL	OPERDOR DE RETRO	28	-

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

3.3 PAGOS SALARIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Según el periodo reportado en el presente informe, no se generó desvinculación del personal que labora en la ejecución del contrato. Por esta razón no se genera ningún documento relacionado con liquidación de prestaciones sociales

3.4 MANEJO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

La interventoría en sus facultades busca cumplir con el plan de trabajo estipulado durante la ejecución de la obra, con el fin de llevar acabo con los objetivos, metas, actividades, reducciones de riesgos y peligros que se puedan presentar en la ejecución del contrato, de la siguiente manera:

La interventoría implementa las medidas de prevención y control con base en el resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros) de los contratos de obra e interventoría, incluidos los prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y en el medio, aquí es donde se refleja el control de la mitigación de los riesgos por medio de programas e inspecciones.

NO.	ELEMENTO	TIPO	UBICACIÓN	ESTADO FÍSICO	VIGENCIA	ESTADO DE CARGA
1	EXTINGUIDOR	Ubicados según la clasificación de riesgo y peligro	Áreas de producción	Buen estado	2024	Vigente
PLAN DE EMERGENCIAS						
	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	TIPO DE INFORMACIÓN	VIGENCIA	DIVULGACIÓN	
					SI	NO
2.1	RUTA DE EVACUACION	Rutas establecidas en el área de producción	Informativa y preventiva	-	-	X
2.2	CARTELERA INFORMATIVA	El contratista no cuenta	No	No	-	X
2.3	BRIGADAS TELEFONOS	El contratista no cuenta	No	No	-	X

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

3.5 INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL IMPLEMENTADO POR LA INTERVENTORÍA.

Durante las inspecciones se observó que el personal interactuando con su entorno, y se consideraron los siguientes puntos:

- Comparar los procedimientos de trabajo seguro con la actividad a realizar.
- Verificación de equipos, herramientas y el buen uso de los EPP durante la jornada laboral.
- Verificar las condiciones locativas de los diferentes puntos de intervención.
- Verificación de las condiciones de higiene postural de las actividades que realizan los trabajadores.
- Verificación y mitigación de los posibles peligros y rasgos presentados en la realización de las diferentes actividades desarrolladas en el contrato de obra 411 de 2022.

Inspecciones realizadas: **Formato No. 10. Inspección De Seguridad Integral:**

CONTRATO DE OBRA No. 411 DE 2022						CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023
FORMATO No. 10. INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL						
INSPECCION A:	AREAS DE PRODUCCION	X	ALMACEN			
INSPECCION No:	1	FECHA:	30/11/2022	UBICACIÓN	VILLAVICENCIO	
RESPONSABLE DE LA INSPECCION:						
CARGO:	PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL					

INSTRUCCIONES: Realice la inspección teniendo en cuenta la guía de elementos a verificar del presente formato, identifique las condiciones inseguras, describalas brevemente y de la valoración de acuerdo a los siguientes parámetros:

"B": la condición encontrada cumple con los parámetros establecidos en los procedimientos.

"R": la condición encontrada puede ocasionar lesiones menores, enfermedad leve o daños menores a la propiedad. Su intervención debe ser pronta

"M" la condición encontrada puede ocasionar lesiones graves, enfermedad grave o la muerte y daños considerables a la propiedad. Su intervención debe ser inmediata.

NO APLICA " NA" : El parámetro evaluado no aplica teniendo en cuenta el criterio de evaluación.

CRITERIOS			BUENO	REGULAR	MALO	N/A	CONDICION REPORTADA
INSTALACIONES ELECTRICAS	Iluminación	Ubicación	X				
		Estado general	X				
	Extensiones o tomacorrientes	Ubicación	X				
		Protección	X				
		Estado general	X				
		Señalización	X				
	Interruptores	Ubicación	X				
		Protección	X				
		Estado general	X				

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

LOCATIVO	Dimensión del área de trabajo		X				
	Techos y paredes		X				
	Pisos		X				
	Ventanas-Vidrios		X				
	Señalización	Ruta de emergencia	X				
		Salida de emergencia	X				
		Kit de emergencia	X				
		Punto de encuentro	X				
SANEAMIENTO BASICO	Baños	Limpieza	X				
		Dotación sanitaria	X				
		Señalización (diferenciación)	X				
		Griferías y sifones					
	cocina	Limpieza					
		Los recipientes asignados en el área para la disposición de los residuos son suficiente y adecuados para la cantidad y clase de residuo (reciclables y no reciclables).					N/A
		Los recipientes para residuos se encuentran cerca de la fuente de generación, limpios, tapados y señalizados.					N/A
		Agua para hidratación					N/A
		La cafetera esta a una altura que facilita el llenado y manipulación.					N/A
		Griferías y sifones					N/A
	Tanque almacenamiento agua potable	Ubicación	X				
		Estado general	X				
ORDEN Y ASEO	Limpieza general		X				
	Los productos químicos empleados para realizar las labores de aseo se encuentran en un lugar protegido de la luz y de alimentos.		X				
	Los implementos de aseo asignados son suficientes, están en buen estado (escoba, trapero, balde).		X				
	Las oficinas están libres de elementos almacenados debajo de escritorios y mesas.		X				
	Las Impresoras y fotocopiadoras tienen solo los recursos necesarios y ordenados y se ve libre de congestión		X				
	Los puestos de trabajo se encuentran debidamente aseados (incluye estantes, cajones, paredes, detrás de mesas, cables, equipos).		X				
MECANICO	Herramientas de trabajo grapadoras, perforadoras, etc.)		X				

Página 1

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

MOBILIARIO	Sillas (Rodachinas, cojinería, sistemas mecánicos)	Ubicación	X				
		Estado general	X				
	Escritorios	Ubicación	X				
		Estado general	X				
EQUIPOS DE COMPUTO	Computadores e impresoras	Ubicación	X				
		Estado general	X				

ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS

	JEILER JOVANI RUIZ CARDENAS	PROFESIONAL SST
FIRMA	NOMBRE	CARGO

Estos formatos se implementarán durante la ejecución de los contratos mencionados.

3.6 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Consorcio inter educativa 2023, ha enfocado según el SGSST sus indicadores en mediciones de resultado, por ejemplo: índice de frecuencia de accidentalidad, tasa de accidentalidad, incidencia de Enfermedad laboral, costos de la accidentalidad etc. Estos indicadores presentan algunas limitaciones para la evaluación de los SG-SST, porque una vez ocurrido un accidente ya es poco lo que se puede hacer al respecto, salvo tomar medidas para evitar que ocurra nuevamente.

Durante el periodo del 01 al 31 julio de 2023, no se presentó accidente laboral y no se informaron enfermedades laborales.

INDICADORES ACCIDENTALIDAD			
Total de HHTT Mes:	1152	Total, HHTT acumuladas:	1776
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0%	Días de ausentismo por Incapacidad:	0%
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0%	Indice Medio de Días Perdidos por Lesiones: No. Total de dias perdidos o cargados por lesiones /No. de casos	0%
	0%		0%

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

INDICADORES ACCIDENTALIDAD			
Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo Mes:		Accidentes de trabajo con pérdida de tiempo acumulado:	
DESCRIBIR EL ACCIDENTE Y EL LUGAR (SI SE PRESENTO)			

4 GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO (conforme a la ley ambiental)


En el mes de julio se realizaron las obras de desmonte de cubiertas, tejas, puertas, ventanas, cerchas, sanitarios y lavamanos de las oficinas y salones de la institución educativa; estos materiales fueron entregados a la comunidad del alto de Pompeya en una única reunión.

Posteriormente, se iniciaron las obras de demolición de las instalaciones y recopilación de los escombros en varios puntos de acopio; estos residuos de escombro serán recogidos por BIOAGRICOLA y serán dispuestos en un área designada por esta misma.

Igualmente, los funcionarios de CONSORCIO EDUCACION C&G-MH realizaron la respectiva ubicación de los elementos de primeros auxilios, kit antiderrames, emergencia y señales de prevención y seguridad dentro y fuera de la obra; por otra parte, se designó un punto de acopio de residuos aprovechables y NO aprovechables los cuales serán recolectados posteriormente por la empresa recolectora de residuos aprovechables y NO aprovechables.

Finalmente, estaremos verificando la pronta designación de senderos peatonales dentro y fuera de la obra, esto como medida de prevención.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

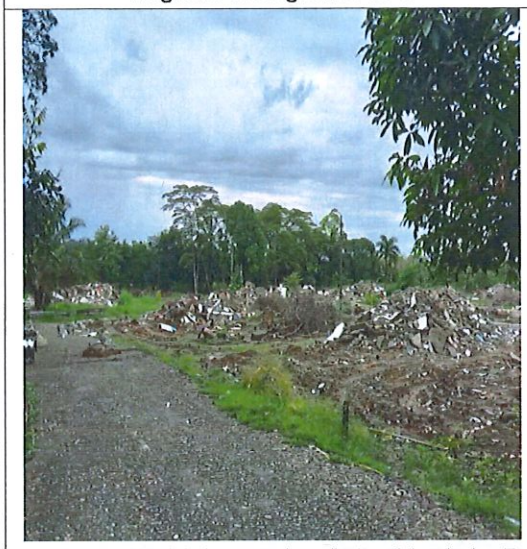Visita en la Institucion Educativa Alfonso López Pumarejo	
Registro Fotografico N°1	**Registro Fotografico N°2**
 Acopio de material de escombro dentro del colegio. En espera para su recolección y transporte para disponer en sitio autorizado por Bioagricola. 18-07-23	 Acopio de material de escombro dentro del colegio. En espera para su recolección y transporte por parte de Bioagricola. para disponer en sitio autorizado por Bioagricola. 18-07-23
Registro Fotografico N°3	**Registro Fotografico N°4**
 Acopio de material de escombro dentro del colegio. En espera para su recolección y transporte por parte de Bioagricola. 18-07-23	 Reunion de comité entre equipo de trabajo del contratista e interventoria. 18-07-23

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

Visita en la Institucion Educativa Alfonso López Pumarejo	
Registro Fotografico N°5	**Registro Fotografico N°6**
	
Ubicación de elementos de primeros auxilios y kit antiderrames en el ingreso a la institución. 18-07-23	Cargue y transporte de material de escombro hacia el punto de disposición final. 18-07-23
Registro Fotografico N°7	**Registro Fotografico N°8**
	
Estado en la zona central del predio, despues del proceso de demolición y transporte del material de escombro (acopio de material vegetal). 27-07-23	Estado en la zona central del predio, despues del proceso de demolición y transporte del material de escombro (acopio de material vegetal). 27-07-23

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

Visita en la Institucion Educativa Alfonso López Pumarejo	
Registro Fotografico N°9	**Registro Fotografico N°10**
	
Estado en la zona central del predio, despues del proceso de demolición y transporte del material de escombro (acopio de material vegetal). 27-07-23	Estado en la zona baja del predio, uso y operación de maquinaria para realización de sondeos 27-07-23
Registro Fotografico N°11	**Registro Fotografico N°12**
	
Cargue y transporte de material de escombro hacia el punto de disposición final. 27-07-23	Cargue y transporte de material de escombro hacia el punto de disposición final. 27-07-23

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

4.1 SEÑALIZACIÓN.

SEÑALIZACION										
COMPONENTE	N.	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
CERRAMIENTO DEL PREDIO Y SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DEL PROYECTO	1	Instalación de valla de presentación Del proyecto (información general del proyecto).	X			10			1.25
	2	Demarcación del perímetro de trabajo	X			10			1.25
	3	Zonificación de la obra	X			10			1.25
	4	Lona de Cerramiento	X			4			0.5
	5	Cinta de Reflectiva	X			8			1
	6	Señales Informativas y preventivas	X			7			0.87
	7	Uso de Paleteros	X			10			1.25
	8	Iluminación Nocturna	X			8			1
Calificación:		Buena: 8-10	Aceptable: 5-7		Deficiente: 0–4		PROMEDIO		1
					8.5		VALOR FINAL		8.4
						NUMERO		FECHA	
N. REGISTRO DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO ANTE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD						N/A		N/A	

Observación: Se realizó la calificación a 8 medidas de mitigación comprendidas para el componente del cerramiento del predio y señalización informativa del proyecto. Dicha calificación obtuvo un resultado promedio de 1 punto y su valor final fue de 8.4 puntos; logrando así una calificación **Buena**.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

4.2 MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS										
COMPONENTE	N.	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1	Capacitación del personal en mantenimiento preventivo	X			10			1.25
	2	Zonas de parqueo	X			10			1.25
	3	Definición de Horarios de trabajo	X			10			1.25
	4	Ficha de control de actividades	X			10			1.25
	5	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X			10			1.25
	6	Elementos de protección personal	X			10			1.25
	7	Extintores	X			10			1.25
	8	Medidas de Contingencia	X			10			1.25
Calificación:		Buena: 8-10	Aceptable: 5-7	Deficiente: 0-4			PROMEDIO		1.25
					10		VALOR FINAL		10

Observación: Se realizo la calificación a 8 medidas de mitigación comprendidas para el componente de manejo de maquinaria y equipos del proyecto. Dicha calificación obtuvo un resultado promedio de 1.25 punto y su valor final fue de 10 puntos; logrando así una calificación **Buena**.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

4.3 MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS.

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS									
COMPONENTE	N.	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	1	Capacitación del Personal	X			8			0,57
	2	Definición de Horarios de trabajo	X			10			0,71
	3	Punto de acopio temporal	X			10			0,71
	4	Ficha de control de actividades	X			10			0,71
	5	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X			10			0,71
	6	Elementos de protección personal	X			10			0,71
	7	Extintores	X			10			0,71
	8	Medidas de Contingencia	X			10			0,71
	9	Recolección de material de escombros	X			8			0,57
	10	Transporte de material sobrante (estado del platón y cubrimiento de carga)	X			10			0,71
	11	Limpieza de llantas (evitar arrastre de material	X			8			0,57
	12	Volumen de material movilizado (m3)	X			8			0,57
	13	Volumen de excavación movilizado (m3)	X			8			0,57
	14	Volumen de escombros movilizado (m3)	X			10			0,71
Calificación:		Buena: 8-10	Aceptable: 5-7		Deficiente: 0-4		PROMEDIO		0,66
							VALOR FINAL		9.24

Observación: Se realizo la calificación a 14 medidas de mitigación comprendidas para el componente de manejo de materiales de escombros del proyecto. Dicha calificación obtuvo un resultado promedio de 0.66 punto y su valor final fue de 9.24 puntos; logrando así una calificación **Buena**.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

4.4 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES									
COMPONENTE	N.	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
BODEGA DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES	1	Programa de manejo y almacenamiento de materiales	X			10			1,42
	2	Almacenamiento adecuado de combustibles			X				
	3	Localización en el Campamento	X			10			1,42
	4	Señalización en el campamento	X				7		1
	5	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X				7		1
	6	Plan de contingencia o emergencia	X			10			1,42
	7	Obras de contención	X				7		1
	8	Capacitación del Personal	X			10			1,42
Calificación:		Buena: 8-10	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 - 4		PROMEDIO		1.24
							VALOR FINAL		8,68

Observación: Se realizo la calificación a 8 medidas de mitigación comprendidas para el componente de bodega de materiales y combustibles del proyecto. Dicha calificación obtuvo un resultado promedio de 1.24 punto y su valor final fue de 8.68 puntos; logrando así una calificación **Buena**. En cuanto al numeral 2 NO se presenta avance debido que a la fecha no se cuenta con material combustible en el lugar de las obras.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

4.5 USO RACIONAL DEL PAPEL.

USO RACIONAL DEL PAPEL										
COMPONENTE	N.	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
APROVECHAMIENTO Y USO ADECUADO DEL PAPEL	1	Puntos de reciclaje en la obra	X			10			2
	2	Reutilización del papel utilizado en documentaciones	X			10			2
	3	Entrega de papel a recicladores de la zona	X				7		1.4
	4	Manejo de información en medio digital	X			10			2
	5	Manejo de información en medio magnético	X			10			2
Calificación:		Buena: 5 -6	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 - 4		PROMEDIO		2
							VALOR FINAL		9.4

Observación: Se realizo la calificación a 5 medidas de mitigación comprendidas para el componente de aprovechamiento y uso adecuado del papel del proyecto. Dicha calificación obtuvo un resultado promedio de 2 puntos y su valor final fue de 9.4 puntos; logrando así una calificación **Buena**.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

4.6 ENERGÍA ELECTRICA.

ENERGÍA ELECTRICA										
COMPONENTE	N.	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGIA	1	Aprovechamiento de la luz natural	X			10			1,66
	2	Utilización de bombillos ahorrativos	X			8			1,33
	3	Apagado de bombillos y demás electrónicos	X			10			1,66
	4	Desconexión de puntos de hidratación (suministro de agua potable)	X			10			1,66
	5	Uso adecuado de conexiones eléctricas	X			8			1,33
	6	Uso adecuado de aire acondicionado	X			10			1,66
Calificación:		Buena: 8-10 Aceptable: 5-7	Deficiente: 0-4			PROMEDIO			1,55
						VALOR FINAL			9,3

Observación: Se realizo la calificación de 6 medidas de mitigación comprendidas para el componente de medidas de ahorro de energía del proyecto. Dicha calificación obtuvo un resultado promedio de 1.55 puntos y su valor final fue de 9.3 puntos; logrando así una calificación **Buena**.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

4.7 SUELOS.

SUELOS.										
COMPONENTE	N.	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO Y MANTENIMIENTO DE PROTECCION DEL SUELO	1	Capacitación Personal			X				
	2	Actividades de remoción de derrames en el suelo			X				
	3	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas			X				
	4	Protección del suelo del residuo de concretos			X				
	5	Limpieza en el área interna y externa de la obra			X				
	6	Campamento			X				
	7	Manejo de Vegetación			X				
Calificación:		Buena: 8-10	Aceptable: 5-7		Deficiente: 0-4		PROMEDIO		
							VALOR FINAL		

Observación: en cuanto a todos los numerales NO se realizó una calificación debido a que NO se realizaron actividades relacionadas con estas.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

4.8 AIRE.

AIRE									
COMPONENTE	N.	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
RIESGOS DE CONTAMINACION ATMOSFERICA	1	Capacitación Personal	X			8			0,88
	2	Humedecimiento de áreas de trabajo	X			10			1,11
	3	Cubrimiento de acopios de materiales	X				7		0,77
	4	Uso de mallas protectoras	X			8			0,88
	5	No exceder volúmenes del volcó de los camiones	X			10			1,11
	6	Olores desagradables	X			8			0,88
	7	Aseo Interno y externo de la obra	X			10			1,11
	8	Uso de equipos en buen estado	X			8			0,88
	9	Medidas de Contingencia	X			10			1,11
Calificación:		Buena: 8-10	Aceptable: 5-7		Deficiente: 0-4		PROMEDIO		0.97
							VALOR FINAL		8.73

Observación: Se realizo la calificación de 9 medidas de mitigación comprendidas para el componente de riesgos de contaminación atmosférica del proyecto. Dicha calificación obtuvo un resultado promedio de 0.97 puntos y su valor final fue de 8.73 puntos; logrando así una calificación **Buena**

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

4.9 AGUA.

AGUA										
COMPONENTE	N.	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
			SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
MANEJO DE VERTIMIENTOS	1	Capacitación Personal			X				
	2	Manejo Escorrentía			X				
	3	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.			X				
	4	Medidas de contingencia			X				
	5	Zonas de trabajo secas			X				
	6	Manejo nivel freático			X				
	7	Separación y clasificación de vertimientos			X				
	8	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)			X				
Calificación:		Buena: 8-10	Aceptable: 5-7		Deficiente: 0-4		PROMEDIO		
							VALOR FINAL		
						NUMERO		FECHA	
NUMERO RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AGUAS						N/A		N/A	
NUMERO RESOLUCION DE CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS						N/A		N/A	
NUMERO RESOLUCION DE OCUPACIÓN DE CAUCE						N/A		N/A	

Observación: en cuanto a todos los numerales NO se realizó una calificación debido a que NO se realizarón actividades relacionadas con estas.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

4.10 RUIDO.

RUIDO										
COMPONENTE		MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
	N.		SI	NO	NO APLICA	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
CONTROL DE CONTAMINACION POR RUIDO	1	Capacitación Personal	X			10			2
	2	Dotación de elementos de protección personal	X			8			1,6
	3	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X			10			2
	4	Apantallamiento sonoro del área	X				6		1,2
	5	Planificación de horarios de trabajo	X			10			2
Calificación:		Buena: 8-10 Aceptable: 5-7	Deficiente: 0-4			PROMEDIO			1,76
						VALOR FINAL			8,8

Observación: Se realizo la calificación de 5 medidas de mitigación comprendidas para el componente de control de contaminación por ruido del proyecto. Dicha calificación obtuvo un resultado promedio de 1.76 puntos y su valor final fue de 8.8 puntos; logrando así una calificación **Buena**

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

5 GESTION SOCIAL

5.1 PROGRAMA SOCIAL

El Programa social en el contexto de proyectos de INFRAESTRUCTURA FORMATIVA, contribuye a mejorar los ambientes para el desarrollo pedagógico de los educandos, hecho que se traduce en aspectos motivacionales que llevan a un mejor aprehender, al tiempo, que asegura la capacidad del sistema para absorber, retener al mayor número de población estudiantil, con la finalidad de que a largo plazo favorezca los índices de desarrollo social de la población, aportando arraigo y correspondencia de parte de a comunidad allí formada.

Por ello, en el plan de gestión social contribuye a un conjunto de estrategias interinstitucionales y comunitarias que identifican posibles cambios u transformaciones del entorno ambiental, social y económico de los habitantes, así pues, la inversión de la reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del Municipio de Villavicencio- Meta, contribuye a mejorar la calidad de vida del cuerpo estudiantil, cuerpo docente y la comunidad en general, fortaleciendo la importancia en la educación de las zonas rurales.

Por este motivo, la infraestructura de la escuela es un factor importante para el rendimiento escolar porque cumple un rol motivacional y funcional, es decir, produce mejor actitud en los estudiantes hacia la enseñanza-aprendizaje los cuales faciliten mejores procesos educativos, contribuyendo a una buena calidad en todos los aspectos formadores de ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, participando activamente en la vida social, económica y política,

Para finalizar, enfatizándonos en el proyecto correspondiente a la reconstrucción total de la escuela, permite un entorno seguro a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, contribuyendo a una mayor inclusión, seguridad y practicas pedagógicas efectivas, pues se sabe que una educación de calidad provee no solo conocimientos, sino que enriquece la diversidad cultural, espiritual, valores, principios, con la finalidad de impulsar nuevos retos para la formación eficiente a nivel rural. contribuyendo al cumplimiento de los estándares y exigencias técnicas establecida por el ministerio de educación.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

5.2 MARCO LEGAL

5.2.1 Normatividad.

Constitución Política de 1991:

ART N°02: Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

ART N°40: Formar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.

ART N°67: a educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

ART N°103: Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

ART N°105: Previo cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale el estatuto general de la organización territorial y en los casos que éste determine, los gobernadores y alcaldes según el caso, podrán realizar consultas populares para decidir sobre asuntos de competencia del respectivo

Ley 134 de 1994: Objeto de la ley. La presente Ley Estatutaria de los mecanismos de participación del pueblo regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta Popular, del orden nacional, departamental, distrital, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto.

Ley 80 de 1993: en su artículo 22 creó el registro de proponentes, en el cual deben inscribirse todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles.

Ley 850 de 2003: Prohibiciones de las veedurías ciudadanas. A las veedurías ciudadanas en el ejercicio de sus funciones les está prohibido, sin el concurso de autoridad competente, retrasar, impedir o suspender los programas, proyectos o contratos objeto de la vigilancia.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."

Ley 1757 del 06 de julio de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. Diario Oficial.

Directiva Presidencial N°10 de 2002: para que la comunidad en general realice una eficiente participación y control social a la gestión administrativa

CONPES 3654 de 2010: sobre la política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos

CONPES 167 de 2013: Política integral anticorrupción

Decreto 1860 de 1994 de la ley general de educación: Las disposiciones del presente Decreto constituyen lineamientos generales para el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales, con el objeto de orientar el ejercicio de las respectivas competencias, y para los establecimientos educativos en el ejercicio de la autonomía escolar.

5.3 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

La implementación del plan de gestión social, permitirá mediante diferentes estrategias y/o actividades posibles cambios u transformaciones del entorno ambiental, político, económico, contribuyendo al cumplimiento de los estándares y exigencias técnicas establecidas por el Ministerio de Educación, de igual manera, el involucramiento de la comunidad del área de influencia directa, tales como: líderes comunitarios, cuerpo estudiantil, cuerpo docente, entidades interinstitucionales gubernamentales o no gubernamentales, todo con la finalidad de que el contratista e interventoría, busquen el cumplimiento total del contrato 1765 del 2023.

En aras de un beneficio para todas las partes interesadas, por ende, su especificidad son las siguientes:

- Atender o hacer seguimiento de los PQRS que surjan en el corregimiento 4 del Municipio de Villavicencio, de manera eficiente y eficaz, a través de mesas de trabajo, reuniones, comités, que permitan soluciones de posibles controversias frente al proyecto

- Trabajar en conjunto con los diferentes actores sociales del área de influencia, por medio de charlas, socializaciones, talleres, actividades a los que halla a lugar.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

- Fortalecer los canales de comunicación de todos los actores sociales, a través de una escucha constante contribuyendo al cumplimiento de los estándares y exigencias técnicas establecidas por el Ministerio de Educación para la ejecución del proyecto.

Por ende, a continuación, se despliega los siguientes programas:

5.3.1 Programa De Atención Al Usuario:

Crear y/o mantener un sistema de atención que permita de manera oportuna, eficaz recibir, oportunamente en la cual se atienda y tramita las diferentes quejas, peticiones, solicitudes y sugerencias que se presenten los actores sociales del área de influencia, por medio personal, vía web o telefónicamente con el fin de contribuir a la satisfacción de los mismos.

En este programa cabe resaltar que, como Interventoría del área social, se realizó acompañamiento a la profesional social del contratista Consorcio C&G – MH, con el fin de verificar los diferentes canales de comunicación los cuales se logró la creación de medios físicos y electrónicos para recibir las diferentes peticiones que los usuarios y comunidad en general requiera hacer sobre el Proyecto. A continuación, se evidencia los dos canales de comunicaciones creados en este periodo:

Numero De Celular Del Contratista	Correo Electrónico Del Contratista
313-8227763	gestionsocialconsorciocygmh@gmail.com

Por otra parte, el contratista del área social el día 13 del mes de julio del 2023, recibió por parte la comunidad del área de influencia una PQRS, debido a que solicitaban se informados sobre toda la contratación de bienes y servicios tales como: (contratación de mano de obra, contratación de empresas del sector, Divulgación de las diferentes vacantes ofertadas, entre otras temáticas), que brinda el proyecto de la construcción: Institución Educativa Alfonso López Pumarejo. Así pues, el contratista emitió respuesta mediante comunicación CE-1201-12-045, el día 21 de julio del año en curso, como se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico:

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

PQRS-Por Parte de la Comunidad del AID Sector Pompeya	
Registro Fotografico N°1	Registro Fotografico N°2
	CONSORCIO EDUCACION CBG-MH NIT: 901.687.301 Villavicencio, 21 de Julio de 2023 CE-201-127-045 Señores Atn MARISOL CALVO JUNTA DE ACCION COMUNAL ALTOS DE POMPEYA. KM 27 Vía Puerto López Villavicencio Meta REFERENCIA: Contrato de obra pública No. 1270 de 2023 *"Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta".* ASUNTO: Respuesta Oficio Solicitud reunión de los líderes de la comunidad con el Representante Legal, Director de Obra y residentes sociales (Obra e Interventoría) con los líderes de la comunidad. Cordial saludo En respuesta a su comunicación del asunto, informamos que el día viernes 14 de Julio de 2023 realizamos reunión con la Comunidad y acompañamiento de la Interventoría; al respecto se trataron los puntos mas importantes de su solicitud y formalmente estamos dando respuesta detallando acorde a cada punto:
Fecha: 13-07-2023	**Fecha:**21-07-2023

Además, en la reunión llevada a cabo el 13 de julio, las profesionales sociales de obra e interventoría manifestaron a la comunidad que es necesario la conformación del comité con la finalidad de trasmitir información verídica al resto de actores sociales del área de influencia, así mismo, las personas que se comprometan a conformar dicho comité no solo tendrán la obligatoriedad de asistir sino a su vez, cumplir con el rol de vigilancia y control del proyecto. así pues, este día se concertó la conformación del mismo.

De igual forma, el próximo mes se socializará el correo electrónico de la profesional social de Interventoría, con la finalidad de atender a la comunidad interesada en cuanto a cualquier requerimiento a que allá a lugar. Sin embargo, se deja evidenciado el correo:

Correo Electrónico De La Interventoría
socialintereducativa2023@gmail.com

De igual forma, se acompañó a la profesional social del contratista, con el fin de verificar la atención brindada a los diferentes actores sociales de manera presencial las cuales manifestaban sus diferentes inquietudes, preguntas o sugerencias del proyecto. Cabe resaltar que en este no se tienen evidencias o soportes pues no hubo nada oficial por parte de la comunidad para realizar la atención y solución del mismo.

5.3.2 Programa De Educación Y Capacitación Al Personal Vinculado Al Proyecto:

Capacitar al personal vinculado al proyecto en todas las áreas en temas relacionados con las medidas de manejo ambiental y social del proyecto, disminuyendo el grado de desinformación y generación de falsas expectativas a la comunidad por información suministrada por el personal vinculado a las obras.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

Para el mes de julio no se realizó capacitación al personal de obra.

5.3.3 Programa De Información Y Participación Comunitaria

Diseñar y desarrollar un sistema de comunicación para el proyecto, que integre estrategias de comunicación comunitaria y social masiva, contribuyendo a la generación de una imagen positiva y sólida del Proyecto, al mejoramiento de las relaciones sociales culturales, organizativas o mediáticas.

Para el mes de julio como estrategias de comunicación comunitaria y social masiva ante los diferentes actores sociales, se realizará la conformación de comité única y exclusivamente para control social de la ejecución de obra de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo del sector rural de Pompeya.

Por otro lado, como se mencionó con anterioridad la comunidad emitido un PQRS, en el cual una de las solicitudes fue la oferta y demanda que tiene el proyecto para involucrar a los empresarios del sector, así pues el pasado 27 de julio del 2023 se logró concertar entre: (empresarios del sector, contratista e interventoría), dicha reunión no obtuvo ningún éxito así que fue cancelada, sin embargo, se obtuvo una segundo acercamiento el día 31 de julio del año en curso, el cual se alcanzó con éxito el desarrollo del mismo, como se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico:

Reunion oferta y demanda para empresarios del sector del AID- No Ejecutada	
Registro Fotografico N°3	Registro Fotografico N°4
	
Fecha: 27-07-2023	**Fecha:**27-07-2023

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

Reunion oferta y demanda para empresarios del sector del AID- Ejecutada	
Registro Fotografico N°5	Registro Fotografico N°6
	
Fecha: 31-07-2023	**Fecha:**31-07-2023

Cabe resaltar que el pasado 31 de Julio del año en curso, el contratista dejo claridad que los precios ofertados y demandados corresponden al año 2021 y que el proyecto no es de Ecopetrol sino netamente de la Alcaldía Municipal.

5.3.4 Conformación de comité o veeduría:

Como se mencionó con anterioridad el 13 de julio del 2023 se realizó la conformación de un comité de vigilancia o control por parte de la comunidad con el fin de informar sobre los diferentes avances de obra, con el propósito que estos integrantes o actores sociales que pertenecen al AID manifiesten en las reuniones todas las inquietudes, hechos o acontecimientos importantes y así mismo, poder resolver cualquier requerimiento concerniente a la ejecución de obra del mega colegio, como se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico:

Conformacion del comité de vigilancia y control	
Registro Fotografico N°7	Registro Fotografico N°8
	
Fecha: 13-07-2023	**Fecha:**13-07-2023

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

5.3.5 Programa de vinculación de mano de obra

Fomentar la vinculación laboral del personal del Área de Influencia Directa del Proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Especificar los perfiles requeridos concerniente a la mano de obra no calificada de la región, con el fin de divulgar por medio de las diferentes agencias públicas de empleo, oficina móvil, las diferentes vacantes laborales en las cuales especifique: caracterización de la población, número de vacantes, perfiles requeridos como (ayudante de obra, oficial de obra, jefe de obra civil, conserje, entre otros a que allá a lugar), aspirantes presentados, seleccionados, seguimiento al contrato, de igual forma como requisito esencial se solicitará certificado de la JAC de residencia en la zona, adicionalmente a eso el certificado si pertenece o no algún grupo población específica, con la finalidad de asegurar la contratación de mínimo un 35% de las personas a intervenir de manera mensual.

Por otro lado, el contratista tendrá la obligación según los hallazgos mediante la caracterización de la población en el cual deberá contratarse de la siguiente manera: el 30% de las personas contratadas deberan ser mujeres o se consideren legalmente de este género y un 5% de población en pobreza extrema, con algún tipo de vulneración o que pertenezcan a un grupo poblacional especifico.

Además, solicitar al contratista que las hojas de vida adjuntadas deben también poseer con Formato N°11 Autorización para el tratamiento de datos personales, pues como lo expone el artículo 18 de la ley 1712 de 2014: "garantizar el derecho de la reserva legal ante cualquier población que presente cualquier factor de riesgo (mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reincorporación o reintegración, población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, ROM o gitana)".

De igual manera, el contratista deberá presentar los diferentes documentos que acredite que dicha persona vinculada al proyecto se encuentra en pobreza extrema, sea víctima del conflicto armado o presente algún tipo de vulneración, como se establece el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 1084 de 2015, dicho soporte deberá tener una expedición de 30 días hábiles a su postulación.

Así mismo, el contratista deberá vincular por lo menos 10% en los cuales se identifique los Mipyme (emprendimiento), en el cual se debe evidenciar mediante el formato N°3

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

Por otro lado, se realizó reunión con actores sociales, con la finalidad de hablar del inicio de obra, proceso correcto de las diferentes recepciones de hojas de vida, al igual, que los diferentes modelos publicitarios que se pretenden realizar acorde a la necesidad de ofertas laborales.

Así pues, desde el área social el contratista realizo un modelo publicitario el cual consistió en divulgar las diferentes vacantes de empleo según la demanda del proyecto, como se puede evidenciar en el siguiente registro fotográfico:

Modelo Publicitario- Vacantes de Empleo

Registro Fotografico N°9



Fecha: 15-07-2023

Por otro lado, se contrató personal para laborar en las actividades de demolición, señalización y apoyo en toda la temática de riesgos laborales, en el cual se contó con personal de mano de obra no calificada que pertenecen al 35% del área de influencia directa de la región, para la ejecución del proyecto, como se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla N°1

N°	Nombres Completos	Sexo	AID	Ocupación	MDONC YMDOC	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro
1	Yeison Alexander Sánchez Palacios	M	Si	Ayudante de Obra	MDONC	26/06/2023	29/07/2023
2	Diosnell Jose Mosquera Torres	M	Si	Ayudante de Obra	MDONC	26/06/2023	29/07/2023
3	Juan David Vega Marín	M	Si	Ayudante de Obra	MDONC	26/06/2023	29/07/2023
4	Leovigildo Vega Quiñones	M	Si	Ayudante de Obra	MDONC	26/06/2023	29/07/2023
5	Deiber Enrique Muñoz Tique	M	Si	Ayudante de Obra	MDONC	26/06/2023	29/07/2023
6	Rodrigo Naranjo Martínez	M	Si	Ayudante de Obra	MDONC	26/06/2023	29/07/2023

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

N°	Nombres Completos	Sexo	AID	Ocupación	MDONC YMDOC	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro
7	Sol Lourdes Ramírez	F	Si	Controlador Vial	MDONC	11/07/2023	Sigue Vigente
8	Angela Silva Ospina	F	Si	Controlador Vial	MDONC	11/07/2023	Sigue Vigente
9	Leovigildo Vega Quiñones	M	Si	Ayudante de Obra	MDONC	17/07/2023	Sigue Vigente
10	Rodrigo Naranjo Martínez	M	Si	Ayudante de Obra	MDONC	17/07/2023	Sigue Vigente
11	Diana Carolina Vega Castillo	F	Si	Profesional SST	MDOC	17/07/2023	Sigue Vigente

A su vez, para el mes de julio del año en curso, se cuenta o se contó con diez (10) personas de mano de obra no calificada y (1) calificada, sin embardo de estas (11) personas, solo se encuentran laborando actualmente, cuatro (4) las cuales pertenecen a la mano de obra no calificada y uno (1) pertenece a mano de obra calificada, contando con un total de cinco (5).

5.3.6 Programa de cultura vial

Informar y promover en los usuarios y comunidades de la zona de influencia del proyecto, el desarrollo de comportamientos adecuados en relación con el uso y disfrute de la infraestructura vial que contribuyan a la prevención y mitigación de accidentes.

El pasado 25 de julio se realizó con la comunidad del área de influencia, campaña sobre concientización y sensibilización frente a como ser un buen actor vial, esto debido a que el proyecto demanda la entrada y salida de volquetas o maquinarias necesarias para el proyecto, por esto, el contratista ubico dos controladores viales para controlar el tráfico y evitar cualquier tipo de accidentalidad.

Campaña Vial Concientizacion y Sensibilizacion- Comunidad del ADI	
Registro Fotografico N°10	Registro Fotografico N°11
	
Fecha: 25-07-2023	**Fecha:** 25-07-2023

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

Campaña Vial Concientizacion y Sensibilizacion- Comunidad del ADI	
Registro Fotografico N°12	Registro Fotografico N°13
	
Fecha: 25-07-2023	**Fecha:** 25-07-2023

5.3.7 Programa de acompañamiento a la gestión socio predial

Brindar acompañamiento social durante el proceso de adaptación y apropiación del nuevo lugar de habitación o desarrollo de la actividad productiva, buscando mantener o mejorar las condiciones de la calidad de vida de las unidades sociales cuyos predios son requeridos.

En este cabe resaltar que si ha lugar en cuanto a la implementación del plan de compensaciones socioeconómicas Resolución 545 de 2008 del Instituto Nacional de Concesiones el Contratista Consorcio C&G –MH, deberá asumir cualquier afectación que presente en las viviendas cercanas al proyecto.



Por otro lado, se realizó acompañamiento el día 18 de julio del año 2023, a la profesional social del contratista, con la finalidad de formalizar las entregas correspondientes a las actas de vecindad iniciales levantada, contando con un total de trece (13) predios ubicados sobre la carretera nacional vía Puerto López del kilómetro 25 al 27, requeridos para el proyecto. A continuación, se evidencia los diferentes registros fotográficos:

Entrega a Propietarios de Actas de Vecindad	
Registro Fotografico N°14	Registro Fotografico N°15
	
Fecha: 18/07/2023	**Fecha:** 18/07/2023

De igual manera, el día 19 de julio la profesional social del contratista, realiza radicación oficial de manera física a la interventoría de las actas de vecindad

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

iniciales entregadas a propietarios del área de influencia, A continuación, se evidencia los diferentes registros fotográficos:

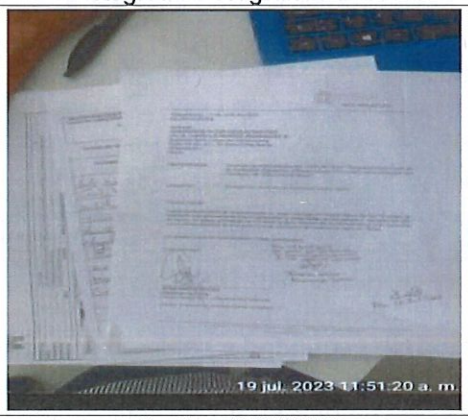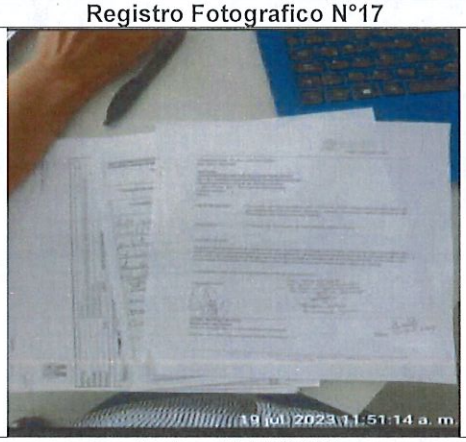Entrega a Propietarios de Actas de Vecindad	
Registro Fotografico N°16	Registro Fotografico N°17
	
Fecha: 19/07/2023	**Fecha:** 19/07/2023

5.3.7.1 Otras Actividades de Acompañamiento.

Para el 19 de julio del 2023, se realizó mesa técnica entre las profesionales sociales, en el cual se concertó la forma de entrega de informes y anexos del mismo, realización del PGSC, entre otros temas sociales, A continuación, se evidencia los diferentes registros fotográficos:

Mesa Tecnica Entre las Profesionales Sociales de Contratista e Interventoria	
Registro Fotografico N°18	Registro Fotografico N°19
	
Fecha: 19/07/2023	**Fecha:** 19/07/2023

De igual manera, se realizó mesa entre contratista e interventoría con el fin de concertar temas en todas las áreas del proyecto, A continuación, se evidencia los diferentes registros fotográficos:

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

Mesa Tecnica Entre Profesionales de Contratista e Interventoria	
Registro Fotografico N°20	Registro Fotografico N°21
	
Fecha: 18/07/2023	**Fecha:** 18/07/2023

Se le solicito a las profesionales del contratista de seguridad y salud en el trabajo y social, realizar la señalización para los que los diferentes actores viales, contaran con un sendero peatonal en pro de la comunidad de influencia del proyecto, en el cual estuviera demarcado, con la finalidad de prever cualquier tipo de accidentalidad.

A su vez, para el mes de agosto se verificará si el requerimiento de seguridad vial fue ejecutado o no por el contratista.

Solicitud Sendero Peatonal Para la Comunidad del AID	
Registro Fotografico N°22	Registro Fotografico N°23
	
Fecha: 25/07/2023	**Fecha:** 25/07/2023

Adicionalmente, a continuación, se evidencia de manera cuantitativa las diferentes actuaciones correspondientes al área social:

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

5.4 Actuaciones correspondientes al área social:

GESTIÓN SOCIAL									
COMPONENTE	No	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION			
			SI	NO	N/A	BUENA	ACEPTABLE	DEFICIENTE	VALOR
Programa de Atención al Usuario	1	Medios de atención físicos- Atención presencial a la comunidad	X			10			10
	2	Medios de atención electrónicos- Creación de correo electrónico	X			10			10
Programación de información y participación comunitaria	1	Reunión oferta y demanda para empresarios del sector del AID- No Ejecutada	X			3			3
	2	Reunión oferta y demanda para empresarios del sector del AID- Ejecutada	X			10			10
	3	Conformación del comité de vigilancia y control				10			10
Programa de vinculación de mano de obra	1	Modelo Publicitario- Vacantes de Empleo	X			10			10
	2	Consolidado- personal de mano de obra no calificada	X			1			1
Programación de Cultura Vial	1	Campaña Vial Concientización y Sensibilización- Comunidad del ADI	X			10			10
Programa Acompañamiento a la Gestión Socio predial	1	Entrega a Propietarios de Actas de Vecindad	X			10			10
Otras Actividades	1	Mesa Técnica Entre las Profesionales Sociales de Contratista e Interventoría	X			10			10
	2	Mesa Técnica Entre Profesionales de Contratista e Interventoría	X			6			6
	3	Solicitud Sendero Peatonal Para la Comunidad del AID	X			1			1
Calificación:		Buena: 8 - 10	Aceptable: 5 - 7		Deficiente: 0 - 4		PROMEDIO		5
							VALOR FINAL		5

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

6 DOCUMENTACION DEL CONTRATO

En el presente capitulo se relacionan los documentos legales que se realizaron desde el inicio del contrato como actas legales, así como en el presente periodo se relaciona actas de comités de obra, correspondencia y bitácora de obra.

6.1 ACTAS LEGALES GENERADAS

En el presente capitulo se relacionará las actas legales generadas a la fecha.

RELACION DE ACTAS LEGALES			
No	TIPO DE ACTA	FECHA	DESCRIPCION
1	Acta de inicio obra	20/05/2023	Acta por la cual se inician actividades de obra
2	Acta de inicio interventoría	16/05/2023	Acta por la cual se inician actividades de interventoría

6.2 ACTAS DE COMITÉ OBRA E INSTITUCIONALES

En el siguiente cuadro se relaciona las actas de comité realizadas hasta la fecha del presente periodo.

RELACION DE ACTAS DE COMITÉ		
TIPO DE ACTA	FECHA	DESCRIPCION
Socialización	11-05-2023	Socialización del proyecto ante la comunidad
Acta de reunión	26-06-2023	Temas varios para el inicio de actividades de desmonte y demolición.
Acta de reunión	06-07-2023	Revisión empalme sobre el plan de gestión social contractual y actas de vecindad.
Acta de reunión	10-07-2023	Revisión programación de actividades y avances, actividades realizadas, tramites y certificados.
Acta de reunión	18-07-2023	Revisión componentes SST, Ambiental, social y técnica.

6.3 CORRESPONDENCIA DEL PERIODO INFORMADO

A continuación, se relación la correspondencia enviada en orden cronológico:

ENVIADA				
FECHA	CONSECUTIVO / RADICADO N°	MEDIO DE ENVÍO	ASUNTO	DIRIGIDO A
4/07/2023	CI-1765-2023-OF-024	Físico	Solicitud informe mensual de obra y documentos ingreso de personal	Consorcio Educación CG-MH
6/07/2023	CI-1765-2023-OF-025	Físico	Entrega de informes revisión de diseños estructural al	Consorcio Educación CG-MH

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

ENVIADA				
			contrato de obra No 1279 de 2023	
14/07/2023	CI-1765-2023-OF-026	Físico	Entrega de informes revisión de estudio de suelos, diseño arquitectónico y diseño eléctrico al contrato de obra No 1279	Consorcio Educación CG-MH
17/07/2023	CI-1765-2023-OF-027	Físico	Entrega de informe revisión diseño hidrosanitario por parte de contratista e informe revisión diseño eléctrico por parte de interventoría al contrato de obra No 1279 de 2023	Consorcio Educación CG-MH
18/07/2023	CI-1765-2023-OF-028	Físico	Cambio de hojas de vida profesionales del contrato de obra No 1279 de 2023.	Consorcio Educación CG-MH
19/07/2023	CI-1765-2023-OF-029	Físico	Entrega copias de actas de vecindad contrato de obra No 1279 de 2023	Consorcio Educación CG-MH
21/07/2023	CI-1765-2023-OF-030	Físico	Solicitud documentación por parte del consultor de los diseños del contrato de obra No 1279 de 2023	Consorcio Educación CG-MH
25/07/2023	-	Físico	Entrega informe de interventoría del contrato de obra No 1279, periodo del 20 al 31 de mayo de 2023.	ALCALDIA MUNICIPIO VILLAVICENCIO Sebastián Oicata Quimbaya, Supervisor delegado
26/07/2023	CI-1765-2023-OF-031	Físico	Solicitud desembolso anticipo del contrato de obra No 1279 de 2023	Consorcio Educación CG-MH
28/07/2023	-	Físico	Entrega informe de interventoría del contrato de obra No 1279, periodo del 01 al 30 de junio de 2023.	ALCALDIA MUNICIPIO VILLAVICENCIO Sebastián Oicata Quimbaya, Supervisor delegado
	CI-1765-2023-OF-032	Físico	Cambio hojas de vida profesionales del contrato de obra No 1279 de 2023	ALCALDIA MUNICIPIO VILLAVICENCIO Sebastián Oicata Quimbaya, Supervisor delegado
31/07/2023	CI-1765-2023-OF-033	Físico	Solicitud respuesta observaciones de los estudios y diseños del contrato de obra No 1279 de 2023	ALCALDIA MUNICIPIO VILLAVICENCIO Sebastián Oicata Quimbaya, Supervisor delegado
	CI-1765-2023-OF-034	Físico	Solicitud respuesta al documento de solicitud CI-1765-2023-OF-022, incluir	ALCALDIA MUNICIPIO VILLAVICENCIO

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

ENVIADA				
			profesional SST en el contrato de interventoría No 1765	Sebastián Oicata Quimbaya, Supervisor delegado

6.4 COPIA DE LA BITACORA

Se anexa a este informe copia de la bitácora firmada del presente periodo. Ver anexos.

7 INFORME FINANCIERO

7.1 MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA 1279.

Tal como quedó establecido en el contrato de obra en la Cláusula 6. ANTICIPO. La entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: Un anticipo del VEINTE por ciento (20%), del valor del contrato previa aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del interventor. Para el manejo del anticipo, EL contratista constituirá un contrato de Administración Fiduciaria en los términos establecidos en el artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011.

El contratista en comunicado CE-201-124-012 del 1 de junio de 2023, envió los documentos para el desembolso del anticipo, la interventoría realiza la revisión y envía observaciones en oficio CI-1765-2023-OF-010 del 05 de junio de 2023 y el contratista envía los documentos mediante oficio CE-201-124-022 el 26 de junio de 2023 y la interventoría radica la documentación del anticipo a la supervisión en comunicado CE-1765-2023-OF-031 el 26 de junio de 2023 con número de radicado 2633.

A la fecha del presente informe la entidad no ha realizado el respectivo giro del anticipo a la Fiducia ALIANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS Nit 830.053.812-2 con número de cuenta de ahorros 482800031437 BANCO DAVIVIENDA.

PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO			
VALOR DEL CONTRATO DE OBRA		$ 25.094.607.822	
ANTICIPO 20%		$ 5.018.921.564,51	
No	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA- SALARIOS Y JORNALES	$1.003.784.312,90	20%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$3.513.245.095,16	70%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$250.946.078,23	5%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$250.946.078,23	5%

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

interlab.ingenieria@gmail.com

CONTROL DE LA INVERSION DEL ANTICIPO					
FECHA	TIPO DE INVERSION	NUMERO DE SOPORTE	PORCENTAJE	VALOR DE INVERSION	% EJECUCIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7.2 PAGOS REALIZADOS.

A la fecha, el contratista de obra, no ha recibido desembolsos por concepto anticipo ni actas de cobro parcial.

7.2.1 Cuadro de control financiero.

CONCEPTO	PERIODO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% EJECUCIÓN
ANTICIPO	-	-	-	-	-
ADICIÓN	-	-	-	-	-
PARCIAL No 1	-	-	-	-	-
PARCIAL No 2	-	-	-	-	-
SALDO A FAVOR CONTRATISTA	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	-	-	-	-	-

7.3 AVANCE FINANCIERO Y CONTROL PRESUPUESTAL

En el siguiente cuadro se relaciona los valores y porcentajes acumulados y mensuales según programación inicial de obra en comparación con lo ejecutado acumulado y mensual a corte del 31 de julio de 2023 del presente informe. Teniendo en cuenta condiciones iniciales del contrato de obra y acta de inicio del 20 de mayo de 2023.

PERIODO	VALOR ACUM. PROGRAMADO	% ACUM. PROGRAMADO	VALOR ACUM. EJECUTADO	% ACUM. EJECUTADO
MAYO	$6.526.561,28	0.03%	$0.00	0.0%
JUNIO	$91.082.041,08	0.36%	$52.389.729,00	0.21%
JULIO	**$468.029.826,38**	**1,87%**	**$ 486.835.392**	**1,94%**

Para el periodo de seguimiento se presenta un avance físico acumulado adelantado correspondiente al 0.07% más del valor programado acumulado a la fecha de corte de este informe.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

8 NFORME LEGAL

8.1 CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS.

- **Licencia de construcción:** Resolución No 50001-2-19-0626 del 19 de agosto de 2020, y resolución de prorroga No 22-2107 del 03 de agosto de 2022.

- **Permiso ANLA:** Resolución No 20223040007175 del 01 de junio de 2022, además de la viabilidad de servicios públicos domiciliarios.

- **Permiso de aprovechamiento forestal por parte de CORMACARENA:** El municipio de Villavicencio presentó la resolución No PS-GJ.1.2.6.22.0125, expediente No. PM-GA3.37.13.022.002, por medio de la cual se acoge el concepto técnico No PM-GA-3.44.22.251. de fecha de 25 de febrero de 2022, y se otorga permiso de aprovechamiento forestal único a favor de la alcaldía municipal de Villavicencio, de 81 individuos arbóreos.0

- **Permiso del uso, la ocupación y a la intervención temporal de la infraestructura vial:** Para la carretera concesionada con la agencia nacional de infraestructura – ANI, conforme al trámite iniciado, según radico No. 20214091290852 de fecha 05 de noviembre de 2021. El municipio entregó resolución No 20223040007175, por la cual se concede el permiso temporal para la construcción de acometida sanitaria para la institución educativa Alfonso López Pumarejo mediante instalación subterránea de tubería de polietileno de 6" de diámetro en el PR – 24+0865, paso poblado Pompeya, en la ruta 4007.

9 CONCLUSIONES Y/O OBSERVACIONES

- Para el presente periodo se contó con tiempo mayormente soleado correspondiente a un porcentaje de ocurrencia durante el mes de 64%, lluvias leves 11%, fuertes 2% y nubosidad 23%, lo cual, en comparación con los periodos anteriores, hubo disminución de tiempo soleado, aumento de nubosidad y aumento de lluvias leves en menor medida, sin embargo, se puede concluir que se continúa presentando clima óptimo para el normal desarrollo de las actividades en el proyecto.

- En el periodo de seguimiento se evidenció un avance físico mensual de obra correspondiente a un **1.73%** con un acumulado físico total a la fecha de **1.94%**, lo cual con respecto al porcentaje programado acumulado a la fecha de **1.87%**, evidencia un adelanto de **0.07%** sobre lo programado, teniendo que la programación de actividades es con respecto a las

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

condiciones iniciales del contrato según acta de inicio y presupuesto inicial.

- El contratista de obra recibió entrega formal del predio del proyecto el 21 de junio de 2023 por parte del municipio, por consiguiente, se tiene en cuenta que, debido a esto, desde el 20 al 31 de mayo y desde el 01 al 21 de junio del 2023, lo que corresponde al tiempo de vigencia del contrato desde el acta de inicio, el contratista no pudo realizar actividades de obra, ya que las aulas aún se encontraban ocupadas con parte mobiliaria del colegio, hasta que se hizo su debida entrega por parte del municipio.

Aprobación del Informe:

Elaboró:	Aprobó:
Ing. David Leonardo Rodríguez Bermúdez. Director de la Interventoría.	Ing. David Leonardo Rodríguez Bermúdez. R/L de la Interventoría

10 LISTA DE ANEXOS

1. Bitácora de obra.
2. Pagos de seguridad social.
3. Actas de comité.
4. Registro fotográfico.
5. Certificados de calibración de equipos topográficos.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

ANEXO 1. BITÁCORA DE OBRA.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

01-07-2023. Actividades Colegio Alfonso Lopez Pumarejo
- Continúa las actividades topográficas de localización y replanteo de estructuras existentes a construir

Ing. Residente Interv.

Residente de obra

02-07-2023. Actividades Colegio Alfonso Lopez Pumarejo
Domingo no se laboró

Ing. Residente Interv.

Residente de obra

03-07-2023. 03-07-2023. Actividades Colegio Alfonso Lopez Pumarejo
Lunes Festivo no se laboró.

Ing. Residente Interv.

Residente de obra

-04-07-2023. Actividades Colegio Alfonso Lopez Pumarejo.
- La topografía continuo sus actividades de localización y replanteo de urbanismo.
- Las actividades de demarte y demolición continuan su curso.
- Clima Soleado

Ing. Residente Interv.

Residente de Obra.

05-07-2023. Actividades Colegio Alfonso Lopez Pumarejo.
- Las labores de demarte y demolición siguen realizandose
- En cuanto a la topografía continuan haciendo localizacion y replanteo del urbanismo
- Clima Soleado

Ing. Residente Interv.

Residente de Obra.

06/07/2023
Jueves.
Clima: se presentan lluvias fuertes en horas de la mañana y lluvias leves en horas de la tarde.
Personal: 1 maestro, 6 Ayudantes, 2 topografos disponibles y 1 operador de retroexcavadora.
Actividades: Demolición y desmontes de cubiertas.
Equipo y maquinaria: Retroexcavadora cat
Observaciones: Retroexcavadora varada, presenta daño en el cucharon extra en reparación.

Firmas:

Res. Interv.

07/07/2023
Viernes.
Clima: se presentan lluvias fuertes de 8:00 a 9:00, lluvias leves de 09:00 a 10:00 y lluvias leves de 12:00 a 13:00.
Personal: 1 maestro, 5 Ayudantes, 2 topografos disponibles y
Actividades: - Demolición y desmontes de cubiertas
Equipo y maquinarias: Retroexcavadora cat
Observaciones: Retroexcavadora continua en reparación, en horas de la tarde se recibe en obra visita por parte del apoyo tecnico de ecopetrol para inspección de los avances de obra.

Res. Interv.

08-Julio-2023 Sabado.
Clima se presenta nubosidad en horas de la mañana y tiempo soleado en la tarde.
Personal: 1 maestro; 6 ayudantes; 2 topografos.
Actividades: finalizar actividad de demolicion exceptuando dos de servicio para la obra, al igual que los desmontes.
Equipos y maquinarias: Retroexcavadora cat.
Observaciones: N/A, llega a obra planta de concreto y bomba estacionaria.

Res. Interv.

Firmas:

go 2023, 11:20

09/07/2023, Domingo
Dia no laboral.

Firmas.

Res. Interv.

10/07/2023, Lunes

Clima: se presenta clima optimo para la realizacion de actividades en toda la jornada laboral.
Personal: 1 maestro, 1 ayudante, 1 topografo, 1 cadenero
Actividades: Desmonte de kiosco, realizacion de corte con excavt.
Equipo y maquinaria: Retroexcavadora cat excavadora
Observaciones: Se realiza comite de obra con asistencia de la secretaria de educacion, interventoria y obra con la residente de la junta para poder compromisos.

Residente

11/07/2023, Martes

Clima: se presento clima optimo, nubosidad en horas de la mañana y tiempo soleado en horas de la tarde.
Personal: 1 maestro, 1 Ayudante, 2 controladoras de trafico
Actividades: Corte de la estructura de kiosco con excavt, inicia istalacion de valla (dc) informativa.
Equipo y maquinaria: Retroexcavadora cat inactiva, Equipo de soldadura excavt, Planta de concreto y bomba estacionaria
Observaciones: se recibe visita hacia el medio dia de personal de la ANI haciendo la observacion de que la instalacion de la valla no se puede realizar por invasion de espacio público, se realiza desmonte de lo avanzado de la actividad y se acoplan los materiales al interior del proyecto., en conjunto con interventoria se realiza inventario de desmonte.

Residente Interv

22 ago 2023, 11:20

12/07/2023, miercoles.

Clima: se presentan lluvias fuertes en horas de la mañana alternadamente y en la tarde tiempo soleado

Personal: 1 maestro, 1 Ayudante, 2 controladoras de trafico.

Actividades: se realizan cortes de estructuras metalicas de recreacion. con oxicorte por parte del personal de obra. (Se retoma actividad de)

Equipos y maquinarias: Retroexcavadora Cat inactiva, planta de concreto, bomba estacionaria.

Observaciones: se suspenden actividades en los momentos de lluvias. se recibe visita de la ingeniera por parte de ecopetrol para inspeccion de estado de la obra hacia el medio dia.

(13/0)

Res. Interv.

13/07/2023, Jueves.

Clima: se presenta Clima soleado en horas de la mañana, tiempo soleado en horas de la tarde.

Personal: 1 maestro, 1 Ayudante, 2 controladoras de trafico, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador de retro,

Actividades: se realiza limpieza y descapote en la zona al lado de los baños para ubicacion de planta de concreto, se retoma actividad de instalacion de valla informativa dentro del predio del proyecto aurea de la zona del espacio público, delmonte de kiosco con la retro.

Equipos y maquinaria: Retroexcavadora Cat, Planta de concreto, Bomba estacionaria, Equipo de oxicorte para cortes de estructuras metalicas.

Observaciones: se realiza reunión de socialización con la comunidad, algunos presidentes de junta, profesionales sociales de obra e interventoria, ingenieros tecnicos y administrativos de obra e interventoria. con la finalidad de conformar el comite de veeduria y aclaraciones con la comunidad.

Res. Social

Res. Interv

ago 2023, 11:21

14-07-2023- Visita del Rector Ingeniero Alfonso López Pumarejo. El objeto de la Visita es retirar aparatos sanitarios los cuales serán instalados en otras sedes educativas del Colegio Alfonso López Pumarejo, y se describen a continuación:

- 3 Sanitarios, con listones y tapas + 1 Tanque (Cisterna)
- 3 Lavamanos con grifería
- 2 Lavaplatos, en Acero inoxidable.

Residente de obra

Nelzar Gomaln
Rector.

Clima: Soleado todo el día.

Personal: 1 Maestro, 1 Ayudante, 2 Controladores de tráfico, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador de Retro., 1 técnico electricista

Actividades: Se realiza instalaciones eléctricas y demás en el campamento

Equipos y Maquinaria: Retroexcavadora orugada, Planta de Concreto, Bomba estacionaria, equipo oxicorte sin utilizar. (inactiva toda la maquinaria)

Res. Interventoría

15-Julio-2023 Sabado.

Clima: Presenta lluvia,

Personal: 1 Maestro, 1 Ayudante, 2 Controladores de tráfico, 1 topógrafo, 1 cadenero, 1 operador de Retro, 1 técnico electricista.

Actividades: Se continua con instalaciones eléctricas provisionales en salones implementados para campamento de obra

Equipos y Maquinaria: Retroexcavadora orugada, Planta de Concreto, Bomba estacionaria, equipo oxicorte sin utilizar. (inactiva todos los equipos).

Res Interventoría

ago 2023, 11:21

16-Julio-2023 Domingo
No se laboro.

Res. Interventoria

17-Julio-2023 Lunes
Clima: Soleado en las horas de la mañana y tarde lluvias.
Personal: 1 Maestro, 3 Ayudantes, 2 controladores de trafico, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador de Retro, 1 tecnico electricista
Actividades: Se realiza instalacion de cerramiento en la fachada frontal del predio del colegio en lona verde, se continua con instalacion electrica provisional para campamento. y se continua con replanteo topografico en zona de parqueadero. Se inicia con la initalacion para la implementacion del PMT.
Equipo y Maquinaria: 1 Retro excavadora, 1 Planta de Concreto, 1 Bomba estacionaria, toda la maquinaria inactiva.

Res. Interventoria

18-Julio-2023 Martes.
Clima: Nuvenos leves en la mañana y Sol, tarde.
Personal: 1 Maestro, 3 Ayudantes, 2 Controladores de trafico, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador de Retro, 1 tecnico electricista.
Equipo y Maquinaria: 1 Retro excavadora, 1 Planta de Concreto. 1 Bomba estacionaria, 1 Volqueta doble troque.
Actividades: Se inicia con el retiro del material de demolicion al sitio autorizado por bioagricola, Se termina de initalar el PMT. aprobado por la Secretaria de Movilidad de Villavicencio. Se inspeccionan pozos AN y se toman los niveles para la posible conexion al sistema de alcantarillado sanitario existente, ubicado sobre la margen derecha sentido V/cio-Pto Lopez.

Res. Interventoria

2 ago 2023, 11:21

RECOMENDACIONES PARTE:

-SE RECOMIENDA VOLVER CON LA ENTIDAD. ENCARGADA SOBRE LAS CONDICIONES Y UBICACION DE LA SEÑALIZACION DE PREVENCION DE LA OBRA SOBRE LA VIA. DE LA ENTIDAD PRINCIPAL.

- SE RECOMIENDA TENER RECOMENDACION DEL PERSONAL EN OBRA CAPACITADO.

Res. Interventoria

19/07/2023, miercoles

Clima: tiempo nublado y lluvias leves termitentes en la mañana y lluvias fuertes, en horas de la tarde se presenta clima nubado.
Personal: 1 maestro, 3 Ayudantes, 1 tecnico electrico, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador de retro, 3 conductores de doble troques.
Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Planta de concreto, Bomba estacionaria, 3 volqueta doble troque.
Actividades: continuar retiro de material de demolicion en sitio autorizado por (Agricola) Bioagricola,
Observaciones: ninguna.

Res. Interventoria

20/07/2023. Jueves

Dia festivo., (NO) se realizaron actividades.
Clima: tiempo soleado todo el dia de la jornada laboral
Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrico, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador retro, 6 conductores de doble troque, 2 controladores de trafico.
Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Planta de concreto, 1 Bomba estacionaria, 6 volquetas doble troque.
Observaciones y actividades: ingresan 3 volquetas mas y continuan con Retros

21/07/2023., Viernes

Clima: se presenta tiempo nublado y lluvias tormentas en horas de la mañana, y tarde.

Personal: 1 maestro, 3 ayudantes, 1 electrico, 1 topografo, 1 cadenero, 1 operador de retro, 3 conductores de doble troque, 2 controladoras de trafico.

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 planta de concreto, 1 bomba estacionaria, 6 volquetas doble troque.

actividades: Continua retiro de mortero de demoliciones, continua retiro de desmonte de desmonte por parte de la comunidad iniciado desde el dia miercoles 19/07/2023.

Observaciones: Contratista e interventoria realizan toma de mediciones a la cimentacion demolida de las edificaciones para donocer el volumen de concreto de cimentacion demolido.

Res. Inten.

22/07/2023., Sabado. Actividades Alfonso Lopez Pumarejo.

-Clima: Sabado

-Personal en obra 1 maestro, 3 Ayudantes, 2 Controladores Viales, 1 Tecnico Electricista, 1 Topografo, 1 Cadenero, 3 Operadores de equipo de Perforacion. Para estudios de Suelos.

- Inicio actividades de Perforacion de estudio de Suelos, el Punto Para el Sondeo del estudio de Suelo fue Georreferenciado

- no hubo movimiento de Volquetas

Res. Inten.

+ Residente de obra

22 ago 2023 11:27

23-07-2023, Domingo.
clima: se presenta clima soleado en todo el día laboral.
Personal: no se encuentra personal de obra ni operadores de maquinaria.
Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora inactiva, 1 planta de concreto y 1 bomba estacionaria.
Actividades: se da inicio a las perforaciones para los sondeos de estudio de suelos.
Observaciones: llega a obra el equipo y personal necesario para la realización del estudio de suelos por medio del ensayo de penetración estándar.

Ing. Res. Interv.

24/07/2023, Lunes.
Clima: se presento clima soleado en toda la jornada laboral.
Personal: 1 operador de retro, 1 maestro, 3 ayudantes, 3 laboratoristas de suelos, 2 topografos, 2 controladores de trafico, 6 conductores de volqueta doble troque.
Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 bomba estacionaria, 1 planta de concreto, equipo para estudio de suelos., 6 doble troquer.
Actividades: continua retiro de escombro proveniente de las demoliciones continua sondeos para estudio de suelos, y limpieza general de obra.
Observaciones: Ninguna.

Ing. Res. Interv.

25/07/2023, Martes.
Clima: se presenta nubosidad en horas de la mañana

Personal: 1 operador de retro, 1 maestro, 2 ayudantes, 3 laboratoristas de suelos, 2 topografos, 2 controladores de trafico, 6 conductores de doble troque.

22 AGO 2023, 11:21

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 planta de concreto, 1 Bomba estacionaria, equipo para estudio de suelos, 6 doble troque.
Actividades: continua retiro de escombros provenientes de demolicion, sondeos para estudio de suelos y aseo general de obra.
Observaciones: ninguna.

Ing.
Residente Interv.

26/07/2023. miercoles
Clima: se presenta tiempo soleado en toda la jornada laboral.
Personal: 1 operador de retroexcavadora, 1 maestro, 3 ayudantes, 6 conductores de doble troque, 2 controladora de trafico, 3 laboratoristas, 2 topografos.
Equipo y maquinaria: 1 retroexcavadora, 1 planta de concreto, 1 bomba estacionaria, equipo para estudio de suelos, 6 volquetas doble troque.
Actividades: Continua retiro de escombros, sondeos para estudio de suelos, poda de material vegetal zona oriental.
Observaciones: ninguna.

Ing.
Res. Interv.

27/07/2023. Jueves.
Clima: se presenta clima lluvioso en horas de la mañana y tiempo soleado en horas de la tarde.
Personal: 1 operador de retroexcavadora, 1 maestro, 3 ayudantes, 3 conductores de doble troque, 2 controladoras de trafico, 3 laboratoristas, 2 topografos.
Equipo y maquinaria: 1 Retro, 1 planta de concreto, 1 bomba estacionaria equipo para estudio de suelos, 3 volquetas doble troque.
Actividades: continua retiro de escombros, sondeos para estudio de suelos, instalaciones de pantos ecologicos y poda de material vegetal zona oriental del proy

Ing.
Res Interv.

2023, 11:21

28/07/2023. Viernes.

Clima: tiempo soleado en horas de la mañana y nubosidad en la tarde.

Personal: 1 operador retro, 1 maestro, 3 ayudantes, 3 volqueteros conductores controladores de tráfico, 3 laboratoristas, 2 topógrafos.

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Planta de concreto, 1 Bomba estacionaria, equipo para estudio de suelos, 3 volquetas doble troque.

Actividades: Continua retiro de material de demoliciones, continua sondeos para estudio de suelos, poda de material vegetal en zona oriental y cerramiento con lona verde zona oriental.

Observaciones:

Res. Interventoría

29/07/2023, sábado.

Clima: se presenta clima soleado durante la jornada laboral.

Personal: 1 operador retro, 1 maestro, 3 ayudantes, 3 volquetes conductores controladores de tráfico, 3 laboratoristas, 2 topógrafos.

Equipo y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 Planta de concreto; 1 Bomba estacionaria, equipo para estudio de suelos, 3 volquetas doble troque.

Actividades: finaliza actividad de retiro de escombros provenientes de las demoliciones realizadas, continua sondeos para estudio de suelos continua instalación de lona verde para cerramiento perimetral.


Observaciones: se retiran conductores de doble troque con el operador de la retro con su maquinaria y equipo.

Res. Interventoría

30/07/2023, domingo.

Día de descanso del personal no se realizan actividades.

Res. Interventoría

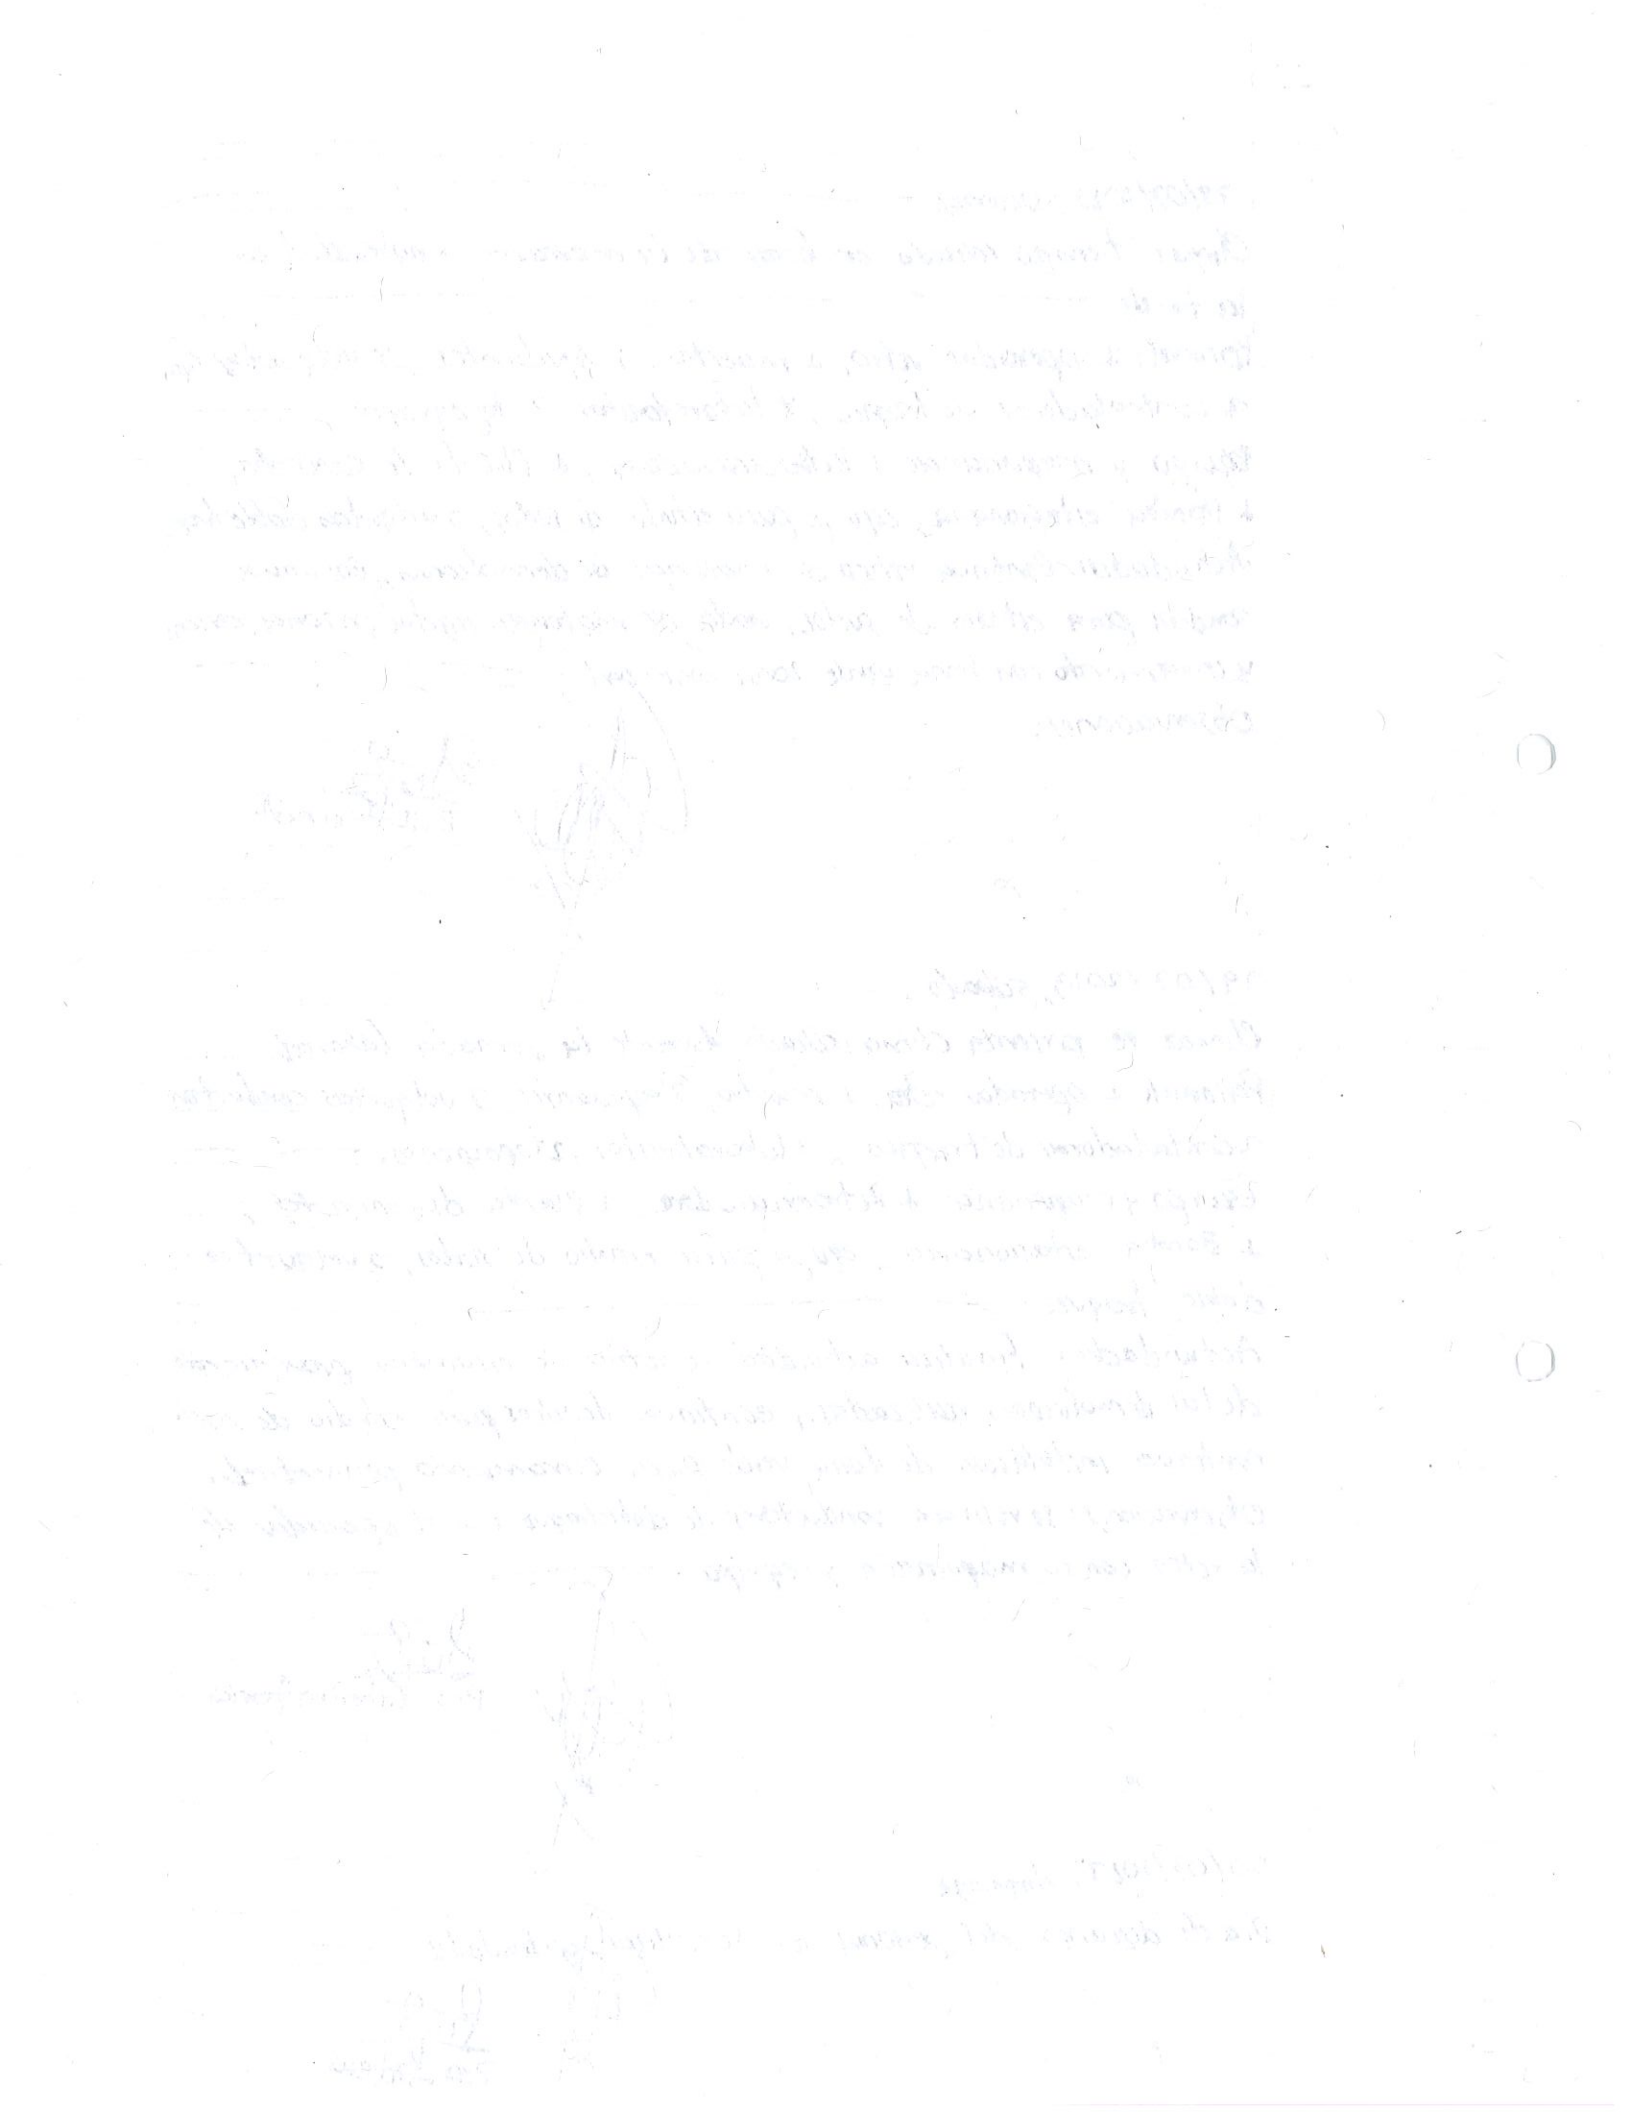

31/07/2023, Lunes.
Clima: Se presentan lluvias leves en horas de la mañana y tiempo soleado en horas de la tarde.
Personal: 1 operador retroexcavadora., 2 Ayudantes, 2 controladoras de tráfico, 3 laboratoristas y 2 topógrafos.
Maquinaria y equipo: 1 retroexcavadora HYUNDAI 130, 1 Planta de concreto, 1 Bomba estacionaria, equipo para estudio de suelos,
Actividades: inicia actividad de desmonte 20cm en zona oriental del proyecto con retro, sondeos para estudio de suelo, continua instalaciones de lona verde para cerramiento perimetral zona oriental.
Observaciones: se hizo ingreso nuevo e incorporacion de retroexcavadora HYUNDAI 130 con su operador.,

Res. Interv.

01/08/2023. Martes.
Clima: se presenta nubosidad en horas de la mañana

Personal, 1 operador retro, 2 Ayudantes, 2 controladoras de tráfico, 3 laboratoristas y 2 topógrafos.
Maquinaria y equipo: 1 Retroexcavadora HYUNDAI 130, 1 planta de concreto, 1 bomba estacionaria, equipo para estudio de suelo,
Continua instalacion lona verde cerramiento perimetral, continua desmonte 20cm zona oriental proyecto.
Observaciones: NIN

Res. Interv.

ANEXO 2. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

ANEXO 2. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SEGURIDAD SOCIAL. JULIO.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DAVID ANDRES LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7172871		RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 19 No. 41 39	VILLAVICENCIO-META	6632759	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	85717165	94543791 00	I	2023/08/17	2023/08/04	BANCOLOMBIA	0	$1,750,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7172871	RODRIGUEZ BERMUDEZ DAVID LEONARDO ANDRES	25-14	30	$4,800,000	$816,000	EPS005	30	$4,800,000	$600,000		0	$0	$0	14-11	30	$4,800,000	$334,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$4,800,000	$816,000			$4,800,000	$600,000			$0	$0			$4,800,000	$334,100		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$816,000	$0	$0	$816,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$816,000	$0	$0	$816,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$334,100	$0	$0	$334,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$334,100	$0	$0	$334,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$600,000	$0	$0	$600,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$600,000	$0	$0	$600,000
TOTAL				1	$1,750,100	$0	$0	$1,750,100

2023/08/04 02:54 PM

SEGURIDAD SOCIAL. JULIO.
RESIDENTE DE OBRA
ALVARO AUGUSTO CASTRO SILVA

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86081630	ALVARO AUGUSTO CASTRO SILVA	CALLE 5 N 34 C 03	6827282	ing.alvarocastro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	11/08/2023	70076255	$1.189.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. residente	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	86081630	CASTRO SILVA ALVARO AUGUSTO	3	0			N																	230301	4.162.000	665.000	0	0	0	0	EPS005	4.162.000	520.300		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	86081630	ALVARO AUGUSTO CASTRO SILVA	CALLE 5 N 34 C 03	6827282	ing.alvarocastro@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	11/08/2023	70076255	$1.189.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	520.300	0		0		0	2	1.200	0	521.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	666.000	0	0	0	0	2	1.500	0	667.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	520.300	521.500
Pensión	1	666.000	667.500
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.186.300	1.189.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL. JULIO.

RESIDENTE DE OBRA
LISBELIA ARIZA GARZON

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	35262355	LISBELIA ARIZA GARZON		CALLE 6 34 - 94	3107841397	lizbelia_ariza@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	11/08/2023	69687800	$712,500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano	Extranjero	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	35262355	ARIZA GARZON LISBELIA	3	0			N																	25-14	2,500,000	400,000	0	0	0	0	EPS005	2,500,000	312,500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	35262355	LISBELIA ARIZA GARZON	CALLE 6 34 - 94	3107841387	lizbelia_ariza@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	11/08/2023	89687800	$712.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	312.500	0		0		0	0	0	0	312.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	312.500	312.500
Pensión	1	400.000	400.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	712.500	712.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL. JULIO.

RESIDENTE DE OBRA

INGRID CAROLINA GAMBOA ALCANTARA

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	30083309	INGRID CAROLINA GAMBOA ALCANTARA	clle 10C No 44 42 la esperanza	6662458	ingridkarol26@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-07	I	11/08/2023	70063653	$1.197.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	520.300	0		0		0	8	4.700	0	525.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	666.000	0	0	0	0	8	6.000	0	672.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	520.300	525.000
Pensión	1	666.000	672.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	1.186.300	1.197.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÈFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	30083309	INGRID CAROLINA GAMBOA ALCANTARA		clle 10C No 44 42 la esperanza	6862458	ingridkarol28@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	11/08/2023	70063653	$1.197.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. retirado	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	30083309	GAMBOA ALCANTARA INGRID CAROLINA	3	0			N																	230301	4.162.000	668.000	0	0	0	0	EPS002	4.162.000	520.300		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SEGURIDAD SOCIAL. JULIO.
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
JUAN RESTREPO

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9726138		RESTREPO RESTREPO JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 43a 18sur-135 oficina 930	MEDELLIN-ANTIOQUIA	6405170	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	105630143	9453973603	I	2023/08/10	2023/08/16	BANCOLOMBIA		$409,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	9726138	RESTREPO JUAN																		230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0	No	$406,400
Total	Afiliados(1)																						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0		$406,400

2023/08/16 08:19 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9726138		RESTREPO RESTREPO JUAN CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 43a 18sur-135 oficina 930	MEDELLIN-ANTIOQUIA	6405170	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-07	105630143	9453973603	I	2023/08/10	2023/08/16	BANCOLOMBIA		$409,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$225,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$225,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$7,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,400	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$176,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$175,000	$0	$176,200
TOTAL				1	$406,400	$0	$409,300

2023/08/16 08:19 AM

SEGURIDAD SOCIAL. JULIO.

INGENIERA AMBIENTAL

ELIANA ANDREA MORENO OCHOA

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

CIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33366311
ÓN SOCIAL:			ELIANA ANDREA MORENO OCHOA
NO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
E:	CRR 46 # 187-80 INT 7 APTO 204	TELÉFONO:	9069892
	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
IENTACIÓN:	UNICO		
ONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7884689149		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/07/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		39917062

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14 COLPENSIONES	1	$ 528.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.300	$ 0	$ 528.300
									$ 528.300	$ 0	$ 528.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 412.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.700	$ 0	$ 0	$ 412.700
												$ 412.700	$ 0	$ 0	$ 412.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 17.300	$ 17.300	$ 0	$ 0	$ 17.300
								$ 17.300	$ 0	$ 0	$ 17.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 66.100	$ 0	$ 66.100
		$ 66.100	$ 0	$ 66.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE: NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
RENO HOA ANA OREA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 3.301.493			NO																

SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
25-14 COLPENSIONES	30	$ 3.301.493	$ 528.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 528.300

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 3.301.493	$ 412.700	$ 0	$ 412.700

SEGURIDAD SOCIAL: ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 3.301.493	33366311	$ 17.300

PARAFISCALES: DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 3.301.493	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 66.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.024.400

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33366311
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ELIANA ANDREA MORENO OCHOA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRR 46 # 187-60 INT 7 APTO	TELÉFONO:	9069892
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7881530505**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/06/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2127074391

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 528.300
SUBTOTAL:			1	**$ 528.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 412.700
SUBTOTAL:			1	**$ 412.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 66.100
SUBTOTAL:			1	**$ 66.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 17.300
SUBTOTAL:			1	**$ 17.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.024.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.024.400**

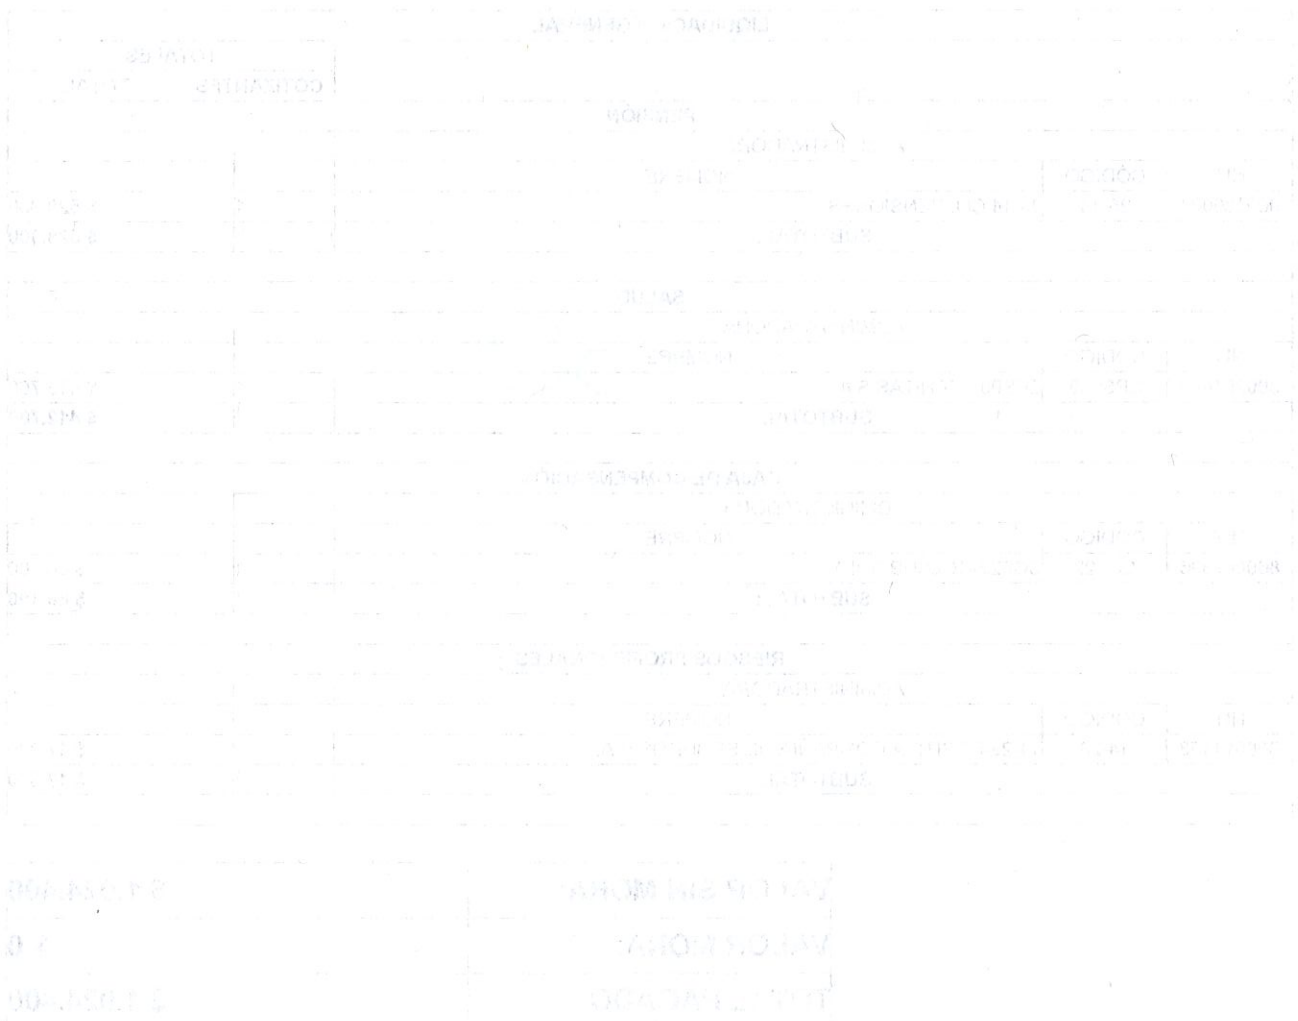

SEGURIDAD SOCIAL. JULIO.
TRABAJADOR SOCIAL
ROSALBA ALBA MORENO

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1049624370	ROSALBA ALBA MORENO	CL 19 41 39	6632753	oficinainterventorias@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	18/08/2023	70209656	$359.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	157.500	0		0		0	1	200	0	157.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	201.600	0	0	0	0	1	300	0	201.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	157.500	157.700
Pensión	1	201.600	201.900
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	359.100	359.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1049624370	ROSALBA ALBA MORENO		CL 19 41 39	6632753	oficinainterventorias@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			META	VILLAVICENCIO	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-07	I	18/08/2023	70209656	$359.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1049624370	ALBA MORENO ROSALBA	3	0			N	X															230301	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS005	1.260.000	157.500		0		0		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ANEXO 3. ACTAS DE COMITÉ.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página ___ de ___

CONTRATO Nº1279 DE 2023 **FECHA ACTA** DD 06/ MM 07/ AA 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION C&G MH

INTERVENTORIA: CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023

OBJETO: RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

Objetivo:
Revisión empalme sobre el Plan de Gestión Social Contractual y Actas de Vecindad

Desarrollo de la Reunión:

Se realizó reunión desde el área social con las profesionales de interventoría y contratista, donde se realizo el ajuste pertinente del plan de gestión social contractual,

La profesional social de interventoría presenta las observaciones en las cuales se concerta por medio de las dos partes que el plan de gestión social contractual obtenga cinco componentes los cuales serán de la siguiente manera:

1. **Programa de atención al Usuario:**

La profesional social del contratista creo medios de atención electrónicos como el correo email, con la finalidad de divulgar por medio de carteleras físicas la dirección de correo electrónico donde la comunidad pueda remitir PQRS o felicitaciones del proyecto, todo actuar será atreves del mismo.

De igual manera, cuando se hacen visitas a campo se recepcionan oficios de manera presencial, de igual forma se atenderá inquietudes y se asesorará a las personas en cualquier temática a tratar.

2. **Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto:**

En el plan de gestión social se dejará establecidas un taller mensual sobre temáticas de interés, al igual que la disminuir el grado de desinformación y generación falsas expectativas a la comunidad por información suministrada por el personal vinculado a las obras.

3. **Programa de Vinculación de Mano de Obra**

Se revisó el pliego en cuanto a los porcentajes de vinculación obligatorios por parte del contratista donde se analizaron que comprende el 30%, el 10% del mipyme y el 5% de la población vulnerable del área de influencia del proyecto.

4. **Programa de Información y Participación Comunitaria**

La profesional social del contratista convocara una reunión con los diferentes presidentes las JAC del área de influencia del proyecto para la conformación del comité de participación ciudadana.

5. Plan de Compensaciones Socioeconómicas

Se concertó entre el contratista y la interventoría que si se llegase a presentar cualquier afectación en los predios circunvecinos, el contratista deberá asumir los costos totales del mismo.

Por otro lado, la profesional del contratista indaga sobre a quien recibirá el material restante del desmonte como: (tejas, puertas, ventanas, inodoros, entre otros), para lo cual la Ingenier Lizbelia Ariza indica que el responsable será la secretaria de educación municipal de Villavicencio, quien por medio de un oficio remitido por el contratista dispondrá del mismo.

N°	Compromisos	Fecha
1	La profesional social del contratista, realizar articulación con las diferentes agencias de empleo para concretar reunión para oferta laboral y contratación del personal	Para el mes de agosto
2	Toda acción que se realice desde el área social se debe de copiarse al correo: interlab.ingenieria@gmail.com	N/A
3	El área técnica realizara la subsanación de las observaciones por parte de la interventoría	07/07/2023
4	Se realizara visita desde el área social recolección de firmas por parte del propietario de las actas de vecindad y toma de registro fílmico	10/07/2023
5	La Reunión para la conformación del comité ciudadano	13/07/2023

Se firma,

Firma _____
Nombre María del Pilar Sepúlveda
Cargo Residente social

Firma _____
Nombre Rabiba Alba Moreno
Cargo Profesional Social

Firma _____
Nombre Lizbelia Ariza
Cargo Residente Interventoría

Firma _____
Nombre
Cargo

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página ___ de ___

DD MM AA

CONTRATO Nº __1279__ DE _2023__ FECHA ACTA ___10_/_07_/_2023_

CONTRATISTA: _____CONSORCIO EDUCACION C&G MH_____

CONTRATISTA: _____CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023__-

OBJETO: __RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META_____

OBSERVACIONES:

	Se reunieron en las instalaciones del Colegio Alfonso López Pumarejo el ingeniero Ing. Richard Gutiérrez secretaria de educación, Mitchell Richard Ninco apoyo a la Supervisión, el Ingeniero José Marx director de obra, Ing. Joel Pineda apoyo técnico de obra, María del Pilar Profesional social de obra y Rosalba Alba profesional social de interventoría y por parte de interventoría el Ing. Antonio Rey apoyo técnico de Interventoría y la Ing. Lizbelia Ariza residente de interventoría.
	El contrato de obra presenta al día de hoy una programación de 1.13% y ejecutado de 1.32% que corresponde a actividades ejecutadas de desmonte y demolición de edificaciones existentes, incluyendo; placas de senderos y canchas, adicionalmente las actividades de localización y replanteo de todas las áreas a construir.
	El contratista ya tiene le inventario de todo lo que ha desmontado de las edificaciones existentes, pregunta a supervisión a quien debe entregar estos elementos como tejas, ventanas, cerchas, puertas. La interventoría manifiesta que el inventario se debe entregar con un comunicado a la secretaria de educación, para que este disponga de su utilización.
	El contratista manifiesta que va solicitar la revisión y ajuste de los precios unitarios, debido a que se ha presentado variación de precios del mercado que llevan a un desequilibrio económico al Contrato, la Supervisión informa que la Interventoría debe revisar puntualmente los ítems que el Contratista solicite y que se soporte con las debidas cotizaciones del mercado.
	El Contratista informa que presentó el No Previsto de demolición de cimentaciones debido a que no está contemplado. La interventoría informa que está en revisión. La Supervisión solicita que se revisen las especificaciones y si no está incluido se analice el precio.
	La comunidad del sector está solicitando que se les tenga en cuenta para los subcontratos o vinculación del personal, maquinaria, volquetas y compra de

	materiales en las ferreterías del mismo sector, se programará una reunión el día jueves 13 de julio de 2023, con las presidentas de la junta, para realizar la respectiva convocatoria y que presenten las cotizaciones de la maquinara y volquetas por parte de la comunidad. El contratista manifiesta que el personal que se ha ingresado a la fecha mano de obra no calificada es de la zona de influencia del proyecto. La interventoría solicita que en esta reunión se realice la conformación del comité de veeduría con la finalidad de pactar reuniones mensuales para aclarar inquietudes y tratar temas correspondientes al seguimiento del contrato. El ingeniero Richard de la secretaria de educación propone se realice actividad de convocatoria con la comunidad por parte de las sociales tanto de obra e interventoría, para la contratación de maquinaria y volquetas por parte de la comunidad de la zona del proyecto.
	Compromisos anteriores
	Instalación de la valla estaba para el día 5 de julio, el contratista manifiesta que el día 11 de julio se instalará. Se realizó la solicitud de la provisional del agua ante el corregimiento de la Junta de acción comunal de Altos de Pompeya- El contratista radico la solicitud de documentación necesaria para el trámite de la provisional eléctrica ante la EMSA. Actas de vecindad esta para recoger firmas por parte de la comunidad y se estará entregando entre hoy y mañana a la entidad una vez se tomen todas las firmas. Las certificaciones de la disposición final de los residuos será entregar en los informes mensuales.
	COMPROMISOS
	Los informes de revisión de la parte hidrosanitaria se entregará el día 12 de julio por parte del contratista
	Los informes de revisión de la parte eléctrica se entregara el día 17 de julio por parte del contratista
	Los informes de revisión de la parte arquictonico se entregara el dio 17 de julio por parte del contratista
	La interventoría entregara el informe de la revisión de los diseños eléctricos se hará entrega el dia 12 de julio de 2023

Firma _____
Nombre Lizbeth Arteaga B
Cargo Residente Interventoria

Firma _____
Nombre JOSE MARK REYES
Cargo DIRECTOR DE OBRA.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página ___ de ___

CONTRATO Nº __1279__ DE _2023__ FECHA ACTA ___10_/_07_/_2023_

CONTRATISTA: _____CONSORCIO EDUCACION C&G MH_____

CONTRATISTA: _____CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023__-

OBJETO: __RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META.

Firma
Nombre Luis Antonio Rey
Cargo Apoyo Tecnico Interventor.

Firma
Nombre Michel Richard Pinco
Cargo Apoyo Profesional Secretaria de Infraestructura

Firma
Nombre Rosalba Alba Marena
Cargo Profesional Social Interventoria.

Firma
Nombre Astrid Ruiz G.
Cargo Ing Ambiental.

Firma
Nombre maria del pilar sepulveda.
Cargo Residente Social obra.

Firma
Nombre
Cargo Residente de Obra.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página ___ de ___

DD MM AA

CONTRATO Nº __1279__ DE _2023__ FECHA ACTA ___18_/_07_/_2023_

CONTRATISTA:_____CONSORCIO EDUCACION C&G MH_____

CONTRATISTA:_____CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023__-

OBJETO: __RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META_____

OBSERVACIONES: REUNION AVANCE DE REVISION DISEÑO ESTRUCTURAL

	Se realiza comité de obra con todas las áreas encargadas: SST, AMBIENTAL, SOCIAL Y TECNICA.
	Nos reunimos en el campamento de la obra el Ing. José Marx director de obra, el ing. Joel Pineda apoyo técnico de obra, la Ing. Astrid Ruiz, ambiental, María del Pilar Sepúlveda profesional social obra, Diana Vega profesional SST de obra, por parte de la interventoría la ing. Lizbelia Ariza Garzón residente de Interventoría, Ing Miguel Pinilla apoyo en el área ambiental, Jovani Ruiz apoyo en el área SST, Rosalba Alba Moreno profesional social. Para tratar los siguientes temas:
	ÁREA AMBIENTAL
	Se realiza inspección en obra donde se observa un ordenado acopio de los diferentes materiales de desmonte en un área la cual no interviene en los diferentes procesos y/o actividades de la obra.
	Se evidencia un correcto acopio de los diferentes materiales de escombro, los cuales estaban listo para su recolección y transporte a un área de disposición final.
	Por último, se verifica la llegada, en las instalaciones de la obra, de los diferentes materiales y equipos de primeros auxilios, kit de derrames y señales de prevención y guía para las diferentes actividades; igualmente, se hizo revisión de cada uno de estos elementos y también de las canecas o puntos de disposición final.
	ÁREA SST: durante el recorrido realizado por los diferentes puntos de intervención
	se realiza las siguientes inspecciones:
	- Se verifica documentos del personal vinculado en la obra como: afiliación a sistema general de seguridad social, exámenes Ocupacionales, Inducciones y entrega de elementos de protección personal.
	- Se comprueba el cumplimiento de plan de emergencia en obra, donde el contratista cuenta con los elementos de primeros auxilios como camilla, Cuello ortopédico, botiquín y extintores.

	- Se realiza inspección de maquinaria y vehículos de la obra
	- Se inspecciona y verifica cumplimiento de la implementación del plan de Manejo de tráfico utilizado en la obra.
	Observación y recomendación por parte de la interventoría
	- Actualizar la documentación pertinente del personal vinculado al contrato de obra
	- Realizar pre -operacionales de la maquinaria en obra
	- La interventoría recomienda al contratista en realizar la consulta a la Entidad encargada sobre la ubicación de la señalización del PMT sobre la vía principal.
	ÁREA SOCIAL: Se solicita realizar entrega de acta de comité con registros fotográficos y firmas de participantes, por otro lado, se requiere a la menor brevedad realizar el plan de gestión social con la finalidad de presentar los informes acordes al mismo. Igualmente, se solicita a los residentes SST y social del contratista que todo personal de mano de obra no calificada (MDNC), que pertenezca al área de influencia del proyecto deben tener como requisito el certificado de residencia expedido por las juntas de acción comunal (JAC), como requisitos de las hojas de vida para vinculación laboral.
	ÁREA TÉCNICA: Se realiza inspección de los pozos sanitarios existentes en la vía nacional ubicados en la margen derecha sentida Villavicencio – Puerto López, con el fin de comprobar diámetros de tubería y profundidad de la misma. Se evidencia la salida de la primera volqueta con el retiro de escombros al sitio dispuesto por Bioagricola.
	COMPROMISOS:
	ÁREA SOCIAL:
	Entrega de acta según lo solicitado por la interventoría
	Entrega de actas de vecindad para el 19 de julio de 2023
	Realización de Campaña Vial, con el fin de sensibilizar a la comunidad para el buen uso de las señalizaciones para el 21 de julio de 2023
	AREA AMBIENTAL
	Después de realizar el respectivo recorrido en la obra se concretaron los siguientes
	Compromisos:
	1- Coordinar con la comunidad las jornadas de entrega de material de desmonte a partir del 19 de julio de 2023
	2- En la semana del 24 al 29 de julio se realizarán las actividades pertinentes para instalar los puntos de acopio de residuos aprovechables y NO aprovechables
	3- En la semana del 24 al 29 de julio se continuarán con las diferentes labores de Recolección de escombros acumulados en las instalaciones de la obra.

	4- En la semana del 24 al 29 de julio se continuarán con las labores para ubicar las diferentes señales de prevención y seguridad; así mismo, se empezarán las actividades para establecer e implementar los diferentes senderos peatonales

Firma _____
Nombre JOEL PINEDA
Cargo APOYO TÉCNICO OBRA

Firma _____
ING Nombre ING LIZBELIA ARIZA GARZON
Cargo RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma _____
Nombre ING JOSE MARX
Cargo DIRECTOR DE OBRA

Firma _____
ING Nombre ROSALBA ALBA MORENO
Cargo Profesional Social de Interventoría.

Firma _____
Nombre DIANA VEGA
Cargo Profesional SST

Firma _____
Nombre JOVANI RUIZ
Cargo APOYO PROFESIONAL SST

Firma _____
Nombre ASTRID RUIZ
Cargo ING AMBIENTAL OBRA

Firma _____
Nombre MIGUEL PINILLA
Cargo ING AMBIENTAL APOYO

Firma _____
Nombre MARIA DEL PILAR
Cargo Residente Social.

Firma _____
Nombre Cargo

ANEXO 4. REGISTRO FOTOGRAFICO.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1765 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATICA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	SECRETARIA LIDER		
TIPO		EDUCACION		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023		

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y PRELIMINARES

1.1. DEMOLICIONES GENERALES.



FOTOGRAFIA 1. FECHA DE TOMA: 04/07/2023

ITEM: 1.1.1. DEMOLICION DE EDIFICACIONES INCLUYE: (MUROS, ESTRUC, CONFINAM, CUBIERTA, DESMONTES APARATOS, CARP, Y RETIROS SOBRANTES).




FOTOGRAFIA 2. FECHA DE TOMA: 04/07/2023

ITEM: 1.1.1. DEMOLICION DE EDIFICACIONES INCLUYE: (MUROS, ESTRUC, CONFINAM, CUBIERTA, DESMONTES APARATOS, CARP, Y RETIROS SOBRANTES).



FOTOGRAFIA 3. FECHA DE TOMA: 04/07/2023

ITEM: 1.1.2 DEMOLICIÓN PLACAS PISO E=0.10M INC CARGUE MANUAL, RETIRO 5KM

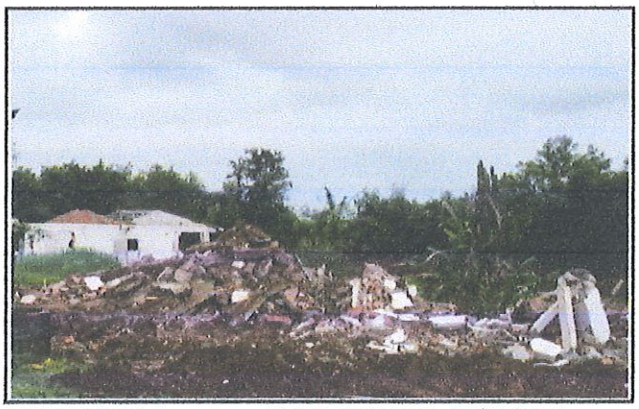

FOTOGRAFIA 4. FECHA DE TOMA: 07/07/2023

ITEM: 1.1.2 DEMOLICIÓN PLACAS PISO E=0.10M INC CARGUE MANUAL, RETIRO 5KM









Municipio de Villavicencio

Proceso Gestion de la Contratacion

REGISTRO FOTOGRAFICO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1765 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATICA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	SECRETARIA LIDER		
TIPO		EDUCACION		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023		

CAPITULO 2: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

2.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO.



FOTOGRAFIA 5. FECHA DE TOMA: 10/07/2023

ITEM: 2.1.1 LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICA (SARDINELES Y REDES).



FOTOGRAFIA 6. FECHA DE TOMA: 25/07/2023

ITEM: 2.1.2. LOCALIZACIÓN Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA PARA VÍAS (EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE BANCA – ANCHO DE CALZADA 6-8M



FOTOGRAFIA 7. FECHA DE TOMA: 25/07/2023

ITEM: 2.1.3 TRAZADO Y REPLANTEO ARQUITECTÓNICO







CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1765 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		31	7	2023
		DIA	MES	AÑO
TIPO CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATICA, SOCIAL, CONTABLE LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA RECONSTRUCCION TOTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.	SECRETARIA LIDER		
TIPO		EDUCACION		
CONTRATISTA		INTERVENTOR		
CONSORCIO EDUCACION C&G-MH		CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023		

CAPITULO 2: ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO

2.2. DESCAPOTE MAQ/MANUAL



FOTOGRAFIA 8. FECHA DE TOMA: 31/07/2023

ITEM: 2.2.1. DESCAPOTE MECÁNICO. E= <0.2M, INC RETIRO. 5KMS



FOTOGRAFIA 9. FECHA DE TOMA: 31/07/2023


ITEM: 2.2.1. DESCAPOTE MECÁNICO. E= <0.2M, INC RETIRO. 5KMS

CAPITULO 22: SOBREACARREO – TRANSPORTE MATERIAL



FOTOGRAFIA 10. FECHA DE TOMA: 21/07/2023

ITEM: 22.2 SOBREACARREO MATERIAL, 20% COMPACTA

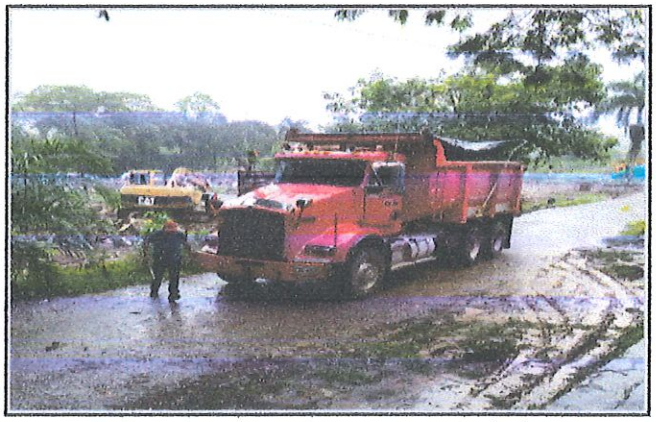

FOTOGRAFIA 11. FECHA DE TOMA: 21/07/2023

ITEM: 22.2 SOBREACARREO MATERIAL, 20% COMPACTA







ANEXO 5. CALIBRACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS.

Calle 19 # 41-39 Barrio Villa María ☎ Móvil: 310 359 77 28
interlab.ingenieria@gmail.com

VERTEX INGENIERIA PH S.A.S

Laboratorio topográfico.
NIT 901224871-9

CERTIFICADO DE CALIBRACION No 0897

EL NIVEL AUTOMATICO TOPCON AT-B4 No. MZ6518

Fue verificado, ajustado y calibrado en nuestro taller de mantenimiento encontrándose actualmente en perfecto estado de funcionamiento, dentro de los parámetros estipulados por el fabricante.

Exactitud por kilómetrodoble de nivelación..... 1.5mm.

Aumentos del anteojo .....32 X

Nivel de compensación automática

Imagen directa

Constante de multiplicación..... 100

Este instrumento fue ajustado y evaluado utilizando colimador óptico y puntos cuya diferencia de altura fue

Previamente verificada: h = 0.426 m

Lectura atrás adelante:	1.557 m	*Lectura adelante atrás:*	1.654 m
	1.131 m		1.228 m
	0.426 m		0.426 m

Patrón utilizado: Colimador óptico marca SANWEI F550 con micrómetro Óptico No de serie 18675120022 y exactitud de 0.7mm.

Esta certificación se expide a solicitud de:

CLIENTE	***ALEXANDER GIRALDO DELGADO***	
CC.NIT	***1´113.624.886***	
FECHA DE CALIBRACION	***07-04-2023***	
FECHA PROXIMA CALIBRACION	***07-10-2023***	
JEFE DE LABORATORIO	***TECNICO LABORATORIO***	***FECHA DE EMISION***
ING NICOLAS HERNANDEZ MP 25202-372822	***ANDRES HERNANDEZ***	VERTEX INGENIERÍA 07-04-2023

ONAC ASOCIADO

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CASA DEL
TOPÓGRAFO

Casa Del Topógrafo

Venta, Alquiler, Reparación

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No.2144

Bogotá D.C **ABRIL 27 de 2023**

Señor(es)
GUERRERO VARGAS JUAN
NIT. 1121858679
Ciudad: VILLAVICENCIO

Apreciados señores

La Estación Total de marca HI TARGET modelo ZTS-360R con serie No. Z136940, fue revisada en nuestro laboratorio, cumple con los parámetros del fabricante HI TARGET y se encuentra en el rango de precisión, referente a las características técnicas para este modelo de instrumentos y está en perfectas condiciones ópticas y mecánicas.

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COLIMADOR SANZHUN W420-3 No 2376512076435
DE ALTA PRECISIÓN 0.001 mm
PROCEDIMIENTO BAJO NORMA DIN 18723

PARÁMETROS TÉCNICOS

Resolución Angular	1" 5" 10"
Precisión angular directa	2"
Aumento	30x
Medición máxima con un prisma	7500 m
Medición máxima sin prisma	600m
Medición máxima con tarjeta reflectiva	800 m
Campo de visión	1°30'
Sistema compensador	Dos ejes
Sensibilidad del compensador	±3'
Precisión del compensador	1"
Temperatura de trabajo	-20°C ~ +50°C
Distancia de enfoque mínima	1.2 m
Torque movimiento fino	Verificado
Aumentos y campo visual a 100 m	Verificado

PERIODO PROMEDIO ÓPTIMO DE CALIBRACIÓN

Fecha de verificación de calibración **OCTUBRE 28 de 2023**

IMPRESO POR Cardenas Print ... NIT: 80184359B-5 ... 348 8850

CASA DEL TOPÓGRAFO

Casa Del Topógrafo

Venta, Alquiler, Reparación

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

No.2144

Se realizan los procesos de pruebas y ajuste de acuerdo a los parámetros técnicos de niveles automáticos de topografía según su correspondiente modalidad, se da el presente certificado de verificación calibración por una duración de seis (6) meses, tiempo normal óptimo, en donde al final del periodo se recomienda realizar un nuevo control.

El procedimiento de calibración realizado al equipo tendrá una garantía máxima de un (1) mes, previa evaluación del error obtenido, siempre y cuando este no se deba a desperfectos físicos del equipo no reportados por el cliente; en cuyo caso, se efectuará el diagnóstico y cotización correspondiente de la reparación a la que se dé lugar; la reparación debe ser autorizada por el cliente por escrito.

Para cualquier aclaración, favor comunicarse con nuestro laboratorio, unidad de Ingeniería, al (1) 457 21 28 o visítenos en la Carrera 29 No. 39 B 52 en Bogotá D.C.

Cordialmente,

CASA DEL TOPÓGRAFO NIT 900043598-4 SERVICIO TECNICO

Departamento de ingeniería
CASA DEL TOPÓGRAFO SAS

Nota Aclaratoria:

Los instrumentos revisados se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, las cuales pueden ser verificadas por el usuario en nuestro laboratorio antes de retirar los instrumentos, si así lo amerita, por lo anterior CASA DEL TOPÓGRAFO SAS, no asume ninguna responsabilidad por mal manejo, transporte o no verificación del instrumento por parte del usuario.

ELABORÓ: Deivyth Alejandro Burgos Páez (Técnico)

IMPRESO POR PUBLI GRAFICOS NIT: 900043598-5 / PBX: 249 8850
