

PARQUES BOGOTA TUNJUELITO.V2

Id	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
1	**PROYECTO DE PARQUES LOCALIDAD TUNJUELITO**	**108 días?**	**$ 630.446.858,00**	**jue 14/12/23**	**lun 22/04/24**
2	**ETAPA PRELIMINAR Y DE DIAGNOSTRICO**	**60 días**	**$ 0,00**	**jue 14/12/23**	**mar 27/02/24**
3	Visitas de diagnostico visual, para definir presupuesto	38 días	$ 0,00	jue 14/12/23	jue 25/01/24
4	Actas de vecindad Parque Claret	0 días	$ 0,00	vie 26/01/24	vie 26/01/24
5	Aprobacion tramites ENEL	0 días	$ 0,00	mar 27/02/24	mar 27/02/24
6	Actas de vecindad Parque San Benito	0 días	$ 0,00	vie 2/02/24	vie 2/02/24
7	Aprobación PMT	0 días	$ 0,00	mar 27/02/24	mar 27/02/24
8	**ETAPA DE EJECUCION MANTENIMIENTO, MEJORMAIENTO Y/O DOTACION**	**62 días?**	**$ 630.446.858,00**	**sáb 3/02/24**	**lun 22/04/24**
9	**PARQUE EL CLARET**	**56 días?**	**$ 239.803.154,00**	**sáb 3/02/24**	**lun 15/04/24**
10	**PRELIMINARES**	**13 días**	**$ 4.476.750,00**	**sáb 3/02/24**	**mar 27/02/24**
11	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	$ 916.527,00	sáb 3/02/24	vie 9/02/24
12	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATONALES (VISUAL). INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y GEORREFERENCIACIÓN DE ELEMENTOS	6 días	$ 163.569,00	sáb 3/02/24	vie 9/02/24
13	Diagnóstico estructura de pavimento existente para cancha deportiva 500m2 con	12 días	$ 3.396.654,00	sáb 3/02/24	vie 16/02/24
14	Aprobación de diseño de pavimentos	0 días	$ 0,00	mar 27/02/24	mar 27/02/24
15	**CERRAMIENTO PRELIMINAR**	**3 días**	**$ 793.614,00**	**sáb 3/02/24**	**mié 7/02/24**
16	CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC) **	3 días	$ 793.614,00	sáb 3/02/24	mié 7/02/24
17	**EXCAVACIONES, RETIRO Y DISPOSICION FINAL**	**18 días**	**$ 5.685.897,00**	**mié 7/02/24**	**mié 6/03/24**
18	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FIN	3 días	$ 4.699.167,00	lun 4/03/24	mié 6/03/24
19	EXCAVACION MANUAL EN MATE	5 días	$ 986.730,00	mié 7/02/24	mar 13/02/24
20	**GEOTEXTIL**	**2 días**	**$ 3.349.201,00**	**mié 6/03/24**	**vie 8/03/24**
21	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPAR	2 días	$ 3.349.201,00	mié 6/03/24	vie 8/03/24
22	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES**	**5 días**	**$ 14.967.552,00**	**lun 4/03/24**	**vie 8/03/24**
23	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTIC	3 días	$ 1.425.540,00	lun 4/03/24	mié 6/03/24
24	Demolicion Manual graderia Lad	2 días	$ 13.487.006,00	lun 4/03/24	mar 5/03/24
25	Caneca M-120 (desmonte)	2 días	$ 55.006,00	mié 6/03/24	vie 8/03/24
26	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**7 días**	**$ 24.858.281,00**	**mié 13/03/24**	**jue 21/03/24**
27	LOSA MACIZA DE GRADERIAS EN	7 días	$ 24.858.281,00	mié 13/03/24	jue 21/03/24
28	**PISOS Y ACABADOS**	**37 días**	**$ 185.027.331,00**	**lun 4/03/24**	**lun 15/04/24**
29	Recubrimiento sintetico Acrilico	5 días	$ 48.848.470,00	lun 25/03/24	vie 29/03/24
30	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENT	8 días	$ 37.976.592,00	jue 7/03/24	sáb 16/03/24
31	RIEGO DE LIGA CON EMULSION	1 día	$ 1.560.803,00	mié 6/03/24	jue 7/03/24
32	Demarcacion pintura trafico mu	5 días	$ 7.591.533,00	mar 2/04/24	lun 8/04/24
33	Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **. El juego incluye dos estructuras. (Incluye equipo de soldadura, anticorrosivo, pintura esmalte)	7 días	$ 780.672,00	sáb 16/03/24	lun 25/03/24
34	Adecuación estr. met. cerr. contra impac h=2.5m**	16 días	$ 22.408.689,00	lun 25/03/24	jue 11/04/24
35	Arreglo y templada Malla Eslab.h=2.0m(Plat+Pint)	16 días	$ 3.527.770,00	lun 25/03/24	jue 11/04/24
36	ASEO GENERAL	3 días	$ 9.951.390,00	jue 11/04/24	lun 15/04/24
37	Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete (2	5 días	$ 13.626.411,00	mié 20/03/24	mar 26/03/24
38	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	3 días	$ 5.143.087,00	sáb 16/03/24	mié 20/03/24
39	Muro e=0.12 ladrillo prens SantFe 2CV (ml)<0.70Alt	7 días	$ 16.655.135,00	mar 5/03/24	mié 13/03/24
40	Pañete impermeab. muro 1:3 e=0.03 a< 0.60 m**	7 días	$ 4.377.498,00	jue 21/03/24	jue 28/03/24
41	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	3 días	$ 3.143.206,00	lun 4/03/24	jue 7/03/24
42	Reparcheo h=0.30 m	7 días	$ 9.436.075,00	lun 4/03/24	mar 12/03/24
43	**MOBILIARIO**	**1 día?**	**$ 644.528,00**	**vie 29/03/24**	**sáb 30/03/24**
44	CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 3000 PSI, PREMEZCLADO	1 día?	$ 644.528,00	vie 29/03/24	sáb 30/03/24
45	**PARQUE SAN BENITO**	**46 días**	**$ 195.684.206,00**	**mié 14/02/24**	**sáb 13/04/24**
46	**PRELIMINARES**	**4 días**	**$ 4.739.869,00**	**mié 14/02/24**	**mar 27/02/24**
47	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	3 días	$ 1.139.799,00	mié 14/02/24	vie 16/02/24
48	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATONALES (VISUAL). INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y	3 días	$ 203.416,00	mié 14/02/24	vie 16/02/24
49	Diagnóstico estructura de pavimento existente para cancha deportiva 500m2 con	3 días	$ 3.396.654,00	mié 14/02/24	vie 16/02/24

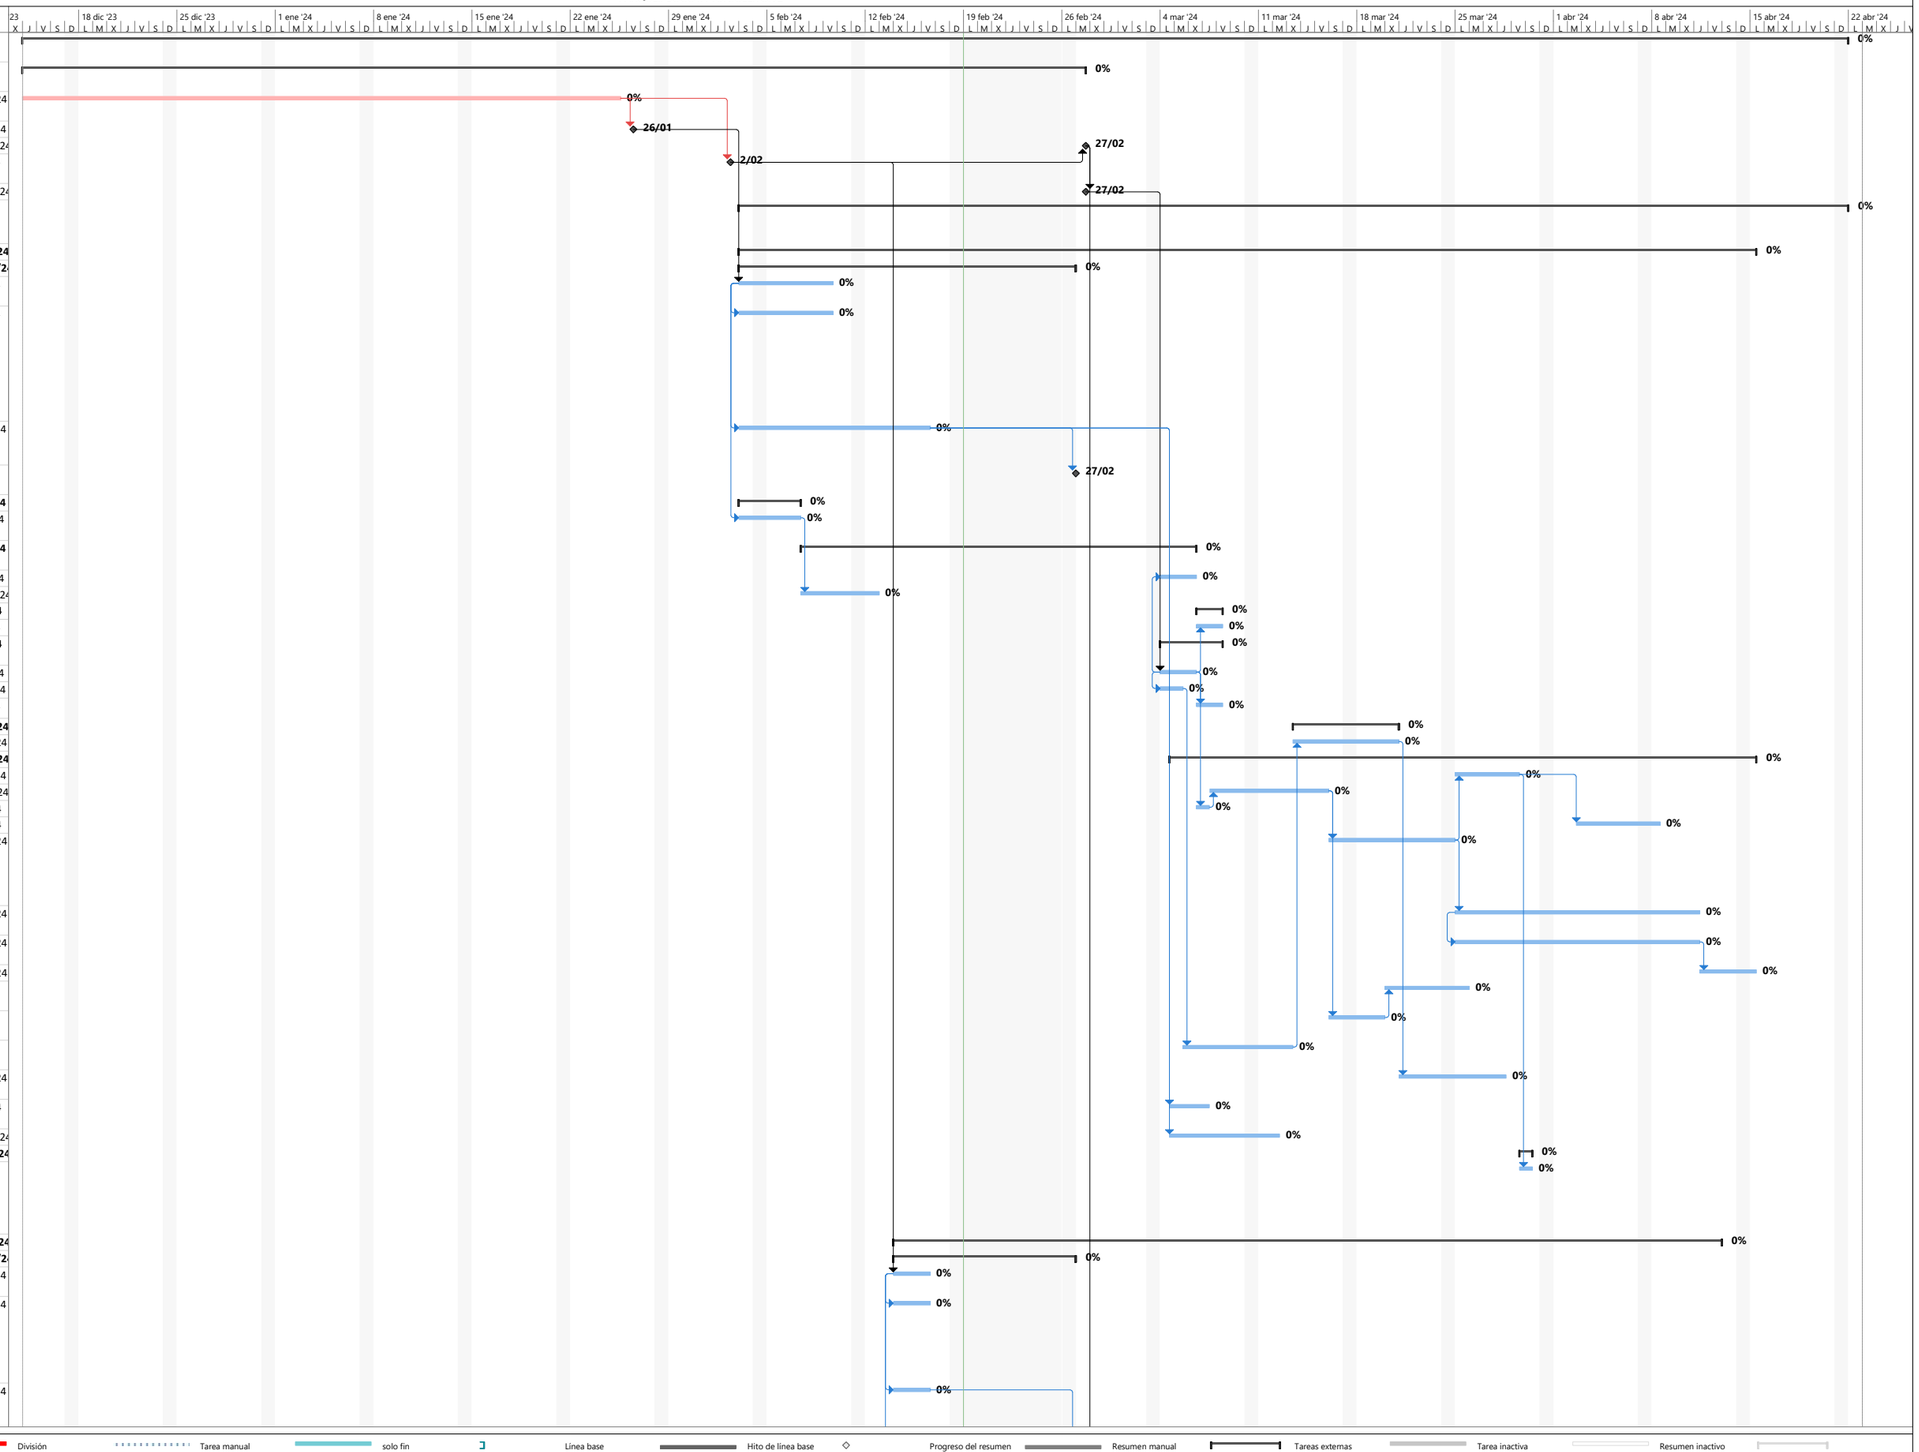


Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

Id	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
50	Aprobación de diseño de pavimentos	0 días	$ 0,00	mar 27/02/24	mar 27/02/24
51	**CERRAMIENTO PRELIMINAR**	**3 días**	**$ 1.047.135,00**	**mié 14/02/24**	**vie 16/02/24**
52	CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC) **	3 días	$ 1.047.135,00	mié 14/02/24	vie 16/02/24
53	**EXCAVACIONES, RETIRO Y DISPOSICION FINAL**	**9 días**	**$ 3.206.383,00**	**jue 29/02/24**	**lun 11/03/24**
54	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD	5 días	$ 2.384.682,00	jue 29/02/24	mié 6/03/24
55	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE	4 días	$ 821.701,00	mié 6/03/24	lun 11/03/24
56	**GEOTEXTIL**	**2 días**	**$ 4.085.340,00**	**mié 6/03/24**	**vie 8/03/24**
57	GEOTEXTIL NT 4000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES (INCLUYE	2 días	$ 4.085.340,00	mié 6/03/24	vie 8/03/24
58	**DEMOLICIONES Y/O DESMONTES**	**6 días**	**$ 2.829.358,00**	**jue 29/02/24**	**jue 7/03/24**
59	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLUYE AGUA, PUNTAS. NO INCLUYE TRANSPORTE DE MAQUINARIA, TRANSPORTE	5 días	$ 2.145.761,00	jue 29/02/24	mié 6/03/24
60	Demol. manual concreto (cargue+retiro)	1 día	$ 683.597,00	mié 6/03/24	jue 7/03/24
61	Desmonte CerramMalla eslabon. h=2 a 5 m+cargue y r	5 días	$ 2.228.857,00	mié 6/03/24	mar 12/03/24
62	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**7 días**	**$ 3.532.207,00**	**jue 7/03/24**	**vie 15/03/24**
63	LOSA MACIZA DE GRADERIAS EN CONCRETO VISTO COLOR GRIS CLARO CON ARENAS CLARAS DE ROZO F'C 28 MPA E: 0.10 M. INCLUYE VIGAS	7 días	$ 3.532.207,00	jue 7/03/24	vie 15/03/24
64	**BORDILLOS, LOSETAS Y CUNETAS**	**1 día**	**$ 526.786,00**	**sáb 16/03/24**	**lun 18/03/24**
65	Adoquin arcilla 10x20x06 pegado mortero **	1 día	$ 526.786,00	sáb 16/03/24	lun 18/03/24
66	**PISOS Y ACABADOS**	**31 días**	**$ 106.094.492,00**	**vie 8/03/24**	**vie 12/04/24**
67	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos TIPO SPORTMASTER O SIMILARES	3 días	$ 48.553.680,00	mié 3/04/24	sáb 6/04/24
68	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO CONVENCIONAL 60-70 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	5 días	$ 47.645.366,00	lun 11/03/24	sáb 16/03/24
69	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	2 días	$ 2.349.726,00	vie 8/03/24	lun 11/03/24
70	Demarcacion pintura trafico multiple a=0.1 **	5 días	$ 7.545.720,00	sáb 6/04/24	vie 12/04/24
71	**PISOS Y ACABADOS**	**37 días**	**$ 67.393.779,00**	**lun 4/03/24**	**sáb 13/04/24**
72	Mantenimiento arcos (porterías) de fútbol **. El juego incluye dos estructuras. (Incluye equipo de soldadura, anticorrosivo, pintura esmalte)	16 días	$ 780.672,00	sáb 16/03/24	mié 3/04/24
73	Adecuación estr. met. cerr. contra impac h=2.5m**	7 días	$ 13.916.581,00	mar 12/03/24	mié 20/03/24
74	Arreglo y templada Malla Eslab.h=2.0m(Plat+Pint)	16 días	$ 10.271.171,00	mar 12/03/24	vie 29/03/24
75	Malla eslabonada cal10+ang+platin+pint	16 días	$ 5.095.734,00	mar 12/03/24	vie 29/03/24
76	ASEO GENERAL	4 días	$ 12.375.615,00	mar 9/04/24	sáb 13/04/24
77	Pintura acrilica Koraza 10 sobre losa / pañete (2	5 días	$ 9.377.567,00	mié 3/04/24	mar 9/04/24
78	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	4 días	$ 3.539.423,00	vie 29/03/24	mié 3/04/24
79	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	4 días	$ 3.143.206,00	lun 4/03/24	jue 7/03/24
80	Reparcheo h=0.30 m	7 días	$ 8.893.810,00	lun 4/03/24	lun 11/03/24
81	**PARQUE LAGUNETA**	**48 días?**	**$ 194.959.498,00**	**mié 28/02/24**	**lun 22/04/24**
82	**PRELIMINARES**	**7 días**	**$ 8.053.022,00**	**mié 28/02/24**	**mié 6/03/24**
83	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	6 días	$ 926.826,00	mié 28/02/24	mar 5/03/24
84	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORRUTA Y PUENTES PEATONALES (VISUAL). INCLUYE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y	6 días	$ 165.407,00	mié 28/02/24	mar 5/03/24
85	Diseño Iluminación Cancha Sinté	7 días	$ 6.960.789,00	mié 28/02/24	mié 6/03/24
86	**CERRAMIENTO PRELIMINAR**	**3 días**	**$ 727.363,00**	**mié 28/02/24**	**vie 1/03/24**
87	CERRAMIENTO LONA H=2.20 MTS(EXC) **	3 días	$ 727.363,00	mié 28/02/24	vie 1/03/24

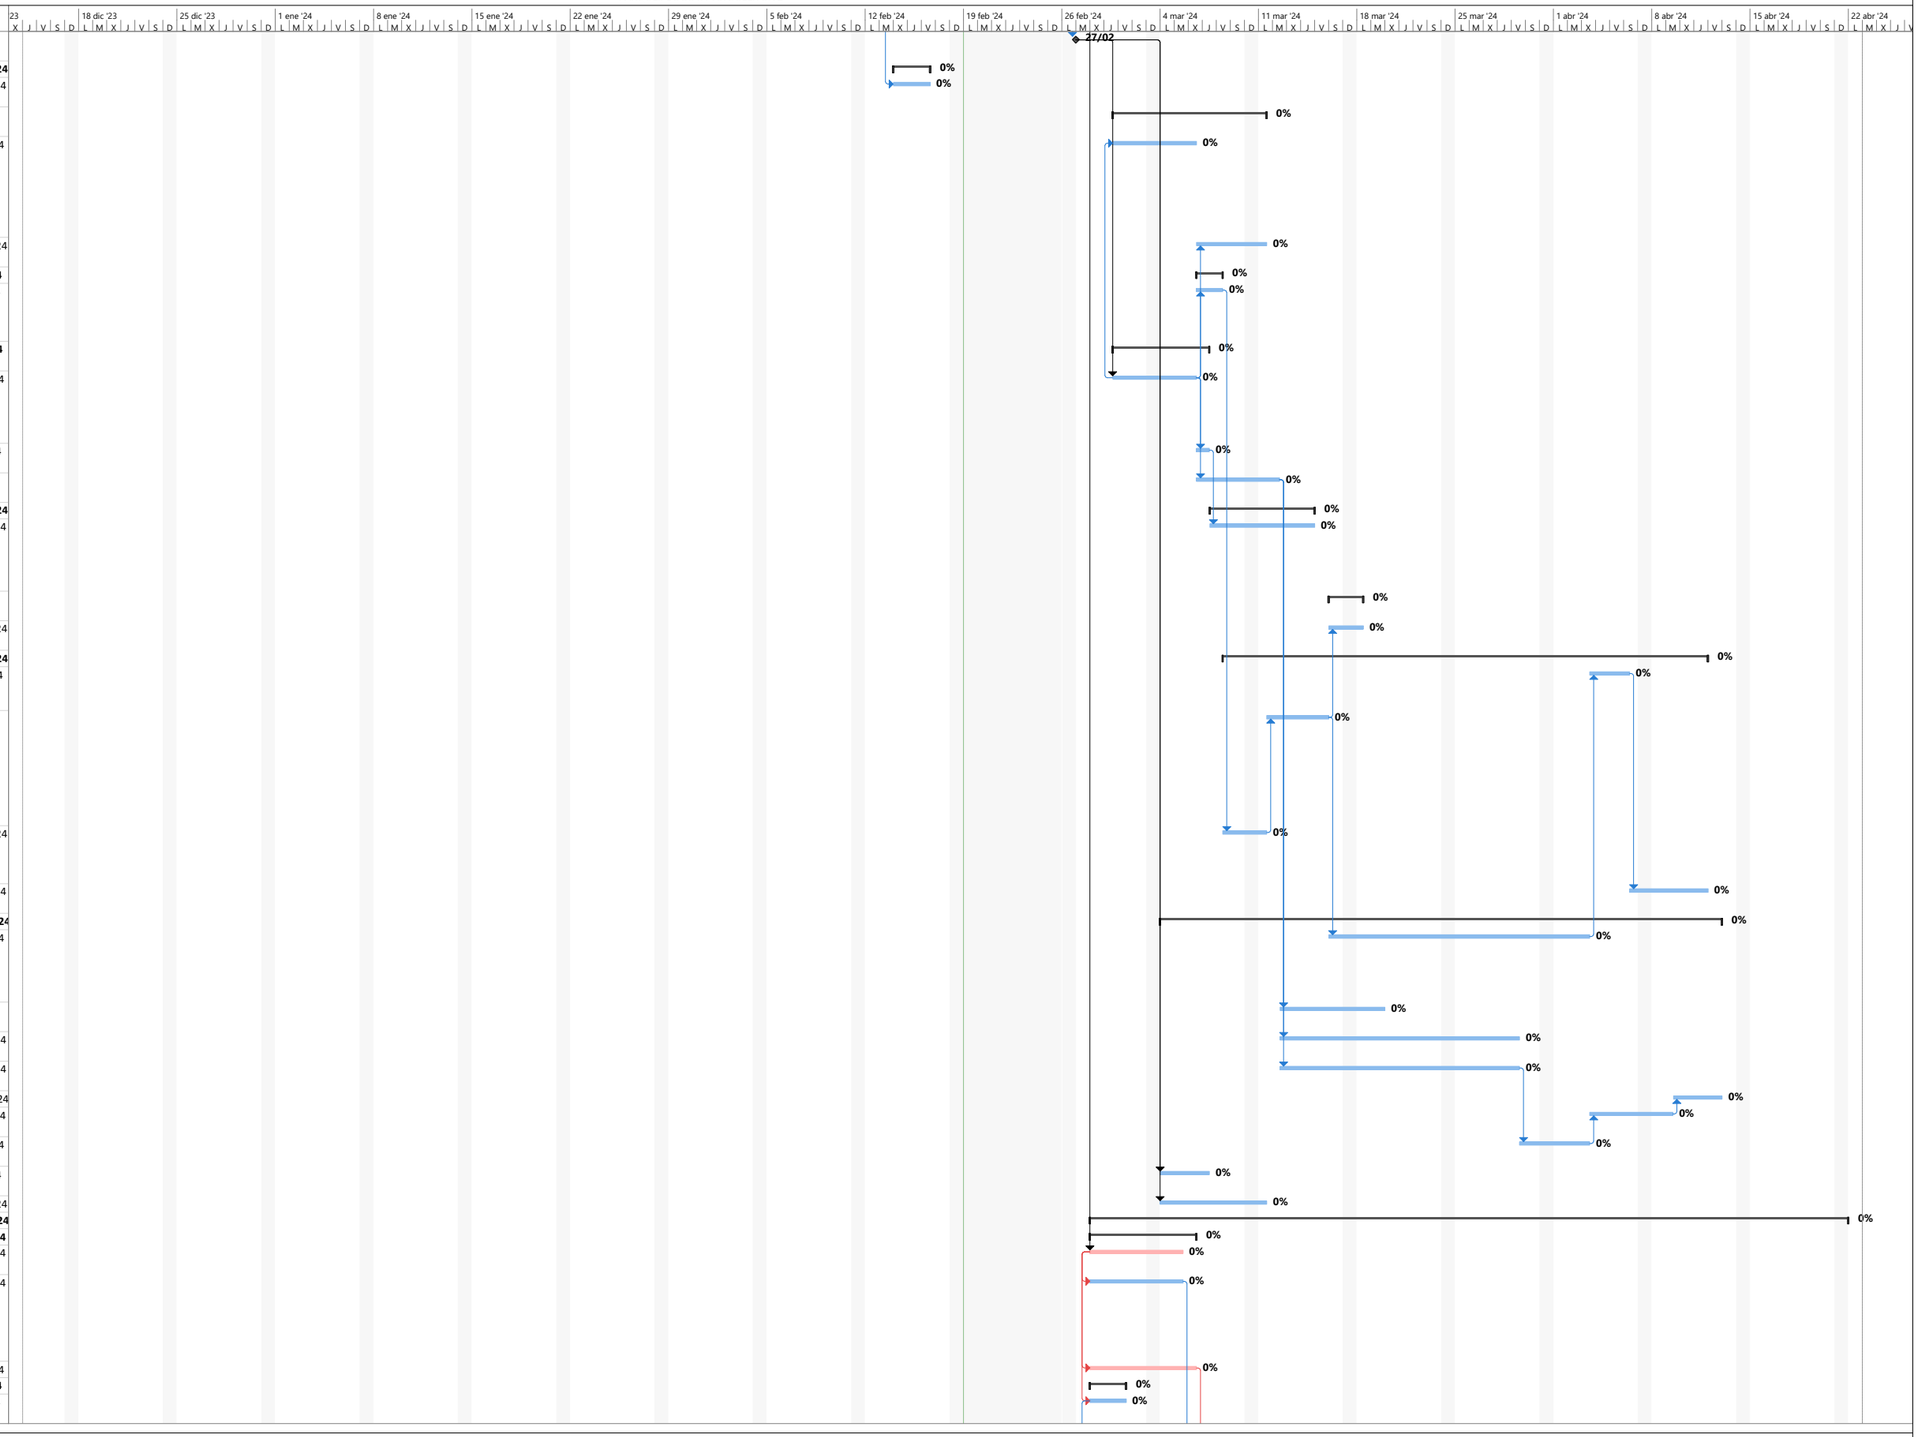

Tareas críticas | División crítica | Tarea | Progreso de tarea crítica | Progreso de tarea | División | Tarea manual | solo el comienzo | solo fin | solo duración | Línea base | División de la línea base | Hito de línea base | Hito | Progreso del resumen | Resumen | Resumen manual | Resumen del proyecto | Tareas externas | Hito externo | Tarea inactiva | Hito inactivo | Resumen inactivo | Fecha límite

Id	Nombre de tarea	Duración	Costo	Comienzo	Fin
88	**EXCAVACIONES, RETIRO Y DISPOSICION FINAL**	**1 día**	**$ 1.078.041,00**	**mié 28/02/24**	**mié 28/02/24**
89	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	1 día	$ 1.078.041,00	mié 28/02/24	mié 28/02/24
90	**INFRAESTRUCTURA ELECTRICA**	**42 días?**	**$ 185.101.072,00**	**mar 5/03/24**	**lun 22/04/24**
91	CANALIZ DUCTO ELECTRIC PVC-D2X3" ZONA DURA	15 días	$ 20.764.590,00	mié 6/03/24	vie 22/03/24
92	EMPALME RESINA SUMERGIBLE	3 días	$ 2.737.760,00	jue 11/04/24	lun 15/04/24
93	SUMISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN CS274	7 días	$ 22.549.119,00	vie 22/03/24	sáb 30/03/24
94	SUM+INST DE BARRAJE DE TIERRA TMGB CDRC Cometas	4 días	$ 2.174.940,00	mié 17/04/24	lun 22/04/24
95	Acometida BT en Aluminio 3#4	5 días	$ 6.993.238,00	lun 1/04/24	vie 5/04/24
96	Cable encauchetado 3N14 Cu (SUMI INST)	5 días	$ 2.186.146,00	lun 18/03/24	vie 22/03/24
97	Cable Cu desnudo # 2/0 enterrado (sum+inst)	10 días	$ 11.934.729,00	lun 18/03/24	jue 28/03/24
98	ALAMBRON ALUMINIO 8MM	7 días	$ 406.904,00	jue 28/03/24	vie 5/04/24
99	Conector de compresión bimetá	7 días	$ 228.741,00	vie 5/04/24	sáb 13/04/24
100	DESMONTE DE MASTIL DE 18M PARA CABLEADO	7 días	$ 14.399.000,00	mar 5/03/24	mié 13/03/24
101	SUMINISTRO Y PINTURA DE MASTIL DE 18M	7 días	$ 5.190.900,00	mié 13/03/24	jue 21/03/24
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 1x3" CORRUGADO PVC + CAMPANAS	10 días	$ 5.923.918,00	mié 6/03/24	lun 18/03/24
103	CERTIFICACION RETIE DE MT Y BT CEFE	1 día?	$ 8.384.091,00	lun 1/04/24	lun 1/04/24
104	CERTIFICACION RETILAP CEFE COMETAS	1 día?	$ 9.673.951,00	lun 1/04/24	lun 1/04/24
105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROYECTOR LED DE 400W, 100-277V, 50/60Hz	3 días	$ 51.674.260,00	mié 27/03/24	sáb 30/03/24
106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLAS COBRE +CONECTOR	5 días	$ 4.185.390,00	vie 5/04/24	jue 11/04/24
107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCEHTADO 3X14 COBRE	1 día?	$ 963.160,00	jue 11/04/24	vie 12/04/24
108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA INTEMPERIE EN ALUMINIO INYECTADO + TAPA	1 día?	$ 216.348,00	jue 11/04/24	vie 12/04/24
109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO IMC 1/2"	1 día?	$ 699.864,00	mié 27/03/24	mié 27/03/24
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO IMC 3"	1 día?	$ 2.732.664,00	mié 27/03/24	mié 27/03/24
111	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA BANDI 5/8" ROLLOS	5 días	$ 465.729,00	vie 5/04/24	jue 11/04/24
112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HEBILLA DE 5/8" EN ACERO INOXIDABLE	5 días	$ 21.780,00	vie 5/04/24	jue 11/04/24
113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTAL CAPTADORA 0,6X5/8"	5 días	$ 544.984,00	vie 5/04/24	jue 11/04/24
114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR REDUCTOR 1" A	5 días	$ 401.236,00	vie 5/04/24	jue 11/04/24
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MASTIL DE ACERO GALVANIZADO 1,5X1"	5 días	$ 868.780,00	jue 21/03/24	mar 26/03/24
116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE DERIVACIÓN PARA PROYECTORES	4 días	$ 1.688.676,00	mié 17/04/24	lun 22/04/24
117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE CONTROL PARA DOS APAGADOS	4 días	$ 3.570.105,00	mié 17/04/24	lun 22/04/24
118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO DE TRANSICIÓN PARA CONTROL	4 días	$ 1.692.790,00	mié 17/04/24	lun 22/04/24
119	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA+ MEDIDOR TRIFASICO 100 AMP+BREAKER	15 días	$ 1.827.279,00	lun 1/04/24	mié 17/04/24

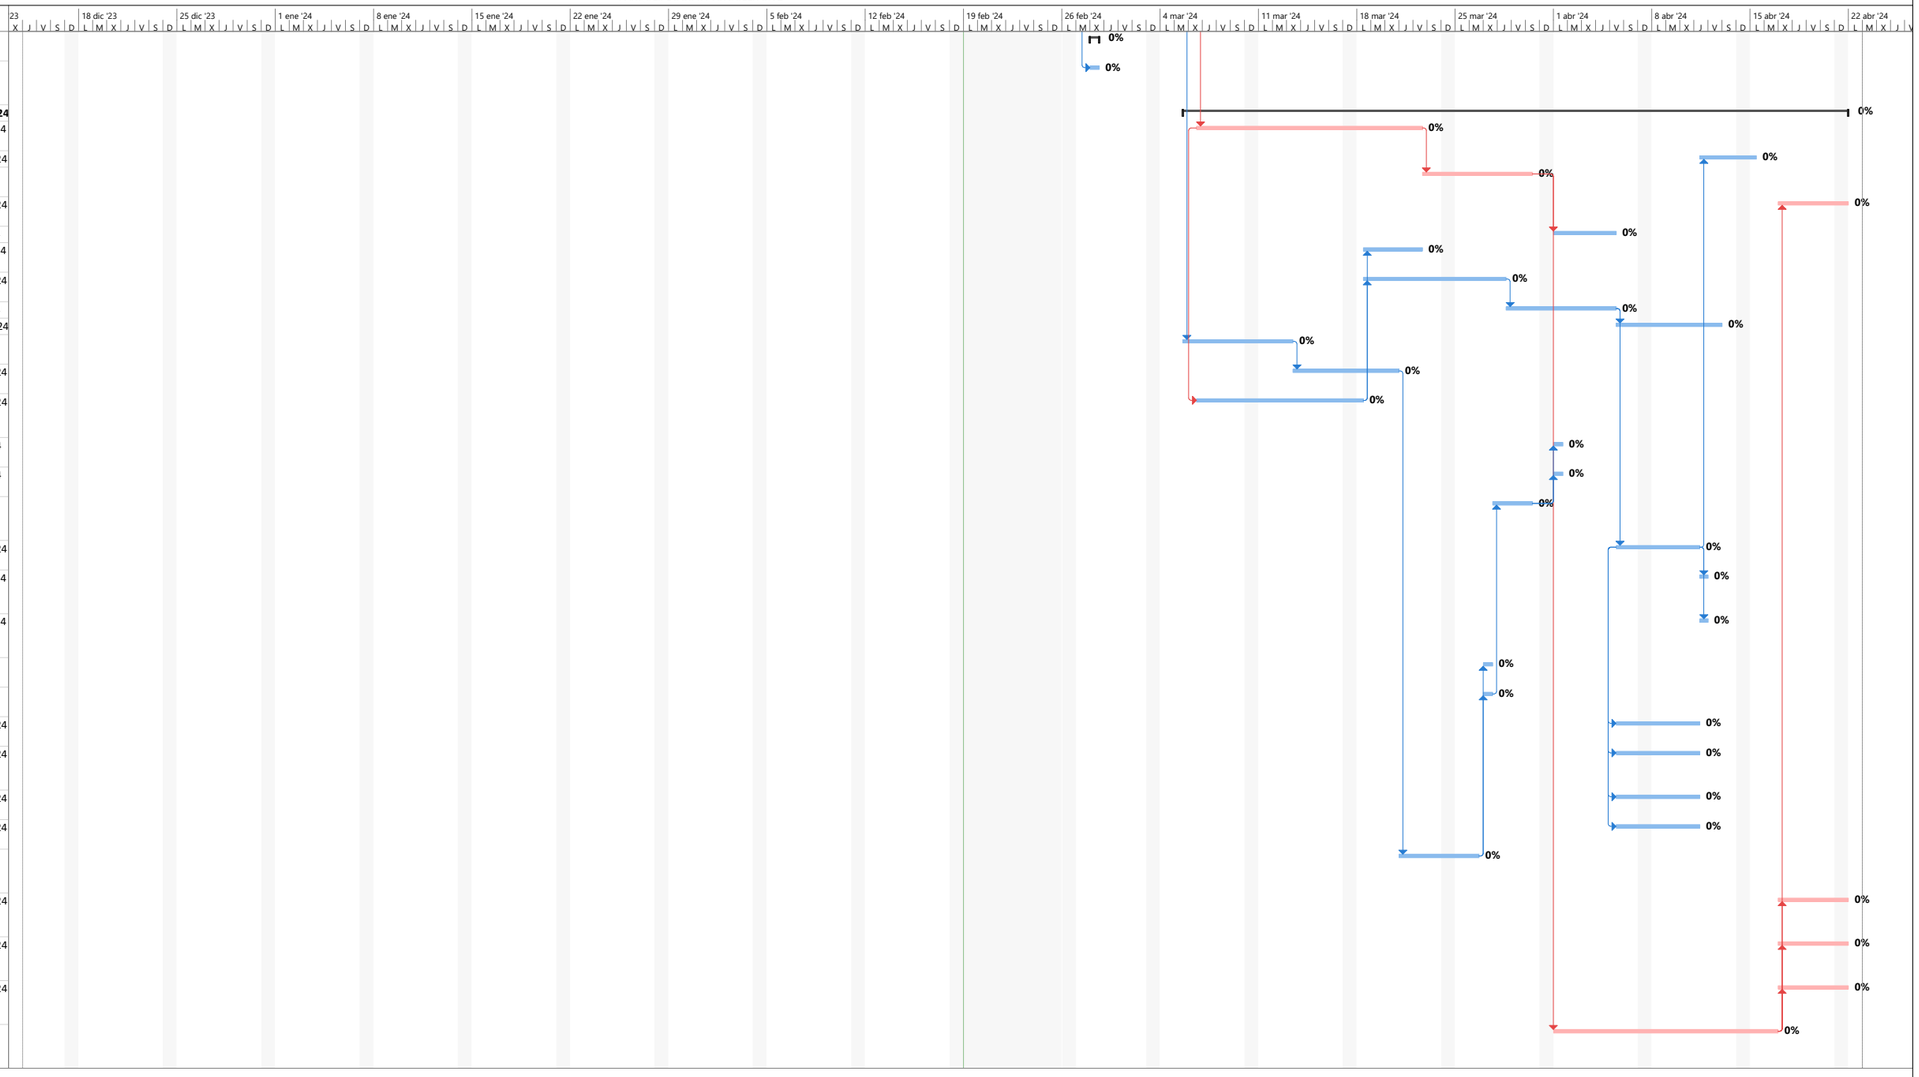

Tareas críticas · Progreso de tarea crítica · División · Tarea manual · solo fin · Línea base · Hito de línea base · Progreso del resumen · Resumen manual · Tareas externas · Tarea inactiva · Resumen inactivo
División crítica · Tarea · Progreso de tarea · solo el comienzo · solo duración · División de la línea base · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Hito externo · Hito inactivo · Fecha límite
