
INFORME MENSUAL DE OBRA N° 9

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH

CONTRATO 1279 de 2023

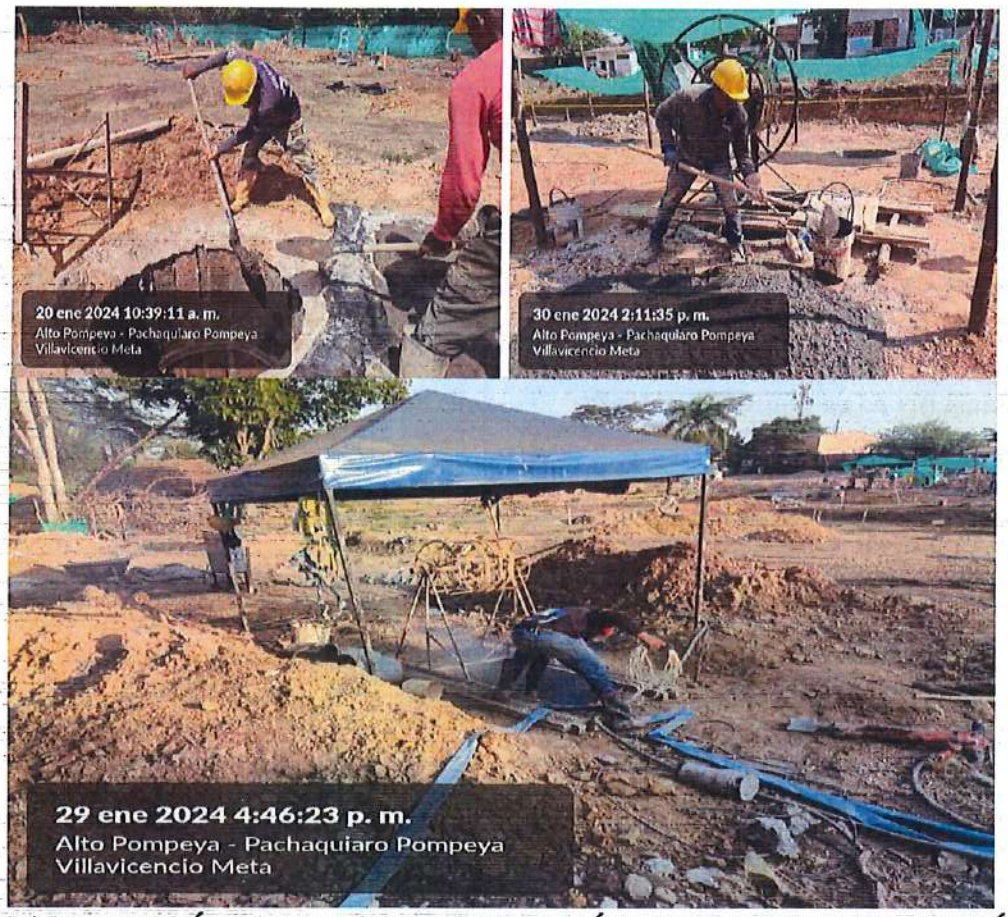

"RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META".

1 DE ENERO A 31 DE ENERO 2023

VERSION 0

Calle 15 Kra 40 No 01 Esq Lobby 1 Ofc 901 CC Primavera Urbana
Obracolegiocontrato1279@gmail.com

Control de Aprobaciones y Versiones

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	FOLIOS
0	07/02/24	DOCUMENTO ORIGINAL	

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
JOEL ALBERTO PINEDA SANDOVAL DIANA CAROLINA VEGA CASTILLO ASTRID RUÍZ GONZÁLEZ MARIA DEL PILAR SEPULVÉDA SUÁREZ	
ING. APOYO TÉCNICO PROFESIONAL SST	NOMBRE: ING. JOSE MARX REYES DIRECTOR DE OBRA

Contenido

Contenido 3

INTRODUCCIÓN. 8

OBJETIVOS. 9

Objetivo General. 9

Objetivos Específicos. 9

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA. 10

1.1. Descripción General del Proyecto. 10

1.2. Localización de Obra. 11

1.3. Implantación del Proyecto. 12

1.4. Alcance del Proyecto. 13

1.5. Control de Garantías. 14

2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS 17

2.1. Programación de Obra del Proyecto. 17

2.2. Análisis Programado Acumulado vs Ejecutado Acumulado. 18

2.3. Grafica de Avance Físico vs Programado 18

3. COMPONENTE TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA. 19

3.1. Actividades Realizadas. 19

3.1.1. Capítulo 2. Acondicionamiento del terreno 19

3.1.2. Capítulo 3. Cimentaciones / Acero de Refuerzo Estructural. 20

3.1.3.1. EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON INCLUYE CARGUE Y RETIRO 5KM 21

3.1.3.2. ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE BOMBEO).....22

3.1.3.3. DEMOLICIÓN CON QUIMICO EXPANSIVO.....23

3.1.4. Plan de Manejo de Transito (PMT).....24

3.2. Uso de Maquinarias y Equipos.....25

3.3. Bitácora o Libro de Obra.....27

3.4. Estado del Tiempo.....27

4. GESTIÓN DE CALIDAD ACORDE AL PLAN DE CALIDAD.....29

4.1. Certificado de Calidad de Materiales y Equipos.....29

4.1.1. Equipos de Topografía.....29

4.1.2. Equipos de Topografía.....29

4.1.3. Certificado de laboratorio.....30

4.2. Ensayos de Laboratorio.....30

4.1. Ensayos In Situ.....36

4.1.1. Asentamiento o Slump.....36

5. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....39

5.1. Relación del Personal Empleado en la Ejecución de la Obra en el Mes.....42

5.2. Registro de Entrega, Reemplazo de EPP's y Dotación.....55

5.3. Procesos de Inducción al Ingreso de Obra.....56

5.4. Charlas de Seguridad y Capacitaciones.....58

5.5. Control de Actividades de Alto Riesgo. 60
5.6. Inspecciones Planificadas. 61
5.7. Accidentabilidad. 62
5.7.1. Frecuencia de Accidentalidad. 62
5.7.2. Severidad de Accidentalidad. 63
1.1.1. Ausentismo Laboral. 63
2. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL. 65
Control y Seguimiento a las Actividades de Gestión Ambiental. 65
Charlas Pre Operacionales. 67
Manejo de Maquinaria y Equipos en Obra. 68
Manejo de la señalización 71
Manejo de Residuos Ambiental. 74
Orden y Aseo. 75
Manejo del Agua. 78
MANEJO SILVICULTURAL 79
Seguridad y Salud en el Trabajo. 86
Demarcación y Señalización de Obra. 88
Acompañamiento a la Gestión Social 91
3. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL. 92
3.1. Programa de Atención al Usuario 92
3.1.1. Taller Trabajo en Equipo. 95
3.1.2. Metodología: 95

3.1.3. Desarrollo de la Actividad: 95

3.2. Programa de Contratación de Mano de Obra. 98

3.3. Reunión con los representantes de las empresas Subcontratistas (Iván Tautiva y Construobras SAS). 98

5.8. Reunión con los representantes de las empresas Subcontratistas (Iván Tautiva y Construobras SAS). 103

3.4. Programa de Información y Participación Comunitaria. 104

5.9. Jornada de información con sector comercial del AID del proyecto. 105

3.5. Comité de Vigilancia y Control. 106

3.6. Programas de Compensaciones Socioeconómicas. 107

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. 108

4.1. Comité y/o Reuniones de Obra. 108

4.2. Correspondencia Enviada. 108

5. COMPONENTE FINANCIERO. 111

5.10. Relación Inversión del Anticipo. 111

5.11. Seguimiento Financiero Control de Actas y Pagos. 119

CONCLUSIÓN. 121

TABLAS 122

ILUSTRACIONES 123

ANEXOS 126

INTRODUCCIÓN.

El presente informe mensual de avance de obra a la interventoría describirá las actividades ejecutadas durante el periodo del 1 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024, en el proyecto y basados en los requisitos establecidos en el objeto del contrato "Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta"

Como parte de la ejecución que Consorcio Educación C&G-MH, efectuara la construcción del proyecto tomando en cuenta las directrices establecidas en los planes y programas determinados en el anexo técnico y se implementan las que aplican en el periodo y se mencionan a continuación:

Plan de Manejo Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-, PDT Programa Detallado de Trabajo, Diagrama de Ruta Crítica, Programa mensual de uso de equipo y maquinaria, Plan de manejo e inversión de anticipo, Programa de inversión mensual de anticipo, Programa de inversión mensual del proyecto, Manual de operación del proyecto, y Plan de Calidad.

OBJETIVOS.

Objetivo General.

El objetivo del presente informe es conocer el desarrollo de actividades y avances de ejecución de obra con el fin transmitir las metas alcanzadas durante el periodo del 01 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024, enmarcado en el cumplimiento las obligaciones establecidas contrato 1279 de 2023, para la "Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta".

Objetivos Específicos.

- Informar el cumplimiento del objeto de lo contratado y el desarrollo de las actividades ejecutadas durante el periodo.
- Desarrollar estrategias de información con el propósito de conocer las metas físicas propuestas y alcanzadas para el periodo del presente informe.
- Diagnosticar desviaciones presentes en las actividades ejecutadas durante el periodo a fin de generar propuestas que mejoren su desarrollo para la consecución de metas físicas de obra.

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA.

1.1. Descripción General del Proyecto.

A continuación, se aportarán datos generales del proyecto los cuales permitirán la comprensión del objeto del contrato 1279 de 2023, para su seguimiento y control, los cuales se describen a continuación:

Tabla 1

Datos Generales del Proyecto

	Condiciones Generales
Entidad Contratante	Municipio de Villavicencio
Contratista	Consorcio Educación C&G-MH
Objeto del Contrato	Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta
Representante Legal	Mauricio Mejía Hoyos
Contrato N°	1279 de 2023
BIPN	2021-50001-0023 BPPIM 2021-050001-0021
NIT	901687301-9
Valor del Contrato	$25.094.607.822,56
Anticipo	20%
Valor Anticipo	$5.018.921.564,51
Plazo Inicial	10 Meses
Plazo Modificado	7 Meses y Once Días
Fecha Acta de Inicio	20 de Mayo 2023
Fecha Prorroga No. 1	22 de diciembre de 2023
Plazo Prorroga No. 1	12 meses
Fecha de Culminación del Contrato	31 de Diciembre de 2024

1.2. Localización de Obra.

EL proyecto está ubicado en el corregimiento 4, del centro poblado Altos de Pompeya calle 6 # 19-36, Villavicencio capital del departamento del Meta, en un terreno de 1.8 Ha, destinado para la construcción del nuevo colegio Alfonso López Pumarejo, con una superficie de 0,3392 Km^2.

En la siguiente tabla se adjuntaron los diferentes tipos de coordenadas de ubicación geográfica del centro poblado Altos de Pompeya, información que nos permitirá realizar la ubicación de coordenadas reales para la posterior georreferenciación del proyecto.

Tabla 2

Ubicación Geográfica Centro poblado Altos de Pompeya

Ubicación Geográfica	
Coordenadas Geográficas	Norte 4°03´48" Oeste 73°23´48"
Coordenada Decimales	Norte 4,063333° Oeste -73,396667°
UTM	449304 677989 18N

Para obtener una mejor comprensión y asimilación de la ubicación geográfica del centro poblado de Altos de Pompeya en la siguiente ilustración se demostrará como el valor informativo de una imagen nos ayuda a entender lo plasmado en los párrafos antes mencionados.

Ilustración 1

Localización Geográfica del Proyecto




1.3. Implantación del Proyecto.

Implica la distribución y ordenamiento de los espacios para los diferentes fines previstos, correspondería a los diferentes módulos que componen la estructura física y obras de urbanismo del nuevo Colegio Alfonso López Pumarejo.

Ilustración 2

Implantación y Localización General

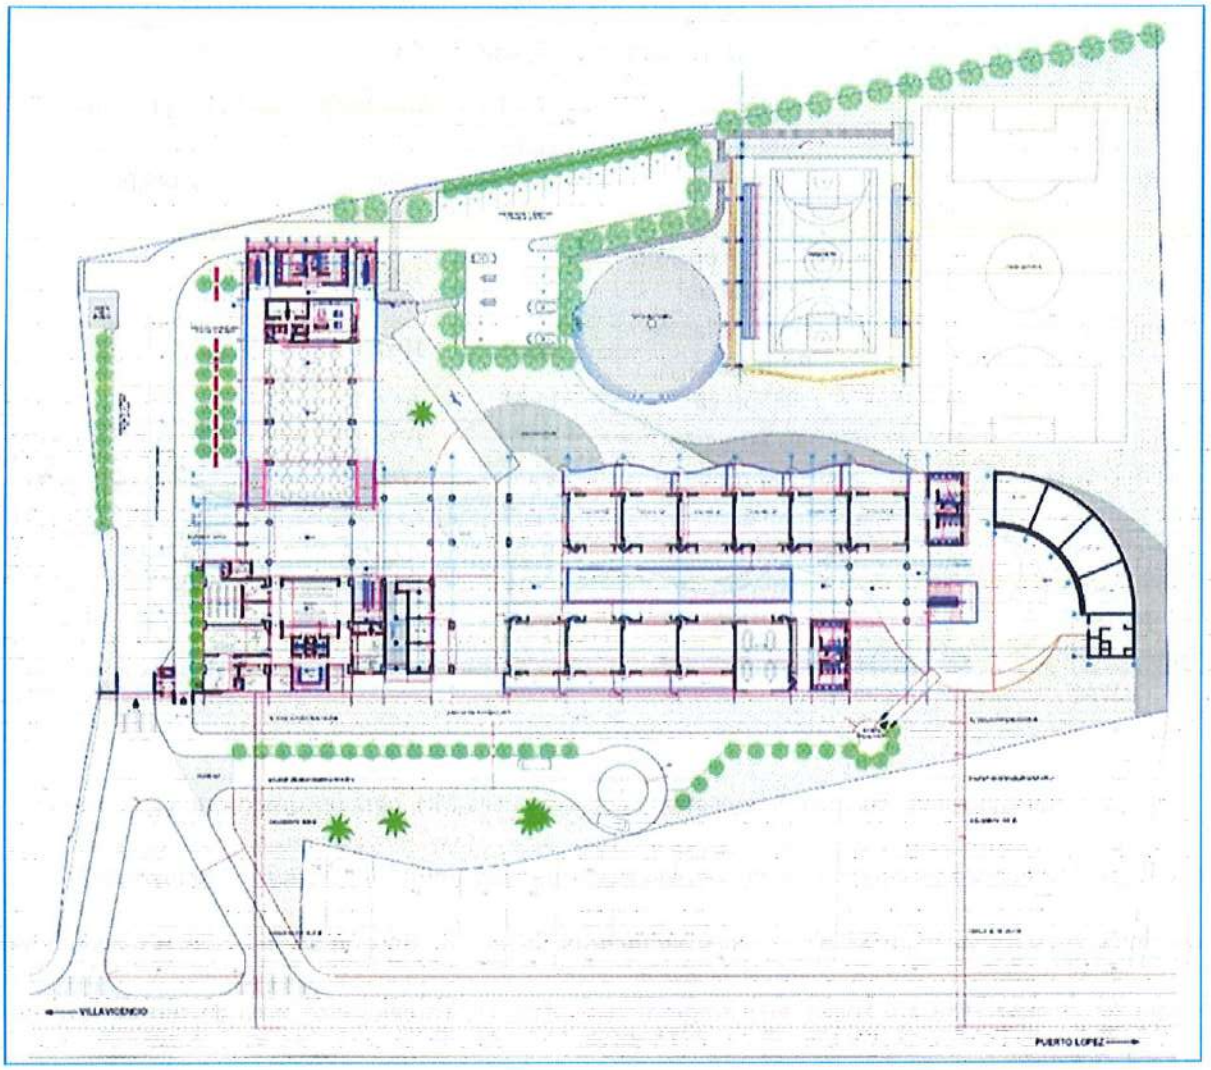

1.4. Alcance del Proyecto.

El Consorcio Educación C&G-MH, enmarcado en el alcance del contrato llevará a cabo la construcción del Colegio Alfonso López Pumarejo hasta la terminación de las edificaciones y demás construcciones en funcionamiento para ser entregada a la entidad para sus operaciones principales las cuales se describen a continuación:

Tabla 3

Áreas a Construir por Edificaciones

Cuadro de Áreas y Niveles					
Módulo	Piso	Espacios	Nivel	Área (m²)	Área (m²) Construida
Auditorio	1	Auditorio	0,00	781,00	2389,00
	2	Restaurante	4,24	804,00	
	3	Laboratorios/Talleres	8,00	804,00	
Administración	1	Rectoría, Recepción, Secretarias	3,60	1009,00	2980,00
	2	Sistemas, Salas de Profesores	8,00	1028,00	
	3	Biblioteca	11,65	943,00	
Educativo	1	Aulas Primarias	3,00	1784,00	5206,00
	2	Aulas Secundaria	8,00	1784,00	
	3	Talleres	11,75	1638,00	
Pre Escolar	1	Aulas Preescolar	5,30	425,00	425,00
Polideportivo	1	Polideportivo	0,99	1088,58	1088,58
Portería	1	Portería	4,45	8,89	8,89
Cuarto Residuos	1	Cuarto Residuos	0,40	15,12	15,12
TOTAL					12.112,59

Como parte de la ejecución del Consorcio Educación C&G-MH, para la construcción del proyecto se aplicarán las directrices establecidas en los planes y programas determinados que se implementaran y a continuación se mencionan: Plan de Manejo Ambiental Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-, Plan de Gestión Social, PDT Programa Detallado de Trabajo, Programa de subcontratos y compras, Plan de manejo e inversión de anticipo y plan de calidad.

1.5. Control de Garantías.

Para garantizar los reparos de daños de manera involuntaria a terceros en el transcurso de ejecución de obra o posterior a su entrega y en cumplimiento a lo establecido en el contrato de obra 1279 de 2023, mediante un control de garantías a continuación, se relacionan las tablas de control de pólizas actualizadas:

Tabla 4

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.391,15	16/03/2023	18/01/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.117,00	16/03/2023	18/01/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.117,00	16/03/2023	18/01/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.117,00	16/03/2023	18/01/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial con Fecha de Firma Inicial de Contrato de Obra.

Póliza de Seguro Cumplimiento

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.782,30	20/05/2023	30/06/2024
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.564,60	20/05/2023	30/06/2024
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.391,15	20/05/2023	31/12/2026
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.911,50	31/12/2023	31/12/2028

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial Correspondiente a la Actualización con Fecha del Acta de Inicio.

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Prorroga No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.392,00	20/05/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.117,00	20/05/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.117,00	20/05/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.117,00	20/05/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 5

Póliza de Seguro Cumplimiento – Prorroga No. 1

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.782,30	22/12/2023	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.564,60	22/12/2023	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.391,15	22/12/2023	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.911,50	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual – Modificación No. 3.

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
RCE	Predios Labores y Operaciones	$ 1.254.730.382,00	20/05/2023	31/12/2024
	Contratistas y Sub Contratistas	$ 376.419.116,00	20/05/2023	31/12/2024
	Responsabilidad Civil patronal	$ 376.419.116,00	20/05/2023	31/12/2024
	Vehículos Propios y no Propios	$ 376.419.116,00	20/05/2023	31/12/2024

Nota. Póliza de RCE N° 100008195. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial.

Tabla 6

Póliza de Seguro Cumplimiento – Modificación No. 3

Póliza de Seguro	Amparos	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta
Cumplimiento	Cumplimiento del Contrato	$ 2.509.460.770,20	22/12/2023	30/06/2025
	Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	$ 5.018.921.540,40	22/12/2023	30/06/2025
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones Laborales	$ 1.254.730.385,10	22/12/2023	31/12/2027
	Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 12.547.303.851,00	31/12/2024	31/12/2029

Nota. Póliza de Seguro de Cumplimiento N° CV-100031880. Expedidas por la Compañía Seguros Mundial

2. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Relación de flujo de inversión ajustado al acta de prorroga No.1 celebrada el 22 de diciembre de 2023 por un periodo de 12 meses, teniendo como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024.

2.1.1.1.1.1.1.1.1. Programación de Obra del Proyecto.

Tabla 7

Flujo de Inversión Programado Por Mes

Mes	Avance Programado Mensual ($)	% Programado Mensual	Avance Programado Acumulado ($)	% Programado Acumulado
MAYO-23	$ 6.722.962,44	0,03%	$ 6.722.962,44	0,03%
JUNIO-23	$ 96.472.126,60	0,38%	$ 103.195.089,04	0,41%
JULIO-23	$ 389.467.266,96	1,55%	$ 492.662.356,00	1,96%
AGOSTO-23	$ 248.331.968,82	0,99%	$ 740.994.324,82	2,95%
SEPTIEMBRE-23	$ 111.181.244,68	0,44%	$ 852.175.569,50	3,40%
OCTUBRE-23	$ 330.640.484,57	1,32%	$ 1.182.816.054,07	4,71%
NOVIEMBRE-23	$ 601.344.832,07	2,40%	$ 1.784.160.886,14	7,11%
DICIEMBRE-23	$ 2.087.908.351,04	8,32%	$ 3.872.069.237,18	15,43%
ENERO-24	$ 1.786.740.909,16	7,12%	$ 5.658.810.146,34	22,55%
FEBRERO-24	$ 1.280.687.387,99	5,10%	$ 6.939.497.534,33	27,65%
MARZO-24	$ 1.271.873.141,55	5,07%	$ 8.211.370.675,88	32,72%
ABRIL-24	$ 1.156.983.425,18	4,61%	$ 9.368.354.101,06	37,33%
MAYO-24	$ 1.221.649.401,08	4,87%	$ 10.590.003.502,14	42,20%
JUNIO-24	$ 1.319.559.686,37	5,26%	$ 11.909.563.188,51	47,46%
JULIO-24	$ 2.587.876.156,43	10,31%	$ 14.497.439.344,94	57,77%
AGOSTO-24	$ 1.830.844.236,09	7,30%	$ 16.328.283.581,03	65,07%
SEPTIEMBRE-24	$ 1.850.427.545,22	7,37%	$ 18.178.711.126,25	72,44%
OCTUBRE-24	$ 1.131.537.157,42	4,51%	$ 19.310.248.283,67	76,95%
NOVIEMBRE-24	$ 2.252.680.817,27	8,98%	$ 21.562.929.100,94	85,93%
DICIEMBRE-24	$ 3.531.678.720,94	14,07%	$ 25.094.607.821,88	100,00%

2.2. Análisis Programado Acumulado vs Ejecutado Acumulado.

Las actividades ejecutadas vs programadas según el acta de prorroga No.1 celebrada el 22 de diciembre de 2023 por un periodo de 12 meses, teniendo como nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2024 del contrato. Logrando mediante tablas y gráficos los indicadores de avances y que a continuación se detallan:

Tabla 8


Relación Avance Programado Acumulado vs Avance Físico Acumulado

Mes 2023	Avance Programado		Avance Ejecutado	
	Acumulado ($)	%Acumulado	Acumulado ($)	%Acum.
MAYO-23	$ 6.722.962,44	0,03%	$ 0,00	0,00%
JUNIO-23	$ 103.195.089,04	0,41%	$ 52.698.676,43	0,21%
JULIO-23	$ 492.662.356,00	1,96%	$ 486.835.391,74	1,94%
AGOS-23	$ 740.994.324,82	2,95%	$ 742.800.391,53	2,96%
SEP.-23	$ 852.175.569,50	3,40%	$ 1.036.407.303,04	4,13%
OCT.-23	$ 1.182.816.054,07	4,71%	$ 1.372.675.047,86	5,47%
NOV.-23	$ 1.784.160.886,14	7,11%	$ 2.198.287.645,20	8,76%
DIC. -23	$ 3.872.069.237,18	15,43%	$ 3.754.153.330,15	14,96%
ENE-24	$ 5.658.810.146,34	22,55%	$ 4.429.198.280,56	**17,65%**

El porcentaje de obra ejecutado a la fecha del presente informe es de 17.65%, el programado del 22.55% como lo indica la gráfica de control de programación.

2.3. Grafica de Avance Físico vs Programado.

Ilustración 3. *Curva S Análisis de Avance Físico vs Programado*

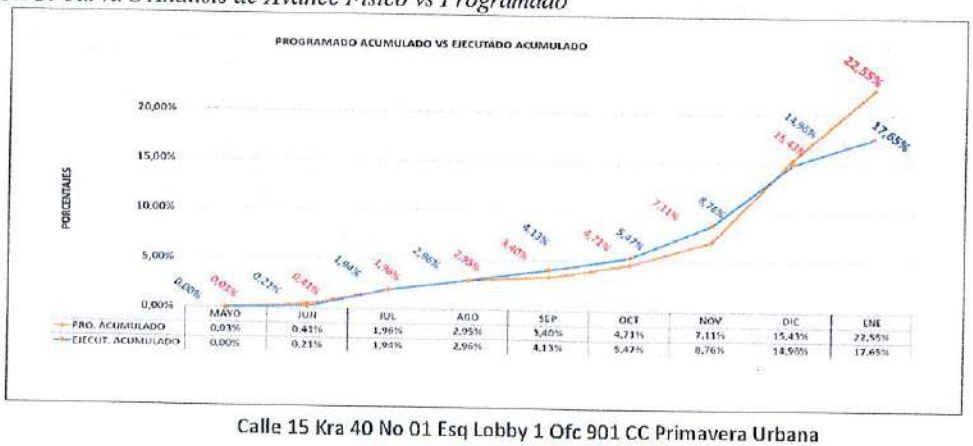

3. COMPONENTE TÉCNICO DEL CONTRATO DE OBRA.

3.1. Actividades Realizadas.

3.1.1. Capítulo 2. Acondicionamiento del terreno

Comprende el conjunto de operaciones que se realizan con el objetivo de conformar los espacios que permitan alojar hormigón en cimentaciones y/o similares, según indicaciones de los estudios de suelos, planos arquitectónicos, estructurales y urbanismo, actividad que se ejecuta en los primeros anillos del módulo A Auditorio.

Tabla 9

Capítulo 2. Cantidad ejecutadas en el mes de enero.

Ítem	Descripción	Cantidad
2.1.3	TRAZADO Y REPLANTEO ARQUIT	- m2
2.3.4	EXCAV. SECAS CONGLOMDO MANUAL. INCL. RETIRO 5 KMS	- m3

Nota. Periodo Comprendido del 1 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024.

Ilustración 4 *Estudios Topográficos*




3.1.2. Capítulo 3. Cimentaciones / Acero de Refuerzo Estructural.

El acero de refuerzo son barras que se proporcionan en combinación con el hormigón simple para convertirse el hormigón armado el Consorcio Educación C&G-MH; realizará el suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 60000 PSI para los elementos en concreto reforzado en los elementos de cimentación profunda según las indicaciones que contienen los planos respetando los recubrimiento y espaciado y direcciones entre ellas, se ejecutan actualmente acero de refuerzo en los anillos de caissons en los modulos A, B Y C y E en los edificios Auditorio, Administrativo, educativo y polideportivo correspondientemente.

Ítem	Descripción	Cantidad
3.4.1	ACERO REFUERZO FIGURADO 412MPA, (4200 KG/CM2,G60)	8.653,54 KG

Nota. Periodo Comprendido del 1 al 31 de enero de 2024.

Ilustración 5 *Acero de refuerzo.*

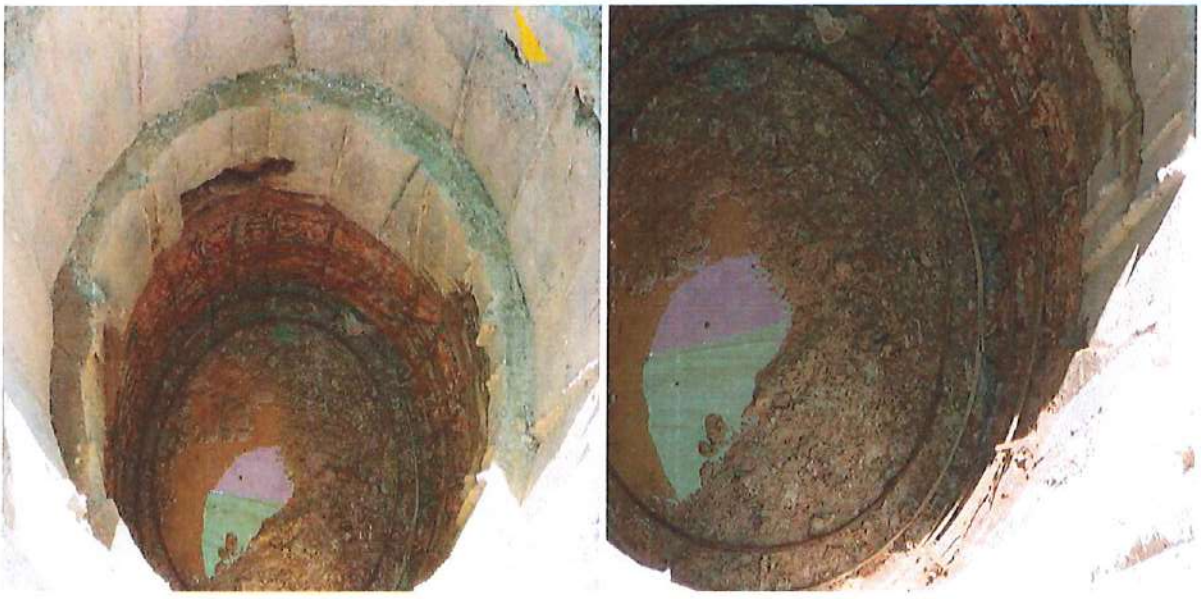

3.1.3. ITEMS NO PREVISTOS.

Estos ítems corresponden a las actividades complementarias a las inicialmente contratadas, que surgen durante la etapa de ejecución y son indispensables para cumplir con el objeto contratado.


3.1.3.1. EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON INCLUYE CARGUE Y RETIRO 5KM

Esta actividad comprende la excavación manual para Caisson (excavación para cimentación profunda) incluyendo equipos y materiales. Se realizaron excavaciones en los módulos A, B Y C y E en los edificios Auditorio, Administrativo, educativo y polideportivo correspondientemente; esta actividad incluye cargue, manejo de aguas y transporte de los sobrantes hasta la zona de depósito autorizado (Acarreo max. 5 km.). Los sobrantes se depositan únicamente en los botadores autorizados por la entidad.

Ítem	Descripción	Cantidad
NP-05	EXCAVACIÓN HÚMEDA CONGLOMERADO MANUAL PARA CAISSON INCLUYE CARGUE Y RETIRO 5KM	973,15 m3

Nota. Periodo Comprendido del 1 al 31 de enero de 2024.

Ilustración 6 *Excavación Húmeda Conglomerado Manual Para Caisson Incluye Cargue Y Retiro 5km*

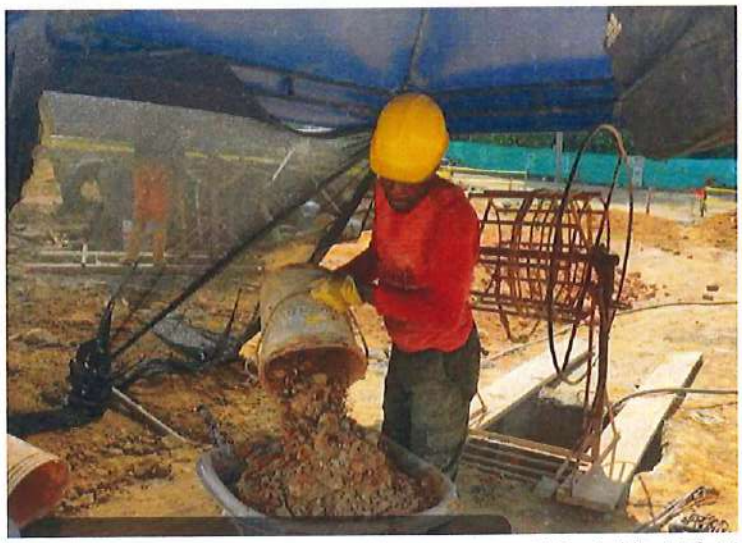



3.1.3.2. ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10m - SIN REFUERZO (INCLUYE BOMBEO)


Se refiere a la construcción de anillos de caisson en concreto, vaciados con concreto premezclado de 4000 PSI cuya ejecución se efectúa excavando previamente el terreno, instalando las formaletas y las correspondientes armaduras para los anillos, con los diámetros, longitudes y profundidades indicados en los planos del proyecto y de acuerdo con las instrucciones del especialista estructural.

La localización de los ejes de las estructuras se viene realizando con equipos de topografía de precisión, debidamente calibrados y certificados con el fin de que el sistema de referencia quede estable y localizado de tal manera que permita la construcción de cada elemento sin que se generen interferencias. Esta actividad se viene desarrollando en los módulos A, B, C y E en los edificios Auditorio, Administrativo, educativo y polideportivo correspondientemente.

Ítem	Descripción	Cantidad
NP-6	ANILLO DE RECUBRIMIENTO PARA CAISSON EN CONCRETO DE 4000 PSI - PROFUNDIDAD 0-10M - SIN REFUERZO (INCLUYE BOMBEO)	189.07 m3

Nota. Periodo Comprendido del 1 al 31 de enero de 2024.

Ilustración 7 *Anillo De Recubrimiento Para Caisson En Concreto De 4000 Psi - Profundidad 0-10m - Sin Refuerzo (Incluye Bombeo)*

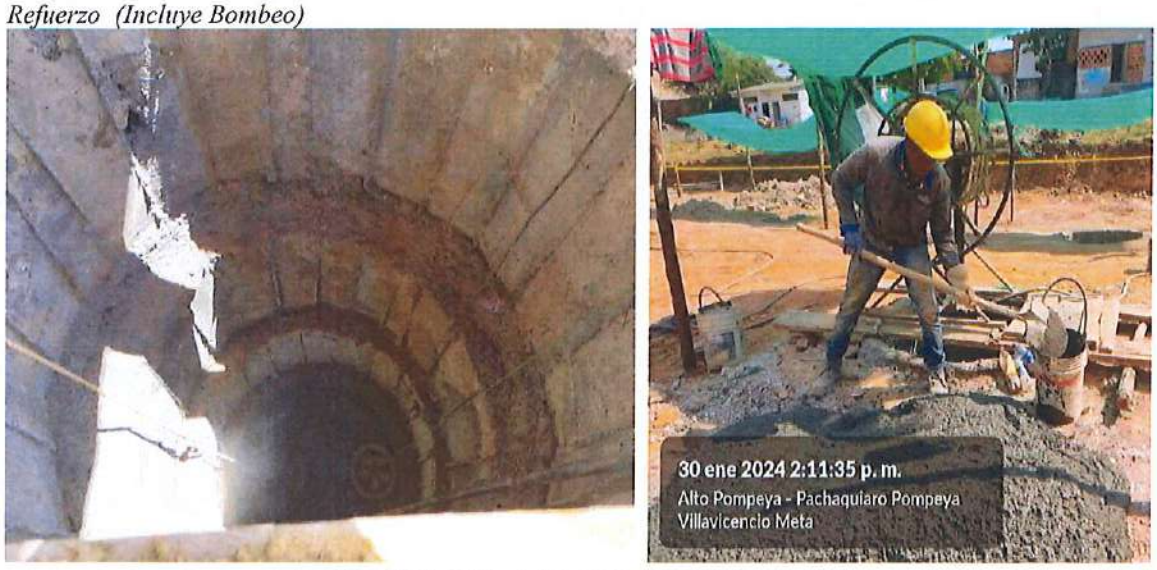

3.1.3.3. DEMOLICIÓN CON QUIMICO EXPANSIVO

Esta actividad comprende el suministro de mano de obra, equipos, materiales y todo trabajo necesario para llevar a cabo las fracturas con químicos expansivos (cloruro potásico – KCL03) en roca, necesarios para fracturar las rocas que se encuentren en la excavación de los caisson, de tal forma que se puedan extraer y continuar con los trabajos de excavación.

Ítem	Descripción	Cantidad	
NP-13	DEMOLICIÓN CON QUIMICO EXPANSIVO	-	UND

Nota. Periodo Comprendido del 1 al 31 de enero de 2024.

Ilustración 8 *Demolición con químico Expansivo*





3.1.4. Plan de Manejo de Transito (PMT).

El propósito principal del manejo de tránsito que se aplicara en la construcción del colegio Alfonso López Pumarejo, es mitigar el impacto en la movilidad ocasionado por la obra mediante alternativas seguras y controladas para los actores viales. (Peatones, transporte público, vehículos privados, transporte de cargas, etc.). Ver anexo. Oficio de aprobación de Movilidad al Plan de manejo de Tránsito.

El uso de controladores viales es fundamental, ya que serán los encargados de controlar y regular la aplicación del PMT, la utilización de señalización informativa, preventiva, reglamentaria y de dispositivos para la canalización como conos, delineadores tabulares y maletines instalados en los puntos críticos estarán encaminados para la prevención de accidentes en incidentes de tráfico.

Ilustración 9 *Plano Plan de Manejo de Transito*

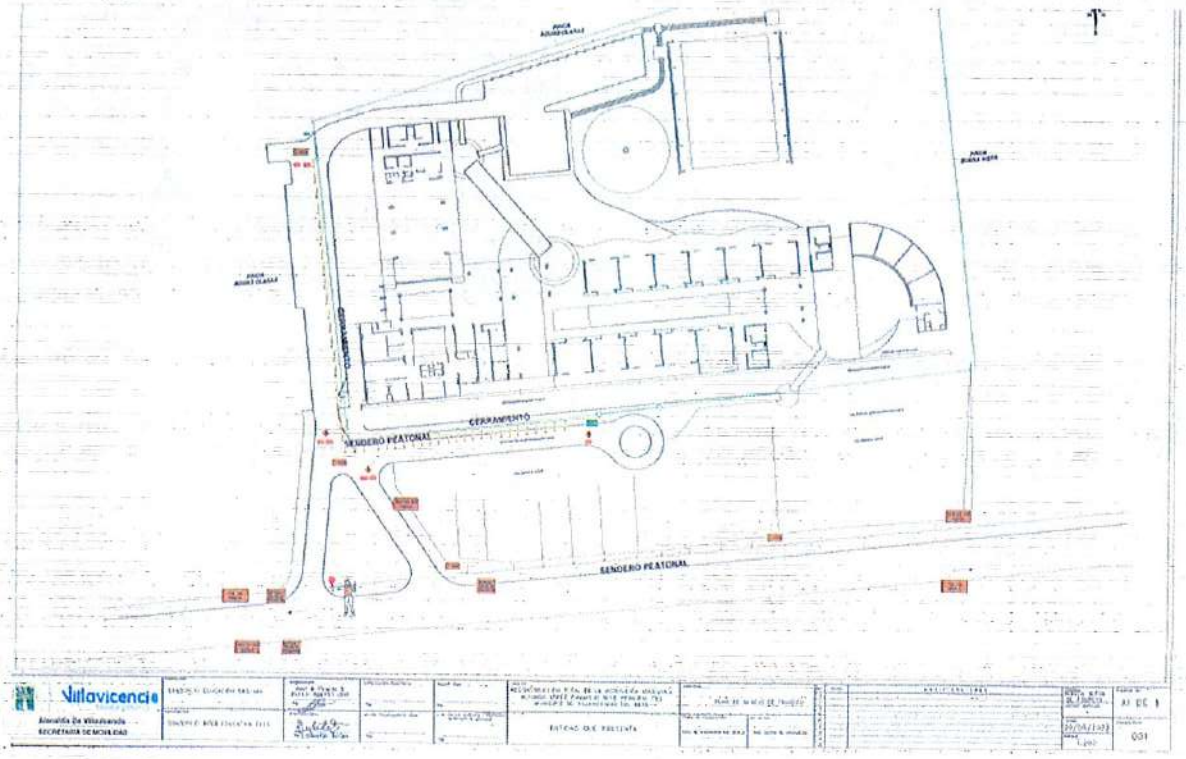


Ilustración 10 *Plan de Manejo de Transito*



3.2. Uso de Maquinarias y Equipos.

Para la operación de los procesos Consorcio Educación C&G-MH, dispone en obra los equipos y maquinarias necesarios, que han permitido ejecutar las obras oportunamente. En el siguiente cuadro el listado y control de maquinaria y equipos se demostrará la maquinaria utilizada con su respectivo estatus y dedicación.

Tabla 10

Relación de Maquinarias Usadas en el Periodo

Maquinaria	Placa	Marca	Modelo	Estatus	Dedicación
Excavadora Hidráulica	-	KOBELCO	SK210LC	Operativa	100%
Planta de Concreto	-	DOMAT	DM SERIES	Standby	100%
Bomba Estacionaria	-	SCHWING	WP 1000X	Standby	100%
Mezcladora	-	-	1,5 Bultos	Operativa	100%
Compactador tipo Canguro	-	-	-	Operativa	100%
Vibrador de Concreto	-	-	-	Operativa	100%
Bomba Sumergible	-	-	-	Operativa	100%

Maquinaria	Placa	Marca	Modelo	Estatus	Dedicación
Compresor sullair 185	2015510 11006	JHON DEERE	-	Operativa	100%
Compresor sullair 210H	-	M. Caterpillar	3044 CT/2600RPM	Operativa	100%
Minicargador	-	BOBCAT	-	Operativa	100%


Nota. Periodo Comprendido del 01 de enero al 31 de enero de 2024.

Ilustración 11: *Maquinaria en Obra*







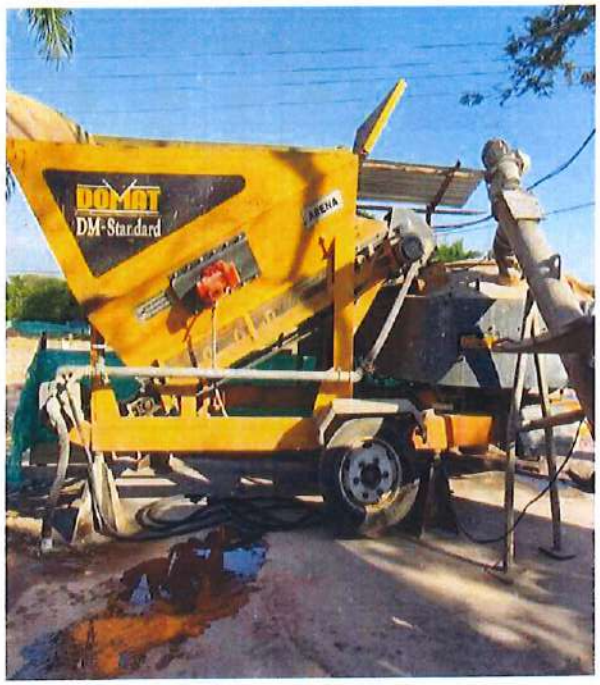

3.3. Bitácora o Libro de Obra

Se adjunta al presente informe copias de las anotaciones diarias sobre las actividades realizadas en la bitácora de obra firmadas tanto por la interventoría como por el constructor el Consorcio Educación C&G-MH. Ver anexo. Bitácora de obra

3.4. Estado del Tiempo.

A continuación, en el siguiente grafico se observará las condiciones climatológicas en el presente periodo de ejecución del proyecto. Las anotaciones del estado del tiempo se encuentran registradas en la bitácora de obra para su posterior análisis, en las siguientes ilustraciones se podrá observar el comportamiento del clima en el periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024.

Ilustración 12

Registro Diario del Clima enero 2024



Ilustración 13

Influencia del Clima enero 2024



Como se puede evidenciar en las ilustraciones y graficas anteriores, durante el mes de enero del 2024 no se presentaron lluvias.

4. GESTIÓN DE CALIDAD ACORDE AL PLAN DE CALIDAD.

El presente plan de calidad es elaborado por el Consorcio Educación C&G-MH, cumpliendo con los requisitos en el desarrollo específico del contrato. El contenido del plan de calidad se encuentra alineado con las directrices establecidas por la norma ISO 9001:2015, GTC-ISO 10005:2019 y el Sistema de Gestión de Calidad aplicado por CYG Ingeniería y Construcciones SAS, como administrador y ejecutor del contrato 1279 de 2023.

4.1. Certificado de Calidad de Materiales y Equipos.

Con el objeto de asegurar los resultados de seguimiento y medición durante este periodo se llevan a cabo el control de los equipos que garanticen la validez y fiabilidad de los resultados y se mencionan a continuación

4.1.1. Equipos de Topografía.

Durante este periodo se contó con una comisión propia del Consorcio Educación C&G-MH, con el fin de viabilizar, liberar y cuantificar las actividades ejecutadas. Ver anexo 6. Certificado de calibración de equipos topográficos.

Tabla 11

Relación de Equipos Topográficos

Equipos	Marca	Modelo	Serie	Fecha Calibración	Vencimiento Calibración
Estación Total	TOPCON	GTS-235W	274383	04/09/2023	03/03/2024
Nivel	POWER GEO	PG424	05761	04/09/2023	03/03/2024

Nota. Periodo Comprendido del 01 al 31 de enero de 2024.

4.1.2. Certificado de laboratorio.

El consorcio Educación C&G-MH, realiza la contratación del laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S., mediante el cual certificará la calidad de los diseños de mezclas y materiales utilizados en los ensayos requeridos con el objetivo de certificar la idoneidad de los materiales utilizados. Con el fin de garantizar la funcionalidad de los equipos utilizado por el laboratorio para las funciones que fue contratado, a continuación, se mencionan los diferentes equipos utilizados con los cuales se realizaron los ensayo en el laboratorio.

Tabla 12

Equipos de Laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S

Maquinaria	Marca	Modelo	Estatus	Dedicación
Tamizadora 8 IN	PINZUAR	Granotest	Operativa	100%
Balanza 20 kg	OHAUS	CD-11	Operativa	100%
Balanza 3 kg	TRUMAX	MIX-A	Operativa	100%
Prensa Doble Rango 1000 KN	PINZUAR	PC-42D	Operativa	100%
Prensa Doble Rango 200 KN	PINZUAR	PC-42D	Operativa	100%

Nota. Periodo comprometido del 1 al 31 de enero de 2024.

4.2. Ensayos de Laboratorio

Para asegurar la correcta ejecución de las actividades de obra el Consorcio Educación C&G-MH, efectuará los ensayos correspondientes para el control y seguimientos de las características de los materiales empleados de acuerdo a las normas establecidas con el objeto de obtener resultados confiables que aseguren la calidad y confiabilidad de los proyectos.

DISEÑO DE MEZCLA PARA CONCRETO TREMIE (280 kg/cm2-4000 PSI CON SikaPlast® MO)

El consorcio Educación C & G-MH Remitió a NHSQ Ingeniería S.A.S muestras de agregados fino y grueso, provenientes del rio Guayuriba, junto con el cemento Cemex de uso Estructural con el propósito de realizar la dosificación de mezcla para concreto Tremie de resistencias a la compresión de (280 kg/cm2-4000 PSI) con aditivo SikaPlastR MO.

Para lo anterior se determina la cantidad de materiales para la elaboración del diseño de mezcla de un concreto que satisfaga los requerimientos de uso, teniendo en cuenta la economía y que cumpla con las especificaciones requeridas en el contrato de obra.

Tabla 13

diseño de mezcla para un metro cubico de concreto.

DOSIFICACIÓN DE MATERIAL PARA UN METRO CUBICO DE CONCRETO							
MATER IAL	PESO SECO Kg	MASA UNITARIA SUELTA (Kg/m3)	VOLUMEN M3	BALDES DE 7 LITROS	BALDES DE 8 LITROS	BALDES DE 10 LITROS	MATERIAL SUELTO
CEMENTO USO GENERAL	4.250			8,4 SACOS	8,4 SACOS	8,4 SACOS	8.4 SACOS
AIRE							
AGUA	2.593	10.000	00.259	31,2 BALDES	27.3 BALDES	21,9 BALDES	219 LITROS
GRAVA	7.581	14.184	00.534	64,4 BALDES	56.3 BALDES	45,0 BALDES	0,45 M3 X M3
ARENA	12.369	1Só3.1	00.791	95.3 BALDES	83.4 BALDES	66,7 BALDES	0,67 M3 X M3
SikaPlast MO				3,33 LITROS	3,33 LITROS	3,33 LITROS	3,33 LITROS
TOTAL	26.793						

Nota. Fecha de informe 01-12-2023.

La tabla anterior describe la dosificación requerida para la elaboración de concreto tremie, mezclado en obra o en planta. Se describe la cantidad de cada uno de los materiales.

La calidad nace desde la planeación, es por ello que Consorcio Educación C&G-MH, establecerá la forma y medios idóneos para el control de calidad en la producción de concreto cumpliendo el plan de inspección de ensayos, se presentan los ensayos a compresión de los cilindros de concreto. Ver anexo 5. Ensayos de cilindros de concreto.

Basándonos en la norma NSR-10, capítulo C.5, sub capítulo C.5.6.2.1, "para los ensayos de resistencia de cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse no menos de una vez al día, ni menos de una vez por cada 40 m3 de concreto, ni menos de una vez por cada 200 m2 de superficie de losas o muros. De igual manera, como mínimo, debe tomarse una muestra por cada 50 tandas de mezclado de cada clase de concreto".

"Cuando en un proyecto dado el volumen total de concreto sea tal que la frecuencia de ensayos

requerida por C.5.6.2.1 proporcione menos de cinco ensayos de resistencia para cada clase dada de concreto, los ensayos deben hacerse por lo menos en cinco tandas de mezclado seleccionadas al azar, o en cada tanda cuando se empleen menos de cinco".

En el presente mes se tomaron *Ensayos de Resistencia* en los elementos correspondientes a los anillos de recubrimiento para Caisson en los modulos A, B, C Y E en los edificios Auditorio, Administrativo, educativo y polideportivo correspondientemente.

Ilustración 14



Tabla 14

Ensayo de Resistencia de Cilindros de Concreto 4000 PSI

Elementos	Resistencia Diseño (PSI)	Fecha Toma Muestra	Edad Ensayo (Días)	Fecha Rotura	Resistencia a la Rotura (PSI)	%Resistencia Respecto a f`c
ANILLO 2 CAISSON A4, A2, A3, A5, A6 POLIDE/CAISSON L9 ANILLO 7, L11 ANILLO 5 EDUCATIV	4000	06/12/2023	7	-	-	-
			14	-	-	-
			28	03/01/2024	4887	122,20
ANILLO 2 CAISSON A2, A3, A4, A5, A6 ADMI Y CAISON L11 ANILLO 7 EDUC	4000	07/12/2023	7	-	-	-
			14	-	-	-
			28	04/01/2024	6237	155,90
	4000	11/01/2024	7	18/12/2023	-	-

Elementos	Resistencia Diseño (PSI)	Fecha Toma Muestra	Edad Ensayo (Días)	Fecha Rotura	Resistencia a la Rotura (PSI)	%Resistencia Respecto a f'c
ANILLO 3 CAISSON A5, A2, A3, A4, A6 POLODEPORTIVO Y CAISSON N9 ANILLO 6 MODULO EDUCATIVO			14	25/12/2023	-	-
			28	08/01/2024	4231	108,80
CAISSON J13 ANILLO 4 (ANILLO 3 CAISSON K11, ANILLO 7 CAISSON O11 EDUCATIVO Y CAISSON B1, B2, B3, B4, B5, B6 MODULO POLIDEPORTIVO)	4000	14/01/2024	7	21/12/2023	-	-
			14	28/12/2023	-	-
			28	11/01/2024	4134	103,40
CAISSON M9 ANILLO 5 (CAISSON J9 ANILLO 3, CAISSON, ANILLO 6 CAISSON P13 Y M6 EDUCATIVO	4000	18/12/2023	7	25/12/2023	-	-
			14	01/01/2024	4148	103,70
			28	15/01/2024	4460	111,70
CAISSON L13 ANILLO 5(CAISSON J13 ANILLO #5) Y CAISSON J9 ANILLO #5 MODULO EDUC	4000	10/01/2024	7	17/01/2024	2288	72,20
			14	14/01/2024	3526	88,20
			28	07/02/2024	-	-
CAISSON J-13 ANILLO 7 (K9 ANILLO 7 , J9 ANILLO 7 Y J6 ANILLO 7) EDUCATI	4000	12/01/2024	14	26/01/2024	3594	89,90
			28	09/02/2024	-	-
			28	09/02/2024	-	-
CAISSON A-6 ANILLOS POLIDEPORTIVO (CAISSON I-10 ANILLO 4 ADMIN	4000	13/01/2024	14	29/01/2024	4981	124,50
			28	12/02/2024	-	-
			28	12/02/2024		
013 ANILLO 7(CAISSON J-13 ANILLO7) CAISSON K-9 ANILLO 7 EDUC	4000	15/01/2024	14	29/01/2024	4688	117,20
			28	12/02/2024	-	-
			28	12/02/2024	-	-
H8 ANILLOS 5 (CAISSON H-10 ANILLOS CAISSON I-10 ANILLO 4 ADMIN	4000	15/10/2024	14	29/01/2024	3793	94,80
			28	12/02/2024	-	-
			28	12/02/2024	-	-

Elementos	Resistencia Diseño (PSI)	Fecha Toma Muestra	Edad Ensayo (Días)	Fecha Rotura	Resistencia a la Rotura (PSI)	%Resistencia Respecto a f`c
CAISSON I-10 ANILLO 6 CAISSON H-8 ANILLO 6 ADMINIT	4000	17/01/2024	7	24/01/2024	4711	117,80
			14	31/10/2024	4914	122,80
			28	14/02/2024-	-	-
CAISSON P-6 ANILLO 9 CAISSON 0-6 ANILLO 9 EDUCATI	4000	17/01/2024	7	24/01/2024	4765	119,10
			14	31/10/2024	4891	122,30
			28	14/02/2024-	-	-
CAISSON B-2 ANILLO 1 (CAISSON B-3 ANILLO 1 CAISSON E2 CAISSON E-4 ANILLO 1 AUDITORI	4000	18/01/2024	7	25/01/2024	4439	111,00
			14	01/02/2024	-	-
			28	14/02/2024	-	-
CAISSON B-1 ANILLO 2 (CAISON B2 ANILLO 2 CAISSON E4 ANILLO 1 AUDITORIO	4000	20/01/2024	7	27/01/2024	3872	96,80
			14	03/02/2024	-	-
			28	17/02/2024	-	-
CAISSON I10 ANILLO 8 (CAISSON I12 MODULO ADMINISTRATIVO)	4000	20/01/2024	7	27/01/2024	4877	121,90
			14	03/02/2024	-	-
			28	17/02/2024	-	-

Ilustración 15

Análisis Estadístico a 7 días del Hormigón 4000 Psi

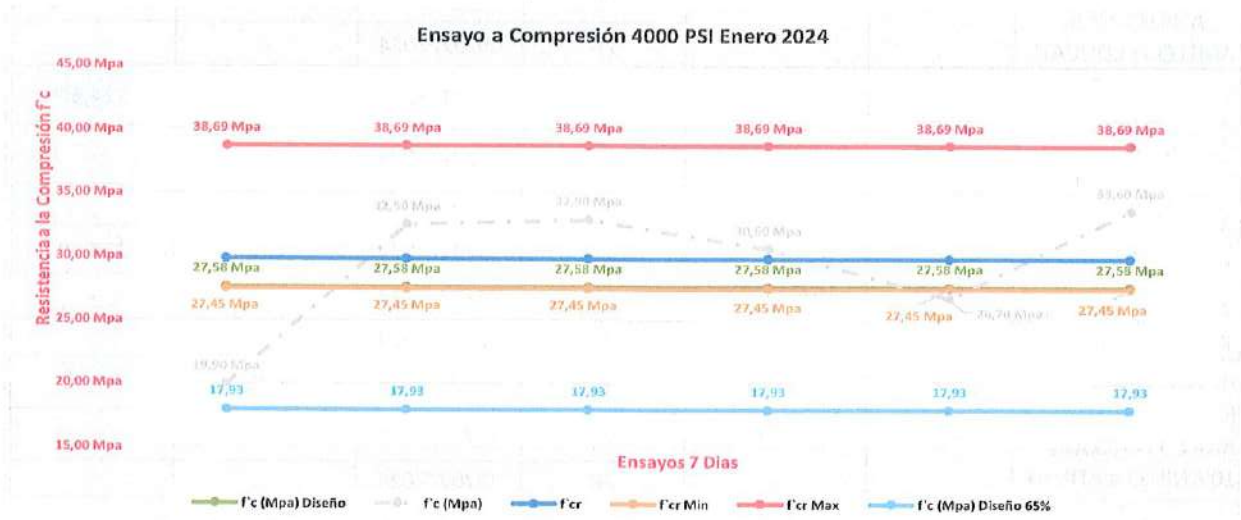


Ilustración 16

Análisis Estadístico a 14 días del Hormigón 4000 Psi


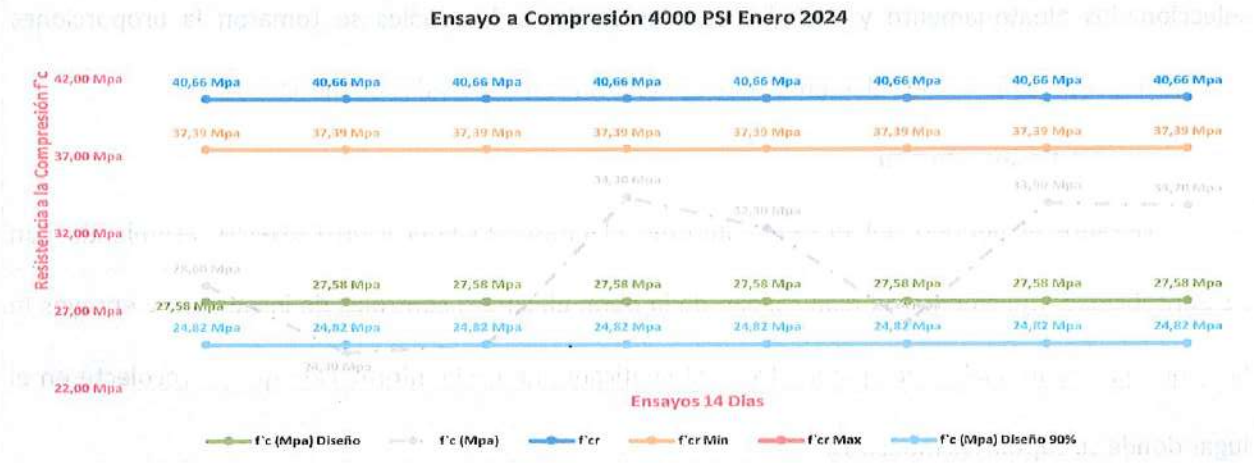


Ilustración 17

Análisis Estadístico a 28 días del Hormigón 4000 Psi

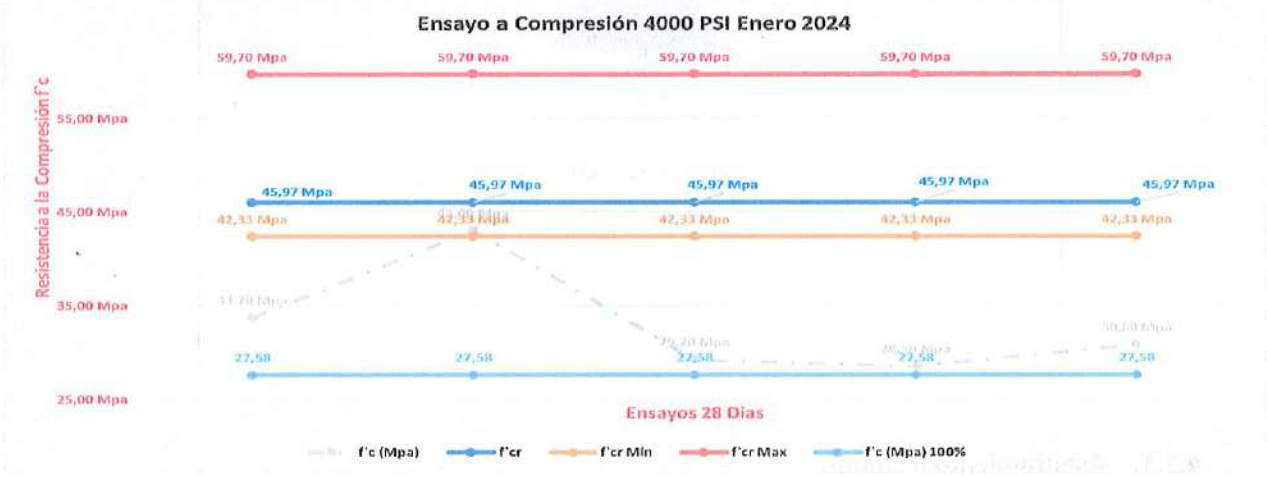

Continuando con la norma NSR-10, capítulo C.5, sub capítulo C.5.6.2.1, "Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m^3, no se requieren ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por el supervisor técnico".

El ensayo de resistencia a la compresión macará la pauta para la calidad del concreto, es por ello, y referenciado en lo descrito en párrafos anteriores en mención a la norma NSR-10, capítulo C.5, las

muestras de concreto deben obtenerse de forma aleatoria, siendo una porción representativa del concreto fresco donde se realizará el vertido en los elementos, es decir, el o los elementos seleccionados aleatoriamente y vaciados con las tandas a las cuales se tomaron la proporciones significativa representarán los elementos que se llenaron con esa tandas de mezclados.

4.1. Ensayos In Situ.

Durante el periodo del presente informe el Consorcio Educación C&G-MH, asumiendo con responsabilidad implementar el plan calidad de la obra, ejecutará controles de inspección y ensayos In Situ, que permitan analizar los parámetros sistemáticamente de la información que se recolecte en el lugar donde se captan las muestras.

Ilustración 18

Esquema de Ensayos In Situ para Concretos



4.1.1. Asentamiento o Slump.

Tabla 15 *Ensayo Asentamiento o Slump*

Elemento	Concreto PSI	Fecha Toma de Muestra	Asentamiento o Slump
CAISSON B-2 ANILLO 1 (CAISSON B-3 ANILLO 1 CAISSON E2 CAISSON E-4 ANILLO 1 AUDITORIO	4000	18/01/2024	7"
CAISSON B-1 ANILLO 2 (CAISON B2 ANILLO 2 CAISSON E4 ANILLO 1 AUDI	4000	20/01/2024	6"

Elemento	Concreto PSI	Fecha Toma de Muestra	Asentamiento o Slump
CAISSON H13 ANILLO 3 CAISSON H12 ANILLO 7 CAISSON G12 ANILLO 6 ADMI	4000	26/01/2024	7"
CAISSON A7 ANILLO 1 CAISSON E1 ANILLO 4 CAISSON F1 ANILLO 3 AUDI	4000	26/01/2024	6"
CAISSON F1 ANILLO4 CAISSON A1, ANILLO 4 CISSON B5 ANILLO 4 CAISSON E7 ANILLO 2 AUDITORIO	4000	29/01/2024	6"

Nota. Periodo Comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024.

En relación, a la prueba slump los elementos seleccionados en la tabla anterior, son como muestras representativas del lote fabricado para los caisson de los módulos Educativo, Polideportivo, Administrativo y auditorio. Como el tipo de concreto a utilizar es de una gran docilidad por su consistencia o capacidad para adaptarse manteniéndose homogéneo con un mínimo de vacíos, el diseño de mezcla indica un asentamiento entre 5" y 7", se evidencia una diferencia entre el slump del diseño y el tomado en campo al cual tenemos una tolerancia de ± 2,5" para asentamientos oscilan entre 4" y 6", ACI-318.

Ilustración 19

Asentamiento o Slump



Es por ello, que aplicar un control de calidad del concreto con la finalidad de evaluar sus propiedades durante la producción como la fluidez de la mezcla, asentamiento, temperatura y el parámetro principal mediante tomas de muestras en obra mediante el ensayo a compresión y otras que por sus características no destructivas deriven por las necesidades de obra.

Los ensayos geotécnicos In Situ, constituirán unas series de técnicas independientes con el fin común de obtenerte las caracterizaciones físicas y mecánicas de los suelos, bases o sub bases a utilizar en el proyecto. En este sentido, las mediciones con el telurómetro del subsuelo permite establecer la configuración óptima del sistema de toma de tierra a proyectar, la resistividad del terreno determina los parámetros del proyecto del sistema de puesta a tierra como la profundidad óptima de enterramiento.

Ilustración 20



5. INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El presente informe refleja las actividades realizadas en el período comprendido entre el 01 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024, por el componente de SST del Consorcio Educación C&G-MH, con el objetivo de crear entornos de trabajo saludables y seguros, ejecutando el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, aplicando las medidas necesarias para minimizar los riesgos existentes en el proyecto, cumpliendo con lo establecido en la normatividad legal vigente (Resolución 0312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015).

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
Levantamiento y Replanteo Topográfico	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificación condiciones del terreno como desniveles o superficies irregulares y la existencia de líneas energizadas y/o de servicios públicos (acueducto, alcantarillado y gas domiciliario, reportar y señalizar). -Charla y/o capacitaciones antes de iniciar actividades. -Inspección de equipos y herramienta menor a utilizar -Utilización de Elementos de Protección Personal-EPP durante la ejecución de actividades. -Disponer de Hidratación en el área de trabajo y uso de protección en caso de temperaturas extremas (rayos solares) como monja o capuchón, guantes y gafas. -Realizar Pausas Activas. - En caso de lluvias y condiciones climáticas tormentas y/o vientos fuertes, suspender actividad y salvaguardarse. Reanudar cuando las condiciones sean favorables.
	-Identificación y Notificación de peligros y riesgos existentes en el área e inspección (verificar condiciones del terreno y el entorno).

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
Excavación Manual y Construcción de Caisson en Módulos Educativo, Administrativo y Polideportivo.	-Personal certificado en Alturas y Espacios Confinados (Verificación de cursos en plataforma de Ministerio de Trabajo) -Inducción y Charla previa a iniciar actividades -Inspección de Herramienta menor a utilizar -Uso de Elementos de Protección Personal –EPP, durante la ejecución de actividad. -Uso de ventilación dentro de la excavación -Rotación de personal en la excavación durante la ejecución de la actividad. -Pausas activas e higiene postural al manipular cargas y -Ubicar el material extraído mínimo a un metro del borde de la excavación. -Revisión periódica del terreno (paredes) especialmente después de presentarse lluvias. -Disponer de puntos de hidratación para el personal. -Orden y aseo en el área de trabajo.
Demolición y fracturación de roca con agente químico y/o expansivo en Caisson	-Personal Certificado en la ejecución de la tarea (Manejo de Explosivos, Alturas y Espacios Confinados). -Disponer de ficha de seguridad (FDS), en el área de trabajo. -Almacenar en sitio seguro y ventilado el producto químico y que su manipulación sea realizado por el personal idóneo. - Identificación y notificación de Peligros y Riesgos al personal ejecutor. - Charlas y capacitaciones previas a iniciar labores. Pausas Activas -Inspección de área de trabajo (verificación de condiciones del Caisson y del entorno) -Inspección de equipos y Herramientas a utilizar. -Ventilación dentro de la excavación -Uso correcto de Elementos de Protección Personal-EPP, durante la ejecución de la actividad.

Actividades Realizadas en Obra	Medidas de Prevención
	-Informar previo a realizar la explosión controlada (solo personal autorizado en el área de trabajo). -Disponer de hidratación para el personal. -Despejar área posterior a la explosión (dispersión del humo emanado)
Estructuras de Modulo Preescolar: Anclaje e instalación de lámina de acero para columnas metálicas -	-Identificación y notificación de Peligros y Riesgos al personal ejecutor. - Charlas y capacitaciones previas a iniciar labores. -Personal Certificado (trabajo en alturas) -Pausas Activas -Inspección de área de trabajo (superficies y desniveles) -Definir accesos y áreas de tránsito del personal. -Inspección de equipos y Herramientas a utilizar. -Uso correcto de Elementos de Protección Personal-EPP, durante la ejecución de la actividad. -Disponer de hidratación para el personal. -Orden y Aseo (disposición adecuada de residuos generados) y limpieza de herramientas -Almacenamiento de equipos y herramientas -Ubicación y Señalización de Elementos de emergencia existentes en obra.


Nota. Periodo Comprendido del de enero de 2024 al 31 de enero de 2024.

5.1. Relación del Personal Empleado en la Ejecución de la Obra en el Mes.

En el desarrollo del periodo del 01 de enero al 31 de enero de 2024, se cuentan con colaboradores que participan según su formación y conocimiento en las diferentes actividades puestas en prácticas, por consiguiente, se relacionan al presente informe el personal que hace parte del proyecto los que componen el Consorcio Educación C&G-MH, como el de los diferentes subcontratistas que laboran en la obra.

Ilustración 21

Personal Vinculado por Empresas enero 2024

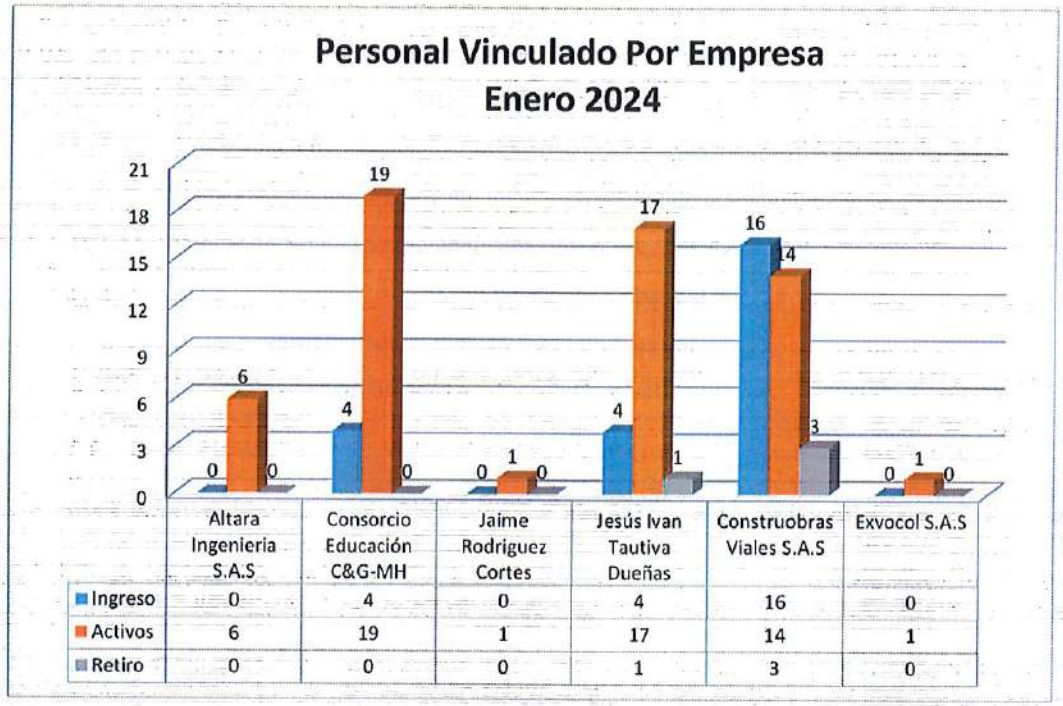

	Altara Ingeniería S.A.S	Consorcio Educación C&G-MH	Jaime Rodríguez Cortes	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	Construobras Viales S.A.S	Exvocol S.A.S
Ingreso	0	4	0	4	16	0
Activos	6	19	1	17	14	1
Retiro	0	0	0	1	3	0

Además, se lleva una matriz de control del personal directo e indirecto de obra por trabajador y por empresa las que continúan y/o terminen sus labores con el objeto de controlar la autoliquidación de la seguridad social.

Personal Vinculado por Profesión enero 2024



Tabla 22

Relación del Personal Profesional en Obra

Nombre	Cédula	Tarjeta Profesional	Cargo	EPS	AFP	ARL	CCF
José Marx Reyes	79.782.465	A25041999-79685757	Director de Obra	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Pedro López Ostos	79.949.909	25202-112099	Residente de Obra	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COLSUBSIDIO
Lina Fernanda Urrego	1.053.797.649	17202-195361	Residente de Obra	FOSYGA	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COLSUBSIDIO
Jeimy Viviana Echeverry Rodríguez	1.014.272.125	25202-356744 CND	Residente de Obra	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR
Jaime Buitrago Nova	79.464.037	25202.43302	Especialista de Estructuras	FAMISANAR	COLPENSIONES	COLPATRIA	COMPENSAR
Edgar Javier Gutiérrez B.	80.122.216	CN205-71295	Ingeniero Eléctrico	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA	COMPENSAR
Claudia Patricia Rodríguez H.	1.010.165.507	25335-200159 CND 25202-347946 CND	Ingeniero Hidráulico	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA SEGUROS	COMPENSAR
Diana Carolina Vega	40.217.089	Resolución 3831	Profesional SST	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
María del Pilar Sepúlveda Suarez	1.018.427.594	1779151023	Profesional Social	SANITAS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	COFREM

Nombre	Cédula	Tarjeta Profesional	Cargo	EPS	AFP	ARL	CCF
Astrid Ruiz González	40.341.812	25238-366217 CND	Ingeniera Ambiental	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Joel Pineda Sandoval	1.126.246.825	25202-388151CND	Ingeniero	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	COFREM
Leidy Natalia Martínez	1.020.807.368	-	Profesional en Finanzas	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Juan Sebastián Calderón Rodríguez	1.121.945.997	0911037-0581731 CND	Residente Administrativo	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM

Nota. Ver anexo. Pago de seguridad social.

Tabla 23

Relación del Personal no Profesional del Contratista de Obra

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF
Sol Lourdes Ramírez	28.589.257	Controladora Vial	Consorcio Educación C&G-MH	CAJACOPI	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Ángela María Silva	1.121.904.972	Controladora Vial	Consorcio Educación C&G-MH	CAJACOPI	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Camilo Gómez Rodríguez	1.006.860.529	Almacenista	Consorcio Educación C&G-MH	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COFREM
Miguel García Buelvas	1.121.904.981	Ayudante	Consorcio Educación C&G-MH	CAJACOPI	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COFREM
Brayan Sneider Urquiza Barrera	1.193.089.901	Ayudante de Obra	Consorcio Educación C&G-MH	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Anderson Camilo Urquiza Barrera	1.006.797.237	Ayudante de Obra	Consorcio Educación C&G-MH	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM

Nota. Ver anexo. Pago de seguridad social.

Tabla 16

Relación del Personal de Contratistas de Obra

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF
Martin Peña Arias	91.447.961	Operador Bomba Estacionaria	Altara Ingeniería S.A.S	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Brayan Herrera Hernández	1.234.788.329	Operador Excavadora Hidráulica	Altara Ingeniería S.A.S	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Leider Cardona Barrera	1.006.516.356	Operador de Minicargador	Altara Ingeniería S.A.S	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Diosnell José Mosqueda Torres	5386773	Auxiliar de Planta Concreto	Altara Ingenieria S.A.S	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Diego Alexander Burgos Barbosa	79.947.504	Operador de Planta de Concreto	Altara Ingenieria S.A.S.	FAMISANAR	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Juan Eduardo Torres Traslaviña	1.000.219.013	Ayudante Bomba Estacionaria	Altara Ingenieria S.A.S	CAJACOPI	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Jesús Iván Tautiva Dueñas	86.048.539	Ingeniero Civil	Jesús Iván Tautiva Dueñas	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Nicolás Ramírez Rodríguez	1.121.938.987	Ingeniero Civil	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Axón Murillo Mosquera	8.116.085	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	COFREM
Cesar Tulio Torres Maturana	1.078.456.783	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	COFREM
Edwin Mosquera Córdoba	1.018.438.040	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	COFREM
Jhon Fredys Bonilla Palacios	1.010.165.547	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	COFREM
Juan Carlos Moreno Palomeque	1.033.714.256	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Wilmar Alberto Álvarez Mesa	1.088.266.262	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	COFREM

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF
Diego Fernando Vázquez Tautiva	9.529.016	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
José Alexis Palacios Murillo	71.990.028	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Harry Valencia Chaverra	1.193.089.901	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Jhon Alexander Gamboa	1.128.525.438	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Brayan Stiven Palacio Chaverra	1.077.438.395	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Jesús Aníbal Reyes Chacón	86.088.695	Maestro de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Héctor Quejada Valoyes	11.791.906	Oficial de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COFREM
Ángel Pérez Peña	17.330.024	Ayudante de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COFREM
Gilber Medina Villamor	1.006.810.122	Ayudante de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Jaime Rodríguez Cortes	93.201.155	Topógrafo	Jaime Rodríguez Cortes	COMPENSAR	PROTECCIÓN	SURA	-
Carlos Islen Plata González	1.032.366.062	Operario de Explosivos	EXVOCOL S.A.S.	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMPENSAR
Juan Carlos Escobar Rentería	1073322160	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S.	NUEVA EPS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Orlando Hinestroza Córdoba	71.762.284	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Eugenio Mena Medina	1.076.018.185	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SURA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Yerlintong Murillo Pino	1.025.643.730	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SURA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
José Clemente Mosquera Perea	1.010.064.371	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF
Cruz Marino Copete Copete	79.947.504	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SURA EPS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Ignacio C. Murillo Bedoya	71.939.286	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Leyser Córdoba Mosquera	1.129.044.302	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SURA EPS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
José Dayle Murillo Palacios	71.386.581	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
José Maurilio Valencia Rivas	11.636.114	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
José Leiser Palacios Moreno	1.078.857.349	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Jahson Olider Lezcano Cuesta	1.042.732.197	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SALUD TOTAL	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Gonzalo E. Calle	11.807.151	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SALUD TOTAL	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Eber Wilinton Palacios Pérez	11.801.617	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SALUD TOTAL	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Abraham Córdoba Cuesta	71.936.468	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SURA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
José Ignacio Valencia Moreno	71.938.949	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	NUEVA EPS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Marín Mosquera Ibarguen	71.780.439	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR

Nota. Ver anexo. Pago de seguridad social.

Tabla 25

Relación Fecha Ingreso vs Fecha Retiro del Personal Profesional en Obra

Nombre	Cédula	Empresa	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Mes
José Marx Reyes	79.782.465	Consorcio Educación C&G-MH	20/06/2023	-	Ene-24
Pedro López Ostos	79.949.909	Consorcio Educación C&G-MH	01/07/2023	-	Ene-24
Lina Fernanda Urrego	1.053.797.649	Consorcio Educación C&G-MH	01/07/2023	-	Ene-24
Jeimy Viviana Echeverry Rodríguez	1.014.272.125	Consorcio Educación C&G-MH	20-05-2023	-	Ene-24
Jaime Buitrago Nova	79.464.037	Consorcio Educación C&G-MH	01/06/2023	-	Ene-24
Edgar Javier Gutiérrez B.	80.122.216	Consorcio Educación C&G-MH	01/01/2024	-	Ene-24
Claudia Patricia Rodríguez H.	1.010.165.507	Consorcio Educación C&G-MH	01/01/2024	-	Ene-24
Diana Carolina Vega	40.217.089	Consorcio Educación C&G-MH	17/07/2023	-	Ene-24
María del Pilar Sepúlveda Suarez	1.018.427.594	Consorcio Educación C&G-MH	20-05-2023	-	Ene-24
Astrid Ruiz González	40.341.812	Consorcio Educación C&G-MH	20-05-2023	-	Ene-24
Joel Pineda Sandoval	1.126.246.825	Consorcio Educación C&G-MH	13/03/2023	-	Ene-24
Leidy Natalia Martínez	1.020.807.368	Consorcio Educación C&G-MH	28/06/2023	-	Ene-24
Juan Sebastián Calderón Rodríguez	1.121.945.997	Consorcio Educación C&G-MH	27/01/2024	-	Ene-24

Relación Fecha de Ingreso vs Fecha Retiro del Personal no Profesional del Contratista

Tabla 26

Relación Fecha de Ingreso vs Fecha Retiro del Personal no Profesional del Contratista

Nombre	Cédula	Empresa	Fecha ingreso	Fecha retiro	Mes
Sol Lourdes Ramírez	28.589.257	Consorcio Educación C&G-MH	11/07/2023	-	Ene-24
Ángela María Silva	1.121.904.972	Consorcio Educación C&G-MH	11/07/2023	-	Ene-24
Camilo Gómez Rodríguez	1.006.860.529	Consorcio Educación C&G-MH	16/08/2023	-	Ene-24
Miguel Ángel García	1.121.904.898	Consorcio Educación C&G-MH	19/09/2023	-	Ene-24
Brayan Sneider Urquiza	1.193.089.901	Consorcio Educación C&G-MH	11/12/2023	-	Ene-24
Anderson Camilo Urquiza Barrera	1.006.797.237	Consorcio Educación C&G-MH	30/01/2024	-	Ene-24

Tabla 27

Relación Fecha de Ingreso vs Fecha Retiro del Personal de Contratistas de Obra

Nombre	Cédula	Empresa	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Mes	Curso de Altura	Fecha	Curso Espacio Confinado	Fecha
Martin Peña Arias	91.447.961	Altara Ingeniería S.A.S	22/08/2023	-	Ene-24	-	-	-	-

Nombre	Cédula	Empresa	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Mes	Curso de Altura	Fecha	Curso Espacio Confinado	Fecha
Brayan Herrera Hernández	1.234.788.329	Altara Ingeniería S.A.S	05/08/2023	-	Ene-24	-	-	-	-
Leider Cardona Barrera	1.00.6516.356	Altara Ingenieria S.A.S	18/11/2023	-	Ene-24	-	-	-	-
Diosnell José Mosqueda Torres	5386773	Altara Ingenieria S.A.S	18/11/2023	-	Ene-24	-	-	-	-
Diego Alexander Burgos Barbosa	1.013.656.142	Altara Ingenieria S.A.S	07/12/2023	-	Ene-24	-	-	-	-
Juan Eduardo Torres Traslaviña	1.000.219.013	Altara Ingenieria S.A.S	07/12/2023	-	Ene-24	-	-	-	-
Iván Tautiva Dueñas	86.048.539	Jesús Iván Tautiva Dueñas	29/08/2023	-	Ene-24	-	-	-	-
Nicolás Ramírez Rodríguez	1.121.938.987	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	17/10/2023	-	Ene-24	-	-	-	-
Axón Murillo Mosquera	8.116.085	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	01/11/2023	-	Ene-24	SI	30-10-2023	SI	04-12-2022
Cesar Tulio Torres Maturana	1.078.456.783	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	01/11/2023	-	Ene-24	SI	29-10-2023	SI	14-01-2023

Nombre	Cédula	Empresa	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Mes	Curso de Altura	Fecha	Curso Espacio Confinado	Fecha
Edwin Mosquera	1.018.438.040	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	01/11/2023	-	Ene-24	SI	30-10-2023	SI	04-12-2022
Jhon Fredys Bonilla Palacios	1.010.165.547	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	01/11/2023	-	Ene-24	SI	29-10-2023	SI	06-05-2022
Juan Carlos Moreno Palomeque	1.033.714.256	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	01/11/2023	-	Ene-24	SI	29-10-2023	SI	26-04-2022
Wilmar Alberto Álvarez Mesa	70.257.108	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	01/11/2023	-	Ene-24	SI	29-10-2023	SI	14-05-2023
José Alexis Palacios Murillo	11.780.179	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	05/12/2023	-	Ene-24	SI	30-10-2023	SI	21-11-2023
Diego Fernando Vázquez Tautiva	1.121.946.169	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	11/11/2023	-	Ene-24	-	-	-	-
Harry Valencia Chaverra	1.128.535.438	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	11/12/2023	-	Ene-24	SI	13-12-2023	SI	12-11-2023
Jhon Alexander Gamboa Bejarano	1.077.438.395	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	11/12/2023	-	Ene-24	SI	13-12-2023	SI	12-11-2023
Brayan Stiven Palacio Chaverra	1.031.183.322	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	11/12/2023	-	Ene-24	-	-	-	-
Jesús Aníbal Reyes Chacón	86.088.695	Jesús Iván Tautiva Dueñas	25/01/2024	-	Ene-24	SI	16-01-2024 (Coordinador)	-	-
Héctor Quejada Valoyes	11.791.906	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	25/01/2024	-	Ene-24	SI	12-12-2023		
Ángel Pérez Peña	17.330.024	Jesús Iván Tautiva Dueñas	25/01/2024	-	Ene-24	SI	12-12-2023	-	-

Nombre	Cédula	Empresa	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Mes	Curso de Altura	Fecha	Curso Espacio Confinado	Fecha
Gilber Medina Villamor	1.006.810.122	Jesús Iván Tautiva Dueñas	25/01/2024	-	Ene-24	-	-	-	-
Jaime Rodríguez Cortes	93.201.155	Jaime Rodríguez Cortes	06/09/2023	-	Ene-24	-	-	-	-
Carlos Islen Plata González	1.032.366.062	Exvocol S.A.S.	15/11/2023	-	Dic-23	SI	11-11-2023	SI	29-08-2023
Juan Carlos Escobar Rentería	71.940.541	Construobras Viales S.A.S	14/11/2023	-	Ene-24	SI	17-11-2023	SI	06-10-2023
Orlando Hinestroza Córdoba	71.990.028	Construobras Viales S.A.S	12/01/2024		Ene-24	SI	21-12-2023	SI	20-02-2022
Eugenio Mena Medina	1.027.940.549	Construobras Viales S.A.S	12/01/2024		Ene-24	SI	14-01-2023	SI	12-02-2023
Yerlintong Murillo Pino	11.814.999	Construobras Viales S.A.S	12/01/2024		Ene-24	SI	23-09-2023	SI	28-05-2022
José Clemente Mosquera Perea	1.010.064.371	Construobras Viales S.A.S	12/01/2024		Ene-24	SI	03-03-2023	SI	05-03-2023
Cruz Marino Copete Copete	79.947.504	Construobras Viales S.A.S	12/01/2024		Ene-24	SI	03-11-2023	SI	05-03-2023
Ignacio C. Valencia	71.938.949	Construobras Viales S.A.S	25/01/2024		Ene-24	SI	20-01-2024	SI	03-08-2022
Leyser Córdoba Mosquera	1.129.044.302	Construobras Viales S.A.S	25/01/2024		Ene-24	SI	20-01-2024	SI	16-10-2022
José Dayle Murillo Palacios	71.386.581	Construobras Viales S.A.S	25/01/2024	30/01/2024	Ene-24	SI	20-01-2024	SI	16-10-2022
José Maurilio Valencia Rivas	11.636.114	Construobras Viales S.A.S	25/01/2024		Ene-24	SI	20-01-2024	SI	08-10-2023
José Leiser Palacios Moreno	1.078.857.349	Construobras Viales S.A.S	25/01/2024		Ene-24	SI	20-01-2024	SI	16-04-2023
Jahson Olider Lezcano Cuesta	1.042.732.197	Construobras Viales S.A.S	25/01/2024		Ene-24	SI	20-01-2024	SI	16-12-2022

Nombre	Cédula	Empresa	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Mes	Curso de Altura	Fecha	Curso Espacio Confinado	Fecha
Gonzalo E. Calle	11.807.151	Construobras Viales S.A.S	25/01/2024		Ene-24	SI	20-01-2024	SI	03-08-2022
Eber Wilinton Palacios Pérez	11.801.617	Construobras Viales S.A.S	25/01/2024		Ene-24	SI	20-01-2024	SI	14-03-2022
Abraham Córdoba Cuesta	71.936.468	Construobras Viales S.A.S	30/01/2024		Ene-24	SI	20-01-2024	SI	02-10-2022
Marín Mosquera Ibarguen	71.780.439	Construobras Viales S.A.S	30/01/2024	30/01/2024	Ene-24	SI	20-01-2024	SI	30-11-2023

5.2. Registro de Entrega, Reemplazo de EPP´s y Dotación.

El Consorcio Educación C&G-MH, adoptará las medidas necesarias para garantizar a sus trabajadores las condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar. Por ello, dotará de la ropa de protección adecuada para evitar daños a la salud, por consiguiente, es indispensable la entrega de dotación de los equipos de protección personal cuando los trabajadores ingresen por primera vez, el reemplazo o sustitución por cualquier daño que sufran los equipos a causa de las actividades laborales, como el registro sistemático de entrega de forma individual. Ver anexo Entrega **de elementos de protección personal.**

Ilustración 22

Entrega y Reemplazo de Equipos de Protección Personal



5.3. Procesos de Inducción al Ingreso de Obra.

Para el mes de enero de 2024, se presentaron un total de 15 ingresos de personal nuevo y 9 reingresos de trabajadores los cuales ingresaron anteriormente a la obra para las empresas contratistas y el Consorcio Educación C&G-MH, se procede a realizar los exámenes médicos pre empleo con la finalidad de conocer el estado de salud de los trabajadores al inicio de la relación laboral. (Ver anexo). Examen médico de ingreso

El personal recibió previo al inicio de sus actividades la inducción correspondiente para visualizar las condiciones que van a desarrollar en el ambiente laboral, la posibilidad de presencia de sustancias en el área de trabajo, los daños que las mismas puedan causar a su salud y los medios o medidas para prevenirlos, a continuación, se indican las inducciones impartidas. El personal que reingreso se realizó una socialización de las actividades, riesgos y peligros existentes en obra Ver anexo. Formato de inducción de ingreso.

Ilustración 23

Proceso de Inducción




Proceso de Inducción por Empresas

Inducciones de Ingresos	Consorcio Educación C&G-MH	Construobras Viales S.A.S
Información General del Proyecto	2	11
Horarios de Trabajos y Zonas Comunes	2	11
Políticas de Seguridad Y Salud en el trabajo	2	11
Cobertura de Seguridad Social, EPS, ARL, AFP, CCF	2	11
Notificación de Riesgos y Protocolos de Seguridad	2	11
Actos y Condiciones Inseguras	2	11
Reportes de Accidentes e Incidentes en el Trabajo	2	11
Normas de Seguridad, Uso de EPPS	2	11
Orden y Aseo en los Lugares de Trabajo	2	11

Nota. Periodo Comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024

Participación de Inducciones

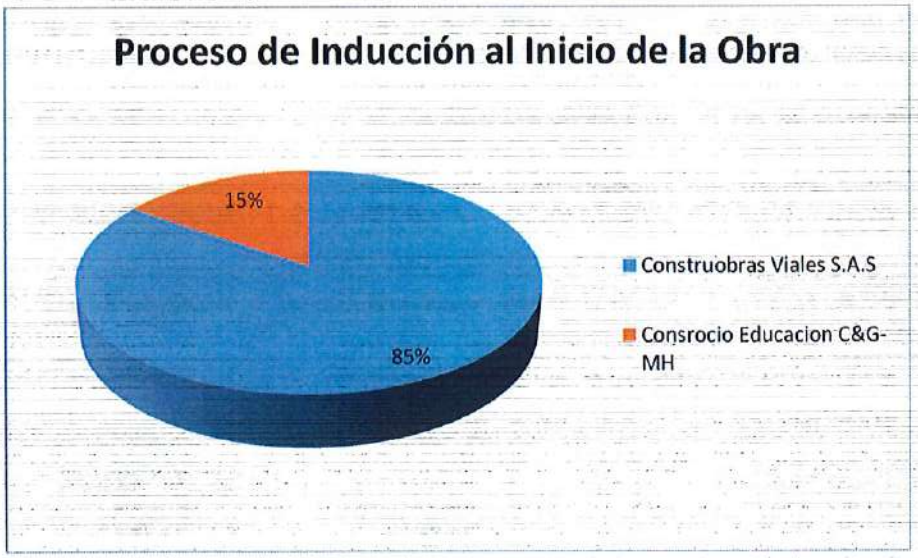

5.4. Charlas de Seguridad y Capacitaciones.

Nuestros colaboradores en el periodo actual reciben información teórica y práctica, adecuada y en forma periódica para las funciones inherentes a su actividad en la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Ver Anexo Charlas de seguridad y capacitaciones.

En la siguiente tabla se muestran las charlas y capacitaciones programadas para el mes de enero de 2024.

Tabla 17


Charlas de Seguridad y Capacitaciones

Fecha	Tema	Duración (min)	Cobertura de Participación
03/01/2024	Orden y Aseo en las áreas de trabajo (almacenamiento de objetos)	15	9
04/01/2024	Clasificación de residuos parte I y solicitud permisos (R.I.T)	15	8
05/01/2024	Clasificación de residuos parte II	15	10
06/01/2024	Reporte de actos y condiciones inseguras, tarjeta A.M.A.R.	15	16
09/01/2024	Uso, cuidado y mantenimiento de Elementos de Protección Personal	15	19
10/01/2024	Riesgo Locativo: Importancia de orden y aseo en la prevención de accidentes laborales.	15	22
11/01/2024	Contaminación del suelo	15	22
12/12/2024	Lavado de manos	15	12
13/01/2024	Estilos de vida saludable: (Hábitos Nocivos)	15	22
15/01/2024	Afecciones del sistema respiratorio (exposición a agentes biológicos y químicos)	15	29
16/01/2024	Inspección de elementos de protección personal (manos)	15	26
17/01/2024	Manejo del Estrés	15	20
18/01/2024	Riesgo Biológico: Picaduras y Mordeduras	15	28
19/01/2024	Riesgo Biomecánico: Manipulación de cargas	15	22

Fecha	Tema	Duración (min)	Cobertura de Participación
20/01/2024	Riesgo Eléctrico: Verificación de equipos (conexiones)	15	23
22/01/2024	Inspección de área de trabajo: Almacenamiento adecuado de elementos y objetos	15	26
23/01/2024	Riesgo Físico: Recomendaciones sobre temperaturas extremas (golpe de calor)	15	23
24/01/2024	Protección de Flora	15	12
25/01/2024	Riesgo mecánico: materiales proyectados	15	30
26/01/2024	Riesgo Biológico: Virus y Bacterias	15	25
27/01/2024	Riesgo Físico: El ruido	15	26
29/01/2024	Inspección de equipos y herramientas	15	19
30/01/2024	Recomendaciones de Autocuidado	15	27
31/01/2024	Riesgo Biomecánico: Sobreesfuerzos y posturas prolongadas	15	23


Charlas y Capacitación por Contratista



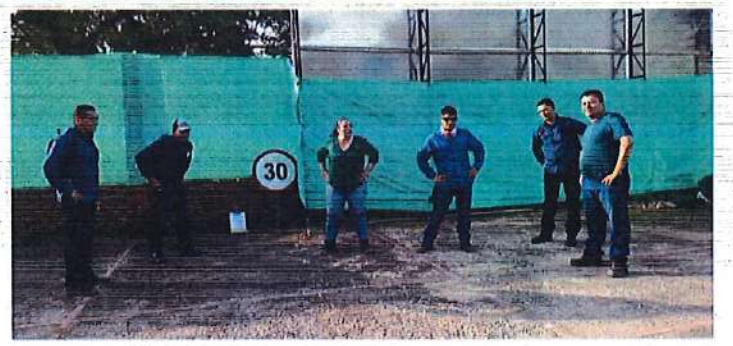

En la siguiente ilustración mostrara los porcentajes de la cobertura de participación por contratistas, indicando que el 100% de nuestros colaboradores participaron en los procesos de charlas y capacitaciones.

Charlas y Capacitación por Contratista

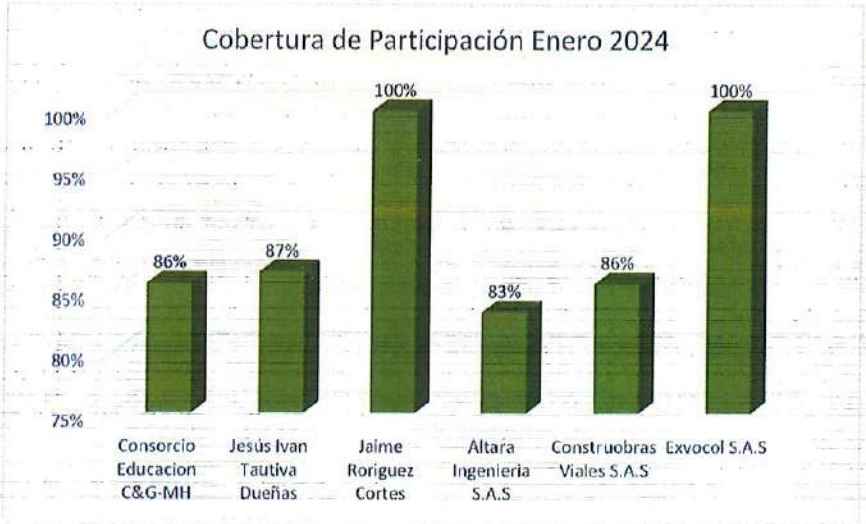

5.5. Control de Actividades de Alto Riesgo.

Para el desarrollo de todas las actividades consideradas de alto riesgo que por sus condiciones generales se ejecutan mediante la interacción de los elementos del proceso de trabajo y el individuo se establecerán parámetros y criterios de seguridad mediante profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo que cuenten con las competencias para validar y firmar los permisos de trabajo seguro como los permisos para trabajos en caliente, trabajos en alturas, trabajo en espacios confinados, excavaciones, izaje de cargas, etc.) y trabajos especiales no rutinarios. Durante el mes de enero 2024 se realizaron actividades de en las cuales se ejecutaron trabajos en alturas y en espacios confinados (Construcción de Caisson). (Ver anexo)

5.6. Inspecciones Planificadas.

La inspección es uno de los mejores instrumentos disponibles para descubrir los problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes y otras pérdidas. El descubrimiento de las condiciones y prácticas inseguras por medio de la inspección y su rápida corrección, son uno de los mejores métodos que pueda emplear el Consorcio Educación C&G-MH, para prevenir accidentes y proteger a sus trabajadores, así La dirección demuestra al personal su interés y sinceridad en la prevención de accidentes laborales.

Tabla 18


Inspecciones Planificadas

Ítem	Equipo a Inspeccionar	Frecuencia
1	Equipos de emergencia (Camilla, botiquín, extintor, etc.)	Mensual
2	Inspección de uso de la dotación y EPP´s	Mensual
3	Pre operacional (Maquinaria :Retroexcavadora, Minicargador, Planta de Concreto herramienta menor)	Diario
4	Inspección Locativa de área	Mensual

Ver anexo. Inspecciones planificadas.

Ilustración 24

Inspecciones Planificadas

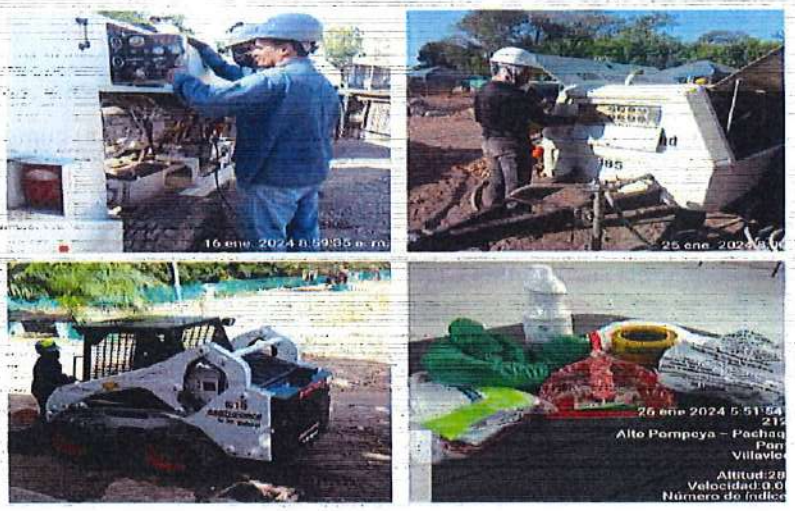


5.7. Accidentabilidad.

En el mes de enero de 2024, no se presentaron eventos que produzcan una lesión corporal o funcional resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por lo cual no se presenta ausentismo laboral. (Ver anexo certificado de accidentalidad emitido por ARL)

Ilustración 25

Indicadores de Accidentabilidad

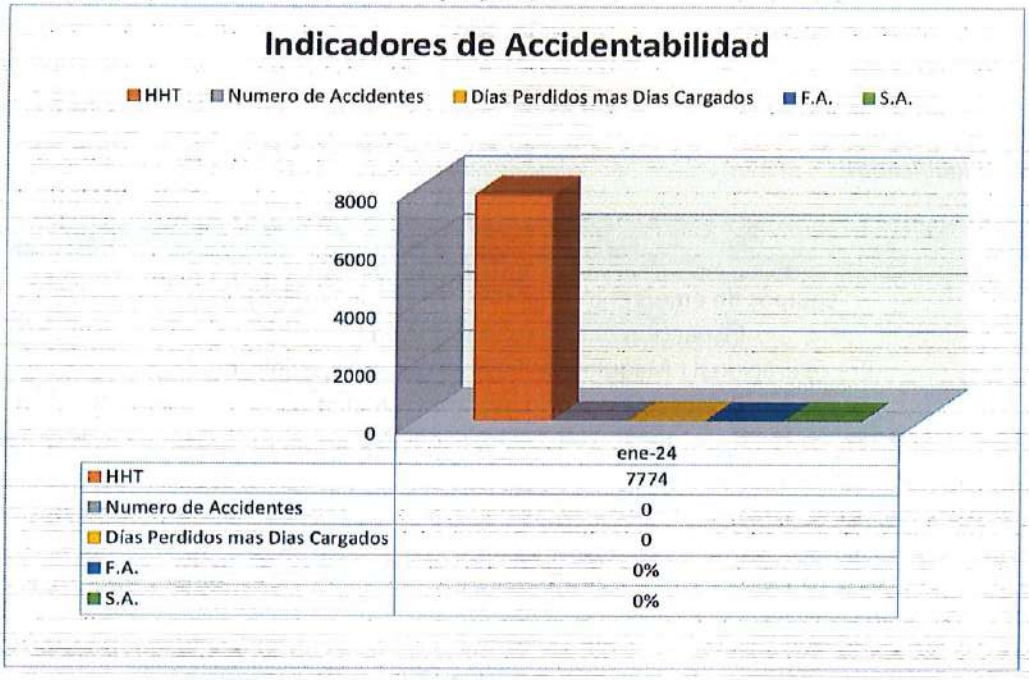

5.7.1. Frecuencia de Accidentalidad.

En relación a la frecuencia de accidentalidad se refiere a la proyección del número de veces que puede ocurrir un accidente de trabajo en el periodo dividido entre el número de trabajadores del periodo, actualmente en Colombia según FASECOLDA la tasa de accidentalidad para el sector de la construcción está entre 7,5%, teniendo en cuenta la tasa a nivel nacional para nuestro proyecto tenemos una proyección de 7,0%.

Frecuencia de accidentalidad = Número de accidentes laborales del periodo/número de trabajadores del mismo periodo X 100.


5.7.2. Severidad de Accidentalidad.

Los días perdidos por accidentes laborales, para el proyecto se establece la meta de 48% para la frecuencia de severidad, teniendo en cuenta el comportamiento a nivel nacional para el gremio de la construcción.

Frecuencia de severidad = Número de días perdidos por AL + días cargados en el periodo / número de trabajadores del periodo X 100.

Ilustración 26


Frecuencia y Severidad de Accidentalidad

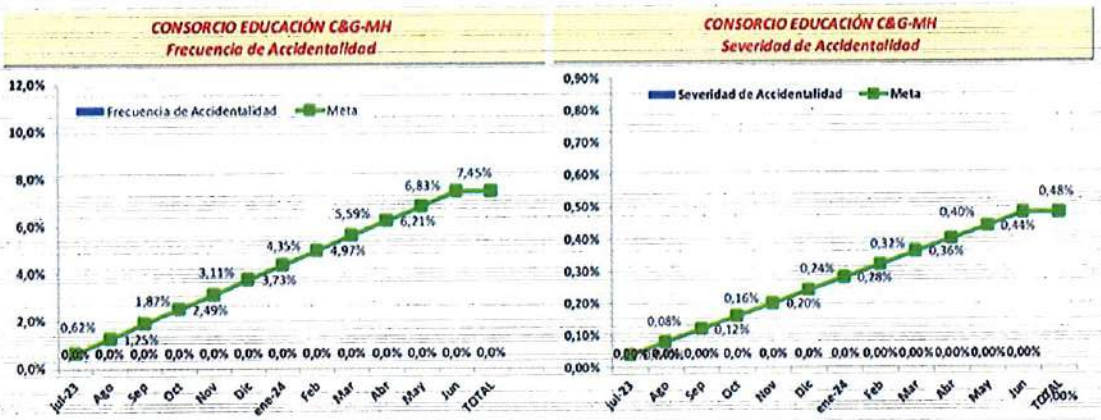

1.1.1. Ausentismo Laboral.

Durante el mes de enero de 2024 se presentó ausentismo laboral generado por enfermedad común o general de un trabajador de empresa contratista evento no relacionado con actividades laborales. El trabajador tiene incapacidad desde el 21 de enero al 19 de febrero de 2024. Se realiza seguimiento a la evolución del estado de salud.

Ilustración 27 *Relación de ausentismo por enfermedad general o común*

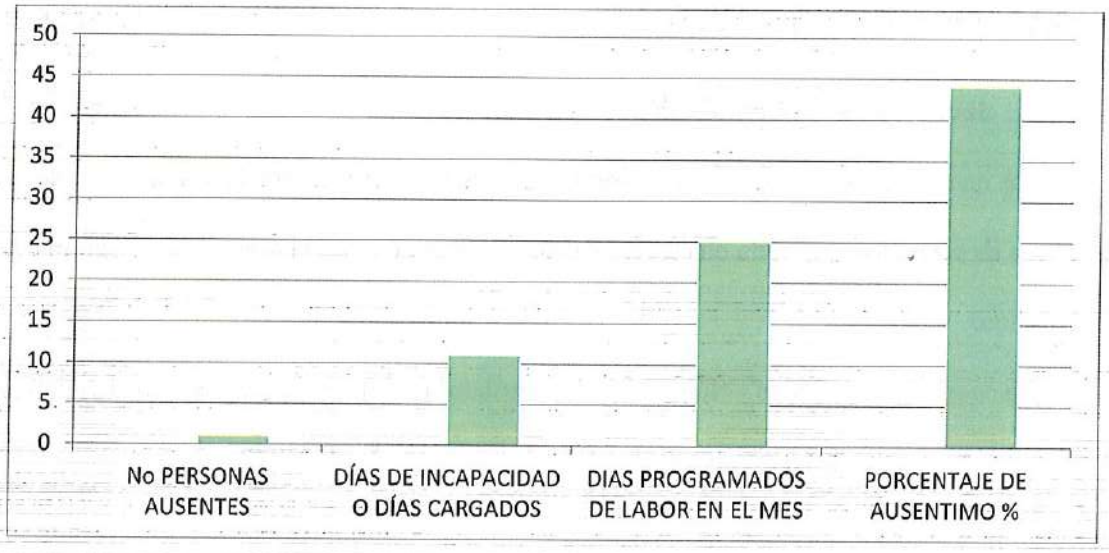

Ausentismo=No de días de ausencia/No de días de trabajo programados en el mes X100.

2. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.

EL trabajo que a continuación se desarrolla expone los resultados del informe ambiental del proyecto "Reconstrucción Total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo Sede Principal del Municipio de Villavicencio Meta", del periodo comprendido entre el 01-01-2024 al 31-01-2024, el cual reporta las actividades ambientales del proyecto

EL CONSORCIO EDUCACIÓN C&G MH tiene el compromiso de informar la implementación de las medidas ambientales de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales durante la etapa de ejecución de los trabajos en la obra

De esta manera el presente informe constituye el instrumento mediante el cual se garantiza la ejecución del proyecto. No constituye solo el desarrollo económico y social si no un instrumento fundamental de ordenamiento territorial por tanto la gestión ambiental está considerado como un tema de vital importancia por lo que garantiza en armonía con las normas ambientales y forestales vigentes y a su vez facilita las condiciones que contribuyan con el normal desarrollo de las obras requeridas.

El proyecto se encuentra en etapa constructiva, las actividades expuestas en el informe se desarrollaron en cada uno de los frentes de trabajo activos del proyecto.

Control y Seguimiento a las Actividades de Gestión Ambiental.

Durante el mes de enero el consorcio educación C&G-MH presenta los componentes del plan de implementación del Plan De Manejo Ambiental describiendo cada una de las actividades realizadas para el aseguramiento de los objetivos ambientales y forestales en el desarrollo de las obras en el periodo que comprende del 01-01-2024 al 31-01-2024. excavación húmeda conglomerado manual para caisson incluye cargue y retiro 5km, anillo de recubrimiento para caisson en concreto de 4000 psi - profundidad 0-10m,

Amarre figurado de acero para caissons, demolición con químico expansivo.

movimiento y retiro de material proveniente de excavación. para caisson incluye cargue y retiro

A continuación se relacionan las actividades propuestas para el manejo ambientan durante el periodo contemplado del 01 de ENERO al 31 de ENERO de 2024.

Tabla 19

CONTROL DE MANEJO AMBIENTAL

Actividad Propuesta Para el Manejo Ambiental	Avance de la Actividad a la Fecha	Observación / Acción
01/01/2024 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	100%	Charlas de seguridad y medio ambiente
01/01/2024 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	100%	Control y seguimiento de la maquinaria que se encuentra en obra.
02/01/2024 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	100%	Implementación Plan de Manejo de Tránsito
02/01/2024 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	100%	Orden y aseo en el campo de trabajo
21 /01/2024	100%	Acompañamiento a la gestión social
25/01/2024 CONSORCIO EDUCACIÓN C&G-MH	100%	Demarcación y señalización ambiental
26/01/2023 CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	50%	Se envió oficio a la interventoría para el estado del tramite del permiso de aprovechamiento forestal

ver anexo: Listado de asistencia charlas de seguridad y capacitaciones.

Charlas Pre Operacionales.

Para la ejecución del proyecto se llevarán a cabo actividades de alto riesgo, se realizan capacitaciones o charlas preoperacionales al inicio de la jornada, se hace un plan de trabajo para prevenir, los incidentes, accidentes y enfermedades laborales u/o impactos que se puedan presentar en la obra, generar concienciación en el área de seguridad y manejo ambiental.

La educación ambiental aumenta la concienciación y el conocimiento de los colaboradores en la obra sobre temáticas o problemas ambientales. Al hacerlo, les brinda a los trabajadores las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y medidas responsables en el manejo adecuado y la importancia de la protección de nuestro entorno.

Socializar con los colaboradores el plan de manejo ambiental y la importancia del cuidado y protección del medio ambiente y el entorno donde nos encontramos, separación en la fuente de los residuos en los puntos ecológicos que se encuentran en la obra, frentes de trabajo limpios y ordenados.

Ilustración 28 *Charlas Ambientales*





Manejo de Maquinaria y Equipos en Obra.

En el mes enero en la obra se encuentran maquinaria retro excavadora con oruga, mini cargador, molinetes, planta concretera, mezcladoras de concreto, demoledor realizando actividades dentro del campo de trabajo. La misma cuenta con certificados de mantenimiento de los equipos expedidos en centros debidamente autorizados. Por otra parte, se les solicita a los operarios de cada una de las maquinas la inspección preoperacional diariamente antes de empezar las funciones.

Se verificará toda la documentación de la maquinaria, documentación de los operarios, por el inspector de seguridad, realiza charla pre operacional antes de iniciar labores para que el trabajador tome todas las medidas de protección y autocuidado en la realización de las actividades.

De acuerdo a la maquinaria que se está utilizando en las actividades de construcción, puede decirse que las emisiones de ruido se han mantenido por debajo de los límites permisibles (80 decibeles según Resolución 8321 de 1983) sin generar perjuicios a la comunidad y/o problemas de salud a los trabajadores del proyecto, igualmente los trabajadores deben portar sus elementos de protección individual (protección auditiva), es preciso aclarar que las labores se realizan en jornada diurna.

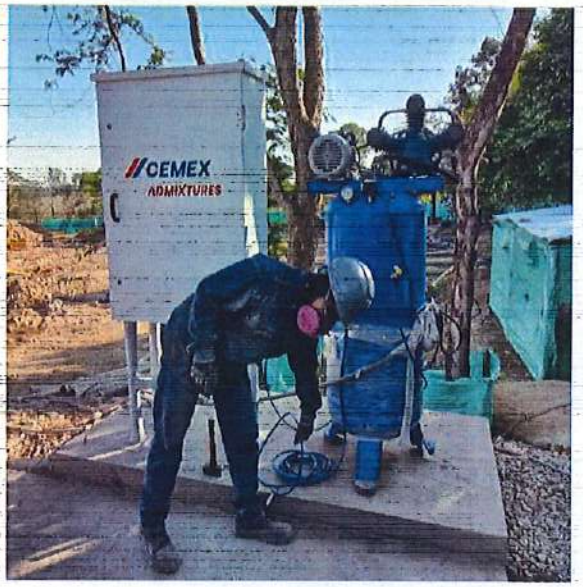
En el desarrollo de las a actividades de las maquinas cuentan con adecuación del patio para la correcta manipulación del equipo, esto con el fin de evitar la contaminación del suelo. Las adecuaciones se realizaron mediante observación en campo.


Ilustración 29 *Maquinaria en obra*




S18
EARTHFORCE
By Bobcat




CEMEX
ADMIXTURES

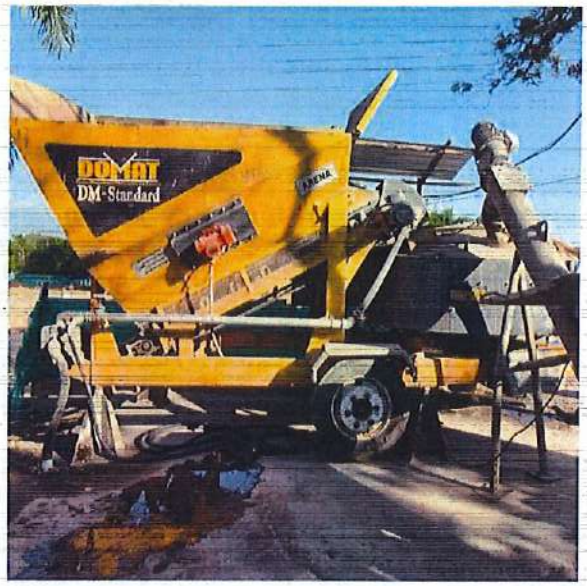
DOMIT
DM-Standard

Manejo de la señalización

Todas las actividades constructivas en el desarrollo de las obras están permanentemente acompañadas por parte del equipo de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo del proyecto con el objeto de manejar, controlar, mitigar y compensar los impactos negativos que se puedan generar en el desarrollo del proyecto. comprometidos con la seguridad y salud de los trabajadores en la importancia de uso y manejo adecuado de Los EPP, que Son la última alternativa de protección de las personas ante los riesgos presentes en las diferentes tareas y áreas de trabajo donde se pueda generar un accidente, esto no impedirá que se ocasione una lesión al trabajador, pero con el uso adecuado de estos ayudara a que esta sea menos grave.

El Elemento de Protección Personal, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador, para protegerlo de los riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.

El desarrollo de las actividades del mes de enero de 2024 se encuentra realizando actividades de acopio de material para su transporte y disposición final adecuada (Bioagricola del Llano S.A) autorizado por la corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la macarena (CORMACARENA).

A la fecha la obra cuenta con tres puntos de emergencia ubicados estratégicamente para la atención inmediata ante cualquier eventualidad.

La comunicación a través de la señalización y la correcta implementación de elementos de emergencia ayuda a las personas a reaccionar ante una situación de crisis que pueda presentarse en un entorno residencial, laboral o comercial. Esto busca principalmente mitigar su impacto, salvaguardando la vida e integridad de las personas y preservando los bienes allí establecidos. Dichos elementos de emergencia incluyen Extintor Multipropósito, Botiquín de Primeros Auxilios, Camilla y Kit de Derrame.

Ilustración 30 *Señalización elementos de emergencia*



Ilustración 31 *Señalización preventiva*



Ilustración 32 *Señalización informativa*



Manejo de Residuos Ambiental.

El manejo y control de residuos en la construcción es un proceso primordial para la reducción de desperdicios en obra. Las actividades descritas en este capítulo comprenden la ejecución de todas las labores en el manejo de los residuos comprendidos en el mes de enero. Se realizaron actividades de orden y aseo en todo el perímetro de la obra, manejo adecuado de los residuos, desinfección de unidades sanitarias, implementación PMT, mantenimiento de puntos ecológicos para separación de residuos que se generan en la obra. El retiro de material proveniente de las actividades de la obra misma será realizado en volquetas y llevado a un sitio de disposición final certificada. Estos residuos son el resultado de las actividades de la construcción, tales como demolición, excavación, construcción y/o reparaciones de las obras civiles, o de otras actividades complementarias.

Hacen parte de los residuos de construcción y demolición los siguientes elementos: concretos, agregados sueltos de demolición como grava, gravilla, arena, recebo, suelo y subsuelo de excavación, ladrillo, cemento, acero y mallas

Bioagrícola del Llano S.A. E.S.P. es la única entidad autorizada en la región para recibir y acopiar de forma definitiva este material. Ofreciendo el servicio de disposición final de los residuos de obra, así mismo, se encarga del manejo adecuado de los mismos.

La ubicación del punto de acopio es en el Parque Ecológico Reciclante que se encuentra ubicado en la Vereda San Juan Bosco, entre los predios El Placer, Brasil y Furatena, en el Km 18 de la vía a Puerto Porfía, Villavicencio- Meta.

Orden y Aseo.

En el desarrollo de las actividades en obra se tendrá personal de brigada de orden, aseo y limpieza el cual permanecerá tiempo completo en la obra realizando actividades de barrido de áreas, organización de puntos ecológicos, restauración de la señalización limpieza de cunetas, cubrimiento de material acopiado con los procedimientos establecidos por el consorcio. Así mismo la brigada de aseo se encuentra con la dotación completa.


El consorcio cuenta con una edificación que se conservó para unidades sanitarias la cual se adecuo, se realizaron medidas de higienización adecuadas y elementos de aseo, con servicio de energía e iluminación adecuada para el personal de la obra.

Ilustración 33 *Mantenimiento de unidades sanitarias*



Ilustración 34 *recolección de desechos, orden y aseo en la obra*



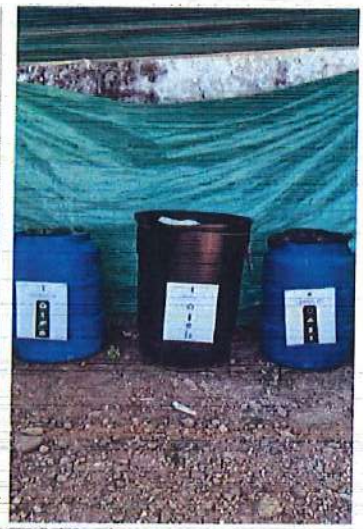

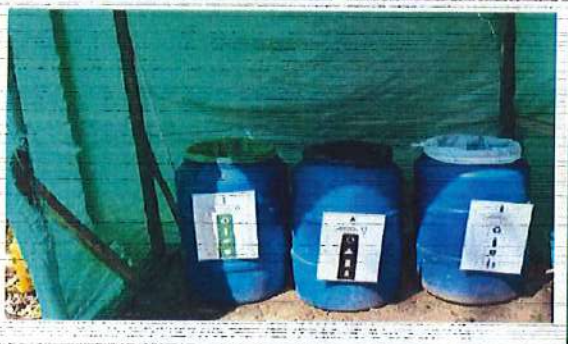




Ilustración 35 *Mantenimiento de puntos ecológicos*







Manejo del Agua.

Con el inicio de las actividades en el presente periodo se implementaron los puntos de hidratación en el campo de trabajo para el personal de obra mediante botellón de 18.9 litros con dispensador. En referencia al suministro de agua el predio cuenta con un acueducto comunal y un sistema de alcantarillado existente donde se encuentran conectadas las unidades sanitarias que se encuentran en la obra y que hacen parte de las edificaciones existentes las cuales durante el mes de enero se realizó mejoramiento para que el suministro sea el más adecuado para el desarrollo de las actividades del proyecto y para el uso del personal operativo.

Ilustración 36

PUNTOS DE HIDRATACION



MANEJO SILVICULTURAL

En el desarrollo de las actividades del proyecto "Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo, sede principal del municipio de Villavicencio, Meta", es necesaria la tala de varios individuos arbóreos que interfieren con el correcto desarrollo del proyecto. La intervención de estos individuos requiere el permiso de aprovechamiento forestal por parte de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - CORMACARENA.

Dicha entidad realizó una visita a las instalaciones del proyecto el 10 de noviembre de 2023 con el fin de identificar el estado actual de los individuos y realizar el inventario de los mismos, dado que en este mismo mes se presentaron fuertes vientos que derribaron varios árboles.

Dada la necesidad del permiso de aprovechamiento forestal para la correcta ejecución del proyecto, la Alcaldía Municipal de Villavicencio realizó esta solicitud ante la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - CORMACARENA el 29 de noviembre de 2023 con radicado Nro. 29418.

Debido al silencio administrativo de la entidad ante la solicitud realizada por la Alcaldía Municipal de Villavicencio, se realizó una visita a la entidad para consultar el estado actual del trámite. Los especialistas respondieron que la solicitud de aprovechamiento forestal para el proyecto se encuentra en proceso de revisión. Además, la nueva administración se encuentra en empalme. Por tanto, no se obtuvo información concreta sobre la fecha probable para la expedición de dicho permiso.

Por lo anterior, a la fecha no contamos con la aprobación del permiso de aprovechamiento forestal, lo que está ocasionando retrasos en la ejecución de la obra, ya que hay individuos arbóreos interfiriendo en la construcción de las edificaciones. Comprometidos con el cuidado y protección de los individuos arbóreos, se mantiene el cerramiento de protección de los árboles presentes en el proyecto para prevenir el colapso de los mismos en el desarrollo de las actividades.

De manera que el Consorcio Educación C&G-MH, por medio de oficio CE-201-125-213 de fecha 26/01/2024 , ha expresado la situación sobre la solicitud a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena - CORMACARENA, ya que esta se realizó en el mes de noviembre y aún no se ha obtenido una respuesta eficaz para la continuidad de ciertas actividades en la obra. La interventoría, por su parte, dio traslado a dicho oficio a la Alcaldía de Villavicencio en la dependencia de la Secretaría de Educación.

Ilustración 37

CERRAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUOS ARBÓREOS



Tabla 20

INSPECCIÓN AMBIENTAL. *Formato de Inspección Ambiental*

Fecha: ENERO 2024.

Responsable: Astrid Ruiz González.

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
1. CONSUMO DE ENERGÍA				
¿Los monitores que no se están utilizando se encuentran apagados o en suspensión?	x			Los monitores que se están utilizando se mantienen apagados cuando no se necesitan
Los aparatos eléctricos y/o electrónicos que no se están utilizando se encuentran desenchufados y/o apagados?	x			En el desarrollo de las actividades en obra se realiza control adecuado sobre el uso adecuado de los aparatos eléctricos
se reutiliza el papel reciclaje	x			Se realiza un acopio de papel para reutilizar.
¿Las luces de lugares no concurridos o donde no se requiere se encuentran apagadas?	x			Las luces permanecen apagadas cuando no se están realizando actividades en el área
¿Se implementan prácticas para el ahorro de energía?	x			Las instalaciones y equipos electrónicos permanecen desconectados cuando no se están utilizando
¿El área cuenta con sistemas ahorradores de energía en buen estado?	x			Se realizará vigilancia que los sistemas de energía se encuentren en buen estado
2. CONSUMO DE AGUA				
¿Se implementan buenas prácticas de ahorro de agua?	x			En el desarrollo de las actividades se realiza buenas practicas de uso racional de agua
¿La red hidrosanitaria se encuentra en buenas condiciones de tal manera que no se evidencian fugas de agua o condiciones de humedad?	x			Las redes hidro sanitarias s e encuentran en buen estado de tal manera que no presentan perdidas importantes del liquido
3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				
punto(s) ecológico(s) para residuos aprovechables y no aprovechables	x			La obra cuenta con puntos ecológicos para la separación en la fuente de los residuos que se generen en la obra, los residuos ordinarios son llevados cada tercer día en la parte de afuera de la obra para ser recogidos por la

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
				empresa de servicios públicos Bioagricola del Llano S. A
¿Cumple con la separación en la fuente de acuerdo con el código de colores establecidos?	x			En el desarrollo de las actividades se realiza separación en la fuente d ellos residuos que se generan en el desarrollo de las actividades de la obra
señalización para la clasificación de residuos en canecas en el punto ecológico	x			Se tienen puntos ecológicos conformado por tres canecas de acuerdo al nuevo código de colores El consorcio cuenta con punto de acopio de material peligroso para realizar disposición final adecuada con empresa certificada
los residuos depositados se encuentran bien clasificados de acuerdo con el código de colores establecido	x			El consorcio comprometido con el manejo adecuado de los residuos cuenta con canecas para la separación en fuente de los residuos
El sitio de acopio evidencia la presencia de vectores como moscas, roedores, cucarachas etc.		X		Los residuos se ordinarios se retiran del punto ecológico cada tercer día para evitar la propagación de plagas
¿los escombros bien almacenados (protegidos del sol y agua) debidamente señalizados	x			Todo el material sobrante de demoliciones, excavación serán acopiados de manera correcta protegidos de la intemperie y señalizados. y llevados a Bioagricola De L Llano S. A
disposición de chatarra con proveedor	x			El material sobrante (chatarra) se entrega a gestores de la comunidad para el aprovechamiento
4. ORDEN Y ASEO				
Área de trabajo limpia y ordenada	x			Se realiza periódicamente orden y aseo en las áreas de trabajo
Área de trabajo demarcada y/o señalizada	x			Se realiza cierre perimetral en los frentes de trabajo donde se están realizando intervenciones
Optimización de recursos en el área (Ahorro de agua, papel, energía)	x			Se realizará un control sobre el uso adecuado de los recursos en la obra.
5. IMPACTOS AMBIENTALES				

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Existe aspectos ambientales significativos que no puedan ser controlados por la empresa y dependan de un tercero? (Cliente, Proveedor, Comunidad, etc.).	x			identificar los productos o servicios que podrían generar algún cambio positivo o negativo en el ambiente.
Los funcionarios/as de la empresa y los contratistas conocen y han apropiado la política ambiental?	x			Se divulgará con todo el personal administrativo, subcontratistas la política ambiental del consorcio
6. MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS				
¿Se encuentran identificadas todas las sustancias químicas utilizadas en el área?	x			El consorcio cuenta con un punto de acopio de sustancias peligrosas dentro del campo de trabajo
¿Se poseen fichas de seguridad de las sustancias químicas que se manejan en el área?	x			Se rotulan las sustancias químicas y se dejarán a la vista las fichas técnicas
Los productos químicos están almacenados en un lugar donde existe ventilación natural y/o forzada?	x			Las sustancias químicas se encuentran en el acopio designado
¿Los productos químicos están separados de elementos o equipos que puedan generar chispas?	x			Los productos químicos se tendrán separados de los equipos
¿Las instalaciones eléctricas de las zonas de almacenamiento de químicos están en buen estado?	x			se realizará revisión de las instalaciones eléctricas en las zonas de almacenamiento de sustancias químicas
7. MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS (UNIDADES SANITARIAS)				
Las unidades sanitarias están en buenas condiciones, funcionalidad sin posibles filtraciones y derrames y normas mínimas de higiene	x			En el desarrollo de las actividades se realizará el manejo adecuado de las unidades sanitarias evitando que existan derrames de acuerdo a las normas de higiene
8. MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE ACEITES				
Se evidencian derrames y contaminación del suelo por derrame de aceites		X		Se implementará el paso de acuerdo al PMA del CONSORCIO EDUCACION C&G-MH
El área de almacenamiento de combustible evita contacto directo con el piso, esta señalizada, lejos de fuente de chispa y dentro de un sistema de contención en caso de derrame	x			En el desarrollo del proyecto el tendrá un punto de acopio de combustibles que evita el contacto directo con el piso, debidamente señalizado, lejos de una fuente de chispa
9. COMBUSTIBLES FÓSILES (ACPM. GASOLINA ETC).				
El área de almacenamiento de combustible evita contacto directo con el piso, esta señalizada, lejos de fuente de chispa y dentro de un sistema de contención en caso de derrame	x			En el desarrollo de las actividades del proyecto el punto de acopio de almacenamiento de combustibles se evitará el contacto directo con el piso en una rea lejos de la fuente de chispa y señalizado

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
Certificado de calidad combustible disponible			x	No aplica
Se mantienen los equipos apagados en el tiempo en el que el personal no se encuentra en el lugar de trabajo.	x			Se mantendrán los equipos apagados en el tiempo en el que en personal no se encuentre en el lugar de trabajo.
10. PLAN DE EMERGENCIA				
¿Cuenta con un plan de emergencia ambiental actualizado?	x			El consorcio cuenta con un plan de acción para cualquier emergencia que se presente en la obra
¿Posee planos con las rutas de evacuaciones de la sede?	x			El consorcio contara con un plano de evacuación en caso de presentarse una emergencia
¿La sede cuenta con una adecuada señalización para una evacuación en caso de una emergencia ambiental?	x			El consorcio tendrá señalización en todo el perímetro para que los colaboradores tengan conocimiento cuando se presente una emergencia ambiental
Se identifican riesgos ambientales	x			Los riesgos para el medio ambiente se identifican en el centro de trabajo a partir de la formación específica y del conocimiento de los procesos productivos
¿Las personas que laboran en la sede conocen estos riesgos?	X			Se socializará con todo el personal los riesgos ambientales que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades
Se cuenta con extintores cargados y fecha de vencimiento al día.	x			Se realizará seguimiento a los extintores multifuncional ABC de los extintores que se encuentren en el campo de trabajo
Poseen Kit de emergencia.	x			Se tendrá un kit de derrame en el campo de trabajo
11. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS				
El kit de derrames cuenta como mínimo con bolsas rojas, tela olefilica, pala guantes nitrilo y mono gafas	x			El kit de derrames contiene todos los elementos necesarios para la atención de cualquier emergencia
Se tiene kit de derrames cerca del lugar de almacenamiento temporal de residuos líquidos peligrosos	x			El consorcio cuenta con tres kits de derrames para los dos frentes de obra
Se tiene kit de derrames cerca de equipo estacionario con potencialidad de derrames de derivados de hidrocarburos	x			Los kits de derrames son idóneos para sustancias químicas, anti derrames que se presenten en el desarrollo de las actividades del proyecto.
Se tiene kit de derrames para vehículo dentro del mismo	x			La máquina que se encuentra en obra cuenta con su kit de derrames

ASPECTO PARA EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
	SI	NO	N/A	
Cuenta con extintor multipropósito de 20 libras cerca del lugar de almacenamiento temporal de residuos peligrosos	x			Em el desarrollo de las actividades se tiene instalado dos puntos de emergencia con camilla, extintor multipropósito botiquín de primeros auxilios
Hojas de seguridad de las sustancias químicas disponibles y divulgadas	x			Las hojas de seguridad de las sustancias que químicas se tendrán en un lugar visible para la manipulación adecuada de los colaboradores
Procedimiento operativo para atención de emergencias ambientales (derrames mayores menores, fugas) disponible	x			Se socializará con el personal colaborador el procedimiento operativo para la atención de emergencias ambientales.
Teléfonos de contacto de policía ambiental en caso de encuentro con abejas, serpientes, otros	x			Se divulgará teléfonos de contacto para atención de emergencias.

S: Si Cumple
N: No Cumple
N/A: No Aplica
Responsable de Inspección Ambiental

NOMBRE RESPONSABLE(S) DE LA INSPECCIÓN:	ASTRID RUIZ GONZÁLEZ INGENIERO AMBIENTAL

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Todas las actividades constructivas en el desarrollo de las obras estarán permanentemente acompañadas por parte del equipo de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo del proyecto con el objeto de manejar, controlar mitigar y compensar los impactos negativos que se vayan generan por el Consorcio Educación C&G-MH, comprometidos con la seguridad y salud de los trabajadores en la importancia de uso y manejo adecuado de Los EPP, que son la última alternativa de protección de las personas ante los riesgos presentes en las diferentes tareas y áreas de trabajo donde se pueda que generar un accidente que no impedirá que se pueda ocasionar una lesión la trabajador pero con el uso adecuado de estos ayudara a que esta sea menos grave.


Los Elementos de Protección Personal (EPP), es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador, para protegerlo de los riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo.


En el desarrollo de las actividades del mes de enero se encuentran realizando, charlas ambientales al personal operativo de la obra, cerramientos perimetrales en las excavaciones, cerramiento de protección de individuos arbóreos, señalización puntos de acopio de material cubiertos con plástico negro, Señales de obligación, peligro o advertencia, auxilio, Prohibición y Señales de equipos contra incendio.

Ilustración 38

USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL



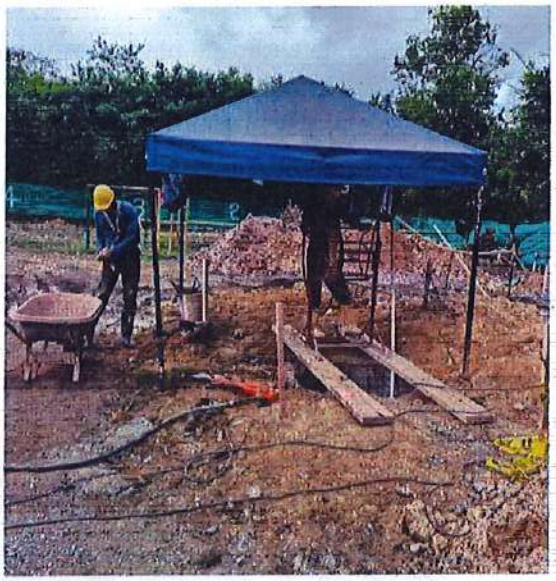

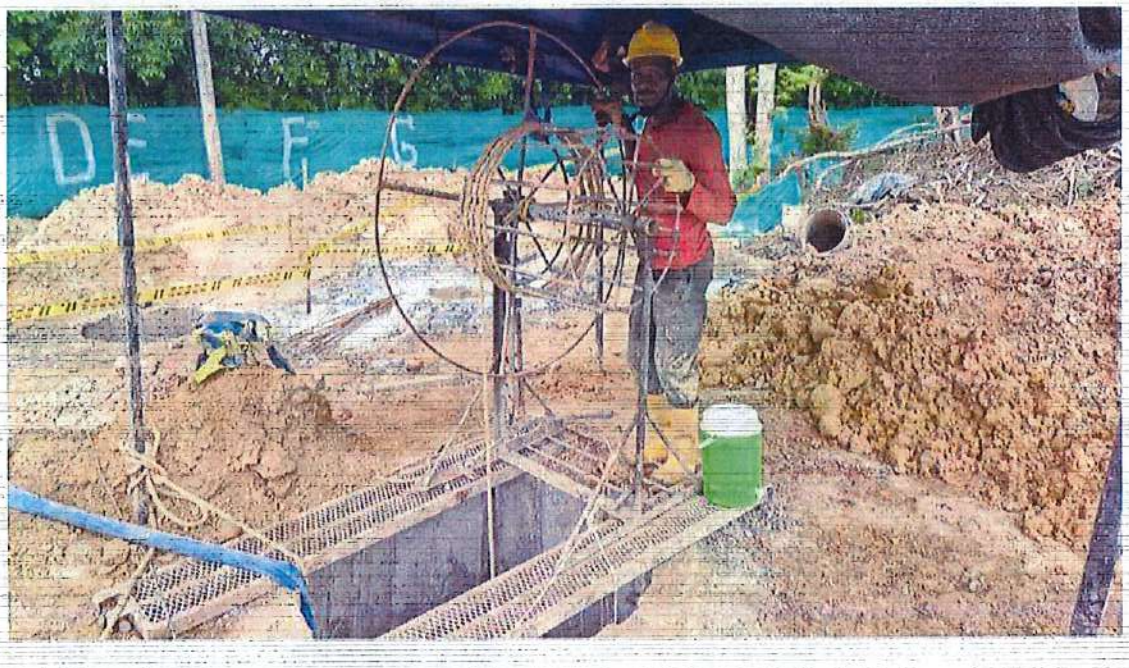

Demarcación y Señalización de Obra.

Se realizará mantenimiento semanal a la señalización y senderos peatonales, se establecerán mínimo de un metro de ancho sin obstáculos y aun mismo nivel que facilita la movilidad de todo el personal de la obra, las señales de seguridad, prohibición, prevención e información del proyecto (valla informativa) las cuales serán ubicadas en todo el campo de trabajo donde se realiza el proyecto.

Ilustración 39

SEÑALIZACIÓN







SEÑALIZACIÓN EN EL FRENTE DE TRABAJO







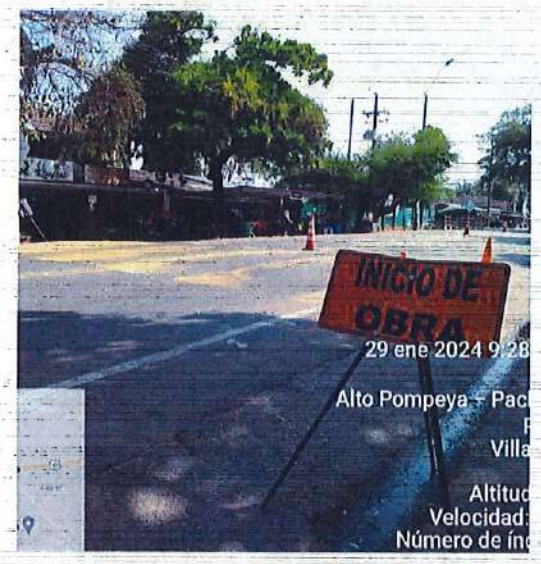





Ilustración 40

IMPLEMENTACIÓN PLAN MANEJO DE TRANSITO







Acompañamiento a la Gestión Social.

Es de importancia resaltar que la comunidad se verá beneficiada con la construcción del nuevo Colegio Alfonso López Pumarejo. De este modo, para que esté informada acerca de cada una de las actividades que se desarrollan en el proceso constructivo para este mes de Enero se contempló el acompañamiento en las actividades desarrolladas por la profesional social del consorcio.

Ilustración 41

CAPACITACIÓN CON EL PERSONAL DE OBRA





3. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL.

El informe de gestión social pretende evidenciar las actividades ejecutas en el periodo comprendido del 1 al 30 de enero del año 2024 de acuerdo al Plan de Gestión Social, donde se evidencia actividades de los diferentes programas como son atención al usuario, educación y capacitación al personal vinculado al proyecto, programa de vinculación de mano de obra, información o participación comunitaria, cultura vial, plan de compensación socioeconómica y demás actividades de acompañamiento.

3.1. Programa de Atención al Usuario.

En este programa se pretende atender quejas peticiones, reclamos Y/o sugerencias que surjan durante la ejecución del proyecto. Este se adelantará de manera virtual haciendo uso de los canales telefónicos y de correo electrónico, atendiendo de manera oportuna todas las PQRS, a las que haya lugar, lo anterior con el fin de generar satisfacción en los usuarios en general del proyecto y mantener una buena imagen institucional en la comunidad.

El punto de atención a la comunidad se estable de manera virtual a través de los canales de comunicación vía telefónica (3138227763) y correo electrónico (social.consorciomh@cyg.com.co).

Durante el mes de enero se realizaron las siguientes atenciones:

Tabla 21

Actividades de Atención al Usuario

Fecha	Objetivo	Descripción de la Actividad
11/01/2024	Atención con líderes y presidentes de alto de Pompeya.	Se realizó atención a las preocupaciones de la comunidad con el cambio de administración, para lo cual se les informó que el consorcio C&G MH se encuentra a la

Fecha	Objetivo	Descripción de la Actividad
		espera de información por parte de la Alcaldía de Villavicencio sobre el nuevo supervisor del contrato, ya que a la fecha no se le ha notificado. Este espacio permitió retomar el proceso que actualmente se adelantan en compañía de la comunidad como la gestión ante la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio para continuar con la solicitud.
25/01/2024	Atención comunidad	Se realizó atención en horas de la mañana de dos personas que requerían información sobre vacantes laborales para lo cual se les suministro el correo electrónico del área social de Consorcio C&G MH, a una de estas personas se le informa que se llamó la semana anterior para contratación al cargo de auxiliar de obra pero no respondió el teléfono aportado en su hoja de vida.
25/01/2024	Atención comunidad	En horas de la tarde se presenta otra persona solicitando información para contratación a lo cual se le informa los medios para radicar la hojas de vida y los requisitos.
25/01/2024	Atención comunidad	Luego del comité realizado con los líderes de la comunidad se brindó atención con un participante de la reunión que solicito información para vinculación laboral, a quien se le informo y compartió los canales

Fecha	Objetivo	Descripción de la Actividad
		de comunicación habilitados para la recepción de hojas de vida como correo o en la oficina de la Junta de Acción Comunal de Alto de Pompeya de manera física.

Ilustración 42

Atención Al Usuario



Programa de Educación y Capacitación al Personal Vinculado al Proyecto.

En este programa se pretende capacitar al personal vinculado al proyecto en todas las áreas en temas relacionados con las medidas de manejo ambiental y social del proyecto. Disminuir el grado de desinformación y generación falsas expectativas a la comunidad por información suministrada por el personal vinculado a las obras.

El 23 de Enero de 2024 se desarrolló taller con el personal de obra donde se abordó el tema **"Planificación y organización laboral"** el cual se llevó a cabo por medio de metodología teórico práctico, iniciando con la presentación audiovisual de diapositivas de la teoría y posteriormente una actividad lúdica experiencial.

3.1.1. Taller Trabajo en Equipo.

Objetivos:

- Dar herramientas que impacten en la eficiencia y el bienestar laboral, reducir el estrés, fomentar la colaboración y permitir una adaptación más rápida al cambio.

3.1.2. Metodología:

Teórico- Práctica

Exposición de conceptos básicos:

- ¿Qué es la planificación?
- Fases de la planificación

3.1.3. Desarrollo de la Actividad:

Se dio inicio con la exposición de los conceptos básicos de la planificación y organización laboral, posteriormente se realizó una actividad lúdica complementaria al tema denominada "Carrera de observación" en esta se dividió el grupo en dos pasando por estaciones de encostalados luego, pimpón en una cuchara, finalizando con la inflada de un globo y estallándolo, cada participante debía terminar el circuito para que su compañero iniciara y así el grupo que más rápido pasara sus participantes al final ganaba la competencia.

Logros:

- Esta actividad permitió generar estrategias de planeación para lograr cumplir el objetivo de manera ágil y eficiente.


- Los colaboradores identificaran la importancia de la planeación previa a la ejecución de las actividades.

Ver anexo 17. Listado de asistencia Taller planeación y organización laboral.

Ilustración 43

Taller Planeación y organización laboral



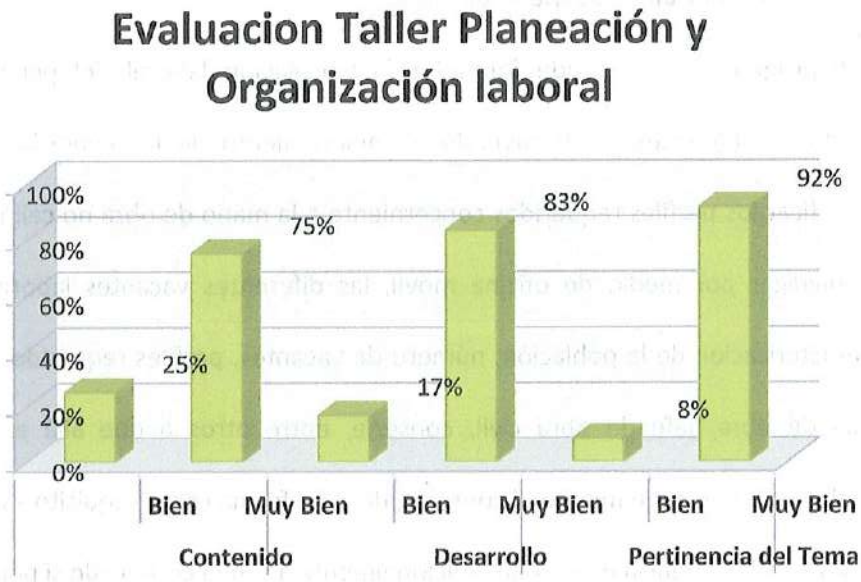

Teniendo en cuenta la gráfica anterior se pude concluir que el taller cumplió con el objetivo y los participantes respondieron a la evaluación de manera positiva:

1. **Ítem contenido**, de trece (13) evaluaciones aplicadas, diez (10) respondieron muy bien y tres (3) bien.
2. **Ítem de Desarrollo del Tema,** de trece (13) participante, diez (10) participantes respondieron muy bien y tres (3) bien.
3. Ítem de Pertinencia del tema, de trece (13) participante, diez (10) participantes respondieron que muy bien y tres (3) Bien.

El taller permitió dar a conocer todo lo relacionado con el proceso de planear y organizar las actividades a desarrollar en el ambiente laboral, la importancia de planear previo a la ejecución a fin de tener más efectividad en el desarrollo, además se generó un espacio de reflexión frente a como se adelantan las actividades diarias y cuáles son los problemas más comunes en el equipo de trabajo. Ver Anexo 18. Evaluaciones de satisfacción Taller Planeación y Organización laboral.

3.2. Programa de Contratación de Mano de Obra.

En este programa se pretende fomentar la vinculación laboral del personal del Área de Influencia Directa del Proyecto, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Especificar los perfiles requeridos concerniente a la mano de obra no calificada de la región, con el fin de divulgar por medio de oficina móvil, las diferentes vacantes laborales en las cuales especifique: caracterización de la población, número de vacantes, perfiles requeridos como (ayudante de obra, oficial de obra, jefe de obra civil, conserje, entre otros a que allá a lugar), aspirantes presentados, seleccionados, seguimiento al contrato, de igual forma como requisito esencial se solicitará certificado de la JAC de residencia en la zona, adicionalmente a eso el certificado si pertenece o no algún grupo población específica, con la finalidad de asegurar la contratación de mínimo un 30% de las personas a intervenir de manera mensual.

Durante el periodo ejecutado, se seleccionó y contrato 20 trabajadores de mano de obra no calificada en el cargo de ayudante de obra de los cuales 4 (cuatro) pertenece al AID del proyecto.

Anexo: Certificados de Residencia

3.3. Reunión con los representantes de las empresas Subcontratistas (Iván Tautiva y Construobras SAS).

El **30/01/2024** Se realizó reunión informativa con dos empresas subcontratistas del proyecto a fin de socializar temas relacionados con la contratación de mano de obra:

- Suministro de los soportes de certificados de residencia del personal actualmente contratado en obra que reside en Villavicencencio o vereda de Pompeya.

- Se socializo el cuadro de selección del personal de obra, con el fin de que cada vez que ingresen personas del área de influencia directa quede soportado el proceso de selección y contratación.
- Se les informo que desde el área social se está realizando la caracterización del personal de obra, para lo cual requerimos de su apoyo en el suministro de la información de los trabajadores que han estado vinculados en sus empresas.

Ilustración 44

Taller Planeación y organización laboral



Anexo: Listado de asistencia


Tabla 22

Mano de Obra no Calificada Contratada al Proyecto

MANO DE OBRA NO CALIFICADA CONTRATADA DEL 1 AL 30 DE ENERO 2024										
No	NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	SEXO	PERTENECE AID	CARGO	MDNC	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	EMPRESA
1	SOL LOURDES	RAMIREZ ROCHA	28.589.257	F	SI	CONTROLADORA VIAL	SI	11/07/2023	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G - MH
2	ANGELA MARIA	SILVA OSPINA	1.121.904.972	F	SI	CONTROLADORA VIAL	SI	11/07/2023	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G - MH
3	CAMILO	GOMEZ RODRIGUEZ	1.006.860.529	M	SI	ALMACENISTA	SI	16/08/2023	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G - MH
4	ANDERSON	URQUIZA BARRERA	1.006.797.237	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	30/01/2024	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G -
5	BRAYAN SNEIDER	URQUIZA BARRERA	1.013.656.142	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	11/12/2023	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G - MH
6	MIGUEL ANGEL	GARCIA BUELVAS	1.121.904.981	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	19/09/2023	PERMANECE	CONSORCIO EDUCACION C&G - MH
7	DIEGO FERNANDO	VAZQUES TAUTIVA	1.121.946.169	M	SI	YUDANTE DE OBR	SI	11/11/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
8	DIOSNELL JÓSE	MOSQUEDA	5.386.773	M	SI	AUXILIAR DE PLANTA DE CONCRETO	SI	18/11/2023	PERMANECE	ALTARA INGENIERIA S.A.S
9	AXON	MURILLO MOSQUERA	8.116.085	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	1/11/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
10	CESAR TULIO	TORRES MATURANA	1.078.456.783	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	1/11/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
11	EDWIN	MOSQUERA CORDOBA	1.018.438.040	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	1/11/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
12	JHON FREDYS	BONILLA PALACIOS	1.010.165.547	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	1/11/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA

13	JUAN CARLOS	MORENO PALOMEQUE	1.033.714.256	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	1/11/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
14	WILMAR ALBERTO	ALVAREZ MESA	70.257.108	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	1/11/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
15	HARRY	VALENCIA CHAVARRA	1.128.525.438	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	1/12/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
16	JUAN EDUARDO	TORRES TRASLAVILLA	1.000.219.013	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	7/12/2023	PERMANECE	ALTARA INGENIERIA S.A.S
17	BRAYAN STIVEN	PALACIO CHAVERA	1.031.183.322	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	13/12/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
18	JHON ALEXANDER	GAMBOA BEJARANO	1.077.438.395	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	13/12/2023	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
19	ORLANDO	HINESTROZA CORDOBA	71.990.028	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	12/01/2024	PERMANECE	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
20	EUGENIO	MENA MEDINA	1.027.940.549	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	12/01/2024	PERMANECE	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
21	YERLINTONG	MURILLO PINO	11.814.999	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	12/01/2024	PERMANECE	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
22	JOSE CLEMENTE	PEREA MOSQUERA	1.010.064.371	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	12/01/2024	PERMANECE	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
23	CRUZ MARINO	COPETE COPETE	79.947.504	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	12/01/2024	PERMANECE	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
24	ANGEL	PEREZ PEÑA	17.330.024	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
25	GILBER	MEDINA VILLAMOR	1.006.810.122	M	SI	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	PERMANECE	JESUS IVAN TAUTIVA
26	IGNACIO CANDELARIO	MURILLO BEDOYA	71.939.286	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	PERMANECE	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
27	LAYSER	CORDOBA MOSQUERA	1.129.044.302	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	PERMANECE	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
28	JOSE ALEXIS	MURILLO PALACIOS	71.386.581	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	RETIRO	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
29	JOSE MAURICIO	VALENCIA RIVAS	11.636.114	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	PERMANECE	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
30	JOSE LEISER	PALACIOS MORENO	1.078.857.349	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	PERMANECE	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S

31	JAHSON OLIDER	LEZCANO CUESTA	1.042.732.197	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	PERMANECE	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
32	GONZALO EDUARDO	CALLE PEREA	11.807.151	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	PERMANECE	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
33	EBER WILINTON	PALACIOS PEREZ	11.801.617	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	25/01/2024	PERMANECE	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
34	ABRAHAM	CORDOBA CUESTA	71.936.468	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	30/01/2024	PERMANECE	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
35	JOSE IGNACIO	VALENCIA MORENO	71.938.949	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	30/01/2024	RETIRO	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S
36	MARIN	MOSQUERA IBARGUEN	71.780.439	M	NO	AYUDANTE DE OBRA	SI	30/01/2024	RETIRO	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S

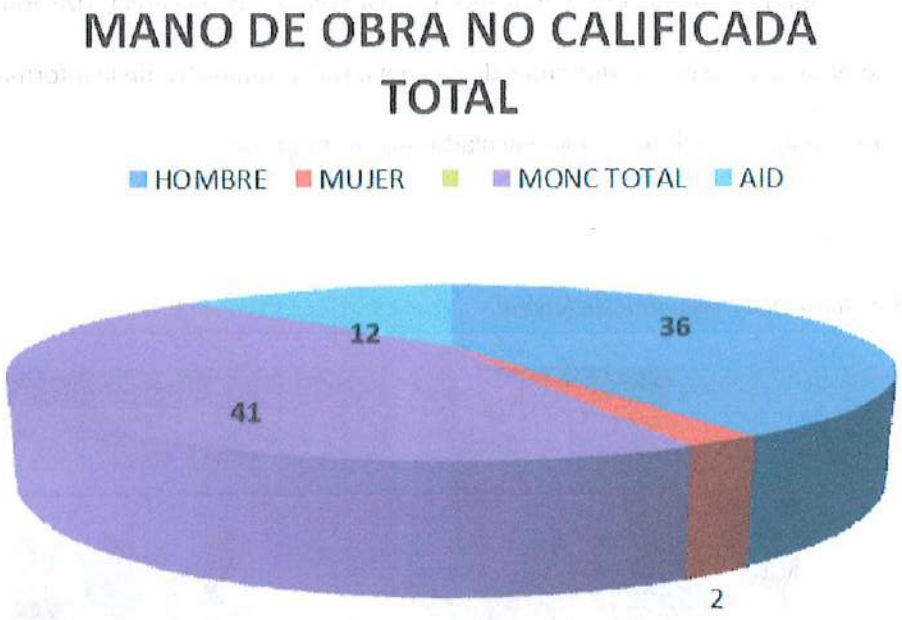

De acuerdo a la gráfica anterior, podemos concluir que los 41 trabajadores de MONC, 12 de ellos pertenecen al AID del proyecto y 2 son mujeres. Cumpliendo así con el 30% en la contratación de MONC del Área de Influencia Directa del Proyecto.

5.8. Reunión con los representantes de las empresas Subcontratistas (Iván Tautiva y Construobras SAS).

El **30/01/2024** Se realizó reunión informativa con dos empresas subcontratistas del proyecto a fin de socializar temas relacionados con la contratación de mano de obra:

- Suministro de los soportes de certificados de residencia del personal actualmente contratado en obra que reside en Villavicencio o vereda de Pompeya.
- Se socializo el cuadro de selección del personal de obra, con el fin de que cada vez que ingresen personas del área de influencia directa quede soportado el proceso de selección y contratación.

- Se les informo que desde el área social se está realizando la caracterización del personal de obra, para lo cual requerimos de su apoyo en el suministro de la información de los trabajadores que han estado vinculados en sus empresas.

Ilustración 45

Taller Planeación y organización laboral



3.4. Programa de Información y Participación Comunitaria.

El programa de información y participación ciudadana consiste en mantener un sistema de comunicación para el proyecto, que integra estrategias de comunicación comunitaria, social masiva, contribuyendo a la generación de una imagen positiva o sólida del Proyecto, al mejoramiento de las relaciones sociales culturales, organizativas, mediáticas. De igual manera, aportar desde la comunicación

al fortalecimiento del capital social de la comunidad objeto en los ámbitos de intervención del proyecto, haciendo énfasis en una participación comunitaria. Visibilizar el alcance y los resultados del proyecto que permita el empoderamiento por parte de las comunidades, el posicionamiento del mismo. Fortalecer las organizaciones sociales existentes, generar otros espacios de participación o control social con las comunidades del área de influencia del proyecto, contribuyendo a la imagen e identidad del proyecto, para su posicionamiento.

5.9. Jornada de información con sector comercial del AID del proyecto.

Se realizó jornada de información por medio de entrega de oficio, el cual comunica a los comerciantes que el Consorcio Educación C&G M-H no se hace cargo de deudas adquiridas por los trabajadores o empresas subcontratistas del proyecto, ya que no hacen parte de las obligaciones contractuales, atender dichas situaciones de orden económico, debido a que son acuerdos establecidos de manera personal por cada uno de los colaboradores o subcontratistas y así mismo cada uno responderá por estas deudas por sus propios medios.



3.5. Comité de Vigilancia y Control.

El 25 de enero se llevó a cabo el comité mensual de Vigilancia y Control en el cual se contó con la participación de los equipos de trabajo del Consorcio C&G MH e Interventoría, en esta reunión se realizó la socialización de los avances del proyecto por cada una de las áreas, técnico, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y Social. Seguido de la socialización de los componentes y sus respectivas actividades ejecutadas en el proyecto, se dio paso para un espacio de preguntas donde se abordaron temas relacionados con los proceso de renovación de licencia ambiental, prorroga de convenio entre Ecopetrol y Alcaldía de Villavicencio, Vigencia y adición al contrato de la Interventoría, tramite de servicios públicos, detalle de materiales en cada una de las actividades constructivas.

Ilustración 46

Comité de Vigilancia y Control



Ver anexo 20. Acta de reunión comité de vigilancia y control enero.

4. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

4.1. Comité y/o Reuniones de Obra.

A continuación, se relacionan las reuniones y comités de obra en los que se participaron en el periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de enero 2024.:

Tabla 23 *Relación de Actas de Reuniones y/o Comité enero 2024.*

Relación de Actas de Reuniones y/o Comité		
Tipo de Acta	Fecha	Descripción
COMITÉ TECNICO DE OBRA	25/01/2024	Revisión de: avance de obra, cronograma de actividades, estado actual de los procesos.
REUNION VEEDURIA	25/01/2024	Reunión con la veeduría, revisión de avance del proyecto
COMITÉ TECNICO DE OBRA	30/01/2024	Revisión de: avance de obra, cronograma de actividades, estado actual de los procesos.

Tabla 24 *Relación de Actas Tramitadas.*

Relación de Actas Tramitadas		
Tipo de Acta	Fecha	Descripción
ACTA DE INICIO	20/05/2023	
ACTA DE ENTREGA DEL LOTE	21/06/2023	
ACTA MODIFICACION No. 3	18/12/2023	Modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos.
PRORROGA No.1	22/12/2023	Prorroga por 12 meses, nueva fecha de terminación 31/12/25

4.2. Correspondencia Enviada.

El motivo para desarrollar un control documental de las correspondencias enviadas

Tabla 25

Relación de Correspondencia Enviada enero 2024

CE	N° SUB CARPETA	N° CONSECUTIVO	FECHA	DIRIGIDO A	ASUNTO
201	125	193	9/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Respuesta a sus observaciones de los Planos y memorias de cálculo de ajustes a diseños Hidrosanitarios de las Edificaciones de Preescolar, Educativo, Administrativo, Auditorio y Polideportivo del Colegio Alfonso

					López.
201	126	194	10/01/2024	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S Atn Sr. JAIRO RAUL BUSTOS DUARTE	Incumplimiento en ejecución de contrato (Reinicio de actividades).
201	125	195	11/01/2024	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO Atn. Supervisor del Contrato CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023 Atn. Ing. David Leonardo Rodríguez	Respuesta a su oficio No 1201-19.18/1478 de diciembre 26 de 2023 (Tramite de actas de recibo parcial)
201	126	196	11/01/2024	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS Atn Sr. JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	Contrato Construcción de Caisson
201	125	198	12/01/2024	CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023 Atn Sr. DAVID LEONARDO RODRIGUEZ B	Documentación de Ingreso Personal de Obra
201	125	199	2/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Informe Mensual de Obra N° 7 Mes de Noviembre
201	125	200	2/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Informe Mensual de Obra N° 8 Mes de Diciembre
201	125	201	2/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Entrega Informe Mensual de PMT mes de Diciembre
201	125	203	16/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Documentación de Ingreso Personal de Obra.
201	125	204	17/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Respuesta al Oficio No CI-1765-2023-OF-113. Observaciones a resultados de ensayos de laboratorio del Colegio Alfonso López
201	125	205	17/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Contestación Comunicaciones CI-1765-2023-OF-070 – CI-1765-2023-OF-114 y CI-1765-2023-OF
201	125	206	22/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Actualización de Precios del Contrato
201	127	207	18/01/2024	CORMACARENA	RESPUESTA RESOSUCIÓN DE CARGOS
201	126	208	19/01/2024	CONTRATISTAS DE OBRA	Reunión de Contratistas en Obra
201	125	209	22/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA	Solicitud Plazo de Entrega Actas De Reunión Componente Social

				2023	
201	125	210	24/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Documentación de Ingreso Personal de Obra
201	125	211	24/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Respuesta a correo del 15 de enero de 2024 vigencia cursos espacios confinados y alturas.
201	125	212	26/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Respuesta al Oficio No CI-1765-2023-OF-127. Solicitud Plan de Contingencia Contrato de Obra No 1279 de 2023
201	125	213	26/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Permiso De Aprovechamiento Forestal.
201	125	214	26/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Reiteración solicitud de solución a la problemática de los Servicios Públicos de Alcantarillado de Aguas Negras, Aguas Lluvias y Acueducto de para el Colegio Alfonso López
201	126	215	26/01/2024	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S Atn Sr. José Raúl Bustos Duarte	Respuesta a su oficio de fecha 24 de Enero de 2024
201	126	216	26/01/2024	JESUS IVAN TAUTIVA	Incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la obra.
201	126	217	26/01/2024	CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S Atn Sr. JAIRO RAUL BUSTOS DUARTE	Incumplimiento de las Especificaciones Técnicas de la obra
201	125	218	27/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Respuesta Comunicación CI-1765-2023-OF-129 Observaciones Informe Mensual No 8 mes Noviembre de 2023.
201	125	219	27/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Documentación de Ingreso Personal de Obra
201	125	220	29/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Reiteración Actualización de Precios y/o Fórmula De Reajuste del Contrato
201	125	221	29/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Respuesta Comunicación CI-1765-2023-OF-130 Observaciones Informe Mensual No 8 mes Diciembre de 2023
201	125	222	30/01/2024	DAVID LEONARDO RODRIGUEZ CONSORCIO INTER EDUCATIVA 2023	Documentación de Ingreso Personal de Obra.

5. COMPONENTE FINANCIERO.

5.10. Relación Inversión del Anticipo.

El contrato establece en su cláusula 6 lo siguiente: "Se pagará al CONTRATISTA de conformidad con lo establecido por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN en los estudios previos la Entidad pagará el contrato celebrado con el adjudicatario de la siguiente manera: Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO cancelará al contratista la remuneración a su favor de la siguiente manera: Un anticipo del VEINTE (20%) por ciento del valor del contrato previa aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del interventor"

A la fecha se realizó el desembolso total del anticipo por valor de $4.767.975.486.28. A continuación, relacionamos el plan de inversión del anticipo aprobado por Interventoría y el Consorcio:

Tabla 26

Plan de Inversión del Anticipo

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
VALOR DEL CONTARTO DE OBRA		$	25.094.607.822,56
ANTICIPO 20%		$	5.018.921.564,51
IMPUESTO DE GUERRA (5%)		$	250.946.078,23
ANTICIPO 20%		$	4.767.975.486,00
No.	**DESCRIPCIÓN**	**VALOR**	**PORCENTAJE**
1	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES	$ 953.595.097,26	20,00%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 3.337.582.840	70,00%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 238.398.774	5,00%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 238.398.774	5,00%
	TOTAL	**$ 4.767.975.486**	**100%**

Tabla 27

Datos Fiduciarios

Para garantizar el cumplimiento del contrato de obra 1279 del 2023, y enmarcado en plan de inversión del anticipo los datos fiduciarios se nombran a continuación.

Empresa	NIT	Porcentaje Anticipo	Valor
Alianza Fiduciaria	830053812-2	20%	$ 5.018.921.564,51

5.11. Seguimiento Financiero Control de Actas y Pagos.

A la fecha la entidad realizó el desembolso total del anticipo a la fiducia por valor de $4.767.975.486.28.

Tabla 28

Control y Seguimiento de Anticipo

Actas de Cobro	Fecha	%	Valor Acta Presente	Amortizado	Neto Parcial	Desembolsos Acumulados
Anticipo	14-09-2023	0.159%	76.000.000,00	0	N/A	76.000.000,00
Anticipo	22-09-2023	65.22%	3.109.966.084,95	0	N/A	3.109.966.084,95
Anticipo	22-11-2023	33.18%	1.582.009.400,56	0	N/A	1.582.009.400,56
		Total		-	-	$4.767.975.486.28

Tabla 29

Control y Seguimiento de Pago de Actas Parciales.

Actas de Cobro	Fecha	%	Valor Acta Presente	Amortizado	Neto Parcial	Desembolsos Acumulados
-	-	-	-	-	-	-
		Total		- -	-	$0

Tabla 30

Formato de Relación de Inversión Anticipo

A continuación, relacionamos el control y seguimiento de pagos del anticipo aprobado por Interventoría y el Consorcio:

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
1	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	167.217.062	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
2	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	58.000.000	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
3	1001	14/07/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	OC 015 -MATERIAL FERRETERIA	506.877	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
4	2263	13/07/2023	901234897-2	ACODEL FERRETERIA DE COLOMBIA SAS	OC 003 -MATERIAL FERRETERIA	7.418.119	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
5	2744	18/07/2023	900539242-5	INVERSIONES ARKA UNION SAS	OC 010 -MATERIAL FERRETERIA	658.042	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
6	1004	14/07/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	OC 015 -MATERIAL FERRETERIA	1.219.275	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023
7	8106	1/08/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	TRANSPORTE A ESCOMBRERA	23.943.721	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
8	1021	1/09/2023	17343650	WILSON CARDENAS SABOGAL	CORTE N° 4 CONTRATO 001 DEMOLICIÓN	9.589.983	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 1	9/10/2023
9	TAU-9	30/08/2023	529016550	MARIA DEL ROSARIO ESQUIVEL ESPINOSA	ORDEN DE COMPRA-014 MATERIAL FERRETERIA	2.176.426	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 1	9/10/2023

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
10	CC049	15/08/2023	900803958-1	ALTARA INGENIERIA SAS	ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CONCRETO OT 007	700.000.000	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
11	CC 003	28/08/2023	1113624886	ALEXANDER GIRALDO DELGADO	COMISION TOPOGRAFICA 19 07 AL 03 08 DE 2023	4.925.250	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
12	321	25/08/2023	901480671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 027 MATERIAL FERRETERIA	6.810.738	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
13	CC 01	8/09/2023	901.455.591-2	INVESTMENT CREARE SAS	ANTICIPO SUMINISTRO MATERIAL PETREO ORDEN DE COMPRA 050	80.021.559	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
14	4970	4/09/2023	900.887.192-7	MADERAS TELLEZ S.A.S.	ORDEN DE COMPRA 030 MATERIAL FERRETERIA	4.444.550	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
15	No. 1BV 326	1/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 032 MATERIAL FERRETERIA	447.347	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
18	CC 01	19/09/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISION TOPOGRAFICA 6 07 08 09 10 11 12 y 13 DE SEPTIEMBRE 2023	3.526.280	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
16	CC	21/09/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	ANTICIPO DEL CONTRATO DCE 201 147 004 E OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	33.612.625	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
17	CC 01	11/09/2023	900342509-9	MH CONSULTING SAS	ANTICIPO SUMINISTRO REDES ELECTRICAS	420.768.060	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
18	NOTA DEBITO N°1	21/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 038 MATERIAL FERRETERIA	2.144.806	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
19	No. 1BV 345	26/09/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA 040 MATERIAL FERRETERIA	4.382.665	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
20	01FE-51445	15/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 041 SUMINISTRO ACERO	3.771.933	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
21	01FE-51650	19/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 045 SUMINISTRO ACERO	38.929.551	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
22	01FE-51756	21/09/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA 046 SUMINISTRO ACERO	11.550.002	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 2	13/10/2023
23	FOS 8321	1/09/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE AGOSTO	35.508.704	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
24	FOS 8576	11/10/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE SEPTIEMBRE I	5.017.014	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
25	FOS 8577	11/10/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE SEPTIEMBRE II	5.294.166	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 2	13/10/2023
26	A-380	1/10/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-052 MADERA	$2.957.668,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2024
27	No. 1BV 360	9/10/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-056 MATERIAL FERRETERIA	$5.685.010,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2024
28	ALT 285	18/10/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	$179.287.996,42	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 3	22/11/2024

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
29	CC	21/10/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	ANTICIPO DEL CONTRATO DCE-201-147-004 E OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	2.249.964,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 3	22/11/2024
30	01FE-53555	20/10/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-063 SUMINISTRO ACERO	54.549.598,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 3	22/11/2024
33	CC 002	1/11/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 DE SEPTIEMBRE 2023 (COBRO 1)	3.967.065,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2024
34	CC 03	7/11/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA 13, 14, 15, 16, 17, 18 DE OCTUBRE 2023	2.644.710,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2024
36	TAU-19	11/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 1 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	9.923.581,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2024
37	TAU-20	11/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 2 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	905.008,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2024

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
38	TAU-23	16/11/2023	86048539-8	JESUS IVAN TAUTIVA DUEÑAS	CORTE N° 3 CE-201-147-004 DE OBRA PARA SUMINISTRO Y MANO DE OBRA ESTRUCTURA EN CONCRETO CONTRATO	7.131.632,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 4	5/12/2024
35	FOS 8715	2/11/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE OCTUBRE 2023	40.170.822,00	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 4	13/12/2024
39	No. 1BV 387	25/10/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-066 MATERIAL FERRETERIA	927.647,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
40	No. 1BV 392	8/11/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-070 MATERIAL FERRETERIA	535.790,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
41	1BV 416	27/11/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-083 MATERIAL FERRETERIA	3.399.818,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
42	1BV 420	9/12/2023	901.480.671-9	BAVIERA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	ORDEN DE COMPRA-087 MATERIAL FERRETERIA	4.870.522,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
43	01FE-54325	1/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-068 SUMINISTRO ACERO	169.304,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
44	01FE-54480	3/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-072 SUMINISTRO ACERO	957.252,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
45	01FE-55455	20/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-074 SUMINISTRO ACERO	52.040.940,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
46	01FE-55453	20/11/2023	900783521	ARCOE S.A.S	ORDEN DE COMPRA-075 SUMINISTRO ACERO	17.072.168,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
47	A-383	1/11/2023	86084222-1	CRISTIAN ALEJANDRO MOSQUERA MURILLO	ORDEN DE COMPRA-057 MADERA	398.580,00	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	Orden de Giro 5	24/01/2024
48	FOS 8915	1/12/2023	822000268-9	BIOAGRICOLA DEL LLANO SA	SERVICIO ESCOMBRERA MES DE NOVIEMBRE 2023	4.134.777,33	TRANSPORTE DE MATERIALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
49	ALT 291	6/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 002 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	45.355.552,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
50	292	18/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 001 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	34.690.133,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
51	293	18/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 002 ORDEN DE TRABAJO CE-201-146-007 CONCRETO	40.007.787,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
52	ALT 294	20/12/2023	900,803,958 - 1	ALTARA INGENIERIA S.A.S	CORTE DE OBRA N° 003 CONTRATO CE-201-147-002 EXCAVACIONES	41.648.556,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
53	CC 04	1/12/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2023 Y DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023	6.800.560,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
54	CC 05	1/01/2023	93201155-4	JAIME RODRIGUEZ CORTES	COMISIÓN TOPOGRAFICA DEL 8 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023 Y EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2023	6.800.560,00	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 5	24/01/2024
54	REINTEGRO	-	800140959-1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	VER RELACIÓN N° 1	456.754.810	MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	Orden de Giro 6	31/01/2024

N°	DOCUMENTO TERCERO (FACTURA/ CUENTA COBRO)	FECHA DE DOCUMENTO TERCERO	NIT TERCERO	NOMBRE TERCERO	CONCEPTO	VALOR A PAGAR APLICANDO RETENCIONES	CLASIFICACIÓN ANTICIPO	ORDEN DE GIRO	FECHA DE GIRO
TOTAL						2.677.922.565			

CLASIFICACIÓN ANTICIPO	VALOR GIRADO OCTUBRE 2023	VALOR GIRADO NOVIEMBRE 2023	VALOR GIRADO DICIEMBRE 2023	VALOR GIRADO ENERO 2024	ACUMULADO TOTAL
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$ 1.285.249.950,00	$ 63.192.276,00	$ 0,00	$ 80.372.021,00	$ 1.428.814.247,00
MANO DE OBRA SALARIOS Y JORNALES	$ 218.871.200,00	$ 201.537.960,42	$ 24.571.996,00	$ 632.057.957,50	$ 1.077.039.113,92
TRANSPORTE DE MATERIALES	$ 127.763.604,58	$ 0,00	$ 40.170.822,00	$ 4.134.777,33	$ 172.069.203,91
COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL	**$ 1.631.884.754,58**	**$ 264.730.236,42**	**$ 64.742.818,00**	**$ 716.564.755,83**	**$ 2.677.922.564,83**

En el periodo del 01 al 31 de enero del 2024 se ha girado por medio de la fiducia el valor de **SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($716.564.755,83).**

CONCLUSIÓN.

El Consorcio Educación C&G-MH, Continua la implantación de Plan de Manejo de Transito (PMT), igualmente con el Plan de manejo Ambiental.

En referencia al avance de obra que se evidencia una ejecución de 17.65% vs 22,55% programado, sin embargo, el consorcio Educación C&G – MH propuso un plan de contingencia de 8 semanas en las cuales se pretende normalizar el avance de la obra.

Lo correspondiente a los ensayos de laboratorio se evidencia que todos se encuentran en los parámetros de las normas correspondientes.

Las dificultades que se han presentado en la ejecución de la obra son:

1. Permisos para tratamiento de tala o traslado de árboles ante Cormacarena: En la obra se encuentran árboles que interfieren en la construcción de actividades tales como, excavaciones, descapotes, construcción de algunos elementos de las cimentaciones profundas, vías y andenes del capítulo de urbanismo. para tales efectos la Alcaldía de Villavicencio inicio trámite para tratamiento de los árboles ante Cormacarena. Mediante oficio CE-201-125-054 de fecha 10 de agosto de 2021 realizamos solicitud de gestión para el trámite para tratamiento de los árboles ante Cormacarena. A la fecha la diligencia ante Cormacarena se encuentra en trámite.

TABLAS

Tabla 1 *Datos Generales del Proyecto* 10

Tabla 2 *Ubicación Geográfica Centro poblado Altos de Pompeya* 11

Tabla 3 *Áreas a Construir por Edificaciones* 14

Tabla 4 *Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual* 15

Tabla 5 *Póliza de Seguro Cumplimiento – Prorroga No. 1* 16

Tabla 6 *Póliza de Seguro Cumplimiento – Modificación No. 3* 16

Tabla 7 *Flujo de Inversión Programado Por Mes* 17

Tabla 8 *Relación Avance Programado Acumulado vs Avance Físico Acumulado* 18

Tabla 9 *Capítulo 2. Cantidad ejecutadas en el mes de enero.* 19

Tabla 10 *Relación de Maquinarias Usadas en el Periodo* 25

Tabla 11 *Relación de Equipos Topográficos* 29

Tabla 12 *Equipos de Laboratorio NHSQ INGENIERIA S.A.S* 30

Tabla 13 *diseño de mezcla para un metro cubico de concreto.* 31

Tabla 14 *Ensayo de Resistencia a los 14 Días de Cilindros de Concreto 3000 PSI* 32

Tabla 15 *Ensayo Asentamiento o Slump* 36

Tabla 16 *Relación del Personal de Contratistas de Obra* 46

Tabla 17 *Charlas de Seguridad y Capacitaciones* 58

Tabla 18 *Inspecciones Planificadas* 61

Tabla 19 66

Tabla 20 81

Tabla 21 *Actividades de Atención al Usuario* 92

Tabla 22 *Mano de Obra no Calificada Contratada al Proyecto* 100

123

Tabla 23 *Relación de Actas de Reuniones y/o Comité enero 2023.* 108

Tabla 24 *Relación de Actas de Reuniones y/o Comité enero 2023.* 108

Tabla 25 *Relación de Correspondencia Enviada enero 2024* 108

Tabla 26 ***Plan de Inversión del Anticipo*** 111

Tabla 27 *Formato de Relación de Inversión Anticipo* 112

Tabla 28 *Datos Fiduciarios* 119

Tabla 29 *Control y Seguimiento de Anticipo* 119

Tabla 30 *Control y Seguimiento de Pago de Actas Parciales.* 120

ILUSTRACIONES

Ilustración 1 *Localización Geográfica del Proyecto* 12

Ilustración 2 *Implantación y Localización General* 13

Ilustración 3 *Curva S Análisis de Avance Físico vs Programado* 18

Ilustración 4 *Estudios Topográficos* 19

Ilustración 5 *Acero de refuerzo.* 20

Ilustración 6 *Excavación Húmeda Conglomerado Manual Para Caisson Incluye Cargue Y Retiro 5km* 21

Ilustración 7 *Anillo De Recubrimiento Para Caisson En Concreto De 4000 Psi - Profundidad 0-10m - Sin Refuerzo (Incluye Bombeo)* 22

Ilustración 8 *Demolición con químico Expansivo* 23

Ilustración 9 *Plano Plan de Manejo de Transito* 24

Ilustración 10 *Plan de Manejo de Transito* 25

Ilustración 11: *Maquinaria en Obra* 26

Ilustración 12 *Registro Diario del Clima enero 2024* 28

Ilustración 13 *Influencia del Clima enero 2024* 28

Ilustración 14 *Ensayo de Resistencia de Cilindros de Concreto 4000 PSI* 32

Ilustración 15 *Análisis Estadístico a 7 días del Hormigón 4000 Psi* 34

Ilustración 16 *Análisis Estadístico a 14 días del Hormigón 4000 Psi* 34

Ilustración 17 *Análisis Estadístico a 28 días del Hormigón 4000 Psi* 35

Ilustración 18 *Esquema de Ensayos In Situ para Concretos* 36

Ilustración 19 *Asentamiento o Slump* 37

Ilustración 20 38

Ilustración 21 42

Ilustración 22 *Entrega y Reemplazo de Equipos de Protección Personal* 55

Ilustración 23 *Proceso de Inducción* 56

Ilustración 24 *Inspecciones Planificadas* 61

En el mes de enero de 2024, no se presentaron eventos que produzcan una lesión corporal o funcional resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por lo cual no se presenta ausentismo laboral. (Ver anexo certificado de accidentalidad emitido por ARL)

Ilustración 25 *Indicadores de Accidentabilidad* 62

Ilustración 26 *Frecuencia y Severidad de Accidentalidad* 63

Ilustración 27 *Relación de ausentismo por enfermedad general o común* 64

Ilustración 28 *Charlas Ambientales* 67

Ilustración 29 *Maquinaria en obra* 69

Ilustración 30 *Señalización elementos de emergencia* 72

Ilustración 31 *Señalización preventiva* 73

Ilustración 32 *Señalización informativa* 73

Ilustración 33 *Mantenimiento de unidades sanitarias* 75

Ilustración 34 recolección de desechos, orden y aseo en la obra 76

Ilustración 35 Mantenimiento de puntos ecológicos 77

Ilustración 36 78

Ilustración 37 80

Ilustración 38 87

Ilustración 39 88

Ilustración 40 90

Ilustración 41 91

Ilustración 42 94

Ilustración 43 *Taller Planeación y organización laboral* 96

Ilustración 44 *Taller Planeación y organización laboral* 99

Ilustración 45 *Taller Planeación y organización laboral* 104

Ilustración 46 *Comité de Vigilancia y Control* 106

ANEXOS

ANEXOS 1. INFORME DE MOVILIDAD ENERO 2024

CONSORCIO
EDUCACIÓN CYG-MH
NIT: 901.687.301

Villavicencio, 07 de Marzo de 2024
CE-201-127-247

SECRETARIA DE MOVILIDAD
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Rr. Radicado ---1739
07 MAR 2024
DUBER (25)

Señores
SECRETARIA DE MOVILIDAD

REFERENCIA: Contrato de obra pública No. 1279 de 2023 *"Reconstrucción total de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo sede principal del municipio de Villavicencio Meta".*

ASUNTO: Informes PMT mes de Enero del 2024

Cordial saludo,

Nos permitimos enviar el informe de PMT del mes de enero del 2024 debidamente firmados por el Consorcio e Interventoría.

Lo anterior para su revisión y aprobación.

Cordialmente

CONSORCIO EDUCACIÓN CYG - MH
MAURICIO MEJIA HOYOS
Representante Legal

Powered by CamScanner

ANEXOS 2. BITACORA ENERO 2024

Enero 2 - 2024
Clima: Soleado durante la Jornada laboral
Personal: 2 Ayudantes, 3 operadores equipo, 1 Controlador Vial, 1 director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST, 1 almacenista.
Maquinaria y equipos: 1 excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat New Holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 Compresores neumaticos, Vibro Concreto, bomba sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se detallan actividades de organización y movimientos de material excavado en los módulos B Auditorio, modulo C Educativo y modulo E polideportivo.

Res. Interv. Ingeld G. Res. Interv

Enero 3 - 2024
Clima: Soleado durante la jornada laboral.
Personal: 4 ayudantes de obra, 3 operadores equipo, 2 controladoras Viales, 1 director de obra, 1 Residente de obra, 1 SST, 1 almacenista.
Maquinaria y equipos: 1 Excavadora hidráulica Kobelco 1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2. Compresores neumaticos, Vibro Concreto, bomba sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se desarrollan actividades de organización y movimientos de material excavado en los módulos B Auditorio, módulo C Educativo y módulo E Polideportivo.

Res. Interv Ingeld G R-INTU

Powered by CamScanner

Enero 4 - 2024
Clima: Soleado durante la jornada laboral
Personal: 4 ayudantes de obra, 3 operadores de equipo, 2 controladoras viales, 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 SST, 1 almacenista.
Maquinaria y equipos: 1 excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se desarrollan actividades de organizacion y movimientos de material excavado en los módulos B auditorio y módulo C Educativo y módulo E polideportivo, de igual forma se adecua un área para el recibo de los pedidos de acero (se construyen burros en madera).

Res. Interv. INGRID G R. INTERV

Enero 5 - 2024
Clima: Soleado durante jornada laboral
Personal: 6 ayudantes de obra, 4 operadores de equipo, 2 controladoras viales, 1 director obra, 1 residente obra, 1 SST, 1 almacenista.
Maquinaria y Equipos: 1 excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades ejecutadas: Se desarrollan actividades de organización y movimientos de material excavados en los módulos B Auditorio, módulo C Educativo y módulo E polideportivo.

Powered by CamScanner

Res Interv. INGRID G R INTU.

Enero 6 - 2024

Clima: Soleado durante la jornada laboral

Personal: 9 ayudantes de obra, 4 operados de equipo 2 controladoras Viales, 1 almacenista, 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 sst.

Maquinaria y Equipos: 1 excavadora hidraulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.

Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo C Educativo, Se arma e instala el acero de refuerzo y se Verte concreto de 4000psi para el 5 anillo de los caisson K13 y O13, el 7 anillo de los caisson M9 y O9, el 8 anillo del caison M6 el 9 anillo de los caisson M11 y N13 y el 10 anillo del caisson M13.

Res Interv. INGRID G R INTU.

Enero 9 - 2024

Clima: Soleado durante la Jornada laboral.

Personal: 12 ayudantes de obra, 1 operario explosivos, 4 operadores equipo, 2 Controladoras Viales, 1 almacenista, 1 topógrafo, 1 director obra, 1 residente obra, 1 Ing. Civil, 1 sst, 1 Almacenista.

Maquinaria y Equipos: 1 excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 compresores

Powered by CamScanner

neumaticos, Vibro Concreto, bomba Sumergible 2" mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del modulo C Educativo, Se arma e instala el acero de refuerzo y se Vierte Concreto de 4000 psi para el 6 anillo de los Caisson K13 y O13, el 8 anillo del Caisson O9 y el 10 anillo de los Caisson L11 y M11, del mismo modo en el módulo B administrativo con el 2 anillo de los Caisson D8 y G8.

Residente Interv. Residente INTV.

Enero 10 - 2024
Clima: Soleado durante jornada laboral
Personal: 11 ayudantes de obra, 1 operario explosivos, 4 operadores equipo, 2 controladoras Viales, 1 almacenista, 1 topografo, 1 director obra, 1 residente, 1 Ing. civil, 1 sst, 1 almacenista.
Maquinaria y Equipos: Excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bulto.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las excavaciones de actividad manual en conglomerado, húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo C educativo, Se arma e instala el acero de refuerzo y se Vierte concreto de 4000 psi para el 5 anillo de los Caisson K6, J9, J13 y L13 el 7 anillo del

Powered by CamScanner

Caisson K13, el 9 anillo de los caisson L6, M6, 09 y 011 y el 10 anillo del caisson N13, del mismo modo en el módulo b administrativo con el 3 anillo del caisson D8.

Res. Interv. INGELD & R INT V.

Enero 11 -2024
Clima: Soleado durante la jornada laboral.
Personal: 12 ayudantes de obra, 1 operario de explosivos, 4 operadores equipo, 2 Controladoras Viales, 1 topografo, 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 Ing. Civil, 1 sst, 1 almacenista
Maquinaria y Equipos: 1 excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de armado e instalación de acero de refuerzo y vertida de concreto de 4000psi para el 6 anillo del caisson J13 del módulo C educativo de igual forma siguen las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo C educativo, se arma e instala el acero de refuerzo y se vierte concreto de 4000psi para el 6 anillo de los caisson J9 y J13, el 8 anillo del caisson K13 y el 10 anillo de los Caisson N11 y p11, del mismo modo en el módulo b administrativo con el 3 anillo del caisson 68 y el 4 anillo del caisson D8. En el desarrollo de las excavaciones se hace necesario realizar detonaciones en el 7 anillo de los

Powered by CamScanner

Caisson J13 y K9 del módulo C.

Res. Interv. INGENIO 6 R. INTV

Enero 12- 2024.
Clima: Soleado durante la jornada laboral.
Personal: 19 ayudantes de obra, 1 oficial, 1 operario de explosivos, 4 operadores equipo, 2 controladoras viales, 1 almacenista, 1 topógrafo, 1 director de obra, 1 residente obra, 1 Ing. civil, 1 SST.
Maquinaria y Equipos: 1 excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 Compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimento para los caisson del módulo C educativo, se arma e instala el acero de refuerzo y se vierte concreto de 4000psi para el 6 anillo de los Caisson K6 y K11, el 7 anillo de los Caisson J6 y K11, J9, n9 y J13, el 8 anillo de Caisson P13, el 9 anillo del Caisson K13, el 10 anillo de los Caisson L6, L9 y 09, y el 11 anillo del caisson n 11, del mismo modo en el módulo b administrativo con el 4 anillo del caisson G8 y el 5 anillo del caisson D8. Se realiza la detonación del químico expansivo para el 6 anillo del Caisson K11 del módulo C.

Res. Interv. INGENIO 6 R. INTV

Powered by CamScanner

Enero 13 - 2024
Clima: Soleado durante jornada laboral.
Personal: 19 ayudantes de obra, 1 oficial, 1 operario explosivos, 4 operadores equipo, 2 Controladoras Viales, 1 topógrafo, 1 director obra, 1 residente obra, 1 Ing. Civil, 1 SST, 1 almacenista
Maquinaria y Equipos: Excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat New holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 Compresores neumaticas, Vibro Concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se Continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson, del módulo C educativo, se arma e instala el acero de refuerzo y se vierte concreto de 4000 psi para los anillos de recubrimiento para el 6 anillo del caisson J11, el 7 anillo de los Caisson K6 y el K11, el 8 anillo de los caisson J6, J9, n9, J13, del mismo modo en el módulo b administrativo con el 4 anillo del caisson i10 y en los Caisson del módulo E polideportivo, para el 5 anillo del Caisson A2, A3, A4, y A6.

Res Interv. INGRID G R INT.

Enero 15 - 2024
Clima: Soleado durante jornada laboral
Personal: 17 ayudantes de obra, 1 oficial, 1 operario explosivos, 4 operadores equipo, 2 controladoras Viales, 1 topografo, 1 director obra, 1 residente obra, 1 Ing. Civil, 1 SST, 1 almacenista.
Maquinaria y Equipos: Excavadora hidraulica Kobelco

Powered by CamScanner

1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 Compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo c educativo, se arma e instala el acero de refuerzo y se vierte concreto de 4000 psi para los anillos de recubrimiento para el 7 anillo de los caisson j11 y el o13, el 8 anillo de los caisson K6, K9, K11 y o13, el 9 anillo de los caisson j6, n9, j13.4 P13, del mismo modo en el módulo b polideportivo, el 5 anillo del Caisson A5.

Res Interv. INGERIO G R INT

Enero 16 - 2024
Clima: Soleado durante jornada laboral.
Personal: 19 ayudantes de obra, 1 oficial, 1 operario explosivos, 4 operadores equipo, 2 Controladoras viales, 1 topografo, 1 director obra, 1 residente obra, 1 Ing. Civil, 1 SST, 1 almacenista.
Maquinaria y Equipos: 1 excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de Concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 Compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los Caisson de módulo c educativo,

Powered by CamScanner

Se arma e instala el acero de refuerzo y Se Verte concreto de 4000psi para los anillos de recubrimiento para el 8 anillo de los caisson ma, J11, y O13, el 9 anillo de los caisson K9 J9, K9 y L13, del mismo modo en el módulo b administrativo con el 4 anillo de caisson j8 y el 7 anillo del caisson d8 y en el módulo E polideportivo, 5 anillo del caisson b1, b2, b3, b4, b5, b6.

INGEID G
RESIDENTE INT

Enero 17 -2024
Clima: Soleado durante la jornada laboral
Personal: 17 ayudantes de obra, 1 oficial, 1 operario explosivos, 4 operadores equipo, 2 Controladoras Viales, 1 topógrafo, 1 director obra, 1 residente obra, 1 Ing. Civil, 1 sst, 1 almacenista.
Maquinaria y Equipos: 1 excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 Compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en Conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo b administrativo, Se arma e instala el acero de refuerzo y Se Verte concreto de 4000psi para los anillos de recubrimiento para el 4 anillo del caisson b10, el 5 anillo de los caisson b8, g8, i8 y d10 el 6 anillo de los caisson h8, h10 e i10 y el 8 anillo del caisson d8, del mismo módo en el módulo C educativo con el 9 anillo de los

Powered by CamScanner

Caisson n6, o6 y p9.

INGRID G R INT

Enero 18 -2024

Clima: Soleado durante jornada laboral

Personal: 17 ayudantes de obra, 1 oficial, 1 operario explosivos, 4 operadores equipo, 2 controladoras viales, 1 topografo, 1 director obra, 1 residente obra, 1 Ing. Civil, 1 SST, 1 almacenista.

Maquinaria y Equipos: 1 excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de concreto, domat, 1 bomba estacionaria, 2 compresores neumaticos, Vibro Concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.

Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo A auditorio, se arma e instala el acero de refuerzo y se vierte concreto de 4000psi para el 1 anillo de los caisson b2, b3, e4, del mismo modo en el módulo b administrativo en el 3 anillo de los caisson g12 e i12, el 5 anillo del caisson c8, el 6 anillo de los caisson i8, c10 y d10, el 7 anillo del caisson h8 y el 9 anillo del caisson d8, asi mismo en el módulo c educativo con el 9 anillo de los caisson p6 y m9, el 10 anillo de los caisson n6, o6 y p9.

INGRID G R INT

Enero 19 -2024

Clima: Soleado durante jornada laboral

Powered by CamScanner

Personal: 19 ayudantes de obra, 1 oficial, 1 operario explosivos, 4 operadores equipo, 2 controladoras viales, 1 topografo, 1 director obra, 1 residente obra, 1 Ing. Civil, 1 SST, 1 almacenista.
Maquinaria y Equipos: 1 excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1S bultos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo b administrativo en el 4 anillo de los caisson g12 e i12, el 6 anillo del caisson C8, el 7 anillo de los caisson i8, C10, d10 e i10, el 8 anillo del caisson h8 y el 10 anillo del caisson d8, asi mismo en el módulo C educativo con el 10 anillo del caisson P6, de igual forma en el módulo e polideportivo, se arma e instala el acero de refuerzo y se vierte concreto de 4000 psi para el 6 anillo del caisson A2, A3, A4, A5, y A6. Se realiza la detonación del quimico expansivo para el anillo del caisson 110 del módulo B administrativo.

Residente Interventoría — Ingeniero Residente INT

Enero 20- 2024
Clima: Soleado durante la jornada laboral.
Personal: 19 ayudantes de obra, 1 oficial, 1 operario explosivo, 3 operadores equipo, 2 controladoras viales, 1 topografo, 1 director obra, 1 residente obra, 1 Ing. civil, 1 SST, 1 almacenista
Maquinaria y Equipos: Excavadora hidráulica Kobelco

Powered by CamScanner

1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 compresores neumaticos Vibro concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo a auditorio, se arma e instala el acero de refuerzo y se vierte Concreto de 4000psi para el 1 anillo de los caisson B1, B4, E1 y E3, el 2 anillo del caisson B2, asi mismo en el módulo b administrativo para el 2 anillo del caisson i8, c10, d10 e i10 y el 9 anillo del caisson h8, asi mismo en el módulo c educativo en el 9 anillo de los caisson j11, K11, y o13 el 11 anillo del caisson P6, Se realiza la detonación de quimico expansivo para el 5 anillo del caisson G12 del módulo B administrativo.

Res. Intern. INGENIERO RESIDENTE

Enero 22- 2024
Clima: Soleado durante jornada laboral
Personal: 19 Ayudantes de obra, 1 oficial, 1 operario explosivos, 3 operadores equipo, 2 controladoras viales, 1 topografo, 1 director obra, 1 residente obra, 1 Ing. Civil, 1 SST, 1 almacenista.
Maquinaria y Equipos: 1 excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 compresores neumaticos, Vibro Concreto, bomba Sumergible 2" mezcladora 1.5 bulto.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las

Powered by CamScanner

actividades de excavación manual en conglarerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del modulo a auditorio en el 2 anillo del caisson b3, b4, e1 y e3, Del mismo modo en el módulo b administrativo en el 3 anillo del caisson i13, el 4 anillo del caisson h12, el 8 anillo del caisson c8, el 9 anillo del caisson i8, c10, d10 y el 10 anillo del caisson h8, asi mismo el módulo E polideportivo, Se arma e instala el acero de refuerzo y se vierte concreto de 4000psi para el 6 anillo de los caisson B1, B2, B3, B4, B5 y B6.

Res. Interv. INGRID G E INT

Enero 23 - 2024.
Clima: Soleado durante jornada laboral.
Personal: 19 ayudantes de obra, 1 oficial, 1 operario explosivos, 3 operadores equipo, 2 Controladora Viales, 1 topógrafo, 1 director obra, 1 residente obra, 1 Ing. Civil, 1 SST, y 1 almacenista.
Maquinaria y Equipos: 1 excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holand, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 Compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo a auditorio en el 2 anillo del caisson b1, el 3 anillo de los caisson b2, b4, e3. Del mismo modo en el módulo b administrativo en el 2 anillo de los caisson c13 y d13 el 3 anillo de los caisson

Powered by CamScanner

b12, c12 y d12, el 4 anillo del caisson i13, el 5 anillo de los Caisson g10 y h12 y el 9 anillo del caisson i10, para el 5 anillo del caisson i13 fue necesaria la implementación del quimico expansivo.

INGRID G Res. Interv. R INT

Enero 24-2024
Clima: Soleado durante la jornada laboral.
Personal: 19 ayudantes de obra, 1 oficial, 1 operario explosivos, 3 operadores equipo, 2 controladoras viales, 1 topógrafo, 1 director obra, 1 residente obra 1 Ing. Civil, 1 Sst, 1 almacenista.
Maquinaria y Equipos: Excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de Concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 Compresores neumaticos, Vibro Concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo B administrativo, Se arma e instala el acero de refuerzo y se Vierte concreto de 4000psi para el 3 anillo de los caisson B13, C13, d13, g13, el 4 anillo del caisson d13, el 5 anillo del caisson i13, el 6 anillo para los Caisson h12 e i12, el 9 anillo para el caisson CB y el 10 anillo Caisson i10.

INGRID G Res. Interv. R INT

Powered by CamScanner

Enero 25 - 2024
Clima: Soleado durante jornada laboral.
Personal: 29 ayudants de obra, 1 Maestro de obra, 2 oficiales, 1 operario de explosivos, 3 operadores de equipo, 2 controladoras Viales, 1 topografo, 1 director obra, 1 residente obra, 1 Ing. Civil, 1 SST, 1 almacenista
Maquinaria y Equipos: 1 Excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 Planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 Compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.S. boltos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo b administrativo, Se arma e instala el acero de refuerzo y se vierte concreto de 4000psi para el 4 anillo de los caisson c12, b13, c13, d13, g13 y h13, el 5 anillo del caisson d12, el 6 anillo del caisson i13 y el 7 anillo del caisson i12, asi mismo en el modulo a audi-torio para el 1 anillo de los caisson es, e7, y f1, el 2 anillo del caisson E5, el 3 anillo de los caisson b3 y e1. Se realiza la detonación de quimico expansivo para el módulo B administrativo.

Res Interv. INGELO G R INT

Enero 26 - 2024
Clima: Soleado durante jornada laboral.
Personal: 29 Ayudantes de obra, 1 Maestro de obra, 2 oficiales de obra, 1 operario explosivos,

Powered by CamScanner

3 operadores equipo, 2 Controladoras Viales, 1 topógrafo, 1 director obra, 1 residente obra, 1 Ing. civil, 1 sst, 1 almacenista.
Maquinaria y Equipos: 1 Excavadora hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 Compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo b administrativo, Se arma e instala el acero de refuerzo y Se Vierte Concreto de 4000psi para el 3 anillo del Caisson h13, el 5 anillo de los Caisson C12, b13, c13, d13, g13 y h13, el 6 anillo del caisson g12, el 7 anillo de los caisson h12 e i13 y el 8 anillo del caisson i12, asi mismo en el módulo a auditorio para 1 anillo del caisson g7, el 2 anillo del caisson f1, el 3 anillo del caisson e5 y el 4 anillo de los Caisson b3 y e1.

Res Interv. Inspector 6 INT

Enero 29 - 2024
Clima: Soleado durante jornada laboral
Personal: 29 ayudantes de obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 1 operario explosivos, 3 operadores equipo, 2 controladoras Viales, 1 topógrafo, 1 director obra, 1 Residente obra, 1 Ing. civil, 1 sst, 1 almacenista.
Maquinaria y Equipos: 1 Excavadora hidraulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de

Powered by CamScanner

Concreto domat, 1 Bomba Estacionaria, 2 Compresores neumaticos, Vibro Concreto, Bomba Sumergible 2" mezcladora 1.5 bultos
Actividades Ejecutadas: Se Continua con las actividades de excavación manual en Conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo b administrativo Se arma e instala el acero de refuerzo y se Verte concreto de 4000psi para el 6 anillo de los Caisson c12, d12, c13, d13, g13, y h13 el 7 anillo del Caisson g12, el 8 anillo de los Caisson h12 e i13 y el 9 anillo del Caisson i12, asi mismo en el módulo a auditorio para el 1 anillo de los caisson b5 y b7, el 3 anillo del caisson f7, el 2 anillo del caisson a7.

INGCIO & Res. Interv. & INT

Enero 29-2024
Clima: Soleado durante Jornada laboral
Personal: 29 ayudantes de obra, 1 maestro de obra, 2 oficiales de obra, 1 operario explosivos, 3 operadores equipo, 2 Controladoras Viales, 1 director obra, 1 Residente obra, 1 Ing. Civil, 1 Sst, 1 Almacenista.
Maquinaria y Equipos: 1 Excavadora hidraulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 compresores neumaticos, Vibro concreto, Bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo b administrativo

Powered by CamScanner

Se arma e instala el acero de refuerzo y Se Verte Concreto de 4000psi para el 7 anillo de los caisson C12, d12, C13, d13, g13 y h13, el 8 anillo del caisson g12 y el 9 anillo de los Caisson h12 e i13, así mismo en el módulo 9 auditorio para el 2 anillo de los Caisson b5 y b7, el 3 anillo de los caisson b7, g7 y b1, el 4 anillo del caisson f4. Se realiza la detonación de quimico expansivo para el 4 anillo del caisson B1 y el anillo del caisson B5 del módulo 9 auditorio.

Res. Interv INGRID G RIM

Enero 30 - 2024.
Clima: Soleado durante jornada laboral
Personal: 33 ayudantes de obra, 1 maestro obra, 2 oficiales de obra, 1 operario explosivos, 3 Operadores equipo, 2 Controladoras Viales, 1 director obra, 1 Residente obra, 1 Ing. Civil, 1 Residente Administrativo, 1 sst, 1 Almacenista.
Maquinaria y Equipos: 1 excavadora Hidraulica, Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de Concreto domat, 1 bomba estacionaria, 2 Compresores neumaticos, Vibro concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en conglomerado húmedo para los anillos de recubrimiento para los caisson del módulo b administrativo, Se arma e instala el acero de refuerzo y Se Verte concreto de 4000psi Para el 4 anillo del caisson b12, el 6 anillo para el caisson g8, el 8 anillo de los caisson C12, d12, C13, d13, g13 y

Powered by CamScanner

h13, y el 9 anillo del caisson g12, asi mismo en el módulo a auditorio para el 2 anillo del caisson b7, y el 4 anillo de los caisson 97, b1, y b7 Se realiza la detonación de quimico expansivo.

Res. Interv. INGENIO G E INT

Enero 31 - 2024
Clima: Soleado durante jornada laboral
Personal: 30 ayudantes de obra, 1 Maestro obra, 2 oficiales de obra, 1 operario explosivos, 3 operadores equipo 2 Controladoras Viales, 1 Director obra, 1 Residente obra, 1 Ing. civil, 1 SST, 1 Almacenista.
Maquinana y Equipos: Excavadura hidráulica Kobelco, 1 bocat new holland, 1 planta de Concreto domat, 1 Bomba estacionaria, 2 Compresores neumaticos, Vibro Concreto, bomba Sumergible 2", mezcladora 1.5 bultos.
Actividades Ejecutadas: Se continua con las actividades de excavación manual en Conglomerado húmedo para los anillos de recuprimiento para los Caisson del módulo b administrativo, Se arma e instala el acero de refuerzo y Se Vierte Concreto de 4000psi para el 7 anillo del Caisson g8, 9 anillo de los Caisson C12, D12, C13, D13, G13 y H13 asi mismo en el módulo a auditorio para el 1 anillo del Caisson F7, el 3 anillo del caisson e7, el 4 anillo del caisson e5 y el 5 anillo de los Caisson A7, B1, B5. para el 5 anillo de los Caisson B5, fue necesaria la implementación del equipo quimico expansivo.

Res. Interv. INGENIO G E INT NICA

Powered by CamScanner


ANEXO 3. LABORATORIOS DE CONCRETO.

NHSQ SAS INGENIERIA
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE
Nit: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 410	08/NOVIEMBRE/2023	F-LAB-011-V9

PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.			**TIPO DE FALLA**	
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**NIT:**	901687301-9		
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**CORREO:**	consorciomh@cyg.com.co		
DEPARTAMENTO:	META	**CELULAR:**	3138613004		
FECHA DE RECEPCIÓN:	VER REMISIÓN	**CONTACTO:**	ING.JOSE MARX REYES		
DESCRIPCIÓN:	CONCRETO PREMEZCLADO			**FECHA DE EMISIÓN:**	lunes, 5 de febrero de 2024

EQUIPOS UTILIZADOS: PRENSA DOBLE RANGO N°: BALANZA N°: FLEXOMETRO: PIE D REY N°:

No. MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA *	RESISTENCIA DE DISEÑO *		ASENTAMIENTO (cm) *	HORA DE TOMA *	FECHA DE TOMA *	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIÁMETRO (mm)	MASA (g)	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA		PORCENTAJE CON RESPECTO A f´c	TIPO DE FALLA	HORA DE FALLA
		(PSI)	(MPa)											(PSI)	(MPa)			
GT-20	PRUEBA PLANTA DE CONCRETO	f´c 3000 PSI	21,0	16	10:00	19-nov.-23	14	3-dic-23	101,33	3790	8064,29	2330,4	170,0	3.058	21,1	101,9%	3	--
							28	17-dic-23	103,00	3915	8332,29	2314,6	262,9	4.577	31,6	152,6%	4	--
							28	17-dic-23	101,33	3810	8064,29	2323,6	256,3	4.610	31,8	153,7%	4	--
GT-21	PRUEBA PLANTA DE CONCRETO	f´c 4000 PSI	28,0	16	1:00	19-nov.-23	14	3-dic-23	100,33	3690	7905,90	2322,1	183,4	3.365	23,2	84,1%	3	--
							28	17-dic-23	101,67	3840	8118,50	2330,0	229,2	4.095	28,2	102,4%	4	--
							28	17-dic-23	101,67	3705	8118,50	2255,5	229,6	4.102	28,3	102,6%	4	--
GT-22	COLUMNA 6A, MODULO PRE ESCOLAR	f´c 4000 PSI	28,0	15	10:00	21-nov.-23	14	5-dic-23	101,00	3775	8011,85	2324,8	190,7	3.452	23,8	86,3%	4	--
							28	19-dic-23	103,00	3880	8332,29	2305,2	255,3	4.444	30,6	111,1%	3	--
							28	19-dic-23	100,33	3730	7905,90	2347,3	242,1	4.441	30,6	111,0%	3	--
GT-23	CAISSON A4 ANILLO 2 (ANILLO 2 DE A2, A3, A5, A6 POLIDEPORTIVO, CAISSON L9 ANILLO 7, L11 ANILLO 5) EDUCATIVO	f´c 4000 PSI	28,0	15	14:00	6- dic-23	7	13-dic-23	100,00	3780	7925,24	2386,5	245,8	4498	31,0	112,5%	3	--
							14	20-dic-23	101,21	3705	8211,24	2349,2	247,2	4673	32,2	116,8%	4	--
							28	3-ene-24	101,21	3780	7853,98	2298,1	264,6	4887	33,7	122,2%	4	--
GT-24	CAISSON A2 ANILLO 2 (ANILLO 2 DE A3, A4, A5, A6 POLIDEPORTIVO Y CAISON L11 ANILLO 7 EDUCATIVO)	f´c 4000 PSI	28,0	14	16:00	7-dic-23	7	14-dic-23	100,00	3845	8192,31	2435,6	271,2	4800	33,1	120,0%	3	--
							14	21-dic-23	100,62	3845	8211,24	2368,7	305,4	5395	37,2	134,8%	5	--
							28	4-ene-24	100,26	3797	7853,98	2309,9	337,7	6237	43,0	155,9%	5	--

Nota: Inserte o elimine celdas si es necesario.

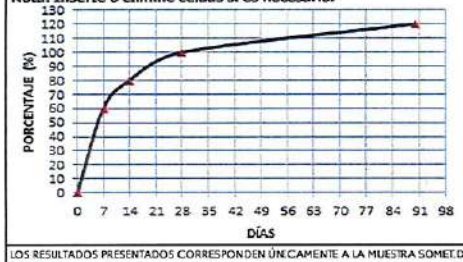

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
CARLOS EDUARDO ROMERO BENITEZ	
Líder de Laboratorio	
PROCESÓ	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio
Analista de Ingeniería	

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.
EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERÍA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.


"FIN DEL INFORME"

NHSQ SAS INGENIERIA
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE
Nit: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 410	08/NOVIEMBRE/2023	F-LAB-011-V9

PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.			**TIPO DE FALLA**	
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**NIT:**	901687301-9		
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**CORREO:**	consorciomh@cyg.com.co		
DEPARTAMENTO:	META	**CELULAR:**	3138613004		
FECHA DE RECEPCIÓN:	VER REMISIÓN	**CONTACTO:**	ING.JOSE MARX REYES		
DESCRIPCIÓN:	CONCRETO PREMEZCLADO			**FECHA DE EMISIÓN:**	lunes, 5 de febrero de 2024

EQUIPOS UTILIZADOS: PRENSA DOBLE RANGO N°: BALANZA N°: FLEXOMETRO: PIE D REY N°:

No. MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA *	RESISTENCIA DE DISEÑO * (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO * (MPa)	ASENTAMIENTO (cm) *	HORA DE TOMA *	FECHA DE TOMA *	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIÁMETRO (mm)	MASA (g)	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (MPa)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA	HORA DE FALLA
GT-25	CAISSON A5 ANILLO 3 (ANILLO 3 CAISSON A2, A3, A4, A6 MODULO POLIDEPORTIVO Y CAISSON N9 ANILLO 6 MODULO EDUCATIVO)	f'c 4000 PSI	28,0	16	08:00	11-dic.-23	7	18-dic-23	100,00	3640	7853,98	2330,4	202,5	3.739	25,8	93,0%	3	--
							14	25-dic-23	100,00	3630	7905,90	2314,6	214,2	3.929	27,1	98,2%	4	--
							28	8-ene-24	100,00	3660	8118,50	2323,6	236,8	4.231	29,2	108,0%	4	--
GT-26	CAISSON J13 ANILLO 4 (ANILLO CAISSON K11, ANILLO 7 CAISSON 011 Y CAISSON B1, B2, B3, B4, B5, B6 MODULO POLIDEPORTIVO)	f'c 4000 PSI	28,0	14	15:00	14-dic.-23	7	21-dic-23	100,33	3740	7905,90	2322,1	200,7	3.684	25,4	92,1%	3	--
							14	28-dic-24	100,20	3815	8064,29	2330,0	212,4	3.815	26,3	95,4%	4	--
							28	11-ene-24	101,00	3780	8011,85	2255,5	228,3	4.134	28,5	103,4%	4	--
GT-27	CAISSON M9 ANILLO 5 (CAISSON J9 ANILLO 3, CAISSON, ANILLO 6 CAISSON P13 Y M6 MODULO EDUCATIVO	f'c 4000 PSI	28,0	15	10:00	18-dic.-23	7	25-dic-24	101,00	3825	8103,34	2324,8	217,1	3.931	27,1	98,3%	4	--
							14	1-ene-24	101,10	3770	8332,29	2305,2	238,4	4.148	28,6	103,7%	3	--
							28	15-ene-24	101,10	3665	8117,82	2347,3	249,6	4.460	30,8	111,7%	3	--
GT-28	CAISSON L13 ANILLO 5(CAISSON J13 ANILLO #5) Y CAISSON J9 ANILLO #5 MODULO EDUCATIVO	f'c 4000 PSI	28,0	15	2:00	10-ene.-24	7	17-ene-24	100,00	3685	7853,98	2334,3	156,4	2.888	19,9	72,2%	4	--
							14	24-ene-24	101,00	3740	8011,85	2314,7	194,8	3.526	24,3	88,2%	1	--
							28	7-feb-24	103,67	3850	8441,04	2250,5	242,3	4163	28,7	104,1%	1	--
GT-29	CAISSON J-13 ANILLO 7 (K9 ANILLO 7 , J9 ANILLO 7 Y J6 ANILLO 7) MODULO EDUCATIVO	f'c 4000 PSI	28,0	14	9:00	12-ene.-24	14	26-ene-24	100,67	3665	7959,58	2279,5	197,2	3.594	24,8	89,9%	1	--
							28	9-feb-24										--
							28	9-feb-24										--

Nota: Inserte o elimine celdas si es necesario.



OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
CARLOS EDUARDO ROMERO BENITEZ	
Lider de Laboratorio	
PROCESÓ	
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Analista de Ingeniería	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.
EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERIA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.


"FIN DEL INFORME"

NHSQ SAS INGENIERIA
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE
Nit: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 410	08/NOVIEMBRE/2023	F-LAB-011-V9

PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.			**TIPO DE FALLA**	
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**NIT:**	901687301-9		
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**CORREO:**	consorciomh@cyg.com.co		
DEPARTAMENTO:	META	**CELULAR:**	3138613004		
FECHA DE RECEPCIÓN:	VER REMISIÓN	**CONTACTO:**	ING.JOSE MARX REYES		
DESCRIPCIÓN:	CONCRETO PREMEZCLADO			**FECHA DE EMISIÓN:**	Lunes, 5 de febrero de 2024

EQUIPOS UTILIZADOS: PRENSA DOBLE RANGO N°: BALANZA N°: FLEXOMETRO: PIE D REY N°:

No. MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA *	RESISTENCIA DE DISEÑO * (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO * (MPa)	ASENTAMIENTO (cm) *	HORA DE TOMA *	FECHA DE TOMA *	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIÁMETRO (mm)	MASA (g)	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (MPa)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA	HORA DE FALLA
GT-30	CAISSON A-6 ANILLOS 6 POLIDEPORTIVO (CAISSON I-10 ANILLO 4 MODULO ADMINISTRATIVO	f'c 4000 PSI	28,0	15	2:00	13-ene.-24	14	27-ene-24	102,00	37901	8171,28	22999,5	280,6	4.981	34,3	124,5%	3	--
							28	10-feb-24										--
							28	10-feb-24										--
GT-31	013 ANILLO 7(CAISSON J-13 ANILLO7) CAISSON K-9 ANILLO 7 MODULO EDUCATIVO	f'c 4000 PSI	28,0	15	10:00	15-ene.-24	14	29-ene-24	101,00	3630	8011,85	2243,0	259,0	4.688	32,3	117,2%	1	--
							28	12-feb-24										--
							28	12-feb-24										--
GT-32	CAISSON H8 ANILLOS 5 (CAISSON H-10 ANILLO 5 CAISSON I-10 ANILLO 4 ADMINISTRATIVO	f'c 4000 PSI	28,0	15	10:00	15-ene.-24	14	29-ene-24	100,00	3550	7853,98	2245,1	205,4	3.793	26,2	94,8%	1	--
							28	12-feb-24										--
							28	12-feb-24										--
GT-33	CAISSON I-10 ANILLO 6 CAISSON H-8 ANILLO 6 ADMINISTRATIVO	f'c 4000 PSI	28,0	14	11:00	17-ene.-24	7	24-ene-24	100,00	3750	7853,98	2340,5	255,1	4.711	32,5	117,8%	3	--
							14	31-ene-24	100,33	3755	7905,90	2335,9	267,9	4.914	33,9	122,8%	1	--
							28	14-feb-24										--
GT-34	CAISSON P-6 ANILLO 9 CAISSON O-6 ANILLO 9 MODULO EDUCATIVO	f'c 4000 PSI	28,0	15	10:00	17-ene.-24	7	24-ene-24	100,00	3685	7853,98	2318,9	258,0	4.765	32,9	119,1%	2	--
							14	31-ene-24	103,33	3895	8385,77	2299,4	282,8	4.891	33,7	122,3%	3	--
							28	14-feb-24										--

Nota: Inserte o elimine celdas si es necesario.

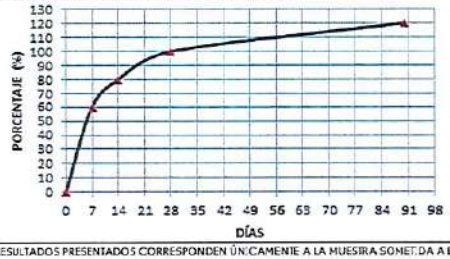

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
CARLOS EDUARDO ROMERO BENITEZ	
Líder de Laboratorio	
ROCESÓ	
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Analista de Ingeniería	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.
EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERIA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.


"FIN DEL INFORME"

NHSQ SAS INGENIERIA
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE
Nit: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 410	08/NOVIEMBRE/2023	F-LAB-011-V9

PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.			**TIPO DE FALLA**	
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**NIT:**	901687301-9		
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**CORREO:**	consorciomh@cyg.com.co		
DEPARTAMENTO:	META	**CELULAR:**	3138613004		
FECHA DE RECEPCIÓN:	VER REMISIÓN	**CONTACTO:**	ING.JOSE MARX REYES		
DESCRIPCIÓN:	CONCRETO PREMEZCLADO			**FECHA DE EMISIÓN:**	lunes, 5 de febrero de 2024

EQUIPOS UTILIZADOS: PRENSA DOBLE RANGO N°: BALANZA N°: FLEXOMETRO: PIE D REY N°:

No. MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA *	RESISTENCIA DE DISEÑO *		ASENTAMIENTO (cm) *	HORA DE TOMA *	FECHA DE TOMA *	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIÁMETRO (mm)	MASA (g)	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA		PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA	HORA DE FALLA
		(PSI)	(MPa)											(PSI)	(MPa)			
GT-35	CAISSON B-2 ANILLO 1 (CAISSON B-3 ANILLO 1 CAISSON E2 CAISSON E-4 ANILLO 1 AUDITORIO	f'c 4000 PSI	28,0	14	10:30	18-ene.-24	7	25-ene-24	101,67	3830	8118,50	2327,7	248,5	4.439	30,6	111,0%	1	--
							14	1-feb-24	101,33	3740	8064,29	2284,6	257,1	4.624	31,9	115,6%	1	--
							28	14-feb-24										--
GT-36	CAISSON B-1 ANILLO 2 (CAISON B2 ANILLO 2 CAISSON E4 ANILLO 1 AUDITORIO	f'c 4000 PSI	28,0	15	8:00	20-ene.-24	7	27-ene-24	103,67	3880	8441,04	2253,2	225,3	3.872	26,7	96,8%	1	--
							14	3-feb-24	101,00	3760	8011,85	2304,2	247,8	4.486	30,9	121,1%	3	--
							28	17-feb-24										--
GT-37	CAISSON I10 ANILLO 8 (CAISSON I12 MODULO ADMINISTRATIVO)	f'c 4000 PSI	28,0	15	8:00	20-ene.-24	7	27-ene-24	100,00	3780	7853,98	2363,1	264,1	4.877	33,6	121,9%	1	--
							14	3-feb-24	102,33	3855	8224,24	2316,7	315,9	5.571	38,4	139,3%	1	--
							28	17-feb-24										--

Nota: Inserte o elimine celdas si es necesario.



OBSERVACIONES:

EJECUTÓ		REVISÓ Y APROBÓ
CARLOS EDUARDO ROMERO BENITEZ		
Líder de Laboratorio		
PROCESÓ		
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO		Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Analista de Ingeniería		Coordinador de Ingeniería y Laboratorio

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.
EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERIA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.


FIN DEL INFORME

NHSQ SAS INGENIERIA
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE
Nit: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO

ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 410	08/NOVIEMBRE/2023	F-LAB-011-V9

PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.			**TIPO DE FALLA**	
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G - MH	**NIT:**	901687301-9		
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**CORREO:**	consorciomh@cyg.com.co		
DEPARTAMENTO:	META	**CELULAR:**	3138613004		
FECHA DE RECEPCIÓN:	VER REMISIÓN	**CONTACTO:**	ING.JOSE MARX REYES		
DESCRIPCIÓN:	CONCRETO PREMEZCLADO			**FECHA DE EMISIÓN:**	lunes, 5 de febrero de 2024

EQUIPOS UTILIZADOS: PRENSA DOBLE RANGO N°: BALANZA N°: FLEXOMETRO: PIE D REY N°:

No. MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA *	RESISTENCIA DE DISEÑO * (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO * (MPa)	ASENTAMIENTO (cm) *	HORA DE TOMA *	FECHA DE TOMA *	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIÁMETRO (mm)	MASA (g)	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (MPa)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f´c	TIPO DE FALLA	HORA DE FALLA
GT-38	CAISSON I12 ANILLO 7 CAISSON I13 ANILLO 6 ADMINISTRATIVO	f´c 4000 PSI	28,0	14	10:30	25-ene.-24	7	1-feb-24	99,67	3760	7802,23	2389,6	202,3	3.760	25,9	94,0%	4	--
							28	22-feb-24										--
																		--
GT-39	CAISSON B-4 ANILLO 3 (CAISON E2 ANILLO 2 AUDITORIO)	f´c 4000 PSI	28,0	15	8:00	25-ene.-24	7	1-feb-24	99,67	3760	7802,23	2389,6	202,3	3.760	25,9	94,0%	1	--
							28	22-feb-24										--
																		--
GT-40	CAISSON H13 ANILLO 3 CAISSON H12 ANILLO 7 CAISSON G12 ANILLO 6 ADMINISTRATIVO	f´c 4000 PSI	28,0	15	8:00	26-ene.-24	7	2-feb-24	101,67	3855	8118,50	2354,5	235,2	4.202	29,0	105,1%	1	--
							14	9-feb-24										--
							28	23-feb-24										--

Nota: Inserte o elimine celdas si es necesario.



OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
CARLOS EDUARDO ROMERO BENITEZ	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Lider de Laboratorio	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio
PROCESÓ	
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO	
Analista de Ingeniería	

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.
EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERIA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.


"FIN DEL INFORME"

NHSQ SAS INGENIERIA
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE
Nit: 901047361-5

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS
HACEMOS LO CORRECTO, CORRECTAMENTE

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO


ESPECIFICACIÓN / NORMA	FECHA DE VIGENCIA	CÓDIGO
INV. E 410	08/NOVIEMBRE/2023	F-LAB-011-V9

PROYECTO:	RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.			**TIPO DE FALLA**	
DIRIGIDO A:	CONSORCIO EDUCACIÓN C&G – MH	**NIT:**	901687301-9		
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	**CORREO:**	consorciomh@cyg.com.co		
DEPARTAMENTO:	META	**CELULAR:**	3138613004		
FECHA DE RECEPCIÓN:	VER REMISIÓN	**CONTACTO:**	ING.JOSE MARX REYES		
DESCRIPCIÓN:	CONCRETO PREMEZCLADO			**FECHA DE EMISIÓN:**	lunes, 5 de febrero de 2024

EQUIPOS UTILIZADOS: PRENSA DOBLE RANGO N°: BALANZA N°: FLEXOMETRO: PIE D REY N°:

No. MUESTRA	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA *	RESISTENCIA DE DISEÑO * (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO * (MPa)	ASENTAMIENTO (cm) *	HORA DE TOMA *	FECHA DE TOMA *	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIÁMETRO (mm)	MASA (g)	ÁREA (mm²)	DENSIDAD (Kg/m³)	CARGA MÁXIMA (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (MPa)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f´c	TIPO DE FALLA	HORA DE FALLA
GT-41	CAISSON A7 ANILLO 1 CAISSON E1 ANILLO 4 CAISSON F1 ANILLO 3 AUDITORIO	f´c 4000 PSI	28,0	15	10:30	26-ene.-24	7	2-feb-24	104,33	4170	8548,86	2406,8	215,4	3.654	25,2	91,4%	4	--
							14	9-feb-24										--
							28	23-feb-24										--
GT-42	CAISSON B8 ANILLO 5 CAISSON C8 ANILLO 4 CAISSON E8 ANILLO 5 ADMINISTRATIVO	f´c 4000 PSI	28,0	16	8:00	29-ene.-24	7	5-feb-24	101,67	3885	8118,50	2372,9	282,2	5.041	34,8	126,0%	1	--
							14	12-feb-24										--
							28	26-feb-24										--
GT-43	CAISSON F1 ANILLO4 CAISSON A1, ANILLO 4 CISSON B5 ANILLO 4 CAISSON E7 ANILLO 2 ADMINISTRATIVO	f´c 4000 PSI	28,0	15	8:00	29-ene.-24	7	5-feb-24	100,33	3790	7905,90	2369,3	280,7	5.150	35,5	128,7%	1	--
							14	12-feb-24										--
							28	26-feb-24										--

Nota: Inserte o elimine celdas si es necesario.

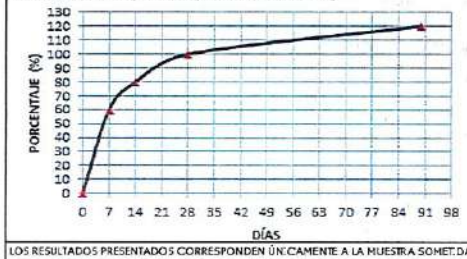

OBSERVACIONES:

EJECUTÓ	REVISÓ Y APROBÓ
CARLOS EDUARDO ROMERO BENITEZ	Ing. HAIVER DAVID OLIVO MELGAREJO
Lider de Laboratorio	Coordinador de Ingeniería y Laboratorio
PROCESÓ	
Ing. KAREN YESENIA FAJARDO BEJARANO	
Analista de Ingeniería	

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO.
EL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S. NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO, NI DEL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS.
ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE.
ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DEL COORDINADOR DE INGENIERIA Y EL SELLO ORIGINAL DEL LABORATORIO NHSQ INGENIERIA S.A.S.
LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LAS COLUMNAS DE DATOS IDENTIFICADAS CON (*), ES SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DE LA INCIDENCIA QUE ESTOS DATOS PUEDAN OCASIONAR EN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS.

"FIN DEL INFORME"

ANEXOS 4. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

CONSORCIO EDUCACIÓN CBGMH

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 12-Enero-2024 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso López

EMPLEADO: Martin Peña Arias

CARGO: Operador Bomba Estacionaria

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
☐	Casco de Seguridad		☐	Protectores auditivos	
☐	Botas de Seguridad de material		☐	Guantes de carnaza	
☐	Botas de caucho		☐	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
☐	Traje impermeable		☐	Tapabocas	
☐	Monogafas		☐	Guantes de Caucho	
☒	Pantalón	01	☐	Máscara de doble filtro	
☒	Camisa	01	☐	Delantal de caucho	
☐	Guantes de Punto de PVC, una cara		☐	Overol de dos piezas	
☐	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

MARTIN PEÑA

Firma del trabajador

N° CC. 91447961 B/GA

Camilo Gomez

Firma quién entrega:

Cargo: Almacenista

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCACIÓN CEGAM

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 24-Enero-2022 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso López

EMPLEADO: Diosnell Jose Hosqueda

CARGO: Auxiliar Planta de Concreto

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
☐	Casco de Seguridad		☐	Protectores auditivos	
☐	Botas de Seguridad de material		☐	Guantes de carnaza	
☒	Botas de caucho	01	☐	Guantes de Vaqueta tipo Ingeniero	
☐	Traje Impermeable		☐	Tapabocas	
☐	Monogafas		☐	Guantes de Caucho	
☐	Pantalón		☐	Máscara de doble filtro	
☐	Camisa		☐	Delantal de caucho	
☐	Guantes de Punto de PVC, una cara		☐	Overol de dos piezas	
☐	Otros, Cuales?: Guantes de Nitrilo (01)				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador

N° CC. 53[illegible]773

Camilo Gomez

Firma quién entrega:

Cargo: Almacenista

Powered by CamScanner

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 25-Enero/2024 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso López

EMPLEADO: Bryan Stiven Herrera H.

CARGO: Operador

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
[ ]	Casco de Seguridad		[ ]	Protectores auditivos	
[ ]	Botas de Seguridad de material		[ ]	Guantes de carnaza	
[ ]	Botas de caucho		[ ]	Guantes de Vaqueta tipo ingeniero	
[ ]	Traje impermeable		[ ]	Tapabocas	
[ ]	Monogafas		[ ]	Guantes de Caucho	
[01]	Pantalón	01	[ ]	Máscara de doble filtro	
[01]	Camisa	01	[ ]	Delantal de caucho	
[ ]	Guantes de Punto de PVC, una cara		[ ]	Overol de dos piezas	
[ ]	Otros, Cuales?:				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador

N° CC. 1234788329

Camilo Gomez

Firma quién entrega:

Cargo: Almacenista

Powered by CamScanner

CONTROL ENTREGA DOTACIÓN

FECHA: 25-Enero/2024 PROYECTO: CE-201 Colegio Alfonso Lopez

EMPLEADO: Camilo Urquiza Barreto

CARGO: Ayudante de Obra

Marque con una X los elementos de dotación entregados:

	ELEMENTO	CANT		ELEMENTO	CANT
X	Casco de Seguridad	01		Protectores auditivos	
X	Botas de Seguridad de material	01		Guantes de carnaza	
X	Botas de caucho	01	X	Guantes de Vaqueta tipo Ingeniero	01
X	Traje Impermeable	01		Tapabocas	
X	Monogafas	02		Guantes de Caucho	
X	Pantalón	02		Máscara de doble filtro	
X	Camisa	02		Delantal de caucho	
	Guantes de Punto de PVC, una cara			Overol de dos piezas	
	Otros, Cuales?: 1 Par Guantes Nitrilo 1 Manga ó Capuchón				

Certifico que:

1. Recibí la dotación de trabajo y los EPP señalados anteriormente.
2. Los revisé y se encuentran en buen estado.
3. Conozco su uso adecuado y correcto.
4. Me comprometo a utilizarlos durante la ejecución de mi trabajo.
5. Me comprometo a mantenerlos en buen estado e informar oportunamente la necesidad de cambiarlos.

Firma del trabajador

N° CC. 1006796237

Camilo Gomez

Firma quién entrega:

Cargo: Almacenista

Powered by CamScanner

ANEXOS 5. NUEVOS INGRESOS

EXAMENES DE INGRESO

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL

RESOLUCIÓN Nº: 906-2021

CALLE 26 A SUR. # 20-27 BARRIO OLAYA /Telef. 3105642373 NIT: 1047446091-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
[X]	[ ]	[ ]

BOGOTÁ.DC. 19 ENERO DEL 2024
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: CORDOBA CUESTA ABRAHAM DOCUMENTO: 71.936.468 EDAD: 61 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: ***OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.***
FINALIDAD DEL EXAMEN: ***ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO***
SEDE / ORDEN: 0200312

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1.	AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)			NORMAL				PERFIL LIPIDICO		NORMAL	
2.	ESPIROMETRÍA (KNUDSON)			NORMAL				PSICOTEST DE ALTURAR		NORMAL	
3.	OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)			PRESBICIA				HEMOCLASIFICACION		O+	
4.	GLICEMIA			NORMAL				OSTEOMUSCULAR		NORMAL	
5.	F/ 22 Xmin	F/C	80 mlo	PESO	74 kg	ESTATURA	1.69 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	X
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	*APLAZADO*	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- **USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL**
- **SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL**
- **HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

He comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCIÓN 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

	FIRMA DEL TRABAJADOR:	HUELLA ÍNDICE DERECHO
Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL Especialista en Salud Ocupacional Resolución No 906-2021	C.C. 71936468	

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN No: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA/Telef. 3105642373 N.I. 1047160962

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO **SI (X)** **NO ( )**

Edgardo mercado pruston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON Dr. Edgardo Mercado Preston MEDICO OCUPACIONAL Resolución No 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR: Abraham Cordoba C.C: 7936865	HUELLA INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. # 20-27 BARRIO OLAYA /Telef. 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
[X]	[ ]	[ ]

BOGOTÁ.DC. 13 ENERO DEL 2024
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: PALACIOS PEREZ EBER WILINTON DOCUMENTO: 11.801.617 EDAD: 50 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: ***OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.***
FINALIDAD DEL EXAMEN: ***ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO***
SEDE / ORDEN: 0200239

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1.	AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)				NORMAL				PERFIL LIPIDICO		NORMAL
2.	ESPIROMETRÍA (KNUDSON)				NORMAL				PSICOTEST DE ALTURAS		NORMAL
3.	OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)				NORMAL				HEMOCLASIFICACION		O+
4.	GLICEMIA				NORMAL				OSTEOMUSCULAR		NORMAL
5.	F/ 22 Xmin	F/C	84 min	PESO	80 kg	ESTATURA	1.80 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	*X*
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	*APLAZADO*	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- **USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL**
- **SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL**
- **HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

He comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN Nº: 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* EBER WILINTON PALACIOS. *C.C:* 11.801.617	*HUELLA INDICE DERECHO*

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Telf. . 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:
Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO **SI (X)** **NO ( )**

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN Nº: 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR: EBER WILINTON PALACIOS C.C: 11.801.617	HUELLA INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. # 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
[X]	[ ]	[ ]

BOGOTÁ.DC. 13 ENERO DEL 2024
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: CALLE PEREA GONZALO EDUARDO DOCUMENTO: 11.807.181 EDAD: 47 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: ***OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.***
FINALIDAD DEL EXAMEN: ***ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO***
SEDE / ORDEN: 0200234

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1.	AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)				NORMAL			PERFIL LIPIDICO		NORMAL	
2.	ESPIROMETRÍA (KNUDSON)				NORMAL			PSICOTEST DE ALTURAS		NORMAL	
3.	OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)				NORMAL			HEMOCLASIFICACION		O+	
4.	GLICEMIA				NORMAL			OSTEOMUSCULAR		NORMAL	
5.	F/ 22 Xmin	F/C	82 min	PESO	70 kg	ESTATURA	1.66 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	*X*
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	*APLAZADO*	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- **USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL**
- **SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL**
- **HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

He comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico quo me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se omiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN Nº: 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* Gonzalo eduardo calle p *C.C:* 11.807.181	*HUELLA INDICE DERECHO*

CALLE 26 A SUR # 20-27. SUR. BARRIO OLAYA/ TELÉF. 3105642373 E-MAIL: MEDICOOCUPACIONAL2022@gmail.com

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. . 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO SI (X) NO ( )

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN Nº: 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR: Gonzalo eduardo calle.p C.C: 11.807.181	HUELLA INDICE DERECHO

CALLE 26 A SUR # 20-27. SUR. BARRIO OLAYA/ TELÉF. 3105642373 E-MAIL: MEDICOOCUPACIONAL2022@gmail.com

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. # 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
X		

BOGOTÁ.DC. 13 ENERO DEL 2024
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: MURILLO BEDOYA IGNACIO CAMNDELARIO DOCUMENTO: 71.939.286 EDAD: 50 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: ***OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.***
FINALIDAD DEL EXAMEN: ***ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO***
SEDE / ORDEN: 0200235

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1.	AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)			NORMAL				PERFIL LIPIDICO		NORMAL	
2.	ESPIROMETRÍA (KNUDSON)			NORMAL				PSICOTEST DE ALTURAS		NORMAL	
3.	OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)			NORMAL				HEMOCLASIFICACION		O+	
4.	GLICEMIA			NORMAL				OSTEOMUSCULAR		NORMAL	
5.	F/ 22 Xmin	F/C	84 min	PESO	79 kg	ESTATURA	1.75 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	*X*
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	*APLAZADO*	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- **USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL**
- **SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL**
- **HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Ile comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Eduardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON Dr. Edgardo Mercado Preston Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* Ignacio candelario murillo *C.C:* 71.939.286	*HUELLA INDICE DERECHO*

CALLE 26 A SUR # 20-27. SUR. BARRIO OLAYA/ TELÉF. 3105642373 E-MAIL: MEDICOOCUPACIONAL2022@gmail.com

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. . 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO SI (X) NO ( )

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN Nº: 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR: Ignacio candelario murillo C.C: 71.939286	HUELLA INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. # 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
[X]	[ ]	[ ]

BOGOTÁ.DC. 10 ENERO DEL 2024
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: MURILLO PALACIOS JOSE DAYLE DOCUMENTO: 71.386.581 EDAD: 42 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: ***OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.***
FINALIDAD DEL EXAMEN: ***ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO***
SEDE / ORDEN: 020130

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1.	AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)			NORMAL			PERFIL LIPIDICO		NORMAL		
2.	ESPIROMETRÍA (KNUDSON)			NORMAL			PSICOTEST DE ALTURAS		NORMAL		
3.	OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)			NORMAL			HEMOCLASIFICACION		O+		
4.	GLICEMIA			NORMAL			OSTEOMUSCULAR		NORMAL		
5.	F/ 22 Xmin	F/C	86 min	PESO	78 kg	ESTATURA	1.75 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	X
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	*APLAZADO*	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- **USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL**
- **SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL**
- **HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Ile comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo Mercado Preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON Dr. Edgardo Mercado Preston Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* JOCE dayle MURILLO.P. *C.C:* 71.386.581	*HUELLA INDICE DERECHO*

CALLE 26 A SUR # 20-27. SUR. BARRIO OLAYA/ TELÉF. 3105642373 E-MAIL: MEDICOOCUPACIONAL2022@gmail.com

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
· MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. . 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:
Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO **SI (X)** **NO ( )**

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN Nº: 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* Jose daile murillo.P. *C.C:* 71.386.581	*HUELLA INDICE DERECHO*

CALLE 26 A SUR # 20-27. SUR. BARRIO OLAYA/ TELÉF. 3105642373 E-MAIL: MEDICOOCUPACIONAL2022@gmail.com

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. # 20-27 BARRIO OLAYA /Telf. 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
[X]	[ ]	[ ]

BOGOTÁ.DC. 10 ENERO DEL 2024
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: PALACIOS MORENO JOSE LEISER DOCUMENTO: 1.078.857.349 EDAD: 36 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: *OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.*
FINALIDAD DEL EXAMEN: *ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO*
SEDE / ORDEN: 020127

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1.	AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)				NORMAL				PERFIL LIPIDICO	NORMAL	
2.	ESPIROMETRÍA (KNUDSON)				NORMAL				PSICOTEST DE ALTURAS	NORMAL	
3.	OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)				NORMAL				HEMOCLASIFICACION	O+	
4.	GLICEMIA				NORMAL				OSTEOMUSCULAR	NORMAL	
5.	F/ 22 Xmin	F/C	81 min	PESO	70 kg	ESTATURA	1,65 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	*X*
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	*APLAZADO*	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL
- SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL
- HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Ilo comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007. se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON Dr. Edgardo Mercado Preston Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* Joce Leiser Palacios M. C.C. 1.078.857.349	*HUELLA INDICE DERECHO*

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. CM: 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO SI (X) NO ( )

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON Dr. Edgardo Mercado Preston Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR: Joce leiser Palacios C.C. 1.028.857.349	HUELLA INDICE DERECHO

CALLE 26 A SUR # 20-27. SUR. BARRIO OLAYA/ TELÉF. *3105642373* E-MAIL: MEDICOOCUPACIONAL2022@gmail.com

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN N°: 906-2021
CALLE 26 A SUR. # 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
[X]	[ ]	[ ]

BOGOTÁ.DC. 10 ENERO DEL 2024
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 **CARGO: AYUDANTE**
TRABAJADOR: CORDOBA MOSQUERA LEYSER **DOCUMENTO: 1.129.044.302** **EDAD: 36 AÑOS** **SEXO: M**
EXAMEN REALIZADO: ***OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.***
FINALIDAD DEL EXAMEN: ***ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO***
SEDE / ORDEN: 020126

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1.	AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)				NORMAL			PERFIL LIPIDICO		NORMAL	
2.	ESPIROMETRÍA (KNUDSON)				NORMAL			PSICOTEST DE ALTURAS		NORMAL	
3.	OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)				NORMAL			HEMOCLASIFICACION		O+	
4.	GLICEMIA				NORMAL			OSTEOMUSCULAR		NORMAL	
5.	F/ 22 Xmin	F/C	80 min	PESO	64 kg	ESTATURA	1.60 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	*X*
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	*APLAZADO*	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- **USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL**
- **SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL**
- **HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Ile comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN N°: 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* Leyser cordoba m *C.C:* 1129044302	*HUELLA INDICE DERECHO*

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN N°: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. . 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO SI (X) NO ( )

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON Dr. Edgardo Mercado Preston MÉDICO OCUPACIONAL RESOLUCIÓN N° 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR: Leyser Cordoba M. C.C: 1.127.044.302	HUELLA INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. # 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. 3105642373 NIT: 1047446091-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO [X] OCUPACIONAL PERIÓDICO [ ] POST OCUPACIONAL O EGRESO [ ]

BOGOTÁ.DC. 19 ENERO DEL 2024
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: VALENCIA MORENO JOSE IGNACIO DOCUMENTO: 71.938.949 EDAD: 56 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: *OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.*
FINALIDAD DEL EXAMEN: *ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO*
SEDE / ORDEN: 0200311

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1. AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)	NORMAL						PERFIL LIPIDICO	NORMAL		
2. ESPIROMETRÍA (KNUDSON)	NORMAL						PSICOTEST DE ALTURAS	NORMAL		
3. OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)	NORMAL						HEMOCLASIFICACION	O+		
4. GLICEMIA	NORMAL						OSTEOMUSCULAR	NORMAL		
5. F/ 22 Xmin	F/C	84 min	PESO	73 kg	ESTATURA	1.70 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	PERMANENTE
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	X
2. APTO CON RESTRICCIONES	
3. NO APTO	
4. APLAZADO	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL
- SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL
- HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL

CONSENTIMIENTO INFORMADO

He comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo Mercado Preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN No. 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR: Jose Luna Valencia C.C. 71938949	HUELLA INDICE DERECHO

CALLE 26 A SUR # 20-27. SUR. BARRIO OLAYA/ TELÉF. 3105642373 E-MAIL: MEDICOOCUPACIONAL20[illegible]mail.com

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Telef.: 3105642373 NIT: 1017446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 de Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO **SI (X)** **NO ( )**

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON Dr. Edgardo Mercado Preston MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL Resolución No. 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR: Joe Ignacio Valerio C.C. 1193891419	HUELLA INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN N°: 906-2021
CALLE 26 A SUR. # 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
X		

BOGOTÁ.DC. 24 ENERO DEL 2024
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: MOSQUERA IBARGÜEN MARÍN DOCUMENTO: 71.780.439 EDAD: 47 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: ***OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.***
FINALIDAD DEL EXAMEN: ***ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO***
SEDE / ORDEN: 0200369

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1. AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)	NORMAL						PERFIL LIPIDICO	NORMAL			
2. ESPIROMETRÍA (KNUDSON)	NORMAL						PSICOTEST DE ALTURAS	NORMAL			
3. OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)	NORMAL						HEMOCLASIFICACION	O+			
4. GLICEMIA	NORMAL						OSTEOMUSCULAR	NORMAL			
5. F/ 22 Xmin	F/C	86 min	PESO	77 kg	ESTATURA	1.74 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%	

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	*X*
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	*APLAZADO*	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- **USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL**
- **SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL**
- **HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

He comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN N°: 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* Mauricio Mosquera Ibargüen *C.C:* 71780439	*HUELLA INDICE DERECHO*

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN N°: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. . 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO SI (X) NO ( )

Edgardo Mercado Preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN N°: 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR: Maximiliano Tarazona C.C: 71780439	HUELLA INDICE DERECHO

CALLE 26 A SUR # 20-27. SUR. BARRIO OLAYA/ TELÉF. 3105642373 E-MAIL: MEDICOOCUPACIONAL2022@gmail.com

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN No: 906-2021
CALLE 26 A SUR. # 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. 3105642373 NIT: 104744609-1

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
X		

BOGOTÁ.DC. 13 ENERO DEL 2024
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: LEZCANO CUESTA JAHSON OLIDER DOCUMENTO: 1.042.732.197 EDAD: 38 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.
FINALIDAD DEL EXAMEN: ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO
SEDE / ORDEN: 0200237

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1.	AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)			NORMAL			PERFIL LIPIDICO		NORMAL		
2.	ESPIROMETRÍA (KNUDSON)			NORMAL			PSICOTEST DE ALTURAS		NORMAL		
3.	OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)			NORMAL			HEMOCLASIFICACION		O+		
4.	GLICEMIA			NORMAL			OSTEOMUSCULAR		NORMAL		
5.	F/ 22 Xmin	F/C	83 min	PESO	79kg	ESTATURA	1.75 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	PERMANENTE
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	X
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	APLAZADO	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- **USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL**
- **SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL**
- **HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

He comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo Mercado Preston MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL Dr. Edgardo Mercado Preston Resolución No. 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* Jahson olider L.C. *C.C:* 1.042.732.197.	*HUELLA INDICE DERECHO*

CALLE 26 A SUR # 20-27. SUR. BARRIO OLAYA/ TELÉF. 3105642373 E-MAIL: MEDICOOCUPACIONAL2022@gmail.com

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN No: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. .3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO **SI (X)** **NO ( )**

Edgardo Mercado Preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON Dr. Edgardo Mercado Preston Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* Jahson olider L.C. *C.C:* 1.042.732.197	*HUELLA INDICE DERECHO*

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN N°: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf: 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
X		

BOGOTÁ.DC. 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: COPETE COPETE CRUZ MARINO DOCUMENTO: 79.947.504 EDAD: 45 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: ***OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.***
FINALIDAD DEL EXAMEN: ***ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO.***
SEDE / ORDEN: 0181179

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1.	AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)				NORMAL			PERFIL LIPIDICO		NORMAL	
2.	ESPIROMETRÍA (KNUDSON)				NORMAL			PSICOTEST DE ALTURAS		NORMAL	
3.	OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)				NORMAL			HEMOCLASIFICACION		O+	
4.	GLICEMIA				NORMAL			OSTEOMUSCULAR		NORMAL	
5.	F/ 22 Xmin	F/C	82 min	PESO	68 kg	ESTATURA	1.63 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	*X*
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	*APLAZADO*	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- **USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL**
- **SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL**
- **HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Ile comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo Mercado Preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN N°: 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:*	*HUELLA INDICE DERECHO*
	C.C:	

Dr. Edgardo Mercado Preston
Especialista en Salud Ocupacional
Resolución No. 906-2021

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN N°: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. CM: 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO SI (X) NO ( )

Edgardo Mercado Preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN N°: 906-2021 Dr. Edgardo Mercado Preston Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* *C.C:*	*HUELLA INDICE DERECHO*

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCION Nº 906-2021
CALLE 26 A SUR 20-27 BARRIO OLAYA Telef. 3105642373 NIT 1047218056-4

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
X		

BOGOTÁ.DC.15 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: MENA MEDINA EUGENIO DOCUMENTO: 1.023.940.549 EDAD: 37 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: *OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FISICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.*
FINALIDAD DEL EXAMEN: *ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO*
SEDE / ORDEN: 0180897

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1.	AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)			NORMAL			PERFIL LIPIDICO		NORMAL		
2.	ESPIROMETRÍA (KNUDSON)			NORMAL			PSICOTEST DE ALTURAS		NORMAL		
3.	OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)			NORMAL			HEMOCLASIFICACION		O+		
4.	GLICEMIA			NORMAL			OSTEOMUSCULAR		NORMAL		
5.	F/ 22 Xmin	F/C	83 min	PESO	74 kg	ESTATURA	1.70 cm	T/A	130 80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	*X*
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	*APLAZADO*	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- **USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL**
- **SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL**
- **HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

He comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen medico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mi en este examen son presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo Mercado Preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL RESOLUCION Nº 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR Eugenio Mena C.C. 1.023.940.549	HUELLA INDICE DERECHO

CALLE 26 A SUR # 20-27, SUR, BARRIO OLAYA / TELEF. 3105642373 / MAIL: MEDICOOCUPACIONAL2052@gmail.com

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN N°: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. CM: 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO SI (X) NO ( )

Edgardo Mercado Preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN N° 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR Eugenio Mena C.C. 1.022.940.546	HUELLA INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN N°: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Tel#: 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
[X]	[ ]	[ ]

BOGOTÁ.DC.15 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: HINESTROZA CORDOBA ORLANDO DOCUMENTO: 71.000.028 EDAD: 50 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: *OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.*
FINALIDAD DEL EXAMEN: *ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO.*
SEDE / ORDEN: 0180696

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1.	AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)				NORMAL			PERFIL LIPIDICO		NORMAL	
2.	ESPIROMETRÍA (KNUDSON)				NORMAL			PSICOTEST DE ALTURAS		NORMAL	
3.	OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)				PRESBICIA			HEMOCLASIFICACION		A+	
4.	GLICEMIA				NORMAL			OSTEOMUSCULAR		NORMAL	
5.	F/ 22 Xmin	F/C	84 min	PESO	84 kg	ESTATURA	1.80 cm	T/A	130/80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	X
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	*APLAZADO*	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- **USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL**
- **SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL**
- **HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

He comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo mercado preston DR. EDGARDO MERCADO PRESTON MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN N°: 906-2021 Dr. Edgardo Mercado Preston Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR ORLANDO HINESTROZA. C.C. 71.000.028	HUELLA INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN N°: 906-2021
CALLE 26 USUR. 20-27 BARRIO OLAYA Teléf. CEL: 3105642373 NIT: 101°446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO SI (X) NO ( )

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Especialista en Salud Ocupacional Resolución No 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR. ORLANDO HINESTROZA C.C: 71.990.028.	HUELLA INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN N°: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf: 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
X	☐	☐

BOGOTÁ.DC. 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: PEREA MOSQUERA JOSE CLEMENTE DOCUMENTO: 1.010.064.371 EDAD: 38 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: ***OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.***
FINALIDAD DEL EXAMEN: ***ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO.***
SEDE / ORDEN: 0181181

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1.	AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)				NORMAL			PERFIL LIPIDICO		NORMAL	
2.	ESPIROMETRÍA (KNUDSON)				NORMAL			PSICOTEST DE ALTURAS		NORMAL	
3.	OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)				NORMAL			HEMOCLASIFICACION		O+	
4.	GLICEMIA				NORMAL			OSTEOMUSCULAR		NORMAL	
5.	F/ 22 Xmin	F/C	82 min	PESO	70 kg	ESTATURA	1.65 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	*X*
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	*APLAZADO*	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- **USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL**
- **SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL**
- **HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Ile comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo Mercado Preston *Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON* *MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL* *RESOLUCIÓN N°: 906-2021* Dr. Edgardo Mercado Preston Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* *C.C:*	*HUELLA INDICE DERECHO*

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN N°: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. CM: 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO SI (X) NO ( )

Edgardo Mercado Preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN N°: 906-2021 Dr. Edgardo Mercado Preston Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR: C.C:	HUELLA INDICE DERECHO

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Telef: 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
[X]	[ ]	[ ]

BOGOTÁ.DC. 29 DE AGOSTO DEL 2023
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: MURILLO PIÑO YERLINTONG DOCUMENTO: 11.814.999 EDAD: 44 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: ***OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.***
FINALIDAD DEL EXAMEN: ***ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO.***
SEDE / ORDEN: 01709097

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1.	AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)				NORMAL			PERFIL LIPIDICO		NORMAL	
2.	ESPIROMETRÍA (KNUDSON)				NORMAL			PSICOTEST DE ALTURAS		NORMAL	
3.	OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)				NORMAL			HEMOCLASIFICACION		O+	
4.	GLICEMIA				NORMAL			OSTEOMUSCULAR		NORMAL	
5.	F/ 22 Xmin	F/C	83 min	PESO	77 kg	ESTATURA	1.72 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1.	APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	X
2.	APTO CON RESTRICCIONES	
3.	NO APTO	
4.	*APLAZADO*	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL
- SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL
- HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL

CONSENTIMIENTO INFORMADO

He comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo Mercado Preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON Dr. Edgardo Mercado Preston MEDICO OCUPACIONAL Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* C.C. 1178144999	*HUELLA INDICE DERECHO*

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Telef. CM: 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 del Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO SI (X) NO ( )

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MEDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCION No. 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional	FIRMA DEL TRABAJADOR: C.C. 1078[illegible]1999	HUELLA INDICE DERECHO

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON

MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. # 20-27 BARRIO OLAYA /Teléf. 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS EN ALTURAS



PRE-OCUPACIONAL INGRESO	OCUPACIONAL PERIÓDICO	POST OCUPACIONAL O EGRESO
X		

BOGOTÁ.DC. 10 ENERO DEL 2024
CONVENIO: CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S NIT: 900.773.521-7 CARGO: AYUDANTE
TRABAJADOR: VALENCIA RIVAS JOSE MAURILIO DOCUMENTO: 11.636.114 EDAD: 51 AÑOS SEXO: M
EXAMEN REALIZADO: ***OCUPACIONAL DE INGRESO Y DE APTITUD FÍSICA PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS.***
FINALIDAD DEL EXAMEN: ***ESTABLECER EL ESTADO DE SALUD DE ACUERDO CON LOS FACTORES DE RIESGO A LOS CUALES ESTARA EXPUESTO***
SEDE / ORDEN: 020129

RESULTADO DE EXAMENES PARACLÍNICOS

1. AUDIOMETRÍA (ESCALA DE LARSEN)				NORMAL				PERFIL LIPIDICO		NORMAL	
2. ESPIROMETRÍA (KNUDSON)				NORMAL				PSICOTEST DE ALTURAS		NORMAL	
3. OPTOMETRÍA (OPTEC-2000)				NORMAL				HEMOCLASIFICACION		O+	
4. GLICEMIA				NORMAL				OSTEOMUSCULAR		NORMAL	
5. F/ 22 Xmin	F/C	88 min	PESO	60 kg	ESTATURA	1.60 cm	T/A	120/80mmHg	SpO2	96%	

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

ALTERACIÓN	CONDICIONES O INTERVENCIONES PARA LIMITAR EL DAÑO	TEMPORAL	*PERMANENTE*
1. VISUAL	NINGUNA		
2. CARDV	NINGUNA		
3. AUDITIVO	NINGUNA		

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

1. APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS SIN RESTRICCIONES	X
2. APTO CON RESTRICCIONES	
3. NO APTO	
4. APLAZADO	

RECOMENDACIONES DE SALUD OCUPACIONAL

- **USO DE GAFAS DE PROTECCION DURANTE LA JORNADA LABORAL**
- **SEGUIR LAS RECOMENDACIONES ESTRICTAS DE MEDICINA OCUPACIONAL**
- **HACER PERIÓDICAMENTE LOS EXÁMENES DE VALORACION OCUPACIONAL**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Ile comprendido el propósito, beneficios, interpretación y riesgos del examen médico que me van a practicar, garantizo que las respuestas suministradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Autorizo para que den a conocer por cualquier medio la información registrada a la persona o entidad, contemplada en la legislación actual vigente. Hago constar con mi firma, que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

CONFIDENCIALIDAD

El presente certificado se expide con fines exclusivos del programa de Salud Ocupacional de la empresa contratante del servicio. En concordancia con la RESOLUCION 2346 de julio de 2007, se respeta la confidencialidad de la historia clínica y no se emiten diagnósticos clínicos en este documento.

Edgardo Mercado Preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN Nº 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	*FIRMA DEL TRABAJADOR:* Jose Maurilio V.R. *C.C:* 11.636.114	*HUELLA INDICE DERECHO*

Powered by CamScanner

Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON
MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL
RESOLUCIÓN Nº: 906-2021
CALLE 26 A SUR. 20-27 BARRIO OLAYA /Telef. : 3105642373 NIT: 1047446094-9

CERTIFICADO MÉDICO

EXAMEN PSICOMETRICO:

Paciente consciente y orientado en tiempo y espacio, buena atención, sigue indicaciones.

Adecuada presentación personal.

En el plano intelectual dentro de parámetros normales

PSICODIAGNOSTICO:

Paciente que asiste a sesión de psicometría, presenta comportamiento mental sano, buena coordinación bimanual, conducta y moderación adecuada.

EXAMEN FISICO:

Mucosas: Normal

TCS: No infiltrado.

Aparato Respiratorio: MV- Normal

Aparato Cardiovascular: Normal

Abdomen: Normal

SNC: Sin alteraciones.

COMORBILIDAD:

Con lo descrito en la circular sanitaria 030 de mayo de 2020 el paciente no presenta ninguno de los factores de riesgo para el covid- 19. (sistema inmunitario deprimido, diabético, cáncer, hipertensión arterial, obesidad)

- **Bajo la Circular 001 del 11 de abril del 2020 y la Circular Nro. 030 del 8 de Mayo del 2020 d Ministerio de Salud, el Suscrito médico certifica:**

1. APTO PARA DESEMPEÑAR SU CARGO SI (X) NO ( )

Edgardo mercado preston Dr. EDGARDO MERCADO PRESTON MÉDICO ESPECIALISTA SALUD OCUPACIONAL RESOLUCIÓN Nº: 906-2021 Especialista en Salud Ocupacional Resolución No. 906-2021	FIRMA DEL TRABAJADOR: Jose Mourilio V. R C.C: 11.636.174	HUELLA INDICE DERECHO

Powered by CamScanner

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL

Dirreción: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

Cendiatra

SEDE	CENDIATRA VILLAVICENCIO	**DIRECCIÓN**	Avenida 40 Nº 27 – 63
TELÉFONO		**EMAIL**	citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-08-14	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



Nombres y Apellidos	ANGEL LIBARDO PEREZ PEÑA			Identificación CC	Nro 17330024
Fecha de Nacimiento	1964-10-19	**Edad**	58	**Sexo**	M
Empresa	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN				
Cargo	AYUDANTE DE CONSTRUCCION				
Fecha Ingreso	2023-08-14 14:51:38	**Fecha Salida**	2023-08-14 14:52:03		

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ	EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO	VISIOMETRIA
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO
COLESTEROL TOTAL	GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
TRIGLICERIDOS	

CONCEPTO_DE_APTITUD

APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS	APTO Y SIN RESTRICCION PARA TRABAJO EN ALTURAS
TIPO DE RESTRICCIONES O LIMITACIONES	EN SU EPS, REQUIERE CORRECCION OPTICA PARA SUS FUNCIONES DIARIAS.

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.

Dra. Johana Diaz
Medico Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 3462 - 2016

Angel libardo perez

JOHANA MARCELA.. DIAZ GARZON.
RM: 35353821
Firma y sello del médico

ANGEL LIBARDO PEREZ PEÑA
CC 17330024
Firma del trabajador

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL PRE INGRESO

Dirreción: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

Cendiatra

SEDE	CENDIATRA VILLAVICENCIO	**DIRECCIÓN**	Avenida 40 N° 27 – 63
TELÉFONO		**EMAIL**	citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-08-14	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



Nombres y Apellidos	ANGEL LIBARDO PEREZ PEÑA			Identificación CC	Nro 17330024
Fecha de Nacimiento	1964-10-19	**Edad**	58	**Sexo**	M
Empresa	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN				
Cargo	AYUDANTE DE CONSTRUCCION				
Fecha Ingreso	2023-08-14 14:49:23	**Fecha Salida**	2023-08-14 14:50:36		

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ	EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO	VISIOMETRIA
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO
COLESTEROL TOTAL	GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
TRIGLICERIDOS	

CONCEPTO_DE_APTITUD

CONCEPTO DE APTITUD	APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES

VALORACION OPTOMETRICA	SI Observaciones: EN SU EPS, REQUIERE CORRECCION OPTICA PARA SUS FUNCIONES DIARIAS.
OTRAS:	SI Observaciones: RECOMENDACIONES GENERALES: CONTROLES ANUALES POR AUDIOMETRIA.

SE_SUGIERE_CONTROL_PROGRAMAS_VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA

CONDICION VISUAL	SI
CONDICION AUDITIVA	SI
OTROS	NO PRESENTA

La presente certificación se expide con base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009 y Resolución 217 de 2014.

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.

Dra. Johana Diaz
Medico Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 3462 - 2014

JOHANA MARCELA.. DIAZ GARZON.
RM: 35353821
Firma y sello del médico

Angel libardo perez

ANGEL LIBARDO PEREZ PEÑA
CC 17330024
Firma del trabajador

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL

Dirreción: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

Cendiatra

SEDE	CENDIATRA VILLAVICENCIO	**DIRECCIÓN**	Avenida 40 Nº 27 – 63
TELÉFONO		**EMAIL**	citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-08-14	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



Nombres y Apellidos	GILBER DUBEY MEDINA VILLAMOR		Identificación CC	Nro	1006810122
Fecha de Nacimiento	2000-07-23	**Edad** 23	**Sexo**	M	
Empresa	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN				
Cargo	OBRERO				
Fecha Ingreso	2023-08-14 14:55:05	**Fecha Salida**	2023-08-14 14:55:17		

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ	EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO	VISIOMETRIA
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO
COLESTEROL TOTAL	GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
TRIGLICERIDOS	

CONCEPTO_DE_APTITUD

APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS	APTO Y SIN RESTRICCION PARA TRABAJO EN ALTURAS
TIPO DE RESTRICCIONES O LIMITACIONES	NO PRESENTA

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.

Dra. Johana Diaz
Medico Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 3462. - 2016

JOHANA MARCELA.. DIAZ GARZON.
RM: 35353821
Firma y sello del médico

GILBER DUBEY MEDINA VILLAMOR
CC 1006810122
Firma del trabajador

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL PRE INGRESO

Dirreción: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

Cendiatra

SEDE	CENDIATRA VILLAVICENCIO	**DIRECCIÓN**	Avenida 40 Nº 27 – 63
TELÉFONO		**EMAIL**	citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-08-14	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



Nombres y Apellidos	GILBER DUBEY MEDINA VILLAMOR			Identificación CC	Nro 1006810122
Fecha de Nacimiento	2000-07-23	**Edad**	23	**Sexo**	M
Empresa	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN				
Cargo	OBRERO				
Fecha Ingreso	2023-08-14 14:54:22	**Fecha Salida**	2023-08-14 14:54:32		

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ	EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO	VISIOMETRIA
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO
COLESTEROL TOTAL	GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
TRIGLICERIDOS	

CONCEPTO_DE_APTITUD

CONCEPTO DE APTITUD — APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES

OTRAS: — NO PRESENTA

SE_SUGIERE_CONTROL_PROGRAMAS_VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA

OTROS — NO PRESENTA

La presente certificación se expide con base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009 y Resolución 217 de 2014.

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Ful Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.

Dra. Johana Diaz
Medico Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 3462 - 2014

JOHANA MARCELA.. DIAZ GARZON.
RM: 35353821
Firma y sello del médico

GILBER DUBEY MEDINA VILLAMOR
CC 1006810122
Firma del trabajador

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL

Dirreción: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

Cendiatra

SEDE	CENDIATRA VILLAVICENCIO	**DIRECCIÓN**	Avenida 40 Nº 27 – 63
TELÉFONO		**EMAIL**	citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-08-14	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



Nombres y Apellidos	HECTOR MANUEL QUEJADA VALOYES			Identificación CC	Nro 11791906
Fecha de Nacimiento	1960-09-04	**Edad**	62	**Sexo**	M
Empresa	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN				
Cargo	OFICIAL				
Fecha Ingreso	2023-08-14 14:37:59	**Fecha Salida**	2023-08-14 14:38:34		

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ
EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO
VISIOMETRIA
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL
COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO
COLESTEROL TOTAL
GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
TRIGLICERIDOS

CONCEPTO_DE_APTITUD

APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
CON RESTRICCIONES TEMPORALES PARA TRABAJO EN ALTURAS
TIPO DE RESTRICCIONES O LIMITACIONES
VALORACION PRIORITARIO EN SU EPS, REQUIERE CORECCION OPTICA PARA SUS FUNCIONES DIARIAS.

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.

Dra. Johana Diaz
Medico Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 3462 - 2014

HECTOR MANUEL

JOHANA MARCELA., DIAZ GARZON.
RM: 35353021
Firma y sello del médico

HECTOR MANUEL QUEJADA VALOYES
CC 11791906
Firma del trabajador

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL PRE INGRESO

Dirrección: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

Cendiatra

SEDE	CENDIATRA VILLAVICENCIO	**DIRECCIÓN**	Avenida 40 Nº 27 – 63
TELÉFONO		**EMAIL**	citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-08-14	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



Nombres y Apellidos	HECTOR MANUEL QUEJADA VALOYES			**Identificación CC**	Nro 11791906
Fecha de Nacimiento	1960-09-04	**Edad**	62	**Sexo**	M
Empresa	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN				
Cargo	OFICIAL				
Fecha Ingreso	2023-08-14 14:30:59	**Fecha Salida**	2023-08-14 14:36:15		

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL
COLESTEROL TOTAL
TRIGLICERIDOS
EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
VISIOMETRIA
COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO
GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA

CONCEPTO_DE_APTITUD

CONCEPTO DE APTITUD	APTO CON RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES

EVITAR SOBRECARGAS MAYORES A 25 KG.	SI
VALORACION OPTOMETRICA	SI Observaciones: VALORACION PRIORITARIO EN SU EPS, REQUIERE CORECCION OPTICA PARA SUS FUNCIONES DIARIAS.
VALORACION EPS	SI Observaciones: MEDICO GENERAL PARA DESCARTAR DEFECTO EN PARED ABDOMINAL.
OTRAS:	NO PRESENTA

SE_SUGIERE_CONTROL_PROGRAMAS_VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA

CONDICION VISUAL	SI
OTROS	NO PRESENTA

La presente certificación se expide con base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009 y Resolución 217 de 2014.

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.

Dra. Johana Diaz
Medico Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 3462 - 2016

Hector manuel

JOHANA MARCELA., DIAZ GARZON.
RM: 35353821
Firma y sello del médico

HECTOR MANUEL QUEJADA VALOYES
CC 11791906
Firma del trabajador

Dirrección: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL

Dirreción: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

Cendiatra

SEDE	CENDIATRA VILLAVICENCIO	**DIRECCIÓN**	Avenida 40 Nº 27 – 63
TELÉFONO		**EMAIL**	citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-08-14	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



Nombres y Apellidos	JESUS ANIBAL REYES CHACON			Identificación CC	Nro 86088695
Fecha de Nacimiento	1985-08-04	**Edad**	38	**Sexo**	M
Empresa	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN				
Cargo	MAESTRO				
Fecha Ingreso	2023-08-14 12:55:04	**Fecha Salida**	2023-08-14 12:55:12		

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ	EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO	VISIOMETRIA
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO
COLESTEROL TOTAL	GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
TRIGLICERIDOS	

CONCEPTO_DE_APTITUD

APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS	APTO Y SIN RESTRICCION PARA TRABAJO EN ALTURAS
TIPO DE RESTRICCIONES O LIMITACIONES	NO PRESENTA

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.

Dra. Johana Diaz
Medico Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 3462 - 2016

Anibal Reyes

JOHANA MARCELA.. DIAZ GARZON.
RM: 35353821
Firma y sello del médico

JESUS ANIBAL REYES CHACON
CC 86088695
Firma del trabajador

CERTIFICADO MÉDICO OCUPACIONAL PRE INGRESO

Dirreción: CALLE 19 No. 3-50 p 12 Cs 1202 y 1203
Teléfono: (57 1) 7443001
Web: www.cendiatra.com
Email: contactenos@cendiatra.com

Cendiatra

SEDE	CENDIATRA VILLAVICENCIO	**DIRECCIÓN**	Avenida 40 Nº 27 – 63
TELÉFONO		**EMAIL**	citas.villavicencio@cendiatra.com
FECHA DE EXAMEN	2023-08-14	**TIPO DE EXAMEN**	PREINGRESO

IDENTIFICACION DEL PACIENTE



Nombres y Apellidos	JESUS ANIBAL REYES CHACON			**Identificación CC**	Nro 86088695
Fecha de Nacimiento	1985-08-04	**Edad**	38	**Sexo**	M
Empresa	TAUTIVA DUEÑAS JESUS IVAN				
Cargo	MAESTRO				
Fecha Ingreso	2023-08-14 12:54:08	**Fecha Salida**	2023-08-14 12:54:33		

EXAMENES

AUDIOMETRIA TAMIZ	EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO	VISIOMETRIA
COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD HDL	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] AUTOMATIZADO
COLESTEROL TOTAL	GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA
TRIGLICERIDOS	

CONCEPTO_DE_APTITUD

CONCEPTO DE APTITUD — APTO Y SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

RECOMENDACIONES

OTRAS: — NO PRESENTA

SE_SUGIERE_CONTROL_PROGRAMAS_VIGILANCIA_EPIDEMIOLOGICA

OTROS — NO PRESENTA

La presente certificación se expide con base a la historia clínica ocupacional del trabajador, la cual tiene carácter confidencial y su manejo está regulado por la Resolución 1995 de 1999, Resolución 2346 de 2007, Resolución 1918 de 2009 y Resolución 217 de 2014.

Acepto las anteriores valoraciones Médicas realizadas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

La firma de este documento no significa aceptación de los conceptos médicos expresados y de su contenido. Sirve adicionalmente para constar quien presento la valoración.

Fui Informado sobre mi estado actual de condiciones salud.

Dra. Johana Diaz
Medico Especialista en Gerencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
Resolución 3462 - 2016

JOHANA MARCELA.. DIAZ GARZON.
RM: 35353821
Firma y sello del médico

Anibal Reyes

JESUS ANIBAL REYES CHACON.
CC 86088695
Firma del trabajador

ANEXO PARAFISCALES

Tabla 22

Relación del Personal Profesional en Obra

Nombre	Cédula	Tarjeta Profesional	Cargo	EPS	AFP	ARL	CCF
José Marx Reyes	79.782.465	A25041999-79685757	Director de Obra	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Pedro López Ostos	79.949.909	25202-112099	Residente de Obra	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COLSUBSIDIO
Lina Fernanda Urrego	1.053.797.649	17202-195361	Residente de Obra	FOSYGA	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COLSUBSIDIO
Jeimy Viviana Echeverry Rodríguez	1.014.272.125	25202-356744 CND	Residente de Obra	SANITAS	PORVENIR	SURA	COMPENSAR
Jaime Buitrago Nova	79.464.037	25202.43302	Especialista de Estructuras	FAMISANAR	COLPENSIONES	COLPATRIA	COMPENSAR
Edgar Javier Gutiérrez B.	80.122.216	CN205-71295	Ingeniero Eléctrico	COMPENSAR	COMPENSAR	COLFONDOS	SURA
Claudia Patricia Rodríguez H.	1.010.165.507	25335-200159 CND 25202-347946 CND	Ingeniero Hidráulico	COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA SEGUROS	COMPENSAR
Diana Carolina Vega	40.217.089	Resolución 3831	Profesional SST	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
María del Pilar Sepúlveda Suarez	1.018.427.594	1779151023	Profesional Social	SANITAS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	COFREM

Nombre	Cédula	Tarjeta Profesional	Cargo	EPS	AFP	ARL	CCF
Astrid Ruiz González	40.341.812	25238-366217 CND	Ingeniera Ambiental	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Joel Pineda Sandoval	1.126.246.825	25202-388151CND	Ingeniero	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	AXA COLPATRIA	COFREM
Leidy Natalia Martínez	1.020.807.368	-	Profesional en Finanzas	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Juan Sebastián Calderón Rodríguez	1.121.945.997	0911037-0581731 CND	Residente Administrativo	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM

Nota. Ver anexo. Pago de seguridad social.

Tabla 23

Relación del Personal no Profesional del Contratista de Obra

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF
Sol Lourdes Ramírez	28.589.257	Controladora Vial	Consorcio Educación C&G-MH	CAJACOPI	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Ángela María Silva	1.121.904.972	Controladora Vial	Consorcio Educación C&G-MH	CAJACOPI	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Camilo Gómez Rodríguez	1.006.860.529	Almacenista	Consorcio Educación C&G-MH	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COFREM
Miguel García Buelvas	1.121.904.981	Ayudante	Consorcio Educación C&G-MH	CAJACOPI	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COFREM
Brayan Sneider Urquiza Barrera	1.193.089.901	Ayudante de Obra	Consorcio Educación C&G-MH	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Anderson Camilo Urquiza Barrera	1.006.797.237	Ayudante de Obra	Consorcio Educación C&G-MH	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM

Nota. Ver anexo. Pago de seguridad social.

Tabla 16

Relación del Personal de Contratistas de Obra

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF
Martin Peña Arias	91.447.961	Operador Bomba Estacionaria	Altara Ingeniería S.A.S	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Brayan Herrera Hernández	1.234.788.329	Operador Excavadora Hidráulica	Altara Ingeniería S.A.S	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Leider Cardona Barrera	1.006.516.356	Operador de Minicargador	Altara Ingeniería S.A.S	COMPENSAR	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Diosnell José Mosqueda Torres	5386773	Auxiliar de Planta Concreto	Altara Ingenieria S.A.S	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Diego Alexander Burgos Barbosa	79.947.504	Operador de Planta de Concreto	Altara Ingenieria S.A.S.	FAMISANAR	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Juan Eduardo Torres Traslaviña	1.000.219.013	Ayudante Bomba Estacionaria	Altara Ingenieria S.A.S	CAJACOPI	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
Jesús Iván Tautiva Dueñas	86.048.539	Ingeniero Civil	Jesús Iván Tautiva Dueñas	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Nicolás Ramírez Rodríguez	1.121.938.987	Ingeniero Civil	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Axón Murillo Mosquera	8.116.085	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	COFREM
Cesar Tulio Torres Maturana	1.078.456.783	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	FAMISANAR	COLFONDOS	POSITIVA	COFREM
Edwin Mosquera Córdoba	1.018.438.040	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	COFREM
Jhon Fredys Bonilla Palacios	1.010.165.547	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PROTECCION	POSITIVA	COFREM
Juan Carlos Moreno Palomeque	1.033.714.256	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Wilmar Alberto Álvarez Mesa	1.088.266.262	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	COFREM

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF
Diego Fernando Vázquez Tautiva	9.529.016	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
José Alexis Palacios Murillo	71.990.028	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Harry Valencia Chaverra	1.193.089.901	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Jhon Alexander Gamboa	1.128.525.438	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Brayan Stiven Palacio Chaverra	1.077.438.395	Ayudante de Obra	Jesús Ivan Tautiva Dueñas	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Jesús Aníbal Reyes Chacón	86.088.695	Maestro de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	SALUD TOTAL	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Héctor Quejada Valoyes	11.791.906	Oficial de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	CAPITAL SALUD	COLPENSIONES	POSITIVA	COFREM
Ángel Pérez Peña	17.330.024	Ayudante de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	COFREM
Gilber Medina Villamor	1.006.810.122	Ayudante de Obra	Jesús Iván Tautiva Dueñas	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	COFREM
Jaime Rodríguez Cortes	93.201.155	Topógrafo	Jaime Rodríguez Cortes	COMPENSAR	PROTECCIÓN	SURA	-
Carlos Islen Plata González	1.032.366.062	Operario de Explosivos	EXVOCOL S.A.S.	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	COMPENSAR
Juan Carlos Escobar Rentería	1073322160	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S.	NUEVA EPS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Orlando Hinestroza Córdoba	71.762.284	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Eugenio Mena Medina	1.076.018.185	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SURA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Yerlintong Murillo Pino	1.025.643.730	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SURA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
José Clemente Mosquera Perea	1.010.064.371	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR

Nombre	Cédula	Cargo	Contratista	EPS	AFP	ARL	CCF
Cruz Marino Copete Copete	79.947.504	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SURA EPS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Ignacio C. Murillo Bedoya	71.939.286	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Leyser Córdoba Mosquera	1.129.044.302	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SURA EPS	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
José Dayle Murillo Palacios	71.386.581	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
José Maurilio Valencia Rivas	11.636.114	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
José Leiser Palacios Moreno	1.078.857.349	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Jahson Olider Lezcano Cuesta	1.042.732.197	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SALUD TOTAL	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Gonzalo E. Calle	11.807.151	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SALUD TOTAL	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Eber Wilinton Palacios Pérez	11.801.617	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SALUD TOTAL	PROTECCION	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Abraham Córdoba Cuesta	71.936.468	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SURA EPS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
José Ignacio Valencia Moreno	71.938.949	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	NUEVA EPS	COLFONDOS	AXA COLPATRIA	COMPENSAR
Marín Mosquera Ibarguen	71.780.439	Ayudante de Obra	Construobras Viales S.A.S	SALUD TOTAL	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COMPENSAR

Nota. Ver anexo. Pago de seguridad social.

DIRECTOR DE OBRA

PROFESIONAL SST

PROFESIONAL SOCIAL

INGENIERA AMBIENTAL

INGENIERO DE APOYO

PROFESIONAL EN FINANZAS

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	432387289	9462586301	E	2024/02/02	2024/02/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$9,929,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO EDUCACION (13 Afiliados)																						$32,352,641	$5,276,800			$32,352,641	$1,294,600			$32,286,013	$1,291,900			$32,352,641		$2,066,100		$0	$0		$9,929,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000	$104,000			$2,600,000		$13,600		$0	$0		$637,600
1	CC	1020807368	MARTINEZ LEIDY																		23030 1	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$104,000	CCF34	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	0.522%	$13,600	30	$0	$0	Si	$637,600
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (12 Afiliados)																						$29,752,641	$4,860,800			$29,752,641	$1,190,600			$29,686,013	$1,187,900			$29,752,641		$2,052,500		$0	$0		$9,291,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (12 Afiliados)																						$29,752,641	$4,860,800			$29,752,641	$1,190,600			$29,686,013	$1,187,900			$29,752,641		$2,052,500		$0	$0		$9,291,800
2	CC	1121945797	CALDERON JUAN	X																	23030 1	8	$933,334	$149,400	EPS005	8	$933,334	$37,400	CCF34	8	$933,334	$37,400	14-4	8	$933,334	6.960%	$65,000	8	$0	$0	Si	$289,200
3	CC	1112190498	GARCIA MIGUEL							X		X									25-14	30	$1,447,287	$231,600	CCFC55	30	$1,447,287	$57,900	CCF34	30	$1,447,287	$57,900	14-4	30	$1,447,287	6.960%	$100,800	30	$0	$0	Si	$448,200
4	CC	1006860529	GOMEZ CAMILO													X					25-14	3	$225,000	$36,000	EPS002	3	$225,000	$9,000	CCF34	3	$180,000	$7,200	14-4	3	$225,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$52,200
5	CC	1006860529	GOMEZ CAMILO									X									25-14	27	$2,165,745	$346,600	EPS002	27	$2,165,745	$86,700	CCF34	27	$2,165,745	$86,700	14-4	27	$2,165,745	6.960%	$150,800	27	$0	$0	Si	$670,800
6	CC	1126246825	PINEDA JOEL																		23020 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS002	30	$4,500,000	$180,000	CCF34	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
7	CC	28589257	RAMIREZ SOL													X					23030 1	1	$43,628	$7,000	CCFC55	1	$43,628	$1,800	CCF34	1	$43,333	$1,800	14-4	1	$43,628	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,600
8	CC	28589257	RAMIREZ SOL							X		X									23030 1	29	$1,315,444	$210,500	CCFC55	29	$1,315,444	$52,700	CCF34	29	$1,315,444	$52,700	14-4	29	$1,315,444	6.960%	$91,600	29	$0	$0	Si	$407,500
9	CC	79782465	REYES JOSE																		23030 1	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS002	30	$10,000,000	$400,000	CCF34	30	$10,000,000	$400,000	14-4	30	$10,000,000	6.960%	$696,000	30	$0	$0	Si	$3,196,000
10	CC	40341812	RUIZ ASTRID																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
11	CC	1018427594	SEPULVEDA MARIA																		23100 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
12	CC	1121904972	SILVA ANGELA							X		X									23030 1	30	$1,327,660	$212,500	CCFC55	30	$1,327,660	$53,200	CCF34	30	$1,327,660	$53,200	14-4	30	$1,327,660	6.960%	$92,500	30	$0	$0	Si	$411,400
13	CC	1006796237	URQUIZA ANDERSON	X								X									23030 1	8	$368,000	$58,900	EPS002	8	$368,000	$14,800	CCF34	8	$346,667	$13,900	14-4	8	$368,000	6.960%	$25,700	8	$0	$0	Si	$113,300
14	CC	1193089901	URQUIZA BRAYAN							X		X									23030 1	30	$1,426,543	$228,300	EPS041	30	$1,426,543	$57,100	CCF34	30	$1,426,543	$57,100	14-4	30	$1,426,543	6.960%	$99,300	30	$0	$0	Si	$441,800
15	CC	40217089	VEGA DIANA																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total			**Afiliados(13)**																				$32,352,641	$5,276,800			$32,352,641	$1,294,600			$32,286,013	$1,291,900			$32,352,641		$2,066,100		$0	$0		$9,929,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901687301	9	CONSORCIO EDUCACION C&G-MH	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO EDUCACION	CL 15 40 01 41 101	VILLAVICENCIO-META	3008620623	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	432387289	9462586301	E	2024/02/02	2024/02/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$9,929,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$5,276,800	$0	$0	$5,276,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$614,200	$0	$0	$614,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,622,600	$0	$0	$3,622,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$720,000	$0	$0	$720,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$2,066,100	$0	$0	$2,066,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	13	$2,066,100	$0	$0	$2,066,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,291,900	$0	$0	$1,291,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	13	$1,291,900	$0	$0	$1,291,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,294,600	$0	$0	$1,294,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$165,600	$0	$0	$165,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$137,100	$0	$0	$137,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$690,500	$0	$0	$690,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$301,400	$0	$0	$301,400
TOTAL				13	$9,929,400	$0	$0	$9,929,400

2024/02/08 03:19 PM

RESIDENTE I

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800140959	1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PUENTE CALLE 80	CRA 7 NO 75 51	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6401500	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	454520561	9462952823	E	2024/02/14	2024/02/14	BANCO POPULAR		$13,906,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	cdp	tap	vsp	cor	vst	sln	igo	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79712273	BELTRAN LUIS											X							23020 1	15	$2,250,000	$360,000	EPS017	15	$2,250,000	$90,000	CCF22	15	$2,250,000	$0	14-4	15	$2,250,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$450,000
2	CC	79712273	BELTRAN LUIS											X							23020 1	15	$2,250,000	$360,000	EPS017	15	$2,250,000	$90,000	CCF22	15	$2,250,000	$0	14-4	15	$2,250,000	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$450,000
3	CC	1073383630	BLANCO PAULA																		23030 1	30	$5,000,000	$800,000	EPS017	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-4	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	SI	$1,548,000
4	CC	80470368	CABRERA MILLER	X																	23030 1	27	$1,170,000	$187,200	EPS017	27	$1,170,000	$46,800	CCF22	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	SI	$362,300
5	CC	1020811925	CASTELLANOS CAROL																		23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS017	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	6.960%	$146,200	30	$0	$0	SI	$650,200
6	CC	53028136	DEVIA KELLY																		25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS017	30	$4,500,000	$180,000	CCF22	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
7	CC	80190401	ESPITIA GONZALO	X																	25-14	14	$1,306,667	$209,100	EPS005	14	$1,306,667	$52,300	CCF22	14	$1,306,667	$52,300	14-4	14	$1,306,667	6.960%	$91,000	14	$0	$0	SI	$404,700
8	CC	1019102314	GARZON JHON	X																	23030 1	27	$3,150,000	$504,000	EPS017	27	$3,150,000	$126,000	CCF22	27	$3,150,000	$126,000	14-4	27	$3,150,000	6.960%	$219,300	27	$0	$0	SI	$975,300
9	CC	79949909	LOPEZ PEDRO																		25-14	30	$7,500,000	$1,275,000	EPS005	30	$7,500,000	$300,000	CCF22	30	$7,500,000	$300,000	14-4	30	$7,500,000	6.960%	$522,000	30	$0	$0	SI	$2,397,000
10	CC	52073499	PEREZ LAURA																		25-14	30	$4,500,000	$720,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF22	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	SI	$1,393,200
11	CC	79241235	PRIETO CARLOS																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
12	CC	18413249	RIVEROS JOSE											X							23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF22	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$17,400
13	CC	18413249	RIVEROS JOSE											X							23030 1	9	$390,000	$62,400	EPS002	9	$390,000	$15,600	CCF22	9	$390,000	$0	14-4	9	$390,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$78,000
14	CC	18413249	RIVEROS JOSE							X											23030 1	19	$823,334	$131,800	EPS002	19	$823,334	$33,000	CCF22	19	$823,334	$33,000	14-4	19	$823,334	6.960%	$57,400	19	$0	$0	SI	$255,200
15	CC	80163880	RUIZ CESAR							X											23100 1	30	$5,300,000	$901,000	EPS005	30	$5,300,000	$212,000	CCF22	30	$5,300,000	$212,000	14-4	30	$5,300,000	6.960%	$368,900	30	$0	$0	SI	$1,693,900
16	CC	80818178	SANDOVAL GELMAN										X								23020 1	3	$160,000	$25,600	EPS002	3	$160,000	$0	CCF22	3	$160,000	$0	14-4	3	$160,000	0.000%	$0	3	$0	$0	SI	$25,600
17	CC	80818178	SANDOVAL GELMAN									X									23020 1	27	$1,457,021	$233,200	EPS002	27	$1,457,021	$58,300	CCF22	27	$1,457,021	$58,300	14-4	27	$1,457,021	6.960%	$101,500	27	$0	$0	SI	$451,300
18	CC	80168029	TORRES JUAN	X								X									23030 1	27	$1,225,319	$196,100	EPS008	27	$1,225,319	$49,100	CCF22	27	$1,225,319	$49,100	14-4	27	$1,225,319	6.960%	$85,300	27	$0	$0	SI	$379,600
19	PT	6603980	URBINA ESTEFANY	X																	23030 1	27	$1,170,000	$187,200	EPSC34	27	$1,170,000	$46,800	CCF22	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	6.960%	$81,500	27	$0	$0	SI	$362,300
Total			Afiliados(15)																				$46,339,008	$7,542,500			$46,339,008	$1,847,400			$46,339,008	$1,648,300			$46,339,008		$2,868,200		$0	$0		$13,906,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$7,542,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$901,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,924,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$2,738,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$978,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$2,868,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	14	$2,868,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,648,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	14	$1,648,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	$1,847,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$49,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$816,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$190,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$744,300
TOTAL				15	$13,906,400

RESIDENTE II

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800140959	1	CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	Cra. 7 No. 75-51 Off: 602	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6401500	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-02	455022111	9462844654	E	2024/02/14	2024/02/14	BANCO DE OCCIDENTE		$41,792,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1022412319	AGUIRRE ANGIE													X					23100 1	7	$1,050,000	$168,000	EPS005	7	$1,050,000	$42,000	CCF22	7	$1,050,000	$42,000	14-4	7	$1,050,000	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$252,000
2	CC	1022412319	AGUIRRE ANGIE							X		X									23100 1	23	$3,496,667	$559,500	EPS005	23	$3,496,667	$139,900	CCF22	23	$3,496,667	$139,900	14-4	23	$3,496,667	0.522%	$18,300	23	$0	$0	Si	$857,600
3	CC	52388739	CARREÑO NELLY							X											23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$515,000
4	CC	52810891	CASTILLO LADY													X					25-14	7	$863,334	$138,200	EPS005	7	$863,334	$34,600	CCF22	7	$863,334	$34,600	14-4	7	$863,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$207,400
5	CC	52810891	CASTILLO LADY							X											25-14	23	$2,836,667	$453,900	EPS005	23	$2,836,667	$113,500	CCF22	23	$2,836,667	$113,500	14-4	23	$2,836,667	0.522%	$14,900	23	$0	$0	Si	$695,800
6	CC	79685757	CLAVIJO JOSE													X					25-14	7	$1,932,234	$328,600	EPS008	7	$1,932,234	$241,600	CCF22	7	$1,352,564	$54,200	14-4	7	$1,932,234	0.000%	$0	7	$3,943,333	$197,200	No	$821,600
7	CC	79685757	CLAVIJO JOSE							X											25-14	23	$9,069,667	$1,542,000	EPS008	23	$9,069,667	$1,133,800	CCF22	23	$9,069,667	$362,800	14-4	23	$9,069,667	6.960%	$631,300	23	$9,069,667	$453,500	No	$4,123,400
8	CC	1101441715	CORTES GRACIELA													X					23030 1	14	$863,334	$138,200	EPS005	14	$863,334	$34,600	CCF22	14	$863,334	$34,600	14-4	14	$863,334	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$207,400
9	CC	1101441715	CORTES GRACIELA							X											23030 1	16	$986,667	$157,900	EPS005	16	$986,667	$39,500	CCF22	16	$986,667	$39,500	14-4	16	$986,667	1.044%	$10,400	16	$0	$0	Si	$247,300
10	CC	1020717486	CRUZ JENNY																		23030 1	30	$6,500,000	$1,105,000	EPS017	30	$6,500,000	$260,000	CCF22	30	$6,500,000	$260,000	14-4	30	$6,500,000	0.522%	$34,000	30	$0	$0	Si	$1,659,000
11	CC	79221656	ESPALZA ANDRES	X																	23020 1	21	$4,900,000	$784,000	EPS005	21	$4,900,000	$196,000	CCF22	21	$4,900,000	$196,000	14-4	21	$4,900,000	6.960%	$341,100	21	$0	$0	Si	$1,517,100
12	CC	79159668	FERREIRA JUAN							X											25-14	30	$32,500,000	$5,850,000	EPS005	30	$32,500,000	$4,062,500	CCF22	30	$32,500,000	$1,300,000	14-4	30	$32,500,000	0.522%	$169,700	30	$32,500,000	$1,625,000	No	$13,007,200
13	CC	1022380697	GOMEZ IVONNE													X					23030 1	7	$443,334	$71,000	EPS008	7	$443,334	$17,800	CCF22	7	$443,334	$17,800	14-4	7	$443,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$106,600
14	CC	1022380697	GOMEZ IVONNE							X											23030 1	23	$1,456,667	$233,100	EPS008	23	$1,456,667	$58,300	CCF22	23	$1,456,667	$58,300	14-4	23	$1,456,667	0.522%	$7,700	23	$0	$0	Si	$357,400
15	CC	1023880850	JIMENEZ CINDY							X		X									23020 1	30	$3,600,000	$576,000	EPS008	30	$3,600,000	$144,000	CCF22	30	$3,600,000	$144,000	14-4	30	$3,600,000	6.960%	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,114,600
16	CC	80198021	LOZANO PEDRO													X					25-14	14	$1,306,667	$209,100	EPS005	14	$1,306,667	$52,300	CCF22	14	$1,306,667	$52,300	14-4	14	$1,306,667	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$313,700
17	CC	80198021	LOZANO PEDRO							X											25-14	16	$1,493,334	$239,000	EPS005	16	$1,493,334	$59,800	CCF22	16	$1,493,334	$59,800	14-4	16	$1,493,334	6.960%	$104,000	16	$0	$0	Si	$462,600
18	CC	1233903207	MARQUEZ PAULA	X																	23030 1	16	$1,066,667	$170,700	EPS005	16	$1,066,667	$42,700	CCF22	16	$1,066,667	$42,700	14-4	16	$1,066,667	0.522%	$5,600	16	$0	$0	Si	$261,700
19	CC	51825589	MEZA LILIANA		X																25-14	30	$2,625,000	$420,000	EPS005	30	$2,625,000	$105,000	CCF22	30	$8,039,063	$321,600	14-4	30	$2,625,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	Si	$860,400
20	CC	1110531763	MONTAÑO ANGIE							X											23100 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$686,700
21	CC	19496776	ORDOÑEZ EDGAR													X						0	$0	$0	MIN001	7	$408,334	$16,400	CCF22	7	$408,334	$16,400	14-4	7	$408,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$32,800
22	CC	19496776	ORDOÑEZ EDGAR							X												0	$0	$0	MIN001	23	$1,341,667	$53,700	CCF22	23	$1,341,667	$53,700	14-4	23	$1,341,667	6.960%	$93,400	23	$0	$0	Si	$200,800
23	CC	1014214014	ORTIZ AURA							X											23030 1	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$400,000	CCF22	30	$10,000,000	$400,000	14-4	30	$10,000,000	0.522%	$52,200	30	$0	$0	Si	$2,552,200
24	CC	1010226098	ORTIZ BRAYAN													X					23100 1	7	$525,000	$84,000	EPS037	7	$525,000	$21,000	CCF22	7	$525,000	$21,000	14-4	7	$525,000	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$126,000
25	CC	1010226098	ORTIZ BRAYAN							X											23100 1	23	$1,725,000	$276,000	EPS037	23	$1,725,000	$69,000	CCF22	23	$1,725,000	$69,000	14-4	23	$1,725,000	6.960%	$120,100	23	$0	$0	Si	$534,100
26	CC	53165441	OZUNA DILIA							X											23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
27	CC	1233499512	PRIETO ASHLY		X					X											23030 1	23	$1,916,667	$306,700	EPS005	23	$1,916,667	$76,700	CCF22	23	$2,326,392	$93,100	14-4	23	$1,916,667	0.522%	$10,100	23	$0	$0	Si	$486,600
28	CC	37901187	QUECHO NATALIA							X											23090 1	30	$7,300,000	$1,241,000	EPS005	30	$7,300,000	$292,000	CCF22	30	$7,300,000	$292,000	14-4	30	$7,300,000	6.960%	$508,100	30	$0	$0	Si	$2,333,100
29	CC	86062727	RODRIGUEZ CARLOS													X					25-14	8	$1,866,667	$317,500	EPS005	8	$1,866,667	$74,700	CCF22	8	$1,866,667	$74,700	14-4	8	$1,866,667	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$466,900
30	CC	86062727	RODRIGUEZ CARLOS							X											25-14	22	$5,133,334	$872,800	EPS005	22	$5,133,334	$205,400	CCF22	22	$5,133,334	$205,400	14-4	22	$5,133,334	0.522%	$26,800	22	$0	$0	Si	$1,310,400
31	CC	17342734	RODRIGUEZ LEONARDO													X					25-14	7	$1,866,667	$317,500	EPS001	7	$1,866,667	$74,700	CCF22	7	$1,866,667	$74,700	14-4	7	$1,866,667	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$466,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

RESIDENTE III
