CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378
Nit. 901.763.954-3

C.M.15378 – 286

Cocorná - Antioquia, 13 de junio de 2024

Radicado R:2024010262437
Fecha:2024/06/13 8:16:47 AM
Tpo:OFICIO
Responsable BEATRIZ ELENA OSPINA MON

Señores:
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Attn.: Luis Horacio Gallón Arango
Secretario de Infraestructura
Calle 42B Número 52 – 106

~2355111B1465~

REFERENCIA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. **LOTE 3**

CON 15378: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA."

ASUNTO: RADICACIÓN INFORMES SOCIALES MARZO Y MAYO DE 2024

Cordial saludo,

Cumpliendo con nuestras obligaciones contractuales, esta Interventoría se permite radicar los informes del componente social de los meses de marzo y mayo de 2024 con sus respectivos anexos en CD.

Radicado #75

Atentamente,

OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
Director de Interventoría
CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378

Elaboró: Katherine Lopesierra Arteaga Revisó: Ing. Oscar Dávila

ARCHIVO SIF
2024 JUL 2 13:51:44

Carrera 80 bis N° 7ª – 15 T 5 oficina 801
Tel: (601)7914082 Cel.: 320-4713676
15378me@gmail.com
Bogotá DC, Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Informe mensual
Gestión social

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal

Contrato de Interventoría No: 23SS111B1465 de 2023

ENTIDAD CONTRATANTE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

PERIODO:
1 al 18 DE MARZO 2024 +5

Elaborado por:
Mayra Henao Moreno
Katherine Lopesierra Arteaga
Profesionales del área social
Consorcio Mejoramiento 15378

Municipio Cocorná y San Carlos – Antioquia
MARZO 2024

ARCHIVO SIF
2024 JUL 2 13:51:51

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN
No: 4600016585 de 2023

CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378
INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No: 23SS111B1465 de 2023

Firma:	Firma:	Firma:
MAYRA HENAO KATHERINE LOPESIERRA Profesionales Sociales Interventoría	OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA Director de Interventoría	NICOLAS GIRALDO MORALES Supervisor Social SIF
Elaboró	Aprobó	Recibe en la SIF

Contenido

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 6
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 7
4. ALCANCE 8
5. LOCALIZACIÓN 9
6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 11
   - 6.1. Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto 11
     - 6.1.1 Tramo Cocorná 11
     - 6.1.2 Tramo San Carlos 19
   - 6.2. Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria 23
     - 6.2.1 Tramo Cocorná 23
     - 6.2.2 Tramo San Carlos 24
   - 6.3. Programa para la Contratación de Mano de Obra. 25
     - 6.3.1 Tramo Cocorná 25
     - 6.3.2 Tramo San Carlos 28
   - 6.4. Programa de Comunicación y Divulgación. 32
     - 6.4.1 Tramo Cocorná 32
     - 6.4.2 Tramo San Carlos 37
   - 6.5. Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto 43

6.5.1 Tramo Cocorná 43

6.5.2 Tramo San Carlos 45

6.6. Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural 48

6.6.1 Tramo Cocorná 48

6.6.2 Tramo San Carlos 49

6.7. Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria 50

6.7.1 Tramo Cocorná 50

6.7.2 Tramo San Carlos 52

6.8. Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 55

6.8.1 Tramo Cocorná 55

6.8.2 Tramo San Carlos 59

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA 62

7.1.1 Tramo Cocorná 62

7.1.2 Tramo San Carlos 67

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 67

8.1.1 Tramo Cocorná 74

8.1.2 Tramo San Carlos 76

9. Listado de Anexos 79

9.1.1 Tramo Cocorná 79

9.1.2 Tramo San Carlos 80

10. Listado de tablas 84

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe contiene el balance de la gestión social realizada en el mes de marzo del año 2024, de los dos tramos que integran el proyecto Mejoramiento y mantenimiento de las vías del grupo 1 de circuitos estratégicos del departamento de Antioquia. Lote 3: Oriente. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal.

Este documento pretende dar cuenta de las actividades del componente social a la luz del desarrollo de la Gestión social establecida por la Gobernación de Antioquia para proyectos de infraestructura y que se encuentra establecida en el anexo técnico como obligación del contratista de la siguiente manera: "El contratista de obra deberá formular un Plan de manejo de gestión social, este plan busca informar, atender y generar espacios de participación de la comunidad que se encuentra aledaña al área de influencia del proyecto, con el fin de resolver inquietudes, solicitudes generadas a partir de la ejecución de las obras que comprenden el proyecto, de acuerdo, a lo contenido en la Guía de Manejo Social, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo para Proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia, actividades que ya se cuentan contempladas en el presupuesto" (Gobernación de Antioquia, anexo técnico 2023).

En el presente informe se brinda información general del proyecto como contexto, el balance de ejecución de cada uno de los programas integrados en el Plan de Gestión Social, con descripciones de los avances y seguimiento a indicadores de gestión y finalmente las actividades de la Interventoría en el marco del seguimiento y acompañamiento correspondiente en los dos tramos incluidos; San Carlos y Cocorná.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Mediante la Resolución No. 2023060334616 del 06 octubre de 2023 la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia adjudicó el Contrato 4600016585 de 2023, de la Licitación Pública N° LIC-15372, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", Lote 3: Oriente al Consorcio Cocorná 15372, conformado por las empresas Ingetierras de Colombia S.A e IDC Pavimentos S.A.S, mediante el cual se otorgan los tramos:...

- SAN CARLOS: Cruces -Narices (60AN20-1-1), Vía de tercer orden, Inicio: K18+840 (Latitud: 06" 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82"W), Fin: K19-'-835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.

- COCORNÁ: Cocorná - El Ramal (Granada) (60AN17-1), Vía de segundo orden, Inicio: K01+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41" W), Fin: K03+205 (Latitud: 06° 04' 17.30" N Longitud: 075° 10,12.67" W) aproximadamente.

El valor del contrato es: cinco mil doscientos cincuenta y tres millones setecientos treinta y tres mil seiscientos noventa y cuatro pesos ($5.253.733.694,00) y cuenta con un plazo de ejecución de 2 meses.

La interventoría del proyecto es llevada a cabo por el Consorcio Mejoramiento 15378, con número de contrato 23SS111B1465 de 2023 celebrado con la Gobernación de Antioquia.

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

De acuerdo a la Resolución 1917 de la Línea Base Red Vial Departamento de Antioquia, del junio 15 de 2018, existe una problemática constante de orden vial que requiere de soluciones óptimas y acciones inmediatas que permitan dar continuidad a la prestación del servicio de todos los usuarios de las vías en las diferentes subregiones en el Departamento.

Con el estado actual de deterioro de las vías, la movilidad entre las subregiones se reduce considerablemente, produciendo consecuencias negativas para los usuarios en todos los campos, económico, social, aumento en gastos de mantenimiento vehicular, tiempos de desplazamiento más largos, además de inseguridad e incomodidad para quienes transitan las vías.

Por lo anterior, con ánimo de mejorar la capa de rodadura y brindar mayor *seguridad a las personas que transitan por el corredor vial denominado Cocorná* - San Carlos y buscando mejorar un tramo que no presenta problemática geológica y que no requiere de una intervención especial en la vía, se propone un proyecto que beneficia a una población aproximada de 30.000 habitantes entre los municipios de Cocorná y San Carlos, permitiendo así una reducción de tiempos y costos en los desplazamientos, mejorando la economía de la Subregión.

4. ALCANCE

Cocorná

El tramo de mejoramiento Cocorná - El Ramal (60AN17- 1), obedece a una vía de segundo orden, el cual inicia en inicio en el K1+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41"W), y finaliza en el K03+205 (Latitud:06°04 17.30" N Longitud: 075° 10,12.67" W) aproximadamente, así como sus aproximaciones y obras complementarias necesarias para el efectivo funcionamiento del tramo a intervenir. Dicho tramo tiene una longitud aproximada de 2 kilómetros.

San Carlos

El tramo de mejoramiento San Carlos: Cruces – Narices (60AN20-1-1), obedece a una vía de tercer orden, el cual inicia en K18+840 (Latitud: 06° 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82" W), y finaliza en el K19+835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.

Dentro del presente informe de Gestión Social se contemplan actividades que permitirán prevenir, dar respuesta oportuna y/o atender los posibles impactos que se pudieran generar con la ejecución del proyecto y, promoverán la participación de los diversos grupos de interés del área de influencia, en sus diferentes momentos.

5. LOCALIZACIÓN

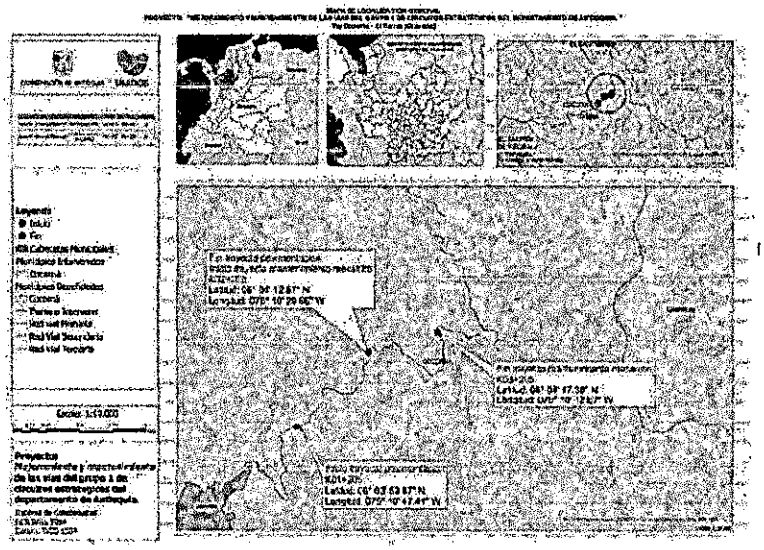


Figura 1.9. Localización de la vía – Cocorná - El Ramal (Granada), (60AN17-1)
Fuente: SIF – Departamento de Antioquia

COCORNÁ: Cocorná - El Ramal (Granada) (60AN17-1), Vía de segundo orden, Inicio: K01+205 (Latitud: 06° 03' 53.87" N Longitud: 075° 10' 47.41" W), Fin: K03+205 (Latitud: 06° 04' 17.30" N Longitud: 075° 10' 12.67" W) aproximadamente.

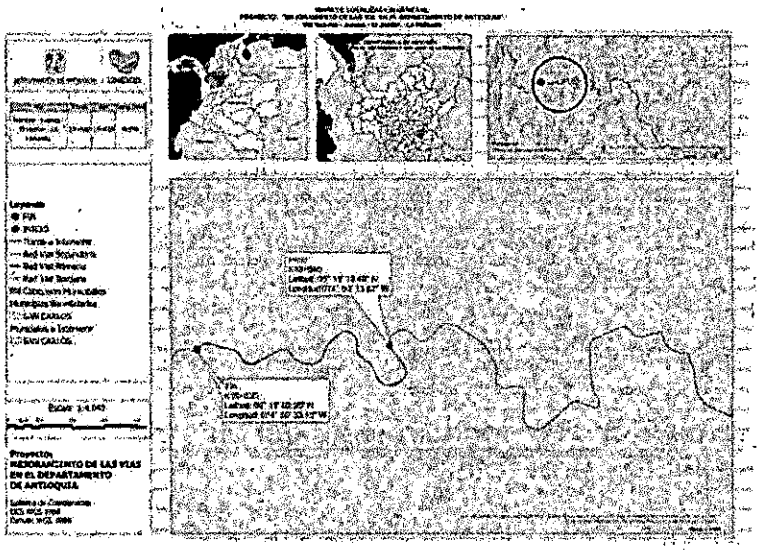


Figura 1.8. Localización de la vía – Cruces – Narices (60AN20-1-1)
Fuente: SIF – Departamento de Antioquia

SAN CARLOS: Cruces -Narices (60AN20-1-1), Vía de tercer orden, Inicio: K18+840 (Latitud: 06° 15' 10.40" N Longitud: 074° 50' 13.82"W), Fin: K19-'-835 (Latitud: 06° 15' 09.95" N Longitud: 074° 50' 33.15" W) aproximadamente.

6. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

En este apartado se desglosan las actividades realizadas por el contratista, esta información se organizó a partir del informe presentado por el mismo y se incluyen las actividades realizadas, indicadores de gestión y el balance desde la Interventoría. Es de aclarar que el informe comprende las fechas entre el 1 al 18 de marzo, teniendo en cuenta que según Acta de suspensión N°1 se considera procedente suspender el contrato, por un término de 20 días entre el 19 de marzo y el 7 de abril de 2024, acorde a lo establecido en el acta CIC 21 del Comité Interno de Contratación celebrado el 19 de marzo del presente año.

6.1. Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto

6.1.1 Tramo Cocorná

Para este tramo el contratista presenta avances en levantamiento de actas de vecindad, de entorno y permisos de intervención de predio para cumplir con el objetivo trazado en el programa correspondiente en el Plan de Gestión Social el cual pretende "implementar medidas de manejo que permitan reconocer el entorno en el cual se desarrolla el proyecto, a través de actividades con las que se pueda identificar el estado actual del área de influencia de la obra, y en caso de generar algún daño, iniciar con el proceso de reparación directa" a continuación se detallan los avances:

Actividades desarrolladas en el período:

- Actas de vecindad:

El número total de predios identificados como línea base para el levantamiento de actas de vecindad es de 48 inmuebles. De estos, 39 corresponden al tramo de

mejoramiento y 9, al tramo de mantenimiento. El levantamiento de estas actas contribuirá a prevenir, mitigar y facilitar la atención en caso de posibles reclamaciones que se pudieran generar por las actividades de obra. En su elaboración se diligenció el formato FO-M2-P2-035 y se levantó el respectivo registro fotográfico de cada predio.

A la fecha, continúa pendiente la firma de las actas de vecindad N° 4 (tramo de mejoramiento) y N° 40 (tramo de mantenimiento) ya que se ha tratado de ubicar a sus propietarios de forma telefónica y no ha sido posible lograr la firma de los mismos. En el primer caso, no se ha podido lograr la firma del documento, por razones de salud de la propietaria y en el segundo, la propietaria se encuentra fuera del país. Se recomendó para el periodo anterior que se hiciera la gestión ante la personería para que sirva como garante de este proceso.

En el presente periodo no fue necesario realizar actualizaciones a las actas de vecindad.

- Actas de Entorno:

Entre los meses de noviembre de 2023 y enero de 2024 fueron levantadas 7 actas de entorno de diferentes tramos de la vía y del ZODME ubicado en el predio El Recreo.

Tabla 1. Actas de entorno levantadas y entregadas Cocorná

Actas de entorno levantadas y entregadas				
N°	**N° de acta de entorno**	**Nov 2023**	**Dic 2023**	**Ene 2024**
1	Acta de entorno n° 1	X		
2	Acta de entorno n° 2	X		
3	Acta de entorno n° 3		X	
4	Acta de entorno n° 4	X		
5	Acta de entorno n° 5		X	
6	Acta de entorno n° 6			X
7	Acta de entorno n° 7			X

- Actas permisos intervención en predios privados:

A lo largo de la ejecución del proyecto se han elaborado 23 actas de "Autorización para intervenir predios privados", en las que además se han abordado temas como: utilización de parte de sus predios para depositar materiales de obra o estacionar maquinaria, la construcción de pasos peatonales provisionales, intervención de obras hidráulicas, retiro de cruz de madera ubicada en el predio, entre otros. Para ello, se utilizó el formato FO-M2-P2-039 de la Gobernación de Antioquia.

Por otra parte, haciendo referencia a 4 de los predios en los que la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, levantó permisos de intervención previamente, se realizan las siguientes anotaciones:

Tabla 2. Propietarios pendientes por contactar – permisos de intervención Gobernación

PENDIENTES DE CONTACTAR			
N°	**Propietario (a)**	**PUNTO REFERENCIA**	**OBSERVACIONES**
1	Gerces Aurelio Peláez	K1+393	Se revisó con la topografía del proyecto y manifiestan que no se intervendrá el predio, por tanto, no se requiere levantar un nuevo permiso de intervención, por tanto se saca de la presente relación para el próximo informe.
2	María Magdalena Quintero - Gloria Martínez	Sin información	Se encuentra pendiente ubicar a los propietarios del predio.
3	José Ernesto Giraldo - Celsia Buitrago	K1+940	Se contactó telefónicamente - pendiente el acta.
4	Jaime de Jesús Suárez Quintero	K02+053	Predio ubicado en el tramo de *mantenimiento. Se encuentra* pendiente contactar al propietario.

Por otra parte, en el presente período se realizaron 4 acercamientos con propietarios de predios ubicados en el área de influencia, de la siguiente manera:

Tabla 3. Acercamientos con propietarios para autorizaciones

N°	FECHA	PROPIETARIO (A)	PUNTO REFERENCIA	OBSERVACIONES - ASUNTO
1	28/02/2024	Clara Zuluaga Mejía	Predio Villa Chamiza – vereda San Juan	Solicitud de autorización para colocación de un punto de emergencia del proyecto. La propietaria dio su aprobación para tal fin.
2	28/02/2024	Sandra Milena Mosquera	K1+740	Solicitud de autorización para colocación de un punto de emergencia del proyecto. La propietaria dio su aprobación para tal fin.
3	01/03/2024	Claver Vargas	K1+890	Solicitud de autorización para la toma de agua de su predio, para la realización de actividades de obra. Se obtuvo la autorización del mismo.
4	02/03/2024	Carlos Danilo Correa	K1+ 117 costado derecho	Se realizó una visita por parte de las áreas social y técnica del Consorcio Cocorná 15372 con el fin de atender sus inquietudes, acerca de la obra hidráulica construida en su predio (autorización de intervención en predio privado N° 18). El propietario, manifestó sentirse satisfecho con la

				información entregada.

- Dificultades presentadas en el proceso:

Las dificultades presentadas en el proceso tienen que ver con las firmas de los propietarios que no están en la zona, sin embargo, como se mencionó anteriormente se le planteo la solución al contratista con el fin de que se apoyè en la personería municipal de Cocorná para que esta sea garante del proceso.




Tabla 4. Indicadores de gestión programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto Tramo Cocorná

Indicador	**%**	**Observaciones**
Una base de datos de actas de vecindad construida.	1 1	Se elaboró la base de datos de actas de vecindad, esta se ha ido actualizando de manera permanente, a medida que ha ido avanzando el proceso.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. Actas de vecindad de inicio diligenciadas/ No. inmuebles en base de datos identificados por el área técnica en zona de influencia directa x 100	48 48	La línea base para el levantamiento de actas de vecindad es de 48 predios (39 del tramo de mejoramiento y 9 del tramo de mantenimiento). De estos, 46 han sido entregadas y firmadas por la Interventoría;

		las otras 2, se encuentran pendiente de firma por parte de los propietarios.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. Actas de entorno de levantadas / No. Actas de entorno de inicio x 100	7 7	Se levantaron 7 actas de entorno de la vía; 6 de ellas corresponden a partes de los tramos de mejoramiento y mantenimiento y 1, al ZODME ubicado en el predio El Recreo.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. actas de permiso de intervención a predios privados levantados y firmados / No. actas de permiso necesarias en el proceso constructivo del proyecto x 100	23 27	A la fecha se han levantado 23 permisos de intervención, 23 de ellos fueron firmados por sus propietarios, 3 de estos fueron incluidos en el recorrido de verificación realizado con la JAC de la vereda San Juan, el 21/02/2024. Se encuentra pendiente, contactar a los 4 propietarios incluidos dentro de los permisos de intervención elaborados previamente por parte de la Gobernación de Antioquia.
Porcentaje de cumplimiento **limiento**	**85%**	

No. de actas de vecindad cerradas/ No. de actas de vecindad totales que requieren cierre x 100.	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. Actas de entorno cierre / Número de actas de entorno totales que requieren cierre x 100.	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de actas de permisos de intervención de predios privados cierre / No. De actas de permisos de intervención de *predios privados totales* que requieren cierre x 100.	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

Tabla 5. Soporte fotográfico para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo Cocorná

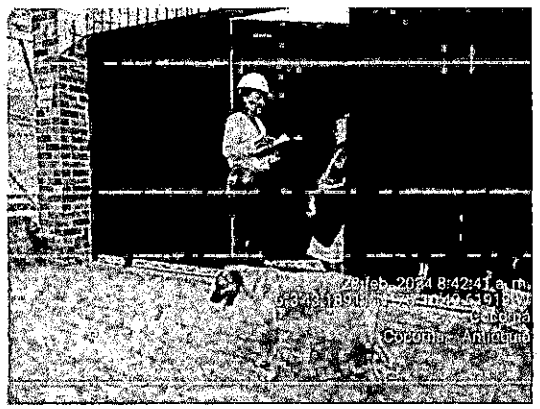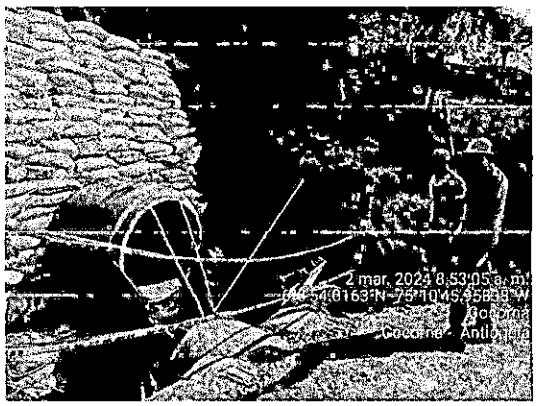	
Reunión con propietaria predio Villa Chamiza - Instalación punto de emergencia del proyecto	Instalación punto de emergencia del proyecto K1+740
	
Reunión con propietario del predio K1+890 - solicitud autorización toma de agua para obras menores	Visita atención inquietudes del propietario del predio K1+117 - 02-03-2024

Anexo 1.Base de datos actas de vecindad, actas de entorno y permisos de intervención.

Anexo 2. Actas reuniones con propietarios

6.1.2 Tramo San Carlos

Para este tramo el contratista no realiza levantamiento de actas de vecindad, dado que ya se realizaron en los periodos anteriores, cumpliendo con el objetivo establecido en el Plan de Gestión Social, por medio de las actividades donde se identifica el estado actual de los predios colindantes y en caso de generar algún daño, iniciar con el proceso de reparación directa.

Actividades desarrolladas en el período:

- Actas de vecindad

Durante el período reportado no correspondía realizar actas de vecindad, puesto que en los periodos anteriores se realizaron las actas de vecindad de apertura y aún no se deben realizar las actas de cierre.

En el mes de noviembre no se registra levantamiento de actas de vecindad.

Durante el mes de diciembre se realizaron cuatro (4) actas de vecindad.

En el mes de enero se finalizó el levantamiento de (6) actas de vecindad dando así un cumplimiento del (100%) las cuales fueron remitidas a interventoría para su revisión y firma.

Desde la Interventoría se realizó acompañamiento al proceso de levantamiento de actas de vecindad para verificar el correcto desarrollo de la actividad.

En los recorridos realizados en las instalaciones de obra, se logró observar que en la zona hay 10 predios, los cuales en su mayoría son residenciales, otros tienen uso comercial para la venta de ganado, piscicultura o lotes sin construcción.

Inicialmente se hizo un primer acercamiento con los propietarios para agendar la visita y ejecutar el diligenciamiento de actas de vecindad, estas se llevaron a cabo sin ninguna novedad, como se menciona anteriormente, se contó con buena disposición de las partes implicadas. Es así como se cumple con este programa sin dificultades presentadas.

Por otro lado, se establece que dentro de las actas de vecindad levantadas no se identifican predios con vulnerabilidad estructural.

En el periodo registrado no se presentaron dificultades

Actas de Entorno

En el mes de marzo no se tuvo la necesidad de realizar actas de entorno.

A la fecha del presente informe no se encuentra pendiente la elaboración de ningún acta de entorno, puesto que se proyectó 1 al inicio del proyecto y ya se encuentra realizada desde el mes de diciembre de 2023, dando por cumplido el 100%de este indicador.

Tabla 6. Actas de entorno levantadas y entregadas en dic-2023 tramo san Carlos – Cruces – Narices

Actas de entorno levantadas y entregadas en dic -2023			
N°	**N° de acta de entorno**	**Nov**	**Dic**
1	Acta de entorno n° 1	0	X

- Actas permisos intervención en predios privados

Tabla 7. Permisos de intervención firmados por Interventoría 2024 tramo San Carlos – Cruces – Narices

PERMISOS DE INTERVENCIÓN REMITIDOS PARA FIRMA DE INTERVENTORÍA					
N°	**N° permiso intervención**	**Propietario (a)**	**Levantados noviembre 2023**	**Levantados diciembre 2023**	**Levantados enero 2024**
1	Permiso *intervención n° 1*	Elquin de *Jesús Franco* Castrillón			x

Tabla 8. Indicadores de gestión Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	**%**	**Observaciones**
Una base de datos de actas de vecindad construida.	1 1	En el mes de enero se elaboró y relaciono la base de datos con la información del total de las actas de vecindad de apertura, por lo tanto, este mes no corresponde continuar con esta actividad.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. Actas de vecindad de inicio diligenciadas/ No. inmuebles en base de datos identificados por el área técnica en zona de influencia directa x 100	10 10	En este periodo no se debían realizar actas de vecindad.
Porcentaje cumplimiento	100%	
~~No. Actas de entorno de levantadas / No.~~	1	~~No correspondía la realización~~

Indicador	%	Observaciones
Actas de entorno de inicio x 100	1	de actas de entorno en el mes de marzo.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. actas de permiso de intervención a predios privados / No. actas de permiso necesarias en el proceso constructivo del proyecto x 100	1 1	Durante el mes de marzo no se realizaron permisos de intervención de predios ni acercamientos con propietarios.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de actas de vecindad cerradas/ No. de actas de vecindad totales que requieren cierre x 100.	N/A N/A	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. Actas de entorno cierre / Número de actas de entorno totales que requieren cierre x 100.	N/A N/A	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	N/A	
No. de actas de permisos de intervención de predios privados cierre / No. De actas de permisos de intervención de predios privados totales que requieren cierre x 100.	N/A N/A	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

6.2. Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria

6.2.1 Tramo Cocorná

En el marco de desarrollo de este programa se realizó la reunión de inicio en el mes de noviembre y en el informe de este periodo fue reportado, por lo cual esto es lo que reporta el contratista:

Actividades desarrolladas en el período:

En el período, no se realizaron reuniones con la comunidad, relacionadas con este programa.

Tabla 9. Indicadores de gestión para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de reuniones de inicio ejecutadas /No. de reuniones de inicio programadas x 100	1 1	El día 15/11/2023 se llevó a cabo la reunión de socialización de inicio de obra. Esta información fue reportada en el mes de noviembre.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de reuniones de finalización ejecutadas / No. de reuniones de finalización programadas x 100	0 0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	

No se presentan anexos no fue necesario

6.2.2 Tramo San Carlos

Como se mencionó en el informe anterior la Reunión de Inicio de obra se realizó el día 29/11/2023 para el tramo Cruces – Narices (San Carlos) en la sede de la Junta

de Acción Comunal del corregimiento El Jordán perteneciente al municipio de San Carlos. En ella se contó con la asistencia de 26 personas de la comunidad, además del personal de la Interventoría y el contratista de obra.

Actividades desarrolladas en el período:

En el período de marzo, no se realizaron reuniones con la comunidad, relacionadas con este programa, por ende, no se presentaron dificultades en la ejecución de las actividades

Tabla 10. Indicadores de gestión programa para la Protección de la Infraestructura Social y comunitario tramo – San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. de reuniones de inicio ejecutadas /No. de reuniones de inicio programadas x 100	1 1	El día 29/11/2023 se llevó a cabo la reunión de socialización de inicio de obra.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de reuniones de finalización ejecutadas / No. de reuniones de finalización programadas x 100	0	Este indicador se medirá en la etapa de cierre del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

6.3. Programa para la Contratación de Mano de Obra.

6.3.1 Tramo Cocorná

1.2.1 Actividades desarrolladas en el período

- Definición de perfiles para mano de obra calificada y no calificada:

En el período se utilizó como mecanismo para publicar los perfiles ocupacionales que se requerían para laborar en el Proyecto, la reunión de CPC efectuada el 14/02/2024. Adicionalmente en cada contacto con los líderes comunitarios de las diferentes veredas del AID se han divulgado los perfiles más requeridos por el proyecto como son de ayudante de obra y oficiales.

- Mecanismos de recepción de hojas de vida:

Por medio del correo electrónico *gestionhumana@ingetierras.com* y, en el Punto de Atención a la Comunidad (PAC) se han venido recibiendo hojas de vida de personal interesado en trabajar para el proyecto. Estas han sido canalizadas al área de Gestión Humana del Consorcio, para los fines pertinentes.

En el mes de marzo no se recibieron hojas de vida de habitantes del AID. Teniendo en cuenta las dimensiones del proyecto, no se requieren volúmenes de contratación de personal muy altos, por lo cual, no se han requerido vinculaciones masivas, por lo cual, no se ha publicado a través de otros medios, información al respecto.

- Vinculación de personal al proyecto:

Entre los meses de noviembre de 2023 y marzo de 2024, han trabajado con el Consorcio Cocorná 15372 - tramo Cocorná - El Ramal (Granada), 45 personas. De las cuales, 15 son habitantes del AID. De estas, 12 laboran en cargos de MONC y 3 como MOC. Por otra parte, 30 personas son foráneas, de las cuales, 19 laboran

53

en cargos de MOC y 11 como MONC. Los cargos de mano de obra calificada – MOC generados en el proyecto son: Ingeniero director de obra, ingenieros, residentes: social, ambiental y SST, tecnólogo en obras civiles, almacenista, operadores de maquinaria pesada, topógrafos, cadenero, conductor y encargados de obra. En cuanto a mano de obra no calificada - MONC se encuentran ayudantes, oficiales, controladoras viales y auxiliar ambiental.

De estas personas, 5 se retiraron en meses anteriores y 3 fueron trasladados entre enero y marzo del presente año; por tanto, el total de personal vinculado al tramo Cocorná – El Ramal (Granada) para el mes de marzo sería 37 personas activas, con este dato, se formularán los indicadores del período.

Tabla 11. Personal vinculado al Proyecto tramo Cocorná

ÍTEM	PERSONAL MOC		PERSONAL MONC	
Procedencia	AID	FORÁNEO	AID	FORÁNEO
Total	3	19	12	11
	22		23	

En este programa, no se han presentado dificultades.

Tabla 12. Indicadores de gestión para la contratación mano de obra – Tramo – Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. trabajadores de MONC del AID contratado / No. total de trabajadores	10 37	De las 37 personas que se encuentran activas en el proyecto, 10 corresponden a MONC del AID.


vinculados al proyecto x 100.		
Porcentaje cumplimiento	**27%**	
No. de trabajadores del proyecto residentes en el área de influencia / No. total, de empleados del proyecto x 100.	12 37	De los 37 empleados que se encuentran activos, 12 son del AID. De estos, 2 corresponde a MOC y 10 a MONC.
Porcentaje cumplimiento	**42%**	
No. de Mujeres contratadas del AID / No. total de trabajadores contratados x 100.	3 37	De los 37 empleados que se encuentran activos a la fecha, 7 son mujeres; de estas 3 son del AID y 4 son foráneas (8%).
Porcentaje cumplimiento	**8%**	

Anexo 3. Formato empleabilidad marzo 2024.

Anexo 4. Formato empleabilidad mujeres marzo 2024

Tabla 13.registro fotográfico personal vinculado al Proyecto tramo Cocorná





6.3.2 Tramo San Carlos

El contratista para este programa y con el fin de cumplir el objetivo establecido que gira en torno a establecer mecanismos claros que permitirán beneficiar a la comunidad del área de intervención directa con la contratación de mano de obra requerida para el proyecto, contribuyendo al desarrollo social y económico de la misma y evitando, la generación de conflictos reporta las siguientes actividades:

- Definición de perfiles para mano de obra calificada y no calificada

Los perfiles que se requerirán para el desarrollo del Proyecto, se irán definiendo a medida que vaya avanzando la obra. Esta información se dará a conocer a través de los diversos medios, a la comunidad del AID: cartelera informativa, CPC, entre otros.

- Mecanismos de recepción de hojas de vida

Por medio del correo electrónico *gestionhumana@ingetierras.com*, en este periodo se han recibido más hojas de vida de forma presencial en el Punto de Atención a la Comunidad (PAC). Estas han sido canalizadas igualmente al área de Gestión Humana del Consorcio, para los fines pertinentes.

- Vinculación de personal al proyecto

A la fecha, laboran en el tramo El Jordán (San Carlos), 35 personas, distribuidas de la siguiente manera:

Tabla 14. Personal vinculado al Proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

ITEM	PERSONAL MOC		PERSONAL MOSC		PERSONAL MONC	
Procedencia	AID	FORÁNEO	AID	FORÁNEO	AID	FORÁNEO
Total	3	6	0	9	8	10
Total personal vinculado al proyecto:			38 personas			

En la tabla anterior se menciona el personal vinculado al proyecto para los cargos relacionados con mano de obra calificada:

Ingeniero director de obra, ingeniero residente, residente ambiental, residente SST, residente social, auxiliar ambiental, almacenista, auxiliar de ingeniería, ingeniero topógrafo, ingeniero auxiliar, tecnólogo topógrafo, para un total de once (11) personal de MOC.

Para mano de obra semi - calificada: se cuenta con un (1) auxiliar de topografía, con tres (3) de maquinaria pesada y cuatro (4) conductores, en cuanto a mano de obra no calificada, se cuenta con cinco (5) oficiales, once ayudantes (11) ayudantes y dos (2) auxiliar de tránsito.

No se presentaron dificultades en la ejecución del presente programa

Desde la interventoría se corrobora que la empresa contratista actualmente cuenta con personal en obra proveniente del corregimiento el Jordán y se continúa con la recepción de hojas de vida y contratación de residentes de la zona. Del mismo modo, se recomienda seguir teniendo en cuenta la empleabilidad de mujeres para dar cumplimiento al ítem establecido para ello.

En este programa, no se han presentado dificultades.

Tabla 15. Indicadores de Gestión para la Contratación de Mano de Obra tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. trabajadores de MONC del AID contratado / No. total de trabajadores vinculados al proyecto x 100.	8 18	El 44,44% del personal de MONC vinculada al proyecto es del AID, en el periodo reportado no se está cumpliendo con la meta, pero se trabajará en ello para el próximo periodo.
Porcentaje cumplimiento	44,44%	
No. de trabajadores del proyecto residentes en el área de influencia / No. total, de empleados del proyecto x 100.	11 35	Del personal vinculado al proyecto, el 28,95% corresponde a MOC y el 72,23% son foráneos. La mano de obra semi calificada cuenta con el 23,68%, 8 son foráneos y 1 es del área de influencia. En cuanto al 47,37% restante, se trata de MONC y (44,44%) son del AID.
Porcentaje cumplimiento	31,42%	
No. de Mujeres contratadas del AID / No. total, de trabajadores contratados x 100.	5 7	Al mes de marzo se contó con siete mujeres en total en el proyecto, lo que representa el 18,42%.
Porcentaje cumplimiento	71,43%	

Anexo 1. Formato Empleabilidad mujeres

Anexo 2. Formato Empleabilidad Marzo

6.4. Programa de Comunicación y Divulgación.

6.4.1 Tramo Cocorná

Con el fin de avanzar en el objetivo del programa que busca "informar de manera oportuna y veraz a la comunidad del AID, sobre temas relacionados con el proyecto, a través de los mecanismos establecidos para tal fin" el contratista desarrolló las siguientes actividades:

1.2.2 Actividades desarrolladas en el período:

- Volantes: en el mes de marzo se establecieron 15 puntos en los que se colocaron afiches con información de los cierres viales de manera semanal, Por tanto, teniendo en cuenta que se elaboraron 9 piezas de divulgación, se considera un total de 135 afiches generados en el mes. Estos se encuentran ubicados en sitios estratégicos de la comunidad, en el PAC del proyecto y al inicio y fin del proyecto donde se encuentran los controladores de tráfico para fácil orientación de la comunidad.

- Adicionalmente, la información se ha divulgado, a través de estados y grupos de WhatsApp publicados en la línea corporativa 3243827981. Los mismos han sido replicados por los integrantes del CPC, habitantes de la comunidad, presidentes de las JAC y residentes de las veredas San Juan, El Chocó, Las Playas y Buenos Aires del municipio, el fontanero del acueducto, los Bomberos de Cocorná y Granada, el Hospital San Juan de Dios y la Policía Nacional y, la oficina de Comunicaciones de la alcaldía de Cocorná a través de sus redes sociales.

- En el período se informó mediante pautas radiales los horarios de cierres de vías.

- Cartelera informativa: Se actualizó la cartelera informativa en el Punto de Atención a la Comunidad, con información referente a los avances presentados en los componentes Social, Ambiental y SST del proyecto.

- Buzones de sugerencias: en el mes de marzo se revisaron semanalmente, los 2 buzones de sugerencias, ubicados en el PAC y en la sede de la JAC de la vereda San Juan, con el acompañamiento de la profesional social de la Interventoría. Se ha recibido una felicitación al personal que labora en el proyecto, por los trabajos realizados y el relacionamiento con la comunidad. De la apertura de los mismos se han levantado actas donde se deja constancia del proceso efectuado.

- Dificultades presentadas en el proceso:

En el período, no se presentaron dificultades o inconvenientes en el desarrollo de este programa.



Tabla 16. Indicadores de Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. vallas informativas instaladas / No. de vallas programadas x 100.	1	En el mes de noviembre se instaló una valla con información del proyecto.
	1	

Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de tijeras de obra instaladas / No. de tijeras de obra totales programadas x 100.	0 2	Se encuentra pendiente la instalación de las tijeras de obra. Sin embargo, este material será incluido en el PMT del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de pasacalles instalados / No. de pasacalles totales programadas x 100.	0 2	Se encuentra pendiente la instalación de las tijeras de obra. Sin embargo, este material será incluido en el PMT del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**N/A**	
No. de volantes distribuidos / No. de volantes programados x 100	135 135	Se elaboraron y distribuyeron 135 volantes para informar a la comunidad, sobre los cierres de la vía por las labores de obra.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de pautas radiales implementadas / No. de pautas programadas x 100.	8 8	Para el período fueron contratadas 8 pautas radiales, con la emisora comunitaria Cascada Estéreo, del municipio de Cocorná, para anunciar cierres viales efectuados por el proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de carteleras implementadas / No. de carteleras programadas x 100.	1	La cartelera informativa ubicada en el PAC del proyecto se ha venido actualizando de forma mensual con

	1	temas de los componentes social, ambiental técnico y SST.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de buzones de sugerencias instalados / No. de buzones de sugerencias programados x 100.	2	Los dos buzones de sugerencia del proyecto, ubicados en el PAC y en la sede de la JAC de la vereda San Juan se han venido revisando de forma semanal conjuntamente, con la Interventoría.
	2	
Porcentaje cumplimiento	**100%**	


Tabla 17. Soporte fotográfico del Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná

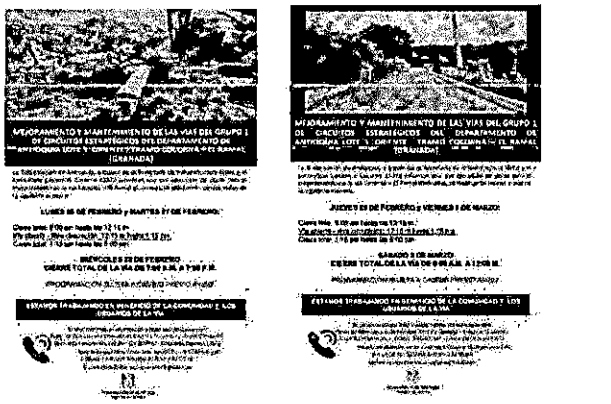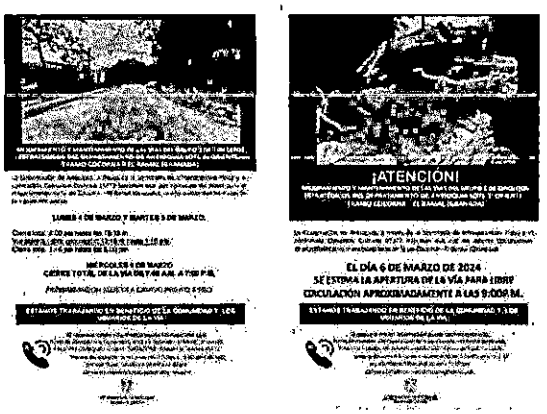	
Divulgación de información de cierres viales – febrero 26 a marzo 18 de 2024	Divulgación de información de cierres viales – febrero 26 a marzo 18 de 2024







Divulgación de información de cierres viales – febrero 26 a marzo 18 de 2024

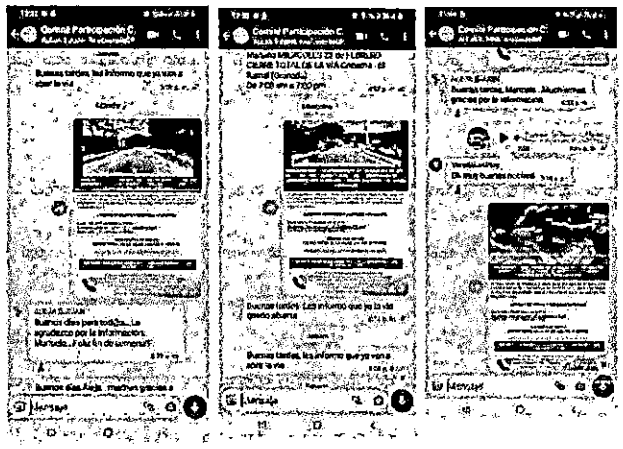

Divulgación de información de cierres viales – febrero 26 a marzo 18 de 2024

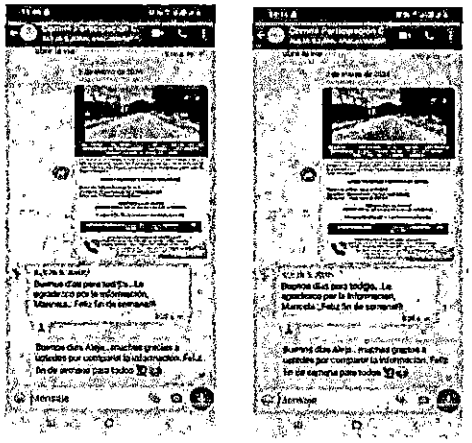





Divulgación de información de cierres viales – febrero 26 a marzo 18 de 2024

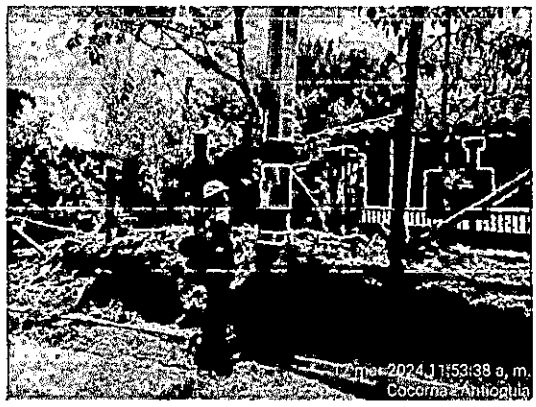

Recorrido para instalación de afiches informativos





Revisión buzón de sugerencias JAC vereda San Juan - Punto de Atención a la Comunidad	Revisión buzón de sugerencias JAC vereda San Juan - Punto de Atención a la Comunidad
 	 
Revisión buzón de sugerencias JAC vereda San Juan - Punto de Atención a la Comunidad	Cartelera informativa del proyecto – Punto de Atención a la Comunidad – PAC (febrero 26 a marzo 18 de 2024)

Anexo 5. Volantes informativos sobre cierres viales.
Anexo 6. Certificado pautas radiales.
Anexo 7. Actas revisión buzones de sugerencias

6.4.2 Tramo San Carlos

Con el fin de avanzar en el objetivo del programa que busca "informar de manera oportuna y veraz a la comunidad del AID, sobre temas relacionados con el proyecto, a través de los mecanismos establecidos para tal fin" el contratista desarrolló las siguientes actividades:

- *Valla informativa:* La valla del proyecto fue instalada en un punto de fácil visualización de la comunidad y usuarios de la vía al ingreso del corregimiento El Jordán en el mes de noviembre.

- *Tijeras:* Se instalarán en sectores de la obra, según la necesidad.

- *Pasacalles:* Se está a la espera de la remisión del diseño por parte de la supervisión del contrato.
- *Volantes:* en el periodo reportado se utilizaron un diseño de volante informativo de cierre de vía y un volante de invitación a la reunión mensual con el comité de participación comunitaria.

- *Cartelera informativa:* fue instalada en el Punto de Atención a la Comunidad (PAC) en la dirección Calle 20#21-40 del corregimiento El Jordán (San Carlos)

- *Buzón de sugerencias:* Se instalaron 2 buzones de sugerencias, uno en el PAC y el segundo en la sede de la Junta de Acción Comunal Urbana El Jordán.

- *Pautas radiales:* En el mes de marzo se informó mediante pautas radiales diarias los horarios de cierres de vías

➢ Dificultades presentadas en el proceso

En este periodo la dificultad del diseño de pasacalles se debe a que se está a la espera de la remisión de los diseños por parte del área de comunicaciones de la *supervisión del contrato.*

A partir de lo anterior, la interventoría expone que a la fecha no se han instalado las tijeras informativas, las cuales ya tienen diseño aprobado. En seguimiento a este programa, se han enviado varios correos electrónicos a la oficina de comunicaciones de la SIF solicitando orientación frente al diseño de estos para proceder a su elaboración y el día 04 del mes de marzo fue enviado el diseño de

tijeras de obra, el cual fue remitido inmediatamente al contratista para que inicie la debida gestión.

Tabla 18. Indicadores de Gestión Programa de Comunicación y Divulgación Tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. vallas informativas instaladas / No. de vallas programadas x 100.	1 1	Se instaló una valla con información del proyecto.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de tijeras de obra instaladas / No. de tijeras de obra totales programadas x 100.	0 2	Se tiene programada la instalación para el mes de abril.
Porcentaje cumplimiento	0,0%	
No. de pasacalles instalados / No. de pasacalles totales programadas x 100.	0 2	Los pasacalles se tienen programados para el mes de abril.
Porcentaje cumplimiento	0,0%	
No. de volantes distribuidos / No. de volantes programados x 100	100 1000	Durante el mes de marzo se distribuyeron 100 volantes informativos de cierre de vía y de invitación a la reunión mensual con el CPC.
Porcentaje cumplimiento	10%	
No. de pautas radiales implementadas / No. de pautas programadas x 100.	1 40	Este periodo se implementaron seis (6) pautas radiales diarias de lunes a viernes, sábados y domingos tres (3) veces diarias, para un total de 36 pautas radiales semanales.
Porcentaje cumplimiento	5%	

Indicador	%	Observaciones
No. de carteleras implementadas / No. de carteleras programadas x 100.	1 1	La cartelera informativa se instaló en el Punto de atención a la Comunidad y se actualiza mensualmente según los avances de la obra desde todas las áreas.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de buzones de sugerencias instalados / No. de buzones de sugerencias programados x 100.	2 2	Los buzones de sugerencias se instalaron en el PAC y en la sede de la JAC urbana El Jordán.
Porcentaje cumplimiento	100%	

Anexo 3. Volante oficial informativo cierre de vía n°6

Anexo 4. Volantes invitación CPC

Anexo 5. Registro fotográfico volantes

Anexo 6. Registro fotográfico cartelera informativa

Anexo 7. Buzón de sugerencias PAC


Anexo 8. Buzón de sugerencias JAC

Anexo 9. Constancia emisora Juventud Stereo

Anexo 10. Pauta radial cierre de vía

Anexo 11. Perifoneo local – cierre de vía

Tabla 19. Soporte fotográfico del Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo San Carlos – Cruces – Narices

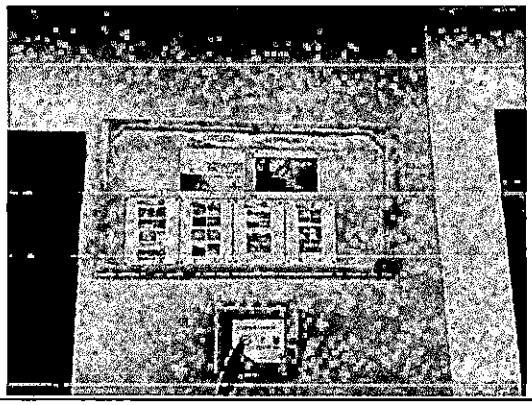


Fotografía N°1
Actualización – cartelera informativa



Fotografía N°2.
Buzón de sugerencias – JAC



Fotografía N°3: Volante informativo de cierres viales

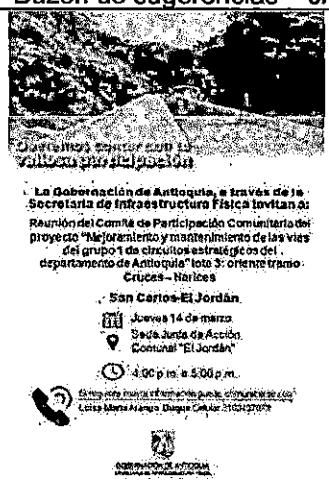

Fotografía N°4: Volante informativo – invitación reunión CPC

	
Fotografía N°5: Socialización de cierres viales	Fotografía N°6 socialización cierres viales

6.5. Programa para la atención a la comunidad e interesados en el Proyecto

6.5.1 Tramo Cocorná

Para este periodo el contratista reporta los siguientes avances

- Atención de PQRS: En el presente periodo no se reportan PQRS.

- *Funcionamiento del Punto de Atención del Proyecto* – PAC- se encuentra operativo en el horario indicado: lunes a viernes 8:00 a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm. Sábados 8:00 am a 12:00 pm., según lo establecido. Funciona en el K1 Vía Cocorná – El Ramal (Granada), Finca Villa Concepción. A su vez, se encuentran activos, el correo electrónico: consorcios.idc@gmail.com y el número de teléfono 3243827981 para

atender a la comunidad. Por estos medios, tampoco se han recibido PQRS por parte de la comunidad.



- Consulta de opinión en la comunidad y el comercio: para tal fin fue elaborado un formato de encuesta, el cual fue remitido a la Interventoría, para su revisión y aprobación. Luego de ello, fue aplicado en la cuarta reunión del CPC realizada el 14/03/2024 a 15 personas asistentes. Los resultados de dicha encuesta están siendo tabulados y se presentarán posteriormente en el próximo reporte.

En este programa, no se han presentado dificultades.

Tabla 20. Indicadores de Gestión Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. total de PQRS atendidas en el período / No. total de PQRS recibidas en el período x 100	0 0	En el período no fueron recibidas PQRS relacionadas con el proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de encuestas proyectadas / No. de personas encuestadas x 100	15 15	Fueron aplicadas 15 encuestas a asistentes a la cuarta reunión del CPC llevado a cabo, el 14/03/2024. La cual será tabulada y enviada en el próximo informe
Porcentaje cumplimiento	**100%**	

Tabla 21. Soporte fotográfico del Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná

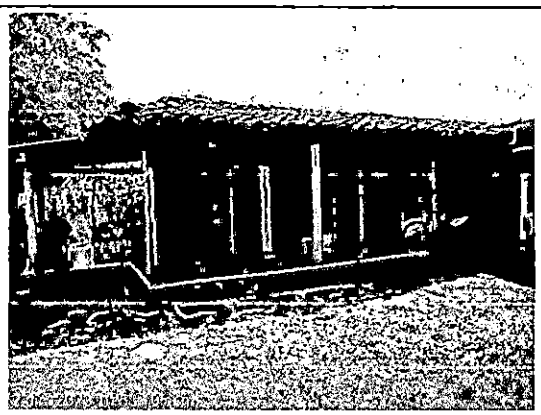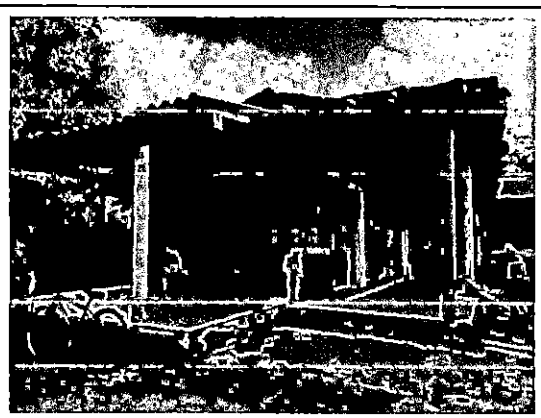	
Punto de Atención a la Comunidad del proyecto – PAC	Punto de Atención a la Comunidad del proyecto - PAC

Anexo 05. Formato consulta de opinión en la comunidad y el comercio.

6.5.2 Tramo San Carlos

Para este programa el contratista reporta las siguientes actividades:

- *Atención de PQRS*: A la fecha de corte del presente informe no se presentan PQRS.
- La revisión de los buzones se realizó una vez por semana con el acompañamiento de la interventoría.

- En este periodo se recibieron dos (2) hojas de vida de personal interesado en laborar en el proyecto, las cuales fueron tramitadas según el procedimiento establecido, de remisión al área de Recursos Humanos de la empresa contratista.

En este periodo no se presentaron dificultades en este programa.

Tabla 22. Indicadores de Gestión Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
1 Punto de Atención al Ciudadano Instalado / 1 Punto de Atención al Ciudadano requerido durante el desarrollo de las obras.	1 1 100%	El PAC se instaló en la zona urbana del corregimiento El Jordán- en la dirección Calle 20 #21-40 y en el horario de atención: lunes a viernes de 9:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm. y los sábados 8:00 am a 10:00 m.
No. total de PQRS atendidas en el período / No. total de PQRS recibidas en el período x 100	0 0	Durante el período no se recibieron PQRS relacionadas con el proyecto.
Porcentaje cumplimiento	100%	
No. de encuestas proyectadas / No. de personas encuestadas x 100	0 0	La implementación de la encuesta se tiene proyectada para el mes de abril.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

Anexo 15. Revisiones de buzones de sugerencias

La interventoría evidencia que el contratista actualiza la cartelera informativa con información correspondiente al proyecto desde cada componente, así mismo, se constata la apertura de los buzones de sugerencias una vez por semana y las socializaciones a la comunidad sobre cierres viales e invitaciones a los encuentros mensuales del CPC.

Tabla 23. Soporte fotográfico del Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo San Carlos – Cruces – Narices

	
Fotografía N°1 Revisión de buzón JAC	Fotografía N°2 Revisión de buzón PAC

6.6. Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural

6.6.1 Tramo Cocorná

Para este periodo el contratista reporta los siguientes avances con el fin de "contribuir al manejo adecuado tendiente a la protección del patrimonio arqueológico, en caso de encontrar un hallazgo fortuito".

En el período, no se presentaron hallazgos arqueológicos. En las inducciones realizadas al personal que ingresa a laborar en el proyecto, entre otros temas, se brindan algunas pautas sobre el procedimiento a seguir en caso de que se presente un hallazgo fortuito en el desarrollo de las obras.

En el presente periodo no se realizaron capacitaciones sobre patrimonio arqueológico.

En el desarrollo de este programa no se han presentado dificultades.

Tabla 24. Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de trabajadores asistentes a la capacitación / *No. total, de trabajadores* vinculados al proyecto x 100	29 38	El 29/01/2024 se realizó una capacitación con el personal sobre "Arqueología Preventiva y Patrimonio Arqueológico", a esta asistieron 29 personas vinculadas al proyecto. La información correspondiente a la misma fue presentada en el informe correspondiente al mes de enero del presente año. A la fecha no se han presentado hallazgos de bienes de interés

		arqueológicos ni culturales en el proyecto. En las inducciones realizadas a los trabajadores que ingresan a laborar en el período, se manifiesta la importancia de seguir el protocolo en caso de un hallazgo fortuito en el proyecto.
Porcentaje cumplimiento	**76%**	

En el presente periodo no se reportan anexos.

6.6.2 Tramo San Carlos

Para este periodo el contratista reporta las siguientes actividades ejecutadas con relación a este programa:

En el período de marzo, no se han presentado hallazgos arqueológicos en el proyecto. El mes anterior se llevó a cabo la capacitación sobre "Hallazgos arqueológicos", en esta capacitación al personal se explicó detalladamente el procedimiento a seguir en caso de presentarse un hallazgo arqueológico en el desarrollo de las labores en las instalaciones de obra.

No se presentaron dificultades en la ejecución del presente programa.

Desde la interventoría se constata que hasta la fecha no se han registrado hallazgos arqueológicos en el punto de intervención, de igual manera, en la capacitación al personal se explicó el protocolo a seguir en caso de evidenciarse alguno.

Tabla 25. Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo San Carlos – Cruces - Narices

Indicador	%	Observaciones
No. de trabajadores asistentes a la capacitación / No. total, de trabajadores vinculados al proyecto x 100	0 0	A la fecha, no se han presentado hallazgos de bienes de interés arqueológicos ni culturales en el proyecto. Se realizó en el mes de febrero una capacitación a la cual asistieron 35 trabajadores. En el presente mes no se llevó a cabo capacitación.
Porcentaje cumplimiento	N/A	

6.7. Programa para la sostenibilidad y apropiación comunitaria

6.7.1 Tramo Cocorná

Estas son las actividades desarrolladas en el período por parte del contratista con el fin de cumplir el objetivo trazado en el programa que consiste en "crear un espacio de participación comunitaria, en el cual se brindará información de los avances de las actividades de obra y a su vez serán abordados los cambios generados en la dinámica del territorio y las proyecciones futuras con la operación del proyecto, con el fin de que los integrantes del comité aporten en la construcción de alternativas para atender las problemáticas identificadas y

finalmente se conviertan en multiplicadores de la información".

Actividades desarrolladas en el período

El 14/03/2024, fue llevada a cabo la cuarta reunión del CPC. A esta asistieron 20 personas entre integrantes del CPC, el Alcalde del municipio de Cocorná, el Secretario de Planeación, el Comandante de la Estación de Policía, 1 concejal, la Interventoría, ediles de las JAC de las veredas San Juan, El Chocó, Las Playas, habitantes de la vereda El Chocó y el Consorcio Cocorná 15372. En este, se presentaron avances en las áreas Social, Ambiental, SST, y Técnica del proyecto.


A su vez, se atendieron las inquietudes planteadas por la comunidad. La reunión fue efectuada en la sede de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juan, aún no se tiene fecha prevista la reunión de cierre del comité

En el desarrollo de este programa no se han presentado dificultades.

Tabla 26. Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. reuniones ejecutadas con el CPC / No. reuniones contempladas con el CPC x 100	4 4	Las tres reuniones con el CPC han sido efectuadas los días 07/12/2023, 18/01/2024, 15/02/2024 y 14/03/2024. A estas asistieron 10, 25, 32 y 20 personas, respectivamente.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	

Tabla 27. Soporte fotográfico del Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná

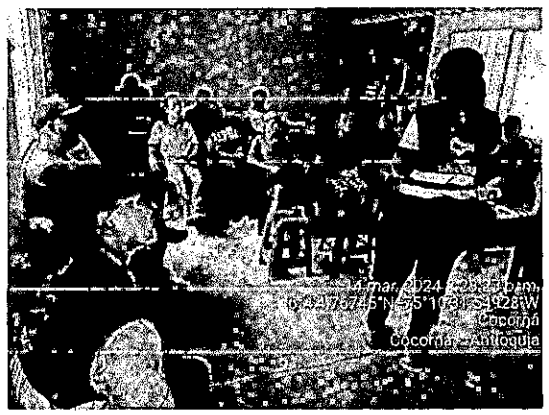	
Reunión N°4 CPC – Sede JAC vereda San Juan Cocorná – 14/03/2024	Reunión N°4 CPC – Sede JAC vereda San Juan Cocorná – 14/03/2024

Anexo 9. Oficios convocatoria CPC
Anexo 10. Presentación CPC
Anexo 16. Acta reunión y registro de asistencia CPC

6.7.2 Tramo San Carlos

El contratista reporta las siguientes actividades realizadas en este programa

- Durante este periodo se hizo la reunión mensual con el Comité de Participación Comunitaria, el día jueves 14 de marzo a las 2:00 p.m., se

socializo a los asistentes el avance que ha tenido el desarrollo de la obra, desde todas las áreas técnica, ambiental, social y SST y se informó además que esta era la reunión de cierre del CPC. Se contó con la asistencia de 4 personas de la comunidad, con el acompañamiento del equipo de interventoría. La mayor inquietud de la comunidad fue sobre los cierres viales durante la semana santa y cuál sería el manejo que íbamos a dar a estos, durante el espacio de preguntas se compartió el refrigerio. Finalizo a las 5:10 p.m. Se deja el registro en los anexos de informe, acta de reunión con registro fotográfico y listado de asistencia.

Tabla 28. Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. reuniones ejecutadas con el CPC / No. reuniones contempladas con el CPC x 100	3 3	Se realizó la reunión mensual con el CPC.
Porcentaje cumplimiento	100%	

Anexo 13. Evidencias fotográficas reunión CPC




Anexo 14. Acta de reunión CPC

Anexo 15. Listado de asistencia CPC

Anexo 16. Presentación reunión CPC

Anexo 17. Volante de invitación

Tabla 29. Soporte fotográfico del Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo San Carlos – Cruces – Narices

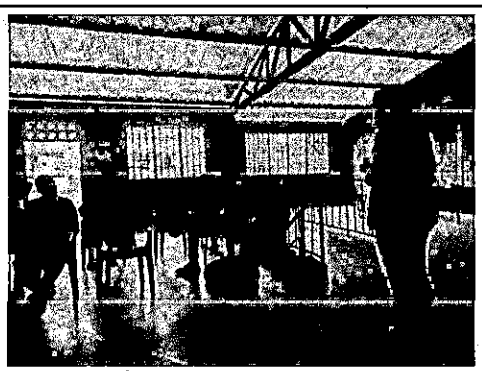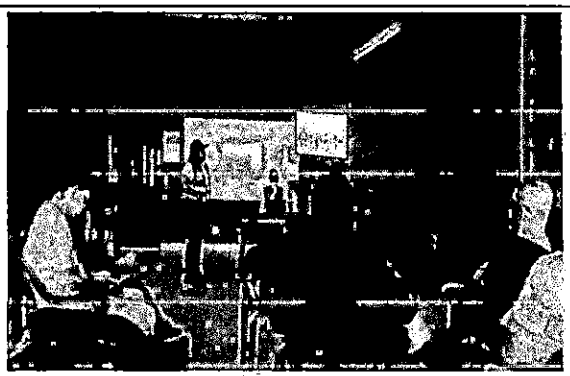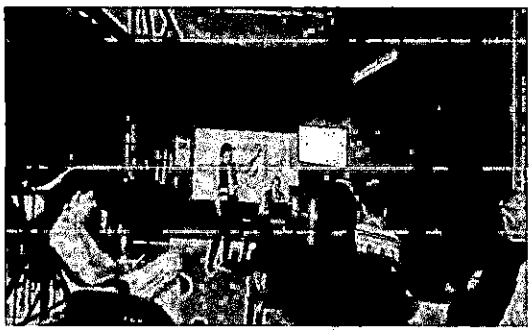	
Fotografía N°1 *3 reunión del CPC*	Fotografía N°2 *Socialización de avance por componente*
	
Fotografía N°3 Intervención – componente social	Fotografía N°4 Toma de refrigerio

6.8. Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto

6.8.1 Tramo Cocorná

El contratista reporta las siguientes actividades en este programa en el marco del objetivo "entrenar al personal que labora en el proyecto, en aspectos relacionados con las medidas de manejo social que se deben implementar en el mismo, con el fin de que establezcan relaciones armónicas con las comunidades del área de influencia":

El día 6 de marzo se realizó inducción a 3 personas que ingresaron a laborar en el proyecto. En estas, se entregó información sobre los diferentes programas del PGS del proyecto, manejo de PQRS, información del PAC, sentido de pertenencia con la empresa, respeto hacia el otro y manejo de posibles hallazgos arqueológicos.

Adicionalmente, el día 27/02/2024 se realizó una jornada lúdico – recreativa con personal vinculado al proyecto, enfocada al tema "trabajo en equipo". La actividad contempla un partido de microfútbol, para lo cual, se gestionó un espacio deportivo en el área urbana de Cocorná y se reforzará de manera práctica, el concepto mencionado. Teniendo en cuenta que la fecha mencionada se encuentra por fuera del corte del presente informe, los soportes correspondientes se adjuntan al presente informe.

En este programa, no se han presentado dificultades.

- OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO:

- Se realizaron recorridos de obra para verificar la divulgación de los volantes informativos.

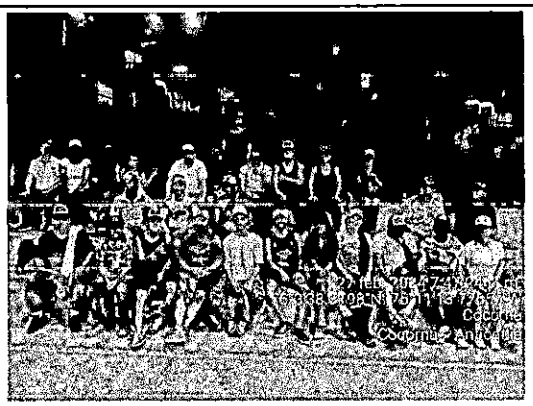
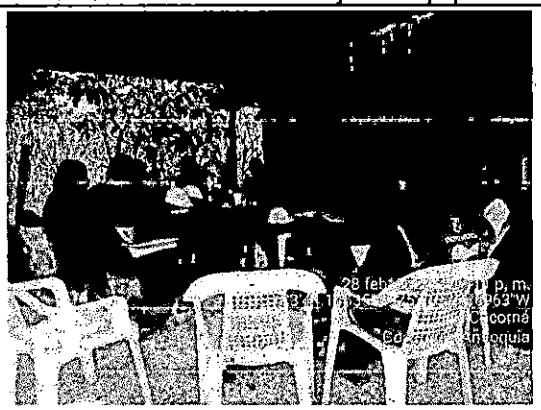
- El 28/02/2024, 06/03/2024 y 12/03/2024 se realizaron comités de seguimiento con el contratista, en los cuales, se revisaron los avances generados en las áreas técnica, social, ambiental y SST. A su vez, se comentaron las actividades pendientes y se brindaron recomendaciones o sugerencias en la realización de las actividades o procesos a desarrollar por cada componente.

Tabla 30. Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná

Indicador	%	Observaciones
No. de capacitaciones desarrolladas / No. de capacitaciones programadas x 100	2 2	Se llevaron a cabo 2 sesiones de inducción al personal vinculado al proyecto. En estas, se conversó sobre los diferentes programas del PGS y las actividades que se desarrollan desde cada uno de ellos.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	
No. de trabajadores asistentes a las capacitaciones / No. de trabajadores convocados x 100	3 3	A las inducciones realizadas asistieron 3 personas, quienes ocupan los cargos de: conductor, operador de maquinaria pesada y ayudante de obra.
Porcentaje cumplimiento	**100%**	

Tabla 31. Soporte fotográfico Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná

	
Inducción al personal vinculado al proyecto – 06-03-2024	Inducción al personal vinculado al proyecto – 06-03-2024

	
Capacitación al personal: Jornada ludico-recreativa "Trabajo en equipo	Capacitación al personal: Jornada ludico-recreativa "Trabajo en equipo
	
Comités de seguimiento Interventoría – Consorcio Cocorná 15372 - 28/02/2024	Comités de seguimiento Interventoría – Consorcio Cocorná 15372 - 06/03/2024

	
Recorrido con supervisor SIF- Interventoría – Consorcio Cocorná 15372 - 12/03/2024	Comités de seguimiento Interventoría – Consorcio Cocorná 15372 - 12/03/2024

Anexo 12. Actas y reg. Asistencia inducciones personal vinculado.

Anexo 13. Registro asistencia Jornada Lúdico- recreativa "Trabajo en equipo"

Anexo 14. Registros asistencia Comité con Interventoría

6.8.2 Tramo San Carlos

El contratista reporta las siguientes actividades en este programa en el marco del objetivo "entrenar al personal que labora en el proyecto, en aspectos relacionados con las medidas de manejo social que se deben implementar en el mismo, con el fin de que establezcan relaciones armónicas con las comunidades del área de influencia":

La capacitación de este mes se realizó sobre el tema "Plan de Gestión Social" y sus actividades, se dio inicio 4:00 p.m. explicando a los asistentes cual es la

finalidad de la Gestión Social en obra, los diferentes programas y actividades desde los cuales se desarrolla y que se hace según los lineamientos dados por la guía socio-ambiental de la Gobernación de Antioquia. En total asistieron de 32 empleados y se contó con el acompañamiento de la residente social y residente técnico de interventoría, esta se llevó a cabo en el campamento del Consorcio Cocorná 15372 y se compartió el refrigerio al terminar la capacitación. Se adjuntan en los anexos los soportes y evidencias fotográficas de la actividad reportada.

Del mismo modo se hizo una explicación sobre las colillas de pago y el pago de las horas extras.

En este programa, no se han presentado dificultades.

Tabla 32. Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices

Indicador	%	Observaciones
No. de capacitaciones desarrolladas / No. de capacitaciones programadas x 100	4 4	En el periodo reportado se llevó a cabo la capacitación mensual al personal vinculado al proyecto sobre el tema "Hallazgos arqueológicos".
Porcentaje cumplimiento	75%	
No. de trabajadores asistentes a las capacitaciones / No. de trabajadores convocados x 100	32 35	Se contó con la participación de 32 empleados, los que se

Indicador	%	Observaciones
		encontraban en obra.
Porcentaje cumplimiento	91,42%	

Anexo 18. Evidencia fotográfica

Anexo 19. Asistencia capacitación mensual

Anexo 20. Acta de capacitación mensual marzo

Anexo 21. Registro fotográfico socialización pago horas extras y colilla de pago

Tabla 33. Soporte fotográfico Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices




Fotografía N°1 Capacitación Plan de gestión social



Fotografía N°2 Capacitación plan de gestión social



Fotografía N°3
Socialización horas extras – colillas de

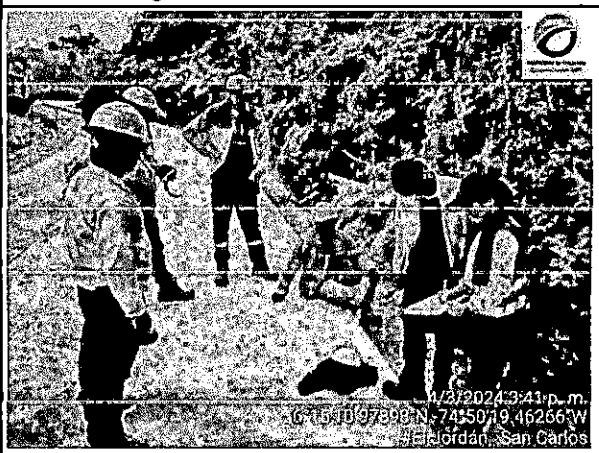

Fotografía N°4
Socialización horas extras –

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA

Actividades de gestión, seguimiento y control del área social de la interventoría

7.1.1 Tramo Cocorná

Desde el área social de la Interventoría en el tramo Cocorná, se ha venido haciendo un acompañamiento desde día de la firma del acta de inicio, a continuación, se presentan las actividades en dicho sentido:

- **Recorridos de obra:** se hacen recorridos de obra en promedio de 4 a 5 veces por semana en estos se observan aspectos relacionados con el funcionamiento del PAC, los buzones de sugerencias, acceso a la información de la comunidad sobre los cierres viales, acompañamiento a actualización de actas de vecindad, manejo de conflictos con las comunidades por cierres, apoyo en la recepción de inquietudes de la comunidad.

  En este periodo se hizo revisión en campo de la divulgación de las piezas comunicativas. El contratista hizo los ajustes y ha mejorado notablemente la divulgación con alianzas interinstitucionales con la Alcaldía y Juntas de acción comunal.

  Se hizo acompañamiento a la apertura de los dos buzones de forma semanal, tanto el que está ubicado en la sede de la JAC de la vereda San Juan, como el que se encuentra en el Punto de Atención a la Comunidad.

- **Elaboración de reportes semanales e informe mensual:** se han elaborado los reportes mensuales y semanales de acuerdo a los requerimientos de la entidad contratante.

- **Elaboración de comunicaciones escritas**: de igual manera se da avance en los informes semanales y consolidación del informe mensual con el fin de documentar la gestión y presentar la trazabilidad del proceso. Las comunicaciones escritas se han hecho en torno al seguimiento al plan de gestión social – actas de vecindad.

- Revisión de informes y cronogramas semanales del contratista

- Mesa de trabajo virtual con profesionales sociales del contratista e interventoría, tramos – COCORNÁ y SAN CARLOS para socialización de insumos para el cierre del componente.

- Envío de diseño de tijeras de obra al contratista para que se realice la gestión para su elaboración.

- Recorrido con par social del tramo San Carlos para verificar pendientes para el cierre social.

- Acompañamiento a reunión con CPC en la sede de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Juan con presencia del equipo contratista, interventoría, alcaldía y líderes comunales.

- Recorrido con supervisor de la SIF y acompañamiento a comités de obra.

- Radicación de informe en físico del mes de febrero.


Comités de seguimiento

Se viene asistiendo a los comités técnicos de obra y en cada uno se ha dado recomendaciones en la ejecución del Plan de Gestión social, en el presente periodo se recalcó la importancia de seguir trabajando de la mano para evitar inconvenientes al termino del proyecto. Del mismo modo se indicó que el contratista ya tiene en su poder los lineamientos para el informe final y se sugiere por parte de la Interventoría una mesa de trabajo con el equipo social con el fin de responder a las inquietudes que surjan una vez leídos los lineamientos. Se informa además que hay dos actas de vecindad sin firmar y que si el propietario aun no aparece se debe gestionar el acompañamiento de la personería, a lo cual el contratista indicó que se estaba a la espera de posesión del nuevo personero para hacer dicha gestión. Se indica además que el rubro de atención a requerimientos de la comunidad debe ir orientado a actividades de seguridad vial con la comunidad. Del mismo modo se hizo énfasis en la actualización del plan de gestión social y el presupuesto.


Tabla 34. Soporte fotográfico de actividades de la interventoría en el mes de marzo de 2024 – Tramo Cocorná

Acompañamiento al Comité de participación Comunitaria 14 de marzo 2024	Acompañamiento a actualización de actas de vecindad - 14 de marzo 2024
	


Mesa de trabajo social tramos Cocorna – San Carlos

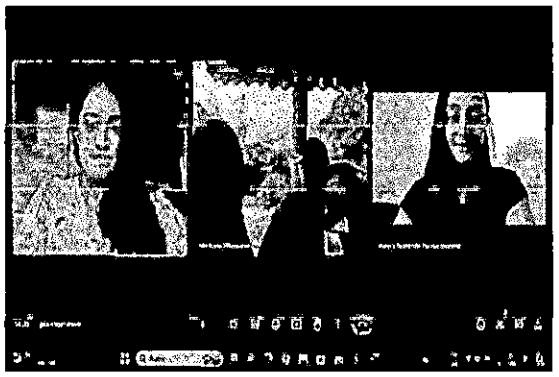

Mesa de trabajo virtual para revisión de acta social - Interventoria Cocorná y San Carlos




Recorrido de obra profesionales Cocorna – San Carlos

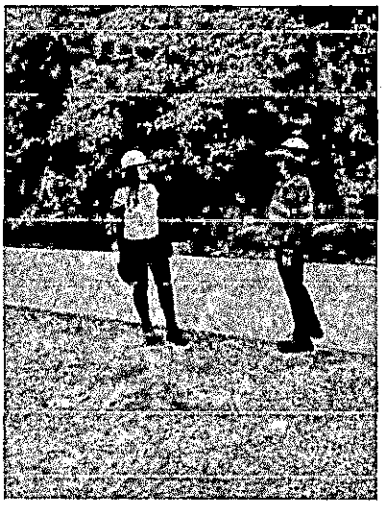


Apertura buzones de marzo 4 de 2024

Verificación funcionamiento de la cartelera informativa

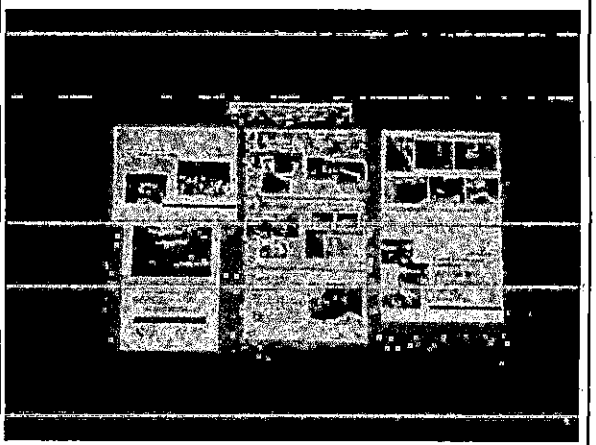

Apertura de buzones 12 de marzo 2024

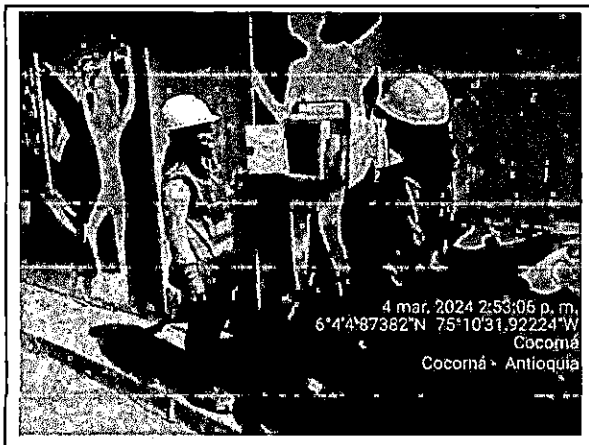





Recorrido de obra son supervisor SIF



Verificación de instalación de volantes informativos

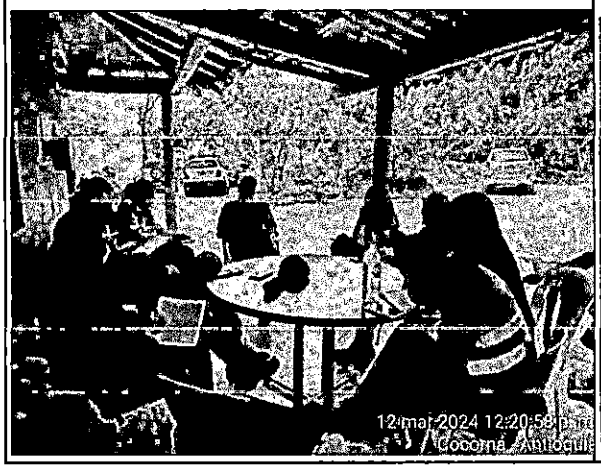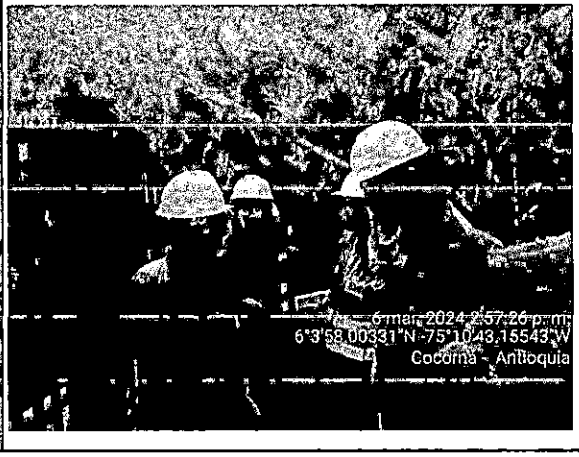

Comité de obra con supervisor SIF	Comité de obra
	

7.1.2 Tramo San Carlos

De manera general, se señalan algunas de las actividades realizadas en el periodo del mes de febrero por esta interventoría y se especifican a continuación:

- Mesa de trabajo virtual con profesionales sociales del contratista e interventoría, tramos – COCORNÁ y SAN CARLOS para socialización de insumos para el cierre del componente.

- Apertura semanal de buzones de sugerencia con residente social del contratista, donde no se registran en el periodo reportado PQRS.

- Envío de reporte de empleabilidad a supervisor social SIF.

- Revisión y observaciones a cronogramas e informes semanales del contratista y sus anexos.

- Revisión y observaciones a cartelera informativa.

- Asistencia a reunión de seguimiento CM 15378 donde se expuso el avance de cada componente en los dos frentes de obra y se plantearon estrategias de mejora.

- Revisión y envío de compromisos contractuales de la interventoría mediante mesa de trabajo con profesional social – Tramo – Cocorná.

- Revisión a observaciones de informe mensual de gestión social del contratista y visto bueno bajo el comunicado CM15378-215 VISTO BUENO INFORME MENSUAL FEBRERO COMPONENTE SOCIAL – TRAMO - SAN CARLOS – CRUCES – NARICES

- Envío de diseño de tijeras de obra al contratista para que se realice la gestión para su elaboración.

- Revisión y envío de observaciones al contratista de acta de cobro del componente social.

- Revisión a actualización del Plan de Gestión Social enviado por el contratista.

- Asistencia a comité de obra #13

- Acompañamiento en capacitación mensual al personal donde se exponen las actividades programadas y ejecutadas del Plan de Gestión Social.

- Solicitud a residente social de contratista de establecer comunicación con propietarios de predios colindantes para inicio de cierre de actas de vecindad.

- Revisión y observaciones a presentación de POWERPOINT para el último encuentro con el CPC

- Acompañamiento a última reunión con CPC en la sede de la Junta de Acción Comunal con presencia del equipo del equipo contratista, interventoría y líderes comunales.

- Elaboración de reportes semanales e informe mensual de interventoría: se han elaborado los reportes mensuales y semanales de acuerdo con los requerimientos de la entidad contratante.

- Revisión y observaciones a informe mensual de gestión social del contratista.

Comités de seguimiento

Se ha realizado presencia en el comité #13 ejecutado en el mes de marzo del 2024 en las instalaciones de las oficinas del contratista, desarrollado por el residente de interventoría, en compañía del supervisor de SIF, equipo contratista de obra e interventoría.



También se hizo asistencia en reuniones de seguimiento interno de interventoría vía virtual donde se expone el avance de cada componente y las oportunidades de mejora.


En la siguiente tabla se presenta un resumen de los compromisos convenidos durante los comités de obra realizados.

Tabla 35. Compromisos comité de seguimiento social tramo San Carlos – Cruces – Narices


No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Compromiso	Estado de cumplimiento
1.	Instalación de pasacalles y tijeras informativas	Consorcio Cocorná 15378 Contratista	01/02/2024	Pendiente
2.	Aplicación de encuesta de satisfacción	Luisa Arango Profesional Social Contratista	13/03/2024	Pendiente
3.	Envío observaciones de acta de cobro con soportes	Luisa Arango Profesional Social Contratista	13/03/2024	Pendiente
4.	Inscripción del CPC en la Personería Municipal	Luisa Arango Profesional Social Contratista	13/03/2024	Pendiente
5.	Inicio de cierre de actas de vecindad	Luisa Arango Profesional Social Contratista	13/03/2024	Pendiente
6.	Envío de observaciones de actualización al PGS	Luisa Arango Profesional Social Contratista	13/03/2024	Cumplido

Tabla 36. Soporte fotográfico de actividades de la interventoría I tramo San Carlos – Cruces – Narices

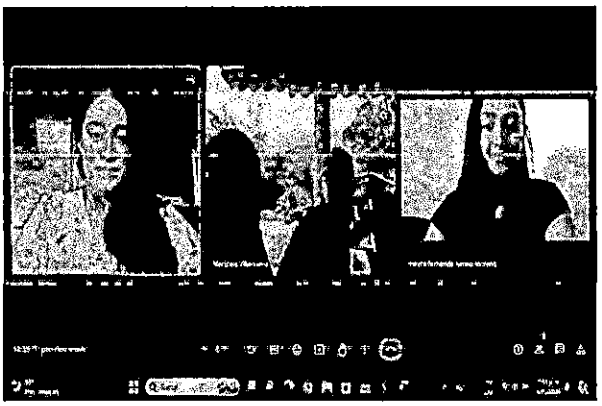
	
Fotografía N°1: mesa de trabajo virtual con profesionales sociales	Fotografía N°2: Mesa de trabajo virtual para revisión de acta de cobro

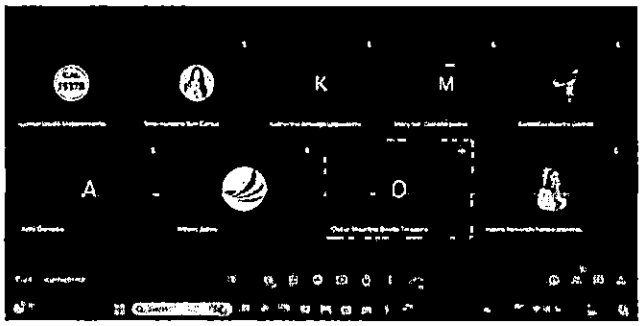


Fotografía N°3: Reunión de seguimiento interno CM 15378

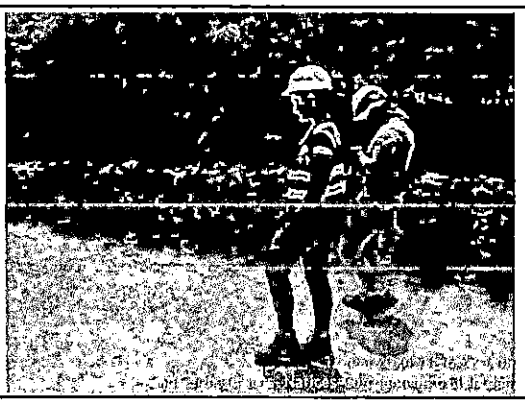


Fotografía N°4: Recorrido de obra

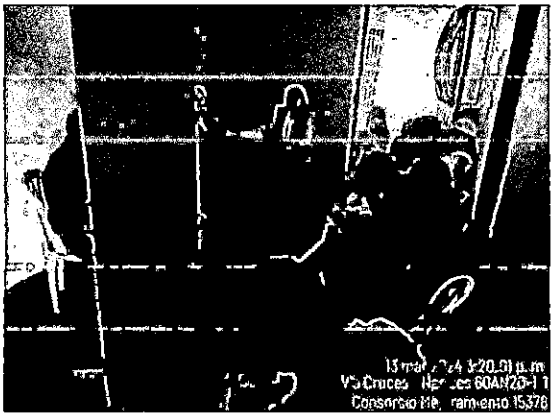

Fotografía N°4: Comité de obra #13

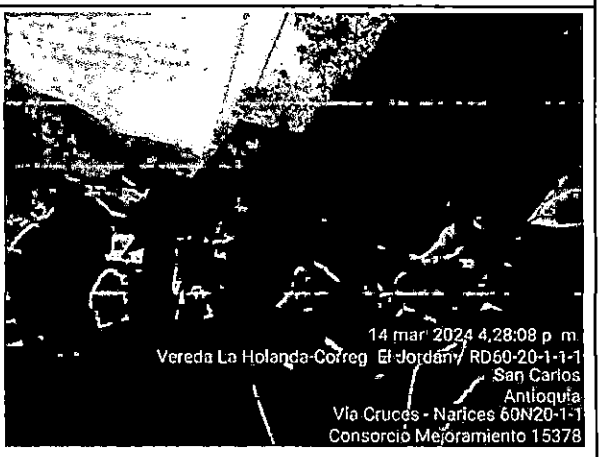


Fotografía N°5: Capacitación al personal

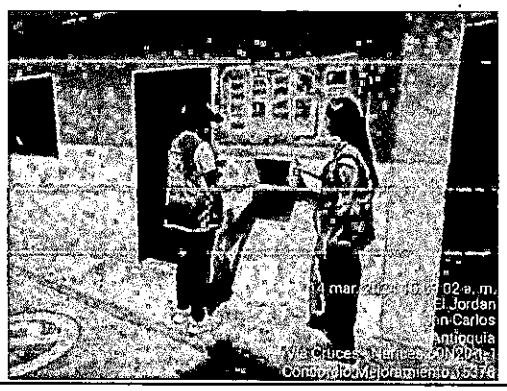


Fotografía N°5

Apertura de buzón de sugerencias PAC


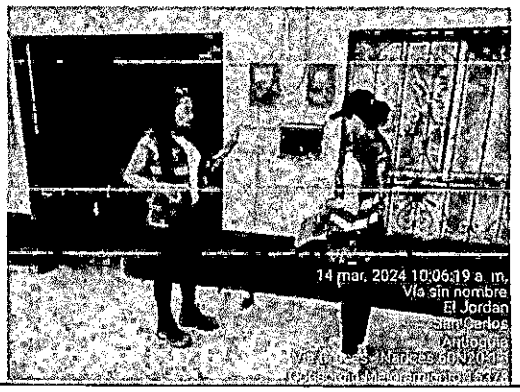


Fotografía N°6

Apertura de buzón de sugerencias JAC

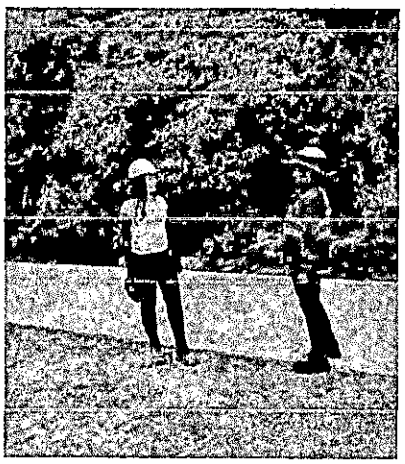

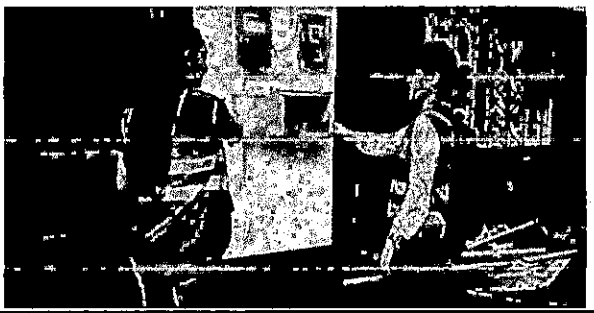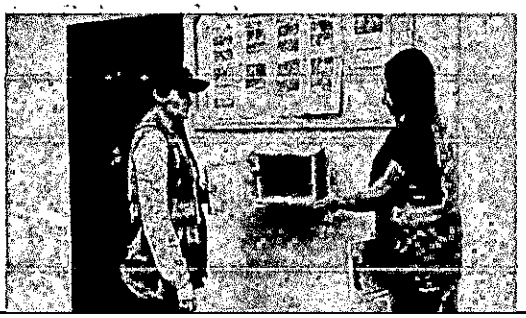

Fotografía N°7: Recorrido de obra con profesional social Interventoria.	Fotografía N°8: Reunión mensual CPC
	
Fotografía N°9: Apertura de buzón de sugerencias JAC	Fotografía N°10: Apertura de buzón de sugerencias PAC

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1.1 Tramo Cocorná

Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria

- Se observa que las recomendaciones del mes anterior fueron adoptadas. Se recomienda hacer enlace con la Personería Municipal para que sirvan como testigo para las dos actas de vecindad que aún no han sido firmadas por los propietarios. Se recomienda en caso de que se requiera seguir actualizando las actas de vecindad.

Programa para la Contratación de Mano de Obra

- Se avanzó con la recomendación al divulgar con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del área de influencia, se recomienda solicitar las certificaciones de residencia de los trabajadores ya sea con la entidad municipal encargada o los presidentes de las juntas de acción comunal.

Programa de Comunicación y Divulgación

Se ha mejorado la articulación con el área técnica, de tal manera que se ha emiten los cierres con anticipación, evitando inconformismos en la comunidad. Se plantea seguir con la misma metodología.

Contar con el Plan de Manejo de tráfico como herramienta guía y reglamentaria para los cierres.

Se solicitó al contratista agilizar la instalación de las tijeras informativas y pasacalles, sin embargo también estamos a la espera aun del diseño para los pasacalles, el cual ha sido solicitado a la oficina de comunicaciones.

Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el Proyecto

- El contratista realizó entrega del modelo de encuesta y aplicó algunas en el *comité de participación comunitaria. Se solicita realizar la tabulación* y análisis de la misma.

Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural

- Se recomienda continuar con las capacitaciones y/o inducciones sobre patrimonio arqueológico y los procesos en caso de posibles hallazgos.

Programa para la Sostenibilidad y Apropiación Comunitaria

- Se llevó a cabo la reunión mensual con el Comité de Participación Comunitario, a la cual se les dio las respuestas a sus inquietudes en el momento.

Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto

- Se incluyeron los anexos de la actividad lúdico – pedagógica en el presente informe, teniendo en cuenta las fechas de corte de informes para el contratista.

8.1.2 Tramo San Carlos

Programa para el Reconocimiento del Entorno en el Cual se Desarrollará el Proyecto

- Se recomienda ponerse en contacto con los propietarios de predios colindantes para dar inicio al cierre de actas de vecindad.

Programa para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria

- La interventoría recomienda continuar con la comunicación establecida con la comunidad para programar la reunión de cierre, teniendo en cuenta los inconvenientes sociales que se han presentado en las últimas semanas por los cierres viales y el plazo de vencimiento del contrato. Se recalca la importancia de enviar la invitación con los 8 días de antelación requeridos para lograr mayor asistencia de la población.

Programa para la Contratación de Mano de Obra

- Utilizar todos los canales establecidos para la divulgación de vacantes y dejar evidencia con el fin de garantizar la oportunidad a la comunidad interesada y cumplir con el objetivo del programa.

Programa de Comunicación y Divulgación

- Se recomienda mantener activos los canales de comunicación, de tal manera que cumplan su función en el acompañamiento al desarrollo de la obra y se mitiguen los impactos del proyecto a la comunidad.

- Dar celeridad al proceso de instalación de tijeras informativas.

- Comunicar a tiempo los cambios en los horarios de cierres viales a la comunidad y en los casos en que estos sean fortuitos por inconvenientes en la vía, se solicita la presencia de la profesional social en el punto de

aglomeración para explicar a la población la novedad que ha generado el cierre.

Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el Proyecto

- Mantener el funcionamiento del PAC acorde a las necesidades de la obra y de la comunidad frente al proyecto y atender cuando se requieran las PQRS pero sobre todo divulgar los canales de comunicación para que la comunidad los conozca y los utilice.

- Aplicar la encuesta de percepción del proyecto a la comunidad con su respectiva tabulación, análisis, evidencias fotográficas y físicas de la misma.

Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural

- Continuar mencionando en las capacitaciones con el personal de obra, la importancia de la protección al patrimonio y el protocolo a seguir en caso de hallazgos arqueológicos.

Programa para la Sostenibilidad y Apropiación Comunitaria

- Para este programa no se tienen recomendaciones desde la interventoría, ya que, el último encuentro con el Comité de Participación Comunitaria fue llevado a cabo de manera exitosa.

Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto

- Continuar haciendo mención sobre la protección del patrimonio y exponer el protocolo en caso de hallazgo.

- Proyectar la última capacitación al personal para el próximo mes; para esta, se recomienda organizar articulación interinstitucional con el cuerpo de bomberos del municipio para dictar primeros auxilios y manejo de camillas y extintores en caso de incidentes o accidentes.

  Así mismo, se recomienda tomar evidencias fotográficas de cada momento de las capacitaciones, donde se evidencien las actividades y toma de refrigerio.

9. Listado de Anexos

9.1.1 Tramo Cocorná

Estos se adjuntan al informe en carpetas organizadas según los programas del plan de gestión social.

- *Programa 1 Reconocimiento del Entorno en el Cual se Desarrollará el proyecto*

Anexo 1. Base de datos actas vecindad, actas entorno y permisos intervención
Anexo 2. Actas de reuniones con propietarios

- *Programa 2 Para la protección de la infraestructura social y comunitaria*

En este periodo no fue necesario presentar soportes de actividades

- *Programa 3 Para la contratación de mano de obra*

Anexo 3. Formato empleabilidad marzo
Anexo 4. Formato empleabilidad mujeres

- *Programa 4. Comunicación y Divulgación*

Anexo 5. Volantes informativos sobre cierres viales.
Anexo 6. Certificado pautas radiales.
Anexo 7. Actas revisión buzones de sugerencias

- *Programa 5. Para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto*

Anexo 8. Formato de consulta de opinión.

- *Programa 6. Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural*

No se presentan anexos para el presente informe.

- *Programa 7 Sostenibilidad y apropiación comunitaria*

Anexo 9. Oficios convocatoria CPC
Anexo 10. Presentación CPC
Anexo 11. Acta reunión y registro de asistencia CPC

- *Programa 8 Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto*

Anexo 12. Actas y reg. Asistencia inducciones personal vinculado.
Anexo 13. Registro asistencia Jornada Lúdico- recreativa "Trabajo en equipo"
Anexo 14. Registros asistencia Comité con Interventoría

9.1.2 Tramo San Carlos

Estos se adjuntan al informe en carpetas organizadas según los programas del plan de gestión social.

Anexos del contratista

- *Programa 1 para el reconocimiento del Entorno en el cual se desarrollará el proyecto*

En este periodo no fue necesario presentar soportes de actividades

- *Programa 2 Para la protección de la infraestructura social y comunitaria*

En este periodo no fue necesario presentar soportes de actividades

- *Programa 3 para la Contratación de Mano de Obra*

Anexo 1. Empleabilidad mujeres
Anexo 2. Empleabilidad

- *Programa 4 comunicación y divulgación*

Anexo 3. Volante oficial informativo cierre de vía n°6
Anexo 4. Volantes invitación CPC
Anexo 5. Registro fotográfico volantes
Anexo 6. Registro fotográfico cartelera informativa
Anexo 7. Buzón de sugerencias PAC
Anexo 8. Buzón de sugerencias JAC
Anexo 9. Constancia emisora Juventud Stereo
Anexo 10. Pauta radial cierre de vía
Anexo 11. Perifoneo local – cierre de vía

- *Programa 5 para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto*

Anexo 12. Revisiones buzones de sugerencias

- *Programa 6 para la protección del patrimonio arqueológico y cultural*

En este periodo no fue necesario presentar soportes de actividades

- *Programa 7 de sostenibilidad y apropiación comunitaria*

Anexo 13. Evidencias fotográficas reunión CPC
Anexo 14. Acta de reunión CPC
Anexo 15. Listado de asistencia CPC
Anexo 16. Presentación reunión CPC
Anexo 17. Volante de invitación CPC

- *Programa 8 para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto*

Anexo 18. Evidencia fotográfica
Anexo 19. Asistencia capacitación mensual
Anexo 20. Acta de capacitación mensual febrero
Anexo 21. RF socialización horas extras

- Anexos de interventoría Tramo San Carlos – Cruces – Narices

Oficios

- Comunicado CM15378-215

10. Listado de tablas

Tabla 1. Actas de entorno levantadas y entregadas Cocorná 13
Tabla 2. Propietarios pendientes por contactar – permisos de intervención Gobernación 14
Tabla 3. *Acercamientos con propietarios para autorizaciones* 15

Tabla 4. Indicadores de gestión programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto Tramo Cocorná 16
Tabla 5. Soporte fotográfico para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo Cocorná 18
Tabla 6. Actas de entorno levantadas y entregadas en dic-2023 tramo san Carlos – Cruces – Narices 21
Tabla 7. Permisos de intervención firmados por Interventoría 2024 tramo San Carlos – Cruces – Narices 21
Tabla 8. Indicadores de gestión Programa para el reconocimiento del entorno en el cual se desarrollará el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 22
Tabla 9. Indicadores de gestión para la Protección de la Infraestructura Social y Comunitaria tramo Cocorná 24
Tabla 10. Indicadores de gestión programa para la Protección de la Infraestructura Social y comunitario tramo – San Carlos – Cruces – Narices 25
Tabla 11. Personal vinculado al Proyecto tramo Cocorná 27
Tabla 12. Indicadores de gestión para la contratación mano de obra – Tramo – Cocorná 27
Tabla 13.registro fotográfico personal vinculado al Proyecto tramo Cocorná 28
Tabla 14. Personal vinculado al Proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 30
Tabla 15. Indicadores de Gestión para la Contratación de Mano de Obra tramo San Carlos – Cruces – Narices 31
Tabla 16. Indicadores de Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná 33
Tabla 17. Soporte fotográfico del Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo Cocorná 35
Tabla 18. Indicadores de Gestión Programa de Comunicación y Divulgación Tramo San Carlos – Cruces – Narices 39
Tabla 19. Soporte fotográfico del Gestión programa de Comunicación y Divulgación Tramo San Carlos – Cruces – Narices 41
Tabla 20. Indicadores de Gestión Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná 43

Tabla 21. Soporte fotográfico del Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo Cocorná 44
Tabla 22. Indicadores de Gestión Programa para la Atención a la Comunidad e Interesados en el proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 45
Tabla 23. Soporte fotográfico del Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto Tramo San Carlos – Cruces – Narices 46
Tabla 24. Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo Cocorná 47
Tabla 25. Indicadores de Gestión Programa para la Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural tramo San Carlos – Cruces - Narices 49
Tabla 26. Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná 50
Tabla 27. Soporte fotográfico del Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo Cocorná 51
Tabla 28. Indicadores de gestión Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo San Carlos – Cruces – Narices 52
Tabla 29. Soporte fotográfico del Programa para la Sostenibilidad y Aprobación Comunitaria tramo San Carlos – Cruces – Narices 53
Tabla 30. Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná 55
Tabla 31. Soporte fotográfico Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo Cocorná 56
Tabla 32. Indicadores de Gestión Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 59
Tabla 33. Soporte fotográfico Programa para la Educación y Capacitación al Personal Vinculado al proyecto tramo San Carlos – Cruces – Narices 60
Tabla 34. Soporte fotográfico de actividades de la interventoría en el mes de marzo de 2024 – Tramo Cocorná 63
Tabla 35. Compromisos comité de seguimiento social tramo San Carlos – Cruces – Narices 69

Tabla 36. Soporte fotográfico de actividades de la interventoría I tramo San Carlos – Cruces – Narices

Consorcio Mejoramiento 15378
Carrera 80 bis N° 7ª – 15 T 5 oficina 801
Tel: (601)7914082 Cel.: 320-4713676
15378me@gmail.com
Bogotá DC, Colombia

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Revisión informe social # 6 Interventoría contrato #43SS111B1465 de 2023		**Fecha de reunión:**
Organismo, Dependencia o Proceso:		**Fecha de elaboración:** **28 de junio de 2024.**
Asistentes, Organismo:	**Ausentes, Organismo:**	

Orden del Día:

1. Lectura del acta anterior N/A
2. Revisión compromisos anteriores N/A
3. Temas tratados N/A
4. Proposiciones y varios N/A
5. Compromisos pactados N/A

Desarrollo de la Reunión:

Contrato N° 43SS111B1465 de 2023, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL GRUPO 1 DE CIRCUITOS ESTRATÉGICOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. LOTE 3: ORIENTE. Cruces - Narices San Carlos, Cocorná - El Ramal.

Informe mensual de # 6 marzo de 2024.

La revisión del presente informe se hace con base en la Guía de manejo Social, Ambiental, y de Seguridad y Salud en el trabajo para proyectos de Infraestructura de la Gobernación de Antioquia.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE GESTION SOCIAL

PROGRAMA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO.

TRAMO COCORNÁ

Actas de vecindad: El contratista presenta avance de levantamientos de actas de vecindad así:

Actas de vecindad levantadas	**Tramo**		**En revisión Interventoría**
48	Mejoramiento	39	38
	Mantenimiento	9	

A la fecha se continua pendiente de la firma del acta # 4 (tramo mejoramiento) y el acta # 40 (tramo mantenimiento) dado que no se ha podido ubicar al propietario y para el otro caso la propietaria se encuentra por fuera del país.

- ***Actas de entorno***: se elaboraron 2 actas de entorno de la vía (tramo Cocorna-El Ramal (Granada).

Actas de entorno levantadas y entregadas				
N°	**N° de acta de entorno**	**Noviembre 2023**	**Diciembre 2023**	**Enero 2024**
1	Acta de entrono N° 1	X		
2	Acta de entrono N° 2	X		
3	Acta de entrono N° 3		X	
4	Acta de entrono N° 4	X		
5	Acta de entrono N° 5		X	
6	Acta de entrono N° 6			X
7	Acta de entrono N° 7			X

- ***Actas permisos de intervención de predios***: a la fecha se han levantado 23 actas de intervención de predios privados, para ser utilizados en construcción de obras hidráulicas, reubicación de poste de energía, entre otros.

  Se tiene pendiente la consecución de 4 predios para el respectivo permiso, y no se ha logrado contactar a los propietarios, lo que ha generado dificultades para el avance de esta actividad; se propone al contratista el apoyo de la personería municipal de Cocorna para que sea garante del proceso.

TRAMO SAN CARLOS

Actas de vecindad: Para el periodo no se realizaron actas de vecindad.

- ***Actas de entorno***: Se cumple con el 100% de las actas de entorno. Para el periodo no se presentaron novedades para esta actividad.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	**Código:** FO-M1-P5-005 **Versión:** 02 **Fecha de aprobación:** 25/06/2018

Actas de entorno levantadas y entregadas noviembre 2023-enero 2024				
N°	**N° de acta de entorno**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Enero**
1	Acta de entrono N° 1	0	X	0

- ***Actas de intervención de predios:*** Para el periodo se realizó 1 permiso de intervención de predio.

PROGRAMA PARA LA PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA.

TRAMO COCORNÁ:

Se llevó a cabo reunión de inicio de obra así:

Fecha	Lugar	Asunto	# asistentes
15 de noviembre del 2023	tramo Cocorna – El Ramal (Granada) en la sede de la Casa de la Cultura del municipio.	Reunión de inicio de obra tramo Cocorna	56

Para el periodo no se reportaron reuniones con la comunidad.

TRAMO SAN CARLOS:

Fecha	Lugar	Asunto	# asistentes
29 de noviembre del 2023	Sede de la JAC del corregimiento el Jordan municipio de San Carlos	Reunión de inicio de obra tramo Cruces-Narices(San Carlos)	26

Para el periodo no se reportaron reuniones con la comunidad.

PROGRAMA PARA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA

TRAMO COCORNÁ:

Para la definición de perfiles de mano de obra calificad y no calificada se utilizó como mecanismo de difusión la reunión del CPC, realizada el 15 de febrero de 2024, así como también con los líderes comunitarios de la zona de influencia directa de la obra.

Mecanismos de recepción de hojas de vida: Por medio del correo electrónico gestionhumana@ingetierras.com, y el punto de atención PAC. Para el periodo no se recibieron hojas de vida.

Vinculación de personal al proyecto: Para el tramo Cocorná –El Ramal (Granada), 41 personas así:

ITEM	PERSONAL MOC		PERSONAL MOSC	
Procedencia	AID	FORANEO	AID	FORANEO
Total	3	19	12	11
	22		23	

TRAMO SAN CARLOS:

La definición de perfiles se requerirá en la medida que se vaya desarrollando el proyecto. Esta información se da a conocer a través de diversos medios como carteleras informativas, CPC, entre otros.

Mecanismos de recepción de hojas de vida: Por medio del correo electrónico gestionhumana@ingetierras.com, y el punto de atención PAC.

Vinculación de personal al proyecto: Para el tramo El Jordán- San Carlos), 38 personas así:

ITEM	PERSONAL MOC		PERSONAL MOSC		PERSONAL MONC	
Procedencia	AID	FORANEO	AID	FORANEO	AID	FORANEO
Total	3	8	0	9	8	10
Total personal vinculado al proyecto			38 personas			

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION

TRAMO COCORNÁ:

Para el periodo se fijaron 15 puntos en sitios estratégicos, con información de cierres viales de manera semanal. Así mismo se utilizaron diferentes canales de comunicación tales como grupos de WhatsApp, integrantes del CPC, presidentes JAC, de las veredas San Juan, el Chocó, las Playas, Buenos Aires, fontanero, Hospital San Juan de Dios del municipio, entre otros.

Se envió comunicación al cuerpo de Bomberos de Cocorna, informando sobre horarios de cierres viales y la utilización de vías alternas.

Se actualizó cartelera informativa en el PAC con información relacionada; avances de los componentes Social, Ambiental, Técnica y SST.

Se instalaron 2 buzones de sugerencias, uno en el PAC y el otro en la JAC de San Juan; sin PQRS reportadas para el periodo.

TRAMO SAN CARLOS

Se cuenta con la instalación de una valla ubicada al ingreso del corregimiento El Jordan municipio de San Carlos.
Pasacalles: pendiente diseño por parte de la supervisión del contrato.
Volantes: Se utilizaron dos diseños diferentes para invitación reunión mensual del CPC y cierre de vía.
Cartelera informativa: fue instalada en el PAC del corregimiento El Jordan municipio de San Carlos.
Se instalaron 2 buzones de sugerencia, uno en el PAC y el segundo en la JAC del corregimiento el Jordan.
Pautas radiales: se difundieron los horarios de cierres de vía
Redes sociales: se difunde cierres de horarios de vía y reunión de CPC.
Para el periodo se ha tenido dificultades para el diseño de pasacalles, tijeras, dado que no se tiene aún una directriz por parte de la oficina de comunicaciones de la SIF.

PROGRAMA PARA ATENCION A LA COMUNIDAD E INTERESADOS EN EL PROYECTO.

TRAMO COCORNÁ:

A la fecha de corte del presente informe no se recibieron PQRS.

El PAC, funciona en el horario lunes-viernes 8:am a 12:00 y de 2.pm-5:pm; sábados 8:am a 12: m; Km1 via Cocorna –El Ramal (Granada) finca Villa Concepción.
Correo electrónico: consorcio.idc@gmail.com
Línea telefónica: 3243827981.

Consulta de opinión en la comunidad y el comercio: se elaboró encuesta con los integrantes del CPC, los resultados de la misma están siendo tabulados y se presentara en el próximo informe.

TRAMO SAN CARLOS:

A la fecha de corte del presente informe no se recibieron PQRS.
Se revisa de manera semanal los buzones
se recibieron 2 hojas de vida de personal interesado en laborar para el proyecto.

La interventoría evidencia que el contratista actualiza la cartelera informativa, con información correspondiente al proyecto desde cada uno de sus componentes, invitaciones a encuentros mensuales del CPC y cierres viales.

PROGRAMA PARA LA PROTECCION DEL PATRIMINIO ARQUEOLOGICO Y CULTURAL.

TRAMO COCORNA:

Para el periodo no se han presentado hallazgos arqueológicos en el proyecto, sin embargo, en las inducciones realizadas al personal que labora en la obra se hace énfasis en el procedimiento a seguir, en caso de algún hallazgo.

En el periodo no se realizaron capacitaciones sobre este programa.

TRAMO SAN CARLOS:

Para el periodo no se han presentado hallazgos arqueológicos en el proyecto, sin embargo, en las inducciones realizadas al personal que labora en la obra se hace énfasis en el procedimiento a seguir, en caso de algún hallazgo.

En el periodo no se realizaron capacitaciones sobre este programa.

PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD Y APROPIACION COMUNITARIA.

TRAMO COCORNÁ:

Se realizó la cuarta reunión del CPC el 14 de marzo de 2024 (20 personas) este comité está integrado por representantes de la alcaldía de Cocorná. Concejo municipal, Personería, presidentes de las JAC de las veredas San Juan y el Chocó, las Playas, policía nacional, etc. En el comité se trataron temas como avance de la obra en sus componentes técnicos, sociales, ambientales, SST.

TRAMO SAN CARLOS:

Se llevó a cabo reunión el 14 de marzo de 2024, (4 personas), acompañamiento de la alcaldía de San Carlos, la mayor inquietud fue finalización de la obra.es de indicar que era la reunión de cierre del comité.

PROGRAMA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

TRAMO COCORNÁ:

Inducción a trabajadores sobre medidas de manejo social; los días 6 y 27 de marzo de 2024.
Capacitación "diferentes programas del PGS, manejo de PQRS, así mismo se reforzó en el tema, Trabajo en equipo.

Se realizaron recorridos de obra para verificar la divulgación de los volantes informativos.

Se realizaron comités de seguimiento entre contratista e interventoría los días 6, y 12 de marzo para revisar los avances en los componentes técnicos, ambiental, social y SST.

TRAMO SAN CARLOS:

Capacitación al personal de la obra en "Plan de Gestión Social" (32 asistentes).

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA

TRAMO COCORNÁ:

- Recorridos de obra en promedio 4 a 5 veces por semana para identificar funcionamientos del PAC, buzón de sugerencias, de igual manera acompañamientos actas de vecindad, entorno, elaboración de reportes semanales e informes mensuales, difusión de cierres viales, etc.
- Para este periodo se hizo revisión de piezas comunicacionales, teniendo en cuenta los cambios de imagen institucional.
- Acompañamiento de apertura de buzones de manera semana.
- Acompañamiento en los CPC que se llevan a cabo de manera mensual.
- Elaboración de reportes semanales y mensuales.
- Mesas de trabajo entre los profesionales sociales de la interventoría y contratista para socializar insumos del cierre del componente
- Recorridos con el par social del tramo San Carlos para verificar pendientes para el cierre social.

COMITES DE SEGUIMIENTO:

En el comité técnico se resalta la importancia de trabajar de manera articulada contratista-interventoría, se aclara que el contratista tiene los lineamentos para el informe final y resolver dudas.

Se tiene pendiente la firma de 2 actas de vecindad sin firma del propietario, se sugiere gestionar acompañamiento de la personería municipal.
El rubro que se tiene previsto para algunas actividades de gestión social debe ir orientado a actividades de seguridad vial, del mismo modo se hizo énfasis en la actualización del plan de gestión social y su presupuesto.

TRAMO SAN CARLOS:

- Mesa de trabajo virtual con profesionales sociales del contratista e interventoría del tramo Cocorna-San Carlos, para socializar insumos para el cierre del componente social.
- Apertura de buzones sin novedad de PQRS.
- Envió de empleabilidad de manera mensual a la supervisión.
- Revisión y observaciones a cartelera informativa.
- Asistencia a comité de obra.
  Revisión actualización del Plan de Gestión Social
- Acompañamiento de interventoría en capacitación al personal donde se expone el Plan de Gestión Social.
- Acompañamiento a última reunión de cierre del CPC en la sede de la JAC.

COMITES DE SEGUIMIENTO

Presencia en los comités # 13, donde se reitera la importancia del cumplimiento de las actividades del Plan de Gestión Social.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

TRAMO COCORNÁ:

Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria: fueron atendidas las observaciones hechas por la interventoría al contratista en contar con el apoyo de la personería para el cierre de 2 actas de vecindad.

Programa para la contratación de mano de obra: Se recomienda utilizar los certificados de residencia de los presidentes de la JAC, para que sean aportados por los trabajadores para su vinculación a la obra.

Programa de comunicación y divulgación: se ha mejorado en la articulación para emitir la divulgación de cierres viales a través de los diferentes medios de difusión disponibles.

Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto: se realizó encuesta de satisfacción la cual fue aplica a los integrantes del CPC, en espera de su tabulación.

Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural: Hacer énfasis de este tema en las capacitaciones al personal de obra, esta recomendación fue atendida por el contratista.

Programa para la Sostenibilidad y apropiación comunitaria: se llevó a cabo reunión mensual con el CPC dando respuesta a sus inquietudes.

Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto: se realizaron actividades lúdico-recreativas con el personal de la obra.

TRAMO SAN CARLOS:

Programa para el reconocimiento del entorno: se recomienda al contratista ponerse en contacto con los propietarios de predios colindantes para dar inicio al cierre de actas de vecindad.

Programa para la protección de la infraestructura social y comunitaria: se deben programar reunión de cierre, teniendo en cuenta los inconvenientes sociales que se tienen por los cierres viales y el plazo del vencimiento del contrato.

Programa para la contratación de mano de obra: Utilizar los medios adecuados para la divulgación de vacantes y dejar evidencia, garantizando la oportunidad a la comunidad del AID.

Programa de comunicación y divulgación: mantener activos los diferentes canales de comunicación para minimizar los impactos en el desarrollo de la obra.
Comunicar con antelación los cambios de horarios de cierres viales y dar celeridad en la instalación de vallas tipo tijera.

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Programa para la atención a la comunidad e interesados en el proyecto: instalar y mantener en funcionamiento el PAC, atender las PQRS.
Aplicar la encuesta de percepción del proyecto a la comunidad con su respetivo análisis y evidencia física.

Programa para la protección del patrimonio arqueológico y cultural: Hacer énfasis de este tema en las capacitaciones al personal de obra.

Programa para la Sostenibilidad y apropiación comunitaria: mantener comunicación permanente con los integrantes del CPC.

Programa para la educación y capacitación al personal vinculado al proyecto: capacitar al personal de manera permanente en protocolos en caso de hallazgos arqueológicos.
Articulación con el cuerpo de bomberos para dictar charla sobre primeros auxilios, manejo de camillas, extintores en caso de accidentes.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde la supervisión social, se acepta el informe correspondiente al mes de marzo de 2024, presentado por la Interventoría CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378.

Los soportes de las actividades ejecutadas para cada programa se pueden consultar en medio físico y digital, los cuales hacen parte de la información entregada por el CONSORCIO MEJORAMIENTO 15378.

1. Compromisos pactados N/A

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1				
2				

Firma de quien elabora

LUCELLY PENAGOS VALENCIA
Profesional Social
Apoyo a la supervisión
Nombre de quien elabora

Firma de quien revisa y aprueba

NICOLAS GIRALDO MORALES
Profesional Social
Supervisor Social
Nombre de quien revisa y aprueba

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO

EN ESTE FOLIO VA UN

VER EXPEDIENTE FISICO

