INFORME SEMANAL

Semana Número: 8 Del: 15 de enero de 2024 Al: 21 de enero de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 47 Días

ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE PACHO SUPERVISOR CESAR BURGOS

OBJETO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2528-2023, OBJETO: ¨REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTRIOL DE PROGRAMACION PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS. GRUPO 1¨.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	1,69%	78,41%
Valor básico de la Obra	$ 1.188.691,27	$ 55.151.054,54

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	3,18%	93,12%
Valor básico de la Obra	$ 2.236.709,01	$ 65.497.592,13

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	CONSORCIO SEDE MARSAF
Contrato No.	2391 de 2023
Valor Inicial:	600.182.493,03
Valor Actualizado:	600.182.493,03
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	CONSORCIO INTERAGRUPACIONES
Contrato No.	2528 de 2023
Valor Inicial:	106.896.795,60
Valor Actualizado:	106.896.795,60
Plazo Inicial:	31 de diciembre de 2023
Plazo Actualizado:	24 de febrero de 2024
Fecha de Iniciación:	22 de noviembre de 2023
Fecha de Vencimiento:	24 de febrero de 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

Se llevó a cabo la ejecución de las siguientes actividades: Aplicación remates de estuco y de pintura en superficies de muro de: Oficina de las Oficinas Administrativas. Limpieza de canales de cubierta. Falta instalación de una tableta de piso exterior y la instalación de sanitarios. Personal en Obra: 1 Oficial de Acabados, 1 Ayudante.


IMAGENES AVANCE




Comentario: Aplicación remates de estuco y de pintura en superficies del Patio.



Comentario: Aplicación remates de estuco y de pintura en superficies del Patio.

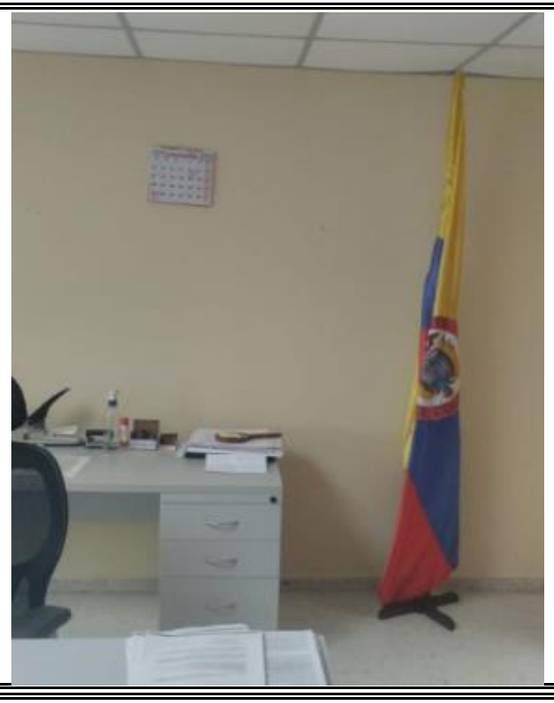

Comentario: Aplicación remates de estuco y de pintura en superficies de muro Oficina del Registrador.

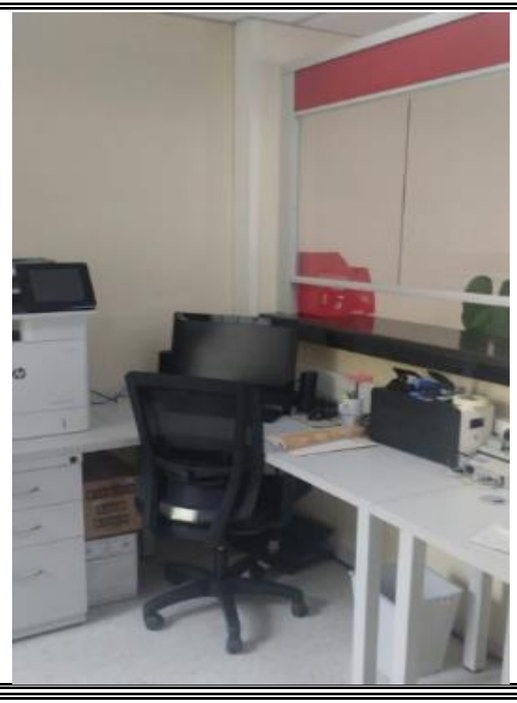

Comentario: Aplicación remates de estuco y de pintura en superficies de muro Oficinas Administrativas.



Comentario: Aplicación remates de estuco y de pintura en superficies de muro Oficinas Administrativas.



Comentario: Limpieza de canales de cubierta.

,

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
	Firma Nombre : Arq. OMAR ANDRES CAMPOS M. Matrícula No.:A25012004-80055117 CND
