Montería 27 de mayo de 2024

Señora
Cilia Tobias Carrascal
Secretaria de Infraestructura
Gobernación de Córdoba

Ref. Cumplimiento de los compromisos adquiridos en mesa de trabajo realizada el de día 17 de mayo de 2024.

Cordial saludo,

En cumplimiento a los compromisos adquiridos por parte del Departamento Administrativo de Planeación en mesa de trabajo realizada el día 17 de mayo del año en curso, en lo concerniente a la actualización de reportes en el aplicativo GESPROY – SGR de los proyectos objeto del PAC-143-24 de fecha 14 de mayo de 2024, me permito poner en su conocimiento las siguientes actuaciones:

1. El martes 20 de mayo del presente año se recibió del correo jose.pastrana@cordoba.gov.co al correo gesproy@cordoba.gov.co la información de la ejecución del proyecto a través del Link we Transfer: https://we.tl/t-jz421Ayq8O proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LOS BARRIOS SAN JORGE Y EN MUCHA JAGUA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” información contenida:

ACTAS SUSCRITAS No SI-LP-017-2020	RECCIBIDO
ACTAS DE RECIBO DE LA COMUNIDAD	RECCIBIDO
ACTA RECIBO FINAL CONTRATO SI-LP-017-2020	RECCIBIDO
SINTESIS DEL PROYECTO	RECCIBIDO
PLANTILLA ACTUALIZADA	RECCIBIDO

2. En el mismo correo fue recibida la información del proyecto “MEJORAMIENTO DE VÍAS DEL TERCER ORDEN EN AGUAS NEGRAS Y EL SABANAL EN LA REGIÓN DEL MEDIO SINÚ DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. La cual contenía:

ACTAS PARCIAL	RECCIBIDO
ACTAS SUSCRITAS CONTRATO INTERVENTORIA No 1272 - 2019	RECCIBIDO
ACTAS SUSCRITAS CONTRATO DE OBRA No 1273 - 2019	RECCIBIDO
OFICIO CONTRATISTA INTERVENTOR REINICIO No 5	RECCIBIDO
PLANTILLA ACTUALIZADA	RECCIBIDO
POLIZA Y APROBACION DE POLIZA ACTA DE REINICIO No 5	RECCIBIDO
SINTESIS DEL PROYECTO	RECCIBIDO


3. Se actualizaron los actos administrativos generados durante la ejecución en el aplicativo Gesproy, de ambos proyectos:
4. Se procedió actualizar la ejecución de actividades llevando a estado terminado los proyectos relacionados en el punto anterior.
5. Se utilizaron los indicadores de productos.
6. Se hizo un registro fotográfico que identifican las diferentes etapas del proyecto, etapa de inicio, etapa de ejecución y etapa de terminación.
7. Los proyectos se encuentran a la espera de acto administrativo de cierre.

Se anexa los procedimientos realizados en el aplicativo Gesproy.


Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LOS BARRIOS SAN JORGE Y EN MUCHA JAGUA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”



Estado actual del proyecto en el aplicativo Gesproy “TERMINADO”

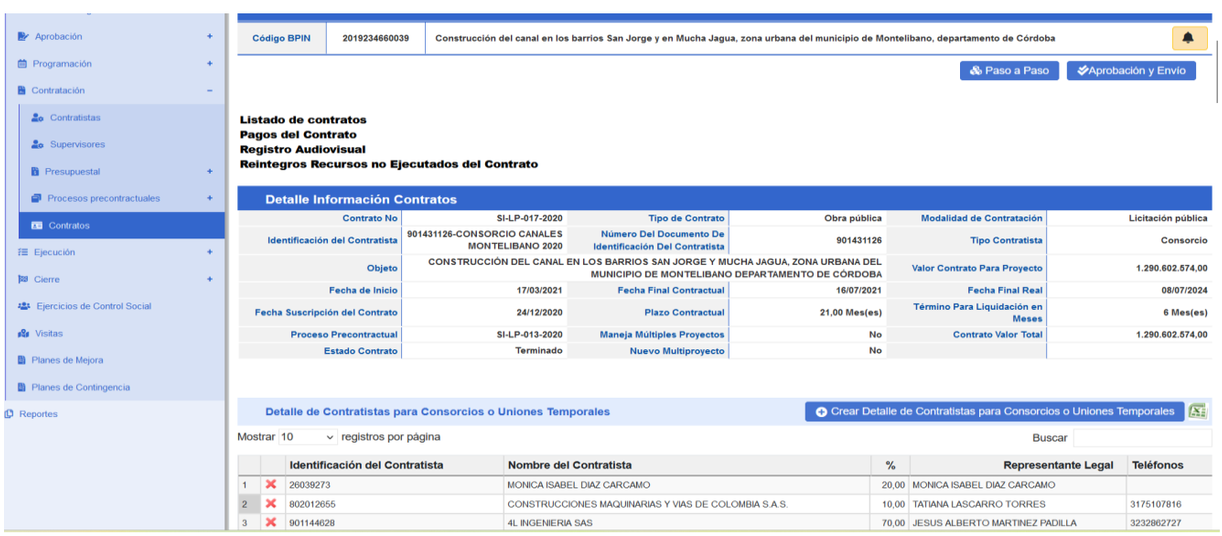

Se procedió actualizar el estado terminado al contrato de obra No SLP-017-2020

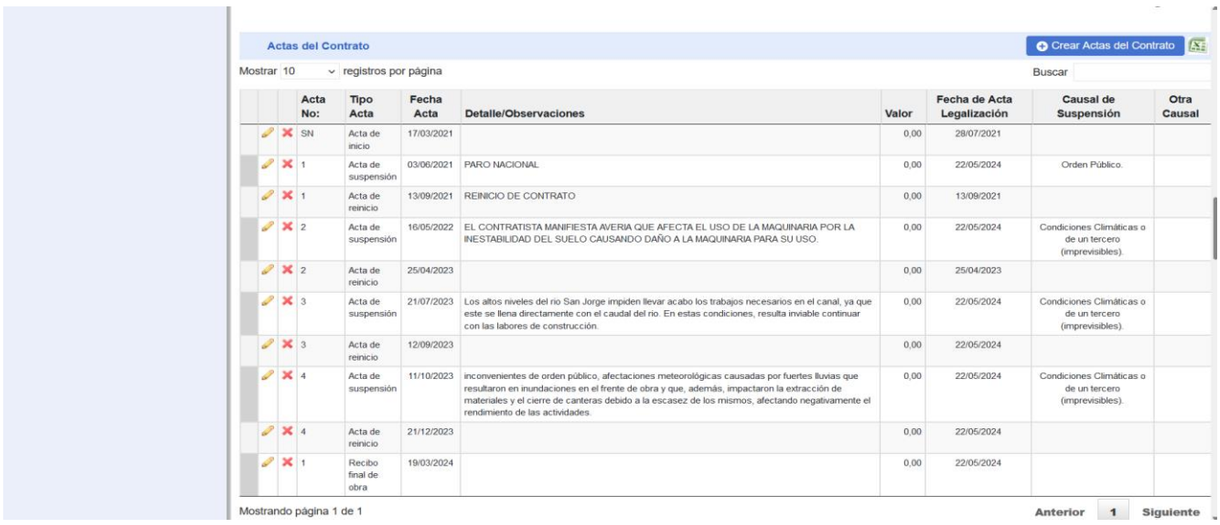

Actas del Contrato — Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

			Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
			SN	Acta de inicio	17/03/2021		0,00	28/07/2021		
			1	Acta de suspensión	03/06/2021	PARO NACIONAL	0,00	22/05/2024	Orden Público.	
			1	Acta de reinicio	13/09/2021	REINICIO DE CONTRATO	0,00	13/09/2021		
			2	Acta de suspensión	16/05/2022	EL CONTRATISTA MANIFIESTA AVERIA QUE AFECTA EL USO DE LA MAQUINARIA POR LA INESTABILIDAD DEL SUELO CAUSANDO DAÑO A LA MAQUINARIA PARA SU USO.	0,00	22/05/2024	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
			2	Acta de reinicio	25/04/2023		0,00	25/04/2023		
			3	Acta de suspensión	21/07/2023	Los altos niveles del rio San Jorge impiden llevar acabo los trabajos necesarios en el canal, ya que este se llena directamente con el caudal del rio. En estas condiciones, resulta inviable continuar con las labores de construcción.	0,00	22/05/2024	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
			3	Acta de reinicio	12/09/2023		0,00	22/05/2024		
			4	Acta de suspensión	11/10/2023	inconvenientes de orden público, afectaciones meteorológicas causadas por fuertes lluvias que resultaron en inundaciones en el frente de obra y que, además, impactaron la extracción de materiales y el cierre de canteras debido a la escasez de los mismos; afectando negativamente el rendimiento de las actividades.	0,00	22/05/2024	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles).	
			4	Acta de reinicio	21/12/2023		0,00	22/05/2024		
			1	Recibo final de obra	19/03/2024		0,00	22/05/2024		

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Registro de actos administrativos relacionados al contrato No SLP-017-2020




Modificaciones al Contrato — Crear Modificaciones al Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

			Tipo De Modificación	Documento	Documento Número	Fecha Documento	Objeto	Valor	Adición En Tiempo
1			Tiempo	Prórroga	1	21/09/2022	constantes lluvias presentadas y proyectadas		90 Dia(s)
2			Tiempo	Prórroga	2	17/01/2022	durante el tiempo transcurrido del contrato las condiciones climáticas (fuertes precipitaciones) han entorpecido la ejecución de las actividades plasmadas en el presupuesto.		2 Mes(es)
3			Tiempo	Prórroga	3	18/03/2022	CONDICIONES CLIMATICAS		2 Mes(es)
4			Tiempo	Prórroga	PRR1 ACTA SUSP2	14/06/2022	CONDICCIONES CLIMATICAS, LLUVIAS CONSTANTES		30 Dia(s)
5			Tiempo	Prórroga	4	25/04/2023	AFECTACIONES METEOROLOGICAS EN LA REGION Y ESCACES MATERIALES PETREOS NECESARIOS PARA LA EJECCUCION DE LA OBRA		2 Mes(es)
6			Tiempo	Prórroga	5	27/06/2023	circunstancias adversas que se han presentado durante la ejecución de la obra		2 Mes(es)
7			Tiempo	Prórroga	PRR1 ACTA SUSP3	25/08/2023	altos niveles del río San Jorge que impiden la normal ejecución de las labores en el canal del barrio Muchas Jaguas, ya que este canal conecta con el río y los niveles del canal en la actualidad aún son altos lo que impide la ejecución de actividades		30 Dia(s)
8			Tiempo	Prórroga	PRR1 ACTA SUSP4	09/11/2023	se presentan fuerte lluvias en el municipio y el río San Jorge aun presenta altos niveles, lo cual dificultaba la ejecución segura y adecuada de las actividades en el canal del barrio Mucha Jaguas.		30 Dia(s)
9			Tiempo	Prórroga	6	21/12/2023	altos niveles que presentó río San Jorge, ha sido objeto de un análisis riguroso por parte de esta Interventoría. Hemos realizado un seguimiento detallado de la situación y verificamos que los niveles del río San Jorge han descendido significativamente, lo que permite afirmar que las condiciones son adecuadas y seguras para reanudar las actividades en el canal del barrio Mucha Jaguas.		2 Mes(es)
10			Tiempo	Prórroga	7	19/02/2024	baja considerablemente la consecución de la mano de obra no calificada y los cierres de inventario por parte de nuestros proveedores lo que ocasiona la tardanza en la llegada de los insumos necesarios para las actividades que se vienen desarrollando		1 Mes(es)

Registro de prorrogas generadas para el contrato No SLP-017-2020

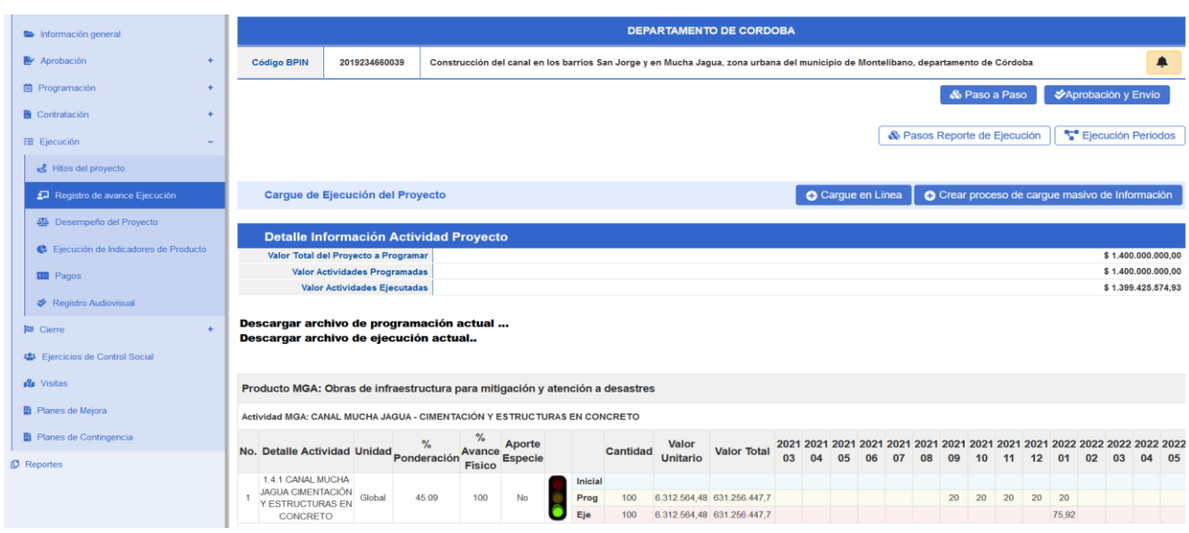

Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Hitos del proyecto
Registro de avance Ejecución
Desempeño del Proyecto
Ejecución de Indicadores de Producto
Pagos
Registro Audiovisual
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN 2019234660039 — Construcción del canal en los barrios San Jorge y en Mucha Jagua, zona urbana del municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba

Paso a Paso — Aprobación y Envío
Pasos Reporte de Ejecución — Ejecución Periodos

Cargue de Ejecución del Proyecto — Cargue en Línea — Crear proceso de cargue masivo de Información

Detalle Información Actividad Proyecto

Valor Total del Proyecto a Programar	$ 1.400.000.000,00
Valor Actividades Programadas	$ 1.400.000.000,00
Valor Actividades Ejecutadas	$ 1.399.425.574,93

Descargar archivo de programación actual ...
Descargar archivo de ejecución actual..


Producto MGA: Obras de infraestructura para mitigación y atención a desastres

Actividad MGA: CANAL MUCHA JAGUA - CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Fisico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 03	2021 04	2021 05	2021 06	2021 07	2021 08	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03	2022 04	2022 05
1	1.4.1 CANAL MUCHA JAGUA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO	Global	45.09	100	No	Inicial																		
						Prog	100	6.312.564,48	631.256.447,7							20	20	20	20	20				
						Eje	100	6.312.564,48	631.256.447,7											75,92				

Se realizo un registro de ejecución de actividades cumpliendo con el 100% de programación establecida


“MEJORAMIENTO DE VÍAS DEL TERCER ORDEN EN AGUAS NEGRAS Y EL SABANAL EN LA REGIÓN DEL MEDIO SINÚ DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

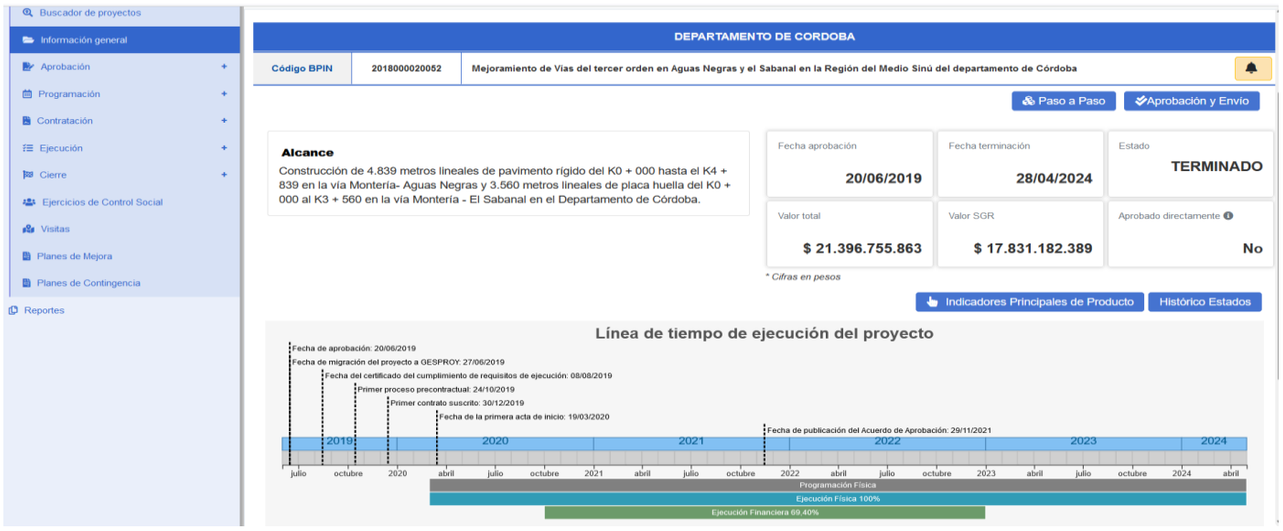


Estado actual del proyecto en el aplicativo Gesproy “TERMINADO”



Se procedió a llevar al estado terminado el contrato de obra No 1273-2019

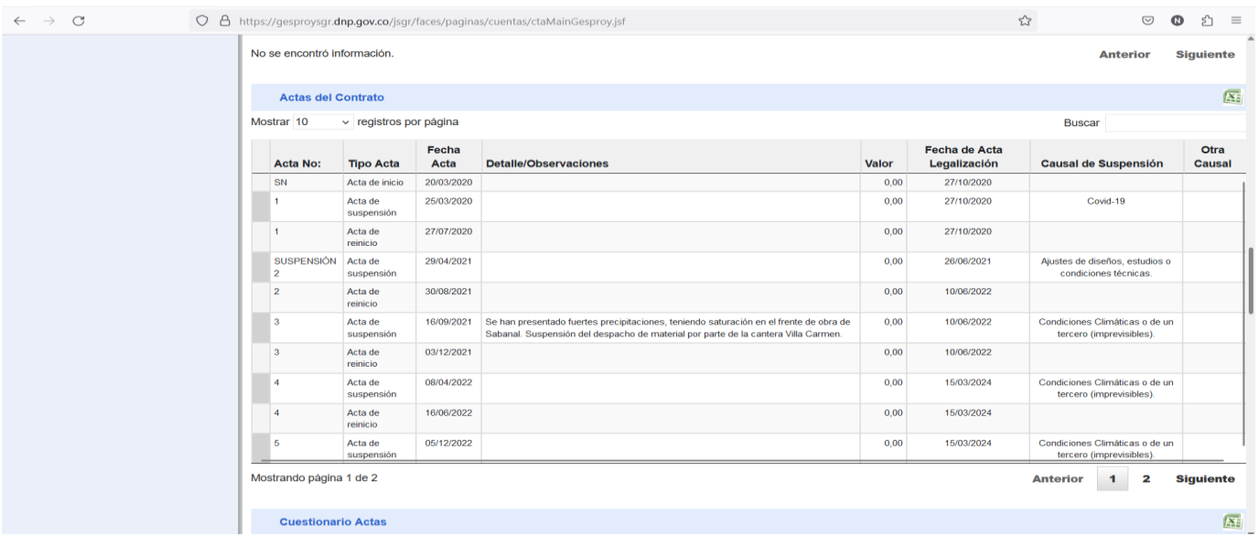

Registro de actos administrativos relacionados al contrato No 1273-2019

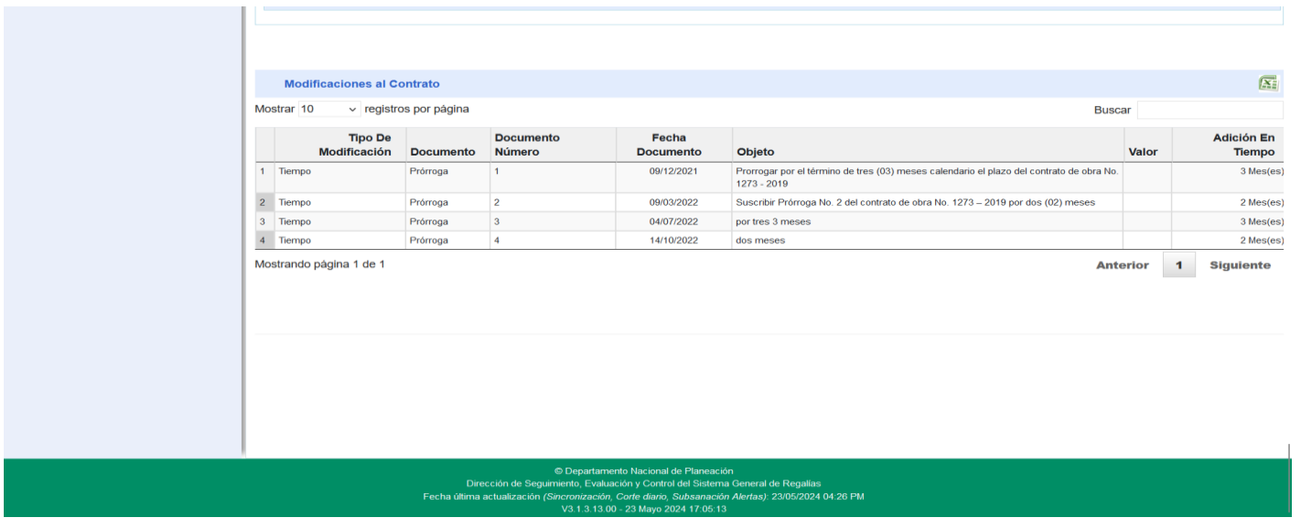

Modificaciones al Contrato


Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Tipo De Modificación	Documento	Documento Número	Fecha Documento	Objeto	Valor	Adición En Tiempo
1	Tiempo	Prórroga	1	09/12/2021	Prorrogar por el término de tres (03) meses calendario el plazo del contrato de obra No. 1273 - 2019		3 Mes(es)
2	Tiempo	Prórroga	2	09/03/2022	Suscribir Prórroga No. 2 del contrato de obra No. 1273 – 2019 por dos (02) meses		2 Mes(es)
3	Tiempo	Prórroga	3	04/07/2022	por tres 3 meses		3 Mes(es)
4	Tiempo	Prórroga	4	14/10/2022	dos meses		2 Mes(es)

Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

© Departamento Nacional de Planeación
Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías
Fecha última actualización *(Sincronización, Corte diario, Subsanación Alertas)*: 23/05/2024 04:26 PM
V3.1.3.13.00 - 23 Mayo 2024 17:05:13

Registro de prorrogas generadas para el contrato No 1273-2019

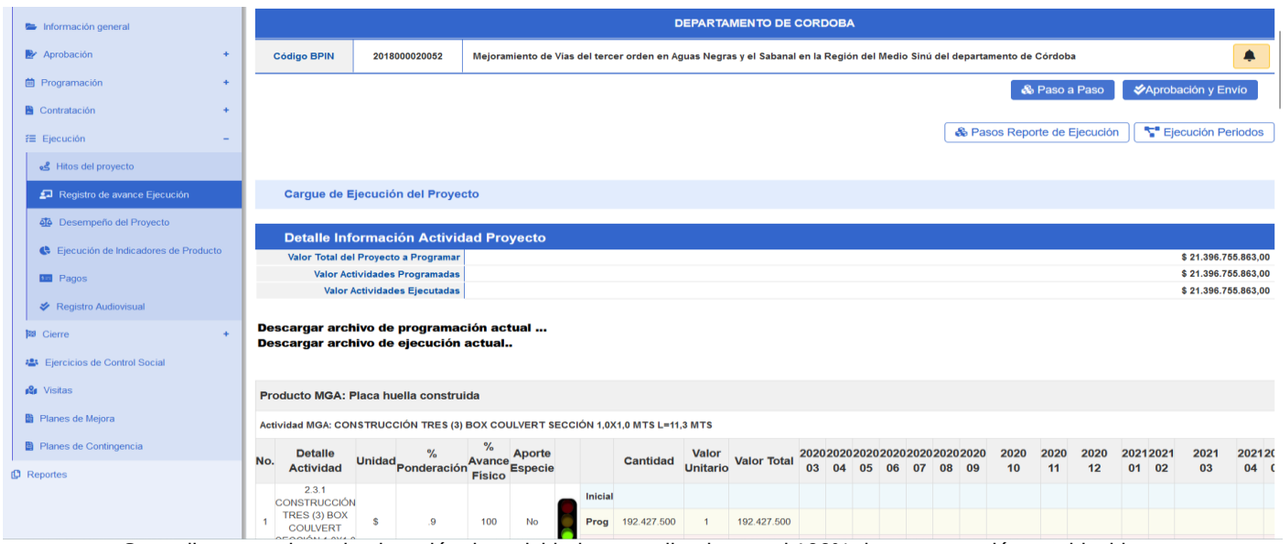

Información general
Aprobación
Programación
Contratación
Ejecución
Hitos del proyecto
Registro de avance Ejecución
Desempeño del Proyecto
Ejecución de Indicadores de Producto
Pagos
Registro Audiovisual
Cierre
Ejercicios de Control Social
Visitas
Planes de Mejora
Planes de Contingencia
Reportes

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Código BPIN	2018000020052	Mejoramiento de Vias del tercer orden en Aguas Negras y el Sabanal en la Región del Medio Sinú del departamento de Córdoba

Paso a Paso — Aprobación y Envío
Pasos Reporte de Ejecución — Ejecución Periodos

Cargue de Ejecución del Proyecto

Detalle Información Actividad Proyecto

Valor Total del Proyecto a Programar	$ 21.396.755.863,00
Valor Actividades Programadas	$ 21.396.755.863,00
Valor Actividades Ejecutadas	$ 21.396.755.863,00

Descargar archivo de programación actual ...
Descargar archivo de ejecución actual..

Producto MGA: Placa huella construida

Actividad MGA: CONSTRUCCIÓN TRES (3) BOX COULVERT SECCIÓN 1,0X1,0 MTS L=11,3 MTS

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2020 03	2020 04	2020 05	2020 06	2020 07	2020 08	2020 09	2020 10	2020 11	2020 12	2021 01	2021 02	2021 03	2021 04
1	2.3.1 CONSTRUCCIÓN TRES (3) BOX COULVERT	$	9	100	No	Inicial																	
						Prog	192.427.500	1	192.427.500														

Se realizo un registro de ejecución de actividades cumpliendo con el 100% de programación establecida

CAMILO ANDRES MEJIA PADILLA
Director del Departamento Administrativo de Planeación

Anexo: Lo enunciado

-

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**
Nombre: Cesar Serrano Florez	**Nombre**: Claudio Paternina Caicedo
Cargo: Contratista DAP	**Cargo:** Contratista DAP
Firma:	**Firma:**

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

1400 **OFICIO DAP 00309**

Montería 11 de junio de 2024


Doctora
Claudia Margarita García Martínez
Secretaria para la Equidad de Mujer, Infancia, Adolescencia y Persona Mayor.
Gobernación de Córdoba

Ref. Creación de usuario rol de consulta aplicativo GESPROY.

Cordial saludo;

Atendiendo la solicitud realizada, de manera comedida me permito remitir la creación de usuario con el rol de "CONSULTA" del aplicativo GESPROY, se procede a notificar a través del presente oficio la creación de dicho usuario enviado al correo claudia.garcia@cordoba.gov.co para su posterior validación y activación.

Se comparte la evidencia de la creación de usuario directo del aplicativo GESPROY

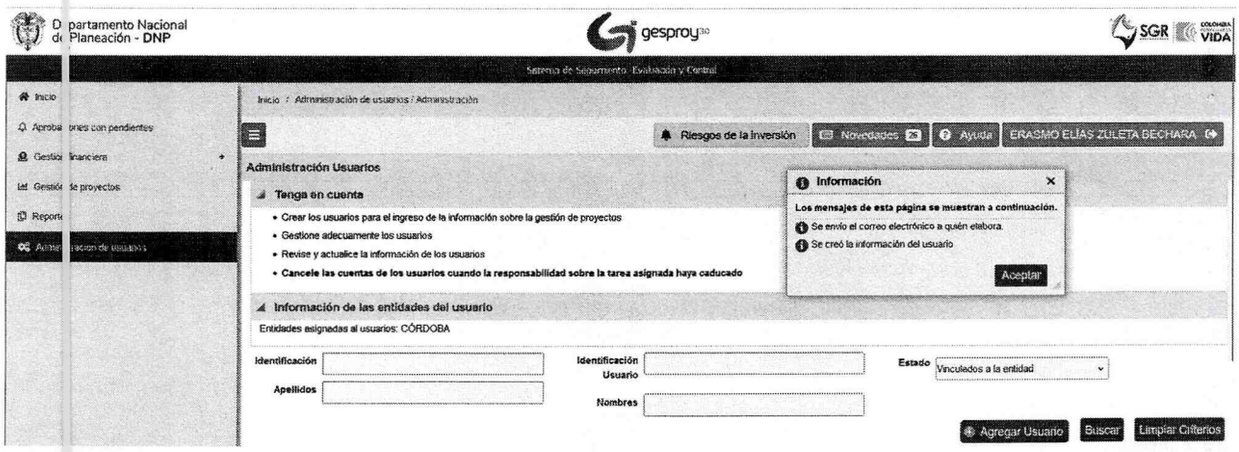

Agradeciendo la atención para con la presente.

Atentamente,

CAMILO ANDRES MEJIA PADILLA
Director del Departamento Administrativo de Planeación

Anexo: Lo enunciado

ELABORADO POR:	**REVISADO POR:**
Nombre: Cesar Serrano Flórez	**Nombre**: Claudio Paternina Caicedo
Cargo: Contratista DAP	**Cargo:** Contratista DAP
Firma:	**Firma:**

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

140(

OFICIO DAP 00322

Montería 17 de junio de 2024

Doctor
IVÁN NÁDER DÍAZ
Secretario de Desarrollo Económico y Agroindustrial
Gobernación de Córdoba

Ref. Solicitud de información del estado actual del proyecto "APLICACIÓN, AISLAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES COMO ESTRATEGIA PARA LA REGULACIÓN HÍDRICA, CONSERVACION DE SUELOS Y MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE REGIONES DEPRIMIDAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA". Identificado con BPIN **2013000020040**

Cordial Saludo;

En atención al asunto de referencia, y con el objetivo de darle cumplimiento a los principios de eficiencia y eficacia de proyectos SGR de manera comedida me permito solicitar la información relacionada con la ejecución del proyecto de referencia, que contenga lo siguiente: Informe final de ejecución, Actas suspensión, Actas de reinicio, Actas de prorrogas, Adiciones si las hay, actas de terminación y/o liquidación de los contrato **No 764-2013** e interventoría **No 455-2014 y No 519-2014**. Registro fotográfico que evidencie las etapas de Inicio, Ejecución y Terminación del proyecto.

La anterior solicitud es necesaria para el reporte oportuno de ejecución de proyectos en el aplicativo Gesproy.

Agradeciendo la atención para con la presente.

Atentamente,

CAMILO ANDRES MEJIA PADILLA
Director del Departamento Administrativo de Planeación

Anexo: Lo enunciado

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
Nombre: Cesar Serrano Flórez	**Nombre**: Claudio Paternina Caicedo
Cargo: Contratista DAP	**Cargo:** Contratista DAP
Firma:	**Firma:**

GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA

1400 **OFICIO DAP 00323**

Montería 17 de junio de 2024

Doctor
EMMA PAOLA GUZMAN TAMARA
Secretaría de Educación Departamental
Gobernación de Córdoba

Ref. Solicitud de información del estado actual de los proyectos: "FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y DEMOCRTICA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA APOYADA EN LAS TICS EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". Identificado con BPIN **2013000100265.**

"FORTALECIMIENTO CAPACIDADES INVESTIGATIVAS Y EMPRENDEDORAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS TODO EL DEPARTAMENTO, CORDOBA, CARIBE" identificado con BPIN **2012000100154.**

Cordial Saludo;

En atención al asunto de referencia, y con el objetivo de darle cumplimiento a los principios de eficiencia y eficacia de proyectos SGR de manera comedida me permito solicitar la información relacionada con la ejecución de los proyectos de referencia, que contenga lo siguiente: Informe final de ejecución, Actas suspensión, Actas de reinicio, Actas de prorrogas, Adiciones si las hay, actas de terminación y/o liquidación de los contratos, Registro fotográfico que evidencie las etapas de Inicio, Ejecución y Terminación del proyecto.

La anterior solicitud es necesaria para el reporte oportuno de ejecución de proyectos en el aplicativo Gesproy.

Agradeciendo la atención para con la presente.

Atentamente,

CAMILO ANDRES MEJIA PADILLA
Director del Departamento Administrativo de Planeación

Anexo: Lo enunciado

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
Nombre: Cesar Serrano Flórez	**Nombre**: Claudio Paternina Caicedo
Cargo: Contratista DAP	**Cargo:** Contratista DAP
Firma:	**Firma:**
