	FORMATO PARA PAGO	Código: FO-GJ-014
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	Versión: 2
		Página: 1 de 1

Elaboró: Abogado Especializado	Revisó: Jefe Oficina Asesora Jurídica	Aprobó: Comité MECI – CALIDAD Alcalde

CIUDAD:	FUSAGASUGA	**FECHA**	20	05	2024	**ACTA**	**No. 3**		
CONTRATO	2024-0196	**PERIODO A CANCELAR**	**03**	**04**	**2024**	**AL**	**30**	**04**	**2024**

OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA"
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($792.916.814.00), MONEDA CORRIENTE INCLUYE IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY
VALOR A CANCELAR EN LA PRESENTA ACTA	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($467.082.306,60)
NOMBRE CONTRATISTA	**MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S Nit: 800.219.167-5 R.L MARÍA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO C.C. 39.614.343 de Fusagasugá**
NOMBRE INTERVENTOR	**N/A**
NOMBRE SUPERVISOR	**Ing. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ-Secretario de Infraestructura**

ANEXO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

X	ACTA No, 3 DE PAGO N° 1
X	ACTA No. 1 INICIO
X	INFORME N°1
X	ACTA No. 2 ENTRADA Y SALIDA
X	FACTURA MA967
X	ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN
X	ACTA DE INICIO
X	COPIA DEL CONTRATO
X	SALUD Y PENSIÓN O PARAFISCALES
X	SOPORTES
X	DISPONIBILIDAD
X	REGISTRO
X	RUT

FIRMA

FUNCIONARIO QUIEN TRAMITA LA CUENTA	FUNCIONARIO QUIEN REVISA LA CUENTA	
	Nombre:	ALCALDIA DE FUSAGASUGA 28 MAY 2024 SECRETARIA JURIDICA
Firma	Firma	

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 2	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No. 3										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**		20	05	2024				
	INICIO			SUSPENSIÓN						
	REINICIO			PRORROGA						
	ADICIÓN			MODIFICACIÓN						
	ENTREGA Y RECIBO			LIQUIDACIÓN						
X	PAGO PARCIAL No. 1			OTRA CUAL?						
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL									
Contrato No.	2024-0196	**Fecha de Suscripción del Contrato**				03	04	2024		
Objeto	**SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSIÓN ASFALTICA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE FUAGASUGÁ**									
Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES Y/o HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**Fecha Acta de Inicio**	03	04	2024	**Fecha de Terminación**	31	12	2024	
Valor del Contrato	SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($792.916.814,00) INCLUYE IMPUESTOS DE LEY									
Nombre del Contratista	**MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S** Nit. 800.219.167-5 R.L MARÍA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO C.C 39.614.343 de Fusagasugá									
Acta No. 1 Inicio	Fecha de Suscripción	03	04	2024	Fecha de terminación	02	12	2024		
Acta No. 2 ENTREGA Y RECIBO	Fecha de Suscripción	08	05	2024						
Supervisor	Ing. **RAUL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura									
Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica	x	Número 202400022		Fecha ingreso 08-05-2024			

En la ciudad de Fusagasugá, a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron el ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ,** Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura, en calidad de **SUPERVISOR,** el Inspector de Obras **ERNESTO RUBIO TERÁN** en calidad de **APOYO A LA SUPERVISIÓN** de la secretaria de infraestructura, y la empresa **MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S** con **Nit 800.219.167-5**, representante legal la señora **MARÍA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO,** identificada con cedula de ciudadanía **No. 39.614.343** expedida en Fusagasugá, en su calidad de **CONTRATISTA,** con el objeto de realizar el acta de pago No. 1 del suministro de Mezcla Asfáltica en caliente y Emulsión Asfáltica con destino al mantenimiento de las vías de Fusagasugá desde el día 03 de abril al 30 de abril de 2024 del contrato en mención, así:

CANTIDADES SUMINISTRADAS ENTRE EL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA MONTO AGOTABLE	CANTIDAD SUMINISTRADA ENTRE EL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2024	TOTAL SUMINISTRADO
1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 INVIAS 450-02	M3	920	540,84	540,84
2	EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	KG	7.323	4.530	4.530

CANTIDADES A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Valor Promedio Unitario Sin iva	IVA 19%	Valor Unitario Con iva	Valor Total
1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 INVIAS 450-02	M3	540,84	$376.424.640.00	$71.520.682,00	$447.945.322,00	$447.945.321,60

2	EMULSIÓN ASFALTICA CRR-1	KG	4.530	$16.081.500,00	$3.055.485,00	$19.136.985,00	$19.136.985,00
	TOTAL A PAGAR						**$467.082.306,60**

ESTADO FINANCIERO

No. de Acta	Periodo	Valor pago Anterior	Valor Presente Acta	Saldo
Acta No. 1 de Inicio			$792.916.814,00	
Acta No. 2 Entrega y Recibo	03/04/2024 al 30/04/2024			

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO / FUENTE	No. Disponibilidad	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	VALOR A PAGAR	SALDO
2.3.2402115.2.3.2.02.01.003.915.1.2.1.0.00	2024020146	20244040017	$64.218.700,00	$64.218.700,00	$0.00
2.3.2402115.2.3.2.02.01.003.915.1.2.4.3.03	2024020146	20244040017	$728.698.114,00	$402.863.607,00	$325.834.507,00
			$792.916.814,00	**$467.082.306,60**	**$325.834.507,40**

Registro Presupuestal	Rubro / Fuente	Nombre	VALOR
2024040017	2.3.2402115.2.3.2.02.01.003.915.1.2.1.0.00	Vía Urbana con mantenimiento periódico o rutinario TRANSPORTE infraestructura red vial regional – FUENTE:1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	$64.218.700,00
20244040017	2.3.2402115.2.3.2.02.01.003.915.1.2.4.3.03	Vía Urbana con mantenimiento periódico o rutinario TRANSPORTE infraestructura red vial regional – FUENTE:1.2.4.3.03- SGP-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN	$728.698.114.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL			**$792.916.814,00**

VALOR A CANCELAR MEDIANTE LA PRESENTE ACTA: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($467.082.306,60) M/CTE.

No siendo otro el objeto de la presente, una vez leída y aprobada en constancia se firma por quien en ellas intervinieron, en Fusagasugá, a los veinte días del mes de mayo de 2024

Firmas

APOYO SUPERVISIÓN	SUPERVISOR	CONTRATISTA
ERNESTO RUBIO TERÁN Inspector de Obras	**Ing. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Secretario de Infraestructura	**MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S** Nit. 800.219.167-5 **R.L MARÍA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** C.C 39.614.343 de Fusagasugá
Firma:	Firma:	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Ernesto Rubio Terán – Inspector de Obras
Revisó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – secretario de Infraestructura

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 1 de 2	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ACTA No.2

CIUDAD	FUSAGASUGÁ	**FECHA PRESENTE ACTA**	**08**	05	2024

	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
X	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACIÓN
	PAGO PARCIAL No. ___		OTRA CUAL? _____
	FINALIZACIÓN O TERMINACIÓN BILATERAL		

Contrato No.	2024-0196	**Fecha de Suscripción del Contrato**	01	04	2024
Objeto	"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ"				

Plazo de Ejecución	DIEZ (10) MESES, Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	**Fecha Acta de Inicio**	03	04	2024	**Fecha de Terminación**	31	12	2024

Valor del Contrato	SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($792.916.814.00), INCLUYE IMPUESTOS DE LEY
***Nombre del* Contratista**	***MAVI PAVIMENTACIONES SAS*** Nit. No 800.219.167-5 R.L **MARÍA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** C.C 39.614.343 de Fusagasugá
Supervisor	**Ing. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** **Secretario de Infraestructura**

Ingreso al almacén	No Aplica		Aplica	X	Número		Fecha ingreso				

En la ciudad de Fusagasugá, al día ocho (8) del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron el ingeniero **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** Jefe de Despacho de la Secretaría de Infraestructura, en calidad de **SUPERVISOR,** el Inspector de Obras **ERNESTO RUBIO TERÁN** en calidad de **APOYO A LA SUPERVISIÓN** de la secretaria de infraestructura, y la señora **MARÍA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO,** identificada con cedula de ciudadanía No. 39.614.343 expedida en Fusagasugá, como Representante Legal de **MAVI PAVIMENTACIONES SAS** NIT 800.219.167-5 en su calidad de **CONTRATISTA,** con el objeto de realizar el acta de **PAGO PARCIAL** del contrato de la referencia, de acuerdo a las siguientes cantidades ejecutadas:

Mediante la suscripción de la presente acta de **ENTREGA Y RECIBO** del contrato de Suministro No. 2024-0196, el contratista, el apoyo técnico y el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

CONSOLIDADO DE CANTIDADES ENTREGADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD SUMINISTRADA DEL 03 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024	CANTIDAD PENDIENTE POR SUMINISTRAR
1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 EN CALIENTE INVIAS 450-02	M3	920	540,84	379,16
2	EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	KG	7323	4530	2793

CUADRO RESUMEN DE ACTAS

ACTA	PAGO	PERIODO	VALOR ANTERIOR	VALOR SERVICIOS PRESENTE ACTA	SALDO
1		INICIO			$ 792.916.814
	ACTA No. 1	del 03 de abril al 30 de abril de 2024	0	0	$792.916.814,00

	FORMATO DE ACTAS	Espacio exclusivo para el rótulo de radicación
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5
Código: FO-GJ-011	**Elaboró:** Dirección de Contratación	
Versión: 3	**Revisó:** Oficina de Desarrollo Institucional	
Página 2 de 2	**Aprobó:** Comité técnico de calidad	

ESTADO JURÍDICO<

DESCRIPCIÓN	HUBO	NO HUBO	OBSERVACIONES
SUSPENSIONES		X	
PRORROGAS		X	
MULTAS		X	
DECLARACIONES DE INCUMPLIMIENTO		X	
ADICIONES		X	
CADUCIDAD		X	

CONSTANCIAS

- Que revisadas las cantidades entregas según los cuadros anteriores, se recibe a satisfacción y se procede al trámite para pago parcial del contrato de la referencia.
- Que el contrato de suministro No. 2024-0196 no ha presentado ningún inconveniente en su desarrollo.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

Firmas		
APOYO SUPERVISIÓN	SUPERVISOR	**CONTRATISTA**
ERNESTO RUBIO TERÁN – Inspector de Obras	Ing. **RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ** – secretario de Infraestructura	**R.L MARÍA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO** MAVI PAVIMENTACIONES SAS
Firma:	Firma:	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL:
Original: Dirección de Contratación
Nombre del archivo sistematizado:
Proyectó: Ernesto Rubio Terán
Revisó: Ing. Raúl Aranguren Martínez – secretario de Infraestructura

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	**Código: FO-GJ-012**
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	**Versión: 1**
		Página: 1 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

SUPERVISIÓN	**FUSAGASUGA**	**FECHA INFORME**	**08**	**05**	**2024**	**INFORME**			**No 01**
CONTRATO	**SUMINISTRO Nº 2024-0196**	**FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO**				**01**	**04**	**2024**	
OBJETO DEL CONTRATO	*"SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ".*								
PLAZO DE EJECUCIÓN	*Diez (10) MESES, y/o hasta el 31 de diciembre de 2024*	**FECHA INICIO**	**03**	**04**	**2024**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**31**	**12**	**2024**
VALOR DEL CONTRATO	***SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($792.916.814,00.) INCLUYE IMPUESTOS DE LEY***								
ADICIÓN									
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	***SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOV ECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($792.916.814,00), INCLUYE IMPUESTOS DE LEY***								
NOMBRE CONTRATISTA	*MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S* *Nit. 800.219.167-5* ***R.L MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO*** *C.C 39.614.343 de Fusagasugá*								
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/ SUP	***Ing. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ*** ***Secretario de Infraestructura***								

El Supervisor ***ing. RAÚL ARANGUREN MARTÍNEZ*** *jefe de Despacho secretario de Infraestructura, el señor* ***ERNESTO RUBIO TERÁN*** *como apoyo a la supervisión de los viajes de Mezcla Asfáltica y Emulsión Asfáltica descritos en el contrato, certifica e informa:*

Que la señora ***MARÍA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO,*** *identificada con cedula de ciudadanía No. 39.614.343 de Fusagasugá a suministrado el material contratado para los diferentes sectores urbanos del municipio de Fusagasugá, durante el periodo comprendido entre el 3 de abril de 2024 y el 30 de abril de 2024*

CANTIDAD CONTRATADA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Valor Promedio Unitario Sin iva	IVA 19%	Valor Unitario Con iva	Valor Total
1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 EN CALIENTE INVIAS 450-02	M3	920	$696,000.00	$132,240.00	$828.240,00	$761.980.800,00
3	EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	KG	7323	$3,550.00	$674,50	$4.224,50	$30.936.014,00
	TOTAL						**$792.916.814,00**

CANTIDADES SUMINISTRADAS ENTRE EL 03 DE ABRIL Y EL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	Valor Promedio Unitario Sin IVA	IVA 19%	Valor Unitario Con iva	Valor Total
1	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 EN CALIENTE INVIAS 450-02	M3	540,84	$376.424.640,00	$71.520.682,00	$447.945.322,00	$447.945.321,60
3	EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	KG	4.530	$16.081.500,00	$3.055.485,00	$19.136.985,00	$19.136.985,00
	TOTAL						**$467.082.306,60**

CONSOLIDADO GENERAL DE SUMINISTRO

24-04-2024	119991	THV078	Mezcla Asfaltica MDC 19 en caliente	M3	14,6
25-04-2024	120015	SQZ298	Mezcla Asfaltica MDC 19 en caliente	M3	14,36
25-04-2024	120019	THV078	Mezcla Asfaltica MDC 19 en caliente	M3	14,18
25-04-2024	120171	TEW157	Mezcla Asfaltica MDC 19 en caliente	M3	7,2
26-04-2024	120050	THV078	Mezcla Asfaltica MDC 19 en caliente	M3	14,31
26-04-2024	120052	SQZ298	Mezcla Asfaltica MDC 19 en caliente	M3	14,85
26-04-2024	120180	SQZ316	Mezcla Asfaltica MDC 19 en caliente	M3	6,02
29-04-2024	120113	THV078	Mezcla Asfaltica MDC 19 en caliente	M3	14,48
29-04-2024	120116	SQZ298	Mezcla Asfaltica MDC 19 en caliente	M3	14,78
29-04-2024	120183	SQZ316	Mezcla Asfaltica MDC 19 en caliente	M3	6,08
30-04-2024	120146	THV078	Mezcla Asfaltica MDC 19 en caliente	M3	14,99
30-04-2024	120147	SQZ298	Mezcla Asfaltica MDC 19 en caliente	M3	14,98
30-04-2024	120191	ESS663	Mezcla Asfaltica MDC 19 en caliente	M3	8,63
TOTAL ENTREGADO					**540,84**

MATERIAL ENTREGADO ENTRE EL 3 DE ABRIL Y EL 30 DE ABRIL DE 2024 EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1

Fecha	No. Remisión	Placa	Descripción	Und.	Cant. Entregada
04-04-2024	119406	GDB224	Suministro de emulsión Asfáltica CRR-1	kg	1000
10-04-2024	119443	GDB224	Suministro de emulsión Asfáltica CRR-1	kg	1000
17-04-2024	119707	GDB224	Suministro de emulsión Asfáltica CRR-1	kg	1000
24-04-2024	119950	GDB224	Suministro de emulsión Asfáltica CRR-1	kg	600
30-04-2024	120189	GDB224	Suministro de emulsión Asfáltica CRR-1	kg	930
TOTAL ENTREGADO					**4.530**

ESTADO FINANCIERO

No. DE ACTA	*PERIODO*	*VALOR PAGO ANTERIOR*	*VALOR PRESENTE ACTA*	*SALDO*
1 de Inicio		*0*	*$792.916.814,00*	*$792.916.814,00*
2 pago parcial No 1	*Del 3 de abril al 30 de abril de 2024*	*0*	*$467.082.306,60*	*$325.834.507.40*


AFECTACION PRESUPUESTAL


RUBRO / FUENTE	No. Disponibilidad	REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	VALOR A PAGAR	SALDO
2.3.2402115.2.3.2.02.01.003.915.1.2.1.0.00	2024020146	20244040017	$64.218.700,00	$64.218.700,00	$0.00
2.3.2402115.2.3.2.02.01.003.915.1.2.4.3.03	2024020146	2024040017	$728.698.114.00	$402.863.607,00	$325.834.507,.00
			$792.916.814,00	$467.082.306,60	$325.834.507,.40

ARCHIVO FOTOGRAFICO:

VIAS URBANAS INTERVENIDAS
CON EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2024-0196 SE INTERVINIERON LOS SIGUIENTES SECTORES:
03 al 8 de abril 2024. Avenida las palmas

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FO-GJ-012
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		Página: 4 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

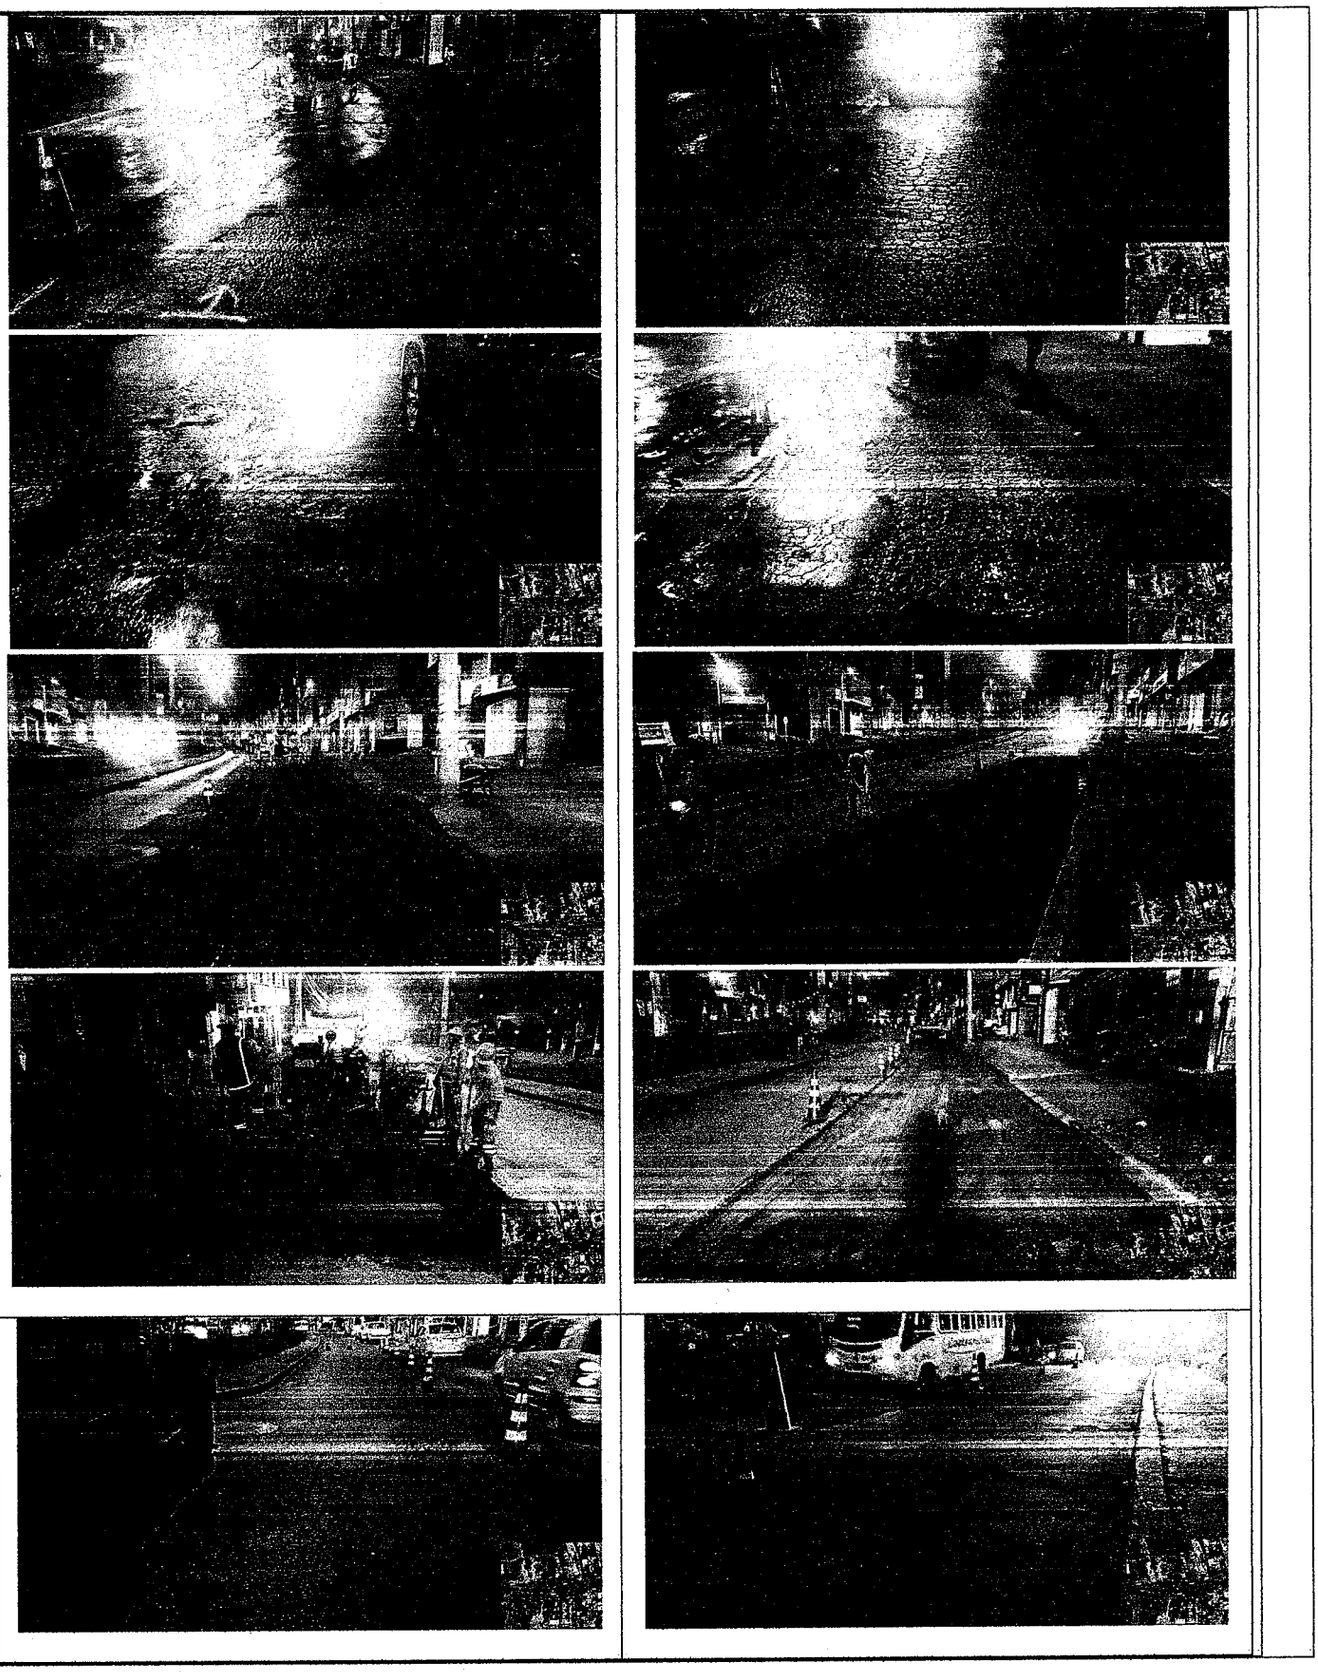


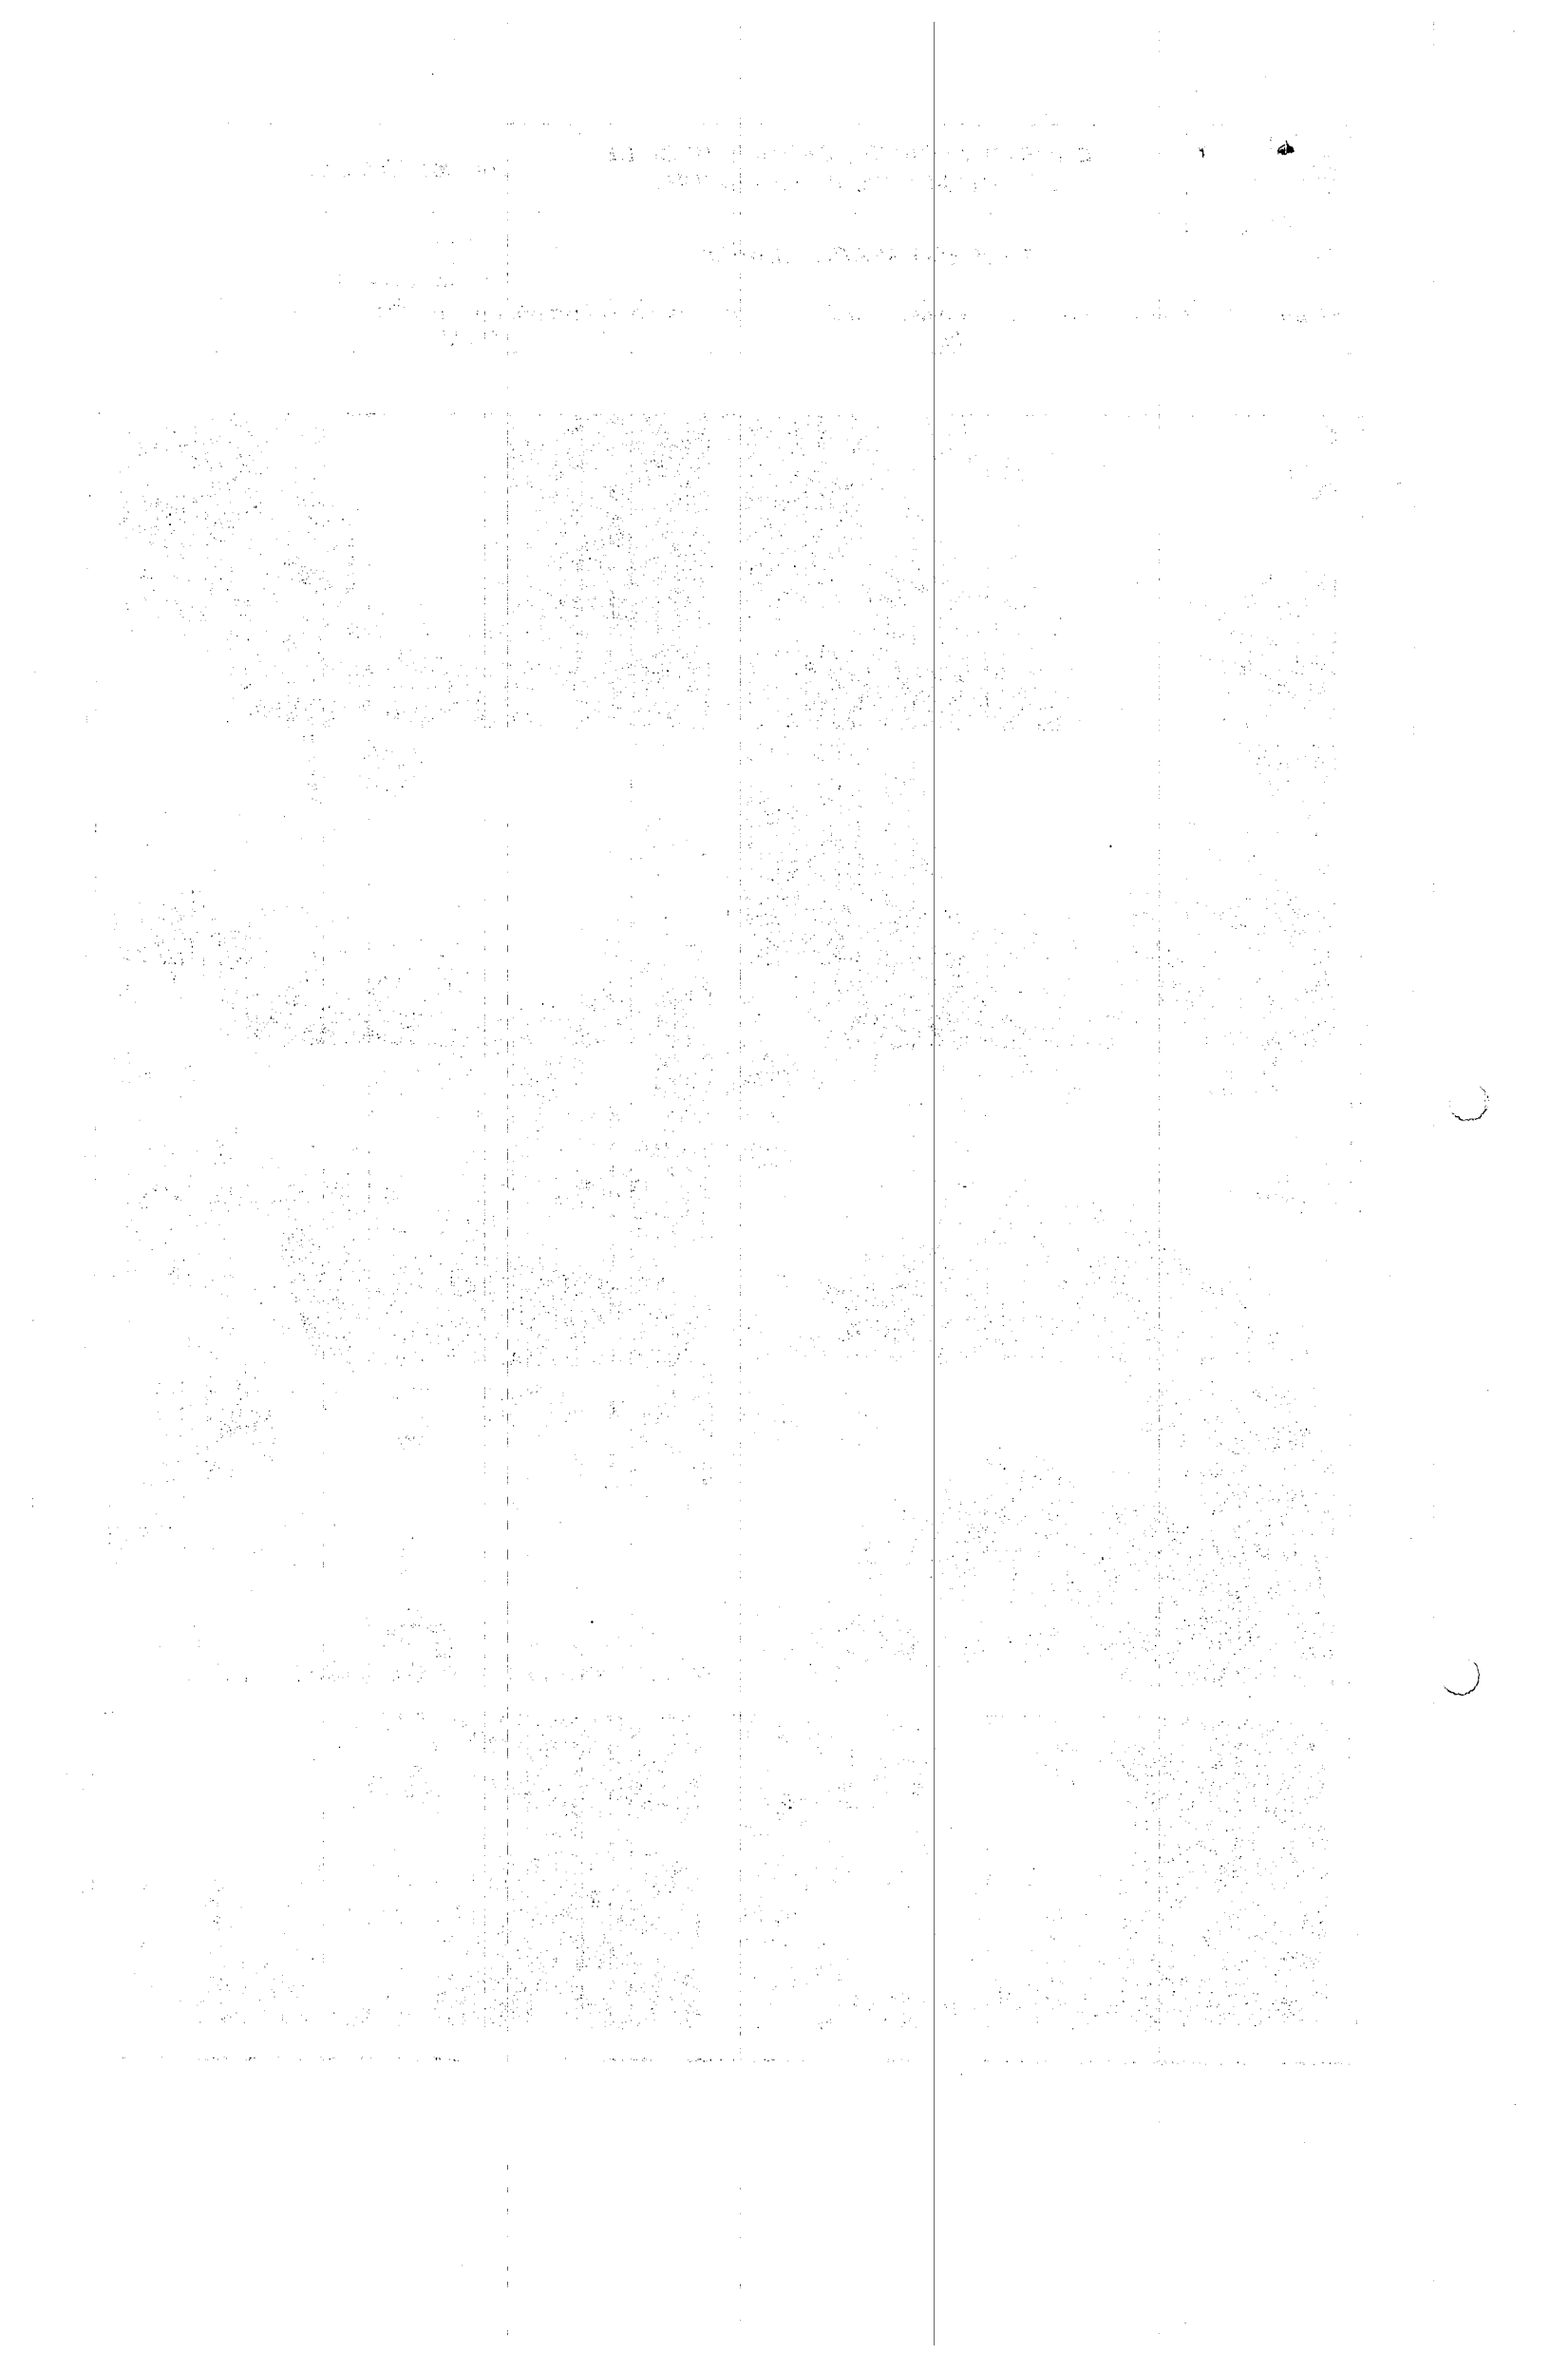











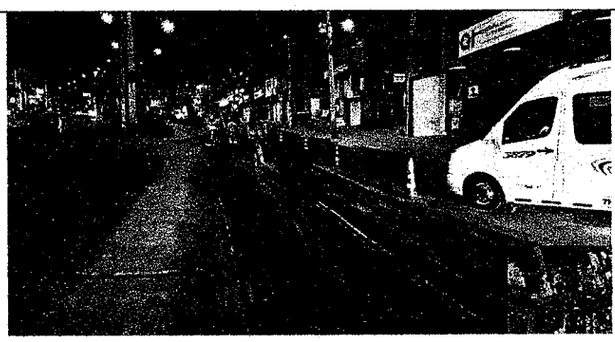


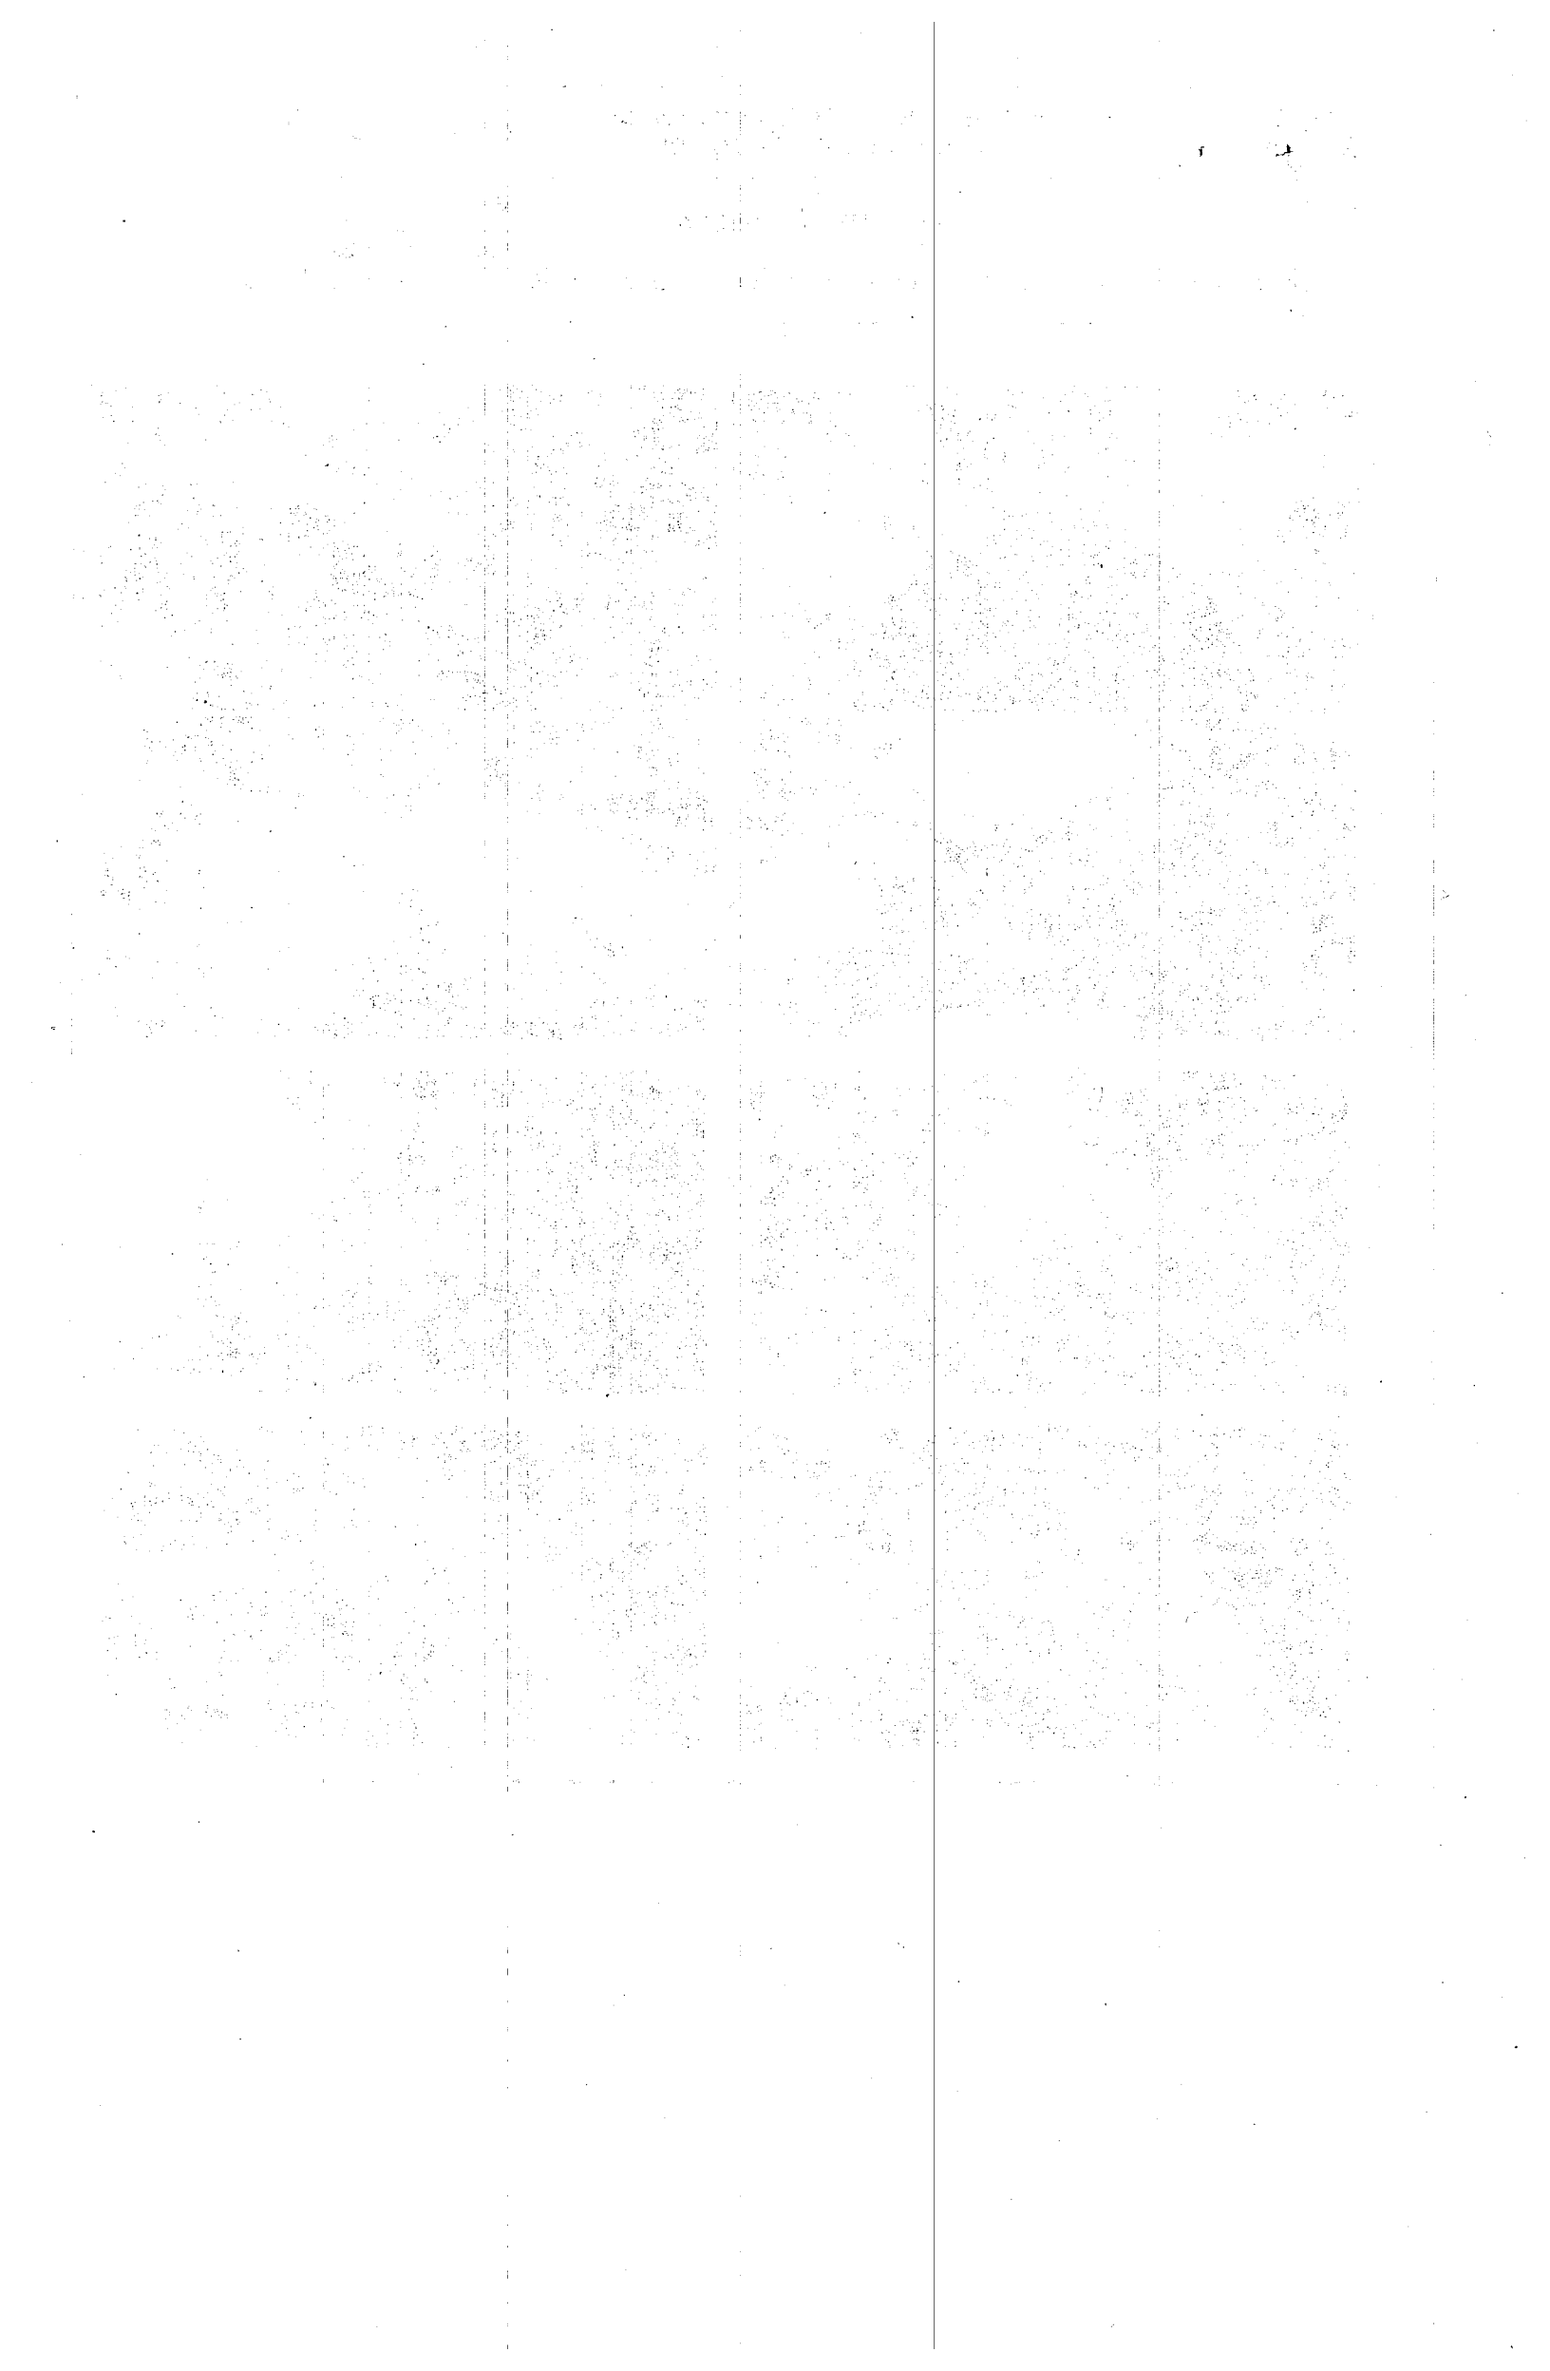
	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	**Código: FO-GJ-012**
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	**Versión: 1**
		Página: 6 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde



	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	**Código: FO-GJ-012**
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	**Versión: 1**
		Página: 7 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

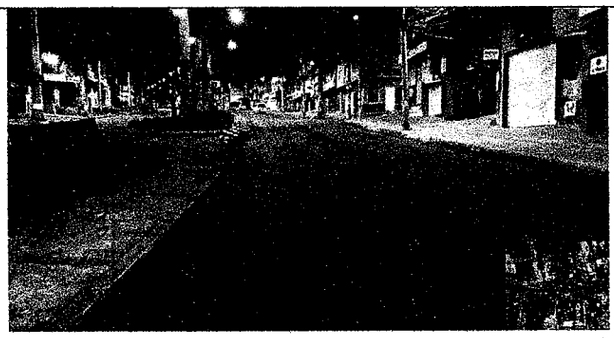

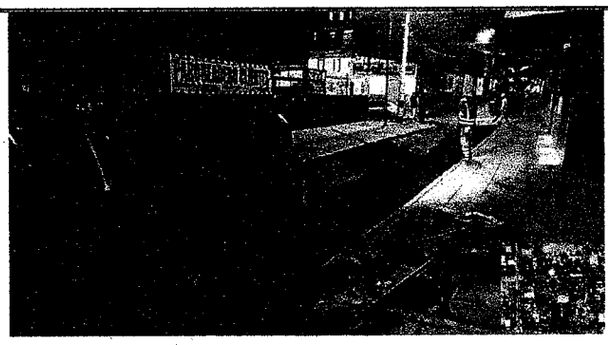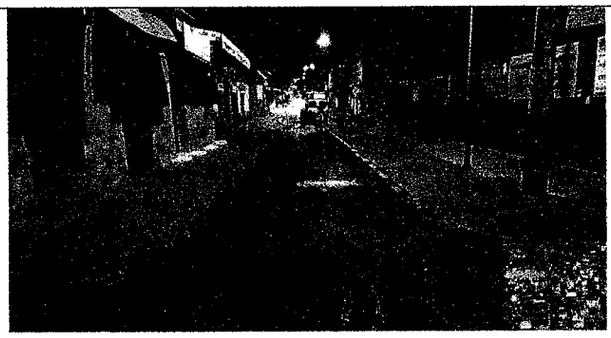


	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FO-GJ-012
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		Página: 8 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde



















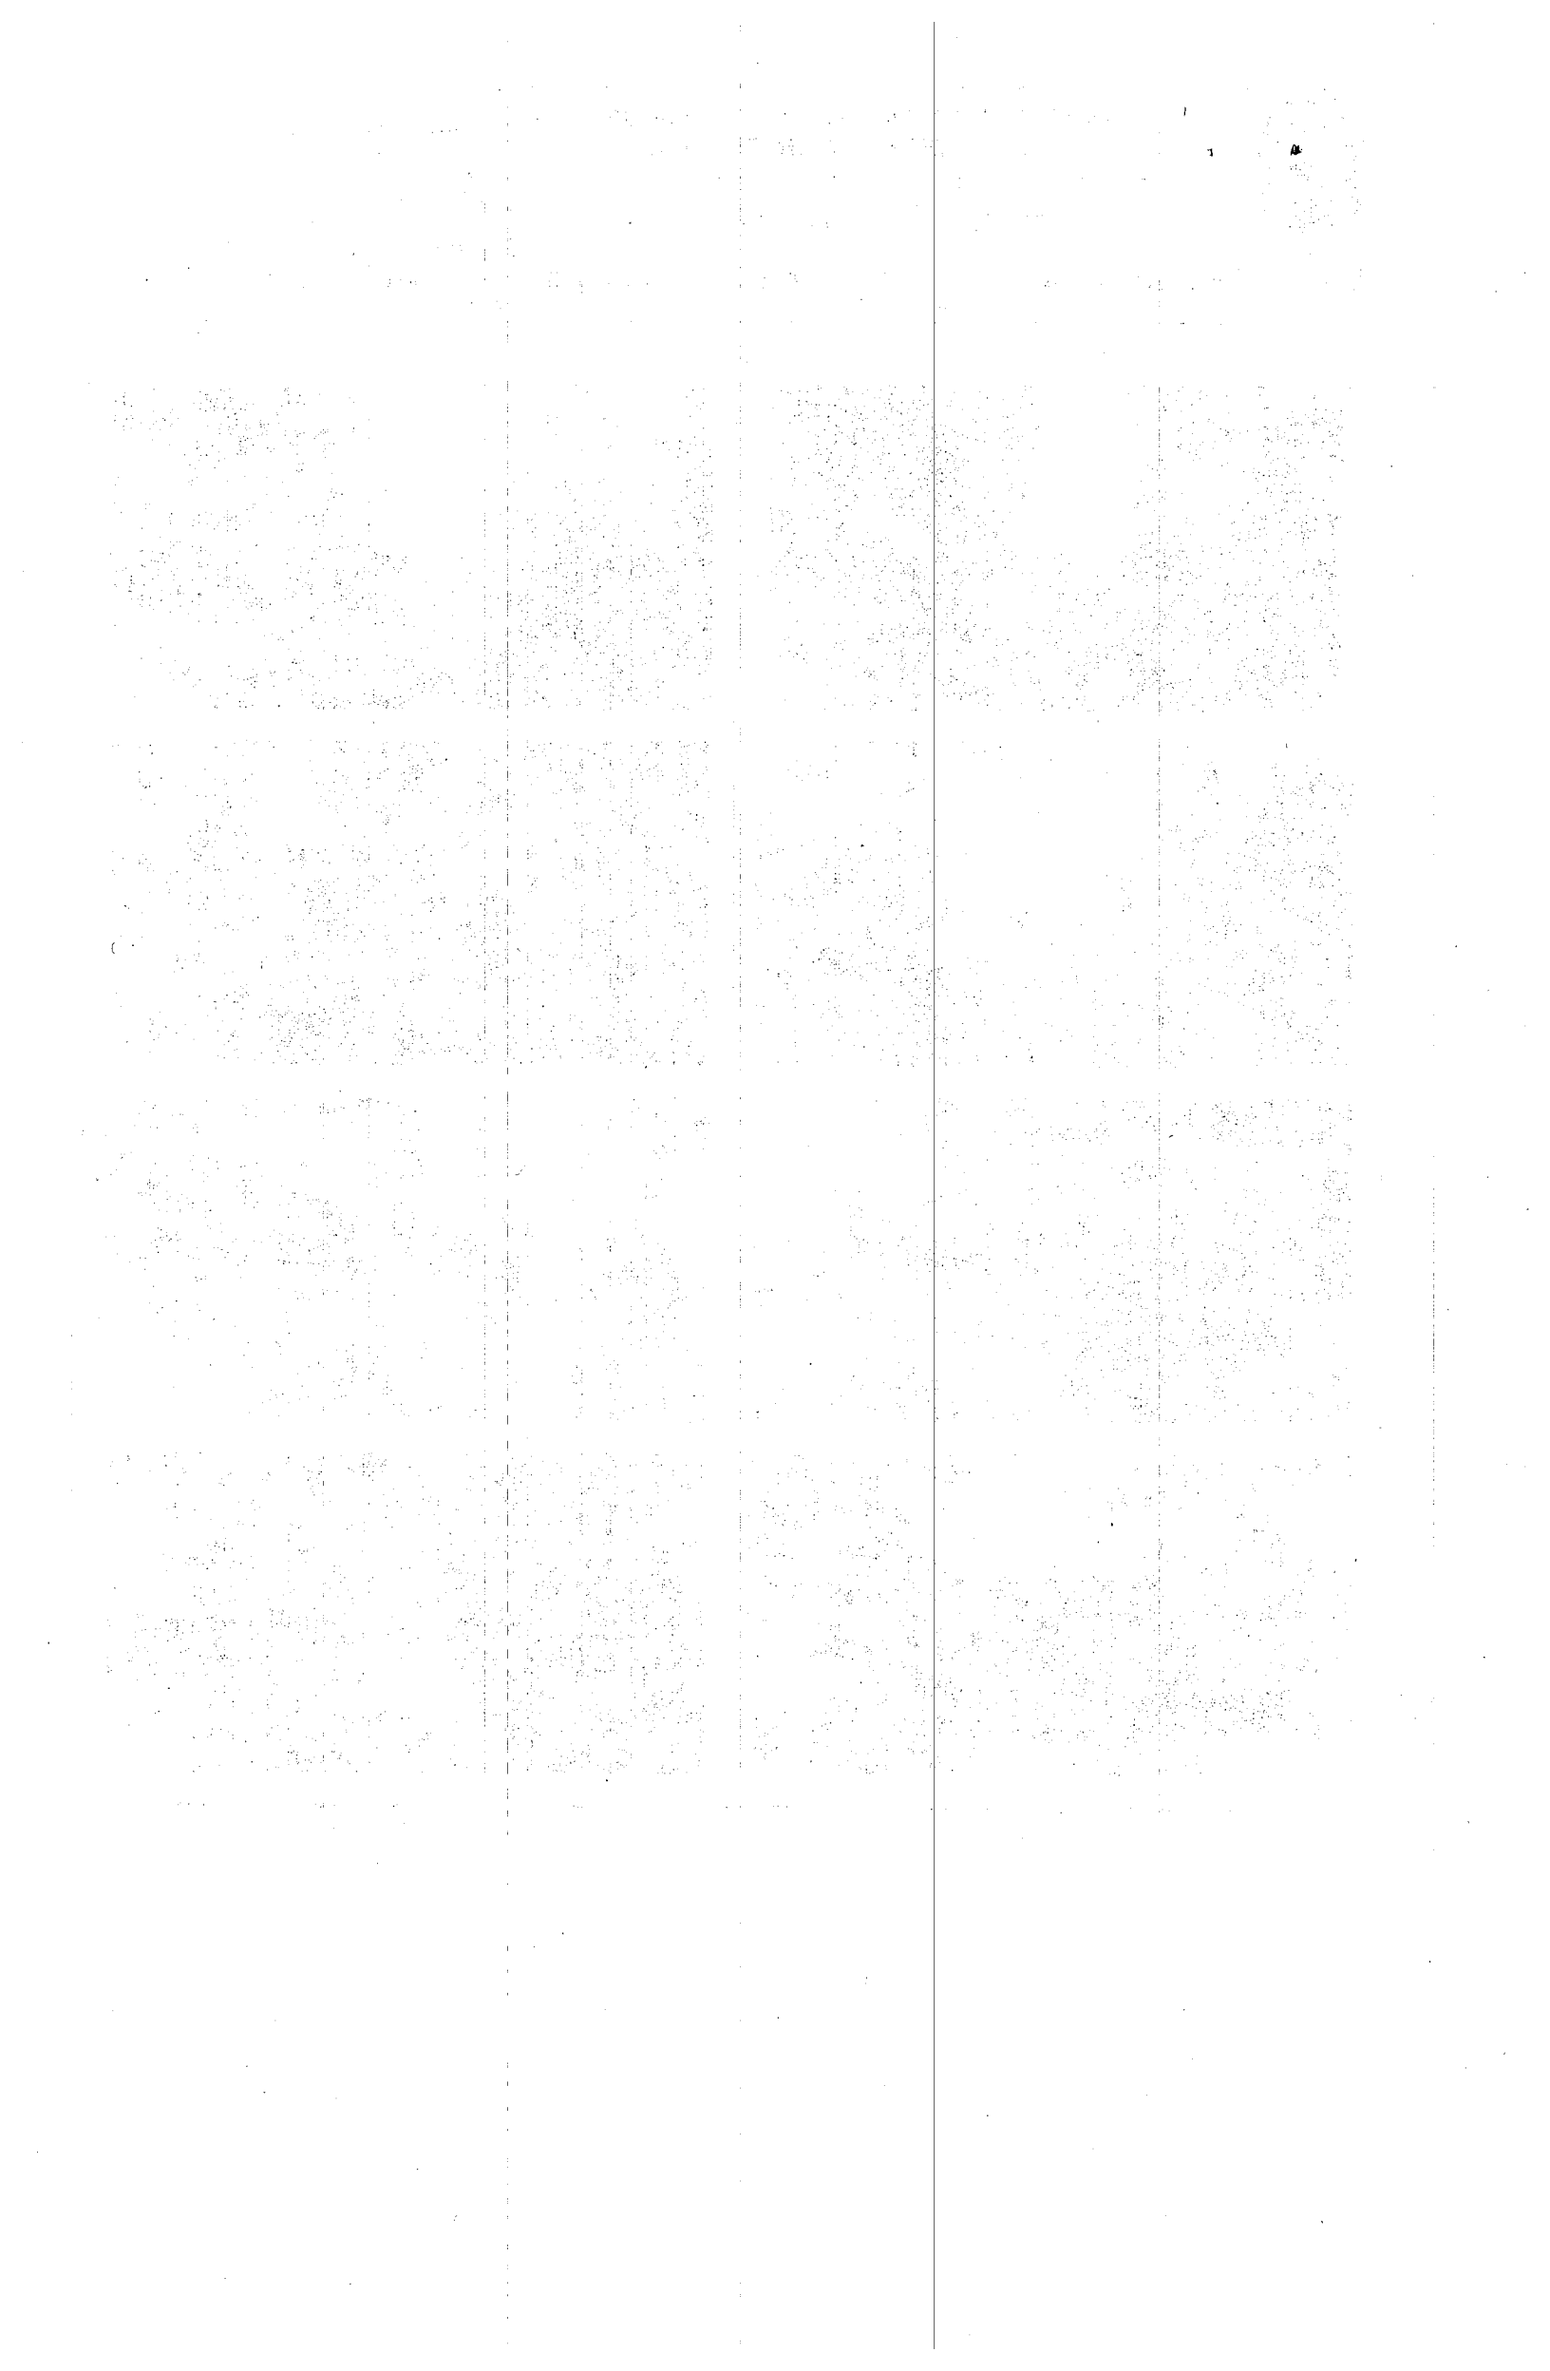


	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FO-GJ-012
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		Página: 9 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde



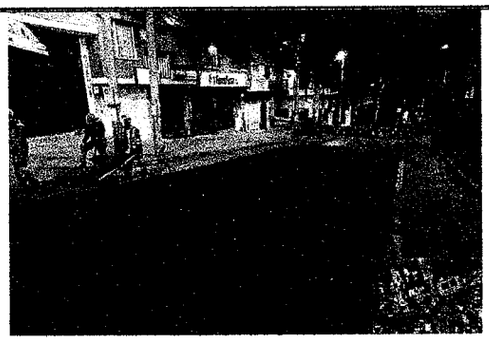






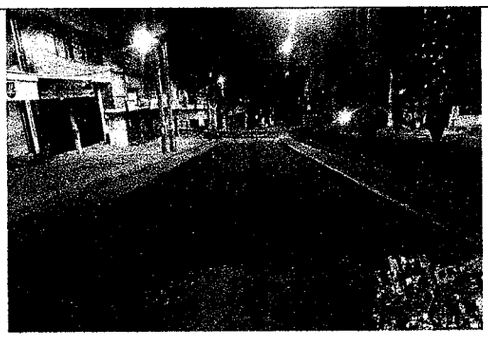








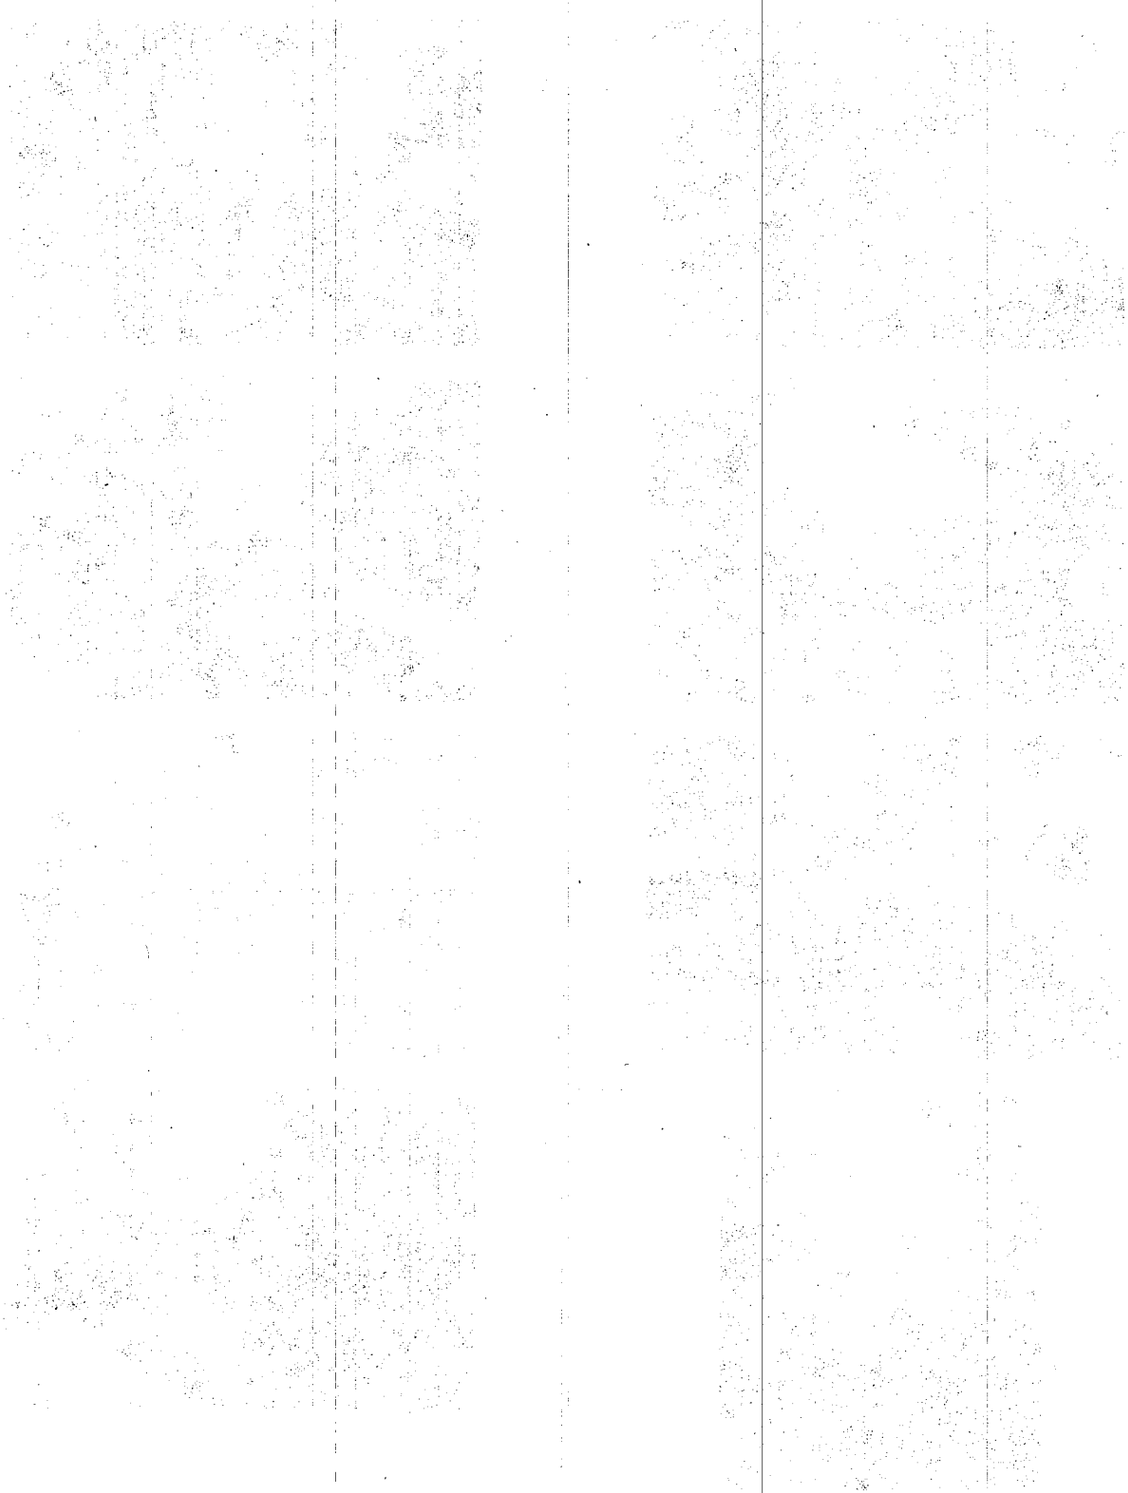


	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	**Código: FO-GJ-012**
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	**Versión: 1**
		Página: 10 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde











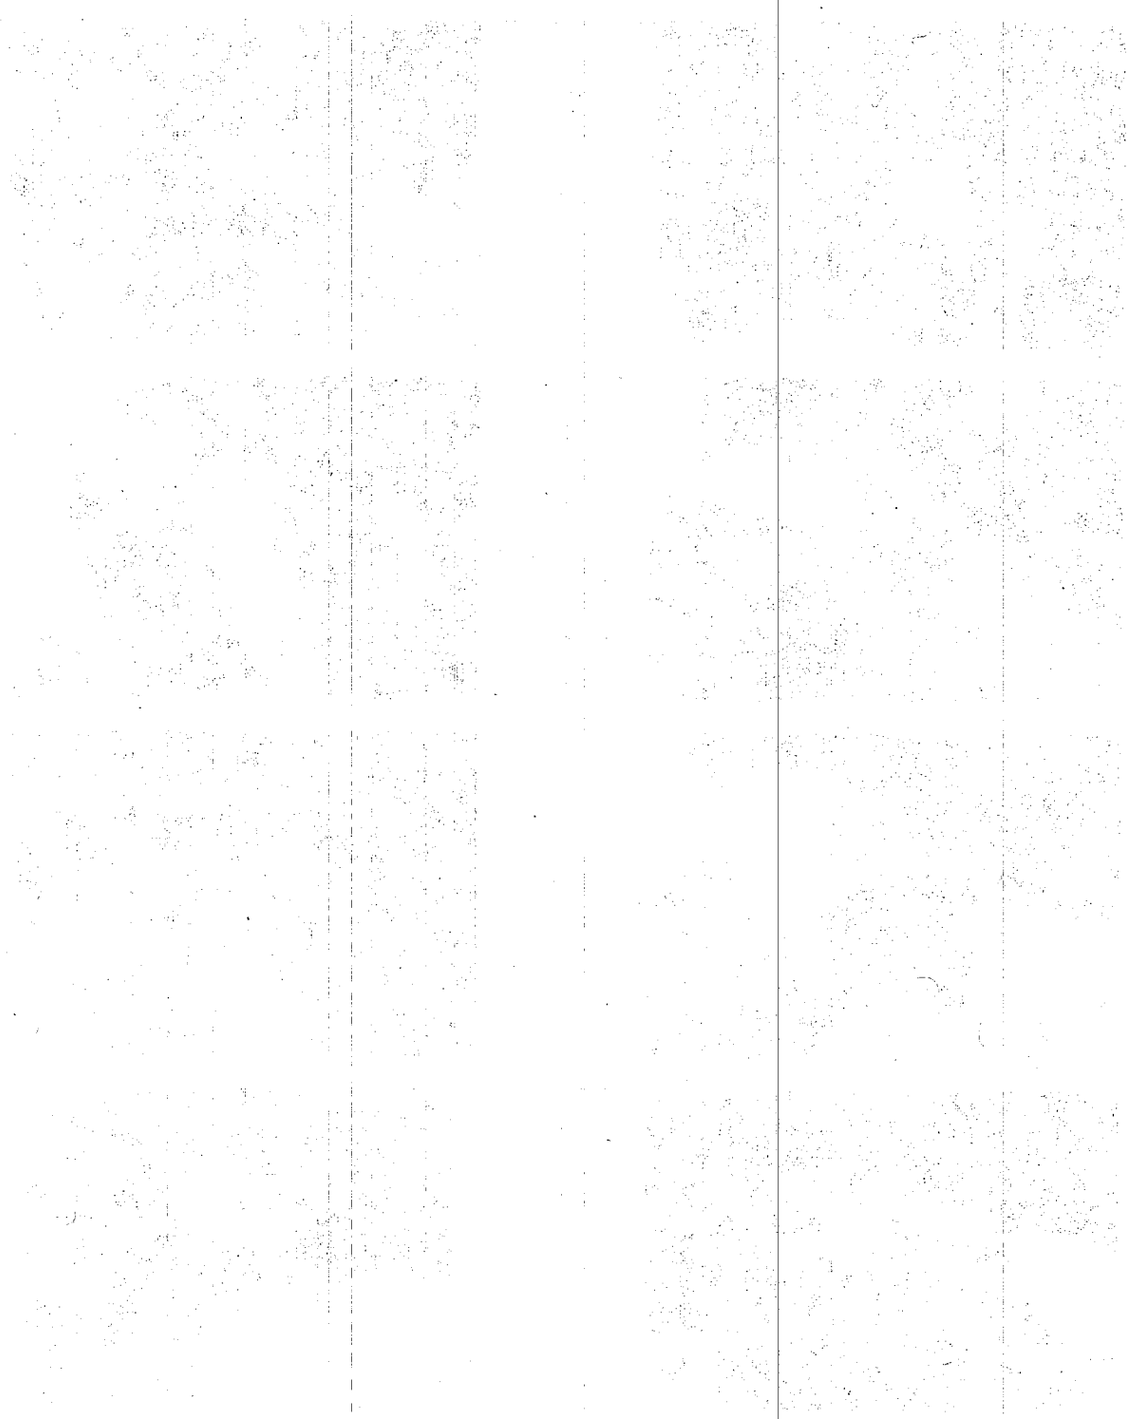


	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	**Código: FO-GJ-012**
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	**Versión: 1**
		Página: 11 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde


	
	
	
	
AVENIDA LAS PALMAS EGUNDA INTERVENCION DEL 24 DE ABRIL AL 25 DE ABRIL.	

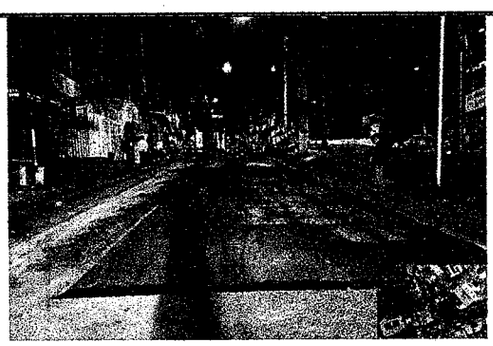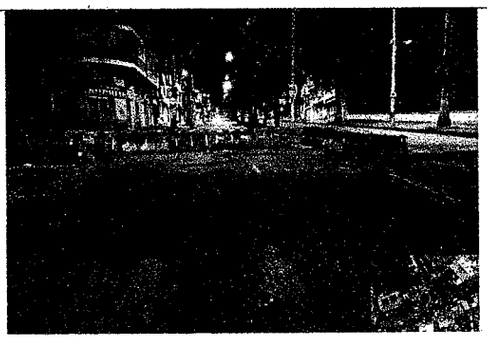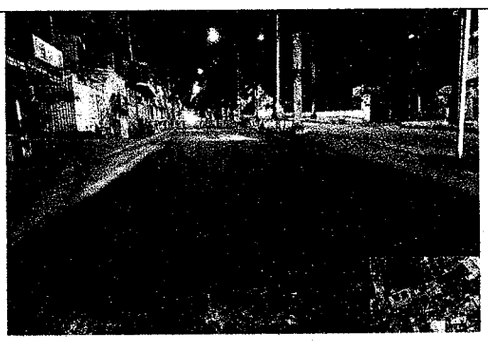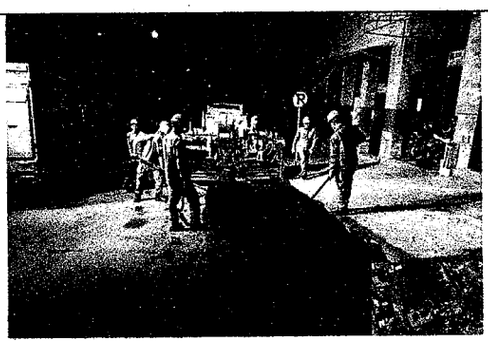


	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	**Código: FO-GJ-012**
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	**Versión: 1**
		Página: 12 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde



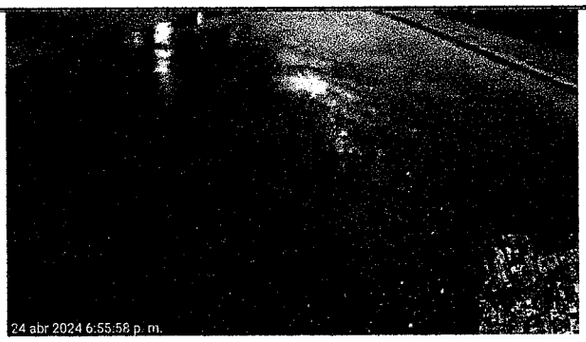

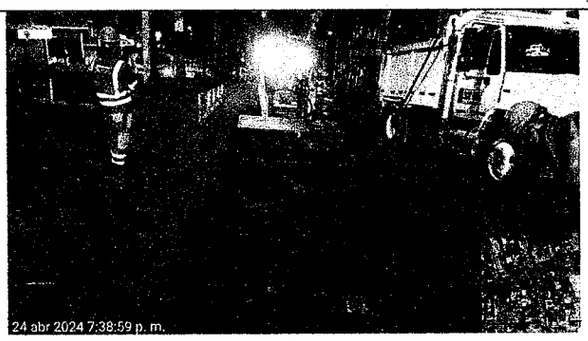




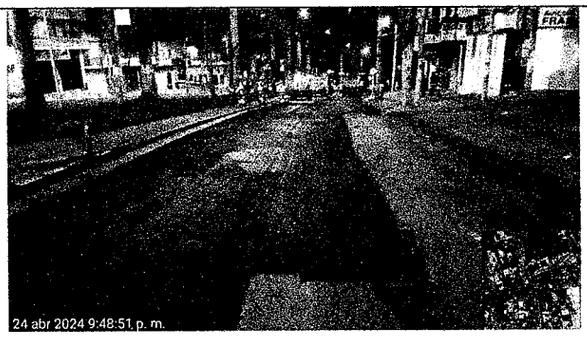








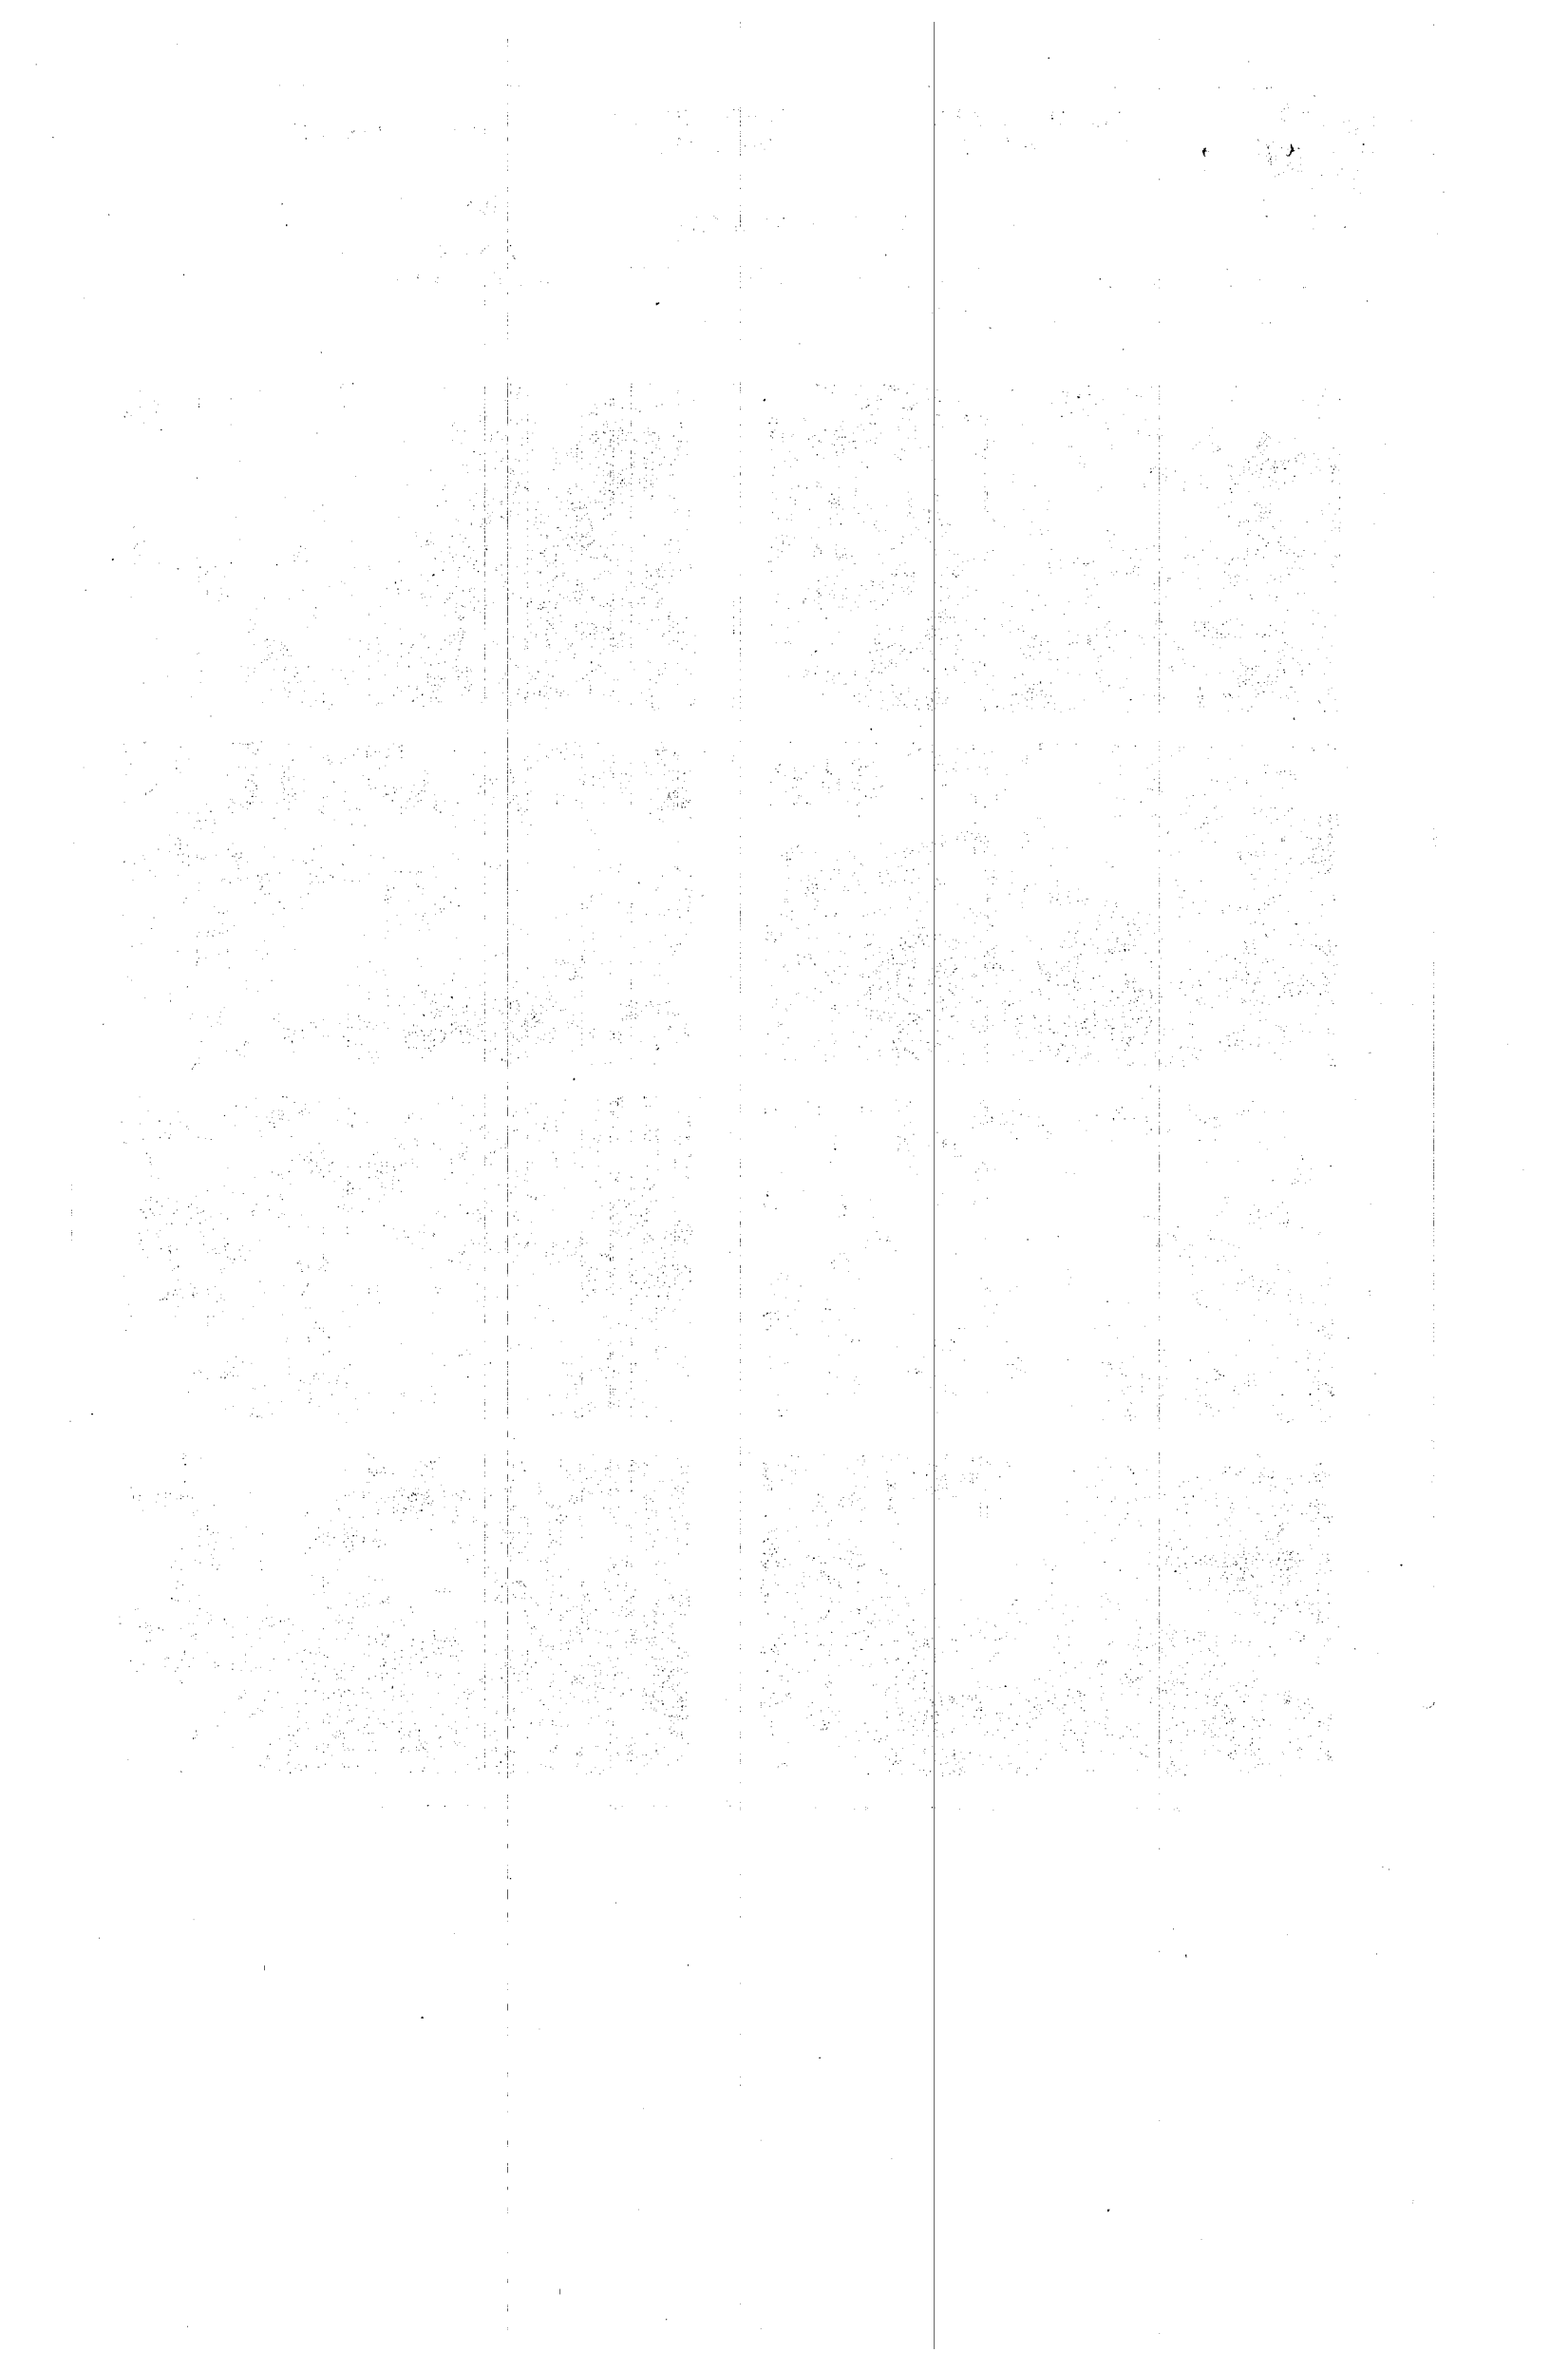

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	***Código: FO-GJ-012***
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	***Versión: 1***
		Página: 13 de 23
Elaboró: *ProfesionalUniversitario*	***Revisó:*** *Jefe Oficina Asesora Jurídica*	***Aprobó:*** *Comité MECI – CALIDAD Alcalde*















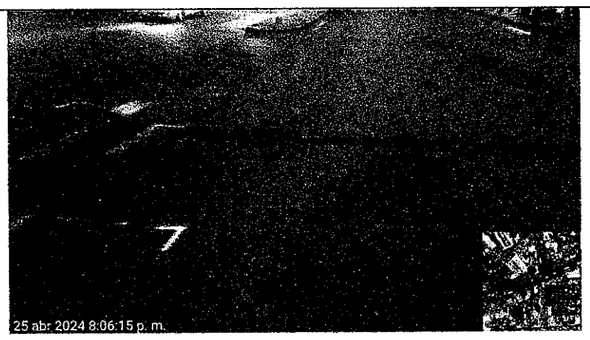



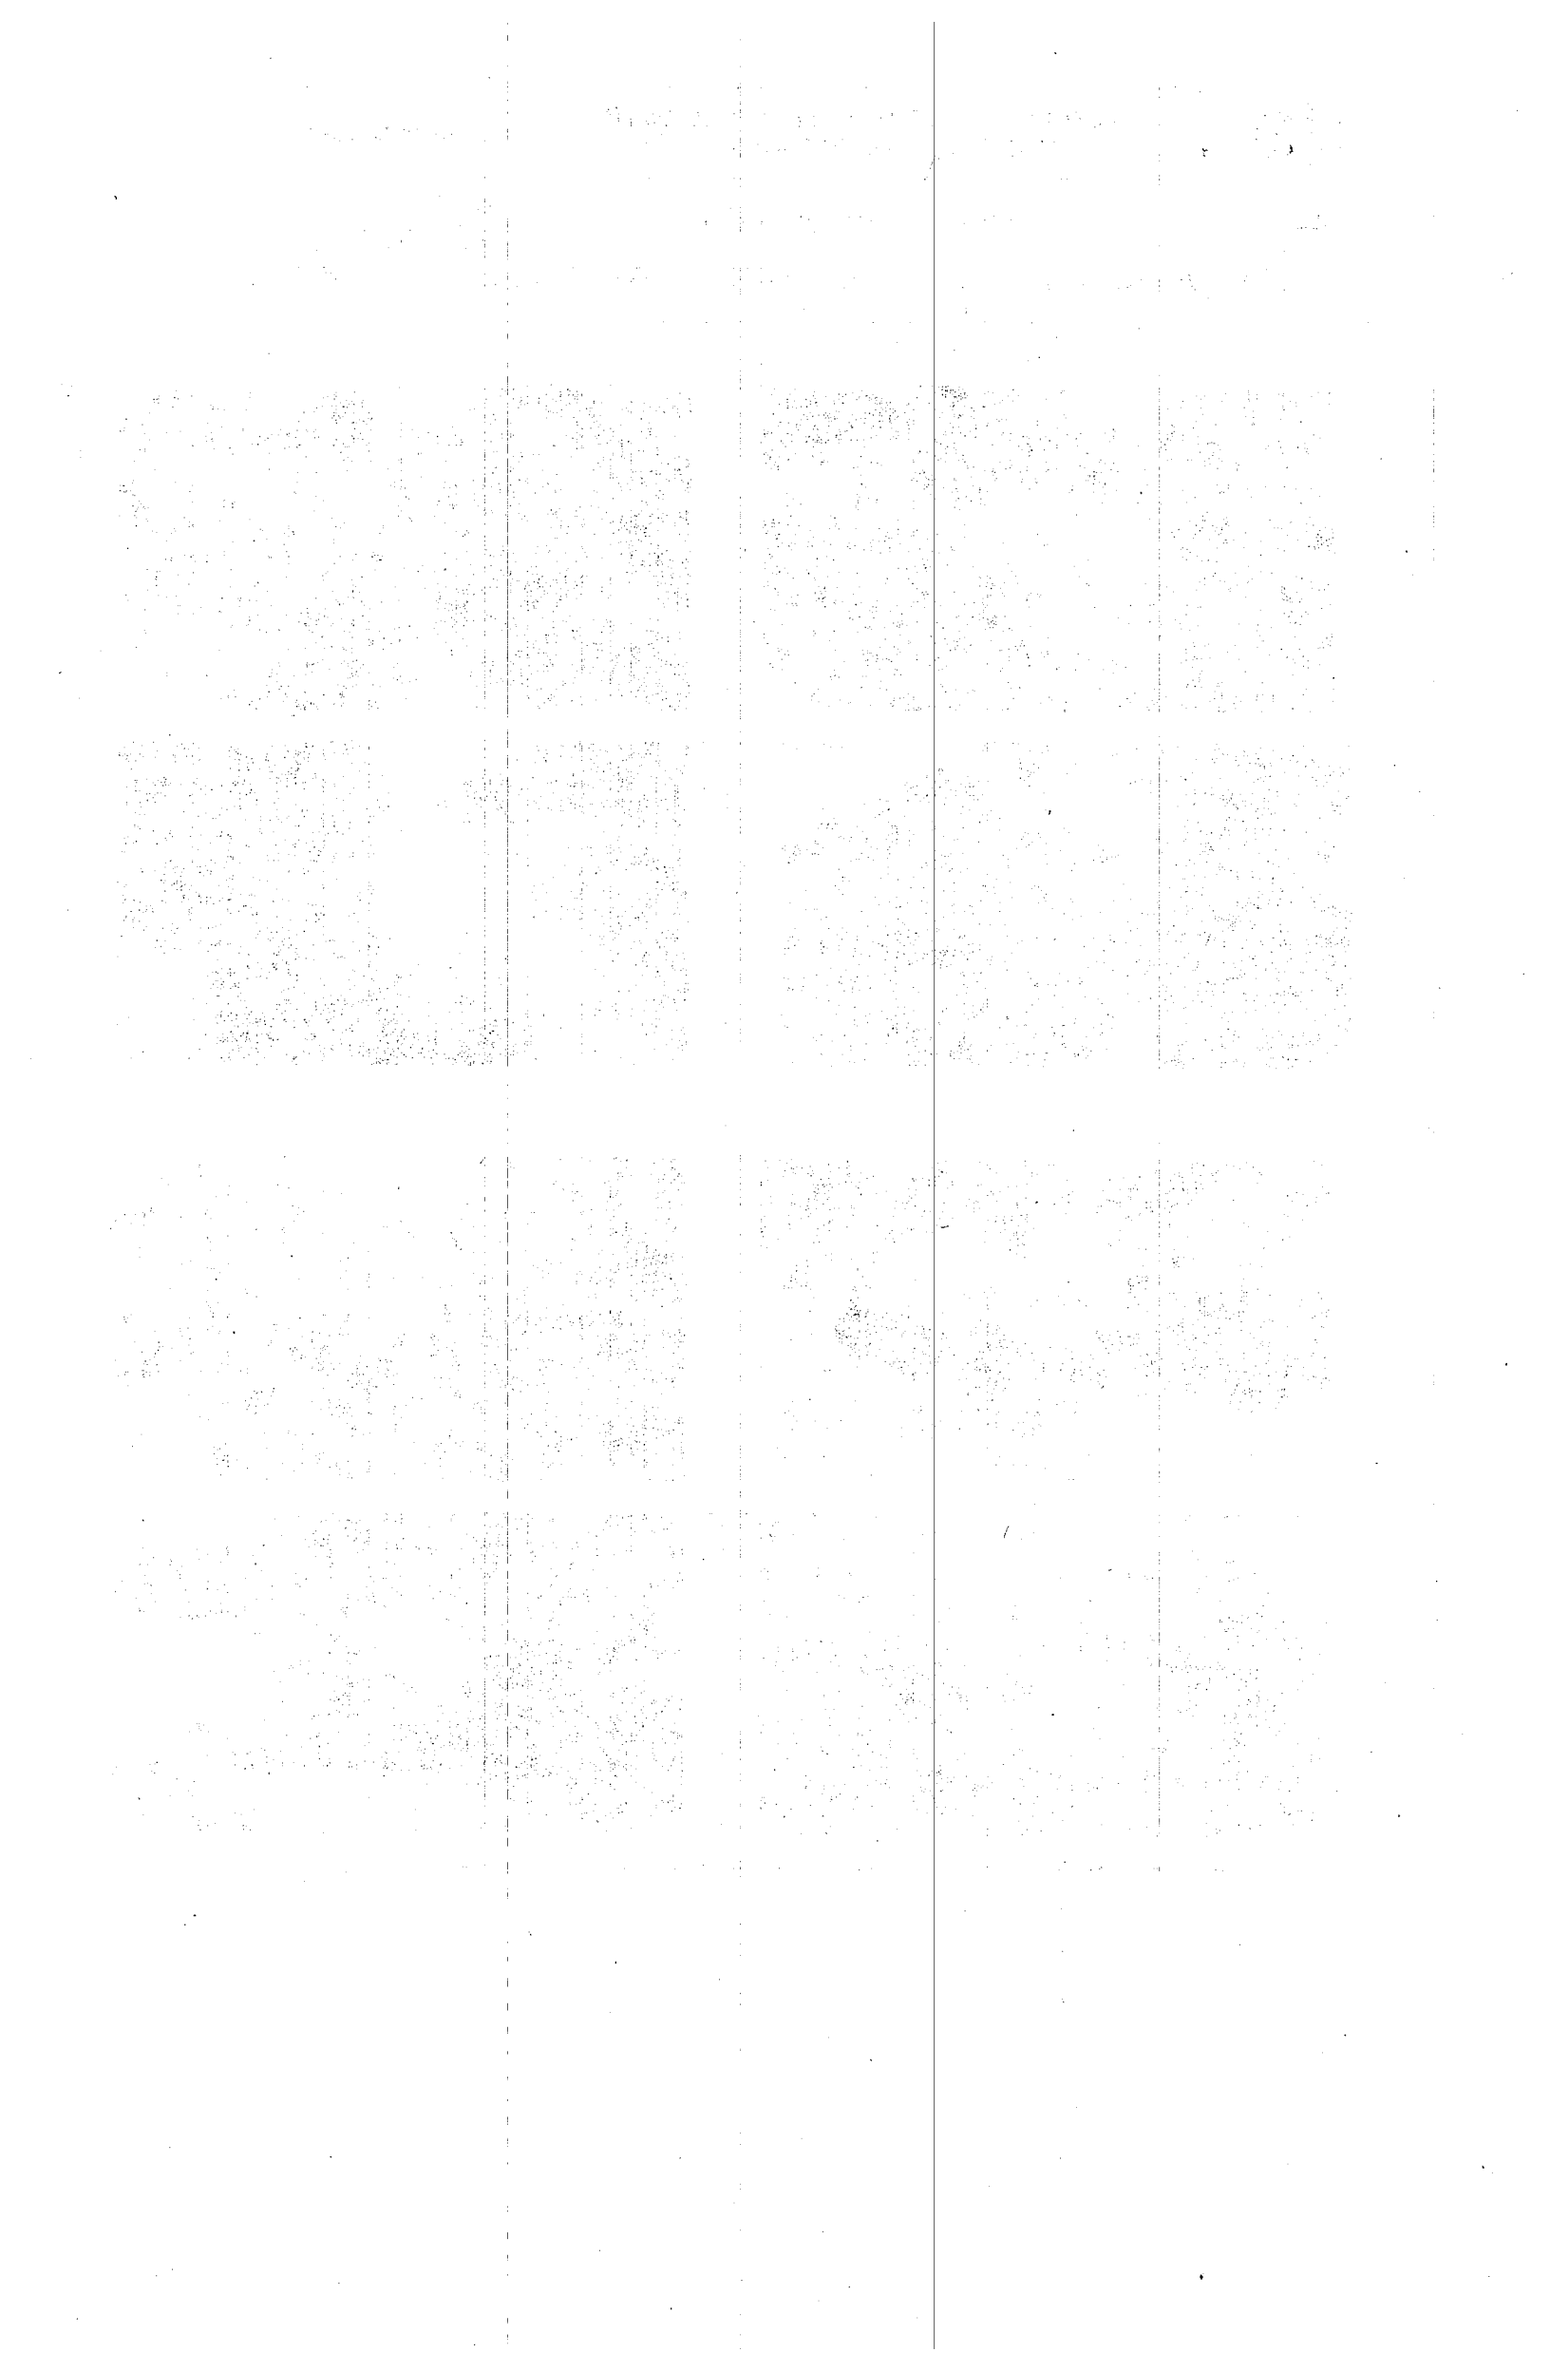

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FO-GJ-012
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		Página: 14 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde


















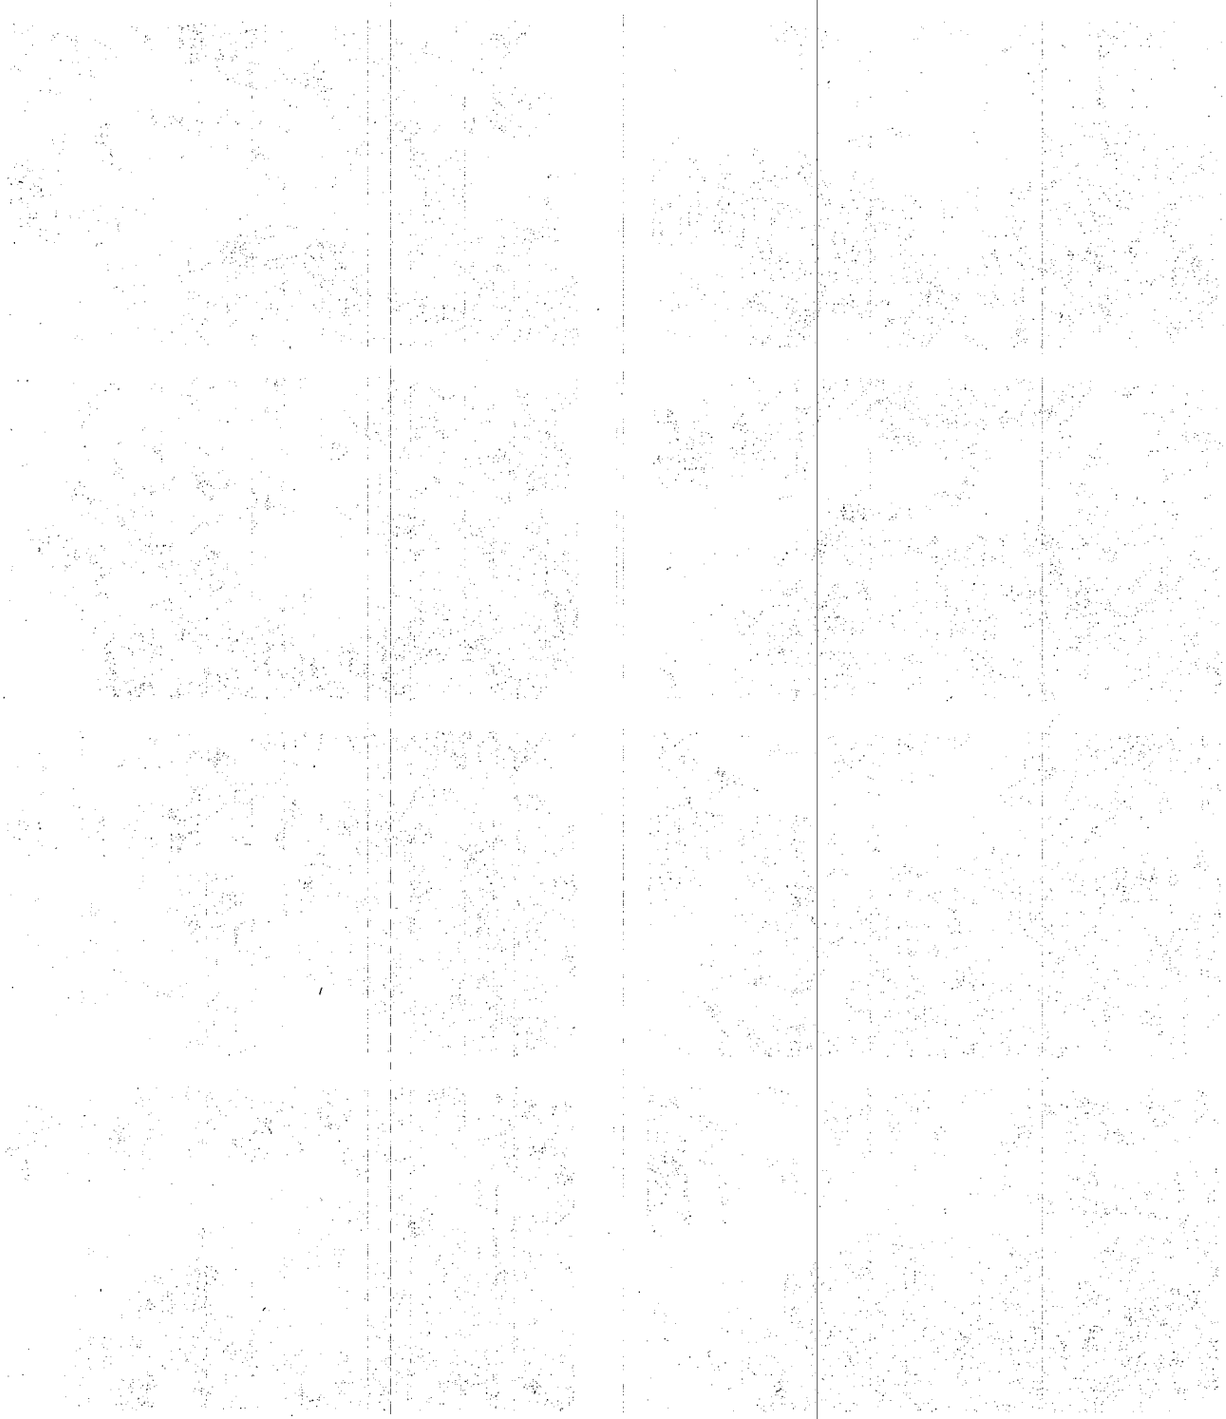







CARRERA SEXTA FRENTE AL ESTADIO







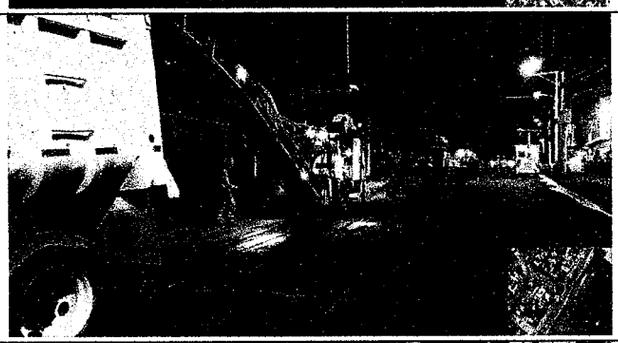




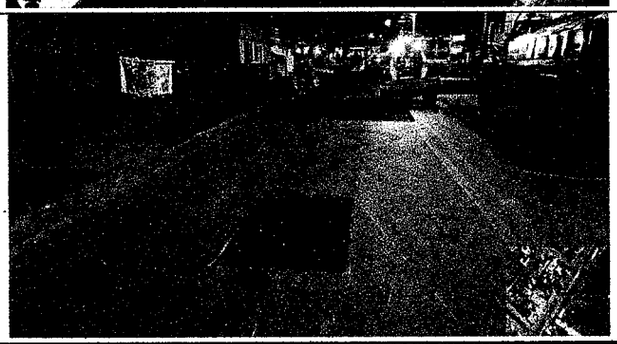

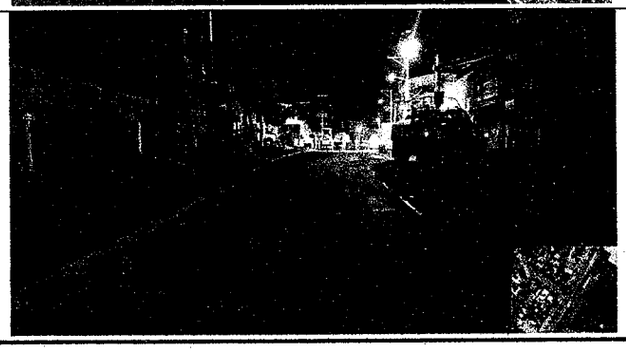

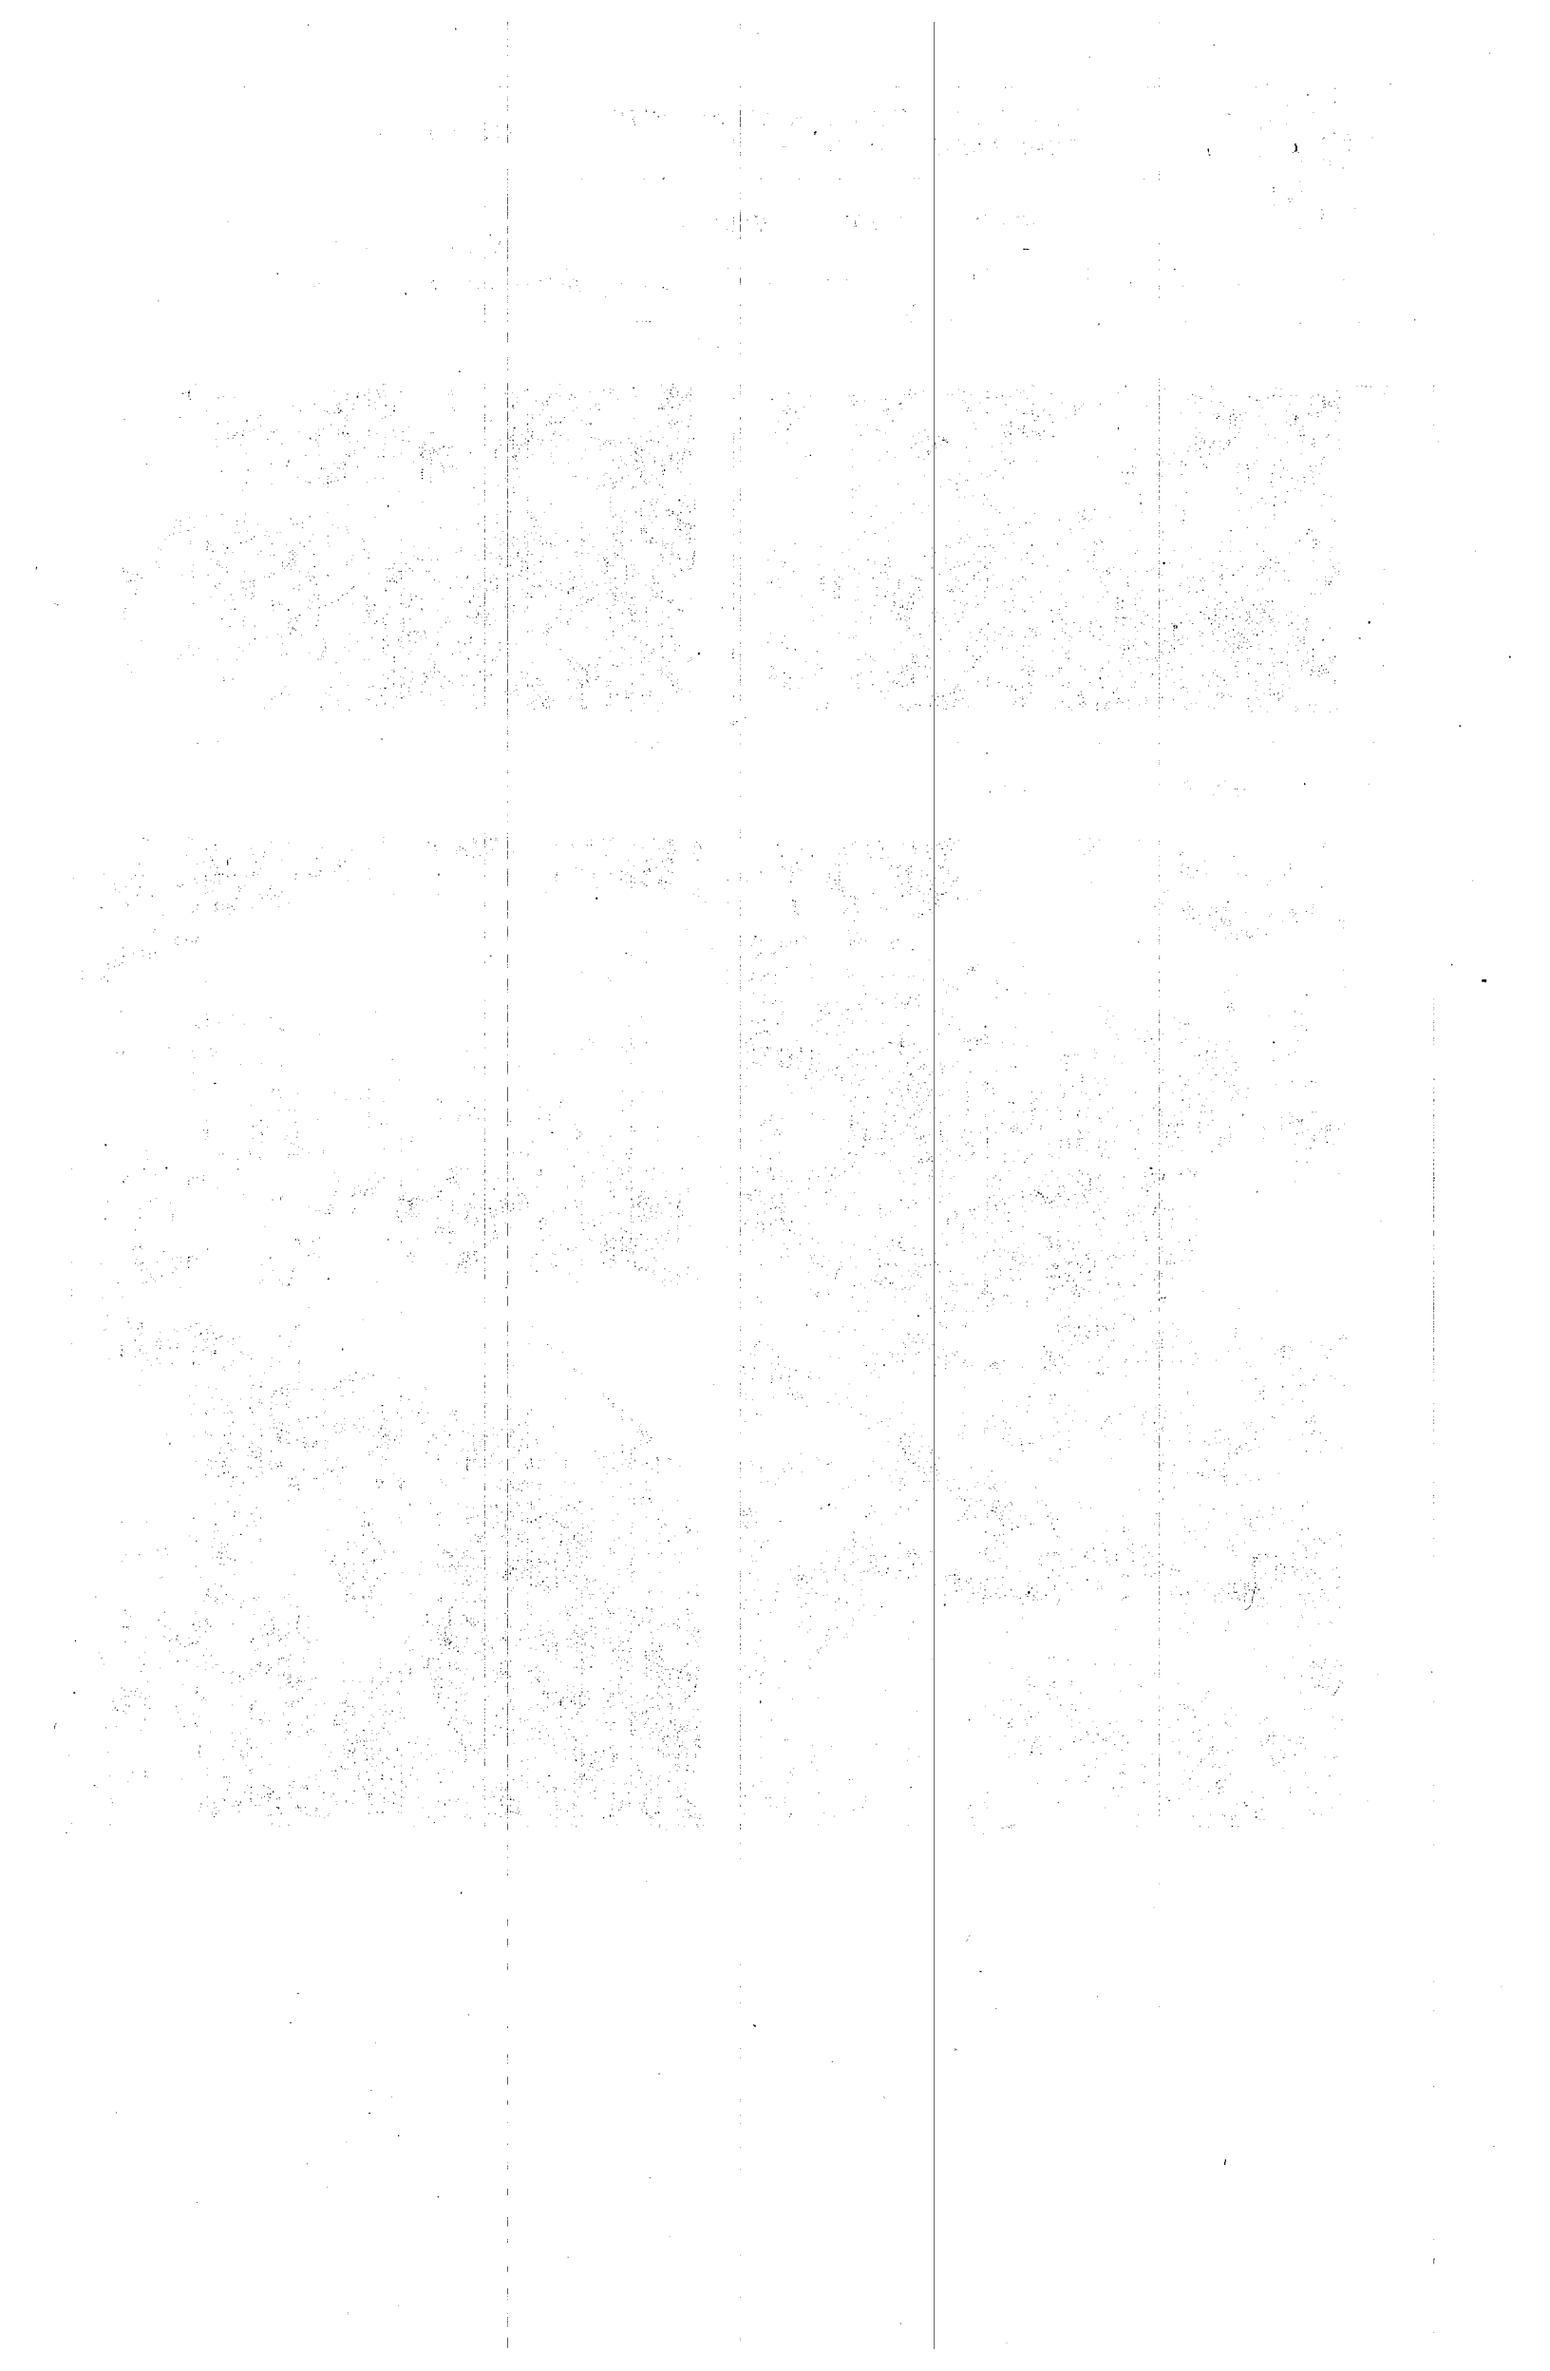




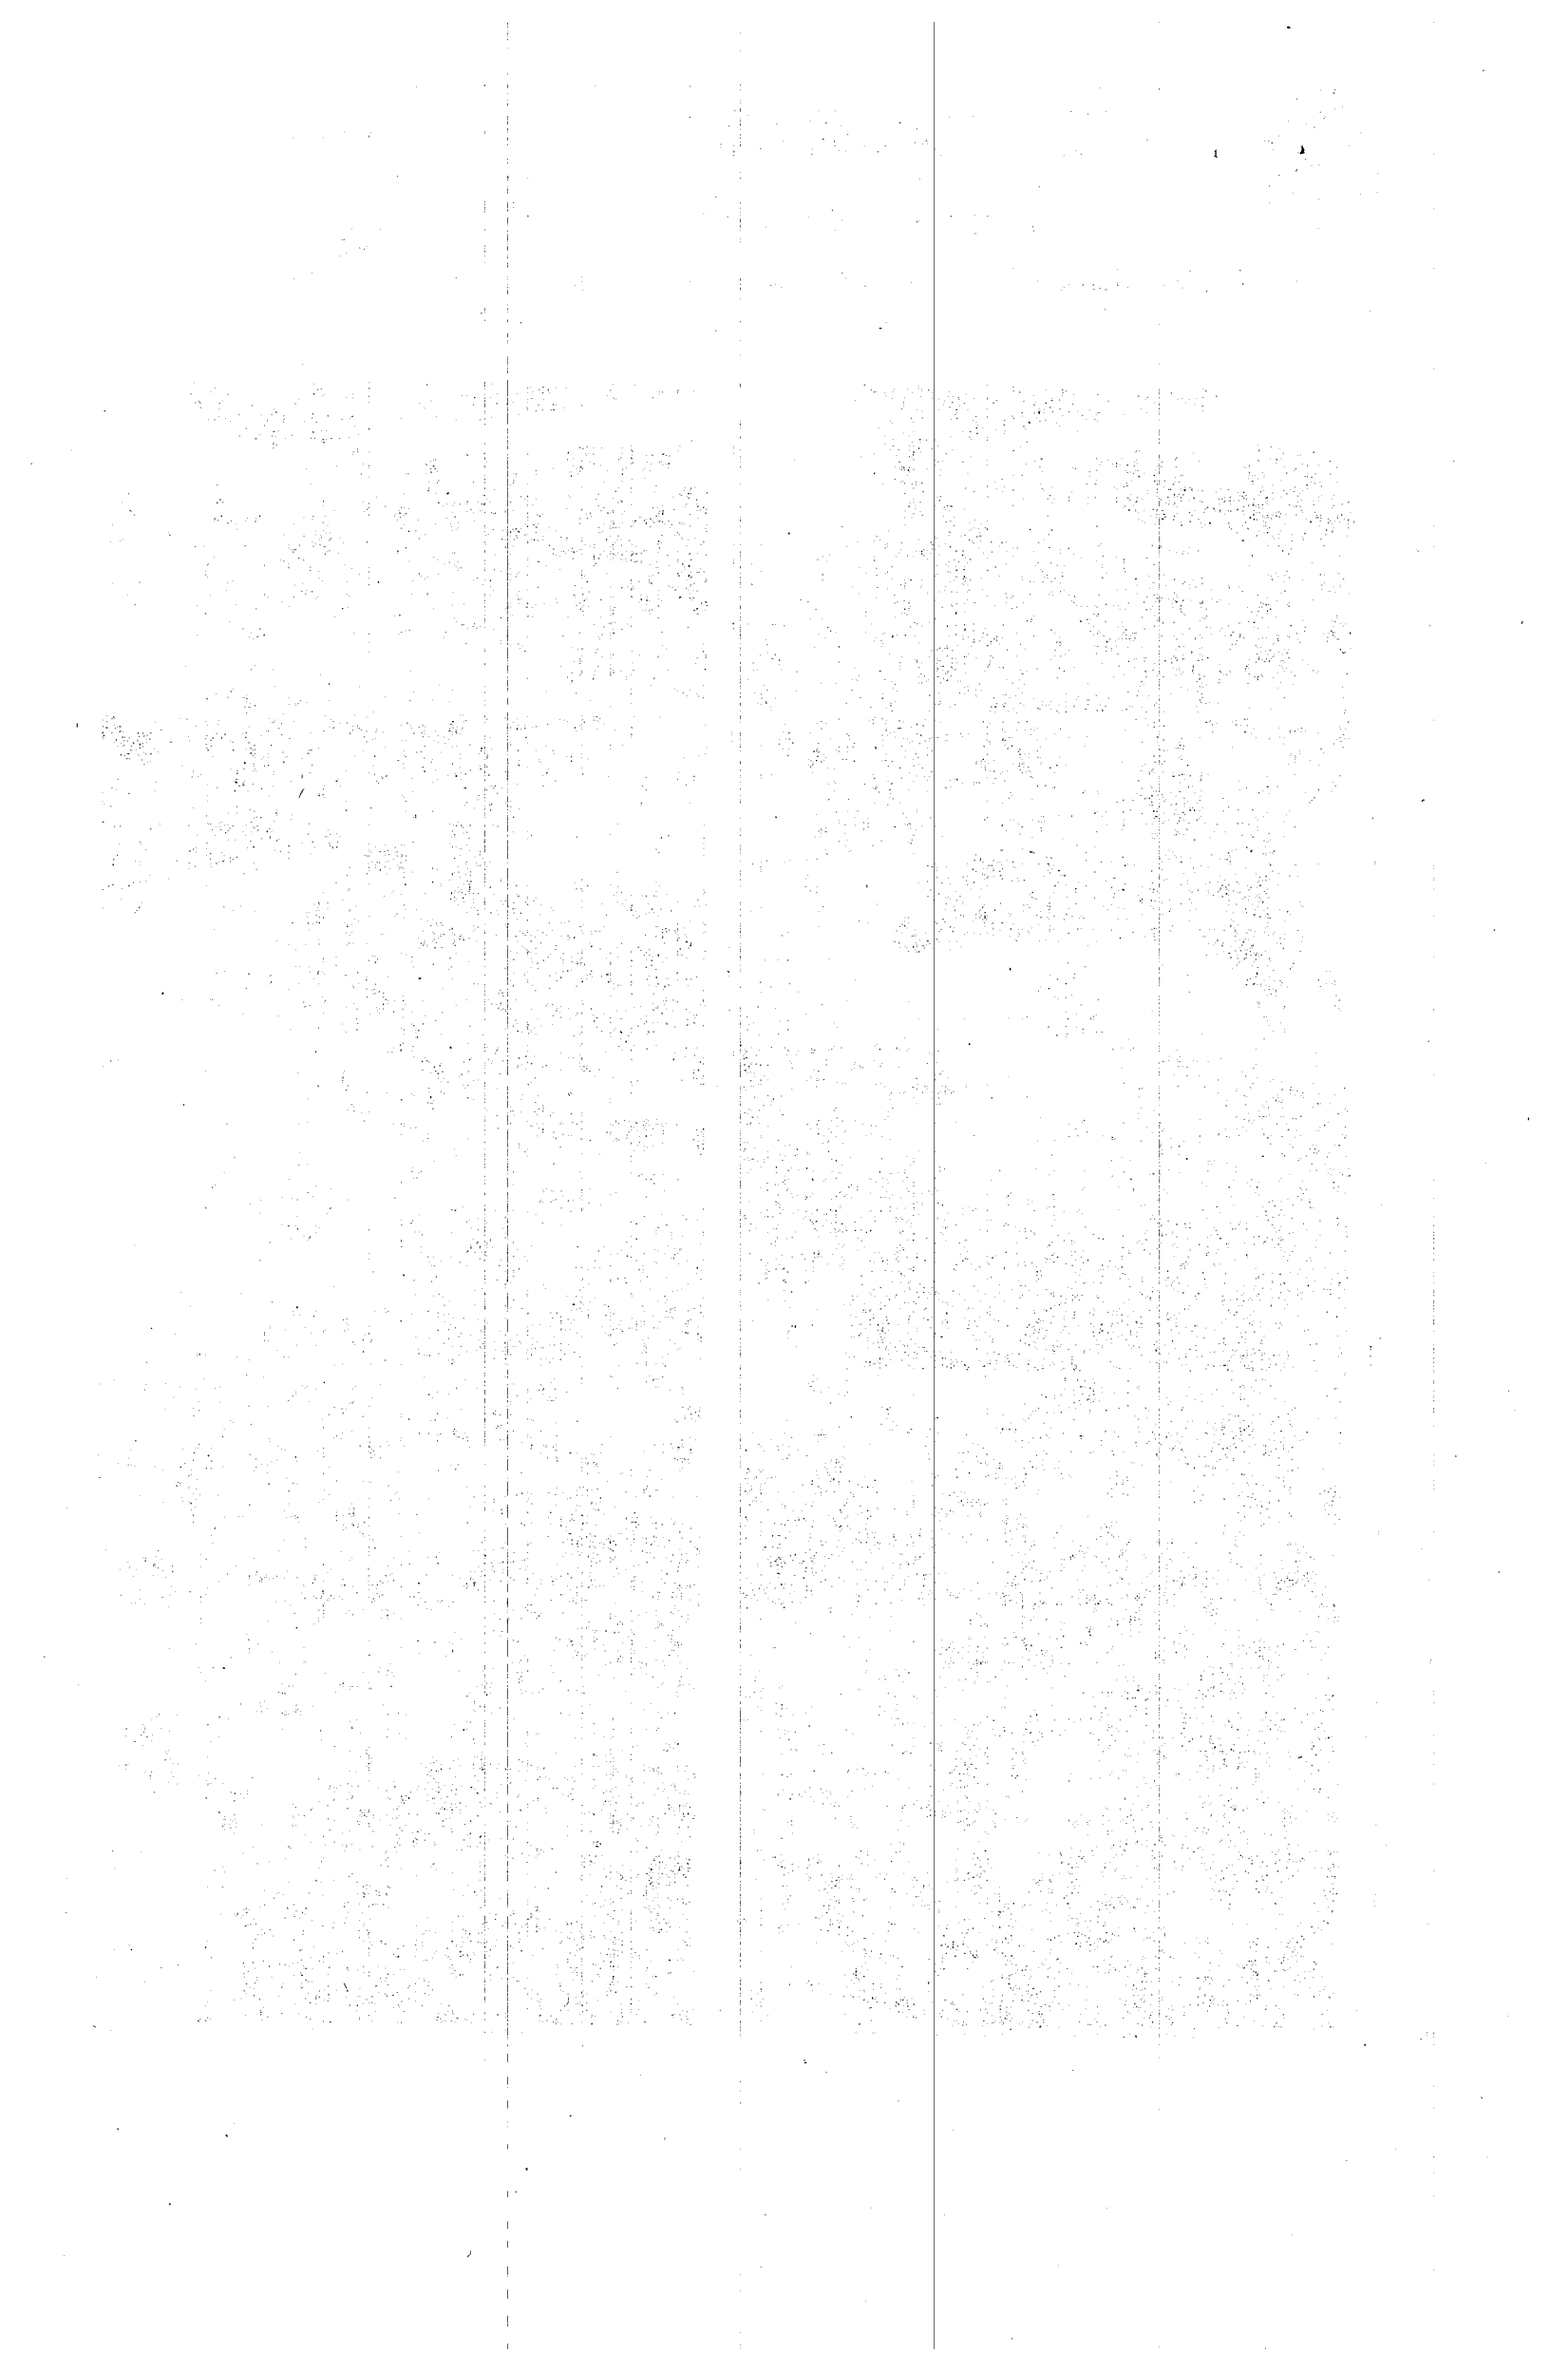


	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FO-GJ-012
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		Página: 17 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde



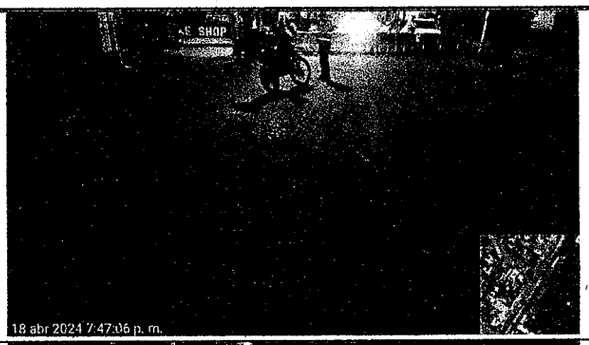






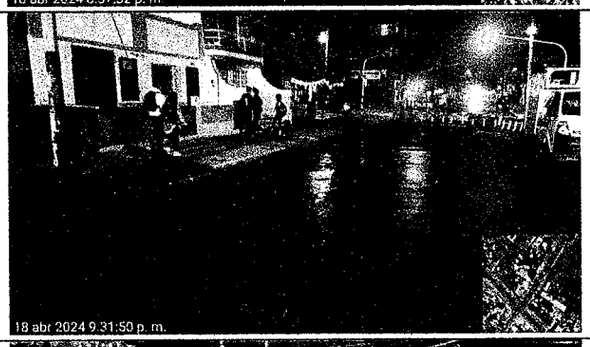




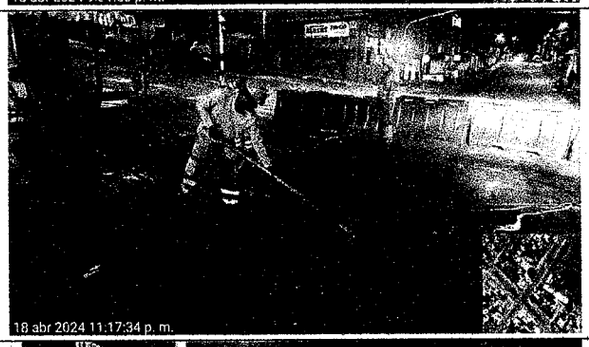







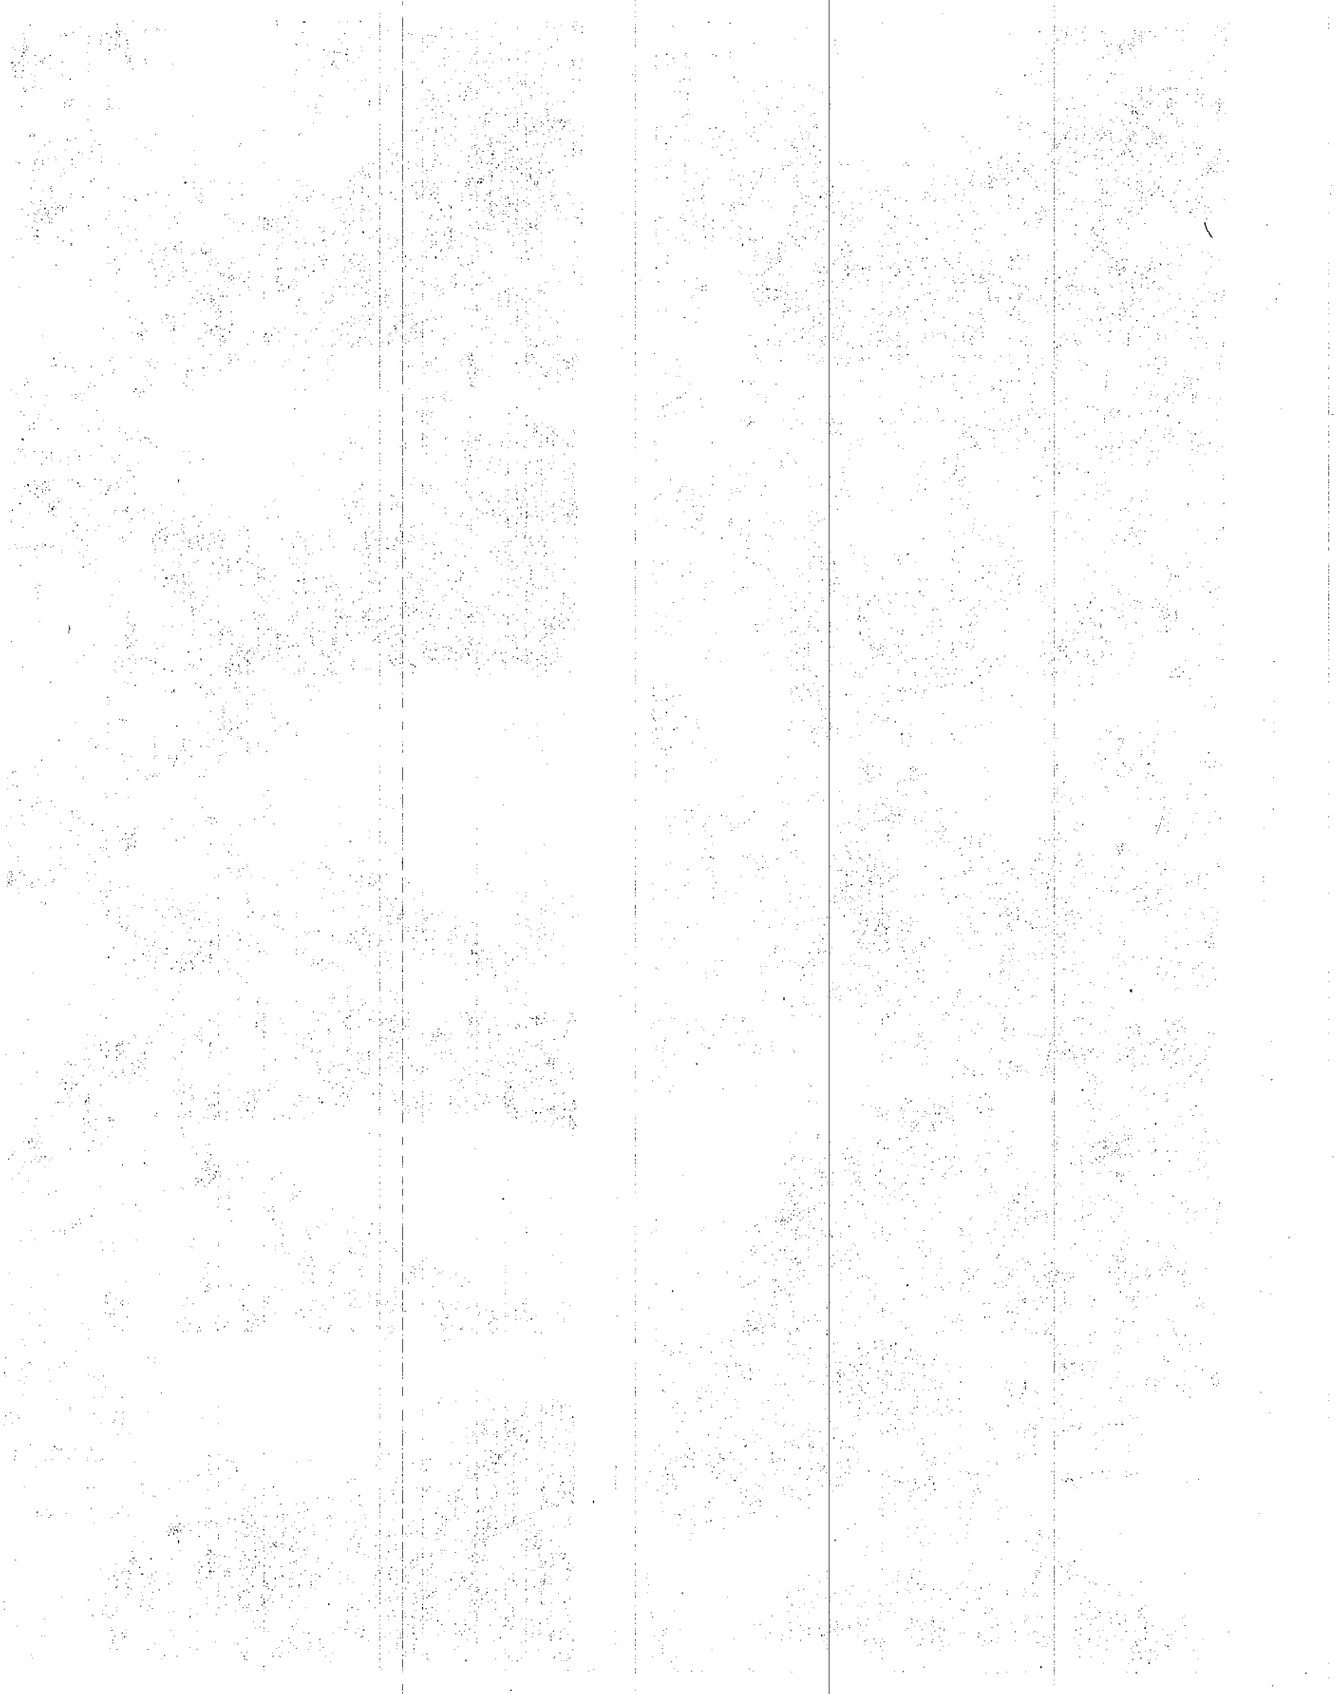


	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FO-GJ-012
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		Página: 18 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde









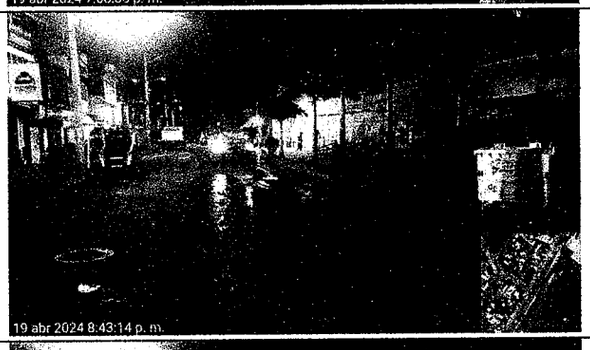




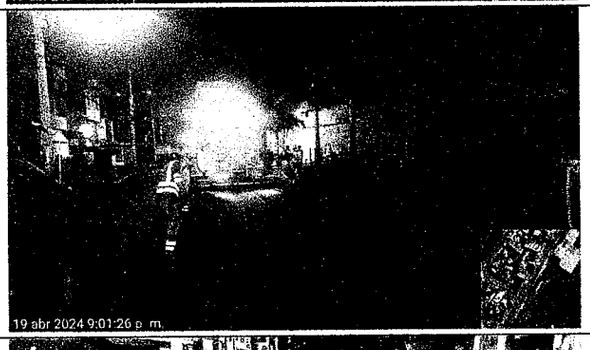


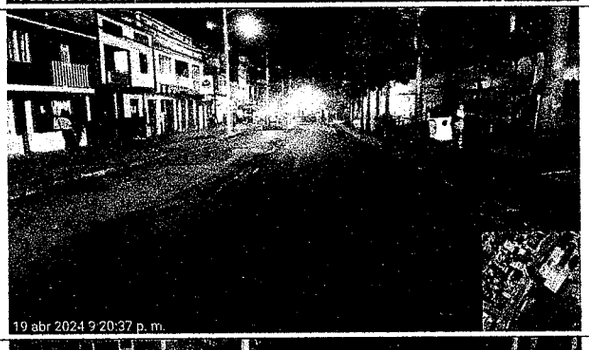






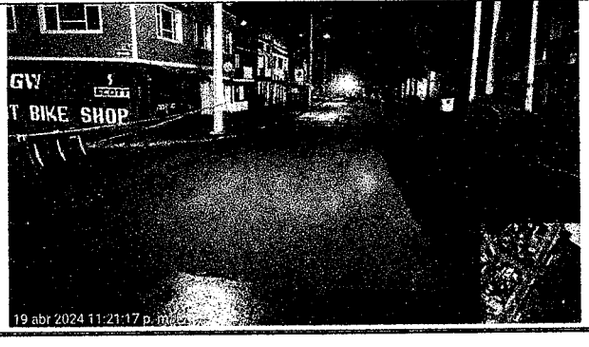

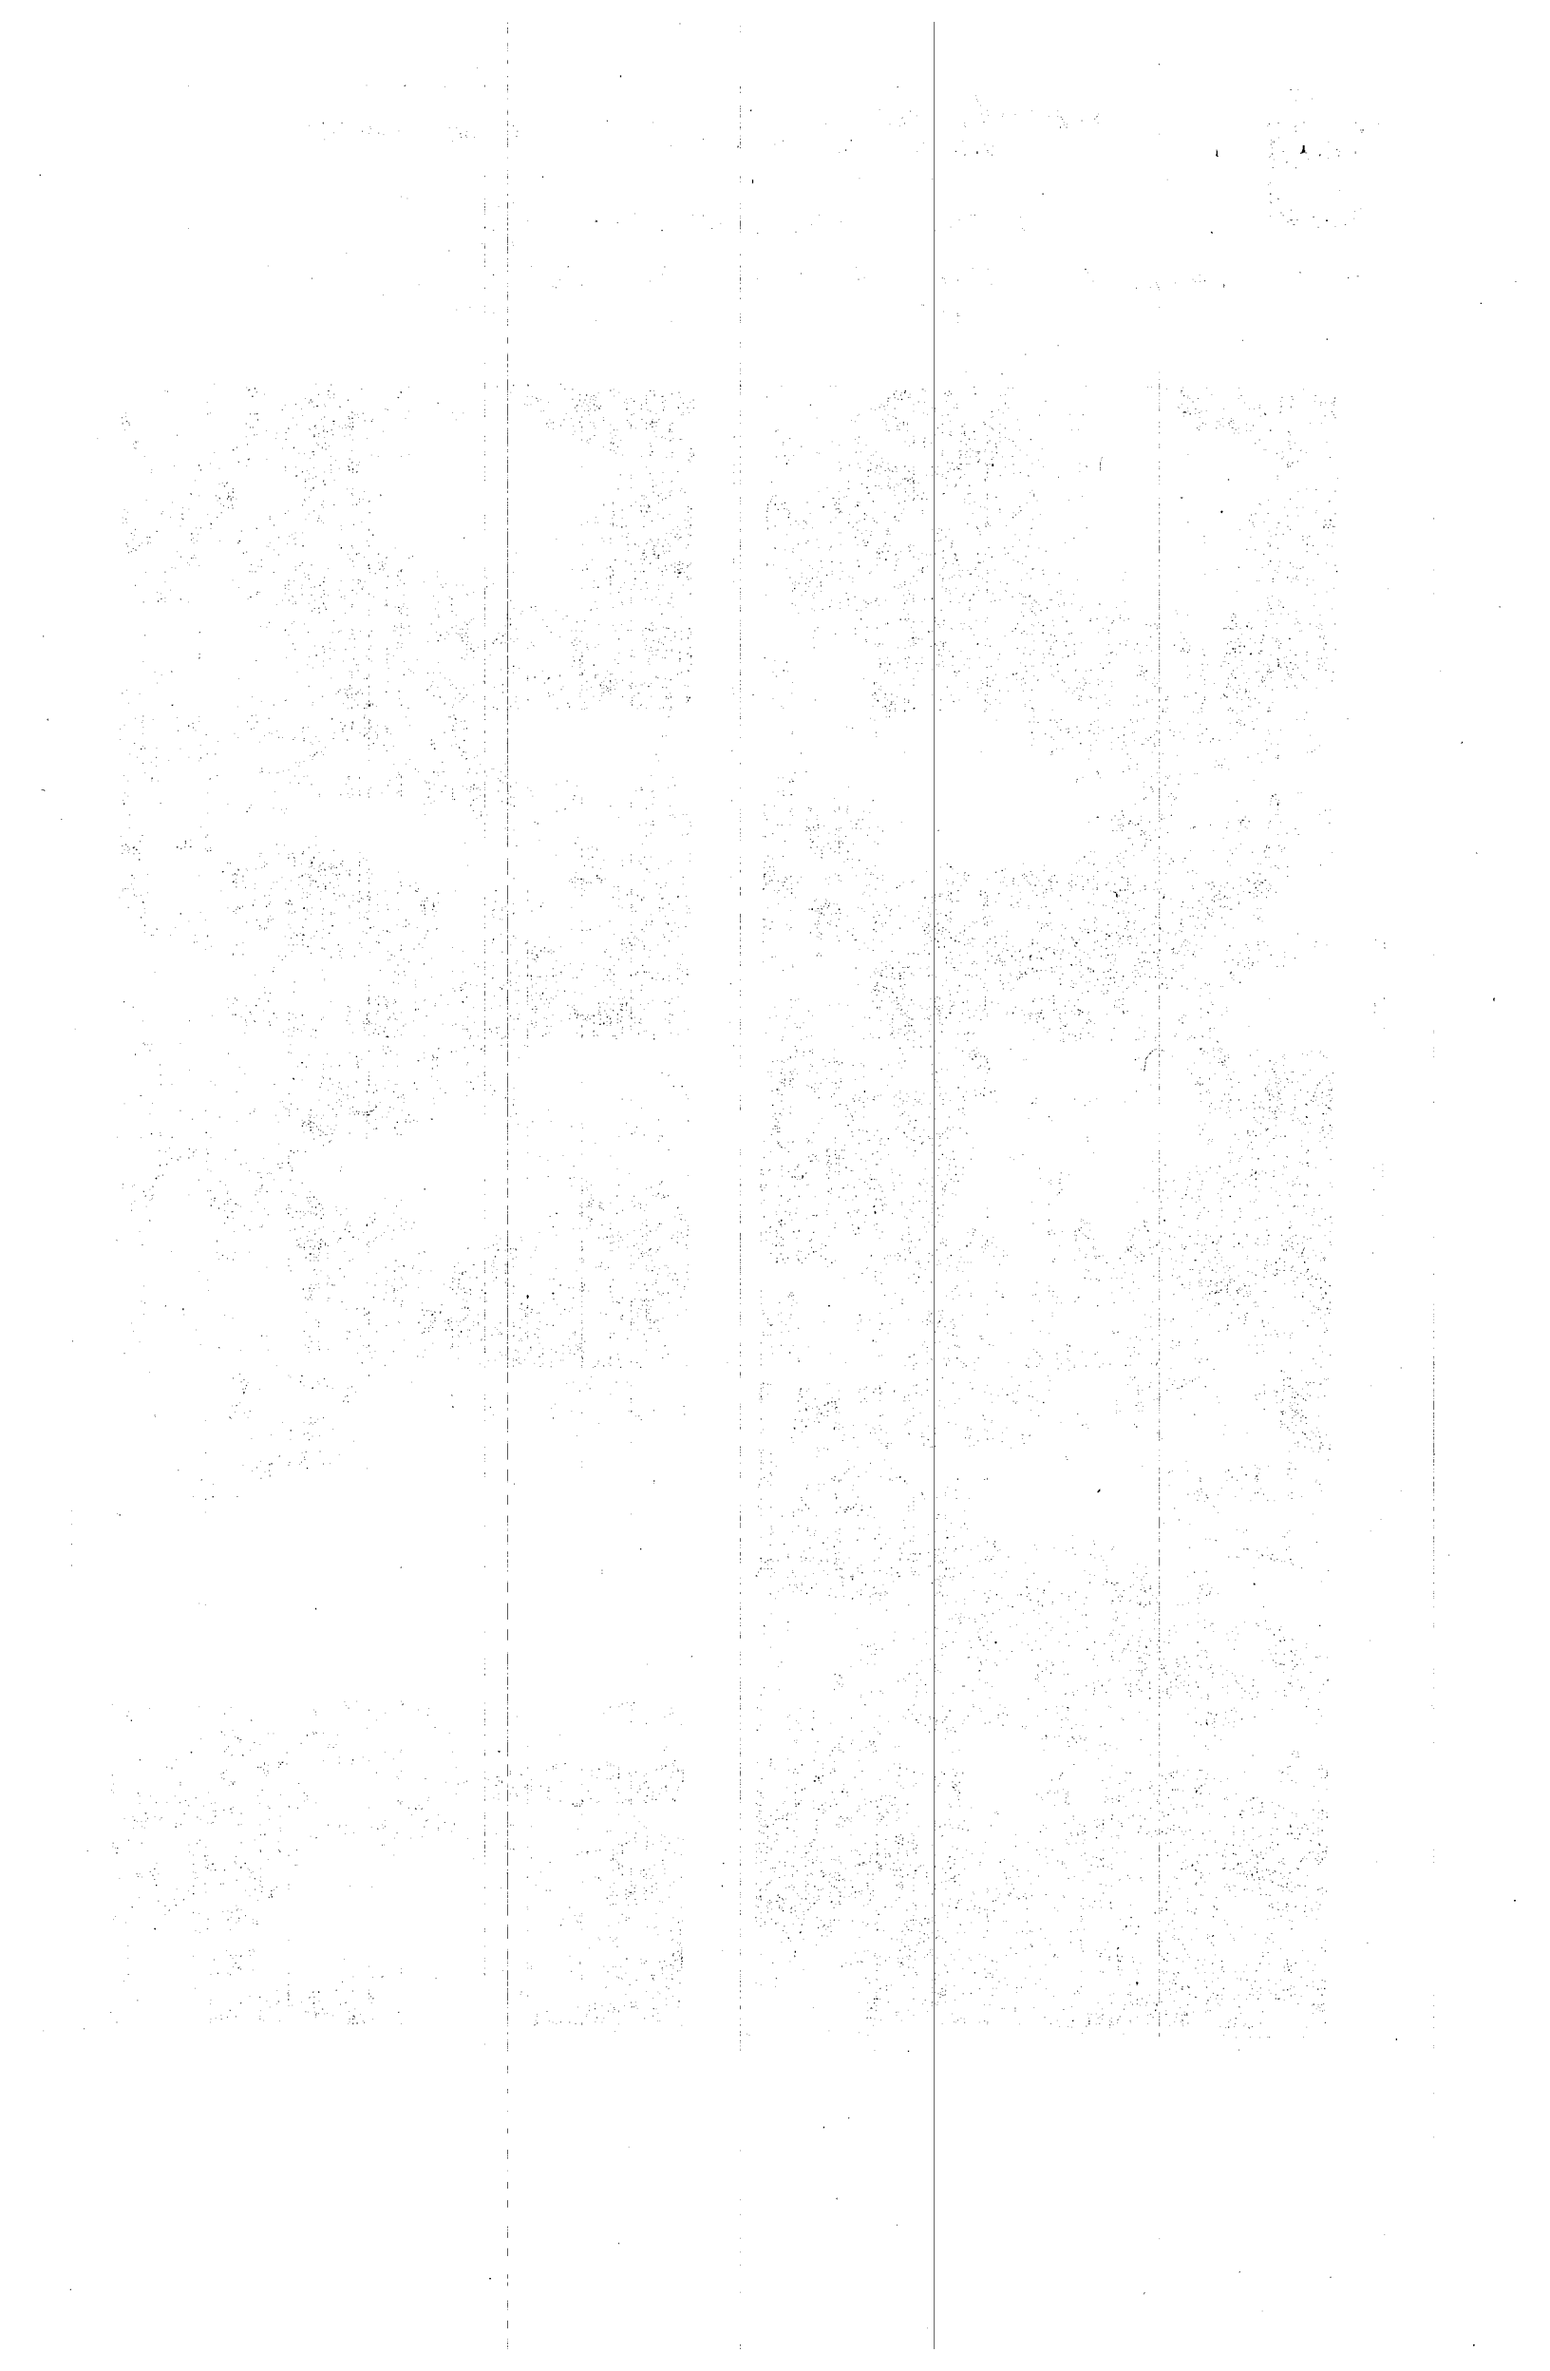

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FO-GJ-012
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		Página: 19 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde



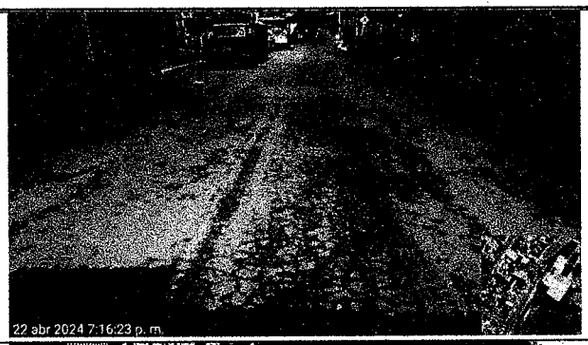













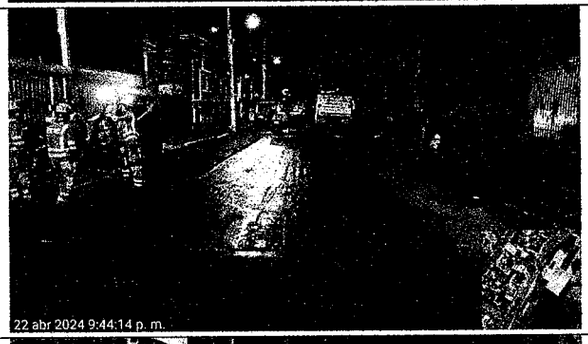







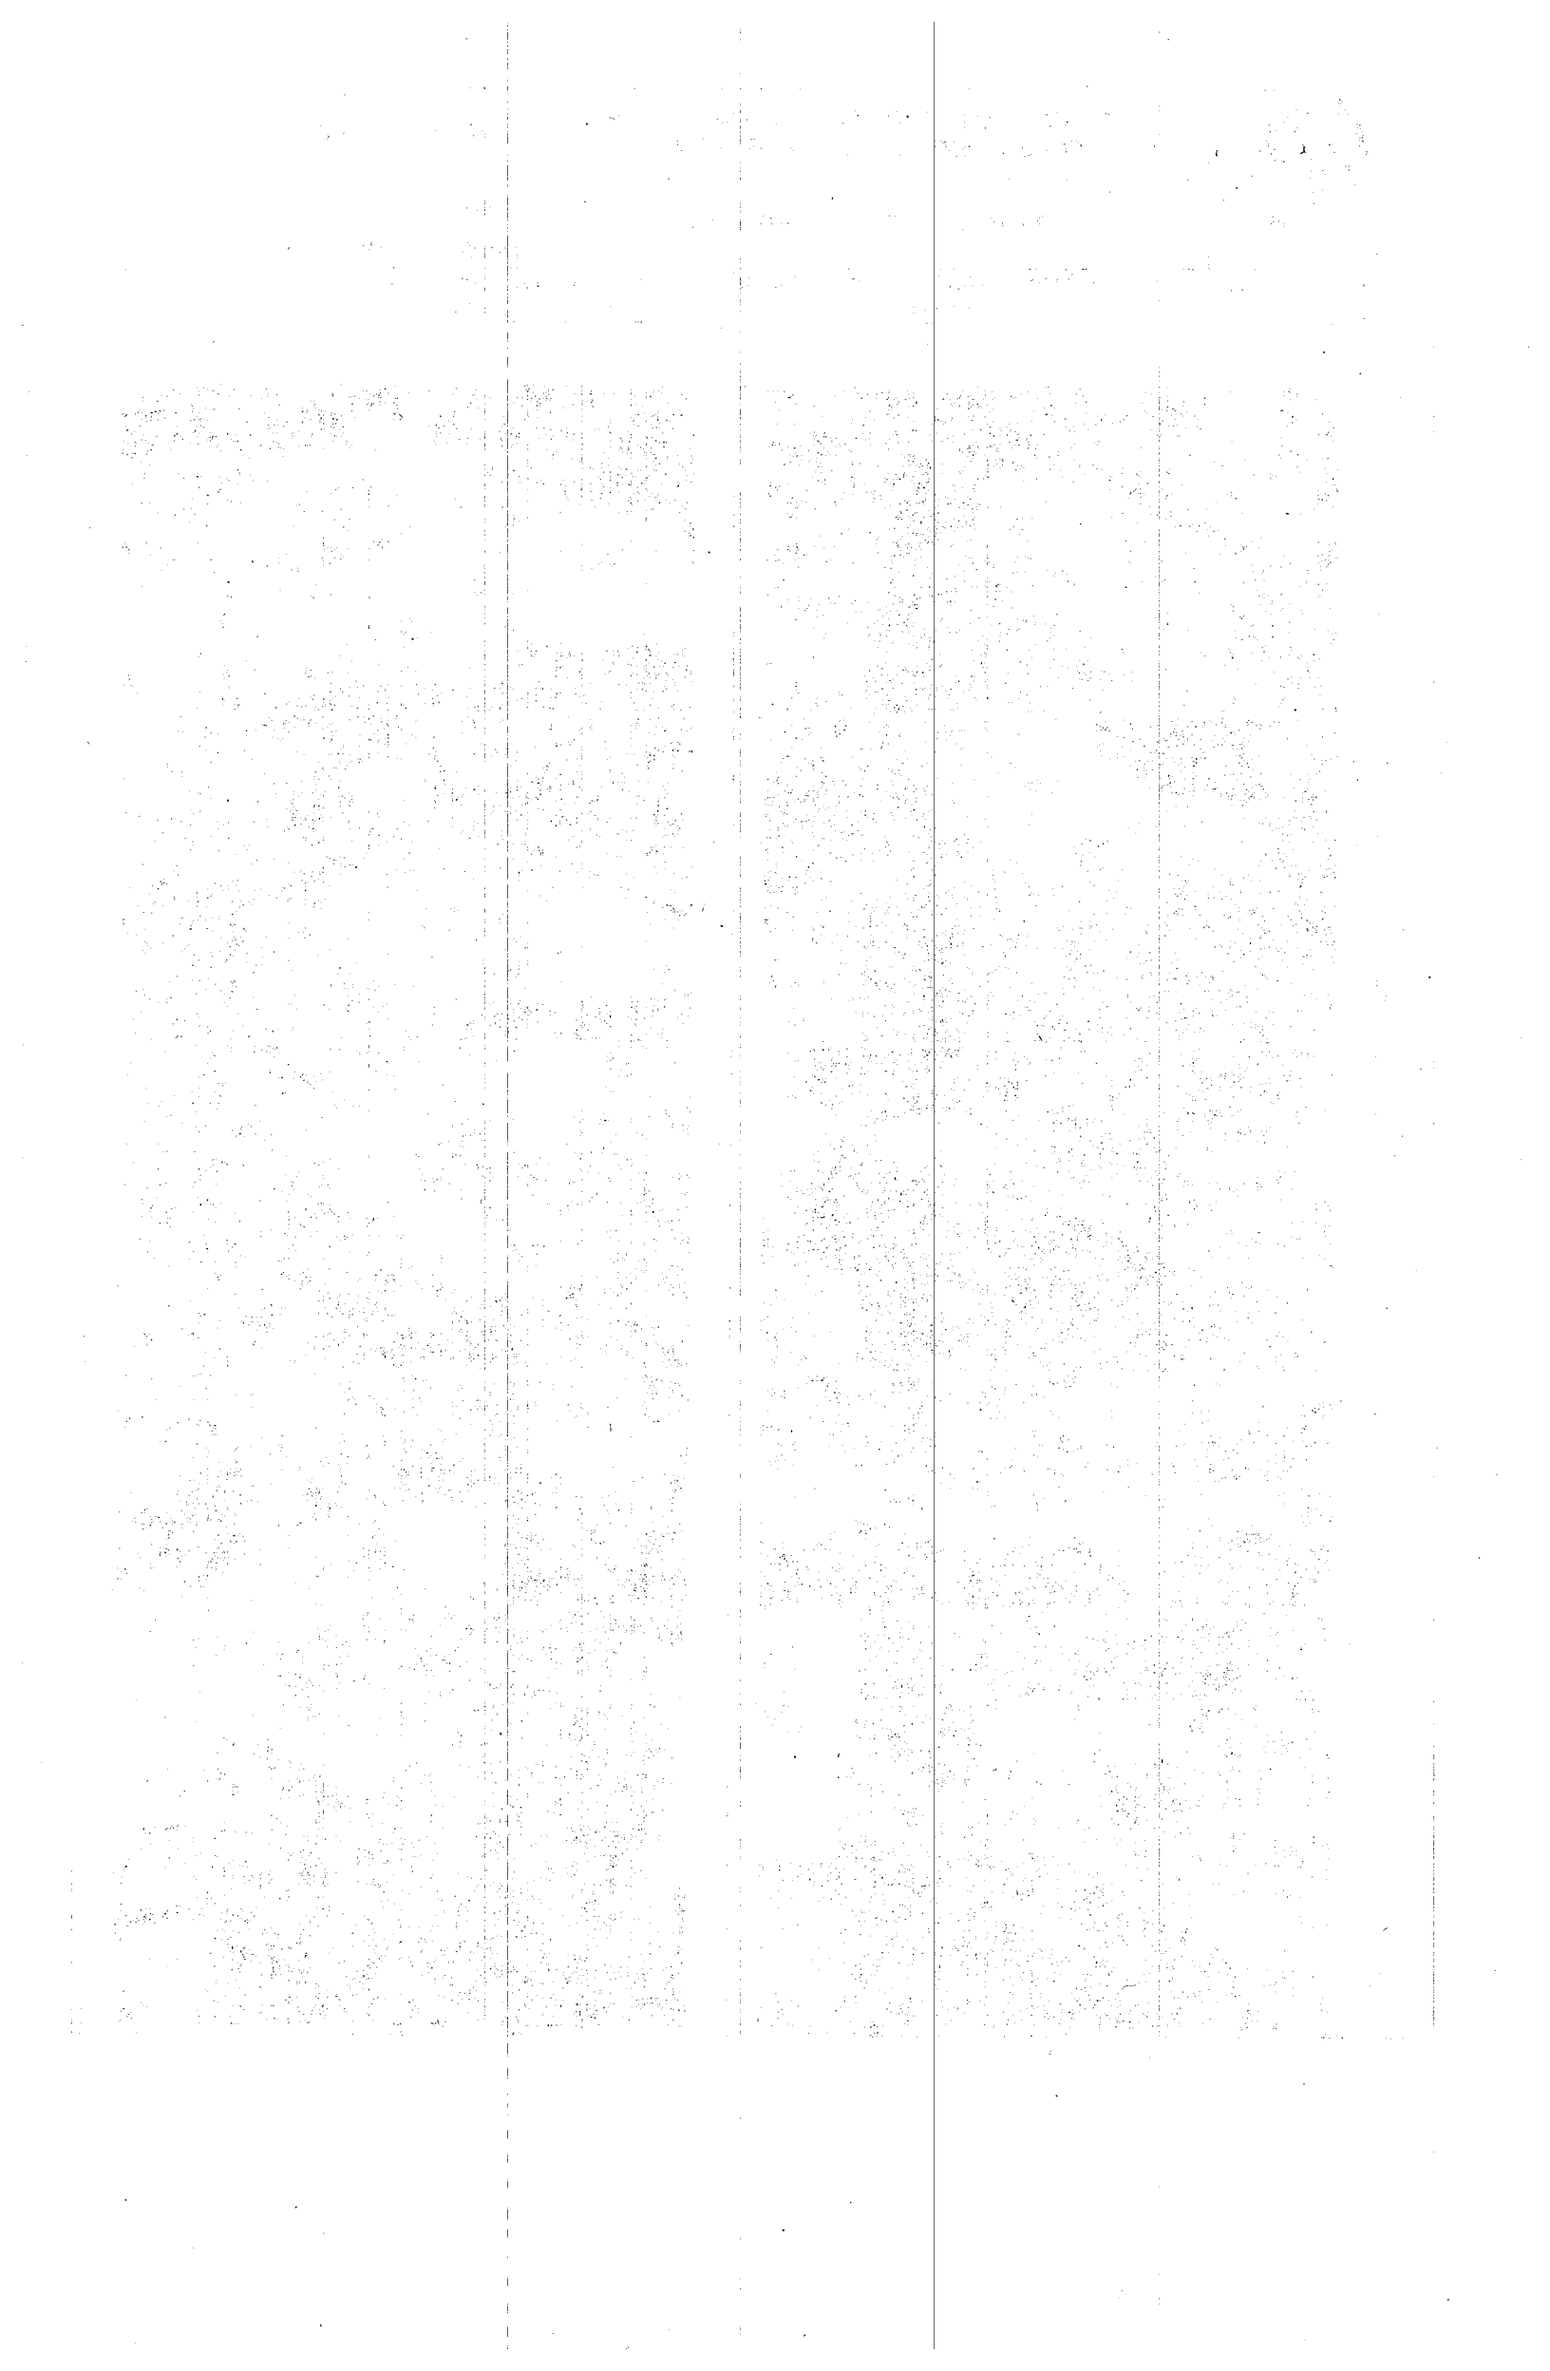

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FO-GJ-012
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		Página: 20 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde

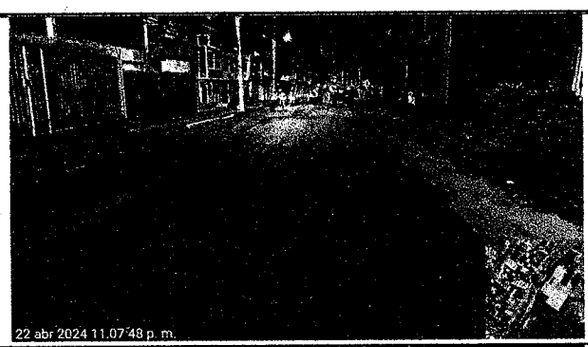

















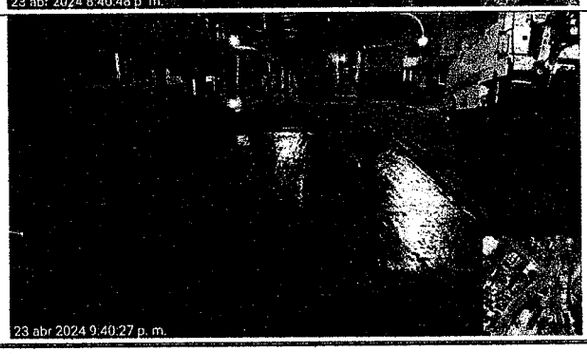




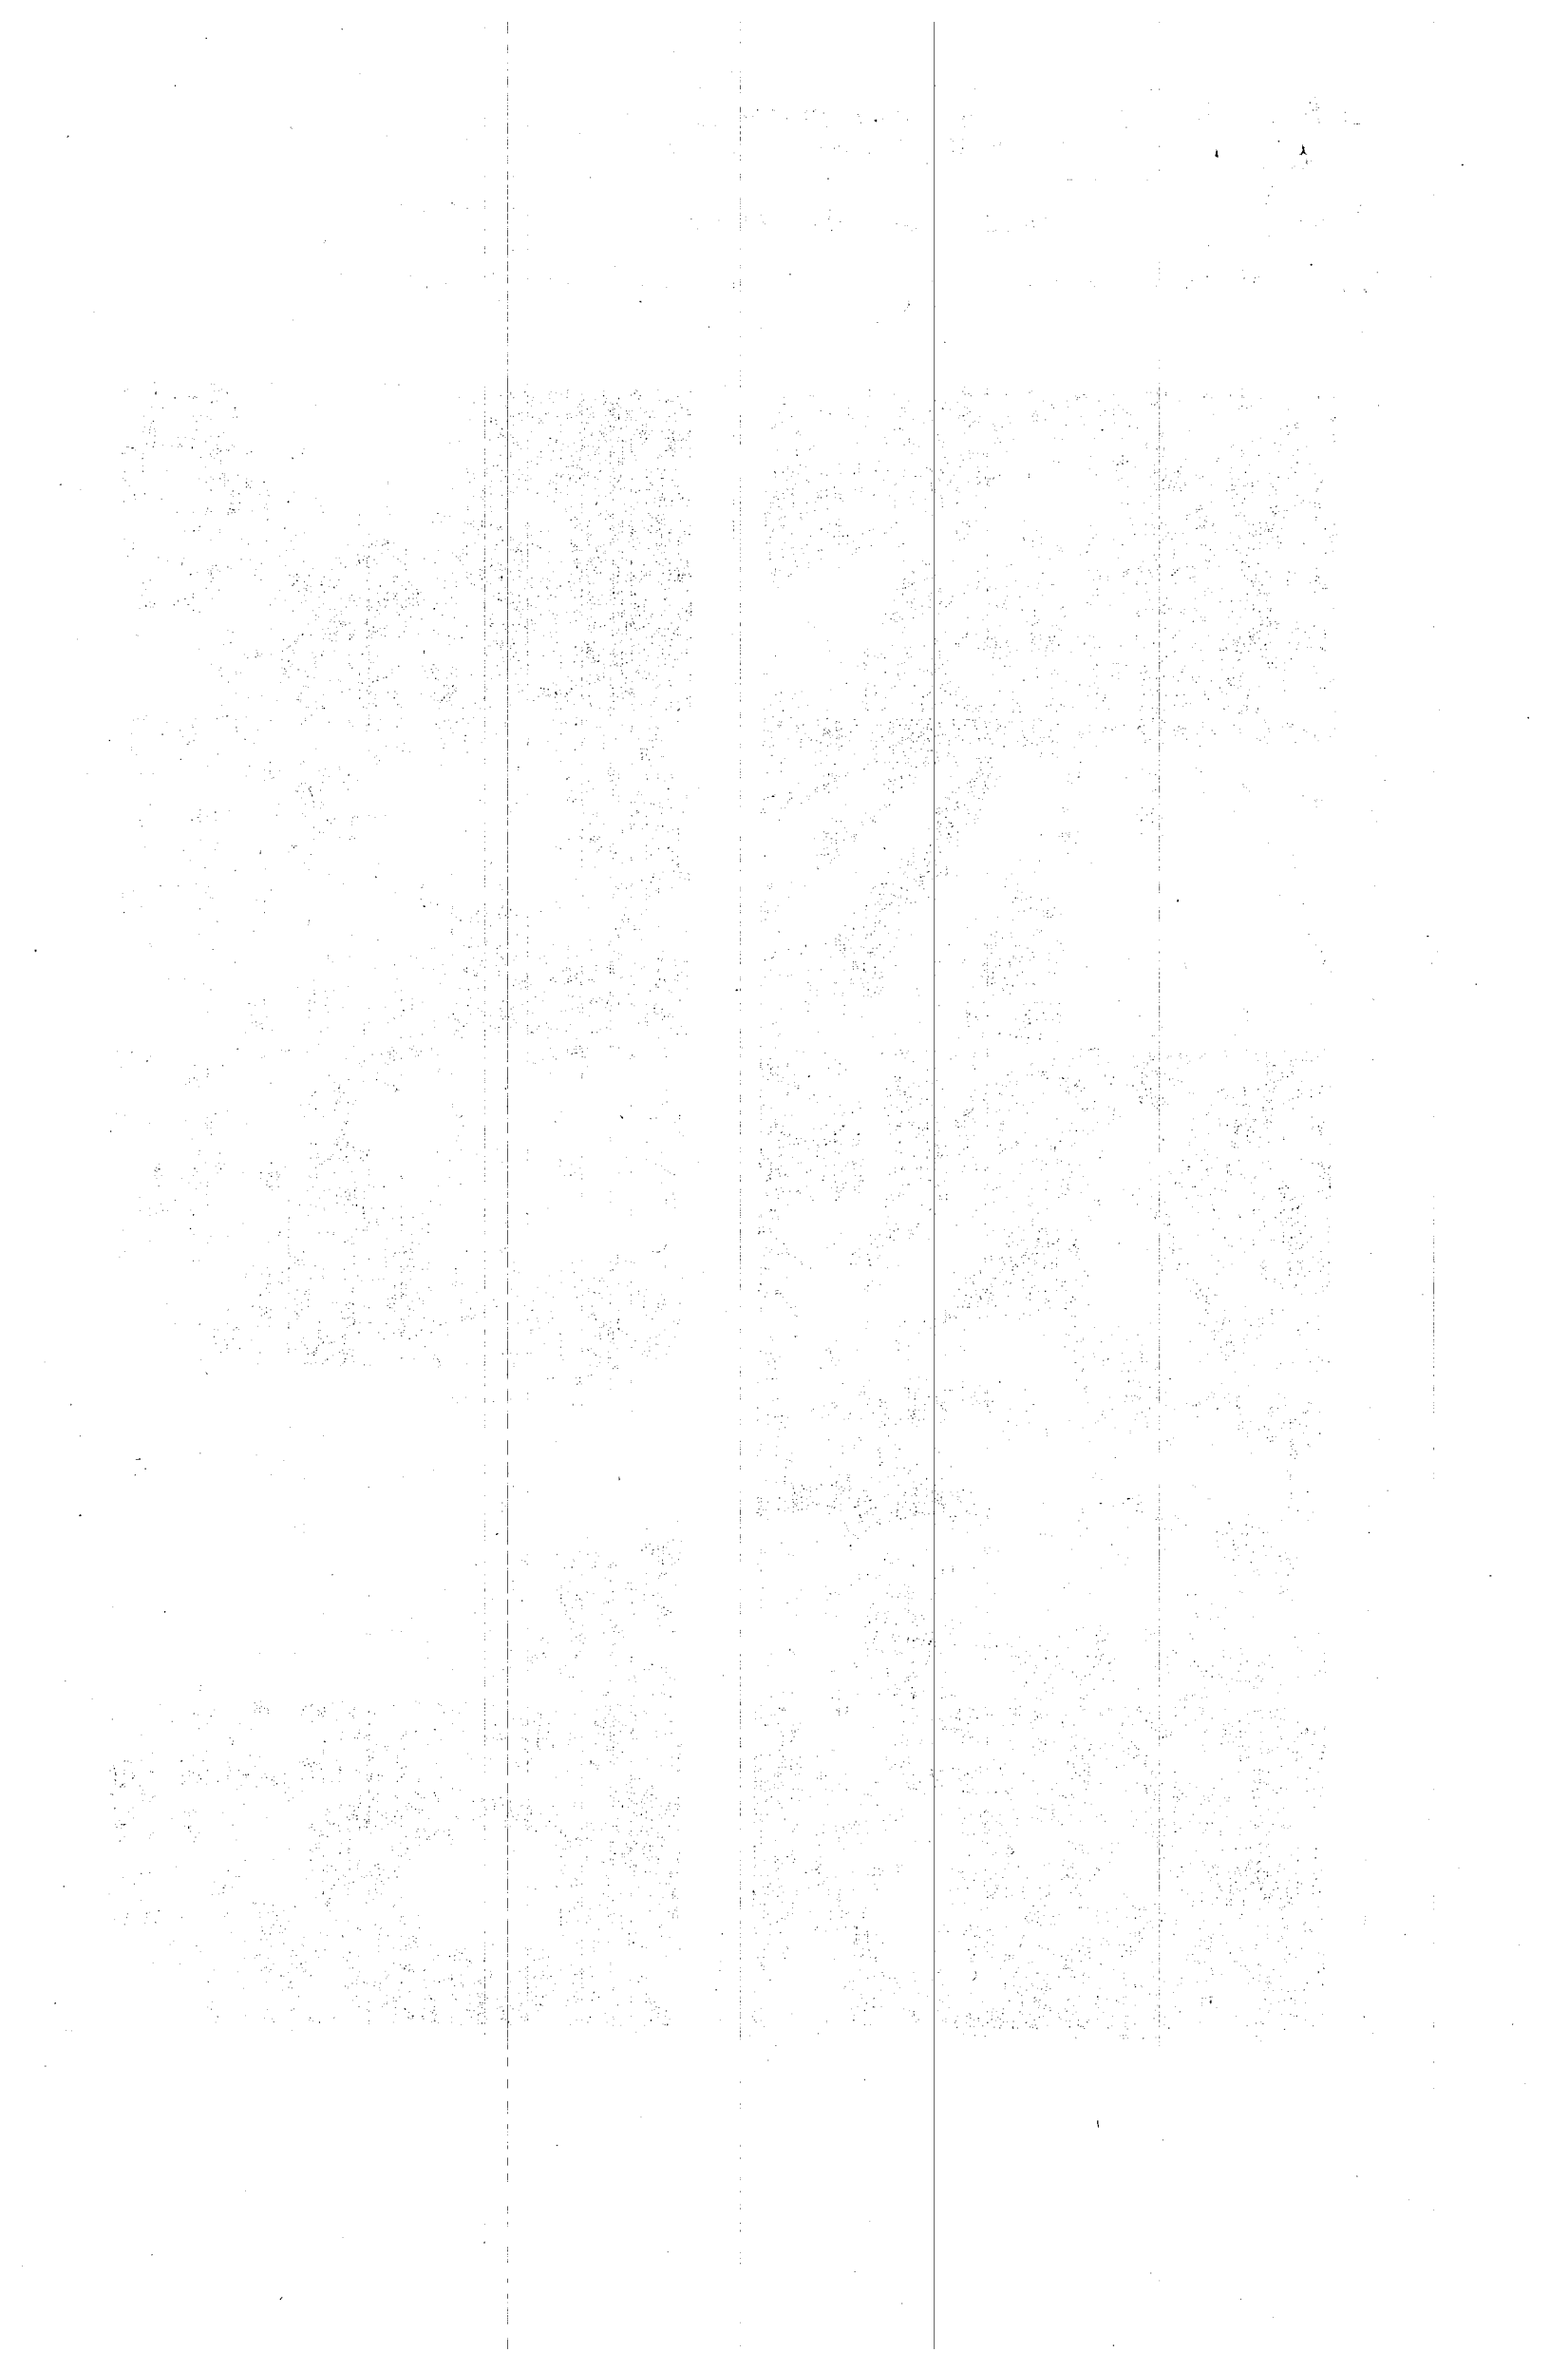

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	**Código: FO-GJ-012**
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	**Versión: 1**
		Página: 21 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde



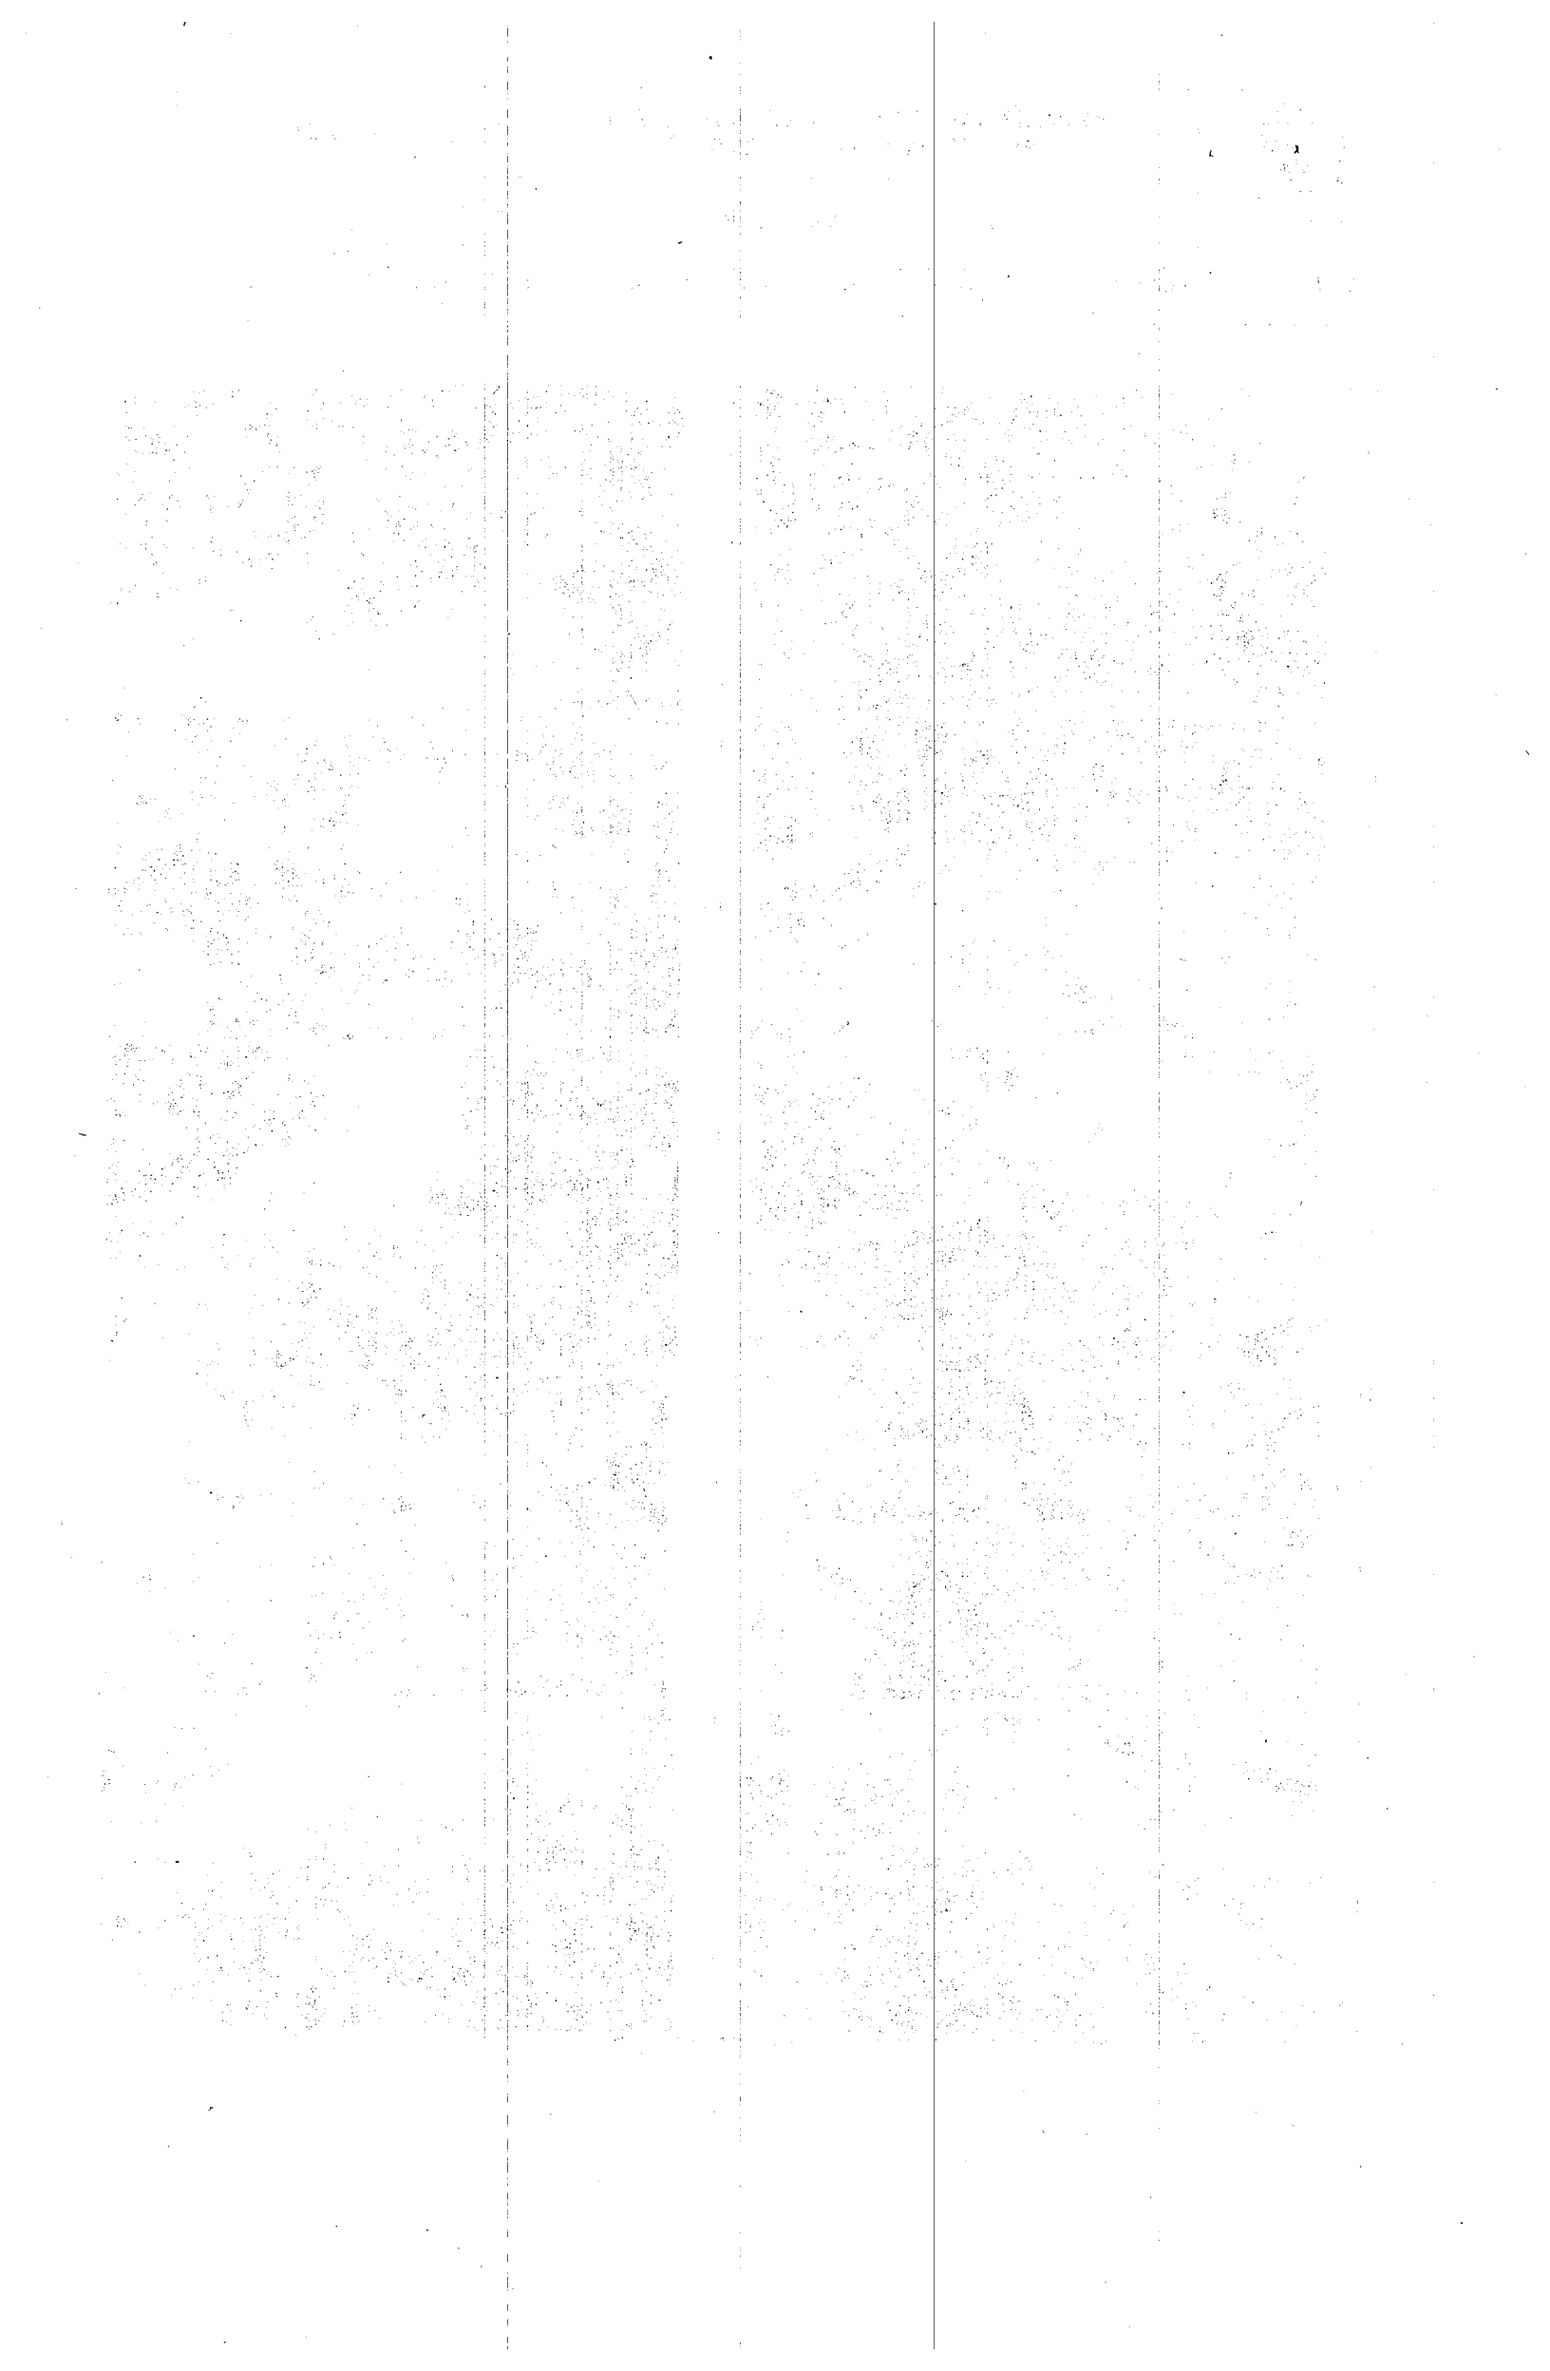

	FORMATO INFORME Y CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FO-GJ-012
	PROCESO GESTIÓN JURÍDICA	Versión: 1
		Página: 22 de 23
Elaboró: ProfesionalUniversitario	**Revisó:** Jefe Oficina Asesora Jurídica	**Aprobó:** Comité MECI – CALIDAD Alcalde















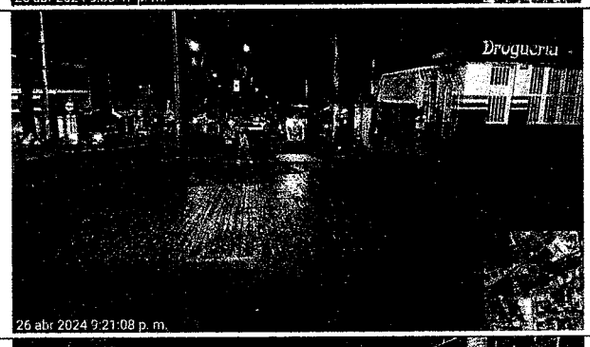

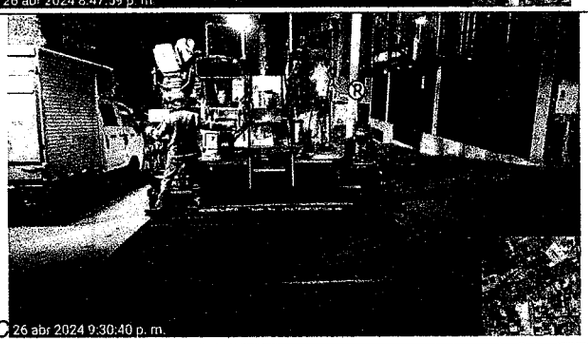





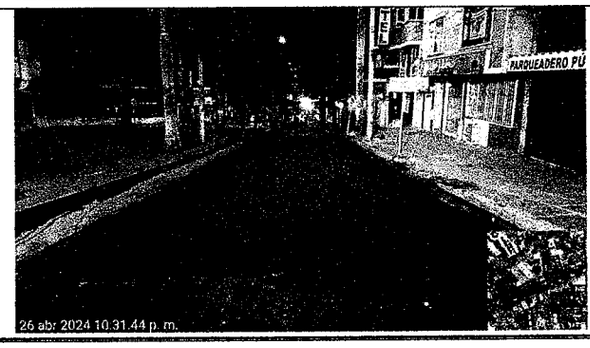

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119950

Fecha: 24-OCT-24 Placa: GOB224
Material: Emulsion Cantidad: 600kg
Destinatario: Alcaldia de Fusa
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Fusagasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119707

Fecha: 17-OCT-24 Placa: GDB724
Material: Emulsion Cantidad: 1000 kg
Destinatario: Alcaldia de Fusa
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Fusagasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119443

Fecha: 10-04-2024 Placa: SPB124
Material: Emulsion Cantidad: 10000kg
Destinatario: Alcaldia de Fosca
Cargue: Mavi pavimentaciones Hora:
Despachado: Victorio
Descargue: Fosca Cundinamarca Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119406

Fecha: 04-04-2024 Placa: SDS224
Material: Emulsion Asfaltico Cantidad: 1000 kg
Destinatario: Alcaldia de Fosca
Cargue: Mavi Pavimentaciones Hora:
Despachado: Victorio
Descargue: Fosca Cundinamarca Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

172

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 120189

Fecha: 30-04-2024 Placa: SDB 224

Material: Emulsion Cantidad: 930 Kg

Destinatario: Alcaldia de Fusa

Cargue: Mavi Hora:

Despachado: Victoria

Descargue: Fusagasuga Hora:

Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119375

Fecha: _____ Placa: _____
Material: _____ Cantidad: _____
Destinatario: _____
Cargue: _____ Hora: _____
Despachado: _____
Descargue: _____ Hora: _____
Observaciones: _____

Despachado _____ Recibido _____

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119377

Fecha: 03-04-2024 Placa: OCD 664
Material: Base triturada MZA 19 Cantidad: 7 M3
Destinatario: Alcaldia de Ayo
Cargue: Mavi Hora: _____
Despachado: La Palma
Descargue: Ayo Cundinamarca Hora: _____
Observaciones: _____

Despachado _____ Recibido Jairo Forero

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119373

Fecha: 03-04-2024 Placa: [illegible]
Material: [illegible] Cantidad: [illegible]
Destinatario: [illegible]
Cargue: [illegible] Hora: [illegible]
Despachado: [illegible]
Descargue: [illegible] Hora: [illegible]
Observaciones: [illegible]

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119425

Fecha: 01-04-24 Placa: [illegible]
Material: [illegible] Cantidad: [illegible]
Destinatario: [illegible]
Cargue: [illegible] Hora: [illegible]
Despachado: [illegible]
Descargue: [illegible] Hora: [illegible]
Observaciones: [illegible]

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

2

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119433

Fecha: 04-04-2024 Placa: [illegible]
Material: [illegible] Cantidad: [illegible]
Destinatario: [illegible]
Cargue: [illegible] Hora: [illegible]
Despachado: [illegible]
Descargue: [illegible] Hora: [illegible]
Observaciones: [illegible]

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

2

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119471

Fecha: 05-04-2024 Placa: [illegible]
Material: [illegible] Cantidad: [illegible]
Destinatario: [illegible]
Cargue: [illegible] Hora: [illegible]
Despachado: [illegible]
Descargue: [illegible] Hora: [illegible]
Observaciones: [illegible]

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

3

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119477

Fecha: 05-04-2024 Placa: GZM989
Material: Gradadura Cantidad: 7,90 m3
Destinatario: Alcaldia de Tesa
Cargue: Mavi Pavimentaciones Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Tesa Colombia Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Via El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

3

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119434

Fecha: 03-04-2024 Placa: SQZ290
Material: Rodadura Cantidad: 13,85m3
Destinatario: Alcaldia de Tesa
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Tocaimita Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Via El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119435

Fecha: 03-04-2024 Placa: SQZ316
Material: Roladura Cantidad: 6.09 m3
Destinatario: Alcaldía de Ruse
Cargue: Movi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Ruscapesuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119438

Fecha: 09-04-2024 Placa: SQZ216
Material: Roladura Cantidad: 13.3 m3
Destinatario: Alcaldía de Ruse.
Cargue: Movi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Ruscapesuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119439

Fecha: 09-04-2024 Placa: SJF 316
Material: Recebo Cantidad: 6.4 m3.
Destinatario: Alcaldia de Tusa
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Tuscaquega Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119432

Fecha: 09-04-2024 Placa: TEW157
Material: Recebo Cantidad: 7.53 m3.
Destinatario: Alcaldia de Tusa
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victor
Descargue: Tuscaquega Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119586

Fecha: 10-04-2024 Placa: THV 018
Material: Recebo arcilla 19 Cantidad: 13 m3
Destinatario: Alcaldía de Fusa
Cargue: Mavi Pavimentaciones Hora:
Despachado: Carlos
Descargue: Obra Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

6

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119587

Fecha: 10-04-2024 Placa: ODD 411
Material: Recebo arcilla 19 Cantidad: 6,10
Destinatario: Alcaldía de Fusa
Cargue: Mavi Pavimentaciones Hora:
Despachado: Carlos
Descargue: Obra Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

6

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119600

Fecha: 18-04-2024 Placa: ESS663

Material: Rodadura Cantidad: 7.75 M3.

Destinatario: Alcaldia de Fusa

Cargue: Mavi Hora:

Despachado: Victoria

Descargue: Fusagasuga Hora:

Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119598

Fecha: 11-04-2024 Placa: TLU078

Material: Rodadura mdc 19 Cantidad: 15,67

Destinatario: Alcaldia de Fusagasuga

Cargue: Mavi Hora:

Despachado: Victoria

Descargue: Fusagasuga Hora:

Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

7

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119601

Fecha: 11-04-2024 Placa: HCR 824
Material: Rodadura MDC 19 Cantidad: 6.23
Destinatario: Alcaldía de Tuja
Cargue: Mavi Pavimentaciones Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Tuja Gasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

1

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119604

Fecha: 11-04-2024 Placa: QDR 412
Material: Rodadura mdc 19 Cantidad: 6.12
Destinatario: Alcaldía de Tuja
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Tuja Gasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

1

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119602

Fecha: 11-04-2024 Placa: SQZ 316
Material: Rajadura Cantidad: 6,2 M3.
Destinatario: Alcaldia de Fusa.
Cargue: Mavi. Hora:
Despachado: Fusagasuga.
Descargue: Victoria Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119635

Fecha: 16-04-2024 Placa: THW 07K
Material: Rajadura Mdc 19 Cantidad: 13,50
Destinatario: Alcaldia de Fusa
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Fusagasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119636

Fecha: 16-04-2024 Placa: [illegible]
Material: [illegible] Cantidad: 6. 6[illegible]
Destinatario: [illegible]
Cargue: [illegible] Hora: [illegible]
Despachado: [illegible]
Descargue: [illegible] Hora: [illegible]
Observaciones: [illegible]

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119638

Fecha: 16-04-2024 Placa: OCB 664
Material: Pedrahita mdc 19 Cantidad: 6. 70
Destinatario: Alcaldia de Fusa
Cargue: Mal. Pavimentadora Hora: [illegible]
Despachado: Lindora
Descargue: Fusagasuga Hora: [illegible]
Observaciones: [illegible]

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119706

Fecha: 19-04-2024 Placa: EMV 018
Material: Gravilla nro 19 Cantidad: 14.26
Destinatario: Alcaldia de Fresno
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Luis Ramon
Descargue: Fresno Tolima Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Via El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119708

Fecha: 19-04-2024 Placa: SQZ 298
Material: Gravilla nro 19 Cantidad: 14.04
Destinatario: Alcaldia de Fresno Tolima
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Luis Ramon
Descargue: Fresno Tolima Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Via El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119709

Fecha: 17-04-2024 Placa: TCW157
Material: Rodadura Cantidad: 37 m3.
Destinatario: Alcaldia de Tesa
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Tocaqasuga. Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

8

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119710

Fecha: 17-04-2024. Placa: ODT 412
Material: Rodadura mdr 19 Cantidad: 6.30
Destinatario: Alcaldia de Tesa
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Tocaqasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

9

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119952

Fecha: 18-04-2024 Placa: THU 078
Material: Rodadura mdc 19 Cantidad: 14,34
Destinatario: Alcaldía de Puerto
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Puerto Gaitán Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

81

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119954

Fecha: 18-04-2024 Placa: SQZ 798
Material: Rodadura mdc 19 Cantidad: 14,95
Destinatario: Alcaldía de Puerto Gaitán
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Puerto Gaitán Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

81

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119956

Fecha: 18 04 2024 Placa: SQZ 411
Material: Rodadura mdc 19 Cantidad: 6,80 m3
Destinatario: Alcaldia de Ospina
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Ospina Pueblo Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

81

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119959

Fecha: 19-04-2024 Placa: SQZ 248
Material: Rodadura mdc 19 Cantidad: 14,99
Destinatario: Alcaldia de Ospina Pueblo
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Ospina Pueblo Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

91

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119961

Fecha: 19- 04- 2024 Placa: TIW018
Material: Rodadura mdd19 Cantidad: 14,67
Destinatario: Alcaldia de Fusagasuga
Cargue: M G V. Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Fusa Fusagasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119963

Fecha: 19- 04- 2024 Placa: ODE 412
Material: Rodadura mdd19 Cantidad: 6.40
Destinatario: Alcaldia de Fusagasuga
Cargue: M G V. Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Fusa Fusagasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119949

Fecha: 19-04-2024 Placa: ESS663
Material: Rodadura Cantidad: 6,33M3
Destinatario: Alcaldia de Tosa
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Tosagasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119966

Fecha: 22-04-2024 Placa:
Material: Cantidad:
Destinatario:
Cargue: Hora:
Despachado:
Descargue: Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119976

Fecha: 23-04-2024 Placa: SQZ 298
Material: Bordillo Mod 19 Cantidad: 14,60
Destinatario: Alcaldia de Puerto Rico
Cargue: Mavi pavimentaciones Hora:
Despachado: Urbina
Descargue: Puerto Rico Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119977

Fecha: 23-04-2024 Placa: INV078
Material: Bordillo mod 19 Cantidad: 14,16
Destinatario: Alcaldia de Puerto
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Urbina
Descargue: Puerto Rico Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119989

Fecha: 24-04-2024 Placa: SQR 298
Material: Recebo mdc 19 Cantidad: 14,74
Destinatario: Alcaldia de Fusa
Cargue: Mavi pavimentaciones Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Fusagasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 119991

Fecha: 24-04-2024 Placa: TPV 078
Material: Recebo mdc 19 Cantidad: 14,60
Destinatario: Alcaldia de Fusagasuga
Cargue: Mavi pavimentaciones Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Fusagasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 120015

Fecha: 25-04-2024 Placa: SQZ 29K
Material: Recebo mdc 19 Cantidad: 14,36
Destinatario: Alcaldía de Fusa
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Fusagasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 120019

Fecha: 25-04-2024 Placa: TIN 098
Material: Recebo MDC 19 Cantidad: 14,18
Destinatario: Alcaldía de Fusagasuga
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Fusagasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 120171

Fecha: 25-04-2021 Placa: TEW157
Material: Rodadura MDC 19 Cantidad: 7.7 M3.
Destinatario: Alcaldía de Tuso
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Tuscaguesa Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 120050

Fecha: 26-04-2021 Placa: THV018
Material: Rodadura Mdc 19 Cantidad: 4.3
Destinatario: Alcaldía de Tuso
Cargue: Mavi Pavimentaciones Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: planta Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 120052

Fecha: 26-04-2024 Placa: SQZ 298
Material: Recebo mix 19 Cantidad: 16.93
Destinatario: Alcaldia de Fusa
Cargue: Mavi
Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Fusagasuga
Hora:
Observaciones:

Despachado

Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 120180

Fecha: 26-04-2024 Placa: SQZ 316
Material: Rajadura Cantidad: 6,02 M3
Destinatario: Alcaldia de Fusa
Cargue: Mavi
Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Fusagasuga
Hora:
Observaciones:

Despachado

Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 120113

Fecha: 29-04-2024 Placa: TAN 078
Material: Rodadura mdc 19 Cantidad: 14,48
Destinatario: Alcaldia de Fusa
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Adriana
Descargue: Fusagasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 120116

Fecha: 29-04-2024 Placa: SOZ 298
Material: Rodadura mdc 19 Cantidad: 14,78
Destinatario: Alcaldia de Fusa
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Adriana
Descargue: Fusagasuga Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 120183

Fecha: 29-04-2024 Placa: SRZ 316
Material: Rodadura Cantidad: 6,03 M3
Destinatario: Alcaldia de Tuso
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Tusoqasuqa Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 120146

Fecha: 30-04-2024 Placa: TNV 618
Material: Rodadura mezcla Cantidad: 14,99
Destinatario: Alcaldia de Tuso
Cargue: Mavi Hora:
Despachado: Victoria
Descargue: Tusoqasuqa Hora:
Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 120147

Fecha: 30-04-2024 Placa: SOZ298

Material: Rodadura md 19 Cantidad: 14.96

Destinatario: Mechas

Cargue: Mavi Hora:

Despachado: Victoria

Descargue: Tocaqueza Hora:

Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

INGRESO ☐
SALIDA ☐

REMISIÓN
Nº 120191

Fecha: 30-04-2024 Placa: SSB863

Material: Rodadura Cantidad: 9.66 m3

Destinatario: Alcaldía de Ibagué

Cargue: Mavi Hora:

Despachado: Victoria

Descargue: Tocaqueza Hora:

Observaciones:

Despachado Recibido

PLANTA: Kilometro 2 Vía El Paso - Carmen de Apicalá - Teléfono: 833 57 09 Celular 315 314 92 48 Girardot

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nit. 800.219.167-5
IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Factura electrónica de venta
No. **MA967**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA	***8/05/2024***	***$ 467.082.306,60***

VENDEDOR

NIT No. : 890680008-4 **N° APROBACIÓN:** -

DIRECCION : CL 6 No 6-24 PALACIO MUNICPAL

FECHA VENCIMIENTO 7/06/2024 **ORDEN DE SERVICIO**

TELEFONO : 3144136382

CIUDAD : FUSAGASUGÁ **PAIS :** Colombia

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
	CONTRATO No.196 DE 2024, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y EMULSION ASFALTICA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.				
MDC57	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MDC-19 EN CALIENTE INVIAS 450-02	540,84 M3	$ 696.000,00		$ 376.424.640,00
EMU13	EMULSION ASFALTICA CRR-1	4.530 KG	$ 3.550,00		$ 16.081.500,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 392.506.140,00
IVA liquidado	$ 392.506.140,00	19%	$ 74.576.166,60
VALOR TOTAL :			$ 467.082.306,60

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 7/06/2024	$ 467.082.306,60

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 60 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%)
Resolución DIAN: 18764048695337. Prefijo: MA. Rango: 681 al 2000. Vigencia: 8/05/2023 hasta 8/11/2024.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura a crédito, plazo hasta 7/06/2024.

Favor consignar a la cuenta corriente No. 264-633224-84 Bancolombia a nombre de MAVI PAVIMENTACIONES SAS

1. Esta factura cumple con la ley 1231 de 2008 como Título valor.
2. A la presente factura se aplicarán, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio art.774 del Cód.de Co.
3. A partir del vencimiento se causarán intereses por mora a la tasa máxima legal autorizada.
4. De NO reclamarse contra el contenido de la factura de venta, dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la misma, se dara aceptada irrevocablemente.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
CGvTLw15y3zNqh47p5e2u2xlU52OyuX01P+8w9T1aGQMdiwQKz/URWlDRUssiNztvrnFW+tip7jCxOY/6pw+ajd+O+TwO8U2QmUlpx7f1m5k5/6XzwhUH+jh4F
A2Q632m1W9tThz+cz80z/1NQAnOTsCuk65ZNnNyHStRJpoagU6E1DzPztBhFyR7fJfEA/0QnmuOeRscCYGX0GcSQdWFdSQTS0aVywah5GOQcv9pdsB1Q
QaUqfzxYo5CZFnntz0E9m6PF3czDpdt9e0RSYXDVJCRk0a7sekRLoo575Ka6Y1JzwvDnBu9nS5nVabELuldPZ4EZ7Pcl0Ys2YhfjSdg==

CUFE: e387fae913ec8cd9cc0c17ef6de54c94e9181aeaf033927051683a412c12b04ea4025a52ba69cfcfd569769191ad91f0
Fecha emisión: 2024-05-08 16:43:48 **Fecha validación DIAN:** 2024-05-08 16:44:48-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Oficina : Carrera 7B No. 20 -86 Barrio la Magdalena Tel (1) 8335700 - 8552000
Planta de Produccion: Km 2 Via el paso - Carmen de Apicala Tel 3167428283
Web: www.mavi.com.co E-mail: gerencia@mavi.com.co

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202400022

FECHA DE INGRESO: FUSAGASUGA MIÉRCOLES, 8 MAYO 2024 **Factura Nº:** MA967

REQUISICION DE SUMINISTRO No **202400002**

Proveedor MAVI PAVIMENTACIONES SAS, DIR: CRA. 2 ESTE NO. 8-19 OFICINA 106 FUSAGASUGA, TEL:8675509 , NIT: 800219167 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	104010230	MEZCLA CALIENTE MDC-19 EN CALIENTE INVIAS 450-02	M3	540.84	828240	447,945,321.60
2	104010232	EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	KG	4,530.00	4224.5	19,136,985.00
					Total $	**467,082,306.60**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	467,082,306.60
Total $	**467,082,306.60**

Detalle: CLAUSULADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO NO 2024-0196, DEL 01 DE ABRIL DE 2024 PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

Destino: A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 60 CTVS. MC.

ALMACENISTA GENERAL **COORDINADOR ALMACEN**

ALCALDIA DE FUSAGASUGA

Nit: 890680008-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202400245

FECHA DE SALIDA: FUSAGASUGA MIÉRCOLES, 8 MAYO 2024

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202400022** del **08/05/2024** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - 8.0.0 **Centro Costo**

RESPONSABLE RAUL ARANGUREN MARTINEZ, C.C.1118535349

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	M3	104010230	540.840	MEZCLA CALIENTE MDC-19 EN CALIENTE INVIAS 450-02	828,240.00	447,945,321.60
2	KG	104010232	4,530.000	EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	4,224.50	19,136,985.00
					Total $	**467,082,306.60**

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	467,082,306.60
Total $	**467,082,306.60**

Detalle: CLAUSULADO DE CONTRATO DE SUMINISTRO NO 2024-0196, DEL 01 DE ABRIL DE 2024 PARA EL SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.

Destino: A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

SON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON 60 CTVS. MC.

	RAUL ARANGUREN MARTINEZ	RAUL ARANGUREN MARTINEZ
COORDINADOR ALMACEN	**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	**RECIBIDO**

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	156,0	11,0	89,0	80	95
3/8	151,0	10,6	78,3	70	88
#4	297,0	20,9	57,4	49	65
#10	265,0	18,7	38,7	29	45
#40	285,0	20,1	18,6	14	25
#80	124,0	8,7	9,9	8	17
#200	75,0	5,3	4,6	4	8
Pasa	65,0	4,6			
TOTAL	1.418,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 03/2024
HORA:	09:50 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,39
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	THV 078

CURVA GRANULOMETRICA

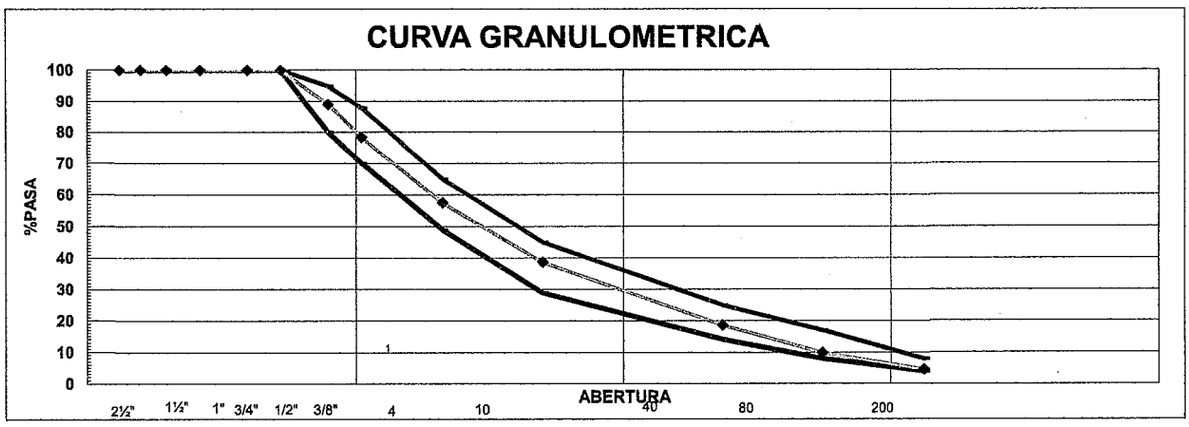

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.197,0	1.194,0	1.195,0	1.199,0	1.196,3
Peso Briqueta Agua (gr)		671,0	669,0	671,0	673,0	671,0
Peso briqueta SSS (gr)		1.198,0	1.195,0	1.196,0	1.200,0	1.197,3
Volumen Briqueta (cm3)		527,0	526,0	525,0	527,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,271	2,270	2,276	2,275	2,273
Estabilidad Medida (N)		13.106	12.785	12.518	12.229	
Estabilidad Corregida (N)		13.106	12.785	12.518	12.229	12.660
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,8	3,4	3,8	3,7	3,7
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,8
Vacios con aire: %	3-5					4,89
Vacios en agregados totales						83,2
vacio llenos de asfalto:	65-75					71,5
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,14					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,89				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,45	3,76	3,29	3,31	3,45

NORMA INVIAS 2012

ELABORO: _____

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	129,0	9,1	90,9	80	95
3/8	156,0	11,0	79,9	70	88
#4	312,0	22,0	57,9	49	65
#10	263,0	18,6	39,3	29	45
#40	293,0	20,7	18,6	14	25
#80	113,0	8,0	10,7	8	17
#200	75,0	5,3	5,4	4	8
Pasa	76,0	5,4			
TOTAL	1.417,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 04/2024
HORA:	09:50 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,41
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	THV 078

CURVA GRANULOMETRICA

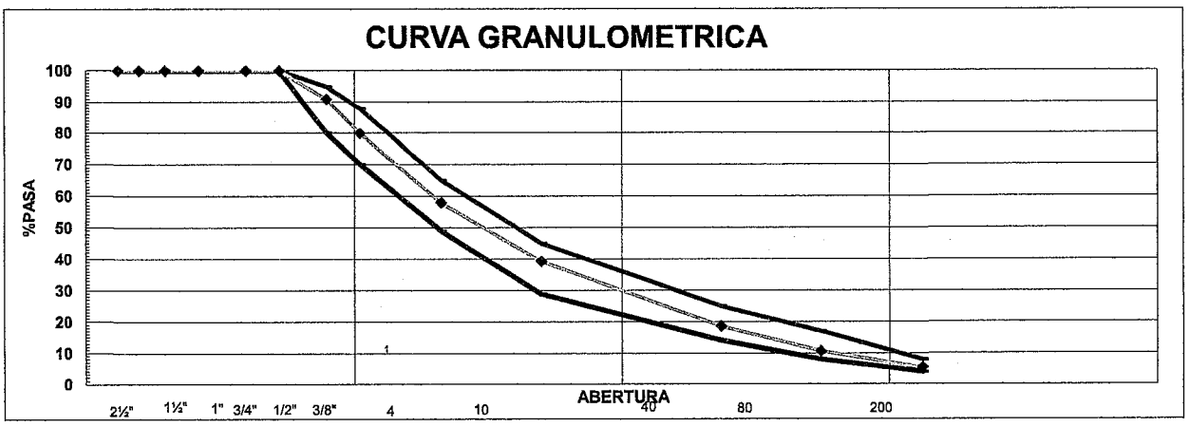

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.195,0	1.197,0	1.196,0	1.192,0	1.195,0
Peso Briqueta Agua (gr)		671,0	672,0	671,0	668,0	670,5
Peso briqueta SSS (gr)		1.196,0	1.198,0	1.197,0	1.193,0	1.196,0
Volumen Briqueta (cm3)		525,0	526,0	526,0	525,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,276	2,276	2,274	2,270	2,274
Estabilidad Medida (N)		12.465	12.743	12.658	12.378	
Estabilidad Corregida (N)		12.465	12.743	12.658	12.378	12.561
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,6	3,5	3,2	3,7	3,5
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,8
Vacios con aire: %	3-5					4,85
Vacios en agregados totales						83,2
vacio silenos de asfalto:	65-75					71,7
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,13					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2			1,05		
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,46	3,64	3,96	3,35	3,60

NORMA INVIAS 2012

ELABORO:

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	194,0	13,7	86,3	80	95
3/8	106,0	7,5	78,7	70	88
#4	290,0	20,6	58,2	49	65
#10	270,0	19,1	39,1	29	45
#40	288,0	20,4	18,6	14	25
#80	125,0	8,9	9,8	8	17
#200	69,0	4,9	4,9	4	8
Pasa	69,0	4,9			
TOTAL	1.411,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 05/2024
HORA:	09:30 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,38
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	THV 078

CURVA GRANULOMETRICA

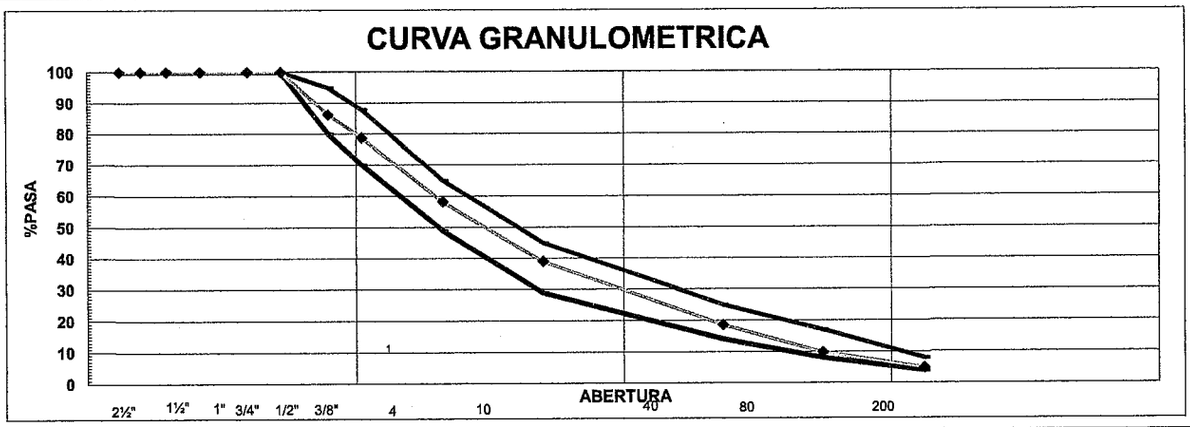

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.192,0	1.195,0	1.199,0	1.194,0	1.195,0
Peso Briqueta Agua (gr)		670,0	672,0	674,0	671,0	671,8
Peso briqueta SSS (gr)		1.193,0	1.196,0	1.201,0	1.195,0	1.196,3
Volumen Briqueta (cm3)		523,0	524,0	527,0	524,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,279	2,281	2,275	2,279	2,278
Estabilidad Medida (N)		12.915	12.653	11.989	12.533	
Estabilidad Corregida (N)		12.915	12.653	11.989	12.533	12.523
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,5	3,1	3,6	3,4	3,4
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,6
Vacios con aire: %	3-5					4,67
Vacios en agregados totales						83,4
vacio llenos de asfalto:	65-75					72,4
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,15					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,95				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,69	4,08	3,33	3,69	3,70

NORMA INVIAS 2012

ELABORO:

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad


ANALISIS DE LABORATORIO

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	170,0	12,0	88,0	80	95
3/8	140,0	9,9	78,1	70	88
#4	304,0	21,5	56,6	49	65
#10	252,0	17,8	38,8	29	45
#40	297,0	21,0	17,8	14	25
#80	114,0	8,1	9,8	8	17
#200	71,0	5,0	4,7	4	8
Pasa	67,0	4,7			
TOTAL	1.415,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 08/2024
HORA:	09:50 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,42
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	THV 078

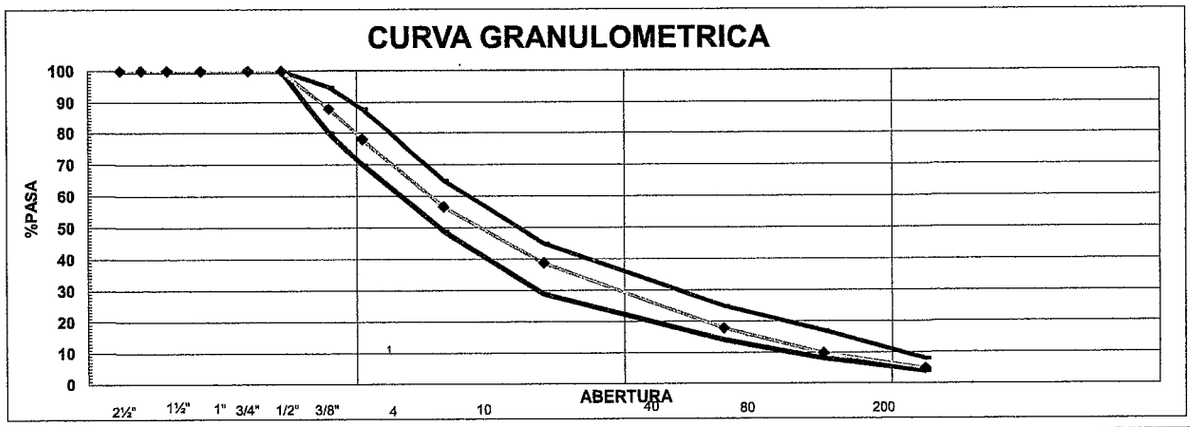

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.197,0	1.198,0	1.196,0	1.199,0	1.197,5
Peso Briqueta Agua (gr)		672,0	673,0	673,0	675,0	673,3
Peso briqueta SSS (gr)		1.198,0	1.199,0	1.197,0	1.200,0	1.198,5
Volumen Briqueta (cm3)		526,0	526,0	524,0	525,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,276	2,278	2,282	2,284	2,280
Estabilidad Medida (N)		12.547	12.841	11.944	12.967	
Estabilidad Corregida (N)		12.547	12.841	11.944	12.967	12.575
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,3	3,6	3,2	3,5	3,4
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,6
Vacios con aire: %	3-5					4,61
Vacios en agregados totales						83,4
vacio llenos de asfalto:	65-75					72,8
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,12					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,92				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,80	3,57	3,73	3,70	3,70

NORMA INVIAS 2012

ELABORO: _____

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	194,0	13,7	86,3	80	95
3/8	116,0	8,2	78,1	70	88
#4	290,0	20,5	57,6	49	65
#10	275,0	19,4	38,2	29	45
#40	278,0	19,6	18,6	14	25
#80	119,0	8,4	10,2	8	17
#200	75,0	5,3	4,9	4	8
Pasa	69,0	4,9			
TOTAL	1.416,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 09/2024
HORA:	07:45 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,52
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	THV 078

CURVA GRANULOMETRICA

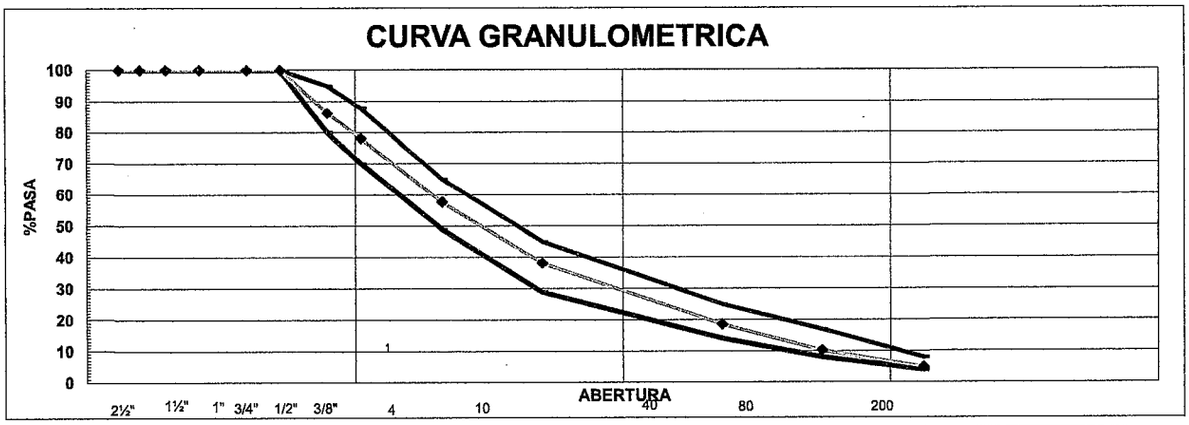

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.196,0	1.198,0	1.193,0	1.195,0	1.195,5
Peso Briqueta Agua (gr)		672,0	674,0	669,0	671,0	671,5
Peso briqueta SSS (gr)		1.198,0	1.199,0	1.194,0	1.197,0	1.197,0
Volumen Briqueta (cm3)		526,0	525,0	525,0	526,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,274	2,282	2,272	2,272	2,275
Estabilidad Medida (N)		13.018	12.896	12.691	12.903	
Estabilidad Corregida (N)		13.018	12.896	12.691	12.903	12.877
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,8	3,7	3,3	3,5	3,6
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,9
Vacios con aire: %	3-5					4,81
Vacios en agregados totales						83,1
vacio silenos de asfalto:	65-75					72,3
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,06					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,96				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,43	3,49	3,85	3,69	3,61

NORMA INVIAS 2012

ELABORO: _____

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**


GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	194,0	13,7	86,3	80	95
3/8	110,0	7,8	78,5	70	88
#4	290,0	20,5	58,0	49	65
#10	270,0	19,1	38,9	29	45
#40	288,0	20,4	18,5	14	25
#80	124,0	8,8	9,8	8	17
#200	69,0	4,9	4,9	4	8
Pasa	69,0	4,9			
TOTAL	1.414,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA

FECHA:	ABRIL 10/2024
HORA:	09:50 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,44
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	THV 078

CURVA GRANULOMETRICA

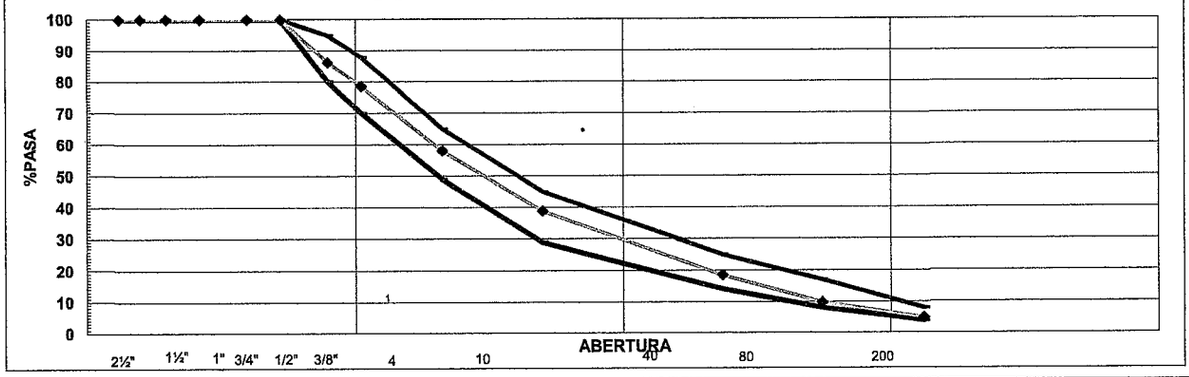

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.192,0	1.197,0	1.198,0	1.191,0	1.194,5
Peso Briqueta Agua (gr)		672,0	673,0	674,0	670,0	672,3
Peso briqueta SSS (gr)		1.194,0	1.199,0	1.200,0	1.193,0	1.196,5
Volumen Briqueta (cm3)		522,0	526,0	526,0	523,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,284	2,276	2,278	2,277	2,279
Estabilidad Medida (N)		12.850	12.910	12.230	12.475	
Estabilidad Corregida (N)		12.850	12.910	12.230	12.475	12.616
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,6	3,7	3,9	3,8	3,8
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,7
Vacios con aire: %	3-5					4,67
Vacios en agregados totales						83,3
vacio silenos de asfalto:	65-75					72,7
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,11					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,95				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,57	3,49	3,14	3,28	3,37

NORMA INVIAS 2012

ELABORO:

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	194,0	13,7	86,3	80	95
3/8	106,0	7,5	78,8	70	88
#4	290,0	20,5	58,3	49	65
#10	270,0	19,1	39,3	29	45
#40	288,0	20,3	18,9	14	25
#80	135,0	9,5	9,4	8	17
#200	69,0	4,9	4,5	4	8
Pasa	64,0	4,5			
TOTAL	1.416,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 11/2024
HORA:	08:30 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,35
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	THV 078

CURVA GRANULOMETRICA

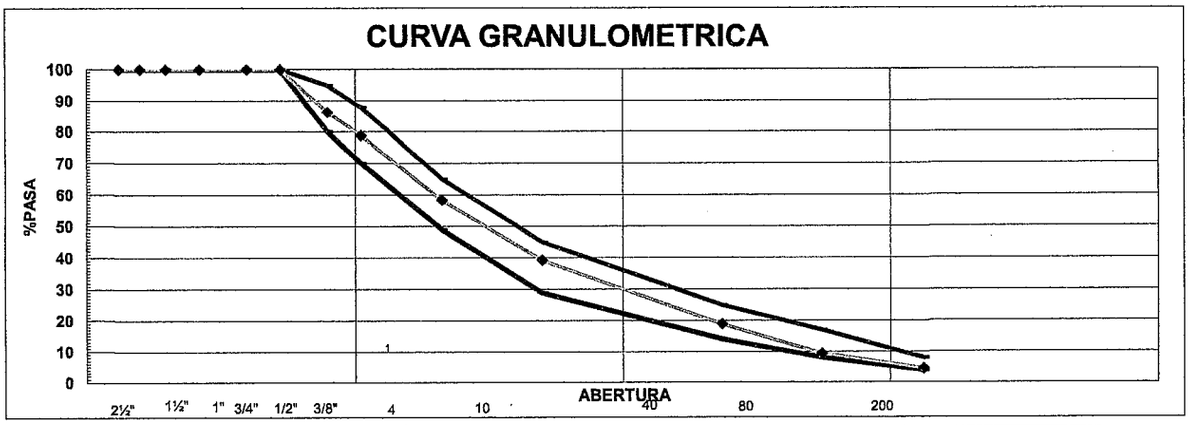

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.196,0	1.193,0	1.195,0	1.196,0	1.195,0
Peso Briqueta Agua (gr)		671,0	669,0	670,0	672,0	670,5
Peso briqueta SSS (gr)		1.197,0	1.194,0	1.196,0	1.197,0	1.196,0
Volumen Briqueta (cm3)		526,0	525,0	526,0	525,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,274	2,272	2,272	2,278	2,274
Estabilidad Medida (N)		12.743	12.468	12.317	12.119	
Estabilidad Corregida (N)		12.743	12.468	12.317	12.119	12.412
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,8	3,4	3,9	3,5	3,7
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,7
Vacios con aire: %	3-5					4,85
Vacios en agregados totales						83,3
vacio llenos de asfalto:	65-75					71,5
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,17					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,88				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,35	3,67	3,16	3,46	3,41

NORMA INVIAS 2012

ELABORO: _____

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	194,0	13,7	86,3	80	95
3/8	106,0	7,5	78,8	70	88
#4	290,0	20,5	58,4	49	65
#10	270,0	19,1	39,3	29	45
#40	288,0	20,3	19,0	14	25
#80	135,0	9,5	9,5	8	17
#200	69,0	4,9	4,6	4	8
Pasa	65,0	4,6			
TOTAL	1.417,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 16/2024
HORA:	09:15 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,45
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	THV 078

CURVA GRANULOMETRICA

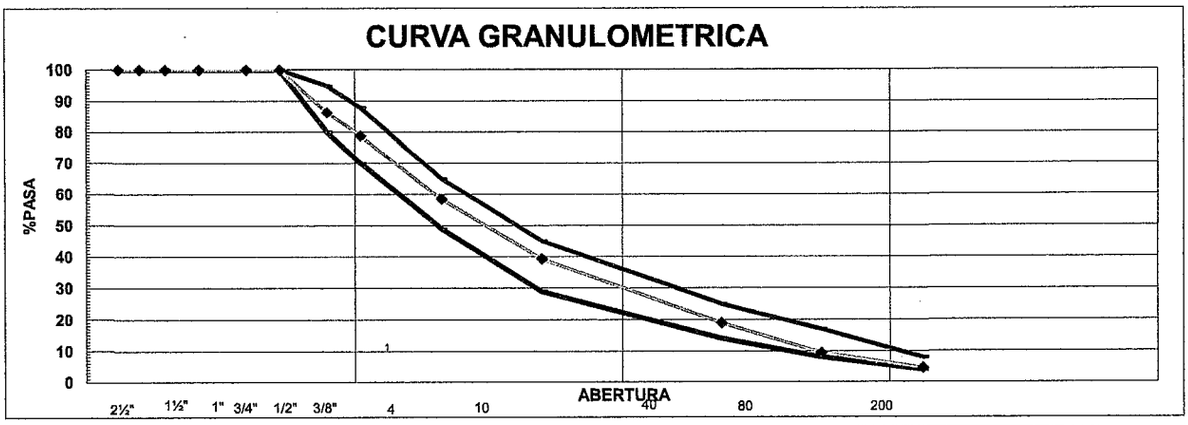

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.199,0	1.193,0	1.194,0	1.197,0	1.195,8
Peso Briqueta Agua (gr)		675,0	668,0	671,0	673,0	671,8
Peso briqueta SSS (gr)		1.200,0	1.194,0	1.195,0	1.198,0	1.196,8
Volumen Briqueta (cm3)		525,0	526,0	524,0	525,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,284	2,268	2,279	2,280	2,278
Estabilidad Medida (N)		12.220	11.930	12.716	12.738	
Estabilidad Corregida (N)		12.220	11.930	12.716	12.738	12.401
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,8	3,5	3,6	3,7	3,7
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,7
Vacios con aire: %	3-5					4,70
Vacios en agregados totales						83,3
vacio silenos de asfalto:	65-75					72,5
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,10					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,90				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,22	3,41	3,53	3,44	3,40

NORMA INVIAS 2012

ELABORO: _____

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	185,0	13,1	86,9	80	95
3/8	110,0	7,8	79,2	70	88
#4	306,0	21,6	57,6	49	65
#10	273,0	19,3	38,3	29	45
#40	281,0	19,8	18,4	14	25
#80	123,0	8,7	9,7	8	17
#200	67,0	4,7	5,0	4	8
Pasa	71,0	5,0			
TOTAL	1.416,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 17/2024
HORA:	09:15 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,46
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	THV 078

CURVA GRANULOMETRICA

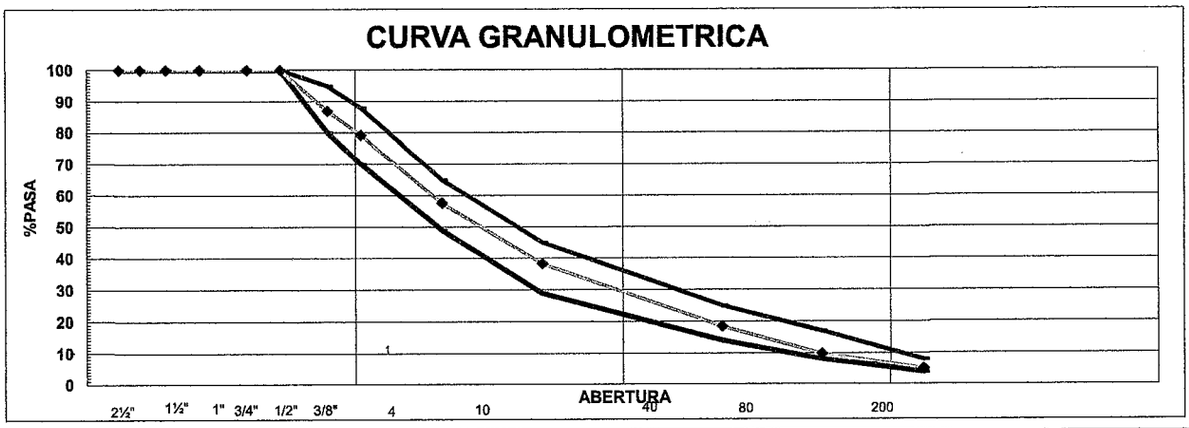

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.195,0	1.194,0	1.197,0	1.198,0	1.196,0
Peso Briqueta Agua (gr)		670,0	669,0	673,0	675,0	671,8
Peso briqueta SSS (gr)		1.196,0	1.195,0	1.198,0	1.199,0	1.197,0
Volumen Briqueta (cm3)		526,0	526,0	525,0	524,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,272	2,270	2,280	2,286	2,277
Estabilidad Medida (N)		12.486	12.721	12.269	13.101	
Estabilidad Corregida (N)		12.486	12.721	12.269	13.101	12.644
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,4	3,8	3,6	3,3	3,5
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,7
Vacios con aire: %	3-5					4,73
Vacios en agregados totales						83,3
vacio silenos de asfalto:	65-75					72,5
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,10					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,98				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,67	3,35	3,41	3,97	3,60

NORMA INVIAS 2012

ELABORO:

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad


ANALISIS DE LABORATORIO

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	196,0	13,8	86,2	80	95
3/8	89,0	6,3	79,9	70	88
#4	295,0	20,8	59,1	49	65
#10	286,0	20,2	38,9	29	45
#40	301,0	21,2	17,6	14	25
#80	110,0	7,8	9,9	8	17
#200	72,0	5,1	4,8	4	8
Pasa	68,0	4,8			
TOTAL	1.417,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 18/2024
HORA:	09:15 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,47
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	SQZ 298

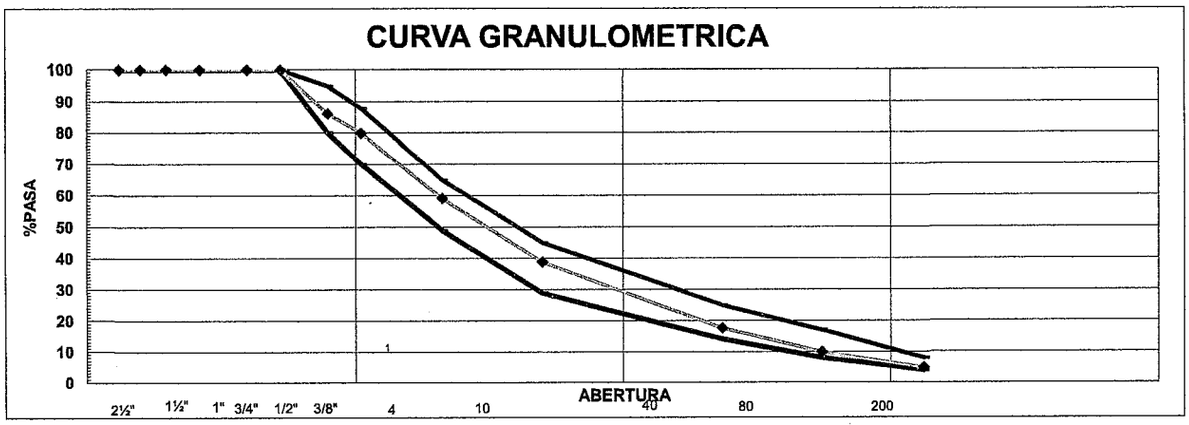

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.198,0	1.193,0	1.192,0	1.198,0	1.195,3
Peso Briqueta Agua (gr)		674,0	668,0	669,0	674,0	671,3
Peso briqueta SSS (gr)		1.199,0	1.194,0	1.193,0	1.199,0	1.196,3
Volumen Briqueta (cm3)		525,0	526,0	524,0	525,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,282	2,268	2,275	2,282	2,277
Estabilidad Medida (N)		12.998	12.228	12.957	12.292	
Estabilidad Corregida (N)		12.998	12.228	12.957	12.292	12.619
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,4	3,6	3,2	3,5	3,4
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,7
Vacios con aire: %	3-5					4,74
Vacios en agregados totales						83,3
vacio llenos de asfalto:	65-75					72,4
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,09					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,94				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,82	3,40	4,05	3,51	3,70

NORMA INVIAS 2012

ELABORO:

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	221,0	15,6	84,4	80	95
3/8	118,0	8,3	76,1	70	88
#4	279,0	19,7	56,4	49	65
#10	262,0	18,5	37,9	29	45
#40	291,0	20,5	17,4	14	25
#80	109,0	7,7	9,7	8	17
#200	67,0	4,7	5,0	4	8
Pasa	71,0	5,0			
TOTAL	1.418,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 19/2024
HORA:	09:15 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,55
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	SQZ 298

CURVA GRANULOMETRICA

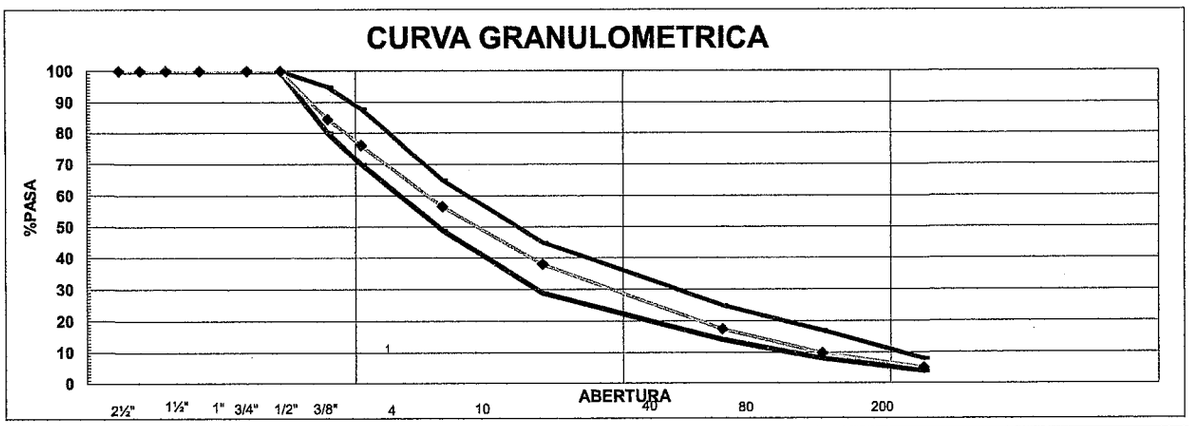

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.200,0	1.198,0	1.198,0	1.196,0	1.198,0
Peso Briqueta Agua (gr)		676,0	673,0	675,0	672,0	674,0
Peso briqueta SSS (gr)		1.201,0	1.199,0	1.199,0	1.197,0	1.199,0
Volumen Briqueta (cm3)		525,0	526,0	524,0	525,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,286	2,278	2,286	2,278	2,282
Estabilidad Medida (N)		11.960	12.503	12.318	12.771	
Estabilidad Corregida (N)		11.960	12.503	12.318	12.771	12.388
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,5	3,6	3,8	3,2	3,5
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,6
Vacios con aire: %	3-5					4,52
Vacios en agregados totales						83,4
vacio llenos de asfalto:	65-75					73,7
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,04					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2			0,99		
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,42	3,47	3,24	3,99	3,53

NORMA INVIAS 2012

ELABORO: _____

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	193,0	13,6	86,4	80	95
3/8	121,0	8,5	77,8	70	88
#4	302,0	21,3	56,5	49	65
#10	267,0	18,8	37,7	29	45
#40	276,0	19,5	18,2	14	25
#80	112,0	7,9	10,3	8	17
#200	70,0	4,9	5,4	4	8
Pasa	76,0	5,4			
TOTAL	1.417,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 22/2024
HORA:	09:15 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,45
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	SQZ 298

CURVA GRANULOMETRICA

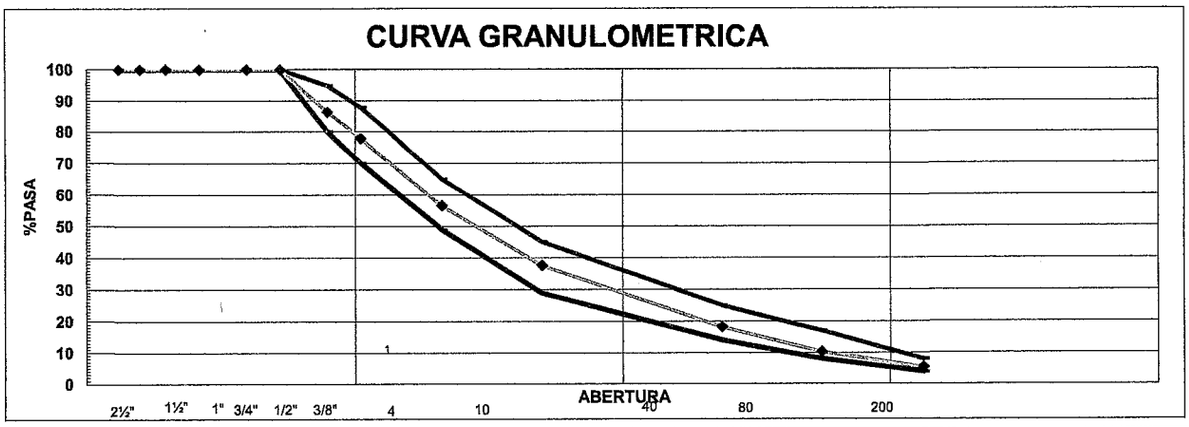

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.196,0	1.191,0	1.198,0	1.195,0	1.195,0
Peso Briqueta Agua (gr)		672,0	666,0	675,0	671,0	671,0
Peso briqueta SSS (gr)		1.197,0	1.192,0	1.199,0	1.196,0	1.196,0
Volumen Briqueta (cm3)		525,0	526,0	524,0	525,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,278	2,264	2,286	2,276	2,276
Estabilidad Medida (N)		12.152	12.497	12.448	12.802	
Estabilidad Corregida (N)		12.152	12.497	12.448	12.802	12.475
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,2	3,8	3,5	3,7	3,6
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,7
Vacios con aire: %	3-5					4,76
Vacios en agregados totales						83,3
vacio llenos de asfalto:	65-75					72,3
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,10					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	1,05				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,80	3,29	3,56	3,46	3,53

NORMA INVIAS 2012

ELABORO:

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	162,0	11,4	88,6	80	95
3/8	135,0	9,5	79,0	70	88
#4	329,0	23,3	55,8	49	65
#10	243,0	17,2	38,6	29	45
#40	294,0	20,8	17,8	14	25
#80	114,0	8,1	9,8	8	17
#200	70,0	4,9	4,8	4	8
Pasa	68,0	4,8			
TOTAL	1.415,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 23/2024
HORA:	09:15 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,43
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	SQZ 298

CURVA GRANULOMETRICA

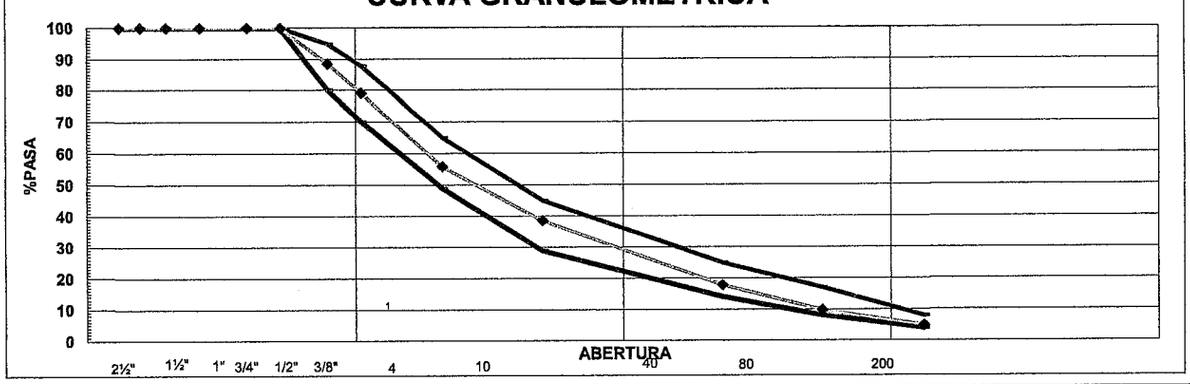

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.195,0	1.193,0	1.197,0	1.192,0	1.194,3
Peso Briqueta Agua (gr)		671,0	668,0	674,0	668,0	670,3
Peso briqueta SSS (gr)		1.196,0	1.194,0	1.198,0	1.193,0	1.195,3
Volumen Briqueta (cm3)		525,0	526,0	524,0	525,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,276	2,268	2,284	2,270	2,275
Estabilidad Medida (N)		12.992	12.533	12.424	12.148	
Estabilidad Corregida (N)		12.992	12.533	12.424	12.148	12.524
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,2	3,3	3,6	3,2	3,3
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,8
Vacios con aire: %	3-5					4,82
Vacios en agregados totales						83,2
vacio llenos de asfalto:	65-75					71,9
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,12					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,94				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	4,06	3,80	3,45	3,80	3,78

NORMA INVIAS 2012

ELABORO:

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	189,0	13,3	86,7	80	95
3/8	120,0	8,5	78,2	70	88
#4	307,0	21,7	56,5	49	65
#10	260,0	18,3	38,2	29	45
#40	281,0	19,8	18,3	14	25
#80	110,0	7,8	10,6	8	17
#200	78,0	5,5	5,1	4	8
Pasa	72,0	5,1			
TOTAL	1.417,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 24/2024
HORA:	09:15 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,33
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	SQZ 298

CURVA GRANULOMETRICA

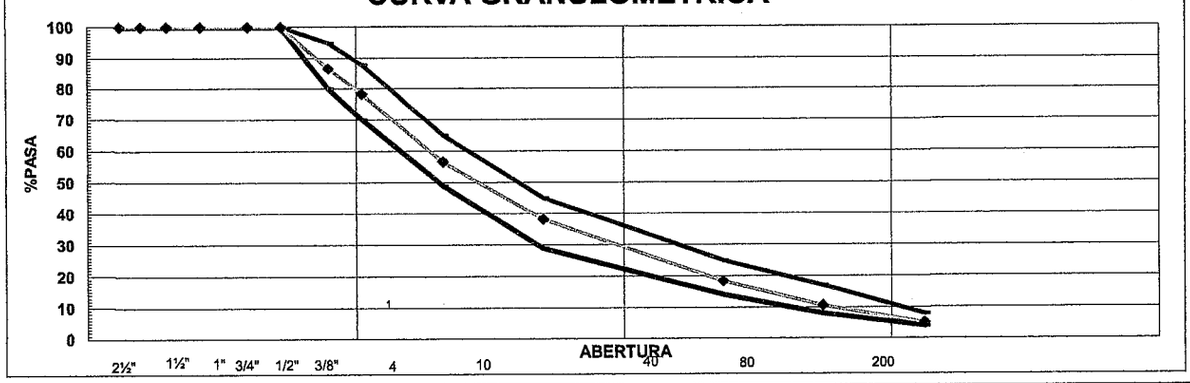

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.196,0	1.194,0	1.196,0	1.198,0	1.196,0
Peso Briqueta Agua (gr)		672,0	669,0	673,0	674,0	672,0
Peso briqueta SSS (gr)		1.197,0	1.195,0	1.197,0	1.199,0	1.197,0
Volumen Briqueta (cm3)		525,0	526,0	524,0	525,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,278	2,270	2,282	2,282	2,278
Estabilidad Medida (N)		12.142	12.518	12.143	12.954	
Estabilidad Corregida (N)		12.142	12.518	12.143	12.954	12.439
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,5	3,4	3,5	3,9	3,6
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,6
Vacios con aire: %	3-5					4,68
Vacios en agregados totales						83,4
vacio llenos de asfalto:	65-75					72,2
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,18					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,98				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,47	3,68	3,47	3,32	3,49

NORMA INVIAS 2012

ELABORO: _____

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	201,0	14,2	85,8	80	95
3/8	106,0	7,5	78,3	70	88
#4	301,0	21,2	57,1	49	65
#10	282,0	19,9	37,2	29	45
#40	291,0	20,5	16,7	14	25
#80	102,0	7,2	9,5	8	17
#200	68,0	4,8	4,7	4	8
Pasa	66,0	4,7			
TOTAL	1.417,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 25/2024
HORA:	09:15 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,36
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	SQZ 298

CURVA GRANULOMETRICA

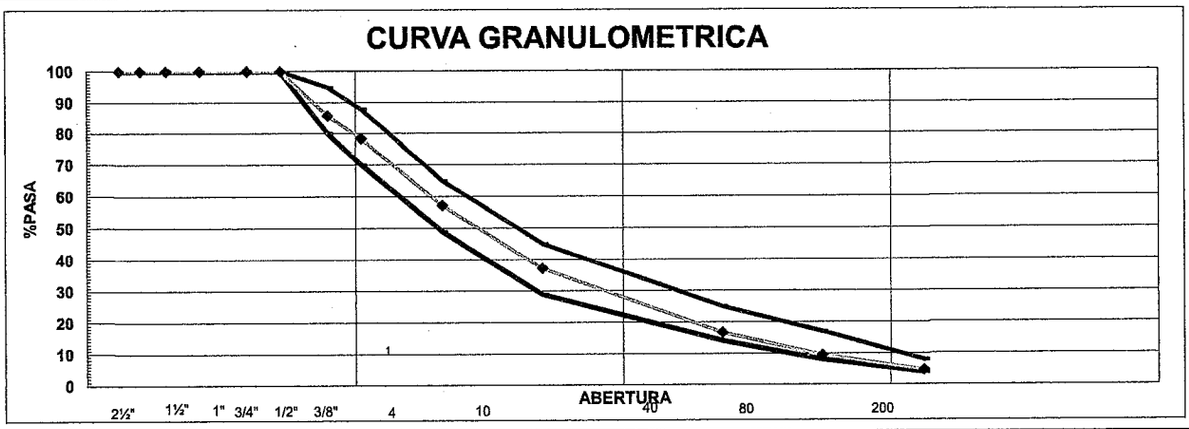

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.197,0	1.196,0	1.194,0	1.196,0	1.195,8
Peso Briqueta Agua (gr)		671,0	671,0	671,0	672,0	671,3
Peso briqueta SSS (gr)		1.198,0	1.197,0	1.195,0	1.197,0	1.196,8
Volumen Briqueta (cm3)		527,0	526,0	524,0	525,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,271	2,274	2,279	2,278	2,275
Estabilidad Medida (N)		12.655	12.745	12.990	12.650	
Estabilidad Corregida (N)		12.655	12.745	12.990	12.650	12.760
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,6	3,5	3,8	3,9	3,7
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,7
Vacios con aire: %	3-5					4,79
Vacios en agregados totales						83,3
vacio llenos de asfalto:	65-75					71,8
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,16					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,90				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,52	3,64	3,42	3,24	3,45

NORMA INVIAS 2012

ELABORO: _____

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	215,0	15,2	84,8	80	95
3/8	111,0	7,8	77,0	70	88
#4	279,0	19,7	57,4	49	65
#10	259,0	18,3	39,1	29	45
#40	309,0	21,8	17,3	14	25
#80	107,0	7,5	9,8	8	17
#200	71,0	5,0	4,8	4	8
Pasa	68,0	4,8			
TOTAL	1.419,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 26/2024
HORA:	09:15 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,38
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	SQZ 298

CURVA GRANULOMETRICA

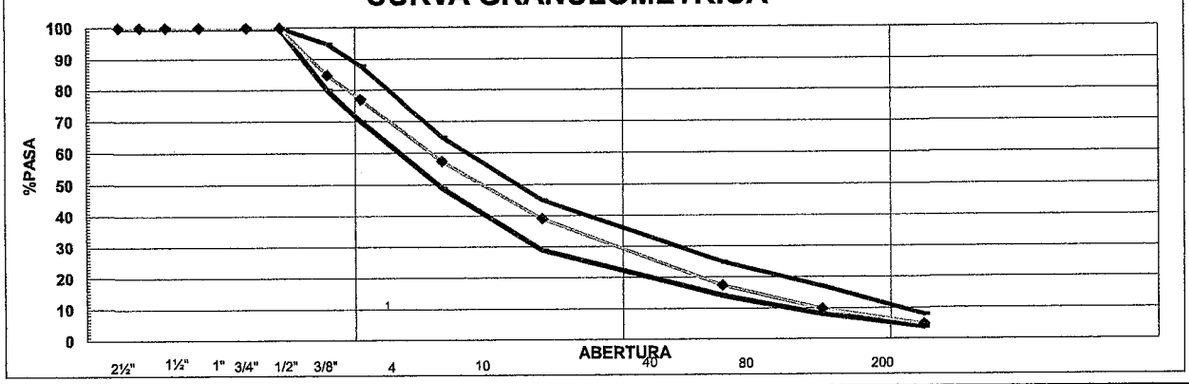

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.192,0	1.196,0	1.194,0	1.190,0	1.193,0
Peso Briqueta Agua (gr)		670,0	671,0	669,0	670,0	670,0
Peso briqueta SSS (gr)		1.194,0	1.197,0	1.196,0	1.193,0	1.195,0
Volumen Briqueta (cm3)		524,0	526,0	527,0	523,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,275	2,274	2,266	2,275	2,272
Estabilidad Medida (N)		12.960	12.470	12.185	12.540	
Estabilidad Corregida (N)		12.960	12.470	12.185	12.540	12.539
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,4	3,8	3,9	3,6	3,7
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,8
Vacios con aire: %	3-5					4,92
Vacios en agregados totales						83,2
vacio llenos de asfalto:	65-75					71,3
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,15					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,93				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,81	3,28	3,12	3,48	3,43

NORMA INVIAS 2012

ELABORO: _____

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | FL-MA-005

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	155,0	11,0	89,0	80	95
3/8	139,0	9,8	79,2	70	88
#4	316,0	22,3	56,9	49	65
#10	246,0	17,4	39,5	29	45
#40	291,0	20,6	18,9	14	25
#80	126,0	8,9	10,0	8	17
#200	74,0	5,2	4,7	4	8
Pasa	67,0	4,7			
TOTAL	1.414,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 29/2024
HORA:	09:15 AM .
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE FUSAGASUGA
CONTRATO No:	196 - 2024
Contenido asfalto (%):	5,46
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	SQZ 298

CURVA GRANULOMETRICA

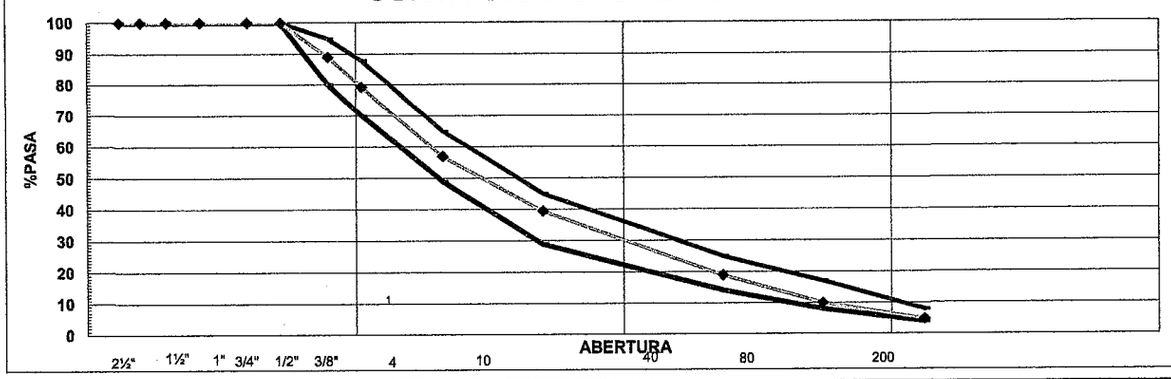

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.195,0	1.198,0	1.199,0	1.192,0	1.196,0
Peso Briqueta Agua (gr)		671,0	673,0	676,0	668,0	672,0
Peso briqueta SSS (gr)		1.196,0	1.199,0	1.200,0	1.193,0	1.197,0
Volumen Briqueta (cm3)		525,0	526,0	524,0	525,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,276	2,278	2,288	2,270	2,278
Estabilidad Medida (N)		12.617	12.590	12.417	13.047	
Estabilidad Corregida (N)		12.617	12.590	12.417	13.047	12.668
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,3	3,7	3,5	3,4	3,5
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,7
Vacios con aire: %	3-5					4,68
Vacios en agregados totales						83,3
vacio silenos de asfalto:	65-75					72,7
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,10					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	0,93				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,82	3,40	3,55	3,84	3,65

NORMA INVIAS 2012

ELABORO: _____

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

ANALISIS DE LABORATORIO


MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S | **FL-MA-005**

GRANULOMETRIA

RESULTADO OBTENIDO				NORMA	
TAMIZ	RETENIDO g	% RETENIDO	%PASA	INFERIOR	SUPERIOR
3	-	0,0	100	100	100
2 1/2	-	0,0	100	100	100
2	-	0,0	100	100	100
1 1/2	-	0,0	100	100	100
1	-	0,0	100	100	100
3/4	-	0,0	100	100	100
1/2	145,0	10,3	89,7	80	95
3/8	135,0	9,5	80,2	70	88
#4	317,0	22,4	57,8	49	65
#10	244,0	17,3	40,5	29	45
#40	312,0	22,1	18,5	14	25
#80	118,0	8,3	10,1	8	17
#200	69,0	4,9	5,2	4	8
Pasa	74,0	5,2			
TOTAL	1.414,0				

MATERIAL:	MDC-19 RODADURA
FECHA:	ABRIL 30/2024
HORA:	09:15 AM .
CONTRATANTE:	
ALCALDIA DE FUSAGASUGA	
CONTRATO No:	
196 - 2024	
Contenido asfalto (%):	5,47
Contenido Diseño (%):	5,4
Rango	5,1 - 5,7
TEMP. GRADOS C:	150
VOLQUETA:	SQZ 298

CURVA GRANULOMETRICA

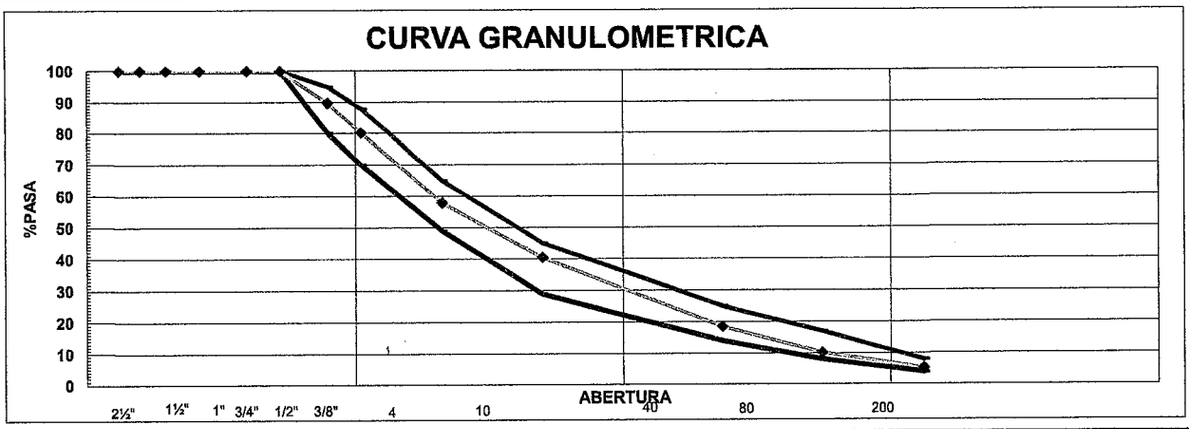

No de Briqueta	NORMA	69	70	71	72	PROMEDIO
No de Golpes por cara	75	75	75	75	75	
Temperatura (Centigrados)		134-138				
Peso briqueta Aire (gr)		1.191,0	1.195,0	1.198,0	1.197,0	1.195,3
Peso Briqueta Agua (gr)		668,0	672,0	674,0	671,0	671,3
Peso briqueta SSS (gr)		1.193,0	1.198,0	1.200,0	1.199,0	1.197,5
Volumen Briqueta (cm3)		525,0	526,0	526,0	528,0	
Peso unitario mezcla Total (gr/cm3)		2,269	2,272	2,278	2,267	2,271
Estabilidad Medida (N)		12.890	12.330	12.690	12.570	
Estabilidad Corregida (N)		12.890	12.330	12.690	12.570	12.620
Flujo (1/100 pulg)	2-4	3,4	3,5	3,6	3,7	3,6
Factor de Correccion (Inv. E748)		1,00	1,00	1,00	1,00	
Densidad Teorica (gr/cm3) RICE						2,390
Vacios minimos en agragados minerales:%	min 15					16,9
Vacios con aire: %	3-5					4,97
Vacios en agregados totales						83,1
vacio silenos de asfalto:	65-75					71,4
PESO ESPECIFICO DE LOS AGREGADOS	2,585					
GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA TEORICA	2,38					
ASFALTO EFECTIVO	5,09					
RELACION LLENANTE / LIGANTE	0,8 - 1,2	1,03				
RELACION ESTABILIDAD /FLUJO (KN/mm)	3 - 6	3,79	3,52	3,53	3,40	3,56

NORMA INVIAS 2012

ELABORO: _____

Ing NESTOR IVAN MIRANDA D.
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS

ECOPETROL
ENERGÍA PARA EL FUTURO

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS


CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: ASFALTO 60/70
NÚMERO DE MUESTRA: 2404120392
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 12/04/2024 17:13
FECHA DE VOBO: 12/04/2024 20:26
ALMACENAMIENTO: K0206
CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
VISCOSIDAD A 80 C	12-04-2024 20:23	19042	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
VISCOSIDAD A 135 C	12-04-2024 20:23	358.3	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
VISCOSIDAD A 150 C	12-04-2024 20:23	178.1	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
VISCOSIDAD A 60 C	12-04-2024 19:57	194000	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
VISCOSIDAD A 100 C	12-04-2024 19:57	3011	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
DUCTILIDAD (25°C, 5cm/min)	12-04-2024 20:23	140	cm	100 Mínimo	ASTM D 113 DUCTILIDAD ASFALTOS
GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C					
GRAVEDAD API	12-04-2024 18:26	7.7	Grados API	REPORTAR	ASTM D 4052-18a DENSIDAD DIGITAL
DENSIDAD A 15 °C	12-04-2024 18:26	1015.9	kg/m3	REPORTAR	ASTM D 4052-18a DENSIDAD DIGITAL
PENETRACION A 25°C, 100g, 5s	12-04-2024 19:57	68	mm/10	60 Mínimo - 70 Máximo	ASTM D 5 INDICE DE PENETRACION CALCULADO
INDICE DE PENETRACION	12-04-2024 19:57	-1	N/A	REPORTAR	ASTM D 5 INDICE DE PENETRACION CALCULADO
PERDIDA DE MASA	12-04-2024 20:23	0.116	g/100g	1.0 Máximo	ASTM D 2872 PERDIDA DE MASA
PUNTO DE ABLANDAMIENTO	12-04-2024 19:37	47.8	°C	45 Mínimo - 55 Máximo	ASTM D 36 PUNTO ABLANDAMIENTO
PUNTO DE INFLAMACION	12-04-2024 19:58	294	°C	232 Mínimo	ASTM D 92-16b PUNTO INFLAM COPA ABIER CLEV
SOLUBILIDAD EN ASFALTOS	12-04-2024 20:23	99.98	%	99 Mínimo	ASTM D 2042 SOLUBILIDAD EN ASFALTOS
VISTO BUENO TANQUES					
VoBo	12-04-2024 20:23	SI	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

CURVA REOLÓGICA

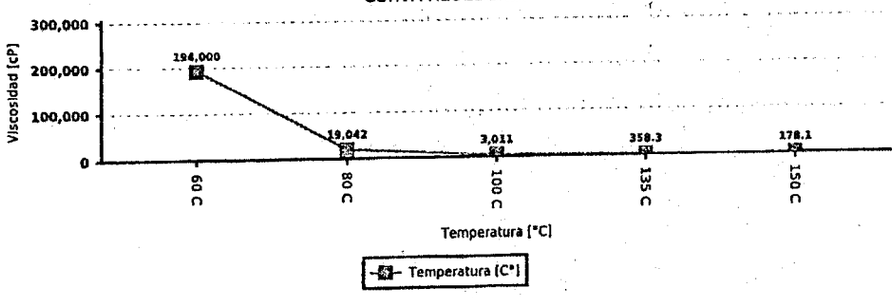

VoBo. Nombre:

JOHN FERNANDO GONZÁLEZ ESPINOSA

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.
"Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A –COMPLEJO INDUSTRIAL
* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097620) 9900/9907 fax (097620) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 5001/5091/5668/4670/5671/5666 FAX. (091231) 5565/5538 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
* Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 5001/5091/5667/5491. FAX (091231) 5565/5538. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
Nota 2: Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Comparado". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

Fecha de Impresión 13/04/2024 09:12

ECOPETROL
ENERGÍA PARA EL FUTURO

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: ASFALTO 60/70

NÚMERO DE MUESTRA: 2404220018

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/04/2024 08:42

FECHA DE VOBO: 22/04/2024 12:12


VOBO: SI

ALMACENAMIENTO: K0205

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
VISCOSIDAD A 80 C	22-04-2024 09:55	19042	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
VISCOSIDAD A 135 C	22-04-2024 09:55	358.3	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
VISCOSIDAD A 150 C	22-04-2024 09:55	178.1	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
VISCOSIDAD A 60 C	22-04-2024 09:36	204000	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
VISCOSIDAD A 100 C	22-04-2024 09:36	2961	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
DUCTILIDAD (25°C, 5cm/min)	22-04-2024 09:55	140	cm	100 Mínimo	ASTM D 113 DUCTILIDAD ASFALTOS
GRAVEDAD API/DENSIDAD A 15 °C					
GRAVEDAD API	22-04-2024 09:31	7.1	Grados API	REPORTAR	ASTM D 4052-18a DENSIDAD DIGITAL
DENSIDAD A 15 °C	22-04-2024 09:31	1020.3	kg/m3	REPORTAR	ASTM D 4052-18a DENSIDAD DIGITAL
PENETRACION A 25°C, 100g, 5s	22-04-2024 12:07	63	mm/10	60 Mínimo - 70 Máximo	ASTM D 5 INDICE DE PENETRACION CALCULADO
INDICE DE PENETRACION	22-04-2024 12:07	-1.1	N/A	REPORTAR	ASTM D 5 INDICE DE PENETRACION CALCULADO
PERDIDA DE MASA	22-04-2024 09:55	0.118	g/100g	1.0 Máximo	ASTM D 2872 PERDIDA DE MASA
PUNTO DE ABLANDAMIENTO	22-04-2024 10:20	48.1	°C	45 Mínimo - 55 Máximo	ASTM D 36 PUNTO ABLANDAMIENTO
PUNTO DE INFLAMACION	22-04-2024 09:13	292	°C	232 Mínimo	ASTM D 92-16b PUNTO INFLAM COPA ABIER CLEV
SOLUBILIDAD EN ASFALTOS	22-04-2024 09:55	99.8	%	99 Mínimo	ASTM D 2042 SOLUBILIDAD EN ASFALTOS
VISTO BUENO TANQUES					
VoBo	22-04-2024 12:12	SI	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

CURVA REOLÓGICA

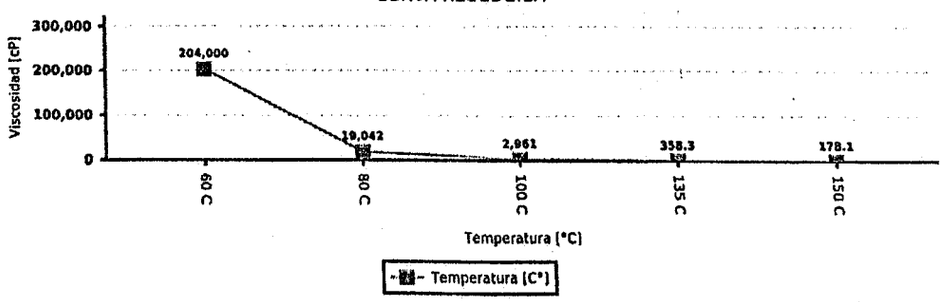

VoBo. Nombre:

JOHN FERNANDO GONZÁLEZ ESPINOSA

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.
"Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 5 CALLES 10 Y 10A –COMPLEJO INDUSTRIAL
" Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097620) 9900/9907 fax (097620) 9071 Refinería ECOPETHOL S.A.
" Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá. (091234) 5001/5091/5668/4670/5671/5668 FAX. (091231) 5695/5638 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
" Coordinación de Combustibles Bogotá. (09123) 5001/5091/5667/5491. FAX (091231) 5695/5638. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
Nota 2. Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN.
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos los cuales han sido comunicados al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

Fecha de Impresión 22/04/2024 22:51

ECOPETROL
ENERGÍA PARA EL FUTURO

GERENCIA REFINERIA BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CALIDAD

PRODUCTO: ASFALTO 60/70

NÚMERO DE MUESTRA: 2404220018

FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 22/04/2024 08:42

FECHA DE VOBO: 22/04/2024 12:12


VOBO: SI

ALMACENAMIENTO: K0205

CLIENTE: Depto. Materias Primas y Productos

ANÁLISIS	FECHA DE ANALISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
COMENTARIO	22-04-2024 12:12	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

CURVA REOLÓGICA

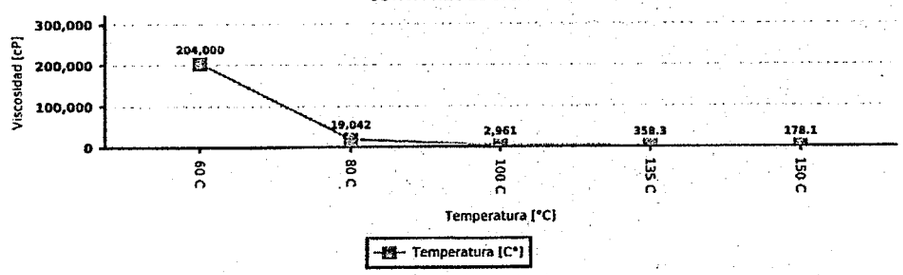

VoBo. Nombre:

JOHN FERNANDO GONZÁLEZ ESPINOSA

Nota 1: Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con la Gerencia de Comercialización.
*Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A –COMPLEJO INDUSTRIAL
* Coordinación de Comercialización Barrancabermeja: (097620) 9900/9907 fax (097620) 9071 Refinería ECOPETROL S.A.
* Coordinación de Petroquímicos e Industriales Bogotá: (091234) 5001/5091/5668/4670/5671/5666 FAX. (091231) 5565/5535 Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
* Coordinación de Combustibles Bogotá: (09123) 5001/5091/5667/5491. FAX (091231) 5565/5535. Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y objeto del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el polietileno adicionar el número de lote.
Nota 2. Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD.
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen estimadas las incertidumbres de los métodos de ensayos las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las Especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o cercano al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8:09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre estos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

Fecha de Impresión 22/04/2024 22:51

222

Inco Asfaltos	GESTIÓN DE PRODUCCION DE MATERIALES ASFÁLTICOS	CODIGO: GB-CC-F-014
	CERTIFICADO DE CALIDAD EMULSIÓN ASFALTICA CATIÓNICA	VERSIÓN: 2
		FECHA: 7-03-2022

TIPO EMULSION	CRL-1
LOTE	EMU23098
FECHA	7-dic.-23

SEGÚN TABLA INVIAS 411-1-13

ENSAYO SOBRE LA EMULSIÓN	UNIDAD	NORMA DE ENSAYO INV	ESPECIFICACIÓN		RESULTADO	FRECUENCIA
			Min	Máx		
Viscosidad Saybolt Furol a 25ºC	s	E-763	20	200	39	CADA LOTE
Contenido de agua	%	E-761	-	43	39	CADA LOTE
Tamizado - Retenido tamiz No. 20 (850 µm)	%	E-765	-	0,1	0,07	CADA LOTE
pH	-	E-768	-	6	1,1	CADA LOTE
Estabilidad durante almacenamiento (24 horas)	%	E-764	-	1	0,1	MENSUAL
Estabilidad durante almacenamiento (5 dias)	%	E-764	-	5	0,3	MENSUAL
Destilación-Contenido de asfalto residual	%	E-762	57	-	61	MENSUAL
Destilación-Contenido de aceite o disolventes	%	E-762	N/A			MENSUAL
Demulsibilidad	%	E-766	N/A			MENSUAL
Carga de particula	-	E-767	POSITIVA		POSITIVA	MENSUAL
ENSAYOS SOBRE EL RESIDUO DE DESTILACION						
Penetración (25 °C, 100g, 5s) - ARD	0,1 mm	E-706	60	100	60	MENSUAL
Penetración (25 °C, 100g, 5s) - ARB	0,1 mm	E-706	100	250		
Ductilidad (25 °C, 5 cm/min)	cm	E-702	40	-	108	MENSUAL
Solubilidad en tricloroetileno	%	E-713	97,5	-	99,9	MENSUAL

Camila M.	
CAMILA MARTINEZ M. LABORATORISTA INDUSTRIA COLOMBIANA DE ASFALTOS S.A.S	**QCA. KELLY LOPEZ** JEFE CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIA COLOMBIANA DE ASFALTOS S.A.S

CARGUE SOBRE REMANENTE VEHICULO GDB224

aportes en línea

Resumen General de Pago

223

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800219167	5	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAVI	CARRERA 2 ESTE N.8A 19 OF 106	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8675509	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	645441333	9467199038	E	2024/05/17	2024/05/17	BANCOLOMBIA	0	$34,724,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MAVI (72 Afiliados)						$116,552,092	$18,650,900			$116,552,092	$4,664,200			$114,217,824	$4,570,700			$116,552,092	$6,838,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS (64 Afiliados)						$99,244,738	$15,881,500			$99,244,738	$3,971,700			$96,910,470	$3,878,200			$99,244,738	$6,748,000		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (64 Afiliados)						$99,244,738	$15,881,500			$99,244,738	$3,971,700			$96,910,470	$3,878,200			$99,244,738	$6,748,000		$0	$0
1	CC	78749325	ARCIRIA AVILEZ NICOLAS JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	82394962	ARIAS URUEÑA FABIAN YESID	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
3	CC	91159285	ARROYO ESCOBAR EDUARDO ENRIQUE	231001	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
4	CC	1193150371	BAQUERO GIL JESUS ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	11316422	BARRIOS MADRIGAL JOSE FREDDY	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
6	CC	1069176181	BAUTISTA RODRIGUEZ CARLOS	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
7	CC	1069176877	BAUTISTA RODRIGUEZ JEFFERSON	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
8	CC	1106307246	BAZURDO VILLANUEVA JHON HENRY	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
9	CC	1054539127	BEDOYA MANIOS MAICOL JAVIER	230201	23	$996,667	$159,500	EPS041	23	$996,667	$39,900	CCF22	23	$996,667	$39,900	14-11	23	$996,667	$69,400	23	$0	$0
10	CC	1070627849	CALDERON RAMIREZ FREDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
11	CC	93469209	CARDOZO MARTINEZ JORGE ARMANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
12	CC	1106306695	CASTAÑEDA MURCIA CESAR JAVIER	230301	30	$1,999,500	$320,000	EPS017	30	$1,999,500	$80,000	CCF22	30	$1,999,500	$80,000	14-11	30	$1,999,500	$139,200	30	$0	$0
13	CC	1065634669	CASTAÑO CAMELO JHON KEDYS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	11324685	CESPEDES HERNANDEZ ABDIAS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
15	CC	1069746331	CHICA GARCIA JULIO CESAR	230301	30	$2,289,000	$366,300	EPS017	30	$2,289,000	$91,600	CCF22	30	$2,289,000	$91,600	14-11	30	$2,289,000	$159,400	30	$0	$0
16	CC	79690731	GARCIA RODRIGUEZ FABIAN ENRIQUE	230301	30	$2,289,000	$366,300	EPS005	30	$2,289,000	$91,600	CCF22	30	$2,289,000	$91,600	14-11	30	$2,289,000	$159,400	30	$0	$0
17	CC	1069178634	GARCIA BOHORQUEZ LUIS HENRIQUE	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
18	CC	1069174240	GIRON HERNANDEZ OSCAR FABIAN	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
19	CC	1042212059	HERNANDEZ PAEZ LUIS CARLOS	230301	16	$693,334	$111,000	EPS002	16	$693,334	$27,800	CCF22	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
20	CC	80493005	HERNANDEZ RAMIREZ WILLIAN	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
21	CC	11220776	JUEZ HERNANDEZ CARLOS EVELIO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
22	CC	28628228	LEAL SOTO DIANA MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
23	CC	93135787	LEAL GOMEZ RONALD JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
24	CC	35476463	LEAL SOTO VICTORIA	25-14	30	$1,868,250	$299,000	EPS002	30	$1,868,250	$74,800	CCF22	30	$1,868,250	$74,800	14-11	30	$1,868,250	$130,100	30	$0	$0
25	CC	80920097	LESMES ARIAS ELKIN FERNANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
26	CC	1003520453	LIÑAN RODRIGUEZ CRISTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
27	CC	1106307215	MANCILLA RIOS NELSON ENRIQUE	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	11324830	MARTINEZ MOSCOSO LUIS FRANCISCO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
29	CC	11223134	MEDINA GALEANO LUIS FREDY	230301	30	$1,507,250	$241,200	EPS002	30	$1,507,250	$60,300	CCF22	30	$1,507,250	$60,300	14-11	30	$1,507,250	$105,000	30	$0	$0
30	CC	1070603983	MONTENEGRO ACOSTA ALEXANDER	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
31	CC	1070605879	MORA RAMIREZ JHON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
32	CC	1109496711	MORA MALAMBO MARIA ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
33	CC	93434346	MORENO CARDOZO JESUS MARIA	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
34	CC	11205943	MUR PERALTA ALEJANDRO	231001	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
35	CC	1106307611	MURCIA JORGE ANDRES	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
36	CC	5821015	MURILLO VALBUENA MARIO FERNANDO	25-14	30	$3,179,610	$508,800	EPS002	30	$3,179,610	$127,200	CCF22	30	$3,179,610	$127,200	14-11	30	$3,179,610	$221,400	30	$0	$0
37	CC	14252604	NUÑEZ BALLEN JOSE ANTONIO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
38	CC	1003558687	OCHOA ORTEGA CARLOS ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
39	CC	1069730535	ORREGO MAYORGA DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
40	CC	1003243967	ORTEGA CAMELO YEINER ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
41	CC	11315818	ORTEGON VARGAS LUIS	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
42	CC	1005958995	PERDOMO SAENZ JESUS DAVID	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
43	CC	1108454372	PULIDO RODRIGUEZ HANNER ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
44	CC	1069759108	QUIROZ MAYORGA NICOLAS	230301	29	$1,552,457	$248,400	EPS017	29	$1,552,457	$62,100	CCF22	29	$1,552,457	$62,100	14-11	29	$1,552,457	$108,100	29	$0	$0
45	CC	1069759108	QUIROZ MAYORGA NICOLAS	230301	1	$43,334	$7,000	EPS017	1	$43,334	$1,800	CCF22	0	$0	$0	14-11	1	$43,334	$0	0	$0	$0
46	CC	11229483	RAMIREZ VILLANUEVA FELIX ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
47	CC	11220399	RAMIREZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
48	CC	1070588474	RINCON CALVO JOSE HECTOR	230301	16	$693,334	$111,000	EPS017	16	$693,334	$27,800	CCF22	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
49	CC	11304652	RODRIGUEZ BOCANEGRA SANTIAGO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
50	CC	1069925208	ROMERO CARDENAS DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
51	CC	1069176202	ROMERO CARDENAS JAMES EDUARDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
52	CC	11221710	SALAS RAMIREZ ANDRES EDUARDO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
53	CC	11308822	SANTOYA GAITAN WILLIAM	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
54	CC	1070587170	SILVA CAMPOS DAVID SNEYDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
55	CC	11305094	SILVA DEVIA JOSE EDUARDO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
56	CC	11319894	SOTO SOTO RUBEN DARIO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
57	CC	1106309052	TRUJILLO MORALES YOAN FELIPE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
58	CC	1070587580	VANEGAS JIMENEZ ANDRES ESTEBAN	230301	16	$693,334	$111,000	EPS037	16	$693,334	$27,800	CCF22	16	$693,334	$27,800	14-11	16	$693,334	$48,300	16	$0	$0
59	CC	1003517283	VANEGAS RODRIGUEZ FERLEY STIWARD	230201	10	$433,334	$69,400	EPS017	10	$433,334	$17,400	CCF22	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0
60	CC	1003517283	VANEGAS RODRIGUEZ FERLEY STIWARD	230201	20	$866,667	$138,700	EPS017	20	$866,667	$34,700	CCF22	0	$0	$0	14-11	20	$866,667	$0	0	$0	$0
61	CC	1070594659	VARGAS BARRIOS DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
62	CC	11314630	VARGAS VANEGAS JAIRO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
63	CC	1192740758	VARON BOHORQUEZ CARLOS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
64	CC	76300615	VELASCO MOLINA MIGUEL ANGEL	25-14	2	$152,600	$24,500	EPS037	2	$152,600	$6,200	CCF22	2	$152,600	$6,200	14-11	2	$152,600	$10,700	2	$0	$0
65	CC	76300615	VELASCO MOLINA MIGUEL ANGEL	25-14	28	$1,424,267	$227,900	EPS037	28	$1,424,267	$57,000	CCF22	0	$0	$0	14-11	28	$1,424,267	$0	0	$0	$0
66	CC	93469362	VIDAL ALFARO EDUINSON ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
67	CC	1069174767	ZAMBRANO MORENO MATEO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (8 Afiliados)						$17,307,354	$2,769,400			$17,307,354	$692,500			$17,307,354	$692,500			$17,307,354	$90,500		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (8 Afiliados)						$17,307,354	$2,769,400			$17,307,354	$692,500			$17,307,354	$692,500			$17,307,354	$90,500		$0	$0
68	CC	52058014	AGUILERA RINCON LUZ STELLA	25-14	30	$3,310,800	$529,800	EPS017	30	$3,310,800	$132,500	CCF22	30	$3,310,800	$132,500	14-11	30	$3,310,800	$17,300	30	$0	$0
69	CC	39625333	BOHORQUEZ MURCIA LUZ FARIDE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
70	CC	39614343	CAMARGO FAJARDO MARIA VIRGINIA	230201	30	$4,904,000	$784,700	EPS005	30	$4,904,000	$196,200	CCF22	30	$4,904,000	$196,200	14-11	30	$4,904,000	$25,600	30	$0	$0
71	CC	1069762766	GONZALEZ GARZON DAYANNE STHEFANY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
72	CC	52984657	MAYORGA CAMARGO ANDREA MARIA	25-14	30	$2,939,220	$470,300	EPS005	30	$2,939,220	$117,600	CCF22	30	$2,939,220	$117,600	14-11	30	$2,939,220	$15,400	30	$0	$0
73	CC	1070626935	MORENO MANZANARES EDLY VANESSA	230301	22	$953,334	$152,600	EPS002	22	$953,334	$38,200	CCF22	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	$5,000	22	$0	$0
74	CC	39619925	RODRIGUEZ ROMERO YOLANDA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
75	CC	1110602396	RUIZ ALVAREZ JUAN DAVID	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(72)**			$116,552,092	$18,650,900			$116,552,092	$4,664,200			$114,217,824	$4,570,700			$116,552,092	$6,838,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800219167	5	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAVI	CARRERA 2 ESTE N.8A 19 OF 106	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8675509	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	645441333	9467199038	E	2024/05/17	2024/05/17	BANCOLOMBIA	0	$34,724,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				72	$18,650,900	$0	$0	$18,650,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$535,000	$0	$0	$535,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	20	$5,894,300	$0	$0	$5,894,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	40	$9,434,800	$0	$0	$9,434,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$2,786,800	$0	$0	$2,786,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	$6,838,500	$0	$0	$6,838,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	72	$6,838,500	$0	$0	$6,838,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				72	$4,570,700	$0	$0	$4,570,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	72	$4,570,700	$0	$0	$4,570,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				72	$4,664,200	$0	$0	$4,664,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	26	$1,711,400	$0	$0	$1,711,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$945,500	$0	$0	$945,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$143,900	$0	$0	$143,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	$1,153,300	$0	$0	$1,153,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$606,100	$0	$0	$606,100
TOTAL				72	$34,724,300	$0	$0	$34,724,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800219167	5	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAVI	CARRERA 2 ESTE N.8A 19 OF 106	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8675509	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	576762242	9465664191	E	2024/04/15	2024/04/15	BANCOLOMBIA	0	$34,528,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MAVI (70 Afiliados)						$116,093,154	$18,577,300			$116,093,154	$4,645,600			$113,476,754	$4,540,800			$116,093,154	$6,764,500		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERARIOS (62 Afiliados)						$98,439,134	$15,752,500			$98,439,134	$3,939,300			$95,822,734	$3,834,500			$98,439,134	$6,672,200		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (62 Afiliados)						$98,439,134	$15,752,500			$98,439,134	$3,939,300			$95,822,734	$3,834,500			$98,439,134	$6,672,200		$0	$0
1	CC	78749325	ARCIRIA AVILEZ NICOLAS JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
2	CC	82394962	ARIAS URUEÑA FABIAN YESID	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
3	CC	91159285	ARROYO ESCOBAR EDUARDO ENRIQUE	231001	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
4	CC	1193150371	BAQUERO GIL JESUS ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
5	CC	11316422	BARRIOS MADRIGAL JOSE FREDDY	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
6	CC	1069176181	BAUTISTA RODRIGUEZ CARLOS	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
7	CC	1069176877	BAUTISTA RODRIGUEZ JEFFERSON	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
8	CC	1106307246	BAZURDO VILLANUEVA JHON HENRY	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
9	CC	1070627849	CALDERON RAMIREZ FREDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
10	CC	93469209	CARDOZO MARTINEZ JORGE ARMANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
11	CC	1106306695	CASTAÑEDA MURCIA CESAR JAVIER	230301	30	$1,999,500	$320,000	EPS017	30	$1,999,500	$80,000	CCF22	30	$1,999,500	$80,000	14-11	30	$1,999,500	$139,200	30	$0	$0
12	CC	1065634669	CASTAÑO CAMELO JHON KEDYS	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
13	CC	11324685	CESPEDES HERNANDEZ ABDIAS	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
14	CC	1069746331	CHICA GARCIA JULIO CESAR	230301	30	$2,289,000	$366,300	EPS017	30	$2,289,000	$91,600	CCF22	30	$2,289,000	$91,600	14-11	30	$2,289,000	$159,400	30	$0	$0
15	CC	79690731	GARCIA RODRIGUEZ FABIAN ENRIQUE	230301	30	$2,289,000	$366,300	EPS005	30	$2,289,000	$91,600	CCF22	30	$2,289,000	$91,600	14-11	30	$2,289,000	$159,400	30	$0	$0
16	CC	1069178634	GARCIA BOHORQUEZ LUIS HENRIQUE	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
17	CC	1069174240	GIRON HERNANDEZ OSCAR FABIAN	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
18	CC	80493005	HERNANDEZ RAMIREZ WILLIAN	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
19	CC	11220776	JUEZ HERNANDEZ CARLOS EVELIO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
20	CC	28628228	LEAL SOTO DIANA MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
21	CC	93135787	LEAL GOMEZ RONALD JOSE	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
22	CC	35476463	LEAL SOTO VICTORIA	25-14	30	$1,868,250	$299,000	EPS002	30	$1,868,250	$74,800	CCF22	30	$1,868,250	$74,800	14-11	30	$1,868,250	$130,100	30	$0	$0
23	CC	80920097	LESMES ARIAS ELKIN FERNANDO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
24	CC	1003520453	LIÑAN RODRIGUEZ CRISTIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
25	CC	1106307215	MANCILLA RIOS NELSON ENRIQUE	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
26	CC	11324830	MARTINEZ MOSCOSO LUIS FRANCISCO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
27	CC	11223134	MEDINA GALEANO LUIS FREDY	230301	30	$1,507,250	$241,200	EPS002	30	$1,507,250	$60,300	CCF22	30	$1,507,250	$60,300	14-11	30	$1,507,250	$105,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	1070603983	MONTENEGRO ACOSTA ALEXANDER	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
29	CC	1070605879	MORA RAMIREZ JHON ALEXANDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
30	CC	1109496711	MORA MALAMBO MARIA ALEJANDRA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
31	CC	93434346	MORENO CARDOZO JESUS MARIA	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
32	CC	11205943	MUR PERALTA ALEJANDRO	231001	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
33	CC	1106307611	MURCIA JORGE ANDRES	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
34	CC	5821015	MURILLO VALBUENA MARIO FERNANDO	25-14	30	$3,179,610	$508,800	EPS002	30	$3,179,610	$127,200	CCF22	30	$3,179,610	$127,200	14-11	30	$3,179,610	$221,400	30	$0	$0
35	CC	14252604	NUÑEZ BALLEN JOSE ANTONIO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
36	CC	1003558687	OCHOA ORTEGA CARLOS ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
37	CC	1069730535	ORREGO MAYORGA DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
38	CC	1003243967	ORTEGA CAMELO YEINER ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
39	CC	11315818	ORTEGON VARGAS LUIS	25-14	20	$1,114,400	$178,400	EPS017	20	$1,114,400	$44,600	CCF22	20	$1,114,400	$44,600	14-11	20	$1,114,400	$77,600	20	$0	$0
40	CC	11315818	ORTEGON VARGAS LUIS	25-14	10	$557,200	$89,200	EPS017	10	$557,200	$22,300	CCF22	0	$0	$0	14-11	10	$557,200	$0	0	$0	$0
41	CC	1005958995	PERDOMO SAENZ JESUS DAVID	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
42	CC	1007355705	PERDOMO JUEZ JHOAN STEVEN	25-14	21	$910,000	$145,600	EPS017	21	$910,000	$36,400	CCF22	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$63,400	21	$0	$0
43	CC	1108454372	PULIDO RODRIGUEZ HANNER ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
44	CC	1069759108	QUIROZ MAYORGA NICOLAS	230301	30	$1,605,990	$257,000	EPS017	30	$1,605,990	$64,300	CCF22	30	$1,605,990	$64,300	14-11	30	$1,605,990	$111,800	30	$0	$0
45	CC	11229483	RAMIREZ VILLANUEVA FELIX ANDRES	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS037	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
46	CC	11220399	RAMIREZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
47	CC	1070588474	RINCON CALVO JOSE HECTOR	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
48	CC	11304652	RODRIGUEZ BOCANEGRA SANTIAGO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
49	CC	1069925208	ROMERO CARDENAS DIEGO FERNANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
50	CC	1069176202	ROMERO CARDENAS JAMES EDUARDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
51	CC	11221710	SALAS RAMIREZ ANDRES EDUARDO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
52	CC	11308822	SANTOYA GAITAN WILLIAM	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS005	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
53	CC	1070587170	SILVA CAMPOS DAVID SNEYDER	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
54	CC	11305094	SILVA DEVIA JOSE EDUARDO	25-14	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
55	CC	11319894	SOTO SOTO RUBEN DARIO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
56	CC	1106309052	TRUJILLO MORALES YOAN FELIPE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
57	CC	1003517283	VANEGAS RODRIGUEZ FERLEY STIWARD	230201	13	$563,334	$90,200	EPS017	13	$563,334	$22,600	CCF22	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,300	13	$0	$0
58	CC	1003517283	VANEGAS RODRIGUEZ FERLEY STIWARD	230201	17	$736,667	$117,900	EPS017	17	$736,667	$29,500	CCF22	0	$0	$0	14-11	17	$736,667	$0	0	$0	$0
59	CC	1070594659	VARGAS BARRIOS DIEGO ARMANDO	230301	30	$1,671,600	$267,500	EPS017	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
60	CC	11314630	VARGAS VANEGAS JAIRO	230201	30	$1,671,600	$267,500	EPS002	30	$1,671,600	$66,900	CCF22	30	$1,671,600	$66,900	14-11	30	$1,671,600	$116,400	30	$0	$0
61	CC	1192740758	VARON BOHORQUEZ CARLOS ANDRES	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC24	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
62	CC	76300615	VELASCO MOLINA MIGUEL ANGEL	25-14	4	$305,200	$48,900	EPS037	4	$305,200	$12,300	CCF22	4	$305,200	$12,300	14-11	4	$305,200	$21,300	4	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
63	CC	76300615	VELASCO MOLINA MIGUEL ANGEL	25-14	26	$1,322,533	$211,700	EPS037	26	$1,322,533	$53,000	CCF22	0	$0	$0	14-11	26	$1,322,533	$0	0	$0	$0
64	CC	93469362	VIDAL ALFARO EDUINSON ALBERTO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
65	CC	1069174767	ZAMBRANO MORENO MATEO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO1 (8 Afiliados)						$17,654,020	$2,824,800			$17,654,020	$706,300			$17,654,020	$706,300			$17,654,020	$92,300		$0	$0
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (8 Afiliados)						$17,654,020	$2,824,800			$17,654,020	$706,300			$17,654,020	$706,300			$17,654,020	$92,300		$0	$0
66	CC	52058014	AGUILERA RINCON LUZ STELLA	25-14	30	$3,310,800	$529,800	EPS017	30	$3,310,800	$132,500	CCF22	30	$3,310,800	$132,500	14-11	30	$3,310,800	$17,300	30	$0	$0
67	CC	39625333	BOHORQUEZ MURCIA LUZ FARIDE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
68	CC	39614343	CAMARGO FAJARDO MARIA VIRGINIA	230201	30	$4,904,000	$784,700	EPS005	30	$4,904,000	$196,200	CCF22	30	$4,904,000	$196,200	14-11	30	$4,904,000	$25,600	30	$0	$0
69	CC	1069762766	GONZALEZ GARZON DAYANNE STHEPFANY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
70	CC	52984657	MAYORGA CAMARGO ANDREA MARIA	25-14	30	$2,939,220	$470,300	EPS005	30	$2,939,220	$117,600	CCF22	30	$2,939,220	$117,600	14-11	30	$2,939,220	$15,400	30	$0	$0
71	CC	1070626935	MORENO MANZANARES EDLY VANESSA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
72	CC	39619925	RODRIGUEZ ROMERO YOLANDA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
73	CC	1110602396	RUIZ ALVAREZ JUAN DAVID	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(70)**			$116,093,154	$18,577,300			$116,093,154	$4,645,600			$113,476,754	$4,540,800			$116,093,154	$6,764,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

230

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800219167	5	MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MAVI	CARRERA 2 ESTE N.8A 19 OF 106	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8675509	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	576762242	9465664191	E	2024/04/15	2024/04/15	BANCOLOMBIA	0	$34,528,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				70	$18,577,300	$0	$0	$18,577,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$535,000	$0	$0	$535,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	$6,048,200	$0	$0	$6,048,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	38	$9,366,800	$0	$0	$9,366,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$2,627,300	$0	$0	$2,627,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	$6,764,500	$0	$0	$6,764,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	70	$6,764,500	$0	$0	$6,764,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				70	$4,540,800	$0	$0	$4,540,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	70	$4,540,800	$0	$0	$4,540,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				70	$4,645,600	$0	$0	$4,645,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	27	$1,772,400	$0	$0	$1,772,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	16	$919,800	$0	$0	$919,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$1,139,300	$0	$0	$1,139,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$606,100	$0	$0	$606,100
TOTAL				70	$34,528,200	$0	$0	$34,528,200

CS1

Certificación Bancaria

Bancolombia

Bogotá D. C., 03 de octubre de 2023

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **MAVI PAVIMENTACIONES SAS** identificada con NIT **800219167** la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	ESTADO
CUENTA CORRIENTE	26463322484	2010/10/11	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.


Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, a través de los siguientes números: Medellín: (57-4) 510 90 00 \ Barranquilla: (57-5) 361 88 88 \ Bogotá: (57-1) 343 00 00 \ Cali: (57-2) 554 05 05 \ Resto del país: 01800 09 12345

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Firma Autorizada

Lizeth Andrea Quiñones Caona
Jefe de centro
CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PYME

Elaborado por: Jenny Viviana Solorzano Arias

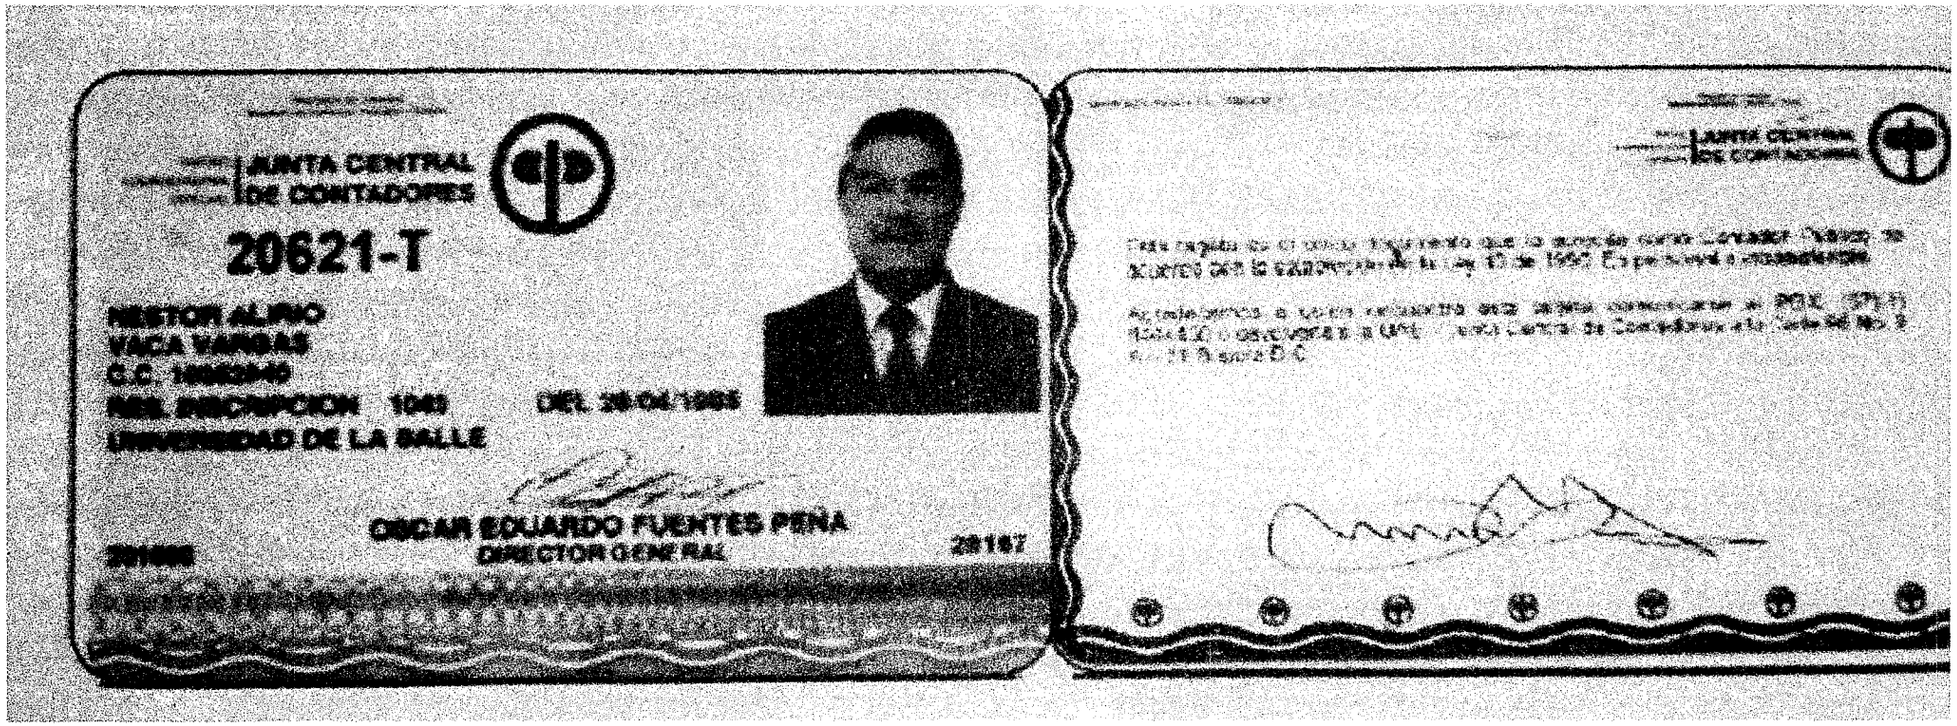
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES
20621-T
HECTOR ALIRIO
VACA VARGAS
C.C. 19092949
REG. INSCRIPCION 1049
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL
28187

MAVI
PAVIMENTACIONES S.A.S.
Nuestro Compromiso la Calidad

El suscrito, **NESTOR ALIRIO VACA VARGAS** Revisor Fiscal con Tarjeta Profesional No.20621-T expedida por la Junta Central de Contadores.

CERTIFICAN

Que la Empresa MAVI PAVIMENTACIONES S.A.S. Con Nit.800.219.167-5 ha presentado y ha pagado las liquidaciones de aportes de sus empleados según contrato No.965-2023,el cual tiene como objeto: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, correspondiente a Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y Fondo Industrial de la Construcción FIC, en los seis (6) meses anteriores a hasta la fecha de la presente certificación.

La presente certificación se expide para cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 789 de 2002, articulo 50.

Para constancia se firma en Fusagasugá, a los OCHO (08) días del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

NESTOR ALIRIO VACA V
Revisor Fiscal
T.P. No. 20621-T
