FUNDACIÓN MERCAJUSTO

NIT. 900.198.924-5

INFORME No. 6 DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL CARC 001 DE 2023

CONTRATO No. 814 DEL 30 de octubre DE 2023

OBJETO:

CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL CARC 001 DE 2023

MAYO 2024

TABLA DE CONTENIDO

Pag.

1. GENERALIDADES 5
1.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 5
1.1.1. Tablón de Gómez 5
2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 6
2.1. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 6
2.2. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 7
2.3 PERSONAL VINCULADO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 8
2.3.1 Interventoría 8
3. AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA 10
4. INFORMACIÓN TÉCNICA 12
4.1. DETALLE TÉCNICO DEL PROYECTO 12
5. ACTIVIDADES PRELIMINARES 13
6. AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA 15
6.1. ACTIVIDAD 1.1.1. ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL (RESTAURACIÓN ACTIVA) 15
6.2. ACTIVIDAD 1.1.2. AISLAR LAS ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN 20
6.3. ACTIVIDAD 1.1.3. EFECTUAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO 25
6.4. ACTIVIDAD 2.1.1. REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN 27
7. AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA 29
8. CONCLUSIONES 31

ÍNDICE DE FIGURAS

Pag.

FIGURA 1. *LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL TABLÓN DE GÓMEZ* 5
FIGURA 2. *VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO* 20
FIGURA 3. *VERIFICACIÓN DE AISLAMIENTO* 25
FIGURA 4. *REGISTRO FOTOGRÁFICO – SEGUNDO EVENTO DE DIFUSIÓN* 28

ÍNDICE DE TABLAS

Pag.

TABLA 1. *DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA* 6
TABLA 2. *DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA* 7
TABLA 3. *PERSONAL DE INTERVENTORÍA VINCULADO AL PROYECTO.* 8
TABLA 4. *RESUMEN DE EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO* 10
TABLA 5. *DETALLES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL OBJETIVO ESPECÍFICO 1* 12
TABLA 6. *BENEFICIARIOS CON PREDIOS VERIFICADOS* 13
TABLA 7. *RELACIÓN DE AVANCE RESTAURACIÓN ACTIVA* 15
TABLA 8. *RELACIÓN DE AVANCE ACUMULADO* 16
TABLA 9. ESPECIES PARA LA RESTAURACIÓN ACTIVA 17
TABLA 10. *RELACIÓN DE AVANCE DE AISLAMIENTO* 21
TABLA 11. *PREDIOS CON ADICIÓN DE AISLAMIENTO* 22
TABLA 12. *RELACIÓN DE AVANCE ACUMULADO* 22
TABLA 13. *RELACIÓN DE AVANCE DE MANTENIMIENTO* 25
TABLA 14. *RELACIÓN DE AVANCE ACUMULADO* 26
TABLA 15. *DETALLE DE AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO* 29

1. GENERALIDADES

1.1. Localización del proyecto

1.1.1. Tablón de Gómez



Figura 1. *Localización del municipio de El Tablón de Gómez*

El Municipio del Tablón de Gómez está ubicado a 62 kilómetros al noroccidente de la ciudad de San Juan de Pasto. Con una altura media sobre el nivel del mar es de 1.495 metros, la temperatura media es de 20 °C, posee un área aproximada de 326,9 km2, posee una población de alrededor de 12.757 habitantes. Limita al norte con el municipio de Albán, San Bernardo y La Cruz; al oriente con el departamento del Cauca y el departamento del Putumayo; al sur con el municipio de Buesaco y al occidente con el municipio de Berruecos. Sus coordenadas geográficas son 1°25′37″N – 77°05′49″O.

Específicamente, el proyecto se desarrollará en las veredas de El Guarango, Isla, Juanoy, Pompeya, San Rafael, El Plan, Marsella, Sinaí, Las Mesas, Llano Largo y Villanueva de este municipio.

2. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

2.1. Información contrato de interventoría

Tabla 1. *Datos generales del contrato de interventoría*

1. Información general del contrato	
Contrato No.	814 DEL 30 de octubre DE 2023
Contratista	FUNDACIÓN MERCAJUSTO
Representante legal	CARMEN LEONOR HIDALGO MELO
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN RESULTADO DE LA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO COMPETITIVO DE RÉGIMEN ESPECIAL CARC 001 DE2023, CUYO OBJETO CORRESPONDE A: "AUNAR ESFUERZOS DE TIPO ECONÓMICO, TÉCNICO, FÍSICO Y HUMANO ENTRE CORPONARIÑO Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PREPARACIÓN, LIMPIEZA DE TERRENO, SIEMBRA DE PLÁNTULAS, APLICACIÓN DE FERTILIZANTES Y AISLAMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO JUANAMBÚ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO".
Entidad contratante	CORPONARIÑO
2. Duración	
Duración total	30 meses
Fecha de inicio	1 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial del contrato	31 de mayo de 2026
Tiempo transcurrido del contrato	6 meses
3. Valor del contrato	
Valor total del contrato	$327.955.198
	Trescientos veintisiete millones novecientos cincuenta y cinco mil ciento noventa y ocho pesos M/CTE.
4. Garantías del contrato	
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Póliza No.	41-44-101276778
Vigencia	30/10/2023 - 30/04/2029

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del contrato	30/10/2023 - 31/08/2026	$65.591.039,60
Calidad del servicio	30/10/2023 - 31/08/2026	$65.591.039,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30/10/2023 - 30/04/2029	$16.397.759,90
Póliza de cumplimiento según acta de inicio (1/12/2023)		
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
Póliza No.	41-44-101276778	
Vigencia	01/12/2023 - 01/06/2029	
Amparo	**Vigencia**	**Valor**
Cumplimiento del contrato	01/12/2023 - 02/10/2026	$65.591.039,60
Calidad del servicio	01/12/2023 - 02/10/2026	$65.591.039,60
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	01/12/2023 - 01/06/2029	$16.397.759,90

2.2. Información contrato de obra

Tabla 2. *Datos generales del contrato de obra*

1. Información general del contrato	
Contrato No.	CONVENIO DE ASOCIACION No. 2023 – 655
Contratista	FUNDACIÓN COLOMBIA RENUEVA
Representante legal	JHONER ARMANDO ALVARADO ORDOÑEZ
Objeto	AUNAR ESFUERZOS DE TIPO ECONÓMICO, TÉCNICO, FÍSICO Y HUMANO ENTRE CORPONARIÑO Y UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA LA PREPARACIÓN, LIMPIEZA DE TERRENO, SIEMBRA DE PLÁNTULAS, APLICACIÓN DE FERTILIZANTES Y AISLAMIENTO CON EL FIN DE REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO JUANAMBÚ DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
Entidad contratante	CORPONARIÑO
2. Duración	
Duración total	29 meses y 16 días
Fecha de inicio	1 de diciembre de 2023
Fecha de terminación inicial del contrato	16 de mayo de 2026
Tiempo transcurrido del	6 meses

contrato		
3. Valor		
Valor total del contrato	$ 3.176.149.608	
	Tres mil ciento setenta y seis millones ciento cuarenta y nueve mil seiscientos ocho pesos M/CTE.	
APORTES SGR	$ 2.913.396.316	
	Dos mil novecientos trece millones trescientos noventa y seis mil trescientos dieciséis pesos M/CTE.	
APORTES CORPONARIÑO	$ 100.000.000	
	Cien millones de pesos M/CTE. (equivalente a 38.461plantúlas)	
APORTES FUNDACIÓN COLOMBIA RENUEVA	$ 162.753.292	
	Ciento sesenta y dos millones setecientos cincuenta y tres mil doscientos noventa y dos pesos M/CTE.	
Anticipo	$728.349.079,00	
	Setecientos veintiocho millones trescientos cuarenta y nueve mil setenta y nueve pesos M/CTE.	
4. Garantías		
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
Póliza No.	C – 100066662	
Vigencia	14/11/2023 - 14/05/2029	
Amparo	**Vigencia**	**Valor**
Cumplimiento	14/11/2023 - 14/09/2026	$635.229.921,60
Buen manejo del anticipo	14/11/2023 - 14/09/2026	$728.349.079,00
Prestaciones sociales	14/11/2023 - 14/05/2029	$158.807.480,40
Calidad del servicio	14/11/2023 - 14/09/2026	$635.229.921,60
Pólizas de responsabilidad civil extracontractual según contrato		
Aseguradora	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
No. de póliza	C – 100017107	
Vigencia	14/11/2023 – 14/05/2026	

2.3 Personal vinculado para el desarrollo del proyecto

2.3.1 Interventoría

Tabla 3. *Personal de interventoría vinculado al proyecto.*

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	PERFIL	CARGO PARA EL CUAL SE VINCULA
1	David Eduardo Álvarez Sánchez	C.C. No. 1.085.270.242 de Pasto (N)	Ingeniero Agrónomo	Coordinador de Proyecto Proceso Ambiental

2	Anderson Mauricio Botina Garzón	C.C. No. 12.752.816 de Pasto (N)	Ingeniero Agroforestal	Profesional de campo
3	Astrid Dalila Rojas Jurado	C.C. No. 27.309.452 de los Andes (N)	Psicóloga	Profesional Social
4	Wilfredy Ortega López	C.C. No. 1.083.812.684 de Belén (N)	Contador Público	Profesional Financiero
5	María Camila Romero Andrade	C.C. No. 1.085.248.944 de Pasto (N)	Abogada	Profesional Jurídico

3. AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA

En la siguiente tabla, se presenta el cronograma de trabajo del operador del proyecto, se semaforiza el mes de mayo de 2024 con el fin de determinar el cumplimiento de las actividades planificadas para dicho periodo:

Tabla 4. *Resumen de ejecución técnica del proyecto*

ACTIVIDAD		META	UNIDAD	MES															
				dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: AUMENTAR LA COBERTURA VEGETAL NATIVA																			
1.1.1 Establecer el material vegetal (Restauración Activa)																			
Plan	Establecimiento	149,75	Hectáreas	0	0	4	5	12	12	13	12	12	12	12	13	13	13	6,75	5	5
Ejec						4	5,05	12,63	41,53											
1.1.2. Aislar las áreas en proceso de restauración																			
Plan	Aislamiento	24,86	Kilómetros			0,64	0,8	2,22	2,22	2,08	2,22	1,92	1,92	1,92	2,08	2,08	2,08	1,08	0,8	0,8
Ejec						0,64	0,84	2.07	4,99											
1.1.3. Mantenimiento en áreas de restauración																			
Plan	Mantenimiento	149,75	Hectáreas	0	0	0	1,33	1,67	4,00	5,33	6,00	9,33	9,67	12,33	12,00	12,67	12,33	12,33	10,58	10,00
Ejec							1,33	1,67	3,16											
1.1.4. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las áreas en proceso de restauración																			
Plan	Monitoreos	5	Número	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Ejec					1		1		0											
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: INCREMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES																			
2.2.1 Realización de eventos de difusión																			
Plan	Eventos	4	Número	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Ejec				1																
2.2.2 Efectuar actividades de sensibilización																			
Plan	Talleres	6	Número	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Ejec						1		2												

Actividad		Meta	Unidad	Mes													Total	%
				may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26		
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: AUMENTAR LA COBERTURA VEGETAL NATIVA																		
1.1.1 Establecer el material vegetal (Restauración Activa)																		42,21%
Plan	Establecimiento	149,75	Hectáreas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,75	
Ejec																	63,21	
1.1.2. Aislar las áreas en proceso de restauración																		34,43%
Plan	Aislamiento	24,86	Kilómetros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,86	
Ejec																	8,56	
1.1.3. Efectuar acciones de mantenimiento																		4,1%
Plan	Mantenimiento	149,75	Hectáreas	10,33	6,58	6,00	3,92	1,67	1,67	0	0	0	0	0	0	0	149,75	
Ejec																	6,16	
1.1.4. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las áreas en proceso de restauración																		40%
Plan	Monitoreos	5	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
																	2	
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: INCREMENTAR LA CULTURA AMBIENTAL DE LAS COMUNIDADES																		
2.2.1 Realización de eventos de difusión																		50%
Plan	Eventos	4	Número	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Ejec																	2	
2.2.2 Efectuar actividades de sensibilización																		50%
Plan	Talleres	6	Número	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
Ejec																	3	

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

4.1. Detalle técnico del proyecto

Con la finalidad de garantizar la correcta ejecución del proyecto, acorde a todas las obligaciones adquiridas por parte del contratista, interventoría realiza el control y seguimiento a las actividades relacionadas para cada objetivo específico, tal y como se suscita en adelante (ver tabla 5), para que se desarrollen acorde a los lineamientos y especificaciones técnicas del contrato:

Tabla 5. *Detalles de actividades correspondiente al objetivo específico 1*

OBJETIVO ESPECÍFICO 1	Aumentar la cobertura vegetal nativa	
ACTIVIDAD	**UNIDAD**	**CANTIDAD**
1.1.1 Establecer el material vegetal (Restauración Activa)	Hectáreas	149,75
1.1.2. Aislar las áreas en proceso de restauración	Kilómetros	24,86
1.1.3. Efectuar acciones de mantenimiento	Hectáreas	149,75
1.1.4. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las áreas en proceso de restauración	Monitoreos	5
OBJETIVO ESPECÍFICO 2	Incrementar la cultura ambiental de las comunidades	
2.2.1 Realización de eventos de difusión	Eventos	4
2.2.2 Efectuar actividades de sensibilización	Talleres	6

5. ACTIVIDADES PRELIMINARES

En el mes de MAYO del año en curso, el operador, realizó visitas de verificación de los predios y ejecución de las actividades de establecimiento, aislamiento y mantenimiento, así pues, se socializaron los compromisos a tener para ingresar al proyecto, y también, los aspectos a tener en cuenta como potencial beneficiario.

El operador, reporta que, al momento de realizar la verificación de potenciales beneficiarios, se encuentra con dificultades como las siguientes:

- Los predios presentan actividades agrícolas con cultivos permanentes o transitorios,
- Los predios cuentan con pastoreo tradicional y pastoreo rotacional cuya intención es la instalación de cercas y barreras vivas para la separación de potreros y suplemento de la alimentación del ganado,
- Los predios se encuentran en estado de arrendamiento o legalización de propiedad debido que son predios herencia y predios con áreas reducidas de 0.001 hasta 0.008 m^2, estos predios al ser de extensión extremadamente pequeña no representan alto valor para realizar las actividades inherentes al proyecto.

Es de señalar, que, en las visitas iniciales a los predios, el operador, tuvo en cuenta que las áreas a intervenir no se encuentren en zonas de alto riesgo de hundimiento o deslizamiento y que no presente uso agrícola o pecuario. En este sentido, a continuación, se presenta la Tabla 6., donde se relacionan los beneficiarios atendidos:

Tabla 6. *Beneficiarios con predios verificados*

BENEFICIARIO	VEREDA
MARI LUZ GÓMEZ	LAS MESAS
ANDRES HERNANDEZ BRAVO	LAS MESAS
JUVENCIO SANTACRUZ	EL GUARANGO
YORLEN GÓMEZ	EL GUARANGO
ANATOLIO SANTACRUZ	EL GUARANGO
ERLEY MILENA GRANDA MARTINEZ	VILLANUEVA
OLIVA GARCIA	LA ISLA
REINALDO SANTACRUZ SANTACRUZ	EL GUARANGO
ALMIDA GRANDA MARTINEZ	VILLANUEVA
OLIVER RODRIGO GUZMAN	SINAI
ANIBAR ENERENCIO GUZMAN SIJINDIOY	SINAI

MIGUEL ANGEL GUZMAN SIJINDIOY	SINAI
ANIBAR ENERENCIO GUZMAN SIJINDIOY	JUANOY
MIGUEL ANGEL GUZMAN SIJINDIOY	JUANOY
MOISES BENAVIDES	JUANOY
NORVEY GAVIRIA GARCÉS	JUANOY
JAVIER GARCÉS MARTINEZ	JUANOY
ALBERTH GAVIRIA BURGOS	JUANOY
NANCI BENAVIDEZ CORDOBA	LA ISLA
MABEL DEL CARMEN BENAVIDEZ	JUANOY
LUCIO JAVIER ROTEGA SIJINDOY	LA ISLA
MARTA CECILIA GARCÉS MARTINEZ	JUANOY
WILSON EVER CHÁVEZ	POMPEYA
FRANCO GAVIRIA GOMEZ	JUANOY
ILDEBRANDO GÓMEZ GRANDA	JUANOY
EDIXON FERNANDO GOMEZ CARLOSAMA	JUANOY
ELIDA ORDOÑEZ CHICUNQUE	JUANOY

En este sentido, el operador, realizó la verificación de 27 beneficiarios que ingresan al proyecto, los cuales recibieron los insumos necesarios para dar desarrollo a las actividades de establecimiento y aislamiento.

A continuación, se describen las actividades ejecutadas por el equipo técnico del operador, en relación a los programado en el cronograma del mismo.

6. AVANCE DE EJECUCIÓN TÉCNICA

A continuación, se describen las actividades efectuadas por la Fundación Colombia Renueva, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo de 2024:

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 Aumentar la cobertura vegetal nativa

6.1. Actividad 1.1.1. ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL (RESTAURACIÓN ACTIVA)

Durante el mes de mayo de 2024, la empresa operadora, realizo la entrega de material vegetal nativo de las zonas a intervenir proveniente de vivero certificado, a beneficiarios de las veredas de Las Mesas, El Guarango, Villanueva, La Isla, Sinai, Juanoy y Pompeya. De igual forma, se entregaron insumos para el establecimiento de las especies arbóreas y arbustivas, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas por el proyecto.

Acorde a la verificación realizada en campo, la siembra del material vegetal se estableció mediante núcleos de restauración en forma cuadrado y rectangular de acuerdo a la metodología planteada en el documento técnico. Sin embargo, la distribución y tamaño de los núcleos, es variable, ya que depende de las áreas a intervenir y la vegetación nativa que se encuentre en el predio. Lo anterior, no modifica el tipo y cantidad de insumo implementado, ni el objetivo de la restauración.

En este sentido, el contratista operador, reporta el establecimiento de **41,53** hectáreas, tal como se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 7. *Relación de avance restauración activa*

BENEFICIARIO	VEREDA	EJECUCIÓN (Ha) Mayo 2024
MARI LUZ GÓMEZ	LAS MESAS	5
ANDRES HERNANDEZ BRAVO	LAS MESAS	7
JUVENCIO SANTACRUZ	EL GUARANGO	3
YORLEN GÓMEZ	EL GUARANGO	1,5
ANATOLIO SANTACRUZ	EL GUARANGO	2
ERLEY MILENA GRANDA MARTINEZ	VILLANUEVA	0,5
OLIVA GARCIA	LA ISLA	0,25
REINALDO SANTACRUZ SANTACRUZ	EL GUARANGO	6,5
ALMIDA GRANDA MARTINEZ	VILLANUEVA	0,5
OLIVER RODRIGO GUZMAN	SINAI	0,9
MIGUEL ANGEL GUZMAN SIJINDIOY	JUANOY	0,33

ANIBAR ENERENCIO GUZMAN SIJINDIOY	JUANOY	0,3
MOISES BENAVIDES	JUANOY	0,25
NORVEY GAVIRIA GARCÉS	JUANOY	2
JAVIER GARCÉS MARTINEZ	JUANOY	2
ALBERTH GAVIRIA BURGOS	JUANOY	0,3
NANCI BENAVIDEZ CORDOBA	LA ISLA	0,25
MABEL DEL CARMEN BENAVIDEZ	JUANOY	0,8
LUCIO JAVIER ROTEGA SIJINDOY	LA ISLA	1
MARTA CECILIA GARCÉS MARTINEZ	JUANOY	0,7
WILSON EVER CHÁVEZ	POMPEYA	0,7
FRANCO GAVIRIA GOMEZ	JUANOY	0,3
ILDEBRANDO GÓMEZ GRANDA	JUANOY	2
EDIXON FERNANDO GOMEZ CARLOSAMA	JUANOY	3
ELIDA ORDOÑEZ CHICUNQUE	JUANOY	0,5
TOTAL		**41,53**

En la siguiente tabla, se puede apreciar la de ejecución acumulada hasta a fecha de la presente actividad:

Tabla 8. *Relación de avance acumulado*

MES (AÑO 2024)	ÁREA TOTAL (HA)	EJECUCIÓN (HA)	ACUMULADO (HA)	PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL
FEBRERO	149,75	4	**63,21 ha**	**42,21 %**
MARZO		5,05		
ABRIL		12,63		
MAYO		41,53		

El equipo interventor de la Fundación Mercajusto, a través de visitas de campo de inspección y verificación a la ejecución de actividades en conjunto con la revisión de documentos de soporte, se permite validar para el ítem ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL (RESTAURACIÓN ACTIVA) un total de 41,53 hectáreas en el mes de mayo. En este sentido, de acuerdo a la tabla 8, es posible inferir que, a la fecha, el avance acumulado de la actividad 1.1.1. corresponde al 42,21%.

Se debe destacar, que el operador, además de cumplir con la meta para el presente corte (12 ha), ejecutó un adelanto en el desarrollo de la presente actividad de 30,16 hectáreas, lo que generan un avance significativo en el establecimiento de material vegetal en las diferentes veredas del Municipio del Tablón de Gómez.

En la tabla 9. se presentan las especies establecidas dentro de los micrositios o núcleos de siembra:


Tabla 9. Especies para la restauración activa

ESPECIE	NOMBRE
Aliso	*Alnus acuminata*
Chilca	*Bacharis floribunda*
Pelotillo	*Viburnum sp*
Laurel	*Morella pubescens*
Capulicillo	*Prunus cerotina*

La siembra de estas especies en los núcleos, permitirá la formación de corredores biológicos, en los cuales habrá biodiversidad de flora, donde las semillas servirán de alimento para las aves que a su vez son dispersores de semilla. Además, las ramas de los árboles brindaran refugio a especies de mamíferos y aves.

En seguida, se presenta un registro fotográfico de las visitas de verificación realizadas por la interventoría:



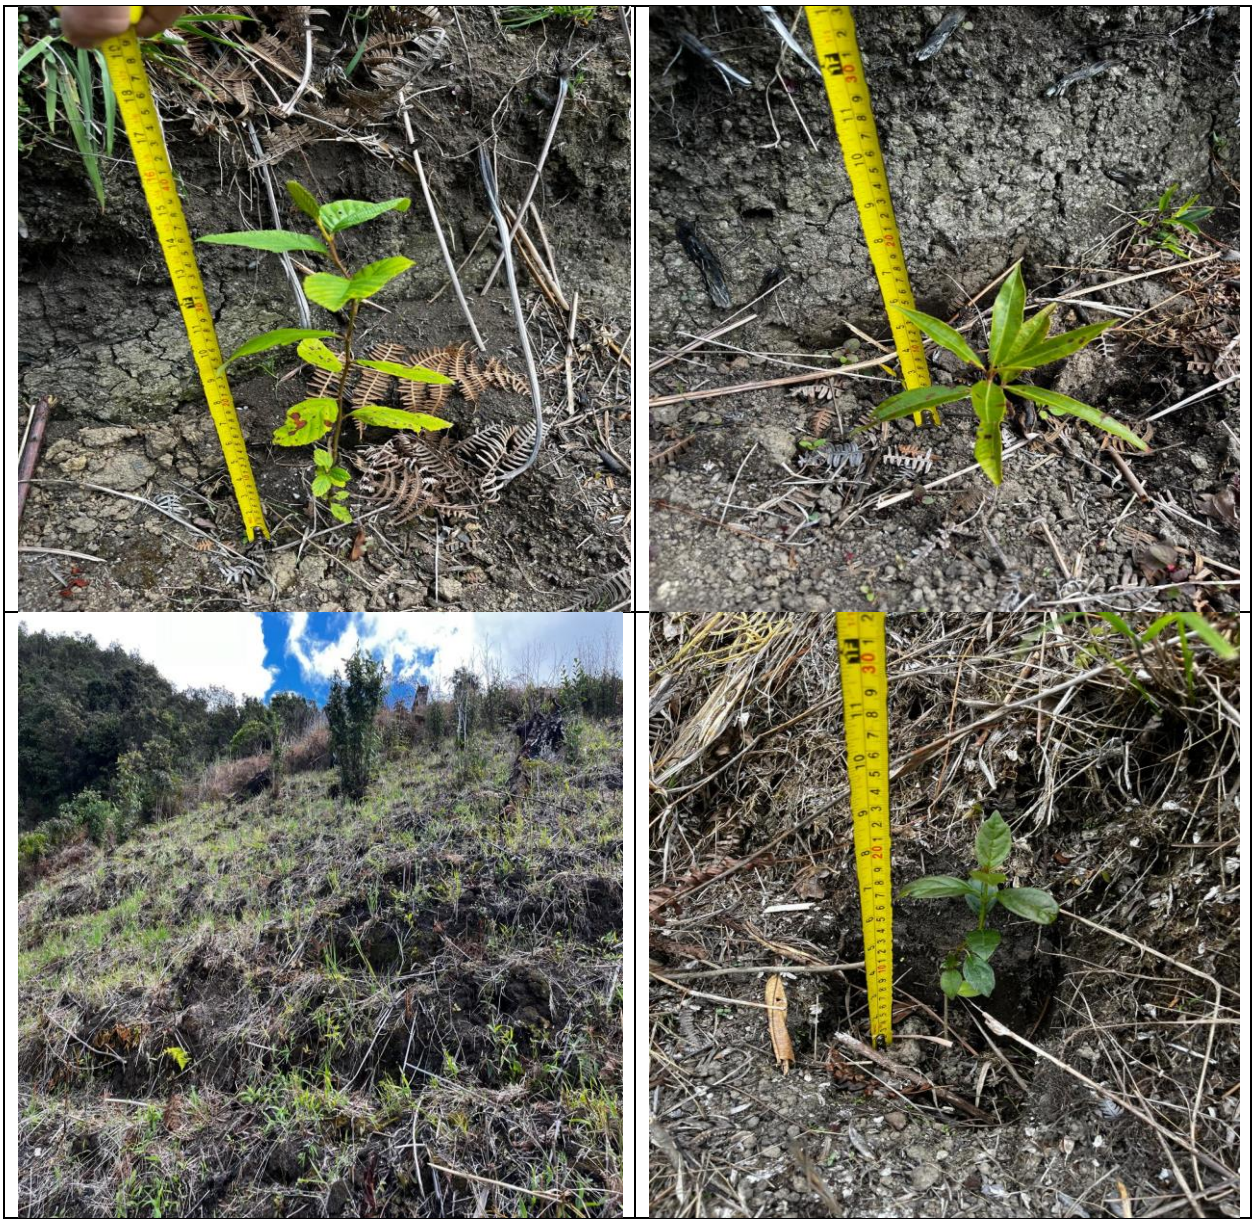







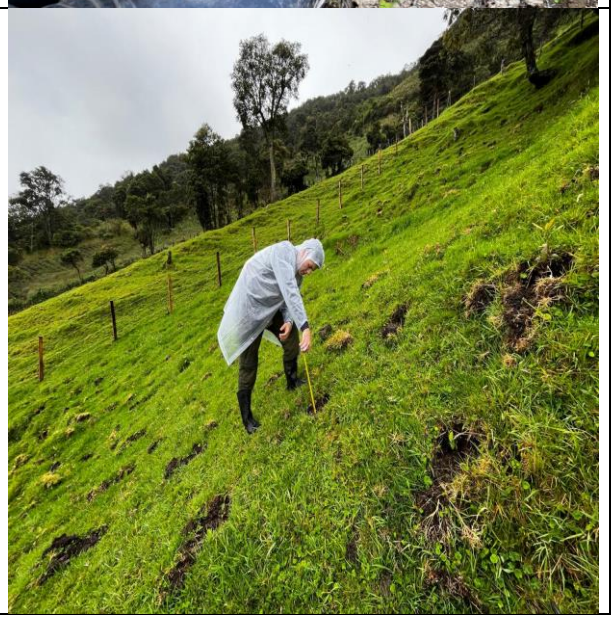




Figura 2. *Verificación de establecimiento*

6.2. Actividad 1.1.2. AISLAR LAS ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN

Para el cumplimiento efectivo de la presente actividad, en el actual corte, la empresa operadora, realizo la entrega de material requerido para aislamiento de predios objeto de restauración a 27 beneficiarios, es de aclarar que los materiales suministrados cumplen con las especificaciones establecidas por el proyecto.

En línea con lo anterior, el contratista operador, reporta el aislamiento de **4,26** kilómetros los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Tabla 10. *Relación de avance de aislamiento*

BENEFICIARIO	VEREDA	EJECUCIÓN (Km) Mayo 2024
MARI LUZ GÓMEZ	LAS MESAS	0,930
ANDRES HERNANDEZ BRAVO	LAS MESAS	1,246
JUVENCIO SANTACRUZ	EL GUARANGO	0,160
YORLEN GÓMEZ	EL GUARANGO	0,083
ANATOLIO SANTACRUZ	EL GUARANGO	0,050
ERLEY MILENA GRANDA MARTINEZ	VILLANUEVA	0,055
OLIVA GARCIA	LA ISLA	0,060
REINALDO SANTACRUZ SANTACRUZ	EL GUARANGO	0,225
ALMIDA GRANDA MARTINEZ	VILLANUEVA	0,055
OLIVER RODRIGO GUZMAN	SINAI	0,115
ANIBAR ENERENCIO GUZMAN SIJINDIOY	JUANOY	0,043
MIGUEL ANGEL GUZMAN SIJINDIOY	JUANOY	0,043
MOISES BENAVIDES	JUANOY	0,042
NORVEY GAVIRIA GARCÉS	JUANOY	0,120
JAVIER GARCÉS MARTINEZ	JUANOY	0,095
ALBERTH GAVIRIA BURGOS	JUANOY	0,050
NANCI BENAVIDEZ CORDOBA	LA ISLA	0,042
MABEL DEL CARMEN BENAVIDEZ	JUANOY	0,125
LUCIO JAVIER ROTEGA SIJINDOY	LA ISLA	0,040
MARTA CECILIA GARCÉS MARTINEZ	JUANOY	0,120
WILSON EVER CHÁVEZ	POMPEYA	0,058
FRANCO GAVIRIA GOMEZ	JUANOY	0,045
ILDEBRANDO GÓMEZ GRANDA	JUANOY	0,165
EDIXON FERNANDO GOMEZ CARLOSAMA	JUANOY	0,215
ELIDA ORDOÑEZ CHICUNQUE	JUANOY	0,083
TOTAL		**4,26**

De acuerdo al operador, en el presente corte, se atendieron a 6 beneficiarios reportados en el mes de abril, ya que, fue necesario ampliar el aislamiento debido a que algunos se encuentran ubicados en zonas de ganadería o quedaron pequeños espacios abiertos que permitieron el ingreso de personas o animales.

A continuación, se relaciona la información de los predios mencionados.

Tabla 11. *Predios con adición de aislamiento*

BENEFICIARIO	VEREDA	Km
CARMENZA YOLANDA ORDOÑEZ	LAS MESAS	0,180
DELI ANIRA ORDOÑEZ	EL PLAN	0,048
EIBAR ARLES BOLAÑOS BOLAÑOS	LAS MESAS	0,063
LEON ANGEL MARTINEZ	LAS MESAS	0,078
JORGE ENRIQUE ORDOÑEZ ROSERO	EL PLAN	0,213
AMELIO BOLAÑOS	LAS MESAS	0,145
TOTAL		**0,73**

En este sentido, en el mes de mayo, se aisló un total de 4,99 kilómetros con 33 beneficiarios atendidos, 27 nuevos y 6 antiguos. En la siguiente tabla, se puede apreciar la de ejecución acumulada hasta a fecha de la presente actividad:

Tabla 12. *Relación de avance acumulado*

MES (AÑO 2024)	KILÓMETROS TOTAL (KM)	EJECUCIÓN (KM)	ACUMULADO (KM)	PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL
FEBRERO	24,86	0,64	**8,56 km**	**34,43 %**
MARZO		0,84		
ABRIL		2,09		
MAYO		4,99		

En este sentido, el equipo interventor de la Fundación Mercajusto, a través de visitas de campo de inspección y verificación a la ejecución de actividades en conjunto con la revisión de documentos de soporte, se permite validar para el ítem AISLAR LAS ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN un total de 4,99 kilómetros para el mes de mayo. Así pues, se tiene un acumulado de 34,43% para la actividad en mención.

Teniendo en cuenta que, para el mes de mayo, el operador cumplió con la meta estipulada, además de aislar un excedente de 2,77 kilómetros, se compensa de esta manera, el faltante del mes de abril (0,15 Km).

En seguida, se presenta un registro fotográfico de las visitas de verificación realizadas por la interventoría:













Figura 3. *Verificación de aislamiento*

El objetivo de esta actividad, es identificar la parte del predio por la cual se presente ingreso de animales o personas que afecten el establecimiento del material vegetal, dado que, el aislamiento, contribuye al desarrollo de las plantas en el proceso de la restauración, evitando así, afectaciones externas a las plantaciones en los predios.

6.3. Actividad 1.1.3. EFECTUAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO

El equipo técnico de la Fundación Colombia Renueva, en el mes de mayo del presente año, llevo a cabo la aplicación de fertilizantes para el mantenimiento de las áreas en proceso de restauración, en este sentido, el contratista reporta el mantenimiento de **3,61** hectáreas, cantidad que valida en su totalidad esta interventoría.

Cabe resaltar, que de la totalidad de área que posee el predio, en este periodo, se realizó el mantenimiento a la tercera parte de cada uno de ellos.

En adelante, se presenta una tabla que detalla la localización específica y predios atendidos:

Tabla 13. *Relación de avance de mantenimiento*

BENEFICIARIO	AREA (Ha)
ANGELINO ADARME	0,50
LUIS GILBERTO MUÑOZ MUÑOZ	0,50
MILEDE AGREDA (JUNTA ACUEDUCTO POMPEYA)	1,00

LEIDY JULIANA BRAVO ERAZO	0,33
REYER ERNALDO MARTINEZ BRAVO	0,20
FABIO GERARDO BOLAÑOS ORDOÑEZ	0,5
	0,3
LEIDY MIRIAN JAMIOY MARTINEZ	0,3
JESUS DIONICIO URBANO	0,25
JAVIER CALISTO BOLAÑOS	0,8
CARMENZA YOLANDA ORDOÑEZ	1,0
DELI ANIRA ORDOÑEZ	0,2
MONICA BOLAÑOS GUERRERO	0,5
YENNY GOMEZ	0,5
EVELIO DELGADO GALLARDO	1,5
EIBAR ARLES BOLAÑOS BOLAÑOS	0,3
WILSON URBANO BOLAÑOS	2,0
LEON ANGEL MARTINEZ	0,2
FRANCISCO SEBASTIAN MARTINEZ	0,25
JORGE ENRIQUE ORDOÑEZ ROSERO	1,0

En la siguiente tabla, se puede apreciar la de ejecución acumulada hasta a fecha de la presente actividad:

Tabla 14. *Relación de avance acumulado*

MES (AÑO 2024)	ÁREA TOTAL (HA)	EJECUCIÓN (HA)	ACUMULADO (Ha)	AVANCE TOTAL
MARZO	149,74	1,33	**6,16**	**4,1%**
ABRIL		1,67		
MAYO		3,61		

De acuerdo a la tabla 14, hasta la fecha, se tiene un acumulado del 4,1% en la actividad 1.1.3.

Cabe resaltar, que las acciones de mantenimiento realizadas por el operador, comprenden plateos de al menos 20 cm alrededor de la planta y eliminación de especies vegetales con potencial invasor. Además de la aplicación de fertilizantes para potenciar el desarrollo vegetativo de las plántulas.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 Incrementar la cultura ambiental de las comunidades

6.4. Actividad 2.1.1. REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN

El presente proyecto, contempla la realización de 2 eventos de presentación y 2 eventos de cierre del proyecto a las comunidades del municipio de El Tablón de Gómez.

En concordancia con lo anterior, en el mes de mayo de 2024, el contratista operador, llevo a cabo el segundo evento de difusión, el cual fue impartido a la comunidad beneficiaria de las Mesas.

En el desarrollo del evento, el operador, dio a conocer lo siguiente:

- Se presentaron los entes involucrados en el desarrollo del proyecto; operador, supervisión e interventoría.
- Se expusieron problemáticas ambientales del cambio climático
- Se dio a conocer la trazabilidad del proyecto
- Se mencionaron las características para ser beneficiario:
- Ser mayor de edad
- Ser alfabeto, o al menos que un miembro del grupo familiar lo sea
- Ser propietario o sano poseedor del predio donde se ejecutarán las actividades y contar con un documento de propiedad
- Que el predio a intervenir no presente actividad agropecuaria y sea dedicado a la conservación
- Desarrollar en sus predios las actividades establecidas en el proyecto conforme a los lineamientos técnicos que le sean indicados por el profesional y/o técnico que se encuentre realizándole el acompañamiento
- Destinar los materiales e insumos entregados exclusivamente para los objetivos y alcances del proyecto
- Asistir a las jornadas de capacitación, talleres y socializaciones programadas

Posterior a lo anterior, una vez se deja en claro las condiciones generales del proyecto, se procedió a socializar las actividades de técnicas a realizar de acuerdo al documento técnico de formulación; ACTIVIDAD 1.1.1 ESTABLECER EL MATERIAL VEGETAL (RESTAURACIÓN ACTIVA), ACTIVIDAD 1.1.2 AISLAR LAS ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN, ACTIVIDAD 1.1.3 EFECTUAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO, ACTIVIDAD 1.1.4 REALIZAR EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ÁREAS EN PROCESO DE RESTAURACIÓN, ACTIVIDAD 2.1.1 REALIZAR EVENTOS DE DIFUSIÓN y ACTIVIDAD 2.1.2 EFECTUAR ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN.

Finalmente, el operador, dio respuesta a las inquietudes presentadas por los beneficiaros, en relación a la documentación, zonas priorizadas, los insumos a entregar, las dimensiones de los predios y la utilidad de los predios.

A continuación, se presenta un registro fotográfico de la actividad:



Figura 4. *Registro fotográfico – segundo evento de difusión*

7. AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

De acuerdo a la información financiera de ejecución presentada por la Fundación Colombia Renueva correspondiente al acumulado del 01 de MAYO al 31 de MAYO de 2024, se tiene lo siguiente:

Tabla 15. *Detalle de avance financiero del proyecto*

COMPONENTE DE EJECUCION	
VALOR APROBADO POR LA INTERVENTORIA	**$ 506.171.203,51**

Nº	ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR TOTAL (MAYO 2024)	VALOR ACUMULADO	%
1	**ESTABLECIMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL**	HECTÁREAS	149,75	$ 9.569.143,59	$ 1.432.979.253,25	41,53	$ 397.406.533,47	$ 604.865.566,60	42,21%
2	**AISLAMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES**	KILÓMETROS	24,86	$ 15.917.706,68	$ 395.714.188,02	4,99	$ 79.429.356,32	$ 136.255.569,17	34,43%
3	**TALLERES DE SOCIALIZACION**	NÚMERO	4	$ 1.505.000,00	$ 6.020.000,00	1	$ 1.505.000,00	$ 3.010.000,00	50,00%
4	**TALLERES DE SENSIBILIZACION Y DIVULGACION**	NÚMERO	6	$ 1.825.000,00	$ 10.950.000,00	0	$ -	$ 5.475.000,00	50,00%
5	**MANO DE OBRA CALIFICADA**	MES/HOMBRE	GLOBAL	$ 430.119.443,76	$ 430.119.443,76	GLOBAL	$ 18.815.299,24	$ 124.557.848,68	28,96%
6	**GASTOS OPERACIONALES**	NÚMERO	21	$ 1.214.931,08	$ 25.513.552,58	1	$ 1.214.931,08	$ 4.859.724,30	19,05%
7	**SEGUIMIENTO Y MONITOREO**	NÚMERO	5	$ 4.132.998,80	$ 20.664.994,00		$ -	$ 8.265.997,60	40,00%
8	**MANTENIMIENTO (1,2 y 3)**	NÚMERO	3	$ 230.478.294,76	$ 691.434.884,29	0,06	$ 7.800.083,40	$ 12.417.344,73	1,80%

9	**MANTENIMIENTO (4)**	NÚMERO	1	$ 120.274.707,50	$ 120.274.707,50		$ -	$ -	
10	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**	NÚMERO	1	$ 42.478.585,00	$ 42.478.585,00		$ -	$ 42.478.585,00	100,00 %
TOTALES				**$ 857.515.811,17**	**$ 3.176.149.608,39**		$ 506.171.203,51	$ 942.185.636,07	29,66%
VALOR TOTAL CONTRATO				**$ 857.515.811,17**	**$ 3.176.149.608,39**		$ 506.171.203,51	$ 942.185.636,07	29,66%

Por lo tanto;

CONSOLIDADO EJECUCIÒN FINANACIERA		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
EJECUCIÓN APROBADA (CORRESPONDE AL INFORME ACTUAL)	$ 506.171.203,51	15,94%
VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA	**$ 942.185.636,07**	**29,66%**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 2.233.963.972,32**	**70,34%**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 3.176.149.608,39**	**100,00%**

8. CONCLUSIONES

- La FUNDACIÓN MERCAJUSTO, logro validar la ejecución integra de las actividades; *1.1.1 Establecer el material vegetal (Restauración Activa) con un avance acumulado del* ***42,21%****, 1.1.2. Aislar las áreas en proceso de restauración con un avance acumulado del* ***34,43%,*** *1.1.3. Mantenimiento en áreas de restauración con un avance acumulado del* ***4,1%*** *y 2.2.1 Realización de eventos de difusión con un avance acumulado del* ***50%***. Durante el proceso se verifico que las actividades desarrolladas ejecutaran los lineamientos y especificaciones del documento técnico.

- Se evidencia el incumplimiento de la meta programada para el mes de mayo de la actividad *1.1.4. Realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación a las áreas en proceso de restauración*, por tal motivo se insta a la Fundación Colombia Renueva, para que tome las acciones pertinentes que permitan equiparar los rezagos y se logre cumplir de manera íntegra al alcance y objeto del presente proyecto.

- Respecto a la actividad *2.2.1 Realización de eventos de difusión,* el operador, desarrolló el segundo evento de difusión, el cual estaba programado para el mes de julio.

- En relación a la actividad *2.2.2 Efectuar actividades de sensibilización,* para el presente corte, de acuerdo al cronograma de ejecución, debía desarrollarse un taller se sensibilización, sin embargo, este fue llevado a cabo en el mes de abril, de esta manera no se afecta el desarrollo integro de esta actividad.

- Para el mes de mayo de 2024, se obtiene una ejecución financiera mensual del proyecto de 15,94% y se alcanza un acumulado total de 29,66% correspondiente a un monto total de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE **($ 942.185.636,07)**.

Atentamente;

CARMEN LEONOR HIDALGO MELO
C.C. 30.722.106 de Pasto (N)
R.L. FUNDACIÓN MERCAJUSTO
Nit. 900.198.924-5
