FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	11	MES	12	AÑO	2023

SEMANA N°	1	DEL	miércoles, 06 de diciembre de 2023	AL	sábado, 09 de diciembre de 2023
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :			

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
1. Señalización y cerramiento provisional tela verde H=2 MTS: Construcción de cerramiento con poli sombra color verde (55gr/m2) con repisas de 8cm x4 cm, enterrados 60cm, cada 2,0m; las repisas deben ser mínimo de 3m de altura; se debe dejar puerta de acceso	60,00%	60,00%	Se inicia el cerramiento como lo indica el item, esto para evitar el ingreso de personal ajeno a la obra y asi poder evitar cualquier incidente o accidente	
1.1 Levantamiento loseta de 40*40 andenes Y Bordillos: Retiro y trasiego para almacenamiento de la loseta existente de 40cm x 40cm en la circulación exterior de las salas de velación, retiro de andenes y bordillos en buen estado y trasiego para almacenamiento	0,00%	5,00%	Se inicia el levantamiento de la losetas de 40x40, esto se realiza manualmente, donde se aplilaran y entregaran a la entidad para un uso posterior	
2.49 IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL DE CUBIERTAS Y PINTURA EXTERIOR Retiro impermeabilización en mal estado: Desmonte y retiro por medios manuales de la impermeabilización existente deteriorada; trasiego y disposición final a botadero certificado.	0,00%	3,00%	Se comienza con el retiro del manto actual que esta en mal estado, para poder realizar la limpieza de la placa para el nuevo manto a instalar	
TOTALES				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 1.023.666.666,67	10.748.500,00	**1.012.918.166,67**		1,05%	0,00%


IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	2	INSPECTOR	
INGENIEROS	2	OBREROS	
TOPÓGRAFO		AYUDANTES	
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

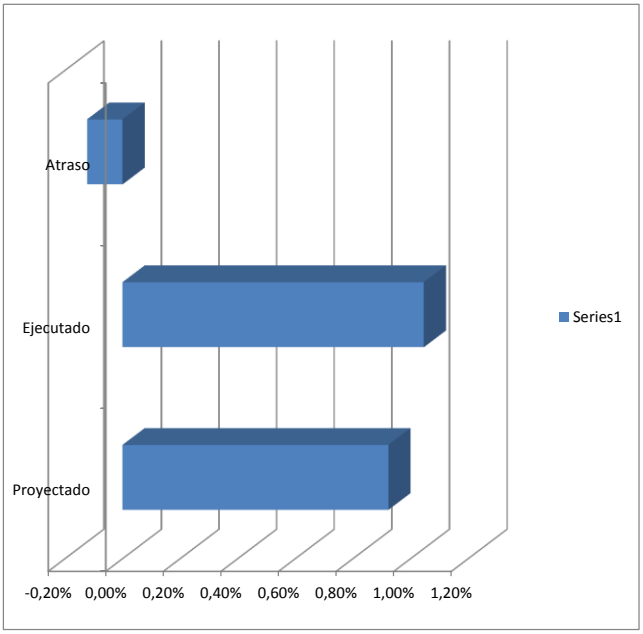

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL							INFORME SEMANAL						
Página: 1 de				DIA	11	MES	12	AÑO	2023				
SEMANA N°	1	DEL	miércoles, 06 de diciembre de 2023			AL	sábado, 09 de diciembre de 2023						

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• Se revisa el cronograma de actividades vs a lo ejecutado y no se encuentra en atrasos a la fecha



LUDWING MORALES PENUELA
RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Código:			Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	1	DEL	miércoles, 06 de diciembre de 2023		AL	sábado, 09 de diciembre de 2023	
FECHA INICIO :		FECHA TERMINO :					

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO					
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Se realiza el retiro de la losetas de 40 x 40 realizado apilado inicial a un costado de las salas de velcion.**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Se hace el retiro de las losetas con un proceso manual**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**SE realizo la instalacion de la polisombra para generar una barrera y evitar el paso de personal no autorizado y evitar algun tipo de incidente**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Se ve como se esta apilando las losetas inicialmente**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Cargue de losetas en camiones del ejecrcito para un nuevo uso en otra institucion.**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Exploracion de las cajas existentes de aguas negras, provenientes de las salas de velacionm, ya que estan ubicadas en el trayecto del nuevo sendero peatonal.**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Retiro de losetas de los senderos peatonales**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Polisombra instalada, iluminacion a retirar.**
