FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	11	MES	12	AÑO	2023

SEMANA N°	02/01/2024	DEL	martes, 02 de enero de 2024	AL	sábado, 06 de enero de 2024
FECHA INICIO :	02/01/2024	FECHA TERMINO :	06/01/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS SENDEROS PEATONALES DE LAS SALAS DE VELACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIA Y BIENESTAR DEL EJÉRCITO Y EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CATEDRAL CASTRENSE JESUCRISTO REDENTOR UBICADA EN EL CANTÓN NORTE, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023				
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS			ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS
1,4 Excavación Material común zona central: Excavación de subbase existente, retirando a botadero certificado el material contaminado y almacenando para su posterior uso el material en buen estado. El material en buen estado se debe aplicar y extender en capa	55,00%	21,00%		
2,11 Resanes y pintura general: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílica mate, tres manos del color a elección. Para su aplica	0,00%	2,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,14 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	0,00%	2,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,17 Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su aplicació	0,00%	2,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,20 BODEGA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su ap	0,00%	2,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,22 CAPILLA Resane y pintura muros: Realizar resanes con estuco plástico en fisuras, humedades o zonas deterioradas; se debe lijar y prepara la superficie a resanar, aplicación de pintura tipo koraza o acrílico mate, tres manos del color a elección. Para su a	0,00%	2,00%	Se inicia resanes de pintura en casa cural	
2,50 Suministro e instalación de impermeabilización: Suministro e instalación de manto sellado con calor, bicapa con especificación de uso para cubiertas expuestas a cambio de temperatura.	0,00%	20,00%	Se comienza a colocar el manto a la casa cural	
TOTALES				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 1.023.666.666,67	8.031.846,15	**1.015.634.820,52**		0,78%	16,24%

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
ARQUITECTOS	2	INSPECTOR	1,00
INGENIEROS	2	OBREROS	21,00
TOPÓGRAFO	0	AYUDANTES	

PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
				SI ☐ NO ☒


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Página: 1 de	DIA	11	MES	12	AÑO	2023

SEMANA N°	02/01/2024	DEL	martes, 02 de enero de 2024	AL	sábado, 06 de enero de 2024

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)

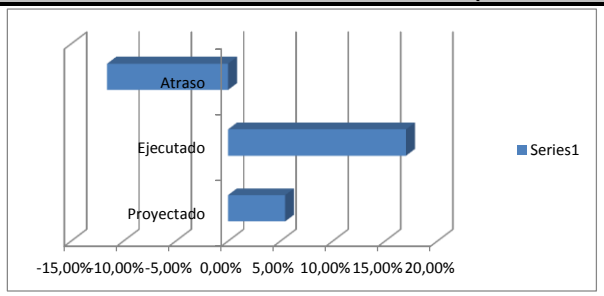

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

• Se revisa el cronograma de actividades vs a lo ejecutado y no se encuentra en atrasos a la fecha

LUDWING MORALES PENUELA
RESIDENTE INTERVENTOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL

Código:			Versión:		Fecha de Emisión:		Página:
SEMANA N°	5	DEL	martes, 02 de enero de 2024		AL	martes, 02 de enero de 2024	
FECHA INICIO :	02/01/2024	02/01/2024			06/01/2024		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO					
INTERVENTOR	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES RAM SAS	NIT O C.C.	901.202.489-3	CONTRATO N°	317
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES COMPAÑIA S.A.S INCO S.A.S	NIT O C.C.	820.004.462-2	CONTRATO N°	284

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN: CANTON NORTE, SALA DE VELACION

COMENTARIOS: **Lluvia fin de semanam excavacion de sendero**




UBICACIÓN: CANTON NORTE, SALA DE VELACION

COMENTARIOS: **Lluvia fin de semanam excavacion de sendero**



UBICACIÓN: CANTON NORTE, SALA DE VELACION

COMENTARIOS: **Impermeabilizacion de casa cural**

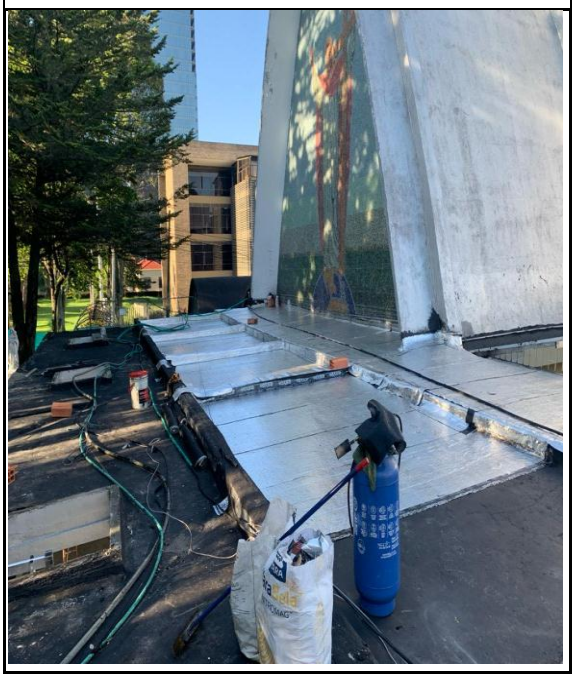

UBICACIÓN: CANTON NORTE, SALA DE VELACION

COMENTARIOS: **Impermeabilizacion de casa cural**



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Resame de pintura en casa cural



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Resane de humedad en casa cural



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Resame de pintura en casa cural



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Se realizara la instalacion de baldosas faltantes en la casa cural




UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Proceso de impermealibilizacion casa cural para evitar la humedad debajo de placa



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	Resane de pintura en casa cural



UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Resane de pintura en casa cural**

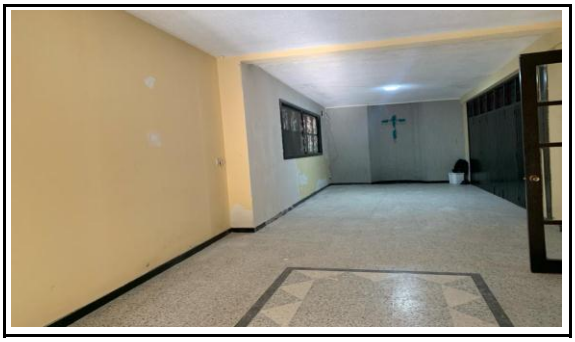

UBICACIÓN:	CANTON NORTE, SALA DE VELACION
COMENTARIOS:	**Resane de pintura en casa cural**
